CONTRATO DE OBRA No 2019-1780

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ZONA PRIMERA – NORTE
LOCALIDADES 1 USAQUÉN Y 11 SUBA

INFORME MENSUAL N° 7

MAYO DE 2020


CONSORCIO SEÑALIZA BTA

JUNIO DE 2020

CONTROL DE REVISIONES

Revisión	Descripción	Modificación	Fecha
0	Documento Original	N/A	12 – Junio - 2020
1			
2			
3			

POR EL CONTRATISTA

	Nombre	Cargo	Firma
Aprobó	Alfonso Urrego Malagón	Director de obra.	
Revisó	Roberto Carlos Pérez	Ingeniero Residente	

POR LA INTERVENTORÍA

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó y aprobó	Samuel Fernando Homez López	Director de Interventoría	

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN- 9
2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 9
2.1 Pólizas 10
3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 11
4 PERIODO DEL INFORME 12
5 COMPONENTE DE OBRA 12
5.1 Recurso humano 12
5.2 Equipos 13
5.3 Estado de avance Identificadores de diseño (ID) 14
5.4 Balance económico 16
5.4.1 Parte 1 – Suministro e instalación de la señalización 16
5.4.2 Parte 2 – Suministro de señalización 17
5.5 Georreferenciación 18
6 COMPONENTE DE CONSULTORÍA 19
6.1 Recursos utilizados, personal y equipo 19
6.2 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 20
6.3 ETAPA 1 DE DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN 21
6.4 ETAPA 2 DE DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN 24
6.5 ETAPA 3 DE DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN 25
6.6 DISEÑOS FACTURADOS 26
6.7 ESTADO DEL CONTRATO 26
7 ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL 27
7.1 Componente de Consultoría 27
7.2 Componente de obra 27
7.3 Análisis estadístico de las actividades ejecutadas 28

8 CALIDAD DE LOS TRABAJOS 29
9 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 30
10 ASPECTOS TÉCNICOS 31
10.1 Problemas y soluciones 31
11 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 32
11.1 Objetivo general 32
11.2 Objetivos específicos 32
11.3 GESTIÓN SOCIAL PARQUE DE LA VIDA 33
11.3.1 Línea de trabajo 33
11.3.2 Objetivo 33
11.3.3 Actividad 33
11.3.4 Meta Lograda 34
11.3.5 Descripción de área de influencia 34
11.3.6 Metodología de socialización 34
11.3.7 Seguimiento técnico y social a esta intervención. 42
11.4 GESTIÓN SOCIAL CARDENAL SANCHA 43
11.4.1 Línea de trabajo 43
11.4.2 Objetivo 43
11.4.3 Actividad 43
11.4.4 Meta Lograda 44
11.4.5 Descripción de área de influencia 44
11.4.6 Metodología de socialización 44
11.5 GESTIÓN SOCIAL CEDRO BOLÍVAR 47
11.5.1 Línea de trabajo 47
11.5.2 Objetivo 47
11.5.3 Actividad 47
11.5.4 Meta Lograda 47
11.5.5 Descripción de área de influencia 47

11.5.6 Metodología de socialización: 48
11.5.7 Seguimiento social y técnico a esta intervención 49
11.6 GESTIÓN SOCIAL DANUBIO 49
11.7 Conclusiones de la gestión social 52
12 INFORME DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL 52
12.1 Objetivo general 52
12.2 Objetivos específicos 52
12.3 Actividades ejecución. 53
12.4 Seguridad social 53
12.5 Inspecciones de seguridad 53
12.6 Personal del contrato 53
12.6.1 PERSONAL OPERATIVO REPORTE DE TEMPERATURAS 55
12.7 Dotación y elementos de protección personal 58
12.8 Carnetización del personal 58
12.9 Identificación de los vehículos 58
12.10 Actividades realizadas 59
12.11 Reporte de accidentalidad 59
12.12 Conclusiones del informe HSEQ 59
13 CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 60

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 - Datos del contrato 10
Tabla 2 - Listado de Pólizas 11
Tabla 3 - Recurso humano 13
Tabla 4 - Resumen de avance 14
Tabla 5 - Presupuesto ejecutado en el mes 15
Tabla 6 - Avance en porcentaje y en millones de pesos 16
Tabla 7 – Resumen planillas 17
Tabla 8 - Balance de ejecución del componente de obra 17
Tabla 9 - Estado de la georreferenciación de los ID para cobro. 18
Tabla 10 - Personal componente de consultoría 19
Tabla 11 - Equipos y recursos del componente de consultoría 20
Tabla 12 - Zonas de Influencia asignados en el transcurso del contrato. 22
Tabla 13 - Zonas de Influencia aprobadas en la etapa 1 23
Tabla 14 - Fecha de asignación de zonas de Influencia para etapa 1 23
Tabla 15. Balance del contrato etapa 1 24
Tabla 16 - Estado de zonas de influencia en Etapa 2 25
Tabla 17. Estado del contrato etapa 2 25
Tabla 18. Estado de zonas de influencia en Etapa 3. 25
Tabla 19. Balance del contrato 26
Tabla 20 - Estado del contrato 27
Tabla 21 - Avance presupuestal 28
Tabla 23 - Seguridad Social personal administrativo 54

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Localización del proyecto 12
Ilustración 2 – Resumen análisis estadístico 29
Ilustración 3.Recorte del video con perifoneo realizado en el Parque de la Vida 43
Ilustración 4.Recorte de video de perifoneo en Cardenal Sancha 45
Ilustración 5.Recorte de video perifoneo en Cardenal Sancha 47
Ilustración 6.Recorte de video de perifoneo en Cedro Bolívar 49
Ilustración 7.Carros parqueados en vía pública 51
Ilustración 8.Recorte de video de perifoneo en Danubio 51
Ilustración 9 – Temperaturas personal Consorcio Señaliza 54
Ilustración 10 - Temperaturas personal Arquitectura y Señalización SAS. 55
Ilustración 11 - Temperaturas personal Socinter SA 55
Ilustración 12. Temperaturas personal Cefevial SA 56
Ilustración 13.Temperaturas personal Q&R Señalizacion SA 56
Ilustración 14. Temperaturas personal LAYC 57
Ilustración 15.Temperaturas personal MAS Soluciones 57
Ilustración 16 - Elementos de protección personal 58
Ilustración 17. Desinfección de vehículos 59

RELACIÓN DE ANEXOS

Anexo 1: Acta parcial y planillas de obra

Anexo 2: Certificados de Calidad de materiales

Anexo 3: Formatos diligenciados de implementación horizontal y vertical

Anexo 4: Formatos de inspección

Anexo 5: Registro fotográfico de la implementación

Anexo 6 Formatos de entrega a almacén

Anexo 7: Soportes del Informe de Gestión Social

Anexo 8: Soportes del Informe de Seguridad Industrial

1 INTRODUCCIÓN-

Con este informe se da cumplimiento al numeral 4.3.13 Informes Mensuales del Contrato de Obra por Zona, del Anexo Nº 1 – Anexo Técnico Definitivo Proceso Licitatorio SDM-LP-026 -2019, que dio origen al contrato de Obra 2019 - 1780 firmado entre la Secretaría de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, cuyo objeto es "Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas en la ciudad de Bogotá D.C." En él se incluye la descripción de las actividades desarrolladas del 5 de mayo de 2020, y el 4 de junio de 2020, evaluando lo avanzado en cada una de sus etapas del componente de consultoría, como en la ejecución de obra de los ID intervenidos, realizando el correspondiente análisis financiero del periodo.

También se presenta la descripción de las actividades de gestión social realizadas con la comunidad vecina y usuaria de la señalización a implementar, y el reporte de las acciones realizadas para el cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial establecidas.

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Se presentan a continuación los datos generales del contrato:

Contrato de obra:	2019-1780
Contratante	Secretaría de Movilidad de Bogotá
Contratista	Consorcio Señaliza Btá
Objeto:	Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas en la ciudad de Bogotá D.C.
Zona:	Primera - Norte
Localidades:	Usaquén y Suba
Valor total:	$5.305.000.000 IVA incluido
Duración:	10 meses
Fecha Acta de inicio:	5 de noviembre de 2019
Acta de suspensión 1	Del 26 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020

Acta de suspensión 2	Del 13 de abril de 2020 al 19 de abril de 2020
Acta de reinicio	20 de abril de 2020
Fecha finalización	29 de septiembre de 2020

Interventoría	Consorcio Movilidad Vial 2019
Contrato	2019-1799
Objeto	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica a los contratos derivados del Proceso de Licitación Publica N° SDM-LP-026-2019 – Zona 1 - Norte
Valor total:	$1.417.363.331
7Duración:	11 meses
Fecha Acta de inicio:	5 de noviembre de 2019
Acta de suspensión 1	Del 26 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020
Acta de suspensión 2	Del 13 de abril de 2020 al 19 de abril de 2020
Acta de reinicio	20 de abril de 2020
Fecha finalización	29 de octubre de 2020

Tabla 1 - Datos del contrato

2.1 Pólizas

La ejecución de este contrato está amparada por las siguientes pólizas que cubren los respectivos riesgos:

Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	Póliza No.	Aseguradora
	Inicial	Final			
Cumplimiento	06-09-2019	01-04-2021	$1.591.500000	11-44-101142817	Seguros del Estado
Calidad del Servicio	30-09-2020	02-04-2021	$1.591.500.000	11-44-101142817	Seguros del Estado
Calidad y funcionamiento de los bienes	30-09-2020	02-04-2021	$1.591.500.000	11-44-101142817	Seguros del Estado
Salarios y Prestaciones	06-09-2019	1-10-2023	$1.061.000.000	11-40-101142817	Seguros del Estado

Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	Póliza No.	Aseguradora
	Inicial	Final			
Estabilidad de Obra	6-07-2020	6-07-2025	$1.591.500.000	11-44-101142817	Seguros del Estado
Responsabilidad Civil	06-09-2019	4-10-2020	$265.250.000	11-40-101033850	Seguros del Estado

Tabla 2 - Listado de Pólizas

Nota: En los Anexo 6 y 10 de estas pólizas se ampliaron las vigencias de las mismas dadas las suspensiones del contrato y conforme las fechas solicitadas por la Secretaria de Movilidad

3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las actividades de campo del componente de consultoría y las necesarias para la implementación de la señalización del componente de obra, se realizan en las localidades de Usaquén y Suba, que se muestran de forma esquemática en la ilustración 1:

No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 4.1 Lineamientos técnicos del Anexo Nº 1 – Anexo Técnico Definitivo, de manera excepcional y conforme a la necesidad del servicio, se podrán adelantar intervenciones de señalización en otras zonas diferentes a la asignada, previa aprobación del Comité y de los responsables de área señalados en el citado numeral. Tal es el caso de las intervenciones en los ID MV_12_102_1560_10 - Ciclorruta de la Transversal 28 y EX_13_200_1881_12 – Ciclorruta Calle 57.



Ilustración 1 - Localización del proyecto

4 PERIODO DEL INFORME

Este informe presenta el detalle de las actividades de consultoría y obra realizadas por el Consorcio Señaliza Btá en cumplimiento del Contrato 2019-1780, para el periodo del 5 de mayo de 2020 al 4 de junio de 2020.

5 COMPONENTE DE OBRA

Para la ejecución de las actividades de obra se dispuso de los siguientes recursos durante el período de este informe:

5.1 Recurso humano

Se relaciona a continuación el equipo de trabajo profesional, tecnólogo, administrativo y operativo vinculado a la ejecución del componente obra:

FUNCIONARIO	CARGO
Alfonso Urrego Malagón	Director de Obra
Andrés Guzmán	Especialista en Tránsito
Roberto Carlos Pérez Patiño	Residente de Obra 1
Luisa Fernanda Chavez	Residente de Obra 2
Pedro Alexander Martínez Gutiérrez	Tecnólogo en Georreferenciación
Yenny Yasmin Páez Bravo	Tecnóloga en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Andrea Viviana Niño Carrión	Trabajadora Social
Diana Elizabeth Casilimas Martínez	Secretaria
Andrés Felipe Casilimas Martínez	Conductor 1

Tabla 3 - Recurso humano

En el Capítulo 12 - Informe de Seguridad Industrial y Ocupacional se presenta en detalle el personal que conforma las cuadrillas que trabajaron en la implementación de la señalización durante el periodo del informe.

5.2 Equipos

Durante el período del presente informe se emplearon los siguientes equipos para la ejecución de los trabajos:

- 2 Vehículos autopropulsado y/o montados para aplicación de pintura liquida con equipo delineador marcas KIA 3000, Chevrolet, Daihatsu y JMC
- 3 Equipos de aplicación manual de pintura marca Titan 6900 (1) y Linelazer Graco (2)
- 1 Equipo de aplicación manual de plástico en frio por el método Spray marca Graco
- 4 Plantas eléctricas marca Cormag y Yamaha
- 6 Taladros marca Bosh (2) y Dewalt (4)
- 1 Equipo de borrado de señalización marca Smitil
- Herramienta menor

Para el control de calidad de la señalización implementada se emplearon los siguientes instrumentos de control en cada frente de obra:

- 1 Galga para la verificación de espesores húmedos
- 1 Medidor de espesores secos para tomar lecturas de la demarcación sobre testigos
- 1 Retro-reflectómetro
- 1 Lupa con aumento de 80X
- 1 Cinta métrica / Odómetro
- 1 Equipo para medir temperatura ambiente y de la superficie por demarcar.
- 1 Equipo para medir humedad relativa

5.3 Estado de avance Identificadores de diseño (ID)

En el siguiente cuadro se presenta el resumen del avance de los Identificadores de Diseño (ID), en el periodo del informe:

ID	Sector	Inspeccionado	En ejecucion	Terminados
MV_01_033_1560_10	Auto Norte	18/nov/19	16/dic/19	14/feb/19
EX_12_007_1249_11 MV_11_351_1236_11 MV_ _352_1236_11	AV SUBA	18/nov/19	26/nov/19	12/dic/19
EX_01_298_ 236_11	Santa Paula	18/nov/19	01/dic/19	08/ene/20
MV_01_032_945-10	CL134	18/nov/19	05/feb/20	
MV_01_293_1236_11	CL161	18/nov/19	19/ene/20	04/mar/20
MV_01_032_945-10	CL164	31/dic/19	19/ene/20	04/mar/20
EX_11_ 151_1560_10	Pontevedra	09/ene/20	14/ene/20	04/mar/20
MV_12_102_1560	Ciclorruta TV 28	17/dic/20	14/dic/20	04/feb/20
EX_13_200_1881	Ciclorruta Cl 57	17/dic/20	14/dic/20	04/mar/20
EX_11_295_1236	Danubio	20/ene/20	14/feb/20	
EX_11_272_868	San Nicolas	29/ene/20	25-feb	04/jun/20
MV_11_352_1236	AV suba Cl120	18/nov/19	10-feb	04/may/20
MV_01_306_1236	Ciclorruta KR 19	03/feb/20	19-feb	04/jun/20
EX_11_376_1842	CP CL 175	06/feb/20	13-mar	
EX_01_346_1842	CP KR 19A	06/feb/20	13-mar	
CP-ENTREGA 3	CP SUBA- USAQUEN	31/ene/20	14-mar	
EX_01_112_1560_10	Cardenal Sancha	18/feb/20	4-may	
EX_11_390_1842_12	CP CL 160	11/feb/20	29/abr/20	
MV_AV_CALI_941_09	CP - AV CALI KR 93	18/mar/20	10-may	
EX_01_358_1842_12	PARQUE DE LA VIDA	20/feb/20	28/abr/20	
EX_01_356_1842_12	CEDRO BOLIVAR	07/may/20	15-may	
CP-ENTREGA 4	CP SUBA- USAQUEN	20/may/20		
MV_AV_CALI_941_09	CP - AV CALI CL 134	20/may/20	24-may	
23	**TOTAL**	**23**	**22**	**11**

Tabla 4 - Resumen de avance

En los anteriores ID se ha ejecutado la siguiente cantidad de obra:

			Ejecutado MES 1	Ejecutado MES 2	Ejecutado MES 3	Ejecutado MES 4	Ejecutado MES 5		Ejecutado MES 6
ID Sector	Presupuesto	% ejecutado	nov-20	dic-20	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20
Primer suministro	$ 46.183.000	100%	$ 46.183.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Compromiso prioritario Pasacalles	$ 5.103.160	100%	$ -	$ 5.103.160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MV_01_033_1560_10	$ 120.287.719	100%	$ -	$ 44.514.746	$ 5.996.805	$ 69.776.168	$ -	$ -	$ -
Corredor Suba 50km/h	$ 12.609.331	100%	$ 12.096.522	$ 512.809	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EX_01_298_1236_11_V3	$ 66.105.592	100%	$ 9.225.099	$ 56.880.493	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MV_12_102_1560_10_V6	$ 166.135.673	100%	$ -	$ 50.432.105	$ 115.703.568	$ -	$ -	$ -	$ -
EX_13_200_1881_12_V2	$ 383.459.454	100%	$ -	$ 105.567.367	$ 93.626.090	$ 183.991.406	$ -	$ -	$ -
EX_11_151_1560_10_V3	$ 402.208.983	100%	$ -	$ -	$ 99.230.944	$ 302.978.039	$ -	$ -	$ -
MV_01_293_1236_11_V6	$ 18.930.137	100%	$ -	$ -	$ 2.242.140	$ 16.687.998	$ -	$ -	$ -
MV_01_032_945_10_V22	$ 26.138.065	100%	$ -	$ -	$ 738.722	$ 25.399.343	$ -	$ -	$ -
MV_11_352_1236_11_V6	$ 35.063.017	100%	$ -	$ -	$ -	$ 17.322.388	$ 7.110.828	$ 10.629.801	$ -
MV_01_032_945_10_V22	$ 35.172.650	77%	$ -	$ -	$ -	$ 1.740.997	$ 4.925.276	$ 20.403.423	$ 4.090.957
EX_01_295_1236_11_V2	$ 757.913.630	75%	$ -	$ -	$ -	$ 274.590.522	$ 68.697.577	$ 55.064.127	$ 167.399.120
EX_11_272_868_12_V2	$ 105.726.278	86%	$ -	$ -	$ -	$ 13.334.041	$ 31.807.608	$ 29.070.768	$ 16.240.610
MV_01_306_1236_11_V6	$ 64.331.494	100%	$ -	$ -	$ -	$ 18.391.708	$ 28.951.717	$ 14.951.517	$ 6.803.526
EX_11_376_1842_12	$ 37.481.632	94%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.242.132	$ 15.984.438	$ -
EX_01_346_1842_12	$ 28.831.760	86%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.696.611	$ 15.089.041	$ -
CP-ENTREGA 3	$ 22.748.997	12%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 880.509	$ 1.006.992	$ 880.510
EX_01_112_1560_10	$ 235.409.175	77%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.540.918	$ 157.689.015
EX_11_390_1842_12	$ 66.443.002	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66.443.002	$ -
EX_01_358_1842_12	$ 568.738.455	73%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 142.184.614	$ 270.266.679
Segundo suministro	$ 133.186.500	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 133.186.500	$ -
MV_AV_CALI_941_09	$ 26.687.341	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.687.341
EX_01_356_1842_12	$ 332.032.443	43%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 141.797.369
MV_AV_CALI_941_09	$ 65.592.222	24%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.046.115
TOTAL	**$ 3.762.519.710**	**82%**	**$ 67.504.621**	**$ 263.010.680**	**$ 317.538.268**	**$ 924.212.610**	**$ 171.312.258**	**$ 527.555.140**	**$ 807.901.242**

Tabla 5 - Presupuesto ejecutado en el mes

Por lo tanto, el avance parcial y acumulado es el siguiente:

OBRA

MES	AVANCE MENSUAL PROYECTADO (%)	ACUMULADO PROYECTADO (%)	AVANCE REAL MES (%)	ACUMULADO REAL (%)	ACUMULADO REAL MENOS ACUMULADO PROYECTADO (%)
1	5,0%	5,0%	1,4%	1,4%	-3,6%
2	8,0%	13,0%	5,4%	6,8%	-6,2%
3	10,0%	23,0%	6,5%	13,3%	-9,7%
4	11,0%	34,0%	18,9%	32,2%	-1,8%
5	11,0%	45,0%	14,3%	46,5%	1,5%
6	11,0%	56,0%	16,5%	63,1%	7,1%

MES	AVANCE MENSUAL PROYECTADO ($)	ACUMULADO PROYECTADO ($)	AVANCE REAL MES ($)	ACUMULADO REAL ($)	ACUMULADO REAL MENOS ACUMULADO PROYECTADO ($)
1	244,1	244,1	68	68	-$ 176,6
2	390,6	634,8	263	331	-$ 304,2
3	488,3	1.123,0	318	648	-$ 475,0
4	537,1	1660,1	924	1572	-88
5	537,1	2197,2	699	2271	74
6	537,1	2734,3	808	3079	345

Tabla 6 - Avance en porcentaje y en millones de pesos

5.4 Balance económico

En el Anexo – 1 Planillas de Obra se tienen las presentan las cantidades de obra de los puntos que se ejecutaron en el período:

5.4.1 Parte 1 – Suministro e instalación de la señalización

En el Anexo 1 se presentan las planillas de los puntos o ID terminados durante el periodo del informe, cuyos totales se relacionan a continuación:

ID Sector	Presupuesto	% ejecutado Cuenta 7	Ejecutado Para Cobro Cuenta 7
EX_11_390_1842_12	$ 66.443.002	99%	$ 66.021.769
CP- PMT- CANTON NORTE	$ 1.006.992	100%	$ 1.006.992
MV_01_306_1236	$ 64.331.494	10%	$ 6.525.657
MV_01_032_945	$ 35.172.650	12%	$ 4.090.957
MV_AV_CALI_941	$ 26.687.341	100%	$ 26.639.437
EX_11_272_868	$ 105.726.278	15%	$ 16.313.276
EX_11_295_1236	$ 757.913.630	20%	$ 148.971.750
EX_01_358_1842	$ 568.738.455	73%	$ 412.451.293
EX_01_356_1842	$ 332.032.443	39%	$ 129.039.017
EX_01_112_1560	$ 235.409.175	33%	$ 77.303.086
TOTAL 1	**$ 2.193.461.460**	**41%**	**$ 888.363.234**

Tabla 7 – Resumen planillas

5.4.2 Parte 2 – Suministro de señalización

Durante el período del informe no se realizó suministro de señalización.

Por lo tanto, el balance económico es el siguiente:

VALOR INICIAL COMPONENTE DE OBRA

Suministro e instalación	$ 4.673.841.463
Suministro	$ 209.048.870
Total componente de obra	$ 4.882.890.333

AVANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE OBRA

Pagos	Costo directo	AIU	Costo básico	Suministros	Valor Acta	Rete-garantía (5%)	Total a girar
Cuenta No 1	$ -	$ -	$ -	$ 46.183.000	$ 46.183.000		$ 46.183.000
Cuenta No 2	$ 61.225.772	$ 22.592.310	$ 83.818.082	$ -	$ 83.818.082	$ 4.190.904	$ 79.627.178
Cuenta No 3	$ 158.252.172	$ 58.395.052	$ 216.647.224	$ -	$ 216.647.224	$ 10.832.361	$ 205.814.863
Cuenta No 4	$ 777.878.821	$ 287.037.285	$ 1.064.916.106	$ -	$ 1.064.916.106	$ 53.245.805	$ 1.011.670.300
Cuenta No 5	$ 242.723.605	$ 89.565.010	$ 332.288.615	$ -	$ 332.288.615	$ 16.614.431	$ 315.674.184
Cuenta No 6	$ 77.523.001	$ 28.605.987	$ 106.128.988	$ 133.186.500	$ 239.315.488	$ 5.306.449	$ 234.009.039
Cuenta No 7	$ 648.913.976	$ 239.449.257	$ 888.363.234		$ 888.363.234	$ 44.418.162	$ 843.945.072

Total facturado Cuenta 1	$ 46.183.000	0,95%
Total facturado Cuenta 2	$ 83.818.082	1,72%
Total facturado Cuenta 3	$ 216.647.224	4,44%
Total facturado Cuenta 4	$ 1.064.916.106	21,81%
Total facturado Cuenta 5	$ 332.288.615	6,81%
Total facturado Cuenta 6	$ 239.315.488	4,90%
Total facturado Cuenta 7	$ 888.363.234	18,19%
Total acumulado	$ 2.871.531.748	58,81%
Saldo por facturar	$ 2.011.358.585	41,19%

Tabla 8 - Balance de ejecución del componente de obra

5.5 Georreferenciación

Durante el desarrollo del contrato hasta el 4 de julio de 2020 se realizó la georreferenciación de los siguientes ID que están para cobro:

No.	ID	ESTADO	CUENTA	FECHA RADICADO	APROBADO INTERTVENTORIA	APRBADO SDM	RADICADO PLANO RECORD
1	EX_01_298_1236_11_V3	APROBADO SDM	2	31/01/2020	24/02/2020	13/05/2020	
2	EX_12_007_1249_11_V5	APROBADO SDM	2	29/01/2020	24/02/2020	12/03/2020	
3	MV_11_351_1236_11_V2	APROBADO SDM	2	29/01/2020	24/02/2020	7/05/2020	
4	MV_11_352_1236_11_V6	APROBADO SDM	2	29/01/2020	17/02/2020	12/03/2020	
5	MV_01_033_1560_10_V12	APROBADO SDM	3	20/02/2020	11/05/2020	20/05/2020	
6	MV_12_102_1560_10_V6	REV. SDM	3	26/02/2020	5/05/2020		
7	MV_01_293_1236_11_V6	APROBADO SDM	4	6/04/2020	5/05/2020	13/05/2020	
8	MV_01_032_945_10_V22	APROBADO SDM	4	6/04/2020	6/05/2020	13/05/2020	
9	EX_01_295_1236_11_V2	REV. SDM	4	6/04/2020	19/05/2020		
10	EX_13_200_1881_12_V2	REV. INTERVENT	4	9/04/2020			
11	MV_01_033_1560_10_V12	REV. CONTRATISTA	4	6/04/2020	19/05/2020		
12	EX_11_151_1560_10_V3	REV. INTERVENT	4	9/04/2020			
13	EX_11_319_1236_11_V5	APROBADO INTV	5	30/04/2020	2/06/2020		
14	EX_01_295_1236_11_V2	DLLO CONTRATISTA	5				
15	EX_01_346_1842_12_V3	APROBADO INTV	5	19/05/2020	3/06/2020		
16	EX_11_272_868_12_V2	DLLO CONTRATISTA	5				
17	EX_11_376_1842_12_V3	APROBADO INTV	5	21/05/2020	4/06/2020		
18	MV_01_032_945_10_V22	REV. INTERVENT	5	19/05/2020			
19	MV_01_306_1236_11_V6	APROBADO INTV	5	20/05/2020	3/06/2020		
20	MV_11_352_1236_11_V6	APROBADO INTV	5	20/05/2020	4/06/2020		
21	EX_01_346_1842_12_V3	DLLO CONTRATISTA	6				
22	EX_11_272_868_12_V2	DLLO CONTRATISTA	6				
23	EX_11_376_1842_12_V3	DLLO CONTRATISTA	6				
24	MV_01_032_945_10_V22	DLLO CONTRATISTA	6				
25	MV_01_306_1236_11_V6	DLLO CONTRATISTA	6				
26	MV_11_352_1236_11_V6	DLLO CONTRATISTA	6				
27	EX_01_358_1842_12_V1	DLLO CONTRATISTA	7				
28	EX_01_112_1560_10_V4	DLLO CONTRATISTA	7				
29	EX_01_356_1842_12_V1	DLLO CONTRATISTA	7				
30	MV_AV_CALI_941_09_V25	DLLO CONTRATISTA	7				
31	MV_01_306_1236_11_V6	DLLO CONTRATISTA	7				
32	MV_01_032_945_10_V22	DLLO CONTRATISTA	7				
33	EX_11_390_1842_12_V8	DLLO CONTRATISTA	7				
34	EX_01_295_1236_11_V2	DLLO CONTRATISTA	7				
35	EX_11_272_868_12_V2	DLLO CONTRATISTA	7				
36	EX_01_354_1842_12	DLLO CONTRATISTA	7				

Tabla 9 - Estado de la georreferenciación de los ID para cobro.

6 COMPONENTE DE CONSULTORÍA

En la ejecución del contrato SDM – 1780 se contempla el componente de consultoría, el cual abarca la actualización y/o elaboración de los diseños de señalización vial en las localidades de Suba y Usaquén. En el presente informe se hace un balance de la ejecución del componente en donde se relacionan las metas, los avances y el estado de la elaboración de los diseños de señalización vial entre el 05 de mayo y el 04 de junio.

Se continua la ejecución del mismo desarrollando un gran compromiso por parte del Consorcio Señaliza BTA, para poder brindar productos de calidad para la SDM y en general para todos los bogotanos, con el apoyo que ha brindado la Entidad y la Interventoría No obstante que la emergencia sanitaria por el control de contagio del COVID-19 ha generado limitaciones que siguen afectando la ejecución del contrato en su componente de consultoría.

6.1 Recursos utilizados, personal y equipo

A continuación, se presenta la relación de personal mínimo y de los recursos utilizados para la labor de la actualización y/o elaboración de los diseños de señalización en la zona norte. Se informa que se cuenta con un equipo de trabajo más amplio que apoya en el desarrollo del contrato al personal relacionado a continuación:

Cargo	Nombre	Dedicación (%)
Director del Proyecto	Alfonso Urrego	50
Especialista de Tránsito	Andrés Guzmán	100
Ingeniero Diseñador	Yeimy Tatiana López	100
Dibujante	Jennifer Casallas	100
Dibujante	Sandra Vargas	100
Auxiliar	Camilo Saldaña	100

Tabla 10 - Personal componente de consultoría

Así mismo, se relaciona los equipos y recursos que fueron utilizados durante el periodo del informe en las actividades del área de consultoría.

Equipos	Descripción	Cantidad
Equipo de Computo	Vel del procesador > 2.9 GHZ, memoria RAM > 8GHz, disco duro > 500 GB de 7200 RPM, con unidad de SD/DVD y pantalla > 17" SVGA o superior, tarjeta de video> 256 MB SVGA con office y tarjeta de red >10/100 Mps	5
Vehículo Renault Koleos	Vehículo Renault Koleos con motor a gasolina. Modelo 2016 cilindraje de 2.500 cc	1
Impresora Epson EcoTank L355	Impresora de inyección en tinta MicroPiezo. Resolución máxima de 5760 X 1440 DPI. Velocidad de impresión de 33 PPM.	1
Plotter Hp Desinjet T130 Wifi 24 Pulgadas	Plotter de serie HP Designjet 130 con impresiones multiformato de calidad fotográfica. Su bandeja para tamaños hasta C/A2, capacidad de alimentación automática por rollo de 24 pulgadas (625 mm), con sistema modular de seis tintas.	1
Cámara VIRB® 360	Cámara de 360 grados compacta y resistente al agua con resolución 5,7K/30fps y estabilización esférica 4K. Tarjeta de memoria de 128Gb	1
Cámaras digitales	Cámara digital de fotografía con video clips con 16 megapíxeles y 1.0 Gb de memoria	2
Oficina	Oficina con cinco puestos de trabajo, puntos de red. Localizada en la Calle 17 No. 33-76	1
Varios	Tablas, chalecos, elementos de oficina, papelería	N/A

Tabla 11 - Equipos y recursos del componente de consultoría

6.2 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

El componente de consultoría está conformado por las siguientes etapas:

- Etapa 1: Información base para la elaboración del diseño, consistente en el Inventario resultado de la visita técnica de inspección.
- Etapa 2: Elaboración del diseño de señalización, que comprende el diseño integral de señalización. Informe ejecutivo de diseño de señalización.
- Etapa 3: Dibujo y presentación de información geográfica para entrega de planos de diseño de señalización.

6.3 ETAPA 1 DE DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN

A continuación, se listan las áreas de influencia asignadas durante el periodo con el indicador de la meta contractual.

ASIGNACIÓN / MES	ID de DISEÑO	LOCALIDAD	Ha
1 (noviembre 5 de 2019 a diciembre 4 de 2019)	EX_01_111_1560_10	Usaquén	14,72
	CPS_988_EX_11_213	Suba	6,76
	EX_01_290_1236_11	Usaquén	6,34
2 (diciembre 5 de 2019 a enero 4 de 2020)	EX_01_307_1236_11	Usaquén	13,27
	EX_01_348_1842_12	Usaquén	11,57
	EX_11_376_1842_12	Suba	27,24
3 (enero 5 de 2020 a febrero 4 de 2020)	EX_11_334_1236_11	Suba	10,78
	EX_11_378_1842_12	Suba	13,03
	EX_11_381_1842_12	Suba	9,04
	EX_11_385_1842_12	Suba	5
	EX_11_388_1842_12	Suba	25,47
	EX_11_413_1842_12	Suba	2,5
	EX_11_415_1842_12	Suba	26,67
	EX_11_418_1842_12	Suba	15,77
	EX_11_422_1842_12	Suba	4,5
	EX_11_364_1236_11	Suba	8,01
4 (febrero 5 de 2020 a marzo 4 de 2020)	EX_01_354_1842_12	Usaquén	2,14
	EX_01_360_1842_12	Usaquén	2,6
	MV_01_029_1560_10	Usaquén	6,03
	EX_11_382_1842_12	Suba	7,01
	EX_11_380_1842_12	Suba	7,51
	EX_11_332_1236_11	Suba	7,67
	EX_11_331_1236_11	Suba	8,5
	EX_01_168_1794_10	Usaquén	10,75
	EX_11_376_1236_11	Suba	12,17
	EX_01_297_1236_11	Usaquén	14,1
	EX_01_107_1794_10	Usaquén	19,53
	EX_01_334_1236_11	Usaquén	25,58
	EX_01_353_1842_12	Usaquén	31,45
5 (marzo 5 de 2020 a marzo 25 de 2020)	EX_11_377_1842_12	Suba	3,63
	EX_01_012_1560_10	Usaquén	4,62
	MV_01_355_988_09	Suba	3,79

ASIGNACIÓN / MES	ID de DISEÑO	LOCALIDAD	Ha
	EX_11_408_1842_12	Suba	13,06
	EX_11_319_1236_11	Suba	28,28
	ZE_01_430_946_10	Usaquén	3,54
	EX_01_362_1842_12	Usaquén	7,5
	EX_01_340_1842_12	Usaquén	12,35
	MV_11_355_1236_11	Suba	5,74
6 (abril 15 de 2020 a mayo 4 de 2020)	Sin asignaciones		
7 (mayo 5 de 2020 a junio 4 de 2020)	EX_11_412_1842_12	Suba	57,6
	EX_11_390_1842_12	Suba	39,04
	EX_11_399_1842_12 MV_11_262_1747_10	Suba	12,42
Total			547,18

Tabla 12 - Zonas de Influencia asignados en el transcurso del contrato.

Las áreas y cantidad de hectáreas han variado levemente, teniendo en cuenta el replanteo de algunas zonas de influencia a lo largo de su desarrollo en las diferentes etapas de diseño.

A continuación, se relacionan las zonas de influencia aprobadas en la etapa 1, en el desarrollo del contrato SDM 1780 de 2019:

ASIGNACIÓN / MES	ID de DISEÑO	LOCALIDAD	Ha
1	EX_01_111_1560_10	Usaquén	14,7
	CPS_988_EX_11_213	Suba	6,76
	EX_01_290_1236_11	Usaquén	6,34
2	EX_01_307_1236_11	Usaquén	13,3
	EX_01_348_1842_12	Usaquén	11,6
	EX_11_376_1842_12	Suba	27,2
3	EX_11_334_1236_11	Suba	10,8
	EX_11_378_1842_12	Suba	13
	EX_11_381_1842_12	Suba	9,04
	EX_11_385_1842_12	Suba	5

ASIGNACIÓN / MES	ID de DISEÑO	LOCALIDAD	Ha
	EX_11_388_1842_12	Suba	25,5
	EX_11_413_1842_12	Suba	2,5
	EX_11_415_1842_12	Suba	26,7
	EX_11_418_1842_12	Suba	15,8
	EX_11_422_1842_12	Suba	4,5
	EX_11_364_1236_11	Suba	8,01
4	EX_01_354_1842_12	Usaquén	2,14
	EX_01_360_1842_12	Usaquén	2,6
	MV_01_029_1560_10	Usaquén	6,03
	EX_11_382_1842_12	Suba	7,01
	EX_11_380_1842_12	Suba	7,51
	EX_11_332_1236_11	Suba	7,67
	EX_11_331_1236_11	Suba	8,5
	EX_11_376_1236_11	Suba	12,2
	EX_01_297_1236_11	Usaquén	14
	EX_01_353_1842_12	Usaquén	31,5
5	MV_11_355_1236_11	Suba	5,74
	EX_11_377_1842_12	Suba	3.63
Total			309,22

Tabla 13 - Zonas de Influencia aprobadas en la etapa 1.

ASIGNACIÓN / MES	HA	FECHA DE ASIGNACIÓN
1 / (noviembre 5 de 2019 a diciembre 4 de 2019)	27,23	07/11/2019
2 / (diciembre 5 de 2019 a enero 4 de 2020)	52,08	09/12/2019
3 / (enero 5 de 2020 a febrero 4 de 2020)	120,77	08/01/2020
4 / (febrero 5 de 2020 a marzo 4 de 2020)	154,94	12/02/2020
5 / (marzo 5 de 2020 a marzo 25 de 2020)	80,01	18/03/2020
6 / (abril 15 de 2020 a mayo 4 de 2020)	0,0	N/A
7 (mayo 5 de 2020 a junio 4 de 2020)	109.06	15/5/2020

Tabla 14 - Fecha de asignación de zonas de Influencia para etapa 1

A continuación, se presenta un cuadro con el balance del estado de la etapa 1 del contrato para las zonas de influencia asignadas a fecha de corte de 04 de junio de 2020:

ID	ESTADO	HA
1	Aprobados	309,22
2	Entregados y en proceso de revisión y aprobación	173,81
3	En elaboración	64,45
Total		**547,48**

Tabla 15. Balance del contrato etapa 1

6.4 ETAPA 2 DE DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN

De acuerdo con las zonas de influencia aprobadas en etapa 1, se ha realizado la etapa 2 del componente de diseño del contrato, encontrando a la fecha de corte aprobados:

ID de DISEÑO	LOCALIDAD	Ha	ESTADO DISEÑO
EX_01_111_1560_10	Usaquén	14,7	Aprobado
CPS_988_EX_11_213	Suba	6,76	Aprobado
EX_01_290_1236_11	Usaquén	6,34	Aprobado
EX_01_307_1236_11	Usaquén	13,3	Aprobado
EX_01_348_1842_12	Usaquén	11,6	Aprobado
EX_11_376_1842_12	Suba	27,2	Aprobado
EX_11_334_1236_11	Suba	10,8	En elaboración
EX_11_378_1842_12	Suba	13	Aprobado
EX_11_381_1842_12	Suba	9,04	Aprobado
EX_11_385_1842_12	Suba	5	Aprobado
EX_11_388_1842_12	Suba	25,5	En elaboración
EX_11_413_1842_12	Suba	2,5	Aprobado
EX_11_415_1842_12	Suba	26,7	En elaboración
EX_11_418_1842_12	Suba	15,8	Aprobado
EX_11_422_1842_12	Suba	4,5	Aprobado
EX_11_364_1236_11	Suba	8,01	En elaboración
EX_01_354_1842_12	Usaquén	2,14	En elaboración
EX_01_360_1842_12	Usaquén	2,6	En elaboración
MV_01_029_1560_10	Usaquén	6,03	En elaboración
EX_11_382_1842_12	Suba	7,01	En elaboración
EX_11_380_1842_12	Suba	7,51	En elaboración
EX_11_332_1236_11	Suba	7,67	En elaboración
EX_11_331_1236_11	Suba	8,5	En elaboración
EX_11_376_1236_11	Suba	12,2	En elaboración
EX_01_297_1236_11	Usaquén	14,1	En elaboración

EX_01_353_1842_12	Usaquén	31,5	En elaboración
EX_11_377_1842_12	Suba	3,63	En elaboración
MV_11_355_1236_11	Suba	5,74	En elaboración

Tabla 16 - Estado de zonas de influencia en Etapa 2

ID	ESTADO	HA
1	Aprobados	129,74
4	En elaboración	179,48
Total		309,22

Tabla 17. Estado del contrato etapa 2

6.5 ETAPA 3 DE DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN

Esta etapa de diseño corresponde a la presentación de información geográfica para entrega de planos de diseño de señalización, en esta etapa se realiza la verificación de la información alfanumérica para que cumpla con los lineamientos del grupo SIG de la SDM.

A continuación, se presenta un cuadro con el balance del estado de la etapa 3 del contrato:

ID de DISEÑO	LOCALIDAD	Ha	ESTADO DISEÑO
EX_01_111_1560_10	Usaquén	14,7	Aprobado
CPS_988_EX_11_213	Suba	6,76	Aprobado
EX_01_290_1236_11	Usaquén	6,34	Aprobado
EX_01_307_1236_11	Usaquén	13,3	Aprobado
EX_01_348_1842_12	Usaquén	11,6	Aprobado
EX_11_376_1842_12	Suba	27,2	Aprobado
EX_11_378_1842_12	Suba	13	Aprobado
EX_11_381_1842_12	Suba	9,04	Aprobado
EX_11_385_1842_12	Suba	5	Aprobado
EX_11_413_1842_12	Suba	2,5	Aprobado
EX_11_418_1842_12	Suba	15,8	Aprobado
EX_11_422_1842_12	Suba	4,5	Aprobado

Tabla 18. Estado de zonas de influencia en Etapa 3.

6.6 DISEÑOS FACTURADOS

En el transcurso del periodo del contrato, se proyecta las siguientes IDs para facturación:

ID de DISEÑO	LOCALIDAD	Ha	ESTADO DISEÑO
EX_01_111_1560_10	Usaquén	14,7	Facturado Cuenta 6
CPS_988_EX_11_213	Suba	6,76	Facturado Cuenta 6
EX_01_290_1236_11	Usaquén	6,34	Facturado Cuenta 6
EX_01_307_1236_11	Usaquén	13,27	Facturado Cuenta 7
EX_01_348_1842_12	Usaquén	11,6	Facturado Cuenta 7
EX_11_376_1842_12	Suba	27,29	Facturado Cuenta 7
EX_11_378_1842_12	Suba	13,22	Facturado Cuenta 7
EX_11_381_1842_12	Suba	9,06	Facturado Cuenta 7
EX_11_385_1842_12	Suba	5	Facturado Cuenta 7
EX_11_413_1842_12	Suba	5	Facturado Cuenta 7
EX_11_418_1842_12	Suba	15,79	Facturado Cuenta 7
EX_11_422_1842_12	Suba	4,6	Facturado Cuenta 7

6.7 ESTADO DEL CONTRATO

Durante el inicio del contrato se tienen asignadas zonas de influencia que suman 547,48 Ha en etapa 1, de estas zonas de influencias se tienen aprobadas en etapa 1 un total de 309.22 Ha, de las cuales, se cuenta con aprobación en etapa 2 y 3 un total de 132,63 Ha.

ID	ESTADO	Etapa 1 HA	Etapa 2 HA	Etapa 3 HA
1	Aprobados	309,22	129,74	132,63
2	Entregados y en proceso de revisión y aprobación	173,81	0	0
3	En elaboración	64,45	179,48	0
Total		547,48	309,22	132,63

Tabla 19. Balance del contrato

Finalmente, se presenta un balance financiero de ejecución del contrato:

Mes	Inicio	Fin	Ha Proyectadas	Ha Aprobadas	Valor Facturado	Saldo
1	5/11/19	4/12/19	0	0	0	$ 422.109.667
2	5/12/19	4/01/20	22	0	0	$ 422.109.667

Mes	Inicio	Fin	Ha Proyectadas	Ha Aprobadas	Valor Facturado	Saldo
3	5/01/20	4/02/20	53	0	0	$ 422.109.667
4	5/02/20	4/03/20	128	0	0	$ 422.109.667
5	5/03/20	4/04/20	156	0	0	$ 422.109.667
6	5/04/20	4/05/20	127	27,82	$16.933.080	$ 405.176.587
7	5/05/20	4/06/20	87	104,83	$ 63.789.737	$ 343.141.678
8	5/06/20	4/07/20	66			
9	5/07/20	4/08/20	39			
10	5/08/20	4/09/20	0			

Tabla 20 - Estado del contrato

7 ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL

7.1 Componente de Consultoría

Para el periodo del 5 de mayo de 2020 al 4 de junio de 2020, se presentó la siguiente cuenta del componente de consultoría:

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO DIRECTO	SUBTOTAL
CONSULTORIA	Ha	Elaboración, presentación y aprobación de diseño de señalización vial	104,83	$ 511.350	$ 53.604.821
			SUBTOTAL		$ 53.604.821
			IVA	19,00%	$ 10.184.916
			D = TOTAL CONSULTORIA UNA ZONA		$ 63.789.737

7.2 Componente de obra

La obra ejecutada para cobro es la siguiente:

ID Sector	Presupuesto	% ejecutado Cuenta 7	Ejecutado Para Cobro Cuenta 7
EX_11_390_1842_12	$ 66.443.002	99%	$ 66.021.769
CP- PMT- CANTON NORTE	$ 1.006.992	100%	$ 1.006.992
MV_01_306_1236	$ 64.331.494	10%	$ 6.525.657
MV_01_032_945	$ 35.172.650	12%	$ 4.090.957
MV_AV_CALI_941	$ 26.687.341	100%	$ 26.639.437
EX_11_272_868	$ 105.726.278	15%	$ 16.313.276
EX_11_295_1236	$ 757.913.630	20%	$ 148.971.750
EX_01_358_1842	$ 568.738.455	73%	$ 412.451.293
EX_01_356_1842	$ 332.032.443	39%	$ 129.039.017
EX_01_112_1560	$ 235.409.175	33%	$ 77.303.086
TOTAL 1	**$ 2.193.461.460**	**41%**	**$ 888.363.234**

El avance presupuestal para el componente de obra para este componente, presenta el siguiente detalle:

VALOR INICIAL COMPONENTE DE OBRA

Suministro e instalación	$ 4.673.841.463
Suministro	$ 209.048.870
Total componente de obra	$ 4.882.890.333

AVANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE OBRA

Pagos	Costo directo	AIU	Costo básico	Suministros	Valor Acta	Rete-garantía (5%)	Total a girar
Cuenta No 1	$ -	$ -	$ -	$ 46.183.000	$ 46.183.000		$ 46.183.000
Cuenta No 2	$ 61.225.772	$ 22.592.310	$ 83.818.082	$ -	$ 83.818.082	$ 4.190.904	$ 79.627.178
Cuenta No 3	$ 158.252.172	$ 58.395.052	$ 216.647.224	$ -	$ 216.647.224	$ 10.832.361	$ 205.814.863
Cuenta No 4	$ 777.878.821	$ 287.037.285	$ 1.064.916.106	$ -	$ 1.064.916.106	$ 53.245.805	$ 1.011.670.300
Cuenta No 5	$ 242.723.605	$ 89.565.010	$ 332.288.615	$ -	$ 332.288.615	$ 16.614.431	$ 315.674.184
Cuenta No 6	$ 77.523.001	$ 28.605.987	$ 106.128.988	$ 133.186.500	$ 239.315.488	$ 5.306.449	$ 234.009.039
Cuenta No 7	$ 648.913.976	$ 239.449.257	$ 888.363.234		$ 888.363.234	$ 44.418.162	$ 843.945.072

Total facturado Cuenta 1	$ 46.183.000	0,95%
Total facturado Cuenta 2	$ 83.818.082	1,72%
Total facturado Cuenta 3	$ 216.647.224	4,44%
Total facturado Cuenta 4	$ 1.064.916.106	21,81%
Total facturado Cuenta 5	$ 332.288.615	6,81%
Total facturado Cuenta 6	$ 239.315.488	4,90%
Total facturado Cuenta 7	$ 888.363.234	18,19%
Total acumulado	$ 2.871.531.748	58,81%
Saldo por facturar	$ 2.011.358.585	41,19%

Tabla 21 - Avance presupuestal


7.3 Análisis estadístico de las actividades ejecutadas

Basado en lo indicado en el Anexo Técnico, para este análisis el componente de obra se descompuso en sus dos partes:

1. Suministro de señalización
2. Suministro e instalación a su vez este último está compuesto por los siguientes grupos:
    - Señalización vertical - ítems 1 a 31

- Señalización horizontal – ítems 32 a 91
- Otros – ítems 92 a 104

En la siguiente figura se puede apreciar el peso de cada una de estos componentes respecto del total ejecutado:

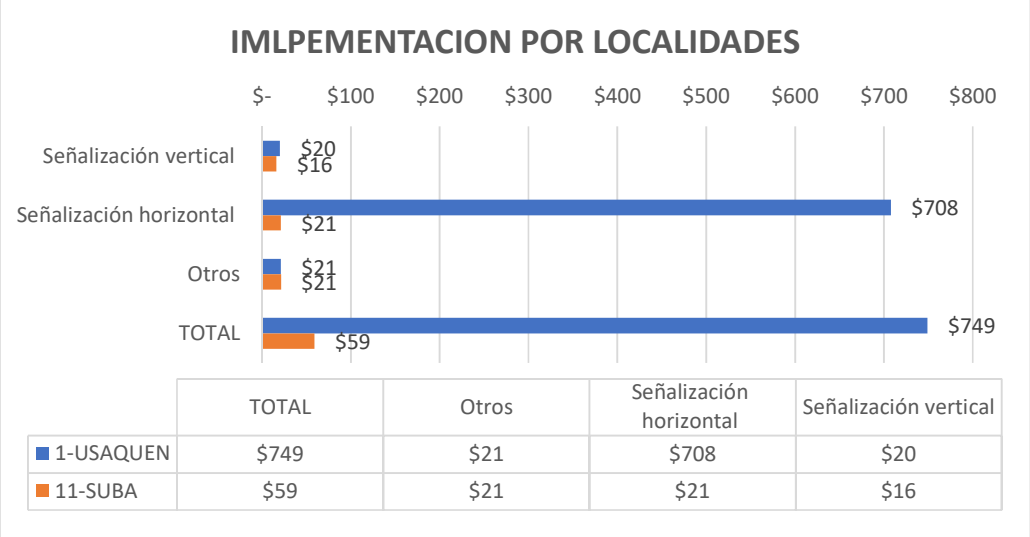

	TOTAL	Otros	Señalización horizontal	Señalización vertical
1-USAQUEN	$749	$21	$708	$20
11-SUBA	$59	$21	$21	$16

Ilustración 2 – Resumen análisis estadístico

Del valor total de señalización ejecutado durante el periodo del informe el 7,30% se implementó en la localidad de Suba y el 92,70% se implementó en la localidad de Usaquén como se observa con los porcentajes durante el periodo los trabajos de señalización se concentraron en la localidad de Usaquén.

Del valor total ejecutado durante el periodo la señalización vertical corresponde al 4,5%, la señalización horizontal corresponde a 90,22% y 5,28% corresponde al otros. Como se observa durante el periodo los trabajos de implementación corresponden en su mayoría a señalización horizontal.

8 CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Conforme al Plan de Calidad presentado, se han realizado los controles de calidad correspondientes a los trabajos realizados en las actividades de señalización horizontal realizadas en los ID para cobro:

- MV_01_032_945
- EX_11_272_868
- MV_01_306_1236
- EX_11_390_1842
- EX_11_295_1236
- EX_01_358_1842
- EX_01_356_1842
- EX_01_112_1560

En constancia de lo anterior se adjuntan los formatos que acreditan el cumplimiento de lo establecido en los siguientes anexos:

Anexo 2:	Certificados de Calidad de materiales
Anexo 3:	Formatos diligenciados de implementación horizontal y vertical
Anexo 4:	Formatos de inspección
Anexo 5:	Espesores en láminas de muestra de demarcación
Anexo 6:	Registro fotográfico de la implementación

9 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El 8 de noviembre se hizo entrega formal del Plan de Manejo (PMT) General en físico mediante comunicación CSB-008-2019. A su vez la Interventoría, en comunicación CMV-014-2019 remitió a la Secretaria Distrital de Movilidad conceptuando que el documento enviado se ajustaba a lo solicitado en el Apéndice C - Especificaciones para el trámite de Planes de Manejo de Tránsito, lo remitió a la Secretaria de Movilidad.

En reunión realizada el 20 de noviembre de 2019, la Secretaria de Movilidad presentó algunas observaciones al PMT presentado, las cuales fueron atendidas, y se hizo entrega de la versión final de este plan el 22 de noviembre de 2019, recibiendo la aprobación por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad en comunicación SDM-SPMT-256568-19 del 27 de noviembre de 2019.

En el numeral 5 - Vigencia de la Autorización, del citado documento, la SDM indica que la aprobación tendrá vigencia hasta el 7 de febrero de 2020, razón por la que en escrito CSB-057-2020 del 21 de enero, se presentó a la interventoría la solicitud de prórroga del PMT general. Mediante comunicación SDM-SPMT-18151-20 la Subdirección Técnica de Planes de Manejo de Tránsito de la Secretaria de Movilidad, autorizó esta prórroga hasta el día 7 de junio de 2020.

Durante el periodo se tramitaron los siguientes PMT´s:

ID	COI N°	Fecha de aprobacion
MV_AV_CALI_941	20	14/may/2020
EX_01_356_1842	20	14/may/2020
EX_01_295_1236	20	14/may/2020
EX_01_356_1842	23	04/jun/2020
EX_01_112_1560	Emergencia	17/may/2020

10 ASPECTOS TÉCNICOS

En el periodo del informe se presentó la siguiente novedad técnica.

10.1 Problemas y soluciones

En la implementación de la señalización en el ID EX_01_112_1560_10 – Cardenal Sancha la comunidad de la carrera 21 entre calles 127ª y 128D, presentó la solicitud para modificar el diseño y no implementar los tachones de la aguja localizada en la sector central de esta calle, debido a que dificultaba el ingreso y salida de los vehículos de los conjuntos residenciales ubicados en frente a esta aguja, además de que se originarían trancones al detenerse cualquier vehículo en frente a sus porterías.

Lo anterior solicitud fue resuelta presentando un nuevo diseño de este sitio sin los referidos tachones, pero incorporando estoperoles como medida para reducir la velocidad y tachas para señalizar la isleta de la aguja. Este diseño se encuentra en base de aprobación por cuenta de la comunidad, que se mostró receptiva al mismo.

11 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

Con la finalidad de mitigar los conflictos que se pueden presentar, durante y después de la ejecución de obras de señalización es importante tener en cuenta que existen diversos tipos de proyectos que deben cumplir con programas de acción los cuales deben tener en cuenta las dinámicas sociales y así mismo.

En este informe se dan a conocer los aspectos básicos en la gestión de los aspectos sociales, donde se relata la ejecución y el cumplimiento de participación ciudadana y socialización a la comunidad del área de influencia directa.

La gestión social es un conjunto de acciones que pretenden establecer canales de comunicación y espacios de control ciudadano, a través de la cual los habitantes de un sector determinado y el contratista en el momento de iniciar con la intervención cuentan con herramientas de diálogo y concertación. La dinámica social de cada territorio, es variante, sin embargo, los programas a tener en cuenta aplican para las obras de señalización que se están desarrollando.

El logro de todas las actividades realizadas en el aspecto social consiste en realizar un trabajo en equipo interdisciplinario la comunicación efectiva con la comunidad para establecer una labor de apoyo y control de la intervención en los sitios a señalizar o señalizados. Se pretende que a través del acompañamiento social que la comunidad adquiera un mayor compromiso, sentido de pertenencia y empoderamiento.

11.1 Objetivo general

Con el componente social se pretende: informar, socializar, atender PQRS (preguntas, quejas, reclamos y sugerencias) presentados por la comunidad e incentivar la participación ciudadana a través del empoderamiento y la sostenibilidad de las obras, así mismo, mitigar los impactos sociales negativos que pudieran presentarse en, durante o posterior a la ejecución de las obras.

11.2 Objetivos específicos

Se plantean los siguientes objetivos específicos de la gestión social:

1. Dar a conocer a la comunidad en general las actividades de señalización a implementar.

2. Sensibilizar a los actores que participan en la ejecución de las obras sobre la responsabilidad que se tiene al intervenir el espacio público, socialización a las políticas y medidas diseñadas para la adecuada intervención de este y el respeto del uso del mismo.
3. Dar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad y propender el bienestar de la comunidad de los trabajadores, contratistas, respetando y protegiendo el entorno natural y urbano.
4. Promover la participación de la comunidad en el desarrollo de la obra y así evitar cualquier tipo de conflicto.

11.3 GESTIÓN SOCIAL PARQUE DE LA VIDA

En el periodo del informe se realizó la gestión social al siguiente punto de intervención denominado Parque de la Vida (localidad de Usaquén).

11.3.1 Línea de trabajo
Socialización con participación ciudadana

11.3.2 Objetivo
Dar a conocer a la comunidad de los espacios que cuentan y lograr el empoderamiento y sentido de pertenencia hacia la sostenibilidad de las obras y hacer control social

11.3.3 Actividad
Se realizó identificación del territorio donde se establece que en el Área de influencia directa –AID observando que consta de un centro comercial y el uso del suelo es un 90% es residencial. No se identifican instituciones educativas.
Debido a la pandemia y a las medidas del gobierno nacional y local se realizó socialización de la implementación a desarrollar en este punto a través de correos electrónicos y perifoneo al final de la socialización.
La encuesta de aceptación o rechazo de las bandas sonoras esta se hace con los administradores, teniendo en cuenta la figura jurídica que ejercen en las zonas residenciales.
Se indica que cualquier información adicional o atención a las manifestaciones ciudadanas se pueden realizar a través del correo electrónico senalizaconsorcio@gmail.co m. o a la línea telefónica 3114634804.

11.3.4 Meta Lograda

Se logró que la comunidad tuviera conocimiento de las actividades a realizar por parte del contratista. En este periodo no se recibieron PQRS en referencia a la intervención en este punto.

11.3.5 Descripción de área de influencia

El denominado sector Parque de la Vida, se encuentra ubicado al Norte de la ciudad, en la localidad de Usaquén, de estratificación 4 y 5. En cuanto a equipamiento social, destinado para los servicios sociales, culturales, de educación, establecimientos educativos, cuenta con un centro comercial denominado Mediterráneo, establecimientos de grandes superficies, en referencia a los parques que se encuentran en la zona, en la primera visita se observó que estos se encuentran equipados tanto para los niños como adultos ya que disponen de equipos para desarrollar ejercicio y otras actividades recreativas. Algunos residentes indican que estos espacios en la actualidad no se aprovechan de forma adecuada, que al contrario con la llegada de personas foráneas se han convertido en foco de inseguridad para los residentes y transeúntes.

Las vías de acceso se encuentran en adecuadas condiciones, está debidamente señalizada. El uso del suelo en su mayoría es residencial.

Este sector no cuenta con colegios oficiales, la comunidad del sector indica que no se encuentra ningún colegio en el área de influencia directa. Refieren que las instituciones educativas están en otros barrios aledaños.

11.3.6 Metodología de socialización

Debido al confinamiento social decretado por el gobierno nacional, el componente de gestión social del Consorcio Señaliza ha activado estrategias de participación comunitaria con el fin de mantener canales de comunicación asertiva, tales como:

- Perifoneo al inicio, durante a la finalización de las obras, para que los habitantes del sector estén informados. Registro fotográfico de esta actividad se presenta en la presentación de la gestión de cada ID
- Correo electrónico
- Línea telefónica habilitada para cualquier tipo de manifestación ciudadana, y así poder ejercer contacto social de las intervenciones a realizar por parte del consorcio.

- Para la socialización de los puntos a intervenir también está planeado, si esto llegase a ser necesario, la realización de reuniones virtuales, a través de plataformas de comunicación como Teams, Meeting, Zoom etc.


Para este punto, se realizó la recolección de direcciones de correos electrónicos a los conjuntos residenciales del AID, donde se remitió pieza informativa, que notifica el inicio de los trabajos de implementación de señalización, estos correos se muestran a continuación. Además, se elaboraron encuestas para aprobar o no la instalación de bandas sonoras, en documento anexo se adjuntan copias de cada una de estas encuestas. Estas actividades se ejecutaron con medidas de bioseguridad, por medio de los administradores de los conjuntos, cumpliendo con los protocolos aprobados para el Consorcio Señaliza Bogotá por la ARL Sura.

Se informó del inicio de la intervención y que esta tendría una duración de 4 semanas, sujeta al clima, y a los decretos que para movilidad expida el gobierno nacional y local para la prevención del COVID 19. Además, se indicó que el Consorcio Señaliza Bogotá, cuenta con todos los parámetros exigidos por la Alcaldía y demás entidades territoriales para la ejecución de las obras, en referencia a los protocolos de bioseguridad tanto de los trabajadores como de los vehículos.

En cuanto a los canales de comunicación con la comunidad se encuentran abiertos para atender los *PQRS.*

A continuación, se anexa copia de correos electrónicos, enviados a los conjuntos residenciales del AÍD.

Conjunto Icata 4- icataclubresidencialcontab@gmail.com

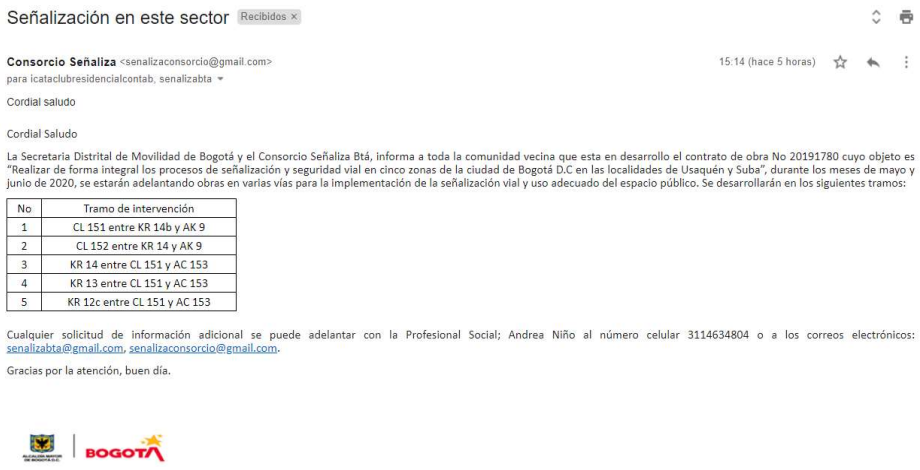

Señalización en este sector Recibidos ×

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> 15:14 (hace 5 horas)
para icataclubresidencialcontab, senalizabta

Cordial saludo

Cordial Saludo

La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:


No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153

Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Gracias por la atención, buen día.

BOGOTÁ

Conjunto residencial Icata 1:conjuntoicata1@yahoo.com

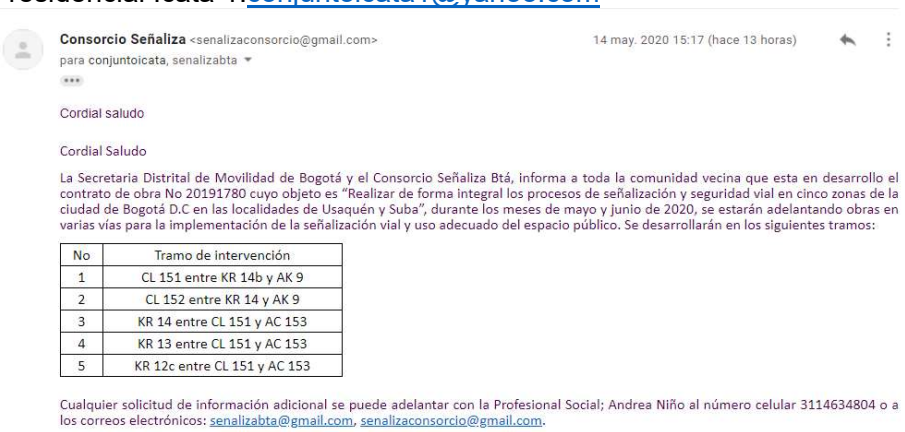

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> 14 may. 2020 15:17 (hace 13 horas)
para conjuntoicata, senalizabta

Cordial saludo


Cordial Saludo

La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:

No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153

Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Conjunto residencial Icata 2: icatados@gmail.com

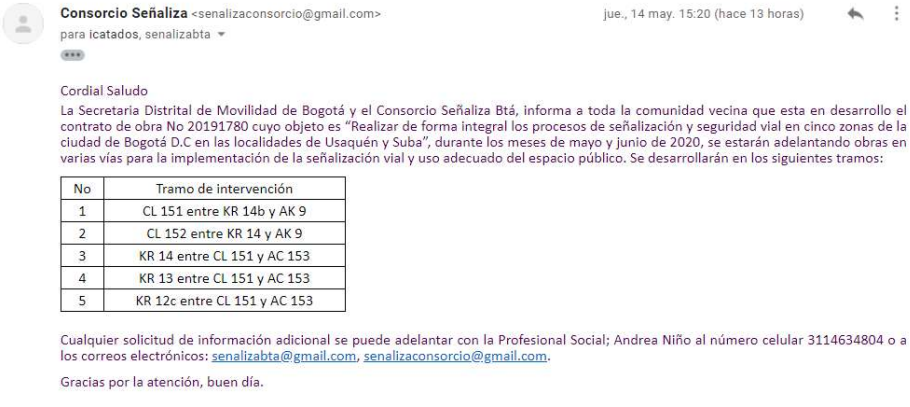

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> jue., 14 may. 15:20 (hace 13 horas)
para icatados, senalizabta

Cordial Saludo


La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:

No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153

Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Gracias por la atención, buen día.

Caminos de Calamari 1: alexandermartinezferro@gmail.com

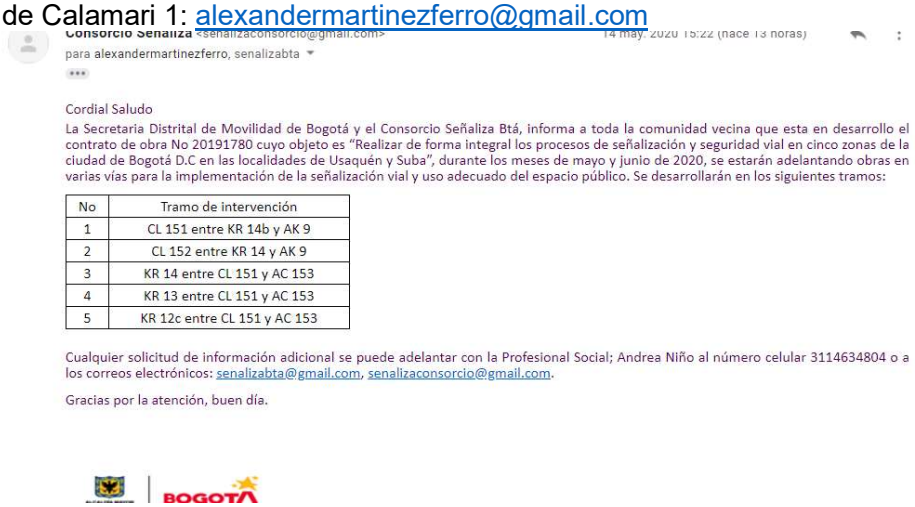

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> 14 may. 2020 15:22 (hace 13 horas)
para alexandermartinezferro, senalizabta

Cordial Saludo

La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:

No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153

Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Gracias por la atención, buen día.

BOGOTÁ

Conjunto residencial Alejandría: conjuntoresidencialalejandria@gmail.com

Cordial Saludo

La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:

No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153

Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Gracias por la atención, buen día.

BOGOTÁ

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Conjunto residencial Catania: conjunto_catania@hotmail.com

Señalización en el sector

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> jue., 14 may. 15:32 (hace 13 horas)
para conjunto_catania, senalizabta

Cordial Saludo

La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:

No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153

Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Gracias por la atención, buen día.

Conjunto Quintas de Calamari guillerminamora@gmail.com

Señalización en el sector

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> jue., 14 may. 15:46 (hace 12 horas)
para guillerminamora, senalizabta, bcc: andreanino02

Cordial Saludo

La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:

No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153

Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Gracias por la atención, buen día.

Conjunto Almería: admosconjuntoalmeria@gmail.com



Señalizacion en el sector

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> jue., 14 may. 15:48 (hace 12 horas)
para admonconjuntoalmeria, senalizabta, bcc: andreanino02

Cordial Saludo


La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:

No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153

Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Gracias por la atención, buen día.

Conjunto Calamar Reservado: calamarireservado@hotmail.com

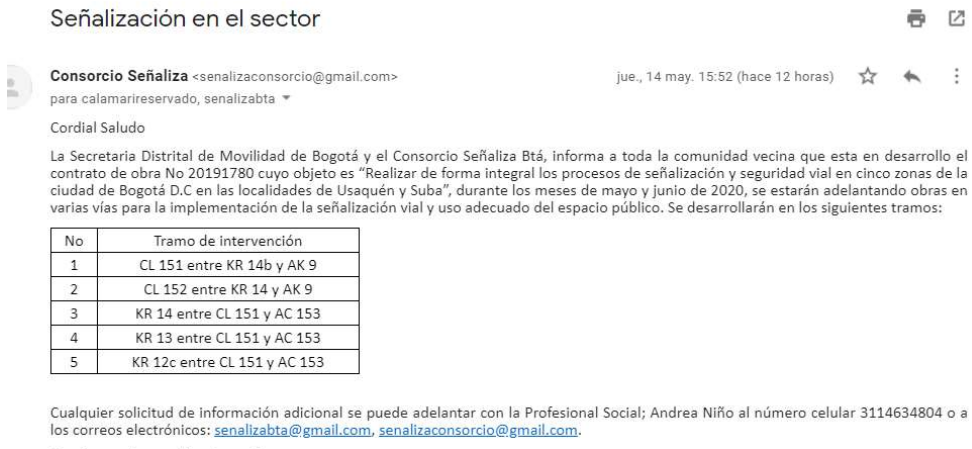

Señalización en el sector

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> jue., 14 may. 15:52 (hace 12 horas)
para calamarireservado, senalizabta

Cordial Saludo

La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:

No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153

Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Caminos de Calamari II etapa: caminosdecalamari@hotmail.com



Señalización en el sector Recibidos ×

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> jue., 14 may. 15:55 (hace 12 horas)
para caminoscalamari, senalizabta

Cordial Saludo


La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:

No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153

Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Gracias por la atención, buen día.

Conjunto Arkadea: admonarakadia@gmail.com

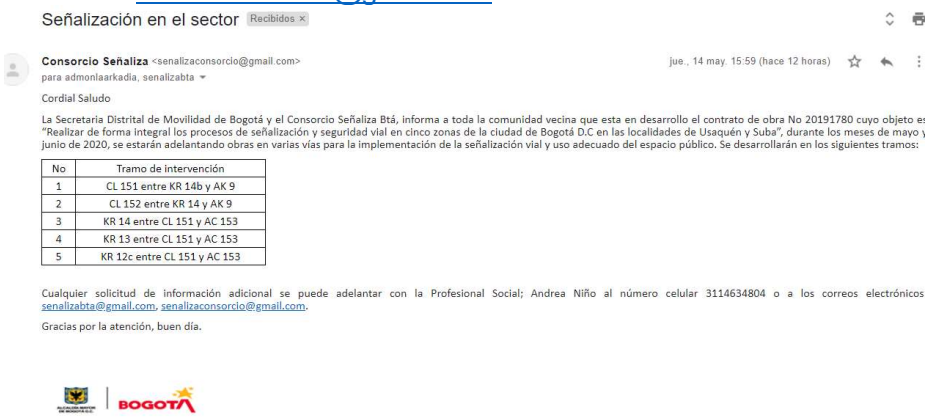

Señalización en el sector Recibidos ×

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> jue., 14 may. 15:59 (hace 12 horas)
para admonlaarkadia, senalizabta

Cordial Saludo

La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:

No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153

Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Gracias por la atención, buen día.

BOGOTÁ

Conjunto residencial Nicosia: admonresidencialnicosia@gmail.com



Señalización en el sector Recibidos ×

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> jue., 14 may. 16:15 (hace 12 horas)
para caminosdemagdalia, senalizabta

Cordial Saludo

La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:


No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153

Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Gracias por la atención, buen día.

BOGOTÁ

Conjunto Stanza: stanza2012@hotmail.com

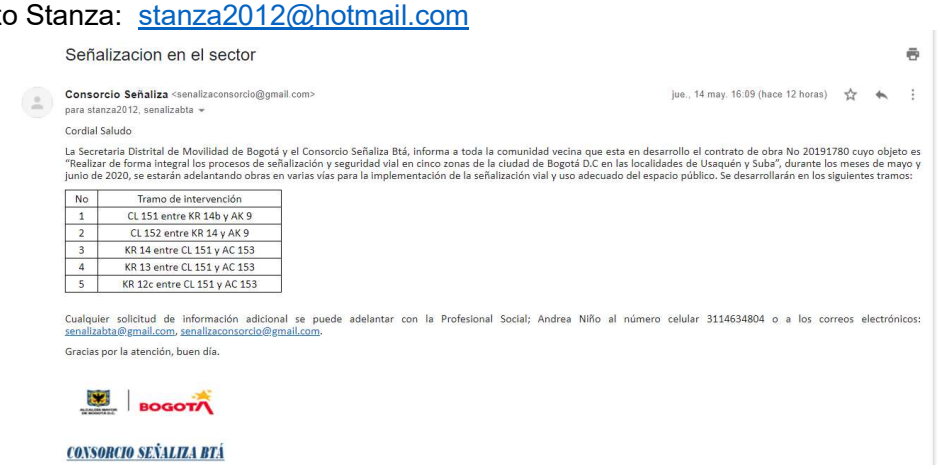

Señalizacion en el sector

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> jue., 14 may. 16:09 (hace 12 horas)
para stanza2012, senalizabta

Cordial Saludo

La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:

No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153


Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Gracias por la atención, buen día.

BOGOTÁ

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Conjunto residencial san Prieto II: sanprietodos@gmail.com

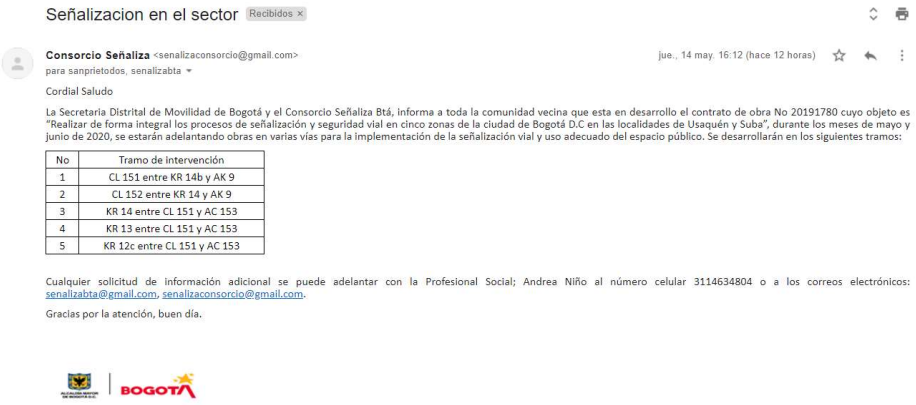

Señalizacion en el sector Recibidos ×

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> jue., 14 may. 16:12 (hace 12 horas)
para sanprietodos, senalizabta

Cordial Saludo

La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:

No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153

Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Gracias por la atención, buen día.

BOGOTÁ

Caminos de Magdla: caminosdemagdla@gmail.com



Señalizacion en el sector Recibidos ×

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> jue., 14 may. 16:15 (hace 12 horas)
para caminosdemagdalia, senalizabta

Cordial Saludo

La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:

No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153

Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Gracias por la atención, buen día.

BOGOTÁ

Conjunto Villas del Mediterráneo 1: villasdelmediterraneo@gmail.com



Señalizacion en el sector

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> jue., 14 may. 16:21 (hace 12 horas)
para villasdelmediterraneo1, senalizabta

Cordial Saludo

La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:

No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153


Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Gracias por la atención, buen día.

BOGOTÁ

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Portal del mediterráneo: admonportalmediterraneo@gmail.com

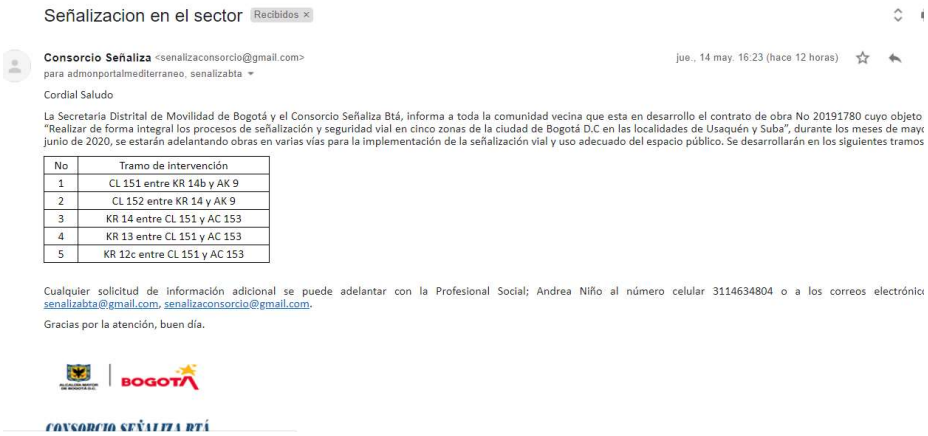

Señalizacion en el sector Recibidos ×

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> jue., 14 may. 16:23 (hace 12 horas)
para admonportalmediterraneo, senalizabta

Cordial Saludo

La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos

No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153


Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónic senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Gracias por la atención, buen día.

BOGOTÁ

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Conjunto residencial La Toscana: latoscanaresidencial-admon@gmail.com

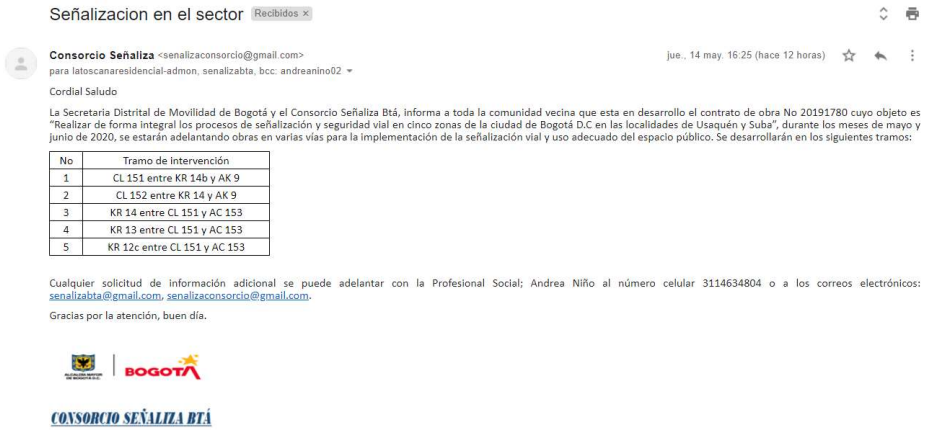

Señalizacion en el sector Recibidos ×

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> jue., 14 may. 16:25 (hace 12 horas)
para latoscanaresidencial-admon, senalizabta, bcc: andreanino02

Cordial Saludo

La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:

No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153


Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Gracias por la atención, buen día.

BOGOTÁ

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Conjunto residencial Mediterráneo 7: admonmediterraneo7@gmail.com

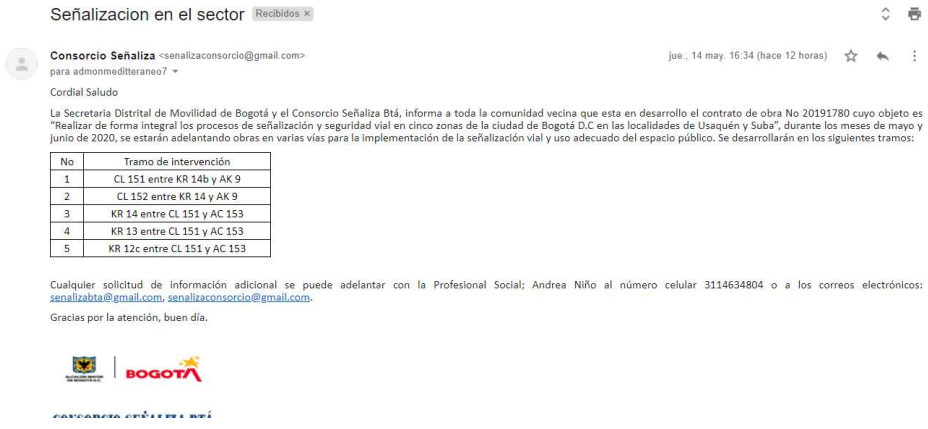

Señalizacion en el sector Recibidos ×

Consorcio Señaliza <senalizaconsorcio@gmail.com> jue., 14 may. 16:34 (hace 12 horas)
para admonmediterraneo7

Cordial Saludo

La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza Btá, informa a toda la comunidad vecina que esta en desarrollo el contrato de obra No 20191780 cuyo objeto es "Realizar de forma integral los procesos de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C en las localidades de Usaquén y Suba", durante los meses de mayo y junio de 2020, se estarán adelantando obras en varias vías para la implementación de la señalización vial y uso adecuado del espacio público. Se desarrollarán en los siguientes tramos:

No	Tramo de intervención
1	CL 151 entre KR 14b y AK 9
2	CL 152 entre KR 14 y AK 9
3	KR 14 entre CL 151 y AC 153
4	KR 13 entre CL 151 y AC 153
5	KR 12c entre CL 151 y AC 153

Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la Profesional Social; Andrea Niño al número celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com, senalizaconsorcio@gmail.com.

Gracias por la atención, buen día.

BOGOTÁ

A la fecha no se ha recibido ningún tipo de manifestación por parte de esta comunidad en referencia a las intervenciones que se están desarrollando en el sector.
Se realizó socialización para la implementación de las bandas sonoras en agregado, en la que se informó de la ventajas que para la reducción de la velocidad de los vehículos ofrecen estos elementos, y de los efectos secundarios que por el ruido y vibraciones puede ocasionar su implementación, a continuación se realizó una encuesta para que el entrevistado expresara su aprobación o no a la instalación de estos elementos en las vía cercana a la vivienda, obteniendo la No aprobación de la instalación de las bandas sonoras. Se adjuntan al informe estas encuestas.
El área técnica recibió la solicitud de la comunidad de los habitantes del Conjunto Residencial Quintas de Calamari, localizado en la calle 155 con carrera 13ª, para implementar la demarcación de un paso peatonal, señalización que se realizó con aprobación de la SDM. Se anexa acta de esta solicitud.

11.3.7 Seguimiento técnico y social a esta intervención.

En compañía del residente del área técnica del Consorcio Señaliza y el componente social se realizó visita a este punto de intervención con el fin de hacer seguimiento a las actividades de implementación, y conocer las posibles inquietudes que pueda tener la comunidad.
A través de medida estratégica de comunicación para dar cumplimiento al distanciamiento social, se realizó perifoneo en el sector, brindando la siguiente información:
"*La Secretaria Distrital de Movilidad y el Consorcio Señaliza Bogotá, informan a la comunidad de este sector, que nos encontramos adelantando actividades de implementación de señalización, para el uso adecuado del espacio público, establecido en el Contrato de Obra No 2019-1780.*
Cualquier información o inquietud en referencia del desarrollo de este contrato, pueden comunicarse a la línea telefónica 3114634804 o emitir sus inquietudes a los siguientes correos electrónicos: consorciosenaliza@gmail.com o al senalizabta@gmail.com".

0:04 -0:38



Ilustración 3.Recorte del video con perifoneo realizado en el Parque de la Vida

11.4 GESTIÓN SOCIAL CARDENAL SANCHA

La actividad del componente social que se ejecutó se describe en el siguiente cuadro que detalla la línea de trabajo, los objetivos y la meta lograda:

11.4.1 Línea de trabajo

Socialización con participación ciudadana

11.4.2 Objetivo

Dar a conocer a la comunidad las actividades de implementación de señalización que serán adelantados en este sector, por parte, del Consorcio Señaliza Bogotá.

11.4.3 Actividad

Teniendo en cuenta que en la ciudad en este momento las medidas de confinamiento social, se encuentran vigentes, desde el componente social se desarrolla la estrategia denominada

perifoneo para que la comunidad del área de influencia directa e indirecta este informada, acerca de las intervenciones a realizar y de los canales de comunicación donde serán atendidos los PQRS, que pueda presentar la comunidad. Se informó que está habilitado el correo electrónico senalizaconsorcio@gmail.co m. o a la línea telefónica 3114634804.

11.4.4 Meta Lograda

Se logró que la comunidad tuviera conocimiento de las actividades a realizar por parte del contratista.

11.4.5 Descripción de área de influencia

Este sector se encuentra en la localidad de Usaquén, en el barrio la Calleja, la mayoría del uso del suelo es residencial, de estratificación 5 y 6, en cuanto a equipamientos comunitarios, presenta una escasa cantidad de parques infantiles y en cuanto a instituciones educativas por la cuarentena no fue posible contactar alguna, sin embrago, en la visita al terreno se evidenció que el Colegio Cardenal Sancha de Bogotá no se encuentra en el área de influencia directa de esta intervención.

11.4.6 Metodología de socialización

Debido al confinamiento social, por parte del Consorcio Señaliza, se realizó el perifoneo en el sector, tanto en el área de influencia directa e indirecta, donde se indicó a la comunidad la siguiente información:

" *Buen día; La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza, informan, que en desarrollo del contrato de obra No 2019-1780 cuyo objeto es: realizar de forma integral proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C- Zona 1-Norte-localidades de Usaquén y Suba-durante los meses de mayo y junio de 2020 se estarán, adelantando obras en estas vías para la implementación de la señalización vial, con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad seguridad vial y el uso adecuado del espacio público.*

Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la profesional social Andrea Niño al celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com o al senalizaconsorcio@gmail.com

Con la finalidad de dar la oportunidad de contacto por correo o telefónico también se realizó perifoneo durante la ejecución de los trabajos, indicando la dirección de correo electrónico y teléfonos donde debían dirigirse la comunidad ante cualquier la necesidad de conocer cualquier aspecto de la implementación de la señalización. Se presenta a continuación registro fotográfico de esta actividad.



Ilustración 4.Recorte de video de perifoneo en Cardenal Sancha

A través de la línea de atención a la comunidad se recibió una petición por parte del señor Manuel Perdomo, quien indica que algunas de las vías las cuales están en disposición por este contrato para realizar la implementación de señalización en el sector, en su concepto no se encuentran en adecuadas condiciones de pavimento, manifestando que es importante que no se vaya a perder el tiempo y el dinero si no están dadas las condiciones para la intervención, se le explica que previo a la intervención el área técnica del Consocio Señaliza y la interventoría realizaron una visita previa al sector donde se realizará la señalización, y que en el caso que efectivamente el punto a intervenir no cuente con las condiciones adecuadas por el estado del pavimento, se reporta a la SDM, indicando que no es posible hacer la señalización y de esta forma se garantiza la adecuada inversión de los recursos, y que en algunos casos se opta por intervenir dado que lo que se pretende es salvar vidas mediante la implementación de señalización vial, sin importar el estado del pavimento. Así mismo, se le informó que los canales de comunicación previo y durante la intervención están dispuestos para cualquier tipo de PQRS.

También se atendió, a través de línea telefónica, la inquietud de la señora Celmira Vargas, quien manifiesta ser una adulta mayor, quien indicó que su preocupación es que las actividades a realizar por parte del contratista se realicen en horas nocturnas, y esto no permita su adecuado descanso, se le explicó que los horarios en los que se realizará la

intervención se determinan a través de un PMT (Plan de Manejo de Transito), que publica la SDM, entidad que prioriza el uso adecuado del espacio público, los horarios en que no se genere una congestión vehicular, y las eventuales afectaciones a la comunidad. Es entendible para el consorcio que las actividades nocturnas generen molestias en la comunidad, pero debe entenderse que es un bien común y su afectación es de corto plazo. Se acordó que se realizaría la gestión para que el PMT fuese publicado en horario diurno, como efectivamente ocurrió, atendiendo de esta forma la solicitud de la comunidad.

Se realizó socialización con la comunidad del Conjunto Residencial Sauces de la Calleja, para la aprobación de instalación de tachones frente a este conjunto, donde la comunidad encabezada por la administración indicó no estar de acuerdo con esta actividad, puesto que esto dificultaría el ingreso a los parqueaderos y generaría trancones en frente del conjunto. Razón por la que se realizó un nuevo diseño, retirando estos elementos, que está en fase de aprobación o rechazo por parte de la comunidad. Se anexa acta y lista de asistencia.

Seguimiento social y técnico a esta intervención

Se realizó perifoneo en este punto, brindado a la comunidad la siguiente información:

“La Secretaria Distrital de Movilidad y el Consorcio Señaliza Bogotá, informan a la comunidad de este sector, que nos encontramos adelantando actividades de implementación de señalización, para el uso adecuado del espacio público, establecido en el Contrato de Obra No 2019-1780.

Cualquier información o inquietud en referencia del desarrollo de este contrato, pueden comunicarse a la línea telefónica 3114634804 o emitir sus inquietudes a los siguientes correos electrónicos: consorciosenaliza@gmail.com o al senalizabta@gmail.com”.

Se presenta a continuación registro fotográfico de esta actividad.



Ilustración 5.Recorte de video perifoneo en Cardenal Sancha

11.5 GESTIÓN SOCIAL CEDRO BOLÍVAR

La actividad del componente social que se ejecutó se describe a continuación detallando la línea de trabajo, los objetivos y la meta lograda.

11.5.1 Línea de trabajo

Socialización con participación ciudadana

11.5.2 Objetivo

Se realizó la estrategia de perifoneo en este sector para que más personas de la comunidad estuvieran informadas acerca de la actividad de señalización.

11.5.3 Actividad

Debido a la contingencia a nivel nacional por la pandemia de COVID-19, se decidió realizar mecanismos participativos, en los cuales no se tuviera contacto con las personas y así cumplir con los parámetros de bioseguridad establecidos por el gobierno local, desde las ventanas de los conjuntos residenciales la comunidad apoyó la implementación.
Mediante perifoneo se informó que está habilitado el correo electrónico senalizaconsorcio@gmail.com o a la línea telefónica 3114634804 para aclarar o dar información sobre la ejecución de los trabajos de señalización

11.5.4 Meta Lograda

Se logró que la comunidad tuviera conocimiento de las actividades a realizar por parte del contratista.

11.5.5 Descripción de área de influencia

Cedro Bolívar, se encuentra ubicada en el norte de la ciudad, de estratificación 5 y 6, cuenta con equipamientos comunitarios, culturales y académicos acorde al sector, debido al receso

de actividades académicas no se logró contactar ninguna institución educativa. Cuenta con rutas de SITP para la conectividad con otros sectores de la ciudad.

11.5.6 Metodología de socialización:

Debido al confinamiento social, por parte del Consorcio Señaliza, se realizó el perifoneo en el sector, tanto en el área de influencia directa e indirecta, donde se indicó a la comunidad la siguiente información:

" *Buen día; La Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá y el Consorcio Señaliza, informan, que en desarrollo del contrato de obra No 2019-1780 cuyo objeto es: realizar de forma integral proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C- Zona 1-Norte-localidades de Usaquén y Suba, durante los meses de mayo y junio de 2020 se estarán, adelantando obras en estas vías para la implementación de la señalización vial, con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad seguridad vial y el uso adecuado del espacio público.*

Cualquier solicitud de información adicional se puede adelantar con la profesional social Andrea Niño al celular 3114634804 o a los correos electrónicos: senalizabta@gmail.com o al senalizaconsorcio@gmail.com

Esto con el fin de mantener a la comunidad informada acerca de las intervenciones que se están realizando en este sector, la comunidad indicó que es importante realizar estas actividades de socialización, además manifiestan que están de acuerdo con las obras, sin embargo, consideran que en algunos tramos que se van a intervenir, en su concepto no se encuentran en adecuadas condiciones, se explicó que previo a la intervención el área técnica del Consocio Señaliza y la interventoría realizaron una visita previa al sector donde se realizaría la señalización, y que en el caso que efectivamente el punto a intervenir no cuente con las condiciones adecuadas por el estado del pavimento, se reporta a la SDM, indicando que no es posible hacer la señalización y de esta forma se garantiza la adecuada inversión de los recursos, y que en algunos casos se opta por intervenir dado que lo que se pretende es salvar vidas mediante la implementación de señalización vial, sin importar el estado del pavimento. Así mismo, se le informó que los canales de comunicación previo y durante la intervención están dispuestos para cualquier tipo de PQRS.

11.5.7 Seguimiento social y técnico a esta intervención

Se realizó perifoneo en este punto, brindado a la comunidad la siguiente información:
"*La Secretaria Distrital de Movilidad y el Consorcio Señaliza Bogotá, informan a la comunidad de este sector, que nos encontramos adelantando actividades de implementación de señalización, para el uso adecuado del espacio público, establecido en el Contrato de Obra No 2019-1780.*
Cualquier información o inquietud en referencia del desarrollo de este contrato, pueden comunicarse a la línea telefónica 3114634804 o emitir sus inquietudes a los siguientes correos electrónicos: consorciosenaliza@gmail.com o al senalizabta@gmail.com".
Se presenta a continuación registro fotográfico de esta actividad.




Ilustración 6.Recorte de video de perifoneo en Cedro Bolívar


11.6 GESTIÓN SOCIAL DANUBIO


En este punto se realizó también gestión de socialización mediante perifoneo como consta en el registro fotográfico, para continuar con los canales de contacto con la comunidad mediante correo o medio telefónico.
En este punto de intervención se ha visto afectado el desarrollo de la implementación, debido a que algunos de los habitantes del sector usan las vías en horas de la noche para el parqueo sus vehículos, como consta en el siguiente registro fotográfico.
Se han realizado acercamientos con la comunidad desde el componente técnico y social y a la fecha no ha sido posible el retiro de estos vehículos, por los que se solicitó a la SDM, tomar medidas por esta ocupación indebida del espacio público, o la publicación de un PMT


en horario diurno, para de esta manera poder terminar la implementación y realizar el cierre social y técnico de este punto.




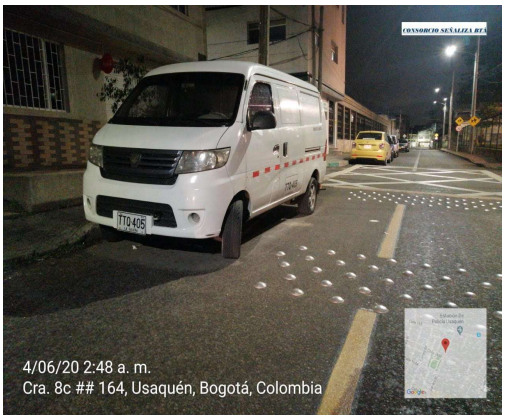

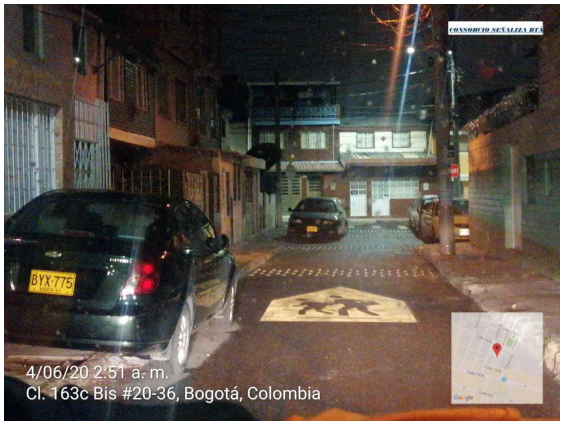

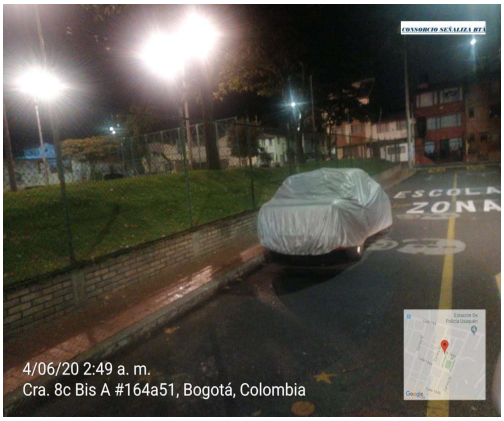

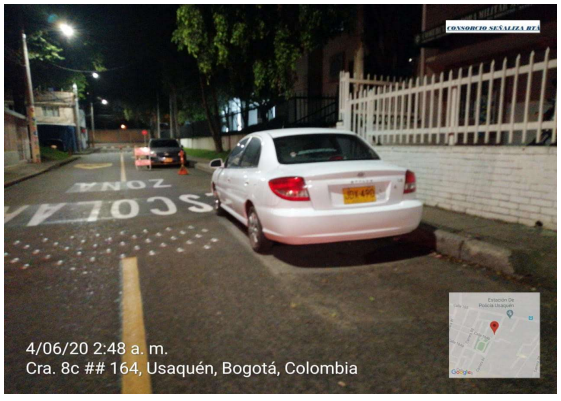

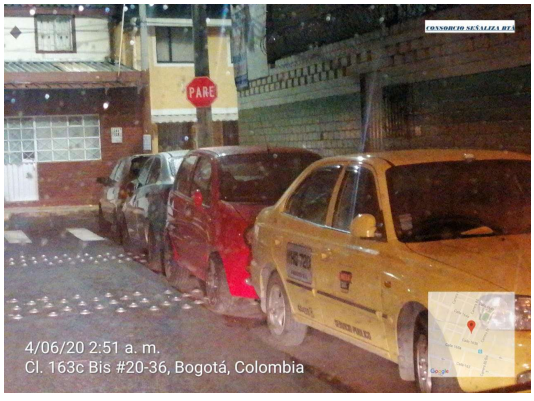

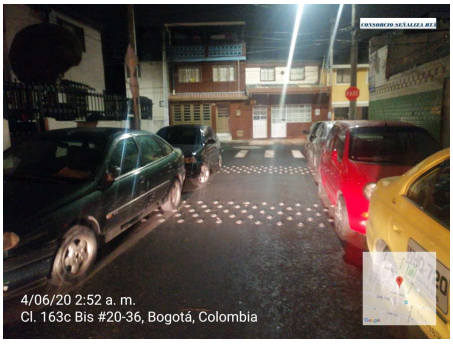


Ilustración 7.Carros parqueados en vía pública

Seguimiento social y técnico a esta intervención

Se realizó perifoneo en este punto, brindado a la comunidad la siguiente información:
"*La Secretaria Distrital de Movilidad y el Consorcio Señaliza Bogotá, informan a la comunidad de este sector, que nos encontramos adelantando actividades de implementación de señalización, para el uso adecuado del espacio público, establecido en el Contrato de Obra No 2019-1780.*
Cualquier información o inquietud en referencia del desarrollo de este contrato, pueden comunicarse a la línea telefónica 3114634804 o emitir sus inquietudes a los siguientes correos electrónicos: consorciosenaliza@gmail.com o al senalizabta@gmail.com".
Se presenta a continuación registro fotográfico de esta actividad.

0:06 -0:34



Ilustración 8.Recorte de video de perifoneo en Danubio

11.7 Conclusiones de la gestión social

De la ejecución de las actividades de gestión social desarrolladas durante el periodo del informe se puede concluir que:

1. Se establecieron canales de comunicación alternos con la comunidad por medio de perifoneo como correo electrónico o telefónicamente, debido a la situación de confinamiento y distanciamiento social, con el fin de mantener canales de comunicación asertivos con los habitantes de los sectores intervenidos.
2. Se realizó socialización teniendo en cuenta lo siguiente: descripción del área de influencia directa, actuación en caso tal de presentarse cualquier requerimiento con la comunidad y se brindó la información clara y oportuna para evitar cualquier tipo de desinformación.

12 INFORME DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL

12.1 Objetivo general

Realizar actividades con el objetivo de la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores promoviendo la adaptación al trabajo evitando accidentes y enfermedades laborales.

12.2 Objetivos específicos

- Mantener y promover la salud y la capacidad de trabajo de los empleados.
- Mejorar las condiciones del trabajo para favorecer la salud y la seguridad de los trabajadores.
- Desarrollar la cultura y el sistema organizacional que favorezcan la salud y la seguridad en el trabajo, promoviendo un clima organizacional positivo, una eficiencia mayor y la optimización de la productividad de la empresa.
- Activar actividades con los controles pertinentes para la mitigación de la emergencia sanitaria COVID-19

12.3 Actividades ejecución.

Realizar inspecciones de seguridad industrial y bioseguridad a los diferentes puntos de trabajo, realizando charlas de seguridad para el personal, divulgación del protocolo de bioseguridad del consorcio y verificar su cumplimento.

12.4 Seguridad social

En el Anexo 7- Soportes del Informe de Seguridad Industrial se presentan las planillas del pago de seguridad social correspondiente al corte de obra.

12.5 Inspecciones de seguridad

Se realizaron inspecciones planeadas para todas las cuadrillas en los diferentes frentes de trabajo en la ciudad de Bogotá. Teniendo en cuenta la mitigación a los riesgos a los cuales estamos expuestos. Realizando la toma diaria de temperatura y el proceso de desinfección de los equipos utilizados en la obra.

12.6 Personal del contrato

De acuerdo con lo establecido en la ficha técnica del proceso se presenta el personal de dirección y administrativo vinculado a las de actividades de ejecución del contrato:

Nombre	Cedula	Cargo	ARL	EPS	Fondo De Pensión
Luis Alfonso Urrego	79.293.923	Director de Obra	Sura	Compensar	Colpensiones
Roberto Carlos Pérez Patiño	1.094.426.558	Residente De Obra	Sura	Coomeva	Porvenir
Luisa Fernanda Chávez	1.020.755.560	Residente De Obra	Sura	Salud Total	Porvenir

Juan David Martínez Gutiérrez	1.019.136.729	Auxiliar De Ingeniería	Sura	Salud Total	Colpensiones
Cristian Felipe Zapata González	1.023.018.738	Auxiliar De Ingeniera	Sura	Capital Salud	Porvenir
Pedro Martínez Gutiérrez	1.019.136.729	Trabajador Social	Sura	Salud Total	Colpensiones
Yenny Páez Bravo	1.031.144.429	Tecnólogo En Salud Ocupacional	Sura	Famisanar	Porvenir
Diana Casilimas	39.542.700	Secretaria	Sura	Compensar	Porvenir
Pedro Alexander Gutiérrez	1,032,426,293	Tecnólogo En Georreferenciación	Sura	Salud Total	Porvenir
Andrea Viviana Niño	1.030.526.438	Trabajador Social	Sura	Nueva Eps	Colpensiones
Andrés Felipe Casilimas Martínez	1.018.446.487	Conductor	Sura	Compensar	Porvenir

Tabla 22 - Seguridad Social personal administrativo

Se presenta a continuación resumen grafico de la toma de temperatura corporal realizado diariamente al personal en cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad, mediante el cual se controla el eventual contagio de COVID-19 a este personal:

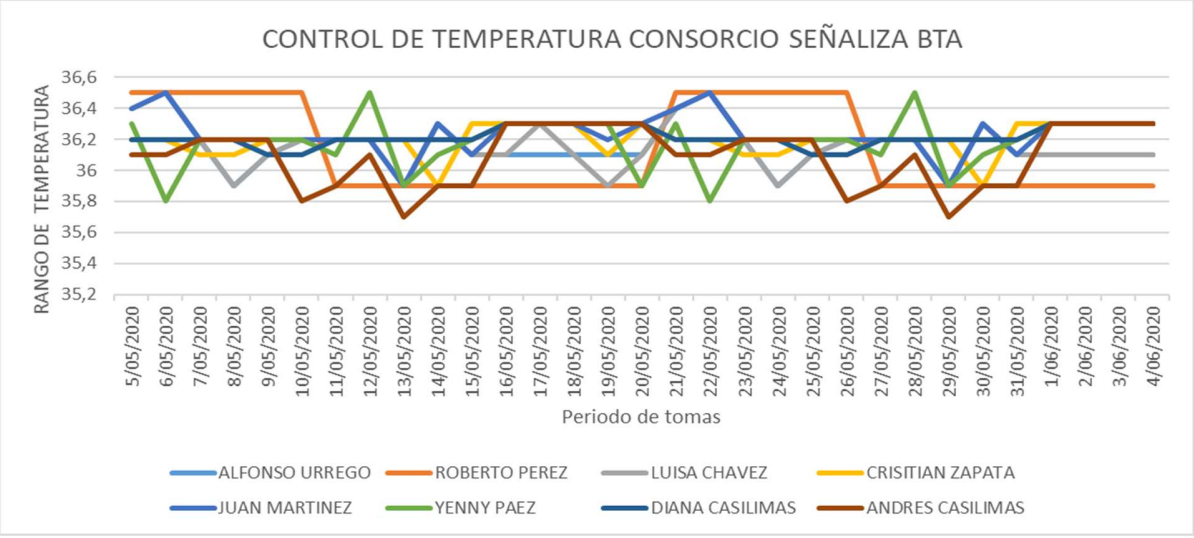


Ilustración 9 – Temperaturas personal Consorcio Señaliza

12.6.1 PERSONAL OPERATIVO REPORTE DE TEMPERATURAS

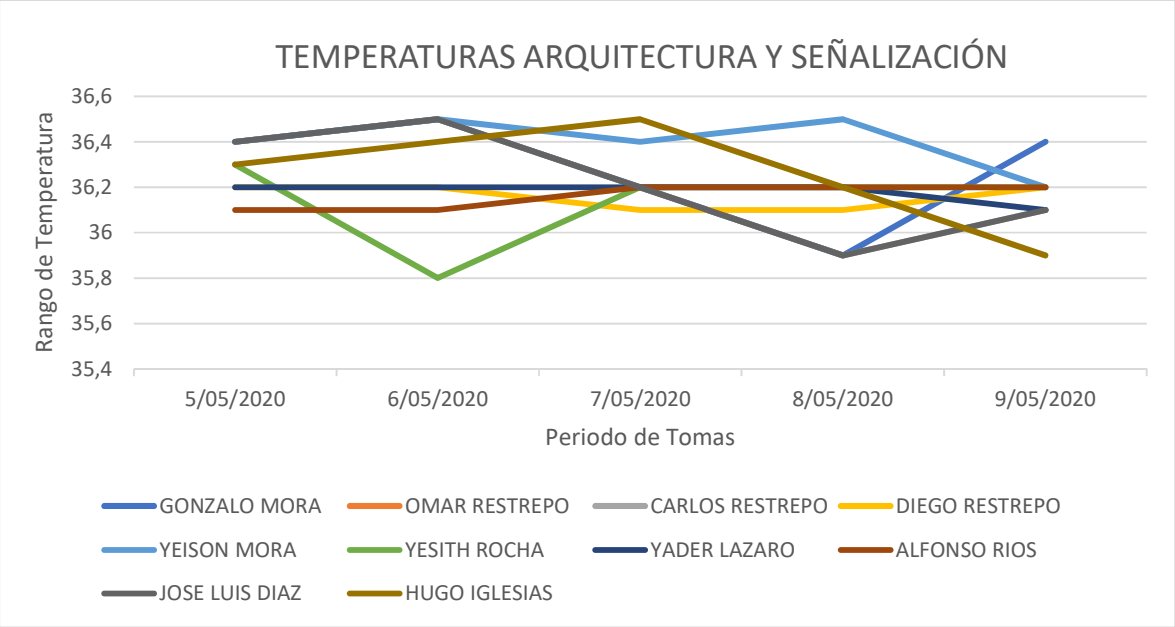


Ilustración 10 - Temperaturas personal Arquitectura y Señalización SAS.

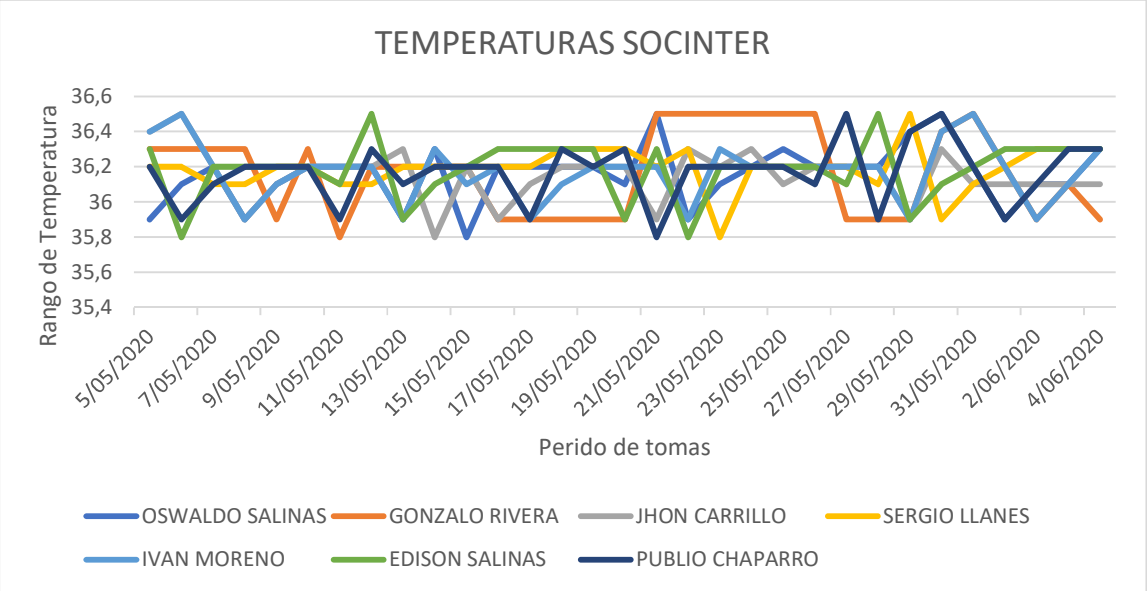


Ilustración 11 - Temperaturas personal Socinter SA

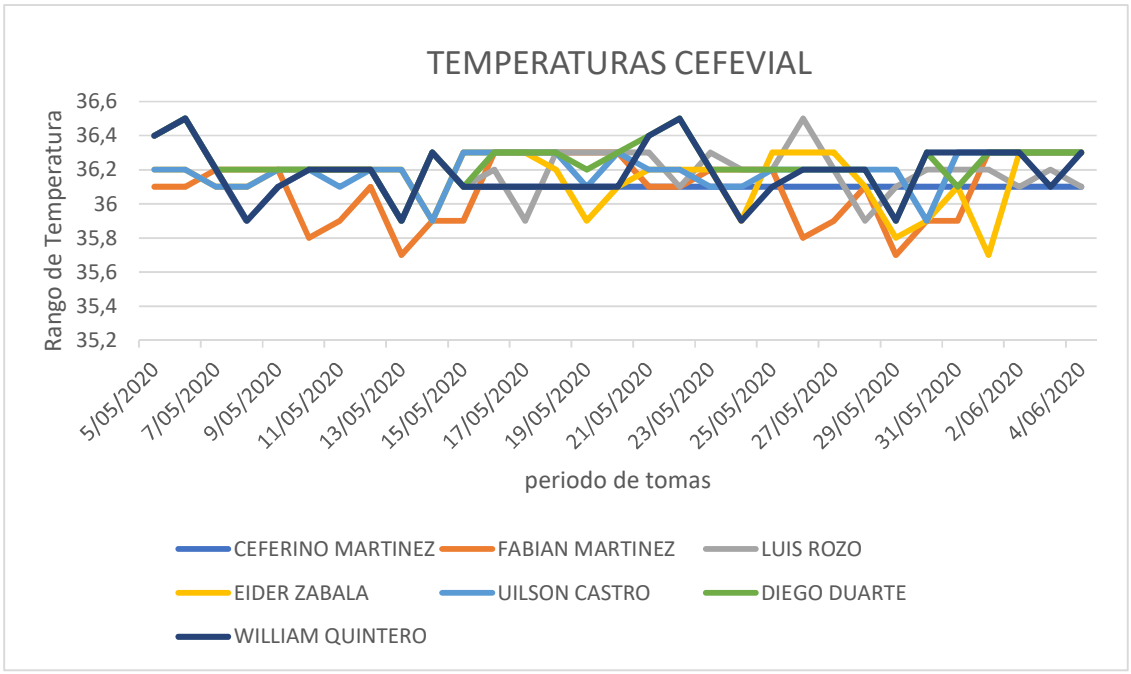


Ilustración 12. Temperatura personal Cefevial SA

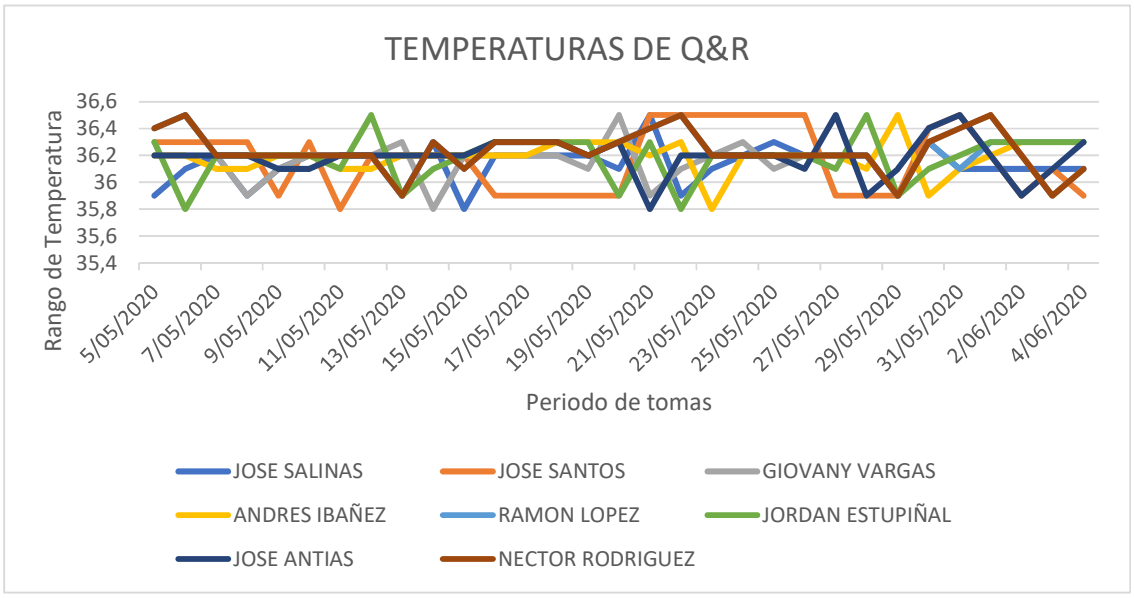


Ilustración 13.Temperaturas personal Q&R Señalizacion SA

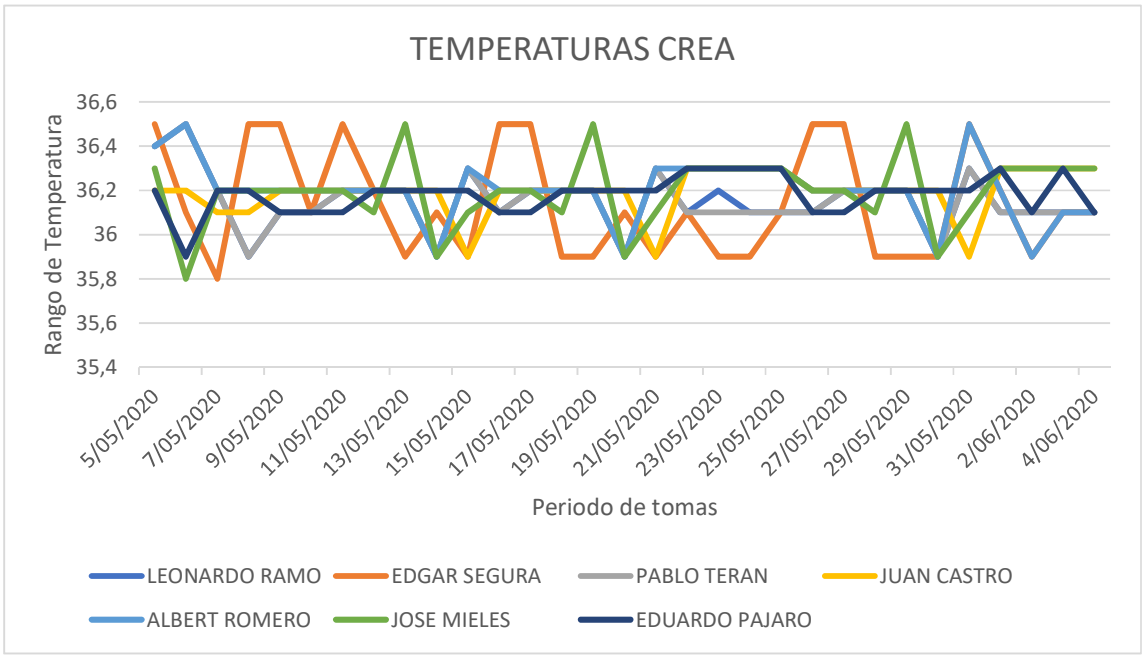


Ilustración 14. Temperaturas personal LAYC

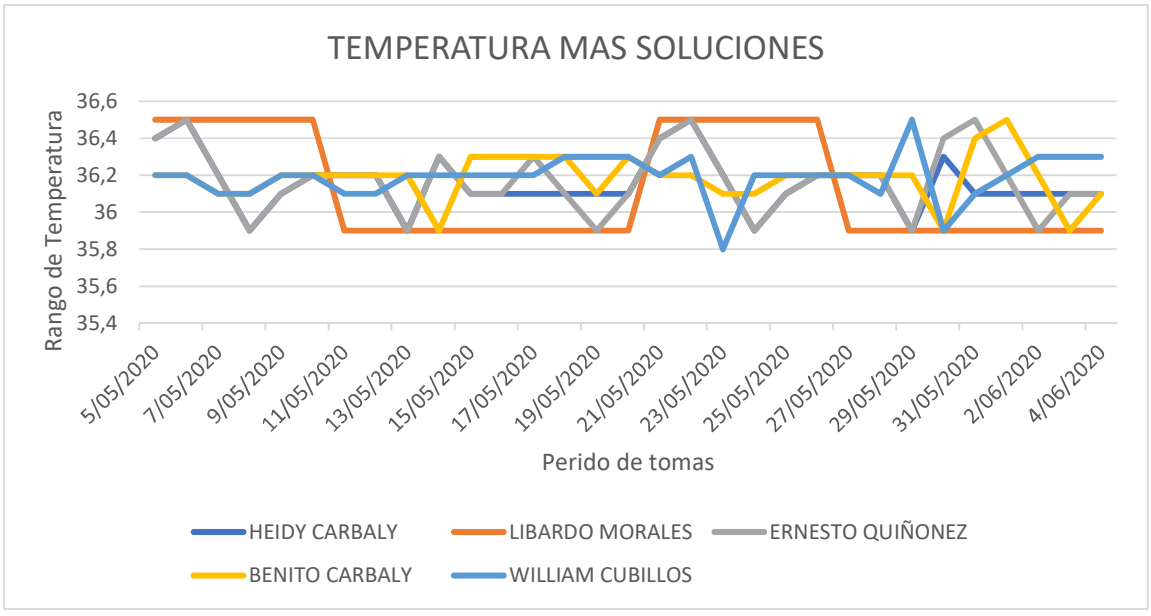


Ilustración 15.Temperaturas personal MAS Soluciones

12.7 Dotación y elementos de protección personal

Durante el periodo del informe se realizaron inspecciones de seguridad efectuando requerimientos a los contratistas para optimizar la presentación en cuanto dotación y elementos de protección personal llegando a una buena solución los centros de trabajo en este momento se encuentran equipados con los elementos de protección personal necesarios para realizar sus labores sin ningún riesgo.

- ✓ Gafas de seguridad
- ✓ Protección auditiva
- ✓ Protección respiratoria
- ✓ Guantes
- ✓ Gel Antibacterial



Ilustración 16 - Elementos de protección personal

12.8 Carnetización del personal

Durante las inspecciones cada trabajador tenía su carnet de ARL en un lugar visible para manejar un control de identificación en caso de necesitarlo al evidenciar un incidente o accidente a la hora de estar ejecutando su labor.

12.9 Identificación de los vehículos

En el mes se verificó que todos los vehículos cuenten con el magnético que muestra la identificación del contrato revisando los extintores, botiquines para descartar los que estén vencidos y reponer los elementos que se gastaron. Además, se realizó la revisión de la documentación de los vehículos para estar al día con los documentos de SOAT, y la revisión Técnico - mecánica.

Todos los días al inicio y fin de la jornada laboral se realizó la desinfección de los vehículos como se muestra en las siguientes fotografías:





Ilustración 17. Desinfección de vehículos

12.10 Actividades realizadas

Se realizaron capacitaciones del protocolo de bioseguridad el correcto lavado manos las medidas de mitigación para evitar el contagio del COVID-19. Tambien se realizaron las encuestas pos-cuarentena a todo el personal que inicio labores presenciales.

12.11 Reporte de accidentalidad

En el Anexo 7- Soportes del Informe de Seguridad Industrial se entrega soporte de accidentalidad del Consorcio Señaliza BTÁ.

12.12 Conclusiones del informe HSEQ

- No se presentaron accidentes laborales durante este periodo
- Hasta la fecha no presentamos ningún personal con sintomatología de contagio del COVID 19 seguimos con el cumplimento del protocolo de seguridad.
- Como conclusión general se observa que en los sitios de trabajo se ven reflejadas en la organización, limpieza y seguridad de cada espacio en las obras, minimizando el riesgo de accidentalidad y garantizando zonas confortables para la ejecución de los trabajos

- Se cuenta con áreas totalmente señalizadas acorde a la actividad que se está ejecutando, así como el acopio de materiales.
- Se evidencia orden y aseo en los frentes de trabajo y su respectiva implementación del PMT
- A la fecha las obras presentan un entorno adecuado de seguridad industrial y salud ocupacional.

13 CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

1. Desde el reinicio de actividades mediante el cumplimiento del Protocolo para el manejo del COVID-19, ha sido exitoso, debido a que no se presentan reportes de personal contagiado
2. En seguimiento de lo establecido en el Plan de Trabajo presentado, se ha logrado en el componente de obra, lograr un avance de lo ejecutado versus lo programado, y en el componente de diseño, una reducción significativa del atraso en inventarios.

Anexo 1: Acta parcial y planillas de obra

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	11 - SUBA	Fecha de entrega	29/05/2020
UPZ	28 - EL RINCÓN		
ID	MV_AV_CALI_941_09_V25	Cuenta	7

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
1	15/05/2020	11009240	395292	PC	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	93	CL	127	CL	127A	m2	0,4	0,4	20	3,2	5,00	A	B	R	A	15
2	18/05/2020	11009240	17801617	TR				Plástico E	Blanco	KR	93	CL	127	CL	127A	Und	°	°	20	◦	◦	A	B	R	A	8
3	15/05/2020	11009240	17801618	ACH	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Azul	KR	93	CL	127	CL	127A	m2	2,5	8,1	1	20,25	21,32	A	B	R	A	15
4	18/05/2020	11009240	17801619	LCA_C	A. Base Solv	A. Base Agua			Amarillo	KR	93	CL	127	CL	127A	ml	0,1	1,2	4	4,8	4,80	A	B	R	A	10
5	15/05/2020	11009240	395291	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	93	CL	127	CL	127A	m2	0,4	4	9	14,4	18,45	A	B	R	A	15
6	18/05/2020	11009240	395275	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	KR	93	CL	127	CL	127A	ml	0,12	16,1	1	16,1	16,10	A	B	R	A	15
7	15/05/2020	11009240	1142386	LP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	93	CL	127	CL	127A	m2	0,6	7,5	1	4,5	5,32	A	B	R	A	15
8	15/05/2020	11009240	395289	FGI	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	93	CL	127	CL	127A	m2	°	°	°	1,5	2,20	A	B	R	A	15
9	18/05/2020	11009240	395287	LPA	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	KR	93	CL	127	CL	127A	ml	0,15	15	1	15	15,00	A	B	R	A	15
10	18/05/2020	11009240	17801620	TR				Plástico E	Blanco	KR	93	CL	127	CL	127A	Und	°	°	16	◦	◦	A	B	R	A	8
11	15/05/2020	11009240	395288	FGD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	93	CL	127	CL	127A	m2	°	°	°	1,5	2,20	A	B	R	A	15
12	18/05/2020	11009240	395278	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	KR	93	CL	127	CL	127A	ml	0,12	14	1	14	14,00	A	B	R	A	15
13	25/05/2020	11012442	17801621	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
14	25/05/2020	11012442	17801622	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
15	25/05/2020	11012442	17801623	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
16	25/05/2020	11012442	17801624	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
17	25/05/2020	11012442	17801625	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
18	25/05/2020	11012442	17801626	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
19	25/05/2020	11012442	17801627	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
20	25/05/2020	11012442	17801628	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
21	25/05/2020	11012442	17801629	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
22	25/05/2020	11012442	17801630	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA	**Fecha de entrega**	29/05/2020
UPZ	28 - EL RINCÓN		
ID	MV_AV_CALI_941_09_V25	**Cuenta**	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
23	25/05/2020	11012442	17801631	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
24	25/05/2020	11012442	17801632	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
25	25/05/2020	11012442	17801633	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
26	25/05/2020	11012442	17801634	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
27	25/05/2020	11012442	17801635	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
28	25/05/2020	11012442	17801636	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
29	25/05/2020	11012442	17801637	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
30	25/05/2020	11012442	17801638	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
31	25/05/2020	11012442	17801639	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
32	25/05/2020	11012442	17801640	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
33	25/05/2020	11012442	17801641	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
34	25/05/2020	11012442	17801642	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
35	25/05/2020	11012442	17801643	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
36	25/05/2020	11012442	17801644	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
37	26/05/2020	11012442	17801645	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
38	26/05/2020	11012442	17801646	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
39	26/05/2020	11012442	17801647	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD				11 - SUBA										**Fecha de entrega**		29/05/2020										
UPZ				28 - EL RINCÓN																						
ID				MV_AV_CALI_941_09_V25										**Cuenta**		7										
No	**Fecha**	**CIV**	**Interno**	**CLASE MARCA**	**Propiedad**					**DIRECCIÓN**						**CANTIDADES**						**GARANTIAS**				
					Imprimante	**Pintura**	**Borrado/ Retiro**	**Material**	**COLOR**	**EJE**		**INICIA**		**TERMINA**		**UND**	**ANCHO**	**LONG**	**CANT**	**PNT**	**IMP**	**TPD**	**CONT**	**EST. PAV**	**AFECT**	**GARANTIA (MESES)**
40	26/05/2020	11012442	17801648	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
41	26/05/2020	11012442	17801649	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
42	26/05/2020	11012442	17801650	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	92	KR	93	m2	0,05	2,25	1	0,11	0,23	M	B	B	M	21
43	15/05/2020	11009241	395272	PC	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,4	0,4	26	4,16	6,50	A	M	R	A	11
44	18/05/2020	11009241	17801651	TR				Plástico E	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	Und	°	°	24	◦	◦	A	M	R	A	8
45	15/05/2020	11009241	17801652	ACH	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Azul	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	2,1	10,3	1	21,63	22,88	A	M	R	A	11
46	19/05/2020	11009241	17801653	LCA_C	A. Base Solv	A. Base Agua			Amarillo	CL	127	KR	93	KR	93C	ml	0,1	1,2	5	6	6,00	A	M	R	A	8
47	13/05/2020	11009241	17801654	PP			Borrado			CL	127	KR	93	KR	93C	m2	°	°	24,08	°	°					
48	16/05/2020	11009241	395264	PP	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,4	4	13	20,8	26,65	A	M	R	A	11
49	26/05/2020	11009241	17801655	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,33	1	0,12	0,23	M	B	B	M	21
50	26/05/2020	11009241	17801656	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,33	1	0,12	0,23	M	B	B	M	21
51	26/05/2020	11009241	17801657	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,33	1	0,12	0,23	M	B	B	M	21
52	26/05/2020	11009241	17801658	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,33	1	0,12	0,23	M	B	B	M	21
53	26/05/2020	11009241	17801659	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,33	1	0,12	0,23	M	B	B	M	21
54	26/05/2020	11009241	17801660	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,33	1	0,12	0,23	M	B	B	M	21
55	26/05/2020	11009241	17801661	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,33	1	0,12	0,23	M	B	B	M	21
56	26/05/2020	11009241	17801662	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,33	1	0,12	0,23	M	B	B	M	21
57	26/05/2020	11009241	17801663	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,33	1	0,12	0,23	M	B	B	M	21
58	26/05/2020	11009241	17801664	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,33	1	0,12	0,23	M	B	B	M	21

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA	**Fecha de entrega**	29/05/2020
UPZ	28 - EL RINCÓN		
ID	MV_AV_CALI_941_09_V25	**Cuenta**	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
59	26/05/2020	11009241	17801665	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,23	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
60	26/05/2020	11009241	17801666	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,23	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
61	26/05/2020	11009241	17801667	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,23	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
62	26/05/2020	11009241	17801668	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,23	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
63	26/05/2020	11009241	17801669	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,23	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
64	26/05/2020	11009241	17801670	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,23	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
65	26/05/2020	11009241	17801671	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,23	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
66	26/05/2020	11009241	17801672	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,23	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
67	26/05/2020	11009241	17801673	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,23	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
68	26/05/2020	11009241	17801674	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,23	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
69	26/05/2020	11009241	17801675	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
70	26/05/2020	11009241	17801676	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
71	26/05/2020	11009241	17801677	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
72	26/05/2020	11009241	17801678	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
73	26/05/2020	11009241	17801679	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
74	26/05/2020	11009241	17801680	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
75	26/05/2020	11009241	17801681	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA	**Fecha de entrega**	29/05/2020
UPZ	28 - EL RINCÓN		
ID	MV_AV_CALI_941_09_V25	**Cuenta**	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
76	26/05/2020	11009241	17801682	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
77	26/05/2020	11009241	17801683	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
78	26/05/2020	11009241	17801684	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
79	16/05/2020	11009241	395293	ZB	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Amarillo	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,3	139,4	1	41,82	55,80	A	M	R	A	11
80	16/05/2020	11009241	395273	PC	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,4	0,4	26	4,16	6,50	A	M	R	A	11
81	19/05/2020	11009241	17801685	TR				Plástico E	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	Und	°	°	24	◦	◦	A	M	R	A	8
82	16/05/2020	11009241	17801686	ACH	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Azul	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	2	10	1	20	21,21	A	M	R	A	11
83	19/05/2020	11009241	17801687	LCA_C	A. Base Solv	A. Base Agua			Amarillo	CL	127	KR	93	KR	93C	ml	0,1	1,2	5	6	6,00	A	M	R	A	8
84	13/05/2020	11009241	17801688	PP			Borrado			CL	127	KR	93	KR	93C	m2	°	°	24,08	°	°					
85	16/05/2020	11009241	395265	PP	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,4	4	13	20,8	26,65	A	M	R	A	11
86	13/05/2020	11009241	17801689	LP			Borrado			CL	127	KR	93	KR	93C	m2	°	°	6,36	°	°					
87	16/05/2020	11009241	395266	LP	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,6	10	1	6	7,07	A	M	R	A	11
88	17/05/2020	11009241	395267	FF	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	M	R	A	11
89	13/05/2020	11009241	17801690	FF			Borrado			CL	127	KR	93	KR	93C	m2	°	°	1,2	°	°					
90	19/05/2020	11009241	395270	LPA	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	ml	0,15	15	1	15	15,00	A	M	R	A	11
91	13/05/2020	11009241	17801691	LPA			Borrado			CL	127	KR	93	KR	93C	m2	°	°	2,55	°	°					
92	19/05/2020	11009241	17801692	TR				Plástico E	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	Und	°	°	16	◦	◦	A	M	R	A	8
93	17/05/2020	11009241	395268	FF	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	M	R	A	11
94	13/05/2020	11009241	17801693	FF			Borrado			CL	127	KR	93	KR	93C	m2	°	°	1,2	°	°					
95	19/05/2020	11009241	395271	LPA	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	ml	0,15	15	1	15	15,00	A	M	R	A	11
96	13/05/2020	11009241	17801694	LPA			Borrado			CL	127	KR	93	KR	93C	m2	°	°	2,55	°	°					
97	19/05/2020	11009241	17801695	TR				Plástico E	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	Und	°	°	16	◦	◦	A	M	R	A	8
98	17/05/2020	11009241	395269	FF	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	M	R	A	11
99	13/05/2020	11009241	17801696	FF			Borrado			CL	127	KR	93	KR	93C	m2	°	°	1,2	°	°					
100	26/05/2020	11009241	17801697	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA	**Fecha de entrega**	29/05/2020
UPZ	28 - EL RINCÓN		
ID	MV_AV_CALI_941_09_V25	**Cuenta**	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
101	26/05/2020	11009241	17801698	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
102	26/05/2020	11009241	17801699	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
103	26/05/2020	11009241	17801700	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
104	26/05/2020	11009241	17801701	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
105	26/05/2020	11009241	17801702	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
106	26/05/2020	11009241	17801703	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
107	26/05/2020	11009241	17801704	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
108	26/05/2020	11009241	17801705	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
109	26/05/2020	11009241	17801706	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
110	26/05/2020	11009241	17801707	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
111	26/05/2020	11009241	17801708	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
112	26/05/2020	11009241	17801709	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
113	26/05/2020	11009241	17801710	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
114	26/05/2020	11009241	17801711	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
115	26/05/2020	11009241	17801712	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
116	26/05/2020	11009241	17801713	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
117	26/05/2020	11009241	17801714	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA	Fecha de entrega	29/05/2020
UPZ	28 - EL RINCÓN		
ID	MV_AV_CALI_941_09_V25	Cuenta	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
118	26/05/2020	11009241	17801715	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
119	26/05/2020	11009241	17801716	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
120	26/05/2020	11009241	17801717	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
121	26/05/2020	11009241	17801718	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
122	26/05/2020	11009241	17801719	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
123	26/05/2020	11009241	17801720	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
124	26/05/2020	11009241	17801721	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
125	26/05/2020	11009241	17801722	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
126	26/05/2020	11009241	17801723	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
127	26/05/2020	11009241	17801724	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
128	26/05/2020	11009241	17801725	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21
129	26/05/2020	11009241	17801726	BA	A. Base Solv			Agregado Pétreo (h=1cm)	Blanco	CL	127	KR	93	KR	93C	m2	0,05	2,2	1	0,11	0,22	M	B	B	M	21

ITEM	DESCRIPCION_ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	16,80	$ 810	$ 13.608
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	30,10	$ 999	$ 30.070
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	45,00	$ 1.236	$ 55.620
36	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	253,26	$ 11.196	$ 2.835.499
51	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	16,80	$ 1.328	$ 22.310
58	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	ML	30,10	$ 3.364	$ 101.256
59	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	45,00	$ 4.017	$ 180.765

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	11 - SUBA	**Fecha de entrega**	29/05/2020
UPZ	28 - EL RINCÓN		
ID	MV_AV_CALI_941_09_V25	**Cuenta**	7

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN			CANTIDADES					IMP	GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE	INICIA	TERMINA	UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT		TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
61	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas																	M2	10,70		$ 35.360	$	378.352
62	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas																	M2	14,40		$ 32.869	$	473.314
68	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.																	M2	59,74		$ 57.854	$	3.456.198
69	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.																	M2	41,60		$ 56.996	$	2.371.034
70	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.																	M2	61,88		$ 57.737	$	3.572.766
71	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072																	UND	188,32		$ 6.800	$	1.280.576
73	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).																	UND	116,00		$ 8.799	$	1.020.684
85	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 1 cm de altura, construida con gravilla de 1/4", pintura de larga duración blanca y resina epóxica																	UND	10,06		$ 161.775	$	1.627.457
104	Borrado mecánico de marcas viales.																	M2	63,22		$ 32.261	$	2.039.540

RESIDENTE DE OBRA

ING. LUISA FERNANDA CHAVES
Firma y Nombre

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. ALBA AVENDAÑO CIPAGAUTA
Firma y Nombre

OBSERVACIONES

SUBTOTAL		**$ 19.459.048**
ADMINISTRACIÓN	29,9%	$ 5.818.255
IMPREVISTOS	2,0%	$ 389.181
UTILIDAD	5,0%	$ 972.952
TOTAL		**$ 26.639.437**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de Entrega**	26/05/2020
UPZ	14 - USAQUEN		
ID	CP - CANTÓN NORTE	**Cuenta**	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	CIV	INTERNO SENAL	CLASE SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	FECHA	CONTENIDO TABLERO	DIRECCION							ITEM		ITEM ANTIGRAF	CANT	RET/REU
											EJE		INICIO		FIN		COSTADO					
1	1005744	591034	SIO-05	100	75	-	-	INSTALAR	11/05/2020	TRANSITE POR LA ACERA DE EN FRENTE	KR	11B	CL	103	CL	103A	ORIENTAL	1 y 2	28		0,75	-
2	1005704	591035	SR-38	75	25	-	-	INSTALAR	11/05/2020		KR	11B	CL	103A	CL	104A	ORIENTAL	19	-		-	-
3	1005704	591036	SR-38	75	25	-	-	INSTALAR	11/05/2020		KR	11B	CL	103A	CL	104A	OCCIDENTAL	19	-		-	-
4	1005663	591037	SIO-05	100	75	-	-	INSTALAR	11/05/2020	TRANSITE POR LA ACERA DE EN FRENTE	KR	11B	CL	104A	AK	9	ORIENTAL	1 y 2	28		0,75	-

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	PRECIO UNITARIO	CANT	PRECIO TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 180.893	1,50	$ 271.340
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 64.185	2,00	$ 128.370
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 136.525	2,00	$ 273.050
28	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 31.404	2,00	$ 62.808

RESIDENTE DE OBRA

Roberto Carlos Perez P.

ING. ROBERTO CARLOS PEREZ

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Gabriel H. Torres R

ING. GABRIEL TORRES

OBSERVACIONES

SUBTOTAL		**$**	**735.568**
ADMINISTRACIÓN	29,9%	$	219.934,83
IMPREVISTOS	2,0%	$	14.711,36
UTILIDAD	5,0%	$	36.778,40
TOTAL		**$**	**1.006.993**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	Fecha de Entrega	5/06/2020
UPZ	13 - TOBERIN		
ID	EX_01_358_1842_12	Cuenta	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No.	CIV	INTERNO SENAL	CLASE SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	FECHA	CONTENIDO TABLERO	DIRECCION							ITEM		ITEM ANTIGRAFITI	CANTIDAD	RET/REU
											EJE		INICIO		FIN		COSTADO						
1	50007296	563714	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	3/06/2020	30	CL	160	KR	14B	KR	14C	SUR	6	-		-	-
2	50007297	563715	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	3/06/2020	F4	CL	160	KR	14B	KR	14C	SUR	1 y 3	28		0,50	-
3	50007297	563716	SR-01	60	60	-	-	RETIRAR	3/06/2020		CL	160	KR	14B	KR	14C	SUR	-	-		-	30
4	50007297	563713	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	3/06/2020	F4	CL	160	KR	14B	KR	14C	NORTE	1 y 3	28		0,50	-
5	1002159	563712	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	3/06/2020	30	KR	14B	CL	160	CL	161	OCCIDENTAL	6	-		-	-
6	1002221	563725	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	3/06/2020	30	DG	159B	KR	14A	KR	14B	NORTE	6	-		-	-
7	1002265	298715	SP-48/SR-30	60	60	60	60	REUBICAR	4/06/2020	30	CL	159A	KR	14A	KR	13A	SUR	-	-		-	31
8	1002265	563730	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	4/06/2020	F4	CL	159A	KR	14A	KR	13A	SUR	1 y 3	28		0,50	-
9	1002265	563733	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	4/06/2020	30	CL	159A	KR	14A	KR	13A	SUR	6	-		-	-
10	1002265	563734	SP-24	60	60	-	-	INSTALAR	4/06/2020		CL	159A	KR	14A	KR	13A	SUR	5	-		-	-
11	1002265	563737	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	4/06/2020	F4	CL	159A	KR	14A	KR	13A	SUR	1 y 3	28		0,50	-
12	1002265	563731	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	4/06/2020	F4	CL	159A	KR	14A	KR	13A	NORTE	1 y 3	28		0,50	-
13	1002265	563732	SP-46A	60	60	-	-	INSTALAR	4/06/2020		CL	159A	KR	14A	KR	13A	NORTE	5	-		-	-
14	1002265	563736	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	4/06/2020	F4	CL	159A	KR	14A	KR	13A	NORTE	1 y 3	28		0,50	-
15	1002264	298713	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	4/06/2020		KR	13A	CL	159A	CL	160	OCCIDENTAL	5	-		-	30
16	1006195	563739	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	4/06/2020	30	KR	12	CL	160	AC	161	OCCIDENTAL	6	-		-	-
17	1002429	563740	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	4/06/2020	F4	KR	12	CL	160	CL	158A	OCCIDENTAL	1 y 3	28		0,50	-
18	1002429	563741	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	4/06/2020	F4	KR	12	CL	160	CL	158A	ORIENTAL	1 y 3	28		0,50	-
19	1002481	563747	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	4/06/2020	30	CL	158A	AK	9	KR	12	NORTE	6	-		-	-
20	1002481	563746	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	4/06/2020	F4	CL	158A	AK	9	KR	12	NORTE	1 y 3	28		0,50	-
21	1002481	563748	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	4/06/2020	F4	CL	158A	AK	9	KR	12	SUR	1 y 3	28		0,50	-
22	1002430	278443	SR-01	60	60	-	-	RETIRAR	4/06/2020		CL	158A	KR	12	KR	13	NORTE	-	-		-	30
23	1002412	563744	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	4/06/2020	F4	DG	159	KR	13	KR	13A	NORTE	1 y 3	28		0,50	-
24	1002412	563745	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	4/06/2020	F4	DG	159	KR	13	KR	13A	SUR	1 y 3	28		0,50	-
25	1002412	563738	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	4/06/2020	30	DG	159	KR	13	KR	13A	SUR	6	-		-	-
26	1002528	563749	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	4/06/2020	30	KR	13	CL	158A	CL	157	OCCIDENTAL	6	-		-	-
27	1002528	563752	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	4/06/2020	F4	KR	13	CL	158A	CL	157	OCCIDENTAL	1 y 3	28		0,50	-
28	1002528	563750	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	4/06/2020	30	KR	13	CL	158A	CL	157	ORIENTAL	6	-		-	-
29	1002528	563751	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	4/06/2020	F4	KR	13	CL	158A	CL	157	ORIENTAL	1 y 3	28		0,50	-
30	1002529	563754	SP-24/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	4/06/2020	30	CL	157	KR	13	KR	13A	SUR	6	-		-	-
31	1002529	563753	SP-46A	60	60	-	-	INSTALAR	4/06/2020		CL	157	KR	13	KR	13A	SUR	5	-		-	-
32	1002725	561226	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	4/06/2020	30	KR	13	CL	155	CL	157	OCCIDENTAL	6	-		-	-
33	1002725	278448	SR-30	60	60	-	-	RETIRAR	4/06/2020		KR	13	CL	155	CL	157	OCCIDENTAL	-	-		-	30
34	1002725	237577	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	4/06/2020		KR	13	CL	155	CL	157	OCCIDENTAL	5	-		-	30

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 180.893	6,96	$ 1.259.015,0
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo duplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 87.058	14,00	$ 1.218.812,0
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 163.915	5,00	$ 819.575,0
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cms, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 220.871	11,00	$ 2.429.581,0
28	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 31.404	14,00	$ 439.656,0
30	Retiro de Señales Verticales (lincluye pedestal y tablero) con entrega a almacen de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	$ 14.099	5,00	$ 70.495,0
31	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	$ 53.080	1,00	$ 53.080,0

RESIDENTE DE OBRA

Roberto Carlos Perez P.

ING. ROBERTO CARLOS PEREZ
Firma y Nombre

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Gabriel H. Torres R

ING. GABRIEL TORRES
Firma y Nombre

OBSERVACIONES

SUBTOTAL		**$ 6.290.214,00**
ADMINISTRACIÓN	29,9%	$ 1.880.774
IMPREVISTOS	2,0%	$ 125.804
UTILIDAD	5,0%	$ 314.511
TOTAL		**$ 8.611.303**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

LOCALIDAD	1 - USAQUEN	Fecha de Entrega	27/05/2020
UPZ	13 - LOS CEDROS		
ID	MV_01_032_945_10_V22	Cuenta	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	CIV	INTERNO SENAL	CLASE SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	FECHA	CONTENIDO TABLERO	DIRECCION							ITEM		ITEM ANTIGRAF	CANT	RET/REU
											EJE		INICIO		FIN		COSTADO					
1	1006302	587847	DCH	50	40	-	-	REEMPLAZAR	22/05/2020		AK	45	AC	134	CL	134 BIS	SEPARADOR	13	-		-	30
2	1006302	169672	DCH	50	40	-	-	REEMPLAZAR	22/05/2020		AK	45	AC	134	CL	134 BIS	SEPARADOR	13	-		-	30
3	1006302	169673	DCH	50	40	-	-	REEMPLAZAR	22/05/2020		AK	45	AC	134	CL	134 BIS	SEPARADOR	13	-		-	30
4	1006302	169674	DCH	50	40	-	-	REEMPLAZAR	22/05/2020		AK	45	AC	134	CL	134 BIS	SEPARADOR	13	-		-	30
5	1006302	169675	DCH	50	40	-	-	REEMPLAZAR	22/05/2020		AK	45	AC	134	CL	134 BIS	SEPARADOR	13	-		-	30
6	1006302	587844	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	22/05/2020	30	AK	45	AC	134	CL	134 BIS	SEPARADOR	6	-		-	-
7	1006302	587845	SRB-05	45	45	-	-	INSTALAR	22/05/2020		AK	45	AC	134	CL	134 BIS	SUR	20	-		-	-
8	1006302	587839	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	22/05/2020	F4	AK	45	AC	134	CL	134 BIS	SUR	1 y 3	28		0,50	-
9	1006302	587841	SPB-46A	45	45	-	-	INSTALAR	22/05/2020		AK	45	AC	134	CL	134 BIS	SUR	20	-		-	-
10	1003918	244481	DCH	50	40	-	-	REEMPLAZAR	22/05/2020		CL	134 BIS	AC	134	AK	45	SEPARADOR	13	-		-	30
11	1003918	244880	DCH	50	40	-	-	REEMPLAZAR	22/05/2020		CL	134 BIS	AC	134	AK	45	SEPARADOR	13	-		-	30
12	1003918	244879	DCH	50	40	-	-	REEMPLAZAR	22/05/2020		CL	134 BIS	AC	134	AK	45	SEPARADOR	13	-		-	30
13	1003918	244878	DCH	50	40	-	-	REEMPLAZAR	22/05/2020		CL	134 BIS	AC	134	AK	45	SEPARADOR	13	-		-	30
14	1003918	587842	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	22/05/2020	F4	CL	134 BIS	AC	134	AK	45	SEPARADOR	1 y 3	28		0,50	-
15	1003918	587843	SRC-05/PLAQUETA	45	45	42	20	INSTALAR	22/05/2020	PRIORIDAD PEATÓN	CL	134 BIS	AC	134	AK	45	NORTE	21	-		-	-
16	1003918	17801616	DCH	50	40	-	-	RETIRAR	22/05/2020		CL	134 BIS	AC	134	AK	45	SEPARADOR	-	-		-	30
16	1003918	183737	SRB-02	45	45	-	-	RETIRAR	22/05/2020		CL	134 BIS	AC	134	AK	45	NORTE	-	-		-	30
17	11012140	14482	SP-16	60	60	-	-	REEMPLAZAR	22/05/2020		AK	45	CL	134A	CL	135	SEPARADOR	5	-		-	30

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	PRECIO UNITARIO	CANT	PRECIO TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 180.893	0,99	$ 179.084
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo duplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 87.058	2	$ 174.116
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 163.915	1	$ 163.915
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cms, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 220.871	1	$ 220.871
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 40 x 50 cm, reflectivo prismático Tipo XI, amarillo limón fluorescente en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad.	UND	$ 145.724	9	$ 1.311.516
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente.(Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UND	$ 223.557	2	$ 447.114
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UND	$ 259.669	1	$ 259.669
28	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 31.404	2	$ 62.808
30	Retiro de Señales Verticales (lincluye pedestal y tablero) con entrega a almacen de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	$ 14.099	12	$ 169.188

RESIDENTE DE OBRA

Roberto Carlos Pérez P.

ING. ROBERTO CARLOS PEREZ

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Gabriel H. Torres R

ING. GABRIEL TORRES

OBSERVACIONES

SUBTOTAL		**$ 2.988.281**
ADMINISTRACIÓN	29,9%	$ 893.496,02
IMPREVISTOS	2,0%	$ 59.765,62
UTILIDAD	5,0%	$ 149.414,05
TOTAL		**$ 4.090.957**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

LOCALIDAD	11 - SUBA	**Fecha de Entrega**	2/06/2020
UPZ	25 - LA FLORESTA		
ID	EX_11_272_868_12_V2	**Cuenta**	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	CIV	INTERNO SENAL	CLASE SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	FECHA	CONTENIDO TABLERO	DIRECCION							ITEM		ITEM ANTIGRAF	CANT	RET/REU
											EJE		INICIO		FIN		COSTADO					
1	11010902	120581	SR-39	75	25	-	-	RETIRAR	1-jun		KR	70H	CL	116A	CL	117	SUR	-	-		-	30
2	11010902	275638	SR-38	75	25	-	-	RETIRAR	1-jun		KR	70H	CL	116A	CL	117	SUR	-	-		-	30
3	11010857	518249	SP-48	60	60	-	-	INSTALAR	21-may		KR	70H	CL	117	CL	117A	ORIENTAL	5	28		-	-
4	11010857	301124	SP-48/SR-30	60	60	60	60	RETIRAR	21-may	30	KR	70H	CL	117	CL	117A	ORIENTAL	-	-		-	30
5	11010857	518246	SP-25/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	21-may	30	KR	70H	CL	117	CL	117A	ORIENTAL	6	-		-	-
6	11010857	518250	SP-25/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	1-jun	30	KR	70H	CL	117	CL	117A	OCCIDENTAL	6	-		-	-
7	11010857	518248	SP-46A	60	60	-	-	INSTALAR	1-jun		KR	70H	CL	117	CL	117A	OCCIDENTAL	5	-		-	-
8	11010857	518247	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	1-jun	F4	KR	70H	CL	117	CL	117A	OCCIDENTAL	1 y 3	28		0,50	-
9	11010902	520963	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	20-may	30	KR	70H	CL	116A	CL	117	OCCIDENTAL	7	-		-	-
10	11010902	80884	SR-28	60	60	-	-	RETIRAR	21-may		KR	70H	CL	116A	CL	117	OCCIDENTAL	-	-		-	30
11	11010902	520964	SR-28/PLAQUETA	60	60	60	33	INSTALAR	20-may	EN ESTA CUADRA	KR	70H	CL	116A	CL	117	OCCIDENTAL	8	-		-	-
12	11010902	80885	SR-28	60	60	-	-	RETIRAR	21-may		KR	70H	CL	116A	CL	117	OCCIDENTAL	-	-		-	30
13	11010902	520965	SP-47B	75	75	37	37	INSTALAR	20-may	F4	KR	70H	CL	116A	CL	117	OCCIDENTAL	9	-		-	-
14	11010902	184137	SP-47	75	75	-	-	RETIRAR	1-jun		KR	70H	CL	116A	CL	117	ORIENTAL	-	-		-	30
15	11010902	518245	SP-47B	75	75	37	37	INSTALAR	20-may	F6	KR	70H	CL	116A	CL	117	ORIENTAL	9	-		-	-
16	11010805	301122	SP-48/SR-30	60	60	60	60	RETIRAR	1-jun	30	CL	117A	KR	70G	KR	70H	NORTE	-	-		-	30
17	11010874	518253	SP-46A	60	60	-	-	INSTALAR	21-may		CL	117	KR	70G	KR	70H	NORTE	5	-		-	-
18	11010874	518254	SP-25/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	21-may	30	CL	117	KR	70G	KR	70H	NORTE	6	-		-	-
19	11010874	120577	SR-39	75	25	-	-	RETIRAR	1-jun		CL	117	KR	70G	KR	70H	SUR	-	-		-	30
20	11010918	518256	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	20-may	30	CL	116A	KR	70G	KR	70H	NORTE	7	-		-	-
21	11010918	518258	SP-47B	75	75	37	37	INSTALAR	20-may	F4	CL	116A	KR	70G	KR	70H	NORTE	9	-		-	-
22	11010918	518255	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	20-may	30	CL	116A	KR	70G	KR	70H	SUR	7	-		-	-
23	11010918	301128	SP-47/SR-30	75	75	60	60	RETIRAR	21-may	30	CL	116A	KR	70G	KR	70H	SUR	-	-		-	30
24	11010918	518257	SP-47B	75	75	37	37	INSTALAR	20-may	F4	CL	116A	KR	70G	KR	70H	SUR	9	-		-	-
25	11010873	518252	SP-48	60	60	-	-	INSTALAR	20-may		KR	70G	CL	117	CL	117A	ORIENTAL	5	-		-	-
26	11010873	518251	SR-30	60	60	-	-	INSTALAR	1-jun		KR	70G	CL	117	CL	117A	ORIENTAL	5	-		-	-
27	11010917	518259	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	20-may	30	KR	70G	CL	116A	CL	117	OCCIDENTAL	7	-		-	-
28	11010917	301125	SP-47/SR-30	75	75	60	60	RETIRAR	21-may	30	KR	70G	CL	116A	CL	117	OCCIDENTAL	-	-		-	30
29	11010917	120585	SR-39	75	25	-	-	RETIRAR	1-jun		KR	70G	CL	116A	CL	117	OCCIDENTAL	-	-		-	30
30	11010875	120576	SR-39	75	25	-	-	RETIRAR	1-jun		CL	117	KR	70F	KR	70G	NORTE	-	-		-	30
31	11010875	120588	SR-39	75	25	-	-	RETIRAR	1-jun		CL	117	KR	70F	KR	70G	NORTE	-	-		-	30
32	11010875	518260	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	20-may	30	CL	117	KR	70F	KR	70G	SUR	6	-		-	-
33	11010875	120578	SR-39	75	25	-	-	RETIRAR	1-jun		CL	117	KR	70F	KR	70G	SUR	-	-		-	30
34	11010865	518261	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	1-jun	30	KR	70F	CL	117	CL	117A	OCCIDENTAL	6	-		-	-
35	11010864	518270	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	1-jun	F4	CL	117	KR	70D	KR	70F	NORTE	1 y 3	28		0,50	-
36	11010864	518272	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	21-may	30	CL	117	KR	70D	KR	70F	NORTE	6	-		-	-
37	11010864	518269	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	1-jun	F4	CL	117	KR	70D	KR	70F	SUR	1 y 3	28		0,50	-
38	11010864	518271	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	21-may	30	CL	117	KR	70D	KR	70F	SUR	7	-		-	-
39	11010864	120586	SP-46	60	60	-	-	RETIRAR	21-may		CL	117	KR	70D	KR	70F	SUR	-	-		-	30
40	11010864	120570	SR-39	75	25	-	-	RETIRAR	1-jun		CL	117	KR	70D	KR	70F	SUR	-	-		-	30
41	50008539	518263	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	21-may	30	CL	116A	KR	70D	KR	70G	NORTE	7	-		-	-
42	50008539	301126	SP-47/SR-30	75	75	60	60	RETIRAR	21-may	30	CL	116A	KR	70D	KR	70G	NORTE	-	-		-	30
43	50008539	120580	SR-39	75	25	-	-	RETIRAR	1-jun		CL	116A	KR	70D	KR	70G	SUR	-	-		-	30
44	50008539	518262	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	21-may	30	CL	116A	KR	70D	KR	70G	SUR	6	-		-	-
45	50008539	120574	SR-39	75	25	-	-	RETIRAR	1-jun		CL	116A	KR	70D	KR	70G	SUR	-	-		-	30
46	11010896	518276	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	21-may	30	KR	70D	CL	116A	CL	117	ORIENTAL	7	-		-	-
47	11010942	518268	SR-28	60	60	-	-	RETIRAR	21-may		KR	70D	AC	116	CL	116A	ORIENTAL	-	-		-	30
48	11010942	518265	SR-28/PLAQUETA	60	60	60	33	INSTALAR	21-may	EN ESTA CUADRA	KR	70D	AC	116	CL	116A	ORIENTAL	8	-		-	-
49	11010942	518264	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	21-may	30	KR	70D	AC	116	CL	116A	ORIENTAL	6	-		-	-
50	11010942	518266	SR-28/PLAQUETA	60	60	60	33	INSTALAR	21-may	EN ESTA CUADRA	KR	70D	AC	116	CL	116A	OCCIDENTAL	8	-		-	-

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

LOCALIDAD	11 - SUBA	**Fecha de Entrega**	2/06/2020
UPZ	25 - LA FLORESTA		
ID	EX_11_272_868_12_V2	**Cuenta**	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	CIV	INTERNO SENAL	CLASE SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	FECHA	CONTENIDO TABLERO	DIRECCION							ITEM		ITEM ANTIGRAF	CANT	RET/REU
											EJE		INICIO		FIN		COSTADO					
51	11010942	518267	SR-28	60	60	-	-	RETIRAR	21-may		KR	70D	AC	116	CL	116A	OCCIDENTAL	-	-		-	30
52	11010848	518279	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	21-may	30	CL	117	KR	70C BIS	KR	70D	NORTE	7	-		-	-
53	11010848	301115	SR-39	75	25	-	-	RETIRAR	1-jun		CL	117	KR	70C BIS	KR	70D	NORTE	-	-		-	30
54	11010786	518280	SR-11	60	60	-	-	INSTALAR	21-may		CL	117B	KR	70C	KR	70C BIS	NORTE	5	-		-	-
55	11010839	120579	SR-39	75	25	-	-	RETIRAR	1-jun		CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	SUR	-	-		-	30
56	11010839	184138	SR-30	60	60	-	-	REEMPLAZAR	1-jun		CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	SUR	5	-		-	30
57	11010839	301114	SP-47/SR-30	75	75	60	60	RETIRAR	1-jun	30	CL	117	KR	70C	KR	70C BIS	SUR	-	-		-	30
58	50008536	120571	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	1-jun		CL	116A	KR	70C	KR	70D	NORTE	5	-		-	30
59	50008536	301127	SR-39	75	25	-	-	RETIRAR	1-jun		CL	116A	KR	70C	KR	70D	NORTE	-	-		-	30
60	50008536	518277	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	21-may	30	CL	116A	KR	70C	KR	70D	NORTE	6	-		-	-
61	50008536	518278	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	21-may	30	CL	116A	KR	70C	KR	70D	SUR	7	-		-	-
62	50008536	80873	SR-01	60	60	-	-	REEMPLAZAR	1-jun		CL	116A	KR	70C	KR	70D	SUR	5	-		-	30
63	11010814	301117	SR-38	75	25	-	-	REEMPLAZAR	1-jun		KR	70C	CL	117	CL	117B	ORIENTAL	19	-		-	30
64	11010814	17757	SR-28	60	60	-	-	RETIRAR	21-may		KR	70C	CL	117	CL	117B	ORIENTAL	-	-		-	30
65	11010814	518281	SR-28/PLAQUETA	60	60	60	33	INSTALAR	21-may	EN ESTA CUADRA	KR	70C	CL	117	CL	117B	ORIENTAL	8	-		-	-
66	11010814	518282	SP-30	60	60	-	-	INSTALAR	1-jun		KR	70C	CL	117	CL	117B	OCCIDENTAL	5	-		-	-
67	11010914	80872	SR-38	75	25	-	-	REEMPLAZAR	1-jun		KR	70C	AC	116	CL	116A	ORIENTAL	19	-		-	30
68	11010914	518284	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	1-jun	30	KR	70C	AC	116	CL	116A	OCCIDENTAL	7	-		-	-
69	11010914	518285	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	1-jun	30	KR	70C	AC	116	CL	116A	ORIENTAL	7	-		-	-
70	11010914	518286	SP-47B	75	75	37	37	INSTALAR	21-may	F4	KR	70C	AC	116	CL	116A	ORIENTAL	9	-		-	-
71	11010862	518287	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	21-may	30	KR	70C	CL	116A	CL	117	OCCIDENTAL	7	-		-	-
72	11010862	518283	SP-47B	75	75	37	37	INSTALAR	21-may	F4	KR	70C	CL	116A	CL	117	OCCIDENTAL	9	-		-	-
73	11010849	518273	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	1-jun	30	KR	70D	CL	117	CL	117B	OCCIDENTAL	7	-		-	-
74	11010849	518274	SP-47B	75	75	37	37	INSTALAR	21-may	F4	KR	70D	CL	117	CL	117B	OCCIDENTAL	9	-		-	-
75	11010849	518275	SP-47B	75	75	37	37	INSTALAR	21-may	F4	KR	70D	CL	117	CL	117B	ORIENTAL	9	-		-	-
76	11010862	184139	SP-47/SR-30	75	75	60	60	RETIRAR	21-may	30	KR	70C	CL	116A	CL	117	OCCIDENTAL	-	-		-	30
78	11010849	301119	SP-01	60	60	-	-	REUBICAR	4-jun	30	KR	70D	CL	117	CL	117B	ORIENTAL	-	-		-	31

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	PRECIO UNITARIO	CANT	PRECIO TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 180.893	1,49	$ 269.531
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo duplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 87.058	3,00	$ 261.174
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 163.915	10,00	$ 1.639.150
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cms, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 220.871	9,00	$ 1.987.839
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cms ó Plaqueta, reflectivo Alta Intensidad Tipo Tipo XI amarillo limón fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 271.675	13,00	$ 3.531.775
8	Fabricación, suministro e instalación de señal SR - SP - SI de 60 cm con plaqueta (alto mínimo de 23 cm) reflectivo Alta intensidad Tipo IV O superior en lámina galvanizada C-16 y pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 184.322	4,00	$ 737.288
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 323.316	8,00	$ 2.586.528
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 136.525	2,00	$ 273.050
28	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 31.404	4,00	$ 125.616

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

LOCALIDAD	11 - SUBA	Fecha de Entrega	2/06/2020
UPZ	25 - LA FLORESTA		
ID	EX_11_272_868_12_V2	Cuenta	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	CIV	INTERNO SENAL	CLASE SENAL	TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	ACCION	FECHA	CONTENIDO TABLERO	DIRECCION				ITEM		ITEM ANTIGRAF	CANT	RET/REU
									EJE	INICIO	FIN	COSTADO					
	30	Retiro de Señales Verticales (Iincluye pedestal y tablero) con entrega a almacen de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)											UND	$	14.099	32,00	$ 451.168
	31	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)											UND	$	53.080	1,00	$ 53.080

RESIDENTE DE OBRA

Roberto Carlos Pérez P.

ING. ROBERTO CARLOS PEREZ

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Gabriel H. Torres R

ING. GABRIEL TORRES

OBSERVACIONES

SUBTOTAL		**$ 11.916.199**
ADMINISTRACIÓN	29,9%	$ 3.562.944
IMPREVISTOS	2,0%	$ 238.324
UTILIDAD	5,0%	$ 595.810
TOTAL		**$ 16.313.276**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de Entrega**	27/05/2020
UPZ	15 - CONTRY CLUB		
ID	MV_01_306_1236_11_V6	**Cuenta**	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	CIV	INTERNO SENAL	CLASE SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	FECHA	CONTENIDO TABLERO	DIRECCION							ITEM		ITEM ANTIGRAF	CANT	RET/REU
											EJE		INICIO		FIN		COSTADO					
1	30001190	536664	SP-31	60	60	-	-	INSTALAR	22/05/2020		AK	19	CL	127 BIS	CL	127A	ORIENTAL	5	-		-	-
2	50007457	38208	SI-11	60	60	-	-	RETIRAR	22/05/2020		AK	19	CL	127A	CL	127B	ORIENTAL	-	-		-	30
3	50007457	38209	SI-11	60	60	-	-	RETIRAR	22/05/2020		AK	19	CL	127A	CL	127B	SEPARADOR	-	-		-	30
4	50007457	473459	SP-59	60	60	-	-	INSTALAR	22/05/2020		AK	19	CL	127A	CL	127B	SEPARADOR	5	-		-	-
5	50007457	536663	SRB-07	45	45	-	-	INSTALAR	22/05/2020		AK	19	CL	127A	CL	127B	SEPARADOR	20	-		-	-
6	50007457	318548	SR-23	60	60	-	-	RETIRAR	22/05/2020		AK	19	CL	127A	CL	127B	SEPARADOR	-	-		-	30
7	50007456	318549	SR-23	60	60	-	-	REEMPLAZAR	22/05/2020		AK	19	CL	127B	CL	127B	ORIENTAL	5	-		-	30
8	50007456	315732	SRC-02	45	45	-	-	RETIRAR	22/05/2020		AK	19	CL	127B	CL	127B	ORIENTAL	-	-		-	30
9	50007456	536662	PEDESTAL	-	-	-	-	RETIRAR	22/05/2020		AK	19	CL	127B	CL	127B	ORIENTAL	-	-		-	30
10	50007456	536661	SRC-01/SRB-07	45	45	45	45	INSTALAR	22/05/2020		AK	19	CL	127B	CL	127B	ORIENTAL	21	-		-	-
11	30001189	536660	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	22/05/2020		AK	19	CL	127B	CL	127B BIS	ORIENTAL	1 y 3	28		0,50	-
12	30001189	536801	SRC-01/SBP-46A	45	45	45	45	INSTALAR	22/05/2020		AK	19	CL	127B	CL	127B BIS	ORIENTAL	21	-		-	-
13	30001189	536800	SP-46A	60	60	-	-	INSTALAR	22/05/2020		AK	19	CL	127B	CL	127B BIS	ORIENTAL	5	-		-	-
14	50007446	536798	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	22/05/2020		AK	19	CL	127B BIS	CL	127C	ORIENTAL	1 y 3	28		0,50	-
15	50007446	536796	SPC-01/SPB-46A	45	45	45	45	INSTALAR	22/05/2020		AK	19	CL	127B BIS	CL	127C	ORIENTAL	21	-		-	-
16	50007445	597348	SRB-01	45	45	-	-	INSTALAR	22/05/2020		AK	19	CL	127C	CL	127D	ORIENTAL	20	-		-	-
17	50007445	299360	SRB-01	45	45	-	-	RETIRAR	22/05/2020		AK	19	CL	127C	CL	127D	ORIENTAL	-	-		-	30
18	50007445	536794	SRB-02	45	45	-	-	INSTALAR	22/05/2020		AK	19	CL	127C	CL	127D	ORIENTAL	20	-		-	-
19	50007445	299360	SRB-01	45	45	-	-	INSTALAR	22/05/2020		AK	19	CL	127C	CL	127D	ORIENTAL	20	-		-	-
20	50007445	299359	SRC-02	45	45	-	-	RETIRAR	22/05/2020		AK	19	CL	127C	CL	127D	ORIENTAL	-	-		-	30
21	50007445	536790	SPC-01/SRB-02	45	45	45	45	INSTALAR	22/05/2020		AK	19	CL	127C	CL	127D	ORIENTAL	21	-		-	-
22	50007445	473472	SI-27	70	50	-	-	INSTALAR	22/05/2020	PRIORIDAD CICLISTAS	AK	19	CL	127C	CL	127D	ORIENTAL	1 y 2	28		0,35	-
23	50007445	473473	SPC-01	45	45	-	-	RETIRAR	22/05/2020		AK	19	CL	127C	CL	127D	ORIENTAL	-	-		-	30
24	50007445	496005	SPC-01	45	45	-	-	INSTALAR	22/05/2020		AK	19	CL	127C	CL	127D	ORIENTAL	20	-		-	-
25	30001194	536786	SRB-02	45	45	-	-	INSTALAR	22/05/2020		AK	19	CL	127D	CL	128	ORIENTAL	20	-		-	-
26	30001194	536785	SI-27	70	50	-	-	INSTALAR	22/05/2020	PRIORIDAD CILCISTAS	AK	19	CL	127D	CL	128	ORIENTAL	1 y 2	28		0,35	-
27	30001194	473480	SPC-01/SPC-01	45	45	45	45	REEMPLAZAR	22/05/2020		AK	19	CL	127D	CL	128	ORIENTAL	21	-		-	30
28	1004207	536779	SPC-01/SRB-07	45	45	45	45	INSTALAR	22/05/2020		AK	19	CL	128	CL	128A	ORIENTAL	21	-		-	-
29	1004207	2411	SPC-01	45	45	-	-	RETIRAR	22/05/2020		AK	19	CL	128	CL	128A	ORIENTAL	-	-		-	30
30	1004207	473492	SI-27	70	50	-	-	INSTALAR	22/05/2020	PRIORIDAD CICLISTAS	AK	19	CL	128	CL	128A	ORIENTAL	1 y 2	28		0,35	-
31	1004207	536781	SP-35	60	60	-	-	INSTALAR	22/05/2020		AK	19	CL	128	CL	128A	SEPARADOR	5	-		-	-

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	PRECIO UNITARIO	CANT	PRECIO TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 180.893	2,04	$ 369.022
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 64.185	3,00	$ 192.555

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de Entrega**	27/05/2020
UPZ	15 - CONTRY CLUB		
ID	MV_01_306_1236_11_V6	**Cuenta**	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	CIV	INTERNO SENAL	CLASE SENAL	TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	ACCION	FECHA	CONTENIDO TABLERO	DIRECCION				ITEM		ITEM ANTIGRAF	CANT	RET/REU
									EJE	INICIO	FIN	COSTADO					
	3	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo duplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.											UND	$ 87.058	2,00	$ 174.116
	5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.											UND	$ 163.915	5,00	$ 819.575
	20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente.(Incluye la cimentación del soporte para la señal)											UND	$ 223.557	6,00	$ 1.341.342
	21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)											UND	$ 259.669	6,00	$ 1.558.014
	28	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.											UND	$ 31.404	5,00	$ 157.020
	30	Retiro de Señales Verticales (lincluye pedestal y tablero) con entrega a almacen de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)											UND	$ 14.099	11,00	$ 155.089

RESIDENTE DE OBRA

Roberto Carlos Pérez P.

ING. ROBERTO CARLOS PEREZ

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES

SUBTOTAL		**$ 4.766.733**
ADMINISTRACIÓN	29,9%	$ 1.425.253,17
IMPREVISTOS	2,0%	$ 95.334,66
UTILIDAD	5,0%	$ 238.336,65
TOTAL		**$ 6.525.657**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	Fecha de entrega	4/06/2020
UPZ	13 - TOBERÍN		
ID	EX_01_358_1842_12_V1	Cuenta	7

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
1	5/05/2020	1002830	1513698	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	ml	0,12	72,8	1	72,8	72,80	A	B	B	A	21
2	5/05/2020	1002830	1513707	LIC	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	ml	0,2	1	5	5	5,00	A	B	B	A	21
3	5/05/2020	1002830	1513708	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	ml	0,12	151,2	1	151,2	151,20	A	B	B	A	21
4	1/05/2020	1002830	1513704	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	B	A	21
5	1/05/2020	1002830	1513706	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	155	AK	9	KR	13	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	B	A	21
6	1/05/2020	1002830	1513711	FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	B	B	A	21
7	1/05/2020	1002830	1513715	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	m2	0,4	4	7	11,2	14,35	A	B	B	A	21
8	1/05/2020	1002830	1514608	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	B	A	21
9	1/05/2020	1002830	1513726	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	155	AK	9	KR	13	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	B	A	21
10	10/05/2020	1002830	1513727	EP				Metálico		CL	155	AK	9	KR	13	Und	°	°	24	◦	◦	A	B	B	A	13
11	1/05/2020	1002830	417194	FDD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	m2	°	°	°	2,2	3,00	A	B	B	A	21
12	10/05/2020	1002830	1513729	EP				Metálico		CL	155	AK	9	KR	13	Und	°	°	24	◦	◦	A	B	B	A	13
13	5/05/2020	1002830	1513700	LCM	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	CL	155	AK	9	KR	13	ml	0,12	240,2	1	240,2	240,20	A	B	B	A	21
14	10/05/2020	1002830	1513710	TR				Plástico	Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	Und	°	°	20	◦	◦	A	B	B	A	9
15	5/05/2020	1002830	1513712	LA	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	CL	155	AK	9	KR	13	ml	0,2	23,4	1	23,4	23,40	A	B	B	A	21
16	1/05/2020	1002830	1513716	ACH	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	155	AK	9	KR	13	m2	1	3	1	3	3,41	A	B	B	A	21
17	10/05/2020	1002830	1513719	TCH				Plástico	Amarillo	CL	155	AK	9	KR	13	Und	°	°	27	◦	◦	A	B	B	A	10
18	10/05/2020	1002830	1513717	BL					Amarillo	CL	155	AK	9	KR	13	Und	°	°	4	◦	◦	A	B	B	A	10
19	10/05/2020	1002830	17801737	TR				Plástico	Amarillo	CL	155	AK	9	KR	13	Und	°	°	24	◦	◦	A	B	B	A	9
20	5/05/2020	1002830	17801738	LA	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	CL	155	AK	9	KR	13	ml	0,2	184	1	184	184,00	A	B	B	A	21
21	1/05/2020	1002830	17801739	ACH	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	155	AK	9	KR	13	m2	1	28,3	1	28,3	31,24	A	B	B	A	21
22	10/05/2020	1002830	17801740	TCH				Plástico	Amarillo	CL	155	AK	9	KR	13	Und	°	°	257	◦	◦	A	B	B	A	10
23	10/05/2020	1002830	17801741	BL					Amarillo	CL	155	AK	9	KR	13	Und	°	°	5	◦	◦	A	B	B	A	10
24	10/05/2020	1002830	1513718	TR				Plástico	Amarillo	CL	155	AK	9	KR	13	Und	°	°	184	◦	◦	A	B	B	A	9
25	1/05/2020	1002830	1513709	PAB	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	m2	0,25	21,6	1	5,4	7,60	A	B	B	A	21
26	10/05/2020	1002830	1513721	EP				Metálico		CL	155	AK	9	KR	13	Und	°	°	24	◦	◦	A	B	B	A	13
27	10/05/2020	1002830	1513723	EP				Metálico		CL	155	AK	9	KR	13	Und	°	°	24	◦	◦	A	B	B	A	13
28	1/05/2020	1002830	1513724	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	155	AK	9	KR	13	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	B	A	21

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	01 - USAQUEN													Fecha de entrega	4/06/2020										
UPZ	13 - TOBERÍN																								
ID	EX_01_358_1842_12_V1													Cuenta	7										

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
29	1/05/2020	1002830	1513725	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	B	A	21
30	1/05/2020	1002830	418255	FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	B	B	A	21
31	5/05/2020	1002830	1513699	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	ml	0,12	33,2	1	33,2	33,20	A	B	B	A	21
32	5/05/2020	1002830	1513701	LIC	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	ml	0,2	1	4	4	4,00	A	B	B	A	21
33	5/05/2020	1002830	1513702	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	ml	0,12	58,3	1	58,3	58,30	A	B	B	A	21
34	5/05/2020	1002830	1513703	LIC	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	ml	0,2	1	8	8	8,00	A	B	B	A	21
35	5/05/2020	1002830	1513705	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	ml	0,12	90,9	1	90,9	90,90	A	B	B	A	21
36	1/05/2020	1002830	1513731	PP	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	m2	0,4	4	7	11,2	14,35	A	B	B	A	21
37	1/05/2020	1002830	1513732	ZBC	A. Base Solv			Agregado Pétreo	Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	m2	0,3	35,2	1	10,56	14,12	A	B	B	A	11
38	1/05/2020	1002830	1513732	ZBC	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	CL	155	AK	9	KR	13	m2	0,3	114,1	1	34,23	45,68	A	B	B	A	21
39	1/05/2020	1002697	1513733	ZBC	A. Base Solv			Agregado Pétreo	Blanco	CL	155	KR	13	KR	13A	m2	0,3	32,8	1	9,84	13,16	A	B	B	A	11
40	1/05/2020	1002697	1513733	ZBC	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	13	KR	13A	m2	0,3	144,6	1	43,38	57,88	A	B	B	A	21
41	29/04/2020	1002697	581386	SPT			Borrado			CL	155	KR	13	KR	13A	m2	°	°	6,6	°	°					
42	2/05/2020	1002697	1513668	PP	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	13	KR	13A	m2	0,4	4	7	11,2	14,35	A	B	B	A	21
43	5/05/2020	1002697	1513669	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	KR	13	KR	13A	ml	0,12	148,2	1	148,2	148,20	A	B	B	A	21
44	2/05/2020	1002697	417129	FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	13	KR	13A	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	B	B	A	21
45	5/05/2020	1002697	1514100	LA	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	CL	155	KR	13	KR	13A	ml	0,2	246,2	1	246,2	246,20	A	B	B	A	21
46	10/05/2020	1002697	1514101	TCH				Plástico	Amarillo	CL	155	KR	13	KR	13A	Und	°	°	346	◦	◦	A	B	B	A	10
47	10/05/2020	1002697	17801742	BL					Amarillo	CL	155	KR	13	KR	13A	Und	°	°	6	◦	◦	A	B	B	A	10
48	10/05/2020	1002697	1514099	TR				Plástico	Amarillo	CL	155	KR	13	KR	13A	Und	°	°	242	◦	◦	A	B	B	A	9
49	10/05/2020	1002697	1513673	EP				Metálico		CL	155	KR	13	KR	13A	Und	°	°	24	◦	◦	A	B	B	A	13
50	2/05/2020	1002697	417130	FDD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	13	KR	13A	m2	°	°	°	2,2	3,00	A	B	B	A	21
51	10/05/2020	1002697	1513674	EP				Metálico		CL	155	KR	13	KR	13A	Und	°	°	22	◦	◦	A	B	B	A	13
52	2/05/2020	1002697	1513675	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	155	KR	13	KR	13A	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	B	A	21
53	2/05/2020	1002697	1513676	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	13	KR	13A	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	B	A	21
54	5/05/2020	1002697	1513670	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	KR	13	KR	13A	ml	0,12	126,4	1	126,4	126,40	A	B	B	A	21
55	2/05/2020	1002674	1513677	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	B	A	21
56	10/05/2020	1002674	1513678	EP				Metálico		CL	155	KR	13A	KR	14 BIS	Und	°	°	22	◦	◦	A	B	B	A	13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	01 - USAQUEN									**Fecha de entrega**	4/06/2020															
UPZ	13 - TOBERÍN									**Cuenta**	7															
ID	EX_01_358_1842_12_V1																									
No	**Fecha**	**CIV**	**Interno**	**CLASE MARCA**	**Propiedad**					**DIRECCIÓN**							**CANTIDADES**						**GARANTIAS**				
					Imprimante	**Pintura**	**Borrado/ Retiro**	**Material**	**COLOR**	**EJE**		**INICIA**		**TERMINA**			**UND**	**ANCHO**	**LONG**	**CANT**	**PNT**	**IMP**	**TPD**	**CONT**	**EST. PAV**	**AFECT**	**GARANTIA (MESES)**
57	2/05/2020	1002674	1513679	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	B	A	21
58	10/05/2020	1002674	1513680	EP				Metálico		CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		Und	°	°	22	◦	◦	A	B	B	A	13
59	10/05/2020	1002674	1513681	EP				Metálico		CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		Und	°	°	22	◦	◦	A	B	B	A	13
60	10/05/2020	1002674	1513682	EP				Metálico		CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		Und	°	°	22	◦	◦	A	B	B	A	13
61	2/05/2020	1002674	1513683	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		m2	0,4	4	6	9,6	12,30	A	B	B	A	21
62	5/05/2020	1002674	17801743	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		ml	0,12	102,9	1	102,9	102,90	A	B	B	A	21
63	2/05/2020	1002674	1514089	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	B	A	21
64	5/05/2020	1002674	1514096	LA	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		ml	0,2	51,2	1	51,2	51,20	A	B	B	A	21
65	11/05/2020	1002674	1514098	TR				Plástico E	Blanco	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		Und	°	°	52	◦	◦	A	B	B	A	9
66	2/05/2020	1002674	1514091	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	B	A	21
67	29/04/2020	1002674	17801744	LA			Borrado			CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		m2	°	°	2	°	°					
68	29/04/2020	1002674	17801745	ACH			Borrado			CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		m2	°	°	2	°	°					
69	6/05/2020	1002674	17801746	LA	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		ml	0,2	220,1	1	220,1	220,14	A	B	B	A	21
70	11/05/2020	1002674	17801747	TCH				Plástico	Amarillo	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		Und	°	°	197	◦	◦	A	B	B	A	10
71	11/05/2020	1002674	1514097	BL					Amarillo	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		Und	°	°	13	◦	◦	A	B	B	A	10
72	11/05/2020	1002674	17801748	TR				Plástico	Amarillo	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		Und	°	°	172	◦	◦	A	B	B	A	9
73	11/05/2020	1002674	1514084	EP				Metálico		CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		Und	°	°	22	◦	◦	A	B	B	A	13
74	11/05/2020	1002674	1514085	EP				Metálico		CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		Und	°	°	24	◦	◦	A	B	B	A	13
75	11/05/2020	1002674	1514086	EP				Metálico		CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		Und	°	°	22	◦	◦	A	B	B	A	13
76	2/05/2020	1002674	1514087	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	B	A	21
77	11/05/2020	1002674	1514088	EP				Metálico		CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		Und	°	°	24	◦	◦	A	B	B	A	13
78	2/05/2020	1002674	1514090	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	B	A	21
79	6/05/2020	1002674	17801749	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		ml	0,12	96,5	1	96,5	96,50	A	B	B	A	21
80	11/05/2020	1002674	1514602	TCH				Plástico	Amarillo	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		Und	°	°	15	◦	◦	A	B	B	A	10
81	11/05/2020	1002674	1514129	BL					Amarillo	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		Und	°	°	5	◦	◦	A	B	B	A	10
82	11/05/2020	1002674	1514106	TCH				Plástico	Amarillo	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		Und	°	°	10	◦	◦	A	B	B	A	10
83	11/05/2020	1002674	1514104	BL					Amarillo	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		Und	°	°	3	◦	◦	A	B	B	A	10
84	2/05/2020	1002674	1513744	ZBC	A. Base Solv			Agregado Pétreo	Blanco	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS		m2	0,3	39,7	1	11,91	15,92	A	B	B	A	11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	01 - USAQUEN													Fecha de entrega	4/06/2020											
UPZ	13 - TOBERÍN																									
ID	EX_01_358_1842_12_V1													Cuenta	7											
No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN							CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
85	2/05/2020	1002674	1513744	ZBC	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	13A	KR	14 BIS	m2	0,3	377,8	1	113,3	151,16	A	B	B	A	21
86	2/05/2020	1002579	1513745	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	0,4	4	6	9,6	12,30	A	M	R	M	12
87	2/05/2020	1002579	17801750	FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	M	R	M	12
88	29/04/2020	1002579	1513747	FF			Borrado			CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	1,2	°	°					
89	2/05/2020	1002579	1513749	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	M	R	M	12
90	11/05/2020	1002579	1513751	EP				Metálico		CL	155	KR	14 BIS	AK	15	Und	°	°	45	◦	◦	A	M	R	M	8
91	2/05/2020	1002579	1513752	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	M	R	M	12
92	11/05/2020	1002579	1513757	EP				Metálico		CL	155	KR	14 BIS	AK	15	Und	°	°	44	◦	◦	A	M	R	M	8
93	2/05/2020	1002579	1513758	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	0,4	4	6	9,6	12,30	A	M	R	M	12
94	2/05/2020	1002579	1514125	RCI	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	4,2	4,95	A	M	R	M	12
95	2/05/2020	1002579	17801751	RCI	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	4,2	4,95	A	M	R	M	12
96	3/05/2020	1002579	17801752	RCI	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	4,2	4,95	A	M	R	M	12
97	6/05/2020	1002579	1513767	LA	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	ml	0,2	27,3	1	27,3	27,30	A	M	R	M	12
98	3/05/2020	1002579	1514108	ACH	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	1	4,22	1	4,22	4,75	A	M	R	M	12
99	6/05/2020	1002579	1519884	LCN	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	ml	0,15	26,9	1	26,9	26,90	A	M	R	M	12
100	11/05/2020	1002579	1513754	TR				Plástico	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	Und	°	°	26	◦	◦	A	M	R	M	8
101	6/05/2020	1002579	1514109	LIC	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	ml	0,2	1	22	22	22,00	A	M	R	M	12
102	3/05/2020	1002579	17801753	FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	M	R	M	12
103	29/04/2020	1002579	1513748	FF			Borrado			CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	1,2	°	°					
104	3/05/2020	1002579	1513750	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	M	R	M	12
105	3/05/2020	1002579	1513759	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	M	R	M	12
106	3/05/2020	1002579	1513761	PSP47A	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	5,8	6,30	A	M	R	M	12
107	3/05/2020	1002579	1513762	PZE	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	6,06	18,75	A	M	R	M	12
108	3/05/2020	1002579	1513746	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	0,4	4	10,65	17,04	21,83	A	M	R	M	12
109	29/04/2020	1002579	1513684	FF			Borrado			CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	1,2	°	°					
110	3/05/2020	1002579	280125	FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	M	R	M	12
111	3/05/2020	1002579	1513779	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	M	R	M	12
112	3/05/2020	1002579	1513777	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	M	R	M	12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de entrega**	4/06/2020
UPZ	13 - TOBERÍN		
ID	EX_01_358_1842_12_V1	**Cuenta**	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
113	3/05/2020	1002579	17801754	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	0,4	4	6	9,6	12,30	A	M	R	M	12
114	11/05/2020	1002579	1514611	EP				Metálico		CL	155	KR	14 BIS	AK	15	Und	°	°	44	◦	◦	A	M	R	M	8
115	3/05/2020	1002579	1513773	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	M	R	M	12
116	11/05/2020	1002579	1513772	EP				Metálico		CL	155	KR	14 BIS	AK	15	Und	°	°	44	◦	◦	A	M	R	M	8
117	3/05/2020	1002579	1513770	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	M	R	M	12
118	6/05/2020	1002579	1514120	LA	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	ml	0,2	77,6	1	77,6	77,60	A	M	R	M	12
119	3/05/2020	1002579	1514121	ACH	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	1	4,74	1	4,74	5,32	A	M	R	M	6
120	11/05/2020	1002579	1514610	TCH				Plástico	Amarillo	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	Und	°	°	50	◦	◦	A	M	R	M	8
121	11/05/2020	1002579	1513786	BL					Amarillo	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	Und	°	°	2	◦	◦	A	M	R	M	8
122	11/05/2020	1002579	1514122	TR				Plástico E	Amarillo	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	Und	°	°	81	◦	◦	A	M	R	M	8
123	6/05/2020	1002579	1514117	LCN	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	ml	0,15	26,9	1	26,9	26,90	A	M	R	M	12
124	11/05/2020	1002579	1513775	TR				Plástico	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	Und	°	°	27	◦	◦	A	M	R	M	8
125	6/05/2020	1002579	1514114	LIC	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	ml	0,2	1	21	21	21,00	A	M	R	M	12
126	29/04/2020	1002579	1513685	FDD			Borrado			CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	2,2	°	°					
127	3/05/2020	1002579	1513782	FGD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	1,5	2,20	A	M	R	M	12
128	3/05/2020	1002579	1513780	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	M	R	M	12
129	3/05/2020	1002579	1513778	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	M	R	M	12
130	3/05/2020	1002579	1513774	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	M	R	M	12
131	3/05/2020	1002579	1513771	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	M	R	M	12
132	6/05/2020	1002579	1514113	LA	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	ml	0,2	39	1	39	39,00	A	M	R	M	12
133	25/05/2020	1002579	1514115	TR				Plástico	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	Und	°	°	40	◦	◦	A	M	R	M	8
134	6/05/2020	1002749	1514588	LA	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	KR	14BIS	CL	153	CL	155	ml	0,2	26,7	1	26,7	26,70	A	M	R	A	11
135	3/05/2020	1002749	1514590	ACH	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	14BIS	CL	153	CL	155	m2	1	10,2	1	10,2	11,33	A	M	R	A	6
136	25/05/2020	1002749	1514604	TCH				Plástico	Amarillo	KR	14BIS	CL	153	CL	155	Und	°	°	37	◦	◦	A	M	R	A	6
137	25/05/2020	1002749	1514589	BL					Amarillo	KR	14BIS	CL	153	CL	155	Und	°	°	4	◦	◦	A	M	R	A	6
138	25/05/2020	1002749	1514603	TR				Plástico E	Blanco	KR	14BIS	CL	153	CL	155	Und	°	°	29	◦	◦	A	M	R	A	8
139	6/05/2020	1002749	17801755	LA	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	KR	14BIS	CL	153	CL	155	ml	0,2	26,6	1	26,6	26,60	A	M	R	A	11
140	3/05/2020	1002749	17801756	ACH	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	#N/A	KR	14BIS	CL	153	CL	155	m2	1	11,4	1	11,4	12,65	A	M	R	A	6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	01 - USAQUEN									**Fecha de entrega**	4/06/2020															
UPZ	13 - TOBERÍN																									
ID	EX_01_358_1842_12_V1									**Cuenta**	7															
No	**Fecha**	**CIV**	**Interno**	**CLASE MARCA**	**Propiedad**					**DIRECCIÓN**							**CANTIDADES**						**GARANTIAS**				
					Imprimante	**Pintura**	**Borrado/ Retiro**	**Material**	**COLOR**	**EJE**		**INICIA**		**TERMINA**			**UND**	**ANCHO**	**LONG**	**CANT**	**PNT**	**IMP**	**TPD**	**CONT**	**EST. PAV**	**AFECT**	**GARANTIA (MESES)**
141	25/05/2020	1002749	17801757	TCH				Plástico	Amarillo	KR	14BIS	CL	153	CL	155		Und	°	°	43	◦	◦	A	M	R	A	6
142	25/05/2020	1002749	17801758	BL					Amarillo	KR	14BIS	CL	153	CL	155		Und	°	°	5	◦	◦	A	M	R	A	6
143	25/05/2020	1002749	17801759	TR				Plástico E	Blanco	KR	14BIS	CL	153	CL	155		Und	°	°	28	◦	◦	A	M	R	A	8
144	3/05/2020	1002749	417096	FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	14BIS	CL	153	CL	155		m2	°	°	°	1,2	1,80	A	M	R	A	11
145	3/05/2020	1002725	1513877	PP	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	KR	13	CL	155	CL	157		m2	0,4	3	3,53	4,24	5,47	A	B	M	M	12
146	3/05/2020	1002725	417137	LP	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	13	CL	155	CL	157		m2	0,6	4,3	1	2,58	3,08	A	B	M	M	6
147	3/05/2020	1002725	1513875	PPARE	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	13	CL	155	CL	157		m2	°	°	°	1,67	6,75	A	B	M	M	6
148	3/05/2020	1002725	747890	FDG	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	13	CL	155	CL	157		m2	°	°	°	2,5	3,50	A	B	M	M	6
149	3/05/2020	1002725	1513871	PCP	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Amarillo	KR	13	CL	155	CL	157		m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	M	M	6
150	5/05/2020	1002570	1513802	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	13B	CL	155	CL	157		m2	0,4	4	8	12,8	16,40					
151	5/05/2020	1002538	1513816	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	14	CL	155	CL	157		m2	0,4	4	8	12,8	16,40	M	M	R	M	18
152	29/04/2020	1002578	280122	SPT			Borrado			KR	14 BIS	CL	155	CL	157		m2	°	°	10,5	°	°					
153	5/05/2020	1002578	1513743	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	14 BIS	CL	155	CL	157		m2	0,4	4	11,65	18,64	23,88	M	M	R	M	18
154	6/05/2020	1002578	580424	LB	A. Base Solv	A. Base Solv			Blanco	KR	14 BIS	CL	155	CL	157		ml	0,12	105,7	1	105,7	105,70	M	M	R	M	7
155	5/05/2020	1002578	1513736	VMP	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	14 BIS	CL	155	CL	157		m2	°	°	°	3,36	8,09	M	M	R	M	7
156	5/05/2020	1002578	1513734	PCP	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Amarillo	KR	14 BIS	CL	155	CL	157		m2	°	°	°	4,18	4,66	M	M	R	M	7
157	25/05/2020	1002578	1513833	EP				Metálico		KR	14 BIS	CL	155	CL	157		Und	°	°	56	◦	◦	M	M	R	M	17
158	5/05/2020	1002578	1513831	FDG	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	14 BIS	CL	155	CL	157		m2	°	°	°	2,5	3,50	M	M	R	M	7
159	25/05/2020	1002578	1513829	EP				Metálico		KR	14 BIS	CL	155	CL	157		Und	°	°	56	◦	◦	M	M	R	M	17
160	5/05/2020	1002578	1513828	PPARE	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	14 BIS	CL	155	CL	157		m2	°	°	°	1,67	6,75	M	M	R	M	7
161	29/04/2020	1002578	580421	FDG			Borrado			KR	14 BIS	CL	155	CL	157		m2	°	°	2,5	°	°					
162	5/05/2020	1002578	580420	LP	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	14 BIS	CL	155	CL	157		m2	0,6	6	1	3,6	4,27	M	M	R	M	7
163	6/05/2020	1002578	1514102	LA	A. Base Solv	A. Base Solv			Amarillo	KR	14 BIS	CL	155	CL	157		ml	0,2	70,9	1	70,9	70,90	M	M	R	M	7
164	6/05/2020	1002578	580423	LCM	A. Base Solv	A. Base Solv			Amarillo	KR	14 BIS	CL	155	CL	157		ml	0,12	139,6	1	139,6	139,60	M	M	R	M	7
165	5/05/2020	1002578	280154	LP	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	14 BIS	CL	155	CL	157		m2	0,6	3,8	1	2,28	2,73	M	M	R	M	7
166	5/05/2020	1002578	1513742	PPARE	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	14 BIS	CL	155	CL	157		m2	°	°	°	1,67	6,75	M	M	R	M	7
167	25/05/2020	1002578	1513741	EP				Metálico		KR	14 BIS	CL	155	CL	157		Und	°	°	18	◦	◦	M	M	R	M	17
168	25/05/2020	1002578	1513740	EP				Metálico		KR	14 BIS	CL	155	CL	157		Und	°	°	18	◦	◦	M	M	R	M	17

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	01 - USAQUEN									**Fecha de entrega**	4/06/2020															
UPZ	13 - TOBERÍN																									
ID	EX_01_358_1842_12_V1									**Cuenta**	7															
No	**Fecha**	**CIV**	**Interno**	**CLASE MARCA**	**Propiedad**					**DIRECCIÓN**						**CANTIDADES**						**GARANTIAS**				
					Imprimante	**Pintura**	**Borrado/ Retiro**	**Material**	**COLOR**	**EJE**		**INICIA**		**TERMINA**		**UND**	**ANCHO**	**LONG**	**CANT**	**PNT**	**IMP**	**TPD**	**CONT**	**EST. PAV**	**AFECT**	**GARANTIA (MESES)**
169	25/05/2020	1002578	1513739	EP				Metálico		KR	14 BIS	CL	155	CL	157	Und	°	°	20	◦	◦	M	M	R	M	17
170	28/05/2020	1002578	1513738	EP				Metálico		KR	14 BIS	CL	155	CL	157	Und	°	°	24	◦	◦	M	M	R	M	17
171	5/05/2020	1002578	1513735	VMP	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	14 BIS	CL	155	CL	157	m2	°	°	°	3,36	8,09	M	M	R	M	7
172	5/05/2020	1002578	1513830	FF	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	14 BIS	CL	155	CL	157	m2	°	°	°	1,2	1,80	M	M	R	M	7
173	29/04/2020	1002578	580422	FF			Borrado			KR	14 BIS	CL	155	CL	157	m2	°	°	1,2	°	°					
174	6/05/2020	1002578	580397	LB	A. Base Solv	A. Base Solv			Blanco	KR	14 BIS	CL	155	CL	157	ml	0,12	102,7	1	102,7	102,70	M	M	R	M	7
175	29/04/2020	1002578	580419	SPT			Borrado			KR	14 BIS	CL	155	CL	157	m2	°	°	11,4	°	°					
176	5/05/2020	1002578	1513826	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	14 BIS	CL	155	CL	157	m2	0,4	4	12	19,2	24,60	M	M	R	M	18
177	5/05/2020	1002529	1513865	ZBC	A. Base Solv			Agregado Pétreo	Blanco	CL	157	KR	13	KR	13A	m2	0,3	38,6	1	11,58	15,48	A	B	R	A	9
178	5/05/2020	1002529	1513865	ZBC	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	13	KR	13A	m2	0,3	162	1	48,6	64,84	A	B	R	A	15
179	29/04/2020	1002529	580999	SPT			Borrado			CL	157	KR	13	KR	13A	m2	°	°	8,4	°	°					
180	5/05/2020	1002529	1513878	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	13	KR	13A	m2	0,4	4	9,23	14,77	18,92	A	B	R	A	15
181	6/05/2020	1002529	581474	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	157	KR	13	KR	13A	ml	0,12	145,4	1	145,4	145,40	A	B	R	A	15
182	28/05/2020	1002529	1513879	EP				Metálico		CL	157	KR	13	KR	13A	Und	°	°	58	◦	◦	A	B	R	A	8
183	5/05/2020	1002529	1513881	FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	13	KR	13A	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	B	R	A	15
184	28/05/2020	1002529	1513882	EP				Metálico		CL	157	KR	13	KR	13A	Und	°	°	58	◦	◦	A	B	R	A	8
185	5/05/2020	1002529	580997	FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	13	KR	13A	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	B	R	A	15
186	6/05/2020	1002529	580996	LCM	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	CL	157	KR	13	KR	13A	ml	0,12	151,4	1	151,4	151,40	A	B	R	A	15
187	28/05/2020	1002529	17801760	TR				Plástico	Amarillo	CL	157	KR	13	KR	13A	Und	°	°	20	◦	◦	A	B	R	A	10
188	5/05/2020	1002529	581000	LP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	13	KR	13A	m2	0,6	4,74	1	2,84	3,39	A	B	R	A	15
189	5/05/2020	1002529	581001	FDG	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	13	KR	13A	m2	°	°	°	2,5	3,50	A	B	R	A	15
190	5/05/2020	1002529	1513883	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	157	KR	13	KR	13A	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	R	A	15
191	5/05/2020	1002529	1513785	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	13	KR	13A	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	R	A	15
192	30/04/2020	1002529	1013820	PVM			Borrado			CL	157	KR	13	KR	13A	m2	°	°	4,8	°	°					
193	6/05/2020	1002529	580428	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	157	KR	13	KR	13A	ml	0,12	88,9	1	88,9	88,90	A	B	R	A	15
194	5/05/2020	1002489	1513790	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	13A	KR	13B	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	R	A	15
195	28/05/2020	1002489	1513796	EP				Metálico		CL	157	KR	13A	KR	13B	Und	°	°	20	◦	◦	A	B	R	A	8
196	5/05/2020	1002489	1513797	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	157	KR	13A	KR	13B	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	R	A	15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de entrega**	4/06/2020
UPZ	13 - TOBERÍN		
ID	EX_01_358_1842_12_V1	**Cuenta**	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
197	28/05/2020	1002489	1513798	EP				Metálico		CL	157	KR	13A	KR	13B	Und	°	°	20	◦	◦	A	B	R	A	8
198	5/05/2020	1002489	580443	FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	13A	KR	13B	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	B	R	A	15
199	28/05/2020	1002489	1513799	EP				Metálico		CL	157	KR	13A	KR	13B	Und	°	°	20	◦	◦	A	B	R	A	8
200	28/05/2020	1002489	1513800	EP				Metálico		CL	157	KR	13A	KR	13B	Und	°	°	20	◦	◦	A	B	R	A	8
201	6/05/2020	1002489	1513791	LA	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	CL	157	KR	13A	KR	13B	ml	0,2	93,8	1	93,8	93,80	A	B	R	A	15
202	5/05/2020	1002489	1513794	ACH	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Amarillo	CL	157	KR	13A	KR	13B	m2	1	18	1	18	19,91	A	B	R	A	7
203	28/05/2020	1002489	1513792	TCH				Plástico	Amarillo	CL	157	KR	13A	KR	13B	Und	°	°	130	◦	◦	A	B	R	A	8
204	28/05/2020	1002489	1513793	BL					Amarillo	CL	157	KR	13A	KR	13B	Und	°	°	8	◦	◦	A	B	R	A	8
205	28/05/2020	1002489	1513795	TR				Plástico	Amarillo	CL	157	KR	13A	KR	13B	Und	°	°	96	◦	◦	A	B	R	A	9
206	5/05/2020	1002489	580995	FDD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	13A	KR	13B	m2	°	°	°	2,2	3,00	A	B	R	A	15
207	6/05/2020	1002489	581026	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	157	KR	13A	KR	13B	ml	0,12	35,5	1	35,5	35,50	A	B	R	A	15
208	10/05/2020	1002456	17801761	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	157	KR	13B	KR	14	ml	0,12	147,5	1	147,5	147,50	A	B	R	A	15
209	5/05/2020	1002456	580439	FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	13B	KR	14	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	B	R	A	15
210	10/05/2020	1002456	1513808	LA	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	CL	157	KR	13B	KR	14	ml	0,2	85	1	85	85,00	A	B	R	A	15
211	5/05/2020	1002456	1513806	ACH	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Amarillo	CL	157	KR	13B	KR	14	m2	1	8,6	1	8,6	9,57	A	B	R	A	7
212	28/05/2020	1002456	1513805	TCH				Plástico	Amarillo	CL	157	KR	13B	KR	14	Und	°	°	108	◦	◦	A	B	R	A	8
213	28/05/2020	1002456	1513804	BL					Amarillo	CL	157	KR	13B	KR	14	Und	°	°	8	◦	◦	A	B	R	A	8
214	28/05/2020	1002456	1513807	TR				Plástico	Amarillo	CL	157	KR	13B	KR	14	Und	°	°	85	◦	◦	A	B	R	A	8
215	30/04/2020	1002456	580440	LCM			Borrado			CL	157	KR	13B	KR	14	m2	°	°	9,12	°	°					
216	28/05/2020	1002456	1513809	EP				Metálico		CL	157	KR	13B	KR	14	Und	°	°	22	◦	◦	A	B	R	A	8
217	28/05/2020	1002456	1513810	EP				Metálico		CL	157	KR	13B	KR	14	Und	°	°	22	◦	◦	A	B	R	A	8
218	5/05/2020	1002456	580441	FDD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	13B	KR	14	m2	°	°	°	2,2	3,00	A	B	R	A	15
219	28/05/2020	1002456	1513811	EP				Metálico		CL	157	KR	13B	KR	14	Und	°	°	22	◦	◦	A	B	R	A	8
220	5/05/2020	1002456	1513812	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	157	KR	13B	KR	14	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	R	A	15
221	28/05/2020	1002456	1513813	EP				Metálico		CL	157	KR	13B	KR	14	Und	°	°	22	◦	◦	A	B	R	A	8
222	10/05/2020	1002456	1513815	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	13B	KR	14	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	R	A	15
223	10/05/2020	1002456	1013809	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	157	KR	13B	KR	14	ml	0,12	40	1	40	40,00	A	B	R	A	15
224	10/05/2020	1002425	1513817	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	14	KR	14 BIS	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	R	A	15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de entrega**	4/06/2020
UPZ	13 - TOBERÍN		
ID	EX_01_358_1842_12_V1	**Cuenta**	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
225	28/05/2020	1002425	1513818	EP				Metálico		CL	157	KR	14	KR	14 BIS	Und	°	°	58	◦	◦	A	B	R	A	8
226	29/05/2020	1002425	1513820	EP				Metálico		CL	157	KR	14	KR	14 BIS	Und	°	°	58	◦	◦	A	B	R	A	8
227	10/05/2020	1002425	580436	FDD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	14	KR	14 BIS	m2	°	°	°	2,2	3,00	A	B	R	A	15
228	10/05/2020	1002425	1513822	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	14	KR	14 BIS	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	R	A	15
229	10/05/2020	1002425	1513824	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	14	KR	14 BIS	m2	0,4	4	7	11,2	14,35	A	B	R	A	15
230	10/05/2020	1002425	580433	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	157	KR	14	KR	14 BIS	ml	0,12	44,5	1	44,5	44,50	A	B	R	A	15
231	10/05/2020	1002425	1513825	ZBC	A. Base Solv			Agregado Pétreo	Blanco	CL	157	KR	14	KR	14 BIS	m2	0,3	48,7	1	14,61	19,52	A	B	R	A	9
232	10/05/2020	1002425	1513825	ZBC	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	14	KR	14 BIS	m2	0,3	227	1	68,1	90,84	A	B	R	A	15
233	10/05/2020	1002404	1013804	FDD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	14 BIS	KR	14A	m2	°	°	°	2,2	3,00	A	B	R	A	15
234	10/05/2020	1002404	1013803	LCM	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	CL	157	KR	14 BIS	KR	14A	ml	0,12	28,6	1	28,6	28,60	A	B	R	A	15
235	10/05/2020	1002404	1013802	FDD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	14 BIS	KR	14A	m2	°	°	°	2,2	3,00	A	B	R	A	15
236	10/05/2020	1002404	580398	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	157	KR	14 BIS	KR	14A	ml	0,12	15	1	15	15,00	A	B	R	A	15
237	10/05/2020	1002388	581469	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	157	KR	14A	KR	14C	ml	0,12	52	1	52	52,00	A	B	R	A	15
238	10/05/2020	1002388	1513989	FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	14A	KR	14C	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	B	R	A	15
239	10/05/2020	1002388	1513984	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	14A	KR	14C	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	R	A	15
240	10/05/2020	1002388	1514081	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	157	KR	14A	KR	14C	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	R	A	15
241	29/05/2020	1002388	1514079	EP				Metálico		CL	157	KR	14A	KR	14C	Und	°	°	58	◦	◦	A	B	R	A	8
242	10/05/2020	1002388	580416	FDD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	14A	KR	14C	m2	°	°	°	2,2	3,00	A	B	R	A	15
243	29/05/2020	1002388	1514077	EP				Metálico		CL	157	KR	14A	KR	14C	Und	°	°	58	◦	◦	A	B	R	A	8
244	10/05/2020	1002388	580417	LCM	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	CL	157	KR	14A	KR	14C	ml	0,12	102,6	1	102,6	102,60	A	B	R	A	15
245	29/05/2020	1002388	1514080	TR				Plástico E	Amarillo	CL	157	KR	14A	KR	14C	Und	°	°	20	◦	◦	A	B	R	A	8
246	10/05/2020	1002388	1514082	PAB	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	14A	KR	14C	m2	0,25	21,2	1	5,3	7,46	A	B	R	A	15
247	10/05/2020	1002388	17801762	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	157	KR	14A	KR	14C	ml	0,12	51,3	1	51,3	51,30	A	B	R	A	15
248	10/05/2020	1002388	1514062	PP	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	14A	KR	14C	m2	0,4	4	9,5	15,2	19,48	A	B	R	A	15
249	10/05/2020	1002388	1514061	ZBC	A. Base Solv			Agregado Pétreo	Blanco	CL	157	KR	14A	KR	14C	m2	0,3	39,1	1	11,73	15,68	A	B	R	A	9
250	10/05/2020	1002388	1514061	ZBC	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	14A	KR	14C	m2	0,3	160	1	48	64,04	A	B	R	A	15
251	10/05/2020	1002321	1013768	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	157	KR	14C	KR	15	ml	0,12	55	1	55	55,00	A	B	B	A	21
252	29/05/2020	1002321	1514064	EP				Metálico		CL	157	KR	14C	KR	15	Und	°	°	60	◦	◦	A	B	B	A	13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	Fecha de entrega	4/06/2020
UPZ	13 - TOBERÍN		
ID	EX_01_358_1842_12_V1	Cuenta	7

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
253	29/05/2020	1002321	1514066	EP				Metálico		CL	157	KR	14C	KR	15	Und	°	°	60	◦	◦	A	B	B	A	13
254	10/05/2020	1002321	580409	FGD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	14C	KR	15	m2	°	°	°	1,5	2,20	A	B	B	A	21
255	10/05/2020	1002321	580406	LCM	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	CL	157	KR	14C	KR	15	ml	0,12	57,4	1	57,4	57,40	A	B	B	A	21
256	10/05/2020	1002321	580410	FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	157	KR	14C	KR	15	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	B	B	A	21
257	10/05/2020	1002321	1514067	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	157	KR	14C	KR	15	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	B	A	21
258	10/05/2020	1002321	17801763	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	157	KR	14C	KR	15	ml	0,12	36,4	1	36,4	36,40	A	B	B	A	21
259	12/05/2020	1002528	1513864	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	13	CL	157	CL	158A	m2	0,4	4	7	11,2	14,35	A	B	R	M	17
260	10/05/2020	1002528	581359	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	KR	13	CL	157	CL	158A	ml	0,12	31,9	1	31,9	31,90	A	B	R	M	17
261	12/05/2020	1002528	1513860	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	13	CL	157	CL	158A	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	R	M	17
262	10/05/2020	1002528	1513854	LA	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	KR	13	CL	157	CL	158A	ml	0,2	61,2	1	61,2	61,20	A	B	R	M	17
263	12/05/2020	1002528	1513855	ACH	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	13	CL	157	CL	158A	m2	1	9,91	1	9,91	11,01	A	B	R	M	17
264	29/05/2020	1002528	1513859	TCH				Plástico	Amarillo	KR	13	CL	157	CL	158A	Und	°	°	75	◦	◦	A	B	R	M	9
265	29/05/2020	1002528	1513856	BL					Amarillo	KR	13	CL	157	CL	158A	Und	°	°	5	◦	◦	A	B	R	M	9
266	29/05/2020	1002528	1513857	TR				Plástico	Amarillo	KR	13	CL	157	CL	158A	Und	°	°	64	◦	◦	A	B	R	M	9
267	29/05/2020	1002528	1513863	EP				Metálico		KR	13	CL	157	CL	158A	Und	°	°	22	◦	◦	A	B	R	M	14
268	29/05/2020	1002528	1513862	EP				Metálico		KR	13	CL	157	CL	158A	Und	°	°	22	◦	◦	A	B	R	M	14
269	12/05/2020	1002528	581360	FDD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	13	CL	157	CL	158A	m2	°	°	°	2,2	3,00	A	B	R	M	17
270	29/05/2020	1002528	1513861	EP				Metálico		KR	13	CL	157	CL	158A	Und	°	°	22	◦	◦	A	B	R	M	14
271	12/05/2020	1002528	1513853	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	13	CL	157	CL	158A	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	R	M	17
272	10/05/2020	1002528	581377	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	KR	13	CL	157	CL	158A	ml	0,12	31,4	1	31,4	31,40	A	B	R	M	17
273	30/04/2020	1002528	581365	SPT			Borrado			KR	13	CL	157	CL	158A	m2	°	°	6,6	°	°					
274	12/05/2020	1002528	1513950	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	13	CL	157	CL	158A	m2	0,4	4	7,35	11,76	15,07	A	B	R	M	17
275	12/05/2020	1002320	1514059	PP	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	KR	14C	CL	157	CL	158A	m2	0,4	4	9,57	15,31	19,62	A	B	R	A	15
276	10/05/2020	1002320	581470	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	KR	14C	CL	157	CL	158A	ml	0,12	16	1	16	16,00	A	B	R	A	15
277	10/05/2020	1002320	1514055	LIC	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	KR	14C	CL	157	CL	158A	ml	0,2	1	5	5	5,00	A	B	R	A	15
278	10/05/2020	1002320	17801764	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	KR	14C	CL	157	CL	158A	ml	0,12	95	1	95	95,00	A	B	R	A	15
279	29/05/2020	1002320	1514060	EP				Metálico		KR	14C	CL	157	CL	158A	Und	°	°	60	◦	◦	A	B	R	A	8
280	29/05/2020	1002320	1514058	EP				Metálico		KR	14C	CL	157	CL	158A	Und	°	°	60	◦	◦	A	B	R	A	8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de entrega**	4/06/2020
UPZ	13 - TOBERÍN		
ID	EX_01_358_1842_12_V1	**Cuenta**	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
281	12/05/2020	1002320	581481	FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	14C	CL	157	CL	158A	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	B	R	A	15
282	29/05/2020	1002320	1514057	EP				Metálico		KR	14C	CL	157	CL	158A	Und	°	°	62	◦	◦	A	B	R	A	8
283	29/05/2020	1002320	1514054	EP				Metálico		KR	14C	CL	157	CL	158A	Und	°	°	64	◦	◦	A	B	R	A	8
284	12/05/2020	1002320	1514052	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	14C	CL	157	CL	158A	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	R	A	15
285	12/05/2020	1002320	581484	LP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	14C	CL	157	CL	158A	m2	0,6	4,2	1	2,52	3,01	A	B	R	A	15
286	12/05/2020	1002320	581482	FDG	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	14C	CL	157	CL	158A	m2	°	°	°	2,5	3,50	A	B	R	A	15
287	12/05/2020	1002320	1514056	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	14C	CL	157	CL	158A	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	R	A	15
288	12/05/2020	1002320	1514053	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	14C	CL	157	CL	158A	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	R	A	15
289	10/05/2020	1002320	580412	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	KR	14C	CL	157	CL	158A	ml	0,12	50	1	50	50,00	A	B	R	A	15
290	10/05/2020	1002320	1514051	LIC	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	KR	14C	CL	157	CL	158A	ml	0,2	1	5	5	5,00	A	B	R	A	15
291	10/05/2020	1006176	1013759	LIC	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	KR	14C	CL	158A	CL	160	ml	0,2	1	5	5	5,00	A	B	R	A	15
292	10/05/2020	1006176	17801765	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	KR	14C	CL	158A	CL	160	ml	0,12	56,2	1	56,2	56,20	A	B	R	A	15
293	29/05/2020	1006176	1514049	EP				Metálico		KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	27	◦	◦	A	B	R	A	8
294	29/05/2020	1006176	1514047	EP				Metálico		KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	21	◦	◦	A	B	R	A	8
295	29/05/2020	1006176	1514046	EP				Metálico		KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	22	◦	◦	A	B	R	A	8
296	29/05/2020	1006176	1514045	EP				Metálico		KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	22	◦	◦	A	B	R	A	8
297	12/05/2020	1006176	1513176	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	14C	CL	158A	CL	160	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	R	A	15
298	12/05/2020	1006176	1513175	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	14C	CL	158A	CL	160	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	R	A	15
299	29/05/2020	1006176	1513174	EP				Metálico		KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	70	◦	◦	A	B	R	A	8
300	12/05/2020	1006176	1513172	FDG	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	14C	CL	158A	CL	160	m2	°	°	°	2,5	3,50	A	B	R	A	15
301	20/05/2020	1006176	1513171	EP				Metálico		KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	70	◦	◦	A	B	R	A	8
302	30/04/2020	1006176	581478	FDG			Borrado			KR	14C	CL	158A	CL	160	m2	°	°	2,5	°	°					
303	20/05/2020	1006176	1513170	EP				Metálico		KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	59	◦	◦	A	B	R	A	8
304	10/05/2020	1006176	1513184	LA	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	KR	14C	CL	158A	CL	160	ml	0,2	49,7	1	49,7	49,70	A	B	R	A	15
305	12/05/2020	1006176	1514036	ACH	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	#N/A	KR	14C	CL	158A	CL	160	m2	1	8,11	1	8,11	9,03	A	B	R	A	7
306	20/05/2020	1006176	1514037	TCH				Plástico	Amarillo	KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	57	◦	◦	A	B	R	A	8
307	20/05/2020	1006176	17801766	BL					Amarillo	KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	5	◦	◦	A	B	R	A	8
308	20/05/2020	1006176	1514034	TR				Plástico	Amarillo	KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	55	◦	◦	A	B	R	A	8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de entrega**	4/06/2020
UPZ	13 - TOBERÍN		
ID	EX_01_358_1842_12_V1	**Cuenta**	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
309	30/04/2020	1006176	581480	LCM			Borrado			KR	14C	CL	158A	CL	160	m2	°	°	7,2	°	°					
310	10/05/2020	1006176	17801767	LA	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	KR	14C	CL	158A	CL	160	ml	0,2	59,4	1	59,4	59,40	A	B	R	A	15
311	13/05/2020	1006176	17801768	ACH	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	#N/A	KR	14C	CL	158A	CL	160	m2	1	9,9	1	9,9	11,00	A	B	R	A	15
312	20/05/2020	1006176	17801769	TCH				Plástico	Amarillo	KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	78	◦	◦	A	B	R	A	8
313	20/05/2020	1006176	17801770	BL					Amarillo	KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	5	◦	◦	A	B	R	A	8
314	20/05/2020	1006176	17801771	TR				Plástico	Amarillo	KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	61	◦	◦	A	B	R	A	9
315	20/05/2020	1006176	1514043	EP				Metálico		KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	22	◦	◦	A	B	R	A	8
316	20/05/2020	1006176	1514042	EP				Metálico		KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	22	◦	◦	A	B	R	A	8
317	20/05/2020	1006176	1514041	EP				Metálico		KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	22	◦	◦	A	B	R	A	8
318	13/05/2020	1006176	1514040	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	14C	CL	158A	CL	160	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	R	A	15
319	20/05/2020	1006176	1514039	EP				Metálico		KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	22	◦	◦	A	B	R	A	8
320	13/05/2020	1006176	1513180	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	14C	CL	158A	CL	160	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	R	A	15
321	13/05/2020	1006176	1513177	LE	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	14C	CL	158A	CL	160	ml	0,2	17,47	1	17,47	17,47	A	B	R	A	15
322	13/05/2020	1006176	1513179	PPP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	14C	CL	158A	CL	160	m2	°	°	°	1,9	3,50	A	B	R	A	15
323	20/05/2020	1006176	1513182	TR				Plástico	Azul	KR	14C	CL	158A	CL	160	Und	°	°	3	◦	◦	A	B	R	A	8
324	13/05/2020	1006176	1513173	FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	14C	CL	158A	CL	160	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	B	R	A	15
325	30/04/2020	1006176	581479	FF			Borrado			KR	14C	CL	158A	CL	160	m2	°	°	1,2	°	°					
326	10/05/2020	1006176	1514038	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	KR	14C	CL	158A	CL	160	ml	0,12	52	1	52	52,00	A	B	R	A	15
327	10/05/2020	1006176	1513181	LIC	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	KR	14C	CL	158A	CL	160	ml	0,2	1	6	6	6,00	A	B	R	A	15
328	10/05/2020	1006176	17801772	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	KR	14C	CL	158A	CL	160	ml	0,12	75,7	1	75,7	75,70	A	B	R	A	15
329	30/04/2020	1006176	581476	SPT			Borrado			KR	14C	CL	158A	CL	160	m2	°	°	11,1	°	°					
330	13/05/2020	1006176	1513169	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	14C	CL	158A	CL	160	m2	0,4	4	8,9	14,24	18,25	A	B	R	A	15
331	13/05/2020	1006516	580408	FGI	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	15	CL	157	CL	158A	m2	°	°	°	1,5	2,20	A	A	M	M	6
332	13/05/2020	1002481	1513845	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	158A	AK	9	KR	12	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	M	R	A	11
333	20/05/2020	1002481	1513844	EP				Metálico		CL	158A	AK	9	KR	12	Und	°	°	60	◦	◦	A	M	R	A	8
334	13/05/2020	1002481	1513843	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	158A	AK	9	KR	12	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	M	R	A	11
335	13/05/2020	1002481	581369	FDD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	158A	AK	9	KR	12	m2	°	°	°	2,2	3,00	A	M	R	A	11
336	20/05/2020	1002481	1513841	EP				Metálico		CL	158A	AK	9	KR	12	Und	°	°	60	◦	◦	A	M	R	A	8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de entrega**	4/06/2020
UPZ	13 - TOBERÍN		
ID	EX_01_358_1842_12_V1	**Cuenta**	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
337	11/05/2020	1002481	1013781	LCM	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	CL	158A	AK	9	KR	12	ml	0,12	52,4	1	52,4	52,40	A	M	R	A	11
338	13/05/2020	1002481	1513839	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	158A	AK	9	KR	12	m2	0,4	4	7	11,2	14,35	A	M	R	A	11
339	13/05/2020	1002481	1513953	ZBC	A. Base Solv			Agregado Pétreo	Blanco	CL	158A	AK	9	KR	12	m2	0,3	18,3	1	5,49	7,36	A	M	R	A	6
340	13/05/2020	1002481	1513953	ZBC	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	158A	AK	9	KR	12	m2	0,3	196	1	58,8	78,44	A	M	R	A	11
341	13/05/2020	1002430	1513951	FDG	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	158A	KR	12	KR	13	m2	°	°	°	2,5	3,50	A	M	R	A	11
342	11/05/2020	1002430	581370	LCM	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	CL	158A	KR	12	KR	13	ml	0,12	45	1	45	45,00	A	M	R	A	11
343	13/05/2020	1002430	1513952	FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	158A	KR	12	KR	13	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	M	R	A	11
344	13/05/2020	1002430	1513949	ZBC	A. Base Solv			Agregado Pétreo	Blanco	CL	158A	KR	12	KR	13	m2	0,3	21,9	1	6,57	8,80	A	M	R	A	6
345	13/05/2020	1002430	1513949	ZBC	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	158A	KR	12	KR	13	m2	0,3	139,7	1	41,91	55,92	A	M	R	A	11
346	13/05/2020	1002412	1513948	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	DG	159	KR	13	KR	13A	m2	0,4	4	7	11,2	14,35	A	B	R	M	17
347	13/05/2020	1002412	1513940	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	DG	159	KR	13	KR	13A	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	R	M	17
348	13/05/2020	1002412	1513939	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	DG	159	KR	13	KR	13A	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	R	M	17
349	20/05/2020	1002412	1513938	EP				Metálico		DG	159	KR	13	KR	13A	Und	°	°	23	◦	◦	A	B	R	M	14
350	20/05/2020	1002412	1513937	EP				Metálico		DG	159	KR	13	KR	13A	Und	°	°	24	◦	◦	A	B	R	M	14
351	13/05/2020	1002412	1513936	FDG	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	DG	159	KR	13	KR	13A	m2	°	°	°	2,5	3,50	A	B	R	M	17
352	20/05/2020	1002412	1513935	EP				Metálico		DG	159	KR	13	KR	13A	Und	°	°	24	◦	◦	A	B	R	M	14
353	30/04/2020	1002412	1013895	FDD			Borrado			DG	159	KR	13	KR	13A	m2	°	°	2,2	°	°					
354	20/05/2020	1002412	1513934	EP				Metálico		DG	159	KR	13	KR	13A	Und	°	°	25	◦	◦	A	B	R	M	14
355	11/05/2020	1002412	1514607	LA	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	DG	159	KR	13	KR	13A	ml	0,2	243,7	1	243,7	243,70	A	B	R	M	17
356	15/05/2020	1002412	1514033	ACH	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Amarillo	DG	159	KR	13	KR	13A	m2	1	37	1	37	40,81	A	B	R	M	7
357	20/05/2020	1002412	1514031	TCH				Plástico	Amarillo	DG	159	KR	13	KR	13A	Und	°	°	342	◦	◦	A	B	R	M	9
358	20/05/2020	1002412	1514032	BL					Amarillo	DG	159	KR	13	KR	13A	Und	°	°	9	◦	◦	A	B	R	M	9
359	15/05/2020	1002412	1514001	TR				Plástico	Amarillo	DG	159	KR	13	KR	13A	Und	°	°	241	◦	◦	A	B	R	M	9
360	30/04/2020	1002412	581380	LCM			Borrado			DG	159	KR	13	KR	13A	m2	°	°	30	°	°					
361	15/05/2020	1002412	1513947	EP				Metálico		DG	159	KR	13	KR	13A	Und	°	°	24	◦	◦	A	B	R	M	14
362	15/05/2020	1002412	1513946	EP				Metálico		DG	159	KR	13	KR	13A	Und	°	°	24	◦	◦	A	B	R	M	14
363	15/05/2020	1002412	1513945	FDG	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	DG	159	KR	13	KR	13A	m2	°	°	°	2,5	3,50	A	B	R	M	17
364	15/05/2020	1002412	1513944	EP				Metálico		DG	159	KR	13	KR	13A	Und	°	°	24	◦	◦	A	B	R	M	14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD				01 - USAQUEN										**Fecha de entrega**			4/06/2020								
UPZ				13 - TOBERÍN																					
ID				EX_01_358_1842_12_V1										**Cuenta**			7								
No	**Fecha**	**CIV**	**Interno**	**CLASE MARCA**	**Propiedad**					**DIRECCIÓN**						**CANTIDADES**						**GARANTIAS**				
					Imprimante	**Pintura**	**Borrado/ Retiro**	**Material**	**COLOR**	**EJE**		**INICIA**		**TERMINA**		**UND**	**ANCHO**	**LONG**	**CANT**	**PNT**	**IMP**	**TPD**	**CONT**	**EST. PAV**	**AFECT**	**GARANTIA (MESES)**
365	15/05/2020	1002412	1513943	EP				Metálico		DG	159	KR	13	KR	13A	Und	°	°	24	◦	◦	A	B	R	M	14
366	15/05/2020	1002412	1513942	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	DG	159	KR	13	KR	13A	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	R	M	17
367	15/05/2020	1002412	1513941	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	DG	159	KR	13	KR	13A	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	R	M	17
368	15/05/2020	1002412	1513907	ZBC	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	DG	159	KR	13	KR	13A	m2	0,3	174	1	52,2	69,64	A	B	R	M	17
369	15/05/2020	1002265	1513908	PP	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	CL	159A	KR	13A	KR	14A	m2	0,4	4	7	11,2	14,35	A	A	M	A	6
370	15/05/2020	1002265	1513911	EP				Metálico		CL	159A	KR	13A	KR	14A	Und	°	°	56	◦	◦	A	A	M	A	8
371	15/05/2020	1002265	1513912	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	159A	KR	13A	KR	14A	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	A	M	A	6
372	15/05/2020	1002265	1513926	PP	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	CL	159A	KR	13A	KR	14A	m2	0,4	4	7	11,2	14,35	A	A	M	A	6
373	30/04/2020	1002265	1013890	FF			Borrado			CL	159A	KR	13A	KR	14A	m2	°	°	1,2	°	°					
374	15/05/2020	1002265	1513913	FDG	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	159A	KR	13A	KR	14A	m2	°	°	°	2,5	3,50	A	A	M	A	6
375	11/05/2020	1513913	581436	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	DG	159B	KR	14A	KR	14B	ml	0,12	22	1	22	22,00	A	B	B	A	21
376	11/05/2020	1513913	1013941	LIC	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	DG	159B	KR	14A	KR	14B	ml	0,2	1	6	6	6,00	A	B	B	A	21
377	11/05/2020	1513913	581442	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	DG	159B	KR	14A	KR	14B	ml	0,12	44,3	1	44,3	44,30	A	B	B	A	21
378	15/05/2020	1513913	1514012	EP				Metálico		DG	159B	KR	14A	KR	14B	Und	°	°	60	◦	◦	A	B	B	A	13
379	15/05/2020	1513913	1514013	EP				Metálico		DG	159B	KR	14A	KR	14B	Und	°	°	60	◦	◦	A	B	B	A	13
380	15/05/2020	1513913	1514015	EP				Metálico		DG	159B	KR	14A	KR	14B	Und	°	°	60	◦	◦	A	B	B	A	13
381	15/05/2020	1513913	1514016	EP				Metálico		DG	159B	KR	14A	KR	14B	Und	°	°	61	◦	◦	A	B	B	A	13
382	15/05/2020	1513913	1514017	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	DG	159B	KR	14A	KR	14B	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	B	A	21
383	15/05/2020	1513913	1514020	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	DG	159B	KR	14A	KR	14B	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	B	A	21
384	15/05/2020	1513913	1514021	EP				Metálico		DG	159B	KR	14A	KR	14B	Und	°	°	60	◦	◦	A	B	B	A	13
385	15/05/2020	1513913	1514022	EP				Metálico		DG	159B	KR	14A	KR	14B	Und	°	°	60	◦	◦	A	B	B	A	13
386	15/05/2020	1513913	1514023	EP				Metálico		DG	159B	KR	14A	KR	14B	Und	°	°	60	◦	◦	A	B	B	A	13
387	15/05/2020	1513913	1514024	EP				Metálico		DG	159B	KR	14A	KR	14B	Und	°	°	60	◦	◦	A	B	B	A	13
388	15/05/2020	1513913	1514014	FDD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	DG	159B	KR	14A	KR	14B	m2	°	°	°	2,2	3,00	A	B	B	A	21
389	15/05/2020	1513913	1514018	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	DG	159B	KR	14A	KR	14B	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	B	A	21
390	15/05/2020	1513913	1514019	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	DG	159B	KR	14A	KR	14B	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	B	A	21
391	11/05/2020	1513913	581468	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	DG	159B	KR	14A	KR	14B	ml	0,12	92	1	92	92,00	A	B	B	A	21
392	15/05/2020	1513913	1513153	ZBC	A. Base Solv			Agregado Pétreo	Blanco	DG	159B	KR	14A	KR	14B	m2	0,3	33,3	1	9,99	13,36	A	B	B	A	11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de entrega**	4/06/2020
UPZ	13 - TOBERÍN		
ID	EX_01_358_1842_12_V1	**Cuenta**	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ
CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
393	15/05/2020	1513913	1513153	ZBC	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	DG	159B	KR	14A	KR	14B	m2	0,3	120,6	1	36,18	48,28	A	B	B	A	21
394	15/05/2020	50007297	1513154	PP	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	CL	160C	KR	14B	KR	14C	m2	0,4	3,5	7	9,8	12,60	A	B	B	A	21
395	11/05/2020	50007297	581457	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	160C	KR	14B	KR	14C	ml	0,12	53	1	53	53,00	A	B	B	A	21
396	11/05/2020	50007297	1513167	LIC	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	160C	KR	14B	KR	14C	ml	0,2	1	3	3	3,00	A	B	B	A	21
397	11/05/2020	50007297	17801773	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	160C	KR	14B	KR	14C	ml	0,12	11,1	1	11,1	11,10	A	B	B	A	21
398	11/05/2020	50007297	1513155	LA	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	CL	160C	KR	14B	KR	14C	ml	0,2	81,3	1	81,3	81,30	A	B	B	A	21
399	15/05/2020	50007297	1513157	ACH	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	160C	KR	14B	KR	14C	m2	1	7,1	1	7,1	7,92	A	B	B	A	21
400	15/05/2020	50007297	1513156	TCH				Plástico	Amarillo	CL	160C	KR	14B	KR	14C	Und	°	°	92	◦	◦	A	B	B	A	10
401	15/05/2020	50007297	1513158	BL					Amarillo	CL	160C	KR	14B	KR	14C	Und	°	°	6	◦	◦	A	B	B	A	10
402	15/05/2020	50007297	1513159	TR				Plástico	Amarillo	CL	160C	KR	14B	KR	14C	Und	°	°	52	◦	◦	A	B	B	A	9
403	30/04/2020	50007297	1013754	FF			Borrado			CL	160C	KR	14B	KR	14C	m2	°	°	1,2	°	°					
404	15/05/2020	50007297	1513163	FF	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	160C	KR	14B	KR	14C	m2	°	°	°	1,2	1,80	A	B	B	A	21
405	15/05/2020	50007297	1513166	PCP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	CL	160C	KR	14B	KR	14C	m2	°	°	°	4,18	4,66	A	B	B	A	21
406	15/05/2020	50007297	1513168	VMP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	160C	KR	14B	KR	14C	m2	°	°	°	3,36	8,09	A	B	B	A	21
407	11/05/2020	50007297	581459	LB	A. Base Solv	P. F. Spray			Blanco	CL	160C	KR	14B	KR	14C	ml	0,12	61,1	1	61,1	61,10	A	B	B	A	21
408	11/05/2020	1002143	17801774	LCM	A. Base Solv	P. F. Spray			Amarillo	CL	160C	KR	14C	AK	15	ml	0,12	38	1	38	38,00	A	B	B	A	21
409	15/05/2020	1002143	581466	FDD	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	CL	160C	KR	14C	AK	15	m2	°	°	°	2,2	3,00	A	B	B	A	21
410	19/05/2020	1002429	1513954	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	12	CL	158A	CL	160	m2	0,4	4	8,2	13,12	16,81	B	A	M	M	19
411	19/05/2020	1002429	581413	LP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	12	CL	158A	CL	160	m2	0,6	4	1	2,4	2,87	B	A	M	M	19
412	19/05/2020	1002429	1513968	SPT	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	12	CL	158A	CL	160	m2	0,3	16,7	1	5,01	6,72	B	A	M	M	19
413	19/05/2020	1002429	1513970	PSP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	12	CL	158A	CL	160	m2	°	°	°	3	3,38	B	A	M	M	19
414	19/05/2020	1002429	1513969	PSP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Amarillo	KR	12	CL	158A	CL	160	m2	°	°	°	3	3,38	B	A	M	M	19
415	30/04/2020	1002264	17801775	SPT			Borrado			KR	13A	CL	159A	AC	161	m2	°	°	6,9	°	°					
416	19/05/2020	1002264	1513906	PP	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	KR	13A	CL	159A	AC	161	m2	0,4	4	8,12	12,99	16,65	B	B	R	M	30
417	11/05/2020	1002264	581385	LB	A. Base Solv	A. Base Solv			Blanco	KR	13A	CL	159A	AC	161	ml	0,12	82	1	82	82,00	B	B	R	M	9
418	15/05/2020	1002264	1513893	EP				Plástico E	Blanco	KR	13A	CL	159A	AC	161	Und	°	°	56	◦	◦	B	B	R	M	25
419	15/05/2020	1002264	1513892	EP				Plástico E	Blanco	KR	13A	CL	159A	AC	161	Und	°	°	56	◦	◦	B	B	R	M	25
420	19/05/2020	1002264	581396	FGD	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	13A	CL	159A	AC	161	m2	°	°	°	1,5	2,20	B	B	R	M	9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

LOCALIDAD	01 - USAQUEN												**Fecha de entrega**	4/06/2020											
UPZ	13 - TOBERÍN																									
ID	EX_01_358_1842_12_V1												**Cuenta**	7											
No	**Fecha**	**CIV**	**Interno**	**CLASE MARCA**	**Propiedad**					**DIRECCIÓN**						**CANTIDADES**						**GARANTIAS**				
					Imprimante	**Pintura**	**Borrado/ Retiro**	**Material**	**COLOR**	**EJE**		**INICIA**		**TERMINA**		**UND**	**ANCHO**	**LONG**	**CANT**	**PNT**	**IMP**	**TPD**	**CONT**	**EST. PAV**	**AFECT**	**GARANTIA (MESES)**
421	15/05/2020	1002264	1513891	EP				Plástico E	Blanco	KR	13A	CL	159A	AC	161	Und	°	°	56	◦	◦	B	B	R	M	25
422	15/05/2020	1002264	1513890	EP				Plástico E	Blanco	KR	13A	CL	159A	AC	161	Und	°	°	60	◦	◦	B	B	R	M	25
423	11/05/2020	1002264	1513895	LA	A. Base Solv	A. Base Solv			Amarillo	KR	13A	CL	159A	AC	161	ml	0,2	80	1	80	80,00	B	B	R	M	9
424	19/05/2020	1002264	1513897	ACH	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Amarillo	KR	13A	CL	159A	AC	161	m2	1	11,8	1	11,8	13,09	B	B	R	M	9
425	15/05/2020	1002264	1513899	TCH				Plástico	Amarillo	KR	13A	CL	159A	AC	161	Und	°	°	100	◦	◦	B	B	R	M	15
426	1/06/2020	1002264	1513898	BL					Amarillo	KR	13A	CL	159A	AC	161	Und	°	°	6	◦	◦	B	B	R	M	15
427	1/06/2020	1002264	1513896	TR				Plástico	Amarillo	KR	13A	CL	159A	AC	161	Und	°	°	81	◦	◦	B	B	R	M	14
428	30/04/2020	1002264	581390	FDG			Borrado			KR	13A	CL	159A	AC	161	m2	°	°	2,5	°	°					
429	1/06/2020	1002264	1513905	EP				Plástico E	Blanco	KR	13A	CL	159A	AC	161	Und	°	°	24	◦	◦	B	B	R	M	25
430	1/06/2020	1002264	1513904	EP				Plástico E	Blanco	KR	13A	CL	159A	AC	161	Und	°	°	22	◦	◦	B	B	R	M	25
431	19/05/2020	1002264	1513903	FDG	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	13A	CL	159A	AC	161	m2	°	°	°	2,5	3,50	B	B	R	M	9
432	1/06/2020	1002264	1513902	EP				Plástico E	Blanco	KR	13A	CL	159A	AC	161	Und	°	°	22	◦	◦	B	B	R	M	25
433	1/06/2020	1002264	1513901	EP				Plástico E	Blanco	KR	13A	CL	159A	AC	161	Und	°	°	22	◦	◦	B	B	R	M	25
434	19/05/2020	1002264	1513900	PCP	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Amarillo	KR	13A	CL	159A	AC	161	m2	°	°	°	4,18	4,66	B	B	R	M	9
435	19/05/2020	1002264	1513894	VMP	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	13A	CL	159A	AC	161	m2	°	°	°	3,36	8,09	B	B	R	M	9
436	11/05/2020	1002264	581389	LB	A. Base Solv	A. Base Solv			Blanco	KR	13A	CL	159A	AC	161	ml	0,12	47	1	47	47,00	B	B	R	M	9
437	11/05/2020	1002264	1013906	LIC	A. Base Solv	A. Base Solv			Blanco	KR	13A	CL	159A	AC	161	ml	0,2	1	5	5	5,00	B	B	R	M	9
438	11/05/2020	1002264	581393	LB	A. Base Solv	A. Base Solv			Blanco	KR	13A	CL	159A	AC	161	ml	0,12	68	1	68	68,00	B	B	R	M	9
439	30/04/2020	1002159	581447	SPT			Borrado			KR	14B	CL	160	AC	161	m2	°	°	6,6	°	°					
440	19/05/2020	1002159	1513152	PP	A. Base Solv	P. F. Llana		Antideslizante	Blanco	KR	14B	CL	160	AC	161	m2	0,4	4	8,18	13,09	16,77	B	B	B	M	46
441	12/05/2020	1002159	581446	LB	A. Base Solv	A. Base Solv			Blanco	KR	14B	CL	160	AC	161	ml	0,12	24	1	24	24,00	B	B	B	M	12
442	12/05/2020	1002159	1013744	LIC	A. Base Solv	A. Base Solv			Blanco	KR	14B	CL	160	AC	161	ml	0,2	1	5	5	5,00	B	B	B	M	12
443	12/05/2020	1002159	581454	LB	A. Base Solv	A. Base Solv			Blanco	KR	14B	CL	160	AC	161	ml	0,12	13,8	1	13,8	13,80	B	B	B	M	12
444	1/06/2020	1002159	1513151	EP				Metálico		KR	14B	CL	160	AC	161	Und	°	°	60	◦	◦	B	B	B	M	29
445	1/06/2020	1002159	1513150	EP				Metálico		KR	14B	CL	160	AC	161	Und	°	°	60	◦	◦	B	B	B	M	29
446	1/06/2020	1002159	1513148	EP				Metálico		KR	14B	CL	160	AC	161	Und	°	°	60	◦	◦	B	B	B	M	29
447	1/06/2020	1002159	1513146	EP				Metálico		KR	14B	CL	160	AC	161	Und	°	°	64	◦	◦	B	B	B	M	29
448	30/04/2020	1002159	581472	FDG			Borrado			KR	14B	CL	160	AC	161	m2	°	°	2,5	°	°					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de entrega**	4/06/2020
UPZ	13 - TOBERÍN		
ID	EX_01_358_1842_12_V1	**Cuenta**	7

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN						CANTIDADES						GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE		INICIA		TERMINA		UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT	IMP	TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
449	19/05/2020	1002159	1513149	FDG	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	14B	CL	160	AC	161	m2	°	°	°	2,5	3,50	B	B	B	M	12
450	19/05/2020	1002159	1513147	PCP	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Amarillo	KR	14B	CL	160	AC	161	m2	°	°	°	4,18	4,66	B	B	B	M	12
451	19/05/2020	1002159	1513145	VMP	A. Base Solv	A. Base Solv		Antideslizante	Blanco	KR	14B	CL	160	AC	161	m2	°	°	°	3,36	8,09	B	B	B	M	12
452	12/05/2020	1002159	581450	LB	A. Base Solv	A. Base Solv			Blanco	KR	14B	CL	160	AC	161	ml	0,12	56,7	1	56,7	56,70	B	B	B	M	12
453	19/05/2020	1002597	1513789	PP	A. Base Solv	P. F. Spray		Antideslizante	Blanco	KR	13A	CL	156	CL	157	m2	0,4	4	6	9,6	12,30	B	B	R	M	30
454	19/05/2020	1002579	1513783	TR				Plástico	Amarillo	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	Und	°	°	10	◦	◦	B	B	R	M	14
455	19/05/2020	1002579	1514614	TR				Plástico	Blanco	CL	155	KR	14 BIS	AK	15	Und	°	°	10	◦	◦	B	B	R	M	14

ITEM	DESCRIPCION_ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	3638,70	$ 999	$ 3.635.061
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	53,80	$ 1.236	$ 66.497

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

LOCALIDAD	01 - USAQUEN	**Fecha de entrega**	4/06/2020
UPZ	13 - TOBERÍN		
ID	EX_01_358_1842_12_V1	**Cuenta**	7

CTO. 20191780

No	Fecha	CIV	Interno	CLASE MARCA	Propiedad					DIRECCIÓN			CANTIDADES					IMP	GARANTIAS				
					Imprimante	Pintura	Borrado/ Retiro	Material	COLOR	EJE	INICIA	TERMINA	UND	ANCHO	LONG	CANT	PNT		TPD	CONT	EST. PAV	AFECT	GARANTIA (MESES)
35	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen																	ML	1864,61		$ 1.317		$ 2.455.691
36	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen																	M2	2157,49		$ 11.196		$ 24.155.258
39	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen																	ML	639,50		$ 1.209		$ 773.156
41	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen																	ML	160,90		$ 1.735		$ 279.162
42	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas																	M2	166,18		$ 16.926		$ 2.812.763
43	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas																	M2	11,20		$ 15.467		$ 173.230
58	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744																	ML	2999,20		$ 3.364		$ 10.089.309
59	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744																	ML	53,80		$ 4.017		$ 216.115
60	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744																	ML	1703,71		$ 4.842		$ 8.249.364
61	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas																	M2	619,84		$ 35.360		$ 21.917.542
62	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas																	M2	243,38		$ 32.869		$ 7.999.657
68	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.																	M2	327,33		$ 57.854		$ 18.937.350
69	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.																	M2	104,23		$ 56.996		$ 5.940.693
71	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072																	M2	1489,63		$ 6.800		$ 10.129.484
72	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).																	UND	1513		$ 6.672		$ 10.094.736
73	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).																	UND	210		$ 8.799		$ 1.847.790
75	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.																	UND	318		$ 6.017		$ 1.913.406
76	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.																	UND	3111		$ 12.389		$ 38.542.179
78	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.																	UND	1964		$ 51.310		$ 100.772.840
83	Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.																	UND	99		$ 47.676		$ 4.719.924
86	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epóxica																	M2	92,28		$ 157.749		$ 14.557.078
104	Borrado mecánico de marcas viales.																	M2	146,02		$ 32.261		$ 4.710.751

SUBTOTAL			**$ 294.989.035**
ADMINISTRACIÓN	29,9%	$	88.201.722
IMPREVISTOS	2,0%	$	5.899.781
UTILIDAD	5,0%	$	14.749.452
TOTAL		**$**	**403.839.989**

RESIDENTE DE OBRA

ING. LUISA FERNANDA CHAVES
Firma y Nombre

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. ALBA AVENDAÑO CIPAGAUTA
Firma y Nombre

OBSERVACIONES

Anexo 2: Certificados de Calidad de materiales

NIT.900.958.926-1

Bogotá D.C., Enero 14 de 2020


CERTIFICACIÒN

El suscrito Gerente técnico de la firma GRUPO EFEXPORT ZF S.A.S se permite certificar que el producto **ESTOPEROL BLANCO CON ESPIGO 10*2.5** cumple con las **especificaciones de calidad** establecidas en el **Manual de Señalización Vial** emitido por el **Ministerio de Transporte.**

Las piezas cuentan con una garantía por defectos de fabricación de seis (6) meses a partir de la fecha de su entrega. LOTE Z1282A01497-102019.

La presente se expide por petición de la firma **CONSORCIO SEÑALIZA BTA** A los catorce (14) días del mes de enero de 2020.

Atentamente,



JUAN MANUEL VELASQUEZ LIEVANO
GERENTE TECNICO

NIT.900.958.926-1

Bogotá D.C., Enero 14 de 2020


CERTIFICACIÒN

El suscrito Gerente técnico de la firma GRUPO EFEXPORT ZF S.A.S se permite certificar que el producto **HITO FLEXIBLE AMARILLO** cumple con las **especificaciones de calidad** establecidas en el **Manual de Señalización Vial** emitido por el **Ministerio de Transporte.**

Las piezas cuentan con una garantía por defectos de fabricación de seis (6) meses a partir de la fecha de su entrega. LOTE Z3338048-122019.

La presente se expide por petición de la firma **CONSORCIO SEÑALIZA BTA.** A los catorce (14) días del mes de enero de 2020.

Atentamente,



JUAN MANUEL VELASQUEZ LIEVANO
GERENTE TECNICO

NIT.900.958.926-1

Bogotá D.C., Enero 14 de 2020


CERTIFICACIÒN

El suscrito Gerente técnico de la firma GRUPO EFEXPORT ZF S.A.S se permite certificar que el producto **TACHA BLANCA CON ESPIGO** cumple con las **especificaciones de calidad** establecidas en el **Manual de Señalización Vial** emitido por el **Ministerio de Transporte.**

Las piezas cuentan con una garantía por defectos de fabricación de seis (6) meses a partir de la fecha de su entrega. LOTE Z9Q5562310613-112019.


La presente se expide por petición de la firma **CONSORCIO SEÑALIZA BTA** A los catorce (14) días del mes de enero de 2020.


Atentamente,



JUAN MANUEL VELASQUEZ LIEVANO
GERENTE TECNICO

(1 : 1)

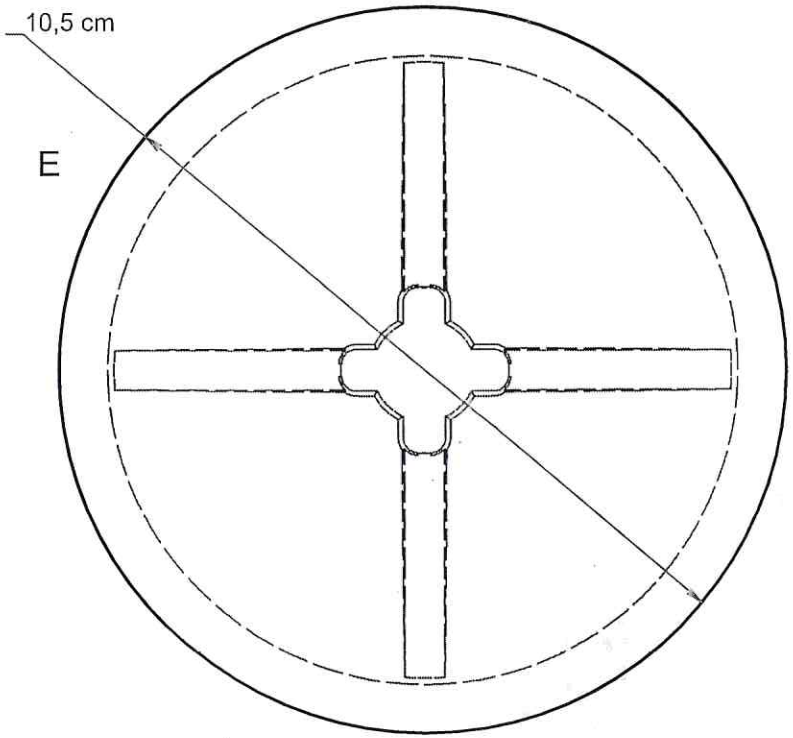

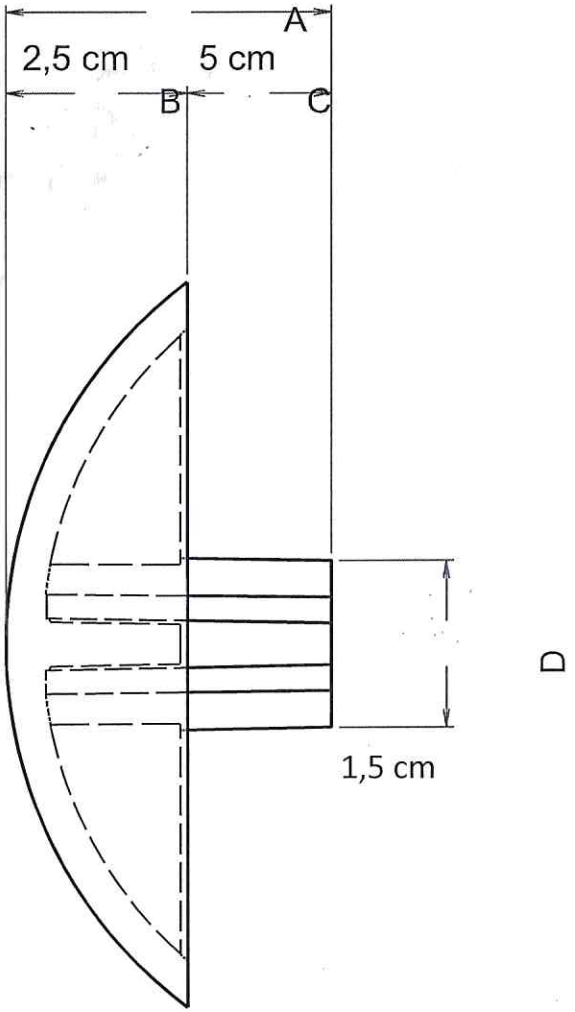

Carrera 27 C No. 71 – 43 Barrio Alcazares - Conmutador 225 21 82 Bogotá D.C.
www.seguridadvialtyg.com - seguridadvialtyg@gmail.com

LINEA CONSTRUCCION Y SEÑALIZACION

FICHA TECNICA ESTOPEROL EN ALUMINIO CON ESPIGO

DESCRIPCION :

Dispositivo de señalización vial, diseñado para anclar a la superficie con el fin de que este logre máxima resistencia al tráfico y el paso vehicular sobre este.

CARACTERISTICAS:

Color: gris aluminio

Forma: Ovalada

Diámetro 10 CM

Altura 2.5 CM

Espigo 5 CM

Resistencia a la compresión: 30Ton sin deformación ni fracturas

USOS:

Los estoperoles se instalan en el pavimento en hileras, con el fin de crear un efecto sonoro, de advertencia y reducción de velocidad para los vehículos, también para advertir sobre cruces peligrosos zonas que requieren la reducción de la velocidad, o atención por parte del conductor como las escolares.


NORMATIVIDAD:

Los estoperoles se fabrican en aluminio. Cumple con todas las especificaciones técnicas de dimensiones y resistencia a la compresión, exigidas en el Manual de Señalización 2015 numeral 5.4.1., según Resolución 1050 de 2.004 Ministerio de Transporte.

FORMULACION ESTANDAR:

MATERIA PRIMA	PORCENTAJE
Aluminio	99

Diagrama de flujo

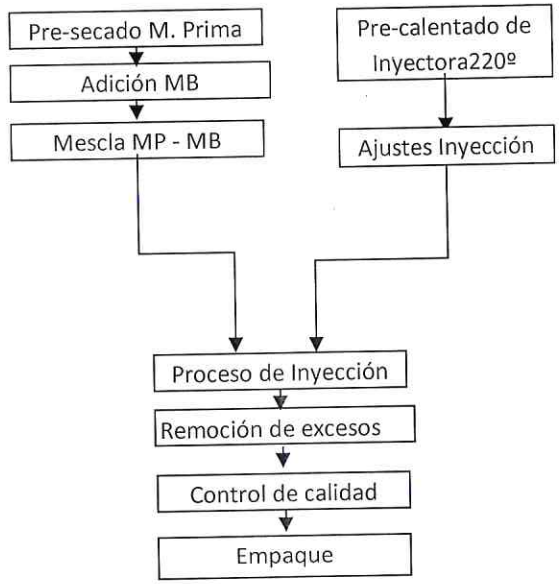

T&G
Seguridad Vial S.A.S.

NIT. 900.944.587-1

CERTIFICACIÒN

El suscrito Representante Legal de la empresa SEGURIDAD VIAL T&G SAS S.A.S se permite certificar que el producto **ESTOPEROL DE ALUMINIO CON ESPIGO (ESTOPEROL VIAL DE ALUMINIO DE 10 x 2.5 CM CON ESPIGODE DE 5 CM)** cumple con las **especificaciones de calidad** establecidas en el **Manual de Señalización Vial 2015 emitido** por el **Ministerio de Transporte descritas en el numeral 5.4.1.**

Las piezas cuentan con una garantía por defectos de fabricación de doce (12) meses a partir de la fecha de su entrega.

La presente se expide a quien interese.

Atentamente,

Ing. Carlos Enrique Trujillo Tujillo.
Representante Legal.

Carrera 27 C No. 71 – 43 Barrio Alcazares - Conmutador 225 21 82 Bogotá D.C.
www.seguridadvialtyg.com - seguridadvialtyg@gmail.com

El Color de la Calidad®

PINTUCO COLOMBIA S.A
Nit. 890.900.148-2
Dirección: Calle 19A No. 43B - 41.
Medellín, Colombia.
PBX: 384 84 84. Fax: 323 04 70.
Apartado Aéreo: 1194
www.pintuco.com

Autopista Med-Bog Via Belen Rionegro Km 1
Rionegro, Antioquia

Artículo1: 10017278
PINTUTRAFICO ACRILICO BASE SOLVENTE AMARILLO 13723 - TAM 50 G
Lote: IU9-230917
Cliente:
Fecha de Fabricación: 26-OCT-19

Prueba/Método/Norma	Resultado	Min	Max	Unid Prueba
VISCOSIDAD KU / I-GC-QAP-048-PINTUCO	89.00	85.00	90.00	KU
DENSIDAD / I-GC-QAP-013-PINTUCO	5.45	5.41	5.51	kg/gal
PODER CUBRIENTE EN HUMEDO / I-GC-QAP-027-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
DECANTACION	Negativa	Negativa		
COLOR VISUAL PRODUCTOS / I-I&D+i-006-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
SECAMIENTO AL TACTO / I-GC-QAP-044-PINTUCO	15.00	0.00	15.00	min
MOLIENDA HEGMAN / I-GC-QAP-023-PINTUCO	3.00	3.00	4.00	Hegman
NIVELACION VISUAL / I-GC-QAP-004-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
FLEXIBILIDAD MANDRIL CILINDRICO 1/2" / I-GC-QAP-018-PINTUCO	Pasa	Pasa		

Observaciones:

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Producto aprobado por Personal de Calidad. Metodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC

Gestion de calidad de la compania garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja tecnica de este producto.

Persona Responsable de Aprobación:	CARLOS.VARGAS

El Color de la Calidad

PINTUCO COLOMBIA S.A
NIt. 890.900.148-2
Dirección: Calle 19A No. 43B - 41.
Medellín, Colombia.
PBX: 384 84 84. Fax: 323 04 70.
Apartado Aéreo: 1194
www.pintuco.com

Autopista Med-Bog Via Belen Rionegro Km 1
Rionegro, Antioquia

Artículo1: 10017277
PINTUTRAFICO ACRILICO BASE SOLVENTE BLANCO 13722 - TAM 50 G
Lote: IU9-230916
Cliente:
Fecha de Fabricación: 28-OCT-19

Prueba/Método/Norma	Resultado	Min	Max	Unid Prueba
VISCOSIDAD KU / I-GC-QAP-048-PINTUCO	89.00	84.00	90.00	KU
DENSIDAD / I-GC-QAP-013-PINTUCO	5.56	5.49	5.59	kg/gal
ACABADO / I-GC-QAP-004-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
NIVELACION VISUAL / I-GC-QAP-004-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
PODER CUBRIENTE EN HUMEDO / I-GC-QAP-027-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
DECANTACION	Negativa	Negativa		
COLOR VISUAL PRODUCTOS / I-I&D+i-006-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
SECAMIENTO AL TACTO / I-GC-QAP-044-PINTUCO	15.00	0.00	15.00	min
MOLIENDA HEGMAN / I-GC-QAP-023-PINTUCO	4.00	3.00	4.00	Hegman
FLEXIBILIDAD MANDRIL CILINDRICO 1/2" / I-GC-QAP-018-PINTUCO	Pasa	Pasa		

Observaciones:

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Producto aprobado por Personal de Calidad. Metodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC

Gestion de calidad de la compania garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja tecnica de este producto.

Persona Responsable de Aprobación:	JUAN.JARAMILLO

Certificado de Análisis

PINTUCO COLOMBIA S.A
Nit. 890.900.148-2
Dirección: Calle 19A No. 438 - 41.
Medellín, Colombia.
PBX: 384 84 84. Fax: 323 04 70.
Apartado Aéreo: 1194
www.pintuco.com

Autopista Med-Bog Via Belen Rionegro Km 1
Rionegro, Antioquia

Artículo1: 10166667
PINTUTRAFICO PLASTICO FRIO SPRAY 1-1 COMP. A AMARILLO 13336A -CAN 4G
Lote: IP0-235154
Cliente:
Fecha de Fabricación: 15-ENE-20

Prueba/Método/Norma	Resultado	Min	Max	Unid Prueba
DENSIDAD / I-GC-QAP-013-PINTUCO	5.74	5.64	5.78	kg/gal
VISCOSIDAD KU / I-GC-QAP-048-PINTUCO	85.00	85.00	95.00	KU
OBSERVACIONES GENERALES	CATALIZA AL 10179207 1/1 V/V SE DEBE PRIMERO MEZCLAR EL 10179210 CON 13761 100:2	1:1 V/V		
SECAMIENTO AL TACTO / I-GC-QAP-044-PINTUCO	0.30	0.00	0.30	h
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	0.20	0.00	0.20	h
ACABADO / I-GC-QAP-004-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		

Observaciones:

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Producto aprobado por Personal de Calidad. Metodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC

Gestion de calidad de la compania garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja tecnica de este producto.

Persona Responsable de Aprobación:	HUGO.PATINO

Certificado de Análisis

PINTUCO COLOMBIA S.A
Nit. 890.900.148-2
Dirección: Calle 19A No. 43B - 41.
Medellín, Colombia.
PBX: 384 84 84. Fax: 323 04 70.
Apartado Aéreo: 1194
www.pintuco.com

Autopista Med-Bog Via Belen Rionegro Km 1
Rionegro, Antioquia

Artículo1: 10166668
PINTUTRAFICO PLASTICO FRIO SPRAY 1-1 COMP. B AMARILLO 13336B -CAN 4G
Lote: IP0-235144
Cliente:
Fecha de Fabricación: 15-ENE-20

Prueba/Método/Norma	Resultado	Min	Max	Unid Prueba
DENSIDAD / I-GC-QAP-013-PINTUCO	5.66	5.63	5.77	kg/gal
VISCOSIDAD KU / I-GC-QAP-048-PINTUCO	85.00	85.00	95.00	KU
OBSERVACIONES GENERALES	CATALIZA AL 10179207 1/1 V/V SE DEBE MEZCLAR EL 10179210	1:1 V/V		
SECAMIENTO AL TACTO / I-GC-QAP-044-PINTUCO	0.30	0.00	0.30	h
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	0.20	0.00	0.20	h
ACABADO / I-GC-QAP-004-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		

Observaciones:

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Producto aprobado por Personal de Calidad. Metodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC

Gestion de calidad de la compania garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja tecnica de este producto.

Persona Responsable de Aprobación:	HUGO.PATINO

Certificado de Análisis

El Color de la Calidad®

PINTUCO COLOMBIA S.A
Nit. 890.900.148-2
Dirección: Calle 19A No. 43B - 41.
Medellín, Colombia.
PBX: 384 84 84. Fax: 323 04 70.
Apartado Aéreo: 1194
www.pintuco.com

Autopista Med-Bog Via Belen Rionegro Km 1
Rionegro, Antioquia

Artículo1: 10166665
PINTUTRAFICO PLASTICO FRIO SPRAY 1 - 1 COMP. A BLANCO 13335A - CAN 4 G
Lote: IR9-232708
Cliente:
Fecha de Fabricación: 25-NOV-19

Prueba/Método/Norma	Resultado	Min	Max	Unid Prueba
DENSIDAD / I-GC-QAP-013-PINTUCO	6.15	6.10	6.24	kg/gal
VISCOSIDAD KU / I-GC-QAP-048-PINTUCO	85.00	85.00	95.00	KU
ACABADO / I-GC-QAP-004-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
OBSERVACIONES GENERALES	1:1 V/V 10179209	1:1 V/V 10179209		
SECAMIENTO AL TACTO / I-GC-QAP-044-PINTUCO	0.30	0.00	0.30	h
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	0.10	0.00	0.20	h
COLOR VISUAL PRODUCTOS / I-I&D+i-006-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		

Observaciones:

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Producto aprobado por Personal de Calidad. Metodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC

Gestion de calidad de la compania garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja tecnica de este producto.

Persona Responsable de Aprobación:	JORGE.PATINO

Fecha del Reporte: 16/01/2020 11:11:01 PM

Certificado de Análisis

PINTUCO COLOMBIA S.A
Nit. 890.900.148-2
Dirección: Calle 19A No. 438 - 41.
Medellín, Colombia.
PBX: 384 84 84. Fax: 323 04 70.
Apartado Aéreo: 1194
www.pintuco.com

Autopista Med-Bog Via Belen Rionegro Km 1
Rionegro, Antioquia

Artículo1: 10166666
PINTUTRAFICO PLASTICO FRIO SPRAY 1 - 1 COMP. B BLANCO 13335B - CAN 4 G
Lote: IP0-235142
Cliente:
Fecha de Fabricación: 11-ENE-20

Prueba/Método/Norma	Resultado	Min	Max	Unid Prueba
DENSIDAD / I-GC-QAP-013-PINTUCO	6.12	6.09	6.23	kg/gal
VISCOSIDAD KU / I-GC-QAP-048-PINTUCO	85.00	85.00	95.00	KU
ACABADO / I-GC-QAP-004-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		
OBSERVACIONES GENERALES	CATALIZA AL 10179206 1/1 POR VOL	1:1 V/V 10179206		
SECAMIENTO AL TACTO / I-GC-QAP-044-PINTUCO	0.30	0.00	0.30	h
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	0.20	0.00	0.20	h
COLOR VISUAL PRODUCTOS / I-I&D+i-006-PINTUCO	Similar Std	Similar Std		

Observaciones:

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Producto aprobado por Personal de Calidad. Metodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC

Gestion de calidad de la compania garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja tecnica de este producto.

Persona Responsable de Aprobación:	JUAN.FLOREZ

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: CONSORCIO SEÑALIZA BTA
NIT : 901314965
LUGAR Y FECHA: 10/01/2020
FACTURA Y/O PEDIDO: 33657
CANTIDAD: 120 CUARTOS
METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo e instructivos internos
PRODUCTO: PEGANTE

LOTE : 33944
FECHA DE FABRICACION: 19/12/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 19/06/2020

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO	NTC /INSTRUCTIVO INTERNO
DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA COMO VISCOSIDAD	115 -120 KU	120 KU	NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal 25°C)	6,40-6,80 Kg/gal	6,50 Kg/Gal	NTC-561
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP)	7 – 25 Minutes	MIN PERATURA: 18°C HUMEDAD :62%	NTC 5734
% CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN	Mínimo 99%	99,50%	NTC 1786
METODO DE ENSAYO GRADO DE SEDIMENTACION DE LA PINTURA	10-0	10%	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	Máximo 5 UK	PASA	NTC 6108
ELONGACION	PASA / NO PASA	PASA	NTC 1115
DUREZA	MINIMO H	3H	NTC 912

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

T.Q Sandra Milena Solano Lara
Jefe de Laboratorio

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: CONSORCIO SEÑALIZA BTA
NIT : 901314965
LUGAR Y FECHA: 12/02/2020
FACTURA Y/O PEDIDO: 50321
CANTIDAD:
METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1360, INVIAS ARTICULO 700 e instructivos internos
PRODUCTO: IMPRIMANTE BASE SOLVENTE ORBITEX® NEGRO

LOTE		p-0000115	
FECHA DE FABRICACION:12/02/2020			
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/02/2021			
PARAMETRO	**ESPECIFICACIONES**	**RESULTADO**	**NTC /INSTRUCTIVO INTERNO**
FINURA DE DISPERSION (UH)	Mínimo 3	4	NTC 1360 NUMERAL 8.2 NTC 557
VISCOSIDAD (KU a 25°C)	80 - 90	83	NTC 1360 NUMERAL 8.6 NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal a 25°C)	5,10 – 5.40	5,25	NTC-561
COLOR	ΔE = 0.50 máx	0,11	I-GP-132
OPACIDAD/CUBRIMIENTO (%)	97 – 99	99	I-GP-132
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP EN MINUTOS)	7 – 15	7 Humedad: 41% Temperatura: 23°C	NTC 1360 NUMERAL 6.2.4 NTC 5734
CONTENIDO DE SOLIDOS EN PESO EN %	Mínimo 60	60,08	NTC 1360 NUMERAL 6.1.2 NTC 1227
CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN EN %	Mínimo 50	50,1	NTC 1360 NUMERAL 6.1.3 NTC 1786
SEDIMENTACION DE LA PINTURA	perfecta 0: Torta firme que no se puede incorporar	10	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	Máximo 5 UK	4 UK	NTC 1360 NUMERAL 6.1 6.2 NTC 6108
BRILLO 65°	10 MAXIMO	4.2	I-GP-132
ESTABILIDAD A LA DILUCION (85% MUESTRA Y 15% XILOL)	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	I-GP-132
ELONGACION	PASA / NO PASA	PASA	NTC 1360 NUMERAL 8.17 NTC 1115
RESISTENCIA AL AGUA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.2 /8.15
RESISTENCIA A LOS ALCALIS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.3.1 /8.14
RESISTENCIA A LA ABRASION (dm3)	>80	179	NTC 1360 NUMERAL 6.3.3 /8.16
APARIENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	NTC 1360 NUMERAL 6.2.3 / 8.10

***ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE**

En Pintuflex® estamos comprometidos con el planeta!

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

T.Q SANDRA SOLANO LARA
JEFE DE LABORATORIO


CERTIFICADO DE CALIDAD **No. CN 260520-1**

DATOS DE PRODUCCIÓN	
PRODUCTO	BORDILLO PLÁSTICO CON TORNILLOS
LOTE	260520
FECHA DE INSPECCIÓN	23 mayo de 2020
NUMERO DE MUESTRAS	45 unidades.

ANÁLISIS DE MUESTRAS		
PARÁMETRO	**ESPECIFICACIÓN**	**RESULTADO**
Material	Polímero termoplástico	Cumple
Color	Amarillo	Cumple
Dimensiones	Según manual de señalización vial	Cumple
Acabado	Sin residuos o faltantes	Cumple
Reflectivos	Bien ubicados y adheridos	Cumple
Tornillos	Dimensiones y cantidad correcta	Cumple

Observaciones: NINGUNA

Revisó:



Ing. Fernando García
ingenieria@meinplas.com
Cel: 3105533415

Anexo 3: Formatos diligenciados de implementación horizontal y vertical

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN LAyC

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

DATOS DE IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD				USAQUEN		FECHA DE INICIO		CUADRILLA					
UPZ				TOBERIN		FECHA DE TERMINACION		ANGELA CORTES TORRES					
ID				EX_01_358_1842_12									

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UND	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	TACHONES	HITOS	TCH Y EP Und CON ESPIGO	TCH Y EP Und SIN ESPIGO	CANTIDADES		PLANO	OBSERVACIONES
										PINTURA	IMPRIMANTE	DIRECCION	
SOLVENTE	B	PP	7	0,40	4,00					11,20	14,35	CALLE 159B CON CARRERA 13A	1	
SOLVENTE	A	ACH	10	1,00	17,80					17,80	19,58	CARRERA 14C ENTRE CLL 160Y 159	1	
TACHONES	A					135,00	10,00		111			CARRERA 14C ENTRE CLL 160Y 159	1	
SOLVENTE	A	ACH	6	1,00	7,10					7,10	7,81	CALLE160 ENTRE CARRERA 14B Y 14C	1	
TACHONES	A					92,00	6,00		82			CALLE160 ENTRE CARRERA 14B Y 14C	1	
LLANA	B	PP	7	0,40	3,50					9,80	12,60	CALLE160 ENTRE CARRERA 14B Y 14C	1	
IMPRIMANTE	N			0,30	8,50						2,55	CALLE160 ENTRE CARRERA 14B Y 14C	1	BORRADO CON IMPRIMANTE POR RESALTO DE CONCRETO COMUNITARIO
LLANA	B	ZBC		0,30	120,60					36,18	48,24	CARRERA 14 B ENTRE CALLE 160 Y 161	1	
SOLVENTE	B	FDG	1							2,50	3,50	CARRERA 14B ENTRE CALLE 160 Y 161	1	
SOLVENTE	B	VMP 30	1							3,36	10,34	CARRERA 14B ENTRE CALLE 160 Y 161	1	
SOLVENTE	A	PCP	1							3,61	4,66	CARRERA 14B ENTRE CALLE 160 Y 161	1	
LLANA	B	ZBC		0,30	377,80					113,34	151,12	CALLE 155 CON CARRERA 14BIS	2	
LLANA	B	ZBC		0,30	160,00					48,00	64,00	CALLE 157 CON CARRERA 14C	2	
LLANA	B	PP	7	0,40	4,00					11,20	14,35	CALLE 157 CON CARRERA 14C	2	
LLANA	B	PP	8	0,40	4,00					15,32	19,45	CARRERA 14C CON CALLE 157	2	(1*1,3)(1*3)(1*2) PP PEQUEÑAS
LLANA	B	PP	14	0,40	4,00					22,40	28,70	CALLE 155 CON CARRERA 13	3	
LLANA	B	PP	7	.40	3,00					9,04	11,08	CARRERA 13 CALLE 155	3	(1+1,6) PP PEQUEÑA
LLANA	B	ZBC		0,30	288,70					86,61	115,48	CALLE 155 CON CARRERA 13	3	ESTAN SUMADAS LAS DOS CUADRICULAS
SOLVENTE	A	ACH	7	1,00	11,80					11,80	12,98	CARRERA 13A ENTRE DIAG159YCLL161	4	
SOLVENTE	A	PCP	1							3,61	4,66	CARRERA 13A ENTRE DIAG159YCLL161	4	
SOLVENTE	B	VMP 30	1							3,36	10,34	CARRERA 13A ENTRE DIAG159YCLL161	4	
SOLVENTE	B	FDG	1							2,50	3,50	CARRERA 13A ENTRE DIAG159YCLL161	4	
TACHONES	A					100,00	6,00		81			CARRERA 13A ENTRE DIAG159YCLL161	4	
LLANA	B	PP	7							12,68	16,20	CARRERA 13A ENTRE DIAG159YCLL161	4	(1*1)(1+2,7) PP PEQUEÑAS

LLANA	B	ZBC		0,30	119,00					35,70	47,60	CARRERA 13A ENTRE DIAG159YCLL161	4	
SOLVENTE	A	ACH	23	1,00	37,00					37,00	40,70	DIAG 159 ENTRE CARRERA 13 Y CARRERA 13 A	4	
TACHONES	A					342,00	9,00		241			DIAG 159 ENTRE CARRERA 13 Y CARRERA 13 A	4	
LLANA	B	PP	7	0,30	4,00					10,28	13,20	CARRERA 14B ENTRE CALLE 160Y 161	1	(1+1,5)(1*3,2) PP PEQUEÑAS

TOTAL

DESCRIPCION	COLOR	M2
IMPRIMANTE M2	NEGRO	676,99
BICOMPONENTE EN LLANA M2	BLANCO; AMARILLO	410,55
SOLVENTE M^2	BLANCO; AMARILLO	103,84
TACHONES	AMARILLOS	669,00
HITOS	AMARILLOS	31,00
TACHAS Y ESTOPEROLES	CON ESPIGO	-
	SIN ESPIGO	515,00
EP METALICOS	METALICO	
RETIROS	ESTOPEROLES, TACHONES E HITOS	

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN LAyC

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	
UPZ	
ID	

DATOS DE IMPLEMENTACION

FECHA DE INICIO	
FECHA DE TERMINACION	

CUADRILLA: ANGELA CORTES TORRES

MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UND	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	TACHONES	HITOS	TCH Y EP Und CON ESPIGO	TCH Y EP Und SIN ESPIGO	CANTIDADES		DIRECCION	PLANO	OBSERVACIONES
										PINTURA	IMPRIMANTE			
RETIROS									40			CALLE 161 CON AUTOPISTA NTE ✓		
RETIROS							1,00		115			~~CARRERA 9 CON CALLE 159 DANDO~~		
												~~CL 159 A~~		
												CL 163 Auto Nte. ✓		

TOTAL

DESCRIPCION	COLOR	M2
IMPRIMANTE M2	NEGRO	-
BICOMPONENTE EN LLANA M2	BLANCO; AMARILLO	
SOLVENTE M²	BLANCO; AMARILLO	
TACHONES	AMARILLOS	-
HITOS	AMARILLOS	
TACHAS Y ESTOPEROLES	CON ESPIGO	-
	SIN ESPIGO	
EP METALICOS	METALICO	
RETIROS	ESTOPEROLES, TACHONES E HITOS	156,00

Punto de Obra.

PUNTO DE OBRAS SAS

CORTE No 2
FECHA 26-may-20

SEÑALIZACION HORIZONTAL

CONTRATO DE OBRA No.

LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
UBICACIÓN:	AV CALI (KR 127) POR CL 93
No ID	
SENTIDO VIAL:	☐ N-S ☐ S-N ☐ W-E ☐ E-W
H. INICIO ACTIVIDADES:	19 DE MARZO DE 2020
H. FINAL ACTIVIDADES	25 DE MAYO DE 2020

CROQUIS:

FECHA DE APLICACIÓN: 14 DE MAYO DE 2020

TIPO DE PAVIMENTO		APERTURA TRAFICO
RIGIDO	FLEXIBLE	

Tª AMBIENTE (ºc)		Tª PISO		HUMEDAD RELATIVA	
INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL

TIEMPO SECADO (MIN):

NUM	ID_INT	TIPO DE MARCA	COLOR	MATERIAL	UND	CANT.	LONG	ANCHO	AREA	DIRECCION	CONTAMINACION			ESTADO DEL PAVIMENTO			OBSERVACIONES
											A	M	B	B	R	M	
1		PP		BORRADO	M2		52.00	0.40	20.80	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
2		PP		BORRADO	M2		52.00	0.40	20.80	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
3		PC		BORRADO	M2		26	0.16	4.16	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
4		PC		BORRADO	M2		26	0.16	4.16	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
5		LP		BORRADO	M2		10.00	0.60	6.00	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
6		FF		BORRADO	M2		3	1.20	3.60	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
7		LPA		BORRADO	M2		30.00	0.15	4.50	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
8		ZB		IMPRIMANTE	M2		139.40	0.40	55.76	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
9		PP		IMPRIMANTE	M2		53.30	0.50	26.65	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
10		PP		IMPRIMANTE	M2		53.30	0.50	26.65	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
11		PC		IMPRIMANTE	M2		26.00	0.25	6.50	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
12		PC		IMPRIMANTE	M2		26.00	0.25	6.50	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
13		CICLORU		IMPRIMANTE	M2		10.30	2.10	21.63	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
14		CICLORU		IMPRIMANTE	M2		10.30	2.10	21.63	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
15		CICLORU		IMPRIMANTE	M2		8.20	2.20	18.04	CL 93 POR AV CALI (KR 127)							
16		FF		IMPRIMANTE	M2		3.00	1.50	4.50	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
17		LP		IMPRIMANTE	M2		10.10	0.70	7.07	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
18		ZB	AMARILLO	BICOMPONENTE	M2		139.40	0.30	41.82	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
19		PP	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		52.00	0.40	20.80	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
20		PP	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		52.00	0.40	20.80	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
21		PC	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		26.00	0.16	4.16	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
22		PC	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		26.00	0.16	4.16	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
23		CICLORU	AZUL	BICOMPONENTE	M2		10.30	2.10	21.63	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
24		CICLORU	AZUL	BICOMPONENTE	M2		10.00	2.00	20.00	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
25		CICLORU	AZUL	BICOMPONENTE	M2		8.10	2.10	17.01	CL 93 POR AV CALI (KR 127)							
26		FF	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		3.00	1.20	3.60	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
27		LP	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		10.00	0.60	6.00	AV CALI (KR 127) POR CL 93							
28																	
29																	
30																	
31																	

OBSERVACIONES:

SUB CONTRATISTA: PUNTO DE OBRA SAS
NOMBRE: EDWIN MUNEVAR
FIRMA:

CONTRATISTA: Sandra Bgta Fernanda Chaves
NOMBRE:
FIRMA:
3/jun/20

CANTIDADES

IMP	194.9		TCH	
COLOR	160.0		BR	64.02
EP	0.0		BL	

PUNTO DE OBRAS SAS

CORTE No 2
FECHA 26-may-20

SEÑALIZACION HORIZONTAL

CONTRATO DE OBRA No.

LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
UBICACIÓN:	CL 166 ENTRE KR 8G Y 8H
No ID	
SENTIDO VIAL:	☐ N-S ☐ S-N ☐ W-E ☐ E-W
H. INICIO ACTIVIDADES:	19 DE MARZO DE 2020
H. FINAL ACTIVIDADES	25 DE MAYO DE 2020

CROQUIS:

FECHA DE APLICACIÓN: 20 DE MAYO DE 2020

TIPO DE PAVIMENTO		APERTURA TRAFICO
RIGIDO	FLEXIBLE	

Tº AMBIENTE (ºc)		Tº PISO		HUMEDAD RELATIVA	
INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL

TIEMPO SECADO (MIN):

NUM	ID_INT	TIPO DE MARCA	COLOR	MATERIAL	UND	CANT.	LONG	ANCHO	AREA	DIRECCION	CONTAMINACION			ESTADO DEL PAVIMENTO			OBSERVACIONES
											A	M	B	B	R	M	
1		BR		BORRADO	M2		70.30	0.15	10.55	KR 7D ENTRE CL 163A Y CL 164							
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	

Notas: este borrado paga Q4 k.

OBSERVACIONES:

SUB CONTRATISTA:	PUNTO DE OBRA SAS	CONTRATISTA:	
NOMBRE:	EDWIN MUNEVAR	NOMBRE:	Fernanda Chaves
FIRMA:		FIRMA:	26/05/20

CANTIDADES

IMP				TCH	
COLO				BR	10.55
EP				BL	

Punto de Obra.

PUNTO DE OBRAS SAS

CORTE No 2
FECHA 26-may-20

SEÑALIZACION HORIZONTAL

CONTRATO DE OBRA No.

LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
UBICACIÓN:	CL 175 POR KR 58
No ID	
SENTIDO VIAL:	☐ N-S ☐ S-N ☐ W-E ☐ E-W
H. INICIO ACTIVIDADES:	19 DE MARZO DE 2020
H. FINAL ACTIVIDADES	25 DE MAYO DE 2020

CROQUIS:

FECHA DE APLICACIÓN: 17 DE MARZO 2020

TIPO DE PAVIMENTO		APERTURA TRAFICO
RIGIDO	FLEXIBLE	

Tº AMBIENTE (ºc)		Tº PISO		HUMEDAD RELATIVA	
INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL

TIEMPO SECADO (MIN):

NUM	ID_INT	TIPO DE MARCA	COLOR	MATERIAL	UND	CANT.	LONG	ANCHO	AREA	DIRECCION	CONTAMINACION			ESTADO DEL PAVIMENTO			OBSERVACIONES
											A	M	B	B	R	M	
1		BR		BORRADO	M2		793.30	0.15	119.00	CL 175 POR KR 58 OK							
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	

OBSERVACIONES:

SUB CONTRATISTA:	PUNTO DE OBRA SAS	CONTRATISTA:	
NOMBRE:	EDWIN MUNEVAR	NOMBRE:	Fernanda Chaves
FIRMA:		FIRMA:	26/05/20

CANTIDADES

IMP	0.0		TCH	
COLOR	0.0		BR	119.00
EP	119.0		BL	

Punto de Obra.

PUNTO DE OBRAS SAS

CORTE No 2
FECHA 26-may-20

SEÑALIZACION HORIZONTAL

CONTRATO DE OBRA No.

LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
UBICACIÓN:	CL 157 Y 161 ENTRE AV KR 9 Y KR 14C
No ID	PARQUE DE LA VIDAD
SENTIDO VIAL:	☐ N-S ☐ S-N ☐ W-E ☐ E-W
H. INICIO ACTIVIDADES:	19 DE MARZO DE 2020
H. FINAL ACTIVIDADES	25 DE MAYO DE 2020

CROQUIS:

FECHA DE APLICACIÓN: DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2020

TIPO DE PAVIMENTO		APERTURA TRAFICO			
RIGIDO		FLEXIBLE			
Tº AMBIENTE (ºc)		Tº PISO		HUMEDAD RELATIVA	
INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL

TIEMPO SECADO (MIN):

NUM	ID_INT	TIPO DE MARCA	COLOR	MATERIAL	UND	CANT.	LONG	ANCHO	AREA	DIRECCION	CONTAMINACION			ESTADO DEL PAVIMENTO			OBSERVACIONES
											A	M	B	B	R	M	
1		EP		METALICO	UND	60.0			60.00	KR 14C ENTRE CL 157 Y CL 160							
2		EP		METALICO	UND	60.0			60.00	KR 14C ENTRE CL 157 Y CL 160							
3		EP		METALICO	UND	62.0			62.00	KR 14C ENTRE CL 157 Y CL 160							
4		EP		METALICO	UND	64.0			64.00	KR 14C ENTRE CL 157 Y CL 160							
5		EP		METALICO	UND	88.0			88.00	KR 14C ENTRE CL 157 Y CL 160							
6		EP		METALICO	UND	92.0			92.00	KR 14C ENTRE CL 157 Y CL 160							
7		EP		METALICO	UND	59.0			59.00	KR 14C ENTRE CL 157 Y CL 160							
8		EP		METALICO	UND	70.0			70.00	KR 14C ENTRE CL 157 Y CL 160							
9		EP		METALICO	UND	70.0			70.00	KR 14C ENTRE CL 157 Y CL 160							
10		EP		METALICO	UND	60.0			60.00	KR 14B ENTRE DG 159B Y CL 160							
11		EP		METALICO	UND	60.0			60.00	KR 14B ENTRE DG 159B Y CL 160							
12		EP		METALICO	UND	60.0			60.00	KR 14B ENTRE DG 159B Y CL 160							
13		EP		METALICO	UND	64.0			64.00	KR 14B ENTRE DG 159B Y CL 160							
14		EP		METALICO	UND	60.0			60.00	DG 159B POR KR 14A Y KR 14B							
15		EP		METALICO	UND	60.0			60.00	DG 159B POR KR 14A Y KR 14B							
16		EP		METALICO	UND	60.0			60.00	DG 159B POR KR 14A Y KR 14B							
17		EP		METALICO	UND	60.0			60.00	DG 159B POR KR 14A Y KR 14B							
18		EP		METALICO	UND	61.0			61.00	DG 159B POR KR 14A Y KR 14B							
19		EP		METALICO	UND	60.0			60.00	DG 159B POR KR 14A Y KR 14B							
20		EP		METALICO	UND	60.0			60.00	DG 159B POR KR 14A Y KR 14B							
21		EP		METALICO	UND	60.0			60.00	DG 159B POR KR 14A Y KR 14B							
22		EP		METALICO	UND	97.0			97.00	DG 159 ENTRE KR 13A Y KR 14A							
23		EP		METALICO	UND	96.0			96.00	DG 159 ENTRE KR 13A Y KR 14A							
24		EP		METALICO	UND	90.0			90.00	KR 13A POR DG 159 Y CL 160							
25		EP		PLASTICO	UND	56.0			56.00	KR 13A POR DG 159 Y CL 160							
26		EP		PLASTICO	UND	56.0			56.00	KR 13A POR DG 159 Y CL 160							
27		EP		PLASTICO	UND	60.0			60.00	KR 13A POR DG 159 Y CL 160							
28		EP		PLASTICO	UND	56.0			56.00	KR 13A POR DG 159 Y CL 160							
29		EP		METALICO	UND	60.0			60.00	CL 158A ENTRE KR 12 Y AV KR 9							
30		EP		METALICO	UND	60.0			60.00	CL 158A ENTRE KR 12 Y AV KR 9							
31		EP		METALICO	UND	56.0			56.00	CL 159A ENTRE KR 13A Y KR 14A							
32																	
35																	

OBSERVACIONES:

SUB CONTRATISTA: PUNTO DE OBRA SAS
NOMBRE: EDWIN MUNEVAR
FIRMA:

CONTRATISTA: Señaliza Bogotá
NOMBRE: Fernanda Chaves
FIRMA:
7/Jun/20.

CANTIDADES

IMP			TCH	
COLOR			BR	
EP	2037.0		BL	

Punto de Obra.

PUNTO DE OBRAS SAS

CORTE No 2
FECHA 26-may-20

SEÑALIZACION HORIZONTAL

CONTRATO DE OBRA No.

LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
UBICACIÓN:	CL 134 POR AUTONORTE
No ID	
SENTIDO VIAL:	☐ N-S ☐ S-N ☐ W-E ☐ E-W
H. INICIO ACTIVIDADES:	19 DE MARZO DE 2020
H. FINAL ACTIVIDADES	25 DE MAYO DE 2020

CROQUIS:

FECHA DE APLICACIÓN: DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2020

TIPO DE PAVIMENTO		APERTURA TRÁFICO
RIGIDO	FLEXIBLE	

Tº AMBIENTE (ºc)		Tº PISO		HUMEDAD RELATIVA	
INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL

TIEMPO SECADO (MIN):

NUM	ID_INT	TIPO DE MARCA	COLOR	MATERIAL	UND	CANT.	LONG	ANCHO	AREA	DIRECCION	CONTAMINACION			ESTADO DEL PAVIMENTO			OBSERVACIONES
											A	M	B	B	R	M	
1		FGD		IMPRIMANTE	M2		2.20	1.00	2.20	CL 134A POR AUTONORTE							
2		LPA		IMPRIMANTE	M2		2.50	0.70	1.75	CL 134A POR AUTONORTE							
3		PP		IMPRIMANTE	M2		28.70	0.50	14.35	CL 134A POR AUTONORTE							
4		CICLORU		IMPRIMANTE	M2		6.00	2.40	14.39	CL 134A POR AUTONORTE							
5		PC		IMPRIMANTE	M2		14.00	0.25	3.50	CL 134A POR AUTONORTE							
6		PPARE		IMPRIMANTE	M2		6.75	1.00	6.75	CL 134A POR AUTONORTE							
7		RCI		IMPRIMANTE	M2	3	4.95		14.85	CL 134 BIS POR AUTONORTE							
8		PP		IMPRIMANTE	M2		36.90	0.50	18.45	CL 134 BIS POR AUTONORTE							
9		ACH		IMPRIMANTE	M2		16.00	1.10	17.60	CL 134 BIS POR AUTONORTE							
10		PSOLO		IMPRIMANTE	M2		7.50	1.00	7.50	AUTONORTE POR CL 134 BIS							
11		FGD		IMPRIMANTE	M2		2.20	1.00	2.20	CL 134 BIS POR AUTONORTE							
12		PP		IMPRIMANTE	M2		36.90	0.50	18.45	CL 134 BIS POR AUTONORTE							
13		PV30		IMPRIMANTE	M2	2	4.05	2.00	16.18	CL 134 BIS POR AUTONORTE							
14		ACH		IMPRIMANTE	M2		8.70	1.10	9.57	CL 134 BIS POR AUTONORTE							
15		CP		IMPRIMANTE	M2		2.10	1.00	2.10	CL 134A POR AUTONORTE							
16		FF		IMPRIMANTE	M2	2	1.80	1.00	3.60	AUTONORTE POR CL 134 BIS							
17		FGD	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		1.50	1.00	1.50	CL 134A POR AUTONORTE							
18		LPA	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		2.40	0.60	1.44	CL 134A POR AUTONORTE							
19		PP	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		28.00	0.40	11.20	CL 134A POR AUTONORTE							
20		CICLORU	AZUL	BICOMPONENTE	M2		5.90	2.29	13.50	CL 134A POR AUTONORTE							
21		PC	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		14.00	0.16	2.24	CL 134A POR AUTONORTE							
22		PPARE	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		1.67	1.00	1.67	CL 134A POR AUTONORTE							
23		RCI	BLANCO	BICOMPONENTE	M2	3	4.20		12.60	CL 134 BIS POR AUTONORTE							
24		PP	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		36.00	0.40	14.40	CL 134 BIS POR AUTONORTE							
25		ACH	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		15.90	1.00	15.90	CL 134 BIS POR AUTONORTE							
26		PSOLO	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		1.96	1.00	1.96	AUTONORTE POR CL 134 BIS							
27		FGD	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		1.50	1.00	1.50	CL 134 BIS POR AUTONORTE							
28		PP	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		36.00	0.40	14.40	CL 134 BIS POR AUTONORTE							
29		PV30	BLANCO	BICOMPONENTE	M2	2	3.36	1.00	6.72	CL 134 BIS POR AUTONORTE							
30		ACH	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		8.60	1.00	8.60	CL 134 BIS POR AUTONORTE							
31		CP	BLANCO	BICOMPONENTE	M2		1.40	1.00	1.40	CL 134A POR AUTONORTE							
32		FF	BLANCO	BICOMPONENTE	M2	2	1.20	1.00	2.40	AUTONORTE POR CL 134 BIS							

OBSERVACIONES:

SUB CONTRATISTA: PUNTO DE OBRA SAS
NOMBRE: EDWIN MUNEVAR
FIRMA:

CONTRATISTA:
NOMBRE:
FIRMA:

CANTIDADES

IMP	153.4		TCH	
COLOR	111.4		BR	
EP			BL	

Punto de Obra.

PUNTO DE OBRAS SAS

CORTE No 2
FECHA 26-may-20

SEÑALIZACION HORIZONTAL

CONTRATO DE OBRA No.

LOCALIZACIÓN	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
UBICACIÓN:	CL 134 POR AUTONORTE
No ID	
SENTIDO VIAL:	☐ N-S ☐ S-N ☐ W-E ☐ E-W
H. INICIO ACTIVIDADES:	19 DE MARZO DE 2020
H. FINAL ACTIVIDADES	25 DE MAYO DE 2020

CROQUIS:

FECHA DE APLICACIÓN: DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2020

TIPO DE PAVIMENTO		APERTURA TRAFICO
RIGIDO	FLEXIBLE	

Tª AMBIENTE (ºc)		Tª PISO		HUMEDAD RELATIVA	
INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL

TIEMPO SECADO (MIN):

NUM	ID_INT	TIPO DE MARCA	COLOR	MATERIAL	UND	CANT.	LONG	ANCHO	AREA	DIRECCION	CONTAMINACION			ESTADO DEL PAVIMENTO			OBSERVACIONES
											A	M	B	B	R	M	
1		TCH		TRANSPASABLES		12			12.00	AUTONORTE POR CL 134A							
2		TCH		NO TRANSPASABLES		14			14.00	AUTONORTE POR CL 134A							
3		BALIZA		HITO		7			7.00	AUTONORTE POR CL 134A							
4		TR		CON ESPIGO		133			133.00	CL 134BIS POR AUTONORTE							
5		TR		SIN ESPIGO		7			7.00	CL 134A POR AUTONORTE							
6		TR		SIN ESPIGO		168			168.00	CL 134BIS POR AUTONORTE							
7		TR		SIN ESPIGO		66			66.00	AUTONORTE POR CL 134A							
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	

OBSERVACIONES:

SUB CONTRATISTA: PUNTO DE OBRA SAS
NOMBRE: EDWIN MUNEVAR
FIRMA:

CONTRATISTA:
NOMBRE:
FIRMA:

CANTIDADES

IMP			TCH	12.0
TCH NO	14.0		TR	241.0
EP/TR	133.0		BL	7

Anexo 4: Formatos de inspección

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
FORMATO DE INSPECCIÓN PRELIMINAR

Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO: 2019-1780

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

OBJETO: El contratista se obliga para con la SECRETARIA DISTRITAL de MOVILIDAD a realizar de forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con las cantidades y caracteristicas en los studios previos, al anexo técnico, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista.

DATOS DE INTERVENTORÍA

CONTRATO: 2019-1799

INTERVENTORÍA: CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019

ID: EX_01_356_1842_12 VERSIÓN V1 FECHA INSPECCIÓN 7/05/2020

LOCALIDAD: 1 - USAQUEN

DIRECCIÓN: CL 151 HASTA AC 153 ENTRE LA AK 9 Y KR 14B

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: SDM ZE BAHÍA CICLORUTA

CONDICIONES GENERALES

N°	TRAMO	TPD			CONTAMI-NACION			ESTADO DEL PAVIMENTO			TIPO DE VÍA			IMPLEMEN-TACIÓN		IMPRIMANTE		TIPO PINTURA						DISPOSITIVOS											
																		CORTA DURACIÓN			LARGA DURACIÓN			EP		TR		RPA		BL		TCH		BA	
		A	M	B	A	M	B	B	R	M	A	M	B	SI	NO	SI	NO	B. SOLVENTE	B. AGUA	TERMOP.	EXTRUSIÓN	SPRAY	LLANA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CL 151 entre KR 14B y KR 14 costado Norte	X				X		X			X			X		X		X				X	X		X	X		X		X					X
2	CL 151 entre KR 14 y KR 11 costado Norte	X				X			X		X			X		X		X				X			X	X		X	X		X			X	
3	KR 14 entre CL 152A y CL 152														X																				
4	KR 14 entre CL 152 y CL 151		X			X		X				X		X		X						X			X		X		X		X		X		X
5	CL 152 entre KR 14 y KR 13			X		X			X			X		X		X		X				X		X		X			X	X		X		X	
6	KR 13 entre CL 152 y AC 153		X				X	X				X		X		X						X		X			X		X		X		X		X
7	KR 13 entre CL 151 y CL 152														X							X													
8	CL 152 entre KR 13 y KR 12c	X				X			X			X		X		X		X				X			X	X		X	X		X		X	
9	KR 12C entre CL 151 y CL 152		X			X		X				X		X		X		X				X		X		X			X	X		X			X
10	KR 12C entre CL 152 y AC 153		X				X		X			X		X		X						X		X			X		X		X		X		X
11	CL 152 entre KR 12c y ak 9	X					X		X			X		X		X		X				X		X		X			X	X		X		X	
12	CL 151 entre KR 14B y KR 12B costado Sur	X				X		X			X			X		X						X	X		X	X		X		X		X	X		
13	CL 151 entre KR 12B y KR 11 costado Sur	X				X			X		X			X		X						X			X	X		X		X		X	X		

CONCLUSIONES INSPECCIÓN PRELIMINAR

RECOMENDACIÓN DE HORARIO PARA IMPLEMENTACIÓN: DÍA NOCHE 24 H

PLAZO DE EJECUCIÓN EN CONDICIONES NORMALES: días

OBSERVACIONES:

FIRMA Roberto Carlos Pérez P.
NOMBRE ROBERTO CARLOS PEREZ PATIÑO
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE
INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
FORMATO DE INSPECCIÓN PRELIMINAR

cpt Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO: 2019-1780

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

OBJETO: El contratista se obliga para con la SECRETARIA DISTRITAL de MOVILIDAD a realizar de forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con las cantidades y caracteristicas en los studios previos, al anexo técnico, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista.

DATOS DE INTERVENTORÍA

CONTRATO: 2019-1799 INTERVENTORÍA: CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019

ID: MV_AV_CALI_941_09 V24 CONECTATE AV CALI CON KR 93 VERSIÓN V24 FECHA INSPECCIÓN 19/03/2020

LOCALIDAD: 11-SUBA

DIRECCIÓN: AV CALI CON CALLE 93

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: SDM ZE BAHÍA CICLORUTA

CONDICIONES GENERALES

N°	TRAMO	TPD			CONTAMI-NACION			ESTADO DEL PAVIMENTO			TIPO DE VÍA			IMPLEMEN-TACIÓN		IMPRIMANTE		TIPO PINTURA						DISPOSITIVOS											
																		CORTA DURACIÓN		LARGA DURACIÓN				EP		TR		RPA		BL		TCH		BA	
		A	M	B	A	M	B	B	R	M	A	M	B	SI	NO	SI	NO	B. SOLVENTE	B. AGUA	TERMOP.	EXTRUSIÓN	SPRAY	LLANA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	AV CALI CON CARRERA 93	X					X		X		X			X		X						X	X		X	X			X		X		X		X
2	CARRERA 93 CON AV CALI	X					X		X		X			X		X						X	X		X	X			X		X		X		X
3	CICRORUTA COSTADO ORIENTE	X					X	X			X			X			X	X							X		X		X		X		X		X
4	CICRORUTA COSTADO OCCIDENTE NORTE	X			X			X			X			X			X	X							X		X		X		X		X		X
5	CICRORUTA COSTADO OCCIDENTE SUR	X					X	X			X			X			X	X							X		X		X		X		X		X
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			

CONCLUSIONES INSPECCIÓN PRELIMINAR

RECOMENDACIÓN DE HORARIO PARA IMPLEMENTACIÓN: DÍA NOCHE 24 H

PLAZO DE EJECUCIÓN EN CONDICIONES NORMALES: días

OBSERVACIONES:

FIRMA Roberto Carlos Perez P.
NOMBRE ROBERTO CARLOS PEREZ PATIÑO
CONTRATISTA

FIRMA Hannah Cabrera T.
NOMBRE
INTERVENTORÍA

MATRIZ DE GARANTIAS

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZA BTA	INTERVENTORIA:	CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019	CONTRATO:	2019-1780
DISEÑO:	EX_01_358_1842_12 PARQUE LA VIDA	LOCALIDAD:	01-USAQUEN	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ	

CL 157 ENTRE KR 15 - KR 14C; CL 155 ENTRE KRA 14BIS - KRA 9; DG 159B ENTRE KRA 14A - KRA 14B; CL 160 ENTRE KRA 14B - 14C						TRAMO N°: 3-10-20-22	
Material	**TPD**	**Contaminacion**	**Estado del Pavimento**	**Afectacion por condiciones geometricas**	**Garantia (meses)**	**Garantia adicional (30%)**	**Garantia Total (meses)**
Estoperoles y tachas con espigo	ALTO	BAJO	BUENO	ALTO	10	3	13
Hitos y tachones - Bordillos transpasables y no transpasables					10	0	10
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					11	0	11
Pintura acrilica base solvente					8	0	8
Pintura de dos componentes por spray					21	0	21
						COMBINACIÓN:	19

CL 157 ENTRE KR 14C - KRA 14A; CL 157 ENTRE KRA 14A - KRA 13; KRA 14C ENTRE CL 160 - CL 157						TRAMO N°: 4-5-23	
Material	**TPD**	**Contaminacion**	**Estado del Pavimento**	**Afectacion por condiciones geometricas**	**Garantia (meses)**	**Garantia adicional (30%)**	**Garantia Total (meses)**
Estoperoles y tachas con espigo	ALTO	BAJA	REGULAR	ALTA	6	1,8	8
Hitos y tachones - Bordillos transpasables y no transpasables					8	0	8
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					9	0	9
Pintura acrilica base solvente					7	0	7
Pintura de dos componentes por spray					15	0	15
						COMBINACIÓN:	22

KRA 14 BIS ENTRE CL 157 - CL 155						TRAMO N°: 6	
Material	**TPD**	**Contaminacion**	**Estado del Pavimento**	**Afectacion por condiciones geometricas**	**Garantia (meses)**	**Garantia adicional (30%)**	**Garantia Total (meses)**
Estoperoles y tachas con espigo	MEDIO	MEDIA	REGULAR	MEDIA	13	3,9	17
Hitos y tachones - Bordillos transpasables y no transpasables					11	0	11
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					16	0	16
Pintura acrilica base solvente					7	0	7
						COMBINACIÓN:	41

CL 155 ENTRE KRA 15 - KRA 14BIS						TRAMO N°: 7	
Material	**TPD**	**Contaminacion**	**Estado del Pavimento**	**Afectacion por condiciones geometricas**	**Garantia (meses)**	**Garantia adicional (30%)**	**Garantia Total (meses)**
Estoperoles y tachas con espigo	ALTO	MEDIA	REGULAR	MEDIA	6	1,8	8
Hitos y tachones - Bordillos transpasables y no transpasables					8	0	8
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					10	0	10
Pintura de dos componentes por spray					12	0	12
						COMBINACIÓN:	14

CL 155 CON KRA 14BIS; CL 158A ENTRE KRA 13 - KRA 9						TRAMO N°: 9-13	
Material	**TPD**	**Contaminacion**	**Estado del Pavimento**	**Afectacion por condiciones geometricas**	**Garantia (meses)**	**Garantia adicional (30%)**	**Garantia Total (meses)**
Estoperoles y tachas con espigo	ALTO	MEDIA	REGULAR	ALTO	6	1,8	8
Hitos y tachones - Bordillos transpasables y no transpasables					6	0	6
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					6	0	6
Pintura de dos componentes por spray					11	0	11
						COMBINACIÓN:	13

KRA 13 ENTRE CL 157 - CL 158A; DG 159 ENTRE CL 158A - CL 159A						TRAMO N°: 12-17	
Material	**TPD**	**Contaminacion**	**Estado del Pavimento**	**Afectacion por condiciones geometricas**	**Garantia (meses)**	**Garantia adicional (30%)**	**Garantia Total (meses)**
Estoperoles y tachas con espigo	ALTO	BAJA	REGULAR	MEDIA	11	3,3	14
Hitos y tachones - Bordillos transpasables y no transpasables					9	0	9
Pintura acrilica base solvente					7	0	7
Pintura de dos componentes por spray					17	0	17
						COMBINACIÓN:	23

KRA 13A ENTRE CL 160 -CL 159A						TRAMO N°: 16	
Material	**TPD**	**Contaminacion**	**Estado del Pavimento**	**Afectacion por condiciones geometricas**	**Garantia (meses)**	**Garantia adicional (30%)**	**Garantia Total (meses)**
Estoperoles y tachas con espigo	BAJO	BAJA	REGULAR	MEDIO	19	5,7	25
Hitos y tachones - Bordillos transpasables y no transpasables					15	0	15
Pintura acrilica base solvente					9	0	9
						COMBINACIÓN:	77

CL 159A ENTRE KRA 13A - KRA 14A						TRAMO N°: 18	
Material	**TPD**	**Contaminacion**	**Estado del Pavimento**	**Afectacion por condiciones geometricas**	**Garantia (meses)**	**Garantia adicional (30%)**	**Garantia Total (meses)**
Estoperoles y tachas con espigo	ALTO	MEDIA	BUENO	ALTA	6	1,8	8
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					9	0	9
Pintura de dos componentes por spray					17	0	17
						COMBINACIÓN:	10

KRA 14B ENTRE CL 160 - CL 161						TRAMO N°: 21	
Material	**TPD**	**Contaminacion**	**Estado del Pavimento**	**Afectacion por condiciones geometricas**	**Garantia (meses)**	**Garantia adicional (30%)**	**Garantia Total (meses)**
Estoperoles y tachas con espigo	BAJO	BAJA	BUENO	MEDIO	22	6,6	29
Pintura acrilica base solvente					12	0	12
						COMBINACIÓN:	74

KRA 12 ENTRE CL 158A - CL 160						TRAMO N°: 14	
Material	**TPD**	**Contaminacion**	**Estado del Pavimento**	**Afectacion por condiciones geometricas**	**Garantia (meses)**	**Garantia adicional (30%)**	**Garantia Total (meses)**
Pintura acrilica base solvente	BAJO	ALTA	MALO	MEDIO	6	0	6
						COMBINACIÓN:	62

FIRMA Roberto Carlos Perez P.
NOMBRE Roberto Carlos Pérez
CONTRATISTA

FIRMA Gabriel H Torres R
NOMBRE GABRIEL HARBEY TORRES RECALDE
INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
FORMATO DE INSPECCIÓN PRELIMINAR

cpt Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO: 2019-1780

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

OBJETO: El contratista se obliga para con la SECRETARIA DISTRITAL de MOVILIDAD a realizar de forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con las cantidades y caracteristicas en los studios previos, al anexo técnico, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista.

DATOS DE INTERVENTORÍA

CONTRATO: 2019-1799

INTERVENTORÍA: CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019

ID: EX_01_358_1842_12 PARQUE LA VIDA

VERSIÓN V1

FECHA INSPECCIÓN (18-19)-02-2020

LOCALIDAD: 01-USAQUEN

DIRECCIÓN: CL 153 HASTA CL 161 ENTRE KRA 9 Y KRA 15

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

SDM

ZE

BAHÍA

CICLORUTA

CONDICIONES GENERALES

N°	TRAMO	TPD			CONTAMI-NACION			ESTADO DEL PAVIMENTO			TIPO DE VÍA			IMPLEMEN-TACIÓN		IMPRIMANTE		TIPO PINTURA						DISPOSITIVOS											
																		CORTA DURACIÓN		LARGA DURACIÓN				EP		TR		RPA		BL		TCH		BA	
		A	M	B	A	M	B	B	R	M	A	M	B	SI	NO	SI	NO	B. SOLVENTE	B. AGUA	TERMOP.	EXTRUSIÓN	SPRAY	LLANA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CL 159 ENTRE AK 15 - CL 157	X			X					X	X				X																			
2	KR 15 ENTRE CL 159 - CL 157	X			X					X		X			X																			
3	CL 157 ENTRE KR 15 - KR 14C	X					X	X			X			X		X						X	X	X			X		X		X		X	X	
4	CL 157 ENTRE KR 14C - KRA 14A	X					X		X		X			X		X						X		X		X			X	X		X		X	
5	CL 157 ENTRE KRA 14A - KRA 13	X					X		X		X			X		X								X		X			X	X		X		X	
6	KRA 14 BIS ENTRE CL 157 - CL 155		X			X			X			X		X		X		X						X		X			X	X		X		X	
7	CL 155 ENTRE KRA 15 - KRA 14BIS	X				X			X			X		X		X						X		X		X			X	X		X		X	
8	KRA 14 BIS ENTRE CL 155 - CL 153			X	X					X		X			X										X	X			X	X		X		X	
9	CL 155 - KRA 14BIS	X				X			X		X			X		X						X		X		X			X	X		X		X	
10	CL 155 ENTRE KRA 14BIS - KRA 9	X					X	X			X			X		X						X	X	X		X			X	X		X		X	
11	KRA 13 ENTRE CL 155 - CL 157	X					X			X		X			X							X		X		X			X	X		X			X
12	KRA 13 ENTRE CL 157 - CL 158A	X					X		X			X		X		X						X		X			X		X		X		X	X	
13	CL 158A ENTRE KRA 13 - KRA 9	X				X			X		X			X		X									X		X		X		X		X		X
14	KRA 12 ENTRE CL 158A - CL 160			X	X					X		X			X		X	X																	
15	CL 160 ENTRE KRA 12 - KRA13A			X	X					X		X			X									X		X			X	X		X			X
16	KRA 13A ENTRE CL 160 -CL 159A			X			X		X			X		X		X		X						X		X			X	X		X			X
17	DG 159 ENTRE CL 158A - CL 159A	X					X		X			X		X		X		X				X		X			X		X		X		X	X	
18	CL 159A ENTRE KRA 13A - KRA 14A	X				X		X			X			X		X						X		X		X			X	X		X		X	
19	KRA 14A ENTRE CL 157 - CL 159A		X		X					X		X			X																				
20	DG 159B ENTRE KRA 14A - KRA 14B	X					X	X			X			X		X						X	X	X			X		X		X		X	X	
21	KRA 14B ENTRE CL 160 - CL 161			X			X	X				X		X		X		X						X			X		X		X		X		X
22	CL 160 ENTRE KRA 14B - 14C	X					X	X			X			X		X		X				X		X		X			X	X		X			X
23	KRA 14C ENTRE CL 160 - CL 157	X					X		X		X			X		X																			

CONCLUSIONES INSPECCIÓN PRELIMINAR

RECOMENDACIÓN DE HORARIO PARA IMPLEMENTACIÓN: DÍA [ ] NOCHE [ ] 24 H [ ]

PLAZO DE EJECUCIÓN EN CONDICIONES NORMALES: días

OBSERVACIONES: * KRA 12 ENTRE CL 158A - CL 160 TRAMO 14 REALIZAR EN BASE SOLVENTE EL SPT, LOS PE Y SEÑALES VERTICALES SP-46B *KRA 13A ENTRE CL 160 -CL 159A ESTOPEROLES PLASTICOS CON ESPIGO
* FDD EN LA CALLE 160 CON KRA 14 EN BASE SOLVENTE * ZBC Y PP EN PLASTICO EN FRIO LLANA * ACHURADOS ENCERRADOS CON DISPOSITIVOS PINTURA BASE SOLVENTE

FIRMA Roberto Carlos Perez P.
NOMBRE ROBERTO CARLOS PEREZ PATIÑO
CONTRATISTA

FIRMA Gabriel H. Torres R
NOMBRE GABRIEL HARBEY TORRES RECALDE
INTERVENTORÍA

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ — SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD — FORMATO DE INSPECCIÓN PRELIMINAR — AIRTIFICIAL

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO: 2019-1780

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

OBJETO: El contratista se obliga para con la SECRETARÍA DISTRITAL de MOVILIDAD a realizar de forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con las cantidades y características en los studios previos, el anexo técnico, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista.

DATOS DE INTERVENTORÍA

CONTRATO: 2019-1799

INTERVENTORÍA: CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019

ID: EX-01-295-1236-11

VERSIÓN 2

FECHA INSPECCIÓN 21-01-2020 (22-01-2020)

LOCALIDAD: 01- Usaquen

DIRECCIÓN:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: SDM ZE BAHÍA CICLORUTA

CONDICIONES GENERALES

N°	TRAMO	TPD A	TPD M	TPD B	CONTAMINACIÓN A	CONTAMINACIÓN M	CONTAMINACIÓN B	ESTADO DEL PAVIMENTO B	ESTADO DEL PAVIMENTO R	ESTADO DEL PAVIMENTO M	TIPO DE VÍA A	TIPO DE VÍA M	TIPO DE VÍA B	IMPLEMENTACIÓN SI	IMPLEMENTACIÓN NO	INSTRUMENTO SI	INSTRUMENTO NO	TIPO PINTURA CORTA DURACIÓN B. SOLVENTE	CORTA DURACIÓN B. AGUA	LARGA DURACIÓN TERMOP.	LARGA DURACIÓN EXTRUSIÓN	SPRAY	LLANA	DISPOSITIVOS EP SI	EP NO	TR SI	TR NO	RTA SI	RTA NO	BL SI	BL NO	TCH SI	TCH NO	BA SI	BA NO
1	Kr 8F entre Cll 165 y Cll 163 A		X			X		X					X	X		X						X		X		X		X			X	X		
2	Kr 8F Bis A entre Cll 163A y Cll 164A		X				X	X					X		X		X					X		X		X		X		X		X	X	
3	Kr 8F Bis A entre Cll 164A y Cll 165		X				X		X				X	X		X						X		X	X		X		X		X	X		
4	Cll 165 entre Kr 8H y AK9	X				X		X					X	X		X						X		X		X		X		X		X	X		
5	Kr 8H entre Cll 165 y Cll 163A	X					X	X					X	X		X						X		X		X		X		X				X	
6	Kr 8G Bis A entre Cll 163A y Volteadero			X			X		X				X	X		X						X		X		X		X							
7	Cll 163B entre Kr 8H y AK9			X	X					X			X		X																				
8	Cll 164 entre Kr 8H y AK9			X			X	X					X		X																				
9	Cll 164A entre Kr 8H y AK9			X			X	X					X		X																				
10	Cll 164B entre Kr 8H y AK9			X			X	X					X		X									X		X		X		X		X	X		
11	Kr 8H entre Cll 165 y Cll 165A		X				X		X				X	X		X						X		X		X		X		X		X	X		
12	Cll 165A entre AK9 y Kr 8G			X			X	X					X	X		X						X		X		X		X		X		X	X		
13	Cll 165A entre Kr 8G y Kr 8F			X		X			X				X	X		X						X		X		X		X		X		X	X		
14	Cll 166 entre AK9 y Volteadero		X			X		X					X	X		X						X		X		X		X		X		X	X		
15	Kr 8F entre Cll 165 y Cll 168		X				X	X					X	X		X						X		X		X	X		X					X	
16	Cll 167D entre AK 7 y Kr 8c		X			X		X				X		X		X																				
17	Cll 168 entre AK 7 y Pan de Cll 168			X	X					X		X			X																				
18	Kr 8 entre Cll 167D y Cll 170		X		X				X				X		X									X		X		X		X		X		X	
19	Kr 8c entre Cll 167D y Cll 168		X				X		X				X	X		X						X		X		X		X	X		X		X		
20	Cll 168 entre Kr 8c y Kr 8G		X				X	X					X	X		X						X		X		X		X	X		X		X		
21	Cll 168 entre Kr 8G y Kr 8H			X	X				X				X		X									X		X		X		X		X	X		
22	Cll 168 entre Kr 8H y AK9			X			X	X					X	X		X						X		X		X		X	X		X		X		
23	Kr 8H entre Cll 170 y Cll 165A		X				X	X					X	X		X																				
24	Kr 8G entre Cll 165 y Cll 165A		X			X		X					X		X							X		X		X		X		X		X	X		
25	Kr 8G entre Cll 166 y Cll 165A		X				X	X					X	X		X						X		X		X		X		X		X	X		
26	Kr 8G entre Cll 170 y Cll 168		X			X			X				X	X		X						X		X		X		X		X		X	X		
27	Kr 8c entre Cll 164B y Cll 164A	X					X	X					X		X																				

CONCLUSIONES INSPECCIÓN PRELIMINAR

RECOMENDACIÓN DE HORARIO PARA IMPLEMENTACIÓN: DÍA [ ] NOCHE [ ] 24 H [ ]

PLAZO DE EJECUCIÓN EN CONDICIONES NORMALES: días

OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE Adrian Vinco
CONTRATISTA

FIRMA Hannah Cabrera T.
NOMBRE Hannah Cabrera Trujillo
INTERVENTORÍA

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
FORMATO DE INSPECCIÓN PRELIMINAR

AIRTIFICIAL

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO: 2019-1780

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

OBJETO: El contratista se obliga para con la SECRETARÍA DISTRITAL de MOVILIDAD a realizar de forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con las cantidades y características en los estudios previos, al anexo técnico, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista.

DATOS DE INTERVENTORÍA

CONTRATO: 2019-1799

INTERVENTORÍA: CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019

ID: EX.01-295-1236.11

VERSIÓN 2

FECHA INSPECCIÓN 20-01-2020

LOCALIDAD: 01-Usaquen

DIRECCIÓN:

SDM ZE BAHÍA CICLORUTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

CONDICIONES GENERALES

Nº	TRAMO	TPD A	TPD M	TPD B	CONTAMINACIÓN A	CONTAMINACIÓN M	CONTAMINACIÓN B	ESTADO DEL PAVIMENTO A	ESTADO DEL PAVIMENTO B	ESTADO DEL PAVIMENTO M	TIPO DE VÍA A	TIPO DE VÍA M	TIPO DE VÍA B	IMPLEMENTACIÓN SI	IMPLEMENTACIÓN NO	IMPRIMANTE SI	IMPRIMANTE NO	TIPO PINTURA CORTA DURACIÓN B. SOLVENTE	TIPO PINTURA CORTA DURACIÓN B. AGUA	TIPO PINTURA LARGA DURACIÓN TERMOPL.	TIPO PINTURA LARGA DURACIÓN EXTRUSIÓN	TIPO PINTURA LARGA DURACIÓN SPRAY	TIPO PINTURA LARGA DURACIÓN LLANA	DISPOSITIVOS EP SI	DISPOSITIVOS EP NO	DISPOSITIVOS TA SI	DISPOSITIVOS TA NO	DISPOSITIVOS RPA SI	DISPOSITIVOS RPA NO	DISPOSITIVOS BL SI	DISPOSITIVOS BL NO	DISPOSITIVOS TCH SI	DISPOSITIVOS TCH NO	DISPOSITIVOS BA SI	DISPOSITIVOS BA NO
28	Kr 7D entre Cll 163A y Cll 164			X		X			X				X	X		X						X		X		X		X		X		X		X
29	Cll 164 entre Kr 7D y Kr 7F			X			X		X				X	X		X						X		X		X		X		X		X		X
30	Kr 7F entre Cll 163A y FIN Kr 7F			X			X	X					X	X		X						X		X		X		X		X		X		
31	Cll 164 entre Kr 7F y Kr 7H			X			X	X					X	X		X						X		X		X		X		X		X		
32	Kr 7G entre Cll 163A y FIN Kr 7G			X			X	X					X	X		X						X		X		X		X		X		X		
33	Kr 7H entre Cll 163A y Cll 165			X			X	X					X	X		X						X		X		X		X		X		X		
34	Kr 8A Bis entre Kr 7H y FIN TV			X			X	X					X		X																			
35	Cll 165 entre AK 7 y Kr 8F	X					X	X					X	X		X						X		X		X		X		X		X		
36	Kr 8c entre Cll 165 y Cll 163A	X					X	X					X	X		X						X			X		X		X		X			X
37	Cll 163B entre Kr 8c y Kr 8D			X			X	X					X	X		X						X												
38	Cll 163c Bis entre Kr 8c Bis y Kr 8D			X			X	X					X		X										X		X		X		X			X
39	Kr 8c Bis A entre Cll 163c Bis y Cll 163B			X			X		X				X	X		X						X				X		X		X		X		
40	Kr 8D entre Cll 163A y Cll 165			X			X	X					X		X																			
41	Kr 8c Bis entre Cll 163B y Cll 164A			X			X	X					X	X		X						X				X		X		X		X		
42	Cll 164A entre Kr 8c y Kr 8D			X			X	X					X	X		X						X				X		X		X		X		
43	Kr 8c Bis A entre Cll 164A y Cll 164B			X			X	X					X	X		X						X				X		X		X		X		
44	Kr 8c Bis A entre Cll 164B y Cll 164c			X			X		X				X	X		X						X				X		X		X		X		
45	Kr 8c Bis entre Cll 164B y Cll 164c			X			X		X				X	X		X						X				X		X		X		X		
46	Cll 164B entre Kr 8c y Kr 8c Bis A			X			X	X					X	X		X						X				X		X		X		X		
47	Cll 164B entre Kr 8c Bis A y Kr 8D			X			X			X			X	X		X																		
48	Cll 164c entre Kr 8c y Kr 8D			X	X					X			X		X																			
49	Kr 8D Bis entre Cll 165 y Cll 164B			X			X			X			X		X																			
50	Cll 164A entre Kr 8D y Kr 8F			X			X	X					X		X																			
51	Cll 164A entre Kr 8F y Kr 8F Bis A			X			X	X					X		X							X		X		X		Y		X		X	X	
52	Cll 165 entre Kr 8F y Kr 8H	X				X				X			X	X		X																		
53	Kr 8G entre Cll 166 y Cll 168		X					X	X					X		X																		
54	Cll 164B entre Kr 8B y Kr 8C			X				X	X					X		X																		

CONCLUSIONES INSPECCIÓN PRELIMINAR

RECOMENDACIÓN DE HORARIO PARA IMPLEMENTACIÓN: DÍA NOCHE 24 H

PLAZO DE EJECUCIÓN EN CONDICIONES NORMALES: días

OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE Adriana Urrego
CONTRATISTA

FIRMA Hannah Cabrera T.
NOMBRE Hannah Cabrera Trujillo
INTERVENTORÍA

MATRIZ DE GARANTIAS

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZA BTA	INTERVENTORIA:	CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019	CONTRATO:	2019-1780
DISEÑO:	EX_01_295_1236_11_V2	LOCALIDAD:	01-USAQUEN	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ	

KR 8F ENTRE CLL 165 Y CLL 163A; CLL 166 ENTRE AK 9 Y KR 8G						TRAMO N°: 1-14	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Medio	Medio	Bueno	Baja	18	5,4	23
Estoperoles y tachas					14	4,2	18
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					23	0	23
Pintura de dos componentes por spray					26	0	26
						COMBINACIÓN:	39

KR 8F ENTRE CLL 165 Y CLL 168; CLL 168 ENTRE KR 8C Y KR 8G; KR 8H ENTRE CLL 170 Y CLL 165A; KR 8G ENTRE CLL 166 Y CLL 165A.						TRAMO N°: 15-20-23-25	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Medio	Baja	Bueno	Baja	22	6,6	29
Hitos y tachones - Bordillos transpasables y no transpasables					15	0	15
Estoperoles y tachas					14	4,2	18
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					33	0	33
Pintura de dos componentes por spray					40	0	40
						COMBINACIÓN:	48

KR 8F BIS A ENTRE CLL 164A Y CLL 165; KR 8H ENTRE CLL 165 Y CLL 165A; KR 8C ENTRE CLL 167D Y CLL 168						TRAMO N°: 3-11-19	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Medio	Baja	Regular	Baja	18	5,4	23
Estoperoles y tachas					12	3,6	16
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					23	0	23
Pintura de dos componentes por spray					24	0	24
						COMBINACIÓN:	51

CLL 165 ENTRE KR 8H Y AK 9						TRAMO N°: 4	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Alto	Media	Bueno	Baja	14	4,2	18
Estoperoles y tachas					11	3,3	14
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					18	0	18
Pintura de dos componentes por spray					21	0	21
						COMBINACIÓN:	12

KR 8H ENTRE CLL 165 Y CLL 163A; CLL 165 ENTRE AK7 Y KR 8F; KR 8C ENTRE CLL 165 Y CLL 163A						TRAMO N°: 5-35-36	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Alto	Baja	Bueno	Baja	18	5,4	23
Hitos y tachones - Bordillos transpasables y no transpasables					12	0	12
Estoperoles y tachas					14	4,2	18
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					23	0	23
Pintura de dos componentes por spray					32	0	32
						COMBINACIÓN:	21

KR 8G BIS A ENTRE CLL 163A Y VOLTEADERO; CLL 164 ENTRE KR 7D Y KR 7F; KR 8C BIS A ENTRE CLL 163C BIS Y CLL 163B; KR 8C BIS A ENTRE CLL 164B Y CLL 164C; KR 8C BIS ENTRE CLL 164B Y CLL 164C						TRAMO N°: 6-29-39-44-45	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Bajo	Baja	Regular	Baja	23	6,9	30
Pintura de dos componentes por spray					42	0	42
						COMBINACIÓN:	78

CLL 165A ENTRE AK9 Y KR 8G; CLL 168 ENTRE KR 8H Y AK9; KR 7F ENTRE CLL 163A Y FIN KR 7F; CLL 164 ENTRE KR 7F Y KR 7H; KR 7G ENTRE CLL 163A Y FIN KR 7G; KR 7H ENTRE CLL 163A Y CLL 165; CLL 163B ENTRE KR 8C Y KR 8D; KR 8C BIS ENTRE CLL 163 B Y CLL 164A; CLL 164A ENTRE KR 8C Y KR 8D; KR 8C BIS A ENTRE CLL 164A Y CLL 164B; CLL 164B ENTRE KR 8C Y KR 8C BIS A						TRAMO N°: 12-22-30-31-32-33-37-41-42-43-46	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Bajo	Baja	Bueno	Baja	24	7,2	31
Estoperoles y tachas					18	5,4	23
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					36	0	36
Pintura de dos componentes por spray					48	0	48
						COMBINACIÓN:	75

CLL 165 A ENTRE KR 8G Y KR 8F; KR 7D ENTRE CLL 163A Y CLL 164						TRAMO N°: 13-28	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Bajo	Media	Regular	Baja	21	6,3	27
Estoperoles y tachas					14	4,2	18
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					28	0	28
Pintura de dos componentes por spray					28	0	28
						COMBINACIÓN:	69

CLL 163D ENTRE AK7 Y KR 8C						TRAMO N°: 16	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Medio	Media	Bueno	Media	15	4,5	20
Hitos y tachones - Bordillos transpasables y no transpasables					13	0	13
Estoperoles y tachas					12	3,6	16
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					19	0	19
Pintura de dos componentes por spray					24	0	24
						COMBINACIÓN:	38

KR 8G ENTRE CLL 170 Y CLL 168						TRAMO N°: 26	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Medio	Media	Regular	Baja	16	4,8	21
Estoperoles y tachas					11	3,3	14
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					21	0	21
Pintura de dos componentes por spray					20	0	20
						COMBINACIÓN:	42

CLL 164B ENTRE KR 8C BIS A Y KR 8D						TRAMO N°: 47	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Pintura de dos componentes por spray	Bajo	Baja	Malo	Baja	36	0	36
						COMBINACIÓN:	81

CLL 165 ENTRE KR 8F Y6 KR 8F BIS A						TRAMO N°: 52	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Alto	Media	Regular	Baja	12	3,6	16
Estoperoles y tachas					9	2,7	12
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					15	0	15
Pintura de dos componentes por spray					14	0	14
						COMBINACIÓN:	15

FIRMA Roberto Carlos Pérez P.
NOMBRE Roberto Carlos Pérez
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE Cristhian David Rico
INTERVENTORÍA

Anexo 5: Registro fotográfico de la implementación

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ


Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ZONA NORTE

Proyecto	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	Localización	USAQUEN - SUBA
Contratista:	Consorcio Señaliza BTA	Director de obra:	ALFONSO URREGO
Interventor:	Consorcio Movilidad Vial 2019	Director Interventoría:	SAMUEL HOMEZ
Fecha del registro fotográfico:	Del 5 de mayo al 4 de junio de 2020		

ID	EX_01_358_1842_12	SEÑALIZACIÓN	Horizontal
LOCALIZACIÓN	LA CALLE 153 HASTA LA CALLE 161 ENTRE CARRERA 9 Y CARRERA 15	UPZ	13- Toberin

FOTOGRAFÍA Nº 1

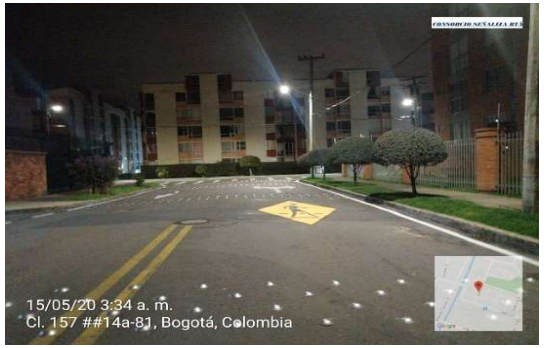

Implementacion de estoperoles Metalicos

FOTOGRAFÍA Nº 2




Implementacion de paso cebrado

FOTOGRAFÍA Nº 3




Implementacion de refugio en bordillos transpasables

FOTOGRAFÍA Nº 4

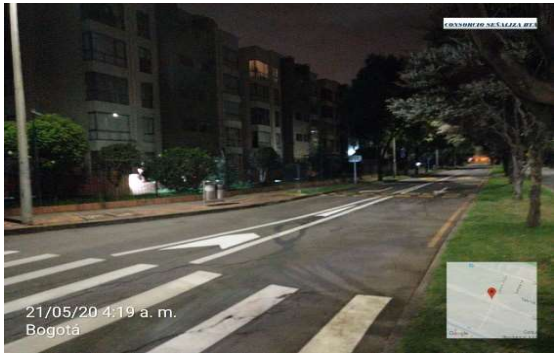

Implementacion de canalizacion

FOTOGRAFÍA Nº 5

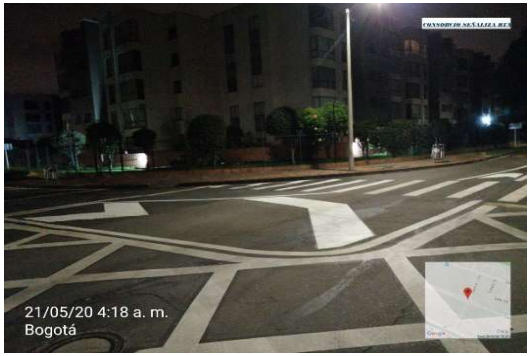

Implemetacion de achurados.

FOTOGRAFÍA Nº 6



Señal SP-46b

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ZONA NORTE

Proyecto	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	Localización	USAQUEN - SUBA
Contratista:	Consorcio Señaliza BTA	Director de obra:	ALFONSO URREGO
Interventor:	Consorcio Movilidad Vial 2019	Director Interventoría:	SAMUEL HOMEZ
Fecha del registro fotográfico:	Del 5 de mayo al 4 de junio de 2020		

ID	EX_11_272_868_12	SEÑALIZACIÓN	Horizontal
LOCALIZACIÓN	AC 116 hasta DG 114 entre KR 70C Y KR 71	UPZ	25- FLORESTA

FOTOGRAFÍA Nº 1



Señal SP-47A / SR-30(30)

FOTOGRAFÍA Nº 2



Señal SP-46A/SR-30(30)

FOTOGRAFÍA Nº 3



Señal SP-46B

FOTOGRAFÍA Nº 4



Señal SP-46B

FOTOGRAFÍA Nº 5



Señal SP-25/SR-30(30)

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ZONA NORTE

Proyecto	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	Localización	USAQUEN - SUBA
Contratista:	Consorcio Señaliza BTA	Director de obra:	ALFONSO URREGO
Interventor:	Consorcio Movilidad Vial 2019	Director Interventoría:	SAMUEL HOMEZ
Fecha del registro fotográfico:	Del 5 de mayo al 4 de junio de 2020		


ID	MV_AV_CALI_941_09_V24	SEÑALIZACIÓN	Horizontal
LOCALIZACIÓN	AV CALI CON KR 93	UPZ	27 - SUBA

FOTOGRAFÍA Nº 1




Implementacion de cebra y linea de pare

FOTOGRAFÍA Nº 2

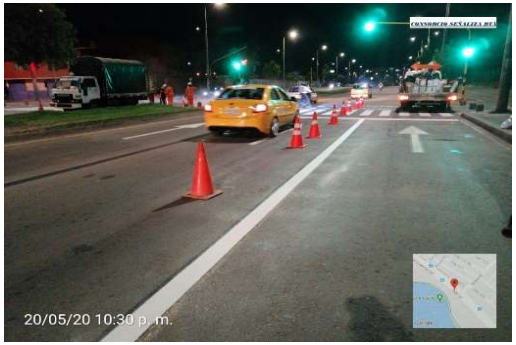

Linea de parada Av Cali

FOTOGRAFÍA Nº 3

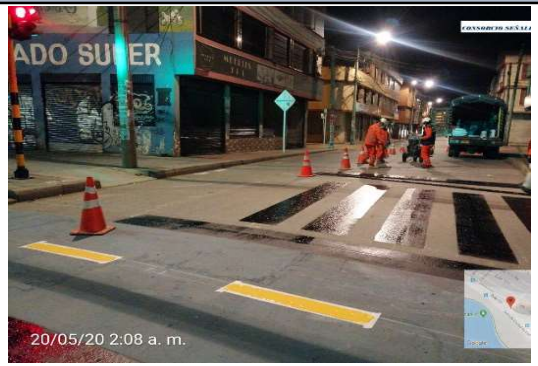


Implementacion paso cebrado en la KR 93

FOTOGRAFÍA Nº 4



Implementacion de ciclo sendero.

FOTOGRAFÍA Nº 5

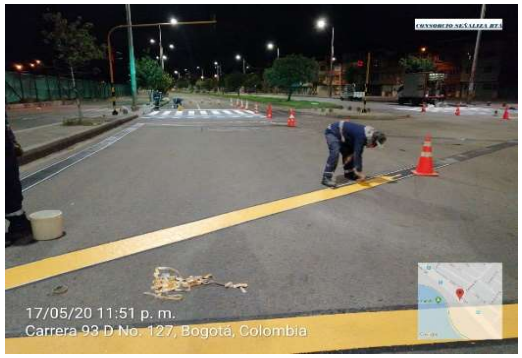

Implementacion de zona antibloqueo

FOTOGRAFÍA Nº 6

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ZONA NORTE

Proyecto	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	Localización	USAQUEN - SUBA
Contratista:	Consorcio Señaliza BTA	Director de obra:	ALFONSO URREGO
Interventor:	Consorcio Movilidad Vial 2019	Director Interventoría:	SAMUEL HOMEZ
Fecha del registro fotográfico:	Del 5 de mayo al 4 de junio de 2020		


ID	EX_11_390_1842_12_V8	SEÑALIZACIÓN	Horizontal
LOCALIZACIÓN	CL 160 A LA CL 161 ENTRE KR 59 Y KR 64	UPZ	18 - Britalia

FOTOGRAFÍA Nº 1



Estoperoles metalicos sobre la cl 160

FOTOGRAFÍA Nº 2

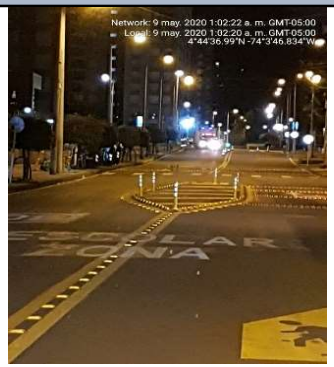

Desarrollo de trafico calmado cl 160

FOTOGRAFÍA Nº 3




Refugio en hitos y tachones cl 160

FOTOGRAFÍA Nº 4



Paso de ciclorruta cl 160

FOTOGRAFÍA Nº 5

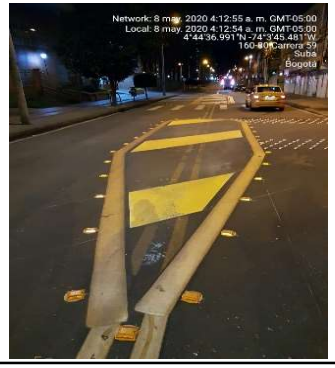

Refugio en pintura cl 160

FOTOGRAFÍA Nº 6

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ZONA NORTE

Proyecto	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	Localización	USAQUEN - SUBA
Contratista:	Consorcio Señaliza BTA	Director de obra:	ALFONSO URREGO
Interventor:	Consorcio Movilidad Vial 2019	Director Interventoría:	SAMUEL HOMEZ
Fecha del registro fotográfico:	Del 5 de mayo al 4 de junio de 2020		

ID	MV_01_032_945_10_V22	SEÑALIZACIÓN	Horizontal
LOCALIZACIÓN	CL 134A CON AUTO NORTE	UPZ	13 - LOS CEDROS

FOTOGRAFÍA Nº 1



Señal SPC-46A

FOTOGRAFÍA Nº 2



Señales delineadores de curva horizontal

FOTOGRAFÍA Nº 3



Señal SP-46B

FOTOGRAFÍA Nº 4



Señal SRC-03



Señal SP-46A/SR-30(30)

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ZONA NORTE

Proyecto	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	Localización	USAQUEN - SUBA
Contratista:	Consorcio Señaliza BTA	Director de obra:	ALFONSO URREGO
Interventor:	Consorcio Movilidad Vial 2019	Director Interventoría:	SAMUEL HOMEZ
Fecha del registro fotográfico:	Del 5 de mayo al 4 de junio de 2020		

ID	MV_01_306_1236_11_V6	SEÑALIZACIÓN	Horizontal
LOCALIZACIÓN	AK 9 ENTRE CL 127B Y CL 128 B	UPZ	15 - CONTRY CLUB

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Señal SP-59	Señal SPC-46A	Señal SPC-01
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Señal SP-30	Señal SPC-46A	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad




CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ZONA NORTE

Proyecto	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	Localización	USAQUEN - SUBA
Contratista:	Consorcio Señaliza BTA	Director de obra:	ALFONSO URREGO
Interventor:	Consorcio Movilidad Vial 2019	Director Interventoría:	SAMUEL HOMEZ
Fecha del registro fotográfico:	Del 5 de mayo al 4 de junio de 2020		

ID	EX_01_295_1236_11	SEÑALIZACIÓN	Horizontal
LOCALIZACIÓN	AV. CARRERA 7 HASTA LA AV. CARRERA 9 ENTRE LA CALLE 163A Y AV. CALLE 170	UPZ	17- San Jose de Babaria

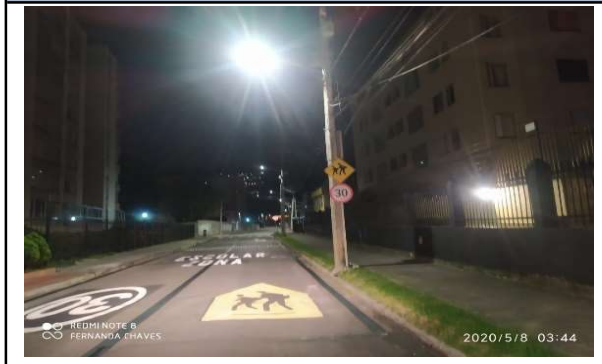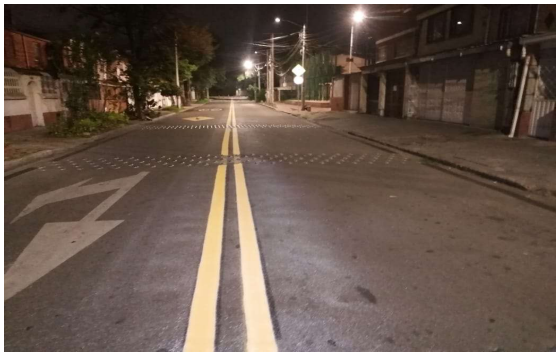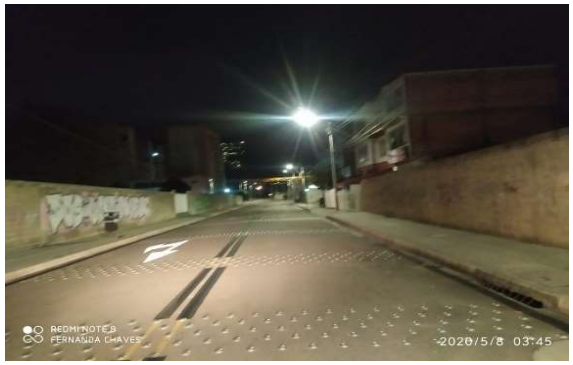FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Implementacion de zona escolar	Implementacion de sendero peatonal	Implementacion de paso peatonal
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Implementacion de estoperoles metalicos	Implementacion de sendero peatonal	Implementacion de estoperoles metalicos

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Compañía de proyectos técnicos s.a. AIRTIFICIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ZONA NORTE

Proyecto	REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	Localización	USAQUEN - SUBA
Contratista:	Consorcio Señaliza BTA	Director de obra:	ALFONSO URREGO
Interventor:	Consorcio Movilidad Vial 2019	Director Interventoría:	SAMUEL HOMEZ
Fecha del registro fotográfico:	Del 5 de mayo al 4 de junio de 2020		

ID	EX_01_356_1842_12_V1	SEÑALIZACIÓN	Horizontal
LOCALIZACIÓN	LA CL 151 HASTA AC 153 ENTRE LA AK 9 Y KR 14B	UPZ	13 - LOS CEDROS

FOTOGRAFÍA Nº 1



Implementacion de linea de canal.

FOTOGRAFÍA Nº 2



Implementacion de ceda el paso

FOTOGRAFÍA Nº 3



Implementacion de frangas transversales en pintura

FOTOGRAFÍA Nº 4



Implementacion de Bandas en Agregado

FOTOGRAFÍA Nº 5



Pictogramas de zona escolar

FOTOGRAFÍA Nº 6



Implementacion de sendero peatonal

Anexo 6 Formatos de entrega a almacén

SDM-SS-83959-2020

MEMORANDO

PARA: **SONIA MYREYA ALFONSO MUÑOZ**
Subdirectora Administrativa

DE: **MARIO GABRIEL CARBONELL GUTIÉRREZ**
Subdirector Técnico de Señalización

Asunto: Concepto Técnico de Señales verticales de pedestal, retiradas en vía.
Referencia: Contrato de obra 2019-1780
Contrato de Interventoría 2019-1799

Fecha:

Atento saludo.

Teniendo en cuenta, que la **SECRETARÍA** es una Entidad del sector central con autonomía administrativa y financiera, domiciliada en la AC 13 No. 37-35 de Bogotá, D.C., cuya creación, estructura, organización y funcionamiento encuentra su reglamentación en el Acuerdo 257 de 2006 y el Decreto 567 de 2006 y que, adicionalmente, mediante resolución 1885 del 17 de junio de 2015, el Ministerio de Transporte adoptó el "MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL – DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORUTAS DE COLOMBIA", el cual en el numeral 1.8.3 establece:

> *"[…] **1.8.3. Conservación y Mantenimiento** […] Toda señalización tiene una vida útil en función de los materiales utilizados en su fabricación, de la acción del medioambiente (SIC), de agentes externos y de la permanencia de las condiciones que la justifican. Por ello es imprescindible que las autoridades responsables de la instalación y, mantenimiento de las señales levanten un inventario de ellas y cuenten con un programa de mantenimiento e inspección que asegure su oportuna limpieza, reemplazo o retiro.*
>
> *La señalización limpia, legible, visible, en buen estado y pertinente inspira respeto en los conductores y peatones. A su vez, cualquier señal que permanece en la vía sin que se justifique, o se encuentra deteriorada, dañada o rayada, solo contribuye a su descrédito y al de la entidad responsable de su mantenimiento, y constituye además un estímulo para actos vandálicos. […]".*

La Secretaria Distrital de Movilidad ejecuta a través del contrato de obra 2019-1780 (ejecutado por el CONSORCIO SEÑALIZA BTA) y el contrato de interventoría 2019-1799 (ejecutado por CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019) las actividades correspondientes a la implementación integral de señalización según lo definido en los documentos contractuales.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Por lo anteriormente expuesto, se infiere que de acuerdo con las actividades propias contempladas en el marco del Contrato de Obra Integral de Señalización y el Contrato de Interventoría se deben realizar las actividades de reemplazo o retiro aquellas señales que por el estado de deterioro no cumplan con el objeto para el cual fueron diseñadas o requieren ser remplazadas para mejorar las condiciones de seguridad vial.

Además, en desarrollo de las actividades de los contratos mencionados se realizaron visitas de inspección que permitieron confirmar el estado de las señales que requieren de remplazo o retiro

A su vez, dentro del procedimiento establecido por el Comité de Inventarios de la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM), a través de la Dirección Administrativa, se contempla como requisito para la recepción de señales de tránsito, postes, semáforos, y en general, bienes de la entidad que se encuentran en mal estado, el concepto técnico que permita retirar del inventario dichos elementos.

En el presente documento se emite el concepto técnico, teniendo en cuenta que en el marco del contrato de obra integral de señalización **2019-1780 (CONSORCIO SEÑALIZA BTA),** se han **retirado 188** señales verticales de pedestal, cuyo registro se asocia a las **Actas de Recibo Parcial No. 02 – 03 – 04,** las cuales dado su alto grado de deterioro se enmarcan en las siguientes condiciones técnicas:

- ✓ Son Inservibles debido a que ya no son funcionales (porque han cesado las condiciones que obligaron a su instalación). En la dinámica urbana, algunas señales dejan de prestar su operatividad, y pueden convertirse en puntos de confusión generando riesgos y accidentalidad. Tal es el caso, cuando en una intersección que ha sido controlada por señales verticales, se implementa un semáforo, en consecuencia, ya dichas señales dejan ser operativas y deben ser retiradas.
- ✓ Son inservibles por salubridad: En este grupo se incluyen las señales son las que presentan corrosión, teniendo en cuenta que tiene componentes metálicos, las cuales al ser sometidos a la contaminación y a las condiciones ambientales (humedad) se deterioran, representando un peligro inminente para los peatones. Por lo tanto, deben tener una disposición final acorde con las normas ambientales.
- ✓ Son Inservibles por deterioro histórico. Factores como la condición climática, así como la contaminación a las que están expuestas las señales viales afectan los materiales con que son fabricadas (materiales en colores que reflejan la luz), por lo tanto, hay propiedades que van disminuyendo con el paso del tiempo, y por consiguiente, pierden la funcionalidad y conllevan a que se originen riesgos para la seguridad vial.
- ✓ Son inservibles por daño parcial o total. Son las señales viales que han sufrido daños irreparables, entre los cuales se tipifican: perdida de verticalidad, grafitis con tinta indeleble, stickers, cuya goma no se puede retirar, y por consiguiente no ofrecen la garantía de operatividad para la seguridad vial.

En consecuencia, las **188 señales retiradas,** deben ser recibidas por el Almacén de la SDM, efectuando el respectivo descargue en el Patio No 4 de la entidad y de conformidad con el procedimiento establecido por el Comité de Inventarios de la SDM, antes mencionado.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Igualmente, como se establece en el procedimiento referido, se menciona que las señales viales retiradas, se componen de tableros elaborados en lámina de acero galvanizado, y los postes o pedestales son fabricados en ángulo de acero, materiales estos que con el tiempo pueden presentar altos índices de corrosión, con el fin de que se tengan en cuenta para su disposición final, acorde con las normas ambientales.

Se anexa el acta de entrega correspondiente de las **188 señales viales retiradas**.

Cordialmente;

MARIO GABRIEL CARBONELL GUTIERREZ
Subdirector Técnico de Señalización

OSCAR EDUARDO RESTREPO ROJAS
Supervisor contrato de Interventoría 2019-1799

SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ
Director de Interventoría Contrato 2019-1799
CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019

ALFONSO URREGO MALAGÓN
Director de Obra Contrato 2019-1780
CONSORCIO SEÑALIZA BTA

Code39

83959-2020

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO	
	Acta de recibo de señales retiradas en vía	
	Código: PM04-PR24-F01	Versión 2.0

CONTRATO SDM 2019-1780: REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C – ZONA 5 , NORTE.

1
No.del Acta

23 de junio de 2020
Fecha de recibo

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Item	Código	Estado de la señal						Cantidad		
		Pedestal		Tablero Superior		Tablero Inferior		Pedestal	Tablero Superior	Tablero Inferior
		Estado	Causa del retiro	Estado	Causa del retiro	Estado	Causa de retiro			
1	SR-30	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
2	SR-30	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
3	SR-30	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
4	SR-30	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
5	SR-30	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
6	SR-30	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
7	SR-30	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
8	SI-25	MALO	REEMPLAZO	MALO	1			1	1	0
9	SR-28	MALO	RETIRO	MALO	3			1	1	0
10	SR-28	MALO	RETIRO	MALO	3			1	1	0
11	SR-28	MALO	RETIRO	MALO	3			1	1	0
12	SR-28	MALO	RETIRO	MALO	3			1	1	0
13	SR-28	MALO	RETIRO	MALO	3			1	1	0
14	SI-05	MALO	REEMPLAZO	MALO	4			1	1	0
15	SI-05	MALO	REEMPLAZO	MALO	1			1	1	0
16	SR-10	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
17	SP-46	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
18	SI-05	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
19	SR-28	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
20	SR-28	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
21	SI-05	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
22	SR-02	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
23	SRB-02	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
24	SI-11	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
25	CHEVRON	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
26	SR-38	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
27	SRB-02	MALO	RETIRO	MALO	1			1	1	0
28	SRC-05 PLAQUETA/SRB-01	MALO	REEMPLAZO	MALO	1	MALO	1	1	1	1
29	SR-32	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
30	SR-02	MALO	RETIRO	MALO	3			1	1	0
31	SR-01	MALO	REEMPLAZO	MALO	3			1	1	0
32	SR-08	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
33	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
34	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
35	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
36	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
37	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
38	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
39	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
40	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
41	SR-06	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
42	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
43	SP-48/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	3	MALO	3	1	1	1
44	SR-06	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
45	SR-18	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0

DESCRIPCION DE LA SEÑALIZACION VERTICAL

Item	Código	Estado de la señal						Cantidad		
		Pedestal		Tablero Superior		Tablero Inferior		Pedestal	Tablero Superior	Tablero Inferior
		Estado	Causa del retiro	Estado	Causa del retiro	Estado	Causa de retiro			
46	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
47	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
48	SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
49	SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
50	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
51	SR-18	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
52	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
53	SR-06	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
54	SR-23	MALO	RETIRAR	MALO	3			1	1	0
55	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
56	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
57	SI-05C	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
58	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
59	SR-31	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
60	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
61	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
62	SR-38	MALO	RETIRAR	MALO	3			1	1	0
63	SR-47	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
64	SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
65	SR-16	MALO	RETIRAR	MALO	3			1	1	0
66	SR-06	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
67	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
68	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
69	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
70	SR-06	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
71	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
72	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
73	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
74	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
75	SR-06	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
76	SR-38	MALO	RETIRAR	MALO	3			1	1	0
77	SR-38	MALO	RETIRAR	MALO	3			1	1	0
78	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
79	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
80	SP-47	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
81	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
82	SP-47	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
83	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
84	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
85	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
86	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
87	SI-05	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
88	SI-05	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1			1	1	0
89	SR-38	MALO	RETIRAR	MALO	3			1	1	0
90	SR-29	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
91	SR-28/PLAQUETA	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
92	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
93	SR-10	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
94	SR-08	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
95	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	3	MALO	1	1	1	1
96	SR-41	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
97	SR-06	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
98	SR-08	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
99	SR-08	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
100	SR-06	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
101	SR-38	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
102	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
103	SP-59	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
104	SR-39	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0

DESCRIPCION DE LA SEÑALIZACION VERTICAL

Item	Código	Estado de la señal						Cantidad		
		Pedestal		Tablero Superior		Tablero Inferior		Pedestal	Tablero Superior	Tablero Inferior
		Estado	Causa del retiro	Estado	Causa del retiro	Estado	Causa de retiro			
105	SR-38	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
106	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
107	SR-30	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
108	SR-01	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
109	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
110	SP-46/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
111	SP-48/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
112	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
113	SR-04	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
114	SR-38	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
115	SP-48	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
116	SR-02	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
117	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
118	SR-39	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
119	SP-03	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
120	SR-01	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
121	SR-39	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
122	SP-67/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
123	SR-11	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
124	SP-48/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
125	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
126	SR-28	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
127	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
128	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
129	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
130	SR-01	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
131	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
132	SP-48/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
133	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
134	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
135	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
136	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
137	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
138	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
139	SP-47	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
140	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
141	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
142	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
143	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
144	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
145	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
146	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
147	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
148	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
149	SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
150	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
151	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
152	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
153	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
154	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
155	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
156	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
157	SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
158	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
159	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
160	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
161	SR-38	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
162	SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
163	SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0

DESCRIPCION DE LA SEÑALIZACION VERTICAL

Item	Código	Estado de la señal						Cantidad		
		Pedestal		Tablero Superior		Tablero Inferior		Pedestal	Tablero Superior	Tablero Inferior
		Estado	Causa del retiro	Estado	Causa del retiro	Estado	Causa de retiro			
164	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
165	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
166	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
167	SP-47	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
168	SP-47	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
169	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
170	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
171	SR-30	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
172	SR-38	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
173	SR-18	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
174	SR-30	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
175	SP-47A/SR-30	MALO	REEMPLAZAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
176	SR-31	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
177	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
178	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
179	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
180	SP-47/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
181	SR-01	MALO	REEMPLAZAR	MALO	3			1	1	0
182	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
183	SP-48/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
184	SR-28	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
185	SP-46/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
186	SR-39	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
187	SP-47A/SR-30	MALO	RETIRAR	MALO	1	MALO	1	1	1	1
188	SP-06	MALO	RETIRAR	MALO	1			1	1	0
							PARA DAR DE BAJA	**188**	**188**	**22**

D. OBSERVACIONES

CAUSA DEL RETIRO

1. Inservibles porque no son funcionales
2. Inservibles por salubridad
3. Inservibles por deterioro histórico
4. Inservibles por daño parcial o total

Entregado por:

Firma Roberto Carlos Pérez P.

Nombre: Roberto Pérez

Cargo: Ingeniero residente

Contratista: Consorcio Señaliza Bta

Recibido por:

Firma Gabriel H. Torres R.

Nombre: Gabriel Torres

Cargo: Ingeniero residente

Interventoría: Consorcio Movilidad Vial 2019

Recibido por
Raul Jimenez
07/07/2020

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2019	Numero Ingreso 0	Interno	926
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	06/12/2019
Documento Soporte	LICITACION PUBLICA DE OBRA		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	06/12/2019	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	01	Fecha Doc Remision	02/12/2019	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO DE SUMINISTRAS DE SEÑALIZACION EN EL MARCO DEL CONTRATO 2019-1780						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1097	CONOS DE TRANSITO	UNIDAD	200	5-1-11-14-001	$53.333,00	$10.666.600,00
2	2705	MALETIN	UNIDAD	100	5-1-11-14-001	$355.164,00	$35.516.400,00
					TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO		$46.183.000,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$46.183.000,00	$0,00
2-4-36-90-002	Est Procultura 0.5%	$0,00	$230.915,00
2-4-36-27-002	Ica tarifa 6.9	$0,00	$318.663,00
2-4-36-90-001	Est universidad Francisco Jose de Caldas 1%	$0,00	$508.013,00
2-4-36-90-003	Est Pro persona mayor	$0,00	$923.660,00
2-9-03-04-001	Depositos sobre contratos	$0,00	$2.309.150,00
2-4-36-90-013	Est Universidad Pedagogica Nacional	$0,00	$230.915,00
2-4-36-26-001	Contratos de obra 2%	$0,00	$923.660,00
2-4-36-90-091	Contribucion Especial	$0,00	$2.309.150,00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	$38.428.874,00
	TOTALES:	$46.183.000,00	$46.183.000,00

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Encargado de bodega

JENNY PAOLA CORTES CANO
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	0	Interno 961
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	14/02/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	2019-178(	Fecha Doc Soporte	14/02/2020	
Proveedor	NIT 901314965	CONSORCIO SEÑALIZA BTA					
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	02	Fecha Doc Remision	14/02/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO ELEMENTOS DE SEÑALIZACION SUMINISTRADOS BAJO EL CONTRATO 2019-1780 / ACTA 02 / ELEMENTOS INCLUYEN VALOR AIU						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2990	TABLERO PARA SEÑAL VERTICAL	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$349.176,00	$349.176,00
2	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$87.869,50	$175.739,00
3	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$119.182,00	$119.182,00
4	1468	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$224.400,00	$448.800,00
5	1642	SEÑAL DOBLE REGLAMENTARIA /	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$302.372,50	$604.745,00
6	1488	SEÑAL DOBLE SP47 Ó SP47A/SR /	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	$371.923,30	$1.487.693,20
7	2690	SEÑAL SR - SP - SI DE 60 CM / RE	UNIDAD	3	5-1-11-14-001	$252.337,40	$757.012,20
8	1653	SEÑAL SP-47B $216849	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$442.620,40	$885.240,80
9	1644	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	33	5-1-11-14-001	$306.223,40	$10.105.372,20
10	2687	SEÑAL VERTICAL - INCLUYE PEDE	UNIDAD	3	5-1-11-14-001	$42.992,50	$128.977,50
11	1498	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	170	5-1-11-14-001	$9.134,00	$1.552.780,00
12	2761	ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10	UNIDAD	1846	5-1-11-14-001	$8.237,29	$15.206.037,34
13	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	103	5-1-11-14-001	$70.243,00	$7.235.029,00
14	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	6	5-1-11-14-001	$65.268,00	$391.608,00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $39.447.392,24

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$39.447.392,24	$0,00
2-4-36-90-002	Est Procultura 0.5%	$0,00	$197.237,00
2-4-36-27-002	Ica tarifa 6.9	$0,00	$272.187,00
2-4-36-90-001	Est universidad Francisco Jose de Caldas 1%	$0,00	$433.921,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	0	Interno	961
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION			Fecha Estado	14/02/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	2019-178(	Fecha Doc Soporte	14/02/2020		
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	02	Fecha Doc Remision	14/02/2020		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION						
Observaciones	INGRESO ELEMENTOS DE SEÑALIZACION SUMINISTRADOS BAJO EL CONTRATO 2019-1780 / ACTA 02 / ELEMENTOS INCLUYEN VALOR AIU							

2-4-36-90-003	Est Pro persona mayor	$0,00	$788.948,00
2-9-03-04-001	Depositos sobre contratos	$0,00	$1.972.370,00
2-4-36-90-013	Est Universidad Pedagogica Nacional	$0,00	$197.237,00
2-4-36-26-001	Contratos de obra 2%	$0,00	$788.948,00
2-4-36-90-091	Contribucion Especial	$0,00	$1.972.370,00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	$32.824.174,44
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	-$0,20
	TOTALES:	$39.447.392,24	$39.447.392,24

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Encargado de bodega

JENNY PAOLA CORTES CANO
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	0	Interno 962
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	14/02/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-2019	Fecha Doc Soporte	14/02/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	03	Fecha Doc Remision	10/02/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO ELEMENTOS DE SEÑALIZACION SUMINISTRADOS BAJO EL CONTRATO 2019-1780 / ACTA 03 / ELEMENTOS INCLUYEN VALOR AIU						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3094	TABLERO EN LAMINA GALVANIZAI	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$235.260,00	$235.260,00
2	1497	PEDESTALES EN ANGULO PARA S	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$87.869,00	$87.869,00
3	1468	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	8	5-1-11-14-001	$224.399,64	$1.795.197,12
4	1642	SEÑAL DOBLE REGLAMENTARIA /	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$302.372,40	$604.744,80
5	1490	DELINEADOR DE OBSTACULO CH	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$233.415,87	$233.415,87
6	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	7	5-1-11-14-001	$306.049,53	$2.142.346,71
7	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$355.486,86	$710.973,72
8	2687	SEÑAL VERTICAL - INCLUYE PEDE	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$42.992,08	$42.992,08
9	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	500	5-1-11-14-001	$9.133,97	$4.566.985,00
10	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	274	5-1-11-14-001	$12.045,83	$3.300.557,42
11	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	431	5-1-11-14-001	$70.243,39	$30.274.901,09
12	2762	BORDILLO NO TRASPASABLE EN	UNIDAD	209	5-1-11-14-001	$91.543,66	$19.132.624,94
13	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	16	5-1-11-14-001	$65.268,44	$1.044.295,04

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $64.172.162,79

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$64.172.162,79	$0,00
2-4-36-90-002	Est Procultura 0.5%	$0,00	$320.861,00
2-4-36-27-002	Ica tarifa 6.9	$0,00	$442.788,00
2-4-36-90-001	Est universidad Francisco Jose de Caldas 1%	$0,00	$705.894,00
2-4-36-90-003	Est Pro persona mayor	$0,00	$1.283.443,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	0	Interno 962
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	14/02/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-2019	Fecha Doc Soporte	14/02/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	03	Fecha Doc Remision	10/02/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO ELEMENTOS DE SEÑALIZACION SUMINISTRADOS BAJO EL CONTRATO 2019-1780 / ACTA 03 / ELEMENTOS INCLUYEN VALOR AIU						

2-9-03-04-001	Depositos sobre contratos	$0,00	$3.208.608,00
2-4-36-90-013	Est Universidad Pedagogica Nacional	$0,00	$320.861,00
2-4-36-26-001	Contratos de obra 2%	$0,00	$1.283.443,00
2-4-36-90-091	Contribucion Especial	$0,00	$3.208.608,00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	$53.397.657,45
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	-$0,66
	TOTALES:	$64.172.162,79	$64.172.162,79

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Encargado de bodega

JENNY PAOLA CORTES CANO
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	0	Interno 985
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	18/03/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-201	Fecha Doc Soporte	18/03/2020	
Proveedor	NIT 901314965	CONSORCIO SEÑALIZA BTA					
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4	Fecha Doc Remision	16/03/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO DE ELEMENTOS SEÑALIZACION CONTRATO DE OBRA 1780-2019 FACTURA 04 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 04						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3094	TABLERO EN LAMINA GALVANIZAI	UNIDAD	16	5-1-11-14-001	$184.285,00	$2.948.560,00
2	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	22	5-1-11-14-001	$64.185,00	$1.412.070,00
3	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	10	5-1-11-14-001	$87.058,00	$870.580,00
4	1468	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	96	5-1-11-14-001	$163.915,00	$15.735.840,00
5	1642	SEÑAL DOBLE REGLAMENTARIA /	UNIDAD	27	5-1-11-14-001	$220.871,00	$5.963.517,00
6	1488	SEÑAL DOBLE SP47 Ó SP47A/SR /	UNIDAD	26	5-1-11-14-001	$271.675,00	$7.063.550,00
7	2690	SEÑAL SR - SP - SI DE 60 CM / RE	UNIDAD	11	5-1-11-14-001	$184.322,00	$2.027.542,00
8	1653	SEÑAL SP-47B $216849	UNIDAD	11	5-1-11-14-001	$323.316,00	$3.556.476,00
9	1469	DELINEADOR DE CURVA HORIZOI	UNIDAD	6	5-1-11-14-001	$145.724,00	$874.344,00
10	1646	DELINEADOR DE OBSTACULO CH	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$170.501,00	$170.501,00
11	1647	DELINEADOR DE OBSTACULO 90	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$139.474,00	$139.474,00
12	1495	SEÑAL SR38 O SR39 DE 75 X 25 C	UNIDAD	39	5-1-11-14-001	$136.525,00	$5.324.475,00
13	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	7	5-1-11-14-001	$223.557,00	$1.564.899,00
14	1468	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	32	5-1-11-14-001	$31.404,00	$1.004.928,00
15	2990	TABLERO PARA SEÑAL VERTICAL	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$14.350,00	$14.350,00
16	1498	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	2414	5-1-11-14-001	$6.672,00	$16.106.208,00
17	1498	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	654	5-1-11-14-001	$8.799,00	$5.754.546,00
18	2761	ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10	UNIDAD	2506	5-1-11-14-001	$6.017,00	$15.078.602,00
19	1500	ESTOPEROLES METALICOS DE 1C	UNIDAD	10042	5-1-11-14-001	$12.389,00	$124.410.338,00
20	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	1796	5-1-11-14-001	$51.310,00	$92.152.760,00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	0	Interno 985
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	18/03/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-2019		Fecha Doc Soporte	18/03/2020
Proveedor	NIT 901314965	CONSORCIO SEÑALIZA BTA					
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	4		Fecha Doc Remision	16/03/2020
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO DE ELEMENTOS SEÑALIZACION CONTRATO DE OBRA 1780-2019 FACTURA 04 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 04						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
21	2762	BORDILLO NO TRASPASABLE EN	UNIDAD	430	5-1-11-14-001	$66.869,00	$28.753.670,00
22	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	191	5-1-11-14-001	$47.676,00	$9.106.116,00
						TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO	$340.033.346,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
	TOTALES:	$0,00	

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Encargado de bodega

JENNY PAOLA CORTES CANO
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	49	Interno 995
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	17/04/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-2019	Fecha Doc Soporte	17/04/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	05	Fecha Doc Remision	15/04/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO DE SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN EN EL MARCO DEL CONTRATO 1780-2019 ACTA DE RECIBO No. 05 FACTURA No. 05						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1468	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$163.915,00	$327.830,00
2	1495	SEÑAL SR38 O SR39 DE 75 X 25 C	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$136.525,00	$273.050,00
3	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	66	5-1-11-14-001	$6.672,00	$440.352,00
4	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	178	5-1-11-14-001	$8.799,00	$1.566.222,00
5	2761	ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10	UNIDAD	6147	5-1-11-14-001	$6.017,00	$36.986.499,00
6	1500	ESTOPEROLES METALICOS DE 10	UNIDAD	5849	5-1-11-14-001	$12.389,00	$72.463.261,00
7	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	379	5-1-11-14-001	$51.310,00	$19.446.490,00
8	2762	BORDILLO NO TRASPASABLE EN	UNIDAD	112	5-1-11-14-001	$66.869,00	$7.489.328,00
9	1206	ACIDO ACETIL SALICILICO	UNIDAD	61	5-1-11-14-001	$47.676,00	$2.908.236,00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $141.901.268,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$141.901.268,00	$0,00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	$141.901.268,00
	TOTALES:	$141.901.268,00	$141.901.268,00

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Encargado de bodega

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	58	Interno 1005
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	18/05/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	18/05/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	7	Fecha Doc Remision	18/05/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO DE SUINISTRO SEÑALIZACION BAJO EL CONTRA DE OBRA 2019-1780. VALORES INCLUYEN % AIU. ACTA No. 06						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2705	MALETIN	UNIDAD	375	5-1-11-14-001	$355.164,00	$133.186.500,00
2	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	168	5-1-11-14-001	$6.672,00	$1.120.896,00
3	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	657	5-1-11-14-001	$8.799,00	$5.780.943,00
4	2761	ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10	UNIDAD	2629	5-1-11-14-001	$6.017,00	$15.818.693,00
5	1500	ESTOPEROLES METALICOS DE 10	UNIDAD	846	5-1-11-14-001	$12.389,00	$10.481.094,00
6	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	27	5-1-11-14-001	$51.310,00	$1.385.370,00
7	2762	BORDILLO NO TRASPASABLE EN	UNIDAD	15	5-1-11-14-001	$66.869,00	$1.003.035,00
8	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	14	5-1-11-14-001	$47.676,00	$667.464,00
					TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO		$169.443.995,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$169.443.995,00	$0,00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	$169.443.995,00
	TOTALES:	$169.443.995,00	$169.443.995,00

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Encargado de bodega

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	70	Interno 1016
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 11/06/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-2019	Fecha Doc Soporte	11/06/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	09	Fecha Doc Remision	10/06/2020	
Encargado de Bodega	CC 51811316 NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN BAJO EL MARCO DEL CONTRATO 1780-2019 / VALORES UNITARIOS INCLUYEN % AIU						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
20	3094	TABLERO EN LAMINA GALVANIZAI	UNIDAD	26	5-1-11-14-001	$90.307,35	$2.347.991,10
21	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	5	5-1-11-14-001	$64.185,00	$320.925,00
22	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	21	5-1-11-14-001	$87.058,00	$1.828.218,00
23	1468	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	21	5-1-11-14-001	$163.915,00	$3.442.215,00
24	1642	SEÑAL DOBLE REGLAMENTARIA /	UNIDAD	21	5-1-11-14-001	$220.871,00	$4.638.291,00
25	1488	SEÑAL DOBLE SP47 Ó SP47A/SR /	UNIDAD	13	5-1-11-14-001	$271.675,00	$3.531.775,00
26	2690	SEÑAL SR - SP - SI DE 60 CM / RE	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	$184.322,00	$737.288,00
27	1653	SEÑAL SP-47B $216849	UNIDAD	8	5-1-11-14-001	$323.316,00	$2.586.528,00
28	1648	DELINEADOR DE CURVA HORIZOI	UNIDAD	9	5-1-11-14-001	$145.724,00	$1.311.516,00
29	1495	SEÑAL SR38 O SR39 DE 75 X 25 C	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	$136.525,00	$546.100,00
30	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	8	5-1-11-14-001	$223.557,00	$1.788.456,00
31	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	7	5-1-11-14-001	$259.669,00	$1.817.683,00
32	2687	SEÑAL VERTICAL - INCLUYE PEDE	UNIDAD	27	5-1-11-14-001	$31.404,00	$847.908,00
33	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	2343	5-1-11-14-001	$6.672,00	$15.632.496,00
34	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	832	5-1-11-14-001	$8.799,00	$7.320.768,00
35	2761	ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10	UNIDAD	2327	5-1-11-14-001	$6.017,00	$14.001.559,00
36	1500	ESTOPEROLES METALICOS DE 10	UNIDAD	10056	5-1-11-14-001	$12.389,00	$124.583.784,00
37	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	2767	5-1-11-14-001	$51.310,00	$141.974.770,00
38	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	172	5-1-11-14-001	$47.676,00	$8.200.272,00
39	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$47.675,90	$47.675,90

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	70	Interno 1016
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	11/06/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-2019	Fecha Doc Soporte	11/06/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	09	Fecha Doc Remision	10/06/2020	
Encargado de Bodega	CC 51811316 NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN BAJO EL MARCO DEL CONTRATO 1780-2019 / VALORES UNITARIOS INCLUYEN % AIU						

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $337.506.219,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$337.506.219,00	$0,00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	$337.506.219,00
	TOTALES:	$337.506.219,00	$337.506.219,00

NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA
Encargado de bodega

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	84	Interno 1030
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	13/07/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-2019	Fecha Doc Soporte	13/07/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	No. 11	Fecha Doc Remision	10/07/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO DE SUMINISTROS DE SEÑALIZACIÓN MEDIANTE CONTRATO DE OBRA 1780-2019 Y ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 08						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3094	TABLERO EN LAMINA GALVANIZAI	UNIDAD	313	5-1-11-14-001	$122.824,35	$38.444.021,55
2	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	87	5-1-11-14-001	$87.869,26	$7.644.625,62
3	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	226	5-1-11-14-001	$119.182,40	$26.935.222,40
4	1468	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	143	5-1-11-14-001	$224.399,63	$32.089.147,09
5	1642	SEÑAL DOBLE REGLAMENTARIA /	UNIDAD	77	5-1-11-14-001	$302.372,39	$23.282.674,03
6	1488	SEÑAL DOBLE SP47 Ó SP47A/SR /	UNIDAD	62	5-1-11-14-001	$371.923,07	$23.059.230,34
7	2690	SEÑAL SR - SP - SI DE 60 CM / RE	UNIDAD	91	5-1-11-14-001	$252.336,81	$22.962.649,71
8	1653	SEÑAL SP-47B $216849	UNIDAD	35	5-1-11-14-001	$442.619,60	$15.491.686,00
9	1644	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	10	5-1-11-14-001	$306.223,39	$3.062.233,90
10	1471	DELINEADOR DE OBSTACULO 90	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$190.945,38	$381.890,76
11	1650	SEÑAL INFORMATIVA 40 X 75 CM	UNIDAD	6	5-1-11-14-001	$201.720,78	$1.210.324,68
12	1651	SEÑAL SR38 O SR39 DE 75 X 25 C	UNIDAD	11	5-1-11-14-001	$186.902,72	$2.055.929,92
13	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	$306.049,53	$1.224.198,12
14	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$355.485,17	$710.970,34
15	2687	SEÑAL VERTICAL - INCLUYE PEDE	UNIDAD	63	5-1-11-14-001	$42.992,07	$2.708.500,41
16	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	1336	5-1-11-14-001	$9.133,96	$12.202.970,56
17	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	1093	5-1-11-14-001	$12.045,83	$13.166.092,19
18	2761	ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10	UNIDAD	1548	5-1-11-14-001	$8.237,27	$12.751.293,96
19	1500	ESTOPEROLES METALICOS DE 10	UNIDAD	8230	5-1-11-14-001	$16.960,54	$139.585.244,20
20	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	852	5-1-11-14-001	$70.243,39	$59.847.368,28

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	84	Interno 1030
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	13/07/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	1780-2019	Fecha Doc Soporte	13/07/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	No. 11	Fecha Doc Remision	10/07/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO DE SUMINISTROS DE SEÑALIZACIÓN MEDIANTE CONTRATO DE OBRA 1780-2019 Y ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 08						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
21	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	137	5-1-11-14-001	$65.268,70	$8.941.811,90
22	1485	RESALTO PORTATIL DE CAUCHO	UNIDAD	28	5-1-11-14-001	$232.829,93	$6.519.238,04
23	2705	MALETIN	UNIDAD	83	5-1-11-14-001	$355.164,00	$29.478.612,00
					TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO		$483.755.936,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$483.755.936,00	$0,00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	$483.755.936,00
	TOTALES:	$483.755.936,00	$483.755.936,00

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Encargado de bodega

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	97	Interno 1045
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	14/08/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	2019-178(	Fecha Doc Soporte	14/08/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	No. 13	Fecha Doc Remision	12/08/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO ELEMENTO SEÑALIZACIÓN / CONTRATO DE OBRA 2019-1780 / ACTA DE RECIBO No. 9						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3094	TABLERO EN LAMINA GALVANIZAI	UNIDAD	15	5-1-11-14-001	$107.972,13	$1.619.581,95
2	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	7	5-1-11-14-001	$87.869,00	$615.083,00
3	1477	PEDESTAL EN ANGULO PARA SR/	UNIDAD	8	5-1-11-14-001	$119.182,00	$953.456,00
4	1468	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	9	5-1-11-14-001	$224.400,00	$2.019.600,00
5	1642	SEÑAL DOBLE REGLAMENTARIA /	UNIDAD	13	5-1-11-14-001	$302.372,00	$3.930.836,00
6	1488	SEÑAL DOBLE SP47 Ó SP47A/SR /	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	$371.923,00	$1.487.692,00
7	2690	SEÑAL SR - SP - SI DE 60 CM / RE	UNIDAD	13	5-1-11-14-001	$252.337,00	$3.280.381,00
8	1653	SEÑAL SP-47B $216849	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$442.620,00	$442.620,00
9	1490	DELINEADOR DE OBSTACULO CH	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$233.416,00	$233.416,00
10	1650	SEÑAL INFORMATIVA 40 X 75 CM	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$201.721,00	$201.721,00
11	1495	SEÑAL SR38 O SR39 DE 75 X 25 C	UNIDAD	10	5-1-11-14-001	$186.903,00	$1.869.030,00
12	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$305.931,00	$305.931,00
13	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	22	5-1-11-14-001	$355.487,00	$7.820.714,00
14	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	1209	5-1-11-14-001	$9.134,00	$11.043.006,00
15	1658	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCI	UNIDAD	249	5-1-11-14-001	$12.046,00	$2.999.454,00
16	2761	ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10	UNIDAD	4425	5-1-11-14-001	$8.237,00	$36.448.725,00
17	1500	ESTOPEROLES METALICOS DE 1(	UNIDAD	2949	5-1-11-14-001	$16.961,00	$50.017.989,00
18	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	235	5-1-11-14-001	$70.243,00	$16.507.105,00
19	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	40	5-1-11-14-001	$65.268,00	$2.610.720,00
20	1495	SEÑAL SR38 O SR39 DE 75 X 25 C	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$186.903,05	$186.903,05

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2020	Numero Ingreso	97	Interno 1045
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	14/08/2020
Documento Soporte	DE OBRA		Numero Doc Soporte	2019-178(	Fecha Doc Soporte	14/08/2020	
Proveedor	NIT 901314965 CONSORCIO SEÑALIZA BTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	No. 13	Fecha Doc Remision	12/08/2020	
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO ELEMENTO SEÑALIZACIÓN / CONTRATO DE OBRA 2019-1780 / ACTA DE RECIBO No. 9						

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $144.593.964,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$144.593.964,00	$0,00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0,00	$144.593.964,00
	TOTALES:	$144.593.964,00	$144.593.964,00

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Encargado de bodega

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Anexo 7: Soportes del Informe de Gestión Social

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

ENCUESTA SOCIAL

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

Contrato 20191780 - "Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas en la ciudad de Bogotá D.C. - Zona 1 – Norte – Localidades de Usaquén y Suba.

Reductores de velocidad a implementar en el identificador de diseño EX_01_358_1842_12_V1– PARQUE LA VIDA CALLE 153 HASTA LA CALLE 161 ENTRE CARRERA 9 Y CARRERA 15

En las Especificaciones Técnicas para la ejecución de la señalización vertical, horizontal y otros dispositivos del Proceso SDM-LP-026-2019 se indica que, con la finalidad de obligar a los conductores a reducir su velocidad de circulación para efectuar la transición de una velocidad determinada a una de menor magnitud en un tramo relativamente corto, se pueden implementar sobre la superficie de la vía elementos reductores de velocidad **tipo bandas en agregado**. Estos dispositivos reductores de velocidad pueden generar aumentos de los niveles de ruido y algunas vibraciones a las edificaciones contiguas donde se instalan.

Comedidamente solicitamos que una vez conocida esta información, diligencie la siguiente encuesta, indicando su opinión con una X sobre las celdas SI o No:

1	¿Fue informado de las ventajas que para la reducción de velocidad de los vehículos en las vías, ofrecen los reductores de velocidad tipo banda sonora en agregado,?	SI	NO
2	¿Fue usted informado de los efectos secundarios de ruido y vibración que trae la implementación la implementación de estos reductores de velocidad?	SI	NO
3	¿Está usted de acuerdo con la implementación de los reductores de velocidad tipo **banda sonora en agregado** en la calle donde se encuentra localizada su vivienda como medida para reducir la velocidad de los vehículos?	SI	NO

Nombre:	Firma:
Teléfono:	Dirección:

Fecha: _____

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0

TEMA	Instalacion de tachones Frente Rincon de la Calleja.	
FECHA 27-05-2020	HORA 9:00AM	LUGAR Kra 21 Nº 127D -63

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA

2. ORDEN DEL DÍA

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

-los Vecinos del Conjunto Rincon de la Calleja Solicitan la no instalacion de los tachones en las Agujas, que quedan en la Direccion Cra 21 Nº 127D-63 Por la dificultad que encuentra al salir de su Parqueadero.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
-Se le informa a los vecinos que se realizan actividades Diurnas de implemetacion desde el Dia domingo 24-05-2020	Consorcio senaliza Bta	27-05-2020

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

INTERVENTORÍA SDM-1799-2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-PR01-F01	Versión 1.0

TEMA: _____ **LUGAR:** _____

RESPONSABLE: _____ **FECHA/HORA:** _____

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Juan Pablo Perez	Ed. Rincon Calgia	Apto 304	3114574080	jppsing@gmail.com	
2	ALBERTO TAPIA	APTO 104.	APTO 404	3157102245	tapiaata@gmail.com	
3	Glorio Reyes	Ed/Rincon	Apto 502	3105654277	gloriorc846@gmail.com	
4	CONSTANZA MUTIS L.	Ed. Rincon	Ap 301	3102903074	connie.mutis@yahoo.es	
5	Maria Clemencia Jara	Ed. Rincon de la.	Apt. 305	3105610733	mariacjara@gmail.com	
6	Nicolás Rueda Jara	Ed. Rincón	Apt. 305	3203819030	nrj1597@gmail.com	
7	Maria Camila forero	Ed. Rincon...	Apt. 305	3168309936	Maquitaf@hotmail.com	
8	Marcela Ramirez S.	Ed. Rincon	Apto 202	3176411079	marcelaramirezsanta@gmail	
9	MARTHA ESLAVA	Ed. Rincon	APTO 204	311-6101256	MARTHA.ESLAVA@HOTMAIL.COM	
10	María Elena caldeson	Ed Rincon	Apto 303	6480567		
11	laila Saud laborde	Ed Rincon	Apto 303	3169677704	lailasaud98@gmail.com	
12	Antonia Char	Ed. Rincón	Apto 301	3124562096	antoniachar1001@gmail.com	
13	Elizabeth Salcedo	Ed Rincon	Apto 701	3173169770	[illegible]	
14	Ma Angela Cadena	Rincon	Apto 504	310-2111747	[illegible]	
15	Stella de Nieto	Ed. Rincón	Apt. 401	3202304005	sdenieto@gmail.	
16	GUIOMAR CELY G.	Ed Rincon	Apt 403	3143367393	guiocely2076@hotmail.	

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaria Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

Nombre	Ed.	Apto	Teléf.	Correo El.	Firma.
MARIA EUGENIA GARCIA	Rincon Callega.	302	3133503822	MEGAR12@hotmail.com.	
REINER GOMEZ M.	Rincon Calleja	103	3166086808	reinergomez@hotmail.com	
Carolina Diaz	Rincon de La Calleja	505	3138889382	carodiaz7@gmail.com	
Ing Alejandra Prieto	rincon de la calleja	506	3166988638	malejandra7@hotmail.com	
Liliana Alvarez	Rincon de la calleja	507	3134792556	elilialvarez@hotmail.com	
Diego Palacios	Rincon de la Calleja	508	3012207602	dpjpalacios diego@gmail.	
Adolfo Aguirre L	Rincon de la Calleja	405	3005388420	olaglo26@hotmail.com	
		306	3135098190	Ing Civil	
Alvaro Diaz	Rincon de calleja				
Lourdes Tomas	RINCON DE LA CALLEJA	307	3138814301.	lourdes.tomas@hotmail.com	
			3212454728	tomas0207@hotmail.com	
Cesar Lozano	Rincon calleja	308			

Nombre	Ed.	Apto	Telefono	Correo Elect	Firma
Esperanza Paez R	Rincon Calleja	206	9071263	espepaez31@hotmail.com	
Noe Acuña Parra	Rincon calleja	206.	9071263.	noeacuna@gmail.com	
Laura C. Acuña Páez	Rincon calleja	206	9071263	caro-vivi1@hotmail.com	
Vivian V. Acuña Páez	Rincon calleja	206	9071263	vale.vi1@live.com	
Bertha Liliana Acosta	Rincón de la calleja	205	3204127504	ottati67@hotmail.com	
Maria Teresa Garcia	Rincon Calle	208	3102361761	mariateregara@hotmail	
Gino Torres Nieto	Rincon Calleja	207	3167423467	gtabogado@hotmal	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0

TEMA	Solicitud de demarcación Paso Peatonal Carrera 13A Calle 155		
FECHA	28 May 2020	HORA	LUGAR Quintos de Calamari

1. ASISTENTES	
NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA

2. ORDEN DEL DÍA
la Comunidad solicita la demarcación de Paso Peatonal que se encuentra en la salida del Conjunto que queda en la Calle 155 con Carrera 13A

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

APROBADO	
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	INTERVENTORÍA SDM-1799-2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-PR01-F01	Versión 1.0

TEMA: Demarcación paso peatonal **LUGAR:** Carrera 13A Calle 155

RESPONSABLE: _____ **FECHA/HORA:** 28 MAY 2020

Quintas de Calamari Administración

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Guillermina Mora G.	Residentes - Administración		8042506	quintasdecalamari@gmail.com	
2	Juan Carlos Beltran	"			Brastpointeu@hotmail.com	
3	Juan Carlos Acuña	"		8042557O	Juccarte7@hotmail.com	
4	Juan Rojas	"		3223446186	juanrojas48@hotmail.com	
5	Consuelo Suarez	"		3112221713	Konsuarez@gmail.com	
6	Oscar Chile B.	"		3016652047	oscarchile@yahoo.com	
7	Juan Mayorga	"		3106131916	juanmayorga@yahoo.com	
8	[illegible]	"		3108335908	[illegible] dignity@hotmail.com	
9	Juan Casallas	"		3174048157	leonardocasallas@gmail.com	
10	Mauricio Marino	"		3114586681	mauricio_marino@hotmail.com	
11	David Diaz	"		3204414402	dadiaz56@gmail.com	
12	Edgar Marroquin	"		3023064398	emarroco34@hotmail.com	
13	Diana De Mera	"		3157903049	angiademera@hotmail.com	
14	Victor Romero	"		3204796042	Victor.r.1950@hotmail.com	
15	Jairo G. Reyes	"		3006	[illegible]	
16	Diego Sandoval	"		3176589615	Sopa.765@hotmail.com	

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaria Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0

TEMA Instalacion de tachones Frente al Consanto Sauces de la Calleja.		
FECHA 28-05-2020	HORA 8:30 AM	LUGAR Kra 21 - Calle 127D-84

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA

2. ORDEN DEL DÍA

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- los Vecinos del Conjunto Sauces de la Calleja Solicitan la no instalacion de los tachones en la Agujas, que quedan en la Direccion Cra 21 No 127D -63 Por la dificultad que encuentran al salir y entrar de su parqueadero.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
-Se le informa a los Vecinos que se realizan actividades diurnas de implementacion desde el dia domingo 24-05-2020	Consorcio senaliza BTA	28-05-2020

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

INTERVENTORÍA SDM-1799-2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Listado de asistencia a reuniones y eventos

Código: PA01-PR01-F01 | **Versión 1.0**

TEMA: No instalacion de tachones en la agoja de la kra 21 Nº 127D-63 **LUGAR:** Cardenal Sanchez

RESPONSABLE: _____ **FECHA/HORA:** 28-05-2020

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Guillermo López Uribe	Sauces Int 3	Residente		gluribe2008@gmail.com	
2	Fibia Solano	Casa 14	Residente.		fibiasolano@gmail.com	
3	Eduardo Arce	Casa 15	Residente		eduardoarce@yahoo.es	
4	Ana Marina Alarcón	CASA 12	RESIDENTE		anab72@hotmail	
5	Tatiana Suarez Garces	Casa 5	Residente		tatiana539@gmail.com	
6	Juan Fernando Chaparro	Casa 6	Residente		JuanFernandoChaparro@gmail.com	
7	Juan Camilo Mora V.	Casa 24	Residente		Juanmanuel.coda@gmail.com	
8	Andrea Perez C	Casa 10	Residente		aperez30@perezcastellon.com	
9	Nelly Porras Barajas	Casa 8	Propietaria		porras_nelly@yahoo.com	
10	NELSON DIMILLA G.	Casa 19	" "		contacto@inmobiliariaglobal.com.co	
11	Juan Carlos Velez Gomez	Casa 30	"		jvelez@mercico.com	
12	Patricia Vera C.	Casa 28			patyvera@yahoo.es	
13	Armando Figueredo Serpa	Casa 21	Residente		afstpq@hotmail.com	
14	Angelica Cardenas M		Administradora		Saucesdelacalle@hotmail.com	
15						
16						

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaria Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

Anexo 8: Soportes del Informe de Seguridad Industrial

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300235	1	Q&R SEÑALIZACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CLL 62 B SUR 70 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	563193538	9402870489	E	2020/02/10	2020/02/13	BANCO CAJA SOCIAL	3	$1,090,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																													
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1053341539	DURAN SALINAS JULIAN DAVID	Dependiente	0	No	No										X	2020/01/01																
2	CC	1098151456	SANTOS MONTOYA JOSE DANIEL	Dependiente	0	No	No										X	2020/01/01																
3	CC	1121887324	SANTOS MONTOYA EDUIN	Dependiente	0	No	No										X	2020/01/01																
4	CC	79912031	VARGAS MORALES GIOVANNI WILSON	Dependiente	0	No	No										X	2020/01/01																

Total Afiliados(4)

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO		PENSION														SALUD						
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total
							$ 877.803	No	PROTECCION	30	$ 877.803	16%	SIN RIESGO	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500		FAMISANAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	$ 0	$ 3
							$ 877.803	No	PORVENIR	30	$ 877.803	16%	SIN RIESGO	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500		SALUD TOTAL	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	$ 0	$ 3
							$ 877.803	No	PORVENIR	30	$ 877.803	16%	SIN RIESGO	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500		FAMISANAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	$ 0	$ 3
							$ 877.803	No	PROTECCION	30	$ 877.803	16%	SIN RIESGO	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	$ 0	$ 3
																				$ 562.000						$ 140.800		$ 14

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
5.200		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 877.803	6,96%	5	$ 61.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
5.200		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 877.803	6,96%	5	$ 61.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
5.200		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 877.803	6,96%	5	$ 61.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
5.200		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 877.803	6,96%	5	$ 61.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0.800						$ 140.800						$ 244.400				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300235	1	Q&R SEÑALIZACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CLL 62 B SUR 70 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	563193538	9402870489	E	2020/02/10	2020/02/13	BANCO CAJA SOCIAL	3	$1,090,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$562,000	$1,400	$0	$563,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$281,000	$700	$0	$281,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$281,000	$700	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$244,400	$600	$0	$245,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$244,400	$600	$0	$245,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$140,800	$400	$0	$141,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$140,800	$400	$0	$141,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$140,800	$400	$0	$141,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$35,200	$100	$0	$35,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$70,400	$200	$0	$70,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,200	$100	$0	$35,300
TOTAL				**4**	**$1,088,000**	**$2,800**	**$0**	**$1,090,800**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901314965-9	CONSORCIO SEÑALIZA BTA	CALLE 17 No. 33-76	9260549	senalizabta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-01	2020-01	Y	12/02/2020	40622939	$1.148.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.148.400				1.148.400	0	0	1.148.400			11.484	1.148.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	1.148.400	1.148.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	1.148.400	1.148.400

PAGADA
40622939

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901314965-9	CONSORCIO SEÑALIZA BTA		CALLE 17 No. 33-76	9260549	senalizabta@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-01	2020-01	Y	12/02/2020	40622939	$1.148.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030526438	NIÑO CARRION ANDREA VIVIANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	7163321	RODRIGUEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	5.000.000	5	348.000		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	79293923	URREGO MALAGON LUIS ALFONSO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	10.000.000	5	696.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860530652-6	Socinter S.A.	CARRERA 18 C 121-40 OF. 301	6192035	asistentegerencia.socinter@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	12/02/2020	40627586	$8.283.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	39.900	0		0		0	0	0	0	39.900	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	224.000	0		0		0	0	0	0	224.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	461.200	0		0		0	0	0	0	461.200	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	148.200	0		0		0	0	0	0	148.200	3
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	10.100	0		0		0	0	0	0	10.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	63.600	0		0		0	0	0	0	63.600	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	48.500	0		0		0	0	0	0	48.500	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	2
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	50.700	0		0		0	0	0	0	50.700	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
ESSC76	EPS-S Ambuq	818000140-0	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.165.000	0	0	0	0	0	0		1.165.000	7
230301	Porvenir	800224808-8	1.104.000	0	0	0	0	0	0		1.104.000	6
231001	Colfondos	800227940-6	1.243.500	0	0	0	0	0	0		1.243.500	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	380.800	0	0	0	0	0	0		380.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.010.300				2.010.300	0	0	2.010.300			20.103	2.010.300	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.189.800	0	0	1.189.800	23

PAGADA
40627586

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860530652-6	Socinter S.A.		CARRERA 18 C 121-40 OF. 301	6192035	asistentegerencia.socinter@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	12/02/2020	40627586	$8.283.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	1.189.800	1.189.800
Pensión	4	3.893.300	3.893.300
Riesgos Laborales	1	2.010.300	2.010.300
CCF	1	1.189.800	1.189.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	8.283.200	8.283.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860530652-6	Socinter S.A.		CARRERA 18 C 121-40 OF. 301	6192035	asistentegerencia.socinter@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	12/02/2020	40627586	$8.283.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013537709	ARIAS ARIAS CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X	X						X									230301	251.355	40.300	0	0	0	0	EPS016	251.355	10.100	14-11	251.355	5	17.500	CCF22	251.355	10.100	0	0	0	0	0
2	CC	1018484233	SALDAÑA NUÑEZ CAMILO ANDRES	1	0			S								X									231001	1.815.750	290.600	0	0	0	0	EPS008	1.815.750	72.700	14-11	1.815.750	5	126.400	CCF22	1.815.750	72.700	0	0	0	0	0
3	CC	1022343084	CAMARGO CAMARGO MAIRA ALEJANDRA	1	0			S							X										230301	792.000	126.800	0	0	0	0	EPS010	792.000	31.700	14-11	792.000	5	55.200	CCF22	792.000	31.700	0	0	0	0	0
4	CC	1022343084	CAMARGO CAMARGO MAIRA ALEJANDRA	1	0			S												X					230301	88.000	14.100	0	0	0	0	EPS010	88.000	3.600	14-11	88.000	5	0	CCF22	88.000	3.600	0	0	0	0	0
5	CC	13478014	LLANES RAMIREZ SERGIO	1	0			S								X									25-14	1.170.500	187.300	0	0	0	0	EPS037	1.170.500	46.900	14-11	1.170.500	5	81.500	CCF22	1.170.500	46.900	0	0	0	0	0
6	CC	13478014	LLANES RAMIREZ SERGIO	1	0			S												X					25-14	40.000	6.400	0	0	0	0	EPS037	40.000	1.600	14-11	40.000	5	0	CCF22	40.000	1.600	0	0	0	0	0
7	CC	17060107	SALAZAR VILLAMIZAR JOSE MARIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	144.000	14-11	3.600.000	5	250.600	CCF22	3.600.000	144.000	0	0	0	0	0
8	CC	19314933	VERGEL AREVALO SAUL	1	4			S		X						X										0	0	0	0	0	0	EPS008	1.793.385	71.800	14-11	1.793.385	5	124.900	CCF22	1.793.385	71.800	0	0	0	0	0
9	CC	21061869	BELTRAN MELO FANNY MARCELA	1	0			S																	230201	316.667	50.700	0	0	0	0	EPS008	316.667	12.700	14-11	316.667	5	22.100	CCF22	316.667	12.700	0	0	0	0	0
10	CC	21061869	BELTRAN MELO FANNY MARCELA	1	0			S												X					230201	633.334	101.400	0	0	0	0	EPS008	633.334	25.400	14-11	633.334	5	0	CCF22	633.334	25.400	0	0	0	0	0
11	CC	22540357	CERA HERRERA MILDRED JOSELINA	1	0			S							X										230301	880.000	140.800	0	0	0	0	ESSC76	880.000	35.200	14-11	880.000	5	61.300	CCF22	880.000	35.200	0	0	0	0	0
12	CC	39547295	TIQUE CRUZ ATENAIS	1	0			S	X																230201	510.000	81.600	0	0	0	0	EPS017	510.000	20.400	14-11	510.000	5	35.500	CCF22	510.000	20.400	0	0	0	0	0
13	CC	51755256	BARRERA BALLEN OLGA LUCIA	1	0			S																	231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
14	CC	60328940	SALAZAR AREVALO ANGELA MARIA	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
15	CC	73595141	CERVERA DE LA ROSA CARLOS ALBERTO	1	0			S							X	X									230301	877.875	140.500	0	0	0	0	ESSC07	877.875	35.200	14-11	877.875	5	61.200	CCF22	877.875	35.200	0	0	0	0	0
16	CC	73595141	CERVERA DE LA ROSA CARLOS ALBERTO	1	0			S												X					230301	30.000	4.800	0	0	0	0	ESSC07	30.000	1.200	14-11	30.000	5	0	CCF22	30.000	1.200	0	0	0	0	0
17	CC	79275816	CORTES CAICEDO EDUARDO	1	0			S																	230301	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS008	2.900.000	116.000	14-11	2.900.000	5	201.900	CCF22	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
18	CC	79645788	CHAPARRO PUBLIO	1	0			S								X									230201	1.129.800	180.800	0	0	0	0	EPS008	1.129.800	45.200	14-11	1.129.800	5	78.700	CCF22	1.129.800	45.200	0	0	0	0	0
19	CC	79713934	CARRILLO CRUZ JOHN JAIRO	1	0			S								X									231001	1.267.000	202.800	0	0	0	0	EPS044	1.267.000	50.700	14-11	1.267.000	5	88.200	CCF22	1.267.000	50.700	0	0	0	0	0
20	CC	79741631	GOMEZ SALINAS EDISON	1	0			S								X									230201	1.816.354	290.700	0	0	0	0	EPS008	1.816.354	72.700	14-11	1.816.354	5	126.500	CCF22	1.816.354	72.700	0	0	0	0	0
21	CC	79892649	GARCIA RIVERA GONZALO ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.079.000	172.700	0	0	0	0	EPS017	1.079.000	43.200	14-11	1.079.000	5	75.100	CCF22	1.079.000	43.200	0	0	0	0	0
22	CC	79913683	SALINAS VALBUENA JOSE OSWALDO	1	0			S							X	X									230201	995.500	159.300	0	0	0	0	EPS002	995.500	39.900	14-11	995.500	5	69.300	CCF22	995.500	39.900	0	0	0	0	0
23	CC	80370026	BARRERA CARRENO PEDRO ANTONIO	1	0			S																	230201	970.000	155.200	0	0	0	0	EPS008	970.000	38.800	14-11	970.000	5	67.600	CCF22	970.000	38.800	0	0	0	0	0
24	CC	80489819	MORENO CAITA JOHN IVAN	1	0			S							X	X									25-14	1.022.062	163.600	0	0	0	0	EPS010	1.022.062	40.900	14-11	1.022.062	5	71.200	CCF22	1.022.062	40.900	0	0	0	0	0
25	CE	819866827051994	JIMENEZ ROSARIO DARWIN JOSE	1	0			S	X	X															25-14	146.301	23.500	0	0	0	0	EPS008	146.301	5.900	14-11	146.301	5	10.200	CCF22	146.301	5.900	0	0	0	0	0
26	PE	831583323101989	ARRIETA JULIO RICARDO	1	0			S							X	X									230201	877.700	140.500	0	0	0	0	EPS041	877.700	35.200	14-11	877.700	5	61.100	CCF22	877.700	35.200	0	0	0	0	0
27	PE	831583323101989	ARRIETA JULIO RICARDO	1	0			S												X					230201	30.000	4.800	0	0	0	0	EPS041	30.000	1.200	14-11	30.000	5	0	CCF22	30.000	1.200	0	0	0	0	0
28	PE	842482522021982	SUAREZ ATALIDO WILLI MANUEL	1	0			S							X	X									231001	858.367	137.400	0	0	0	0	EPS041	858.367	34.400	14-11	858.367	5	59.800	CCF22	858.367	34.400	0	0	0	0	0
29	PE	842482522021982	SUAREZ ATALIDO WILLI MANUEL	1	0			S												X					231001	29.334	4.700	0	0	0	0	EPS041	29.334	1.200	14-11	29.334	5	0	CCF22	29.334	1.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901314965-9	CONSORCIO SEÑALIZA BTA	CALLE 17 No. 33-76	9260549	senalizabta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	12/02/2020	40623758	$2.617.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	61.400	0		0		0	0	0	0	61.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	36.000	0		0		0	0	0	0	36.000	1
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	128.000	0		0		0	0	0	0	128.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	66.200	0		0		0	0	0	0	66.200	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	46.600	0		0		0	0	0	0	46.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.352.200	0	0	0	0	0	0		1.352.200	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	588.500				588.500	0	0	588.500			5.885	588.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	338.200	0	0	338.200	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	338.200	338.200
Pensión	1	1.352.200	1.352.200
Riesgos Laborales	1	588.500	588.500
CCF	1	338.200	338.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.617.100	2.617.100

PAGADA
40623758

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901314965-9	CONSORCIO SEÑALIZA BTA	CALLE 17 No. 33-76	9260549	senalizabta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E	12/02/2020	40623758	$2.617.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023018738	ZAPATA GONZALEZ CRISTIAN FELIPE	1	0			S								X									230301	1.164.167	186.300	0	0	0	0	EPSC34	1.164.167	46.600	14-11	1.164.167	5	81.100	CCF22	1.164.167	46.600	0	0	0	0	0
2	CC	1031144429	PAEZ BRAVO YENNY YASMIN	1	0			S								X									230301	1.653.125	264.500	0	0	0	0	EPS017	1.653.125	66.200	14-11	1.653.125	5	115.100	CCF22	1.653.125	66.200	0	0	0	0	0
3	CC	1032426293	MARTINEZ GUTIERREZ PEDRO ALEXANDER	1	0			S	X																230301	1.533.334	245.400	0	0	0	0	EPS002	1.533.334	61.400	14-11	1.533.334	5	106.800	CCF22	1.533.334	61.400	0	0	0	0	0
4	CC	1094426558	PEREZ PATIÑO ROBERTO CARLOS	1	0			S																	230301	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS016	3.200.000	128.000	14-11	3.200.000	5	222.800	CCF22	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
5	CC	39542700	CASILIMAS MARTINEZ DIANA ELIZABETH	1	0			S							X										230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS008	900.000	36.000	14-11	900.000	5	62.700	CCF22	900.000	36.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2020-02-10, 1:30:38 p. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 43192847

Periodo Cotización: 202002 **Periodo Servicio:** 202002

PAGADA 2020-02-10 01:30:PM

Se certifica que en la fecha 10/02/2020, la empresa FAVIAN CAMILO CASTELLANOS NOY, con documento de identificación CC1016091355, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado HINESTROZA GOMEZ CAMILO ALFONSO , con CC 80864796, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
EPS	N860066942	EPS008	COMPENSAR EPS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2020-02-10, 1:20:49 PM.

Tipo Planilla: E **Número Planilla:** 431956371

Periodo Cotización: 202002 **Periodo Servicio:** 202002

PAGADA 2020-02-10 1:20:PM

Se certifica que en la fecha 10/02/2020, la empresa FAVIAN CAMILO CASTELLANOS NOY, con documento de identificación CC1016091355, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CORTES TORRES YICETD XIMENA, con CC 52931597, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2020-02-10, 1:15:52 p. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 431959537

Periodo Cotización: 202002 **Periodo Servicio:** 202002

PAGADA 2020-02-10 1:15 pm

Se certifica que en la fecha 10/02/2020, la empresa FAVIAN CAMILO CASTELLANOS NOY, con documento de identificación CC1016091355, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado PINA MONTES JOHOMAR JOSE, con PE 819172727081995, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
EPS	N800130907	EPS002	FAMISANAR EPS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2020-02-10, 01:25:38 p. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 431955429

Periodo Cotización: 202002 **Periodo Servicio:** 202002

PAGADA 2020-02-10 01:25:PM

Se certifica que en la fecha 10/02/2020, la empresa FAVIAN CAMILO CASTELLANOS NOY, con documento de identificación CC1016091355, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CORTES TORRES LUZ ANGELA , con CC 52530273, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
EPS	N860066942	EPS008	COMPENSAR EPS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300235	1	Q&R SEÑALIZACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CLL 62 B SUR 70 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	563193538	9402870489	E	2020/02/10	2020/02/13	BANCO CAJA SOCIAL	3	$1,090,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																													
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1053341539	DURAN SALINAS JULIAN DAVID	Dependiente	0	No	No										X	2020/01/01																
2	CC	1098151456	SANTOS MONTOYA JOSE DANIEL	Dependiente	0	No	No										X	2020/01/01																
3	CC	1121887324	SANTOS MONTOYA EDUIN	Dependiente	0	No	No										X	2020/01/01																
4	CC	79912031	VARGAS MORALES GIOVANNI WILSON	Dependiente	0	No	No										X	2020/01/01																

Total Afiliados(4)

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO		PENSION														SALUD						
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total
							$ 877.803	No	PROTECCION	30	$ 877.803	16%	SIN RIESGO	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500		FAMISANAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	$ 0	$ 3
							$ 877.803	No	PORVENIR	30	$ 877.803	16%	SIN RIESGO	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500		SALUD TOTAL	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	$ 0	$ 3
							$ 877.803	No	PORVENIR	30	$ 877.803	16%	SIN RIESGO	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500		FAMISANAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	$ 0	$ 3
							$ 877.803	No	PROTECCION	30	$ 877.803	16%	SIN RIESGO	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	$ 0	$ 3
																				$ 562.000						$ 140.800		$ 14

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
5.200		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 877.803	6,96%	5	$ 61.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
5.200		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 877.803	6,96%	5	$ 61.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
5.200		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 877.803	6,96%	5	$ 61.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
5.200		COMPENSAR	30	$ 877.803	4%	$ 35.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 877.803	6,96%	5	$ 61.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0.800						$ 140.800						$ 244.400				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300235	1	Q&R SEÑALIZACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CLL 62 B SUR 70 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	563193538	9402870489	E	2020/02/10	2020/02/13	BANCO CAJA SOCIAL	3	$1,090,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$562,000	$1,400	$0	$563,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$281,000	$700	$0	$281,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$281,000	$700	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$244,400	$600	$0	$245,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$244,400	$600	$0	$245,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$140,800	$400	$0	$141,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$140,800	$400	$0	$141,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$140,800	$400	$0	$141,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$35,200	$100	$0	$35,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$70,400	$200	$0	$70,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,200	$100	$0	$35,300
TOTAL				**4**	**$1,088,000**	**$2,800**	**$0**	**$1,090,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900736863	3	CYS SEÑALES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VARGAS	AC 31 SUR N 12 ESTE 55 BL INTE 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8932001	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	9402893826	9402893826	E	2020/02/14	2020/02/14	BANCO BOGOTA	0	$825,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1067711696	BELEÑO PEDRO		X					X											230301	1	$29,261	$4,700	EPS017	1	$29,261	$1,200	CCF24	1	$29,261	$1,200	14-23	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	Si	$9,200
2	CC	79979115	GALVIS ADOLFO							X											230301	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
3	CC	78028119	HERNANDEZ FREDDY							X											230301	30	$877,803	$140,500	EPS016	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
4	CC	79561846	VARGAS ALVARO							X											230201	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
Total	**Afiliados(4)**																					$2,662,670	$426,200			$2,662,670	$106,800			$2,662,670	$106,400			$2,662,670	$185,400		$0	$0		$825,200

2020/02/18 08:34 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900736863	3	CYS SEÑALES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VARGAS	AC 31 SUR N 12 ESTE 55 BL INTE 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8932001	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	9402893826	9402893826	E	2020/02/14	2020/02/14	BANCO BOGOTA	0	$825,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$426,200	$0	$0	$426,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$285,700	$0	$0	$285,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$185,400	$0	$0	$185,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$185,400	$0	$0	$185,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$106,800	$0	$0	$106,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$106,800	$0	$0	$106,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$106,800	$0	$0	$106,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$35,200	$0	$0	$35,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				4	$825,200	$0	$0	$825,200

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900682769-5	CEFEVIAL SAS	CL 22 J BIS 120 25 P1	4207111	martinez1258@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E		40659192	$1.835.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	99.900	0		0		0	0	0	0	99.900	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	45.800	0		0		0	0	0	0	45.800	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	23.500	0		0		0	0	0	0	23.500	1
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	468.500	0	0	0	0	0	0		468.500	5
230301	Porvenir	800224808-8	309.200	0	0	0	0	0	0		309.200	4
231001	Colfondos	800227940-6	37.500	0	0	0	0	0	0		37.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	400.500				400.500	0	0	400.500			4.005	400.500	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	239.600	0	0	239.600	11

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900682769-5	CEFEVIAL SAS		CL 22 J BIS 120 25 P1	4207111	martinez1258@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E		40659192	$1.835.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	239.600	239.600
Pensión	4	955.700	955.700
Riesgos Laborales	1	400.500	400.500
CCF	1	239.600	239.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	1.835.400	1.835.400

PAGADO 563739076

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900682769-5	CEFEVIAL SAS		CL 22 J BIS 120 25 P1	4207111	martinez1258@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E		40659192	$1.835.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002549439	LOPEZ TORRES DAVID FELIPE	1	0			S	X																230301	672.983	107.700	0	0	0	0	EPS037	672.983	27.000	14-11	672.983	5	46.900	CCF22	672.983	27.000	0	0	0	0	0
2	CC	1012332847	PERDOMO PARRAGA HERNAN DARIO	1	0			S	X																230201	292.601	46.900	0	0	0	0	EPS005	292.601	11.800	14-11	292.601	5	20.400	CCF22	292.601	11.800	0	0	0	0	0
3	CC	1030608564	QUINTERO QUIÑONES WILLIAM ERNESTO	1	0			S	X																230201	585.202	93.700	0	0	0	0	EPSC34	585.202	23.500	14-11	585.202	5	40.800	CCF22	585.202	23.500	0	0	0	0	0
4	CC	1031175351	ZABALA ZULETA EDIER FERNANDO	1	0			S		X															230301	146.301	23.500	0	0	0	0	EPS005	146.301	5.900	14-11	146.301	5	10.200	CCF22	146.301	5.900	0	0	0	0	0
5	CC	1057411230	DUARTE MOGOLLON DIEGO FERMANDO	1	0			S	X																230201	585.202	93.700	0	0	0	0	EPS005	585.202	23.500	14-11	585.202	5	40.800	CCF22	585.202	23.500	0	0	0	0	0
6	CC	17641797	MARTINEZ CUBILLOS CEFERINO	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF22	877.803	35.200	0	0	0	0	0
7	CC	17690299	MARTINEZ FABIAN ISIDRO	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS010	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF22	877.803	35.200	0	0	0	0	0
8	CC	2251911	CASTRO NOVA UILSON	1	0			S	X																230201	585.202	93.700	0	0	0	0	EPS005	585.202	23.500	14-11	585.202	4	25.500	CCF22	585.202	23.500	0	0	0	0	0
9	CC	28220865	FIGUEROA NIÑO MARTHA	1	0			S	X																230301	234.081	37.500	0	0	0	0	EPS037	234.081	9.400	14-11	234.081	5	16.300	CCF22	234.081	9.400	0	0	0	0	0
10	CC	28338950	MORENO ANGARITA MIRYAM	1	0			S	X																231001	234.081	37.500	0	0	0	0	EPS037	234.081	9.400	14-11	234.081	5	16.300	CCF22	234.081	9.400	0	0	0	0	0
11	CC	7128554	DURAN YAGAMA DIEGO FABIAN	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	ESSC33	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF22	877.803	35.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900489591-5	VELASQUEZ LATORRE INDUSTRIAS S.A.S	CALLE 26 N 23-35	2459061	vlindustrias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E		40696008	$781.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC53	EPS-S Comfacundi	860045904-7	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	122.200				122.200	0	0	122.200			1.222	122.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	70.400	0	0	70.400	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
35.200	0	0	35.200	2
ICBF				
52.800	0	0	52.800	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	219.600	219.600
Pensión	2	281.000	281.000
Riesgos Laborales	1	122.200	122.200
CCF	1	70.400	70.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	52.800	52.800
MEN	0	0	0
SENA	1	35.200	35.200
TOTALES	8	781.200	781.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900489591-5	VELASQUEZ LATORRE INDUSTRIAS S.A.S		CALLE 26 N 23-35	2459061	vlindustrias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E		40696008	$781.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013678206	CRUZ SALCEDO NICOLAS CAMILO	1	0			N																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS010	877.803	109.800	14-7	877.803	5	61.100	CCF22	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
2	CC	1079034817	ROMERO PORTELA JUAN FELIPE	1	0			N																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	CCFC53	877.803	109.800	14-7	877.803	5	61.100	CCF22	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901232408-5	MAS SOLUCIONES INTEGRALES SEÑALIZACION VIAL Y CAL		CALLE 33 N 20 ESTE TO 18 APT 472	3144556806	msenalizacion@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-01	2019-12	E	13/01/2020	39903252	$1.947.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	43.200	0		0		0	6	200	0	43.400	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	27.800	0		0		0	6	200	0	28.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	33.200	0		0		0	6	200	0	33.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	41.000	0		0		0	6	200	0	41.200	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	100.600	0		0		0	6	500	0	101.100	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	411.100	0	0	0	0	6	1.800	0	412.900	5
230301	Porvenir	800224808-8	455.100	0	0	0	0	6	2.000	0	457.100	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	167.900	0	0	0	0	6	800	0	168.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	409.900				409.900	6	1.800	411.700			4.099	411.700	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	249.000	6	1.100	250.100	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	245.800	247.100
Pensión	3	1.034.100	1.038.700
Riesgos Laborales	1	409.900	411.700
CCF	1	249.000	250.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.938.800	1.947.600

PAGADA
39903252

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901232408-5	MAS SOLUCIONES INTEGRALES SEÑALIZACION VIAL Y CAL	CALLE 33 N 20 ESTE TO 18 APT 472	3144556806	msenalizacion@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-01	2019-12	E	13/01/2020	39903252	$1.947.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000831565	BUITRAGO PACHON JOSE DAVID	1	0			S	X	X															230201	524.474	84.000	0	0	0	0	EPSC34	524.474	21.000	14-11	524.474	5	36.600	CCF21	548.627	22.000	0	0	0	0	0
2	CC	1001077288	SIERRA GARAY CARLOS GIOVANNY	1	0			S	X	X															25-14	276.039	44.200	0	0	0	0	EPS005	276.039	11.100	14-11	276.039	5	19.300	CCF21	297.892	12.000	0	0	0	0	0
3	CC	1010236934	OSPINA SANCHEZ JAIME ALEJANDRO	1	0			S	X	X															230301	82.812	13.300	0	0	0	0	EPS005	82.812	3.400	14-11	82.812	5	5.800	CCF21	86.262	3.500	0	0	0	0	0
4	CC	1013651354	CUBILLOS BOLAÑOS CRISTIAN ANDRES	1	0			S	X	X															230301	579.682	92.800	0	0	0	0	EPSC34	579.682	23.200	14-11	579.682	5	40.400	CCF21	603.835	24.200	0	0	0	0	0
5	CC	1019127282	MENDEZ SERNA MIGUEL EDUARDO	1	0			S	X	X															230201	524.474	84.000	0	0	0	0	EPS017	524.474	21.000	14-11	524.474	5	36.600	CCF21	546.327	21.900	0	0	0	0	0
6	CC	1030608564	QUINTERO QUIÑONES WILLIAM ERNESTO	1	0			S		X															230201	634.889	101.600	0	0	0	0	EPSC34	634.889	25.400	14-11	634.889	5	44.200	CCF21	867.222	34.700	0	0	0	0	0
7	CC	11038456	BLANCO BURGOS BENITO ANTONIO	1	0			S																	230301	386.455	61.900	0	0	0	0	EPS017	386.455	15.500	14-11	386.455	5	26.900	CCF21	386.455	15.500	0	0	0	0	0
8	CC	11038456	BLANCO BURGOS BENITO ANTONIO	1	0			S									X								230301	441.662	53.000	0	0	0	0	EPS017	441.662	0	14-11	441.662	5	0	CCF21	441.662	0	0	0	0	0	0
9	CC	1117535812	CARABALI QUIÑONEZ HEIDY LEANY	1	0			S	X																230201	524.474	84.000	0	0	0	0	EPSC34	524.474	21.000	14-11	524.474	5	36.600	CCF21	524.474	21.000	0	0	0	0	0
10	CC	1117535812	CARABALI QUIÑONEZ HEIDY LEANY	1	0			S										X							230201	248.435	39.800	0	0	0	0	EPSC34	248.435	10.000	14-11	248.435	5	0	CCF21	248.435	0	0	0	0	0	0
11	CC	11434620	MARTIN LOPEZ JOSE GUILLERMO	1	0			S	X																230301	303.643	48.600	0	0	0	0	EPS002	303.643	12.200	14-11	303.643	5	21.200	CCF21	303.643	12.200	0	0	0	0	0
12	CC	16186305	QUIÑONEZ CUBILLOS WILLIAN	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS010	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF21	828.116	33.200	0	0	0	0	0
13	CC	16189457	QUIÑONEZ CUBILLOS ERNESTO	1	0			S	X																25-14	772.909	123.700	0	0	0	0	EPS002	772.909	31.000	14-11	772.909	5	53.800	CCF21	772.909	31.000	0	0	0	0	0
14	CC	80224757	HERNANDEZ HURTADO DAVID HUMBERTO	1	0			S	X																230301	331.247	53.000	0	0	0	0	EPS005	331.247	13.300	14-11	331.247	5	23.100	CCF21	331.247	13.300	0	0	0	0	0
15	CC	8567988	MORALES HERNANDEZ LIBARDO	1	0			S	X																230201	110.416	17.700	0	0	0	0	EPS017	110.416	4.500	14-11	110.416	5	7.700	CCF21	110.416	4.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Medellín, 5 de mayo de 2020

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO SEÑALIZA BTA, NIT N901314965, no presenta accidentes de trabajo desde el 05 de marzo de 2020 hasta el 25 de marzo de 2020.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 200.89.254.125, 172.16.42.57. Código

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
