
CONTRATO DE OBRA N°: 520 DE 2022 — **OBJETO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU – PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA"** — **ENTIDAD CONTRATANTE: IDU**

CRONOGRAMA MAYOR CANTIDAD DE OBRA — **CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2022**

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	%compl Núm	%ProgramNúm (Número2)
1		**PROGRAMA CONTRATO 520-2022 - GRUPO I**	**20%**	**0,2**	**0,28**
2		**PRELIMINARES**	**100%**	**1**	**1**
10		**Etapa de Ejecución**	**17%**	**0,17**	**0,17**
11		**PROYECTO TRONCAL CENTENARIO (AC13)**	**41%**	**0,41**	**0,17**
12		90 PREDIOS	11%	0,11	0,17
13		ELABORACION, GESTION Y APROBACION PMT	100%	1	0,17
14		PROCEDIMIENTO DEMOLICION	11%	0,11	0,18
15		**PROYECTO AV SUBA - COTA**	**37%**	**0,37**	**0,18**
16		70 PREDIOS	6%	0,06	0,18
17		ELABORACION, GESTION Y APROBACION PMT	100%	1	0,18
18		PROCEDIMIENTO DE DEMOLICION	6%	0,06	0,18
19		**PROYECTO AVENIDA CONSTITUCION**	**0%**	**0**	**0,18**
20		6 PREDIOS	0%	0	0,18
21		ELABORACION, GESTION Y APROBACION PMT	0%	0	0,18
22		PROCEDIMIENTO DE DEMOLICION	0%	0	0,18
23		**PROYECTO AVENIDA VILLAS**	**9%**	**0,09**	**0,17**
24		8 PREDIOS	13%	0,13	0,17
25		ELABORACION, GESTION Y APROBACION PMT	0%	0	0,17
26		PROCEDIMIENTO DE DEMOLICION	13%	0,13	0,17
27		**PROYECTO JOSE CELESTINO MUTIS**	**8%**	**0,08**	**0,17**
28		4 PREDIOS	0%	0	0,17
29		ELABORACION, GESTION Y APROBACION PMT	0%	0	0,17
30		PROCEDIMIENTO DE DEMOLICION	50%	0,5	0,17
31		EJECUCION PLAN DE GESTION AMBIENTAL	0%	0	0,17
32		EJECUCION PLAN DE GESTION SOCIAL	0%	0	0,17
33		PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	0%	0	0,17

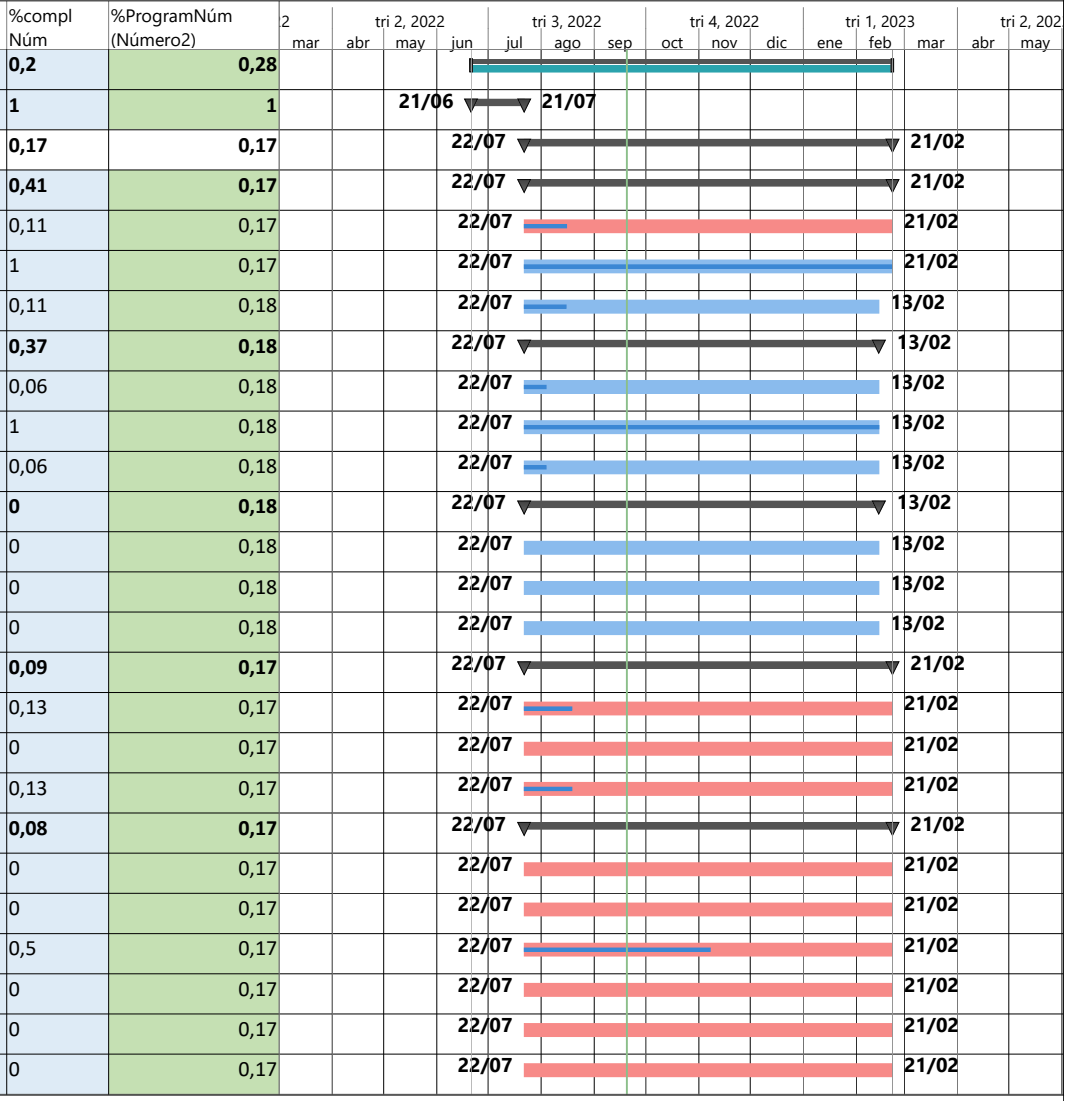

Proyecto: PROGRAMA INICIAL
Fecha: mar 20/09/22

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

YAMILL MONTENEGRO
Contratista

EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS
Interventor
