INFORME DE OBRA No. 2



Objeto: **"CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA I.E. SANTA BARBARA SEDE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, DEPARTAMENTO DE BOYACA"**

FECHA INFORME:	15 DE FEBRERO DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. DEL CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8656646/4008
CONTRATANTE:	GOBERNACION DE BOYACA
CONTRATISTA:	OBRAS INSIGNIA S.A.S
NIT:	901.740.550-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NICOLAS ALEJANDRO AFRICANO BENITEZ CC. No. 1.019.112.140 DE BOGOTA D.C
VALOR DEL CONTRATO:	$72.199.396,00
VALOR EN LETRA:	SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE
FECHA DE CONTRATO:	1 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO:	15 DE ENERO DE 2026
PLAZO:	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR:	LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 5
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
EQUIPO DE TRABAJO 8
Relación de personal en obra 8
Jornadas de trabajo 8
AVANCE DE OBRA 9
LOCALIZACION DEL PROYECTO 10
REGISTRO FOTOGRAFICO 11
- Excavación manual en material común 11
- Solado de concreto de esperos E=0.005 M 14 Mpa (2000psi) 11
- Concreto para viga de amarre 21 Mpa (3000psi) seccion rectangular 12
- Concreto para zapatas de 21 Mpa (3000psi)+formaleta madera 12
- Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 Mpa 13
- Suministro e instalacion de porton abatible de 3m x 2,30m, en malla eslabonada cal 10: 14

CONCLUSIONES 15

Señor(s)

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Atn. ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
SUPERVISION

Ref: Informe de ejecución y actividades – Contrato No. **CO1.PCCNTR.8656646/4008**

Cordial saludo

Mediante el presente informe, se relaciona el estado de ejecución del contrato cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA I.E. SANTA BARBARA SEDE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**.
Es importante precisar que la dinámica operativa inició el día 09 de diciembre de 2025; no obstante, el proceso contó con una suspensión a partir del día 26 de diciembre, motivada por las festividades decembrinas que dificultaban el suministro de materiales y la disponibilidad de mano de obra local.

Una vez superada dicha novedad, se procedió con el **reinicio de las actividades el día 15 de enero de 2026**. Por lo tanto, el presente documento detalla las labores realizadas durante el periodo comprendido entre el **15 de enero y el 15 de febrero de 2026**.

A continuación, relaciono el plan de trabajo que se llevó a cabo durante la ejecución del contrato en mención:

Cordialmente,

OBRAS INSIGNIA S.A.S
NIT. 901.740.550-2
NICOLAS ALEJANDRO AFRICANO BENITEZ
C.C 1.019.112.140 DE BOGOTA D.C

INTRODUCCION

El presente informe técnico tiene como objeto primordial relacionar el estado de avance físico, la gestión operativa y el cumplimiento de los hitos contractuales del proyecto de obra destinado a la **"Construcción del cerramiento de la Institución Educativa Santa Bárbara, sede Santa Bárbara"**, ubicada en la jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur, departamento de Boyacá. La ejecución de este proyecto se fundamenta en la necesidad imperativa de fortalecer la seguridad perimetral del plantel, garantizando un control de acceso eficiente que salvaguarde la integridad de la comunidad estudiantil y docente, así como la protección de los activos y la infraestructura física de la institución frente a posibles factores externos.

El proceso de ejecución del contrato inició formalmente su dinámica operativa el día **09 de diciembre de 2025**, desarrollando las labores preliminares correspondientes. No obstante, en cumplimiento de las disposiciones logísticas de fin de año y con el fin de evitar traumatismos en el suministro de insumos y la disponibilidad de personal técnico especializado, las labores fueron objeto de una **suspensión temporal a partir del día 26 de diciembre de 2025**. Esta medida se adoptó para garantizar que, una vez retomadas las actividades, se contara con el flujo de materiales y la mano de obra local necesarios para dar continuidad al cronograma de obra sin interrupciones adicionales.

Tras la superación del periodo de suspensión, se procedió con el **reinicio formal de las actividades el día 15 de enero de 2026**, fecha en la cual se normalizó el ingreso de materiales y personal al frente de obra. En consecuencia, el presente reporte detalla de manera pormenorizada las gestiones realizadas en el periodo comprendido entre el **15 de enero y el 15 de febrero de 2026**, periodo en el cual se ha priorizado la recuperación de los rendimientos constructivos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la supervisión.

A continuación, se exponen los detalles técnicos del proceso constructivo, incluyendo la descripción de las unidades de obra ejecutadas tras el reinicio, el análisis del avance financiero y los resultados obtenidos en términos de calidad, seguridad industrial y compromiso social para el beneficio directo de la comunidad educativa de San Pablo de Borbur.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para cumplir con la ejecución de la obra y la construcción del cerramiento en el municipio de San Pablo de Borbur, se realizaron las siguientes tareas:

- **Excavación manual en material común:** Realización de las aperturas en terreno necesarias para el desplante de la cimentación del cerramiento, ejecutadas de acuerdo con las dimensiones y niveles definidos en los planos estructurales.

- **Solado de concreto de esperos E=0.005 M 14 Mpa (2000psi):** Aplicación de una capa de concreto pobre de limpieza para nivelar el fondo de las excavaciones, garantizando una superficie óptima para la colocación del refuerzo y evitando la contaminación del concreto estructural con el suelo.

- **Concreto para zapatas de 21 Mpa (3000psi)+formaleta madera:** Construcción de los elementos de cimentación superficial mediante el vaciado de concreto de 3000 psi y el uso de moldes de madera, asegurando la estabilidad y el soporte de las columnas del cerramiento.

- **Concreto para viga de amarre 21 Mpa (3000psi) seccion rectangular:** Ejecución de vigas estructurales en concreto reforzado, encargadas de confinar los elementos de cimentación y distribuir uniformemente las cargas horizontales y verticales de la estructura.

- **Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 Mpa:** Preparación e instalación de barras de acero de alta resistencia, cortadas y dobladas según el diseño estructural, para dotar a los elementos de concreto de la capacidad necesaria para resistir esfuerzos de tracción.

- **Cerramiento en malla eslabonada Cal 10 (incluye tubo agua negra de 2" y angulo de 1" x 1" x 1/8"):** Instalación de la barrera perimetral compuesta por malla de alta durabilidad, soportada por postes de tubería de agua negra de 2" y marcos en ángulo de 1" x 1/8", garantizando la seguridad y delimitación definitiva de la sede educativa.

- **Suministro e instalacion de porton abatible de 3m x 2,30m, en malla eslabonada cal 10:** Esta actividad consiste en el suministro e instalación técnica de un portón de doble hoja abatible con dimensiones de $3,00 \times 2,30 \text{ m}$, fabricado sobre una estructura de tubería de acero galvanizado reforzado y revestido con malla eslabonada calibre 10 de alta resistencia. El proceso incluye el anclaje de postes de soporte en concreto, la instalación de bisagras industriales de alto tráfico, pasadores de seguridad y la aplicación de recubrimiento anticorrosivo, garantizando un acceso funcional, duradero y seguro que se integra perfectamente a la continuidad del cerramiento perimetral de la I.E. Santa Bárbara.

EQUIPO DE TRABAJO

Relación de personal en obra

Para el desarrollo del proyecto durante el periodo de tiempo del presente informe se ha contratado personal profesional y auxiliares para la ejecución de la obra en el municipio de san pablo de borbor.

ITEM	CARGO	CANTIDAD
1	ING. RESIDENTE DE OBRA/DIRECTOR DE OBRA	01
2	MAESTRO DE OBRA	01
Personal Operativo		
1	OFICIALES	01
2	AYUDANTES	01

Jornadas de trabajo

Para el desarrollo del proyecto se presentan las siguientes jornadas de trabajo:

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
7:00 A.M.-12:00 P.M.	7:00 A.M.-12:00 P.M.	7:00 A.M.-12:00 P.M.	7:00 A.M.-12:00 P.M.	7:00 A.M.-12:00 P.M.	7:00 A.M.-12:00 P.M.	N/A
ALMUERZ 12:00 P.M. – 1:00 P.M.	ALMUERZ 12:00 P.M. – 1:00 P.M.	ALMUERZ 12:00 P.M. – 1:00 P.M.	ALMUERZ 12:00 P.M. – 1:00 P.M.	ALMUERZ1 2:00 P.M. – 1:00 P.M.	.	N/A
1:00 P.M. – 5:00 P.M.	1:00 P.M. – 5:00 P.M.	1:00 P.M. – 5:00 P.M.	1:00 P.M. – 5:00 P.M.	1:00 P.M. – 5:00 P.M.		N/A

AVANCE DE OBRA

En desarrollo del Contrato **CO1.PCCNTR.8656646/4008**, cuyo objeto es, **"CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA I.E. SANTA BARBARA SEDE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, DEPARTAMENTO DE BOYACA"** el contratista manifiesta haber ejecutado de manera satisfactoria, a la fecha del 15 de febrero de 2026, actividades verificadas por la supervisión, las cuales representan un avance físico del 97,62% del contrato conforme a la programación contractual.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						AVANCE FISICO INFORME 1		AVANCE FISICO INFORME 2		AVANCE FISICO TOTAL
ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCION	FUENTE DE PRECIOS	UND	CANT	CANT	%	CANT	%	% ACUMULADO
1.00		PRELIMINARES								
1.01	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	Precios Gober.	Metro Cúbico	4.13	3.64	88.14%	0.49	11.86%	100.00%
2.00		REALIZAR ACTIVIDADES DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, MAPOSTERIA Y CERRAMIENTO								
2.02	2.02.25	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E=0.05 M. 14 Mpa (2000psi)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	23.25	16.65	71.61%	6.60	28.39%	100.00%
2.03	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 Mpa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Precios Gober.	Metro Cúbico	4.13	2.63	63.56%	1.51	36.44%	100.00%
2.04	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 Mpa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Precios Gober.	Metro Cúbico	3.56	2.40	67.42%	1.16	32.58%	100.00%
2.05	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Precios Gober.	Kilogramo	515.64	264.26	51.25%	251.38	48.75%	100.00%
2.06	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Precios Gober.	Metro Cuadrado	198.00	52.80	26.67%	112.20	56.67%	83.33%
2.07	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTÓN ABATIBLE DE 3M X 2.30 M. EN MALLA ESLABONADA CAL 10	Precios Ref.	Unidad	1.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%	100.00%
		AVANCE TOTAL					52.66%		44.96%	97.62%

LOCALIZACION DEL PROYECTO


El proyecto se realizó en **la Institución Educativa Santa Bárbara, sede Santa Bárbara, ubicada en el municipio de San Pablo de Borbur, departamento de Boyacá**.

San Pablo de Borbur es un municipio colombiano ubicado en la provincia de Occidente en el departamento de Boyacá.

El municipio está situado a unos 65 km de la ciudad de Chiquinquirá, capital de la provincia y limita al norte con Otanche y Pauna, al sur con Muzo, al oriente con Maripi y Pauna y al occidente con Otanche.

San Pablo de Borbur también es conocido como «el municipio esmeralda de Colombia»,[3] por sus numerosos yacimientos en su jurisdicción.

En 1875 se creó el caserío y hacia 1912 se construyó la primera capilla por iniciativa de Guillermo Lancheros. El primer párroco de la población fue el sacerdote Pablo Valette quien llegó en 1918. Fue creado a partir del municipio de Pauna el 9 de diciembre de 1959. Dentro de las dos vertientes antropológicas de la población se encuentra los indígenas muzos y los españoles.

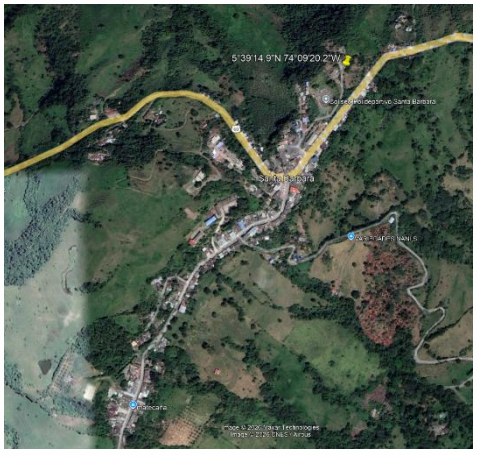

REGISTRO FOTOGRAFICO

- **Excavación manual en material común**




- **Solado de concreto de esperos E=0.005 M 14 Mpa (2000psi)**





- **Concreto para viga de amarre 21 Mpa (3000psi) seccion rectangular**





- **Concreto para zapatas de 21 Mpa (3000psi)+formaleta madera**





- **Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 Mpa**






- **Cerramiento en malla eslabonada Cal 10 (incluye tubo agua negra de 2" y angulo de 1" x 1" x 1/8")**




- **Suministro e instalacion de porton abatible de 3m x 2,30m, en malla eslabonada cal 10:**



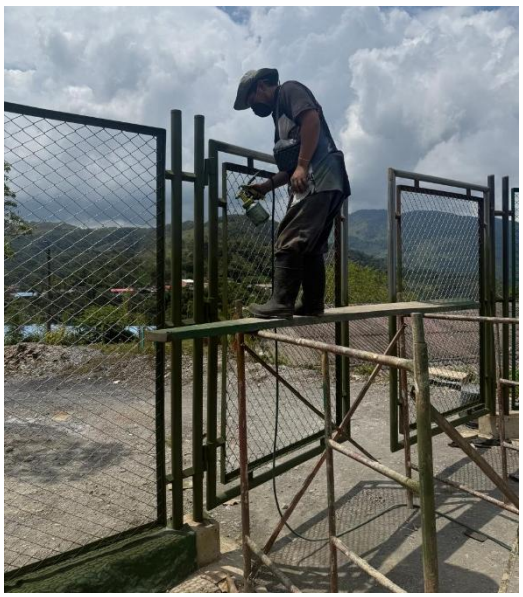


CONCLUSIONES

- Tras el reinicio de actividades el 15 de enero de 2026, se logró una estabilización exitosa de los rendimientos constructivos. La estrategia de suspensión temporal decembrina resultó efectiva, pues permitió retomar las obras con un flujo constante de materiales y personal técnico, minimizando tiempos muertos por desabastecimiento.
- Durante el periodo reportado (enero-febrero), las unidades de obra ejecutadas en el cerramiento cumplen rigurosamente con los estándares de calidad y seguridad industrial exigidos. El control de supervisión garantiza que la infraestructura final ofrecerá la resistencia necesaria para cumplir su función de seguridad perimetral.
- A pesar de la pausa logística de fin de año, la programación de obra se encuentra alineada con los hitos contractuales. La priorización de frentes de trabajo tras el reinicio ha permitido compensar los días de suspensión, manteniendo una proyección de entrega acorde a los tiempos estipulados por el municipio de San Pablo de Borbur.
- La ejecución del proyecto avanza hacia la consolidación de un entorno escolar seguro. El cerramiento de la Sede Santa Bárbara se perfila no solo como una mejora física, sino como una medida de mitigación de riesgos externos, cumpliendo con el objeto social de proteger a la comunidad estudiantil y los activos de la institución.

El presente informe se firma en Bogotá a los 15 días del mes de febrero del año 2026

OBRAS INSIGNIA S.A.S
NIT. 901.740.550-2
NICOLAS ALEJANDRO AFRICANO BENITEZ
C.C 1.019.112.140 DE BOGOTA D.C

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL 15 /01/25 AL 15/02/26 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8656646/4008

REGISTRO BPyP No.: 202500000038123

FECHA INICIACIÓN: 09 de diciembre de 2025 FECHA TERMINACIÓN: 06 de marzo del 2026

CONTRATISTA: OBRAS INSIGNIA S.A.S INTERVENTOR: LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA I.E. SANTA BARBARA SEDE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, DEPARTAMENTO DE BOYACA

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
2.01.70	Excavación manual en material común	Excavación manual en material común	X			
2.02.25	Solado de concreto de esperos E=0.005 M 14 Mpa (2000psi)	Solado de concreto de esperos E=0.005 M 14 Mpa (2000psi)	X			
2.02.10	Concreto para zapatas de 21 Mpa (3000psi)+formaleta madera	Concreto para zapatas de 21 Mpa (3000psi)+formaleta madera	X			
2.02.13	Concreto para viga de amarre 21 Mpa (3000psi) seccion rectangular	Concreto para viga de amarre 21 Mpa (3000psi) seccion rectangular	X			
3.10.12	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 Mpa:	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 420 Mpa	X			
2.19.06	Cerramiento en malla eslabonada Cal 10 (incluye tubo agua negra de 2" y angulo de 1" x 1" x 1/8")	Cerramiento en malla eslabonada Cal 10 (incluye tubo agua negra de 2" y angulo de 1" x 1" x 1/8")		X		
APU	Suministro e instalacion de porton abatible de 3m x 2,30m, en malla eslabonada cal 10	Suministro e instalacion de porton abatible de 3m x 2,30m, en malla eslabonada cal 10	X			

Firma: _____
Nombre: LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: ____
Nombre: Nicolas Alejandro Africano Benitez
CONTRATISTA


T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.


Contratista.

Sabado 27 de Diciembre de 2025
Contiato en sospension




contiatista

Domingo 28 de Diciembre de 2025
Contiato en sospension



contratista

Lunes 29 de Diciembre de 2025
Contiato en sospension



contiatista

Martes 30 de Diciembre de 2025
Contiato en sospension

Miercoles 31 de Diciembre de 2025
Contrato en suspensión

Contratista

Jueves 1 de Enero de 2026
Contrato en suspensión

Contratista

Viernes 2 de Enero de 2026
Contrato en suspensión

Contratista

Sabado 3 de Enero de 2026
Contrato en suspensión

Contratista

Domingo 4 de Enero de 2026
Contrato en suspensión

Contratista

Lunes 5 de Enero de 2026
Contrato en suspensión

Contratista

Martes 6 de Enero de 2026
Contrato en suspensión

Contratista.

Scanned with CamScanner

Miercoles 7 de Enero de 2026
Contrato en suspension

Contratista

Jueves 8 de Enero de 2026
Contrato en suspension

Contratista

Viernes 9 de Enero de 2026
Contrato en suspension

Contratista.

Sabado 10 de Enero de 2026
Contrato en suspension

Contratista

Domingo 11 de Enero de 2026
Contrato en suspension

Contratista

Lunes 12 de Enero de 2026
Contrato en suspension


Contratista

Martes 13 de Enero de 2026
Contrato en suspension


Contratista

Scanned with CamScanner

Miercoles 14 de Enero de 2026
Contrato en suspension


Contratista

Jueves 15 de Enero de 2026
Clima: Soleado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.
Equipo en obra: (2) carretillas, herramienta menor, (1) equipo de soldadura, (1) compresor, (1) planta electrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto.
Avance de obra: Se da reinicio a las actividades en obra, se inicia confinamiento de tableros para viga de cimentacion, se realiza excavacion para solado en concreto pobre y se continua con la fabricacion de tableros para el cerramiento en el costado sur.


Contratista

Viernes 16 de Enero de 2026
Clima: Soleado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.
Equipo en obra: (2) carretillas, herramienta menor, (1) equipo de soldadura, (1) compresor, (1) planta electrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto.
Avance de obra: Se da inicio a la lyada de los tubos que confinan el cerramiento, para aplicacion de anticorrosivo y pintura, se funde solado en concreto pobre del costado sur del cerramiento y se continua con el amarre de acero de viga de cimentacion, asi como el amarre de zapatas de concreto

Se continua con el izaje de tableros en malla eslabonada calibre 10 para el cerramiento.

Contratista

Sabado 17 de Enero de 2026
Clima: Soleado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.
Equipo de obra: (2) carretillas, herramienta menor, (1) equipo de soldadura, (1) compresor, (1) planta electrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto.
Avance de obra: Se funde la viga del costado sur dejando los tubos de 2" embebidos en las zapatas de concreto para proximo montaje de modulos del cerramiento en malla eslabonada.
Se continua con la aplicacion de anticorrosivo y pintura de los modulos y tubos del costado oriental del cerramiento.
De igual manera se aplica pintura sobre la malla eslabonada.

Contratista

Domingo 18 de Enero del 2026
El presente dia no se realizan actividades de acuerdo con la programacion de obra

Contratista

Lunes 19 de Enero del 2026
Clima: Nublado
Personal de obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.
Equipo en obra: (2) carretillas, herramienta menor,

Scanned with CamScanner

(1) equipo de soldadura, (1) compresor, (1) planta eléctrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto.
Avance de Obra: Se continua con el amarre de acero del costado occidental de las vigas y zapatas de cimentación. Se continua con la pintura de tableros metálicos para cerramiento
De acuerdo a la proyección y los indicios estipulados se inicia la toma de niveles y replanteo perimetral de la zona noroccidental del cerramiento

Contratista.

Martes 20 de Enero del 2026.
Clima: Lluvioso.
Personal en Obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.
Equipo en obra: (2) carretillas, herramienta menor, (1) equipo de soldadura, (1) compresor, (1) planta eléctrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto.
Avance de obra: De acuerdo por la condiciones del clima no es posible realizar la fundida de vigas y zapatas del costado occidental del proyecto. por esta razón se continua con la fabricación de tableros en malla eslabonada y se dejan las estacas de nivel y proyección del costado noroccidental

Contratista.

Miercoles 21 de Enero de 2026
Clima: Nublado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.
Equipo en obra: (2) carretillas, herramienta menor,

Scanned with CamScanner

(1) compresor, (1) planta eléctrica. (1) trompo tipo mezcladora de concreto.
Avance de obra. Se da inicio a la fundido de vigas y zapatas del costado occidental del cerramiento. Se continua con el izaje de tableros metálicos en malla eslabonada.
Se da inicio a la excavacion de zapatas y solado de la zona noroccidental del cerramiento Se continua con la aplicacion de pintura de malla eslabonada para los tableros.

Contratista.

Jueves 22 de Enero de 2026
Clima: Nublado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.
Equipo en obra: (2) carretillas, herramienta menor, (1) equipo de soldadura, (1) compresor, (1) planta electrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto
Avance de obra. Se continua con la fabricacion de tableros del costado occidental, de igual forma se identifica que en la zona noroccidental debe hacerse el cerramiento en terrazas de diferente nivel dado a las condiciones del terreno esto con el fin de evitar sobre costos y que el futuro cerramiento de la parte norte mantenga homogeneidad y armonizacion arquitectonica.
Se inicia la fundida del solado de concreto pobre para limpieza de las vigas.

Contratista.

Viernes 23 de Enero de 2026

Clima: Soleado

Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra

Equipo en obra: (2) carretillas, herramienta menor, (1) equipo de soldadura, (1) compresor, (1) planta electrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto

Avance de obra: Se inicia con el resane de los vigas de cimentación en continuidad con el amarre de vigas y zapatas.

Se continua con el amarre de vigas y zapatas en acero de 60000 psi, se nivelan resanes tanto en plomo como en longitud para fundida de vigas en concreto, se monta la tubería de 2" en el costado noroccidental.

Se continua con la fabricación de tableros metalicos en malla eslabonada y su debida aplicación de pintura.

Contratista

Sabado 24 de Enero de 2026

Clima: Lluvioso

Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.

Equipo en obra: (1) carretillas, herramienta menor, (1) equipo de soldadura, (1) compresor, (1) planta electrica (1) trompo tipo mezcladora de concreto.

Avance de obra: no es posible avanzar con las actividades debido a las fuertes lluvias registradas en este dia por lo cual se procede a realizar una jornada de aseo a la obra.

Contratista

Scanned with CamScanner

Domingo 25 de Enero de 2026
El presente día no se realizan actividades de acuerdo con la programación de obra.

Contratista.

Lunes 26 de Enero de 2026
Clima: Soleado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra,
Equipo en obra: (2) carretillas, herramienta menor, (1) equipo de soldadora, (1) compresor, (1) planta eléctrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto
Avance de obra: Se da inicio a la fundida de vigas de cimentación del costado noroccidental
Se continua con la fabricación de tableros para el cerramiento en malla eslabonada.
Se continua con la aplicación de pintura para la tubería y malla eslabonada en el costado occidental del cerramiento.

Contratista.

Martes 27 de Enero de 2026
Clima: Soleado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante
Equipo en obra: (2) carretillas, herramienta menor, (1) equipo de soldadura, (1) compresor, (1) planta Eléctrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto
Avance de obra: Se continua con la fabricación de tableros para el cerramiento.
Se continua con el izaje e instalación de tableros para el cerramiento entre los tubos de 2"

Scanned with CamScanner

Se continua con la aplicación de pintura a la malla eslabonada calibre 10.

Contratista.

Miercoles 28 de Enero de 2026
Clima: Soleado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.
Equipo en obra: (2) carretillas, herramienta menor, (1) equipo de soldadura, (1) compresor, (1) planta electrica, (1) trompo tipo mezcladora.
Avance de obra: Se continua con la fabricacion de tableros para el cerramiento.
Se continua con dirigir a instalacion de tableros entre los tubos de 2"
Se continua con la aplicación de pintura a la malla eslabonada calibre 10

Contratista

Jueves 29 de Enero de 2026
Clima: Lluvioso
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.
Equipo en obra. (2) carretillas, herramienta menor, (1) equipo de soldadura, (1) compresor (1) planta electrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto.
Avance de obra: no es posible avanzar con las actividades debido a las Lluvias registradas este dia

Contratista.

Scanned with CamScanner

Viernes 30 de Enero de 2026
Clima: Soleado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante.
Equipo en obra: (2) carretillas, herramienta menor, (1) equipo de soldadura, (1) planta eléctrica (1) trompo tipo: mezcladora de concreto.
Avance de obra. Se continua con la fabricación de tableros de concreto. Se continua con el izaje e instalación de tableros entre los tubos de 2". Se da continuidad con la aplicación de pintura a la malla eslabonada.

Contratista.

Sabado 31 de Enero de 2026
Clima: Soleado.
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.
Equipo en obra: (2) carretillas, herramienta menor, (1) equipo soldadura, (1) compresor, (1) planta electrico. (1) trompo tipo mezclador de concreto.
Avance de obra: Se continua con la fabricación de tableros para el cerramiento.
Se da continuidad con el izaje e instalación de tableros entre los tubos de 2"
Se continua con la aplicación de pintura a la malla eslabonada.

Contratista.

Domingo 1 de febrero de 2026
El presente dia no se realizan actividades de acuerdo con la programacion de obra

Contratista.

Lunes 2 de febrero de 2026
Clima: Soleado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.
Equipo en obra: (2) carretillas, herramienta menor, (1) equipo de soldadura, (1) compresor, (1) planta electrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto.
Avance de obra: Se continua con la fabricacion de tableros para el cerramiento.
Se da continuidad con el izaje e instalacion de tableros entre los tubos de 2"
Se continua con la aplicacion de pintura a la malla esclabonada.

Contratista.

Martes 3 de febrero de 2026
Clima: Soleado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.
Equipo en obra: (2) carretillas, Herramienta menor, (1) equipo de soldadura, (1) compresor, (1) planta electrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto.
Avance de obra: Se continua con la fabricacion de tableros para el cerramiento.
Se da continuidad con el izaje e instalacion de tableros para el cerramiento entre los tubos de 2 pulgadas.
Se continua con la aplicacion

Scanned with CamScanner

de pintura a la malla eslabonada calibre 10

Contratista.

Miercoles 4 de febrero de 2026

Clima: Soleado

Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.

Equipo en obra: (2) carretillas, Herramienta menor, (1) equipo de soldadura, (1) compresor, (1) planta electrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto

Avance de obra: Se continua con la fabricacion de tableros para el cerramiento.

Se da continuidad con el izaje e instalacion de tableros entre los tubos de 2"

Se continua con la aplicacion de pintura a la malla eslabonada.

Contratista.

Jueves 5 de febrero de 2026

Clima: Nublado

Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.

Equipo de obra: (2) carretillas, Herramienta menor (1) equipo de soldadora, (1) compresor, (1) planta electrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto

Avance de obra: Se continua con la fabricacion de tableros para el cerramiento.

Se da continuidad con el izaje e instalacion entre los tubos de 2". Se continua con la aplicacion de pintura a los mallas eslabonados

Contratista.

Scanned with CamScanner

Viernes 6 de febrero de 2026

Clima: Soleado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.
Equipo de obra: (2) carretillas, Herramienta menor, (1) equipo de soldadora, (1) compresor, (1) planta electrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto.
Avance de obra: Se continua con la fabricacion de tableros entre los tubos de 2" y se correspondiente izaje.
Se continua con la aplicacion de pintura a la malla ecolaborada.

Contratista.

Sabado 7 de febrero de 2026
Clima: Lluvioso
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.
Equipo en obra: (2) carretillas, Herramienta menor, (1) equipo de soldadura, (1) compresor, (1) planta electrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto
Avance de obra: Este dia no se realizan actividades programadas debido a las lluvias registradas

Contratista

Domingo 8 de febrero del 2026.
El presente dia no se realizan actividades de acuerdo con la programacion de obra.

Contratista.

Lunes 9 de febrero de 2026
Clima: Soleado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.
Equipo en obra: (2) cortadillos, Herramienta menor, (1) compresor (1) planta electrica, (1) equipo de soldadura (1) trompo tipo mezcladora de concreto.
Avance de obra: Se inicia con la fabricación del portón principal con malla eslabonada, Angulo y tubería de 2". Se establece que la altura del portón de acuerdo con los planos arquitectonicos tendrá un vacio en la parte inferior de una altura aproximado de 30 cm, por ende se sugiere la fabricación de una rejilla en la parte inferior que disminuya dicha altura y que respete la futura proyección de la placa huella a construir en el acceso, de acuerdo con lo anterior se da inicio con la fabricación de la primera hga del portón principal

Contratista.

Martes 10 de febrero de 2026
Clima: Soleado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.
Equipo en obra: (2) cortadillos, Herramienta menor, (1) compresor, (1) planta electrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto.
Avance de obra: Se continua con la fabricacion de la primera hga del portón principal con malla eslabonada tol. 10.

Contratista

Miercoles 11 de febrero de 2026
Clima: Soleado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra.
Equipo en obra: (2) carretillas, Herramienta menor, (1) equipo de soldadura, (1) compresor, (1) planta electrica (1) trompo tipo mezcladora de concreto
Avance de obra: Se da inicio a la fabricación de la segunda hoja del porton principal con malla eslabonada calibre 10 y angolo

Contratista

Jueves 12 de febrero de 2026
Clima: Nublado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra
Equipo de obra: (2) carretillas, Herramienta menor (1) equipo de soldar, (1) compresor, (1) planta electrica (1) trompo tipo mezcladora de concreto.
Avance de Obra: Se continua con la fabricacion de la segunda hoja del porton principal en malla eslabonada calibre 10 y angolo.

Contratista

Viernes 13 de febrero de 2026
Clima: Soleado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra
Equipo de obra: (2) carretillas, Herramienta menor, (1) equipo de soldadora, (1) compresor, (1) planta electrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto
Avance de obra: Se da inicio al montaje del porton principal con sus respectivas

dos hojas, de igual manera se aplica anticorrosivo y pintura a las dos hojas del portón principal.

Contratista.

Sabado 14 de febrero de 2026
Clima: Soleado
Personal en obra: (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) ayudante de obra
Equipo en obra: (2) carretillas, Herramienta menor, (1) equipo de soldadura, (1) compresor, (1) planta electrica, (1) trompo tipo mezcladora de concreto
Avance de obra: Se instalan pasadores para el correcto funcionamiento del portón de acuerdo con los planos arquitectonicos. Se remata la pintura del portón principal y se detalla la malla eslabonada del mismo.

Contratista

Domingo 15 de febrero de 2026
El presente dia no se realizan actividades de acuerdo con la programacion de obra.

Contratista

TERRATEST SAS
LABORATORIO DE SUELOS, ROCAS Y MATERIALES
CALIDAD QUE CONSTRUYE RELACIONES CONFIABLES

Fecha: 28/01/2026
version. No.: 15
Ft-14

INFORME DE ENSAYO. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO.

Orden de ensayo No. 241-26

Norma(s) Técnica(s) de Referencia Aplicada(s)					Procedimiento de Ensayo
NTC-673:2021	.	INV E - 410-2013		X	PT - 07

CLIENTE: OBRAS INSIGNIA S.A.S
LOCALIZACION: SANTA PABLO DE BORBUR - BOYACA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA I.E. SANTA BARBARA SEDE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, DEPARTAMENTO DE BOYACA
INGENIERO ENCARGADO: ING. NICOLAS ALEJANDRO AFRICANO BENITEZ
DIRECCION: CL 169 A 62 26 TO 4 AP 304
FECHA DE RECEPCION: .

Información suministrada por el cliente. Por lo tanto, TERRATEST SAS no asume la responsabilidad cuando la informacion sea proporcionada por el cliente y pueda afectar la validez de los resultados

TEMP. AMBIENTE (°C)
HUMEDAD RELATIVA (%) .


CILINDRO No.	SITIO DE FUNDIDA	FECHA DE TOMA	HORA DE TOMA	HORA DE FALLA	EDAD EN DIAS	FECHA ROTURA	f'c DISEÑO (kg/cm2)	f'c DISEÑO (Mpa)	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	MASA (g)	CARGA (Kn)	AREA mm2	DENSIDAD (kg/m3)	RELACION L/D	TIPO DE FALLA	ESFUERZO DE ROTURA (MPa)	DESARROLLO %	DEFECTO ESPECIMEN	CARACTERISTICAS ENSAYOS
1	zapatas cimentación	21/01/2026	.	8:30 a. m.	7	28/01/20026	214	20,6	150,0	300	12.617	259.764	17671,5	2.380	2.00	4	14,7	70	NA	N
2		21/01/2026	.	8:35 a. m.	14	4/02/2026	214	20,6	151,0	300	12.670	314.552	17672,5	2.390	2.00	4	17,8	85	NA	N
3		21/01/2026	.	8:40 a. m.	28	18/02/2026	214	20,6	152,0	300	**12.644**	371.101	17673,5	2.385	2.00	4	**21**	100	NA	N

CARACTERISTICAS DE ENSAYO: NEOPRENO= **N** REFRENTADO=**R** PULIDO=**P** **DEFECTOS DEL ESPECIMEN:** DESNIVELADO=**D** FALTA ADHERENCIA=**FA** POROSO=**PO** MICROFISURAS=M NINGUNO=**NA** AGREGADO ESCASO=**AE**

OBSERVACIONES:

ESPECIMENES ELABORADOS POR:	CLIENTE:	X	TERRATEST	.	**PRESENCIA DEL CLIENTE PARA VER FALLA:**	SI	.	NO	X
ESPECIMENES TRANSPORTADOS POR:	CLIENTE:	.	TERRATEST	X		NOMBRE Y CARGO:			

TIPO DE FALLA



INCERTIDUMBRE TOMANDO UN K2 Y UN NIVEL DE CONFIANZA DE 95% +/- 0,35 Mpa

APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO: ING. LUTHER HERRERA

ESTE ENSAYO NO PODRA REPRODUCIRSE SIN LA APROBACION ESCRITA DE DE TERRATEST S.A.S
LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

TERRATEST SAS
LABORATORIO DE SUELOS, ROCAS Y MATERIALES
CALIDAD QUE CONSTRUYE RELACIONES CONFIABLES

Fecha: 28/01/2026
version. No.: 15
Ft-14

INFORME DE ENSAYO. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO.

Orden de ensayo No. 241-26

Norma(s) Técnica(s) de Referencia Aplicada(s)					Procedimiento de Ensayo
NTC-673:2021	.	INV E - 410-2013		X	PT - 07

CLIENTE: OBRAS INSIGNIA S.A.S
LOCALIZACION: SANTA PABLO DE BORBUR - BOYACA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA I.E. SANTA BARBARA SEDE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, DEPARTAMENTO DE BOYACA
INGENIERO ENCARGADO: ING. NICOLAS ALEJANDRO AFRICANO BENITEZ
DIRECCION: CL 169 A 62 26 TO 4 AP 304
FECHA DE RECEPCION: .

Información suministrada por el cliente. Por lo tanto, TERRATEST SAS no asume la responsabilidad cuando la informacion sea proporcionada por el cliente y pueda afectar la validez de los resultados

TEMP. AMBIENTE (°C)
HUMEDAD RELATIVA (%) .


CILINDRO No.	SITIO DE FUNDIDA	FECHA DE TOMA	HORA DE TOMA	HORA DE FALLA	EDAD EN DIAS	FECHA ROTURA	f'c DISEÑO (kg/cm2)	f'c DISEÑO (Mpa)	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	MASA (g)	CARGA (Kn)	AREA mm2	DENSIDAD (kg/m3)	RELACION L/D	TIPO DE FALLA	ESFUERZO DE ROTURA (MPa)	DESARROLLO %	DEFECTO ESPECIMEN	CARACTERISTICAS ENSAYOS
4	vigas cimentación	21/01/2026	.	9:00 a. m.	7	28/01/2026	214	20,6	150,0	300	12.635	263.305	17671,5	2384	2.00	4	14,9	71	NA	N
5		21/01/2026	.	9:05 a. m.	14	4/02/2026	214	20,6	151,0	300	12.678	316.320	17671,5	2392	2.00	4	17,9	85	NA	N
6		21/01/2026	.	9:08 a. m.	28	18/02/2026	214	20,6	152,0	300	12.650	374.636	17671,5	2387	2.00	4	21,2	101	NA	N

CARACTERISTICAS DE ENSAYO: NEOPRENO= **N** REFRENTADO=**R** PULIDO=**P** **DEFECTOS DEL ESPECIMEN:** DESNIVELADO=**D** FALTA ADHERENCIA=**FA** POROSO=**PO** MICROFISURAS=M NINGUNO=**NA** AGREGADO ESCASO=**AE**

OBSERVACIONES:

ESPECIMENES ELABORADOS POR:	CLIENTE:	X	TERRATEST	.	**PRESENCIA DEL CLIENTE PARA VER FALLA:**	SI	.	NO	X
ESPECIMENES TRANSPORTADOS POR:	CLIENTE:	.	TERRATEST	X		NOMBRE Y CARGO:			

TIPO DE FALLA



INCERTIDUMBRE TOMANDO UN K2 Y UN NIVEL DE CONFIANZA DE 95% +/- 0,35 Mpa

APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO: ING. LUTHER HERRERA

ESTE ENSAYO NO PODRA REPRODUCIRSE SIN LA APROBACION ESCRITA DE DE TERRATEST S.A.S
LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901740550-2	OBRAS INSIGNIA SAS	CLL 169 A 62 26	3162742250	obrasinsigniasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	12/02/2026	50210700	$2.387.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	9.400	0		0		0	0	0	0	9.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	37.500	0		0		0	0	0	0	37.500	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	9.400	0		0		0	0	0	0	9.400	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	42.100	0		0		0	0	0	0	42.100	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	242.900	0	0	0	0	0	0		242.900	3
230301	Porvenir	800224808-8	672.500	0	0	0	0	0	0		672.500	3
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	37.400	0	0	0	0	0	0		37.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	536.600				536.600	0	0	536.600			5.366	536.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	140.300	0	0	140.300	3
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	168.400	0	0	168.400	5

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901740550-2	OBRAS INSIGNIA SAS		CLL 169 A 62 26	3162742250	obrasinsigniasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	12/02/2026	50210700	$2.387.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	308.700	308.700
Pensión	4	1.233.000	1.233.000
Riesgos Laborales	1	536.600	536.600
CCF	2	308.700	308.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	2.387.000	2.387.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901740550-2	OBRAS INSIGNIA SAS		CLL 169 A 62 26	3162742250	obrasinsigniasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	12/02/2026	50210700	$2.387.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019112140	AFRICANO BENITEZ NICOLAS ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF22	1.750.905	70.100	1.750.905	0	0	0	0
2	CC	1022927472	BOLAÑOS GIL RUBEN FREDY	1	0			S																	231001	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF22	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
3	CC	1054120243	CELY ORDUZ HECTOR HERNANDO	1	0			S	X	X															25-14	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.454	9.400	14-11	233.454	5	16.300	CCF22	233.454	9.400	0	0	0	0	0
4	CC	1055552765	MELO SANCHEZ WILLIAN	1	0			S	X	X															230301	700.362	112.100	0	0	0	0	EPS005	700.362	28.100	14-11	700.362	5	48.800	CCF10	700.362	28.100	0	0	0	0	0
5	CC	1056505647	HERNANDEZ AVILA JOSEPH ALEXANDER	1	0			S	X																230201	1.050.543	168.100	0	0	0	0	EPS041	1.050.543	42.100	14-11	1.050.543	5	73.200	CCF10	1.050.543	42.100	0	0	0	0	0
6	CC	1056506070	NIÑO AVILA YEISON JULIAN	1	0			S		X															230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF10	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
7	CC	79841537	BELTRAN GARZON NELSON	1	0			S	X	X															230201	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS005	233.454	9.400	14-11	233.454	5	16.300	CCF22	233.454	9.400	0	0	0	0	0
8	CC	80323255	BELTRAN RAMIREZ FABIO NELSON	1	0			S	X	X															230201	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	9.400	14-11	233.454	5	16.300	CCF22	233.454	9.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
