INFORME N°1 DE INTERVENTORÍA
(15 DE OCTUBRE DE 2025 – 14 DE NOVIEMBRE DE 2025)

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.



NOVIEMBRE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

2.1. LOCALIZACIÓN PROYECTO 7

2.2. ESTADO INICIAL DE LA ZONA A INTERVENIR 8

2.3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 10

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 13

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 16

3.1. INFORMACIÓN GENERAL 16

3.3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 15 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 16

3.3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO. 19

3.4. INFORME DE AVANCE 22

3.4.1. ESTADO Y AVANCE EN EL PERIODO 22

3.4.2. ESTADO Y AVANCE ACUMULADO 23

3.5. COPIA DE LAS ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS EN EL PERIODO. 24

3.6. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA 24

3.7. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 24

3.8. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 24

3.9. *ESTADO GENERAL DEL TIEMPO* 24

3.10. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 25

3.11. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR 25

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 26

4.2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR EN EL MES 26

4.3. LIBRO DE OBRA 28

4.4. CONTROL DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 28

4.5. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA 28

4.6. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.....28
4.7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....29
4.8. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL INTERVENTOR.....29
5. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA, INTERVENTOR Y SUPERVISOR.....29
5.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA.....29
5.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.....29
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO.....29
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....30
8. ANEXOS.....31

TABLAS

Tabla 1. Información del contrato de obra 16
Tabla 2. Valores ejecutados y programados en el periodo 22
Tabla 2. Valores ejecutados y programados en el periodo 23
Tabla 4. Información del contrato de interventoría 26
Tabla 5. Correspondencia enviada 29
Tabla 6. Correspondencia recibida 29

FIGURAS Y FOTOGRAFÍAS

Figura 1. Ubicación Barrios Belén y Asolivos. 7

Figura 2. Ubicación Quebraba El Tejar. 8

Fotografía No. 1. Estado inicial zona de intervención. 9

Fotografía No. 2. Estado inicial zona de intervención. 10

Figura 3. Trazado colector D=8" parte baja barrio Belén 14

Figura 4. Vista plano diseño colector Quebrada El Tejar. 14

Figura 5. Avance en el periodo. 23

Figura 6. Avance acumlado. 24

ANEXOS

Anexo N° 01 Seguimiento a las garantías contractuales de obra e interventoría.

Anexo N° 02 Control Diario de Equipo Contratista Obra

Anexo N° 03 Control Diario de Personal Contratista Obra

Anexo N° 04 Información financiera Obra

Anexo N° 05 Reporte estado general del tiempo.

Anexo Nº 06 Reporte ensayos de laboratorio.

Anexo Nº 07 Control Parafiscales Obra

Anexo N° 08 Control Diario de Personal Interventoría

Anexo N° 09 Información financiera Interventoría

Anexo N° 10 Control Parafiscales Interventoría

Anexo N° 11 Registro fotográfico del estado o avance de las obras.

Anexo N° 12 Copia Bitácora

Anexo N° 13 Informes semanales.

Anexo N°14 Informe HSE Contratista.

Anexo Nº15 Informe HSE Interventoría.

Anexo Nº16 Informe PMA Contratista.

Anexo Nº17 Correspondencia enviada y recibida.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objeto presentar a la Alcaldía Municipal de Ocaña, el estado y avance del contrato de obra No. LP-SVIV-001 de 2025, a cargo del CONSORCIO ALCANTARILLADO y como parte de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría No. SVIV-CMA-003 de 2025 cuyo objeto es la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, a cargo de la empresa BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS para el periodo comprendido entre el 15 de octubre al 14 de noviembre de 2025.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN PROYECTO



Figura 1. Ubicación Barrios Belén y Asolivos.



Figura 2. Ubicación Quebraba El Tejar.

Basados en el diagnóstico realizado por la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda El escenario deportivo a intervenir se encuentra ubicado en el Corregimiento de Aguas Claras, este es uno de los corregimientos de mayor importancia en el municipio y cuanta con una población aproximada de 1125 habitantes, solo en su centro poblado residen 385 personas, las demás se encuentran distribuidas en cinco veredas. Esta población se encuentra regularmente expuesta a múltiples afectaciones derivadas al accionar de grupos armados al margen de la ley, que buscan reclutarlos o utilizarlos en acciones como microtráfico y demás.

Este escenario recreo deportivo está localizado en la zona céntrica del centro poblado, detrás de la iglesia principal en la dirección calle 8 N°4-49.

2.2. ESTADO INICIAL DE LA ZONA A INTERVENIR

Los barrios de Olivos, Belén y la comunidad aledaña de la quebrada el tejar, albergan a una población de estrato 1 y 2, de ingresos bajos a medios, este sector se caracteriza por su ubicación en la zona urbana, con calles estrechas, y viviendas de baja altura en su mayoría, pero también se encuentran viviendas de dos o tres pisos, construidas con materiales sencillos en mampostería y cubiertas livianas, bien construidas. Se incumplen algunas normas urbanas de paramentos y retrocesos con áreas de lotes pequeñas, lo que indica una densidad de población alta, no se observa áreas de sesión de equipamiento urbano con excepción del parque belén, y un espacio para la realización de actividad deportiva (futbol), en el barrio los olivos. De igual manera también se pudo identificar la construcción de un


centro de rehabilitación y algunos lotes que cuentan con una proyección urbanística en un futuro.

Actualmente existen dos vertimientos puntuales de aguas residuales domesticas en la quebrada, los provenientes de los barrios Belén y los Olivos, los cuales no cuentan con ningún tipo de sistema de conducción, ni elementos sanitarios adecuados. Como resultado, la quebrada el tejar está funcionando como una alcantarilla generando una grave contaminación en el cuerpo de agua y al entorno ambiental, afectando negativamente a las comunidades de la zona y a los barrios aguas abajo por donde pasa la quebrada el tejar quien reciben todos estos vertimientos.

Por otra parte, existe un colector sanitario de 10" el sector del puente de la Avenida Circunvalar, al cual se pretende conectar el colector futuro del presente proyecto, este colector debe construirse linealmente por el cauce de la quebrada bajo un sistema de columnas y vigas de soporte, con el recubrimiento de la tubería para evitar que en posibles subidas intempestivas del caudal en temporadas invernales afecten la estabilidad del colector.



Fotografía No. 1. Estado inicial zona de intervención.

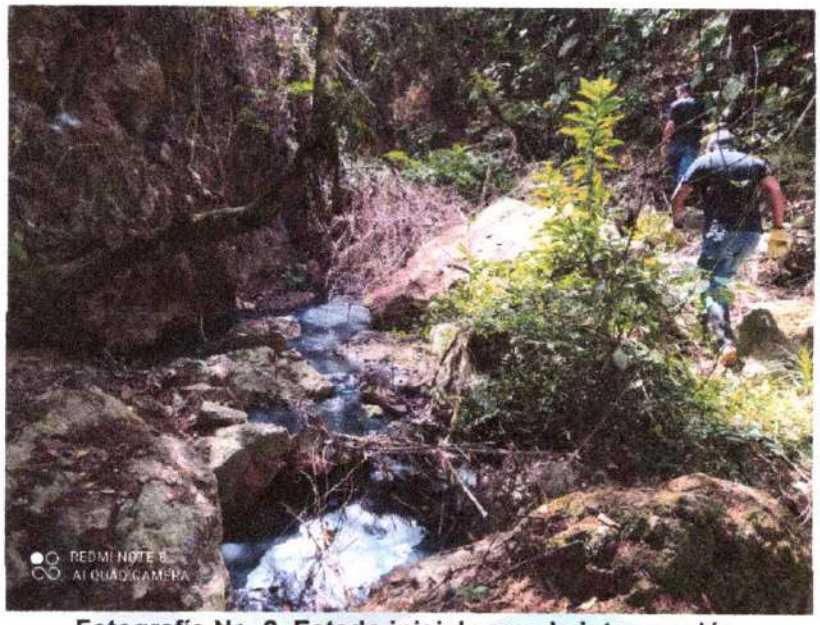

Fotografía No. 2. Estado inicial zona de intervención.

2.3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance general del presente contrato comprende la ejecución integral de las obras civiles descritas y cuantificadas en la oferta económica, los cuales tiene como resultado eliminar las descargas directas a cielo abierto de las aguas residuales domesticas de la Quebrada El Tejar, a través de la construcción de un colector sanitario que lleve estas aguas hasta el interceptor del Rio Chiquito.

Una vez se realice la construcción del colector sanitario en el sector del proyecto, se controlará las descargas de aguas residuales directas de las viviendas provenientes de los barrios los olivos y belén y demás residencias cercanas, para redirigirlas y conectarlas al interceptor del rio chiquito, permitiendo así la recuperación de la quebrada el tejar en un trayecto de 603 metros, por la cual están circulando actualmente, disminuyendo su contaminación y ayudando a restablecer el equilibrio ecológico.

De igual manera, la ejecución de este proyecto mitigará el riesgo sanitario que representa para la comunidad de la zona, el efecto por los malos olores y la proliferación de plagas, producidas por el no correcto transporte de las aguas residuales, y que pueden generar diferentes enfermedades que afectan la calidad de vida de los habitantes del sector. Este proyecto permitirá proporcionar un entorno más higiénico y un ambiente confortable para las personas que residen en el área promoviendo su bienestar general.

Presupuestalmente las actividades se encuentran agrupadas distribuidas en 8 capítulos contractuales y estos subdivididos en ítems de construcción. Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con un presupuesto de obra de $1.291.072.319,43 y un presupuesto de interventoría de $105.532.770,00.

Estas actividades contractuales relacionadas con la obra se relacionan a continuación:

1. OBRAS PRELIMINARES

1.1 Localización y replanteo: **601,00 (ML).**

1.2 Descapote y Limpieza Manual: **601,00 (ML).**

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 EXCAVACIONES

2.1.1 Excavación Manual en Material Común: **663,54 (M3).**

2.1.2 Excavación Manual En Material Conglomerado: **53,76 (M3).**

2.1.3 Excavación Mecánica En Roca: **79,56 (M3).**

2.1.4 Mejoramiento En Pedraplen: **41,47 (M3).**

2.2 RELLENOS.

2.2.1 Relleno Con Material Seleccionado Procedente De La Excavación: **200,37 (M3).**

2.2.2 Suministro E Instalación De Base Granular: **1,80 (M3).**

2.2.3 Suministro E Instalación De Sub-Base Granular: **1,80 (M3).**

2.2.4 Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado: **91,94 (M3).**

2.3 ENTIBADOS

2.3.1 Entibado Altura Mayor A 1,2M (3 Usos): **100,00 (M3).**

3. DEMOLICIONES Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS

3.1 DEMOLICIONES

3.1.1 Demolición De Pavimento Flexible e=0.15m (Incluye Corte de Pav): **6,00 (M2).**

3.1.2 Demolición De Concreto Para Cunetas e=0.10m: **10,00 (M2).**

3.1.3 Suministro E Instalación De Sub-Base Granular: **10,00 (M2).**

3.2 REPOSICIONES DE PAVIMENTOS Y CONCRETO

3.2.1 Reposicion De Pavimento Flexible En Asfalto MDC-19, Incluye Imprimacion Y Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento: **0,90 (M3).**

3.2.2 Reposicion De Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI), Para Cunetas: **1,00 (M3).**

3.2.3 *Reposicion De Concreto Reforzado* 24,5 *Mpa* (3500 PSI): **2,00 (M3).**

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS

4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

4.1.1 Suministro E Instalacion Tubería Sanitaria Pvc D=10": **603,00 (ML).**

5. ESTRUCTURAS ESPECIALES

5.1 CAMARA DE CAIDA

5.1.1 Construcción Camara De Caida En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI), Incluye Accesorios Y Recubrimiento Para Tubería: **1,00 (UND).**

5.2 CAJAS DE INSPECCIÓN

5.2.1 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H<1,00 M: **45,00 (UND).**

5.2.2 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,00 M Y 1,50 M: **10,00 (UND).**

5.2.3 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,50 M Y 2,00 M: **2,00 (UND).**

5.2.4 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 2,00 M Y 2,50 M: **1,00 (UND).**

6. CONCRETOS Y ACEROS

6.1 CONCRETOS

6.1.1 Viga Aerea En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M: **211,74 (ML).**

6.1.2 Columna En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI): **20,54 (M3).**

6.1.3 Concreto Simple Resist. 14 Mpa (2000 PSI): **17,74 (M3).**

6.1.4 Suministro E Instalación De Concreto 21 Mpa (3000 PSI): **4,65 (M3).**

6.1.5 Revestimiento Para Tubería En Concreto De 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,55 x 0,50 M: **207,31 (UND).**

6.1.6 Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 1 (130x150x30): **26,00 (UND).**

6.1.7 Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 2 (150x240x30): **28,00 (UND).**

6.1.8 Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 3 (120x120x30): **18,00 (UND).**

6.1.9 Concreto Ciclopeo 60/40 En Concreto 21 Mpa (3000 PSI): **34,87 (M3).**

6.1.10 Anclaje De Caja con camara de caida a aleta existente: **25,00 (UND).**

6.2 ACEROS

6.2.1 Acero De Refuerzo De 60000 Psi: **532,00 (KG).**

7. TRANSPORTE

7.1 TRANSPORTE

7.1.1 Cargue Y Retiro Material Escombros: **30,00 (M3).**

7.1.2 *Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Cajas En* Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H

prom Entre 1,00 M Y 1,50 M, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 200 M: **20,00 (UND).**

7.1.3 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Viga Aerea En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M: **105,87 (ML)**

7.1.4 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Concreto, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M: **68,93 (M3).**

7.1.5 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Revestimiento Para Tubería En Concreto De 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M: **103,66 (ML).**

7.1.6 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Ciclopeo 60/40 En Concreto 21 Mpa (3000 PSI), Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M: **34,87 (M3).**

8. COLECTOR BELEN PARTE BAJA

8.1 COLECTOR BELEN PARTE BAJA

8.1.1 Localización Y Replanteo: **280,00 (ML).**

8.1.2 Excavación Manual En Material Común: **450,39 (ML).**

8.1.3 Relleno Con Material Seleccionado Procedente De La Excavación: **113,40 (ML).**

8.1.4 Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado: **250,91 (M3).**

8.1.5 Cargue Y Retiro Material Escombros: **336,99 (M3).**

8.1.6 Entibado Altura Mayor A 1,2M (3 Usos): **280,00 (ML).**

8.1.7 Suministro E Instalacion Tubería Sanitaria Pvc D=8": **280,00 (ML).**

8.1.8 Suministro e instalación para Acometidas con tubería de 6" incluye accesorios y silla yee 8" x 6" longitud hasta 6 metros: **43,00 (UND).**

8.1.9 Cajas de inspección 0.6 X 0.6 X 0.6: **43,00 (UND).**

8.1.10 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,00 M Y 1,50 M: **6,00 (UND).**

8.1.11 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 2,00 M Y 2,50 M: **6,00 (UND).**

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Como se puede evidenciar en las actividades contratadas anteriormente descritas, los trabajos a realizar se dividen en 2 sectores, el primero de ellos tiene previsto la intervención con un tramo de 280 ml de tubería pvc D=8" y la conexión de 43 viviendas dentro del sector de la parte baja del barrio Belén, como lo ilustra la siguiente imagen.

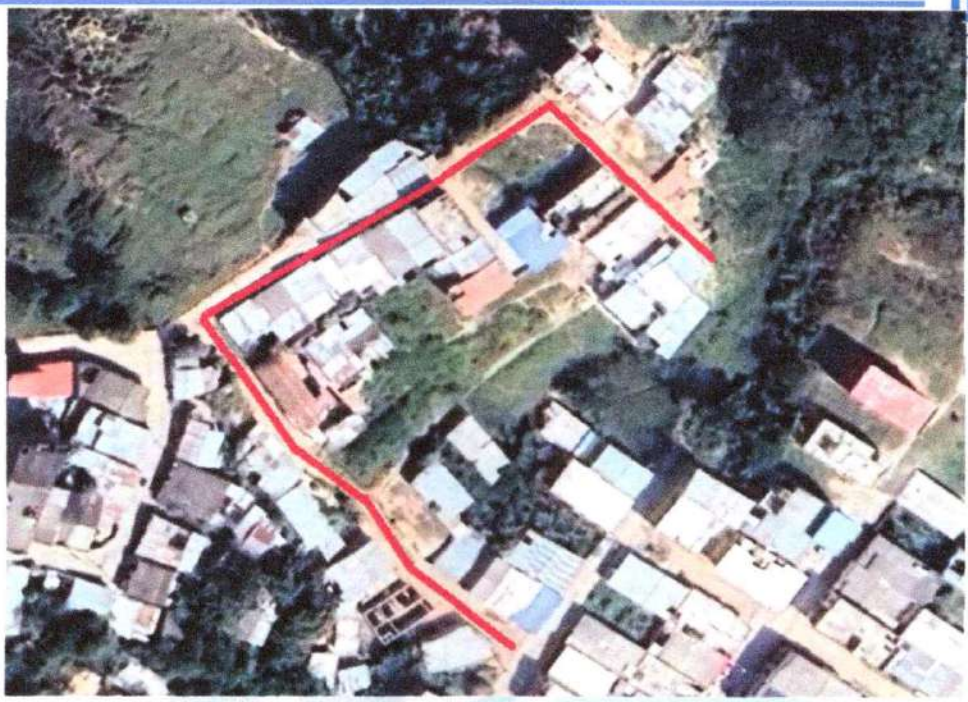


Figura 3. Trazado colector D=8" parte baja barrio Belén.

Por otra parte, se tiene prevista la construcción de un colector sanitario de D=10" con una longitud de 610,00 ml, el cual conecta el pozo existente donde convergen las aguas residuales de estos dos barrios, transitando por el cauce natural de la quebrada el tejar, hasta conectar con una caja existente cruzando la Avenida Circunvalar, esta intervención tiene previsto el recubrimiento en concreto reforzado de 207,31 ml de tubería y el paso elevado mediante una viga en concreto reforzado de 211,74 ml de tubería, la cual estará apoyada sobre columnas en concreto reforzado, como lo muestra la siguiente figura.

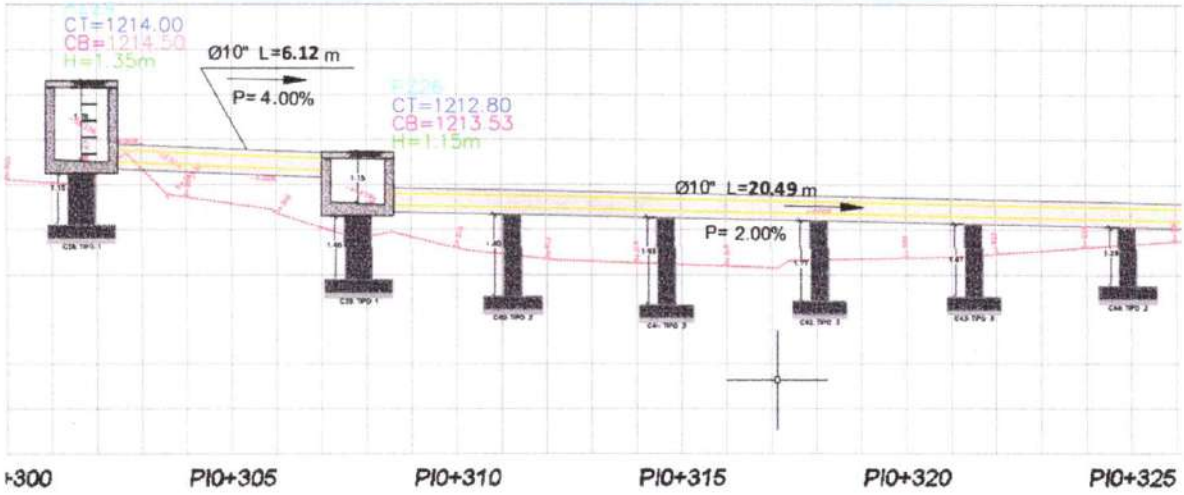


Figura 4. Vista plano diseño colector Quebrada El Tejar.

Adicionalmente, se tiene prevista la construcción de 58,00 cajas de inspección en concreto reforzado y 1,00 cámara de caída en concreto reforzado para realizar la interconexión con la caja existente.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información del contrato de obra

CONTRATO DE OBRA No	LP-SVIV 001 DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALCANNTARILLADO
NIT:	*901.992.571-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	RODRIGO ALBERTO ASCAIO MANTILLA
IDENTIFICACIÓN:	1.091.668.854 de Ocaña
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
VALOR:	$ 1.291.072.319,43
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	15 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	14 de enero de 2026
SUPERVISOR:	GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda
CDP No.:	0613 del 07 de mayo de 2025
RP No:	1282 del 15 de octubre de 2025

3.3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 15 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 15 de octubre de 2025 hasta el 14 de noviembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades:

Estas actividades se relacionan a continuación:

1. OBRAS PRELIMINARES

1.1 Localización y replanteo: **601,00 (ML).**

1.2 Descapote y Limpieza Manual: **601,00 (ML).**

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 EXCAVACIONES

2.1.1 Excavación Manual en Material Común: **199,43 (M3).**
2.1.2 Excavación Manual En Material Conglomerado: **12,29 (M3).**
2.1.3 Excavación Mecánica En Roca: **19,53 (M3).**
2.1.4 Mejoramiento En Pedraplen: **0,00 (M3).**

2.2 RELLENOS.
2.2.1 Relleno Con Material Seleccionado Procedente De La Excavación: **0,00 (M3).**
2.2.2 Suministro E Instalación De Base Granular: **0,00 (M3).**
2.2.3 Suministro E Instalación De Sub-Base Granular: **0,00 (M3).**
2.2.4 Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado: **44,55 (M3).**

2.3 ENTIBADOS
2.3.1 Entibado Altura Mayor A 1,2M (3 Usos): **0,00 (M3).**

3. DEMOLICIONES Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS
3.1 DEMOLICIONES
3.1.1 Demolición De Pavimento Flexible e=0.15m (Incluye Corte de Pav): **0,00 (M2).**
3.1.2 Demolición De Concreto Para Cunetas e=0.10m: **0,00 (M2).**
3.1.3 Suministro E Instalación De Sub-Base Granular: **0,00 (M2).**

3.2 REPOSICIONES DE PAVIMENTOS Y CONCRETO
3.2.1 Reposición De Pavimento Flexible En Asfalto MDC-19, Incluye Imprimacion Y Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento: **0,00 (M3).**
3.2.2 Reposición De Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI), Para Cunetas: **0,00 (M3).**
3.2.3 Reposición De Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI): **0,00 (M3).**

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
4.1.1 Suministro E Instalacion Tubería Sanitaria Pvc D=10": **132,00 (ML).**

5. ESTRUCTURAS ESPECIALES
5.1 CAMARA DE CAIDA
5.1.1 Construcción Camara De Caida En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI), Incluye Accesorios Y Recubrimiento Para Tuberia: **0,00 (UND).**

5.2 CAJAS DE INSPECCIÓN
5.2.1 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H<1,00 M: **6,00 (UND).**
5.2.2 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,00 M Y 1,50 M: **0,00 (UND).**
5.2.3 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,50 M Y 2,00 M: **0,00 (UND).**

5.2.4 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 2,00 M Y 2,50 M: **0,00 (UND).**

6. CONCRETOS Y ACEROS

6.1 CONCRETOS

6.1.1 Viga Aerea En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M: **9,78 (ML).**
6.1.2 Columna En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI): **2,18 (M3).**
6.1.3 Concreto Simple Resist. 14 Mpa (2000 PSI): **3,85 (M3).**
6.1.4 Suministro E Instalación De Concreto 21 Mpa (3000 PSI): **2,28 (M3).**
6.1.5 Revestimiento Para Tubería En Concreto De 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,55 x 0,50 M: **44,18 (UND).**
6.1.6 Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 1 (130x150x30): **3,00 (UND).**
6.1.7 Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 2 (150x240x30): **4,00 (UND).**
6.1.8 Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 3 (120x120x30): **2,00 (UND).**
6.1.9 Concreto Ciclopeo 60/40 En Concreto 21 Mpa (3000 PSI): **12,15 (M3).**
6.1.10 Anclaje De Caja con camara de caida a aleta existente: **0,00 (UND).**

6.2 ACEROS

6.2.1 Acero De Refuerzo De 60000 Psi: **525,28 (KG).**

7. TRANSPORTE

7.1 TRANSPORTE

7.1.1 Cargue Y Retiro Material Escombros: **0,00 (M3).**
7.1.2 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H prom Entre 1,00 M Y 1,50 M, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 200 M: **20,00 (UND).**
7.1.3 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Viga Aerea En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M: **52,94 (ML)**
7.1.4 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Concreto, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M: **37,32 (M3).**
7.1.5 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Revestimiento Para Tubería En Concreto De 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M: **51,83 (ML).**
7.1.6 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Ciclopeo 60/40 *En Concreto 21 Mpa (3000 PSI), Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De* Obra, Aproximadamente 400 M: **34,87 (M3).**

8. COLECTOR BELEN PARTE BAJA
8.1 COLECTOR BELEN PARTE BAJA
8.1.1 Localización Y Replanteo: **280,00 (ML).**
8.1.2 Excavación Manual En Material Común: **291,40 (ML).**
8.1.3 Relleno Con Material Seleccionado Procedente De La Excavación: **73,18 (ML).**
8.1.4 Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado: **162,22 (M3).**
8.1.5 Cargue Y Retiro Material Escombros: **112,00 (M3).**
8.1.6 Entibado Altura Mayor A 1,2M (3 Usos): **0,00 (ML).**
8.1.7 Suministro E Instalacion Tubería Sanitaria Pvc D=8": **186,68 (ML).**
8.1.8 Suministro e instalación para Acometidas con tubería de 6" incluye accesorios y silla yee 8" x 6" longitud hasta 6 metros: **29,00 (UND).**
8.1.9 Cajas de inspección 0.6 X 0.6 X 0.6: **13,00 (UND).**
8.1.10 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,00 M Y 1,50 M: **2,00 (UND).**
8.1.11 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 2,00 M Y 2,50 M: **2,00 (UND).**

Para mayor ilustración y referencia de avance de obra en el periodo remitirse a los informes semanales.

3.3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO.

En cuanto a las cantidades acumuladas ejecutadas hasta la fecha de este informe tenemos:

1. OBRAS PRELIMINARES
1.1 Localización y replanteo: **601,00 (ML).**
1.2 Descapote y Limpieza Manual: **601,00 (ML).**

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 EXCAVACIONES
2.1.1 Excavación Manual en Material Común: **199,43 (M3).**
2.1.2 Excavación Manual En Material Conglomerado: **12,29 (M3).**
2.1.3 Excavación Mecánica En Roca: **19,53 (M3).**
2.1.4 Mejoramiento En Pedraplen: **0,00 (M3).**

2.2 RELLENOS.
2.2.1 Relleno Con Material Seleccionado Procedente De La Excavación: **0,00 (M3).**
2.2.2 Suministro E Instalación De Base Granular: **0,00 (M3).**
2.2.3 Suministro E Instalación De Sub-Base Granular: **0,00 (M3).**

2.2.4 Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado: **44,55 (M3).**

2.3 ENTIBADOS

2.3.1 Entibado Altura Mayor A 1,2M (3 Usos): **0,00 (M3).**

3. DEMOLICIONES Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS

3.1 DEMOLICIONES

3.1.1 Demolición De Pavimento Flexible e=0.15m (Incluye Corte de Pav): **0,00 (M2).**

3.1.2 Demolición De Concreto Para Cunetas e=0.10m: **0,00 (M2).**

3.1.3 Suministro E Instalación De Sub-Base Granular: **0,00 (M2).**

3.2 REPOSICIONES DE PAVIMENTOS Y CONCRETO

3.2.1 Reposición De Pavimento Flexible En Asfalto MDC-19, Incluye Imprimacion Y Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento: **0,00 (M3).**

3.2.2 Reposición De Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI), Para Cunetas: **0,00 (M3).**

3.2.3 Reposición De Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI): **0,00 (M3).**

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS

4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

4.1.1 Suministro E Instalacion Tubería Sanitaria Pvc D=10": **132,00 (ML).**

5. ESTRUCTURAS ESPECIALES

5.1 CAMARA DE CAIDA

5.1.1 Construcción Camara De Caida En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI), Incluye Accesorios Y Recubrimiento Para Tubería: **0,00 (UND).**

5.2 CAJAS DE INSPECCIÓN

5.2.1 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H<1,00 M: **6,00 (UND).**

5.2.2 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,00 M Y 1,50 M: **0,00 (UND).**

5.2.3 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,50 M Y 2,00 M: **0,00 (UND).**

5.2.4 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 2,00 M Y 2,50 M: **0,00 (UND).**

6. CONCRETOS Y ACEROS

6.1 CONCRETOS

6.1.1 Viga Aerea En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M: **9,78 (ML).**

6.1.2 Columna En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI): **2,18 (M3).**

6.1.3 Concreto Simple Resist. 14 Mpa (2000 PSI): **3,85 (M3).**

6.1.4 Suministro E Instalación De Concreto 21 Mpa (3000 PSI): **2,28 (M3).**

6.1.5 Revestimiento Para Tubería En Concreto De 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,55 x 0,50 M: **44,18 (UND).**
6.1.6 Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 1 (130x150x30): **3,00 (UND).**
6.1.7 Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 2 (150x240x30): **4,00 (UND).**
6.1.8 Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 3 (120x120x30): **2,00 (UND).**
6.1.9 Concreto Ciclopeo 60/40 En Concreto 21 Mpa (3000 PSI): **12,15 (M3).**
6.1.10 Anclaje De Caja con camara de caida a aleta existente: **0,00 (UND).**

6.2 ACEROS
6.2.1 Acero De Refuerzo De 60000 Psi: **525,28 (KG).**

7. TRANSPORTE
7.1 TRANSPORTE
7.1.1 Cargue Y Retiro Material Escombros: **0,00 (M3).**
7.1.2 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H prom Entre 1,00 M Y 1,50 M, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 200 M: **20,00 (UND).**
7.1.3 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Viga Aerea En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M: **52,94 (ML)**
7.1.4 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Concreto, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M: **37,32 (M3).**
7.1.5 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Revestimiento Para Tubería En Concreto De 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M: **51,83 (ML).**
7.1.6 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Ciclopeo 60/40 En Concreto 21 Mpa (3000 PSI), Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M: **34,87 (M3).**

8. COLECTOR BELEN PARTE BAJA
8.1 COLECTOR BELEN PARTE BAJA
8.1.1 Localización Y Replanteo: **280,00 (ML).**
8.1.2 Excavación Manual En Material Común: **291,40 (ML).**
8.1.3 Relleno Con Material Seleccionado Procedente De La Excavación: **73,18 (ML).**
8.1.4 Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado: **162,22 (M3).**
8.1.5 Cargue Y Retiro Material Escombros: **112,00 (M3).**

8.1.6 Entibado Altura Mayor A 1,2M (3 Usos): **0,00 (ML).**
8.1.7 Suministro E Instalacion Tubería Sanitaria Pvc D=8": **186,68 (ML).**
8.1.8 Suministro e instalación para Acometidas con tubería de 6" incluye accesorios y silla yee 8" x 6" longitud hasta 6 metros: **29,00 (UND).**
8.1.9 Cajas de inspección 0.6 X 0.6 X 0.6: **13,00 (UND).**
8.1.10 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,00 M Y 1,50 M: **2,00 (UND).**
8.1.11 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 2,00 M Y 2,50 M: **2,00 (UND).**


3.4. INFORME DE AVANCE

3.4.1. ESTADO Y AVANCE EN EL PERIODO

En la tabla No 2 se presentan los valores del periodo tanto programado como ejecutado, lo que arroja un porcentaje ejecutado en el primer periodo comprendido entre el 15 de octubre de 2025 al 14 de noviembre de 2025 del 25,63% vs un avance programado del 18,70%, lo que refleja un avance en el periodo del 6,93%.

Tabla 2. Valores ejecutados y programados en el periodo

CONCEPTO	EJECUTADO	PROGRAMADO
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES INCLUIDO AIU	$ 330.901.835,47	$ 241.430.523,73
PORCENTAJE AVANCE	25,63%	18,70%

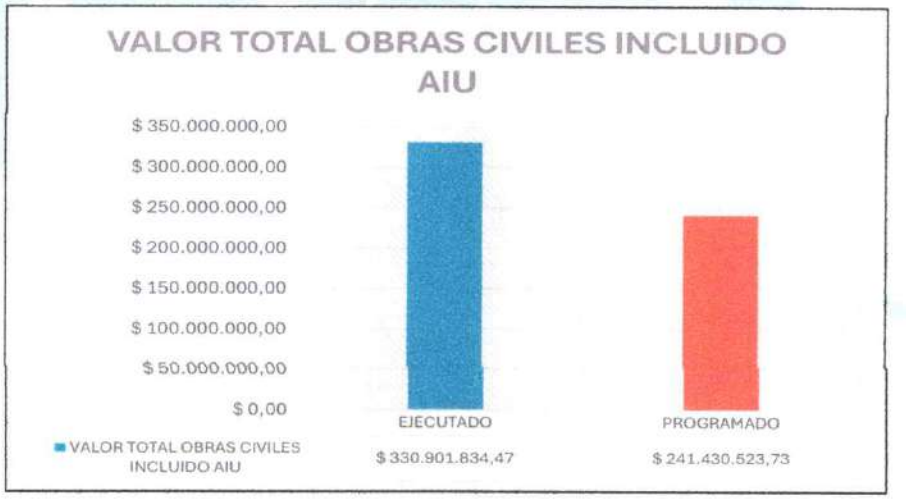

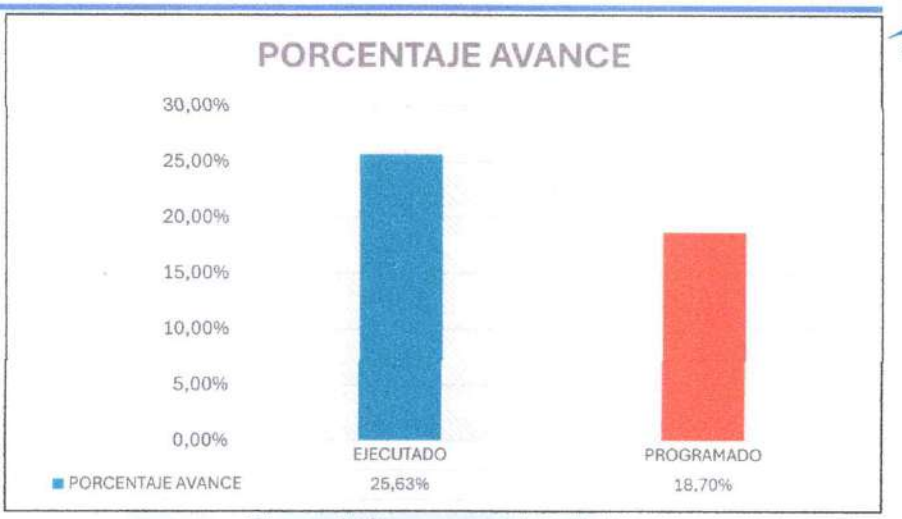


Figura 5. Avance en el periodo.

3.4.2. ESTADO Y AVANCE ACUMULADO

En la tabla No 3 se presenta los valores acumulados programados y ejecutados, del periodo, luego de transcurrido el primer período, el equivalente es del 25,63% de avance contractual acumulado vs un avance programado acumulado del 18,70%, lo que refleja un avance acumulado del 6,93%.

Tabla 2. Valores ejecutados y programados en el periodo

CONCEPTO	EJECUTADO	PROGRAMADO
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES INCLUIDO AIU	$ 330.901.835,47	$ 241.430.523,73
PORCENTAJE AVANCE	25,63%	18,70%



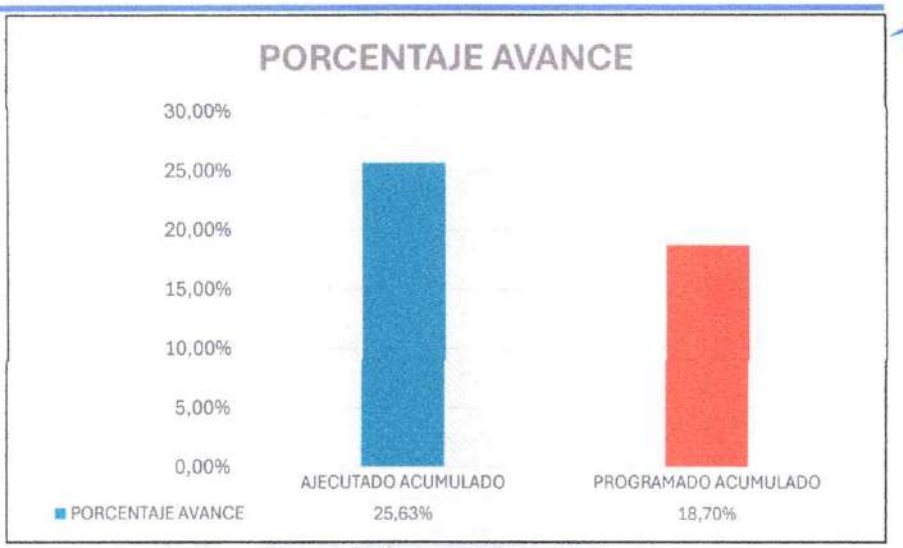


Figura 6. Avance acumulado.

3.5. COPIA DE LAS ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS EN EL PERIODO.

En este primer periodo de labores no se realizaron comités técnicos.

3.6. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se presenta el formato del control diario del equipo del contratista, utilizado este mes para la ejecución de las obras.

3.7. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se presenta el formato, donde se relaciona el personal del contratista de obra para el presente periodo.

3.8. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se adjunta el formato donde se tramita la información financiera del contrato de obra especificando cada componente del valor total (valor básico y AIU).

3.9. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato donde se registra el estado del tiempo durante el periodo.

3.10. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo se tomaron muestras de resistencia al concreto de zapatas, pedestales y vigas, pero a la fecha del informe no se han entregado los resultados de laboratorio, los cuales se anexarán en el próximo informe.

3.11. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR

Se adjuntan planillas para verificación de pago y aportes a la seguridad social integral y parafiscal del periodo.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 4. Información del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	SVIV-CMA 003 DE 2024
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
CONTRATISTA	BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS
VALOR INICIAL	$105.532.770,00
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE ORDEN DE INICIACIÓN	15 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ROYECTADA	14 de enero de 2026
SUPERVISOR	GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda
CDP No.	0678 del 23 de mayo de 2025
RP No.	0937 del 4 de agosto de 2025

4.2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR EN EL MES

La interventoría durante este primes periodo de labores ha realizado el respectivo control técnico, administrativo, financiero, ambiental y de seguridad, sumado al cumplimiento de las especificaciones técnicas, y las demás obligaciones establecidas en Clausula 9, del contrato de interventoría, garantizando el cumplimiento del objeto contractual del contrato de obra.

Es por eso que a continuación se describen las actividades que se han realizado conjuntamente con el Contratista, para mantener informado a la entidad contratante.

Inicialmente se realizó la revisión del alcance y elementos del diseño suministrado por la entidad contratante, además de verificar la coherencia entre ítems, cantidades de obra, precios unitarios y valor total contratado.

Dentro de ese análisis de las actividades contractuales vs las cantidades actualizadas reales, debemos manifestar que algunas difieren de lo pactado contractualmente, es por esto que más adelante se requiere de la presentación del balance de estas cantidades ante la entidad contratante.

En el marco de las actividades contractuales y conforme a la revisión técnica realizada por la Interventoría, se evaluó la necesidad de implementar sistemas de entibado para excavaciones con profundidades mayores a 1,20 m.

Al respecto, se precisa que, si bien la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo establece la obligatoriedad de adoptar medidas de protección en excavaciones profundas, la necesidad de entibado no depende exclusivamente de la profundidad, sino de un análisis integral de las condiciones geotécnicas, estabilidad del terreno, presencia de cargas cercanas, nivel freático, tipo de suelo y método constructivo.

Para el caso específico de las excavaciones previstas dentro del alcance del contrato, la Interventoría constató que las profundidades proyectadas, aun siendo *superiores a 1,20 m, se desarrollan en condiciones de suelo estable, con taludes* seguros, sin presencia de cargas adicionales, vibraciones significativas ni nivel freático superficial, lo cual no configura un escenario de riesgo alto que haga técnicamente obligatorio el uso permanente de entibados.

En consecuencia, desde el punto de vista técnico y de seguridad, la Interventoría considera que la excavación puede ejecutarse de manera segura sin la implementación sistemática de entibados, siempre que se mantengan las pendientes adecuadas, se controle el acceso del personal, se garantice la señalización y se apliquen las demás medidas preventivas establecidas en el SG-SST del contratista.

No obstante, se deja constancia de que la Interventoría ordenará la implementación inmediata de entibados u otras medidas de contención en aquellos tramos donde se evidencien condiciones de inestabilidad, presencia de agua, interferencias, cargas cercanas o cualquier situación que incremente el nivel de riesgo durante la ejecución de la excavación.

Por ende, y con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, la Interventoría considera técnicamente viable que los recursos presupuestados para el entibado sean reorientados para financiar actividades no previstas inicialmente,

pero necesarias para asegurar la funcionalidad, estabilidad y calidad de la obra, tales como:

- Colchón de Arena E=0.10m, para adecuado apoyo y protección de la tubería.
- Suministro e instalación de polietileno para aislamiento de la tubería al recubrimiento en concreto.
- Excavación Mecánica para adecuación de terrenos, requerida para el correcto desarrollo de las actividades constructivas.

Las actividades anteriormente descritas serán incorporadas mediante la modificación contractual correspondiente, respetando los procedimientos establecidos, sin que ello implique alteración del objeto del contrato, sino una optimización técnica y financiera orientada al cumplimiento integral del mismo.

La Interventoría dejará constancia de que dicha redistribución presupuestal se fundamenta en criterios técnicos y de seguridad, y estará sujeta a la aprobación del contratante y a la formalización de la modificación contractual respectiva.

4.3. LIBRO DE OBRA

La Interventoría lleva el control diario del libro de obra con el equipo utilizado, personal, actividades ejecutadas y notas u observaciones a las que haya lugar. Se anexa copia de esta bitácora.

4.4. CONTROL DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

El personal de la interventoría con base en las especificaciones técnicas y al pliego de condiciones, realiza el acompañamiento durante la ejecución de las actividades en lo relacionado con este periodo, al igual que el control del personal, equipo y calidad de los materiales utilizados por el contratista, dirección de los comités de obra realizados y el cumplimiento del objeto contractual.

4.5. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA

En este informe no se presenta la relación de equipo utilizado para la Interventoría en el periodo.

4.6. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

En el formato se presenta la relación de personal utilizado para la Interventoría en el presente período.

4.7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el formato se presenta la información financiera del contrato de Interventoría.

4.8. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL INTERVENTOR

Se adjuntan planillas para el Control De Aportes Para La Seguridad Social Integral Y Parafiscales de La Interventoría del período correspondiente al informe N°1.

5. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA, INTERVENTOR Y SUPERVISOR

5.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

Tabla 5. Correspondencia enviada

CONSECUTIVO	FECHA	RADICADO	DIRIGIDO A:	ASUNTO / REFERENCIA
001	27-OCT-2025	N.A	Rodrigo Alberto Ascanio Mantilla R/L Consorcio Alcantarillado	Requerimiento inicial
002	29-OCT-2025	N.A	Rodrigo Alberto Ascanio Mantilla R/L Consorcio Alcantarillado	Requerimiento PMA

5.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Tabla 6. Correspondencia recibida

CONSECUTIVO	FECHA	RADICADO	ORIGEN	ASUNTO / REFERENCIA
001	03-NOV-2025	N.A	Rodrigo Alberto Ascanio Mantilla R/L Consorcio Alcantarillado	Respuesta a requerimiento inicial

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa el registro fotográfico correspondiente para las actividades intervenidas durante el periodo establecido para el presente informe N°1.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Del análisis comparativo entre los valores ejecutados y programados para el período evaluado, se evidencia que el contrato presenta un avance superior al inicialmente programado. En efecto, el valor ejecutado de obras civiles, incluido AIU, asciende a $330.901.835,47, frente a un valor programado de $241.430.523,73, lo que representa un porcentaje de avance ejecutado del 25,63%, superior al 18,70% programado.

  Este comportamiento indica un adelanto en la ejecución física y financiera del contrato, atribuible a una mayor productividad en obra y a la ejecución anticipada de actividades previstas para períodos posteriores, sin que a la fecha se evidencien afectaciones negativas sobre la calidad, el alcance o el objeto contractual.

  La Interventoría continuará realizando el seguimiento técnico y financiero correspondiente, con el fin de verificar que el avance anticipado se mantenga alineado con el cronograma general del contrato y que la ejecución se desarrolle conforme a lo establecido en los documentos contractuales.

- La Interventoría identificó la necesidad de incluir ítems no previstos para el adecuado cumplimiento del objeto contractual; no obstante, su ejecución y reconocimiento económico estarán condicionados a la previa formalización de la modificación contractual respectiva.

- Adelantar de manera prioritaria el trámite de la modificación contractual correspondiente, con el fin de incorporar formalmente los ítems no previstos identificados, debidamente justificados desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero.

- Optimizar la redistribución de los recursos presupuestales, considerando la supresión o disminución de actividades inicialmente previstas que no resultan técnicamente necesarias, sin que ello implique alteración del objeto del contrato.

CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
R/L BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS
Interventor

ANEXOS

Anexo N° 01 Seguimiento a las Garantías Contractuales de Obra e interventoría

Alcaldía de Ocaña | Busbanzá Ingeniería S.A.S | CONSORCIO ALCANTARILLADO

PÁGINA	1	DE	1

FECHA	14	11	2025

UNIDAD EJECUTORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A MUNICIPIO: OCAÑA

CONTRATO No. LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207) CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO

POLIZA No. CUM. 11-44-101267009 RCE. 11-40-101084218

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE INICIO 15 DE octubre DE 2025 (Fecha en la cual se imparte)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO TRES (3) MESES (Número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO FINAL DEL CONTRATO 15 DE enero DE 2026

		VIGENCIA						
		DESDE:				HASTA		
1. Garantía Única de Cumplimiento:	X	3	10	2025		3	5	2026
1.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo y/o pago anticipado								
1.2. Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	X	3	10	2025		3	1	2029
1.3. Estabilidad de la obra	X	3	10	2025		3	1	2031
1.4. Calidad del servicio								
2. Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	X	3	10	2025		1	1	2026

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Contratos Adicionales: Modificación No. Póliza No.

Firma
Nombre: ANDRES ARCINIEGAS GAMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860 009 578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C	BOGOTA	11	11-44-101267009	0

FECHA EXPEDICION DIA	MES	ANO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	ANO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	ANO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	10	2025	03	10	2025	00:00	03	01	2031	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACION	
	CONSORCIO ALCANTARILLADO		NIT. 901.992.571-8
DIRECCION	CL 3 # 23 - 15 BRR MARABELITO	CIUDAD	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
TELEFONO	3165789722		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACION	
	MUNICIPIO DE OCAÑA -NORTE DE SANTANDER		NIT. 890.501.102-2
DIRECCION	KR 12 NRO 10 - 42	CIUDAD	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
TELEFONO	5636300		

ADICIONAL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN EC0010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DEL TOMADOR DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 012-2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO DIRECTOS LOS OLIVOS- BRISAS QUEBRADA EL TROPA EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEGURADA/UVR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/10/2025	03/05/2026	$258,214,463.88
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/10/2025	03/01/2029	$129,107,231.94
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$129,107,231.94

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION E... HUMO

PARTICIPANTES DE CONSORCIO - UNION TEMPORAL:

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ASCANIO MONTILLA RODRIGO	1091668854	50.00
MORALES INGENIERIA CIVIL S.A.S.	901578893-4	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,272,994.00	$ ******20,000.00	$ *****435,669.00	$ *********2,728,663.00	$ ******516,428,927.77	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AMAYA RADDA ASESORES DE SEGUROS LT	93102	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101267009

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C	BOGOTA	11	11-40-101084218	0

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	10	2025	03	10	2025	00 00	03	01	2026	23 59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACION
CONSORCIO ALCANTARILLADO		NIT 901 992 571-8

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 3 # 23 - 15 BRR MARABELITO	OCAÑA NORTE DE SANTANDER	3165789722

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO		IDENTIFICACION
MUNICIPIO DE OCAÑA -NORTE DE SANTANDER		NIT 890 501 102-2

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KR 12 NRO 10 - 42	OCAÑA NORTE DE SANTANDER	5636300

BENEFICIARIO 890501102 - MUNICIPIO DE OCAÑA -NORTE DE SANTANDER ADICIONAL TERCEROS AFECTADOS O LOS DE LEY

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 11-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS, CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE OBRA N° CT-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001 DE FECHA 15/05/2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE OCAÑA Y EL CONSORCIO ALCANTARILLADO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO DIRECTO LOCETA 2004 ATRAVESANDO EL PREDIO EL MOLINO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE OCAÑA".

ASEGURADO / BENEFICIARIO:
TERCEROS AFECTADOS O LOS DE LEY
MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER NIT 890501102-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLES	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/10/2025	03/01/2026	$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/10/2025	03/01/2026	$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/10/2025	03/01/2026	$284,700,000.00

ACLARACIONES

[illegible] CONSORCIO - UNION TEMPORAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ANTONIO MONTILLA PEDROZO	1091680854	25.00
MUNARCO INGENIERIA SOMOS S.A.S.	901578895-5	75.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****179.400.00	$ *******3.000.00	$ ******34.656.00	$ **********217.056.00	$ ******284.700.000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AMAYA ASESORES ASESORES DE SEGUROS LTDA	93102	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101084218

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA D.C.	BOGOTA	11	11-40-101084218	0

FECHA EXPEDICION DIA	MES	ANO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	ANO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	ANO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	10	2025	03	10	2025	00:00	03	01	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACION	
CONSORCIO ALCANTARILLADO		NIT.	901.992.571-8
DIRECCION: CL 3 # 23 - 15 BRR MARABELITO	CIUDAD: OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	TELEFONO:	3165789722

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACION	
MUNICIPIO DE OCAÑA -NORTE DE SANTANDER		NIT:	890.501.102-2
DIRECCION: KR 12 NRO 10 - 42	CIUDAD: OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	TELEFONO:	5606300

BENEFICIARIO: 890501102 - MUNICIPIO DE OCAÑA -NORTE DE SANTANDER

AMPARO	PORCENTAJE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/10/2025	03/01/2026	$284,700,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/10/2025	03/01/2026	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/10/2025	03/01/2026	$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101084218

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF0971628

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Alcaldia de Ocaña — Busbanzá Ingeniería S.A.S — CONSORCIO ALCANTARILLADO	PÁGINA	1	DE	1
	FECHA	14	11	2025

UNIDAD EJECUTORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A MUNICIPIO: OCAÑA

CONTRATO No. LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207) CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO

POLIZA No. CUM. 11-44-101267009 RCE. 11-40-101084218

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE INICIO 15 DE octubre DE 2025
(Fecha en la cual se imparte)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO TRES (3) MESES
(Número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO FINAL DEL CONTRATO 15 DE enero DE 2026

		VIGENCIA						
		DESDE:				HASTA		
1. Garantía Única de Cumplimiento:	X	15	10	2025		15	5	2026
1.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo y/o pago anticipado								
1.2. Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	X	15	10	2025		15	1	2029
1.3. Estabilidad de la obra	X	15	10	2025		15	1	2031
1.4. Calidad del servicio								
2. Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	X	15	10	2025		15	1	2026

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Contratos Adicionales: Modificación No. Póliza No.

Firma
Nombre: ANDRES ARCINIEGAS GAMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101267009	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	10	2025	15	10	2025	00:00	15	01	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO ALCANTARILLADO	NIT. 901.992.571-8

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
CL 3 # 23 - 15 BRR MARABELITO	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	3165789722

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE OCAÑA -NORTE DE SANTANDER	NIT. 890.501.102-2

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
KR 12 NRO 10 - 42	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	5636300

ADICIONAL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE OBRA NO. LP-2025-001 DEL 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS- BELEN QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/10/2025	15/05/2026	$258,214,463.89	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/10/2025	15/01/2029	$129,107,231.94	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$129,107,231.94	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE RADICA ACTA DE INICIO DE FECHA 15/10/2025, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS QUEDANDO DE LA MANERA ESTIPULADA EN LA PRESENTE POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,272,994.00	$ ******20,000.00	$ *****435,669.00	$ *********2,728,663.00	$ ******516,428,927.77	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AMAYA RADDEL ASESORES DE SEGUROS LT	93102	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101267009

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oyeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA D.C.	BOGOTA	11	11-44-101267009	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	10	2025	15	10	2025	00:00	15	01	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ALCANTARILLADO		NIT. 901.992.571-8
DIRECCIÓN:	CL 3 # 23 - 15 BRR MARABELITO	CIUDAD:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
TELEFONO:	3165789722		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE OCAÑA -NORTE DE SANTANDER		NIT. 890.501.102-2
DIRECCIÓN:	KR 12 NRO 10 - 42	CIUDAD:	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
TELEFONO:	5690300		

ADICIONAL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO UNION TEMPORAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGANTO MARTINEZ ADOLFO	1091668511	15.00
MONARCA INGENIERIA ROMAC S.A.S.	901578855-4	85.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101267009

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLE0221629

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860 009 578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101084218	2

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	10	2025	15	10	2025	00:00	15	01	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALCANTARILLADO		NIT: 901.992.571-8

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
CL 3 # 23 - 15 BRR MARABELITO	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	3165789722

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE OCAÑA -NORTE DE SANTANDER		NIT. 890.501.102-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 12 NRO 10 - 42	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	5636300

BENEFICIARIO 890501102 - MUNICIPIO DE OCAÑA -NORTE DE SANTANDER ADICIONAL TERCEROS AFECTADOS O LOS DE LEY

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D002 / 11-01-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE OBRA No. [illegible] CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS- [illegible] QUEBRADA EL TRIGAL EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ASEGURADOS BENEFICIARIOS
TERCEROS AFECTADOS O LOS DE LEY
MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER NIT 890501102-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/10/2025	15/01/2026	$284,700,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/10/2025	15/01/2026	$284,700,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/10/2025	15/01/2026	$284,700,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE RADICA ACTA DE INICIO DE FECHA 15/10/2025, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS QUEDANDO DE LA MANERA REFLEJADA EN LA CARATULA DE LA POLIZA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****179,400.00	$ *******3,000.00	$ *****34,656.00	$ **********217,056.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART
AMAYA RAMOREL ASESORES DE SEGUROS LT	93102	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101084218

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA D.C	BOGOTA	11	11-40-101084218	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	10	2025	15	10	2025	00:00	15	01	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALCANTARILLADO		NIT. 901.992.571-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 3 # 23 - 15 BRR MARABELITO	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	3165789722

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE OCAÑA -NORTE DE SANTANDER	NIT. 890.501.102-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
KR 12 NRO 10 - 42	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	5606300

BENEFICIARIO: 890501102 - MUNICIPIO DE OCAÑA -NORTE DE SANTANDER

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/10/2025	15/01/2026	$284,700,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/10/2025	15/01/2026	$284,700,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/10/2025	15/01/2026	$284,700,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-6074 - TELEFONO. 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101084218

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLI 0221628

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101084218	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	10	2025	15	10	2025	00:00	15	01	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO ALCANTARILLADO		NIT. 901.992.571-8	
DIRECCIÓN: CL 3 # 23 - 15 BRR MARABELITO	CIUDAD: OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO: 3165789722	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE OCAÑA -NORTE DE SANTANDER		NIT. 890.501.102-2	
DIRECCIÓN: KR 12 NRO 10 - 42	CIUDAD: OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO: 5636300	

BENEFICIARIO: 890501102 - MUNICIPIO DE OCAÑA -NORTE DE SANTANDER

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ASCANIO MANTILLA RODRIGO	1091668856	10.00
MONAPCA INGENIERIA JOMAC S.A.S.	901576895-4	90.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101084218

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OLF99110725

Alcaldía de Ocaña — Busbanzá Ingeniería S.A.S — CONSORCIO ALCANTARILLADO

PÁGINA	1	DE	1

FECHA	14	11	2025

UNIDAD EJECUTORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

MUNICIPIO: OCAÑA

CONTRATO No.: SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528)

CONTRATISTA: BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS

POLIZA No.: CUM. 56-44-101010787

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ORDEN DE INICIO: 29 DE octubre DE 2025 (Fecha en la cual se imparte)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: TRES (3) MESES (Número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO FINAL DEL CONTRATO: 15 DE enero DE 2026

		VIGENCIA						
		DESDE:				HASTA		
1. Garantía Única de Cumplimiento:	X	31	7	2025		31	10	2025
1.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo y/o pago anticipado								
1.2. Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	X	31	7	2025		31	10	2028
1.3. Estabilidad de la obra								
1.4. Calidad del servicio	X	31	10	2025		31	10	2030
2. Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual								

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Contratos Adicionales: Modificación No. _____ Póliza No. _____

Firma _____
Nombre: ANDRES ARCINIEGAS GAMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Firma _____
Nombre: CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101010787	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	31	07	2025	00:00	31	10	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
BUSBANZA INGENIERIA SAS	NIT: 901.185.879-9	5625257

DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 4 - 04 URB.VILLA CAROLINA,CASA.3,APT. CIUDAD: OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE OCAÑA	NIT: 890.501.102-2	5636300

DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO. 10-42 PALACIO MUNICIPAL *CIUDAD: OCAÑA, NORTE DE SANTANDER*

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONTRATO No SVIV CMA 003 DE 2025, REFERENTE A INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS- BELEN-QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/07/2025	31/10/2025	$10,553,277.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/07/2025	31/10/2028	$10,553,277.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/10/2025	31/10/2030	$10,553,277.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****237,860.00	$ *******8,000.00	$ ******46,713.00	$ **********292,573.00	$ *******31,659,831.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AMAYA AGENCIA DE SEGUROS LTDA	194875	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

56-44-101010787

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101010787	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	31	07	2025	00:00	31	10	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
BUSBANZA INGENIERIA SAS	NIT: 901.185.879-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 4 - 04 URB.VILLA CAROLINA,CASA.3,APT.	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	5625257

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE OCAÑA	NIT: 890.501.102-2

DIRECCIÓN:	*CIUDAD:*	*TELÉFONO*
CARRERA 12 NO. 10-42 PALACIO MUNICIPAL	*OCAÑA, NORTE DE SANTANDER*	*5636300*

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****237,860.00	$ *******8,000.00	$ ******46,713.00	$ **********292,573.00	$ *******31,659,831.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AMAYA AGENCIA DE SEGUROS LTDA	194875	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1102040079512 5(3900)000000292573(96)20260731

REFERENCIA PAGO: 1102040079512-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Alcaldía de Ocaña | Busbanzá Ingeniería S.A.S | CONSORCIO ALCANTARILLADO

PÁGINA	1	DE	1

FECHA	14	11	2025

UNIDAD EJECUTORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A MUNICIPIO OCAÑA

CONTRATO No. SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528) CONTRATISTA BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS

POLIZA No. CUM. 56-44-101010787

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ORDEN DE INICIO 29 DE octubre DE 2025
(Fecha en la cual se imparte)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO TRES (3) MESES
(Número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO FINAL DEL CONTRATO 15 DE enero DE 2026

		VIGENCIA							
1. Garantía Única de Cumplimiento:	X	DESDE:	15	10	2025	HASTA	15	1	2026
1.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo y/o pago anticipado		DESDE:				HASTA			
1.2. Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	X	DESDE:	15	10	2025	HASTA	15	1	2029
1.3. Estabilidad de la obra		DESDE:				HASTA			
1.4. Calidad del servicio	X	DESDE:	15	1	2026	HASTA	15	1	2031
2. Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual		DESDE:				HASTA			

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Contratos Adicionales: Modificación No. Póliza No.

Firma
Nombre: ANDRES ARCINIEGAS GAMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101010787	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	10	2025	15	10	2025	00:00	15	01	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	BUSBANZA INGENIERIA SAS	NIT: 901.185.879-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 10 NRO. 4 - 04 URB.VILLA CAROLINA,CASA.3,APT.	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	5625257

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE OCAÑA	NIT: 890.501.102-2

DIRECCIÓN:	*CIUDAD:*	*TELÉFONO*
CARRERA 12 NO. 10-42 PALACIO MUNICIPAL	*OCAÑA, NORTE DE SANTANDER*	*5636300*

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONTRATO No SVIV CMA 003 DE 2025, REFERENTE A INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS- BELEN-QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/10/2025	15/01/2026	$10,553,277.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/10/2025	15/01/2029	$10,553,277.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	15/01/2026	15/01/2031	$10,553,277.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE RADICA ACTA DE INICIO DE FECHA 15/10/2025, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS QUEDANDO DE LA MANERA ESTIPULADA EN LA PRESENTE POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****237,860.00	$ *******8,000.00	$ ******46,713.00	$ **********292,573.00	$ *******31,659,831.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AMAYA AGENCIA DE SEGUROS LTDA	194875	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 6008461136 - BARRANCABERMEJA

56-44-101010787

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101010787	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	10	2025	15	10	2025	00:00	15	01	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	BUSBANZA INGENIERIA SAS		NIT: 901.185.879-9
DIRECCION: CL 10 NRO. 4 - 04 URB.VILLA CAROLINA,CASA.3,APT.	**CIUDAD:** OCA¥A, NORTE DE SANTANDER	**TELEFONO:**	5625257

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE OCAÑA		NIT: 890.501.102-2
DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO. 10-42 PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** OCA¥A, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	5636300

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-44-101010787

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Anexo N° 02 Control Diario de Equipo Contratista Obra

OFICINA, CALLE 6 25-38 BARRIO 20 DE JULIO
CEL. 3185549013
Email. busbanzaingeniena@gmail.com

Alcaldía de Ocaña

Busbanzá Ingeniería S.A.S

CONSORCIO ALCANTARILLADO

PAGINA	1	DE	1

FECHA 31 / 10 / 2025

INTERVENTOR: BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS

MUNICIPIO: OCAÑA

CONTROL DIARIO EQUIPO DE OBRA

CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

MES: 15 OCTUBRE - 31 OCTUBRE **CONTRATO No.** LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207) **SECTOR**

CONTRATISTA CONSORCIO ALCANTARILLADO

OCTUBRE

EQUIPO \ DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Mezcladora de Concreto															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Vibrocompactador tipo Canguro															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Andamios															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Cortadora de concreto															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Volqueta cap 6 m3															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Equipo Topografico															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Herramienta menor															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A

Nomenclatura: A = Activo R = Repación I = Inactivo

Firma
Nombre : ANDRES ARCINIEGAS GAMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre : CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Ocaña

Busbanzá Ingeniería S.A.S

CONSORCIO ALCANTARILLADO

PAGINA	1	DE	1

FECHA 14 / 11 / 2025

INTERVENTOR: BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS

MUNICIPIO: OCAÑA

CONTROL DIARIO EQUIPO DE OBRA

CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

MES: 1 NOVIEMBRE - 14 NOVIEMBRE **CONTRATO No.** LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207) **SECTOR**

CONTRATISTA CONSORCIO ALCANTARILLADO

NOVIEMBRE

EQUIPO \ DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Mezcladora de Concreto	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
Vibrocompactador tipo Canguro	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
Andamios	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
Cortadora de concreto	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
Volqueta cap 6 m3	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
Equipo Topografico	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
Herramienta menor	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	

Nomenclatura: A = Activo R = Repación I = Inactivo

Firma
Nombre : ANDRES ARCINIEGAS GAMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre : CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo N° 03 Control Diario de Personal Contratista Obra

OFICINA, CALLE 6 25-38 BARRIO 20 DE JULIO
CEL. 3185549013
Email. busbanzaingeniena@gmail.com

Alcaldía de Ocaña

Busbanzá Ingeniería S.A.S

CONSORCIO ALCANTARILLADO

PAGINA	1	DE	1

FECHA 31 10 25

INTERVENTOR BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS MUNICIPIO OCAÑA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

MES: 15 OCTUBRE - 31 OCTUBRE **CONTRATO No.** LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207) **SECTOR** CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA CONSORCIO ALCANTARILLADO

DIA / PERSONAL	OCTUBRE																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CONTRERAS RUEDA DAINER ESTIWER															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
SANCHEZ ASCANIO RONALD EMIRO															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
TARAZONA SARABIA DEIVY															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
MEJIA CARDENAS VICTOR MANUEL															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
RINCON CHACON LEONARDO AUGUSTO															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I
PALLARES VACCA MARCIAL FERNANDO															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
TRILLOS JACOME DIEGO ANDRES															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
VERGEL CALDERON JUAN CAMILO															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
DURAN CASTILLA JHONATAN															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
LAZARO PATIÑO YANIER ELIAS															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
SANCHEZ RUEDA GUVER ANTONIO															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
CARRASCAL RUEDAS NIXON ARMANDO															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
CHACON URIBE DAIRO															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
RIOS CHACON CRISTIAN FERNANDO															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I
HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
PEREZ CARLOS ALBERTO															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
TRIGOS YANDER															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A

Alcaldía de Ocaña — Busbanzá Ingeniería S.A.S — CONSORCIO ALCANTARILLADO

PAGINA	1	DE	1

FECHA: 31 / 10 / 25

INTERVENTOR: BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS — MUNICIPIO: OCAÑA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

MES: 15 OCTUBRE - 31 OCTUBRE

CONTRATO No. LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207)

SECTOR CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA CONSORCIO ALCANTARILLADO

OCTUBRE

PERSONAL \ DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TRILLOS MEJIA JOSE DELFIN															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
PEREZ CONTRERAS ALEXANDER															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
OVALLOS AVENDAÑO YORDAN STIVEN															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
PEREZ CONTRERAS DEIGO FERNANDO															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A

Nomenclatura: A = Activo R = Repación I = Inactivo

Firma Tatiana C. Navarro P.
Nombre : TATIANA CAROLINA NAVARRO PEÑARANDA
PROFESIONAL SST

Firma
Nombre : CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Ocaña

Busbanzá Ingeniería S.A.S

CONSORCIO ALCANTARILLADO

PAGINA	1	DE	1

FECHA 14 11 25

INTERVENTOR BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS MUNICIPIO OCAÑA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

MES: 1 NOVIEMBRE - 15 NOVIEMBRE CONTRATO No. LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207) SECTOR

CONTRATISTA CONSORCIO ALCANTARILLADO

NOVIEMBRE

DIA / PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CONTRERAS RUEDA DAINER ESTIWER	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
SANCHEZ ASCANIO RONALD EMIRO	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
TARAZONA SARABIA DEIVY	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
MEJIA CARDENAS VICTOR MANUEL	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
PALLARES VACCA MARCIAL FERNANDO	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
TRILLOS JACOME DIEGO ANDRES	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
VERGEL CALDERON JUAN CAMILO	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
DURAN CASTILLA JHONATAN	A			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I																	
LAZARO PATIÑO YANIER ELIAS	A			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I																	
SANCHEZ RUEDA GUVER ANTONIO	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
CARRASCAL RUEDAS NIXON ARMANDO	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
CHACON URIBE DAIRO	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
RODRIGUEZ QUINTERO JOSE LUIS	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
PEREZ CARLOS ALBERTO	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
TRIGOS YANDER	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	

Alcaldía de Ocaña — Busbanzá Ingeniería S.A.S — CONSORCIO ALCANTARILLADO

PAGINA	1	DE	1

FECHA: 14 / 11 / 25

INTERVENTOR: BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS — MUNICIPIO: OCAÑA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

MES: 1 NOVIEMBRE - 15 NOVIEMBRE — CONTRATO No. LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207) — SECTOR: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO

NOVIEMBRE

PERSONAL \ DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TRILLOS MEJIA JOSE DELFIN	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
MANOSALVA REINALDO	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
PEREZ CONTRERAS ALEXANDER	A			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I																	
OVALLOS AVENDAÑO YORDAN STIVEN	A			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I																	
PEREZ CONTRERAS DEIGO FERNANDO	A			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I																	

Nomenclatura: A = Activo R = Repación I = Inactivo

Firma: Tatiana C. Navarro P.
Nombre: TATIANA CAROLINA NAVARRO PEÑARANDA
PROFESIONAL SST

Firma:
Nombre: CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo N° 04 Información Financiera Obra

OFICINA, CALLE 6 25-38 BARRIO 20 DE JULIO
CEL. 3185549013
Email. busbanzaingeniena@gmail.com

Alcaldía de Ocaña

Busbanzá Ingeniería S.A.S

CONSORCIO ALCANTARILLADO

PAGINA	1	DE	1

FECHA	14	11	2025

INTERVENTOR: BUSBANZA INGENIERI SAS — MUNICIPIO: OCAÑA

CONTRATO No: LP-SVIV-001-2025 (COL1 PCCNTR 8359207) — CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO — MES: 15 OCTUBRE - 14 NOVIEMBRE

SECTOR: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

INFORME N°	Mes/ Año	Valor Básico de las Obras	Valor AIU + IVA sobre U	Valor Total Obra	Amort. Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Registro presup. Nos. De fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	Observaciones
1										Avance fisico y financiero pero aun no se tiene cobros por parte del Contratista

Nota: Los valores se deben expresar en millones de pesos

Firma

Nombre: ANDRES ARCINIEGAS GAMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo N° 05 Reporte estado general del tiempo.

Alcaldía de Ocaña — Busbanzá Ingeniería S.A.S — CONSORCIO ALCANTARILLADO

PAGINA	1	DE	1

FECHA: 31 / 10 / 25

INTERVENTOR: BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS — MUNICIPIO: OCAÑA

CONTROL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BÉLEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

MES: 15 OCTUBRE - 31 OCTUBRE — **CONTRATO No.** LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207) — **SECTOR**

CONTRATISTA CONSORCIO ALCANTARILLADO

OCTUBRE

CLIMA \ DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Soleado															6	9	9	5		6	9	4	9	9	5		9	6	9	9	9
Lluvia moderada															1		1			1		5						1			
Lluvia intensa															2					2								2			

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO, TENIENDO EN CUENTA EL DIA COMO UNA JORNADA LABORAL DE 9 HORAS DIARIAS

Firma
Nombre: ANDRES ARCINIEGAS GAMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Ocaña — Busbanzá Ingeniería S.A.S — CONSORCIO ALCANTARILLADO

PAGINA	1	DE	1

FECHA 14 11 25

INTERVENTOR: BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS — MUNICIPIO: OCAÑA

CONTROL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BÉLEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

MES: 1 NOVIEMBRE - 15 NOVIEMBRE — **CONTRATO No.** LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207) — **SECTOR**

CONTRATISTA CONSORCIO ALCANTARILLADO

OCTUBRE

CLIMA \ DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Soleado	5		5	9	9	9	9	5		6	9	9	9	9																	
Lluvia moderada																															
Lluvia intensa										3																					

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO, TENIENDO EN CUENTA EL DIA COMO UNA JORNADA LABORAL DE 9 HORAS DIARIAS.

Firma
Nombre: ANDRES ARCINIEGAS GAMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo N°6 Reporte Ensayos de Laboratorio

Anexo Nº7 Control Parafiscales Obra

OFICINA, CALLE 6 25-38 BARRIO 20 DE JULIO
CEL. 3185549013
Email. busbanzaingeniena@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901992571-8	CONSORCIO ALCANTARILLADO		CL 3 23 15	1111111	CONSORCIOALCANTARILLADO06@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				21	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	07/11/2025	91224867	$2.648.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	7.600	0		0		0	0	0	0	7.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	19.000	0		0		0	0	0	0	19.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	102.600	0		0		0	0	0	0	102.600	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	77.900	0		0		0	0	0	0	77.900	5
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	7.600	0		0		0	0	0	0	7.600	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	70.300	0		0		0	0	0	0	70.300	4
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	836.000	0	0	0	0	0	0		836.000	12
25-14	Colpensiones	900336004-7	532.000	0	0	0	0	0	0		532.000	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	596.100				596.100	0	0	596.100			5.961	596.100	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	342.000	0	0	342.000	21

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901992571-8	CONSORCIO ALCANTARILLADO	CL 3 23 15	1111111	CONSORCIOALCANTARILLADO06@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		NORTE DE SANTANDE	OCAÑA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				21	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	07/11/2025	91224867	$2.648.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	342.000	342.000
Pensión	2	1.368.000	1.368.000
Riesgos Laborales	1	596.100	596.100
CCF	1	342.000	342.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	2.648.100	2.648.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901992571-8	CONSORCIO ALCANTARILLADO		CL 3 23 15	1111111	CONSORCIOALCANTARILLADO06@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				21	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	07/11/2025	91224867	$2.648.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Encargado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003174824	CONTRERAS RUEDA DAINER ESTIWER	1	0			S	X																	230301	474.500	76.000	0	0	0	0	ESSC82	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF36	474.500	19.000	0	0	0	0	0
2	CC	1004903749	SANCHEZ ASCANIO RONALD EMIRO	1	0			S	X																	25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS041	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF36	427.050	17.100	0	0	0	0	0
3	CC	1007539444	TARAZONA SARABIA DENY	1	0			S	X																	25-14	189.600	30.400	0	0	0	0	CCFC50	189.600	7.600	14-11	189.600	5	13.300	CCF36	189.600	7.600	0	0	0	0	0
4	CC	1064791134	MEJIA CARDENAS VICTOR MANUEL	1	0			S	X																	230301	189.600	30.400	0	0	0	0	EPS041	189.600	7.600	14-11	189.600	5	13.300	CCF36	189.600	7.600	0	0	0	0	0
5	CC	1064838234	RINCON CHACON LEONARDO AUGUSTO	1	0			S	X	X																230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS037	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF36	474.500	19.000	0	0	0	0	0
6	CC	1064839866	PALLARES VACCA MARCIAL FERNANDO	1	0			S	X																	230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS005	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF36	474.500	19.000	0	0	0	0	0
7	CC	1091680414	TRILLOS JACOME DIEGO ANDRES	1	0			S	X																	230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS037	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF36	474.500	19.000	0	0	0	0	0
8	CC	1091854212	VERGEL CALDERON JUAN CAMILO	1	0			S	X																	25-14	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS037	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF36	189.800	7.600	0	0	0	0	0
9	CC	1092670390	DURAN CASTILLA JHONATAN	1	0			S	X																	25-14	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS037	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF36	474.500	19.000	0	0	0	0	0
10	CC	1148440336	LAZARO PATIÑO YANIER ELIAS	1	0			S	X																	230301	427.050	68.400	0	0	0	0	ESSC24	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF36	427.050	17.100	0	0	0	0	0
11	CC	13175352	SANCHEZ RUEDAS GIVER ANTONIO	1	0			S	X																	230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS041	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF36	427.050	17.100	0	0	0	0	0
12	CC	13175421	CARRASCAL RUEDAS NIXON ARMANDO	1	0			S	X																	25-14	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS042	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF36	189.800	7.600	0	0	0	0	0
13	CC	1064840995	CHACON URIBE DAIRO	1	0			S	X																	230301	474.500	76.000	0	0	0	0	ESSC82	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF36	474.500	19.000	0	0	0	0	0
14	CC	1064841249	RIOS CHACON CRISTIAN FERNANDO	1	0			S	X	X																230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS037	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF36	474.500	19.000	0	0	0	0	0
15	CC	1068578437	HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	1	0			S	X																	230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS037	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF36	474.500	19.000	0	0	0	0	0
16	CC	13177177	PEREZ CARLOS ALBERTO	1	0			S	X																	230301	427.050	68.400	0	0	0	0	ESSC24	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF36	427.050	17.100	0	0	0	0	0
17	CC	13178015	TRIGOS YANDER	1	0			S	X																	230301	427.050	68.400	0	0	0	0	ESSC24	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF36	427.050	17.100	0	0	0	0	0
18	CC	5084256	TRILLOS MEJIA JOSE DELFIN	1	0			S	X																	25-14	474.500	76.000	0	0	0	0	ESSC82	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF36	474.500	19.000	0	0	0	0	0
19	CC	1092670475	PEREZ CONTRERAS ALEXANDER	1	0			S	X																	25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS041	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF36	427.050	17.100	0	0	0	0	0
20	CC	1092671114	OVALLOS AVENDAÑO YORDAN STIVEN	1	0			S	X																	25-14	474.500	76.000	0	0	0	0	ESSC24	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF36	474.500	19.000	0	0	0	0	0
21	CC	1092730643	PEREZ CONTRERAS DIEGO FERNANDO	1	0			S	X																	25-14	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS041	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF36	474.500	19.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Anexo N° 08 Control Diario de Personal Interventoría

Alcaldía de Ocaña — Busbanzá Ingeniería S.A.S — CONSORCIO ALCANTARILLADO

PAGINA	1	DE	1

FECHA: 31 / 10 / 2025

INTERVENTOR: BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS — MUNICIPIO: OCAÑA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

MES: 15 OCTUBRE - 31 OCTUBRE — **CONTRATO No.** SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528) — **SECTOR**

CONTRATISTA BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS

OCTUBRE

PERSONAL \ DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
ANDRES ARCINIEGAS GAMERO - RESIDENTE DE INTERVENTORÍA															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
TATIANA CAROLINA NAVARRO PEÑARANDA - PSST															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
ANDRES FELIPE CARDOZO MARTINEZ - TOPOGRAFO															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
JULIO CESAR CARVAJAL RAMIREZ - AUXILIAR ADMINISTRATIVO															A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A

Firma: Tatiana C. Navarro P
Nombre: TATIANA CAROLINA NAVARRO PEÑARANDA
PROFESIONAL DE SST

Firma:
Nombre: CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Ocaña | Busbanzá Ingeniería S.A.S | CONSORCIO ALCANTARILLADO

PAGINA	1	DE	1

FECHA 14 / 11 / 2025

INTERVENTOR: BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS

MUNICIPIO: OCAÑA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

MES: 1 NOVIEMBRE - 14 NOVIEMBRE | **CONTRATO No.** SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528) | **SECTOR**

CONTRATISTA BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS

PERSONAL \ DIA	NOVIEMBRE																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																
ANDRES ARCINIEGAS GAMERO - RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																
TATIANA CAROLINA NAVARRO PEÑARANDA - PSST	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																
ANDRES FELIPE CARDOZO MARTINEZ - TOPOGRAFO	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																
JULIO CESAR CARVAJAL RAMIREZ - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																

Firma Tatiana C. Navarro P.
Nombre : TATIANA CAROLINA NAVARRO PEÑARANDA
PROFESIONAL DE SST

Firma
Nombre : CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo N° 09 Información financiera Interventoría

Alcaldía de Ocaña — Busbanzá Ingeniería S.A.S — CONSORCIO ALCANTARILLADO

PAGINA	1	DE	1

FECHA: 14 | 11 | 2025

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA — MUNICIPIO: OCAÑA

CONTRATO: SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528) — INTERVENTORIA: BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS — MES : OCTUBRE - NOVIEMBRE

SECTOR: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

INFORMACION FINANCIERA DE LA INTERVENTORIA

Informe N°	Mes/ Año	Valor Básico	Valor IVA	Valor Impuestos	Valor Total	Amort. Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Registro presup. Nos. De fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	Observaciones
1											Avance fisico y financiero pero aun no se tiene cobros por parte de la Interventoria

NOTA:

Firma
Nombre: ANDRES ARCINIEGAS GAMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
INTERVENTOR

Anexo N° 10 Control Parafiscales Interventoría

OFICINA, CALLE 6 25-38 BARRIO 20 DE JULIO
CEL. 3185549013
Email. busbanzaingeniena@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35222634
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-11-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	BUSBANZA INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901185879	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	KDX194 185 OFIC 201	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	OCANA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	TRAMITESALUD0106 @GMAIL.COM	TELÉFONO	5625257
FAX	5622857	SUCURSAL	5	NOMBRE SUCURSAL	TARRA1
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88285864	PRIMER APELLIDO	AREVALO	SEGUNDO APELLIDO	OROZCO
PRIMER NOMBRE	CARLOS	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 10	Año: 2025	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$14.420.001		35222634

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1091673979	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	ARCINIEGAS GAMERO ANDRES MAURICIO	$3.800.000
CC-88285864	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	AREVALO OROZCO CARLOS ROBERTO	$3.600.000
CC-1098738355	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	CARDOZO MARTINEZ ANDRES FELIPE	$2.500.000
CC-91277749	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	CARVAJAL RAMIREZ JULIO CESAR	$1.500.000
CC-88284792	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	JACOME CLARO LIBARDO JAIR	$2.600.000
CC-1091664955	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	NAVARRO PEÑARANDA TATIANA CAROLINA	$3.200.000
CC-1091659204	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	OSORIO MOLINA CRISTIAN CAMILO	$2.600.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1091673979	X	2025-10-23																														
CC - 88285864																													0			
CC - 1098738355	X	2025-10-29																											0			
CC - 91277749																													0			
CC - 88284792																													0			
CC - 1091664955																													0			
CC - 1091659204	X	2025-10-04																											0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1091673979	PORVENIR	8	$1.013.334	0.1600000	$162.200	$0	$0	$162.200	$0	$0	$0
CC - 88285864	PORVENIR	30	$3.600.000	0.1600000	$576.000	$0	$0	$576.000	$0	$0	$0
CC - 1098738355	COLFONDOS	2	$166.667	0.1600000	$26.700	$0	$0	$26.700	$0	$0	$0
CC - 91277749	COLPENSIONES	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 88284792	PORVENIR	30	$2.600.000	0.1600000	$416.000	$0	$0	$416.000	$0	$0	$0
CC - 1091664955	PORVENIR	30	$3.200.000	0.1600000	$512.000	$0	$0	$512.000	$0	$0	$0
CC - 1091659204	PORVENIR	27	$2.340.000	0.1600000	$374.400	$0	$0	$374.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1091673979	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$1.013.334	0.0400000	$40.600	$0	0	$0	0	$0	8	$1.013.334	1	0.0696000	$70.600
CC - 88285864	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.600.000	0.0400000	$144.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.600.000	1	0.0696000	$250.600
CC - 1098738355	SALUD MIA EPS	2	$166.667	0.0400000	$6.700	$0	0	$0	0	$0	2	$166.667	1	0.0696000	$11.700
CC - 91277749	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	1	0.0696000	$104.400
CC - 88284792	SANITAS	30	$2.600.000	0.0400000	$104.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.600.000	1	0.0696000	$181.000
CC - 1091664955	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.200.000	0.0400000	$128.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.200.000	1	0.0696000	$222.800
CC - 1091659204	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$2.340.000	0.0400000	$93.600	$0	0	$0	0	$0	27	$2.340.000	1	0.0696000	$162.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1091673979	COMFANORTE	8	$1.013.334	0.0400000	$40.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88285864	COMFANORTE	30	$3.600.000	0.0400000	$144.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098738355	COMFANORTE	2	$166.667	0.0400000	$6.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91277749	COMFANORTE	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88284792	COMFANORTE	30	$2.600.000	0.0400000	$104.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091664955	COMFANORTE	30	$3.200.000	0.0400000	$128.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091659204	COMFANORTE	27	$2.340.000	0.0400000	$93.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$2.040.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.040.600
COLFONDOS	1	$26.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$26.700
COLPENSIONES	1	$240.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$240.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD MIA EPS	1	$6.700	$0	0	$0	0	$0	$6.700	0	$0	$0	$6.700	$0	0	$0	$0	$6.700	$0	$0	$6.700
SANITAS	1	$104.000	$0	0	$0	0	$0	$104.000	0	$0	$0	$104.000	$0	0	$0	$0	$104.000	$0	$0	$104.000
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$466.200	$0	0	$0	0	$0	$466.200	0	$0	$0	$466.200	$0	0	$0	$0	$466.200	$0	$0	$466.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	$1.004.000	0	$0	$0	$1.004.000	0	$0	$1.004.000	0	$0	$0	$1.004.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	7	$576.900	0	$0	$576.900
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0


TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$576.900
PENSIONES	3	$2.307.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.004.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$576.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.465.100

Anexo N° 11 Registro fotográfico del estado o avance de las obras.


REGISTRO FOTOGRAFICO QUEBRADA EL TEJAR



Localización y Replanteo

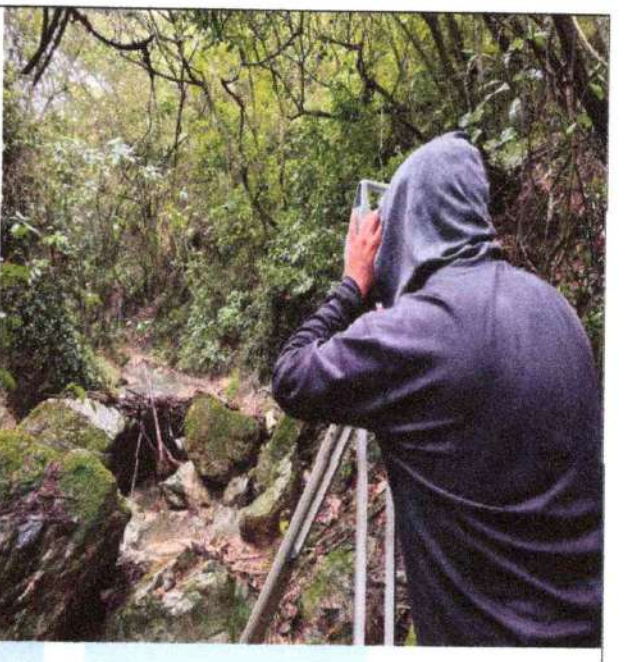


Localización y Replanteo

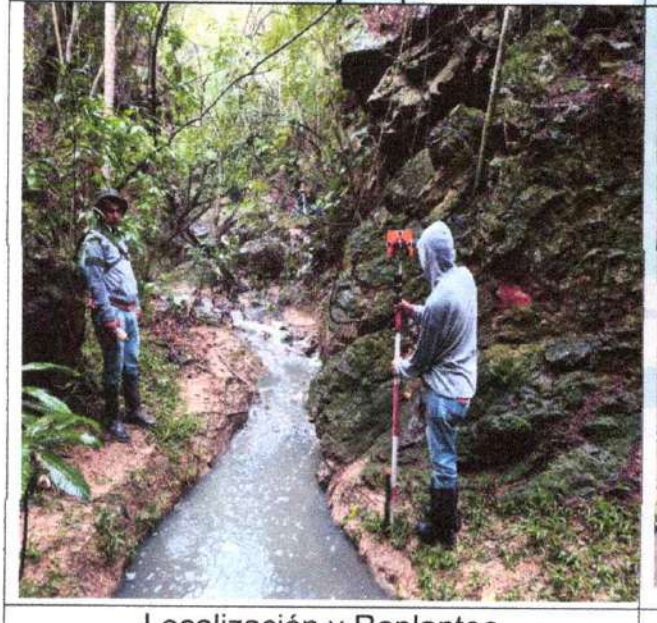


Localización y Replanteo



Localización y Replanteo

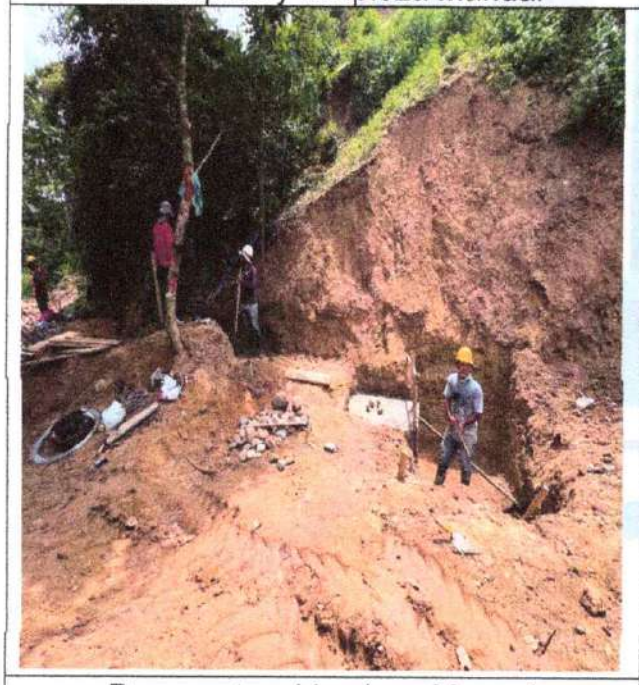
	
Descapote y Limpieza Manual	Descapote y Limpieza Manual
	
Descapote y Limpieza Manual	Descapote y Limpieza Manual

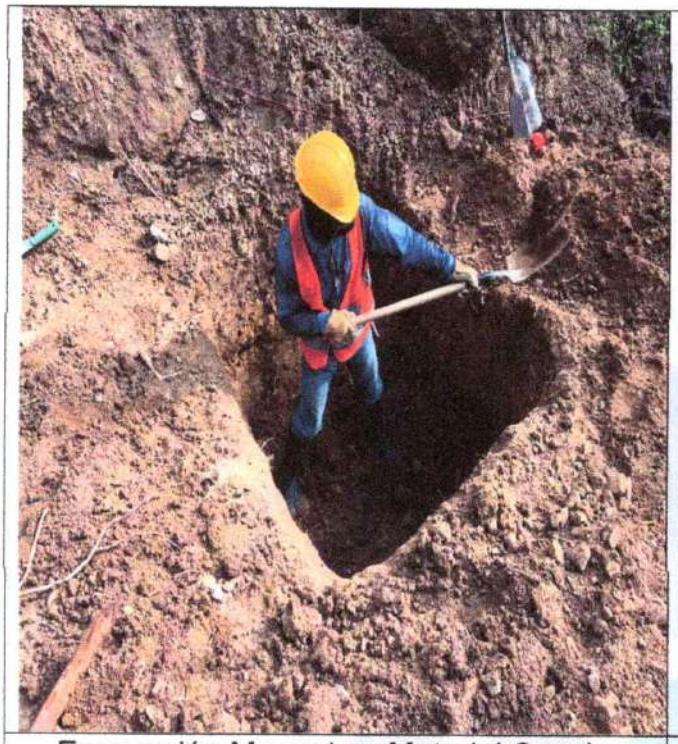

Excavación Manual en Material Común




Excavación Manual en Material Común

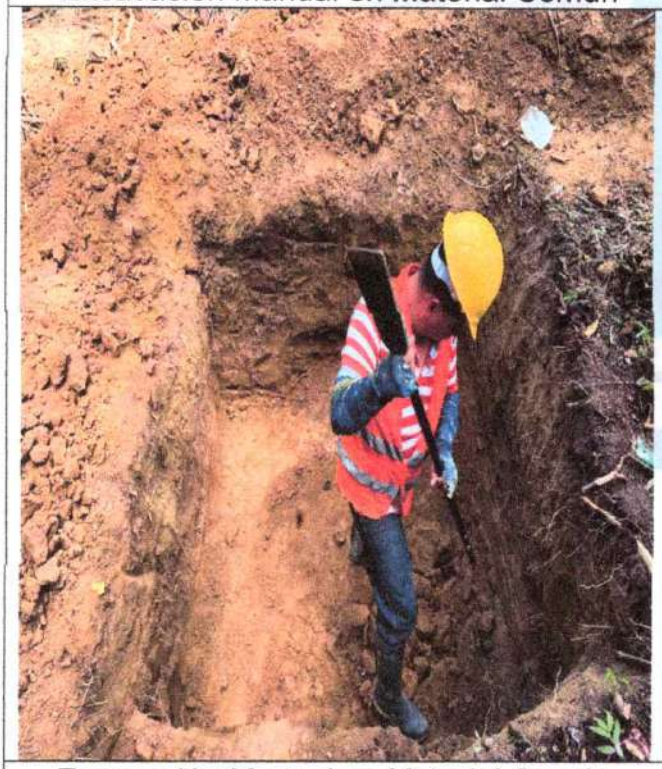


Excavación Manual en Material Común




Excavación Manual en Material Común

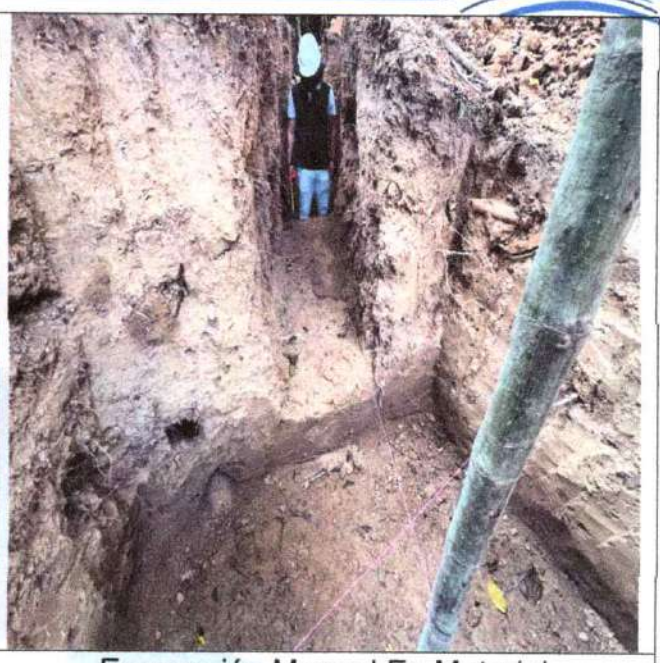
	
Excavación Manual En Material Conglomerado	Excavación Manual En Material Conglomerado
	
Excavación Manual En Material Conglomerado	Excavación Manual En Material Conglomerado

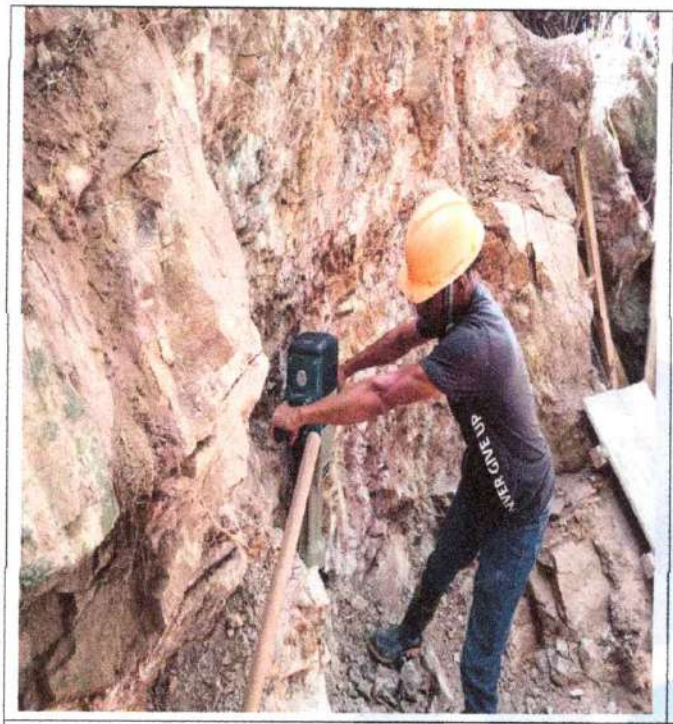


Excavación Mecánica En Roca

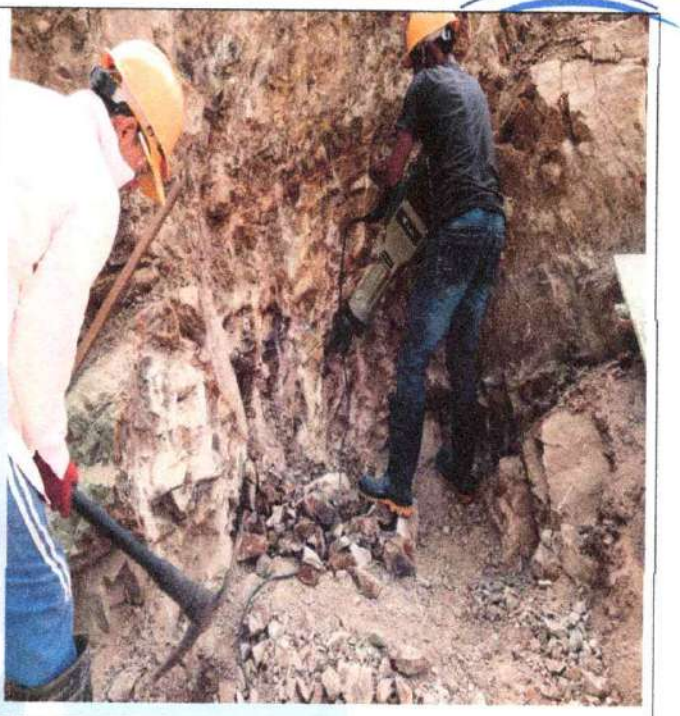




Excavación Mecánica En Roca

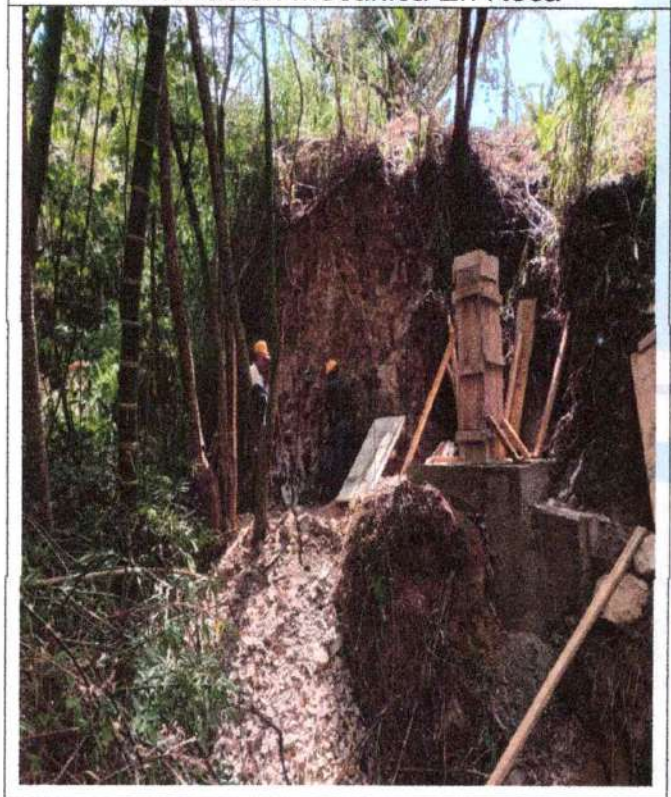

Excavación Mecánica En Roca

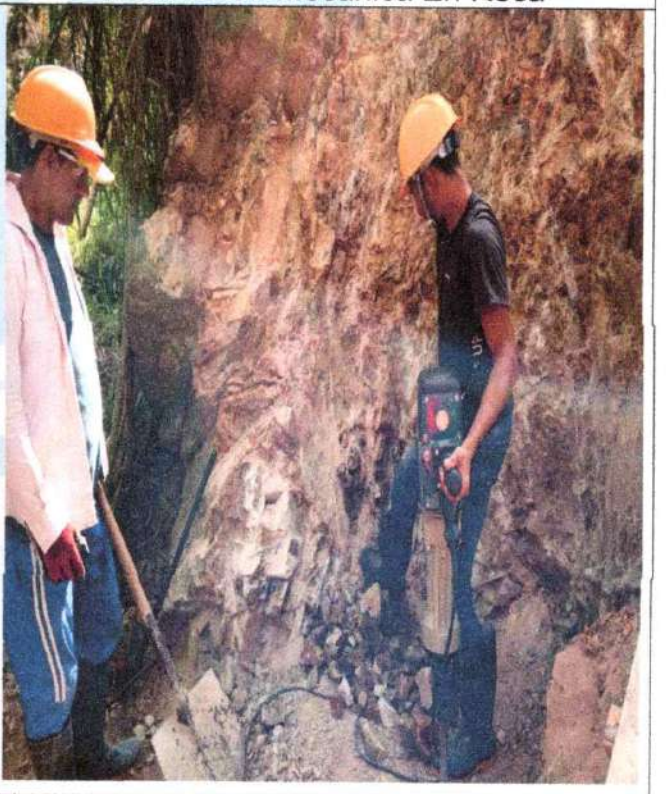

Excavación Mecánica En Roca

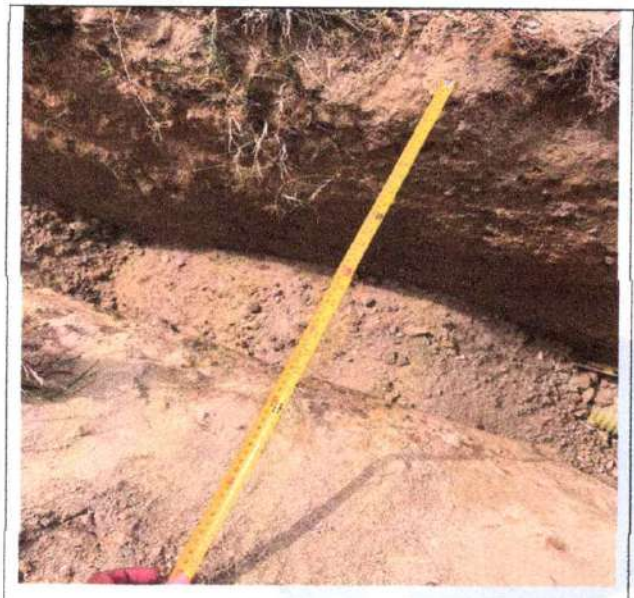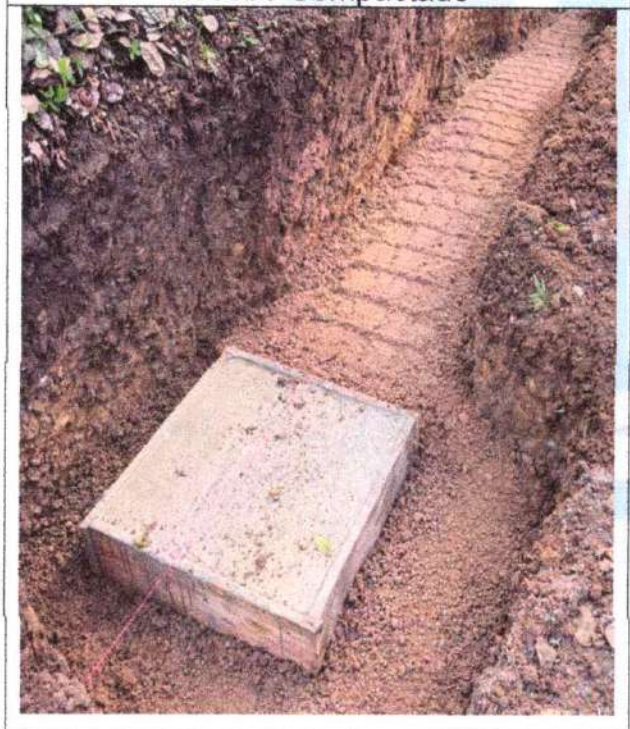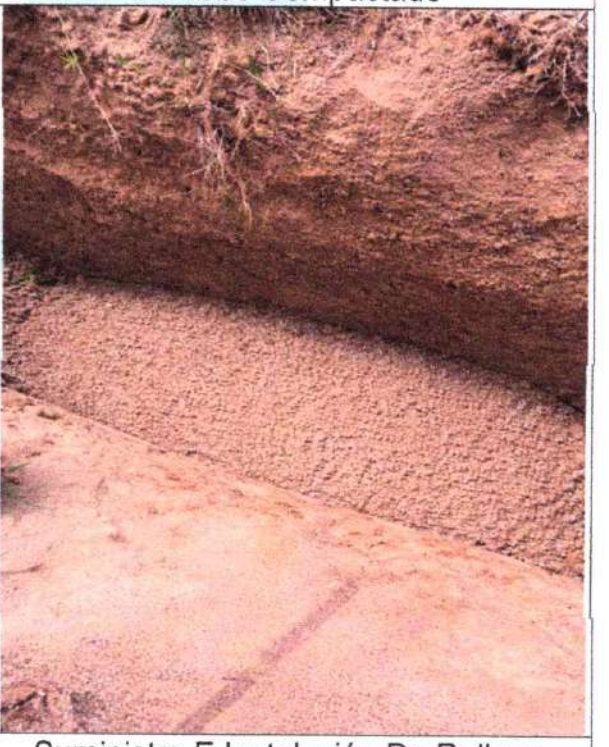	
Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado	Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado
	
Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado	Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado



Suministro E Instalación Tubería Sanitaria Pvc D=10"



Suministro E instalación Tubería Sanitaria Pvc D=10"



Suministro E instalación Tubería Sanitaria Pvc D=10"




Suministro E instalación Tubería Sanitaria Pvc D=10"



Suministro E instalación Tubería Sanitaria Pvc D=10"



Suministro E instalación Tubería Sanitaria Pvc D=10"

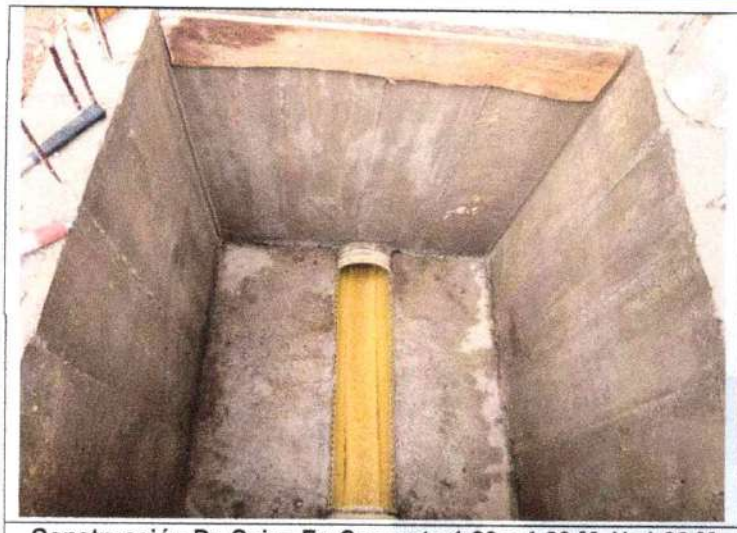


Construcción De Cajas En Concreto 1,20 x 1,20 M, H<1,00 M




Construcción De Cajas En Concreto 1,20 x 1,20 M, H<1,00 M



Construcción De Cajas En Concreto 1,20 x 1,20 M, H<1,00 M

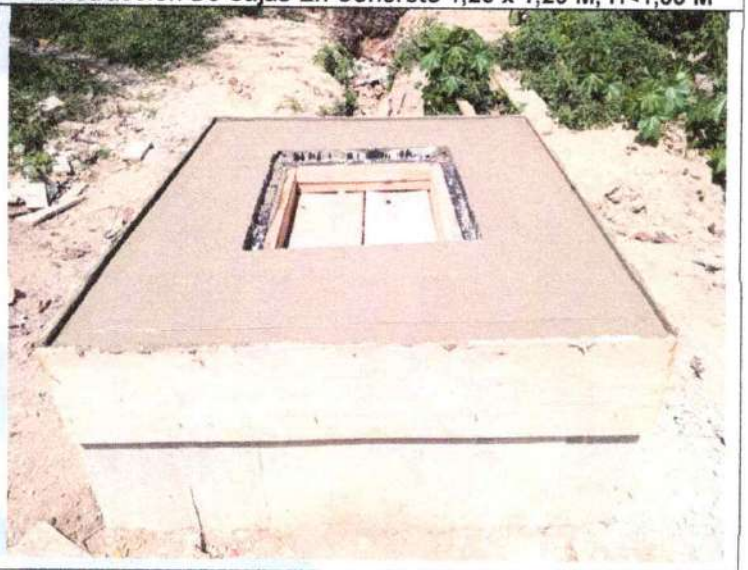

Construcción De Cajas En Concreto 1,20 x 1,20 M, H<1,00 M

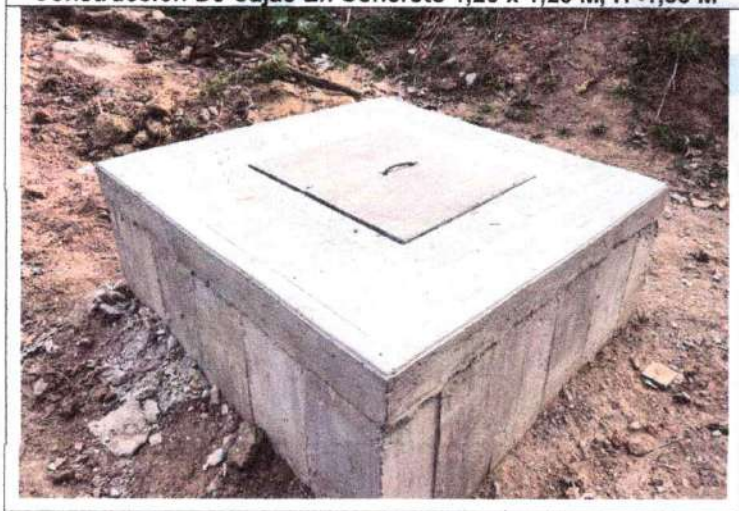

Construcción De Cajas En Concreto 1,20 x 1,20 M, H<1,00 M



Construcción De Cajas En Concreto 1,20 x 1,20 M, H<1,00 M



Viga Aérea En Concreto 0,50 x 0,50 M



Viga Aérea En Concreto 0,50 x 0,50 M



Viga Aérea En Concreto 0,50 x 0,50 M




Viga Aérea En Concreto 0,50 x 0,50 M





Viga Aérea En Concreto 0,50 x 0,50 M



Viga Aérea En Concreto 0,50 x 0,50 M

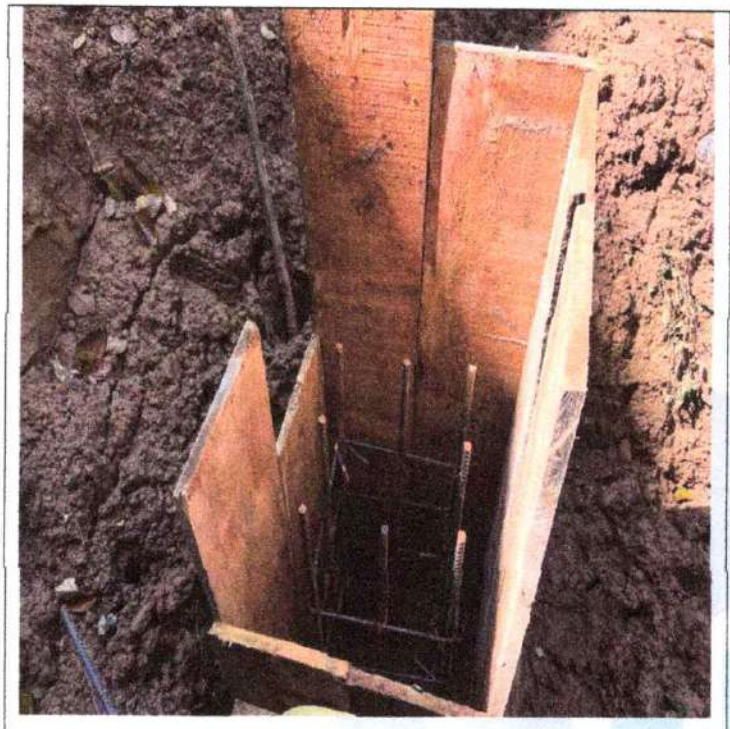	
Columna En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI)	Columna En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI)
	
Columna En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI)	Columna En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI)

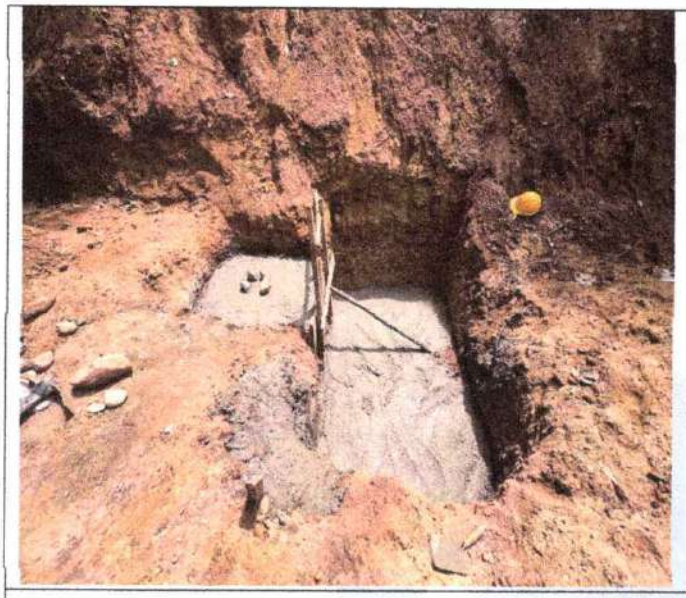	
Concreto Simple Resist. 14 Mpa (2000 PSI)	Concreto Simple Resist. 14 Mpa (2000 PSI)
	
Concreto Simple Resist. 14 Mpa (2000 PSI)	Concreto Simple Resist. 14 Mpa (2000 PSI)

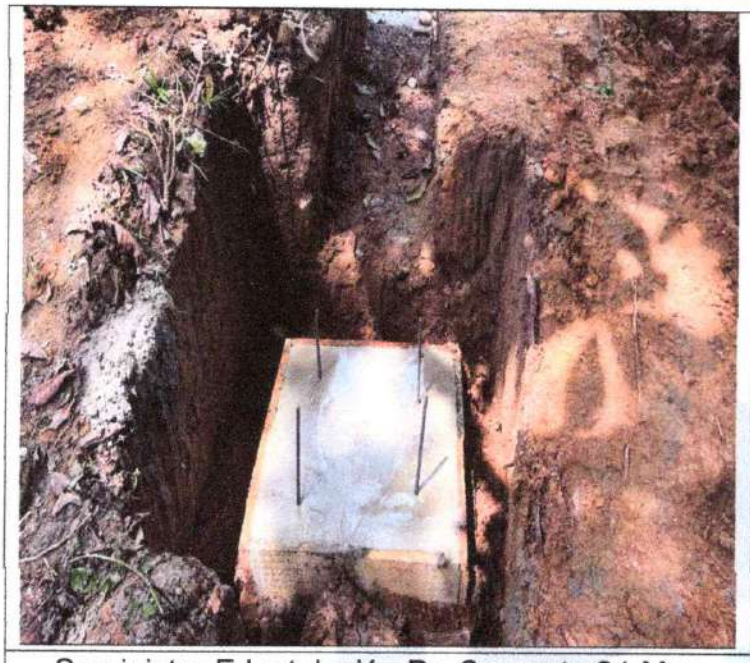	
Suministro E Instalación De Concreto 21 Mpa (3000 PSI)	Suministro E Instalación De Concreto 21 Mpa (3000 PSI)
	
Suministro E Instalación De Concreto 21 Mpa (3000 PSI)	Suministro E Instalación De Concreto 21 Mpa (3000 PSI)



Revestimiento Para Tubería En Concreto



Revestimiento Para Tubería En Concreto



Revestimiento Para Tubería En Concreto





Revestimiento Para Tubería En Concreto



Revestimiento Para Tubería En Concreto



Revestimiento Para Tubería En Concreto

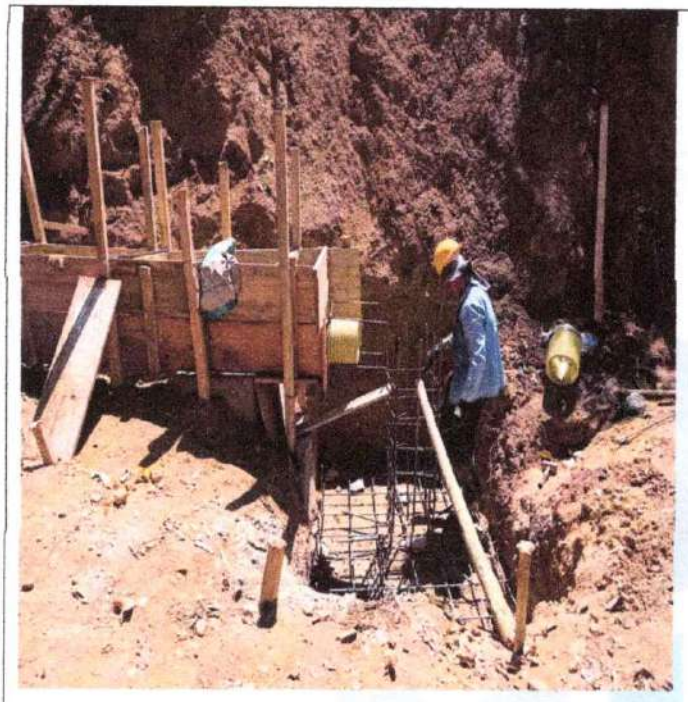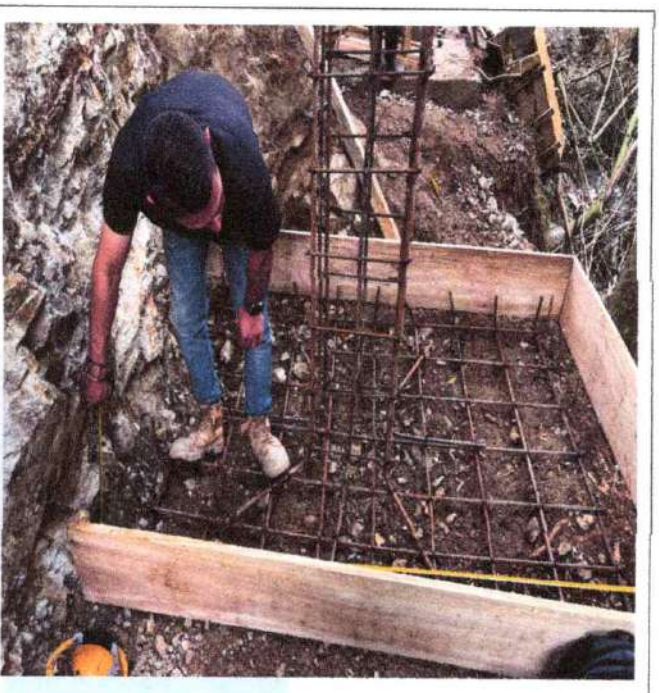	
Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 1 (130x150x30)	Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 1 (130x150x30)
	
Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 1 (130x150x30)	Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 1 (130x150x30)


	
Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 2 (150x240x30)	Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 2 (150x240x30)
	
Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 2 (150x240x30)	Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 2 (150x240x30)



Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 3 (120x120x30)




Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 3 (120x120x30)

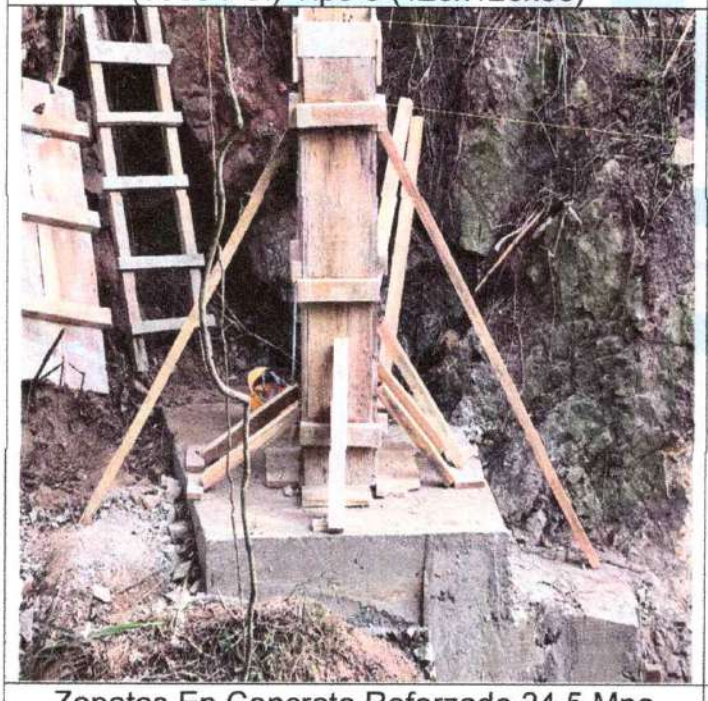

Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 3 (120x120x30)



Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 3 (120x120x30)

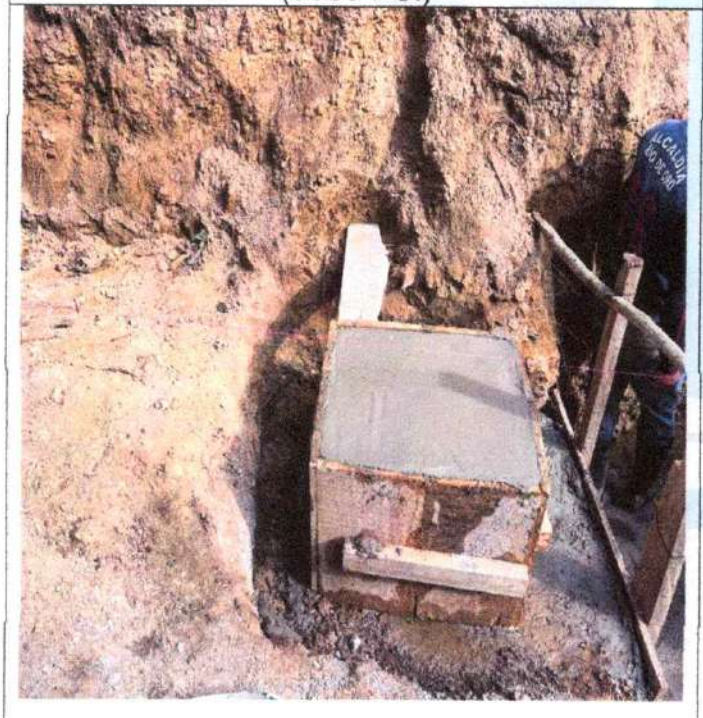	
Concreto Ciclopeo 60/40 En Concreto 21 Mpa (3000 PSI)	Concreto Ciclopeo 60/40 En Concreto 21 Mpa (3000 PSI)
	
Concreto Ciclopeo 60/40 En Concreto 21 Mpa (3000 PSI)	Concreto Ciclopeo 60/40 En Concreto 21 Mpa (3000 PSI)



Acero De Refuerzo De 60000 Psi



Acero De Refuerzo De 60000 Psi



Acero De Refuerzo De 60000 Psi



Acero De Refuerzo De 60000 Psi




Acero De Refuerzo De 60000 Psi



Acero De Refuerzo De 60000 Psi

	
Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Cajas En Concreto	Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Cajas En Concreto
	
Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Cajas En Concreto	Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Cajas En Concreto

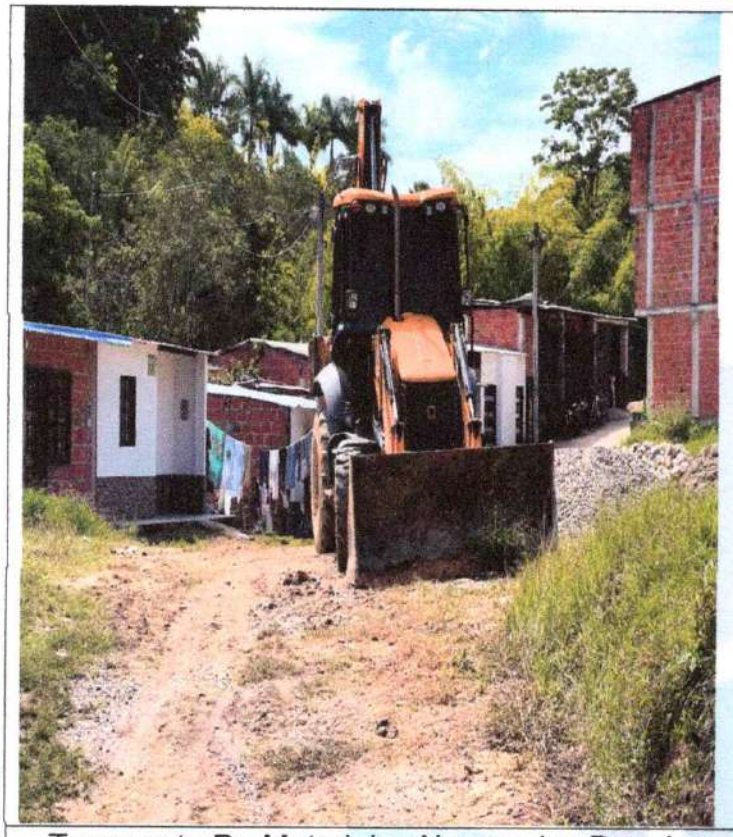

Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Viga Aerea



Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Viga Aerea




Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Viga Aerea



Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Viga Aerea

	
Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Concreto	Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Concreto
	
Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Concreto	Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Concreto

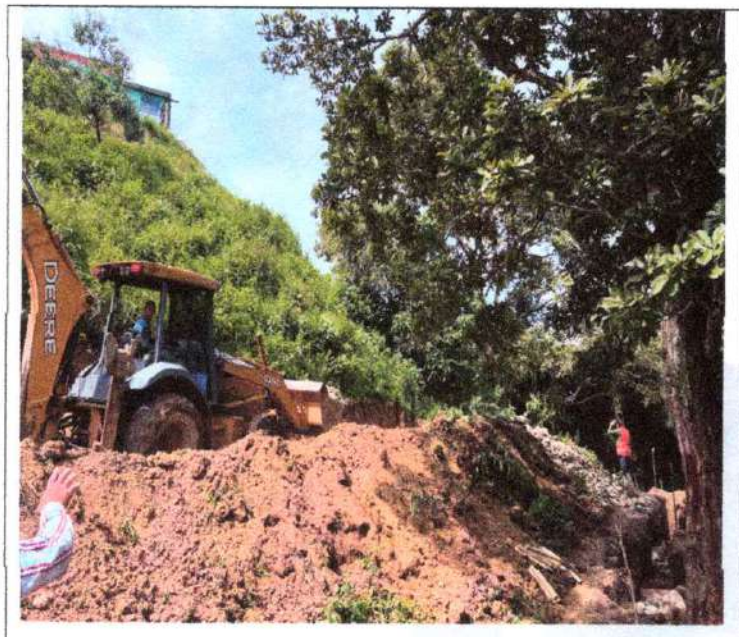

Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Revestimiento Para Tubería En Concreto



Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Revestimiento Para Tubería En Concreto




Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Revestimiento Para Tubería En Concreto



Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Revestimiento Para Tubería En Concreto




Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Ciclopeo

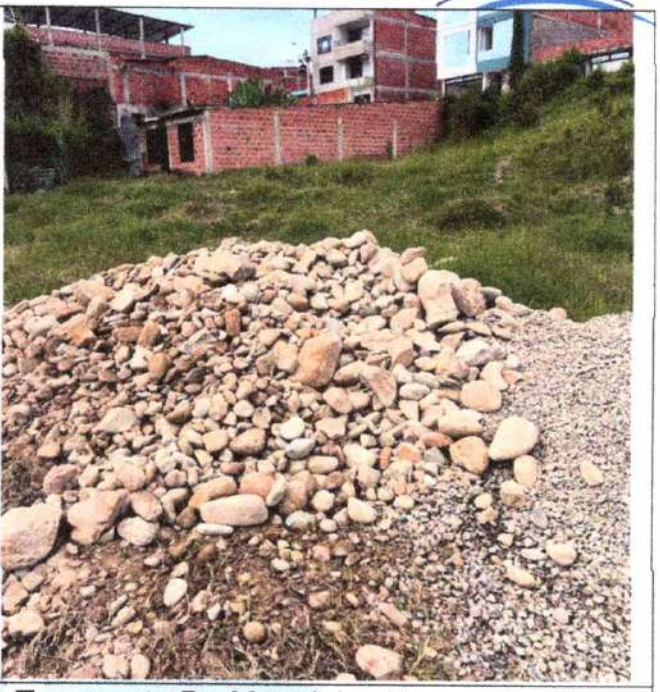

Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Ciclopeo





Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Ciclopeo

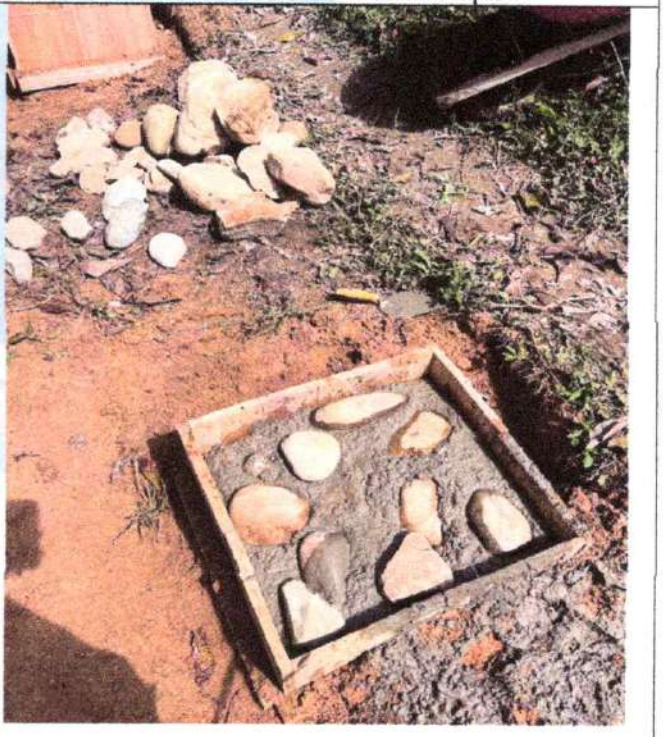




Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Ciclopeo


REGISTRO FOTOGRAFICO COLECTOR BELEN PARTE BAJA

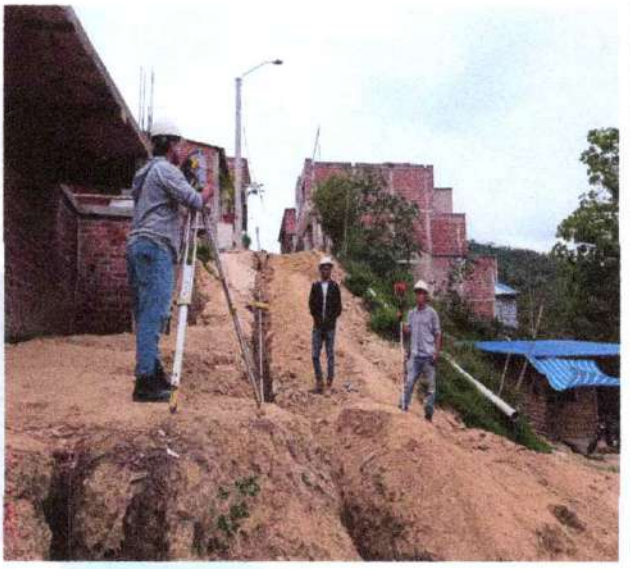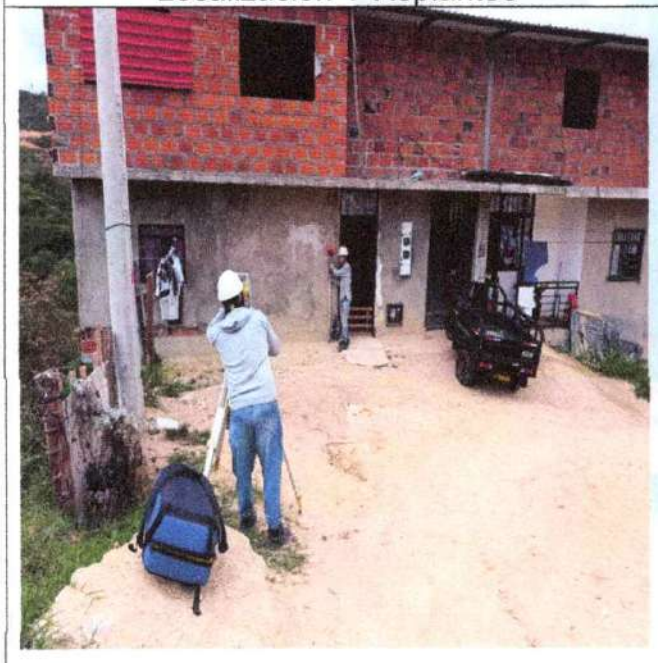	
Localización Y Replanteo	Localización Y Replanteo
	
Localización Y Replanteo	Localización Y Replanteo


	
Excavación Manual En Material Común	Excavación Manual En Material Común
	
Excavación Manual En Material Común	Excavación Manual En Material Común

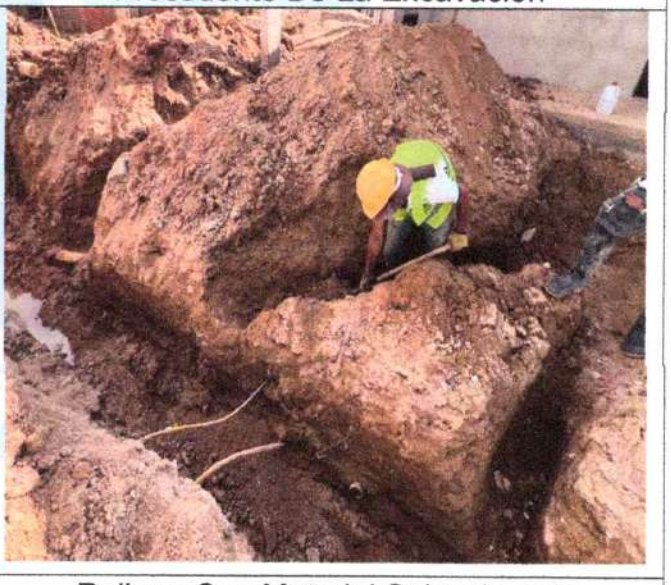	
Relleno Con Material Seleccionado Procedente De La Excavación	Relleno Con Material Seleccionado Procedente De La Excavación
	
Relleno Con Material Seleccionado Procedente De La Excavación	Relleno Con Material Seleccionado Procedente De La Excavación

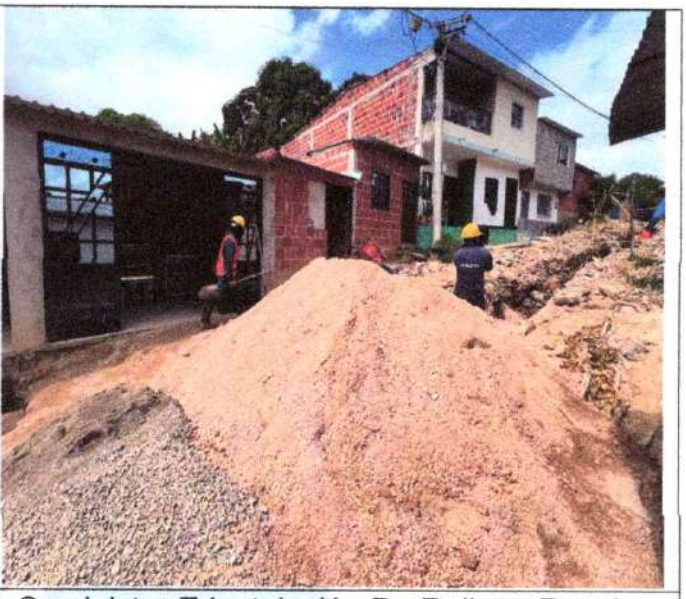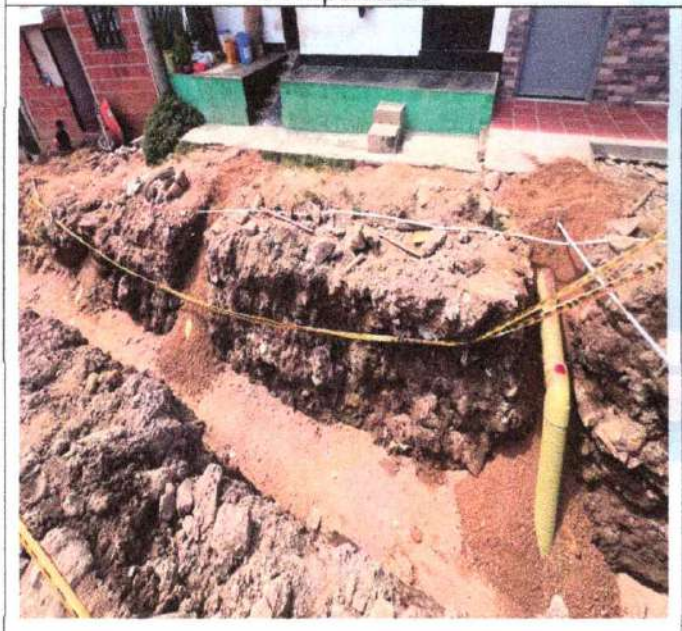	
Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado	Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado
	
Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado	Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado

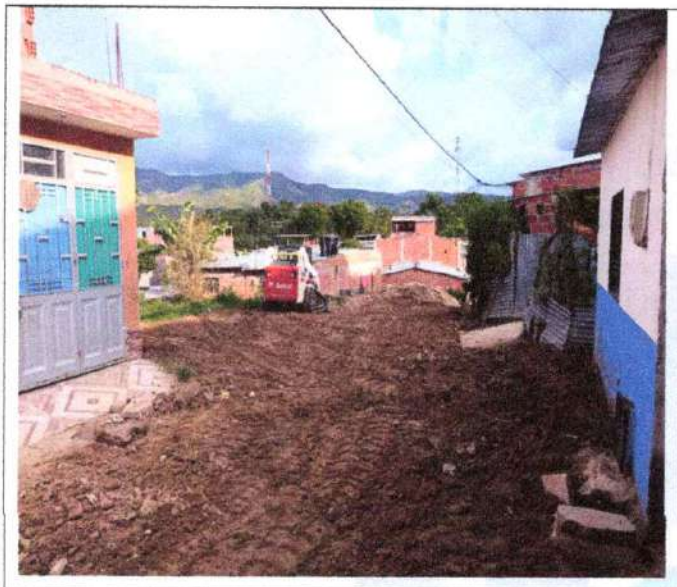	
Cargue Y Retiro Material Escombros	Cargue Y Retiro Material Escombros
	
Cargue Y Retiro Material Escombros	Cargue Y Retiro Material Escombros

	
Suministro E Instalacion Tubería Sanitaria Pvc D=8"	Suministro E Instalacion Tubería Sanitaria Pvc D=8"
	
Suministro E Instalacion Tubería Sanitaria Pvc D=8"	Suministro E Instalacion Tubería Sanitaria Pvc D=8"

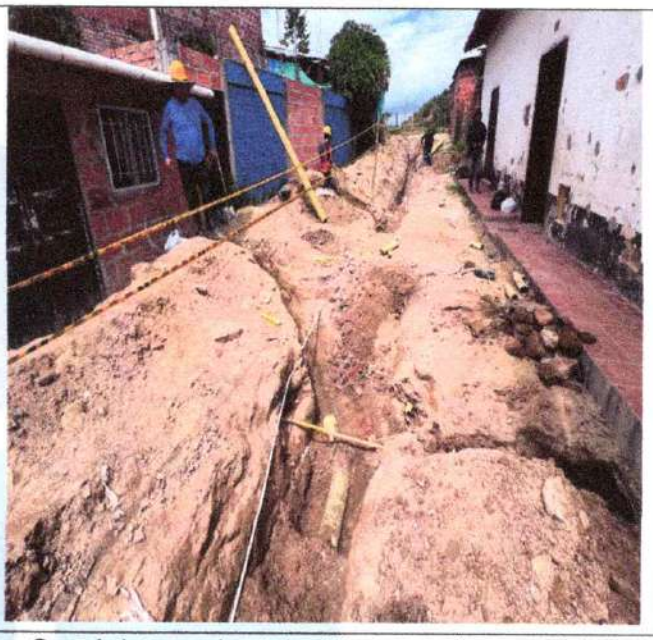
	
Suministro e instalación para Acometidas	Suministro e instalación para Acometidas
	
Suministro e instalación para Acometidas	Suministro e instalación para Acometidas




Cajas de inspección 0.6 X 0.6 X 0.6



Cajas de inspección 0.6 X 0.6 X 0.6

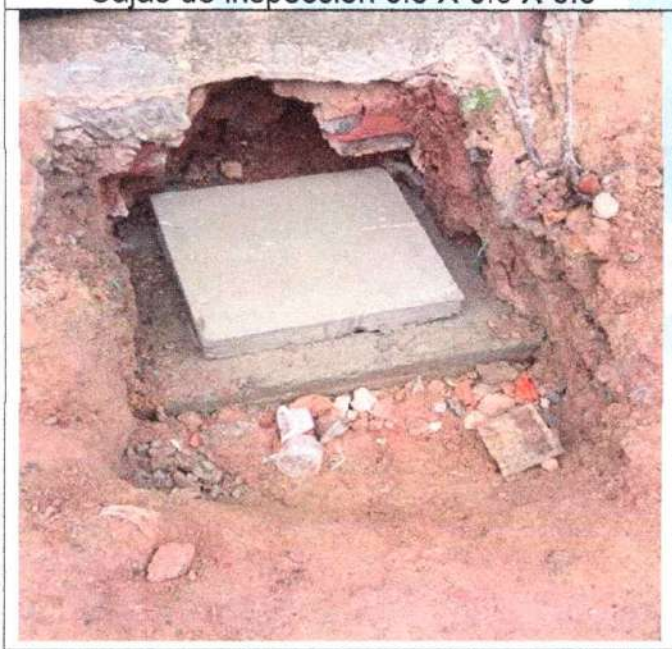


Cajas de inspección 0.6 X 0.6 X 0.6

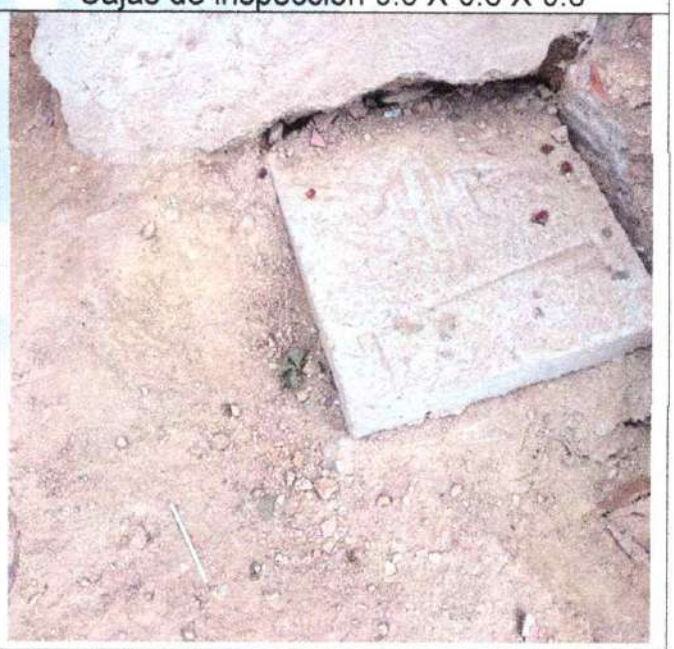

Cajas de inspección 0.6 X 0.6 X 0.6

	
Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,00 M Y 1,50 M	Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,00 M Y 1,50 M
	
Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,00 M Y 1,50 M	Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,00 M Y 1,50 M

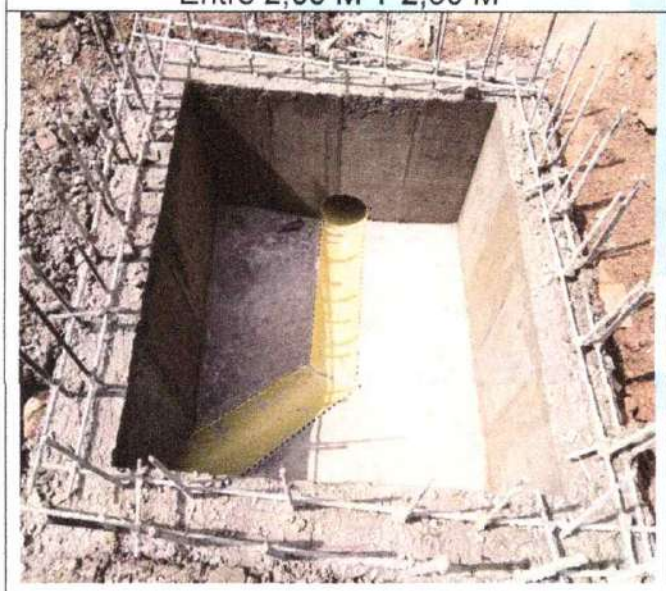	
Construcción De Cajas En Concreto Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 2,00 M Y 2,50 M	Construcción De Cajas En Concreto Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 2,00 M Y 2,50 M
	
Construcción De Cajas En Concreto Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 2,00 M Y 2,50 M	Construcción De Cajas En Concreto Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 2,00 M Y 2,50 M

Anexo N° 12 Copia Bitácora

BITACORA DE OBRA 15 DE OCTUBRE DEL 2025

Con apoyo de una cuadrilla de Topografía y una cuadrilla de ayudantes de obra, se inicia en este día la ejecución de las actividades de Localización y Replanteo, además de las actividades de Descapote y Limpieza manual, con el objetivo de obtener la información en campo por donde pasará la línea de la red de alcantarillado en 10", así mismo conocer la ubicación de cada una de las cajas de inspección, de cada uno de los apoyos tanto en concreto ciclopeo como apoyos tipo zapatas, los tramos en que la red de 10" irá recubierta y los tramos en que la red irá elevada. Estas actividades se ejecutan con el fin de dar inicio a las actividades de excavación manual y a las actividades de vaciado de concreto ciclopeo para los apoyos tipo 1 y tipo 2, en un tramo comprendido entre la caja de inspección 7 y la caja de inspección 8. donde inicia la viga con recubrimiento para la red de alcantarillado en 10". Se Presento lluvias en este día en la zona de trabajo.

Marcial Pallares Vacca
Ing. Residente de obra

Andrés Arciniegas G.
Ing. Residente de Interventoría

líder

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 16 DE OCTUBRE DEL 2025

Se Continua con la ejecución de las actividades de Localización y Replanteo con la cuadrilla de Topografía y con las actividades de Descapote y limpieza manual con una cuadrilla de obreros, con los cuales con ayuda de estacas de madera se dio inicio a la toma de niveles de la red de alcantarillado en 10". así como la ubicación exacta de cada caja de inspección, esto con el Fin de dar inicio con las actividades de excavación manual.

Marcial Pallares Vacca — Ing. Residente de obra.

Andrés Arcinegas G. — Ing. Residente de Interventoría

líder=

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 17 DE OCTUBRE DEL 2025.

Teniendo para este día los niveles de un tramo de la línea de la red de alcantarillado en 10" y la ubicación exacta tanto de los apoyos en concreto ciclopeo como de las cajas de inspección en dicho tramo, se da inicio en este día con la ejecución de las actividades de excavación manual para la construcción de la viga con recubrimiento en el tramo comprendido entre el pozo o caja de inspección 7 y la caja de inspección 8.
Con estacas de madera se ubican los apoyos tipo 1 y tipo 2 en concreto ciclopeo comprendidos en el tramo antes mencionado, se hace la demarcación de cada uno y con ayuda de una cuadrilla de ayudantes de obra se inicia la excavación manual.
De igual manera se avanza con la cuadrilla de Topografía en las actividades de Localización y Replanteo de la Red, Así mismo, con una cuadrilla de Ayudantes de obra se continua con la actividad de Descapote y Limpieza manual del área indicada por el personal de Topografía.

Marcial Pallares Vacca.
Ing. Residente de obra.

Andrés Arciniegas G.
Ing. Residente de Interventoría

líder=

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 18 DE OCTUBRE DEL 2025.

Se continua en este dia la ejecución de las actividades de Excavación manual con apoyo de una cuadrilla de Ayudantes de obra, para los apoyos tipo 1 y Tipo 2 en concreto ciclopeo para el tramo comprendido entre la caja de inspección 7 y Caja de inspección 8.

Marcial Pallares Vacca. — Ing. Residente de obra.

Andrés Arcinlegas G. — Ing. Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 20 DE OCTUBRE DEL 2025.

Se inicia esta semana de actividades con la continuidad en las actividades de Excavación manual en el tramo comprendido entre las cajas de inspección 7 y 8 con la cuadrilla de ayudantes de obra. Con apoyo del maestro de obra se demarcan entre la caja de inspección 8 y caja de inspección 9, los apoyos tipo 1 y Tipo 2 que estan comprendidos en este tramo y con otra cuadrilla de Ayudantes de obra, se inicia la Excavación de los mismos.
Debido a las lluvias presentadas sobre horas de la tarde en la zona de trabajo, toco suspender la ejecución de las actividades a desarrollar entre las 4:30 pm a las 4:30 pm. Cabe mencionar, que por estas condiciones climaticas presentadas en la zona de trabajo, el acceso hacia el área de trabajo se torna difícil por las condiciones de saturación del terreno, lo cual ocasiona atrasos en el avance de la obra.

Marcial Pallares Vacca.
Ing Residente de obra.

Andrés Arciniegas G
Ing. Residente de Interventoria

líder

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 21 DE OCTUBRE DEL 2025

Seguimos avanzando con las actividades de excavación manual con una cuadrilla de obreros en el tramo comprendido entre la caja de inspección 7 y caja de inspección 9, de los apoyos tipo 1 y tipo 2, asi mismo la excavación para la viga con recubrimiento. se recibe en obra materiales para iniciar con las actividades de Concretos y se hace su respectivo acopio.
Con apoyo de la maquinaria amarilla tipo pajarita continuamos acomodando la via de acceso, ya que cada vez que se presentan lluvias las condiciones del terreno se ven afectadas para el buen transito de la misma y asi poder trasegar material. por tal motivo se dube remover el material saturado, acopiarlo en un lugar apropiado para que la maquina haga su recorrido libremente y por último traer material seco y acondicionar la via de acceso. Actividad no incluida en el proyecto.

Marcial Pallares Vacca.
Ing. Residente de obra.

Andrés Arcinegas G
Ing Residente de Interventoría

líder=

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 22 DE OCTUBRE DEL 2025.

Con la vía de acceso en óptimas condiciones en este día gracias a las condiciones climáticas, con ayuda de la maquinaria amarilla tipo Pasaita o Retrocargador se inicia el trasiego del material necesario para las actividades de Concretos en un punto de acopio dentro de la obra. Con una cuadrilla de obreros y el Maestro se continua la actividad de excavación manual para los apoyos en ciclopeo tipo 1 y tipo 2 en el tramo de trabajo.

Se inicia la actividad de suministro e instalación de acero de refuerzo para los apoyos en concreto ciclopeo, con el Maestro de obra y una cuadrilla de obreros se procede a realizar el corte y figurado de las parrillas, ya que cada uno de estos apoyos debe llevar una de estas en acero de 3/8".

Debido a lloviznas constantes en horas de la mañana en este día, nos vimos en la tarea de sacar la maquinaria de la obra por las condiciones del terreno y suspender las actividades de trasiego de material, lo cual provoca atrasos en el avance de las actividades programadas para este día.

Marcial Pallares Vacca. Andres Arciniegas G
Ing. Residente de obra. Ing. Residente de Interventoría

líder=

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 23 DE OCTUBRE DEL 2025

Por motivo de las lluvias presentadas el día anterior en horas de la mañana, con la maquinaria amarilla tipo retrocargador se inicia de nuevo a acondicionar la vía de acceso para continuar con el trasiego de material a los puntos de acopio dentro de la zona de trabajo. Con una cuadrilla de obreros y un maestro de obra, iniciamos la actividad de instalación de acero en cada uno de los apoyos, así como el vaciado de concreto ciclopeo de los mismos. De igual manera se inicia con la ejecución de la actividad Mejoramiento con pedraplén para las cajas de inspección, en este día teniendo la excavación de la caja de inspección 7 y la caja de inspección 8 se procede a construir el pedraplén. Se logró observar en campo que para la mayoría de las cajas de inspección que llevan este mejoramiento por las condiciones del terreno, puede que no cumplan con la capacidad de soporte de la estructura, por tal motivo se evaluará la posibilidad de cambiar esta actividad por un mejoramiento en concreto ciclopeo que garantice soporte de las cajas de inspección y de toda la estructura del proyecto.

Marcial Pallares Vasca.
Ing. Residente de obra.

Andrés Arcila Legarda
Ing. Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 24 DE OCTUBRE DEL 2025.

Para el avance de las obras, en este dia se continua con la actividad de trasiego de material para la elaboración de concretos con ayuda de la maquinaria amarilla tipo retrocargador. Teniendo los apoyos en ciclopeo tipo 1 y tipo 2 del tramo comprendido entre las cajas de inspección 7 y 8 ya Fundidos, se procede en este dia con una cuadrilla de obreros y un Maestro, a construir o conformar la Formaleta de madera o el cajón para hacer el vaciado en concreto de la viga reenbierta del tramo en mención. Con otra cuadrilla de Ayudantes de obra y un Maestro se inicia a Figurar las estructuras en acero de 3/8" que conformarán la viga reenbierto.
Seguidamente, con una cuadrilla de obreros y el Oficial de obra se continua la demarcación y excavación de apoyos en concreto ciclopeo y de apoyos tipo zapata, esta vez, en un tramo comprendido entre las cajas de inspección 14 y 15. Tramo en el cual se observa un material rocoso para la excavación.

Marcial Pallares Vacca.
Ing. Residente de obra.

Andres Arciniegas G
Ing Residente de Interventoria

líder=

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 25 DE OCTUBRE DEL 2025.

Teniendo la estructura de Acero para la construcción de la viga recubierta, la tubería de alcantarillado en 10" en campo, así como el cajón o Formaleta en madera listos, con las cuadrillas de obreros y los maestros de obra se inicia con la ejecución de la actividad viga con recubrimiento en el tramo de la caja de inspección 7 a la caja de inspección 8. Esta Actividad consiste en hacer el recubrimiento de la tubería de alcantarillado en 10" con una viga en concreto reforzado para evitar afectaciones en esta por distintos motivos y se garantice la calidad de las obras. Teniendo la estructura de Acero dentro del cajón de madera, se procede a inserta la tubería de 10", la cual va recubierta por un Polietileno negro, material no incluido en el presupuesto del proyecto; teniendo todo listo se procede a hacer el vaciado de la viga con concreto elaborado con la dosificación especificada en los documentos técnicos del proyecto.

Marcial Pallares Vacca. Andrés Arciniegas G
Ing. Residente de obra Ing. Residente de Interventoría

líder=

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 27 DE OCTUBRE DEL 2025.

Iniciamos esta semana de actividades, con la continuidad en las actividades de excavación manual entre las cajas de inspección 14 y 15. Con una cuadrilla de ayudantes de obra y el Maestro se procede a continuar de marcando los apoyos en este tramo y excavando el material rocoso encontrado en él. De igual manera, con otra cuadrilla de obreros y el oficial de obra se inicia el vaciado de concreto ciclopeo para apoyos tipo 1 y tipo 2 en el tramo comprendido entre las cajas de inspección 8 y 9. Con ayuda de un Maestro de obra se continua demarcando la linea de la red y en este dia los apoyos tipo zapatas ubicados en las cajas de inspección 10 y 11; con una cuadrilla de obreros se procede a iniciar la excavación de estos apoyos, actividad en la cual se hace presente el nivel Freatico de la quebrada, ademas de las aguas negras que por el circulan, ocasionando un atraso en la ejecución de estas actividades de excavación. se realiza también, la instalación del solado para unos apoyos tipo zapata en el tramo antes mencionado con una cuadrilla de ayudantes de obra.
Con la maquinaria se continua el trasiego de materiales para la elaboración de concretos.
Se realiza el recorrido de localización con acompañamiento del Maestro de obra en el sector del Barrio Belén donde se hará la instalación de la red de alcantarillado en 8" para iniciar las actividades.

Marcial Pallares Vacca.
Ing. Residente de obra.

Andrés Arcinegas G
Ing. Residente de Interventoría
líder

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 28 DE OCTUBRE DEL 2025.

Continuando con la ejecución de las actividades programadas en esta semana, para este día se continua con la excavación manual en material rocoso con una cuadrilla de obreros entre el tramo comprendido entre caja de inspección 14 y caja de inspección 16. Se continua de igual manera, la actividad de vaciado de concreto ciclopeo tipo 1 y tipo 2 entre las cajas de inspección 8 y 9, así como el solado de los apoyos tipo zapata restantes entre cajas de inspección 10 y 11, con su debida cuadrilla de obreros y un Maestro de obra.
Despues del Recorrido de localización en una de las calles del Barrio Belén de la red de alcantarillado en 8" que se instalará, se inicia en este día con la excavación con ayuda de una cuadrilla de obreros de la red Principal en 8", así como la excavación manual con otra cuadrilla de obreros de las acometidas domiciliarias de cada una de las viviendas del sector.
se presento lluvias fuertes en horas de la tarde por más de 30 minutos en la zona de trabajo, por tal motivo se suspenden actividades y se presentan atrasos en las actividades programadas para el dia.
Por la profundidad de las excavaciones realizadas y para garantizar la seguridad del personal de obra, se procede a ejecutar la actividad de Entibado en la excavación, así mismo la actividad de señalizar bien la zona de trabajo para prevenir accidentes de los habitantes del barrio.

Marcial Pallares Vacca. — Ing. Residente de obra.

Andrés Arciniegas G — Ing. Residente de interventoria

líder=

BITACORA DE OBRA 29 DE OCTUBRE DEL 2025.

Para este dia con una cuadrilla de obreros se continua la excavación en material Rocoso en el tramo comprendido entre las cajas de inspección 14 y 16. Para el tramo comprendido entre cajas de inspección 8 y 9, teniendo los apoyos en concreto ciclopeo tipo 1 y tipo 2 listos, así como la estructura de acero y la tubería instalada; se procede con una cuadrilla de obreros y el oficial de obra el vaciado de la viga reenbierta para el tramo antes mencionado. De igual manera se hace la instalación del acero correspondiente para la zapata en la caja de inspección 9 y se realiza su correspondiente vaciado en concreto. Al termino del día no se pudo realizar el vaciado completo de la viga reenbierta, por lo cual queda un tramo para el siguiente dia. Se continua el trasiego de material con la maquinaria amarilla tipo retro cargador. Para la instalación de la red de alcantarillado en 8", con una cuadrilla de obreros y un Maestro de obra se continua la excavación manual de las acometidas domiciliarias así como la instalación de los accesorios y la tubería de 6" de las mismas, además de la instalación de la Red de alcantarillado en 8"; para la cual se hace la instalación de Relleno con recebo compactado para evitar afectaciones en la red por el contacto con otro tipo de material.

Marcial Pallares Vacca.
Ing. Residente de obra.

Andrés Acuelegas G.
Ing. Residente de Interventoria

lider

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 30 DE OCTUBRE DEL 2025.

Para este dia, con apoyo del oficial de obra y una cuadrilla de obreros se termina de Fundir la viga con recubrimiento ubicada en el tramo de la caja de inspección 8 a la caja de inspección 9. Con este mismo personal de obra, se hace el vaciado de concreto ciclopeo para los apoyos tipo 1 y tipo 2 asi como la instalación de la parrilla en acero de 7/8" para cada uno de ellos. De igual manera se hace la instalación de un solado reforzado con acero de 7/8" entre las cajas de inspección 15 y 16.
Los apoyos de ciclopeo vaciados el dia de hoy, se ubican entre las cajas de inspección 14 y 16.
Debido a las condiciones climáticas de la noche anterior, se vio imposible el ingreso de la maquinaria a la zona de trabajo de instalación de la Red de 10", por tal motivo se realizo el traslado manual de los materiales necesarios para terminar las actividades de concretos programadas para este dia, con una cuadrilla de obreros.
se avanzo en este dia en excavación manual para acometidas domiciliarias, con personal de obra y el Maestro se hizo la instalación de la tubería de 6" y de los accesorios para cada una de estas acometidas, y se avanzo de igual manera en la instalación de tubería de 8". Con esta misma cuadrilla de obreros antes de Finalizar la Jornada, se realizo relleno manual con material de Recebo para la tubería de 8", asi como el entibado de la excavación.

Marcial Pallares Vacca.
Ing. Residente de obra.

Andrés Arciniegas G
Ing. Residente de Interventoría

líderes

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 31 DE OCTUBRE DEL 2025.

Continuando en la ejecución de las obras para la instalación de la red de alcantarillado en 10", con un maestro de obra y una cuadrilla de obreros se realiza el corte y Figrado del acero para los apoyos tipo zapata así como el acero de las columnas que llevan cada una, ubicadas entre los cajas de inspección 9 a la 11. Con este mismo personal se logra en este dia el vaciado de concreto para 4 apoyos de los antes mencionados. Como en el dia anterior, por las condiciones climaticas de la noche anterior se hace dificil la entrada de la maquinaria a la zona de trabajo, por tal motivo se hace trasiego manual de materiales. Con una cuadrilla de Ayudantes de obra, se avanza en la excavación para la instalación de la red de alcantarillado en 8". Con otra cuadrilla de obreros y el Maestro se continua la instalación de la red de 8", así como la instalación de las acometidas domiciliarias y el Relleno manual con material de Recebo y material seleccionado de la Excavación. Continua de igual manera el entibado de la Excavación por precaución.

Marcial Pallares Vacca.
Ing. Residente de obra.

Andrés Arciniegas G
Ing. Residente de Interventoria

líder=

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Para este día con una cuadrilla de obreros y el OFICial de obra se termina la instalación del acero y el vaciado del concreto para los apoyos tipo zapata ubicados entre las cajas de inspección 10 y 11; así como la instalación de solado en 2 apoyos tipo zapata entre las cajas de inspección 14 y 15.
Con apoyo de una cuadrilla de obreros se continua la excavación para la instalación de la red de 8" y con otra cuadrilla de obreros apoyados por los maestros de obra se continua la instalación de esta tubería, así como la instalación de las acometidas domiciliarias.
Se toman muestras de concreto para los ensayos de laboratorio

Marcial Pallares Vaca. — Andrés Arciniegas G
Ing. Residente de obra. — Ing. Residente de Interventoría

lider =

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Con una cuadrilla de obreros y un maestro de obra, se inicia esta semana de actividades con la ejecución de las actividades de excavación manual para acometidas domiciliarias. De igual manera con otra cuadrilla de obreros y un Maestro se va haciendo la conexión a la red principal de 8" cada una de estas acometidas. Seguidamente con otra cuadrilla de obreros y el oficial de obra se continua el Relleno y compactación con material de Recebo y material seleccionado de la excavación.

Marcial Pallares Vacca.
Ing. Residente. de obra.

Andrés Arciniegas G.
Ing. Residente de Interventoría

líder=

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Para este día con ayuda de un Maestro de obra se inicia la demarcación de los apoyos en ciclopeo tipo 1 y tipo 2 así como de las cajas de inspección ubicadas entre la caja de inspección 35 y 37, con el Fin de iniciar las actividades de excavación manual con una cuadrilla de obreros. Seguidamente con la maquinaria amarilla tipo retrocargador se inicia de nuevo con la adecuación de la vía de acceso que se vio afectada en días anteriores por las lluvias, y que aprovechando el clima se realiza esta actividad para continuar con el trasiego de los materiales a los puntos de acopio. Al realizar esta actividad se puede observar que el terreno todavía es inestable para el paso de la maquina por tal motivo se evaluará el ingreso de otro tipo de maquina que nos ayude en esta actividad.
Se continua con la excavación de las acometidas Domiciliarias con una cuadrilla de obreros y un maestro para avanzar en la instalación de las mismas a la red principal de 8".

Marcial Pallares Vacca.
Ing. Residente de obra

Andrés Arcuriegas G.
Ing. Residente de interventoria.

líder

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Con la via de acceso en optimas condiciones, hace el ingreso el dia de hoy un mini cargador Bobcat, con el cual se hara las actividades del traslego o transporte de los materiales a la zona de trabajo y con la maquinaria amarilla tipo retrocargador.
Se continua la excavación para la instalación de la red de alcantarillado de 8", así mismo con una cuadrilla de obreros se continua la instalación de la red 8" y se inicia la construcción de las cajas de inspección domiciliarias.
Con otra cuadrilla de obreros se continua la excavación manual entre las cajas de inspección 35 y 37.
Con un Maestro de obra y otra cuadrilla de obreros, se inicia a realizar el encofrado de las columnas ubicadas entre las cajas de inspección 10 y 11. y su posterior vaciado de concreto con el mismo personal.

Marcial Pallares Vacca.
Ing. Residente de obra.

Andrés Arciniegas G.
Ing. Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Para este día, se continua la excavación manual para las cajas de inspección 10 y 11, con el mismo personal de obra posteriormente se instala el solado correspondiente para este tipo de apoyo, así como el vaciado de la columa donde se ubica la caja de inspección 9 y la columa ubicada entre las cajas de inspección 9 y 10. Seguidamente, se continua la excavación de los apoyos tipo 1 y tipo 2 en concreto ciclopeo entre las cajas de inspección 37 y 39 con una cuadrilla de obreros.
Para la instalación de la red de alcantarillado en 8", se continua la excavación con ayuda de una cuadrilla de Ayudantes de obra, así como la instalación de la tubería de 8" y de las acometidas domiciliarias. Con ayuda del mini Cargador bobcat, se trasega el material de Recebo para hacer el relleno y compactación manual de las excavaciones.

Marcial Pallares Vacca. Andrés Arciniegas G
Ing. Residente de obra. Ing. Residente de Interventoría

líder

BITACORA DE OBRA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Se termina en este día, las actividades de excavación manual con una cuadrilla de obreros un tramo ubicado entre las cajas de inspección 35 a la 39, con el mismo personal se inicia el trasiego de material necesario para la elaboración del concreto.
Se realiza un recorrido con personal de Topografía, para revisar los niveles de la llegada de la red de 10" al emisario Final.
Con una cuadrilla de obreros se avanza en la excavación manual y con el minicargador se continua el trasiego del material para el Relleno manual de la Excavación donde ya se instalo la tubería de 8" y con una cuadrilla de obreros y el Maestro se continua la excavación manual de las acometidas domiciliarias y la instalación de la red principal de 8".

Marcial Pallares Vacca. Andrés Arciniegas G
Ing. Residente. de obra. Ing. Residente de Interventoría

líder

BITACORA DE OBRA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Para terminar esta semana de actividades, se ejecuta la actividad de adecuación con ayuda de la maquinaria amarilla tipo retrocargador de un tramo comprendido entre el pozo inicial del proyecto hasta la caja de inspección 7. Con una cuadrilla de obreros y un Maestro de obra se inicia la actividad de vaciado de concreto ciclopeo para los apoyos tipo 1 y tipo 2 entre las cajas de inspección 35 a la 39.
Con otra cuadrilla de obreros y el Maestro se continua la excavación y la instalación de las acometidas domiciliarias en tubería de 6" y con ayuda del mini cargador bobcat se hace el relleno con material de recebo y material seleccionado de la excavación para su posterior compactación. Continuamos con la toma de muestras del concreto para los ensayos.

Marcial Pallaro Rocca. Andrés Arcinlegas G
Ing. Residente de obra. Ing. Residente de Interventoría

líder

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Se inicia esta semana de actividades, con la ejecución de la actividad de excavación manual para apoyos en ciclopeo tipo 1 ubicados en el tramo comprendido entre la caja de inspección 4 y la caja de inspección 6. Seguidamente a esto actividad se realiza la excavación manual para la instalación de acometidas domiciliarias en la red principal de alcantarillado en 8", asi mismo se continua la instalación de la red principal de alcantarillado y el manejo de los sobrantes de excavación para el mejoramiento de las vias intervenidas.
Se continua el vaciado de concreto ciclopeo para apoyos tipo 1 ubicados entre las cajas de inspección 35-39; asi como el corte, armado y la instalación del acero para cada uno de estos apoyos.
Cabe mencionar que se presentó sobre horas de la tarde en la zona de trabajo, fuertes lluvias que ocasionaron la suspensión de las actividades que se ejecutaban en el momento como el vaciado de concreto ciclopeo, asi como las actividades de excavación e instalación de acometidas domiciliarias en la red de alcantarillado de 8".

Marcial Pallares Vacca. . . Andrés Arcinegas G.
Ing. Residente de obra . . . Ing. Residente de Interventoria

líder

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Se continua en este dia con una cuadrilla de obreros la actividad de excavación manual, esta vez para los apoyos Zapatas tipo 1 y tipo 2 en el tramo comprendido entre las cajas de inspección 34 y 35. Esto con el Fin de avanzar en la actividad de viga aérea. Por otra parte, teniendo el tramo entre la caja de inspección 4 a la 6 listo con la excavación de los apoyos en ciclopeo tipo 1, con una cuadrilla de obreros y 1 maestro se procede a ejecutar la elaboración y el vaciado de concreto ciclopeo asi como la instalación del acero para cada uno de estos apoyos; seguidamente con este mismo personal, se ejecuta la actividad de suministro e instalación de concreto de 21 MPA para este tramo en mención, el cual consiste en un solado reforzado de 10 cm donde descansara la red de alcantarillado en 10°.
Para la red de 8" que se esta instalando, en este dia con una cuadrilla de obreros y un maestro se continua la instalación de acometidas domiciliarias, asi como el Relleno de las mismas con material de recibo compactado, asi como el manejo de los sobrantes de excavación.

Marcial Pallares Vacca. ... Andres Arcinieges G
Ing. Residente de obra. ... Ing. Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

En este dia continuamos con una cuadrilla de obreros y un maestro de obra, la excavación manual para los apoyos zapatas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. se Termina la excavación para los apoyos donde se ubicaran las cajas de inspección 34 y 35, de igual manera se terminan los apoyos intermedios ubicados en el tramo en mención y se inicia la excavación de los apoyos intermedios entre las cajas de inspección 33 y 34. De igual manera con otra cuadrilla de obreros y un maestro se pasan los niveles para iniciar con la excavación manual de los apoyos en concreto ciclopeo tipo 1 en el tramo comprendido entre las cajas de inspección 6 y 7. Seguidamente se continua con una cuadrilla de obreros y un maestro las actividades de Excavación manual, instalación de accesorios y tubería en 6", así como el Relleno con material de recebo compactado para las acometidas domiciliarias en la red principal de 8", ademas del manejo de los sobrantes de excavación.

Marcial Pallares Vacca.
Ing. Residente de obra.

Andrés Arciniegas G
Ing. Residente de Interventoría

lider

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Se inicia este día con la continuidad en las actividades de excavación manual, con una cuadrilla de obreros y un maestro se realizan las excavaciones para los apoyos zapatas ubicados entre las cajas de inspección 33 y 34, además de las excavaciones para los apoyos donde se ubicaron las cajas de inspección 32 y 33 De igual manera con otra cuadrilla de personal de obra y un maestro se termina la actividad de excavación manual para los apoyos en ciclopeo tipo 1 ubicados en el tramo de la caja de inspección 6 a la 7. Dejando listo este tramo para ejecutar las actividades de vaciado de concreto ciclopeo así como el suministro e instalación de concreto 21 MPA.
Se Continua en las vías del Barrio Belén parte baja con su respectiva cuadrilla de Ayudante y un maestro la excavación manual, la instalación de la tubería en 6" y de las acometidas, así como el Relleno con recebo compactado de las acometidas domiciliarias en la Red principal de alcantarillado en 8".

Manuel Pallares Vacca.
Ing. Residente. de obra.

Andrés Arciniegas G
Ing. Residente de Interventoría

lider

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Teniendo previamente formaleteado los apoyos en ciclopeo tipo 2 entre las cajas de inspección 35 a la 37, para este día se programa Fundir estos, con ayuda de una cuadrilla de obreros y un Maestro. De igual manera con esta misma cuadrilla, se realiza la actividad de concreto simple para la instación de solado en los apoyos tipo zapata donde se ubicaran las cajas de inspección 34 y 35 así como los apoyos intermedios en este tramo. Para la instalación de la red de alcantarillado en 8", se continua en este día la instalación de las acometidas domiciliarios en 6", así como con la instalación de recebo compactado para las mismas, y con el manejo de los sobrantes de excavación para el mejoramiento de la vía intervenida.

Marcial Pallares Vacca.
Ing. Residente de obra.

Andrés Arciniegas G
Ing. Residente de Interventoría

líder

Powered by CamScanner

Anexo N° 13 Informes Semanales

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
NIT: 890.501.102 - 2
Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 01

FECHA:	19/10/2025	**PERIODO:**	15/10/2025	AL	19/10/2025

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
INTERVENTOR:	BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA:	CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
No. DE CONTRATO:	SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528)
OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ALCANTARILLADO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA:	RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA
No. DE CONTRATO:	LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207)
OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA:	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

CONTROL DE PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA		CONTROL DEL PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Plazo Inicial:	3 meses	**Plazo Inicial:**	3 meses
Plazo Actualizado:	3 meses	**Plazo Actualizado:**	3 meses
Fecha de Inicio:	15/10/2025	**Fecha de Inicio:**	15/10/2025
Fecha de Vencimiento:	15/01/2026	**Fecha de Vencimiento:**	15/01/2026

CONTROL PRESUPUESTAL			CONTROL PRESUPUESTAL		
Valor inicial:	$	1.291.072.319,43	**Valor inicial:**	$	105.532.770,00
Adición en Valor No 1:	$	-	**Adición en Valor No 1:**	$	-
Valor con adición:	$	1.291.072.319,43	**Valor con adición:**	$	105.532.770,00
Valor acta No.1:	$	-	**Valor acta No. 1:**	$	-

PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA

Ayudantes		Oficiales		Supervisor		Ingenieros:	
T. Social		Operadores		Topógrafo		Cadenero:	

PERSONAL EMPLEADO POR LA INTERVENTORIA

Ingenieros _____ Secretaria _____ Apoyo tecnico residente _____

AVANCE SEMANAL DE LA OBRA

OBRA EJECUTADA

	INICIAL	ADICIÓN No 01		
Acumulado anterior	0,00%		$	-
Ejecutado en el periodo	0,28%		$	3.615.002,49
Acumulado actual	0,28%		$	3.615.002,49

OBRA PROGRAMADA

	INICIAL	ADICIÓN No 01		
Acumulado anterior	0,00%		$	-
Programado en el periodo	0,33%		$	4.260.538,65
Acumulado actual	0,33%		$	4.260.538,65

Diferencia	-0,05%	
Plazo actualizado	92,00	DIAS
Plazo transcurrido	4,00	DIAS

REPORTE DE ACCIDENTES (con o sin afectación de personas y/o medio ambiente):
NINGUNO.

SEÑALIZACION DE LA OBRA:	SI	NO
Valla informativa:		X
Vallas preventivas:		X
Postes, cintas y señales preventivas:		X

Alcaldía de Ocaña

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
NIT: 890.501.102 - 2
Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda

Busbanzá Ingeniería S.A.S

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 01

FECHA:	19/10/2025	PERIODO:	15/10/2025	AL	19/10/2025

COMENTARIOS GENERALES:

En esta semana se firmaron las Actas de Inicio de los contratos de obra e interventoría

Comienza el proceso de afiliciación para personal de obra, almacenamiento de materiales y disposición de equipo y maquinaria.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS QUEBRADA EL TEJAR



FOTO 2: LOALIZACION Y REPLANTEO OBRAS QUEBRADA EL TEJAR



FOTO 3: LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS QUEBRADA EL TEJAR



FOTO 4: LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS QUEBRADA EL TEJAR

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LOCALIZACION Y REPLANTEO QUEBRADA EL TEJAR	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL
LOCALIZACION Y REPLANTEO BELEN PARTE BAJA	EXCAVACIN MANUAL EN MATERIAL COMUN
	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO
	FIGURADO ACERO DE REFUERZO
	INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA BELEN PARTE BAJA


OBSERVACIONES

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
NIT: 890.501.102 - 2
Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 01

FECHA:	19/10/2025	PERIODO:	15/10/2025	AL	19/10/2025

BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

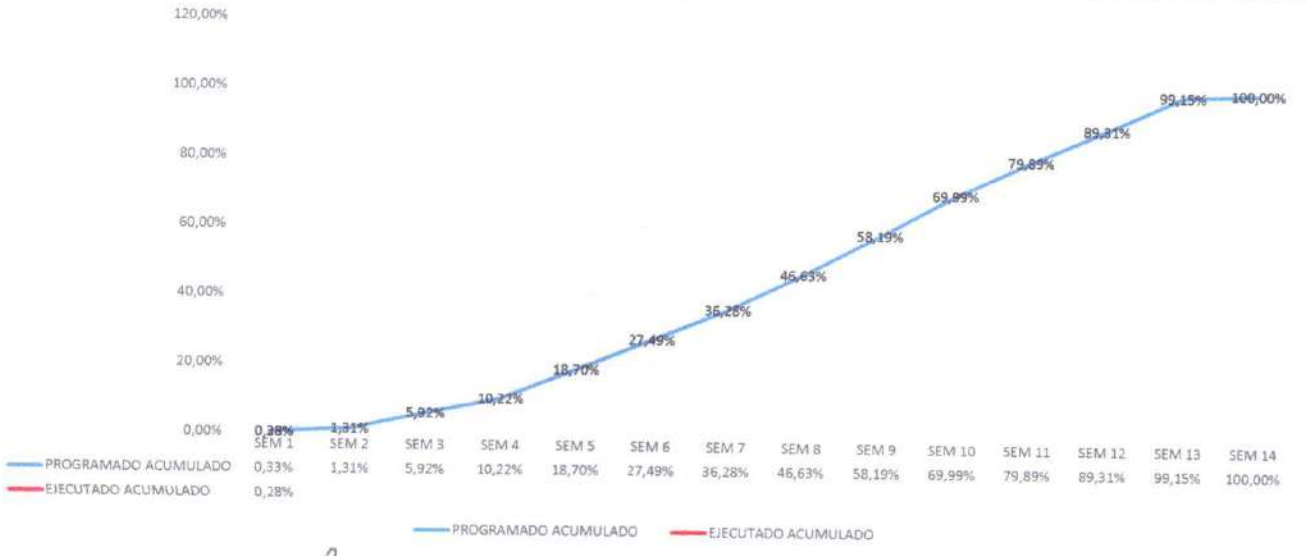

CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MP. 54202-113227 NTS

ANDRES ARCINIEGAS GAMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MP. 54202-420986 NTS

TATIANA CAROLINA NAVARRO PEÑARANDA
PROFESIONAL SST

CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO CONTRACTUAL	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528)		
INTERVENTOR:	CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO		
VALOR CONTRATO	$ 105.532.770,00	**ORDEN DE INICIO:**	15 de octubre de 2025
FECHA TERMINACION:	15 de enero de 2026	**PLAZO INICIAL:**	3 meses
		PLAZO ACTUAL:	3 meses

CONTRATO DE OBRA

OBJETO CONTRACTUAL	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No:	LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALCANTARILLADO		
VALOR TOTAL OBRAS	$ 1.291.072.319,43	**ORDEN DE INICIO:**	15 de octubre de 2025
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 1.396.605.089,43	**PLAZO INICIAL:**	3 meses
FECHA TERMINACION:	15 de enero de 2026	**PLAZO ACTUAL:**	3 meses

CONTROL DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

SEMANA	FECHA		PROGRAMADO			EJECUTADO		
			% SEMANAL	% ACUM.	$ ACUM.	% SEMANAL	% ACUM.	$ ACUM.
SEMANA No.01	15/10/2025	19/10/2025	0,33%	0,33%	$ 4.260.538,65	0,28%	0,28%	$ 3.615.002,49
SEMANA No.02	20/10/2025	26/10/2025	0,98%	1,31%	$ 16.913.047,38			$ -
SEMANA No.03	27/10/2025	2/11/2025	4,61%	5,92%	$ 76.431.481,31			$ -
SEMANA No.04	3/11/2025	9/11/2025	4,30%	10,22%	$ 131.947.591,05			$ -
SEMANA No.05	10/11/2025	16/11/2025	8,48%	18,70%	$ 241.430.523,73			$ -
SEMANA No.06	17/11/2025	23/11/2025	8,79%	27,49%	$ 354.915.780,61			$ -
SEMANA No.07	24/11/2025	30/11/2025	8,79%	36,28%	$ 468.401.037,49			$ -
SEMANA No.08	1/12/2025	7/12/2025	10,35%	46,63%	$ 602.027.022,55			$ -
SEMANA No.09	8/12/2025	14/12/2025	11,56%	58,19%	$ 751.274.982,68			$ -
SEMANA No.10	15/12/2025	21/12/2025	11,80%	69,99%	$ 903.621.516,37			$ -
SEMANA No.11	22/12/2025	28/12/2025	9,90%	79,89%	$ 1.031.437.675,99			$ -
SEMANA No.12	29/12/2025	4/01/2026	9,42%	89,31%	$ 1.153.056.688,48			$ -
SEMANA No.13	5/01/2026	11/01/2026	9,84%	99,15%	$ 1.280.098.204,71			$ -
SEMANA No.14	12/01/2026	15/01/2026	0,85%	100,00%	$ 1.291.072.319,43			$ -

Alcaldía de Ocaña

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
NIT: 890.501.102 - 2
Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda

Busbanzá Ingeniería S.A.S

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 02

FECHA:	26/10/2025	PERIODO:	20/10/2025	AL	26/10/2025
ENTIDAD CONTRATANTE:		ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE:		SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			
INTERVENTOR:		BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS			
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA:		CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO			
No. DE CONTRATO:		SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528)			
OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA:		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.			
CONTRATISTA OBRA:		CONSORCIO ALCANTARILLADO			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA:		RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA			
No. DE CONTRATO:		LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207)			
OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA:		CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER			

CONTROL DE PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA	
Plazo Inicial:	3 meses
Plazo Actualizado:	3 meses
Fecha de Inicio:	15/10/2025
Fecha de Vencimiento:	15/01/2026

CONTROL DEL PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Plazo Inicial:	3 meses
Plazo Actualizado:	3 meses
Fecha de Inicio:	15/10/2025
Fecha de Vencimiento:	15/01/2026

CONTROL PRESUPUESTAL		
Valor inicial:	$	1.291.072.319,43
Adición en Valor No 1:	$	-
Valor con adición:	$	1.291.072.319,43
Valor acta No.1:	$	-

CONTROL PRESUPUESTAL		
Valor inicial:	$	105.532.770,00
Adición en Valor No 1:	$	-
Valor con adición:	$	105.532.770,00
Valor acta No. 1:	$	-

PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA

Ayudantes		Oficiales		Supervisor		Ingenieros:	
T. Social		Operadores		Topógrafo		Cadenero:	

PERSONAL EMPLEADO POR LA INTERVENTORIA

Ingenieros _____ Secretaria _____ Apoyo tecnico residente _____

AVANCE SEMANAL DE LA OBRA

OBRA EJECUTADA

	INICIAL	ADICIÓN No 01		
Acumulado anterior	0,28%		$	3.615.002,49
Ejecutado en el periodo	2,52%		$	32.535.022,45
Acumulado actual	2,80%		$	36.150.024,94

OBRA PROGRAMADA

	INICIAL	ADICIÓN No 01		
Acumulado anterior	0,33%		$	4.260.538,65
Programado en el periodo	0,98%		$	4.260.538,65
Acumulado actual	1,31%		$	4.260.538,65
Diferencia	1,49%			
Plazo actualizado	92,00	DIAS		
Plazo transcurrido	11,00	DIAS		

REPORTE DE ACCIDENTES (con o sin afectación de personas y/o medio ambiente):
NINGUNO

SEÑALIZACION DE LA OBRA:	SI	NO
Valla informativa:		X
Vallas preventivas:		X
Postes, cintas y señales preventivas:		X

Alcaldía de Ocaña

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
NIT: 890.501.102 - 2
Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda

Busbanzá Ingeniería S.A.S

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 02

FECHA:	26/10/2025	PERIODO:	20/10/2025	AL	26/10/2025

COMENTARIOS GENERALES:

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL



FOTO 2: EXCAVACION EN MATERIAL COMUN QUEBRADA EL TEJAR



FOTO 3: FIGURADO ACERO DE REFUERZO



FOTO 4: SUMINISTRO DE TUBERIA 8" BELEN PARTE BAJA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
LOCALIZACION Y REPLANTEO QUEBRADA EL TEJAR	EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO
LOCALIZACION Y REPLANTEO BELEN PARTE BAJA	EXVACACION EN ROCA
DESCAPOTE MANUAL	INSTALACION DE TUBERIA QUEBRADA EL TEJAR
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	TRANSPORTE DE MATERIALES QUEBRADA EL TEJAR
RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	ACOMETIDAS BELEN PARTE BAJA
INSTALACION DE TUBERIA 8" BELEN PARTE BAJA	
FIGURADO ACERO DE REFUERZO	

OBSERVACIONES

Alcaldía de Ocaña

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
NIT: 890.501.102 - 2
Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda

Busbanzá Ingeniería S.A.S

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 02

FECHA:	26/10/2025	PERIODO:	20/10/2025	AL	26/10/2025

BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"



CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MP. 54202-113227 NTS

ANDRES ARCINIEGAS GAMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MP. 54202-420986 NTS

Tatiana C. Navarro P.
TATIANA CAROLINA NAVARRO PEÑARANDA
PROFESIONAL SST

CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO CONTRACTUAL	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
CONTRATO DE INTERVENTORIA	SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528)
INTERVENTOR:	CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
VALOR CONTRATO	$ 105.532.770,00
FECHA TERMINACION:	15 de enero de 2026
ORDEN DE INICIO:	15 de octubre de 2025
PLAZO INICIAL:	3 meses
PLAZO ACTUAL:	3 meses

CONTRATO DE OBRA

OBJETO CONTRACTUAL	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATO No:	LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207)
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALCANTARILLADO
VALOR TOTAL OBRAS	$ 1.291.072.319,43
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 1.396.605.089,43
FECHA TERMINACION:	15 de enero de 2026
ORDEN DE INICIO:	15 de octubre de 2025
PLAZO INICIAL:	3 meses
PLAZO ACTUAL:	3 meses

CONTROL DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

SEMANA	FECHA		PROGRAMADO			EJECUTADO		
			% SEMANAL	% ACUM.	$ ACUM.	% SEMANAL	% ACUM.	$ ACUM.
SEMANA No.01	15/10/2025	19/10/2025	0,33%	0,33%	$ 4.260.538,65	0,28%	0,28%	$ 3.615.002,49
SEMANA No.02	20/10/2025	26/10/2025	0,98%	1,31%	$ 16.913.047,38	2,52%	2,80%	$ 36.150.024,94
SEMANA No.03	27/10/2025	2/11/2025	4,61%	5,92%	$ 76.431.481,31			$ -
SEMANA No.04	3/11/2025	9/11/2025	4,30%	10,22%	$ 131.947.591,05			$ -
SEMANA No.05	10/11/2025	16/11/2025	8,48%	18,70%	$ 241.430.523,73			$ -
SEMANA No.06	17/11/2025	23/11/2025	8,79%	27,49%	$ 354.915.780,61			$ -
SEMANA No.07	24/11/2025	30/11/2025	8,79%	36,28%	$ 468.401.037,49			$ -
SEMANA No.08	1/12/2025	7/12/2025	10,35%	46,63%	$ 602.027.022,55			$ -
SEMANA No.09	8/12/2025	14/12/2025	11,56%	58,19%	$ 751.274.982,68			$ -
SEMANA No.10	15/12/2025	21/12/2025	11,80%	69,99%	$ 903.621.516,37			$ -
SEMANA No.11	22/12/2025	28/12/2025	9,90%	79,89%	$ 1.031.437.675,99			$ -
SEMANA No.12	29/12/2025	4/01/2026	9,42%	89,31%	$ 1.153.056.688,48			$ -
SEMANA No.13	5/01/2026	11/01/2026	9,84%	99,15%	$ 1.280.098.204,71			$ -
SEMANA No.14	12/01/2026	15/01/2026	0,85%	100,00%	$ 1.291.072.319,43			$ -

Alcaldía de Ocaña

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
NIT: 890.501.102 - 2
Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda

Busbanzá Ingeniería S.A.S

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 03

FECHA: 2/11/2025	PERIODO:	27/10/2025	AL	2/11/2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			
INTERVENTOR:	BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS			
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA:	CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO			
No. DE CONTRATO:	SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528)			
OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.			
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ALCANTARILLADO			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA:	RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA			
No. DE CONTRATO:	LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207)			
OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA:	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER			

CONTROL DE PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA	
Plazo inicial:	3 meses
Plazo Actualizado:	3 meses
Fecha de Inicio:	15/10/2025
Fecha de Vencimiento:	15/01/2026

CONTROL DEL PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Plazo inicial:	3 meses
Plazo Actualizado:	3 meses
Fecha de Inicio:	15/10/2025
Fecha de Vencimiento:	15/01/2026

CONTROL PRESUPUESTAL		
Valor inicial:	$	1.291.072.319,43
Adición en Valor No 1:	$	-
Valor con adición:	$	1.291.072.319,43
Valor acta No.1:	$	-

CONTROL PRESUPUESTAL		
Valor inicial:	$	105.532.770,00
Adición en Valor No 1:	$	-
Valor con adición:	$	105.532.770,00
Valor acta No. 1:	$	-

PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA

Ayudantes		Oficiales		Supervisor		Ingenieros:	
T. Social		Operadores		Topógrafo		Cadenero:	

PERSONAL EMPLEADO POR LA INTERVENTORIA

Ingenieros		Secretaria		Apoyo tecnico residente	

AVANCE SEMANAL DE LA OBRA

OBRA EJECUTADA

	INICIAL	ADICIÓN No 01		
Acumulado anterior	2,80%		$	36.150.024,94
Ejecutado en el periodo	6,47%		$	83.532.379,07
Acumulado actual	9,27%		$	119.682.404,01

OBRA PROGRAMADA

	INICIAL	ADICIÓN No 01		
Acumulado anterior	1,31%		$	16.913.047,38
Programado en el periodo	4,61%		$	59.518.433,93
Acumulado actual	5,92%		$	76.431.481,31
Diferencia	3,35%			
Plazo actualizado	92,00	DIAS		
Plazo transcurrido	18,00	DIAS		

REPORTE DE ACCIDENTES (con o sin afectación de personas y/o medio ambiente):
NINGUNO

SEÑALIZACION DE LA OBRA:	SI	NO
Valla informativa:		X
Vallas preventivas:	X	
Postes, cintas y señales preventivas:	X	

Alcaldía de Ocaña

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
NIT: 890.501.102 - 2
Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda

Busbanzá Ingeniería S.A.S

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 03

FECHA:	2/11/2025	PERIODO:	27/10/2025	AL	2/11/2025

COMENTARIOS GENERALES:

REGISTRO FOTOGRAFICO

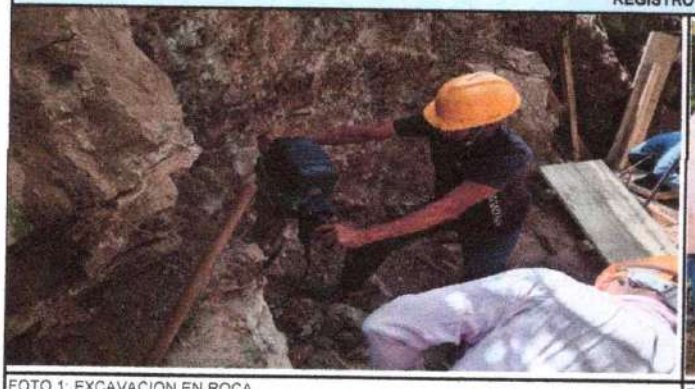


FOTO 1: EXCAVACION EN ROCA



FOTO 2: EXCAVACION EN ROCA



FOTO 3: INSTALACION TUBERIA 10" QUEBRADA EL TEJAR



FOTO 4: SUMINISTRO DE TUBERIA 6" ACOMETIDAS BELEN PARTE BAJA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
DESCAPOTE MANUAL	CONSTRUCCION DE CAJAS EN CONCRETO REFORZADO
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	CONSTRUCCION DE ZAPATAS Y COLUMNAS QUEBRADA EL TEJAR
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO	REVESTIMIENTO DE TUBERIA 10" QUEBRADA EL TEJAR
EXCAVACION EN ROCA	CONSTRUCCION DE APOYOS EN CONCRETO CICLOPEO
INSTALACION DE TUBERIA 10" QUEBRADA EL TEJAR	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION ACOMETIDAS BELEN PARTE BAJA
INSTALACION DE TUBERIA 8" BELEN PARTE BAJA	
INSTALACION DE TUBERIA 6" ACOMETIDAS BELEN PARTE BAJA	
FIGURADO ACERO DE REFUERZO	

OBSERVACIONES

Alcaldía de Ocaña

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
NIT: 890.501.102 - 2
Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda

Busbanzá Ingeniería S.A.S

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 03

FECHA:	2/11/2025	PERIODO:	27/10/2025	AL	2/11/2025

BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"



	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14
PROGRAMADO ACUMULADO	0,33%	1,31%	5,92%	10,22%	18,70%	27,49%	36,28%	46,63%	58,19%	69,99%	79,89%	89,31%	99,15%	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	0,28%	2,80%	9,27%											

CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MP. 54202-113227 NTS

ANDRES ARCINIEGAS GAMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MP. 54202-420986 NTS

Tatiana C. Navarro P.

TATIANA CAROLINA NAVARRO PEÑARANDA
PROFESIONAL SST

CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO CONTRACTUAL	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
CONTRATO DE INTERVENTORIA	SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528)
INTERVENTOR:	CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
VALOR CONTRATO	$ 105.532.770,00
FECHA TERMINACION:	15 de enero de 2026
ORDEN DE INICIO:	15 de octubre de 2025
PLAZO INICIAL:	3 meses
PLAZO ACTUAL:	3 meses

CONTRATO DE OBRA

OBJETO CONTRACTUAL	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATO No:	LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207)
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALCANTARILLADO
VALOR TOTAL OBRAS	$ 1.291.072.319,43
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 1.396.605.089,43
FECHA TERMINACION:	15 de enero de 2026
ORDEN DE INICIO:	15 de octubre de 2025
PLAZO INICIAL:	3 meses
PLAZO ACTUAL:	3 meses

CONTROL DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

SEMANA	FECHA		PROGRAMADO			EJECUTADO		
			% SEMANAL	% ACUM.	$ ACUM.	% SEMANAL	% ACUM.	$ ACUM.
SEMANA No.01	15/10/2025	19/10/2025	0,33%	0,33%	$ 4.260.538,65	0,28%	0,28%	$ 3.615.002,49
SEMANA No.02	20/10/2025	26/10/2025	0,98%	1,31%	$ 16.913.047,38	2,52%	2,80%	$ 36.150.024,94
SEMANA No.03	**27/10/2025**	**2/11/2025**	**4,61%**	**5,92%**	**$ 76.431.481,31**	**6,47%**	**9,27%**	**$ 119.682.404,01**
SEMANA No.04	3/11/2025	9/11/2025	4,30%	10,22%	$ 131.947.591,05			$ -
SEMANA No.05	10/11/2025	16/11/2025	8,48%	18,70%	$ 241.430.523,73			$ -
SEMANA No.06	17/11/2025	23/11/2025	8,79%	27,49%	$ 354.915.780,61			$ -
SEMANA No.07	24/11/2025	30/11/2025	8,79%	36,28%	$ 468.401.037,49			$ -
SEMANA No.08	1/12/2025	7/12/2025	10,35%	46,63%	$ 602.027.022,55			$ -
SEMANA No.09	8/12/2025	14/12/2025	11,56%	58,19%	$ 751.274.982,68			$ -
SEMANA No.10	15/12/2025	21/12/2025	11,80%	69,99%	$ 903.621.516,37			$ -
SEMANA No.11	22/12/2025	28/12/2025	9,90%	79,89%	$ 1.031.437.675,99			$ -
SEMANA No.12	29/12/2025	4/01/2026	9,42%	89,31%	$ 1.153.056.688,48			$ -
SEMANA No.13	5/01/2026	11/01/2026	9,84%	99,15%	$ 1.280.098.204,71			$ -
SEMANA No.14	12/01/2026	15/01/2026	0,85%	100,00%	$ 1.291.072.319,43			$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
NIT: 890.501.102 - 2
Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 04

FECHA:	9/11/2025	PERIODO:	3/11/2025	AL	9/11/2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA				
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA				
INTERVENTOR:	BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS				
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA:	CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO				
No. DE CONTRATO:	SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528)				
OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.				
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ALCANTARILLADO				
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA:	RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA				
No. DE CONTRATO:	LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207)				
OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA:	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER				

CONTROL DE PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA	
Plazo Inicial:	3 meses
Plazo Actualizado:	3 meses
Fecha de Inicio:	15/10/2025
Fecha de Vencimiento:	15/01/2026

CONTROL DEL PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Plazo Inicial:	3 meses
Plazo Actualizado:	3 meses
Fecha de Inicio:	15/10/2025
Fecha de Vencimiento:	15/01/2026

CONTROL PRESUPUESTAL		
Valor Inicial:	$	1.291.072.319,43
Adición en Valor No 1:	$	-
Valor con adición:	$	1.291.072.319,43
Valor acta No.1:	$	-

CONTROL PRESUPUESTAL		
Valor Inicial:	$	105.532.770,00
Adición en Valor No 1:	$	-
Valor con adición:	$	105.532.770,00
Valor acta No. 1:	$	-

PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA

Ayudantes		Oficiales		Supervisor		Ingenieros:	
T. Social		Operadores		Topógrafo		Cadenero:	

PERSONAL EMPLEADO POR LA INTERVENTORIA

Ingenieros		Secretaria		Apoyo tecnico residente	

AVANCE SEMANAL DE LA OBRA

OBRA EJECUTADA

	INICIAL	ADICIÓN No 01		
Acumulado anterior	9,27%		$	119.682.404,01
Ejecutado en el periodo	7,95%		$	102.640.249,39
Acumulado actual	17,22%		$	222.322.653,41

OBRA PROGRAMADA

	INICIAL	ADICIÓN No 01		
Acumulado anterior	5,92%		$	76.431.481,31
Programado en el periodo	4,30%		$	55.516.109,74
Acumulado actual	10,22%		$	131.947.591,05
Diferencia	7,00%			
Plazo actualizado	92,00	DIAS		
Plazo transcurrido	25,00	DIAS		

REPORTE DE ACCIDENTES (con o sin afectación de personas y/o medio ambiente):
NINGUNO.

SEÑALIZACION DE LA OBRA:	SI	NO
Valla informativa:		X
Vallas preventivas:	X	
Postes, cintas y señales preventivas:	X	

Alcaldía de Ocaña

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
NIT: 890.501.102 - 2
Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda

Busbanzá Ingeniería S.A.S

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 04

FECHA:	9/11/2025	PERIODO:	3/11/2025	AL	9/11/2025

COMENTARIOS GENERALES:

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: CONSTRUCCION DE CAJAS EN CONCRETO REFORZADO



FOTO 2: CONSTRUCCION DE ZAPATAS QUEBRADA EL TEJAR



FOTO 3: MEJORAMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO QUEBRADA EL TEJAR



FOTO 4: SUMINISTRO DE TUBERIA 8" REDES BELEN PARTE BAJA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
DESCAPOTE MANUAL	CONSTRUCCION DE VIGA AEREA QUEBRADA EL TEJAR
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	
EXCAVACION EN ROCA	
RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	
INSTALACION DE TUBERIA 10" QUEBRADA EL TEJAR	
INSTALACION DE TUBERIA 8" BELEN PARTE BAJA	
INSTALACION DE TUBERIA 6" ACOMETIDAS BELEN PARTE BAJA	
FIGURADO ACERO DE REFUERZO	
CONSTRUCCION DE CAJAS EN CONCRETO REFORZADO	
CONSTRUCCION DE ZAPATAS Y COLUMNAS QUEBRADA EL TEJAR	
CONSTRUCCION DE APOYOS EN CONCRETO CICLOPEO	
TRANSPORTE DE MATERIALES	
CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION ACOMETIDAS BELEN PARTE BAJA	

OBSERVACIONES

Alcaldía de Ocaña

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
NIT: 890.501.102 - 2
Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda

Busbanzá Ingeniería S.A.S

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 04

FECHA:	9/11/2025	PERIODO:	3/11/2025	AL	9/11/2025

BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"



	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14
PROGRAMADO ACUMULADO	0,33%	1,31%	5,92%	10,22%	18,70%	27,49%	36,28%	46,63%	58,19%	69,99%	79,89%	89,31%	99,15%	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	0,28%	2,80%	9,27%	17,22%										

CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MP. 54202-113227 NTS

ANDRES ARCINIEGAS GAMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MP. 54202-420986 NTS

Tatiana C. Navarro P.
TATIANA CAROLINA NAVARRO PEÑARANDA
PROFESIONAL SST

CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO CONTRACTUAL	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528)		
INTERVENTOR:	CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO		
VALOR CONTRATO	$ 105.532.770,00	**ORDEN DE INICIO:**	15 de octubre de 2025
FECHA TERMINACION:	15 de enero de 2026	**PLAZO INICIAL:**	3 meses
		PLAZO ACTUAL:	3 meses

CONTRATO DE OBRA

OBJETO CONTRACTUAL	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No:	LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALCANTARILLADO		
VALOR TOTAL OBRAS	$ 1.291.072.319,43	**ORDEN DE INICIO:**	15 de octubre de 2025
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 1.396.605.089,43	**PLAZO INICIAL:**	3 meses
FECHA TERMINACION:	15 de enero de 2026	**PLAZO ACTUAL:**	3 meses

CONTROL DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

SEMANA	FECHA		PROGRAMADO			EJECUTADO		
			% SEMANAL	% ACUM.	$ ACUM.	% SEMANAL	% ACUM.	$ ACUM.
SEMANA No.01	15/10/2025	19/10/2025	0,33%	0,33%	$ 4.260.538,65	0,28%	0,28%	$ 3.615.002,49
SEMANA No.02	20/10/2025	26/10/2025	0,98%	1,31%	$ 16.913.047,38	2,52%	2,80%	$ 36.150.024,94
SEMANA No.03	27/10/2025	2/11/2025	4,61%	5,92%	$ 76.431.481,31	6,47%	9,27%	$ 119.682.404,01
SEMANA No.04	**3/11/2025**	**9/11/2025**	**4,30%**	**10,22%**	**$ 131.947.591,05**	**7,95%**	**17,22%**	**$ 222.322.653,41**
SEMANA No.05	10/11/2025	16/11/2025	8,48%	18,70%	$ 241.430.523,73			$ -
SEMANA No.06	17/11/2025	23/11/2025	8,79%	27,49%	$ 354.915.780,61			$ -
SEMANA No.07	24/11/2025	30/11/2025	8,79%	36,28%	$ 468.401.037,49			$ -
SEMANA No.08	1/12/2025	7/12/2025	10,35%	46,63%	$ 602.027.022,55			$ -
SEMANA No.09	8/12/2025	14/12/2025	11,56%	58,19%	$ 751.274.982,68			$ -
SEMANA No.10	15/12/2025	21/12/2025	11,80%	69,99%	$ 903.621.516,37			$ -
SEMANA No.11	22/12/2025	28/12/2025	9,90%	79,89%	$ 1.031.437.675,99			$ -
SEMANA No.12	29/12/2025	4/01/2026	9,42%	89,31%	$ 1.153.056.688,48			$ -
SEMANA No.13	5/01/2026	11/01/2026	9,84%	99,15%	$ 1.280.098.204,71			$ -
SEMANA No.14	12/01/2026	15/01/2026	0,85%	100,00%	$ 1.291.072.319,43			$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
NIT: 890.501.102 - 2
Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 05

FECHA:	16/11/2025	PERIODO:	10/11/2025	AL	16/11/2025
ENTIDAD CONTRATANTE:		ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE:		SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			
INTERVENTOR:		BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS			
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA:		CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO			
No. DE CONTRATO:		SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528)			
OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA:		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.			
CONTRATISTA OBRA:		CONSORCIO ALCANTARILLADO			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA:		RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA			
No. DE CONTRATO:		LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207)			
OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA:		CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER			

CONTROL DE PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA	
Plazo Inicial:	3 meses
Plazo Actualizado:	3 meses
Fecha de Inicio:	15/10/2025
Fecha de Vencimiento:	15/01/2026

CONTROL DEL PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Plazo Inicial:	3 meses
Plazo Actualizado:	3 meses
Fecha de Inicio:	15/10/2025
Fecha de Vencimiento:	15/01/2026

CONTROL PRESUPUESTAL		
Valor Inicial:	$	1.291.072.319,43
Adición en Valor No 1:	$	-
Valor con adición:	$	1.291.072.319,43
Valor acta No.1:	$	-

CONTROL PRESUPUESTAL		
Valor Inicial:	$	105.532.770,00
Adición en Valor No 1:	$	-
Valor con adición:	$	105.532.770,00
Valor acta No. 1:	$	-

PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA

Ayudantes _____ Oficiales _____ Supervisor _____ Ingenieros: _____
T. Social _____ Operadores _____ Topógrafo _____ Cadenero: _____

PERSONAL EMPLEADO POR LA INTERVENTORIA

Ingenieros _____ Secretaria _____ Apoyo tecnico residente _____

AVANCE SEMANAL DE LA OBRA

OBRA EJECUTADA

	INICIAL	ADICIÓN No 01		
Acumulado anterior	17,22%		$	222.322.653,41
Ejecutado en el periodo	8,41%		$	108.579.182,06
Acumulado actual	25,63%		$	330.901.835,47

OBRA PROGRAMADA

	INICIAL	ADICIÓN No 01		
Acumulado anterior	10,22%		$	131.947.591,05
Programado en el periodo	8,48%		$	109.482.932,69
Acumulado actual	18,70%		$	241.430.523,73
Diferencia	6,93%			
Plazo actualizado	92,00	DIAS		
Plazo transcurrido	32,00	DIAS		

REPORTE DE ACCIDENTES (con o sin afectación de personas y/o medio ambiente):
NINGUNO.

SEÑALIZACION DE LA OBRA:	SI	NO
Valla informativa:		X
Vallas preventivas:	X	
Postes, cintas y señales preventivas:	X	

Alcaldía de Ocaña

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
NIT: 890.501.102 - 2
Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda

Busbanzá Ingeniería S.A.S

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 05

FECHA:	16/11/2025	PERIODO:	10/11/2025	AL	16/11/2025

COMENTARIOS GENERALES:

REGISTRO FOTOGRAFICO

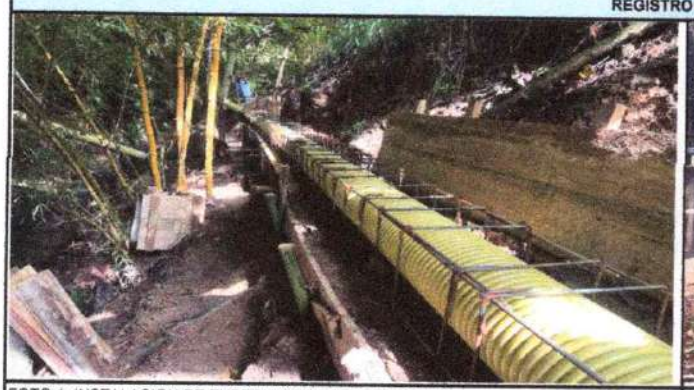


FOTO 1: INSTALACION DE TUBERIA QUEBRADA EL TEJAR



FOTO 2: CONSTRUCCION DE VIGA AEREA QUEBRADA EL TEJAR



FOTO 3: CONSTRUCCION DE VIGA RECUBIERTA QUEBRADA EL TEJAR



FOTO 4: CONSTRUCCION DE COLUMNAS QUEBRADA EL TEJAR

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	
EXCAVACION EN ROCA	
RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	
INSTALACION DE TUBERIA 10" QUEBRADA EL TEJAR	
INSTALACION DE TUBERIA 8" BELEN PARTE BAJA	
INSTALACION DE TUBERIA 6" ACOMETIDAS BELEN PARTE BAJA	
FIGURADO ACERO DE REFUERZO	
CONSTRUCCION DE CAJAS EN CONCRETO REFORZADO	
CONSTRUCCION DE ZAPATAS Y COLUMNAS QUEBRADA EL TEJAR	
CONSTRUCCION DE APOYOS EN CONCRETO CICLOPEO	
TRANSPORTE DE MATERIALES	
CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION ACOMETIDAS BELEN PARTE BAJA	
CONSTRUCCION DE VIGA AEREA QUEBRADA EL TEJAR	

OBSERVACIONES

Alcaldía de Ocaña

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
NIT: 890.501.102 - 2
Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda

Busbanzá Ingeniería S.A.S

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 05

FECHA:	16/11/2025	PERIODO:	10/11/2025	AL	16/11/2025

BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"



	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14
PROGRAMADO ACUMULADO	0,33%	1,31%	5,92%	10,22%	18,70%	27,49%	36,28%	46,63%	58,19%	69,99%	79,89%	89,31%	99,15%	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	0,28%	2,80%	9,27%	17,22%	25,63%									

CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MP. 54202-113227 NTS

ANDRES ARCINIEGAS GAMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MP. 54202-420986 NTS

Tatiana C. Navarro P.
TATIANA CAROLINA NAVARRO PEÑARANDA
PROFESIONAL SST

CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO CONTRACTUAL	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO DE INTERVENTORIA	SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528)		
INTERVENTOR:	CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO		
VALOR CONTRATO	$ 105.532.770,00	**ORDEN DE INICIO:**	15 de octubre de 2025
FECHA TERMINACION:	15 de enero de 2026	**PLAZO INICIAL:**	3 meses
		PLAZO ACTUAL:	3 meses

CONTRATO DE OBRA

OBJETO CONTRACTUAL	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No:	LP-SVIV-001-2025 (COL1.PCCNTR.8359207)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALCANTARILLADO		
VALOR TOTAL OBRAS	$ 1.291.072.319,43	**ORDEN DE INICIO:**	15 de octubre de 2025
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 1.396.605.089,43	**PLAZO INICIAL:**	3 meses
FECHA TERMINACION:	15 de enero de 2026	**PLAZO ACTUAL:**	3 meses

CONTROL DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

SEMANA	FECHA		PROGRAMADO			EJECUTADO		
			% SEMANAL	% ACUM.	$ ACUM.	% SEMANAL	% ACUM.	$ ACUM.
SEMANA No.01	15/10/2025	19/10/2025	0,33%	0,33%	$ 4.260.538,65	0,28%	0,28%	$ 3.615.002,49
SEMANA No.02	20/10/2025	26/10/2025	0,98%	1,31%	$ 16.913.047,38	2,52%	2,80%	$ 36.150.024,94
SEMANA No.03	27/10/2025	2/11/2025	4,61%	5,92%	$ 76.431.481,31	6,47%	9,27%	$ 119.682.404,01
SEMANA No.04	3/11/2025	9/11/2025	4,30%	10,22%	$ 131.947.591,05	7,95%	17,22%	$ 222.322.653,41
SEMANA No.05	**10/11/2025**	**16/11/2025**	**8,48%**	**18,70%**	**$ 241.430.523,73**	**8,41%**	**25,63%**	**$ 330.901.835,47**
SEMANA No.06	17/11/2025	23/11/2025	8,79%	27,49%	$ 354.915.780,61			$ -
SEMANA No.07	24/11/2025	30/11/2025	8,79%	36,28%	$ 468.401.037,49			$ -
SEMANA No.08	1/12/2025	7/12/2025	10,35%	46,63%	$ 602.027.022,55			$ -
SEMANA No.09	8/12/2025	14/12/2025	11,56%	58,19%	$ 751.274.982,68			$ -
SEMANA No.10	15/12/2025	21/12/2025	11,80%	69,99%	$ 903.621.516,37			$ -
SEMANA No.11	22/12/2025	28/12/2025	9,90%	79,89%	$ 1.031.437.675,99			$ -
SEMANA No.12	29/12/2025	4/01/2026	9,42%	89,31%	$ 1.153.056.688,48			$ -
SEMANA No.13	5/01/2026	11/01/2026	9,84%	99,15%	$ 1.280.098.204,71			$ -
SEMANA No.14	12/01/2026	15/01/2026	0,85%	100,00%	$ 1.291.072.319,43			$ -

Anexo N° 14 Informe HSE Contratista

"CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO ENTRE LOS SECTORES LOS OLIVOS- BELÉN – QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

CONSORCIO
ALCANTARILLADO

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -1
(15 octubre al 14 de noviembre 2025)

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

INTRODUCCION

El presente informe tiene como fin dar cumplimiento a los pliegos contractuales y servir como base para el seguimiento de la gestión desde el punto de vista de Seguridad y Salud en el Trabajo para el contrato cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS – BELÉN – QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

En el informe de SST correspondiente al periodo comprendido desde el 15 de octubre al 14 de noviembre del año 2025, se presentan las generalidades de la gestión del periodo en revisión en el área de SST. Así mismo hace referencia al conjunto de medidas que se implementaron y aplicaron en el transcurso de este periodo relacionado con la seguridad y salud de los trabajadores del contrato: CONTRATO DE OBRA LP-SVIVI-001-2025 a cargo del contratista CONSORCIO ALCANTARILLADO.

Este documento fue elaborado, teniendo en cuenta cada uno de los aspectos que fueron ofertados e implementados en el frente de obra, teniendo en cuenta que la gestión SST, no solo se desarrolla con la finalidad de cumplir con los requerimientos legales del contrato sino además para contribuir con la minimización y mitigación de los impactos causados a la comunidad por la ejecución de las actividades constructivas y la seguridad y salud de los trabajadores.

Bajo la dirección y coordinación con la interventoría, se han manejado y controlado los impactos causados y se han suplido las necesidades de la obra y de la comunidad coordinadamente.

OBJETIVO

Efectuar las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo, para mantener la seguridad del personal que se encuentra en obra, alcanzando hábitos de vida saludable, prevención de incidentes y accidentes y enfermedades profesionales, por medio de las actividades ejecutadas en SST que permiten dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del contrato de obra.

LISTADO DE PERSONAL ACTIVO

No.	Nombres y apellidos	Cedula de ciudadanía	Cargo
1	Víctor Rafael Collante Navarro	88.285.499	Director del proyecto
2	Marcial Fernando Pallares Vacca	1064839866	Ingeniero residente
3	Gineth Dayana Paba Arevalo	1091669706	Profesional SSTA
4	Dairo Chacón Uribe	1064840995	Oficial de obra
5	Cristian Fernando Ríos Chacón	1064841249	Maestro de obra
6	Leonardo Augusto Rincon Chacón	1064838234	Maestro de obra
7	Carlos Alberto Pérez	13177177	Auxiliar de obra
8	Dainer Stiwer Contreras Ruedas	1003174824	Auxiliar de obra
9	Deivy Tarazona Sarabia	1007539444	Auxiliar de obra
11	Guver Antonio Sánchez Ruedas	13175352	Auxiliar de obra
12	José Delfín Trillos Mejía	5084256	Auxiliar de obra
13	Juan Camilo Vergel Calderón	1091654212	Auxiliar de obra
14	Marco Antonio Hernández Hernández	1068578437	Auxiliar de obra
15	Nixon Armando Carrascal Ruedas	13176421	Auxiliar de obra
16	Ronald Emiro Sánchez Ascanio	1004903749	Auxiliar de obra
17	Víctor Manuel Mejía Cárdenas	1064791134	Auxiliar de obra
18	Yander Trigos	13178015	Auxiliar de obra
19	Diego Andrés Trillos Jácome	1091680414	Auxiliar de obra
20	Reinaldo Manosalva	5084805	Auxiliar de obra

LISTADO PERSONAL EGRESO

Nombres y apellidos	Cedula	Cargo y/o oficio	Fecha de ingreso	Fecha de egreso
Yordan Stiven Ovallos Avendaño	1092671114	Ayudante de obra	17-10-2025	21-10-2025
Jhonatan Duran Castilla	1092670390	Ayudante de obra	20-10-2025	01-11-2025
Alexander Pérez Contreras	1092670475	Ayudante de obra	18-10-2025	01-11-2025
Yanier Elías Lázaro Patiño	1148440336	Ayudante de obra	22-10-2025	04-11-2025
Diego Fernando Pérez Contreras	1092730643	Ayudante de obra	20-10-2025	10-11-2025

RELACION DE EQUIPOS EN LA OBRA

Equipo	Ubicación	Horas de uso
Mezcladora	Frente de trabajo	18
Canguro	Frente de trabajo	12
Pulidora	Frente de trabajo	6

RELACION DE MAQUINARIA

Equipo	Ubicación	Días
Retroexcavadora	Frente de trabajo	24
Mini cargador	Frente de trabajo	20
Volqueta	Transporte de material	15

Indicadores de accidentes de trabajo, enfermedad laboral (atel) y origen común

El CONSORCIO ALCANTARILLADO. en aras de generar estrategias en materia de prevención e intervención al ausentismo por enfermedad general y lesiones por accidentes de trabajo, se realiza cada mes el análisis estadístico de los Accidentes de Trabajo, Enfermedades Laborales y Origen Común, a continuación, se relacionan en la Tabla con los datos más relevantes del análisis:

ITEM	REQUERIMIENTO	DATOS
1	Número promedio de trabajadores en el período	18
2	Número de horas trabajadas al día	9
3	Días trabajados en el período	24
4	Número de accidentes ocurridos durante el periodo	1
5	Numero de enfermedades laborales y/o origen común	1

- Durante el período ejecutado se registró 1 accidente de trabajo. El señor Dairo Chacón Uribe el día 04 de noviembre en el lugar de trabajo realizo un movimiento de su cuerpo ocasionándole una contusión de rodilla, incapacitándolo por 5 días de sus labores. En el tiempo transcurrido no ocurrieron otros eventos que implicaran lesiones a los trabajadores, lo cual evidencia una gestión efectiva de los riesgos laborales y el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Durante el periodo evaluado se presentó una incapacidad médica. El señor Diego Andrés Trillos Jácome el día 04 de noviembre presento malestar general, se dirigió al centro de salud donde le diagnosticaron una Dispepsia incapacitándolo por 1 día de sus labores. En el tiempo transcurrido no se presentaron otras incapacidades por accidentes de trabajo, este resultado refleja un entorno laboral seguro y controlado, donde las acciones preventivas han contribuido a evitar eventos que afecten la salud y continuidad operativa del personal.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el periodo ejecutado en el marco del programa de capacitación, inducción y reinducción y toma de conciencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del CONSORCIO ALCANTARILLADO, se realizaron charlas diarias en los diferentes frentes de trabajo que actualmente se encuentran laborando y capacitaciones en temas de especial importancia en el proyecto relativos a seguridad y salud en el trabajo a continuación se relacionan los temas tratados.

Los temas abordados fueron los siguientes:

- Socialización del PMA
- La importancia de no hacer bromas en los puestos de trabajo
- Uso correcto de los elementos de protección personal (EPP)
- Correcta separación de los residuos solidos
- Uso adecuado de herramientas
- La importancia de los recursos naturales y su conservación

- Comunicación y trabajo en equipo
- Identificación de riesgos en el área de trabajo

ENTREGA DE EPP

Para la fecha de corte del presente informe se entregó EPP al personal que actualmente se encuentra vinculado al proyecto, así mismo, se realizó la entrega de dotación al personal.

ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

Durante el periodo, no se registraron reportes de actos ni condiciones inseguras por parte del personal operativo, que actualmente labora en las diferentes actividades. Esto refleja un comportamiento preventivo adecuado, el cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos y una mejora en la cultura de reporte. Se continuará promoviendo la identificación y notificación oportuna de cualquier situación que pueda representar un riesgo, con el fin de mantener ambientes laborales seguros y prevenir incidentes.

ASIGNACIÓN DE VIGÍA SST

Se realizó la asignación del vigía en SST al ingeniero **Marcial Fernando Pallares Vacca**, se le informan sus funciones y de esta manera vigilar el cumplimiento de los programas específicos en materia de seguridad para los trabajadores.

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Durante el mes de ejecución se realizaron visitas de inspección de seguridad en las cuales se evaluó el nivel de cumplimiento del uso de los EPP, la señalización, así mismo, se realizan inspecciones a elementos de primeros auxilios, extintores, herramienta menor y las inspecciones de condiciones de seguridad locativas.

MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista se controlan los riesgos por la exposición a sustancias químicas, tanto en el uso, transporte y almacenamiento, para lo cual se llevan en conjunto desde la coordinación de seguridad y salud en el trabajo y la coordinación ambiental del proyecto los siguientes controles:

- Inventario de sustancias químicas
- Se tienen disponibles todas las hojas de datos de seguridad en las áreas de almacenamiento de acuerdo con las actividades del uso de estas.

SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN

La señalización en el trabajo es importante porque ayuda a prevenir accidentes y enfermedades laborales. Las señales de seguridad alertan a los trabajadores sobre los riesgos y les indican cómo evitarlos. Por esta razón, se realiza señalización en puntos de trabajo tales como bodega y en campo para que de esta manera los trabajadores conozcan todas y cada una de las señales que puedan ayudar a identificar puntos de emergencias, puntos de hidratación, rutas de evacuación, entre otras.

RESPUESTA Y ATENCIÓN A EMERGENCIA

Los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias buscan disminuir la vulnerabilidad ante las amenazas por medio de las medidas necesarias que garanticen la supervivencia de los involucrados de manera directa o indirecta y la reducción de costos por daños a muebles, maquinaria y/o enseres, esta preparación implica la identificación de los riesgos potenciales, la evaluación de la vulnerabilidad, elaboración de procedimientos de emergencia, capacitación y entrenamiento al personal, instalación y mantenimiento de equipos de seguridad, la evaluación y mejora continua.

En el desarrollo de las actividades, se cuenta en el área de trabajo con:

Botiquín de primeros auxilios: Botiquín tipo A con los elementos básicos para lograr atender alguna eventualidad leve, o estabilizar a un posible herido mientras se le brinda atención medica de agosto nivel.

Extintor: *Tipo multipropósito de 10 Lb, se contempla para la atención de la presencia de algún* conato de incendio.

Camilla de primeros auxilios: Camilla flotante de polietileno de alta densidad de 185 cm x 43 cm. Utilizada en caso de emergencia para mover de forma segura a personas lesionadas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ilustración 1. Despeje de servidumbre manual.



Ilustración 2.Triturado y arena, cubierto.



Ilustración 3. Elaboración de concreto.



Ilustración 4. Excavaciones.

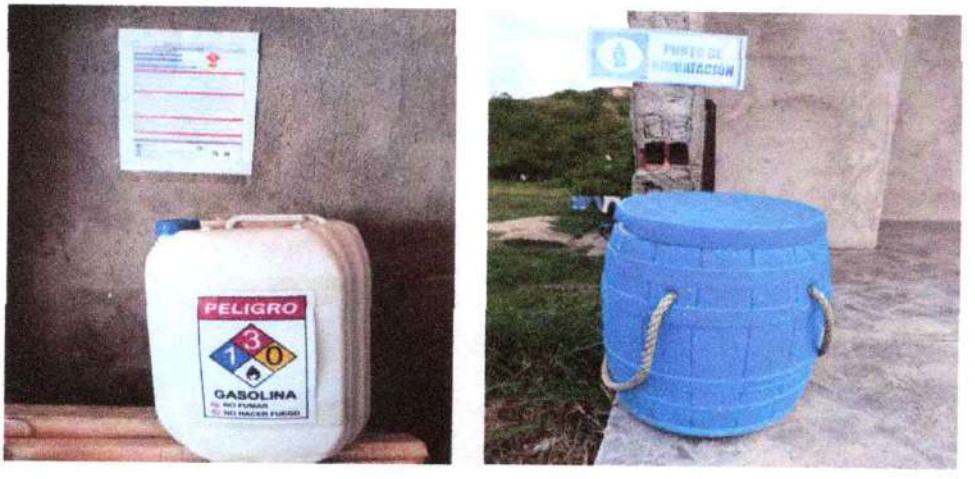


Ilustración 5. etiquetado de sustancias químicas y punto de hidratación.



Ilustración 6. Transporte adecuado del material.



Ilustración 7. Orden y aseo en los frentes de trabajo.



Ilustración 84. Socialización a la comunidad



Ilustración 9. Entrega de EPP.



Ilustración 50. Uso de EPP.





Ilustración 11. Ruta de evacuación y punto de encuentro







Ilustración 62. Señalización.



Ilustración 73. Charla a los trabajadores.





Ilustración 84. Encuesta y capacitaciones.





Ilustración 95. Donación Material sobrante para mejoramiento de vías.

GINETH DAYANA PABA AREVALO
Ingeniera Ambiental
Esp. Gerencia en Riesgos Laborales Seguridad y Salud en el Trabajo
MP No. 54238-328937 NST

ANEXOS DEL INFORME

Anexo 1. Afiliaciones, exámenes de ingreso del personal, incapacidades y desvinculación.
Anexo 2. Inducción, socialización de la política de seguridad y salud en el trabajo, encuesta perfil sociodemográfico de los trabajadores.
Anexo 3. Matriz de peligros y valoración de riesgos.
Anexo 4. Entrega de EPP.
Anexo 5. Asistencia a Charlas – capacitaciones.
Anexo 6. Planilla de seguridad social.
Anexo 7. Inspecciones a equipos, herramientas y maquinaria.
Anexo 8. Fichas de seguridad de las sustancias químicas.
Anexo 9. Acta de nombramiento VIGIA.
Anexo 10. Hoja de vida profesional ambiental y social. (documento anexado en carpeta).

Anexo. 1

CONSORCIO ALCANTARILLADO	**CONSORCIO ALCANTARILLADO**	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025**

Marcial Fernando Pallares Vacca









Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

Dairo Chacón Uribe









Cristian Fernando Ríos Chacón









Leonardo Augusto Rincón Chacón


ARL sura

CERTIFICADO DE AFILIACION - ARL SURA


DATOS DEL TRABAJADOR

TIPO DE EXAMEN

EXAMENES REALIZADOS

CONCEPTO DE APTITUD

REQUISITOS DE SALUD

CONDUCTA


nueva eps

Gerencia de Afiliaciones


porvenir

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

Carlos Alberto Pérez









Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

Dainer Stiwer Contreras Ruedas









Deivi Tarazona Sarabia


ARL sura

LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR


DATOS DEL TRABAJADOR


TIPO DE EXAMEN

EXAMENES REALIZADOS

CONCEPTO DE APTITUD

REQUISITOS DE SALUD

CONDUCTA

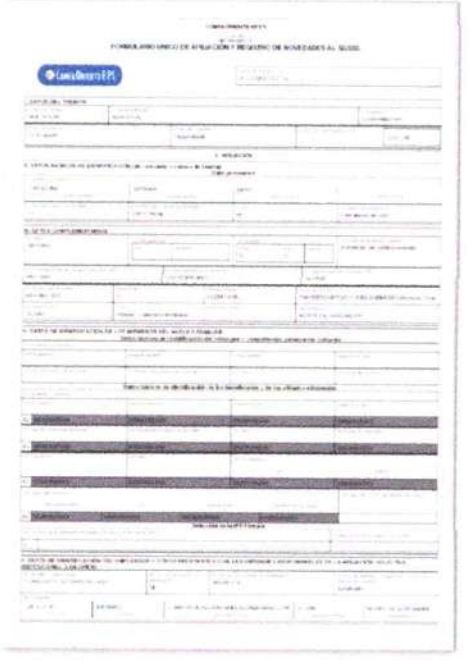

ColPensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES


CERTIFICA QUE

Guver Antonio Sánchez Ruedas


ARL | sura

LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR

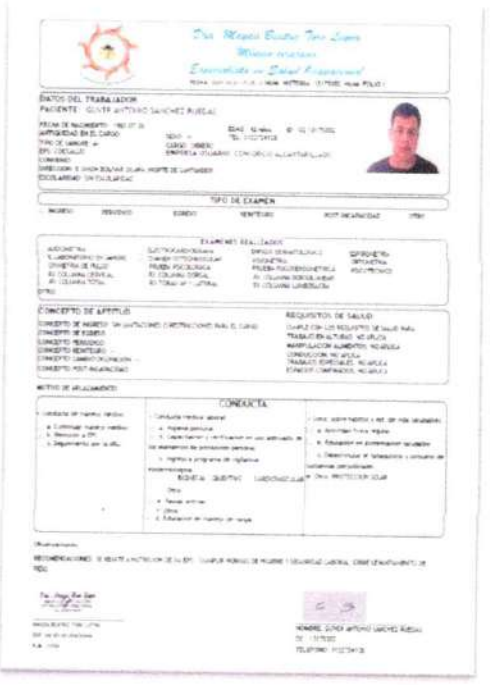


nueva eps

CERTIFICA QUE


porvenir

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR


CERTIFICA QUE

José Delfín Trillos Mejía


ARL sura

LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR

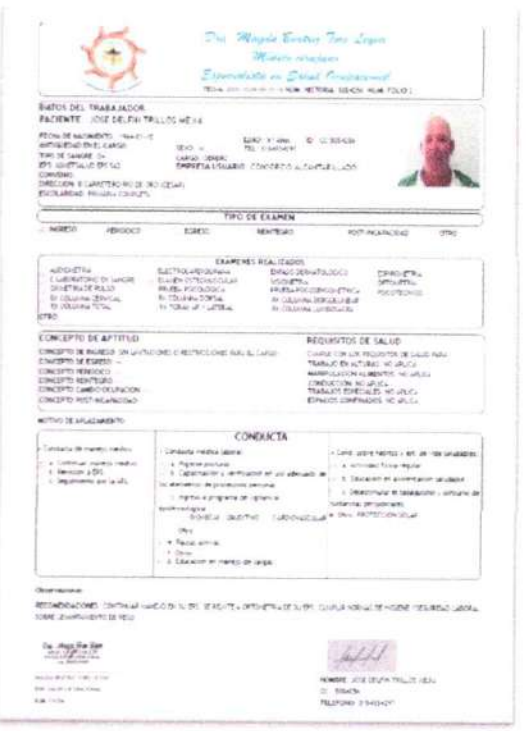
EXAMENES REALIZADOS

CONCEPTO DE APTITUD

REQUISITOS DE SALUD

CONDUCTA


ASMET

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN


Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

Juan Camilo Vergel Calderón


ARL sura

LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR


DATOS DEL TRABAJADOR

PACIENTE JUAN CAMILO VERGEL CALDERON

TIPO DE EXAMEN

EXAMENES REALIZADOS

CONCEPTO DE APTITUD

REQUISITOS DE SALUD

CONDUCTA


nueva eps

NUEVA EPS S.A.

NIT. 900156264-2

CERTIFICA QUE

NUMERO DE RADICACION	FECHA DE RADICACION	TIPO DE SOLICITUD
[illegible]	26/11/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACION	NOMBRE CUSTOMER	BC	CARGO	FECHA
CEDULA DE CIUDADANIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

La siguiente certificacion se expide a solicitud del interesado a los 26 dias del mes de Noviembre del año 2025

Cordialmente

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva


Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Marco Antonio Hernández Hernández



ARL sura

LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR

A continuación se relacionan las fechas de afiliación



DATOS DEL TRABAJADOR

PACIENTE: MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

TIPO DE EXAMEN

EXAMENES REALIZADOS

CONCEPTO DE APTITUD

REQUISITOS DE SALUD

CONDUCTA



nueva eps

CERTIFICA QUE

Fecha de Afiliación de: 25/04/2025

Estado de la Afiliación: ACTIVO

IPS: IPS FAMILY S MEDICAL CASANARE S.A.S-SUAN

Categoria: A

La presente certificación se puede validar solicitud directa en Bogotá para QUIEN INTERESE a los 25 días del mes de noviembre del año 2025

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación

Observaciones:

ESTA CERTIFICACION NO APLICA PARA SERVICIOS MEDICOS
NO VALIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS

Cordialmente:

Nueva EPS S.A



porvenir

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

CERTIFICA QUE

Cordialmente,

Tenga en cuenta

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

Nixon Armando Carrascal Ruedas


ARL sura

LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR


DATOS DEL TRABAJADOR

EXAMENES REALIZADOS

CONCEPTO DE APTITUD

CONDUCTA


COOSALUD

CERTIFICADO DE AFILIACION


Col

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

Ronald Emiro Sánchez Ascanio


ARL sura

LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR


Dra. Magda Beatriz Toro Lopez
Medico general
Especialista en Salud Ocupacional

DATOS DEL TRABAJADOR

PACIENTE: RONALD EMIRO SANCHEZ ASCANIO

TIPO DE EXAMEN

EXAMENES REALIZADOS

CONCEPTO DE APTITUD

REQUISITOS DE SALUD

CONDUCTA


nueva EPS

CERTIFICA QUE

La(el) Señora(o) RONALD EMIRO SANCHEZ ASCANIO identificada(o) con CC 1004031745 se encuentra afiliado a la EPS en condicion de 1 COTIZANTE

Fecha de Activacion de	10-08-2021
Estado de la Afiliacion	ACTIVO
IPS	SUBREGIADO-I P S HOSPITAL SAN MARTIN
Categoria	A

La presente certificacion se expide a solicitud, desde la ciudad de Bogotá para QUIEN INTERESE a los 26 días del mes de noviembre del año 2025

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación

Observaciones:

ESTA CERTIFICACION NO APLICA PARA SERVICIOS MEDICOS
NO VALIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A.


Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Rosa Mercedes Niño Arenas
Dirección de Afiliaciones

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

Yander Trigos









Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

Diego Andrés Trillos Jácome


ARL sura

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR


CONDUCTA


nueva eps

CERTIFICA QUE


porvenir

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

CERTIFICA QUE

Víctor Manuel Mejía Cárdenas









Reinaldo Manosalva











Incapacidad Dairo Chacón Uribe

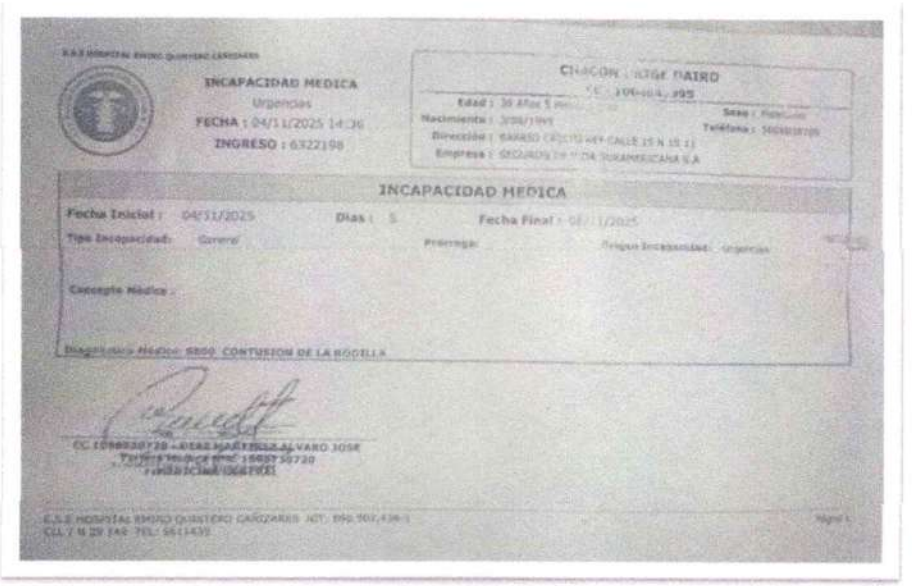

Incapacidad Diego Andrés Trillos Jácome

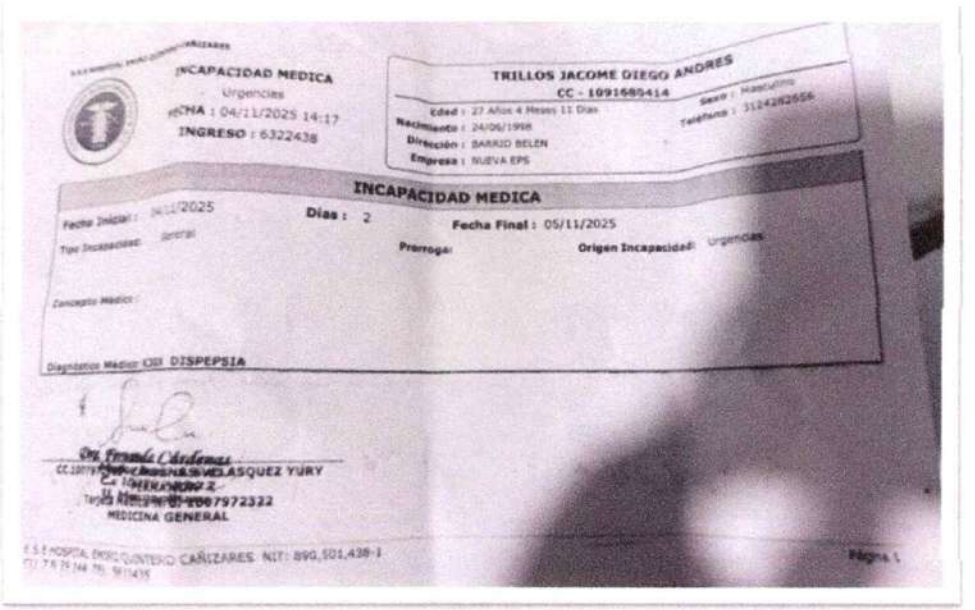

Desvinculación Yordan Stiven Ovallos Avendaño



PAZ Y SALVO

Yo [illegible] identificado con cédula de ciudadanía número [illegible] de [illegible] actuando a nombre propio como trabajador dependiente y/o independiente DECLARO que el CONSORCIO ALCANTARILLADO identificado con NIT 901.992.571 - 8, se encuentra A PAZ Y SALVO conmigo por concepto de obligaciones laborales contractuales pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), responsabilidades y pagos suelos a servicios prestados en obra

La presente la firmo el día 03 del mes de Noviembre del año 2025

Atentamente

Huella

Firma [illegible]
Nombre
CC [illegible]



22 octubre de 2025

Ocaña, Norte de Santander

Yo, YORDAN STIVEN OVALLOS AVENDAÑO mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania N. 1.092.671.114, de acuerdo con la normatividad vigente declaro que fui informado de la necesidad de realizarme el examen médico de egreso, sin embargo, desisto, en forma expresa, a la realización de dicha evaluación médica ocupacional a la cual fui convocado y a la vez asumo la responsabilidad por este hecho, del cual la empresa CONSORCIO ALCANTARILLADO NO es causante

Atentamente

[illegible]
YORDAN STIVEN OVALLOS AVENDAÑO
1.092.671.114

Desvinculación Yanier Elías Lázaro Patiño



PAZ Y SALVO

Yo [illegible] identificado con cédula de ciudadanía número [illegible] de [illegible] actuando a nombre propio como trabajador dependiente y/o independiente DECLARO que el CONSORCIO ALCANTARILLADO identificado con NIT 901.992.571 - 8, se encuentra A PAZ Y SALVO conmigo por concepto de obligaciones laborales contractuales pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), responsabilidades y pagos suelos a servicios prestados en obra

La presente la firmo el día 05 del mes de Noviembre del año 2025

Atentamente,

Huella

Firma [illegible]
Nombre
CC [illegible]



05 de noviembre de 2025

Ocaña, Norte de Santander

Yo, YANIER ELIAS LAZARO PATIÑO mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania N. 1.148.440.336, de acuerdo con la normatividad vigente declaro que fui informado de la necesidad de realizarme el examen médico de egreso, sin embargo, desisto en forma expresa a la realización de dicha evaluación médica ocupacional a la cual fui convocado y a la vez asumo la responsabilidad por este hecho, del cual la empresa CONSORCIO ALCANTARILLADO NO es causante

Atentamente

[illegible]
YANIER ELIAS LAZARO PATIÑO
1.148.440.336

Desvinculación Alexander Pérez Contreras



PAZ Y SALVO

Yo ALEXANDER PEREZ C identificado con cedula de ciudadania numero 1092670475 de OCAÑA actuando a nombre propio como trabajador dependiente y/o independiente, **DECLARO** que el **CONSORCIO ALCANTARILLADO** identificado con NIT. 901.992.571 - 8, se encuentra **A PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de obligaciones laborales contractuales pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), responsabilidades y pagos sujetos a servicios prestados en obra

La presente la firmo el dia 03 del mes de NOVIEMBRE del año 2025

Atentamente,

Huella

Firma ALEXANDER PEREZ C
Nombre
C.C 1092670475



02 de noviembre de 2025

Ocaña, Norte de Santander

Yo, ALEXANDER PEREZ CONTRERAS mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania N. 1.092.670.475, de acuerdo con la normatividad vigente declaro que fui informado de la necesidad de realizarme el examen médico de egreso, sin embargo, desisto en forma expresa a la realización de dicha evaluación médica ocupacional a la cual fui convocado y a la vez asumo la responsabilidad por este hecho, del cual la empresa CONSORCIO ALCANTARILLADO NO es causante

Atentamente

ALEXANDER PEREZ C
ALEXANDER PEREZ CONTRERAS
1.092.670.475

Desvinculación Jhonatan Duran



PAZ Y SALVO

Yo Jhonatan Duran identificado con cédula de ciudadania numero 1093670390 de Ocaña actuando a nombre propio como trabajador dependiente y/o independiente, **DECLARO** que el **CONSORCIO ALCANTARILLADO** identificado con NIT. 901.992.571 - 8, se encuentra **A PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de obligaciones laborales contractuales pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), responsabilidades y pagos sujetos a servicios prestados en obra

La presente la firmo el dia 03 del mes de NOVIEMBRE del año 2025

Atentamente,

Huella

Firma Jhonatan Duran
Nombre
C.C 1093670390



02 de noviembre de 2025

Ocaña, Norte de Santander

Yo, JHONATAN DURAN CASTILLA mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania N. 1.092.670.390, de acuerdo con la normatividad vigente declaro que fui informado de la necesidad de realizarme el examen médico de egreso, sin embargo, desisto en forma expresa a la realización de dicha evaluación médica ocupacional a la cual fui convocado y a la vez asumo la responsabilidad por este hecho, del cual la empresa CONSORCIO ALCANTARILLADO NO es causante

Atentamente

Jhonatan Duran
JHONATAN DURAN CASTILLA
1.092.670.390

Desvinculación Diego Fernando Pérez Contreras



10 de noviembre de 2025

Ocaña, Norte de Santander

Yo, DIEGO FERNANDO PEREZ CONTRERAS mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía N. 1.092.730.643, de acuerdo con la normatividad vigente declaro que fui informado de la necesidad de realizarme el examen médico de egreso, sin embargo, desisto en forma expresa a la realización de dicha evaluación médica ocupacional a la cual fui convocado y a la vez asumo la responsabilidad por este hecho, del cual la empresa CONSORCIO ALCANTARILLADO NO es causante.

Atentamente

Diego Fernando Perez
DIEGO FERNANDO PEREZ CONTRERAS
1.092.730.643



PAZ Y SALVO

Yo Diego Fernando Perez identificado con cedula de ciudadanía numero 1092730643 de Ocaña actuando a nombre propio como trabajador dependiente y/o independiente **DECLARO** que el **CONSORCIO ALCANTARILLADO** identificado con NIT 901.992.571 - 8 se encuentra **A PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de obligaciones laborales contractuales cargo de salarios prestaciones sociales liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL); responsabilidades y pagos sueltos a servicios prestados en obra

La presente la firmo el dia 13 del mes de noviembre del año 2025

Atentamente

Huella

Firma Diego Fernando Perez
Nombre
CC 1092730643

Anexo. 2

CONSORCIO ALCANTARILLADO

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES-SST-FT-001 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Cristian Fernando Ruiz Acuña	C.C. 1064[illegible]2469	
ÁREA:	Operativa	**CARGO:**	Auxiliar

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del Contratista		Asistente contable		✓	
	Presentación Plataforma Estratégica. (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional.)		Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento interno de Trabajo, Políticas Organizacionales)	15 oct	Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal.		Asistente contable			
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal).	15 octubre/25	Coordinadora administrativa			✓
	Seguridad (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa			✓
	Protocolos, instructivos de trabajo		Coordinadora administrativa			✓
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa			✓
Inducción en SST	Políticas		Responsable SST			✓
	Reglamento de higiene y seguridad industrial.		Responsable SST			✓
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores.		Responsable SST			✓
	Matriz de Identificación de Peligros		Responsable SST			✓
	EPP		Responsable SST			✓
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST			✓
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST			✓
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.		Coordinador de obra			✓
	Posición del cargo dentro de la estructura.		Asistente contable			✓
	Localización física del puesto de trabajo		Coordinador de obra			✓
	Líneas de comunicación y autoridad.		Representante legal			✓
	Objetivos y funciones del cargo.	15	Representante legal			✓
	Procedimientos de la unidad o Área		Coordinador de obra			
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra			

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			X
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			X
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			X
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			X
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.			X
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			X
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			X
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			X

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: Si

3. Haría usted alguna recomendación para mejorar este proceso de inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador: Cristian Ruiz

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI ☒ NO ☐
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI ☐ NO ☒
OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO ALCANTARILLADO

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES-SST-FT-001 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	CARLOS ALBERTO	C.C:	73177774
ÁREA:	Operativa	CARGO:	Ayudante

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del Contratista		Asistente contable		V	
	Presentación Plataforma Estratégica. (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional.)	15 oct.	Coordinadora administrativa		V	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento Interno de Trabajo, Políticas Organizacionales).		Coordinadora administrativa		V	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		V	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo – Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		V	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal		Asistente contable			
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal).	15 octubre/25	Coordinadora administrativa		V	
	Seguridad (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa		V	
	Protocolos, instructivos de trabajo		Coordinadora administrativa		V	
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa		V	
Inducción en SST	Políticas		Responsable SST		V	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial.		Responsable SST		V	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST		V	
	Matriz de Identificación de Peligros		Responsable SST		V	
	EPP		Responsable SST		V	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		V	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		V	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.		Coordinador de obra		V	
	Posición del cargo dentro de la estructura.		Asistente contable		V	
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra		V	
	Líneas de comunicación y autoridad.		Representante legal		V	
	Objetivos y funciones del cargo.		Representante legal		V	
	Procedimientos de la unidad o Área.		Coordinador de obra			
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra			

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			X
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			X
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			X
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			X
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.			X
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			X
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			X
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			X

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: Si

3. Haría usted alguna recomendación para mejorar este proceso de Inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador: CARLOS ALBERTO

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI [X] NO [ ]
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI [ ] NO [X]
OBSERVACIONES GENERALES:

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

CONSORCIO ALCANTARILLADO

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES-SST-FT-001 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	[illegible]	C.C:	[illegible]
ÁREA:	operativa	CARGO:	ayudante

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del Contratista		Asistente contable		✓	
	Presentación Plataforma Estratégica. (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional.)	15 oct	Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento Interno de Trabajo, Políticas Organizacionales)		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo – Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal		Asistente contable			
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal).	15 octubre/25	Coordinadora administrativa			✓
	Seguridad (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa			✓
	Protocolos, instructivos de trabajo.		Coordinadora administrativa			✓
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa			✓
Inducción en SST	Políticas		Responsable SST			✓
	Reglamento de higiene y seguridad industrial.		Responsable SST			✓
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST			✓
	Matriz de identificación de Peligros		Responsable SST			✓
	EPP		Responsable SST			✓
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST			✓
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST			✓
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.		Coordinador de obra			✓
	Posición del cargo dentro de la estructura.		Asistente contable			✓
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra			✓
	Líneas de comunicación y autoridad.		Representante legal			✓
	Objetivos y funciones del cargo.		Representante legal			✓
	Procedimientos de la unidad o área.		Coordinador de obra			
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra			

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			X
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			X
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			X
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			X
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.			X
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			X
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			X
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			X

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: Si.

3. Haría usted alguna recomendación para mejorar este proceso de Inducción? No ¿Cuál?

Firma del Trabajador: [signature]

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI ☒ NO ☐
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI ☐ NO ☒
OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: ES-SST-FT-001 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Dayis Tarazona S.	C.C:	1007539444
ÁREA:	Operativa	CARGO:	Ayudante

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentacion de historia del Contratista	15 oct	Asistente contable	Gineth Pabon	✓	
	Presentación Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional.)		Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento Interno de Trabajo, Políticas Organizacionales).		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal.		Asistente contable			
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal).	15 octubre 25	Coordinadora administrativa	Gineth Pabon	✓	
	Seguridad (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa		✓	
	Protocolos, instructivos de trabajo.		Coordinadora administrativa		✓	
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa		✓	
Inducción en SST	Políticas		Responsable SST		✓	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial.		Responsable SST		✓	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST		✓	
	Matriz de Identificación de Peligros		Responsable SST		✓	
	EPP		Responsable SST		✓	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		✓	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		✓	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.	15 octubre 25	Coordinador de obra	Gineth Pabon	✓	
	Posición del cargo dentro de la estructura.		Asistente contable		✓	
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra		✓	
	Líneas de comunicación y autoridad.		Representante legal		✓	
	Objetivos y funciones del cargo.		Representante legal		✓	
	Procedimientos de la unidad o Área		Coordinador de obra		✓	
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra		✓	

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			X
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			X
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			X
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			X
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.			X
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			X
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			X
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			X

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: Si

3. Haría usted alguna recomendación para mejorar este proceso de Inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador: Dayis Tarazona S.

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI ☒ NO ☐
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI ☐ NO ☐
OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES SST-FT-001 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Nixon Armando Carrascal **C.C:** 13,176,421
ÁREA: Operativa **CARGO:** ayudante

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del Contratista	15 oct	Asistente contable	Gineth Pabon	✓	
	Presentación Plataforma Estratégica. (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional.)		Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento Interno de Trabajo, Políticas Organizacionales).		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo – Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal		Asistente contable			
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal).	15 octubre/25	Coordinadora administrativa			
	Seguridad (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa			
	Protocolos, instructivos de trabajo.		Coordinadora administrativa			
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa			
Inducción en SST	Políticas		Responsable SST	Gineth Pabon		
	Reglamento de higiene y seguridad industrial.		Responsable SST			
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores.		Responsable SST			
	Matriz de Identificación de Peligros		Responsable SST			
	EPP		Responsable SST			
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST			
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST			
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.	15 octubre/25	Coordinador de obra	Gineth Pabon		
	Posición del cargo dentro de la estructura		Asistente contable			
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra			
	Líneas de comunicación y autoridad.		Representante legal			
	Objetivos y funciones del cargo.		Representante legal			
	Procedimientos de la unidad o Área.		Coordinador de obra			
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra			

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporciono información sobre el consorcio.			X
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			X
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			X
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			X
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.			X
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			X
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			X
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			X

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: si a todo

3. Haría usted alguna recomendación para mejorar este proceso de inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador: Nixon Carrascal

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI [X] NO [ ]
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI [ ] NO [X]
OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES-SST-FT-001 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Juan Carlos Vargas Calderon	C.C: 1.096.234.371	
ÁREA:	Operativa	**CARGO:**	Obrero

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Induccion a la organización	Bienvenida y presentacion de historia del Contratista	15 oct	Asistente contable	Gineth Pabon	✓	
	Presentación Plataforma Estratégica. (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional.)		Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento Interno de Trabajo, Políticas Organizacionales).		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo – Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal.		Asistente contable			
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal).	15 octubre/25	Coordinadora administrativa		✓	
	Seguridad (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa		✓	
	Protocolos, instructivos de trabajo.		Coordinadora administrativa		✓	
	Plan de Gestion de Residuos		Coordinadora administrativa		✓	
Inducción en SST	Politicas		Responsable SST	Gineth Pabon	✓	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial.		Responsable SST		✓	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST		✓	
	Matriz de Identificación de Peligros		Responsable SST		✓	
	EPP		Responsable SST		✓	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		✓	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		✓	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.	15 octubre/25	Coordinador de obra	Gineth Pabon	✓	
	Posición del cargo dentro de la estructura		Asistente contable		✓	
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra		✓	
	Lineas de comunicación y autoridad.		Representante legal		✓	
	Objetivos y funciones del cargo		Representante legal		✓	
	Procedimientos de la unidad o Area.		Coordinador de obra		✓	
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra		✓	

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			X
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			X
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			X
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			X
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.			X
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			X
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			X
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			X

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: Si

3. Haria usted alguna recomendación para mejorar este proceso de inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador: Juan Carlos Vargas

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI ☒ NO ☐
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI ☐ NO ☒
OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES-SST-FT-001 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Dayner Steven contreras C.C: 1003748724

ÁREA: Operativa **CARGO:** Ayudante

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del Contratista	15 octubre	Asistente contable	Gineth Pabon	✓	
	Presentación Plataforma Estratégica. (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional.)		Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento Interno de Trabajo, Políticas Organizacionales).		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo – Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal.		Asistente contable			
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal).	15 octubre/25	Coordinadora administrativa		✓	
	Seguridad (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa		✓	
	Protocolos, instructivos de trabajo.		Coordinadora administrativa		✓	
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa		✓	
Inducción en SST	Políticas		Responsable SST	Gineth Pabon	✓	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial.		Responsable SST		✓	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST		✓	
	Matriz de Identificación de Peligros		Responsable SST		✓	
	EPP		Responsable SST		✓	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		✓	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		✓	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.	15 octubre/25	Coordinador de obra		✓	
	Posición del cargo dentro de la estructura.		Asistente contable		✓	
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra		✓	
	Líneas de comunicación y autoridad.		Representante legal		✓	
	Objetivos y funciones del cargo.		Representante legal		✓	
	Procedimientos de la unidad o Área.		Coordinador de obra		✓	
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra		✓	

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			X
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			X
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			X
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			X
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.			X
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			X
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			X
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			X

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: Si

3. Haría usted alguna recomendación para mejorar este proceso de inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador: Dayner contreras

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI [X] NO [ ]
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI [ ] NO [X]
OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES-SST-FT-001 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Leonardo Pinzón	C.C:	1.064838.234
ÁREA:	Oficina	CARGO:	Maestro

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del Contratista	15 octubre	Asistente contable		✓	
	Presentación Plataforma Estrategica. (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional.)		Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento Interno de Trabajo, Políticas Organizacionales).		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo – Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal.		Asistente contable			
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal).	15 octubre 2025	Coordinadora administrativa		✓	
	Seguridad (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa		✓	
	Protocolos, instructivos de trabajo.		Coordinadora administrativa		✓	
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa		✓	
Inducción en SST	Políticas		Responsable SST		✓	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial.		Responsable SST		✓	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST		✓	
	Matriz de Identificación de Peligros		Responsable SST		✓	
	EPP		Responsable SST		✓	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		✓	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		✓	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.	15 octubre	Coordinador de obra		✓	
	Posición del cargo dentro de la estructura.		Asistente contable		✓	
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra		✓	
	Líneas de comunicación y autoridad.		Representante legal		✓	
	Objetivos y funciones del cargo.		Representante legal		✓	
	Procedimientos de la unidad o Área.		Coordinador de obra			
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra			

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			X
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			X
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			X
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			X
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.			X
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			X
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			X
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			X

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: SI

3. Haría usted alguna recomendación para mejorar este proceso de inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador: Leonardo Pinzón

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción: SI ☒ NO ☐
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar: SI ☐ NO ☒
OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO ALCANTARILLADO

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES-SST-FT-001 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: DAIRO CHACÓN URIBE **C.C:** [redacted]1064 840 945

ÁREA: OPERATIVA **CARGO:** MAESTRO

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del Contratista	15 octubre	Asistente contable	Gineth Pabon		
	Presentación Plataforma Estratégica. (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional.)		Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento interno de Trabajo, Políticas Organizacionales).		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo – Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal.		Asistente contable			
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal).	15 octubre /25	Coordinadora administrativa		✓	
	Seguridad (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa		✓	
	Protocolos, instructivos de trabajo		Coordinadora administrativa		✓	
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa		✓	
Inducción en SST	Políticas		Responsable SST		✓	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial.		Responsable SST		✓	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST		✓	
	Matriz de identificación de Peligros		Responsable SST		✓	
	EPP		Responsable SST		✓	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		✓	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		✓	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.	15 octubre	Coordinador de obra	Gineth Pabon	✓	
	Posición del cargo dentro de la estructura.		Asistente contable		✓	
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra		✓	
	Líneas de comunicación y autoridad.		Representante legal		✓	
	Objetivos y funciones del cargo.		Representante legal		✓	
	Procedimientos de la unidad o Área.		Coordinador de obra			
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra			

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			X
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			X
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			X
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			X
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.			X
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			X
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			X
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			X

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: SI

3. Haría usted alguna recomendación para mejorar este proceso de inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador: Dairo Chacon Uribe

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI ☒ NO ☐
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI ☐ NO ☒
OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES-SST-FT-001 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Victor Manuel Mejia Cardenas — **C.C:** 1064791134
ÁREA: Operativa — **CARGO:** Aydante

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del Contratista	15 octubre	Asistente contable	Gineth Pabon	✓	
	Presentación Plataforma Estratégica. (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional.)		Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento Interno de Trabajo, Políticas Organizacionales).		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal.		Asistente contable			
Según sus funciones requiera entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa		✓	
	Seguridad (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa		✓	
	Protocolos, instructivos de trabajo.		Coordinadora administrativa		✓	
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa		✓	
Inducción en SST	Políticas	15 octubre 125	Responsable SST	Gineth Pabon	✓	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial.		Responsable SST		✓	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST		✓	
	Matriz de Identificación de Peligros		Responsable SST		✓	
	EPP		Responsable SST		✓	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		✓	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		✓	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.	15 octubre	Coordinador de obra	Gineth Pabon	✓	
	Posición del cargo dentro de la estructura.		Asistente contable		✓	
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra		✓	
	Líneas de comunicación y autoridad.		Representante legal		✓	
	Objetivos y funciones del cargo.		Representante legal		✓	
	Procedimientos de la unidad o Área.		Coordinador de obra			
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra			

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			X
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			X
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			X
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			X
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.			X
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			X
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			X
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			X

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: SI

3. Haría usted alguna recomendación para mejorar este proceso de inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador: Victor M

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI [X] NO [ ]
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI [ ] NO [X]
OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES-SST-FT-003 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Marco Antonio Hernandez	C.C: 1068 [illegible] 1068 [illegible] 3
ÁREA:	Operativa	CARGO: Ayudante de obra

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del Contratista	15 octubre	Asistente contable	Graciela	✓	
	Presentación Plataforma Estratégica. (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional.)		Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento Interno de Trabajo, Políticas Organizacionales).		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal.		Asistente contable			
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa		✓	
	Seguridad (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa		✓	
	Protocolos, instructivos de trabajo.		Coordinadora administrativa		✓	
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa		✓	
Inducción en SST	Políticas	15 octubre /25	Responsable SST	Gineth Rojas	✓	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial.		Responsable SST		✓	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST		✓	
	Matriz de Identificación de Peligros		Responsable SST		✓	
	EPP		Responsable SST		✓	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		✓	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		✓	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.	15 octubre	Coordinador de obra	Gineth Rojas	✓	
	Posición del cargo dentro de la estructura.		Asistente contable		✓	
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra		✓	
	Líneas de comunicación y autoridad.		Representante legal		✓	
	Objetivos y funciones del cargo.		Representante legal		✓	
	Procedimientos de la unidad o Área.		Coordinador de obra			
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra			

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			X
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			X
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			X
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			X
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.			X
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado			X
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			X
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			X

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: Si

3. Haría usted alguna recomendación para mejorar este proceso de inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador: Marco Hernandez

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI [X] NO [ ]
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI [ ] NO [X]
OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES-SST-FT-001 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Ronald Emiro Sanchez Ascanio **CC:** [redacted] 3004903719
ÁREA: Operativo **CARGO:** Ayudante

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del Contratista	15 Octubre	Asistente contable		✓	
	Presentación Plataforma Estratégica. (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional.)		Coordinadora administrativa	Gineth Pabon	✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento Interno de Trabajo, Políticas Organizacionales).		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal.		Asistente contable		✓	
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal)	15 Octubre /25	Coordinadora administrativa		✓	
	Seguridad (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa		✓	
	Protocolos, instructivos de trabajo.		Coordinadora administrativa		✓	
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa		✓	
Inducción en SST	Políticas		Responsable SST		✓	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial		Responsable SST		✓	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST	Gineth Pabon	✓	
	Matriz de identificación de Peligros		Responsable SST		✓	
	EPP		Responsable SST		✓	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		✓	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		✓	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.	15 Octubre	Coordinador de obra		✓	
	Posición del cargo dentro de la estructura		Asistente contable	Gineth Pabon	✓	
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra		✓	
	Líneas de comunicación y autoridad		Representante legal		✓	
	Objetivos y funciones del cargo.	15 Octubre	Representante legal			
	Procedimientos de la unidad o Área.		Coordinador de obra			
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra			

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			X
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			X
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			X
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			X
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.			X
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			X
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			X
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			X

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: SI

3. Haría usted alguna recomendación para mejorar este proceso de Inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador: Ronald Sanchez

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI [X] NO [ ]
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI [ ] NO [X]
OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES-SST-FT-001 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Guver Antonio Sanchez Pineda	C.C:	1317575?2
ÁREA:	Operativa	CARGO:	Ayudante de Obra

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del Contratista		Asistente contable		✓	
	Presentación Plataforma Estrategica. (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional.)	15 oct.	Coordinadora administrativa	Gineth Pabon	✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento interno de Trabajo, Políticas Organizacionales).		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal.		Asistente contable			
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Especifico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal).	15 octubre/25	Coordinadora administrativa	Gineth Pabon	✓	
	Seguridad (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa		✓	
	Protocolos, instructivos de trabajo.		Coordinadora administrativa		✓	
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa		✓	
Inducción en SST	Políticas		Responsable SST		✓	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial.		Responsable SST		✓	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST		✓	
	Matriz de Identificación de Peligros		Responsable SST		✓	
	EPP		Responsable SST		✓	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		✓	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		✓	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.	15 Octubre/25	Coordinador de obra	Gineth Pabon	✓	
	Posición del cargo dentro de la estructura.		Asistente contable		✓	
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra		✓	
	Lineas de comunicación y autoridad.		Representante legal		✓	
	Objetivos y funciones del cargo.		Representante legal			
	Procedimientos de la unidad o Área.		Coordinador de obra			
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra			

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			X
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			X
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			X
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			X
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.			X
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			X
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			X
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			X

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: Si

3. Haria usted alguna recomendación para mejorar este proceso de inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador: NO FIRMA

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI [X] NO [ ]
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI [ ] NO [X]
OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES-SST-FT-001 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: yuneidy Rodriguez Rios **C.C:** 13.178.015

ÁREA: Operativa **CARGO:** Ayudante.

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del Contratista	15 octubre	Asistente contable		✓	
	Presentación Plataforma Estratégica. (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional.)		Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento interno de Trabajo, Políticas Organizacionales).		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal		Asistente contable			
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal).	15 octubre/25	Coordinadora administrativa		✓	
	Seguridad (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa		✓	
	Protocolos, instructivos de trabajo.		Coordinadora administrativa		✓	
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa		✓	
Inducción en SST	Políticas		Responsable SST		✓	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial.		Responsable SST		✓	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST		✓	
	Matriz de Identificación de Peligros		Responsable SST		✓	
	EPP		Responsable SST		✓	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		✓	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		✓	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.	15 octubre/25	Coordinador de obra		✓	
	Posición del cargo dentro de la estructura.		Asistente contable		✓	
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra		✓	
	Líneas de comunicación y autoridad.		Representante legal		✓	
	Objetivos y funciones del cargo.		Representante legal			
	Procedimientos de la unidad o Área.		Coordinador de obra			
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra			

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			X
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			X
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			X
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			X
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.			X
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			X
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			X
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			X

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: Si

3. Haría usted alguna recomendación para mejorar esté proceso de Inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador: yunley Rios

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI ☒ NO ☐
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI ☐ NO ☒
OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES-SST-FT-001 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Marcial Pallares V.	C.C:	1064839866
ÁREA:	Operativa	CARGO:	Ing Residente

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del Contratista	15 Octubre	Asistente contable		✓	
	Presentación Plataforma Estratégica. (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional.)		Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento interno de Trabajo, Políticas Organizacionales).		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo – Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal.		Asistente contable			
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal).	15 Octubre/25	Coordinadora administrativa		✓	
	Seguridad (Todo el Personal)		Coordinadora administrativa		✓	
	Protocolos, instructivos de trabajo.		Coordinadora administrativa		✓	
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa		✓	
Inducción en SST	Políticas		Responsable SST		✓	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial.		Responsable SST		✓	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST		✓	
	Matriz de Identificación de Peligros		Responsable SST		✓	
	EPP		Responsable SST		✓	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		✓	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		✓	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo	15 Octubre/25	Coordinador de obra		✓	
	Posición del cargo dentro de la estructura.		Asistente contable		✓	
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra		✓	
	Líneas de comunicación y autoridad.		Representante legal		✓	
	Objetivos y funciones del cargo.		Representante legal		✓	
	Procedimientos de la unidad o Área.		Coordinador de obra			
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra			

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			X
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			X
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			X
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			X
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.			X
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			X
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			X
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			X

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: Si.

3. Haría usted alguna recomendación para mejorar este proceso de Inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador: Marcial Pallares V.

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI [X] NO [ ]
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI [ ] NO [X]
OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES-SST-FT-001 Version: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: JOSE RAFAEL trillos mejia C.C: 5054286
ÁREA: OPERACIONES **CARGO:** AYUDANTE

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del Contratista	15 OCT	Asistente contable		V	
	Presentación Plataforma Estratégica. (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional.)		Coordinadora administrativa		V	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento Interno de Trabajo, Políticas Organizacionales).		Coordinadora administrativa		V	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		V	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		V	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal.		Asistente contable			
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa			
	Seguridad (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa			
	Protocolos, instructivos de trabajo.		Coordinadora administrativa			
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa			
Inducción en SST	Políticas	15 octubre 2025	Responsable SST			
	Reglamento de higiene y seguridad industrial		Responsable SST			
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST			
	Matriz de Identificación de Peligros		Responsable SST			
	EPP		Responsable SST			
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST			
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST			
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.		Coordinador de obra			
	Posición del cargo dentro de la estructura.		Asistente contable			
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra			
	Líneas de comunicación y autoridad.		Representante legal			
	Objetivos y funciones del cargo.		Representante legal			
	Procedimientos de la unidad o Área.		Coordinador de obra			
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra			

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			X
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			X
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			X
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			X
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.			X
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			X
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			X
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			X

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: SI

3. Haría usted alguna recomendación para mejorar este proceso de Inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador:

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI [X] NO [ ]
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI [ ] NO [X]
OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FS SST FT 001 Version: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Jhonatan Duran	C.C:	1092670290
ÁREA:	Operativa	CARGO:	ayudante

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del contratista	15 oct	Asistente contable	6 - NOV 25	✓	
	Presentación Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional)		Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento Interno de Trabajo, Políticas Organizacionales)		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal		Asistente contable		✓	
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal)	15 octubre 2025	Coordinadora administrativa		✓	
	Seguridad (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa		✓	
	Protocolos, instructivos de trabajo.		Coordinadora administrativa		✓	
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa		✓	
Inducción en SST	Políticas		Responsable SST		✓	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial		Responsable SST		✓	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST		✓	
	Matriz de Identificación de Peligros		Responsable SST		✓	
	EPP		Responsable SST		✓	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		✓	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		✓	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.	15 octubre 2025	Coordinador de obra		✓	
	Posición del cargo dentro de la estructura.		Asistente contable		✓	
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra		✓	
	Líneas de comunicación y autoridad.		Representante legal		✓	
	Objetivos y funciones del cargo.		Representante legal		✓	
	Procedimientos de la unidad o Área.		Coordinador de obra		✓	
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra		✓	

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			✓
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			✓
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			✓
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			✓
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción			✓
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			✓
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			✓
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			✓

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: Si

3. Hacia usted alguna recomendación para mejorar este proceso de inducción? NO ¿Cual?

Firma del Trabajador: Jhonatan Duran

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI ☑ NO ☐
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI ☐ NO ☑
OBSERVACIONES GENERALES

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: FT-SST-001 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Alexander Perez Cortes	CC	1092670495
ÁREA: Operativa	CARGO	Aydante	

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del Consorcio	15 octubre	Asistente contable		✓	
	Presentación Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional)		Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento Interno de Trabajo, Políticas Organizacionales)		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal		Asistente contable		✓	
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal)	2025	Coordinadora administrativa		✓	
	Seguridad (Todo el Personal)		Coordinadora administrativa		✓	
	Protocolos, instructivos de trabajo		Coordinadora administrativa		✓	
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa		✓	
Inducción en SST	Políticas	15 octubre	Responsable SST		✓	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial		Responsable SST		✓	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST		✓	
	Matriz de identificación de Peligros		Responsable SST		✓	
	EPP		Responsable SST		✓	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		✓	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		✓	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo	15	Coordinador de obra		✓	
	Posición del cargo dentro de la estructura		Asistente contable		✓	
	Localización física del puesto de trabajo		Coordinador de obra		✓	
	Líneas de comunicación y autoridad		Representante legal		✓	
	Objetivos y funciones del cargo		Representante legal		✓	
	Procedimientos de la unidad o Área		Coordinador de obra		✓	
	Alcances y limitaciones		Coordinador de obra		✓	

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporciono información sobre el consorcio			✓
b. Adquirio conocimiento sobre las funciones de su cargo			✓
c. Se cumplio con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción			✓
d. Recibio orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo			✓
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción			✓
f. Se cumplio con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado			✓
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo			✓
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar			✓

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: Si claro

3. Haria usted alguna recomendación para mejorar este proceso de inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador: ALEXANDER PEREZ C.

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI [X] NO [ ]
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI [ ] NO [X]
OBSERVACIONES GENERALES

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES-SST-FT-001 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Yamer elias Lozano	CC:	1148490336
ÁREA:	Operativa	CARGO:	Ayudante

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de Historia del Contratista		Asistente contable		✓	
	Presentación Plataforma Estrategica: (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional.)	8 Oct.	Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento Interno de trabajo, Politicas Organizacionales)		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo – Plan Operativo de Emergencias	15	Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal.		Asistente contable		✓	
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Especifico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal).	15 octubre 2025	Coordinadora administrativa		✓	
	Seguridad (Todo el Personal).		Coordinadora administrativa		✓	
	Protocolos, instructivos de trabajo.		Coordinadora administrativa		✓	
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa		✓	
Inducción en SST	Politicas		Responsable SST		✓	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial.		Responsable SST		✓	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST		✓	
	Matriz de identificación de Peligros		Responsable SST		✓	
	EPP		Responsable SST		✓	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		✓	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		✓	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.	15 Octubre	Coordinador de obra		✓	
	Posición del cargo dentro de la estructura.		Asistente contable		✓	
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra		✓	
	Líneas de comunicación y autoridad.		Representante legal		✓	
	Objetivos y funciones del cargo.	15	Representante legal		✓	
	Procedimientos de la unidad o Área.		Coordinador de obra		✓	
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra		✓	

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			✓
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			✓
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			✓
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			✓
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción.			✓
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			✓
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo.			✓
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			✓

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: Si

3. Haria usted alguna recomendación para mejorar este proceso de inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador: Yamer L.

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI ☑ NO ☐
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI ☐ NO ☒
OBSERVACIONES GENERALES:

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES-SST-FT-001 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Yordan Stiven Ovallos	C.C:	1092691114
ÁREA:	Operativa	CARGO:	Ayudante

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del Contratista	15 oct	Asistente contable			
	Presentación Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional)		Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento Interno de Trabajo, Políticas Organizacionales)		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo – Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal		Asistente contable		✓	
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal)	15 oct 2025	Coordinadora administrativa		✓	
	Seguridad (Todo el Personal)		Coordinadora administrativa		✓	
	Protocolos, instructivos de trabajo		Coordinadora administrativa		✓	
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa		✓	
Inducción en SST	Políticas	15 octubre 2025	Responsable SST		✓	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial		Responsable SST		✓	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST		✓	
	Matriz de Identificación de Peligros		Responsable SST		✓	
	EPP		Responsable SST		✓	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		✓	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		✓	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo	15 octubre	Coordinador de obra		✓	
	Posición del cargo dentro de la estructura		Asistente contable		✓	
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra		✓	
	Líneas de comunicación y autoridad.		Representante legal		✓	
	Objetivos y funciones del cargo.		Representante legal		✓	
	Procedimientos de la unidad o Área.		Coordinador de obra		✓	
	Alcances y limitaciones.		Coordinador de obra		✓	

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			✓
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo			✓
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción.			✓
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			✓
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción			✓
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado.			✓
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo			✓
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar.			✓

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: SI

3. Haría usted alguna recomendación para mejorar este proceso de inducción? NO ¿Cuál?

Firma del Trabajador: Yordan Ovallos A.

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI [X] NO [ ]
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI [ ] NO [X]
OBSERVACIONES GENERALES

CONSORCIO ALCANTARILLADO

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Codigo: FT-SST-FT-003
Version: 005
Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Diego Leonardo Perez	C.C:	1092750643
ÁREA:	Operativa	**CARGO:**	Ayudante

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de Política del contratista	15 octubre	Asistente contable		✓	
	Presentación Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional)		Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer el reglamento interno de Trabajo, Políticas Organizacionales		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Áreas, Roles de Ambiental		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal		Asistente contable		✓	
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistematizados (Todo el Personal)	15 octubre /2025	Coordinadora administrativa		✓	
	Seguridad (Todo el Personal)		Coordinadora administrativa		✓	
	Protocolos, instructivos de trabajo		Coordinadora administrativa		✓	
	Plan de Gestión de Residuos		Coordinadora administrativa		✓	
Inducción en SST	Políticas		Responsable SST		✓	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial		Responsable SST		✓	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST	Robo	✓	
	Matriz de identificación de Peligros		Responsable SST		✓	
	EPP		Responsable SST		✓	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		✓	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		✓	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.	15 octubre	Coordinador de obra		✓	
	Posición del cargo dentro de la estructura		Asistente contable		✓	
	Localización física del puesto de trabajo		Coordinador de obra		✓	
	Líneas de comunicación y autoridad		Representante legal		✓	
	Objetivos y funciones del cargo		Representante legal		✓	
	Procedimientos de la unidad o Área		Coordinador de obra		✓	
	Alcances y limitaciones		Coordinador de obra		✓	

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos según la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporcionó información sobre el consorcio.			✓
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo.			✓
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción			✓
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			✓
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción			✓
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado			✓
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo			✓
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar			✓

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: Si

3. Haría usted alguna recomendación para mejorar este proceso de inducción? NO ¿Cual?

Firma del Trabajador: Diego Leonardo Perez

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI [X] NO [ ]
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI [ ] NO [X]
OBSERVACIONES GENERALES

CONSORCIO ALCANTARILLADO

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: 15-SST-ST-005 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Reinaldo manosalva	C.C:	5.084.605
ÁREA:	Oficina	CARGO:	Ayudante

FORMATO PARA INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN AL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AGENDA FECHA	RESPONSABLE INDUCCIÓN	FIRMA	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
Inducción a la organización	Bienvenida y presentación de historia del Contratista		Asistente contable		✓	
	Presentación Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Valores Corporativos, Objetivos Organizacionales, Estructura Organizacional)	15 NOV	Coordinadora administrativa		✓	
	Dar a conocer la normatividad (Reglamento Interno de Trabajo, Políticas Organizacionales)		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Bienestar		Coordinadora administrativa		✓	
	Presentación de las Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - Plan Operativo de Emergencias		Coordinadora administrativa		✓	
	Recorrido por las instalaciones del consorcio y Presentación al Personal		Asistente contable		✓	
Según sus funciones requiere entrenamiento en:						
Entrenamiento Específico	Aplicativos Sistemáticos (Todo el Personal)	15 noviembre 2025	Coordinadora administrativa		✓	
	Seguridad (Toda el Personal).		Coordinadora administrativa		✓	
	Protocolos, instructivos de trabajo		Coordinadora administrativa		✓	
	Plan de Gestion de Residuos		Coordinadora administrativa		✓	
Inducción en SST	Políticas		Responsable SST		✓	
	Reglamento de higiene y seguridad industrial		Responsable SST		✓	
	Obligaciones y responsabilidades del empleador y los trabajadores		Responsable SST		✓	
	Matriz de Identificación de Peligros		Responsable SST		✓	
	EPP		Responsable SST		✓	
	Accidentes, incidentes y enfermedades laborales		Responsable SST		✓	
	Cronograma de actividades en SST		Responsable SST		✓	
Presentación del cargo	Presentación al Jefe y Equipo de Trabajo.	15 NOVIEMBRE 2025	Coordinador de obra		✓	
	Posicion del cargo dentro de la estructura		Asistente contable		✓	
	Localización física del puesto de trabajo.		Coordinador de obra		✓	
	Lineas de comunicacion y autoridad		Representante legal		✓	
	Objetivos y funciones del cargo		Representante legal		✓	
	Procedimientos de la unidad o Área		Coordinador de obra		✓	
	Alcances y limitaciones		Coordinador de obra		✓	

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN

1. Favor califique los siguientes aspectos segun la escala: 1. Inferior 2. Medio 3. Superior

FACTOR	CALIFICACIÓN 1	2	3
a. Se le proporciono información sobre el consorcio			✓
b. Adquirió conocimiento sobre las funciones de su cargo			✓
c. Se cumplió con las expectativas con relación a los conocimientos adquiridos en la inducción			✓
d. Recibió orientación, apoyo y/o retroalimentación para desarrollar mejor su trabajo.			✓
e. Considera suficiente el tiempo de la inducción			✓
f. Se cumplió con la agenda de inducción en cuanto a la coordinación y ejecución de lo programado			✓
g. Entrega de documentos y/o herramientas de trabajo de acuerdo al cargo			✓
h. Se logró un correcto entrenamiento y fue acorde al cargo a desempeñar			✓

2. Con la inducción recibida usted considera que se encuentra preparado para desempeñar el nuevo cargo?
Explique: Si

3. Haria usted alguna recomendación para mejorar este proceso de inducción? NO ¿Cual?

Firma del Trabajador: Reinaldo Manosalva

PARA USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Se cumplió con el objetivo del programa de inducción SI [X] NO [ ]
El programa de inducción debe ser modificado o se debe volver a programar SI [ ] NO [X]
OBSERVACIONES GENERALES:

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO ALCANTARILLADO.. se compromete con la prevención de accidentes y enfermedades laborales, protección y promoción de la salud de todos los trabajadores independientemente de su vinculación laboral en las diferentes áreas de trabajo manteniendo unas condiciones seguras y saludables, procurando su integridad física mediante actividades que se desarrollen por medio de la planificación, la organización, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el fin de identificar, evaluar y controlar los riesgos que puedan llegar a afectar la seguridad y salud en el trabajo de toda la organización.

El responsable asignado por la empresa para liderar el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, cuenta con el apoyo de la alta dirección quien asume la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro, vinculando a las partes interesadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo como al COPASST o VIGIA y trabajadores en general, mediante el compromiso de los mismos con las actividades de seguridad y salud en el trabajo.

CONSORCIO ALCANTARILLADO., tiene un firme compromiso para cumplir la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales establecidas por el Ministerio de Trabajo.

Para el cumplimiento de esta Politica y el logro de los objetivos establecidos por la alta dirección, el CONSORCIO ALCANTARILLADO., destina recursos humanos, físicos y financieros requeridos para la oportuna identificación, valoración e intervención de los peligros que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias, así como los que se requieren para el desarrollo efectivo de actividades y programas que contribuyen a fortalecer la eficiencia de los trabajadores, la competitividad y buena imagen de la empresa.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Ocaña, Norte de Santander, octubre 2025

RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA
Representante Legal

CONSORCIO ALCANTARILLADO	ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Ronald Sánchez A.
Cargo	Ayudante
Fecha	15-octubre-2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
X b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
X a. Soltero (a)
b. Casado (a)/Union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
X a. Masculino
b. Femenino

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
X a. Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
X b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestría

6. TENENCIA DE VIVIENDA
X a. Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
X e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
X a. Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
X a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
X a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
X d. Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA
a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
X c. Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, balonterapias etc)
X f. Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
X b. Si
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional X

14. FUMA
X a. Si
b. No
Promedio diario 2

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
X Si

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
X a. No
b. Si
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional _____

Ley 1581 de 2012. De protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Guver Antonio Jaimes Rueda
Cargo	Ay-dante de Obra
Fecha:	16-octubre-2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
✗ 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
✗ Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
✗ Masculino
b. Femenino

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
✗ Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
✗ Primaria
b. Secundaria
c. Tecnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
✗ Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
✗ Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
✗ Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
✗ Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
✗ Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
✗ Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA

a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
✗ Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, baloniterapias etc)
✗ Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
✗ Si
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional ✗

14. FUMA
a. Si
✗ No
Promedio diario ___

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
✗ Si

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. No
✗ Si
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional ✗

Ley 1581 de 2012. De proteccion de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación

ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	CARLOS ALBERTO
Cargo	AYUDANTE
Fecha	15 - OCTUBRE - 25

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
X 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
X Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
X Masculino
b. Femenino

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
X Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
X Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
X Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
X Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
X Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN
a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
X Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA
a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
X Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, baloterapias etc)
X Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
X Si
Semanal ____
Mensual ____
Quincenal ____
Ocasional X

14. FUMA
a. Si
X No
Promedio diario ____

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
X Si

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
X No
b. Si
Diario ____
Semanal ____
Quincenal ____
Mensual ____
Ocasional ____

Ley 1581 de 2012. De protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Mario Hernandez
Cargo	1006377491 Operario auxiliar obra
Fecha:	15 - Octubre - 2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
x d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
Xa. Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
x a. Masculino
b. Femenino

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
Xa. Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 5 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
x c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
Xb. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
Xd. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
x a. Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
Xa. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
X a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN
a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
Xd. Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA
a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
Xc. Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, baloterapias etc.)
Xf. Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
Xb. Si
Semanal: X
Mensual
Quincenal
Ocasional

14. FUMA
Xa. Si
b. No
Promedio diario (1)

15.CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
X b. Si

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
Xa. No
b. Si
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Ocasional

Ley 1581 de 2012. De protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

CONSORCIO ALCANTARILLADO

ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Leonardo Pinzon
Cargo	Maestro
Fecha:	16-octubre-2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
X. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
X. Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GENERO
X. Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
X. Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
X. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
X. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
X. Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
a. Mínimo Legal (S.M.L.)
X. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA
X. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
X. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
X. Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA
a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
X. Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, balonterapias etc)
X. Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
X. No
b. SI
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

14. FUMA
a. Si
X. No
Promedio diario ____

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
X. SI

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. No
X. SI
Diario X
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional _____

Ley 1581 de 2012. De protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

CONSORCIO ALCANTARILLADO

ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Divis Tuvazma S.
Cargo	Ayudante
Fecha:	16-OCTUBRE-2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
(c). 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
(a) Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
(a) Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
(a) Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
(a) Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
(c) Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
(e) Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
(a) Minimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Mas de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
(d) Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA
a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
(c) Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumboterapias, balonterapias, etc.)
(f) Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
(b) Si
Semanal ____
Mensual ____
Quincenal ____
Ocasional X

14. FUMA
a. Si
(b) No
Promedio diario ____

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
(b) Si

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. No
(b) Si
Diario X
Semanal ____
Quincenal ____
Mensual ____
Ocasional ____

Ley 1581 de 2012. De protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

CONSORCIO ALCANTARILLADO	ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	DAIRO CHACÓN URIBE
Cargo	MAESTRO
Fecha:	16 - octubre - 2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
X 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
X Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
X Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
X Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 5 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
X Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
X Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
X Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
a. Mínimo Legal (S.M.L.)
X Entre 1 a 3 S.M.L
c. Entre 4 a 5 S.M.L
d. Entre 5 y 6 S.M.L
e. Mas de 7 S.M.L

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
X Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA

a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
X Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periodicos
e. Gimnasia Laboral (Rumboterapias, balonterapias etc)
X Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
X No
b. Si
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

14. FUMA
a. Si
X No
Promedio diario ___

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
X Si

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
X No
b. Si
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional _____

Ley 1581 de 2012. De protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

CONSORCIO ALCANTARILLADO	ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada.

Nombre	Nixon cayrasco
Cargo	ayudante
Fecha	16 - octubre - 2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
x 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
x Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
x Masculino
b. Femenino

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
x Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
x Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
x Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domesticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
x Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
x Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
x Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
x Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
x Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA

a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
x Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, bioriterapias etc.)
x Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
x No
b. SI
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

14. FUMA
a. Si
x No
Promedio diario ___

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
x SI

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
x No
b. SI
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional _____

Ley 1581 de 2012. De protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

CONSORCIO ALCANTARILLADO	ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Victor Manuel Mejia Cardenas
Cargo	Ayudante
Fecha	16 - octubre - 2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
(b) 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
(a) Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
(a) Masculino
b. Femenino

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
(a) Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
(b) Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
(c) Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
(d) Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
(a) Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN
a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
(d) Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA
a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
(c) Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, balonterapias etc)
(f) Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
(a) No
b. SI
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

14. FUMA
a. Si
(b) No
Promedio diario ___

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
(b) SI

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. No
(b) SI
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual X
Ocasional _____

Ley 1581 de 2012 "De protección de datos personales", es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

CONSORCIO ALCANTARILLADO	ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Dayner Steven Contreras
Cargo	ayudante
Fecha	16 - Octubre - 2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
X. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
X. Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
X. Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
X. Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
X. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestría

6. TENENCIA DE VIVIENDA
X. Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
X. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
X. Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA
X. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
X. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
X. Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA

a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
X. Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, baiunderapias etc.)
X. Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
X. SI
Semanal ____
Mensual ____
Quincenal ____
Ocasional X

14. FUMA
a. Si
X. No
Promedio diario ___

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
X. SI

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. No
b. X
Diario X
Semanal ____
Quincenal ____
Mensual ____
Ocasional ____

Ley 1581 de 2012. De proteccion de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

CONSORCIO	ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Diego Andres Carlos Jacome.
Cargo	Ay. Logistic
Fecha:	16 - Octubre - 2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
X. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
X. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GENERO
X. Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
X Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
X. Secundaria
c. Tecnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
X. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familias(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
X. Labores domesticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
X. Mínimo Legal (1 S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L
c. Entre 4 a 5 S.M.L
d. Entre 5 y 6 S.M.L
e. Mas de 7 S.M.L

9. ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA
X. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGUEDAD EN EL CARGO ACTUAL
X. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
X. Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA
a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
X. Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, baloneterapias etc)
X. Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
X. No
b. Si
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

14. FUMA
a. Si
X. No
Promedio diario ___

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
X. Si

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
X. No
b. Si
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional _____

Ley 1581 de 2012. De protección de datos personales es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación

CONSORCIO ALCANTARILLADO	ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Jose delfin trillos mejia
Cargo	ayudante
Fecha	6 - octubre - 2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
X 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
X Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
X Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
X Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
X Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestría

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
X Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
X Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
X Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
X Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA

a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
X Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, baloncestopias etc.)
X Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. **X**
b. Si
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

14. FUMA
a. Si
X No
Promedio diario ____

15 CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
X Si

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. **X**
b. Si
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional _____

Ley 1581 de 2012. De protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Juan camilo Vental
Cargo	obrero
Fecha:	16 - OCTubre - 2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
a. Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnologo
d. Universitario
e. Especialista / Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domesticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
a. Minimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGUEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACION
a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
d. Contrato de Prestacion de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA
a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
c. Examenes de laboratorio/otros
d. Examenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, baloterapias etc)
f. Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
b. Si
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

14. FUMA
a. Si
b. No
Promedio diario ___

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
b. Si

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. No
b. Si
Diario _____
Semana _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional X

Ley 1581 de 2012. De protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación

CONSORCIO ALCANTARILLADO	ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Cristian [illegible]
Cargo	Maestro
Fecha:	16 - Octubre 2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
X 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
X Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
X Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
X Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Mas de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
X Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
X Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
X Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
a. Mínimo Legal (S.M.L.)
X Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
X De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
X Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA

a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
X Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, balonterapias etc)
X Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
X No
b. SI
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

14. FUMA
a. Si
X No
Promedio diario ___

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
(X) SI

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
X No
b. SI
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional X

Ley 1581 de 2012. De proteccion de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Marial Pallari V.
Cargo	Ingeniero Residente
Fecha:	16 - octubre - 2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
X 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
X Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
X Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
X Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
X Universitario
e. Especialista / Maestría

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
X Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
X Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
a. Mínimo Legal (S.M.L.)
X Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
X Por obra o Labor
d. Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA

a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
X Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, baiunterapias etc)
X Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
X Si
Semanal: _____
Mensual: _____
Quincenal: _____
Ocasional: X

14. FUMA
a. Si
X No
Promedio diario: ___

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
X Si

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. No
X Si
Diario: _____
Semanal: _____
Quincenal: _____
Mensual: _____
Ocasional: X

Ley 1581 de 2012. De protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación

CONSORCIO ALCANTARILLADO	ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Yander, Trigos
Cargo	Ayudante
Fecha:	18-Octubre-2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
X 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
X Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
X Masculino
b. Femenino

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
X Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
X Secundaria
c. Tecnico / Tecnologo
d. Universitario
e. Especialista / Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
X Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
X Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
X Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L
c. Entre 4 a 5 S.M.L
d. Entre 5 y 6 S.M.L
e. Mas de 7 S.M.L

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
X Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA

a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
X Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, baloterapias etc)
X Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
X No
b. SI
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

14. FUMA
a. Si
X No
Promedio diario ____

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
X SI

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. No
X SI
Diario __X__
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional _____

Ley 1581 de 2012. De protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

CONSORCIO ALCANTARILLADO

ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el tratamiento de la misma es información clasificada

Nombre: Diego Fernando Perez Cortes
Cargo: CONSEJO
Fecha: 16 octubre 2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
X 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
X Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
X Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
X 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
X Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestría

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
X Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
X Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
a. Minimo Legal (S.M.L.)
X Entre 1 a 3 S.M.L
c. Entre 4 a 5 S.M.L
d. Entre 5 y 6 S.M.L
e. Mas de 7 S.M.L

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
X Por obra o Labor
d. Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA
a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
X Exámenes de laboratorio/otros
d. Examenes periodicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, baloneterapias etc)
X Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
X No
b. SI Semanal ____
Mensual ____
Quincenal ____
Ocasional ____

14. FUMA
a. Si
X No
Promedio diario ___

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
X Si

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
X No
b. SI Diario ____
Semanal ____
Quincenal ____
Mensual ____
Ocasional ____

Ley 1581 de 2012. De protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación

CONSORCIO ALCANTARILLADO

ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Jhonatan Duran
Cargo	Obrero
Fecha:	16- Octubre - 2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
a. Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestría

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
a. Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L
c. Entre 4 a 5 S.M.L
d. Entre 5 y 6 S.M.L
e. Mas de 7 S.M.L

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
d. Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA

a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
c. Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, balonterapias etc)
f. Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
b. SI — Semanal ___ Mensual ___ Quincenal ___ Ocasional ___

14. FUMA
a. Si
b. No
Promedio diario ___

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
b. SI

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. No
b. SI — Diario ___ Semanal ___ Quincenal ___ Mensual ___ Ocasional ___

Ley 1581 de 2012. De protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación

CONSORCIO ALCANTARILLADO

ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Alexander Perez Ocañeras
Cargo	Obrero
Fecha:	16-Octubre-2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
a. Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. *NIVEL DE ESCOLARIDAD*
a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
a. Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 6 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
d. Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA

a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
c. Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, baloterapias etc)
f. Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. *Ninguna*

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
b. SI
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

14. FUMA
a. Si
b. No
Promedio diario 1

15. CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
b. SI

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. No
b. SI
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional _____

Ley 1581 de 2012. De protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación

CONSORCIO ALCANTARILLADO

ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Yamiel Elias Lozano Patiño
Cargo	Obrero
Fecha:	16 - octubre - 2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
X 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
X Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
X Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
X 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
X Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
X Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
X Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
a. Minimo Legal (S.M.L.)
X Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
X Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA

a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
X Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laberal (Rumbaterapias, balonterapias etc)
X Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
X SI
Semanal ____
Mensual ____
Quincenal X
Ocasional ____

14. FUMA
a. Si
X No
Promedio diario ____

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
X SI

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
X No
b. SI
Diario ____
Semanal ____
Quincenal ____
Mensual ____
Ocasional ____

Ley 1581 de 2012. De protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación

CONSORCIO ALCANTARILLADO

ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Yeraldin Silva Carillo
Cargo	Oficios
Fecha	16 Octubre 2025

Encierre en un circulo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
X 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
b. Casado (a)/Union libre
X Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
X Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
X 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
X Primaria
b. Secundaria
c. Tecnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
X Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
X Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S M L)
X Minima Legal (S M L)
b. Entre 1 a 3 S M L
c. Entre 4 a 5 S M L
d. Entre 5 y 6 S M L
e. Mas de 7 S M L

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
X Contrato de Prestación de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA

a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
c. Exámenes de laboratorio/otros
X Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, balonterapias etc)
X Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
X Si
Semanal
Mensual X
Quincenal
Ocasional

14. FUMA
a. Si
X No
Promedio diario

15. CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
X Si

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
X No
b. Si
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Ocasional

Ley 1581 de 2012 De proteccion de datos personales es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior uso actualización y rectificación

CONSORCIO ALCANTARILLADO

ENCUESTA PARA EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

Nombre	Fernando Mondaluza
Cargo	Obrero
Fecha:	15 Noviembre 2025

Encierre en un círculo la respuesta que le corresponda

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
X 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
X Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GÉNERO
X Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
X 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 persona

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
X Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
X Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domesticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
X Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
a. Minimo Legal (S.M.L.)
X Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. A termino fijo
b. Indefinido
c. Por obra o Labor
X Contrato de Prestacion de Servicios
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR EMPRESA

a. Cardiovasculares y visuales
b. Salud oral
X Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Gimnasia Laboral (Rumbaterapias, baloterapias etc)
X Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo
g. Ninguna

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
X No
b. SI
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

14. FUMA
X Si
b. No
Promedio diario 1

15-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
X SI

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. No
X SI
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional X

Ley 1581 de 2012 De protección de datos personales es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho de habeas data que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación

Anexo. 3

CONSORCIO ALCANTARILLADO

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO: ES-067-MT-02 | VERSION: 001 | FECHA: 11/02/2025

REPRESENTANTE	RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA	DIRECCION	OCAÑA NORTE DE SANTANDER
FECHA INICIO	15 DE OCTUBRE DE 2025	ELABORADO POR	GINETH DAYANA PARA AREVALO
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO ENTRE LOS SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER		

PROCESO	ZONA/LUGAR	ACTIVIDAD	TAREA	RUTINARIA (SI o NO)	PELIGRO: DESCRIPCIÓN	PELIGRO: CLASIFICACIÓN	EFECTOS POSIBLES	CONTROL EXISTENTES: FUENTE	CONTROL EXISTENTES: MEDIO	CONTROL EXISTENTES: INDIVIDUO	EVALUACIÓN DEL RIESGO: Nivel de Deficiencia	EVALUACIÓN DEL RIESGO: Nivel de Exposición (NE)	EVALUACIÓN DEL RIESGO: Nivel de Probabilidad (NP)	EVALUACIÓN DEL RIESGO: Interpretación del Probabilidad	EVALUACIÓN DEL RIESGO: Nivel de Consecuencia	EVALUACIÓN DEL RIESGO: Significado Valoración del Nivel de Riesgo	VALORACIÓN DEL RIESGO: ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER: No. EXPOSITORES	CRITERIOS PARA ESTABLECER: PEOR CONSECUENCIA	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: ELIMINACIÓN	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: SUSTITUCIÓN	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: CONTROLES DE INGENIERIA	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: SEÑALIZACION, ADVERTENCIA, CONTROLES ADMINISTRATIVOS	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
CONSTRUCCIÓN	CAMPAMENTO OBRA	ADMINISTRATIVAS	Actividades de verificación, registros, informes, diligencias de protección personal y utilización para el personal de obra	SI	Infecciones, enfermedades transmitidas de agentes patógenos	BIOLOGICO (Virus y bacterias)	Fiebre, tos seca, dificultad para respirar, posible ruptura del saco o el parto	NE	Sobrevisión de uso de EPP y aseo permanente de la información Donde la mano, uso de higiénicos, ventilación natural, ventilación de puntos de humedad y Donde la mano) Notificación	Formación (verbal), Uso de EPP	6	4	24	ALTO	60	1	NO ACEPTABLE	1	Muerte	N/A	N/A	N/A	1. Sobrevisión permanente y obligatorio de EPP y ventilación apropiados. 2. Sensibilización del protocolo de bioseguridad establecido para la obra y capacitación charlas de EPP con relación a la enfermedad COVID-19. 3. Sostenimiento de áreas de trabajo, herramientas, ventilación adecuada, ventilación natural.	Entrega de elementos de protección personal EPP (mascarilla, monogafas y antimicrobianos, monogafas, botas, botas, guantes de látex, sobretodos y de aseo.)
				SI	Atropellamiento, Accidentes	BIOLOGICO (Peligro)	Atropellamiento, accidentes	NE	Sobrevisión de uso de EPP	Uso de EPP Existen componentes de ingreso.	2	1	5	MEDIO	10	60	0	ACEPTABLE	1	Enfermedades laborales (osteomusculares, accidentes de trabajo, caídas, golpes, lesiones)	N/A	N/A	N/A	1. Sobrevisión permanente y obligatorio de EPP. 2. Capacitación de riesgo biológico. 3. Sostenimiento de seguridad.	N/A
				SI	La caída y posible de manipulación de objetos de todas clases.	PELIGRO: Biomecánicos (por movimiento, fuerza, vibraciones, mal orden, sobrecarga y postura)	Fuerza, mal, alteraciones de los objetos, lesiones	NE	NE	Existen componentes de ingreso.	2	1	5	MEDIO	10	60	0	ACEPTABLE	1	Fatiga crónica, alteración de los objetos, lesiones	N/A	N/A	Fuentes de riesgo y mal flujo.	1. Capacitación en riesgo físico. 2. Pausas activas durante la jornada laboral. 3. Uso de protección en el cuerpo con fuentes de ruido.	N/A
				SI	Manipulación de herramientas eléctricas (Pequeñas de fuerte, filos)	QUIMICO (Líquidos (Polvos y vapores)	Inhalación, en la piel, alteraciones respiratorias	NE	Sobrevisión de uso de EPP	Uso de EPP Existen componentes de ingreso.	2	1	5	MEDIO	10	60	0	ACEPTABLE	1	Enfermedad de la piel, alteraciones respiratorias	N/A	N/A	Cuenta con ventilación para disolventes, almacenamiento adecuado de materiales, ambientes, almacenes	1. Capacitación en riesgo químico. 2. Inspección de almacenamiento de materiales químicos y líquidos.	N/A
				SI	Actividades de traslado de materiales, cambios de trabajo	QUIMICO: Polvos, vapores y sustancias	Intoxicación por inhalación, ingestión o contacto	NE	Sobrevisión de uso de EPP	Uso de EPP Existen componentes de ingreso.	2	1	5	MEDIO	10	60	0	ACEPTABLE	1	Enfermedad del sistema respiratorio	N/A	N/A	N/A	1. Sobrevisión de pausa activa de realizar actividades de tarea.	N/A
				SI	Cargo mental (Exigencias emocionales, Manejo de personas, responsabilidad por la información confidencial, Turno de Actividad, etc.)	PSICOSOCIAL (Las diversas de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, cultura de control, definición de roles y comunicación)	Estrés por tarea, mal ambiente laboral, problemas de salud mental	NE	NE	Existen componentes de ingreso.	6	1	1	MEDIO	10	60	0	ACEPTABLE	1	Enfermedad laboral	N/A	N/A	N/A	1. Aplicar bateria para prevención de riesgo Psicosocial. 2. Aplicar recomendaciones. 3. Individuales dados a trabajo. 4. Pausas activas. 5. Dominancia psicológica. 6. Capacitación de comunicación asertiva e inteligencia emocional y en manejo de conflictos.	N/A
		Trabajo en altura		SI	Caídas de objetos y trabajadores, resbalones, golpes, lesiones, fracturas, Electrocución, Incendios	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Eléctrico (alta y baja tensión), caídas)	Accidentes, daño de equipos, quemaduras, explosiones	NE	NE	Existen componentes de ingreso.	6	1	10	ALTO	60	360	1	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Quemaduras, muerte	N/A	N/A	Instrumentos eléctricos, con capacitar trabajos para todos los equipos portátiles	1. Procedimiento de soldadura y en soldadura. 2. Identificación de señal y avisos. 3. Registro de mantenimiento equipos. 4. Capacitación en riesgo eléctrico.	N/A
				SI	Transporte de personal, en obra de trabajo y maquinaria	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Condición de Vehículo)	Accidentes, Explosión	NE	NE	Existen componentes de ingreso.	6	1	10	ALTO	60	360	1	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Fracturas, muerte	N/A	N/A	Mantenimiento preventivo maquinaria	1. Adecuación de vendedor preventivo maquina y vehículo. 2. Personal capacitado para la operación de maquinaria pesada. 3. Adecuación preventiva hacia la obra.	N/A
				SI	Movimientos, estiramientos, manipulación de equipos pesados	BIOLOGICO (Virus y bacterias)	Fiebre, tos seca, dificultad para respirar, posible ruptura del saco o el parto	NE	Sobrevisión de uso de EPP y aseo permanente de la información Donde la mano, uso de higiénicos, ventilación natural, ventilación de puntos de humedad y Donde la mano) Notificación	Vacunación (covid), Uso de EPP	6	4	24	ALTO	60	1440	1	NO ACEPTABLE	1	Muerte	N/A	N/A	N/A	1. Sobrevisión permanente y obligatorio de EPP y ventilación apropiados. 2. Sensibilización del protocolo de bioseguridad establecido para la obra y capacitación charlas de EPP con relación a la enfermedad COVID-19. 3. Sostenimiento de áreas de trabajo, herramientas, ventilación natural.	Entrega de elementos de protección personal EPP (Mascarilla, monogafas y antimicrobianos, monogafas, botas, botas, guantes de látex, sobretodos y de aseo.)
				SI	Exposición a ruido permanente de equipos de trabajo y movimientos, ruido ofrecido de maquinaria y vehículo	RUIDO (Ruido (impacto, intermitente y continuo)	Pérdida de audición, cansancio, dificultad en comunicación laboral y social	NE	Sobrevisión de uso de EPP	Uso de EPP Existen componentes de ingreso.	2	3	6	MEDIO	10	60	0	ACEPTABLE	1	Hipoacusia	N/A	N/A	Mantenimiento preventivo maquinaria	1. Sobrevisión permanente y obligatorio de EPP y ventilación apropiados. 2. Valoraciones medico laborales periodicas. 3. Inspecciones del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y vehículo. 4. Sobrevisión preventiva y obligatoria. 5. Inspecciones de EPP. 6. Mantenimiento preventivo de maquinaria y vehículo en obra de trabajo.	EPP preventivo auditivo de acuerdo a la exposición
				SI	Falta de hidratación en obra	FISICO (Ambientales (por estrés por calor) y Biomecánicos)	Deshidratación, golpes, caídas	NE	NE	Existen componentes de ingreso.	2	2	4	BAJO	10	40	0	ACEPTABLE	1	Deshidratación de trabajo	N/A	N/A	N/A	1. Procedimiento de hidratación en trabajo. 2. Sobrevisión de trabajo en obra de trabajo. 3. Inspecciones de EPP.	N/A
				SI	Manipulación de cemento, agregados, madera, pinturas, solventes, ACPM, químicos, gaseosos, polvos, residuos peligrosos, etc	QUIMICO (Líquidos (Polvos peligrosos, humos metálicos, EPP y combustibles)	Inhalación, en la piel, alteraciones respiratorias	NE	NE	Uso de EPP Existen componentes de ingreso.	6	1	10	ALTO	60	360	1	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Enfermedad laboral por contacto de trabajo	N/A	N/A	Adecuación de áreas para almacenamiento de materiales químicos	1. Procedimiento de hidratación en trabajo. 2. Sobrevisión preventiva y obligatoria. 3. Inspecciones de EPP. 4. Capacitación en riesgo químico y ambiental. 5. Inspecciones de áreas de trabajo.	N/A
				SI	Trabajo repetitivo, movimientos, manipulación del cal, tareas, tareas cotas (posturales) trabajos, vibraciones prolongadas, etc	PSICOSOCIALES (Condiciones de la tarea (Carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.)	Sobrecargas en la capacidad laboral, Estrés de labores	NE	NE	Existen componentes de ingreso.	2	1	5	MEDIO	10	60	0	ACEPTABLE	1	Enfermedad laboral	N/A	N/A	N/A	1. Procedimiento de hidratación y en trabajo. 2. Sobrevisión de trabajo en obra de trabajo. 3. Capacitación en riesgo Psicosocial. 4. Aplicar recomendaciones. 5. Actividades dadas a trabajo. 6. Pausas activas. 7. Dominancia psicológica. 8. Capacitación de comunicación asertiva e inteligencia emocional y en manejo de conflictos.	N/A
				SI	Por desplazamientos (entre el campo y el área), riesgo, el tránsito vial, exposición del trabajo, vehículos de los objetos. Falta de medio de objetos	BIOMECANICO (Mecánicos de caída de cargo)	Lesiones, accidentes graves, fallecidos	NE	NE	Existen componentes de ingreso.	6	1	10	ALTO	60	360	1	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Enfermedad laboral (por caída de la capacidad laboral)	N/A	N/A	Implementar sistema mecánicos para el transporte de material y/o equipos	1. Procedimiento de hidratación y en trabajo. 2. Valoraciones medico ocupacionales periodicas. 3. Capacitación en Riesgos Forestal y manejo de cargas. 4. Pausas activas. 5. Análisis de puestos de trabajo. 6. Salud ocupacional EPS para riesgo biomecánico.	N/A
				SI	Herramientas manuales, equipos y elementos de trabajo, diseño de operación, mantenimiento de elementos, manipulación de elementos, movimientos repetitivos, trabajos con equipos electrógenos, falta de orden y aseo	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecánicos)	Accidentes, golpes	Mantenimiento preventivo de equipos	Sobrevisión de uso de EPP	Uso de EPP Existen componentes de ingreso.	6	1	10	ALTO	60	360	1	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Muerte, quemaduras, amputaciones, atrapamiento	N/A	N/A	Inspecciones periodicas de equipos y herramientas. Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y/o equipos herramientas de trabajo.	1. Procedimiento de hidratación y en trabajo. 2. Capacitación en riesgo mecánico. 3. Sensibilización para uso adecuado, uso y mantenimiento de elementos de protección personal. 4. Señalización necesaria y adecuada de EPP. 5. Control y manejo de personal ajeno a la obra.	Entrega de botas de seguridad con puntera, casco, monogafas, guantes de cabritilla, auditivo
				SI	Atropellos por capacitación por desconocimiento de señalización, ignorar señalización preventiva	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativos)	Atropellamiento, golpes de vehículos	NE	NE	Uso de EPP Existen componentes de ingreso.	2	1	5	MEDIO	25	150	1	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Muerte, quemaduras, perdida de sentido	N/A	N/A	N/A	1. Procedimiento de hidratación y en trabajo. 2. Capacitación en manejo de sustancias químicas. 3. Instalación y prácticas de fuego, en materiales y ejercicio de emergencia de prevalentes ambiental. 4. Asesorar en caminos químicos. 5. Inspecciones antes de trabajo.	N/A
				SI	Riesgo ergonómico, falta de adaptación de cambios diarios	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativos)	Accidentes, golpes, caídas, quemaduras	NE	NE	Uso de EPP Existen componentes de ingreso.	6	1	10	MEDIO	60	360	1	ACEPTABLE	1	Fracturas, capacitar	N/A	N/A	Inducción de terceros a obra	1. Procedimiento de hidratación y en trabajo. 2. Capacitación EPP - condiciones de orden y aseo. 3. Capacitación de capacidad en la herramientas. 4. Adherencia para caídas. 5. Cumplimiento de uso adecuado	Entrega de botas de capacidad con puntera, casco, monogafas, guantes de cabritilla, auditivo

Anexo. 4

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ES-SST-FT 03
Versión: 001
Fecha: 15/12/2025

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - MELEN - QUEBRADA EL TEJAREN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER			NOMBRE DEL TRABAJADOR:	CARLOS ALBERTO		
CARGO:	Ayudante	C.C.:	73777777	TALLA CAMISA (S, M, L, XL, XXL)		TALLA PANTALÓN (30, 32...)	28	No CALZADO:	40
CONTROLADO POR:	Gineth Daycira Paba A.	CARGO:	Prof. SST-A			FIRMA:	Gineth Paba		

MOTIVO DE ENTREGA (ME): 1- ORDINARIA. Entrega inicial o periodicidad establecida 2- DESGASTE. Reposición por deterioro del elemento del elemento 3- PÉRDIDA. Nueva entrega por pérdida

FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AAAA)	EPP	P. CABEZA			P. PIES		P. INVERNAL		P. MANOS				P. RESPIRATORIA		P. OJOS		P. AUDITIVA			EQUIPOS ESPECIALES			ROPA TRABAJO				FIRMA
		CASCO INDUSTRIAL	CASCO CON BARBUQUEJO	CAPUCHÓN VENTILADO	BOTINA CUERO SEGURIDAD	BOTAS CAUCHO RIEG	GUARDAMONTE / PONCHO	CHAQUETA Y PANTALÓN	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES NITRILO	GUANTES VARIOS	PROTECCIÓN RESPIRATORIA CAPUCHÓN	TAPABOCAS	MONOGAFAS	CARETA CAMBIO RÁPIDO	COPA	INSERCIÓN	ENDIMBLE CASCO	ARNÉS	ESLINGAS	LÍNEA DE VIDA	CAMISA	PANTALÓN	OVEROL	CHALECO	
15-Oct-25	ME	1				1			1					1	1									1		1	CARLOS ALBERTO
	CANT	1				1			1					1	1									1		1	CARLOS ALBERTO
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, falla o deterioro para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos. Igualmente Yo, Carlos Alberto Perez autorizo al Consorcio para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de pérdida intencional o la no devolución del mismo, igualmente autorizo, para que se descuente de mi salario las multas o sanciones impuestas por el incumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Empresa con relación a los EPP.

CARLOS ALBERTO
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. 73777777

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ES-SST-FT-03
Versión: 001
Fecha: 15/10/2025

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO RECTIFICADO DE LA AVE. BOLÍVAR, QUEBRADA EL TEJAREN EL MUNICIPIO DE OCAÑA CONTRATO DE CONTRATISTA	NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Marco Antonio Hernandez Hernandez		
CARGO	Ayudante de Obra	C.C.	1068578434	TALLA CAMISA (S, M, L, XL, XXL)	TALLA PANTALÓN (30, 32, ...)	32	No CALZADO	40
CONTROLADO POR	Gineth Cayana Pabon	CARGO:	Prof. SST-A	FIRMA:	Gineth Pabon			

MOTIVO DE ENTREGA (ME): 1- ORDINARIA: Entrega inicial o periodicidad establecida | 2- DESGASTE: Reposición por desgaste del elemento del elemento | 3- PÉRDIDA: Nueva entrega con perdida

FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AAAA)	EPP	P. CABEZA			P. PIES		P. INVERNAL		P. MANOS				P. RESPIRATORIA		P. OJOS		P. AUDITIVA			EQUIPOS ESPECIALES			ROPA TRABAJO				FIRMA
		CASCO ANTICAIDAS	CASCO CON BARBUQUEJO	CAPUCHON ignifugo	BOTAS CUERO REFLECTIVO	BOTAS CAUCHO SRC	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA Y PANTALÓN	GUANTES CARNAZA	GUANTES NITRILO	GUANTES LATEX	GUANTES CALIBRE	PROTECCIÓN FACIAL CARTUCHO	TAPABOCAS	GAFAS SEGURIDAD	GAFAS CONTRA IMPACTOS	COPA	INSERCIÓN	ENCAUCHE CABLE	ARNES	ESLINGA	LINEA DE VIDA	CAMISA	PANTALÓN	OVEROL	CHALECO	
15-Oct-25	HE	1				1			1						1	1								1		1	
	CANT	1				1			1						1	1								1		1	
	HE																										
	CANT																										
	HE																										
	CANT																										
	HE																										
	CANT																										
	HE																										
	CANT																										
	HE																										
	CANT																										
	HE																										
	CANT																										
	HE																										
	CANT																										
	HE																										
	CANT																										

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o deterioro para proceder a su respectiva reposición, se compromete a dar uso adecuado de los mismos. Igualmente Yo, Marco Antonio Hernandez autorizo al Consorcio para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de pérdida intencional o la no devolución del mismo. Igualmente autorizo, para que se descuente de mi salario las multas o sanciones impuestas por el no cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Empresa con relación a los EPP

Marco Antonio Hernandez
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. 1068578434

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO: ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ES-SST-FT-03
Versión: 001
Fecha: 15/10/2025

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN COLECTOR SANITARIO RECTIFICACIÓN CRUCE RELEVO QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER			NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Ronald Emiro Sánchez Ascanio		
CARGO	Ayudante de obra	CC:	1004903749	TALLA CAMISA (S, M, L, XL, XXL)	-	TALLA PANTALÓN (28, 32...)	30	No CALZADO:	42
CONTROLADO POR:	Gineth Dayana Paba	CARGO:	Prof. SST-A			FIRMA:	Gineth Paba		

MOTIVO DE ENTREGA (MD): 1- ORDINARIA: Entrega inicial o periodicidad establecida. 2- DESGASTE: Reposición por desgaste del elemento del elemento. 3- PÉRDIDA: Nueva entrega por pérdida

FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AAAA)	EPP	P. CABEZA			P. PIES		P. INVERNAL		P. MANOS				P. RESPIRATORIA		P. OJOS		P. AUDITIVA			EQUIPOS ESPECIALES			ROPA TRABAJO				FIRMA
		CASCO INDUSTRIAL	CASCO CON BARBUQUEJO	CAPUCHÓN - VISERA	BOTAS CUERO (SEGURIDAD)	BOTAS CAUCHO RES.	GABARDINA / PONCHO	CHAQUETA Y PANTALÓN	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES NITRILO	GUANTES LATEX	MASCARILLA ENTRES CARTUCHOS	TAPABOCA	GAFAS SEGURIDAD	GAFAS ANTIEMPAÑO	COPAS	DIADEMA	DIADEMA C/ CASCO	ARNES	ESLINGAS	LINEA DE VIDA	CAMISA	PANTALÓN	OVEROL	CHALECO	
15-Oct-25	MC	1/12				1/12			1/12					1	1									1		1	Ronald Sánchez
	CANT	1				1			1					1	1									1		1	Ronald Sánchez
	MC																										
	CANT																										
	MC																										
	CANT																										
	MC																										
	CANT																										
	MC																										
	CANT																										
	MC																										
	CANT																										
	MC																										
	CANT																										
	MC																										
	CANT																										
	MC																										
	CANT																										

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o deterioro para proceder a su respectiva reposición, se compromete a dar uso adecuado de los mismos. igualmente Yo, Ronald Emiro Sánchez, autorizo al Consorcio para que descuente de mi sueldo el valor correspondiente del EPP en caso de pérdida intencional o la no devolución del mismo, igualmente autorizo, para que se descuente de mi sueldo las multas o sanciones impuestas por el no cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Empresa con relación a los EPP.

Ronald Sánchez
FIRMA DEL TRABAJADOR
cc. 1004903749

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código:	EG-SST-FT-03
Versión:	001
Fecha:	15/10/2025

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS, BELÉN, GUAYABAL EL TEJARES EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER			NOMBRE DEL TRABAJADOR:					
CARGO:	ayudante	C.C.:	5084256	TALLA CAMISA (S, M, L, XL, XXL)		TALLA PANTALÓN (30, 32, ..)	36	No CALZADO:	41
CONTROLADO POR:	Gineth Dayana Paba	CARGO:	Prof. SST-A			FIRMA:	Gineth Paba		

MOTIVO DE ENTREGA (MD): 1- ORDINARIA: Entrega inicial o periodicidad establecida | 2- DESGASTE: Reposición por desgaste del elemento del elemento | 3- PÉRDIDA: Nueva entrega por pérdida

FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AAAA)	EPP	P. CABEZA			P. PIES		P. INVERNAL		P. MANOS				P. RESPIRATORIA		P. OJOS		P. AUDITIVA			EQUIPOS ESPECIALES			ROPA TRABAJO				FIRMA
		CASCO INDUSTRIAL	PANTALLA PARA SOLDAR	CAPUCHON/ CAPUZ	BOTAS CUERO SEGURIDAD	BOTAS CAUCHO RED	GABARDINA / PONCHO	CHAQUETA Y PANTALÓN	GUANTES CARNAZA	GUANTES NITRILO	GUANTES LATEX	GUANTES CAUCHO	PROTECCIÓN FACIAL/ GAFAS	TAPABOCA	GAFAS SEGURIDAD	LENTES CONTRA IMPACTOS	COPA	INSERCIÓN	DIADEMA DUCO	ARNES	ESLINGAS	LÍNEA DE VIDA	CAMISA	PANTALÓN	PARES	CHALECO	
15-Oct-25	NO	1				1			1					1	1								1		1	Gineth
	CANT	1				1			1					1	1								1		1	
	NO																									
	CANT																									
	NO																									
	CANT																									
	NO																									
	CANT																									
	NO																									
	CANT																									
	NO																									
	CANT																									
	NO																									
	CANT																									
	NO																									
	CANT																									
	NO																									
	CANT																									

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, se compromete a dar uso adecuado de los mismos, igualmente he JOSE DELFIN TRILLOS autorizado al Consorcio para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de pérdida intencional o la no devolución del mismo, igualmente autorizo, para que se descuente de mi salario las multas o sanciones impuestas por el no cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Empresa con relación a los EPP.

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. 5084256

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ES-SST-FT 03
Versión: 001
Fecha: 15/10/2025

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS CLIVOS - BELEN - GUERRERO EL TEJAREN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER			NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Yander Trigos		
CARGO:	Ayudante de obra	C.C.:	13.178.015	TALLA CAMISA (S, M, L, XL, XXL):	TALLA PANTALÓN (28, 32, ...):	30	No CALZADO: 40
CONTROLADO POR:	Gineth Dayana Paba A.	CARGO:	Prof. SST-A	FIRMA:	Gineth Paba		

MOTIVO DE ENTREGA (ME): 1- ORDINARIA: Entrega inicial o periodicidad establecida | 2- DESGASTE: Reposición por deterioro del elemento del elemento | 3- PÉRDIDA: Nueva entrega por pérdida

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	EPP	P. CABEZA			P. PIES		P. INVERNAL		P. MANOS				P. RESPIRATORIA		P. OJOS		P. AUDITIVA			ELEMENTOS ESPECIALES			ROPA TRABAJO				FIRMA
		CASCO INDUSTRIAL	CASCO CON BARBUQUEJO	CAPUCHÓN VERDE	BOTAS CUERO SEGURIDAD	BOTA CAUCHO RES.	GABARDINA / PONCHO	CHAQUETA Y PANTALÓN	GUANTES CARNAZA	GUANTES NAVETA	GUANTE ESCARCHA	GUANTE NITRILO	MASCARILLA CON FILTRO Y CARTUCHO	VENOCEN	GAFAS INCOLORAS	GAFAS CONTRA IMPACTO	COPA	INSERCIÓN	DISPENSADOR CABLE	ARNES	SILLA DE VIDA	LÍNEA DE VIDA	CAMISA	PANTALÓN	OVEROL	CHALECO	
15-OCT-25	ME	1				1			1					1	1								1		1		Yander Trigos
	CANT	1				1			1					1	1								1		1		Yander Trigos
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o deterioro para proceder a su respectiva reposición, se compromete a dar uso adecuado de los mismos. igualmente yo, Yander Trigos, autorizo al Consorcio para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de pérdida intencional o la no devolución del mismo; igualmente autorizo, para que se descuente de mi salario las multas o sanciones impuestas por el incumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Empresa con relación a los EPP.

Yander Trigos
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. 13.178.015

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ES-SST-FT 53 Versión: 001 Fecha: 15/10/2025

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO INCLUYENDO LOS PASOS ELEVADOS QUEBRADA EL TEMPISQUE, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER			NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Marcial Pallares V.		
CARGO:	Ingeniero Residente	C.C.	1064839866	TALLA CAMISA (S, M, L, XL, XXL)		TALLA PANTALÓN (28, 32, ...)		No CALZADO:	
CONTRATADO POR:	Gineth Dayana Pabon	CARGO	Prof. SST-A	FIRMA:	Gineth Pabon		

MOTIVO DE ENTREGA (MD): 1- ORDINARIA: Entrega inicial o periodicidad establecida. 2- DESGASTE: Reposición por desgaste del elemento del elemento. 3- PÉRDIDA: Nueva entrega con permiso

FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AAAA)	EPP	P. CABEZA			P. PIES		P. INVERNAL		P. MANOS				P. RESPIRATORIA		P. OJOS		P. AUDITIVA			EQUIPOS ESPECIALES			ROPA TRABAJO				FIRMA
		CASCO INDUSTRIAL	CASCO CON BARBUQUEJO	CAPUCHÓN VERDE	BOTAS CAÑA ALTA CON CASQUILLO DE SEGURIDAD	BOTAS CAÑA CORTA DIELECTRICAS	CHAQUETA CON FORRO	CHAQUETA IMPERMEABLE	GUANTES CARNAZA	GUANTES NITRILO	GUANTES LATEX	GUANTES CUERO	RESPIRADOR PURIFICADOR DE CARTUCHO	MASCARA	GAFAS SEGURIDAD	GAFAS CONTRA IMPACTO	CAPS	INSERCIÓN	DIADEMA CASCO	ARNES	ESLINGA	ARRESTADOR VIDA	CAMISA	PANTALÓN	PARKA	OVEROL	
15-Oct-25	ME	1												1													Marcial Pallares
	CANT	1												1													Marcial Pallares
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o peligro para proceder a su respectiva reposición, se compromete a dar uso adecuado de los mismos. igualmente Yo, Marcial Pallares autorizo al Consorcio para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de pérdida intencional o la no devolución del mismo, igualmente autorizo, para que se descuente de mi salario las multas o sanciones impuestas por el no cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Empresa con relación a los EPP.

Marcial Pallares V
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. 1064839866

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

CONSORCIO ALCANTARILLADO	**CONSORCIO ALCANTARILLADO**	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025**

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ES-SST-FT 03
Versión: 001
Fecha: 15/10/2025

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS CANOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJARERO EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER			NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Cristian F. Rios Ch		
CARGO:		C.C.:	1064841249	TALLA CAMISA (S, M, L, XL, 2XL):		TALLA PANTALÓN (36, 38,...):	34
CONTRATADO POR:	Maeko Gineth Dayana Pabon A.	CARGO:	Prof. SST-A	FIRMA:	Gineth Pabon	No. CALZADO:	40

MOTIVO DE ENTREGA (MED): 1- ORDINARIA: Entrega inicial o periodicidad establecida. 2- DESGASTE: Reposición por desgaste del elemento del elemento. 3- PÉRDIDA: Volver a entregar con sanción

FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AAAA)	EPP	P. CABEZA			P. PIES		P. INVERNAL		P. MANOS				P. RESPIRATORIA		P. OJOS		P. AUDITIVA			EQUIPOS ESPECIALES			ROPA TRABAJO				FIRMA
		CASCO INDUSTRIAL	DIADEMA BARBUQUEJO	CAPUCHÓN / CAPUCHA	BOTAS CORREDERAS (PVC)	BOTAS CAÑA ALTA (CUERO)	GUARDAMONTE / PRENDA	CHAQUETA O PANTALÓN	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE CUERO	GUANTES DE LATEX	MEDIA MASCARILLA (CON FILTROS)	FILTROS	GAFAS DE SEGURIDAD	GAFAS CLARAS	CASCO	AUDIFONOS	DIADEMA CASCO	ARNÉS	ESLINGA	LÍNEA DE VIDA	CAMISA	CHAQUETA	OVEROL	CHALECO	
15-Oct-25	ME	1				1			1					1	1									1		1	Cristian Ri.
	CANT	1				1			1					1	1									1		1	Cristian Rios
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o deterioro para proceder a su respectiva reposición, se comprometa a dar uso adecuado de los mismos. Igualmente Yo, Cristian Fernando Rios, autorizo al Consorcio para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de pérdida intencional o de no devolución del mismo, igualmente autorizo, para que se descuente de mi salario las multas o sanciones impuestas por el no cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Empresa con relación a los EPP.

Cristian F. Rios Ch.
FIRMA DEL TRABAJADOR
CC. 1064841249

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ES-SST-FT 03
Versión: 001
Fecha: 15/10/2025

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - GUAIMARO EL TEJARERO EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER			NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Nixon carrascal			
CARGO	Ayudante	C.C.	13.176421	TALLA CAMISA (S, M, L, XL, XXL)		TALLA PANTALÓN (30, 32,...)	36	No CALZADO: 44
CAPACITADO POR:	Gineth Dayana Paba	CARGO:	Prof - SST-A			FIRMA:	Gineth Paba	

MOTIVO DE ENTREGA (ME): 1- ORDINARIA Entrega inicial o periodicidad establecida | 2- DESGASTE Reposición por desgaste del elemento del elemento | 3- PÉRDIDA Nueva entrega por pérdida

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AAAA)	EPP	P. CABEZA			P. PIES		P. INVERNAL		P. MANOS				P. RESPIRATORIA		P. OJOS		P. AUDITIVA			EQUIPOS ESPECIALES			ROPA TRABAJO				FIRMA
		CASCO INDUSTRIAL	CASCO ALPINISMO/RESCATE	CAPUCHON / BALACLAVA	BOTAS CUERO SEGURIDAD	BOTAS CAUCHO SEG.	CHAQUETA / PONCHO	OVEROL/CHAQUETA/PANTALÓN	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES NITRILO	GUANTES LATEX	RESPIRADOR MEDIA CARA / CARTUCHOS	TAPABOCAS	GAFAS SEGURIDAD	GAFAS CLARAS	COPA	INSERCIÓN	DIADEMA O CASCO	ARNES	ESLINGA	LINEA DE VIDA	CAMISA	PANTALÓN	OVEROL	CHALECO	
15-Oct-25	ME	1				1			1					1	1									1		1	Nixon carrascal
	CANT	1				1			1					1	1									1		1	Nixon carrascal
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, se compromete a dar uso adecuado de los mismos. igualmente Yo: Nixon Carrascal autorizo al Consorcio para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de pérdida intencional o la no devolución del mismo, igualmente autorizo, para que se descuente de mi salario las multas o sanciones impuestas por el no cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Empresa con relación a los EPP.

Nixon carrascal
FIRMA DEL TRABAJADOR
CC 13.176421

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ES-SST-FT 03
Versión: 001
Fecha: 15/10/2025

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELÉN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER			NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Daiver Contreras		
CARGO:	Ayudante	C.C.:	1007134934	TALLA CAMISA (S, M, L, XL, XXL):		TALLA PANTALÓN (30, 32,...):	36	No CALZADO:	41
CONTROLADO POR:	Gineth Dayana Faba	CARGO:	Prof. SST - A	FIRMA:	Gineth Faba				

MOTIVO DE ENTREGA (ME): 1- ORDINARIA: Entrega inicial o periodicidad establecida. 2- DESASTE: Reposición por desgaste del elemento del elemento. 3- PERDIDA: Nueva entrega por perdida.

FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AAAA)	EPP	P. CABEZA			P. PIES		P. INVERNAL		P. MANOS				P. RESPIRATORIA		P. OJOS		P. AUDITIVA			EQUIPOS ESPECIALES			ROPA TRABAJO				FIRMA
		CASCO INDUSTRIAL	CASCO CON BARBUQUEJO	CAPUCHÓN - MONJA	BOTAS CUERO SEGURIDAD	BOTAS CAUCHO RES	GABARDINA / PONCHO	CHAQUETA Y PANTALÓN	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES LATEX	GUANTES CAUCHO	MASCARILLA DESECHABLE	TAPABOCAS	GAFAS SEGURIDAD	LENTE CONTRA IMPACTOS	COPA	INSERCIÓN	ENSAMBLE CASCO	ARNÉS	ESLINGA	LÍNEA DE VIDA	CAMISA	PANTALÓN	OVEROL	CHALECO	
15-OCT-25	ME	1				1			1					1	1									1		1	Daiver Contreras
	CANT	1				1			1					1	1									1		1	Daiver Contreras
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o deterioro para proceder a su respectiva reposición, se compromete a dar uso adecuado de los mismos. igualmente Yo, Daiver Contreras autorizo al Consorcio para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de pérdida intencional o la no devolución del mismo; igualmente autorizo, para que se descuente de mi salario las multas o sanciones impuestas por el incumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Empresa con relación a los EPP.

Daiver Contreras
FIRMA DEL TRABAJADOR
CC. 1007134934

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ES-SST-FT 03
Versión: 001
Fecha: 15/10/2025

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS CLAVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER		NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Deivis Turizona S.			
CARGO:	Ayudante	C.C.:	1007539444	TALLA CAMISA (S, M, L, XL, 2XL)		TALLA PANTALÓN (30, 32,...)	32	No CALZADO:	41
CONTROLADO POR:	Gineth Dayana Paba A.	CARGO:	Prof. SST-A			FIRMA:	Gineth Paba		

MOTIVO DE ENTREGA (ME): 1- ORDINARIA. Entrega inicial o periodicidad establecida | 2- DESGASTE. Reposición por deterioro del elemento | 3- PÉRDIDA. Nueva entrega por pérdida

FECHA DE ENTREGA (dd-mm-aaaa)	EPP	P. CABEZA			P. PIES		P. INVERNAL		P. MANOS				P. RESPIRATORIA		P. OJOS		P. AUDITIVA			EQUIPOS ESPECIALES			ROPA TRABAJO				FIRMA
		CASCO INDUSTRIAL	GORRA CON BARBUQUEJO	CAPUCHÓN - MITAJA	BOTAS CUERO SEGURIDAD	BOTAS CAUCHO RES	GABARDINA / PONCHO	CHAQUETA Y PANTALÓN	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES DIELÉCTRICOS	GUANTES NITRILO	RESPIRADOR MEDIA CARA (CARTUCHO)	TAPABOCA	GAFAS PANORÁMICAS	GAFAS CONVENCIONALES	COPA	INSERCIÓN	ESCARAMUZ CASCO	ARNÉS	ESLINGA	LÍNEA DE VIDA	CAMISA	PANTALÓN	OVEROL	CHALECO	
15-Oct-25	ME	1			1				1					1	1								1		1	Deivis Turizona S.
	CANT	1			1				1					1	1								1		1	Deivis Turizona S.
	ME																									
	CANT																									
	ME																									
	CANT																									
	ME																									
	CANT																									
	ME																									
	CANT																									
	ME																									
	CANT																									
	ME																									
	CANT																									
	ME																									
	CANT																									
	ME																									
	CANT																									
	ME																									
	CANT																									

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos. Igualmente Yo, Deivis Turizona, autorizo al Consorcio para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de pérdida intencional o la no devolución del mismo. Igualmente autorizo, para que se descuente de mi sueldo las multas o sanciones impuestas por el incumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Empresa con relación a los EPP.

Deivis Turizona S.
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. 1007 539 444

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: ES-SST-FT-03 Version: 001 Fecha: 15/10/2025

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJARES EL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER			**NOMBRE DEL TRABAJADOR:**	leonardo Rincón		
CARGO:	Maestro	**C.C.:**	1.065738.234	**TALLA CAMISA (S, M, L, XL, 2XL)**		**TALLA PANTALÓN (28, 32,...)**	34	**No CALZADO:**	40
CONTROLADO POR:	Gineth Dayana Pabon	**CARGO:**	Pick SST-A	**FIRMA:**	Gineth Pabon		

MOTIVO DE ENTREGA (ME): 1- ORDINARIA Entrega inicial o periodicidad establecida | 2- DESGASTE Reposición por desgaste del elemento del elemento | 3- PÉRDIDA Nueva entrega por pérdida

FECHA DE ENTREGA (AÑO-MES-DIA)	EPP	P. CABEZA			P. PIES		P. INVERNAL		P. MANOS				P. RESPIRATORIA		P. OJOS		P. AUDITIVA			EQUIPOS ESPECIALES			ROPA TRABAJO				FIRMA
		CASCO INDUSTRIAL	CASCO CON BARBUQUEJO	CAPUCHÓN - MONJA	BOTAS CUERO SEGURIDAD	BOTAS CAUCHO SEG.	DELANTAL PVC/HOJA	OVEROL/ESTE Y PANTALÓN	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	MONOGUANTE	MANGUITOS TELA/PVC	PROTECCIÓN RESPIRATORIA CERTIFICADA	TAPABOCAS	GAFAS SEGURIDAD	GAFAS CONTRA IMPACTOS	COPA	INSERCIÓN	DIADEMA CASCO	ARNÉS	ESLINGA	LÍNEA DE VIDA	CAMISA	PANTALÓN	CHAQUETA	OVEROL	
15-oct-25	ME	1				1			1					1										1		1	leonardo Rincón
	CANT	1				1			1					1										1		1	leonardo Rincón
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida ocasionada por su uso a su respectiva reposición, se compromete a dar uso adecuado de los mismos igualmente Yo, Leonardo Rincón autorizo al Consorcio para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de pérdida intencional o la no devolución del mismo, igualmente autorizo, para que se descuente de mi salario las multas o sanciones impuestas por el no cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Empresa con relación a los EPP.

leonardo Rincón
FIRMA DEL TRABAJADOR
c.c. 1.065738234

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ES-SST-4FT 03
Versión: 001
Fecha: 15/12/2025

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO RECTIFICACIÓN Y/O CLAUSURA BELÉN QUEBRADA EL TEJARITO EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER			NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Victor Manuel Mejia Carderius		
CARGO:	Ayudante	C.C.:	1064791134	TALLA CAMISA (S, M, L, XL, XXL):		TALLA PANTALÓN (28, 32,...):	34	No CALZADO:	40
CONTROLADO POR:	Gineth Dayana Puba	CARGO:	Prof. SST-A	FIRMA:	Gineth Puba				

MOTIVO DE ENTREGA (ME): 1- ORDINARIA: Entrega inicial o periodicidad establecida. 2- DESGASTE: Reposición por deterioro del elemento del elemento. 3- PERDIDA: Nueva entrega por pérdida

FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AAAA)	EPP	P. CABEZA			P. PIES		P. INVERNAL		P. MANOS				P. RESPIRATORIA		P. OJOS		P. AUDITIVA			EQUIPOS ESPECIALES			ROPA TRABAJO				FIRMA
		CASCO AISLANTE	CASCO CON BARBUQUEJO	CAPUCHÓN MALLA	BOTAS CUERO DIELECTRICO	BOTAS CAUCHO SRO	GABARDINA / PONCHO	CHAQUETA Y PANTALÓN	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	MANGUITO NEOPRENO	MANGUITO CUERO	MASCARILLA CON FILTROS ORGANICOS	TAPABOCA	GAFAS SEGURIDAD	GAFAS CON VENTILACIÓN	COPA	INSERCIÓN	DIADEMA CASCO	GAFAS	CARETA	LINEA DE VIDA	CAMISA	PANTALÓN	OVEROL	CHALECO	
15-Oct-25	ME	1				1			1					1	1									1		1	Victor M
	CANT	1				1			1					1	1									1		1	Victor M
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o deterioro para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos. Igualmente Yo, Victor Manuel Mejia, autorizo al Consorcio para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de pérdida intencional o la no devolución del mismo; igualmente autorizo, para que se descuente de mi salario las multas o sanciones impuestas por el incumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la empresa con relación a los EPP.

Victor M
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. 1064791134

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ES-SST-FT 03
Versión: 001
Fecha: 15/10/2025

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS CLAVOS, SELVA, QUEBRADA EL TEJARERO, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER			NOMBRE DEL TRABAJADOR:	DAIRO CHACÓN URIBE		
CARGO:	MAESTRO	C.C.:	1064840995	TALLA CAMISA (S, M, L, XL, XXL):		TALLA PANTALÓN (30, 32...):	36	No. CALZADO:	40
CONTROLADO POR:	Gineth Dayana Pabon A.	CARGO:	Prof. SST - A	FIRMA:	Gineth Pabon				

MOTIVO DE ENTREGA (MES): 1- ORDINARIA: Entrega inicial o periodicidad establecida | 2- DESGASTE: Reposición por desgaste del elemento del elemento | 3- PÉRDIDA: Nueva entrega por pérdida

FECHA DE ENTREGA DIA-MES-AÑO	EPP	P. CABEZA			P. PIES		P. INVERNAL		P. MANOS				P. RESPIRATORIA		P. OJOS		P. AUDITIVA			EQUIPOS ESPECIALES			ROPA TRABAJO				FIRMA
		CASCO INDUSTRIAL	CASCO CON BARBUQUEJO	CAPUCHON: MONJA	BOTAS CUERO REQUEMADO	BOTAS CAUCHO ROJO	CHAQUETA O CHAMARRA	CHAQUETA Y PANTALÓN	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	NITRILO/LATEX	ANTIDESLIZANTE	RESPIRADOR CON FILTROS Y CARTUCHOS	TAPABOCAS	GAFAS SEGURIDAD	GAFAS CONTRA IMPACTOS	COPA	INSERCIÓN	DESECHABLE CUBO	ARNES	ESLINGA	LINEA DE VIDA	CAMISA	PANTALÓN	OVEROL	CHALECO	
15-OCT-25	ME	1				1			1						1	1								1		1	Dairo Chacon U.
	CANT	1				1			1						1	1								1		1	Dairo Chacon U.
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos. igualmente Yo, DAIRO CHACON URIBE, autorizo al Consorcio para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de pérdida intencional o la no devolución del mismo, igualmente autorizo, para que se descuente de mi salario las multas o sanciones impuestas por el no cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Empresa con relación a los EPP.

Dairo Chacon Uribe
FIRMA DEL TRABAJADOR
cc. 1064 840 995

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SS-SST-FT 03
Versión: 001
Fecha: 15/10/2025

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS CUROS - BELÉN, UBICADO EN EL TRAMO EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Diego Andres Trillos Jacome				
CARGO:	Ayudante	C.C.:	1094684474.	TALLA CAMISA (S, M, L, XL, XXL):		TALLA PANTALÓN (30, 32,...):	32.	No. CALZADO:	40
CONTROLADO POR:	Gineth Dayana Pabo	CARGO:	Prof. SST-A	FIRMA:	Gineth Pabo				

MOTIVO DE ENTREGA (ME): 1- ORDINARIA: Entrega inicial y periodicidad establecida. 2- DESGASTE: Reposición por desgaste del elemento del elemento. 3- PERDIDA: Nueva entrega por pérdida.

FECHA DE ENTREGA DD/MM/AAAA	EPP*	P. CABEZA			P. PIES		P. INVERNAL		P. MANOS				P. RESPIRATORIA		P. OJOS		P. AUDITIVA			EQUIPOS ESPECIALES			ROPA TRABAJO				FIRMA
		CASCO INDUSTRIAL	CASCO CON BARBUQUEJO	CAPUCHON ANTIAC.	BOTAS CUERO DIELECTRICAS	BOTAS CAUCHO RES.	CHAQUETA/PONCHO	CHAQUETA Y PANTALÓN	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES LATEX	GUANTES NITRILO	PROTECTOR RESPIRATORIO CARTUCHOS	TAPABOCA	GAFAS SEGURIDAD	GAFAS CONTRA IMPACTOS	COPA	INSERCIÓN	DIADEMA CASCO	ARNES	ESLINGA	LINEA DE VIDA	CAMISA	CHAQUETA	BUSO/POLO	CHALECO	
15-Oct-25	ME	1			1				1					1	1									1		1	
	CANT	1			1				1					1	1									1		1	
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	AR																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o deterioro para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos. Igualmente Yo, Diego Andres Trillos Jacome autorizo al Consorcio para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de pérdida intencional o la no devolución del mismo, igualmente autorizo, para que se descuente de mi salario las multas o sanciones impuestas por el incumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Empresa con relación a los EPP.

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. 1094684474.

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Codigo: ES-SST-FT-03
Version: 001
Fecha: 15/10/2025

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO RECTORES LOS CLAVOS, RUTA 1, UBICADO EN EL TRAMO EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Juan Camilo Vargel		
CARGO:	Ayudante	C.C.:	1.097.673.624	TALLA CAMISA (S, M, L, XL, 2XL):	TALLA PANTALÓN (28, 32, ...): 32 — No CALZADO: 39
CONTROLADO POR:	Gineth Octavio Faba	CARGO:	Prof. SST - A	FIRMA:	Gineth Faba

MOTIVO DE ENTREGA (ME): 1- ORDINARIA Entrega inicial o periodicidad establecida. 2- DESGASTE Reposición por deterioro del elemento del elemento. 3- PÉRDIDA Nueva entrega con reporte.

FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AAAA)	EPP	P. CABEZA			P. PIES		P. INVERNAL		P. MANOS				P. RESPIRATORIA		P. OJOS		P. AUDITIVA			EQUIPOS ESPECIALES			ROPA TRABAJO				FIRMA
		CASCO INDUSTRIAL	CASCO CON BARBUQUEJO	CACHUCHA - VISERA	BOTAS CON PUNTA DE SEGURIDAD	BOTAS CAUCHO RES.	BARBIFORM / PONCHO	OVEROL EN TELA	GUANTES CARNAZA	GUANTES NITRILO	GUANTES LATEX	GUANTES VAQUETA	MASCARILLA CON FILTROS CARTUCHOS	TAPABOCA	GAFAS	GAFAS CONTRA IMPACTO	COPA	INSERCIÓN	DIADEMA Y CASCO	ARNES	ESLINGA	LINEA DE VIDA	CAMISA	PANTALÓN	CHAQUETA	CHALECO	
15-Oct-25	ME	1			1				1						1	1								1		1	Juan Camilo
	CANT	1			1				1						1	1								1		1	Juan Camilo
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o deterioro para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos. Igualmente Yo, Juan Camilo Vargel autorizo al Consorcio para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de pérdida intencional o la no devolución del mismo, igualmente autorizo, para que se descuente de mi salario las multas o sanciones impuestas por el incumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Empresa y con relación a los EPP.

Juan Camilo Vargel
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. 1.097.654.242

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ES-SST-FT 03
Versión: 001
Fecha: 15/10/2025

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELÉN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER			NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Guver Antonio Sanchez Burda		
CARGO:	Ayudante de Obra	C.C.:	1317 5352	TALLA CAMISA (S, M, L, XL, 2XL):		TALLA PANTALÓN (28, 32...):	34	No. CALZADO:	39
CONTROLADO POR:	Gineth Cayetana Paba	CARGO:	Profesional SST-A			FIRMA:	Gineth Paba		

MOTIVO DE ENTREGA (ME): 1- ORDINARIA: Entrega inicial o periodicidad establecida. 2- DESGASTE: Reposición por desgaste del elemento del elemento. 3- PERDIDA: Nueva entrega por pérdida

FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AAAA)	EPP	P. CABEZA			P. PIES		P. INVERNAL		P. MANOS				P. RESPIRATORIA		P. OJOS		P. AUDITIVA			EQUIPOS ESPECIALES			ROPA TRABAJO				FIRMA
		CASCO INDUSTRIAL	CASCO CON BARBUQUEJO	CAPUCHON - MONJA	BOTAS CUERO SEGURIDAD	BOTAS CAUCHO DIELECTRICAS	GABARDINA - PONCHO	CHAQUETA Y PANTALON	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	GUANTES LATEX	GUANTES NITRILO	MASCARILLA DESECHABLE O CON CARTUCHOS	MASCARA	GAFAS DE SEGURIDAD	CAREY CONTRA IMPACTOS	GAFA	DIADEMA	ENSAMBLE CASCO	ARNES	ESLINGAS	LINEA DE VIDA	CAMISA	PANTALON	OVEROL	CHALECO	
15-oct-2025	ME	1				1			1					1	1									1		1	NO FIRMA
	CANT	1				1			1					1	1									1		1	NO FIRMA
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										
	ME																										
	CANT																										

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o deterioro para proceder a su respectiva reposición; se compromete a dar uso adecuado de los mismos. igualmente Yo, Guver Antonio Sanchez, autorizo al Consorcio para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de pérdida intencional o la no devolución del mismo; igualmente autorizo, para que se descuente de mi salario las multas o sanciones impuestas por el no cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Empresa con relación a los EPP.

NO FIRMA.
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. 1317 5352

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO

FORMATO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ES-SST-FT-03
Versión: 001
Fecha: 15/10/2025

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS CAYOS - BELÉN, LOCALIZADO EN EL PERÍMETRO URBANO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER			NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Reinaldo Manosalva		
CARGO:	Obrero	C.C.	5.294.916	TALLA CAMISA (S, M, L, XL, XXL):		TALLA PANTALÓN (30, 32, ...):	38	No CALZADO:	39
CONTROLADO POR:	Gineth Dayana Peña	CARGO:	Prof. SST - Amb	FIRMA:			

MOTIVO DE ENTREGA (ME): 1- ORDINARIA: Entrega inicial o periodicidad establecida | 2- DESGASTE: Reposición por deterioro del elemento del elemento | 3- PÉRDIDA: Nueva entrega por pérdida

FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AAAA)	EPP	P. CABEZA			P. PIES		P. MIXTA		P. MANOS				P. RESPIRATORIA		P. OJOS		P. AUDITIVA			EQUIPOS ESPECIALES			ROPA TRABAJO				FIRMA
		CASCO ANTIGOLPES	CASCO CON BARBUQUEJO	CAPUCHÓN TERMICO	BOTAS CAÑA MEDIA	BOTAS CAÑA ALTA	OVEROL	CHAQUETA Y PANTALÓN	GUANTES LATEX	GUANTES VAQUETA	GUANTES NITRILO	GUANTES KEVLAR	MASCARILLA PURIFICADORA	CARTUCHOS	GAFAS	CARETA	COPA	BALACLAVA	TAPONES O CASCO	ARNES	ESTROBO	LINTERNA	CAMISA	PANTALÓN	CHALECO	
	ME	1				1			1						1	1								1		1	Reinaldo M.
	CAMP	1				1			1						1	1								1		1	Reinaldo M.
	ME																										
	CAMP																										
	ME																										
	CAMP																										
	ME																										
	CAMP																										
	ME																										
	CAMP																										
	ME																										
	CAMP																										
	ME																										
	CAMP																										
	ME																										
	CAMP																										
	ME																										
	CAMP																										

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o deterioro para proceder a su respectiva reposición, se compromete a dar uso adecuado de los mismos. Igualmente yo, Reinaldo manosalva, autorizo al Consorcio para que descuente de mi salario el valor correspondiente del EPP en caso de pérdida intencional o la no devolución del mismo, igualmente autorizo, para que se descuente de mi salario las multas o sanciones impuestas por el incumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la Empresa con relación a los EPP.

Reinaldo Manosalva
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C.

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

Anexo. 5

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST

FECHA	17 octubre 2025	LUGAR	frente de obra
HORA	7:00 am	NOMBRE DEL CAPACITADOR	Gineth Paba
TEMA	Socialización del plan de manejo Ambiental		

CRITERIOS: INDUCCIÓN ____ REINDUCCIÓN ____ CAPACITACIÓN X OTRA ____

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA ASISTENTE
MARCIAL FERNANDO PALLARES VACA	Ing. Residente	1064839866	Marcial Pallares Vaca
DARIO CHACON URIBE	Maestro	10[illegible]995	Dario Chacon Uribe
CRISTIAN FERNANDO RIOS CHACON	Maestro	1064841249	Cristian Fernando Rios Chacon
LEONARDO AUGUSTO RINCON CHACON	Maestro	1.064835297	Leonardo Rincon
CARLOS ALBERTO PEREZ	ayudante	13774777	CARLOS ALBERTO PEREZ
DANIER STIVEN CONTRERAS RUEDAS	Ayudante	1003174824	Danier Contreras
DEIVY TARAZONA SARABIA	Ayudante	1007539444	Deivis Tarazona
DIEGO FERNANDO PEREZ CONTRERAS	ayudante	1092730643	Diego Fernando Perez
GUIVER ANTONIO SANCHEZ RUEDAS	Ayudante	13775352	NO FIRMA
JOSE DELFIN TRILLOS MOJA	ayudante	5084256	[illegible]
JUAN CARLO VERGEL CALDERON	ayudante	1.091.654.272	Juan Carlo Vergel
MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Ayudante	1069578421	Marco H
NIXON ARMANDO CARRASCAL RUEDAS	Ayudante	13.176.421	Nixon Carrascal
RONALD EMIRO SÁNCHEZ ASCANIO	Ayudante	1004903749	Ronald Sanchez
VICTOR MANUEL MEJIA CARDENAS	Ayudante	1064741134	Victor H
YANDER TRIGOS	Ayudante	13.178.016	Yander Trigos
DIEGO ANDRES TRILLOS JACOME	Ayudante	1091660474	[illegible]
JHONATHAN DURAN	Ayudante	1092670290	Jhonatan Duran
ALEXANDER PEREZ CONTRERAS	Ayudante	1092670975	ALEXANDER PEREZ C.
YANIER ELIAS LAZARO PATIÑO	Ayudante	1148440336	Yanier L.
YORDAN STIVEN OVALLOS AHENCIO	Ayudante	1092671114	Yordan Ovallos A.

Nombre del capacitador: Gineth Paba Firma:

Observaciones:

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST

FECHA	21 octubre 2025	LUGAR	Frente de obra
HORA	7:10 am	NOMBRE DEL CAPACITADOR	Gineth Pabon
TEMA	La importancia de no hacer bromas en los Puestos de trabajo		

INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRA ☒ X

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA ASISTENTE
MARCIAL FERNANDO PALLARES VACA	Ing. Residente	1004859866	Marcial Pallares Vaca
DAIRO CHACÓN URIBE	Maestro	1064840995	Dairo Chacon Uribe
CRISTIAN FERNANDO RIVAS CHACÓN	Maestro	1064841249	Cristian Fernando Rivas Chacon
LEONARDO AUGUSTO RINCÓN CHACÓN	Maestro	1.064.839.274	Leonardo Rincon
CARLOS ALBERTO PEREZ	AYUDANTE	93772177	CARLOS ALBERTO
DAMIEN STIWER CONTRERAS RUEDAS	Ayudante	1003134824	Damien Contreras
DENY TARAZONA SARABIA	ayudante	1007539444	Deivis Tarazona
DIEGO FERNANDO PEREZ CONTRERAS	ayudante	1092770647	Diego Fernando Perez
OLIVER ANTONIO SANCHEZ RUEDAS	Ayudante	13175352	NO FIRMA
JOSE DELFIN TRILLOS MEJIA	ayudante	5094756	
JUAN CAMILO VERGEL CALDERÓN	ayudante	1.047.434.776	Juan Camilo Vergel
SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Ayudante	1068578434	
NIXON ARMANDO CARRASCAL RUEDAS	Ayudante	13.176.421	Nixon Carrascal
RONALD ENRIQUE SANCHEZ ASCANIO	Ayudante	1007903719	Ronald Sanchez
VICTOR MANUEL MEJIA CÁRDENAS	Ayudante	1064741134	Victor M
YANDER TRIGOS	Ayudante	13.178.015	Yander Trigos
DIEGO ANDRES TRILLOS JACOME	Ayudante	1091660474	
JHONATHAN DURAN	Ayudante	1092670390	Jhonatan Duran
ALEXANDER PEREZ CONTRERAS	Ayudante	1092670475	ALEXANDER PEREZ C.
YANER ELIAS LAZARO PATIÑO	Ayudante	1148440336	Yaner L.
YORDAN STIVEN OVALLOS AVENDAÑO			

Nombre del capacitador: Gineth Pabon Firma:

Observaciones

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST

FECHA	27 octubre 2025	LUGAR	Frente de obra
HORA	7:05am	NOMBRE DEL CAPACITADOR	Gineth Paba
TEMA	Uso correcto de los elementos de protección personal		

CRITERIOS: INDUCCIÓN ____ REINDUCCIÓN ____ CAPACITACIÓN ____ OTRA X

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA ASISTENTE
MARCIAL FERNANDO PALLARES VACA	Ing. Residente	1064839866	Marcial Pallares Vaca.
DAIRO CHACÓN UNIBE	MAESTRO	1064840995	Dairo Chacon Unibe
CRISTIAN FERNANDO RIOS CHACON	Maestro	1064841249	Cristian Fernando Rios Chacon
LEONARDO AUGUSTO RINCON CHACÓN	Maestro	1.065 535 274	Leonardo Augusto Rincon Chacon
CARLOS ALBERTO PEREZ	AYudante	77777777	CARLOS ALBERTO PEREZ
DAINER STHIBER CONTRERAS RUEDAS	Ayudante	1003174824	Dainer Contreras
DEIVIS TAPIA ZONA SARABIA	Deivis Ayudante	1007539444	Deivis Tapiazona
DIEGO FERNANDO PEREZ CONTRERAS	ayudante	1092730643	Diego Fernando Perez
GUAVEN ANTONIO SÁNCHEZ RUEDAS	AYudante	15175352	NO FIRMA
JOSE DELFIN TRILLOS MEJIA	ayudante	5084256	
JUAN CAMILO VERGEL CALDERON	ayudante	1.041.654.172	Juan camilo
MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Ayudante	1068 [illegible]	[illegible]
NIXON ARMANDO CARRASCAL RUEDAS	AYudante	13.176.121	Nixon carrascal
RONALD ENRIQUE SÁNCHEZ ASCANIO	AYudante	1004903449	Ronald Sanchez
VICTOR MANUEL MEJIA CÁRDENAS	Ayudante	1064741134	Victor M
YANDER TRIGOS	Ayudante	13.178.065	Yander trigos
DIEGO ANDRES TRILLOS JACOME	Ayudante	1091680474	
JHONATHAN DURAN	Ayudante	1092670340	Jhonathan Duran
ALEXANDER PEREZ CONTRERAS	AYudAnte	1092670976	ALEXANDER PEREZ C.
YANIER DJAS LAZARO PAÑO	Ayudante	1148440336	yanier L.
YORDAN STIVEN OVALLOS AVENDAÑO			

Nombre del capacitador: Gineth Paba Firma:

Observaciones:

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO

ASISTENCIA A CAPACITACION INDUCCION Y REINDUCCION DE SST

FECHA	31 octubre 2025	LUGAR	Frente de obra
HORA	7:05 am	NOMBRE DEL CAPACITADOR	Gineth Paba
TEMA	Correcta Separación de los residuos solidos		

X

NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
MARCIAL FERNANDO PALLARES VACA	Ing. Residente	1064834866	Marcial Pallares Vaca
DIARO CHACÓN IVIRE	Maestro	1064840945	
CRISTIAN FERNANDO RICO CHACÓN	Maestro	1064841244	
LEONARDO AUGUSTO RINCON CHACON	Maestro	1007737231	
CARLOS ALBERTO PEREZ	AYUDANTE	73777777	CARLOS ALBERTO
DANER STIVEN CONTRERAS RUEDAS	ayudante	1003174824	Daner Contreras
DENY TARAZONA NARANJO	ayudante	1007534444	Denis Tarazona
DIEGO FERNANDO PEREZ CONTRERAS	ayudante	1092930643	Diego Fernando Perez
OLIVER ANTONIO SANCHEZ RUEDAS	Ayudante	13175352	NO FIRMA
JOSE DELFIN TRILLOS MEJIA	ayudante	5084256	
JUAN CARLO VERGEL CALDERÓN	ayudante	1.047.654.272	
MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Ayudante	1064944957	
NIXON ARMANDO CARRASCAL RUEDAS	AYudante	13.176.421	Nixon carrascal
RONALD EMIRO SANCHEZ ASCANIO	Ayudante	1004903749	Ronald Sánchez
VICTOR MANUEL MEJIA CARDENAS	Ayudante	1064741134	Victor M
YANDER TRIGOS	AYUdante	13.178.018	Yunier Trigos
DIEGO ANDRES TRILLOS JACOME	Ayudante	1091680474	
JHONATHAN DURAN	Ayudante	1092670390	Jhonatan Duran
ALEXANDER PEREZ CONTRERAS	AYUDANTE	1092670975	ALEXANDER PEREZ C.
YAMER ELIAS LAZARO PATIÑO	Ayudante	1148446336	yamer L.
YERSAN STIVEN OVALLOS AVENDAÑO			

Nombre del capacitador: Gineth Paba Firma

Observaciones

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST

FECHA:	04 - Noviembre 2025	LUGAR:	Frente de obra
HORA:	7:00 am	NOMBRE DEL CAPACITADOR:	Gineth Paba
TEMA:	uso adecuado de herramientas		

CRITERIOS: INDUCCIÓN | REINDUCCIÓN | CAPACITACIÓN | OTRO: X

NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA ASISTENTE
MARCIAL FERNANDO PALLARES VACA	Ing Residente	1064839866	Marcial Pallares Vacca
DARIO CHACON URIBE	MAESTRO	1064840995	Dario chacon Uribe
CRISTIAN FERNANDO RICO CHACÓN	Maestro	1064561249	Cristian Fernando Rico Chacon
LEONARDO AUGUSTO RINCON CHACÓN	Maestro	1064838277	Leonardo Rincon
CARLOS ALBERTO PÉREZ	Ayudante	73777777	CARLOS ALBERTO
DARWIN STIWER CONTRERAS RUEDAS	ayudante	1002137487	Darw. Contreras
DENYS TARAZONA SARABIA	ayudante	1007539444	Denys Tarazona
DIEGO FERNANDO PEREZ CONTRERAS	ayudante	1092730643	Diego fernando Perez
OLIVER ANTONIO SANCHEZ RUEDAS	Ayudante	13175352	NO FIRMA
JOSE DELFIN TRILLOS MEJIA	Ayudante	5084256	
JUAN CAMILO VERGEL CALDERÓN	ayudante	1.097.654.276	Juan camilo vergel
MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Ayudante	1098976437	
NIXON ARMANDO CARRASCAL RUEDAS	Ayudante	13.176.421	Nixon carrascal
RONALD EMIRO SANCHEZ ASCANIO	Ayudante	1064901749	Ronald Sanchez
VICTOR MANUEL MEJIA CARDENAS	Ayudante	1064741134	Victor M
YANDER TRIGOS	Ayudante T.S	13.178.015	Yander Trigos
DIEGO ANDRES TRILLOS JACOME	Ayudante	1091688479	
JHONATHAN DURAN			
ALEXANDRA PEREZ CONTRERAS			
YANDER ELIAS LAZARO PATIÑO			
YORDAN STIVEN OVALLOS AVENDAÑO			

Nombre del capacitador: Gineth Paba Firma

Observaciones.

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST

FECHA	10 Noviembre 2025	LUGAR	Frente de obra
HORA	7:00 am	NOMBRE DEL CAPACITADOR	Gineth Paba
TEMA	la importancia de cuidar los recursos naturales		

INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ X

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA ASISTENTE
MARCIAL FERNANDO PALLARES VACA	Ing. Residente	1064834866	Marcial Pallares Vaca
DARIO CHACÓN URIBE	MAESTRO	1064840945	Dario Chacon Uribe
CRISTIAN FERNANDO RICO CHACÓN	Maestro	1064841244	Cristian Fernando Rico Chacon
LEONARDO AUGUSTO RINCÓN CHACÓN	Fontanero	1.064.838.079	Leonardo Rincon
CARLOS ALBERTO PEREZ	AYUDANTE	73777777	CARLOS ALBERTO
DANNER STINDER CONTRERAS RUEDAS	ayudante	1092174874	Danner Contreras Ruedas
DEIVY TARAZONA SANABRIA	ayudante	1007539444	Deivy Tarazona
DIEGO FERNANDO PEREZ CONTRERAS	ayudante	1093726647	Diego Fernando Perez
OLIVER ANTONIO SANCHEZ RUEDAS	Ayudante	13175352	NO FIRMA
JOSE DELFIN TRILLOS MEJIA	ayudante	5084256	
JUAN CAMILO VERGEL CALDERON	ayudante	1.047.654.272	Juan Camilo Vergel
MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Ayudante	1064794[illegible]	Marco
NIXON ARMANDO CARRASCAL RUEDAS	Ayudante	73176421	Nixon Carrascal
RONALD ERRIO SANCHEZ ASCANIO	Ayudante	1064903719	Ronald Sanchez
VICTOR MANUEL MEJIA CÁRDENAS	Ayudante	1064741134	Victor M
YANDER TRIGOS	Ayudante	13.178.015	Yander Trigos
DIEGO ANDRES TRILLOS JACOME	Ayudante	1091688474	Diego
JHONATHAN DURAN			
ALEXANDER PEREZ CONTRERAS			
YAMER ELIAS LAZARO PATIÑO			
YORDAN STIVEN OVALLOS AVENDAÑO			

Nombre del capacitador: Gineth Paba Firma:

Observaciones

CONSORCIO ALCANTARILLADO	CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST

FECHA	12 Noviembre 2025	LUGAR	frente de obra
HORA	7:10 am	NOMBRE DEL CAPACITADOR	Gineth Pabon
TEMA	Identificación de riesgos en el area de trabajo		

CAPACITACIÓN: ___ REINDUCCIÓN: ___ CAPACITACIÓN: ___ OTRO: X

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA ASISTENTE
MARCIAL FERNANDO PALLARES VACA	Ing. Residente	1064834866	Marcial Pallares Vaca.
DARIO CHACON URIBE	MAESTRO	1064840995	Dario chacon Uribe
CRISTIAN FERNANDO RIOS CHACON	Maestro	1064541241	Cristian Fernando Rios Chacón
LEONARDO AUGUSTO RINCON CHACON	Albañil	1064533234	Leonardo Rincon
CARLOS ALBERTO PEREZ	AYUDANTE	73777777	CARLOS Alberto
DANER STIWER CONTRERAS RUEDAS	ayudante	1003174824	Daner (DAMPER)
DEIVY TARAZONA SANABRIA	ayudante	1007534444	Deivis Tarazona
DIEGO FERNANDO PEREZ CONTRERAS			
OLIVER ANTONIO SANCHEZ RUEDAS	AYUDANTE	15195352	NO FIRMA
JOSE DELFIN TRILLOS MEJIA	ayudante	5084256	
JUAN CAMILO YERGEL CALDERON	ayudante	1.047.694.272	Juan camilo Yergel
MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Ayudante	1068 5784 1	Marco H.
NIXON ARMANDO CARRASCAL RUEDAS	AYUDANTE	13.176.421	Nixon carrascal
RONALD EMIRO SANCHEZ ASCANIO	AYUDANTE	1004903749	Ronald Sanchez
VICTOR MANUEL MEJIA CARDENAS	Ayudante	1064741134	Victor M
YANDER TRIGOS	AYUDANTE	12.178.015	yander Trigos
DIEGO ANDRES TRILLOS JACOME	Ayudante	1091680474	
JHONATHAN DURAN			
ALEXANDER PEREZ CONTRERAS			
YAMER ELIAS LAZARO PATIÑO			
YERDAN STIVEN OVALLOS AYENDAÑO			
REINALDO MANOSALVA	AYUDANTE	5084 805	Reinaldo Manosalva

Nombre del capacitador: Gineth Pabon Firma:

Observaciones:

CONSORCIO ALCANTARILLADO

FORMATO
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SST

FECHA:	14 Noviembre 2025	LUGAR:	Frente de obra
HORA:	7:00 am	NOMBRE DEL CAPACITADOR:	Gineth Pabon
TEMA:	Comunicación y trabajo en equipo		

CRITERIOS: INDUCCIÓN ____ REINDUCCIÓN ____ CAPACITACIÓN ____ OTRO ____

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA ASISTENTE
MARGIAL FERNANDO PALLARES VACA	Ing. Residente	1064839866	Margial Pallares Vaca
DAIRO CHACÓN URIBE	Maestro	1064840995	Dairo Chacon Uribe
CRISTIAN FERNANDO RIOS CHACON	Maestro	1064541249	Cristian Fernando Rios Chacon
LEONARDO AUGUSTO RINCON CHACÓN	Maestro	1065538239	Leonardo Augusto Rincon
CARLOS ALBERTO PEREZ	Ayudante	13177777	CARLOS ALBERTO
DARNEA STINER CONTRERAS RUEDAS	Ayudante	1003174824	Darnea contreras
DENY TARAZONA SAMBIA	Ayudante	1007534444	Deivis Tarazona
DIEGO FERNANDO PEREZ CONTRERAS			
OLIVER ANTONIO SANCHEZ RUEDAS	Ayudante	13175352	NO FIRMA
JOSE DELFIN TRILLOS MEJIA	Ayudante	5084256	
JUAN CAMILO VERGEL CALDERON	Ayudante	1.047.654.272	Juan Camilo Vergel
MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Ayudante	1065704037	Marco H
NIXON ARMANDO CARRASCAL RUEDAS	Ayudante	13.176.421	Nixon Carrascal
RONALD ENRRIQUE SANCHEZ ASCANIO	Ayudante	1004903744	Ronald Sanchez
VICTOR MANUEL REJA CÁRDENAS	Ayudante	1064741134	Victor M.
YHADIR TRIGOS	Ayudante	13.178.015	Yhader Trigos
DIEGO ANDRES TRILLOS JACOME	Ayudante	1091680474	
JHONATHAN DURAN			
ALEXANDER PEREZ CONTRERAS			
YAMER ELIAS LAZARO PATIÑO			
FORDAN STIVEN OVALLOS AVENDAÑO			
REINALDO MANOSALVA	Ayudante	5.084.805	Reinaldo Manosalva

Nombre del capacitador: Gineth Pabon Firma:

Observaciones

Anexo. 6

CONSORCIO ALCANTARILLADO	**CONSORCIO ALCANTARILLADO**	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901992571-8	CONSORCIO ALCANTARILLADO	CL 3 23 15	3111111	CONSORCIOALCANTARILLADO OSG@GMAIL.CON	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	S – Inferior a 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (CAMBIARIO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (CAMBIARIO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	07/11/2025	91224997	$2.646.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS10	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	7.600	0		0		0	0	0	0	7.600	1
EPS008	Sanitas EPS	800251440-6	16.000	0		0		0	0	0	0	16.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	102.606	0		0		0	0	0	0	102.606	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	77.900	0		0		0	0	0	0	77.900	5
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	7.600	0		0		0	0	0	0	7.600	1
ESSC24	EPS-S Cosalud	900226715-3	15.200	0		0		0	0	0	0	15.200	4
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900566126-7	37.200	0		0		0	0	0	0	37.200	3

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora PEP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	900228058-9	630.000	0	0	0	0	0	0		630.000	12
25-14	Colpensiones	900336004-7	532.000	0	0	0	0	0	0		532.000	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-13	ARL SURA	830031790-9	590.100				590.100	0	0	590.100			5.901	590.100	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF30	Comfanorte	890503016-6	842.000	0	0	842.000	21

PAGADA

CONSORCIO ALCANTARILLADO	**CONSORCIO ALCANTARILLADO**	
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901992871-8	CONSORCIO ALCANTARILLADO		CL 3 23 15	1111111	CONSORCIOALCANTARILLAD OD@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APO
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	07/11/2025	91224887	$2.946.100	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	342.000	342.000
Pensión	2	1.369.000	1.369.000
Riesgos Laborales	1	596.100	596.100
CCF	1	342.000	342.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	2.946.100	2.946.100

PAGADA

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

CONSORCIO ALCANTARILLADO

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 15 OCT - 14 NOV 2025

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901992571-8	CONSORCIO ALCANTARILLADO	CL 2 23 15	1111111	CONSORCIOALCANTARILLADO06@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c		NORTE DE SANTANDE	OCAÑA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	07/11/2025	91224987	$2.648.100	

DETALLE POR COTIZANTE


INFORMACION COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES														PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y nombres	Colombiano	Extranjero	Extranjero en tránsito	Pensionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRP	Cód. AFP	Días AFP	Salario	Cotización	Voluntario o retirado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Pensión de cubiertos	Cód. EPS	Días EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	Días ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	Días CCF	Aporte CCF	Días cotiz. parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1053174554	CONTRERAS RUEDA DANER ESTIVEN	1	0			X	X													230301	474.600	19.000	0	0	0	0	ESS042	474.600	19.000	14-01	474.600	3	0,522	19.000	CCF36	474.600	19.000	0	0	0	0	0
2	CC	1094868748	SANCHEZ NAGANO RAFAEL ENRIQ	1	0			X	X													28-14	427.260	17.100	0	0	0	0	EPS041	427.260	17.100	14-01	427.260	3	0,522	28.600	CCF36	427.260	17.100	0	0	0	0	0
3	CC	1007338444	TARAZONA LARAMBA DEILY	1	0			X	X													28-14	189.600	7.600	0	0	0	0	EPS190	189.600	7.600	14-01	189.600	3	0,522	13.300	CCF36	189.600	7.600	0	0	0	0	0
4	CC	1094791194	VILLA CARDENAS VICTOR SAMUEL	1	0			X	X													230301	189.600	30.400	0	0	0	0	EPS041	189.600	7.600	14-01	189.600	3	0,522	13.300	CCF36	189.600	7.600	0	0	0	0	0
5	CC	1094488294	RINCON CHACON LEONARDO AUGUSTO	1	0			X	X													230301	474.600	19.000	0	0	0	0	EPS037	474.600	19.000	14-01	474.600	3	0,522	33.100	CCF36	474.600	19.000	0	0	0	0	0
6	CC	1094488888	PALLARES VACA MARCIAL FERNANDO	1	0			X	X													230301	474.600	19.000	0	0	0	0	EPS037	474.600	19.000	14-01	474.600	3	0,522	33.100	CCF36	474.600	19.000	0	0	0	0	0
7	CC	1094480414	TRILLOS JACOME DIEGO ANDRES	1	0			X	X													230301	474.600	19.000	0	0	0	0	EPS037	474.600	19.000	14-01	474.600	3	0,522	33.100	CCF36	474.600	19.000	0	0	0	0	0
8	CC	1091884212	LEPESQUEZ CALDERON JUAN CAMILO	1	0			X	X													28-14	189.600	30.400	0	0	0	0	EPS037	189.600	7.600	14-01	189.600	3	0,522	13.300	CCF36	189.600	7.600	0	0	0	0	0
9	CC	1092872290	DURAN CASTILLA JHONATAN	1	0			X	X													28-14	474.600	76.200	0	0	0	0	EPS037	474.600	19.000	14-01	474.600	3	0,522	33.100	CCF36	474.600	19.000	0	0	0	0	0
10	CC	1140443558	LAZARO PATIÑO YAMIER ELIAS	1	0			X	X													230301	427.260	68.400	0	0	0	0	ESS028	427.260	17.100	14-01	427.260	3	0,522	28.600	CCF36	427.260	17.100	0	0	0	0	0
11	CC	1007788821	SANCHEZ RUEDAS SILVER ANTONIO	1	0			X	X													230301	427.260	68.400	0	0	0	0	EPS041	427.260	17.100	14-01	427.260	3	0,522	28.600	CCF36	427.260	17.100	0	0	0	0	0
12	CC	1007788231	DARRASCAL RUEDAS RAMON ARMANDO	1	0			X	X													28-14	189.600	30.400	0	0	0	0	EPS042	189.600	7.600	14-01	189.600	3	0,522	13.300	CCF36	189.600	7.600	0	0	0	0	0
13	CC	1094482888	DIAZGON URIBE DARIO	1	0			X	X													230301	474.600	76.000	0	0	0	0	ESS042	474.600	19.000	14-01	474.600	3	0,522	33.100	CCF36	474.600	19.000	0	0	0	0	0
14	CC	1094481248	RODRIGUEZ CRISTIAN FERNANDO	1	0			X	X													230301	474.600	76.000	0	0	0	0	EPS037	474.600	19.000	14-01	474.600	3	0,522	33.100	CCF36	474.600	19.000	0	0	0	0	0
15	CC	1090773437	HERNANDEZ HERNANDEZ UNRICO ANTONIO	1	0			X	X													230301	474.600	76.000	0	0	0	0	EPS037	474.600	19.000	14-01	474.600	3	0,522	33.100	CCF36	474.600	19.000	0	0	0	0	0
16	CC	1007777777	PEREZ CARLOS ALBERTO	1	0			X	X													230301	427.260	68.400	0	0	0	0	ESS024	427.260	17.100	14-01	427.260	3	0,522	28.600	CCF36	427.260	17.100	0	0	0	0	0
17	CC	1007788318	TRIGOS YANDER	1	0			X	X													230301	427.260	68.400	0	0	0	0	ESS024	427.260	17.100	14-01	427.260	3	0,522	28.600	CCF36	427.260	17.100	0	0	0	0	0
18	CC	1094481288	TRILLOS VILLA JOSE DELFIN	1	0			X	X													28-14	474.600	76.200	0	0	0	0	ESS042	474.600	19.000	14-01	474.600	3	0,522	33.100	CCF36	474.600	19.000	0	0	0	0	0
19	CC	1092873478	PEREZ CONTRERAS ALEXANDER	1	0			X	X													28-14	427.260	68.400	0	0	0	0	EPS041	427.260	17.100	14-01	427.260	3	0,522	28.600	CCF36	427.260	17.100	0	0	0	0	0
20	CC	1092871114	CHALLOS AVENDAÑO YORDAN STIVEN	1	0			X	X													28-14	474.600	76.200	0	0	0	0	ESS024	474.600	19.000	14-01	474.600	3	0,522	33.100	CCF36	474.600	19.000	0	0	0	0	0
21	CC	1092730643	PEREZ CONTRERAS DIEGO FERNANDO	1	0			X	X													28-14	474.600	76.200	0	0	0	0	EPS041	474.600	19.000	14-01	474.600	3	0,522	33.100	CCF36	474.600	19.000	0	0	0	0	0

Anexo. 7

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MAQUINARIA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: SGSST-PDIHEM-01 Version: 001 Fecha: 15/10/2025

FECHA: 17 (DD) / 10 (MM) / 2025 (AAAA)

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
Sitio de Inspección:	Cambrento

Herramienta de Corte	SEGUETAS/ SERRUCHO/SIERRA		
No Herramientas:			
USO	Buen uso [X]	Mal uso [ ]	
OBSERVACIONES DE USO			

CONDICIÓN (No. Herramientas)	Bueno	Malo	OBSERVACIONES
El bastidor o marco se encuentra en buen estado, no presenta fisuras no esta roto o arqueado.	X		
Las hojas cuentan con sus dientes y estos están bien afilados, no están rotos o desgastados.	X		
La hoja se encuentra bien ajustada al bastidor.	X		
La sierra esta limpia y libre de grasa.	X		

Herramienta de Corte	CANGURO		
No Herramientas:			
USO	Buen uso [X]	Mal uso [ ]	
OBSERVACIONES DE USO			

CONDICIÓN (No. Herramientas)	Bueno	Malo	OBSERVACIONES
El tanque de gasolina se encuentra en buen estado (no presentan fisuras o estén rotos).	X		
El fuelle de caucho esta en buenas condiciones (no tiene fisuras)	X		
La placa vibradora se encuentra ajustada y en buen estado (no presnte fisuras)	X		

Herramientas Electricas	CORTADORA/PULIDORAS		
No Herramientas:			
USO	Buen uso [X]	Mal uso [ ]	
OBSERVACIONES DE USO			

CONDICIÓN (No. Herramientas)	Bueno	Malo	OBSERVACIONES
El bastidor o marco se encuentra en buen estado, no presenta fisuras no esta roto o arqueado	X		
El disco abrasivo esta en buenas condiciones	X		
El guarda o protector esta en buen estado (no hay fisuras)	X		
El interruptor y boton de uso continuo se encuentra en buenas condiciones	X		
La herramienta esta limpia y libre de grasa	X		

Herramienta Varias	PALA/PICA/HOTADORA		
No Herramientas:			
USO	Buen uso [X]	Mal uso [ ]	
OBSERVACIONES DE USO			

CONDICIÓN (No. Herramientas)	Bueno	Malo	OBSERVACIONES
El mango se encuentra en buen estado sin rajaduras, grietas, rugoso o astillado	X		
El mango es proporcional al peso de la cabeza	X		
La cabeza esta en buen estado con sus aristas y esquinas limpias no tiene rebabas.	X		
El mango se encuentra perfectamente unido a la cabeza	X		

Herramienta Varias	CARRETILLA		
No Herramientas:			
USO	Buen uso [X]	Mal uso [ ]	
OBSERVACIONES DE USO			

CONDICIÓN (No. Herramientas)	Bueno	Malo	OBSERVACIONES
Estado de los neumáticos y su presión de inflado.	X		
El mango se encuentra en buen estado amoldado a la mano.	X		
El deposito de material se encuentra en buenas condiciones sin golpes, huecos, desperfectos etc.	X		Se recomienda limpiarla muy bien una vez terminada las labores del dia
El soporte se encuentra nivelado y en buenas	X		
Limpieza general de la herramienta.	X		

Herramienta Varias	MEZCLADORA		
No Herramientas:			
USO	Buen uso [X]	Mal uso [ ]	
OBSERVACIONES DE USO			

CONDICIÓN (No. Herramientas)	Bueno	Malo	OBSERVACIONES
Estado de los neumáticos y su presión de inflado.	X		
El soporte se encuentra en buenas condiciones	X		
El tanque de gasolina esta en buen estado	X		
El tambor no tiene fisuras, esta en buen estado.	X		
Limpieza general de la herramienta.	X		

Herramienta Varias	EXTENSIONES ELECTRICAS		
No Herramientas:			
USO	Buen uso [X]	Mal uso [ ]	
OBSERVACIONES DE USO			

CONDICIÓN (No. Herramientas)	Bueno	Malo	OBSERVACIONES
Extremos en buenas condiciones, no tener alambre por fuera de su protección aislantes.	X		

¿Se evidencian otras herramientas?		Si	No
HERRAMIENTAS/ ESTADO	Bueno	Malo	OBSERVACIONES

Realizado por

Nombre Gineth Dayana Paba Arevalo

Cargo SST - A

CONSORCIO ALCANTARILLADO	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO N°	SST-002		
		SG-SST		
INSPECCION PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA	FECHA		NOVIEMBRE 2025	
	VERSION		001	
	PAGINAS 1 DE 1			

FECHA DE INPECCION: 15 OCT AL 14 NOV 2025	PLACAS No.	MODELO: 2018	MARCA: JCB	EQUIPO No: 1
LOCALIZACION: FRENTE DE OBRA	INSPECCIONADO POR: GINETH DAYANA PABA AREVALO			
NUMERO DE IDENTIFICACION DE RETROCARGADOR: 14104				

ITEM	SEMANA 1		SEMANA2		SEMANA 3		SEMANA 4		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	
Frontales	X		X		X		X		
Traseras de trabajo (reflector)	X		X		X		X		
Direcciones delanteras de parqueo (giro)	X		X		X		X		
Direcciones traseras de parqueo (Giro)	X		X		X		X		
De stop y señal trasera	X		X		X		X		
CABINA									
Alarma									
Pito	X		X		X		X		
Freno de servicio	X		X		X		X		
Freno de emergencia	X		X		X		X		
Direccion /suspncion (Terminales)	X		X		X		X		
Cinturon de seguridad	X		X		X		X		
Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	X		X		X		X		
Extintor de incendios (10 lbs) PQS	X		X		X		X		
Asiento en buena condicion	X		X		X		X		
Indicaciones (hidraulico-voltimetro)	X		X		X		X		
Motor refrigerante-orometro, aire	X		X		X		X		
Escaleras y pasamanos(cabina/trompo)	X		X		X		X		
Bateria y cables									
LLANTAS									
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		
ESTADO MECANICO									
Control de fugas hidraulicas	X		X		X		X		
Pasadores, suspension	X		X		X		X		
Control fugas de aire	X		X		X		X		
Brazon de levante hidraulicos	X		X		X		X		
Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		
Descarga (gato, pivote, pasadores)	X		X		X		X		
Eje de toma de fuerza	X		X		X		X		
Manguera de agua y de alta presion	X		X		X		X		

FUERA DE SERVICIO:		FECHA DE CORRECCION:	
NOMBRE/APELLIDOS CONDUCTOR	Jhon Esteban Balbosa		
OBSERVACIONES:			

FIRMA DE INSPECTOR

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decision mas segura.

CONSORCIO ALCANTARILLADO	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO N°		SST-002	
			SG-SST	
INSPECCION PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR	FECHA		NOVIEMBRE 2025	
	VERSION		001	
			PAGINAS 1 DE 1	

FECHA DE INPECCION: 15 OCT AL 14 NOV 2025	PLACAS No.	MODELO: 2006	MARCA: BOBCAT	EQUIPO No: 2	
LOCALIZACION: FRENTE DE OBRA	INSPECCIONADO POR: GINETH DAYANA PABA AREVALO				
NUMERO DE IDENTIFICACION DE RETROCARGADOR	145956				

ITEM	SEMANA 1		SEMANA2		SEMANA 3		SEMANA 4		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	
Frontales	X		X		X		X		
Traseras de trabajo (reflector)	X		X		X		X		
Direcciones delanteras de parqueo (giro)	X		X		X		X		
Direcciones traseras de parqueo (Giro)	X		X		X		X		
De stop y señal trasera	X		X		X		X		
CABINA									
Alarma									
Pito	X		X		X		X		
Freno de servicio	X		X		X		X		
Freno de emergencia	X		X		X		X		
Direccion/suspencion (Terminales)	X		X		X		X		
Cinturon de seguridad	X		X		X		X		
Cabina antivuelco (ROPS) certificada	X		X		X		X		
Extintor de incendios (10 lbs) PQS	X		X		X		X		
Asiento en buena condicion	X		X		X		X		
Indicaciones hidraulicas (cinvolumetrico)	X		X		X		X		
Motor refrigerante (cromatico, aire	X		X		X		X		
Escaleras y pasamanos(cabina/trompo)									
Bateria y cables	X		X		X		X		
LLANTAS									
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		
ESTADO MECANICO									
Control de fugas hidraulicas	X		X		X		X		
Pasadores suspension	X		X		X		X		
Control fugas de aire	X		X		X		X		
Brazon de levante hidraulicos	X		X		X		X		
Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		
Descarga (gato, pivote, pasadores)	X		X		X		X		
Eje de toma de fuerza	X		X		X		X		
Manguera de agua y de alta presion	X		X		X		X		

FUERA DE SERVICIO:		FECHA DE CORRECCION:	
NOMBRE/APELLIDOS CONDUCTOR	Sergio Diego Cuellero		
OBSERVACIONES:			

FIRMA DE INSPECTOR

En caso de necesitar ayuda adicional debe informale a su SUPERVISOR quien tomara la decision mas segura.

CONSORCIO ALCANTARILLADO	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO N°	SST-002		
		SG-SST		
INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA	FECHA		NOVIEMBRE 2025	
	VERSION		001	
	PAGINAS 1 DE 1			
FECHA DE INPECCION: 15 OCT AL 14 NOV 2025	PLACAS No. ONC 12	MODELO: 1973	MARCA: FORD	EQUIPO No: 3
LOCALIZACION: FRENTE DE OBRA	INSPECCIONADO POR: GINETH DAYANA PABA AREVALO			
NUMERO DE IDENTIFICACION DE RETROCARGADOR				

ITEM	SEMANA 1		SEMANA2		SEMANA 3		SEMANA 4		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	
Frontales	X		X		X		X		
Traseras de trabajo (reflector)	X		X		X		X		
Direcciones delanteras de parqueo (giro)	X		X		X		X		
Direcciones traseras de parqueo (Giro)	X		X		X		X		
De stop y señal trasera	X		X		X		X		
CABINA									
Alarma									
Pito	X		X		X		X		
Freno de servicio	X		X		X		X		
Freno de emergencia	X		X		X		X		
Direccion (funcione con fluidez)	X		X		X		X		
Cinturon de seguridad	X		X		X		X		
Cabina antivuelco (ROPS) certificada	X		X		X		X		
Extintor de incendios (10 lbs) PQS	X		X		X		X		
Asiento en buena condicion	X		X		X		X		
Indicaciones (hidraulico-voltimetro)	X		X		X		X		
Motor-refrigerante-orometro, aire	X		X		X		X		
Escaleras y pasamanos(cabina/trompo)									
Bateria y cables	X		X		X		X		
LLANTAS									
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		
ESTADO MECANICO									
Control de fugas hidraulicas	X		X		X		X		
Pasadores, suspension	X		X		X		X		
Control fugas de aire	X		X		X		X		
Brazon de levante hidraulicos	X		X		X		X		
Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		
Descarga (gato, pivote, pasadores)	X		X		X		X		
Eje de toma de fuerza	X		X		X		X		
Manguera de agua y de alta presion	X		X		X		X		

FUERA DE SERVICIO:		FECHA DE CORRECCION:	
NOMBRE/APELLIDOS CONDUCTOR	Maria del Carmen Claro		
OBSERVACIONES			

FIRMA DE INSPECTOR

En caso de necesitar ayuda adicional debe informale a su SUPERVISOR quién tomara la decision mas segura.

Anexo. 8

CONSORCIO ALCANTARILLADO	FORMATO INSPECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: ES-SST-FT-018 Version: 001 Fecha: 15/10/2025

FECHA	22	10	2025
	DD	MM	AAAA

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO ENTRE LOS SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER		
SITIO EXACTO	Bodega	Nº INSPECCIÓN	1

ITEM	CRITERIOS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
1	El piso del deposito de productos químicos es plano, para un manejo sencillo y seguro y evitar derrames.	X			
2	Está suficientemente identificado y correctamente señalizado las sustancias químicas.	X			
3	Se dispone de las fichas de seguridad de todos las sustancias químicas que se utilizan.	X			
4	Las hojas de seguridad del producto químico están ubicados en un lugar visible en el área donde se	X			
5	Las personas que manipulan las Sustancias Químicas, cuentan con los respectivos EPP (guantes,	X			
6	Conocen las personas que tienen contacto con las	X			
7	Conocen el color de seguridad para los envases de sustancias químicas de acuerdo con la	X			
8	Los envases y tapas de las sustancias químicas están debidamente anclados para evitar			X	
9	Se verifican la fecha de vencimiento de los productos químicos			X	
10	Se cuenta con kits antiderrames para controlar un posible derrame de Sustancias				
11	Se cuenta con mínimo 1 extintor multipropósito en el almacenaje de sustancias	X			
12	Las sustancias inflamables/combustibles esta fuera del alcance de	X			
13	Se tiene un área de acopio o depósito donde se disponen	X			
14	Los envases vacíos o material inservible se encuentran libres de	X			
15	Las canecas se encuentran sobre soportes señalizadas y demarcadas	X			
16	¿Hay presencia de fugas o escapes?		X		

Elaborado por:	
Nombre	Gineth Dayana Pabon Arenas
Cargo	SST - A

Anexo. 9

CONSORCIO ALCANTARILLADO

R.L RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA
NIT 901992571 8

Acta de nombramiento del Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo

CONSORCIO ALCANTARILLADO
NIT 901992571-8

Acta de nombramiento del Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 del 2015, la Resolución 2013 de 1986 *"por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo"* se designa como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en calidad de principal a: **MARCIAL FERNANDO PALLARES VACCA, ING RESIDENTE DE OBRA.** Así mismo **CRISTIAN FERNANDO RIOS CHACON, MAESTRO DE OBRA**, se designa como vigía supiente.

En virtud a lo anterior, los referidos actuarán como vigía principal y vigía suplente por el término de 2 años de conformidad con el Decreto 1295 de 1994, período durante el cual el empleador se obliga a brindar 4 horas semanales dentro de la jornada normal para que estos realicen sus respectivas funciones.

La presente se firma el **20 de octubre del 2025.**

Vigía principal

Marcial Pallares V.
MARCIAL FERNANDO PALLARES VACCA
Cargo: Ing. residente de obra
CC: 1064839866

Vigía suplente

Cristian Fernando Rios Ch.
CRISTIAN FERNANDO RIOS CHACON
Cargo: Maestro de obra
CC: 1064841249

Correo: Consorcioalcantarillado06@gmail.com Cel. 3165789722
Calle 3 # 23 - 15 Marabelito, Ocaña Norte de Santander

Anexo Nº15 Informe HSE Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SVIV-CMA-003 de 2025

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO ENTRE LOS SECTORES LOS OLIVOS - BELEN – QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N°1

15 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

INTERVENTORÍA: BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS

CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO

ENTIDAD CONTRATANTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA

SECRETARÍA DE VÌAS, INFTRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

NOVIEMBRE, 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
2. OBJETIVO 4
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 4
4. SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADA POR LA INTERVENTORIA BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS A CONSORCIO ALCANTARILLADO. 6
4.1 INGRESO DE PERSONAL 6
4.2 SOPORTE DE AFILIACION Y PAGO DE APORTES DE LOS TRABAJADORES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (EPS – ARL – AFP – CCF) 8
4.3 EXAMENES MEDICOS LABORALES 10
4.4 INDUCCIONES Y SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 12
4.5 MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS 12
4.6 ENTREGA DE EPP Y DOTACION 12
4.7 INSPECCIONES DE ELEMENTOS BASICOS DE ACTUACION ANTE UNA EMERGENCIA 13
4.8 MANEJO DE BIOSEGURIDAD 13
4.9 INSTALACION Y USO ADECUADO DE LA SEÑALIZACION PREVENTIVA, INFORMATIVA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 13
4.10 DELIMITACION DE AREAS DE TRABAJO 14
4.11 VIGIA DE SST 14
4.12 CAPACITACIONES 14
4.13 INCAPACIDADES 15
4.14 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 15
4.15 ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO 15
4.16 INSPECCIONES A EQUIPOS, VEHICULOS Y MAQUINARIA 16
4.17 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 17
4.18 MANEJO DE EQUIPOS, VEHICULOS Y MAQUINARIA 17
4.19 ATS – ANALISIS DE TRABAJO SEGURO 17
4.20 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 19
4.21 OTROS 21
4.22 REGISTRO FOTOGRAFICO 21
5. CONCLUSIONES 29

6. RECOMENDACIONES 29
7. ANEXOS 29

1. INTRODUCCION

El presente documento elaborado por la empresa **BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS,** contiene el **INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORIA N°1,** correspondiente a las actividades realizadas como parte del Contrato de Interventoría, y los compromisos del contratista entre el: **15 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

El contratista responsable de la obra es la empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO,** quien se encargará de la ejecución de las obras y de la correcta implementación del **SG-SST** durante el tiempo del proyecto.

2. OBJETIVO

Dar cumplimiento al **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,** con el fin de identificar, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud del personal de la empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO.**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene por objeto la **"CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO ENTRE LOS SECTORES LOS OLIVOS - BELEN – QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**

El proyecto se desarrollará en el municipio de Ocaña, Norte de Santander especificamente en los barrios los Olivos, Belén y la comunidad aledaña. La quebrada recibe vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratamiento de los barrios mencionados, lo que genera un impacto negativo en el entorno ambiental y en la calidad de vida de las comunidades cercanas. La línea de alcantarillado sanitario propuesta tiene como objetivo Diseñar y construir un sistema de colectores y tratamiento de aguas residuales para eliminar los *vertimientos puntuales en la quebrada El Tejar, mejorar la calidad del agua de la quebrada* y reducir la contaminación ambiental, como también promover la gestión sostenible del recurso hídrico y la protección del medio ambiente en la zona, y así mismo beneficiar a la población de los barrios Olivos, Belén y la comunidad aledaña, mejorando su calidad de vida y salud.



Figura 1. Localización geográfica Barrios Belén y Asolivos.

Fuente: Formulación del Proyecto secretaria de vías, infraestructura y vivienda.



Figura 2. Localización geográfica Quebraba El Tejar.
Fuente: Formulación del Proyecto secretaria de vías, infraestructura y vivienda.

4. SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADA POR LA INTERVENTORIA BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS A CONSORCIO ALCANTARILLADO.

A continuación, se presenta el seguimiento, verificación y control realizado por la interventoría **BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS** a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que viene realizando la empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO** en cumplimiento al contrato **"CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO ENTRE LOS SECTORES LOS OLIVOS - BELEN – QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER".**

Periodo: **15 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025**

4.1 INGRESO DE PERSONAL

La empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO**, relaciona el personal que se encontraba activo en el presente periodo de ejecución comprendido desde el **15 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025**

Así mismo el contratista presenta en su **ANEXO 6. INGRESO AL PERSONAL A OBRA del INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**, en donde se relaciona el personal que ingreso en el periodo de ejecución.

N°	NOMBRE	C.C	CARGO	FECHA DE INGRESO	TIPO DE CONTRATACION
		CONSORCIO ALCANTARILLADO			
1	CONTRERAS RUEDA DAINER ESTIWER	1003174824	AYUDANTE DE OBRA	21/10/2025	DIRECTO
2	SANCHEZ ASCANIO RONALD EMIRO	1004903749	AYUDANTE DE OBRA	22/10/2025	DIRECTO
3	TARAZONA SARABIA DEIVY	1007539444	AYUDANTE DE OBRA	27/10/2025	DIRECTO
4	MEJIA CARDENAS VICTOR MANUEL	1064791134	AYUDANTE DE OBRA	21/10/2025	DIRECTO
5	RINCON CHACON LEONARDO AUGUSTO	1064838234	MAESTRO DE OBRA	21/10/2025	DIRECTO
6	PALLARES VACCA MARCIAL FERNANDO	1064839866	ING. RESIDENTE	21/10/2025	DIRECTO

7	TRILLOS JACOME DIEGO ANDRES	1091680414	AYUDANTE DE OBRA	21/10/2025	DIRECTO
8	VERGEL CALDERON JUAN CAMILO	1091854212	AYUDANTE DE OBRA	27/10/2025	DIRECTO
9	DURAN CASTILLA JHONATAN	1092670390	AYUDANTE DE OBRA	20/10/2025	DIRECTO
10	LAZARO PATIÑO YANIER ELIAS	1148440336	AYUDANTE DE OBRA	22/10/2025	DIRECTO
11	SANCHEZ RUEDAS GUVER ANTONIO	13175352	AYUDANTE DE OBRA	22/10/2025	DIRECTO
12	CARRASCAL RUEDAS NIXON ARMANDO	13175421	AYUDANTE DE OBRA	27/10/2025	DIRECTO
13	CHACON URIBE DARIO	1064840995	AYUDANTE DE OBRA	21/10/2025	DIRECTO
14	RIOS CHACON CRISTIAN FERNANDO	1064841249	MAESTRO DE OBRA	21/10/2025	DIRECTO
15	HERNANDEZ HERNADEZ MARCO ANTONIO	1068578437	AYUDANTE DE OBRA	21/10/2025	DIRECTO
16	PEREZ CARLOS ALBERTO	13177177	AYUDANTE DE OBRA	22/10/2025	DIRECTO
17	TRIGOS YANDER	13178015	AYUDANTE DE OBRA	22/10/2025	DIRECTO
18	TRILLOS MEJIA JOSE DELFIN	5084256	AYUDANTE DE OBRA	21/10/2025	DIRECTO
19	PEREZ CONTRERAS ALEXANDER	1092670475	AYUDANTE DE OBRA	18/10/2025	DIRECTO
20	OVALLOS AVENDAÑO YORDAN STIVEN	1092671114	AYUDANTE DE OBRA	17/10/2025	DIRECTO
21	PEREZ CONTRERAS DIEGO FERNANDO	1092730643	AYUDANTE DE OBRA	20/10/2025	DIRECTO
22	COLLANTE NAVARRO VICTOR RAFAEL	88285499	DIRECTOR DEL PROYECTO	-	INDIRECTO
23	PABA AREVALO GINETH DAYANA	1091669706	PROFESIONAL SSTA	-	INDIRECTO

Del mismo modo el contratista menciona que para el presente periodo de ejecución, **EL CONSORCIO ALCANTARILLADO** realizó desvinculación de (7) trabajadores. Por lo tanto, se relaciona los documentos donde se evidencia que la organización se encuentra a paz y salvo con todos los trabajadores que estuvieron vinculados directamente con la Unión Temporal.

N°	Nombre del trabajador	Cargo	Fecha de retiro
1	RINCON CHACON LEONARDO AUGUSTO	MAESTRO DE OBRA	21/OCT/2025
2	RIOS CHACON CRISTIAN FERNANDO	MAESTRO DE OBRA	21/OCT/2025
3	OVALLOS AVENDAÑO YORDAN STIVEN	AYUDANTE DE OBRA	21/OCT/2025
4	DURAN CASTILLA JHONATAN	AYUDANTE DE OBRA	01/NOV/2025
5	PEREZ CONTRERAS ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA	01/NOV/2025
6	LAZARO PATIÑO YANIER ELIAS	AYUDANTE DE OBRA	04/NOV/2025
7	PEREZ CONTRERAS DIEGO FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA	10/NOV/2025

4.2 SOPORTE DE AFILIACION Y PAGO DE APORTES DE LOS TRABAJADORES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (EPS – ARL – AFP – CCF)

El contratista presenta, las afiliaciones correspondientes a **la ARL, EPS, AFP y CCF** del personal asociado al proyecto durante el periodo que va del **15 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025**, en el **ANEXO 6.** Del informe del contratista se relaciona los soportes de afiliación correspondientes al personal que ingreso en el periodo de ejecución.

N°	NOMBRE	C.C	CARGO	ARL	EPS	AFP	CCF
			CONSORCIO ALCANTARILLADO				
1	CONTRERAS RUEDA DAINER ESTIWER	1003174824	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	ASMET SALUD EPS SAS	PORVENIR	COMFAORIENTE
2	SANCHEZ ASCANIO RONALD EMIRO	1004903749	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	NUEVA EPS S.A MOV	COLPENSIONES	COMFAORIENTE
3	TARAZONA SARABIA DEIVY	1007539444	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	EPS-S COMFAORIENTE	COLPENSIONES	COMFAORIENTE
4	MEJIA CARDENAS	1064791134	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	NUEVA EPS S.A MOV	PORVENIR	COMFAORIENTE



	VICTOR MANUEL						
5	RINCON CHACON LEONARDO AUGUSTO	1064838234	MAESTRO DE OBRA	ARL SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAORIENTE
6	PALLARES VACCA MARCIAL FERNANDO	1064839866	ING. RESIDENTE	ARL SURA	SANITAS EPS	PORVENIR	COMFAORIENTE
7	TRILLOS JACOME DIEGO ANDRES	1091680414	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAORIENTE
8	VERGEL CALDERON JUAN CAMILO	1091854212	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFAORIENTE
9	DURAN CASTILLA JHONATAN	1092670390	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COMFAORIENTE
10	LAZARO PATIÑO YANIER ELIAS	1148440336	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	EPS-S COOSALUD	PORVENIR	COMFAORIENTE
11	SANCHEZ RUEDAS GUVER ANTONIO	13175352	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	NUEVA EPS S.A MOV	PORVENIR	COMFAORIENTE
12	CARRASCAL RUEDAS NIXON ARMANDO	13175421	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	EPS COOSALUD	COLPENSIONES	COMFAORIENTE
13	CHACON URIBE DARIO	1064840995	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	ASMET SALUD EPS SAS	PORVENIR	COMFAORIENTE
14	RIOS CHACON CRISTIAN FERNANDO	1064841249	MAESTRO DE OBRA	ARL SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAORIENTE
15	HERNANDEZ HERNADEZ MARCO ANTONIO	1068578437	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAORIENTE
16	PEREZ CARLOS ALBERTO	13177177	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	EPS-S COOSALUD	PORVENIR	COMFAORIENTE

17	TRIGOS YANDER	13178015	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	EPS-S COOSALUD	PORVENIR	COMFAORIENTE
18	TRILLOS MEJIA JOSE DELFIN	5084256	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	ASMET SALUD EPS SAS	COLPENSIONES	COMFAORIENTE
19	PEREZ CONTRERAS ALEXANDER	1092670475	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	NUEVA EPS S.A MOV	COLPENSIONES	COMFAORIENTE
20	OVALLOS AVENDAÑO YORDAN STIVEN	1092671114	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	EPS-S COOSALUD	COLPENSIONES	COMFAORIENTE
21	PEREZ CONTRERAS DIEGO FERNANDO	1092730643	AYUDANTE DE OBRA	ARL SURA	NUEVA EPS S.A MOV	COLPENSIONES	COMFAORIENTE
22	COLLANTE NAVARRO VICTOR RAFAEL	88285499	DIRECTOR DEL PROYECTO	ARL SURA	NUEVA EPS S.A MOV	COLPENSIONES	COMFAORIENTE
23	PABA AREVALO GINETH DAYANA	1091669706	PROFESIONAL SSTA	ARL SURA	NUEVA EPS S.A MOV	COLPENSIONES	COMFAORIENTE

4.3 EXAMENES MEDICOS LABORALES

La empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO**, en su **ANEXO 1.** Relaciona los exámenes médicos laborales de ingreso del personal asociado al proyecto en el periodo de ejecución.

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	EXAMENES DE INGRESO
1	CONTRERAS RUEDA DAINER ESTIWER	1003174824	AYUDANTE DE OBRA	APTO
2	SANCHEZ ASCANIO RONALD EMIRO	1004903749	AYUDANTE DE OBRA	APTO
3	TARAZONA SARABIA DEIVY	1007539444	AYUDANTE DE OBRA	APTO
4	MEJIA CARDENAS VICTOR MANUEL	1064791134	AYUDANTE DE OBRA	APTO
5	RINCON CHACON LEONARDO AUGUSTO	1064838234	MAESTRO DE OBRA	APTO

6	PALLARES VACCA MARCIAL FERNANDO	1064839866	ING. RESIDENTE	APTO
7	TRILLOS JACOME DIEGO ANDRES	1091680414	AYUDANTE DE OBRA	APTO
8	VERGEL CALDERON JUAN CAMILO	1091854212	AYUDANTE DE OBRA	APTO
9	DURAN CASTILLA JHONATAN	1092670390	AYUDANTE DE OBRA	APTO
10	LAZARO PATIÑO YANIER ELIAS	1148440336	AYUDANTE DE OBRA	APTO
11	SANCHEZ RUEDAS GUVER ANTONIO	13175352	AYUDANTE DE OBRA	APTO
12	CARRASCAL RUEDAS NIXON ARMANDO	13175421	AYUDANTE DE OBRA	APTO
13	CHACON URIBE DARIO	1064840995	AYUDANTE DE OBRA	APTO
14	RIOS CHACON CRISTIAN FERNANDO	1064841249	MAESTRO DE OBRA	APTO
15	HERNANDEZ HERNADEZ MARCO ANTONIO	1068578437	AYUDANTE DE OBRA	APTO
16	PEREZ CARLOS ALBERTO	13177177	AYUDANTE DE OBRA	APTO
17	TRIGOS YANDER	13178015	AYUDANTE DE OBRA	APTO
18	TRILLOS MEJIA JOSE DELFIN	5084256	AYUDANTE DE OBRA	APTO
19	PEREZ CONTRERAS ALEXANDER	1092670475	AYUDANTE DE OBRA	APTO
20	OVALLOS AVENDAÑO YORDAN STIVEN	1092671114	AYUDANTE DE OBRA	APTO
21	PEREZ CONTRERAS DIEGO FERNANDO	1092730643	AYUDANTE DE OBRA	APTO
22	COLLANTE NAVARRO VICTOR RAFAEL	88285499	DIRECTOR DEL PROYECTO	APTO
23	PABA AREVALO GINETH DAYANA	1091669706	PROFESIONAL SSTA	APTO

Del mismo modo, el contratista relaciona **LOS EXÁMENES MÉDICOS DE EGRESO** debido a que se registraron egresos de personal en el presente periodo. Sin embargo, los trabajadores han desistido de realizar el examen médico de egreso, firmando una declaración de desistimiento y asumiendo la responsabilidad por cualquier consecuencia que pueda derivarse de su decisión.

N°	NOMBRE	CARGO	FECHA DE EGRESO	NOTIFICACION DE EXAMEN DE RETIRO
1	RINCON CHACON LEONARDO AUGUSTO	MAESTRO DE OBRA	21/OCT/2025	Desistió (D)
2	RIOS CHACON CRISTIAN FERNANDO	MAESTRO DE OBRA	21/OCT/2025	Desistió (D)
3	*OVALLOS AVENDAÑO YORDAN STIVEN*	*AYUDANTE DE OBRA*	*21/OCT/2025*	*Desistió (D)*
4	DURAN CASTILLA JHONATAN	AYUDANTE DE OBRA	01/NOV/2025	Desistió (D)
5	PEREZ CONTRERAS ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA	01/NOV/2025	Desistió (D)
6	LAZARO PATIÑO YANIER ELIAS	AYUDANTE DE OBRA	04/NOV/2025	Desistió (D)
7	PEREZ CONTRERAS DIEGO FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA	10/NOV/2025	Desistió (D)

4.4 INDUCCIONES Y SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO**, realiza la inducción al personal y a su vez socializa la política de seguridad y salud en el trabajo, notificando así mismo los riesgos y peligros en los que se encuentran expuestos al realizar sus labores, del mismo modo se realizó la encuesta de perfil sociodemográfica, se evidencia registro de firma del trabajador. En su **ANEXO 2** relacionan los soportes pertinentes.

4.5 MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS

El contratista en su **ANEXO 3.** *Relaciona la matriz de peligros y valoración de riesgos para* la ejecución de actividades administrativas y operativas, con base a esta herramienta se tomarán las medidas necesarias para reducir la exposición a los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores.

4.6 ENTREGA DE EPP Y DOTACION

En el presente periodo de ejecución, La empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO,** realiza la entrega de elementos de protección personal al igual que la dotación al personal

asociado al proyecto, en su **ANEXO 4.** relacionan los formatos de entrega de EPP y dotación.

4.7 INSPECCIONES DE ELEMENTOS BASICOS DE ACTUACION ANTE UNA EMERGENCIA

Durante el periodo del **15 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025**, La empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO,** reporta las actividades que el personal encargado realizo como la inspección de acuerdo con el plan de trabajo.

N°	INSPECCIONES
1	Botiquín de primeros auxilios frente #1
3	Extintores frente #1
5	Camilla frente #1
7	Señalización

4.8 MANEJO DE BIOSEGURIDAD

Para el manejo de las normas básica de **BIOSEGURIDAD,** La empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO,** dispuso de un punto de desinfección para el personal presente en obra el cual cuenta con los siguientes elementos:

- Gel antibacterial
- Alcohol antiséptico
- Agua
- Jabón
- Tapabocas

4.9 INSTALACION Y USO ADECUADO DE LA SEÑALIZACION PREVENTIVA, *INFORMATIVA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO*

La empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO,** señala que durante el periodo del **15 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025**, se ejecutaron actividades contractuales previstas para el periodo, por ello se instaló la señalización necesaria en los frentes de trabajo, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios, teniendo en cuenta la dinámica del proyecto, se van realizando cambios en la señalización en todos los frentes de trabajo, con el fin de informar y prevenir a propios o visitantes que transitan por el área de influencia del proyecto.

4.10 DELIMITACION DE AREAS DE TRABAJO

Como consecuencia del desarrollo de las actividades contractuales ejecutadas por La empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO,** indica que las áreas de trabajo al finalizar la jornada laboral son debidamente demarcadas y señalizadas para indicar a propios y visitantes sobre los cambios temporales que están presentando en la vía, de tal forma que se pueda transitar de manera segura.

4.11 VIGIA DE SST

En el **ANEXO 9.** El contratista hace entrega del acta de nombramiento del vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, con fecha **20 DE OCTUBRE DE 2025,** reunión que abarca las responsabilidades, funciones, la accidentalidad presentada en el periodo de ejecución y plantea actividades de mejoramiento del espacio laboral.

4.12 CAPACITACIONES

Se realizaron capacitaciones en cumplimiento de lo planificado en el cronograma de capacitaciones del **SG-SST**. En el **ANEXO 5.** Se vinculan las asistencias de las capacitaciones realizadas en el periodo de ejecución.

N°	CAPACITACION SST	FECHA
1	Socialización del plan de manejo ambiental (PMA)	17/OCT/2025
2	La importancia de no hacer bromas en los puestos de trabajo	21/OCT/2025
3	Uso obligatorio de elementos de los EPP	27/OCT/2025
4	Correcta separación de los residuos solidos	31/OCT/2025
5	Uso adecuado de herramientas	04/NOV/2025
6	La importancia de cuidar los recursos naturales	01/NOV/2025
7	Identificación de riesgos en el área de trabajo	12/NOV/2025
8	Comunicación y trabajo en equipo	14/NOV/2025

4.13 INCAPACIDADES

Durante el periodo comprendido entre **15 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025,** el contratista reporta **(2) INCAPACIDADES,** por consiguiente, se presenta información adicional al respecto.

NOMBRE	IDENT.	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	TIPO DE INCAPACIDAD
CHACON URIBE DARIO	1064840995	AYUDANTE DE OBRA	04/NOV/2025	09/NOV/2025	INCAPACIDAD TEMPORAL
TRILLOS JACOME DIEGO ANDRES	1091680414	AYUDANTE DE OBRA	04/NOV/2025	05/NOV/2025	INCAPACIDAD MEDICA

4.14 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Se presentan planillas de pagos de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social de La empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO,** del mes de **OCTUBRE.** En el **ANEXO 6** se vinculan las planillas de pagos del personal directo.

PERIODO	N° PLANILLA	EMPRESA	N° DE TRABAJADORES
2025/10 – 2025/11	91224867	CONSORCIO ALCANTARILLADO	21

4.15 ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

En el presente periodo de ejecución, se reportó **(1)** accidente laboral por parte de la empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO**, correspondiente al personal subcontratado. A continuación, se presenta información adicional al respecto:

NOMBRE	IDENT.	CARGO	FECHA DEL ACCIDENTE	TIPO DE LESION	CAUSA DEL ACCIDENTE	DIAS DE INCAPACIDAD	OTROS EVENTOS
CHACON URIBE DARIO	1064840995	AYUDANTE DE OBRA	04/NOV/2025	CONTUSION DE RODILLA	MOVIMIENTO DEL CUERPO EN EL LUGAR DE TRABAJO	5	NO SE REGISTRARON

4.16 INSPECCIONES A EQUIPOS, VEHICULOS Y MAQUINARIA

La empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO,** durante el presente periodo de ejecución reporta las inspecciones a equipos, vehículos y maquinaria de acuerdo con el plan de trabajo. En el **ANEXO 7.** Se relacionan los Preoperacionales

N°	INSPECCIONES	FECHA
1	*Herramienta De Corte Seguetas/Serrucho/Sierra*	17/OCT/2025
2	Herramienta Canguro	17/OCT/2025
3	Herramientas Eléctricas Cortadora/Pulidoras	17/OCT/2025
4	Herramienta Varias Pala/Pica/Hoyadora	17/OCT/2025
5	Herramienta Varias Carretilla	17/OCT/2025
6	Herramienta Mezcladora	17/OCT/2025
7	Herramienta Varias Extensiones Eléctricas	17/OCT/2025
8	Retrocargador 141014	15/OCT/2025 -14/NOV/2025
9	Retrocargador 148956	15/OCT/2025 -14/NOV/2025

4.17 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

En el presente periodo de ejecución, La empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO,** empleo en el desarrollo de sus actividades contractuales el uso de **SUSTANCIAS QUIMICAS** como (ACPM, Gasolina, Aditivo y Cemento Estructural), evidenciando un correcto manejo de dichas sustancias en el transporte, almacenamiento y uso. Las hojas de seguridad de dichos productos están relacionadas en el informe del contratista correspondiente al mes de **NOVIEMBRE**.

4.18 MANEJO DE EQUIPOS, VEHICULOS Y MAQUINARIA

la empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO,** Se evidencia la relación de máquinas y vehículos que se encontraron en obra en el presente periodo de ejecución.

N°	EQUIPO	UBICACION	HORAS DE USO
1	MEZCLADORA	FRENTE DE TRABAJO	18
2	CANGURO	FRENTE DE TRABAJO	12
3	PULIDORA	FRENTE DE TRABAJO	6
4	RETROEXCAVADORA	FRENTE DE TRABAJO	24
5	MINICARGADOR	FRENTE DE TRABAJO	20
6	VOLQUETA	FRENTE DE TRABAJO	15

4.19 ATS – ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Durante el periodo comprendido entre el entre **15 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025**, la empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO,** ejecuto las siguientes actividades operativas:

1. OBRAS PRELIMINARES
1.1 Localización y replanteo.
1.2 Descapote y Limpieza Manual.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 EXCAVACIONES
2.1.1 Excavación Manual en Material Común.
2.1.2 Excavación Manual En Material Conglomerado

2.1.3 Excavación Mecánica En Roca.

2.2 RELLENOS.

2.2.4 Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado.

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS

4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

4.1.1 Suministro E Instalacion Tubería Sanitaria Pvc D=10".

5.2 CAJAS DE INSPECCIÓN

5.2.1 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H<1,00 M.

6. CONCRETOS Y ACEROS

6.1 CONCRETOS

6.1.1 Viga Aerea En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M.
6.1.2 Columna En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI).
6.1.3 Concreto Simple Resist. 14 Mpa (2000 PSI).
6.1.4 Suministro E Instalación De Concreto 21 Mpa (3000 PSI).
6.1.5 Revestimiento Para Tubería En Concreto De 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,55 x 0,50 M.
6.1.6 Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 1 (130x150x30).
6.1.7 Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 2 (150x240x30).
6.1.8 Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 3 (120x120x30).
6.1.9 Concreto Ciclopeo 60/40 En Concreto 21 Mpa (3000 PSI).

6.2 ACEROS

6.2.1 Acero De Refuerzo De 60000 Psi.

7. TRANSPORTE

7.1 TRANSPORTE

7.1.2 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H prom Entre 1,00 M Y 1,50 M, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 200 M.

7.1.3 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Viga Aerea En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M.

7.1.4 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Concreto, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M.

7.1.5 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Revestimiento Para Tubería En Concreto De 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M.

7.1.6 Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Ciclopeo 60/40 En Concreto 21 Mpa (3000 PSI), Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M.

8. COLECTOR BELEN PARTE BAJA

8.1 COLECTOR BELEN PARTE BAJA

8.1.1 Localización Y Replanteo.
8.1.2 Excavación Manual En Material Común.
8.1.3 Relleno Con Material Seleccionado Procedente De La Excavación.
8.1.4 Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado.
8.1.5 Cargue Y Retiro Material Escombros.
8.1.7 Suministro E Instalacion Tubería Sanitaria Pvc D=8".
8.1.8 Suministro e instalación para Acometidas con tubería de 6" incluye accesorios y silla yee 8" x 6" longitud hasta 6 metros.
8.1.9 Cajas de inspección 0.6 X 0.6 X 0.6.
8.1.10 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,00 M Y 1,50 M.
8.1.11 Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 2,00 M Y 2,50 M.

4.20 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

la empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO,** Presenta el reporte de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo ante el **MINISTERIO DE TRABAJO** de las actividades referentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el año 2023 conforme a la **RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019**, obteniendo un resultado del **88% ACEPTABLE.**

N°	NOMBRE	C.C	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	TIPO DE CONTRATACION
			CONSORCIO ALCANTARILLADO			
1	CONTRERAS RUEDA DAINER ESTIWER	1003174824	AYUDANTE DE OBRA	21/10/2025	N/A	DIRECTO
2	SANCHEZ ASCANIO RONALD EMIRO	1004903749	AYUDANTE DE OBRA	22/10/2025	N/A	DIRECTO



3	TARAZONA SARABIA DEIVY	1007539444	AYUDANTE DE OBRA	27/10/2025	N/A	DIRECTO
4	MEJIA CARDENAS VICTOR MANUEL	1064791134	AYUDANTE DE OBRA	21/10/2025	N/A	DIRECTO
5	RINCON CHACON LEONARDO AUGUSTO	1064838234	MAESTRO DE OBRA	21/10/2025	-	DIRECTO
6	PALLARES VACCA MARCIAL FERNANDO	1064839866	ING. RESIDENTE	21/10/2025	N/A	DIRECTO
7	TRILLOS JACOME DIEGO ANDRES	1091680414	AYUDANTE DE OBRA	21/10/2025	N/A	DIRECTO
8	VERGEL CALDERON JUAN CAMILO	1091854212	AYUDANTE DE OBRA	27/10/2025	N/A	DIRECTO
9	DURAN CASTILLA JHONATAN	1092670390	AYUDANTE DE OBRA	20/10/2025	01/NOV/2025	DIRECTO
10	LAZARO PATIÑO YANIER ELIAS	1148440336	AYUDANTE DE OBRA	22/10/2025	04/11/2025	DIRECTO
11	SANCHEZ RUEDAS GUVER ANTONIO	13175352	AYUDANTE DE OBRA	22/10/2025	N/A	DIRECTO
12	CARRASCAL RUEDAS NIXON ARMANDO	13175421	AYUDANTE DE OBRA	27/10/2025	N/A	DIRECTO
13	CHACON URIBE DARIO	1064840995	AYUDANTE DE OBRA	21/10/2025	N/A	DIRECTO
14	RIOS CHACON CRISTIAN FERNANDO	1064841249	MAESTRO DE OBRA	21/10/2025	-	DIRECTO
15	HERNANDEZ HERNADEZ MARCO ANTONIO	1068578437	AYUDANTE DE OBRA	21/10/2025	N/A	DIRECTO

16	PEREZ CARLOS ALBERTO	13177177	AYUDANTE DE OBRA	22/10/2025	N/A	DIRECTO
17	TRIGOS YANDER	13178015	AYUDANTE DE OBRA	22/10/2025	N/A	DIRECTO
18	TRILLOS MEJIA JOSE DELFIN	5084256	AYUDANTE DE OBRA	21/10/2025	N/A	DIRECTO
19	PEREZ CONTRERAS ALEXANDER	1092670475	AYUDANTE DE OBRA	18/10/2025	01/11/2025	DIRECTO
20	OVALLOS AVENDAÑO YORDAN STIVEN	1092671114	AYUDANTE DE OBRA	17/10/2025	21/10/2025	DIRECTO
21	PEREZ CONTRERAS DIEGO FERNANDO	1092730643	AYUDANTE DE OBRA	20/10/2025	10/11/2025	DIRECTO
22	COLLANTE NAVARRO VICTOR RAFAEL	88285499	DIRECTOR DEL PROYECTO	-	N/A	INDIRECTO
23	PABA AREVALO GINETH DAYANA	1091669706	PROFESIONAL SSTA	-	N/A	INDIRECTO

4.21 OTROS

la empresa **CONSORCIO ALCANTARILLADO,** relaciona al personal que se encontraba activo en el presente periodo comprendido desde el **15 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025,** con sus respectivas novedades.

4.22 REGISTRO FOTOGRAFICO

Se presenta el registro fotográfico, como soporte de las labores ejecutadas en el marco del objeto contractual

ACTIVIDADES CONTRUCTIVAS

































INSPECCION DE SEÑALIZACION










PELIGRO
3
1
0
GASOLINA















ORDEN Y ASEO





ENTREGA DE EPP





SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD









TRANSPORTE ADECUADO DE MATERIAL









5. CONCLUSIONES

Una vez revisada la información documentada, así como la implementación del Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en obra física, la interventoría procede a validar y aprobar lo concerniente al **INFORME MENSUAL N°1,** presentado por el **CONSORCIO ALCANTARILLADO,** ya que cumple con los requisitos del componente de gestión de seguridad y salud en el trabajo del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SVIV-CMA-003 de 2025** para realizar la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO ENTRE LOS SECTORES LOS OLIVOS - BELEN – QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**

6. RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento a los requisitos de implementación del SG – SST.
- El contratista subsana las recomendaciones indicadas desde el área de seguridad y salud en el trabajo de interventoría que muestran condiciones y actos seguros.

7. ANEXOS

ANEXO 1. Informe mensual SST N°1 del contratista

Tatiana C. Navarro P.

TATIANA CAROLINA NAVARRO PEÑARANDA
PROFESIONAL SST

Anexo N° 16 Informe PMA Contratista

"CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO ENTRE LOS SECTORES LOS OLIVOS- BELÉN – QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

Contrato LP-SVIVI-001-2025

CONSORCIO
ALCANTARILLADO

INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL -1

(15 octubre al 14 de noviembre 2025)

INTRODUCCION

El presente informe tiene como fin dar cumplimiento a los pliegos contractuales y servir como base para el seguimiento de la gestión desde el punto de vista ambiental para el contrato cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS – BELÉN – QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

En el informe ambiental correspondiente al periodo comprendido desde el 15 de octubre al 14 de noviembre del año 2025, se presentan las generalidades de la gestión del periodo en revisión en el área ambiental dentro de los ítems contractuales contemplados en el PMA. Así mismo hace referencia al conjunto de medidas que se implementaron y aplicaron en el transcurso de este periodo relacionado con el manejo ambiental del contrato: CONTRATO DE OBRA LP-SVIVI-001-2025 a cargo del contratista CONSORCIO ALCANTARILLADO.

Este documento fue elaborado, teniendo en cuenta cada uno de los aspectos que fueron ofertados e implementados en el frente de obra, teniendo en cuenta que la gestión AMBIENTAL, no solo se desarrolla con la finalidad de cumplir con los requerimientos legales del contrato sino además para contribuir con la minimización y mitigación de los impactos causados al medio ambiente por la ejecución de las actividades constructivas.

Bajo la dirección y coordinación con la interventoría, se han manejado y controlado los impactos causados y se han suplido las necesidades de la obra y de la comunidad coordinadamente.

OBJETIVO

Tomar medidas tendientes para prevenir, mitigar y/o controlar los impactos ambientales que se generen en el proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS – BELÉN – QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER".

PROGRAMAS PARA EL MANEJO AMBIENTAL

Programa de divulgación, socialización y capacitación ambiental:

Objetivo

- Divulgar información puntual y oportuna sobre la ejecución del proyecto a la comunidad establecida en el área de influencia directa y demás partes interesadas pertinentes e instruir y capacitar al personal de la obra sobre las actividades del PMA y demás temas pertinentes relacionados con el medio ambiente.

Actividades ejecutadas

- Se realizaron reuniones a las comunidades aledañas al proyecto con el fin de dar a conocer el objeto del proyecto, el ente ejecutor y el tiempo de duración del mismo.
- Se realizó la socialización del PMA a los trabajadores del proyecto y a la comunidad de las áreas de influencia con el fin de resolver dudas e inquietudes.
- Se realizó capacitación al personal en obra sobre la importancia del PMA y sus actividades a desarrollar.
- A la fecha de entrega de este informe no se han presentado quejas y reclamos por parte de la comunidad.

Registro fotográfico




Capacitacion ambiental a la comunidad y al personal en obra

Programa para el manejo de descapote y cobertura vegetal:

Objetivo

Mitigar la afectación y prevenir innecesariamente la perdida de la cobertura vegetal, presente en el área de influencia del proyecto.

Actividades ejecutadas

- La remoción de cobertura vegetal basal se realizó de manera manual con el fin de no generar grandes afectaciones al ambiente.
- Se dieron instrucciones al personal en la obra con el fin de intervenir solo el área requerida y evitar afectaciones innecesarias.
- En los frentes de trabajo se preparó el concreto necesario para cada jornada laboral, evitando desperdicios de material y evitar disponer este material en el suelo y alterar su composición natural.
- Se le indico a los trabajadores que está prohibido utilizar los árboles o arbustos para disponer elementos como alambres, carteles, cables y otros, de igual manera no se podrá arrojar basuras ni residuos sólidos en áreas de ronda hídrica ni en las coberturas de vegetación aledañas a las zonas de intervención.
- Los residuos sólidos generados en el área de intervención se disponen en las canecas respectivas y luego recolectados por ESPO S.A los días lunes, miércoles y viernes, ellos les dan disposición final en el relleno sanitario La Madera.

Registro fotográfico



Despeje de material vegetativo manual



Disposición de residuos solidos

Programa para el manejo de materiales de construcción y sobrantes:

Objetivo

Implementar actividades encaminadas a evitar los impactos ambientales negativos que pudieran generarse por el uso y presencia de materiales de construcción en el área de influencia directa del proyecto.

Actividades ejecutadas

- Los materiales de construcción se acopiaron en zonas despejadas de material vegetativo, andenes y en la ronda hídrica.
- El material removido producto de las excavaciones, fue empleado nuevamente para llenado de zanjas elaboradas para la instalación de la tubería.
- Los materiales de construcción y sobrantes utilizados en la obra son tapados con plástico negro para evitar la emisión de material particulado a la atmosfera.
- El material sobrante de la obra como escombros fueron donados a la comunidad del barrio Belén para relleno de las vías, lotes y viviendas.
- Los materiales como arena, gravas y cemento se dispusieron en sitios estratégicos con el fin de evitar el arrastre del mismo en caso de lluvia y así evitar desperdicios de material, contaminación del medio e invasión del espacio público.
- Los materiales empleados durante el periodo de ejecución, se adquirieron de canteras autorizadas y legalmente constituidas con su permiso ambiental y minero.

Registro fotográfico



Material cubierto

Programa para el manejo integral de residuos sólidos especiales:

Objetivo

Implementar y efectuar actividades que permitan el manejo integral de residuos sólidos y especiales generados dentro de la ejecución del proyecto.

Actividades ejecutadas

- Se realiza charla de sensibilización sobre la correcta separación de los residuos sólidos.
- La obra cuenta con un punto ecológico ubicado en el campamento y a medida que el proyecto avanza se va moviendo. Estos puntos ecológicos cuentan con 3 canecas; blanca para residuos aprovechables (plástico, cartón, vidrio, papel y metales), negra para residuos no aprovechables (papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados), y verde para residuos orgánicos aprovechables (restos de comida y desechos agrícolas).
- Las canecas o contenedores permanecen siempre tapados para evitar la dispersión de olores y proliferación de vectores.
- A la fecha del presente informe no se ha generado residuos sólidos peligrosos que tengan que darles disposición final con empresas autorizadas para la correcta manipulación.
- Los residuos generados son entregados a ESPO SA quién realiza la recolección de residuos los días lunes, miércoles y viernes y su adecuada disposición final en el relleno sanitario La Madera.
- Al finalizar cada jornada, los frentes de trabajo son dejados limpios.

Registro fotográfico



Punto ecologico y frente de obra limpios

Programa para el control de emisiones atmosféricas y ruido:

Objetivo

Prevenir y mitigar los impactos generados por las emisiones atmosféricas y los niveles de presión sonora durante el desarrollo del proyecto.

Actividades ejecutadas

- Las vías de acceso de entrada y salida de la obra permanecen limpias y libre de materiales.
- Los vehículos que transportan los materiales cuentan con la respectiva revisión técnico mecánica y de gases, en buen estado y con su respectiva lona, además no superan los 20 km/h con el fin de disminuir la emisión de material particulado.
- Está prohibido las quemas a cielo abierto en los lugares donde se adelanta la obra.
- El material (triturado y arena) se encuentra cubierto con plástico negro y así evitar que por acción del viento se genere material particulado.
- Está prohibido el uso de equipos de sonido o parlantes durante la ejecución de las actividades de obra.
- Para este mes de ejecución de las obras no se presentaron quejas o reclamos por parte de la comunidad con respeto a los niveles de ruido.

Registro fotográfico

Retroexcavadora:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 141014

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC747194	JCB	3CX 15HFCE	2018

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	JCB3CXHFCE2518749

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	SJ320H41294U071618	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
8265 Kg	3890 mm	2350 mm	7490 mm

PROPIETARIO(S) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): GARCIA DIAZ PAUL RENE
IDENTIFICACIÓN: C.C. 91.256.188

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR: STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
21-11-2024	21-11-2024	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	462024000644648	19/11/2024

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
TM03000060766

Mini cargador:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 148956

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC112526	BOBCAT	T190	2006

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	CARGADOR	531613052

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
BLANCO CON NARANJA	V2403MCITEU2B	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3442 Kg	1814 mm	9140 mm	2472 mm

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): CONEQUIPOS 24-7 SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 901414753


LOCATARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
IDENTIFICACIÓN
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA
FECHA REGISTRO
13/03/2020
FECHA EXPEDICIÓN
15/10/2025
FECHA VENCIMIENTO
******
ORIGEN
IMPORTACIÓN
DEC. IMPORTACIÓN
482012000062303
FECHA DE LEVANTE
14/02/2012
ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
TM07000058318

Volqueta:


BLICA DE COLOMBIA
NISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No.
10029884968
PLACA
OAE612
MARCA
FORD
LÍNEA
F 500
MODELO
1973
CILINDRADA CC
5.700
COLOR
VERDE
SERVICIO
PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO
VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA
PLATON
COMBUSTIBLE
DIESEL
CAPACIDAD KG/PSJ
4000
NÚMERO DE MOTOR
467TM2U089944
REG
N
VIN
******
NÚMERO DE SERIE
F50CVS02555
SEG
N
NÚMERO DE CHASIS
F50CVS02555
REG
N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CLARO DE ANGARITA MARIA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN
C.C.37365179


RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE
******
POTENCIA HP
0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
35511
NÚMERO DE SERIE
I
FECHA IMPORT
02/11/1973
FUERTAS
2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******
FECHA MATRÍCULA
28/02/1974
FECHA EXP. LIC. TTO
29/08/2023
FECHA VENCIMIENTO
******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA MOVYTTO OCAÑA
LT07002589932


SOAT
PREVISORA


RUNT



Volqueta con su respectiva lona

Programa para el manejo de aguas superficiales y gestión de residuos líquidos en la obra:

Objetivo

Establecer medidas necesarias para el adecuado manejo de aguas superficiales y escorrentías generadas por las acciones directas de las obras de construcción del proyecto.

Actividades ejecutadas

- Los materiales de construcción son tapados con plástico negro y ubicados estratégicamente para evitar el contacto con cuerpos de agua.
- Está prohibido el lavado de vehículos dentro de la obra, así como el vertimiento de aceites y combustibles en la quebrada.
- El mezclado del cemento y la construcción son llevados con carretilla a los puntos donde se requiere con el fin de evitar la contaminación del recurso hídrico de la quebrada el tejar.
- En la obra se prepara el material que se va a utilizar con el fin de evitar sobrantes.
- Se utilizó agua del acueducto municipal para la realización de mezclas y se le da un uso adecuado para evitar gastos innecesarios.

Registro fotográfico




Material de construccion tapado y mezcla de cemento transportado en carretilla

Programa de manejo de equipos, vehículos y maquinaria:

Objetivo

Realizar acciones necesarias para el adecuado manejo de los equipos, vehículos y maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto con el fin de evitar impactos negativos al ambiente generados por la utilización de los mismo.

Actividades ejecutadas

- Los vehículos para el transporte de materiales tienen platones apropiados para que la carga depositada quede contenida en su totalidad.
- Las maquinarias se desplazan por las zonas establecidas en la obra.
- A la fecha de este informe no se han generado fuga de combustibles o aceites que perjudiquen el medio ambiente.

Registro fotográfico




Material transportado correctamente

Programa de limpieza y abandono del área del proyecto:

Objetivo

Realizar la limpieza y adecuación del área de la ejecución del proyecto con el fin de garantizar que en el sitio no quede ningún tipo de material o afectación que genere impactos negativos al ambiente.

Actividades ejecutadas

- Una vez terminada la jornada laboral la zona queda limpia de cualquier material utilizado.



Orden y aseo en los frentes de obra

Gineth Dayana Paba A.

GINETH DAYANA PABA AREVALO
Ingeniera Ambiental
Esp. Gerencia en Riesgos Laborales Seguridad y Salud en el Trabajo
MP No. 54238-328937 NST

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Permisos mineros de extraccion de material.

Anexo 2. Acta de uso de baño.

Anexo 3. Acta donacion de material sobrante a la comunidad.

Anexo 1.

CONCRETOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S
NIT. 900.776.992-6

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, la suscrita Representante Legal de **CONCRETOS & TRITURADOS ALGODONAL SAS** con Nit 900.776.992-6 se permite certificar que el material ofrecido en nuestra planta de producción, se explota y se comercializa de manera legal, y se encuentra amparado bajo la Licencia Ambiental N° 0595 de 30 de junio de 2011 y Contrato de Concesión para la Explotación de Materiales N° KJ6-15371; igualmente contamos con el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) otorgado por la Agencia Nacional de Minería, el cuales nos permitimos adjuntar.

La presente se expide por solicitud del **CONSORCIO ALCANTARILLADO** con Nit. **901.992.571-8** para el **Contrato de Obra n° LP-SVIV 001 del 2025.** a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025) con destino **A QUIEN PUEDA INTERESAR.**

Atentamente,

YOJANNA MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ
Representante Legal CTA
Copia Archivo

CTA

CONCRETOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S
NIT. 900.776.992-6

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Certificado

Registro Único de

RUCOM

Registro **RUCOM-2023053024574**

En cumplimiento del Capítulo 6° del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 26 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que CONCRETOS & TRITURADOS ALGODONAL S.A.S. con NIT número 900776992 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 02-09-2025 hasta el 31-07-2026. Durante el mes de mayo de 2026 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Los minerales autorizados para ser comercializados son: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CONGLOMERADOS, ARENISCAS, CANTOS, GRAVAS, MACADAN, MACADAN ALQUITRANADO, GRAVILLA, LASCA Y POLVOS DE ROCA O PIEDRA, INCLUSO LOS DE LAS PIEDRAS DE LAS CLASES 1512 Y 1513 (EXCEPTO LOS DE LA SUBCLASE 37690), Y DEMAS ROCAS TRITURADAS O NO PARA CONSTRUCCIÓN

Dado en Bogotá D.C., a los 2 días del mes de septiembre del año 2025

JAIME ALONSO GARCÍA ARANGO
Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CARLOS ARBEY CEDENO 3630
02-09-2025 09:32

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999 y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co con el Número Registro RUCOM disponible en este certificado.

Anexo 2.

CONSORCIO ALCANTARILLADO	
	REGISTRO ACTA

Dependencia Solicitante:	**Fecha de la Visita:** 20 de octubre 2025

DATOS DEL USUARIO

Nombres y Apellidos: Yoleise Garay Montagut		
Dirección: KDX 384-260	**Teléfono:** 3115921387	
Barrio / Vereda: Belen parte baja	**Municipio:** Ocaña	**Estrato:** 1

Motivo de la Visita: Permiso para el uso de sanitario con el fin de darle cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental PMA, comprendido en el programa PMA-PGR-006 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y GESTION DE RESIDUOS LIQUIDOS EN LA OBRA

Resultado de la Visita:

La Señora Yoleise Garay Montagut residente del barrio Belén parte baja autorita el permiso para el uso del sanitario de su vivienda, con el compromiso que se deje en las condiciones encontradas inicialmente. De igual forma CONSORCIO ALCANTARILLADO se compromete a suministrar los elementos de aseo necesarios para uso del mismo

Firma de Usuario:

Yoleise Garay Montagut
Nombre y apellidos:
C.C. 1091 652 445

Firma del Profesional:

Gineth Dayana Paba A.
Nombre y apellidos:
C.C. 1091669706

Anexos (Opcional):

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Ley 1581 de 2012. uso imagen y datos personales: "autorizo a ELECTROARCO DEL ORIENTE S.A.S. para emplear mi imagen con fines pedagógicos, y mis datos personales con la finalidad de enviarme información, alertas de carácter comercial y contenidos educativos. Entiendo expresamente que, para los efectos señalados, ELECTROARCO DEL ORIENTE S.A.S podrá utilizar cualquier canal de comunicación de uso corriente y que podré conocer, actualizar y rectificar el uso de mi información y/o revocar esta autorización cuando expresamente le manifieste mi deseo en tal sentido. Manifiesto además que fui informado acerca de la facultad para solicitar prueba de esta autorización, conocer el uso que se le ha dado a mis datos personales en ELECTROARCO DEL ORIENTE S.A.S y presentar ante la superintendencia de Industria y Comercio, quejas al tratamiento de mis datos personales y del uso de mi imagen

Anexo 3.

CONSORCIO ALCANTARILLADO

REGISTRO ACTA

Dependencia Solicitante | Fecha de la Visita: 12 Noviembre 2025

DATOS DEL USUARIO

Nombres y Apellidos: Liliana Pacheco Navarro
Dirección: KDX 394 - 200 | Teléfono: 3137368889
Barrio/Vereda: Belen | Municipio: Ocaña | Estrato: 1

Motivo de la Visita: Reutilización de escombros y material sobrante proveniente de la obra "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO ENTRE LOS SECTORES LOS OLIVOS-BELÉN-QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER " por parte de la comunidad para rellenos y terraplenes en sus lotes y viviendas.

Resultado de la Visita:
La señora Liliana Pacheco Navarro residente y presidenta del barrio Belén de la ciudad de Ocaña, recibe el material sobrante de excavación de la obra para reutilizarlo en el mejoramiento de las calles de dicho barrio, generando beneficios medio ambientales con el aprovechamiento de residuos.

Firma de Usuario:

Liliana Pacheco N.
Nombre y apellidos:
cc 1091653566

Firma del Profesional:

Gineth Dayana Peña A.
Nombre y apellidos:
cc 1091669706

Anexos (Opcional):

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Ley 1581 de 2012: mis imagen y datos personales "servirán a ELECTRIZARCO DEL ORIENTE S.A.S. para originar mi imagen con fines pedagógicos, y esos datos personales con la finalidad de entregar información, alertas de carácter informativo y contenidos educativos. Entiendo expresamente que, para los efectos señalados ELECTRIZARCO DEL ORIENTE S.A. S podrá utilizar cualquier canal de comunicación de uso común y que podré conocer, actualizar y rectificar el uso de mi información y/o revocar esta autorización cuando exista también la inquietud mi deseo en tal sentido. Manifiesto además que fui informado acerca de la facultad para solicitar prueba de esta autorización, conocer el uso que se le ha dado a mis datos personales en ELECTRIZARCO DEL ORIENTE S.A.S y presentar ante la superintendencia de Industria y Comercio, quejas el tratamiento de mis datos personales y del uso de mi imagen.

Anexo N° 17 Correspondencia

Correspondencia Enviada

OFICINA, CALLE 6 25-38 BARRIO 20 DE JULIO
CEL. 3185549013
Email. busbanzaingenieria@gmail.com

Ocaña, 27 de octubre de 2025.

OFICIO N°CTR-OCA-003-001

INGENIERO:
RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA
CONSORCIO ALCANTARILLADO
Contratista

REF 1: SVIV-CMA-003-2025 (CO1.PCCNTR.8160528) "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS – BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

REF 2: LP-SVIV-001-2025 (CO1.PCCNTR.8359207) "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS – BELEN – QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

Cordial Saludo.

Como es de competencia de la interventoría le solicito después de atender a todas las cláusulas del contrato y luego de impartida el acta de inicio del proyecto, tener siempre en cuenta durante el transcurso de la obra que:

- El contratista deberá tener en cuenta lo ofrecido en la propuesta que elaboró, en cuanto a personal, equipo, herramientas; la cual será objeto de verificación por parte de la interventoría.

- Se debe contar con el equipo mínimo de seguridad que sea necesario en la ejecución de la obra, para la protección del personal a su cargo y de terceros, por esta razón se le recomienda la utilización del casco protector.

- Se deben tomar las precauciones necesarias para evitar que se presenten accidentes de cualquier naturaleza, también debe tomar medidas para no ocasionar daños y perjuicios a obras existentes, y a terceros, ya que cualquier daño debe ser reparado por el contratista.

- Cualquier solicitud a la interventoría se debe presentar por escrito y debidamente justificada por el contratista.

- Cumplir con las especificaciones técnicas estipuladas para el proyecto, en cuanto a la calidad de los materiales, tuberías, accesorios, agregados pétreos, etc.

Por último, me permito solicitarles la siguiente información y documentación de soporte para cumplir con los requerimientos Técnicos, Administrativos, Financieros y Ambientales correspondientes al contrato en referencia.

- Listado de maquinaria, equipo y personal que participará en la ejecución de las obras, y demás requisitos en cumplimiento del numeral 15.1 Información para el control de la ejecución de la Obra.

- Cumplir con el requerimiento del numeral 4.2.1 Implementación del programa de gerencia de proyectos al que hace referencia el pliego de condiciones definitivo del proceso.

- Cumplir con el requerimiento del numeral 4.2.2 Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria en obra.

- Llevar el registro diario en la Bitácora de obra y registro fotográfico de las actividades realizadas.

- Tener señalizado cada uno de los puntos de intervención.

- Presentar los Análisis de Precios Unitarios del proyecto relacionados con la propuesta ofertada.

- Cronograma de inversión y de actividades ajustado a la orden de inicio del proyecto.

- Actualización de las pólizas relacionadas con el contrato en referencia según Acta de iniciación de fecha octubre 15 de 2025, para mantener las vigencias contractuales.

- Adjuntar el presupuesto detallado del PMA acorde a las actividades previstas por la entidad contratante ajustado al valor ofertado en su propuesta.

- Para el recibo parcial y definitivo de las actividades desarrolladas se le solicitará a la entidad contratante el listado de documentos requeridos para el trámite administrativo, el cual le será informado a penas se tenga respuesta.

Agradeciéndole la atención a la presente.

Cordialmente,

CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
R/L BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS
INTERVENTOR

ELABORO: ING. DIRECTOR CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
PSST. TATIANA CAROLINA NAVARRO PEÑARANDA

Ocaña, 29 de octubre de 2025.

OFICIO N°CTR-OCA-003-002

INGENIERO:
RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA
CONSORCIO ALCANTARILLADO
Contratista

REF 1: SVIV-CMA-003-2025 (CO1.PCCNTR.8160528) "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS – BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

REF 2: LP-SVIV-001-2025 (CO1.PCCNTR.8359207) "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS – BELEN – QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

Cordial Saludo.

Basados en loa compromisos relacionas con el PMA y el componente relacionado con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, solicito muy respetuosamente con el ánimo de adjuntar la información requerida, para el informe Nº1 correspondiente al primer mes de labores, solicito tener en cuenta lo siguiente:

1. Se debe informar el personal ingresado en el periodo adjuntado el soporte de afiliación y el examen médico de ingreso respectivo, en caso de realizar alguna desvinculación es necesario la presentación del examen de egreso y el paz y salvo respectivo.

2. En el informe de seguridad y salud en el trabajo deberá tener en cuenta lo *anteriormente descrito además sugerimos tener en cuenta de la siguiente* información:

- Formatos de inducción y socialización de la política de seguridad y salud en el trabajo, encuesta de perfil sociodemográfica con su evidencia y firma del trabajador.
- Matriz de peligros y valoración de riesgos.
- Formatos de entrega de EPP y Dotación.
- Cumplimiento de los programas incluidos en el PMA presentado.
- Evidencias de la instalación y uso adecuado de la señalización preventiva, informativa y de seguridad y salud en el trabajo.
- Formatos de evidencias de las capacitaciones realizadas en el periodo.
- Relación de incapacidades presentadas en el periodo.
- Planilla de aportes al sistema Integral de Seguridad Social de la empresa y de los subcontratistas si hubiese lugar.
- Reporte de accidentes e incidentes de trabajo.
- Inspecciones a equipos, vehículos y maquinaria.

- Manejo de sustancias químicas.
- Manejo de vehículos y maquinaria, teniendo en cuenta la documentación al día de los vehículos y maquinaria como SOAT, Revisión Tecno mecánica etc.
- Certificados de trabajo en alturas si a ello hubiese lugar.
- Registro fotográfico.

Y los demás requisitos que bajo la idoneidad del profesional a cargo sean necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

Por otra parte, anexar las hojas de vida del personal ambiental y social a cargo de la implementación del PMA, para mayor coordinación comunicarse y coordinar las labores con nuestra PSST Tatiana Carolina Navarro Peñaranda Cel 3223684456

Agradeciéndole la atención a la presente.

Cordialmente,

CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
R/L BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS
INTERVENTOR

ELABORO: PSST. TATIANA CAROLINA NAVARRO PEÑARANDA

Correspondencia recibida

OFICINA, CALLE 6 25-38 BARRIO 20 DE JULIO
CEL. 3185549013
Email. busbanzaingenieria@gmail.com
