DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

ACTA No:	92	**FECHA:**	01 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5055621		
OBJETO:	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"		

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto del Contrato de Obra o Interventoría:			
Responsable por Contratista (Director y/o Representante Legal)	ANDRES HERNANDEZ		
Responsable por Interventoría (Director y/o Representante Legal)	JUAN ANDRES PAREDES		
Fecha programada cumplimiento	08 de octubre 2025	% de avance	742 días de ejecución de obra

SEMANA DE EJECUCIÓN No. 106 (29/Sep. al 04/oct. de 2025)

- **PORCENTAJE PROGRAMADO = 88.16%**
- **PORCENTAJE EJECUTADO = 80.85%**
- **ATRASO = -7.31**
- **DÍAS DE EJECUCIÓN = 742 Días**
- **DÍAS DE ATRASO = -54 Días**



TEMAS PRESENTE ACTA
• Lectura del acta anterior. • Verificación de compromisos. • Revisión actividades ejecutadas en obra.

1. ASPECTOS TÉCNICOS
• Se está a la espera que se revisen las fichas técnicas enviadas por el contratista al especialista de la interventoría. • El contratista indica que está atento a la confirmación de las actividades de instalación y de permisos para la red de gas instalada por vanti. Se tiene previsto que esta actividad inicie el 15 de octubre. • La supervisión solicita que la interventoría el envió de toda la planimetría del proyecto para la solicitud de licencia de construcción de los parqueaderos del centro cultural. • La interventoría envió las observaciones del modificatorio N°5, se esta a la espera de la subsanación.
En el proyecto se encuentran laborando: • Personal operativo = 70 • Personal administrativo =13 • Total = 83

2. PROGRAMA DE PROYECTO	
SEMANA DE EJECUCIÓN No. 106 (29/Sep. al 04/oct. de 2025)	• **PORCENTAJE PROGRAMADO = 88.16%** • **PORCENTAJE EJECUTADO = 80.85%** • **ATRASO = -7.31** • **DÍAS DE EJECUCIÓN = 742 Días** • **DÍAS DE ATRASO = -54 Días**

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
• Verificación de porcentajes

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES
• No se reportan novedades.

5. RIESGOS
• No se reportan novedades.

6. ASPECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES Y/O JURÍDICOS
• No se reportan novedades.

ACCIONES FORMULADAS CON BASE A LA PRESENTE ACTA
Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No.**

COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL COMITÉ		
ENTIDAD	**DESCRIPCIÓN DE COMPROMISO**	**FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO**
MEGACONSTRUCCIONES ZIPA	Verificación del proceso de la red de gas	15 de octubre de 2025
CONSORCIO ARTES 2023	Verificación de Fichas técnicas eléctricas	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Paula Lán Pérez	
En Representación de	Secretaria de Obras Públicas.	
Correo electrónico	obras.cont2@zipaquira.gov.co	
Teléfono	3045248613	Firma
NOMBRE	Andrés Duran López	
En Representación de	Interventoría	
Correo electrónico	andresduran.arq@gmail.com	
Teléfono	3213147567	Firma
NOMBRE	Andrés Hernandez Diaz	
En Representación de	CMCZ.	
Correo electrónico	ahernandez@promark.com	
Teléfono	3208081347	Firma
NOMBRE	Jaime Madero	
En Representación de	CMCZ	
Correo electrónico	jaime.madero@promark	
Teléfono	3002147061	Firma
NOMBRE	Julieth Alejandra Torres Castro	
En Representación de	CMCZ.	
Correo electrónico	J.torres@promark.com	
Teléfono	3115193734	Firma
NOMBRE	Wilson Martinez Φ	
En Representación de	CONSORCIO ARTES 2023	
Correo electrónico	Ingwilsonmartinez1@Gmail	
Teléfono	3114577977	Firma
NOMBRE	LIDA MARIBEL	
En Representación de	C/ARTES 2023 INTERVENTORIA	
Correo electrónico	ARQ.LIDA@GMAIL.COM	
Teléfono	3108521462	Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

Se agregarán más casillas de acuerdo con lo establecido en nota 1.

Nota 1: Las personas que asisten al comité de seguimiento deben ser las ofertadas por el contratista, previa verificación por parte del supervisor del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma: _____
Nombre:

Firma: _____
Nombre:

CONTRATISTA[1]

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR

Para uso exclusivo del supervisor: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Original: Secretaría de Obras Públicas
Copia: Interventoría Copia: Contratista

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría el acta la suscribe el director de Interventoría y el Representante Legal.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

ACTA No:	93	**FECHA:**	03 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5055621		
OBJETO:	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"		

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto del Contrato de Obra o Interventoría:			
Responsable por Contratista (Director y/o Representante Legal)	ANDRES HERNANDEZ		
Responsable por Interventoría (Director y/o Representante Legal)	JUAN ANDRES PAREDES		
Fecha programada cumplimiento		% de avance	742 días de ejecución de obra

SEMANA DE EJECUCIÓN No. 106 (29/Sep. al 04/oct. de 2025)

- **PORCENTAJE PROGRAMADO = 88.16%**
- **PORCENTAJE EJECUTADO = 80.85%**
- **ATRASO = -7.31**
- **DÍAS DE EJECUCIÓN = 742 Días**
- **DÍAS DE ATRASO = -54 Días**



TEMAS PRESENTE ACTA
• Verificación de compromisos. • Revisión actividades ejecutadas en obra.

1. ASPECTOS TÉCNICOS
• Se realiza la verificación del trasformador en la subestación, se identifica la instalación de las celdas, queda por confirmar con serie 3 el aprobado de que no se requiere rampa. • Revisión y medición de malla puesta a tierra. • Se hace necesario la instalación de cielo rasó donde está ubicado el trasformador, ya que se ubica un ducto de aire acondicionado encima de la celda. • Falta la instalación de la celda triples • Falta marcación de tubería eléctrica en varias zonas donde se ubican tubería datos, eléctrica y rcd • Revisión de certificados retie de materiales • Revisión de todas las tapas de las cajas redondas y cuadradas ya que no coinciden con el tamaño de la caja. • Cambiar caja metálica del hall cerca a la entrada del auditorio • Falta que se verifique la todos los soportes de la tubería ya que se idéntica que varias partes de la tubería no cuentan con soportes y quedando en vacío. • Falta cableado de datos con salidas en bandeja de datos. Se idéntica tramos de las bandejas en vacíos, se solicita que se instalen soportes. • Falta entrega de planos taller de tableros eléctricos • Falta entrega de serie 3 aprobada
En el proyecto se encuentran laborando: • Personal operativo = 70 • Personal administrativo =13 • Total = 83

2. PROGRAMA DE PROYECTO	
SEMANA DE EJECUCIÓN No. 106 (29/Sep. al 04/oct. de 2025)	• **PORCENTAJE PROGRAMADO = 88.16%** • **PORCENTAJE EJECUTADO = 80.85%** • **ATRASO = -7.31** • **DÍAS DE EJECUCIÓN = 742 Días** • **DÍAS DE ATRASO = -54 Días**

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
• Verificación de porcentajes

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES

- No se reportan novedades.

5. RIESGOS

- No se reportan novedades.

6. ASPECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES Y/O JURÍDICOS

- No se reportan novedades.

ACCIONES FORMULADAS CON BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen
Acción de Proyecto No.

COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL COMITÉ		
ENTIDAD	**DESCRIPCIÓN DE COMPROMISO**	**FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO**
MEGACONSTRUCCIONES ZIPA	Subsanación de observación ,entrega de planos taller y de certificados de materiales.	

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES
• No se reportan novedades.
5. RIESGOS
• No se reportan novedades.
6. ASPECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES Y/O JURÍDICOS
• No se reportan novedades.

ACCIONES FORMULADAS CON BASE A LA PRESENTE ACTA
Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No.**

COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL COMITÉ		
ENTIDAD	**DESCRIPCIÓN DE COMPROMISO**	**FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO**
MEGACONSTRUCCIONES ZIPA	Subsanación de observación ,entrega de planos taller y de certificados de materiales.	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	David Ombaita.	
En Representación de	Interventoria	
Correo electrónico	dombaiiba@gmail.com.	
Teléfono	320 856 6670	Firma
NOMBRE	Javier Orlando Alar	
En Representación de	Consorcio	
Correo electrónico	alarcar.javier412@gmail.com	
Teléfono	3203649505.	Firma
NOMBRE	Andres Doran López	
En Representación de	Interventoria	
Correo electrónico	andresdoran.arq@gmail.co	
Teléfono	3213147567	Firma
NOMBRE	Jaime Madero	
En Representación de	CMC	
Correo electrónico	jamadero@proincrk.com	
Teléfono	3002117061	Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		Firma
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		Firma
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		Firma
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		Firma
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		Firma
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		Firma
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		Firma
Teléfono		

Se agregarán más casillas de acuerdo con lo establecido en nota 1.

Nota 1: Las personas que asisten al comité de seguimiento deben ser las ofertadas por el contratista, previa verificación por parte del supervisor del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma: _____
Nombre:
CONTRATISTA[1]

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR

Para uso exclusivo del supervisor: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Original: Secretaría de Obras Públicas
Copia: Interventoría Copia: Contratista

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría el acta la suscribe el director de Interventoría y el Representante Legal.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

ACTA No:	94	**FECHA:**	08 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5055621		
OBJETO:	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"		

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto del Contrato de Obra o Interventoría:			
Responsable por Contratista (Director y/o Representante Legal)	ANDRES HERNANDEZ		
Responsable por Interventoría (Director y/o Representante Legal)	JUAN ANDRES PAREDES		
Fecha programada cumplimiento		% de avance	742 días de ejecución de obra

SEMANA DE EJECUCIÓN No. 106 (06/Oct. al 11/Oct. de 2025)

- **PORCENTAJE PROGRAMADO = 88.16%**
- **PORCENTAJE EJECUTADO = 80.85%**
- **ATRASO = -7.31**
- **DÍAS DE EJECUCIÓN = 742 Días**
- **DÍAS DE ATRASO = -54 Días**



TEMAS PRESENTE ACTA
• Verificación de compromisos. • Revisión actividades ejecutadas en obra.

1. ASPECTOS TÉCNICOS
• El contratista de obra presenta la propuesta de la baranda del edificio de salones en color negro. • El arquitecto de la consultoría se compromete a enviar unos render con diferentes propuestas de color del muero perimetral interno del auditorio. • El consultor propone que se aplique por la capa exterior de los muros donde está instalado el glafon muro exterior donde está instalado el glafom se aplique entre los módulos de glafon el frisol en color gris oscuro con el objetivo de generar diferentes contrastes entre el muero y los • El consultor sugiere que se aplique en las columnas microcemento según la muestra intermedia presentada de color gris • El consultor sugiera que en los muros en concreto por el costado donde se ubica el auditorio se agreguen dilataciones con el objetivo de dar movimiento y resaltar el muro a lo largo
En el proyecto se encuentran laborando: • Personal operativo = 70 • Personal administrativo =13 • Total = 83

2. PROGRAMA DE PROYECTO	
SEMANA DE EJECUCIÓN No. 106 (29/Sep. al 04/oct. de 2025)	• **PORCENTAJE PROGRAMADO = 88.16%** • **PORCENTAJE EJECUTADO = 80.85%** • **ATRASO = -7.31** • **DÍAS DE EJECUCIÓN = 742 Días** • **DÍAS DE ATRASO = -54 Días**

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
• Verificación de porcentajes

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES
• No se reportan novedades.

5. RIESGOS

- No se reportan novedades.

6. ASPECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES Y/O JURÍDICOS

- No se reportan novedades.

ACCIONES FORMULADAS CON BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No.**

COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL COMITÉ		
ENTIDAD	**DESCRIPCIÓN DE COMPROMISO**	**FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO**
MEGACONSTRUCCIONES ZIPA	Subsanación de observación ,entrega de planos taller y de certificados de materiales.	

Alcaldía de Zipaquirá

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Daniel Rojas Pobón	
En Representación de	Arquitecura	
Correo electrónico	daniel.rojaspobon@gmail.com	
Teléfono	313 854 3940	Firma
NOMBRE	Sebastian Mendoza	
En Representación de	CMC7	
Correo electrónico	S.mendoza@proinark.com	
Teléfono	3502926516	Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		

NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

Se agregarán más casillas de acuerdo con lo establecido en nota 1.

Nota 1: Las personas que asisten al comité de seguimiento deben ser las ofertadas por el contratista, previa verificación por parte del supervisor del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma: _____
Nombre:
CONTRATISTA[1]

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR

Para uso exclusivo del supervisor: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Original: Secretaría de Obras Públicas
Copia: Interventoría Copia: Contratista

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría el acta la suscribe el director de Interventoría y el Representante Legal.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

ACTA No:	95	**FECHA:**	08 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5055621		
OBJETO:	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"		

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO


Acción de Proyecto del Contrato de Obra o Interventoría:			
Responsable por Contratista (Director y/o Representante Legal)	ANDRES HERNANDEZ		
Responsable por Interventoría (Director y/o Representante Legal)	JUAN ANDRES PAREDES		
Fecha programada cumplimiento	08 de octubre 2025	% de avance	742 días de ejecución de obra
SEMANA DE EJECUCIÓN No. 106 (06/Oct. al 11/oct. de 2025)	• **PORCENTAJE PROGRAMADO = 89.56%** • **PORCENTAJE EJECUTADO = 80.85%** • **ATRASO = -8.71** • **DÍAS DE EJECUCIÓN = 749 Días** • **DÍAS DE ATRASO = -66 Días**		



TEMAS PRESENTE ACTA
• Lectura del acta anterior. • Verificación de compromisos. • Revisión actividades ejecutadas en obra.

1. ASPECTOS TÉCNICOS

- El día 8 de octubre se va a realizar una reunión entre los profesionales eléctricos del contratista y la interventoría para revisar las observaciones de modificatorio N°5.
- El contratista indica que está atento a la confirmación de las actividades de instalación y de permisos para la red de gas instalada por vanti. Se tiene previsto que esta actividad inicie el 15 de octubre.
- La interventoría presenta dos planos donde se idéntica la planimetría existente y el otro plano solo el área que hace parte del área construir de los parqueaderos.
- La interventoría envió las observaciones del modificatorio N°5 al contratista, se está a la espera de la subsanación.
- El contratista y la interventoría presenta a la supervisión los diferentes acabados propuestos para las columnas del proyecto. La supervisión decide que se presente la propuesta en la que se perfila y se pule la columna quedando en un acabo natural del concreto, con el objetivo que el próximo comité se presente la propuesta a la supervisión y se seleccione el acabo que tendrán todas las columnas.
- La supervisión solicita revisar la propuesta del acabo final de los muros internos de la parte baja del auditorio. La supervisión solicita que se plantee como propuesta un acabo similar al friso.
- El contratista de obra presenta a la supervisión las propuestas de acabado para los vanos que se generan en los muros exteriores donde está instalado el glafon. Dentro del recorrido de obra la supervisión selecciono la propuesta material tipo friso en color negro.

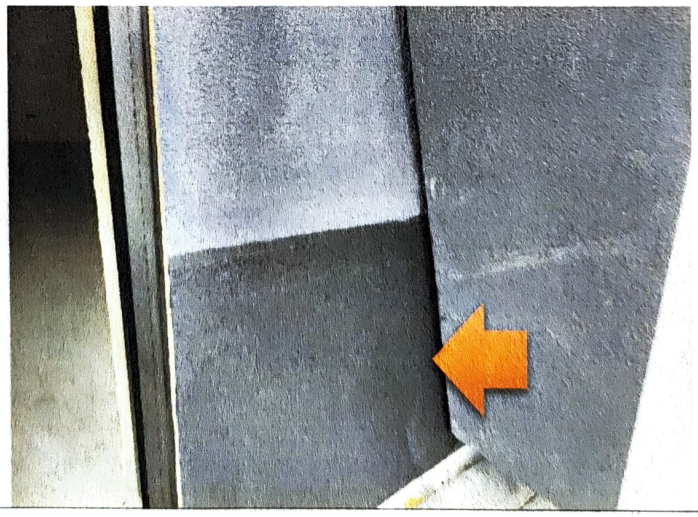

En el proyecto se encuentran laborando:

- Personal operativo = 79
- Personal administrativo =14
- Total = 93

2. PROGRAMA DE PROYECTO

SEMANA DE EJECUCIÓN No. 106 (06/Oct. al 11/oct. de 2025)

- **PORCENTAJE PROGRAMADO = 89.56%**
- **PORCENTAJE EJECUTADO = 80.85%**
- **ATRASO = -8.71**
- **DÍAS DE EJECUCIÓN = 749 Días**
- **DÍAS DE ATRASO = -66 Días**

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- Verificación de porcentajes

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES

- No se reportan novedades.

5. RIESGOS

- No se reportan novedades.

6. ASPECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES Y/O JURÍDICOS

- No se reportan novedades.

ACCIONES FORMULADAS CON BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen
Acción de Proyecto No.

COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL COMITÉ		
ENTIDAD	**DESCRIPCIÓN DE COMPROMISO**	**FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO**
MEGACONSTRUCCIONES ZIPA	Verificación del proceso de la red de gas	15 de octubre de 2025
CONSORCIO ARTES 2023 MEGACONSTRUCCIONES ZIPA	Reunión de profesionales eléctricos	08 de octubre de 2025

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Jaimes Alcadero H.	
En Representación de	CMCZ	
Correo electrónico	h.mederod@gmail.com	
Teléfono	3002147061	Firma
NOMBRE	Pedro Andres Gutierrez Cort	
En Representación de	Interventoría	
Correo electrónico	pedro.gutierrez@gmail.com.	Pedro Gutierrez C.
Teléfono	3143850389	Firma
NOMBRE	JULIAN CONTES	
En Representación de	CONSORCIO ARTES 2023	JULIAN Contes
Correo electrónico	julian.ingpetor.olanas@gmail.com	
Teléfono	322 438 3027	Firma
NOMBRE	Wilson MARTINEZ O.	
En Representación de	Consorcio Artes 2023	
Correo electrónico	Pruwilsonmartinez1@Gmail.com	
Teléfono	3114577977	Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

Se agregarán más casillas de acuerdo con lo establecido en nota 1.

Nota 1: Las personas que asisten al comité de seguimiento deben ser las ofertadas por el contratista, previa verificación por parte del supervisor del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma: _____
Nombre:
CONTRATISTA[1]

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR

Para uso exclusivo del supervisor: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Original: Secretaría de Obras Públicas
Copia: Interventoría Copia: Contratista

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría el acta la suscribe el director de Interventoría y el Representante Legal.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

ACTA No:	96	**FECHA:**	15 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5055621		
OBJETO:	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"		

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto del Contrato de Obra o Interventoría:			
Responsable por Contratista (Director y/o Representante Legal)	ANDRES HERNANDEZ		
Responsable por Interventoría (Director y/o Representante Legal)	JUAN ANDRES PAREDES		
Fecha programada cumplimiento	22 de octubre 2025	% de avance	756 días de ejecución de obra

SEMANA DE EJECUCIÓN No. 107 (13/Oct. al 18/oct. de 2025)

- **PORCENTAJE PROGRAMADO = 90.89%**
- **PORCENTAJE EJECUTADO = 81.22%**
- **ATRASO = -9.67%**
- **DÍAS DE EJECUCIÓN = 756 Días**
- **DÍAS DE ATRASO = -73 Días**



TEMAS PRESENTE ACTA

- Lectura del acta anterior.
- Verificación de compromisos.
- Revisión actividades ejecutadas en obra.

1. ASPECTOS TÉCNICOS

- El día 8 de octubre se va a realizar una reunión entre los profesionales eléctricos del contratista y la interventoría para revisar las observaciones de modificatorio N°5. El contratista se compromete a enviar las subsanaciones el día 15 de octubre.
- Se está a la espera por parte de vanti, a la confirmación del día en que se iniciaran las actividades de instalación de la red de gas. Aun se están tramitando los permisos correspondientes para iniciar.
- La interventoría presenta dos planos donde se idéntica la planimetría existente y el segundo plano el área que hace parte de los parqueaderos. El día 15 de octubre la interventoría radicara los planos ante el municipio.
- El contratista y la interventoría presenta a la supervisión los diferentes acabados propuestos para las columnas del proyecto. La supervisión decide que se presente la propuesta en la que se perfila y se pule la columna quedando en un acabo natural del concreto, con el objetivo que el próximo comité se presente la propuesta a la supervisión y se seleccione el acabo que tendrán todas las columnas. El compromiso queda pendiente para ser revisado y avalado por la supervisión en el trascurso de la semana del 13 al 17 de octubre.
- La supervisión solicita revisar la propuesta del acabo final de los muros internos de la parte baja del auditorio. La supervisión solicita que se plantee como propuesta un acabo similar al friso. Queda pendiente la instalación de la muestra por parte del contratista de obra para ser revisada y avalada por la supervisión.

En el proyecto se encuentran laborando:

- Personal operativo = 69
- Personal administrativo =13
- Total = 82

2. PROGRAMA DE PROYECTO

SEMANA DE EJECUCIÓN No. 107 (13/Oct. al 18/oct. de 2025)

- **PORCENTAJE PROGRAMADO = 90.89%**
- **PORCENTAJE EJECUTADO = 81.22%**
- **ATRASO = -9.67%**
- **DÍAS DE EJECUCIÓN = 756 Días**
- **DÍAS DE ATRASO = -73 Días**

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- Verificación de porcentajes

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES

- No se reportan novedades.

5. RIESGOS

- No se reportan novedades.

6. ASPECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES Y/O JURÍDICOS

- No se reportan novedades.

ACCIONES FORMULADAS CON BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No.**

COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL COMITÉ

ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE COMPROMISO	FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO
MEGACONSTRUCCIONES ZIPA	Instalación red de gas	Pendiente
MEGACONSTRUCCIONES ZIPA	Subsanación de observaciones modificatorio N°5	08 de octubre de 2025
SUPERVISION DEL MUNICIPIO	Elección de acabado de columnas, muros en concreto, muros interiores auditorio.	14 al 17 de octubre 2025
CONSORCIO ARTES 2023	Planos para licencia de construcción parqueaderos	15 de octubre de 2025

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

Alcaldía de Zipaquirá

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Paula Alejandra León.	
En Representación de	Secretaria de Obras Publicas	
Correo electrónico	obras.contratos@zipaquira.gov.co	
Teléfono	3045298613	Firma
NOMBRE	Julieta Alejandra Torres Castro.	
En Representación de	Onca	
Correo electrónico	J.torres@proinark.com	
Teléfono	3115193734	Firma
NOMBRE	Rodo Andres Gutierrez Duarte	
En Representación de	Interventoria	
Correo electrónico	Rodo.gutierrezu@gmail.com	
Teléfono	3143850389	Firma
NOMBRE	Jaime Madero	
En Representación de	CMCZ	
Correo electrónico	Ja.maderoc@proinark.com	
Teléfono	3002147061	Firma
NOMBRE	Wilson Martinez	
En Representación de	Consorcio Artes 2023	
Correo electrónico	Inbwilsonmartinez1@gmail.com	
Teléfono	3145779777	Firma
NOMBRE	JULIAN CORTES	
En Representación de	CONSORCIO ARTES 2023	
Correo electrónico	Julian.inspector.obras@gmail.com	
Teléfono	3224383027	Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

Se agregarán más casillas de acuerdo con lo establecido en nota 1.

Nota 1: Las personas que asisten al comité de seguimiento deben ser las ofertadas por el contratista, previa verificación por parte del supervisor del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma: _____
Nombre:
CONTRATISTA[1]

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR

Para uso exclusivo del supervisor: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Original: Secretaría de Obras Públicas
Copia: Interventoría Copia: Contratista

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría el acta la suscribe el director de Interventoría y el Representante Legal.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

ACTA No:	97	**FECHA:**	22 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5055621		
OBJETO:	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"		

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto del Contrato de Obra o Interventoría:			
Responsable por Contratista (Director y/o Representante Legal)	ANDRES HERNANDEZ		
Responsable por Interventoría (Director y/o Representante Legal)	JUAN ANDRES PAREDES		
Fecha programada cumplimiento	29 de octubre 2025	% de avance	763 días de ejecución de obra

SEMANA DE EJECUCIÓN No. 107 (20/Oct. al 25/oct. de 2025)

- **PORCENTAJE PROGRAMADO = 88.00%**
- **PORCENTAJE EJECUTADO = 83.55%**
- **ATRASO = -4.45%**
- **DÍAS DE EJECUCIÓN = 763 Días**
- **DÍAS DE ATRASO = -34 Días**



TEMAS PRESENTE ACTA
• Lectura del acta anterior. • Verificación de compromisos. • Revisión actividades ejecutadas en obra.

1. ASPECTOS TÉCNICOS
• Se está realizado la revisión de las observaciones eléctricas enviadas por el contratista, se está a la espera que el profesional de la interventoría termine su revisión. • El contratista informa que ya fue adjudicado la instalación de la red de gas, se esta la espera que se defina una fecha para iniciar la instalación de la red por vanti. • El contratista de obra presenta el acabado final de las columnas del proyecto, queda pendiente que se revise y se seleccione la propuesta del acabado de las columnas por la supervisión. Esta decisión será tomada el día viernes 24 de octubre. • Queda pendiente revisar la propuesta del acabo final de los muros internos de la parte baja del auditorio por la supervisión. Esta decisión será tomada el día viernes 24 de octubre. • Se realiza la verificación de los porcentajes de avance entre la interventoría y el contratista de obra. Se realizan ajustes en los porcentajes de las actividades realizadas. • Se hace la solicitud al contratista de un plan de acción, adelantándose a la fecha de terminación del contrato. • Se realiza recorrido de obra con la supervisión del municipio • De acuerdo a la revisión del plan de acción la interventoría aprueba que se utilice la programación y los porcentajes arrojados por Microsoft proyect.
En el proyecto se encuentran laborando: • Personal operativo = 68 • Personal administrativo =14 • Total = 82

2. PROGRAMA DE PROYECTO	
SEMANA DE EJECUCIÓN No. 107 (20/Oct. al 25/oct. de 2025)	• **PORCENTAJE PROGRAMADO = 88.00%** • **PORCENTAJE EJECUTADO = 83.55%** • **ATRASO = -4.45%** • **DÍAS DE EJECUCIÓN = 763 Días** • **DÍAS DE ATRASO = -34 Días**

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
• Verificación de porcentajes

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES
• No se reportan novedades.

- No se reportan novedades.

6. ASPECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES Y/O JURÍDICOS

- No se reportan novedades.

ACCIONES FORMULADAS CON BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No.**

COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL COMITÉ		
ENTIDAD	**DESCRIPCIÓN DE COMPROMISO**	**FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO**
MEGACONSTRUCCIONES ZIPA	Instalación red de gas	Pendiente
MEGACONSTRUCCIONES ZIPA	Revisión de observaciones, profesional eléctrico interventoría	08 de octubre de 2025
SUPERVISION DEL MUNICIPIO	Elección de acabado de columnas, muros en concreto, muros interiores auditorio.	24 de octubre 2025

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

Alcaldía de Zipaquirá

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Andrés Hernandez Ruiz	
En Representación de	CMCZ	
Correo electrónico	a.hernandez@proinark.com	
Teléfono	3208081342	Firma
NOMBRE	C.C. Los Garcetes	
En Representación de	CCCZ	
Correo electrónico	C.garcete@proinark.com	
Teléfono	6218854	Firma
NOMBRE	César Prieto	
En Representación de	Cons Artes 2023	
Correo electrónico	cesarprieto@gmail.com	
Teléfono	3008194600	Firma
NOMBRE	Wilson Martinez d	
En Representación de	consorcio Arte	
Correo electrónico	ingwilsonmartinez@yahoo	
Teléfono	3144774	Firma
NOMBRE	JULIAN CONTES	
En Representación de	CONSORCIO ARTES 2023	
Correo electrónico	julian.inspector.obras@gmail.com	
Teléfono	3224383027	Firma
NOMBRE	Jaime Madero Alarcon	
En Representación de	CMCZ	
Correo electrónico	jmadero@proinark.com	
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		Firma
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		Firma
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		Firma
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		Firma
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		Firma
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		Firma
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

Se agregarán más casillas de acuerdo con lo establecido en nota 1.

Nota 1: Las personas que asisten al comité de seguimiento deben ser las ofertadas por el contratista, previa verificación por parte del supervisor del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma: _____
Nombre:
CONTRATISTA[1]

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR

Para uso exclusivo del supervisor: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Original: Secretaría de Obras Públicas
Copia: Interventoría Copia: Contratista

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría el acta la suscribe el director de Interventoría y el Representante Legal.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

Alcaldía de Zipaquirá

0ACTA No:	98	**FECHA:**	29 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5055621		
OBJETO:	"CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPQUIRA, CUNDINAMARCA"		

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto del Contrato de Obra o Interventoría:			
Responsable por Contratista (Director y/o Representante Legal)	ANDRES HERNANDEZ		
Responsable por Interventoría (Director y/o Representante Legal)	JUAN ANDRES PAREDES		
Fecha programada cumplimiento	5 de noviembre 2025	% de avance	770 días de ejecución de obra

SEMANA DE EJECUCIÓN No. 110 (27/Oct al 01 Nov de 2025)

- **PORCENTAJE PROGRAMADO = 90.00%**
- **PORCENTAJE EJECUTADO = 83.55%**
- **ATRASO = -6.45%**
- **DÍAS DE EJECUCIÓN = 770 Días**
- **DÍAS DE ATRASO = -50 Días**



TEMAS PRESENTE ACTA
• Lectura del acta anterior. • Verificación de compromisos. • Revisión actividades ejecutadas en obra.

1. ASPECTOS TÉCNICOS
• El contratista informa que ya fue adjudicado la instalación de la red de gas, se esta la espera que se defina una fecha para iniciar la instalación de la red por vanti. Aun no se tiene una fecha definida por vanti para iniciar las actividades de instalación de la red de gas. • El contratista de obra presenta el acabado final de las columnas del proyecto, queda pendiente que se revise y se seleccione la propuesta del acabado de las columnas por la supervisión. • Queda pendiente revisar la propuesta del acabo final de los muros internos de la parte baja del auditorio por la supervisión. • Se realiza la verificación de los porcentajes de avance entre la interventoría y el contratista de obra.
En el proyecto se encuentran laborando: • Personal operativo = 68 • Personal administrativo =14 • Total = 82

2. PROGRAMA DE PROYECTO	
SEMANA DE EJECUCIÓN No. 110 (27/Oct. al 01 Nov de 2025)	• **PORCENTAJE PROGRAMADO = 90.00%** • **PORCENTAJE EJECUTADO = 83.55%** • **ATRASO = -6.45%** • **DÍAS DE EJECUCIÓN = 770 Días** • **DÍAS DE ATRASO = -50 Días**

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
• Verificación de porcentajes

4. ASPECTOS PRESUPUESTALES
• No se reportan novedades.

5. RIESGOS
• No se reportan novedades.

6. ASPECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES Y/O JURÍDICOS

- No se reportan novedades.

ACCIONES FORMULADAS CON BASE A LA PRESENTE ACTA
Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No.**

COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL COMITÉ		
ENTIDAD	**DESCRIPCIÓN DE COMPROMISO**	**FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO**
MEGACONSTRUCCIONES ZIPA	Instalación red de gas	Pendiente
SUPERVISION DEL MUNICIPIO	Elección de acabado de columnas, muros en concreto, muros interiores auditorio.	Pendiente

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Jaime Madero	
En Representación de	CMCZ	
Correo electrónico	ja.madero@proinark.com	
Teléfono	3002117061.	Firma
NOMBRE	Julieth Alejandra Torres C.	
En Representación de	CMCZ.	
Correo electrónico	J.torres@gmail.com.	
Teléfono	3115193734	Firma
NOMBRE	Sebastian Mendoza	
En Representación de	CMCZ.	
Correo electrónico	S.mendoza@proinark.com	
Teléfono	3502926570.	Firma
NOMBRE	Andres Duran Lozada	
En Representación de	Interventoria	
Correo electrónico	andresduran.29@gmail.com	
Teléfono	3213147567	Firma
NOMBRE	JULIAN Cortes	
En Representación de	CONSORCIO ARTES 2023	
Correo electrónico	julian.inspector.obras@gmail.com	
Teléfono	3224388027	Firma
NOMBRE	Ingrid Morales	
En Representación de	Interventoria	
Correo electrónico	Consorcioartes2023.3@gmail.com	
Teléfono	3173055674	Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		Firma

Se agregarán más casillas de acuerdo con lo establecido en nota 1.

Nota 1: Las personas que asisten al comité de seguimiento deben ser las ofertadas por el contratista, previa verificación por parte del supervisor del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma: _____
Nombre:
CONTRATISTA[1]

Firma: _____
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre:
SUPERVISOR

Para uso exclusivo del supervisor: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Original: Secretaría de Obras Públicas
Copia: Interventoría Copia: Contratista

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría el acta la suscribe el director de Interventoría y el Representante Legal.
