CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025


Fecha: 05-03-2026

Señor
MANUEL ALEJANDRO MANZANO DIAZ
INTERVENTOR – CONTRATO 545 DE 2025

Ref: INFORME DE OBRA **CONTRATO 547 DE 2025** ACTA PARCIAL 03

En atención a las obligaciones contractuales y a las actividades de seguimiento del proyecto "Adecuaciones Menores de los Puestos de Salud de las veredas Alto Naranjos y Alto del Obispo de la E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas del municipio de San Agustín, departamento del Huila", el Consorcio San Agustín 2025 se permite remitir el Informe de Obra correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de enero de 2026 y el 20 de febrero de 2026, en el cual se presenta de manera detallada la relación de las actividades ejecutadas, los avances físicos alcanzados, el estado general del proyecto y las principales novedades técnicas, administrativas y operativas registradas durante el periodo evaluado, para su conocimiento, revisión y demás fines pertinentes.

Así mismo, se informa que para el presente documento y para efectos de la estructuración del Acta Parcial No. 03, únicamente se presenta el balance de ejecución correspondiente a uno de los dos puestos de salud contemplados en el contrato, específicamente el puesto de salud de la vereda Alto del Obispo. En cuanto al puesto de salud de la vereda Alto Naranjos, actualmente se adelanta la estructuración del informe y la recolección de la información técnica y administrativa correspondiente, la cual será presentada en un informe posterior.



FREDDY ESNEIDER SALAS MEDINA
Cc 1080933543
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
Nit: 902003558-3

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

<table>
<tr><th colspan="5">INFORMACION CONTRATO DE OBRA</th></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO</td><td colspan="4">547-2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td colspan="4">ADECUACIONES MENORES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS ALTO NARANJOS Y ALTO DEL OBISPO DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA.</td></tr>
<tr><td>CONTRATANTE</td><td colspan="4">ESE HOSPITAL “ARSENIO REPIZO VANEGAS”</td></tr>
<tr><td>NIT</td><td colspan="4">891.180113-8</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td colspan="4">CONSORCIO “SAN AGUSTIN 2025”</td></tr>
<tr><td>NIT</td><td colspan="4">902003558-3</td></tr>
<tr><td>VALOR CONTRATO</td><td colspan="4">CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($475,285,171.00)</td></tr>
<tr><td>DURACION INICIAL CONTRATO</td><td colspan="4">DOS (02) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio</td></tr>
<tr><td>PRORROGA</td><td colspan="4">UN (01) MES MAS</td></tr>
<tr><td>DURACION FINAL CONTRATO</td><td colspan="4">TRES (03) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar la presente vigencia Fiscal.</td></tr>
<tr><td>ACTA DE INICIO</td><td colspan="4">21 DE NOVIEMBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td rowspan="6">POLIZAS</td><td colspan="4">ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA N 560 47 994000195115
FECHA DE EXPEDICION: 18/11/2025</td></tr>
<tr><td>POLIZA</td><td>DESDE</td><td>HASTA</td><td>VALOR ASEGURADO</td></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO</td><td>18/11/2025</td><td>18/07/2026</td><td>$ 95,057,034.20</td></tr>
<tr><td>PRESTACIONES SOCIALES</td><td>18/11/2025</td><td>18/07/2026</td><td>$ 95,057,034.20</td></tr>
<tr><td>ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA</td><td>18/11/2025</td><td>18/07/2029</td><td>$ 142,585,551.30</td></tr>
<tr><td colspan="4">ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA N 560 74 994000036472
FECHA DE EXPEDICION: 18/11/2025</td></tr>
<tr><td>POLIZA</td><td>DESDE</td><td>HASTA</td><td>VALOR ASEGURADO</td></tr>
<tr><td>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONT.</td><td>18/11/2025</td><td>18/01/2029</td><td>$ 284,700,000.00</td></tr>
</table>

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PUESTO DE SALUD

ALTO DEL OBISPO

La intervención se desarrolla en el puesto de salud ubicado en el centro poblado de Alto del Obispo, en zona rural del municipio de San Agustín, accesible mediante una vía terciaria en buen estado y rodeado por viviendas, equipamientos comunitarios y una institución educativa. El lote es esquinero y colinda con una vivienda unifamiliar y un local comercial. Debido a las condiciones rurales, la disponibilidad de suministros y servicios para actividades constructivas es limitada, por lo que se requiere logística adicional para el transporte de personal y materiales; sin embargo, el sitio cuenta con adecuada conectividad y servicios básicos para la ejecución. La edificación presenta un avanzado deterioro derivado del abandono: muros y columnas en bloque de ladrillo con fisuras y riesgo de colapso, cubierta en asbesto-cemento con filtraciones, cielorrasos en madera con pérdidas de material, y pisos en concreto y baldosa con grietas. Se evidencian también problemas de drenaje pluvial que generan empozamientos en áreas como la sala de espera. Aunque existen acometidas, actualmente la infraestructura no dispone de servicio de energía ni de tanque de almacenamiento de agua, y las puertas y ventanas muestran condiciones variables, algunas aceptables y otras afectadas por corrosión y desgaste.



CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025


CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PUESTO DE SALUD

ALTO NARANJOS

La obra se desarrolla en el puesto de salud de Alto Naranjos, ubicado en zona rural del municipio de San Agustín, con acceso mediante vía terciaria en placa huella en buen estado y a aproximadamente treinta minutos del casco urbano. El inmueble se encuentra en el centro poblado, rodeado de viviendas y contiguo a una institución educativa, aunque sin compartir muros con esta. El entorno rural presenta limitaciones en la disponibilidad de suministros y servicios para actividades constructivas, por lo que es necesaria logística adicional para el transporte de materiales y personal; no obstante, el sitio cuenta con adecuada conectividad y servicios para la ejecución. En cuanto al estado de la estructura, se identificaron afectaciones por humedad debido a la ausencia de cubierta en el patio posterior, así como una cubierta general en asbesto-cemento apoyada en vigas trianguladas de varilla, con tejas deterioradas que generan filtraciones. Los pisos, en concreto o baldosa según el espacio, presentan grietas; el puesto de salud no cuenta con cielorraso, dejando expuestas tuberías y cables eléctricos. No se observaron columnas, pero sí vigas aéreas dispuestas para proyección de cuchillas. La instalación cuenta con acometidas y servicio de energía, aunque carece de tanque de almacenamiento. Puertas y ventanas muestran estados variables, algunas aceptables y otras con corrosión y deterioro. Si bien algunos espacios continúan utilizándose para brigadas de salud, es evidente la falta de mantenimiento y adecuación de la infraestructura.











CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ALTO DEL OBISPO

RESUMEN EJECUTIVO – INFORME DE OBRA NO. 01

Durante el primer mes de ejecución de la obra se desarrollaron de manera progresiva las actividades preliminares y constructivas iniciales, orientadas a la adecuación del frente de trabajo y a la intervención de los elementos existentes conforme al alcance contractual. En una primera etapa se priorizó la organización logística del proyecto, incluyendo la adecuación de la bodega, el suministro oportuno de materiales, el transporte del personal y la correcta disposición de residuos, lo que permitió mantener la continuidad de las labores sin interrupciones. Paralelamente, se ejecutaron actividades de demolición, desmontes parciales de cubierta, excavaciones manuales, construcción de cajas de inspección y retiro de elementos arquitectónicos existentes.

Durante el inicio de las intervenciones se identificaron diversas condiciones no previstas en la fase de presupuestación, principalmente asociadas a deficiencias estructurales y a inconsistencias entre planos y presupuesto, las cuales requerían ajustes técnicos para garantizar la seguridad, estabilidad y funcionalidad de la edificación. Estos imprevistos fueron socializados con la interventoría y formalizados mediante el Acta 01 y el acta de imprevistos correspondiente, permitiendo avanzar en la definición de mayores y menores cantidades de obra.

En las semanas siguientes se ejecutaron elementos estructurales adicionales para el confinamiento y estabilización del muro lateral izquierdo de la sala de capacitaciones, incluyendo zapatas, columnas y vigas, así como la estructura necesaria para el soporte del tanque elevado. De manera simultánea, se avanzó en la construcción de nuevos muros en bloque, cuchillas de cubierta, cerramientos para unidades sanitarias —incluida una para personas con discapacidad— y muros correspondientes a consultorios, garantizando la correcta conformación de los espacios proyectados.

Adicionalmente, se desarrollaron actividades relacionadas con las instalaciones hidrosanitarias, sanitarias y eléctricas, tales como la preparación de salidas, conducciones y puntos hidráulicos y eléctricos, así como la cuantificación de materiales requeridos para la futura conexión al sistema de alcantarillado. Finalmente, se adelantaron trabajos de estructura metálica y cubierta, incluyendo la instalación de perfiles estructurales, aplicación de anticorrosivo y colocación de teja termoacústica UPVC, junto con la ejecución parcial de pañetes en muros, consolidando así el avance físico del proyecto durante el primer mes de obra.

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

El 30 de diciembre de 2025 se suscribió el Otrosí modificatorio al Contrato No. 547 de 2025, mediante el cual se aprobó la prórroga del plazo contractual por un (1) mes adicional. Esta ampliación de la vigencia resultó determinante para el adecuado desarrollo del proyecto, en la medida en que permitió programar y ejecutar las actividades previstas de manera ordenada, garantizando su realización dentro de los términos técnicos, administrativos y constructivos establecidos, así como la correcta culminación de los trabajos conforme al alcance contractual.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS – INFORME DE OBRA NO. 01

- Adecuación del frente de trabajo y organización logística de la obra.
- Adecuación de bodega para almacenamiento de materiales e insumos.
- Transporte de personal, suministro de materiales y evacuación de residuos.
- Demolición de muros en mampostería.
- Desmonte total de cubierta en asbesto–cemento.
- Demolición de placa de piso en concreto (espesor 0,10 m).
- Retiro de marcos, puertas y ventanas internas.
- Excavación manual en material común y disposición de sobrantes en sitio autorizado.
- Construcción de cajas de inspección de 80 × 80 cm.
- Levantamiento de muros en bloque N.° 4 (espesor 0,10 m).
- Construcción de vanos para puertas y ventanas.
- Construcción de elementos estructurales en concreto (zapatas, columnas y vigas aéreas).
- Confinamiento estructural del muro lateral izquierdo de la sala de capacitaciones.
- Construcción de cuchillas y muros para adecuación de la nueva cubierta.
- Construcción de cerramientos para unidades sanitarias, incluyendo sanitario accesible.
- Construcción de muros para consultorios médicos.
- Ejecución de estructura para soporte de tanque elevado.
- Instalaciones hidrosanitarias para tanque elevado y puntos hidráulicos.
- Ejecución de salidas sanitarias en PVC (3” y 4”).
- Instalaciones eléctricas: conducciones, salidas para luminarias y tomas dobles.
- Instalación de estructura metálica para cubierta (tubos rectangulares 100 × 50 × 2 mm).
- Aplicación de anticorrosivo en elementos metálicos.
- Instalación de cubierta en teja termoacústica UPVC de 2,5 mm.
- Aplicación parcial de pañete liso en muros (proporción 1:4).

RESUMEN EJECUTIVO – INFORME DE OBRA NO. 02

Durante el segundo mes de ejecución, comprendido entre el 22 de diciembre de 2025 y el 24 de enero de 2026, la obra presentó avances significativos en los frentes estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y de acabados, pese a las condiciones particulares derivadas de la temporada decembrina y a las restricciones temporales de acceso ocasionadas por trabajos de mejoramiento vial desarrollados en la vereda Alto del Obispo.

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

En el periodo correspondiente al cierre del mes de diciembre e inicio de enero, la programación fue ajustada para optimizar los días hábiles efectivos, priorizando la culminación de actividades críticas. En esta etapa se logró finalizar completamente la estructura y la cubierta del proyecto, así como las instalaciones sanitarias internas y su conexión definitiva al sistema de alcantarillado, garantizando su correcto funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

Durante el mes de enero se consolidaron los frentes de acabados y adecuaciones internas. Se avanzó de manera continua en la ejecución de pañetes en muros, conformación de placas base en concreto de 2.500 psi, montaje e instalación de cielo raso en sistema drywall, y ejecución de sistemas complementarios de cubierta, incluyendo canales y bajantes para aguas lluvias. Asimismo, se realizó la instalación del tanque elevado de 1.000 litros y se completaron los trabajos asociados a las instalaciones hidrosanitarias.

En la última semana evaluada se dio inicio a la fase de acabados finales con la instalación de baldosa institucional tipo grano mármol Payandé y la ejecución de medias cañas, marcando el inicio de la etapa de terminaciones arquitectónicas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS – INFORME DE OBRA NO. 02

- Colocación de caballete en cubierta termoacústica.
- Instalación de canales en PVC tipo Amazonas.
- Instalación de bajantes en PVC para evacuación de aguas lluvias.
- Ejecución de instalaciones hidrosanitarias internas.
- Conexión al sistema de alcantarillado.
- Instalación de tanque plástico elevado de 1.000 litros.
- Aplicación de pañete liso en muros (dosificación 1:4, espesor promedio 1,5 cm).
- Ejecución de filos.
- Ejecución de juntas de dilatación en muros.
- Ejecución de placa base en concreto de 8 cm de espesor, resistencia 2.500 psi.
- Conformación y nivelación de bases para pisos.
- Ejecución de estructura para cielo raso plano en sistema drywall.
- Instalación de cielo raso plano en sistema drywall.
- instalación de baldosa institucional tipo grano mármol Payandé, fondo blanco.
- Ejecución de medias cañas.
- Adecuación vanos para puertas y ventanas

MES 03

SEMANA DEL 26 AL 31 DE ENERO

Se avanzó en el tratamiento de muros mediante la aplicación de pañete liso, incluyendo la ejecución de filos y juntas de dilatación, lo que permitió dejar superficies listas para las etapas

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

posteriores de estuco y pintura. Estas actividades se desarrollaron de manera simultánea con la instalación del cielo raso plano en sistema drywall, logrando cerrar progresivamente áreas internas del proyecto.

En paralelo, se dio continuidad a la instalación de baldosa institucional tipo grano mármol Payandé, fondo blanco, consolidando la fase de terminaciones en pisos y mejorando la definición arquitectónica de los espacios.
Respecto a los elementos metálicos, se realizó el alistamiento para la colocación de marcos y puertas en lámina calibre 18, incluyendo unidades con aplicación de anticorrosivo. Los materiales se encontraron disponibles en obra y se adelantaron adecuaciones en vanos y ajustes dimensionales para garantizar su correcta instalación. Asimismo, se efectuó la preparación de áreas destinadas a la ejecución de medias cañas, dejando las superficies en condiciones técnicas adecuadas.

El desarrollo de los trabajos se ejecutó en varios frentes simultáneos, optimizando recursos y mano de obra, con el objetivo de avanzar de manera sostenida hacia la culminación de las actividades pendientes conforme a la programación establecido.

- Actividades realizadas:
- Filos o dilataciones s/muro
- Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm
- cielo raso plano drywall
- baldosa institucional grano mármol payande fondo blanco
- Marco para puerta en lámina cal 18-0.8
- Puerta en lamina cal 18 inc. Anticorrosivo

SEMANA DEL 02 AL 07 DE FEBRERO

Durante la presente semana se culminaron las actividades relacionadas con el afinado de muros mediante la aplicación de pañete liso, dejando las superficies debidamente niveladas y listas para el proceso de estuco y pintura.
De manera paralela, se avanzó en la instalación del cielo raso plano en sistema drywall, consolidando los espacios interiores y permitiendo definir alturas y acabados finales en las diferentes áreas del proyecto.
En esta misma etapa se dio inicio a la instalación de marcos, puertas y ventanas en lámina calibre 18, incluyendo la aplicación de anticorrosivo, realizando previamente la verificación de medidas, alineación de vanos y ajustes necesarios para garantizar su correcta fijación y funcionamiento.
La ejecución se desarrolló de forma organizada y progresiva, manteniendo varios frentes activos y asegurando la continuidad operativa de la obra conforme a la programación establecida, avanzando hacia la etapa final de acabados arquitectónicos.

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

- Instalación de cielo raso plano en sistema drywall.
- Instalación de marco para puerta en lámina calibre 18 (0.8 mm).
- Instalación de puerta en lámina calibre 18, incluye aplicación de anticorrosivo.
- Instalación de ventana en lámina calibre 18, incluye aplicación de anticorrosivo.
- baldosa institucional grano mármol payande fondo blanco

SEMANA DEL 09 AL 14 DE FEBRERO

se avanzó de manera significativa en la etapa de acabados, logrando el cierre de varios frentes correspondientes a actividades interiores y exteriores del proyecto.
Se culminaron los trabajos de pañetes, revoques y repellos exteriores, dejando definidas las superficies para procesos finales de pintura. De igual forma, se completó la instalación del cielo raso plano en sistema drywall en las áreas pendientes, garantizando nivelación, alineación y correcta fijación estructural.
En el frente de carpintería metálica se finalizaron las actividades de instalación de marcos, puertas y ventanas en lámina calibre 18 con aplicación de anticorrosivo, quedando pendiente pintura.
Se avanzó en la ejecución de enchapes en baños mediante la instalación de baldosa cerámica piso–pared 20x20, así como en la conformación de medias cañas en granito, consolidando las condiciones sanitarias y de fácil mantenimiento requeridas para estos espacios. Paralelamente, se ejecutaron placas base en concreto de 8 cm de espesor y resistencia 2.500 psi para anden lateral, fortaleciendo las áreas exteriores del proyecto. Se avanzó en la aplicación de estuco sobre superficies previamente afinadas.

- cielo raso plano drywall
- Marco para puerta en lámina cal 18-0.8
- Puerta en lamina cal 18 inc. Anticorrosivo
- ventana lámina calibre 18 inc.anticorrosivo
- baldosa cerámica piso-pared 20x20
- media caña en granito
- ANDENES placa base concreto 0.08 2500 psi.
- Estuco

SEMANA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO

Durante la presente semana se culminaron las actividades programadas dentro del plazo contractual, consolidando los diferentes capítulos del proyecto y logrando la terminación sustancial de la obra conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

Se finalizaron los trabajos correspondientes a cielo raso en sistema drywall, carpintería metálica, pañetes, revoques, repellos y enchapes, cerrando integralmente los frentes de

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

acabados interiores. De igual manera, media caña, proceso de pulido de pisos, garantizando condiciones técnicas adecuadas para su correcta terminación.

Durante esta semana se mantuvieron frentes de trabajo simultáneos con disponibilidad suficiente de recurso humano y logística, lo que permitió optimizar el rendimiento y cumplir con el término de ejecución pactado contractualmente.

- cielo raso plano drywall
- Estuco
- media caña en granito
- fraguado y pulido de piso.
- Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería)
- Suministro e instalación lavamanos pedestal (incluye grifería)
- Juegos incrustar (incluye toallero, porta rollo, jabonera, cepillera y percha simple

Al cierre del 20 de febrero, fecha de finalización del plazo contractual, la obra quedó sustancialmente terminada, restando únicamente actividades complementarias y detalles menores propios de la fase de cierre operativo, las cuales no afectan la funcionalidad ni el cumplimiento del objeto contractual.

ACTIVIDADES DE AJUSTE, CIERRE Y GARANTÍA EJECUTADAS

Con fecha 25 de febrero de 2026 se presentó una novedad derivada de las intensas lluvias registradas en el sector, las cuales ocasionaron infiltración de agua en el punto de encuentro entre la cubierta del proyecto y el muro colindante de la edificación vecina perteneciente a la Junta de Acción Comunal, situación que generó afectación en el cielo raso del Consultorio Médico 01 (3,40 m x 3,00 m). Una vez identificada la condición, procedimos de manera inmediata a realizar inspección técnica detallada del punto crítico en cubierta, verificando pendientes, traslapos, sellos y el tratamiento constructivo del encuentro cubierta–muro, determinando la necesidad de ajustar el sistema de impermeabilización para garantizar la correcta evacuación de aguas lluvias y la estanqueidad del elemento. Paralelamente, se efectuó el desmonte total del cielo raso afectado y su posterior reposición en sistema drywall, asegurando nivelación, acabado y condiciones óptimas de funcionalidad del espacio intervenido. Esta situación y las acciones correctivas implementadas fueron informadas oportunamente a la Interventoría para su conocimiento y seguimiento, dejando constancia de la atención técnica realizada dentro del marco de responsabilidad post-ejecución.

PERSONAL EN OBRA

para el desarrollo de las actividades correspondientes a las adecuaciones del puesto de salud del centro poblado **Alto del Obispo**, se contó con el personal técnico y operativo requerido, conformado por un **ingeniero civil** en calidad de **director de obra**, con una dedicación del **20 %**, un **ingeniero civil** como **residente de obra**, con una dedicación del **50 %**, así como un **maestro de obra** y **tres (3) ayudantes**, estos últimos con una dedicación del **100 %**. El equipo

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

dispuesto posee la experiencia y capacidad técnica necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las especificaciones técnicas, la programación establecida y las obligaciones contractuales.

VISITAS DE INTERVENTORIA

Durante el periodo comprendido entre el 25 de enero de 2026 y el 20 de febrero de 2026, la interventoría realizó visitas técnicas periódicas a la obra, en el marco del seguimiento y control al contrato, con el fin de verificar el avance físico de las actividades ejecutadas por el contratista y constatar su correcta ejecución conforme a los estudios, diseños, especificaciones técnicas y condiciones contractuales vigentes. Estas visitas constituyen un soporte técnico fundamental para la validación de las cantidades de obra ejecutadas y para la posterior suscripción del **Acta Parcial de Obra N.° 03**, orientada al reconocimiento y pago de las actividades efectivamente realizadas.

Las visitas de interventoría realizadas durante el periodo señalado corresponden a las siguientes fechas:

- Visita 1: 30 de enero de 2026
- Visita 2: 05 de febrero de 2026
- Visita 3: 13 de febrero de 2026
- Visita 4: 20 de febrero de 2026

- Visita 5: 27 de febrero de 2026 posterior a terminación contractual

SUPERVISIÓN

Durante la ejecución de las actividades de obra se ha mantenido una comunicación permanente y oportuna con la supervisión ejercida por la ESE Hospital Arsenio repizo Vanegas, a través de la gerencia, secretaria general y del profesional designado para la supervisión del contrato, lo cual ha permitido la socialización de avances, la atención de observaciones técnicas y la articulación necesaria para el adecuado desarrollo de las actividades, dentro del marco de las competencias de cada una de las partes.

VEEDURÍA


El personal técnico vinculado al desarrollo de adecuaciones en el puesto de salud alto del obispo han procurado mantener una relación respetuosa y colaborativa con los habitantes del sector, sosteniendo canales de comunicación constantes con los vecinos del área de influencia, el párroco, la rectora de la institución educativa, el presidente de la Junta de Acción Comunal y la promotora de salud, con el propósito de informar sobre el desarrollo de las actividades, atender inquietudes y contribuir a un ambiente laboral adecuado que favorezca la correcta ejecución del proyecto.

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

ACTA DE BITÁCORA

Se diligencia diariamente en obra, se escanea y se cargan en nube virtual para su resguardo y revisión.

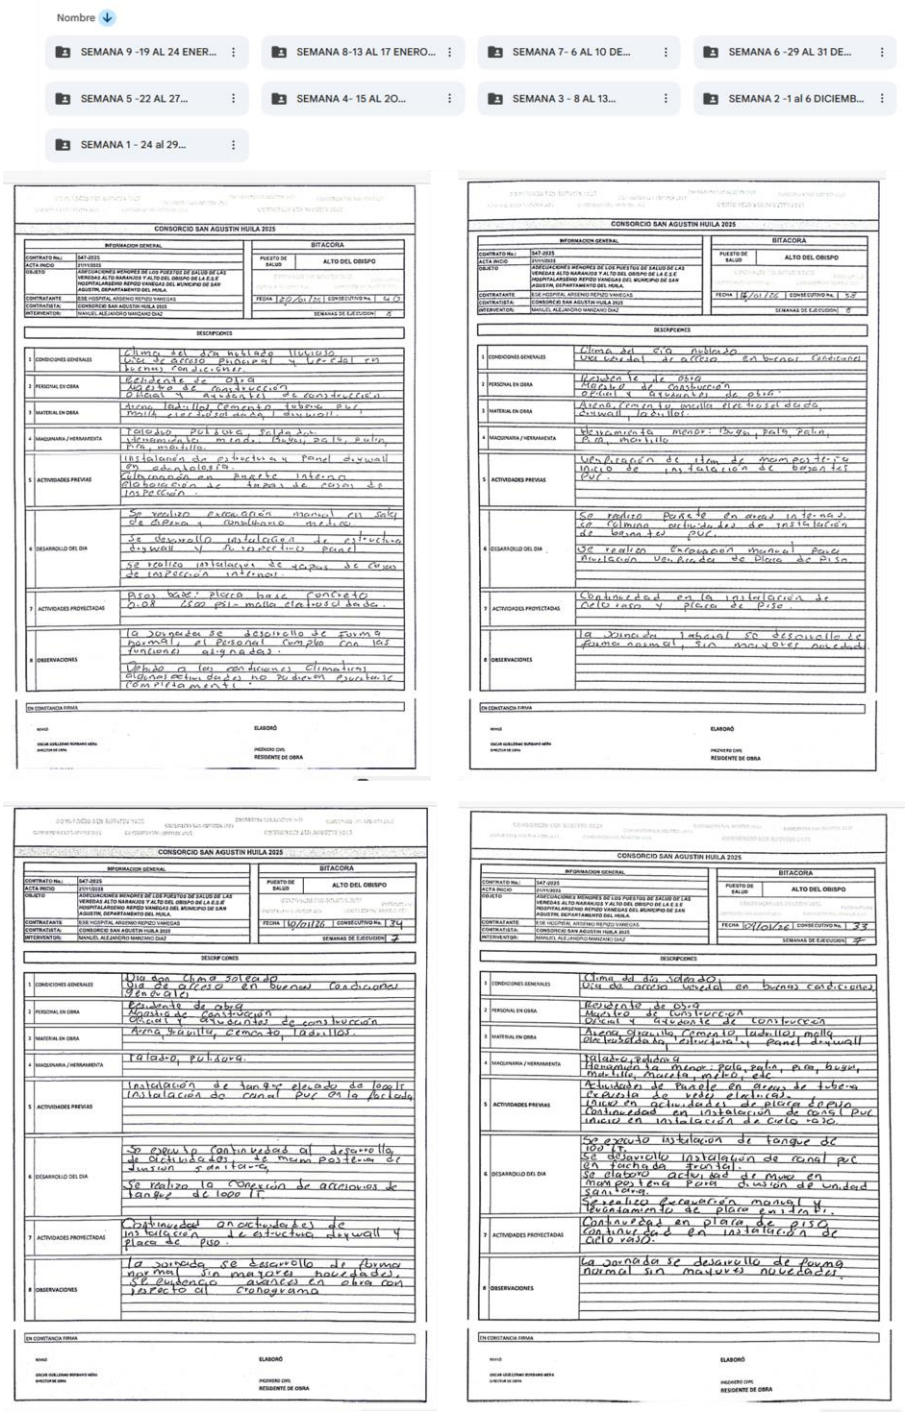

CRONOGRAMA DE OBRA EJECUTADO (ANEXO ACTA y DOCUMENTO EXCEL)

PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO (ANEXO ACTA y DOCUMENTO EXCEL)

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

BALANCE ECONOMICO

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO		
	VALOR	**VALOR TOTAL**
ALTO DEL OBISPO	$ 299.439.477,00	**$ 475,285,171.00**
ALTO NARANJOS	$ 175.845.694,00	
EJECUCION POR PUESTO DE SALUD		
PUESTO DE SALUD	**NUMERO DE ACTA**	**VALOR**
ALTO DEL OBISPO	**ACTA PARCIAL 01**	**$ 100.045.520,00**
	VALOR POR EJECUTAR	**$ 199.393.957,00**
	% DE EJECUCION	**33%**
ALTO NARANJO	**ACTA PARCIAL 01**	**-**
	VALOR POR EJECUTAR	**-**
	% DE EJECUCION	**-**
ALTO DEL OBISPO	**ACTA PARCIAL 02**	**$ 127.187.353,91**
	VALOR POR EJECUTAR	**$72.206.603,09**
	% DE EJECUCION	**75.88%**
ALTO NARANJO	**ACTA PARCIAL 02**	**-**
	VALOR POR EJECUTAR	**-**
	% DE EJECUCION	**-**
ALTO DEL OBISPO	**ACTA PARCIAL 03**	**$72.206.603,09**
	VALOR POR EJECUTAR	**$0**
	% DE EJECUCION	**100%**
ALTO NARANJO	**ACTA PARCIAL 03**	**-**
	VALOR POR EJECUTAR	**-**
	% DE EJECUCION	**-**
EJECUCION GENERAL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 475,285,171.00**
VALOR ACTA ANTERIOR		**$ 127.187.353,91**
VALOR PRESENTE ACTA		**$ 72.206.603,09**
VALOR POR EJECUTAR		**175.845.694,00**
% DE EJECUCION		**63.00%**

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

OBSERVACIONES

PUESTO DE SALUD ALTO DEL OBISPO

CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE CONTRACTUAL Se deja constancia de que durante la ejecución del contrato se desarrollaron en su totalidad las actividades contempladas dentro del presupuesto oficial y en los documentos contractuales que hacen parte integral del proyecto. Se dio estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas, cantidades de obra y condiciones establecidas contractualmente, ejecutando cada uno de los ítems previstos y en lo aprobado en el OTRO SI 02 que, modifico el porcentaje de AIU y amplio el valor del costo directo.

Asimismo, se acataron de manera integral todas las recomendaciones técnicas, ajustes operativos y lineamientos emitidos por la Supervisión y la Interventoría, garantizando que la obra se desarrollara en condiciones óptimas de calidad, estabilidad, seguridad y funcionalidad.

En consecuencia, el proyecto fue ejecutado conforme al alcance contratado y bajo los parámetros técnicos definidos.

CONDICIÓN DE HUMEDAD EN PATIO POSTERIOR CONSULTORIO MEDICO – Influencia de alud de tierra

En el patio posterior del puesto de salud se evidencia que los muros laterales se encuentran en contacto directo con un alud o “luz de tierra” perimetral, lo cual genera acumulación permanente de humedad en el terreno adyacente. Técnicamente, esta condición produce:

- Humedad por capilaridad en los elementos murarios.
- Presión hidrostática lateral por ausencia de un sistema de drenaje o impermeabilización perimetral externo.
- Incremento de la humedad relativa interior, generando fenómenos de condensación superficial en elementos metálicos.

La “sudoración” observada en la estructura metálica y en la cubierta corresponde a un fenómeno de condensación por punto de rocío, donde el vapor de agua presente en el ambiente húmedo entra en contacto con superficies metálicas cuya temperatura es inferior, generando condensación visible (sereno).

Se deja expresa constancia de que esta situación no corresponde a goteras, filtraciones por cubierta, defectos de instalación ni mala práctica constructiva, sino a una condición externa asociada a la configuración topográfica y a la inexistencia de un sistema de drenaje perimetral.

CONDICIÓN DE HUMEDAD MURO SALA DE CAPACITACIONES - Durante el proceso de ejecución de las actividades constructivas se evidenció que el muro lateral

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

correspondiente a la sala de capacitaciones del puesto de salud colinda directamente con el patio de ropas del predio vecino. En dicho espacio el vecino dispone de una alberca de almacenamiento de agua, la cual presentaba filtraciones que generaban presencia permanente de humedad en el muro colindante del puesto de salud.

Inicialmente se procedió a realizar tratamiento e impermeabilización por la cara interna del muro perteneciente al puesto de salud; no obstante, al persistir la presencia de humedad, se identificó que el origen de la filtración provenía de la estructura de la alberca ubicada en el predio vecino. En consecuencia, y con autorización previa del propietario del inmueble colindante, se realizó un proceso de impermeabilización en la alberca, con el fin de mitigar la fuente de humedad y proteger las condiciones físicas del muro del puesto de salud.

RED DE ALCANTARILLADO EN GRES Por el costado izquierdo del puesto de salud atraviesa una red de alcantarillado en tubería de gres proveniente de la institución educativa contigua. Dicha red, debido a su antigüedad y al deterioro de sus uniones, presenta filtraciones constantes de agua hacia el terreno circundante.

Durante la ejecución del contrato:

- Se solicitó a la Rectoría del plantel educativo la intervención del tramo afectado.
- No se generó actuación correctiva por parte de dicha entidad.
- La situación fue puesta en conocimiento del presidente de la Junta de Acción Comunal para su eventual gestión futura.
- Como medida de mitigación temporal y preventiva, el consorcio procedió a sellar las uniones visibles de la tubería de gres, con el fin de reducir la infiltración de agua hacia el perímetro del puesto de salud. Sin embargo, esta intervención no constituye una solución definitiva, ya que la problemática estructural de la red se encuentra fuera del alcance contractual.

INTERVENCIÓN A EVENTO DE LLUVIAS Con ocasión de las fuertes precipitaciones registradas el 25 de febrero, se presentó afectación en el cielo raso del Consultorio No. 1. En coordinación con la Junta de Acción Comunal, se acordó realizar una intervención preventiva en el costado del predio vecino, con el objetivo de minimizar riesgos futuros derivados de escorrentías o acumulación de agua. La intervención consistió en:

- Instalación de perfiles metálicos.
- Colocación de cubierta nueva en el sector intervenido.

Dicha actuación tuvo carácter preventivo y de mitigación del riesgo, orientada a proteger la infraestructura del puesto de salud ante eventos climáticos similares.

MODIFICACIÓN PUNTUAL EN DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA Durante la ejecución se realizó una única modificación respecto a la distribución arquitectónica inicial del proyecto. Esta modificación correspondió a:

- Baño No. 1 – Consultorio No. 1.

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

- Baño No. 2 – Sala de Capacitaciones.

El ajuste consistió en modificar las dimensiones para que el baño de la Sala de Capacitaciones cumpliera con las medidas necesarias para garantizar accesibilidad a personas con discapacidad. Como consecuencia, el baño del Consultorio No. 1 redujo su dimensión, quedando con un área aproximada de 1.20 m x 1.50 m, manteniendo su funcionalidad conforme al uso previsto. Se deja constancia de que esta modificación no alteró el valor contractual ni el alcance general del proyecto.

ACTAS, IMPREVISTOS Y DECISIONES TÉCNICAS DURANTE LA EJECUCIÓN
Durante el desarrollo de la obra surgieron situaciones técnicas, imprevistos constructivos y ajustes operativos propios de la intervención de una edificación existente. Todas estas situaciones fueron:

- Revisadas técnicamente por el contratista.
- Evaluadas por la Interventoría.
- Formalizadas y aprobadas mediante actas, registros y demás documentos contractuales correspondientes.
- En ningún caso se realizaron intervenciones unilaterales ni modificaciones sin la debida revisión técnica y aprobación formal.
- Las decisiones adoptadas tuvieron como finalidad garantizar la correcta funcionalidad del proyecto, la estabilidad de los elementos intervenidos y la adecuada prestación del servicio en el puesto de salud.

AJUSTE PORCENTUAL DEL AIU Y REGULARIZACIÓN EN ACTA PARCIAL NO. 3 se deja constancia de que el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) inicialmente contemplado en la estructuración del contrato fue del **32%** sobre el costo directo. No obstante, con ocasión de la modificación del costo directo del proyecto, el porcentaje efectivo de AIU se ajustó a **27,1%**, en concordancia con la nueva estructura económica resultante. Se precisa que en las Actas Parciales No. 1 y No. 2 del Contrato No. 547 se liquidó y cobró el AIU con base en el porcentaje inicial del 32%, conforme a la programación financiera vigente al momento de su trámite.

En consecuencia, para la **Acta Parcial No. 3** se realizará el ajuste correspondiente, cobrando únicamente el saldo o excedente necesario para que el AIU total del contrato quede definitivamente liquidado conforme al porcentaje ajustado del **27,1%**, garantizando así la coherencia financiera y el cierre contable adecuado del contrato.

CONSIDERACIÓN CONTRACTUAL Y FINANCIERA Durante la ejecución se tramitaron tres (3) actas parciales. No se realizó cobro por actividades desarrolladas en el puesto de salud de Alto Naranjo, no por inexistencia de circunstancias que pudieran justificarlo, sino por acuerdo interno del consorcio. Habiéndose culminado el plazo

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

contractual, el acta de liquidación se elaborará con el valor económico correspondiente exclusivamente al proyecto del Puesto de Salud Alto Naranjos, conforme al alcance ejecutado.


CONCLUSION

Durante el periodo reportado se culminó la ejecución del proyecto correspondiente al Puesto de Salud Alto del Obispo, desarrollando las actividades contractuales de manera progresiva y conforme a la programación aprobada. La ejecución permitió consolidar los diferentes frentes de trabajo y cumplir satisfactoriamente con las actividades constructivas previstas dentro del alcance del contrato. A lo largo del desarrollo de la obra se atendieron oportunamente las condiciones técnicas identificadas en campo, incluyendo la ejecución de ajustes operativos y actividades complementarias necesarias para garantizar la estabilidad, funcionalidad y calidad de los trabajos ejecutados. Todas las decisiones técnicas fueron revisadas y avaladas por la interventoría, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento contractual.

La suscripción del Otrosí No. 01 modificatorio al Contrato No. 547 de 2025, mediante el cual se aprobó la prórroga del plazo contractual, resultó determinante para el adecuado desarrollo del proyecto, ya que permitió reorganizar la programación de obra, optimizar la ejecución de los recursos y garantizar que las actividades se ejecutaran dentro de los parámetros técnicos y constructivos establecidos. De igual forma, la suscripción del Otrosí No. 02 modificatorio al Contrato No. 547 de 2025, mediante el cual se ajustó el AIU del 32% al 27,1%, permitió reestructurar financieramente el proyecto conforme a la modificación del costo directo, optimizando los recursos disponibles y asegurando la atención de actividades necesarias dentro de los términos técnicos definidos.

Es importante precisar que el Contrato No. 547 de 2025 contempla la intervención de dos (2) puestos de salud: Alto del Obispo y Alto Naranjos. En las Actas Parciales No. 1, 2 y 3 únicamente se efectuó cobro por la ejecución del Puesto de Salud Alto del Obispo, en virtud de un acuerdo interno del Consorcio San Agustín 2025. No obstante, se deja expresa constancia de que el proyecto correspondiente al Puesto de Salud Alto Naranjos también fue ejecutado dentro de los términos técnicos y contractuales establecidos.



Atentamente:



FREDDY ESNEIDER SALAS MEDINA
Cc 1080933543
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
Nit: 902003558-3



CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

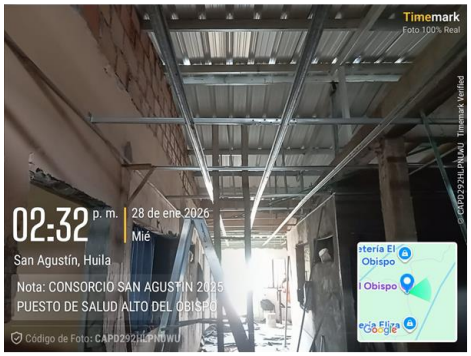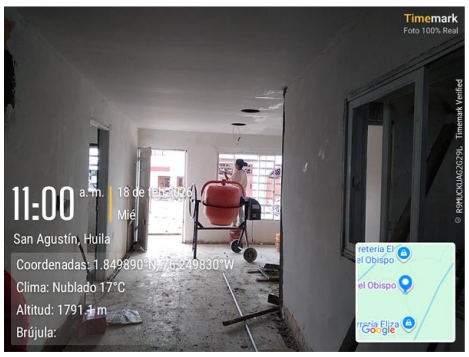REGISTRO FOTOGRAFICO ALTO DEL OBISPO	
AVANCE	       

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

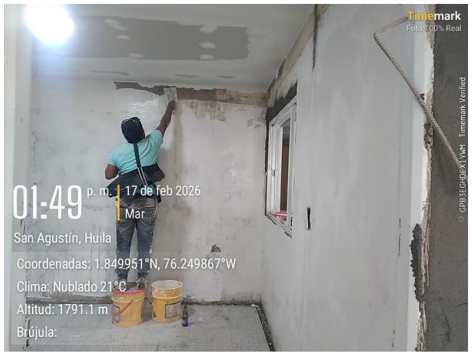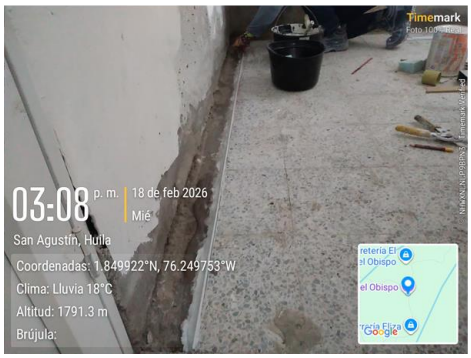AVANCE	       


CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

SEMANA 4





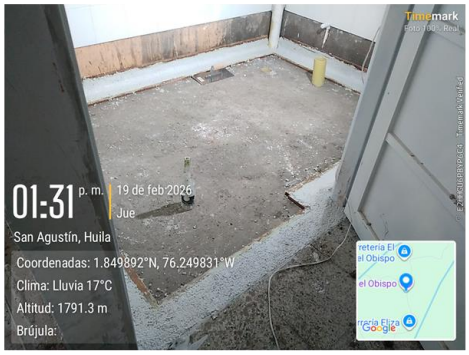











CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA

OBJETO:	**ADECUACIONES MENORES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS ALTO NARANJOS Y ALTO DEL OBISPO DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA.**				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 NIT: 9 0 2 0 0 3 5 5 8 -3	**CTO DE OBRA**	**PLAZO (DIAS)**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR TOTAL OBRA**
INTERVENTOR:	**MANUEL ALEJANDRO MANZANO DIAZ**	**547 DE 2025**	60 **ADICIONAL** 30 **PLAZO TOTAL (DIAS)** **90**	$ 299.439.477,00 **ADICIONAL** - **VALOS ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**$ 299.439.477,00**
SUPERVISOR:	Dra. ANGIE LORENA GASCA OME				
PUESTO DE SALUD	**ALTO DEL OBISPO**				
ACTA MODIFICATORIA					

ACTAS

FECHA DEL CONTRATO	**18/11/2025**
ACTA INICIO	**21/11/2025**
ACTA PARCIAL 1	**19/12/2025**
ACTA PARCIAL 2	**26/01/2026**
OTRO SI 01	**30/12/2025**
OTRO SI 02	**10/02/2026**
HOJA	1 DE 2

		CONDICIONES ORIGINALES				**MODIFICACIONES**		**CANTIDADES APROBADAS OTROSI**		**CONDICIONES EJECUTADAS**		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**% EJECUCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
ADECUACIONES PUESTO DE SALUD VEREDA DE ALTO DEL OBISPO												
1.	**PRELIMINARES**											
1.1	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	14,28	$ 27.480,00	$ 392.414,00	-0,11	-$ 3.022,80	14,17	$ 389.392,00	100%	14,17	$ 389.392,00
1.2	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	162,76	$ 31.780,00	$ 5.172.513,00	0,00	$ -	162,76	$ 5.172.513,00	100%	162,76	$ 5.172.513,00
1.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 57.321,00	$ 57.321,00	0,00	$ -	1,00	$ 57.321,00	100%	1,00	$ 57.321,00
1.4	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	14,60	$ 26.112,00	$ 381.235,00	35,00	$ 913.920,00	49,63	$ 1.295.939,00	100%	49,63	$ 1.295.939,00
1.5	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	146,45	$ 33.438,00	$ 4.896.995,00	-4,55	-$ 152.142,90	141,90	$ 4.744.852,00	100%	141,90	$ 4.744.852,00
1.6	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UND	7,00	$ 66.875,00	$ 468.125,00	0,00		7,00	$ 468.125,00	100%	7,00	$ 468.125,00
1.7	DESMONTE DE VENTANAS	UND	6,00	$ 28.661,00	$ 171.966,00	0,00	$ -	6,00	$ 171.966,00	100%	6,00	$ 171.966,00
				Sub Total	**$ 11.540.569,00**	**Sub Total**	**$ 758.754,30**		**$ 12.300.108,00**			**$ 12.300.108,00**
2.	**DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**											
2.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80	UND	3,00	$608.377,00	$ 1.825.131,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.825.131,00	100%	3,00	$ 1.825.131,00
				Sub Total	**$ 1.825.131,00**				**$ 1.825.131,00**			**$ 1.825.131,00**
3	**MAMPOSTERIA**											
3.1	MURO EN BLOQUE N° 4 E=0.10 M	M2	40,71	$61.659,00	$ 2.510.138,00	84,32	$ 5.199.086,88	125,03	$7.709.225,00	100%	125,03	$ 7.709.225,00
				Sub Total	**$ 2.510.138,00**	**Sub Total**	**$ 5.199.086,88**		**$ 7.709.225,00**			**$ 7.709.225,00**
4	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**					0,00	$ -					
4.1	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	5,00	$ 22.195,00	$ 110.975,00	36,40	$ 807.898,00	4,80	$ 106.536,00	100%	4,80	$ 106.536,00
4.2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	125,85	$32.064,00	$ 4.035.254,00	53,16	$ 1.704.522,24	142,00	$4.553.088,00	100%	142,00	$ 4.553.088,00
				Sub Total	**$ 4.146.229,00**	**Sub Total**	**$ 2.512.420,24**		**$ 4.659.624,00**			**$ 4.659.624,00**
5	**CUBIERTAS**					0,00	$ -					
5.1	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	12,00	$47.554,00	$ 570.648,00	0	$ 0,00	12,00	$ 570.648,00	100%	12,00	$ 570.648,00
5.2	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	10,64	$ 79.289,00	$ 843.635,00	0	$ -	10,64	$ 843.635,00	100%	10,64	$ 843.635,00
5.3	CANAL PVC AMAZONAS	ML	20,68	$ 70.118,00	$ 1.450.040,00	0,50	$ 35.059,00	20,18	$ 1.414.981,00	100%	20,18	$ 1.414.981,00
5.4	TEJA TERMOACÚSTICA UPVC 2.5 MM	M2	173,07	$163.430,00	$ 28.284.830,00	0,00	$ -	173,07	$ 28.284.830,00	100%	173,07	$ 28.284.830,00
5.5	CUBIERTA.	ML	200,01	$109.996,00	$ 22.000.300,00	-1,00	-$ 109.996,00	200,00	$ 21.999.200,00	100%	200,00	$ 21.999.200,00
				Sub Total	**$ 53.149.453,00**	**Sub Total**	**-$ 74.937,00**		**$ 53.113.294,00**			**$ 53.113.294,00**
6	**VIDRIOS**					0,00	$ -					
6.1	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 mm	M2	13,86	$89.375,00	$ 1.238.738,00	-1,92	-$ 171.600,00	11,94	$ 1.067.138,00	100%	11,94	$ 1.067.138,00
				Sub Total	**$ 1.238.738,00**	**Sub Total**	**-$ 171.600,00**		**$ 1.067.138,00**			**$ 1.067.138,00**
7	**CARPINTERÍA METÁLICA**											
7.1	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8	UND	13,00	$288.698,00	$ 3.753.074,00	-2,00	-$ 577.396,00	11,00	$3.175.678,00	100%	11,00	$ 3.175.678,00
7.2	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	26,28	$380.507,00	$ 9.999.724,00	-5,40	-$ 2.054.737,80	20,88	$7.944.986,00	100%	20,88	$ 7.944.986,00
7.3	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	13,86	$254.803,00	$ 3.531.570,00	-1,92	-$ 489.221,76	11,94	$3.042.348,00	100%	11,94	$ 3.042.348,00
				Sub Total	**$ 17.284.368,00**	**Sub Total**	**-$ 3.121.355,56**		**$ 14.163.012,00**			**$ 14.163.012,00**
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**											
8.1	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UND	1,00	$ 304.905,00	$ 304.905,00	0,00	$ -	1,00	$ 304.905,00	100%	1,00	$ 304.905,00
8.2	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	15,00	$ 88.212,00	$ 1.323.180,00	0,00	$ -	15,00	$ 1.323.180,00	100%	15,00	$ 1.323.180,00
8.3	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	11,00	$ 137.505,00	$ 1.512.555,00	0,00	$ -	11,00	$ 1.512.555,00	100%	11,00	$ 1.512.555,00
8.4	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	4,00	$ 146.475,00	$ 585.900,00	0,00	$ -	4,00	$ 585.900,00	100%	4,00	$ 585.900,00
8.5	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	80,83	$ 22.910,00	$ 1.851.815,00	-5,83	-$ 133.565,30	75,00	$ 1.718.250,00	100%	75,00	$ 1.718.250,00
8.6	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	39,00	$ 53.142,00	$ 2.072.538,00	0,00	$ -	39,00	$ 2.072.538,00	100%	39,00	$ 2.072.538,00
8.7	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	31,35	$72.727,00	$ 2.279.991,00	-4,35	-$ 316.362,45	27,00	$ 1.963.629,00	100%	27,00	$ 1.963.629,00
8.8	REGISTRO 1/2"	UND	4,00	$125.918,00	$ 503.672,00	0,00	$ -	4,00	$ 503.672,00	100%	4,00	$ 503.672,00
8.9	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESSORIOS E INSTALACIÓN).	UND	1,00	$1.038.547,00	$ 1.038.547,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.038.547,00	100%	1,00	$ 1.038.547,00
				Sub Total	**$ 11.473.103,00**				**$ 11.023.176,00**			**$ 11.023.176,00**
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					0,00	$ -					
9.1	SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	20,00	$83.997,00	$ 1.679.940,00	0,00	$ -	20,00	$1.679.940,00	100%	20,00	$ 1.679.940,00
9.2	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	27,00	$80.797,00	$ 2.181.519,00	0,00	$ -	27,00	$2.181.519,00	100%	27,00	$ 2.181.519,00
9.3	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$150.727,00	$ 150.727,00	0,00	$ -	1,00	$150.727,00	100%	1,00	$ 150.727,00
9.4	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1,00	$405.300,00	$ 405.300,00	0,00	$ -	1,00	$405.300,00	100%	1,00	$ 405.300,00
9.5	LUMINARIA LED 25W	UND	20,00	$97.400,00	$ 1.948.000,00	0,00	$ -	20,00	$1.948.000,00	100%	20,00	$ 1.948.000,00
				Sub Total	**$ 6.365.486,00**				**$ 6.365.486,00**			**$ 6.365.486,00**
10	**PISOS BASES**											
10.1	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM	M2	204,48	$102.320,00	$ 20.922.394,00	-18,60	-$ 1.903.152,00	185,88	$19.018.809,00	100%	185,88	$ 19.018.809,00
				Sub Total	**$ 20.922.394,00**	**Sub Total**	**-$ 1.903.152,00**		**$ 19.018.809,00**			**$ 19.018.809,00**
11	**PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**											
11.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	75,70	$ 95.777,00	$ 7.250.319,00	8,30	$ 794.949,10	84,00	$ 8.045.268,00	100%	84,00	$ 8.045.268,00
11.2	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO, DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5INCLUYE ALISTADO.	M2	160,84	$ 203.410,00	$ 32.716.464,00	-21,21	-$ 4.314.326,10	139,63	$ 28.402.138,00	100%	139,63	$ 28.402.138,00
11.3	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UND	4,00	$ 170.839,00	$ 683.356,00	0,00	$ -	4,00	$ 683.356,00	100%	4,00	$ 683.356,00
11.4	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	129,62	$108.856,00	$ 14.109.915,00	-0,09	-$ 9.797,04	129,53	$ 14.100.118,00	100%	129,53	$ 14.100.118,00
				Sub Total	**$ 54.760.054,00**	**Sub Total**	**-$ 3.529.174,04**		**$ 51.230.880,00**			**$ 51.230.880,00**
12	**CIELO RASO**											
12.1	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	129,11	$ 93.544,00	$ 12.077.466,00	0,00	$ -	129,11	$ 12.077.466,00	100%	129,11	$ 12.077.466,00

				Sub Total	$ 12.077.466,00				$ 12.077.466,00			$	12.077.466,00
13	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
13.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	30,66	$ 46.550,00	$ 1.427.223,00	-1,16	-$	53.998,00	29,50	$ 1.373.225,00	100%	29,50	$ 1.373.225,00
13.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	20,45	$ 96.500,00	$ 1.973.425,00	-19,45	-$	1.876.925,00	1,00	$ 96.500,00	100%	1,00	$ 96.500,00
				Sub Total	$ 3.400.648,00	Sub Total		-$ 1.930.923,00		$ 1.469.725,00			$ 1.469.725,00
14	APARATOS SANITARIOS												
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	4,00	$ 469.371,00	$ 1.877.484,00	0,00	$	-	4,00	$ 1.877.484,00	100%	4,00	$ 1.877.484,00
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	5,00	$ 369.371,00	$ 1.846.855,00	0,00	$	-	5,00	$ 1.391.855,00	100%	5,00	$ 1.391.855,00
				Sub Total	$ 3.724.339,00					$ 3.269.339,00			$ 3.269.339,00
15	PINTURAS					0,00	$	-					
15.1	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	60,00	$ 22.008,00	$ 1.320.480,00	0,00	$	-	60,03	$ 1.321.140	100%	60,03	$ 1.321.140
15.2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	134,28	$ 27.932,00	$ 3.750.709,00	0,00	$	-	134,28	$ 3.750.709	100%	134,28	$ 3.750.709
15.3	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	ML	65,14	$ 12.572,00	$ 818.940,00	0,00	$	-	66,00	$ 829.752	100%	66,00	$ 829.752
15.4	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	416,39	$ 39.722,00	$ 16.539.844,00	-67,71	-$	2.689.576,62	348,68	$ 13.850.267	100%	348,68	$ 13.850.267
				Sub Total	$ 22.429.973,00	Sub Total		-$ 2.689.576,62		$ 19.751.984	100%		$ 19.751.984
	ITEM NUEVOS												
16	CONCRETO												
16.1	ESTRUCTURA EN CONCRETO COLMUNAS 20 X 15 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND		$ 523.000,00	$,00	8,00	$	4.184.000,00	8,00	$ 4.184.000,00	100%	8,00	$ 4.184.000
16.2	ESTRUCTURA EN CONCRETO VIGUETAS DE CONFINAMIENTO 0.15 x 0.25, 4D= 1/2" + FLEJES 1/4"A 15 CM C/U	UND		$ 281.000,00	$,00	18,00	$	5.058.000,00	18,00	$ 5.058.000,00	100%	18,00	$ 5.058.000
16.3	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI 0.50 X 0.50, P 0.60 - INC ACERO	UND		$ 412.000,00	$,00	8,00	$	3.296.000,00	8,00	$ 3.296.000,00	100%	8,00	$ 3.296.000
16.4	PLACA BASE PARA TANQUE ELEVADO CONCRETO 0.08 2500 PSI, INCLUYE LAMINA METAL D Y ACERO	M2		$ 51.500,00	$,00	8,00	$	412.000,00	3,00	$ 154.500,00	100%	3,00	$ 154.500
				Sub Total		Sub Total		$ 12.950.000,00	Sub Total	$ 12.692.500,00			$ 12.692.500
17	MESONES												
17.1	PLACA BASE CONCRETO 2500 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM	M2		$102.320,00	$ 0,00	4,5	$	460.440,00	3,92	$ 401.094,00	100%	3,92	$ 401.094,00
17.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2		$ 95.777,00	$ 0,00	13,89	$	1.329.863,65	13,62	$ 1.304.447,00	100%	13,62	$ 1.304.447,00
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UND		$ 278.371,00	$ 0,00	1	$	278.371,00	1	$ 278.371,00	100%	1	$ 278.371,00
17.4	REMATE BOCEL ALUMINIO	ML		$ 13.000,00	$ 0,00	5,6	$	72.800,00	5,6	$ 72.800,00	100%	5,6	$ 72.800,00
				Sub Total	$ 0,00	Sub Total		$ 2.141.474,65	Sub Total	$ 2.056.712,00		Sub Total	$ 2.056.712,00
18	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS										100%	219	$ -
18.2	CONEXIÓN ALCANTARILLADO PUBLICO TUBO CORRUGADO 4" X 6 ML	ML		$ 150.000,00	$ 0	12	$	1.800.000,00	12	$ 1.800.000,00	100%	12,00	$ 1.800.000,00
				Sub Total		Sub Total		$ 1.800.000,00	Sub Total	$ 1.800.000,00		Sub Total	$ 1.800.000,00

COSTOS DIRECTOS TOTALES		226.848.089,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA		226.848.089,00
ADMINISTRACIÓN	26%	58.980.503,00
IMPREVISTOS	1%	2.268.481,00
UTILIDADES	5%	11.342.404,00
TOTAL DE OBRA		299.439.477,00

Total Presupuesto inicial		299.439.477,00

COSTOS DIRECTOS TOTALES		235.593.609,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA		235.593.609,00
ADMINISTRACIÓN	21,10%	49.710.252,00
IMPREVISTOS	1%	2.355.936,00
UTILIDADES	5%	11.779.680,00
TOTAL DE OBRA		299.439.477,00

Total Presupuesto modificado	299.439.477,00

EJECUTADO		235.593.609,00
		235.593.609,00
		49.710.252,00
		2.355.936,00
		11.779.680,00
		299.439.477,00

EJECUTADO	299.439.477,00

VALOR CONTRATO: Doscientos noventa y nueve millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete pesos m/cte ($299.439.477,00).

Dra. ANGIE LORENA GARCA OME.
Supervisor ESE ARSENIO REPIZO VANEGAS

Ing. MANUEL ALEJANDRO MANZANO DIAZ
Interventor

ARQ. FREDDY ESNEIDER SALAS MEDINA
Contratista de Obra

ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTIN - HUILA

OBJETO:	**ADECUACIONES MENORES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS ALTO NARANJOS Y ALTO DEL OBISPO DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA.**					**ACTAS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 NIT: 9 0 2 0 0 3 5 5 8 -3	**CTO DE OBRA**	**PLAZO (DIAS)**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR TOTAL OBRA**	**FECHA DEL CONTRATO**	**18/11/2025**
INTERVENTOR:	MANUEL ALEJANDRO MANZANO DIAZ		60	$ 299.439.477,00		**ACTA INICIO**	**21/11/2025**
SUPERVISOR:	Dra. ANGIE LORENA GASCA OME		**ADICIONAL**	**ADICIONAL**		**ACTA PARCIAL 1**	**19/12/2025**
PUESTO DE SALUD	**ALTO DEL OBISPO**	**547 DE 2025**	30,00	-	**$ 299.439.477,00**	**ACTA PARCIAL 2**	**26/01/2026**
ACTA FINAL PUESTO DE SALUD ALTO DEL OBISPO			**PLAZO TOTAL (DIAS)**	**VALOS ESTUDIOS Y DISEÑOS**		**OTRO SI**	**30/12/2025**
			90			**OTRO SI**	**10/02/2026**
						HOJA	1 DE 2


		CONDICIONES MOFIFICADAS OTRO SI				**ACTA ANTERIOR (1 -2)**		**PRESENTE ACTA 3**		**CONDICIONES EJECUTADAS**		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**% EJECUCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	ADECUACIONES PUESTO DE SALUD VEREDA DE ALTO DEL OBISPO											
1.	**PRELIMINARES**											
1.1	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	14,17	$ 27.480,00	$ 389.392,00	0,00	$ -	14,17	$ 389.392,00	100%	14,17	$ 389.392,00
1.2	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	162,76	$ 31.780,00	$ 5.172.513,00	162,76	$ 5.172.512,80	0,00	$,00	100%	162,76	$ 5.172.512,80
1.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 57.321,00	$ 57.321,00	0,00	$ -	1,00	$ 57.321,00		1,00	$ 57.321,00
1.4	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	49,63	$ 26.112,00	$ 1.295.939,00	49,63	$ 1.295.938,56	0,00	$,00	100%	49,63	$ 1.295.939,00
1.5	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	141,90	$ 33.438,00	$ 4.744.852,00	141,90	$ 4.744.852,20	0,00	$,00	100%	141,90	$ 4.744.852,20
1.6	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UND	7,00	$ 66.875,00	$ 468.125,00	7,00	$ 468.125,00	0,00	$,00	100%	7,00	$ 468.125,00
1.7	DESMONTE DE VENTANAS	UND	6,00	$ 28.661,00	$ 171.966,00	6,00	$ 171.966,00	0,00	$,00	100%	6,00	$ 171.966,00
				Sub Total	**$ 12.300.108,00**		**$ 11.853.394,56**		**$ 446.713,00**			**$ 12.300.108,00**
2.	**DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**											
2.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80	UND	3,00	$608.377,00	$ 1.825.131,00	3,00	$ 1.825.131,00	0,00	$0,00	100%	3,00	$ 1.825.131,00
				Sub Total	**$ 1.825.131,00**		**$ 1.825.131,00**		**$,00**			**$ 1.825.131,00**
3	**MAMPOSTERIA**											
3.1	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M	M2	125,03	$61.659,00	$ 7.709.225,00	119,77	$ 7.384.898,43	5,26	$324.326,34	100%	125,03	$7.709.225,00
				Sub Total	**$ 7.709.225,00**		**$ 7.384.898,43**		**$ 324.326,34**			**$7.709.225,00**
4	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**											
4.1	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	4,80	$ 22.195,00	$ 106.536,00	4,80	$ 106.536,00	0,00	$,00	100%	4,80	$ 106.536,00
4.2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	142,00	$32.064,00	$ 4.553.088,00	142,00	$ 4.553.088,00	0,00	$0,00	100%	142,00	$ 4.553.088,00
				Sub Total	**$ 4.659.624,00**		$ 4.659.624,00		**$,00**			**$ 4.659.624,00**
5	**CUBIERTAS**											
5.1	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	12,00	$47.554,00	$ 570.648,00	12,00	$ 570.648,00	0,00	$,00	100%	12,00	$ 570.648,00
5.2	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	10,64	$ 79.289,00	$ 843.635,00	10,64	$ 843.634,96	0,00	$,00	100%	10,64	$ 843.634,96
5.3	CANAL PVC AMAZONAS	ML	20,18	$ 70.118,00	$ 1.414.981,00	20,18	$ 1.414.981,24	0,00	$,00	100%	20,18	$ 1.414.981,24
5.4	TEJA TERMOACÚSTICA UPVC 2.5 MM	M2	173,07	$163.430,00	$ 28.284.830,00	173,07	$ 28.284.830,10	0,00	$,00	100%	173,07	$ 28.284.830,10
5.5	TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100X50, 2 MM PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA.	ML	200,00	$109.996,00	$ 21.999.200,00	200,00	$ 21.999.200,00	0,00	$0,00	100%	200,00	$ 21.999.200,00
				Sub Total	**$ 53.113.294,00**		**$ 53.113.294,30**		**$,00**			**$ 53.113.294,00**
6	**VIDRIOS**											
6.1	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 mm	M2	11,94	$89.375,00	$ 1.067.138,00	0,00	$ -	11,94	$1.067.137,50	100%	11,94	$ 1.067.138,00
				Sub Total	**$ 1.067.138,00**				**$ 1.067.137,50**			**$ 1.067.138,00**
7	**CARPINTERÍA METÁLICA**											
7.1	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8	UND	11,00	$288.698,00	$ 3.175.678,00	11,00	$ 3.175.678,00	0,00	$0,00	100%	11,00	$ 3.175.678,00
7.2	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	20,88	$380.507,00	$ 7.944.986,00	20,88	$ 7.944.986,16	0,00	$0,00	100%	20,88	$ 7.944.986,16
7.3	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	11,94	$254.803,00	$ 3.042.348,00	11,94	$ 3.042.347,82	0,00	$0,00	100%	11,94	$ 3.042.347,82
				Sub Total	**$ 14.163.012,00**		**$ 14.163.011,98**		**$,00**			$ 14.163.012,00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**											
8.1	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UND	1,00	$ 304.905,00	$ 304.905,00	1,00	$ 304.905,00	0,00	$,00	100%	1,00	$ 304.905,00
8.2	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	15,00	$ 88.212,00	$ 1.323.180,00	15,00	$ 1.323.180,00	0,00	$,00	100%	15,00	$ 1.323.180,00
8.3	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	11,00	$ 137.505,00	$ 1.512.555,00	11,00	$ 1.512.555,00	0,00	$,00	100%	11,00	$ 1.512.555,00
8.4	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	4,00	$ 146.475,00	$ 585.900,00	4,00	$ 585.900,00	0,00	$,00	100%	4,00	$ 585.900,00
8.5	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	75,00	$ 22.910,00	$ 1.718.250,00	75,00	$ 1.718.250,00	0,00	$,00	100%	75,00	$ 1.718.250,00
8.6	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	39,00	$ 53.142,00	$ 2.072.538,00	39,00	$ 2.072.538,00	0,00	$,00	100%	39,00	$ 2.072.538,00
8.7	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	27,00	$72.727,00	$ 1.963.629,00	27,00	$ 1.963.629,00	0,00	$,00	100%	27,00	$ 1.963.629,00
8.8	REGISTRO 1/2"	UND	4,00	$125.918,00	$ 503.672,00	4,00	$ 503.672,00	0,00	$,00	100%	4,00	$ 503.672,00
8.9	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESSORIOS E INSTALACIÓN).	UND	1,00	$1.038.547,00	$ 1.038.547,00	1,00	$ 1.038.547,00	0,00	$,00	100%	1,00	$ 1.038.547,00
				Sub Total	**$ 11.023.176,00**		**$ 11.023.176,00**		**$,00**			**$ 11.023.176,00**
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					0,00	$ -					
9.1	SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	20,00	$83.997,00	$ 1.679.940,00	20,00	$ 1.679.940,00	0,00	$0,00	100%	20,00	$ 1.679.940,00
9.2	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	27,00	$80.797,00	$ 2.181.519,00	27,00	$ 2.181.519,00	0,00	$0,00	100%	27,00	$ 2.181.519,00
9.3	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UND	1,00	$150.727,00	$ 150.727,00	1,00	$ 150.727,00	0,00	$0,00	100%	1,00	$ 150.727,00
9.4	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1,00	$405.300,00	$ 405.300,00	1,00	$ 405.300,00	0,00	$0,00	100%	1,00	$ 405.300,00
9.5	LUMINARIA LED 25W	UND	20,00	$97.400,00	$ 1.948.000,00	20,00	$ 1.948.000,00	0,00	$0,00	100%	20,00	$ 1.948.000,00
				Sub Total	**$ 6.365.486,00**		**$ 6.365.486,00**		**$,00**			**$ 6.365.486,00**
10	**PISOS BASES**											
10.1	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM	M2	185,88	$102.320,00	$19.018.809,00	167,89	$ 17.178.504,80	17,99	$1.840.304,20	100%	185,88	$ 19.018.809,00
				Sub Total	**$ 19.018.809,00**		**$ 17.178.504,80**		**$ 1.840.304,20**			**$ 19.018.809,00**
11	**PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**											
11.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	84,00	$ 95.777,00	$ 8.045.268,00	0,00	$ -	84,00	$ 8.045.268,00	100%	84,00	$ 8.045.268,00
11.2	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO, DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5INCLUYE ALISTADO.	M2	139,63	$ 203.410,00	$ 28.402.138,00	90,63	$ 18.435.048,30	49,00	$ 9.967.090,00	100%	139,63	$ 28.402.138,30
11.3	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UND	4,00	$ 170.839,00	$ 683.356,00	0,00	$ -	4,00	$ 683.356,00	100%	4,00	$ 683.356,00
11.4	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	129,53	$108.856,00	$ 14.100.118,00	0,00	$ -	129,53	$ 14.100.117,68	100%	129,53	$ 14.100.117,68
				Sub Total	**$ 51.230.880,00**		$ 18.435.048,30		**$ 32.795.831,68**			**$ 51.230.880,00**
12	**CIELO RASO**											

12.1	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	129,11	$ 93.544,00	$ 12.077.466,00	49,00	$ 4.583.656,00	80,11	$ 7.493.809,84	100%	129,11	$ 12.077.465,84
				Sub Total	**$ 12.077.466,00**		**$ 4.583.656,00**		**$ 7.493.809,84**			**$ 12.077.466,00**
13	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
13.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29,50	$ 46.550,00	$ 1.373.225,00	29,50	$ 1.373.225,00	0,00	$,00	100%	29,50	$ 1.373.225,00
13.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1,00	$ 96.500,00	$ 96.500,00	1,00	$ 96.500,00	0,00	$,00	100%	1,00	$ 96.500,00
				Sub Total	**$ 1.469.725,00**		**$ 1.469.725,00**		**$,00**			**$ 1.469.725,00**
14	**APARATOS SANITARIOS**											
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	4,00	$ 469.371,00	$ 1.877.484,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.877.484,00	100%	4,00	$ 1.877.484,00
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	5,00	$ 278.371,00	$ 1.391.855,00	0,00	$ -	5,00	$ 1.391.855,00	100%	5,00	$ 1.391.855,00
				Sub Total	**$ 3.269.339,00**				**$ 3.269.339,00**			**$ 3.269.339,00**
15	**PINTURAS**					0,00	$ -					
15.1	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	60,03	$ 22.008,00	$ 1.321.140,00	60,03	$ 1.321.140,24	0,00	$	100%	60,03	$ 1.321.140,24
15.2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	134,28	$ 27.932,00	$ 3.750.709,00	124,84	$ 3.487.030,88	9,44	$ 263.678	100%	134,28	$ 3.750.708,96
15.3	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	ML	66,00	$ 12.572,00	$ 829.752,00	62,88	$ 790.527,36	3,12	$ 39.225	100%	66,00	$ 829.752,00
15.4	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	348,68	$ 39.722,00	$ 13.850.267,00	0,00	$ -	348,68	$ 13.850.267	100%	348,68	$ 13.850.266,96
				Sub Total	**$ 19.751.984**		**$ 5.598.698,48**		**$ 14.153.286**			**$ 19.751.984,00**
					ITEM NUEVOS							
16	**CONCRETO**											
16.1	ESTRUCTURA EN CONCRETO COLMUNAS 20 X 15 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	8,00	$ 523.000,00	$ 4.184.000,00	8,00	$ 4.184.000,00	0,00	$,00	100%	8,00	$ 4.184.000,00
16.2	ESTRUCTURA EN CONCRETO VIGUETAS DE CONFINAMIENTO 0.15 x 0.25, 4D= 1/2" + FLEJES 1/4"A 15 CM C/U	UND	18,00	$ 281.000,00	$ 5.058.000,00	18,00	$ 5.058.000,00	0,00	$,00	100%	18,00	$ 5.058.000,00
16.3	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI 0.50 X 0.50, P 0.60 - INC ACERO	UND	8,00	$ 412.000,00	$ 3.296.000,00	8,00	$ 3.296.000,00	0,00	$,00	100%	8,00	$ 3.296.000,00
16.4	PLACA BASE PARA TANQUE ELEVADO CONCRETO 0.08 2500 PSI, INCLUYE LAMINA METAL D Y ACERO	M2	3,00	$ 51.500,00	$ 154.500,00	3,00	$ 154.500,00	0,00	$,00	100%	3,00	$ 154.500,00
				Sub Total	**$ 12.692.500**		**$ 12.692.500,00**					**$ 12.692.500,00**
17	**MESONES**											
17.1	PLACA BASE CONCRETO 2500 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM	M2	3,92	$102.320,00	$ 401.094,00	0,00	$ -	3,92	$ 401.094,40	100%	3,92	$ 401.094,40
17.2	BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	13,62	$ 95.777,00	$ 1.304.483,00	0,00	$ -	13,62	$ 1.304.482,74	100%	13,62	$ 1.304.482,74
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	1	$ 278.371,00	$ 278.371,00	0,00	$ -	1,00	$ 278.371,00	100%	1,00	$ 278.371,00
17.4	REMATE BOCEL ALUMINIO	ML	5,6	$ 13.000,00	$ 72.800,00	0,00	$ -	5,60	$ 72.800,00	100%	5,60	$ 72.800,00
				Sub Total	**$ 2.056.712**		$ -		**$ 2.056.712**			**$ 2.056.712,00**
18	**DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**											$ -
18.2	CONEXIÓN ALCANTARILLADO PUBLICO TUBO CORRUGADO 4" X 6 ML	ML	12,00	$ 150.000,00	$ 1.800.000	12,00	$ 1.800.000	0,00	$,00	100%	12,00	$ 1.800.000,00
			$,00	**Sub Total**	**$ 1.800.000**		**$ 1.800.000**		$,00			$ 1.800.000,00

COSTOS DIRECTOS TOTALES		235.593.609,00	172.146.116,60	63.447.459,08	235.593.609,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA		235.593.609,00	172.146.116,60	63.447.459,08	235.593.609,00
ADMINISTRACIÓN	21,1%	49.710.252,00	44.757.990,32	4.952.261,68	49.710.252,00
IMPREVISTOS	1%	2.355.936,00	1.721.461,17	634.474,83	2.355.936,00
UTILIDADES	5%	11.779.680,00	8.607.305,83	3.172.374,17	11.779.680,00
TOTAL DE OBRA		299.439.477,00	227.232.873,91	72.206.603,09	299.439.477,00

Total Proyecto	**299.439.477,00**	**total Ejecutado**	**299.439.477,00**

VALOR CONTRATO: Doscientos noventa y nueve millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete pesos m/cte ($299.439.477,00).



Dra. ANGIE LORENA GARCA OME.
Supervisor ESE ARSENIO REPIZO VANEGAS



Ing. MANUEL ALEJANDRO MANZANO DIAZ
Interventor



ARQ. FREDDY ESNEIDER SALAS MEDINA
Contratista de Obra

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2d12392344478c824e682eff4f80d344b496ada8d9d12939c4f0827ac2973151326fce8954a30634017d460c43aae9b1

Número de Factura: FE-5
Fecha de Emisión: 04/03/2026
Fecha de Vencimiento: 04/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
Nombre Comercial: CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
Nit del Emisor: 902003558
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7111

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Timaná
Dirección: CR 9 5 69 BRR PRIMAVERA
Teléfono / Móvil: 3219636335
Correo: fesalasarq@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180113
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: San Agustín
Dirección: Calle 3 2 51
Teléfono / Móvil: 3133769596
Correo: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	004	Acta parcial 03 adecuaciones menores del puesto de salud de la vereda alto del obispo segun contrato 547 de 2025	NIU	1,00	$ 72.206.603,09	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.206.603,09

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/03/2026 11:45:06
Documento validado por la DIAN:
04/03/2026 11:45:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	72206603.09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	72206603.09
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	72206603.09
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 72206603.09

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	72.206.603,09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	72.206.603,09
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	72.206.603,09
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 72.206.603,09

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102799702 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-12-09

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025** i dentificada con el número de documento **9020035583** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 09 de diciembre de 2025 con la Cuenta de Ahorros 370-827586 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **10 de febrero de 2026.**

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PERSONAS JURIDICAS.

San Agustín - Huila, 04 de marzo de 2026

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

CONSORCIO SAN AGUSTÍN 2025
902003558-3

ha realizado oportunamente los pagos correspondientes a Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, conforme a lo establecido en la normatividad vigente y en cumplimiento de los requisitos contractuales de los CONTRATOS DE OBRA NO. 546 Y 547 de 2025, suscritos con la E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS de San Agustín, Huila, correspondientes al período comprendido entre el mes de 21 noviembre de 2025 y el mes de febrero de 2026; en el marco de la ejecución del objeto contractual relacionado con la adecuación menor de los puestos de salud de las veredas puerto Quinchana, Alto Naranjo y Alto del Obispo, pertenecientes a la red de servicios de la E.S.E. en el municipio de San Agustín, departamento del Huila.

Realizando aportes de la siguiente manera:

1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PLANILLA TIPO Y			
1. No. de la planilla	**Ingreso Base de Cotización (40%)**	**Tipo de Aportes**	**Valor**
35764645 Noviembre	$ 3.938.350	Salud	$ 493.900,00
		Pensión	$ 632.200,00
		ARL	$ 41.600,00
36128739 Diciembre	$ 14.235.000	Salud	$ 1.791.000,00
		Pensión	$ 2.292.000,00
		ARL	$ 150.000,00
36315391 Enero	$ 17.509.050	Salud	$ 2.189.000,00
		Pensión	$ 2.802.000,00
		ARL	$ 183.000

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025 CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PLANILLA TIPO E			
1. No. de la planilla	**Ingreso Base de Cotización (40%)**	**Tipo de Aportes**	**Valor**
36451840 Noviembre	$ 996.450	Salud	$ 130.200,00
		Pensión	$ 166.400,00
		ARL	$ 11.000,00
		CAJA	$ 41.600,00
		SENA	$ 21.000,00
		ICBF	$ 31.300,00
36451875 Diciembre	$ 4.275.000	Salud	$ 545.700,00
		Pensión	$ 698.400,00
		ARL	$ 45.700,00
		CAJA	$ 174.800,00
		SENA	$ 87.400,00
		ICBF	$ 131.300,00
36451902 Enero 2026	$ 5.252.715	Salud	$ 659.700,00
		Pensión	$ 844.400,00
		ARL	$ 55.200,00
		CAJA	$ 211.300,00
		SENA	$ 105.800,00
		ICBF	$158.600,00

En constancia firman:

FREDDY ESNEIDER SALAS MEDINA
Cc 1080938543
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

ANDRES FELIPE OME PEREZ
C.C:1.083.898.860
T.P:246726-T
CONTADOR PUBLICO

CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
IDENTIFICACIÓN:	NI-902003558
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	002
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	NOMINA
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-15
FECHA DE PAGO:	2026-03-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	36575248
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36575248
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 41.600	$ 43.700
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 41.600	$ 43.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 53.200	$ 55.900
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 53.200	$ 55.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 3.500	$ 3.700
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 3.500	$ 3.700
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 13.300	$ 14.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 13.300	$ 14.000
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 6.700	$ 7.100
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 10.000	$ 10.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 6.600	$ 128.300	$ 134.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2026

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
IDENTIFICACIÓN:	NI-902003558
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	002
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	NOMINA
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-15
FECHA DE PAGO:	2026-02-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	36451840
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36451840
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 41.600	$ 43.400
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 41.600	$ 43.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 41.600	$ 43.400
Subtotal Salud		3	3	$ 0	$ 0	$ 5.400	$ 124.800	$ 130.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 53.200	$ 55.500
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 4.500	$ 106.400	$ 110.900
Subtotal Pensión		2	3	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 159.600	$ 166.400
14-23	860011153	POSITIVA	3	$ 0	$ 0	$ 500	$ 10.500	$ 11.000
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 500	$ 10.500	$ 11.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 39.900	$ 41.600
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 39.900	$ 41.600
PASENA	899999034	SENA	3	$ 0	$ 0	$ 900	$ 20.100	$ 21.000
PAICBF	899999239	ICBF	3	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 30.000	$ 31.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 16.600	$ 384.900	$ 401.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
IDENTIFICACIÓN:	NI-902003558
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	002
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	NOMINA
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-16
FECHA DE PAGO:	2026-02-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36451875
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36451875
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 178.000	$ 181.900
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 178.000	$ 181.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 178.000	$ 181.900
Subtotal Salud		3	3	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 534.000	$ 545.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 227.800	$ 232.800
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 10.000	$ 455.600	$ 465.600
Subtotal Pensión		2	3	$ 0	$ 0	$ 15.000	$ 683.400	$ 698.400
14-23	860011153	POSITIVA	3	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 44.700	$ 45.700
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 44.700	$ 45.700
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 171.000	$ 174.800
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 171.000	$ 174.800
PASENA	899999034	SENA	3	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 85.500	$ 87.400
PAICBF	899999239	ICBF	3	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 128.400	$ 131.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 36.300	$ 1.647.000	$ 1.683.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/02/2026

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
IDENTIFICACIÓN:	NI-902003558
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	002
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	NOMINA
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-16
FECHA DE PAGO:	2026-03-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36575371
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36575371
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 178.000	$ 183.300
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 178.000	$ 183.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 227.800	$ 234.600
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 227.800	$ 234.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 14.900	$ 15.400
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 14.900	$ 15.400
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 57.000	$ 58.700
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 57.000	$ 58.700
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 28.500	$ 29.400
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 42.800	$ 44.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 16.500	$ 549.000	$ 565.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/02/2026

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
IDENTIFICACIÓN:	NI-902003558
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	002
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	NOMINA
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-13
FECHA DE PAGO:	2026-03-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36579313
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36579313
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 218.900	$ 221.600
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 218.900	$ 221.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 280.200	$ 283.600
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 280.200	$ 283.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 18.300	$ 18.600
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 18.300	$ 18.600
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 70.100	$ 71.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 70.100	$ 71.000
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 35.100	$ 35.600
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 52.600	$ 53.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 8.500	$ 675.200	$ 683.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/03/2026

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
IDENTIFICACIÓN:	NI-902003558
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	002
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	NOMINA
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-13
FECHA DE PAGO:	2026-02-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36451902
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36451902
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 218.900	$ 219.900
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 218.900	$ 219.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 218.900	$ 219.900
Subtotal Salud		3	3	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 656.700	$ 659.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 280.200	$ 281.500
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 560.400	$ 562.900
Subtotal Pensión		2	3	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 840.600	$ 844.400
14-23	860011153	POSITIVA	3	$ 0	$ 0	$ 300	$ 54.900	$ 55.200
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 300	$ 54.900	$ 55.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 210.300	$ 211.300
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 210.300	$ 211.300
PASENA	899999034	SENA	3	$ 0	$ 0	$ 500	$ 105.300	$ 105.800
PAICBF	899999239	ICBF	3	$ 0	$ 0	$ 800	$ 157.800	$ 158.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 2.025.600	$ 2.035.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/03/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
IDENTIFICACIÓN:	NI-902003558
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	002
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	NOMINA
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-13
FECHA DE PAGO:	2026-03-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36599544
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36599544
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.000	$ 146.000
Subtotal Salud		4	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 802.700	$ 802.700
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.000	$ 467.000
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 560.400
Subtotal Pensión		2	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.027.400	$ 1.027.400
14-23	860011153	POSITIVA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.100	$ 67.100
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.100	$ 67.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.000	$ 257.000
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.000	$ 257.000
PASENA	899999034	SENA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.700	$ 128.700
PAICBF	899999239	ICBF	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.900	$ 192.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.475.800	$ 2.475.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/04/2026

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
IDENTIFICACIÓN:	NI-902003558
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-15
FECHA DE PAGO:	2025-12-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35764645
TOTAL COTIZANTES:	10
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35764645
TIPO DE PLANILLA:	Y

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 1.138.800	$ 0	$ 0	$ 300	$ 142.600	$ 142.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 1.186.250	$ 0	$ 0	$ 300	$ 148.500	$ 148.800
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 474.500	$ 0	$ 0	$ 200	$ 59.400	$ 59.600
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	$ 1.138.800	$ 0	$ 0	$ 300	$ 142.600	$ 142.900
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 1.138.800	$ 0	$ 0	$ 400	$ 182.400	$ 182.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 200	$ 60.800	$ 61.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	$ 2.419.950	$ 0	$ 0	$ 800	$ 387.600	$ 388.400
14-23	860011153	POSITIVA	10	$ 3.938.350	$ 0	$ 0	$ 100	$ 41.500	$ 41.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 1.165.400	$ 1.168.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
IDENTIFICACIÓN:	NI-902003558
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-16
FECHA DE PAGO:	2026-03-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	36467454
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36467454
TIPO DE PLANILLA:	Y

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 1.518.400	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 189.800	$ 195.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 759.200	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 94.900	$ 97.700
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	$ 1.518.400	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 189.800	$ 195.400
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 1.518.400	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 243.000	$ 250.200
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 1.518.400	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 243.000	$ 250.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 759.200	$ 0	$ 0	$ 3.600	$ 121.500	$ 125.100
14-23	860011153	POSITIVA	5	$ 3.796.000	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 40.000	$ 41.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 33.200	$ 1.122.000	$ 1.155.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/02/2026

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
IDENTIFICACIÓN:	NI-902003558
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-16
FECHA DE PAGO:	2026-01-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	36128739
TOTAL COTIZANTES:	10
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36128739
TIPO DE PLANILLA:	Y

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 4.270.500	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 534.000	$ 537.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 4.270.500	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 534.000	$ 537.300
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 178.000	$ 179.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	$ 4.270.500	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 534.000	$ 537.300
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 5.694.000	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 911.200	$ 916.800
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 2.847.000	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 455.600	$ 458.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 5.694.000	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 911.200	$ 916.800
14-23	860011153	POSITIVA	10	$ 14.235.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 149.000	$ 150.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 4.207.000	$ 4.233.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/02/2026

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
IDENTIFICACIÓN:	NI-902003558
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-13
FECHA DE PAGO:	2026-02-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36315391
TOTAL COTIZANTES:	10
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36315391
TIPO DE PLANILLA:	Y

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 5.252.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 656.700	$ 656.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 5.252.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 656.700	$ 656.700
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	$ 5.252.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 656.700	$ 656.700
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 7.003.620	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.800	$ 1.120.800
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 3.501.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 560.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 7.003.620	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.800	$ 1.120.800
14-23	860011153	POSITIVA	10	$ 17.509.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.000	$ 183.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.174.000	$ 5.174.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/03/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
IDENTIFICACIÓN:	NI-902003558
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-13
FECHA DE PAGO:	2026-03-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36467600
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36467600
TIPO DE PLANILLA:	Y

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 3.501.810	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 437.800	$ 443.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 218.900	$ 221.600
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	$ 3.501.810	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 437.800	$ 443.100
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 3.501.810	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 560.400	$ 567.200
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 3.501.810	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 560.400	$ 567.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 280.200	$ 283.600
14-23	860011153	POSITIVA	5	$ 8.754.525	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 91.500	$ 92.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 31.500	$ 2.587.000	$ 2.618.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/03/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO SAN AGUSTIN 2025
IDENTIFICACIÓN:	NI-902003558
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-13
FECHA DE PAGO:	2026-03-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36467833
TOTAL COTIZANTES:	12
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36467833
TIPO DE PLANILLA:	Y

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	5	$ 7.003.620	$ 0	$ 0	$ 0	$ 875.800	$ 875.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 2.918.175	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.900	$ 364.900
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 1.167.270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.000	$ 146.000
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	4	$ 5.836.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 729.800	$ 729.800
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 3.501.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 560.400
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 5.836.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 934.000	$ 934.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.167.270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.800	$ 186.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	$ 6.419.985	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.027.400	$ 1.027.400
14-23	860011153	POSITIVA	12	$ 16.925.415	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.900	$ 176.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.002.000	$ 5.002.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/04/2026
