DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-6	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5

Villavicencio, 02/03/2026

Doctor(a):
ANDREA CAROLINA LIZCANO NOGUERA
Secretaria de Gobierno y Seguridad
Gobernación del Meta

INFORME DE SUPERVISIÓN

Objetivo del Informe
Mantener informada a la Gobernación del Meta sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

Contrato No. y Fecha:	2209 del 21/10/2025		
Clase de Contrato:	Suministro		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	12080 del 22/10/2025		
Contratista:	MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA S.A.S	Nit./c.c.	900.714.956-5
Representante Legal:	FABIAN GUZMAN SOTO	c.c.	86.079.311
Supervisor: (Insertar filas cuando en el periodo de pago se presenten varios supervisores)	CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS	c.c	86.070.495
	MARIA LISBETH LOPEZ PARRA	c.c.	1.121.835.665
Acto administrativo de designación supervisor: No. y Fecha	Resolución 289 de 2025 del 23/10/2025		
Objeto:			
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN CCTV, Y MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO Y CONTROL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	**TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($3.914.269.800,00) M/CTE.**		
Término Inicial de Ejecución:	UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	27/10/2025	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	16/12/2025

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios, Reducciones y Otras)			
Tipo de Modificación	**Valor de la Modificación** (Cuando Aplique)	**Fecha de expedición del documento**	**Tiempo de Modificación** (Cuando Aplique)

ACTA MODIFICATORIA No.01	N/A	26/11/2025	
ACTA DE PRORROGA No.01	N/A	10/12/2025	14 días
ACTA DE SUSPENSIÓN No.01	N/A	24/12/2025	30 días
ACTA DE REINICIO No. 01	N/A	23/01/2026	
ACTA DE PRORROGA No.02	N/A	29/01/2026	2 meses.
*Si no existen modificaciones diligencie casillas con N/A **Inserte filas si requiere			

Término Total de Ejecución: (Solo cuando existan modificaciones)	CUATRO (04) MESES Y CUATRO (04) DÍAS	**Fecha Finalización:** (Solo cuando existan modificaciones)	28/03/2026
Valor total del contrato +/- las modificaciones: (Solo cuando existan modificaciones) (Letras y Números)	**TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($3.914.269.800,00) M/CTE.**		
*Si no existen modificaciones diligencie casillas con N/A			

Periodo de Pago:	Del	17/12/2025		Al	23/02/2026			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial	X	Final		No. de Pago	2

Valor Total Autorizado a Pagar (Letras y números Máximo 2 Decimales)	**OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($898.985.700) M/CTE**

Se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así para dar cumplimiento al Decreto No. 075 de 2021 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Departamento del Meta, me permito informar el desarrollo correspondiente al presente periodo de pago en los siguientes aspectos:

Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	Si	No	N/A
Registro Presupuestal	X		
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la Ley	X		
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)		X	
Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales ARL			X
Publicaciones en Secop	X		
Publicaciones en SIA Observa	X		
Carpeta física actualizada en la Gerencia de Asuntos Contractuales	X		

Ejecución de las actividades en cumplimiento de las obligaciones específicas en el periodo del informe:

<table>
<tr><th>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA</th><th>DESARROLLO</th></tr>
<tr><td>1. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico de conformidad a lo solicitado.</td><td>Se evidencia, de acuerdo con el informe presentado por el contratista correspondiente al período comprendido entre el 17 de diciembre del 2025 al 23 de febrero de 2026, y conforme al plan de trabajo y cronograma aprobado del Anexo 01, que se dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de las fichas técnicas, las cuales fueron aprobadas por esta supervisión mediante acta junto con fichas técnicas aportados por el contratista en su informe, identificados como Anexos 02.</td></tr>
<tr><td>2. El contratista realizará la adquisición, instalación y configuración de los dispositivos según fichas técnicas y protocolos establecidos en estudios previos, anexo técnico de cada entidad beneficiaria y propuesta económica presentada.</td><td>Se evidencia, de acuerdo con el informe presentado por el contratista correspondiente al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 y el 23 de feb de 2026, que a la fecha del presente corte el contratista presenta los siguientes ítems correspondientes a los municipios de El Calvario y San Juanito así:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td></td><td>COMPONENTE CCTV MUNICIPIO EL CALVARIO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Punto de Cámara</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Suministro e Instalación Switch para Cámaras en gabinete de 4 puertos</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Suministro e Instalación Cámara Fija Tipo 1 (Seguridad Instalaciones Estación de Policía)</td><td>UNID</td><td>5</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Suministro e Instalación Equipo de Transmisión y Recepción de Microondas</td><td>UNID</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>Sala de Control</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>Suministro e Instalación Software de visualización, control y administración</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Suministro e Instalación Joystick de Operación</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Suministro e Instalación Computador Workstation</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Suministro e Instalación Impresora Multifuncional</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Suministro e Instalación Monitor de visualización 80"</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Suministro e Instalación Are acondicionado 12000 Btu</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Suministro e Instalación Puntos de cableado estructurado</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Puntos de energía eléctrica normal</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Puntos de energía eléctrica regulada</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Sistema puesta a tierra (para todos los elementos)</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Suministro e Instalación Módulos - Puesto de trabajo</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Suministro e Instalación Sistema de detección de incendios, estación manual, extintor, luz estroboscópica y control de acceso.</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Suministro e Instalación Control de acceso facial</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>26</td><td>Suministro e Instalación Sistema de Apertura</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>27</td><td>Adaptación centro de monitoreo y cuarto de equipos</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>Cuarto de Equipos</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td>Suministro e Instalación Sistema de Almacenamiento</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>29</td><td>Suministro e Instalación Switch 24 Puertos</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>30</td><td>Suministro e Instalación Gabinete Equipos Cuarto de Equipos</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>31</td><td>Suministro e Instalación Ups 6 Kva</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>COMPONENTE CCTV MUNICIPIO SAN JUANITO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Punto de Cámara</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Suministro e Instalación Switch para Cámaras en gabinete de 4 puertos</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Suministro e Instalación Cámara Fija Tipo 1 (Seguridad Instalaciones Estación de Policía)</td><td>UNID</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td>Sala de Control</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Suministro e Instalación Software de visualización, control y administración</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Suministro e Instalación Joystick de Operación</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Suministro e Instalación Computador Workstation</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Suministro e Instalación Impresora Multifuncional</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Suministro e Instalación Monitor de visualización 80"</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Suministro e Instalación Are acondicionado 12000 Btu</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Suministro e Instalación Puntos de cableado estructurado</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Puntos de energía eléctrica normal</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Puntos de energía eléctrica regulada</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Sistema puesta a tierra (para todos los elementos)</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Suministro e Instalación Módulos - Puesto de trabajo</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Suministro e Instalación Sistema de detección de incendios, estación manual, extintor, luz estroboscópica y control de acceso.</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Suministro e Instalación Control de acceso facial</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Suministro e Instalación Sistema de Apertura</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>26</td><td>Adaptación centro de monitoreo y cuarto de equipos</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>Cuarto de Equipos</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td>Suministro e Instalación Sistema de Almacenamiento</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>28</td><td>Suministro e Instalación Switch 24 Puertos</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>29</td><td>Suministro e Instalación Gabinete Equipos Cuarto de Equipos</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
<tr><td>30</td><td>Suministro e Instalación Ups 6 Kva</td><td>UNID</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	DESARROLLO
	Se realizó la adquisición de los elementos anteriores y se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas, lo cual se validó mediante acta del **Anexo 03** del informe del contratista. Posteriormente se realiza la verificación de la instalación de los elementos en sitio conforme al **Anexo 04** del informe presentado por el contratista. En consecuencia, la supervisión valida el cumplimiento de lo establecido.
3. El contratista realizará todas las instalaciones y debidas adecuaciones bajo las normas establecidas para dicha puesta en marcha.	Se evidencia, de acuerdo con el informe presentado por el contratista correspondiente al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 y el 23 de febrero de 2026, que el contratista dio cumplimiento al **Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)**, conforme a la Resolución 40117 del 2 de abril de 2024, a la Norma Técnica Colombiana NTC 2050, segunda actualización de 2020, y a las demás normas aplicables, lo cual se valida mediante el **Anexo 05** del informe del contratista.
4. El contratista deberá entregar actualización de la carta de empalme del circuito cerrado de videovigilancia en medio digital.	Las cartas de empalme de la fibra óptica instalada en los municipios de El Calvario y San Juanito se relacionan a continuación: Carta de fusión del tendido de fibra óptica CCTV del municipio de San Juanito – Meta. Carta de fusión del tendido de fibra óptica CCTV del municipio de El Calvario – Meta. Dichos documentos fueron entregados y validados en **el Informe No. 01.** Se encuentra pendiente la entrega de la carta de empalme correspondiente al municipio de Villavicencio, toda vez que su ejecución aún se encuentra en curso y no ha finalizado en su totalidad.
5. El contratista deberá realizar todas las fusiones requeridas para el correcto flujo de información a través de la red de fibra óptica instalada.	El contratista realizó el tendido de fibra óptica en los municipios de El Calvario (más de 1.500 metros) y San Juanito (más de 2.000 metros). Para su instalación se emplearon los respectivos accesorios, tales como herrajes de retención, herrajes de suspensión, domos de empalme y cajas terminales de fibra óptica para los puntos de cámara. Así mismo, se efectuaron las correspondientes fusiones en los domos de empalme y en las cajas terminales de fibra óptica, con el fin de garantizar la correcta comunicación del sistema CCTV instalado, lo cual fue validado en el **Informe No. 01.** Se encuentran pendientes las fusiones de la fibra óptica en el municipio de Villavicencio, toda vez que su ejecución aún se encuentra en curso y no ha finalizado en su totalidad.
6. El contratista deberá realizar una capacitación durante la ejecución	Las capacitaciones se brindarán luego de que todos los ítems de cada uno de los municipios y/o componentes estén finalizados,

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	DESARROLLO
contractual dirigida al personal técnico encargado del monitoreo en relación con la operación del software de administración de monitoreo de las cámaras de seguridad, dicha capacitación se realizará en fecha concertada con el supervisor del contrato.	teniendo en cuenta que cada solución corresponde a un sistema integral.
7. Todos los equipos deben quedar instalados, configurados, programados y operando correctamente, garantizando la visualización (monitoreo), almacenamiento y administración del vídeo de las cámaras de seguridad en el Centro de Monitoreo de cada una de las entidades beneficiarias, lo cual deberá acreditar a través de registro fotográfico.	Se evidencia que en el presente periodo se presentan los ítems finalizados, instalados, con sus configuraciones iniciales y operación local desconectados, que se evidencia el informe del contratista numeral **5. "ITEMS FINALIZADOS PARA CORTE PARCIAL".** Las pruebas de monitoreo, almacenamiento y administración, se realizarán al final todos los ítems de cada municipio y/o componente, teniendo en cuenta que se tratan de sistemas integrales.
8. El contratista deberá entregar a través de un informe en medio digital, un inventario pormenorizado y georreferenciado de cada uno de los puntos de visualización a fin de ser entregado al personal de cada uno de los beneficiarios y copia del inventario general que reposará en la Secretaría de Gobierno y Seguridad del Departamento.	Se evidencia, de acuerdo con el informe presentado por el contratista correspondiente al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 y el 23 de febrero de 2026, que el contratista entrega la matriz de control de adquisiciones de los equipos a cobrar en el presente corte, en la cual se detallan los elementos, marcas, modelos o referencias, puntos de instalación y estado. Lo anterior se valida en el **Anexo 03** del informe del contratista.
9- Entregar un archivo digital KMZ actualizado del sistema CCTV de cada una de las entidades beneficiarias del sistema de videovigilancia debidamente instalado en este contrato.	Se hizo entrega de los archivos KMZ actualizados, como resultado de las visitas técnicas realizadas en cada uno de los municipios Calvario y San Juanito, con el acompañamiento de las partes interesadas del proyecto, lo cual fue presentado en el Informe No. 01. Para el municipio de Villavicencio, se entrega el archivo KMZ actualizado en el presente informe, teniendo en cuenta que se realizaron ajustes derivados de concesiones viales y proyecciones de infraestructura vial, que implicó la reubicación estratégica de los puntos LPR y de los puntos correspondientes al estadio, con el fin de optimizar la cobertura. Dichos cambios fueron concertados con la Policía Nacional. Se valida en el **Anexo 06** del informe del contratista.
10. El contratista deberá entregar en formato digital los planos del sistema, acompañado del registro fotográfico de la arquitectura tecnológica del CCTV.	Durante el primer periodo reportado en el informe parcial No.1 se anexó la documentación de ingeniería de diseño inicial para los municipios y/o componentes a entregar por el proyecto. Durante el presente periodo, el contratista presenta archivo comprimido con toda la documentación de ingeniería: Formatos Site Survey; Planos; Diagramas; Esquemas; Renders, etc., con las

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	DESARROLLO
	actualizaciones a la fecha Se entregan los planos actualizados de la arquitectura tecnológica del CCTV, Se validan en el **Anexo 07** del informe del contratista.
11. El contratista debe llevar a cabo con debido cuidado y diligencia todos los trabajos que realice, en las estaciones, oficinas y recintos técnicos. Además, deberá entregar los lugares limpios, libres de desechos o fungibles, así como de elementos auxiliares utilizados en la instalación, que puedan entorpecer la circulación de personas o implique un riesgo de accidente, garantizando así la utilización correcta de las señales de trabajo y permisos que requieran para la intervención.	Se evidencia, de acuerdo con el informe presentado por el contratista correspondiente al período comprendido, entre el 17 de diciembre de 2025 y el 23 de febrero de 2025, la empresa MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA SAS, llevó a cabo todos los respectivos trabajos con cuidado y diligencia, tanto en las oficinas de la Policía Nacional visitadas y/o intervenidas como en los sitios en calle definidos para los puntos de cámara. Luego de las intervenciones realizadas se realiza aseo, recolección de materiales sobrantes, recolección y separación de residuos, organización de herramienta y equipo de trabajo, así como de los elementos de seguridad utilizados durante las respectivas actividades.
12. El contratista deberá dar cumplimiento a los factores de ponderación ofrecidos, los cuales se acreditarán en la ejecución contractual.	De acuerdo a lo requerido en el pliego de condiciones del proceso **GCSJ-LP-013-2025,** los factores de ponderación ofrecidos que aplican para el periodo de ejecución actual, como la promoción del empleo local, con el uso del personal mínimo requerido ofrecido con residencia local (DIRECTOR DEL PROYECTO; RESIDENTE DEL PROYECTO; INGENIERO DE APOYO; TÉCNICO DE APOYO; TÉCNICO DEL PROYECTO; COORDINADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) y capacitación adicional requerida, personal adicional local, así como los servicios del CONSULTOR DE SEGURIDAD ofrecido quien se encuentra vinculado al contrato siguen manteniéndose en el desarrollo del contrato y para este periodo.
13. El contratista deberá entregar a cada una de las entidades beneficiarias los correspondientes soportes de garantías directas de los fabricantes de los equipos (en los casos que aplique).	Los certificados y/o soportes de garantía directa con fábrica de los equipos instalados serán entregados una vez finalice la implementación total en cada municipio y/o componente, teniendo en cuenta que se trata de un sistema integrado y que aún se encuentran equipos pendientes por suministrar e instalar.
14. Suscribir las actas y demás documentos requeridos para dar ingreso de los elementos a adquirir de manera oportuna al Almacén Departamental, cumpliendo cabalmente con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico	Se evidencia, de acuerdo con el informe presentado por el contratista correspondiente al período comprendido, entre el 17 de diciembre de 2025 y el 23 de febrero de 2026, se realizó el proceso para el ingreso y salida de los elementos adquiridos y entregados instalados en sitio, para los Municipios de San Juanito y El Calvario, junto con la documentación requerida por el almacén departamental del Meta y los procedimientos definidos por la Gobernación del Meta. Lo anterior se valida en el ***ANEXO N°08 – RESOLUCIÓN ENTREGA DE ELEMENTOS ALMACEN DPTAL DEL META.pdf***
15. Las demás que resulten de la	El contratista realizó diferentes reuniones con la supervisión y los

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	DESARROLLO
descripción técnica establecida.	diferentes actores interesados y participantes en el proyecto. Se anexan las actas de reunión llevadas a cabo durante el presente periodo (ver ***ANEXO N°09 – ACTAS DE REUNIÓN PERIODO PARCIAL 01.pdf***). Por otro lado, dadas las dificultades ya mencionadas en los municipios de El Calvario y San Juanito, y algunos inconvenientes con trámites de permisos de intervención las vías concesionadas aledañas a la ciudad de Villavicencio, impactadas directamente por el proyecto, lo cual afectó el cronograma de actividades, hizo necesario realizar la solicitud de suspensión al contrato 2209 de 2025, solicitud aprobada por la supervisión y finalmente formalizada mediante acta de suspensión No. 01 del 24 de diciembre de 2025. el cual se encuentra anexo el informe del contratista como ***ANEXO N°10 – ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 Y DOCUMENTACIÓN.pdf***). Una vez superados los inconvenientes mencionados en la solicitud de suspensión del dia 24 de diciembre del año 2025 se procede con la solicitud de reinicio del contrato la cual queda aprobada por la supervisión en el acta de reinicio No.1 del 23 de enero de 2026, el cual se encuentra anexo el informe del contratista como ***ANEXO N°11 – ACTA DE REINÍCIO No. 01.pdf*** Una vez reiniciado el contrato se realiza solicitud a la supervisión de una ampliación en tiempo derivada de demoras en la cadena logística de adquisición y nacionalización de ciertos equipos principales para la correcta ejecución del contrato la cual es aprobada por la supervisión y finalmente formalizada mediante acta de prórroga No.2. el cual se encuentra anexo el informe del contratista como ***ANEXO N°12 – ACTA DE PRORROGA No.2.pdf*** De conformidad, con las modificaciones al contrato realizadas durante el presente periodo, se realizan las actualizaciones a las garantías del contrato.

Conforme a lo anterior descrito y de acuerdo al cronograma de trabajo aprobado por esta supervisión, se relaciona el seguimiento realizado a la fecha del presente informe, así:

PRESUPUESTO DE CANTIDADES DE PROPUESTA ECONÓMICA				PESOS PORCENTUALES							FECHA CORTE:		23-feb-26		AVANCE (%)		57,16%	$2.237.205.600,00
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL COMPONENTE	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN ALMACEN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINAL	TOTAL	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN ALMACEN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINAL	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN COMPONENTE	ACUMULADO TOTAL POR PESO PORCENTUAL FINANCIERO	ACUMULADO EJECUCIÓN FINANCIERA
1	COMPONENTE CCTV MUNICIPIO EL CALVARIO			24,83%													23,27%	$ 911.016.900,00
	PUNTO DE CÁMARA			13,60%													13,60%	$ 532.198.000,00
1.1	Suministro e Instalación Poste Tipo 3	UNID	8,00	1,51%	20%	40%	30%		10%	100%	8	8	8		8	100,00%	1,51%	$ 59.280.000,00
1.2	Suministro e Instalación Gabinete de poste	UNID	8,00	1,11%	20%	40%	30%		10%	100%	8	8	8		8	100,00%	1,11%	$ 43.440.000,00
1.3	Suministro e Instalación Switch para Cámaras en gabinete de 4 puertos	UNID	8,00	0,85%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	8	8	8	8	8	100,00%	0,85%	$ 33.200.000,00
1.4	Suministro e Instalación UPS 1,5 Kva (Cámara)	UNID	8,00	0,84%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	8	8	8	8	8	100,00%	0,84%	$ 32.984.000,00
1.5	Suministro e Instalación Brazo Soporte para Cámaras	UNID	8,00	0,15%	20%	40%	30%		10%	100%	8	8	8		8	100,00%	0,15%	$ 5.760.000,00
1.6	Suministro e Instalación Cámara Domo PTZ Tipo 2	UNID	8,00	3,55%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	8	8	8	8	8	100,00%	3,55%	$ 138.800.000,00
1.7	Suministro e Instalación Cámara Fija Tipo 1 (Seguridad Instalaciones Estación de Policía)	UNID	5,00	0,58%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	5	5	5	5	5	100,00%	0,58%	$ 22.650.000,00
1.8	Suministro e Instalación Corona antiescalatoria	UNID	8,00	0,12%	20%	40%	30%		10%	100%	8	8	8		8	100,00%	0,12%	$ 4.784.000,00
1.9	Suministro e Instalación Fibra óptica Monomodo	ML	1.500,00	1,49%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1500	1500	1500	1500	1500	100,00%	1,49%	$ 58.500.000,00
1.10	Suministro e Instalación Sistema puesta a tierra Punto de cámara	UNID	8,00	0,66%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	8	8	8	8	8	100,00%	0,66%	$ 25.840.000,00
1.11	Suministro e Instalación Canalización eléctrica de cámara	UNID	8,00	1,22%	20%	40%	30%		10%	100%	8	8	8		8	100,00%	1,22%	$ 47.760.000,00
1.12	Suministro e Instalación Equipo de Transmisión y Recepción de Microondas	UNID	2,00	1,51%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	2	2	2	2	2	100,00%	1,51%	$ 59.200.000,00
	SALA DE CONTROL			6,88%													6,88%	$ 269.451.370,00
1.13	Suministro e Instalación Software de visualización, control y administración	UNID	1,00	0,33%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00%	0,33%	$ 12.725.370,00
1.14	Suministro e Instalación Joystick de Operación	UNID	1,00	0,28%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00%	0,28%	$ 11.000.000,00
1.15	Suministro e Instalación Computador Workstation	UNID	1,00	1,07%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00%	1,07%	$ 42.000.000,00
1.16	Suministro e Instalación Impresora Multifuncional	UNID	1,00	0,23%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00%	0,23%	$ 8.950.000,00
1.17	Suministro e Instalación Monitor de visualización 80"	UNID	1,00	0,99%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00%	0,99%	$ 38.900.000,00

PRESUPUESTO DE CANTIDADES DE PROPUESTA ECONÓMICA				PESOS PORCENTUALES							FECHA CORTE:		23-feb-26		AVANCE (%)		57,16%	$2.237.205.600,00
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL COMPONENTE	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN ALMACEN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINAL	TOTAL	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN ALMACEN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINAL	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN COMPONENTE	ACUMULADO TOTAL POR PESO PORCENTUAL FINANCIERO	ACUMULADO EJECUCIÓN FINANCIERA
1.18	Suministro e Instalación Aire acondicionado 12000 Btu	UNID	1,00	0,08%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	0,08%	$ 3.200.000,00
1.19	Suministro e Instalación Puntos de cableado estructurado	UNID	8,00	0,39%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	8	8	8	8	8	100,00 %	0,39%	$ 15.440.000,00
1.20	Puntos de energía eléctrica normal	UNID	8,00	0,30%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	8	8	8	8	8	100,00 %	0,30%	$ 11.632.000,00
1.21	Puntos de energía eléctrica regulada	UNID	8,00	0,30%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	8	8	8	8	8	100,00 %	0,30%	$ 11.712.000,00
1.22	Sistema puesta a tierra (para todos los elementos)	UNID	1,00	0,06%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	0,06%	$ 2.342.000,00
1.23	Suministro e Instalación Módulos - Puesto de trabajo	UNID	1,00	0,11%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	1	1	1		1	100,00 %	0,11%	$ 4.150.000,00
1.24	Suministro e Instalación Sistema de detección de incendios, estación manual, extintor, luz estroboscópica y control de acceso.	UNID	1,00	1,08%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	1,08%	$ 42.300.000,00
1.25	Suministro e Instalación Control de acceso facial	UNID	1,00	0,18%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	0,18%	$ 6.900.000,00
1.26	Suministro e Instalación Sistema de Apertura	UNID	1,00	0,10%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	0,10%	$ 3.900.000,00
1.27	Adaptación centro de monitoreo y cuarto de equipos	UNID	1,00	1,39%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	1	1	1		1	100,00 %	1,39%	$ 54.300.000,00
	CUARTO DE EQUIPOS			4,35%													2,79%	$ 109.367.530,00
1.28	Suministro e Instalación Sistema de Almacenamiento	UND	1,00	1,24%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	1,24%	$ 48.600.000,00
1.29	Suministro e Instalación Switch 24 Puertos	UND	1,00	0,24%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	0,24%	$ 9.347.530,00
1.30	Suministro e Instalación Gabinete Equipos Cuarto de Equipos	UND	1,00	0,59%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	1	1	1		1	100,00 %	0,59%	$ 23.000.000,00
1.31	Suministro e Instalación UPS 6 Kva	UND	1,00	0,34%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	0,34%	$ 13.200.000,00
1.32	Suministro e Instalación Planta Eléctrica 15 kva	UND	1,00	1,94%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1					20,00 %	0,39%	$ 15.220.000,00
2	COMPONENTE CCTV MUNICIPIO SAN JUANITO			23,84%													21,42%	$ 838.604.800,00
	PUNTO DE CÁMARA			12,58%													12,58%	$ 492.498.000,00
2.1	Suministro e Instalación Poste Tipo 3	UNID	8,00	1,51%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	8	8	8		8	100,00 %	1,51%	$ 59.280.000,00
2.2	Suministro e Instalación Gabinete de poste	UNID	8,00	1,11%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	8	8	8		8	100,00 %	1,11%	$ 43.440.000,00
2.3	Suministro e Instalación Switch para Cámaras en gabinete de 4 puertos	UNID	8,00	0,85%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	8	8	8	8	8	100,00 %	0,85%	$ 33.200.000,00

PRESUPUESTO DE CANTIDADES DE PROPUESTA ECONÓMICA				PESOS PORCENTUALES							FECHA CORTE:		23-feb-26		AVANCE (%)		57,16%	$2.237.205.600,00
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL COMPONENTE	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN ALMACEN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINAL	TOTAL	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN ALMACEN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINAL	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN COMPONENTE	ACUMULADO TOTAL POR PESO PORCENTUAL FINANCIERO	ACUMULADO EJECUCIÓN FINANCIERA
2.4	Suministro e Instalación UPS 1,5 Kva (Cámara)	UNID	8,00	0,84%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	8	8	8	8	8	100,00 %	0,84%	$ 32.984.000,00
2.5	Suministro e Instalación Brazo Soporte para Cámaras	UNID	8,00	0,15%	20%	40%	30%	[redacted]	10%	100%	8	8	8	[redacted]	8	100,00 %	0,15%	$ 5.760.000,00
2.6	Suministro e Instalación Cámara Domo PTZ Tipo 2	UNID	8,00	3,55%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	8	8	8	8	8	100,00 %	3,55%	$ 138.800.000,00
2.7	Suministro e Instalación Cámara Fija Tipo 1 (Seguridad Instalaciones Estación de Policía)	UNID	5,00	0,58%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	5	5	5	5	5	100,00 %	0,58%	$ 22.650.000,00
2.8	Suministro e Instalación Corona antiescalatoria	UNID	8,00	0,12%	20%	40%	30%	[redacted]	10%	100%	8	8	8	[redacted]	8	100,00 %	0,12%	$ 4.784.000,00
2.9	Suministro e Instalación Fibra óptica Monomodo	ML	2.000,00	1,99%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	2000	2000	2000	2000	2000	100,00 %	1,99%	$ 78.000.000,00
2.10	Suministro e Instalación Sistema puesta a tierra Punto de cámara	UNID	8,00	0,66%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	8	8	8	8	8	100,00 %	0,66%	$ 25.840.000,00
2.11	Suministro e Instalación Canalización eléctrica de cámara	UNID	8,00	1,22%	20%	40%	30%	[redacted]	10%	100%	8	8	8	[redacted]	8	100,00 %	1,22%	$ 47.760.000,00
	SALA DE CONTROL			6,91%													6,05%	$ 236.739.300,00
2.12	Suministro e Instalación Software de visualización, control y administración	UNID	1,00	0,33%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	0,33%	$ 12.725.300,00
2.13	Suministro e Instalación Joystick de Operación	UNID	1,00	0,28%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	0,28%	$ 11.000.000,00
2.14	Suministro e Instalación Computador Workstation	UNID	1,00	1,07%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1					20,00 %	0,21%	$ 8.400.000,00
2.15	Suministro e Instalación Impresora Multifuncional	UNID	1,00	0,23%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	0,23%	$ 8.950.000,00
2.16	Suministro e Instalación Monitor de visualización 80"	UNID	1,00	0,99%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	0,99%	$ 38.900.000,00
2.17	Suministro e Instalación Aire acondicionado 12000 Btu	UNID	1,00	0,08%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	0,08%	$ 3.200.000,00
2.18	Suministro e Instalación Puntos de cableado estructurado	UNID	8,00	0,39%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	8	8	8	8	8	100,00 %	0,39%	$ 15.440.000,00
2.19	Puntos de energía eléctrica normal	UNID	8,00	0,30%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	8	8	8	8	8	100,00 %	0,30%	$ 11.632.000,00
2.20	Puntos de energía eléctrica regulada	UNID	8,00	0,30%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	8	8	8	8	8	100,00 %	0,30%	$ 11.712.000,00
2.21	Sistema puesta a tierra (para todos los elementos)	UNID	1,00	0,08%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	0,08%	$ 3.230.000,00

PRESUPUESTO DE CANTIDADES DE PROPUESTA ECONÓMICA				PESOS PORCENTUALES							FECHA CORTE:		23-feb-26		AVANCE (%)		57,16%	$2.237.205.600,00
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL COMPONENTE	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN ALMACEN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINAL	TOTAL	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN ALMACEN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINAL	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN COMPONENTE	ACUMULADO TOTAL POR PESO PORCENTUAL FINANCIERO	ACUMULADO EJECUCIÓN FINANCIERA
2.22	Suministro e Instalación Módulos - Puesto de trabajo	UNID	1,00	0,11%	20%	40%	30%	[redacted]	10%	100%	1	1	1	[redacted]	1	100,00 %	0,11%	$ 4.150.000,00
2.23	Suministro e Instalación Sistema de detección de incendios, estación manual, extintor, luz estroboscópica y control de acceso.	UNID	1,00	1,08%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	1,08%	$ 42.300.000,00
2.24	Suministro e Instalación Control de acceso facial	UNID	1,00	0,18%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	0,18%	$ 6.900.000,00
2.25	Suministro e Instalación Sistema de Apertura	UNID	1,00	0,10%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	0,10%	$ 3.900.000,00
2.26	Adaptación centro de monitoreo y cuarto de equipos	UNID	1,00	1,39%	20%	40%	30%	[redacted]	10%	100%	1	1	1	[redacted]	1	100,00 %	1,39%	$ 54.300.000,00
	CUARTO DE EQUIPOS			4,35%													2,79%	$ 109.367.500,00
2.27	Suministro e Instalación Sistema de Almacenamiento	UND	1,00	1,24%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	1,24%	$ 48.600.000,00
2.28	Suministro e Instalación Switch 24 Puertos	UND	1,00	0,24%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	0,24%	$ 9.347.500,00
2.29	Suministro e Instalación Gabinete Equipos Cuarto de Equipos	UND	1,00	0,59%	20%	40%	30%	[redacted]	10%	100%	1	1	1	[redacted]	1	100,00 %	0,59%	$ 23.000.000,00
2.30	Suministro e Instalación UPS 6 Kva	UND	1,00	0,34%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1	1	1	1	100,00 %	0,34%	$ 13.200.000,00
2.31	Suministro e Instalación Planta Eléctrica 15 kva	UND	1,00	1,94%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1					20,00 %	0,39%	$ 15.220.000,00
3	COMPONENTE CCTV MUNICIPIO VILLAVICENCIO ESTADIO			25,81%													6,11%	$ 239.160.360,00
	PUNTO DE CÁMARA			8,22%													2,48%	$ 97.014.760,00
3.1	Suministro e instalación postes tipo 2	UNID	4,00	1,04%	20%	40%	30%	[redacted]	10%	100%	4			[redacted]		20,00 %	0,21%	$ 8.120.000,00
3.2	Suministro e instalación gabinetes de poste/fachada	UNID	5,00	0,63%	20%	40%	30%	[redacted]	10%	100%	5			[redacted]		20,00 %	0,13%	$ 4.970.000,00
3.3	Suministro e instalación switch para cámaras en gabinete (4 puertos base t)	UNID	4,00	0,42%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	4					20,00 %	0,08%	$ 3.320.000,00
3.4	Suministro e instalación switch para cámaras en gabinete (8 puertos base t)	UNID	1,00	0,16%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1					20,00 %	0,03%	$ 1.284.000,00
3.5	Suministro e instalación UPS 2 kva (para cámara)	UNID	4,00	0,33%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	4	4				60,00 %	0,20%	$ 7.800.000,00
3.6	Suministro e instalación UPS 3kva para cámaras para el cai	UNID	1,00	0,12%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1				60,00 %	0,07%	$ 2.803.320,00
3.7	Suministro e instalación UPS 10kva trifasica	UNID	1,00	0,65%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1	1				60,00 %	0,39%	$ 15.180.000,00

PRESUPUESTO DE CANTIDADES DE PROPUESTA ECONÓMICA				PESOS PORCENTUALES							FECHA CORTE:		23-feb-26		AVANCE (%)		57,16%	$2.237.205.600,00
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL COMPONENTE	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN ALMACEN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINAL	TOTAL	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN ALMACEN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINAL	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN COMPONENTE	ACUMULADO TOTAL POR PESO PORCENTUAL FINANCIERO	ACUMULADO EJECUCIÓN FINANCIERA
3.8	Suministro e instalación brazos de soporte para cámaras coronas	UNID	4,00	0,07%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	4					20,00 %	0,01%	$ 576.000,00
3.9	Suministro e instalación cámaras domo PTZ. tipo 2.	UNID	4,00	1,58%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	4					20,00 %	0,32%	$ 12.360.000,00
3.10	Suministro e instalación cámara fija tipo 1	UNID	12,00	1,09%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	12					20,00 %	0,22%	$ 8.568.480,00
3.11	Suministro e instalación coronas antiescalatorias	UNID	4,00	0,06%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	4					20,00 %	0,01%	$ 478.400,00
3.12	Suministro e instalación fibra óptica monomodo	ML	1.136,00	0,99%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1136	1136				60,00 %	0,59%	$ 23.242.560,00
3.13	Suministro e instalación sistemas de puesta a tierra	UNID	5,00	0,30%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	5					20,00 %	0,06%	$ 2.342.000,00
3.14	Suministro e instalación canalización eléctrica de cámaras y nodos	UNID	5,00	0,76%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	5					20,00 %	0,15%	$ 5.970.000,00
	CENTRO DE CONTROL Y MANDO - CCM			7,00%													1,51%	$ 59.238.400,00
3.15	Suministro e instalación monitor de visualización para videowall	UNID	4,00	2,48%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	4					20,00 %	0,50%	$ 19.448.000,00
3.16	Suministro e instalación software de visualización, control y administración	UNID	1,00	0,31%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1					20,00 %	0,06%	$ 2.400.000,00
3.17	Suministro e instalación joystick de operación	UNID	2,00	0,56%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	2	1				40,00 %	0,22%	$ 8.800.000,00
3.18	Suministro e instalación computador workstation	UNID	2,00	2,15%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	2					20,00 %	0,43%	$ 16.800.000,00
3.19	Suministro e instalación computador all in one	UNID	4,00	0,44%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	4					20,00 %	0,09%	$ 3.440.000,00
3.20	Suministro e instalación monitor operador cctv	UNID	1,00	0,04%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1					20,00 %	0,01%	$ 306.000,00
3.21	Suministro e instalación aire acondicionado 36.000 btu	UNID	1,00	0,26%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1					20,00 %	0,05%	$ 2.000.000,00
3.22	Suministro e instalación puntos de cableado estructurado	UNID	2,00	0,09%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	2					20,00 %	0,02%	$ 720.000,00
3.23	Suministro e instalación puntos de energía eléctrica normal	UNID	4,00	0,15%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	4					20,00 %	0,03%	$ 1.163.200,00
3.24	Suministro e instalación puntos de energía eléctrica regulada	UNID	4,00	0,15%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	4					20,00 %	0,03%	$ 1.171.200,00
3.25	Suministro e instalación módulos - puestos de trabajo	UNID	1,00	0,11%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	1					20,00 %	0,02%	$ 830.000,00
3.26	Suministro e instalación sistema de apertura	UNID	1,00	0,10%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1					20,00 %	0,02%	$ 780.000,00

PRESUPUESTO DE CANTIDADES DE PROPUESTA ECONÓMICA				PESOS PORCENTUALES							FECHA CORTE:		23-feb-26		AVANCE (%)		57,16%	$2.237.205.600,00
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL COMPONENTE	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN ALMACEN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINAL	TOTAL	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN ALMACEN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINAL	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN COMPONENTE	ACUMULADO TOTAL POR PESO PORCENTUAL FINANCIERO	ACUMULADO EJECUCIÓN FINANCIERA
3.27	Suministro e instalación lector de acceso facial a la sala de control	UNID	1,00	0,18%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1					20,00 %	0,04%	$ 1.380.000,00
					2,81%												0,56%	$ 22.000.000,00
3.28	Suministro e instalación punto de visualización entidad territorial tipo 1 (CAI popular)	UND	1,00	1,92%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1					20,00 %	0,38%	$ 15.000.000,00
3.29	Suministro e instalación kit seguridad CAI's y/o estaciones de policía	UND	1,00	0,89%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1					20,00 %	0,18%	$ 7.000.000,00
	SOLUCIÓN DE ANALÍTICAS Y RECONOCIMIENTO FACIAL			7,78%													1,56%	$ 60.907.200,00
3.28	Suministro e instalación software de analítica avanzada (comportamental)	UND	16,00	0,41%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	16					20,00 %	0,08%	$ 3.187.200,00
3.29	Suministro e instalación licenciamiento de reconocimiento facial	UND	12,00	0,98%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	12					20,00 %	0,20%	$ 7.680.000,00
3.30	Suministro e instalación licenciamiento base de datos 50,000 sujetos para reconocimiento facial	UND	1,00	2,35%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1					20,00 %	0,47%	$ 18.400.000,00
3.30	Suministro e instalación servidor para reconocimiento facial	UND	1,00	3,43%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1					20,00 %	0,69%	$ 26.840.000,00
3.31	Suministro e instalación software de gestion centralizada para procesamiento e integracion de millones de rostros	UND	1,00	0,61%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1					20,00 %	0,12%	$ 4.800.000,00
4	COMPONENTE PROYECTO LPR VILLAVICENCIO			25,52%													6,35%	$ 248.423.540,00
	PUNTO DE CÁMARA			11,99%													3,64%	$ 142.525.540,00
4.1	Suministro e instalación cámara fija para reconocimiento de placas – LPR en borde	UND	12,00	2,67%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	12					20,00 %	0,53%	$ 20.880.000,00
4.2	Suministro e instalación postes tipo 1 e instalación	UND	7,00	1,24%	20%	40%	30%		10%	100%	7					20,00 %	0,25%	$ 9.702.000,00
4.3	Suministro e instalación gabinetes de poste/fachada	UND	7,00	0,89%	20%	40%	30%		10%	100%	7					20,00 %	0,18%	$ 6.958.000,00
4.4	Suministro e instalación cámaras domo PTZ. tipo 2.	UND	6,00	2,37%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	6					20,00 %	0,47%	$ 18.540.000,00
4.5	Suministro e instalación UPS 2kva kva para cámaras	UND	7,00	0,58%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	7	7				60,00 %	0,35%	$ 13.650.000,00

PRESUPUESTO DE CANTIDADES DE PROPUESTA ECONÓMICA				PESOS PORCENTUALES							FECHA CORTE:		23-feb-26		AVANCE (%)		57,16%	$2.237.205.600,00
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL COMPONENTE	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN ALMACEN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINAL	TOTAL	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN ALMACEN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINAL	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN COMPONENTE	ACUMULADO TOTAL POR PESO PORCENTUAL FINANCIERO	ACUMULADO EJECUCIÓN FINANCIERA
4.6	Suministro e instalación brazos de soporte para cámaras coronas	UND	7,00	0,13%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	7					20,00 %	0,03%	$ 1.008.000,00
4.7	Suministro e instalación coronas antiescalatorias	UND	7,00	0,11%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	7					20,00 %	0,02%	$ 837.200,00
4.8	Suministro e instalación fibra óptica monomodo	ML	2.899,00	2,53%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	2899	2899				60,00 %	1,52%	$ 59.313.540,00
4.9	Suministro e instalación sistemas de puesta a tierra	UND	7,00	0,42%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	7					20,00 %	0,08%	$ 3.278.800,00
4.10	Suministro e instalación canalización eléctrica de cámaras y nodos	UND	7,00	1,07%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	7					20,00 %	0,21%	$ 8.358.000,00
	CENTRO DE CONTROL Y MANDO - CCM			7,15%													1,43%	$ 55.968.000,00
4.11	Suministro e instalación switch para cámaras en gabinete (4 puertos base t)	UND	7,00	0,74%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	7					20,00 %	0,15%	$ 5.810.000,00
4.12	Suministro e instalación monitor de visualización para videowall	UND	4,00	2,48%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	4					20,00 %	0,50%	$ 19.448.000,00
4.13	Suministro e instalación joystick de operación	UND	2,00	0,56%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	2					20,00 %	0,11%	$ 4.400.000,00
4.14	Suministro e instalación computador workstation	UND	2,00	2,15%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	2					20,00 %	0,43%	$ 16.800.000,00
4.15	Suministro e instalación computador all in one	UND	4,00	0,44%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	4					20,00 %	0,09%	$ 3.440.000,00
4.16	Suministro e instalación monitor operador cctv (opcional para equipos all in one)	UND	4,00	0,14%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	4					20,00 %	0,03%	$ 1.080.000,00
4.17	Suministro e instalación aire acondicionado 36.000 btu	UND	1,00	0,26%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	1					20,00 %	0,05%	$ 2.000.000,00
4.18	Suministro e instalación módulos - puestos de trabajo	UND	1,00	0,11%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1					20,00 %	0,02%	$ 830.000,00
4.19	Suministro e instalación sistema de apertura	UND	1,00	0,10%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1					20,00 %	0,02%	$ 780.000,00
4.20	Suministro e instalación lector de acceso facial a la sala de control	UND	1,00	0,18%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	1					20,00 %	0,04%	$ 1.380.000,00
	SOLUCIÓN DE ANALÍTICAS Y RECONOCIMIENTO FACIAL			6,38%													1,28%	$ 49.930.000,00
4.21	Suministro e instalación solución lpr en borde	UND	12,00	2,10%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	12					20,00 %	0,42%	$ 16.440.000,00
4.22	Suministro e instalación servidor lpr	UND	1,00	3,43%	20%	40%	20%	10%	10%	100%	1					20,00 %	0,69%	$ 26.840.000,00
4.23	Suministro e instalación brazo de soporte para	UND	7,00	0,85%	20%	40%	30%	0%	10%	100%	7					20,00 %	0,17%	$ 6.650.000,00

PRESUPUESTO DE CANTIDADES DE PROPUESTA ECONÓMICA				PESOS PORCENTUALES							FECHA CORTE:		23-feb-26		AVANCE (%)		57,16%	$2.237.205.600,00
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL COMPONENTE	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN ALMACEN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINAL	TOTAL	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN ALMACEN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINAL	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN COMPONENTE	ACUMULADO TOTAL POR PESO PORCENTUAL FINANCIERO	ACUMULADO EJECUCIÓN FINANCIERA
	cámara lpr (para uso en poste)																	
VALOR TOTAL				100,00 %							TOTAL AVANCE ACUMULADO						57,16%	$2.237.205.600,00

AVANCE PORCENTUAL POR MUNICIPIO Y/O COMPONENTE DEL PROYECTO

De igual forma se puede observar en la misma tabla los avances en las actividades programadas por municipio y/o componente, teniendo en cuenta el "**PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL COMPONENTE",** así:

COMPONENTE	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE CCTV MUNICIPIO EL CALVARIO	**93,74%**	Visitas técnicas, documentación técnica de la adquisición, entrega en sitio e instalación de 8 postes tipo 3, 8 camaras PTZ, 8 brazos soportes para cámara ptz, 8 gabinetes de poste, 8 ups de 2kva, 8 coronas antiescalatoria, 8 canalizaciones eléctricas y de datos para punto de camara, 8 sistemas de puesta a tierra para punto de camara; 8 Switch para Cámaras en gabinete de 4 puertos, 5 camaras Fija Tipo 1 (Seguridad Instalaciones Estación de Policía) y 2 equipos de transmisión y Recepción de Microondas Todo lo relacionado a los equipos de la sala de control como lo es: Suministro e Instalación Software de visualización, control y administración Suministro e Instalación Joystick de Operación Suministro e Instalación Computador Workstation Suministro e Instalación Impresora Multifuncional Suministro e Instalación Monitor de visualización 80" Suministro e Instalación Aire acondicionado 12000 Btu Suministro e Instalación Puntos de cableado estructurado 8- Puntos de energía eléctrica normal 8 Puntos de energía eléctrica regulada 8 Sistema puesta a tierra (para todos los elementos) Suministro e Instalación Módulos - Puesto de trabajo Suministro e Instalación Sistema de detección de incendios, estación manual, extintor, luz estroboscópica y control de acceso. Suministro e Instalación Control de acceso facial Suministro e Instalación Sistema de Apertura Adaptación centro de monitoreo y cuarto de equipos Suministro e Instalación Sistema de Almacenamiento Suministro e Instalación Switch 24 Puertos

COMPONENTE	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN
		Suministro e Instalación Gabinete Equipos Cuarto de Equipos Suministro e Instalación Ups 6 Kva Dentro del alcance del proyecto, resta por ejecutar únicamente el suministro de la planta eléctrica de 15 kVA.
COMPONENTE CCTV MUNICIPIO SAN JUANITO	**89,87%**	Visitas técnicas, documentación técnica de la adquisición, entrega en sitio e instalación de 8 postes tipo 3, 8 camaras PTZ, 8 brazos soportes para cámara ptz, 8 gabinetes de poste, 8 ups de 2kva, 8 coronas antiescalatoria, 8 canalizaciones eléctricas y de datos para punto de camara, 8 sistemas de puesta a tierra para punto de camara; 8 Switch para Cámaras en gabinete de 4 puertos, 5 camaras Fija Tipo 1 (Seguridad Instalaciones Estación de Policía). Todo lo relacionado a los equipos de la sala de control como lo es: Suministro e Instalación Software de visualización, control y administración Suministro e Instalación Joystick de Operación Suministro e Instalación Computador Workstation Suministro e Instalación Impresora Multifuncional Suministro e Instalación Monitor de visualización 80" Suministro e Instalación Aire acondicionado 12000 Btu Suministro e Instalación Puntos de cableado estructurado 8- Puntos de energía eléctrica normal 8 Puntos de energía eléctrica regulada 8 Sistema puesta a tierra (para todos los elementos) Suministro e Instalación Módulos - Puesto de trabajo Suministro e Instalación Sistema de detección de incendios, estación manual, extintor, luz estroboscópica y control de acceso. Suministro e Instalación Control de acceso facial Suministro e Instalación Sistema de Apertura Adaptación centro de monitoreo y cuarto de equipos Suministro e Instalación Sistema de Almacenamiento Suministro e Instalación Switch 24 Puertos Suministro e Instalación Gabinete Equipos Cuarto de Equipos Suministro e Instalación Ups 6 Kva Dentro del alcance del proyecto, resta por ejecutar únicamente el suministro de la planta eléctrica de 15 kVA.
COMPONENTE CCTV MUNICIPIO VILLAVICENCIO ESTADIO	**23,67%**	Visitas de inspección, levantamiento de información y documentación técnica inicial (KMZ) Actualizada, suministro y revisión de UPS y Fibra óptica
COMPONENTE PROYECTO LPR VILLAVICENCIO	**24,87%**	Visitas de inspección, levantamiento de información y documentación técnica inicial (KMZ) Actualizada y suministro y revisión de UPS y Fibra óptica.

Nota: *Resulta de dividir el* ***PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL DEL COMPONENTE*** *entre el* ***ACUMULADO TOTAL POR PESO PORCENTUAL FINANCIERO.***

Asimismo, se valida que el personal mínimo requerido, que hace parte de la ejecución contractual, se encuentra vinculado al proyecto y que se acredita el pago de la seguridad social correspondiente del personal, de la siguiente manera:

CARGO	NOMBRE	% DEDICACIÓN
DIRECTOR DEL PROYECTO	JULIÁN ANDRÉS LOZANO FLÓREZ	50%
RESIDENTE DEL PROYECTO	CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ LANDINEZ	100%
INGENIERO DE APOYO	FREDDY ALEXANDER ACOSTA BERNAL	100%
TECNICO DE APOYO	BREZHNEV LEONARDO CHIA GOMEZ	100%
TÉCNICO DEL PROYECTO	DIEGO ALEXANDER RIVERA AVILEZ	100%
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ANGY NATHALI MORENO GUTIERREZ	100%
CONSULTOR DE SEGURIDAD	FABIAN GUZMAN SOTO	N/A

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO:

Se valida el cumplimiento del pago de la seguridad social del personal mínimo requerido. A continuación, se detalla el pago correspondiente a cada integrante del personal durante el período del presente corte, manteniéndose el personal ofertado en el contrato, así:

CARGO	DIRECTOR DEL PROYECTO	CARGO	RESIDENTE DEL PROYECTO
NOMBRE Y APELLIDOS	JULIÁN ANDRÉS LOZANO FLÓREZ	NOMBRE Y APELLIDOS	CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ LANDINEZ
MES	DICIEMBRE	MES	DICIEMBRE
No. DE PLANILLA	9496496819	No. DE PLANILLA	1750405303
SALUD	$196,800	SALUD	$ 142.400
PENSION	$786,900	PENSION	$ 182.300
ARL	$214,000	ARL	$ 27.800
MES	ENERO	MES	ENERO
No. DE PLANILLA	9499989591	No. DE PLANILLA	1750405583
SALUD	$ 205.500	SALUD	$ 58.400
PENSION	$ 822.000	PENSION	$ 74.800
ARL	$ 187.900	ARL	$ 11.400

CARGO	INENIERO DE APOYO	CARGO	TECNICO DE APOYO
NOMBRE Y APELLIDOS	FREDDY ALEXANDER ACOSTA BERNAL	NOMBRE Y APELLIDOS	BREZHNEV LEONARDO CHIA GOMEZ
MES	DICIEMBRE	MES	DICIEMBRE
No. DE PLANILLA	92612707	No. DE PLANILLA	9497762216
SALUD	185.000	SALUD	$96,300
PENSION	236.800	PENSION	$384,800
ARL	7.800	ARL	$139.500

MES	ENERO	MES	ENERO
No. DE PLANILLA	91712091	No. DE PLANILLA	9499989591
SALUD	185.000	SALUD	$99.900
PENSION	236.800	PENSION	$399.100
ARL	7.800	ARL	$123.400

CARGO	TÉCNICO DEL PROYECTO	CARGO	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NOMBRE Y APELLIDOS	DIEGO ALEXANDER RIVERA AVILEZ	NOMBRE Y APELLIDOS	ANGY NATHALI MORENO GUTIERREZ
MES	DICIEMBRE	MES	DICIEMBRE
No. DE PLANILLA	9496495367	No. DE PLANILLA	1750405737
SALUD	$96,200	SALUD	$ 142.400
PENSION	$384,700	PENSION	$ 182.300
ARL	$167,400	ARL	$ 27.800
MES	ENERO	MES	ENERO
No. DE PLANILLA	9499989591	No. DE PLANILLA	1749666845
SALUD	$ 100.800	SALUD	$ 58.400
PENSION	$ 403.100	PENSION	$ 74.800
ARL	$ 91.700	ARL	$ 11.400

CARGO	CONSULTOR EN SEGURIDAD
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIAN GUZMAN SOTO
MES	DICIEMBRE
No. DE PLANILLA	9497100576
SALUD	$218,600
PENSION	$874,300
ARL	$380,300
MES	ENERO

No. DE PLANILLA	**9499989591**
SALUD	$ 230.300
PENSION	$ 921.100
ARL	$ 400.700

ÍTEMS EJECUTADOS EN EL PRESENTE PERIODO:

Se valida el cumplimiento de los siguientes ítems ejecutados durante el período comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 al 23 de febrero de 2026 los cuales se relacionan a continuación:


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COMPONENTE CCTV MUNICIPIO EL CALVARIO					
PUNTO DE CAMARA					
3	Suministro e Instalación Switch para Cámaras en gabinete de 4 puertos	UNID	8	$ 4.150.000	$ 33.200.000
7	Suministro e Instalación Cámara Fija Tipo 1 (Seguridad Instalaciones Estación de Policía)	UNID	5	$ 4.530.000	$ 22.650.000
12	Suministro e Instalación Equipo de Transmisión y Recepción de Microondas	UNID	2	$ 29.600.000	$ 59.200.000
SALA DE CONTROL					
13	Suministro e Instalación Software de visualización, control y administración	UNID	1	$ 12.725.370	$ 12.725.370
14	Suministro e Instalación Joystick de Operación	UNID	1	$ 11.000.000	$ 11.000.000
15	Suministro e Instalación Computador Workstation	UNID	1	$ 42.000.000	$ 42.000.000
16	Suministro e Instalación Impresora Multifuncional	UNID	1	$ 8.950.000	$ 8.950.000
17	Suministro e Instalación Monitor de visualización 80"	UNID	1	$ 38.900.000	$ 38.900.000
18	Suministro e Instalación Aire acondicionado 12000 Btu	UNID	1	$ 3.200.000	$ 3.200.000
19	Suministro e Instalación Puntos de cableado estructurado	UNID	8	$ 1.930.000	$ 15.440.000
20	Puntos de energía eléctrica normal	UNID	8	$ 1.454.000	$ 11.632.000
21	Puntos de energía eléctrica regulada	UNID	8	$ 1.464.000	$ 11.712.000

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	Sistema puesta a tierra (para todos los elementos)	UNID	1	$ 2.342.000	$ 2.342.000
23	Suministro e Instalación Módulos - Puesto de trabajo	UNID	1	$ 4.150.000	$ 4.150.000
24	Suministro e Instalación Sistema de detección de incendios, estación manual, extintor, luz estroboscópica y control de acceso.	UNID	1	$ 42.300.000	$ 42.300.000
25	Suministro e instalación de sistemas de reconocimiento facial	UND	1	$ 6.900000	$ 6.900000
26	Suministro e Instalación Sistema de Apertura	UNID	1	$ 3.900.000	$ 3.900.000
27	Adaptación centro de monitoreo y cuarto de equipos	UNID	1	$ 54.300.000	$ 54.300.000
	Cuarto de Equipos				
28	Suministro e Instalación Sistema de Almacenamiento	UND	1	$ 48.600.000	$ 48.600.000
29	Suministro e Instalación Switch 24 Puertos	UND	1	$ 9.347.530	$ 9.347.530
30	Suministro e Instalación Gabinete Equipos Cuarto de Equipos	UND	1	$ 23.000.000	$ 23.000.000
31	Suministro e Instalación Ups 6 Kva	UND	1	$ 13.200.000	$ 13.200.000
COMPONENTE CCTV MUNICIPIO SAN JUANITO					
	Punto de Cámara				
3	Suministro e Instalación Switch para Cámaras en gabinete de 4 puertos	UNID	8	$ 4.150.000	$ 33.200.000
7	Suministro e Instalación Cámara Fija Tipo 1 (Seguridad Instalaciones Estación de Policia)	UNID	5	$ 4.530.000	$ 22.650.000
SALA DE CONTROL					
12	Suministro e Instalación Software de visualización, control y administración	UNID	1	$ 12.725.300	$ 12.725.300
13	Suministro e Instalación Joystick de Operación	UNID	1	$ 11.000.000	$ 11.000.000
14	Suministro e Instalación Computador Workstation	UNID	1	$ 42.000.000	$ 42.000.000
15	Suministro e Instalación Impresora Multifuncional	UNID	1	$ 8.950.000	$ 8.950.000

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	Suministro e Instalación Monitor de visualización 80"	UNID	1	$ 38.900.000	$ 38.900.000
17	Suministro e Instalación Aire acondicionado 12000 Btu	UNID	1	$ 3.200.000	$ 3.200.000
18	Suministro e Instalación Puntos de cableado estructurado	UNID	8	$ 1.930.000	$ 15.440.000
19	Puntos de energía eléctrica normal	UNID	8	$ 1.454.000	$ 11.632.000
20	Puntos de energía eléctrica regulada	UNID	8	$ 1.464.000	$ 11.712.000
21	Sistema puesta a tierra (para todos los elementos)	UNID	1	$ 3.230.000	$ 3.230.000
22	Suministro e Instalación Módulos - Puesto de trabajo	UNID	1	$ 4.150.000	$ 4.150.000
23	Suministro e Instalación Sistema de detección de incendios, estación manual, extintor, luz estroboscópica y control de acceso.	UNID	1	$ 42.300.000	$ 42.300.000
24	Suministro e instalación de sistemas de reconocimiento facial	UND	1	$ 6.900000	$ 6.900000
25	Suministro e Instalación Sistema de Apertura	UNID	1	$ 3.900.000	$ 3.900.000
26	Adaptación centro de monitoreo y cuarto de equipos	UNID	1	$ 54.300.000	$ 54.300.000
CUARTO DE EQUIPOS					
27	Suministro e Instalación Sistema de Almacenamiento	UND	1	$ 48.600.000	$ 48.600.000
28	Suministro e Instalación Switch 24 Puertos	UND	1	$ 9.347.500	$ 9.347.500
29	Suministro e Instalación Gabinete Equipos Cuarto de Equipos	UND	1	$ 23.000.000	$ 23.000.000
30	Suministro e Instalación Ups 6 Kva	UND	1	$ 13.200.000	$ 13.200.000
VALOR CORTE PARCIAL					**$ 898.985.700**


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SUPERVISIÓN EJERCIDA

Se relaciona el registro fotográfico de las actividades realizadas por esta supervisión, mediante el cual se valida el cumplimiento de las actividades e ítems relacionados en el presente informe, así:

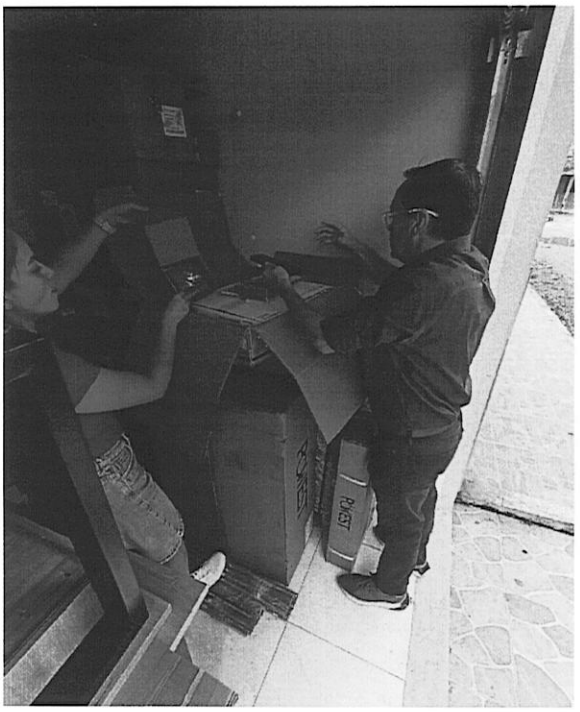







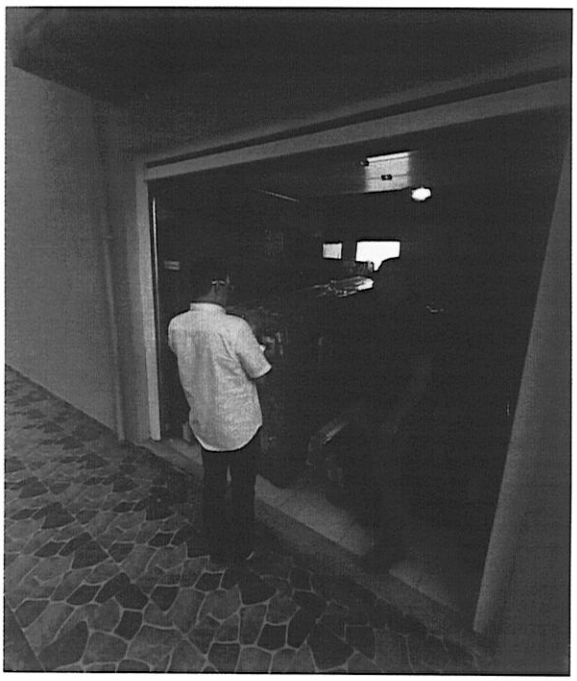


Verificación de componentes y elementos del proyecto, por parte de la supervisión y apoyo a la supervisión en la bodega principal del contratista. Validación del cumplimiento de las fichas técnicas aprobadas y de las especificaciones técnicas mínimas requeridas para el presente corte parcial

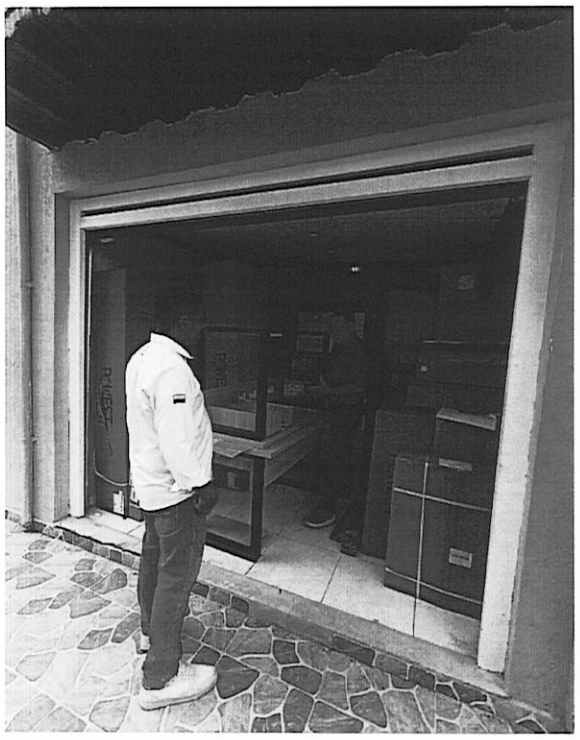


alhua
Wiz Mind S
SMART NETWORK CAMERA

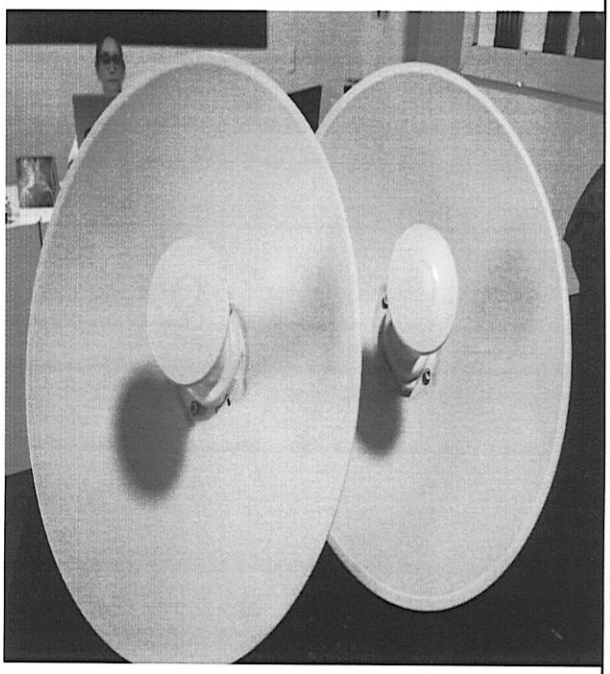

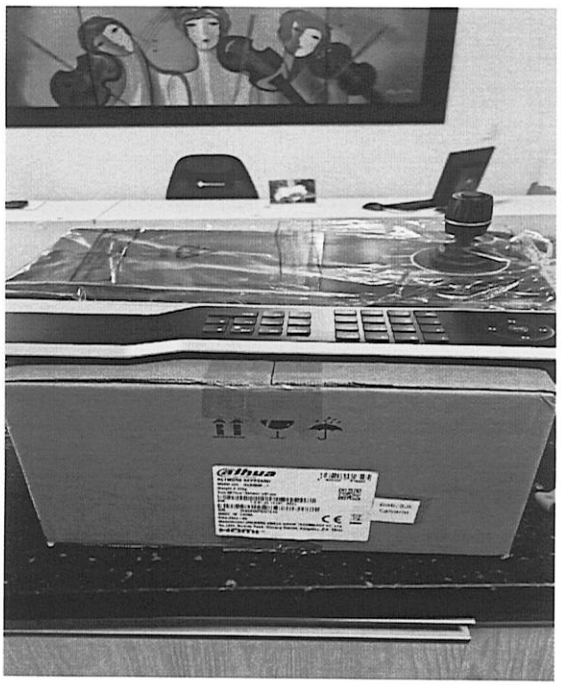






Visita de verificación de equipos y elementos del proyecto en sitio, en los municipios de El Calvario y San Juanito, por parte del profesional de apoyo a la supervisión.




Revisión de equipos y elementos del proyecto, para validación del cumplimiento de las especificaciones mínimas requeridas, cantidades y estado, previo a la instalación.

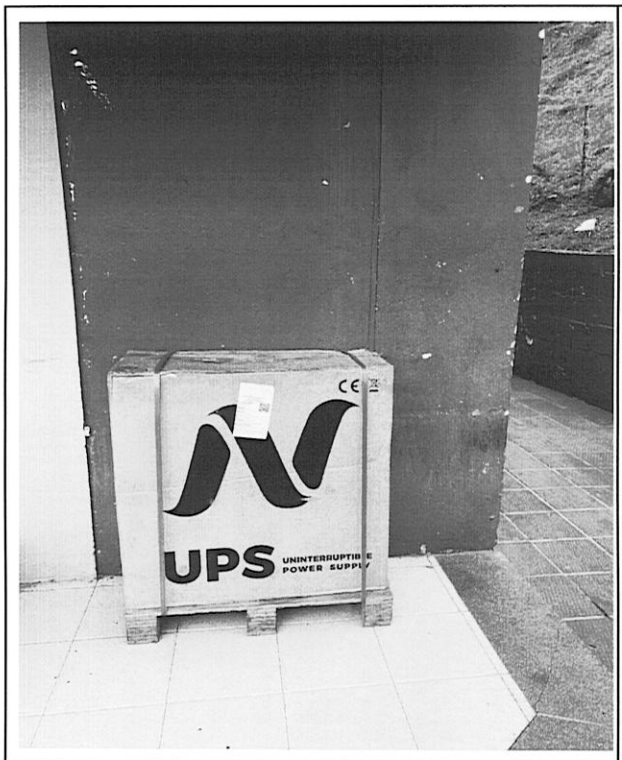


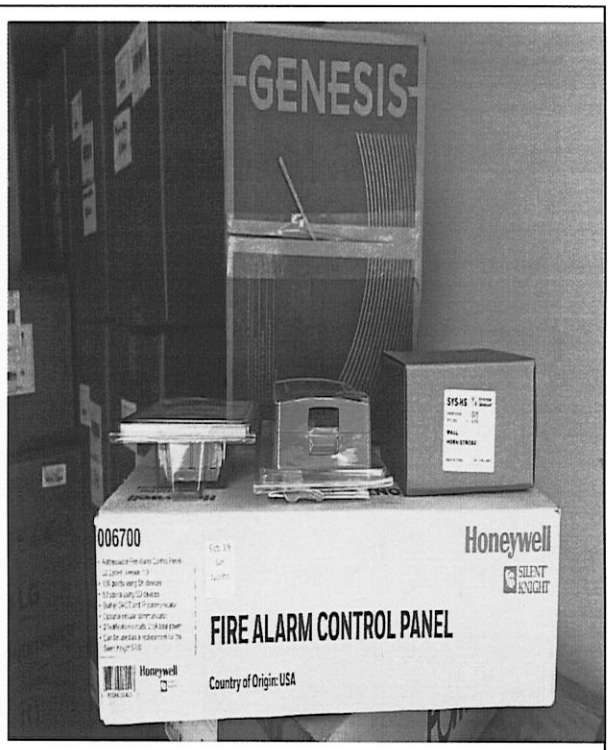


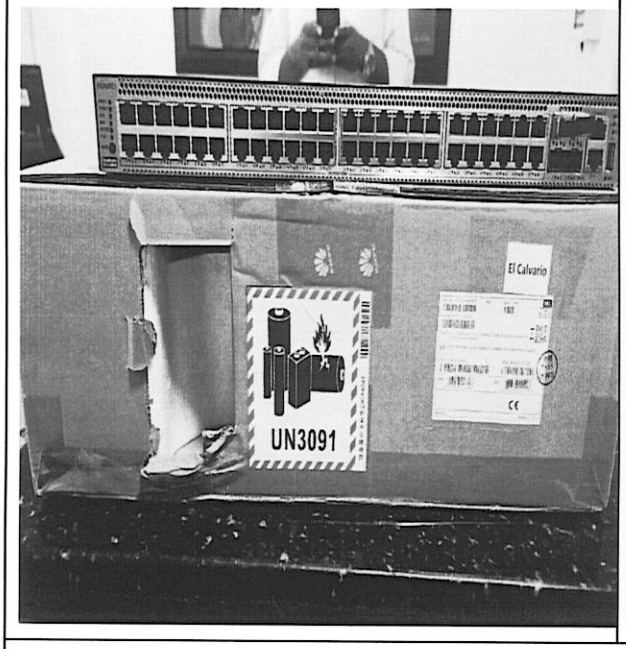

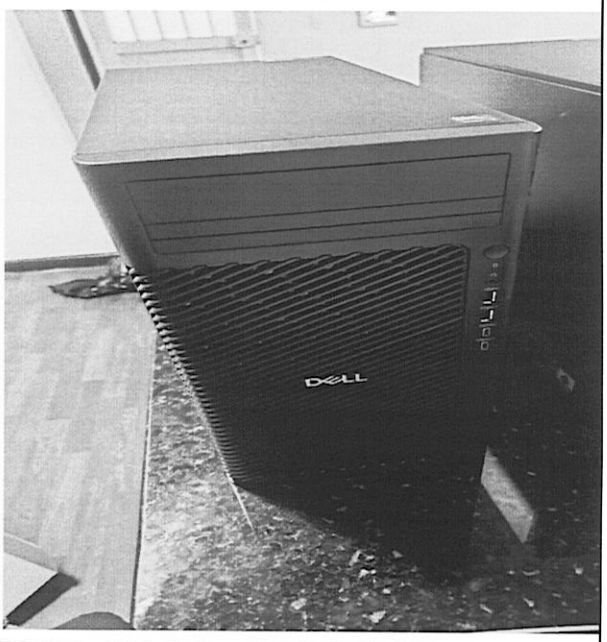


Revisión de equipos y elementos del proyecto, para validación del cumplimiento de las especificaciones mínimas requeridas, cantidades y estado, previo a la instalación.

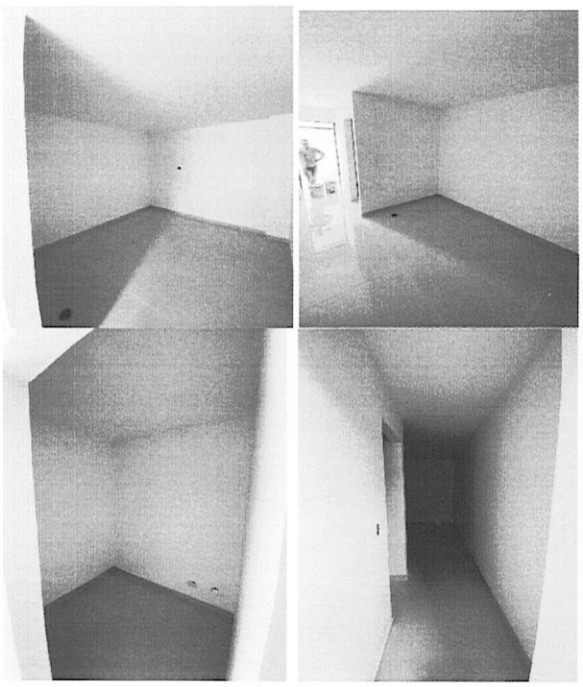

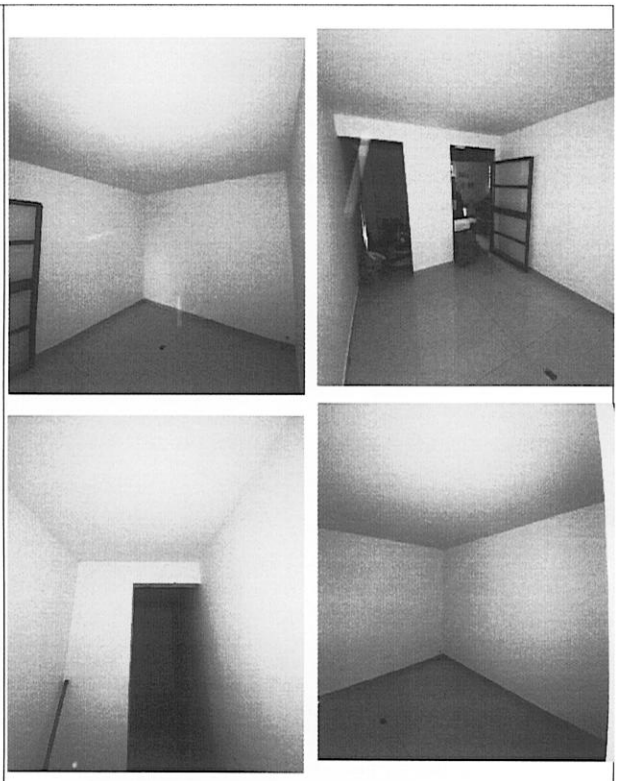



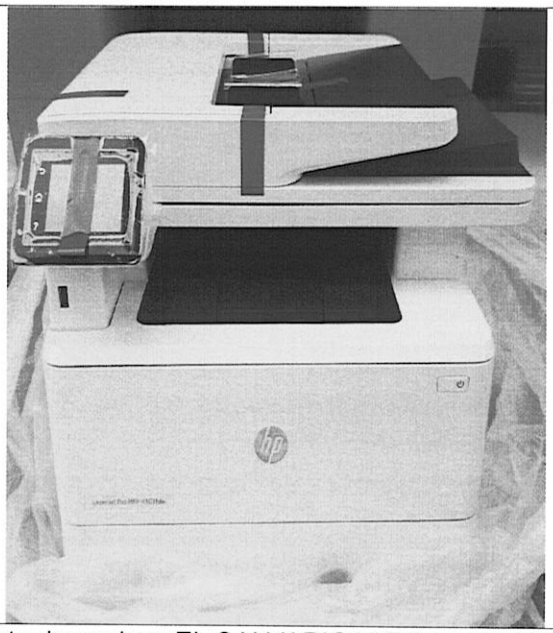

Revisión de la Adaptación centro de monitoreo y cuarto de equipos EL CALVARIO Y SAN JUANITO; a si como el aire acondicionado e impresora del cuartos de equipos para validación del cumplimiento de las especificaciones mínimas requeridas, cantidades y estado, previo a la instalación

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

La supervisión llevó a cabo reuniones de seguimiento, así:

- Reunión del 13 de febrero 2025 (Presencial): Se realizó revisión en sitio de los elementos acá relacionados, verificando el cumplimiento de las especificaciones mínimas requeridas por el contrato 2209 de 2025, se verificaron las fichas técnicas y documentación técnica de los elementos entregados, así como el cumplimiento de las cantidades mínimas solicitadas y su buen estado físico, libre de golpes, abolladuras, imperfecciones u otros daños físicos que puedan afectar su correcto funcionamiento.

DE TECNOLOGÍA	ACTA DE ENTREGA, REVISIÓN Y/O DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS	CÓDIGO:	FR-SG-35
		VERSIÓN:	02
		FECHA DE VIGENCIA:	10/01/2023
		PAGINA:	1 de 5

PROYECTO:	CCTV MUNICIPIOS	**CONTRATO:**	2209 DE 2025
CLIENTE:	GOBERNACIÓN DEL META	**FECHA:**	13 DE FEBRERO DE 2026
UBICACIÓN:	EL CALVARIO Y SAN JUANITO (META)	**HORA:**	8:00 AM

TIPO DE NOVEDAD	ENTREGA	DEVOLUC	CAMBIO	GARANTÍA	PRESTAMO	OBSERVACIONES DE NOVEDAD
	X					REVISIÓN EN SITIO DE ELEMENTOS

Nota: Marque con una "X" el tipo de novedad.

EQUIPOS Y DISPOSITIVOS (CON SERIAL)								
DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIAL	CUMPLE*	ESTADO(X)			OBSERVACIONES DE EQUIPO Y DISPOSITIVO ENTREGADO
					EN SITIO	INSTALADO	OFEBANDO	
COMPONENTE CCTV MUNICIPIO EL CALVARIO (Punto de Cámara) **3. Suministro e Instalación Switch para Cámaras en gabinete de 4 puertos** CANTIDAD = 8 UNIDADES	LANPRO	LPSGW1082XPI	202508200694 PT1	SI	X			Cumplen con las especificaciones mínimas requeridas y fichas técnicas presentadas. Se encuentran en buen estado físico.
	LANPRO	LPSGW1082XPI	202508200691 PT2	SI	X			
	LANPRO	LPSGW1082XPI	202508200692 PT3	SI	X			
	LANPRO	LPSGW1082XPI	202508200696 PT4	SI	X			
	LANPRO	LPSGW1082XPI	202508200693 PT5	SI	X			
	LANPRO	LPSGW1082XPI	202508200700 PT6	SI	X			
	LANPRO	LPSGW1082XPI	202508200695 PT7	SI	X			
	LANPRO	LPSGW1082XPI	202508200699 PT8	SI	X			
COMPONENTE CCTV MUNICIPIO EL CALVARIO (Punto de Cámara) **7. Suministro e Instalación Cámara Fija Tipo 1 (Seguridad Instalaciones Estación de Policía)** CANTIDAD = 5 UNIDADES	DAHUA	DH-IPC-HFW5442EP-ZE-271253	AL0DFEFPAGSFED6 PT01	SI	X			Cumplen con las especificaciones mínimas requeridas y fichas técnicas presentadas. Se encuentran en buen estado físico.
	DAHUA	DH-IPC-HFW5442EP-ZE-271253	AL0DFEFPAG4DBE7 PT02	SI	X			
	DAHUA	DH-IPC-HFW5442EP-ZE-271253	AL0656CPAG28E9E PT03	SI	X			
	DAHUA	DH-IPC-HFW5442EP-ZE-271253	AL0558FPAGC0595 PT04	SI	X			
	DAHUA	DH-IPC-HFW5442EP-ZE-271253	AL0DFEFPAGA1000 PT05	SI	X			
COMPONENTE CCTV MUNICIPIO EL CALVARIO (Punto de Cámara) **12. Suministro e Instalación**	CAMBIUN NETWORKS	C060940P041A	EBBG04HVWWZW	SI	X			umplen con las especificaciones mínimas requeridas y fichas técnicas presentadas. Se encuentran

Evaluación y Reevaluación del Contratista

Rango de Calificación	
Excelente	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Bueno	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Regular	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
No Cumple	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

Evaluación y Reevaluación del Contratista	Calificación
CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Bueno
CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Bueno

COMUNICACIÓN: (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Bueno
EVALUACIÓN GENERAL: (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Bueno

Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social:


Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales correspondiente al periodo del presente informe como se establece en el F-BS-16 Certificado del Supervisor Autorizando el Pago.

Certificación de Cumplimiento General

De acuerdo con la información anteriormente suministrada y la contenida en el F-BS-16 Certificado del Supervisor Autorizando el Pago, certifico que durante el periodo objeto de este informe, el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato, y cumplió con el pago del sistema de seguridad social, la cual fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

Cordialmente;

Firma:	
Nombre:	CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS
Cargo:	Gerente de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Supervisor desde el 04 de febrero a la fecha	

Firma:	
Nombre:	MARIA LISBETH LOPEZ PARRA
Cargo:	Gerente de Seguridad y Convivencia Ciudadana. (Encargada)
Supervisor desde el 05 de enero al 03 de febrero 2026	

Villavicencio, 05/01/2026

Doctor(a):
ANDREA CAROLINA LIZCANO NOGUERA
Secretaria de Gobierno y Seguridad
Gobernación del Meta

INFORME DE SUPERVISIÓN

Objetivo del Informe

Mantener informada a la Gobernación del Meta sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

Contrato No. y Fecha:	2209 del 21/10/2025		
Clase de Contrato:	Suministro e instalación		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	12080 del 22/10/2025		
Contratista:	MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA S.A.S	Nit./c.c.	900.714.956-5
Representante Legal:	FABIAN GUZMAN SOTO	c.c.	86.079.311
Supervisor: (Insertar filas cuando en el periodo de pago se presenten varios supervisores)	EDGAR ALEXANDER QUITIÁN BUSTOS	c.c.	86.064.270
Acto administrativo de designación supervisor: No. y Fecha	Resolución 289 de 2025 del 23/11/2025		
Objeto:			
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN CCTV, Y MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO Y CONTROL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	**TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($3.914.269.800,00) M/CTE.**		
Término Inicial de Ejecución:	UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	27/10/2025	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	16/12/2025

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios, Reducciones y Otras)			
Tipo de Modificación	**Valor de la Modificación** (Cuando Aplique)	**Fecha de expedición del documento**	**Tiempo de Modificación** (Cuando Aplique)
ACTA MODIFICATORIA No.01	N/A	26/11/2025	N/A
ACTA DE PRORROGA No.01	N/A	10/12/2025	14 días
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	N/A	24/12/2025	N/A
*Si no existen modificaciones diligencie casillas con N/A **Inserte filas si requiere			

Término Total de Ejecución: (Solo cuando existan modificaciones)	DOS (02) MESES Y CUATRO (04) DÍAS	**Fecha Finalización:** (Solo cuando existan modificaciones)	30/12/2025

Valor total del contrato +/- las modificaciones: (Solo cuando existan modificaciones) (Letras y Números)	**TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($3.914.269.800,00) M/CTE.**
*Si no existen modificaciones diligencie casillas con N/A	

Periodo de Pago:	Del	17/10/2025		Al	04/01/2026			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial	N/A	Final		No. de Pago	N/A

Valor Total Autorizado a Pagar (Letras y números Máximo 2 Decimales)	**N/A**

Se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así para dar cumplimiento al Decreto No. 075 de 2021 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Departamento del Meta, me permito informar el desarrollo correspondiente al presente periodo de pago en los siguientes aspectos:

Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	Si	No	N/A
Registro Presupuestal	X		
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la Ley	X		
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)			X
Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales ARL			X
Publicaciones en Secop	X		
Publicaciones en SIA Observa	X		
Carpeta física actualizada en la Gerencia de Asuntos Contractuales	X		

Ejecución de las actividades en cumplimiento de las obligaciones específicas en el periodo del informe:

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	DESARROLLO
1. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico de conformidad a lo solicitado.	Se evidencia, de acuerdo con el informe presentado por el contratista correspondiente al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025 que, se dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de las fichas técnicas, en periodos anteriores, las cuales fueron aprobadas por esta supervisión.
2. El contratista realizará la adquisición, instalación y configuración de los dispositivos según fichas técnicas y protocolos establecidos en estudios previos, anexo técnico de cada entidad beneficiaria y propuesta económica presentada.	Se evidencia, de acuerdo con el informe presentado por el contratista correspondiente al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025 que, no se realizaron avances nuevos en la adquisición, instalación y/o configuración de los equipos y elementos del proyecto, debido a causas objetivas e imprevisibles, derivadas de la demora en la entrega de los equipos de CCTV, causada por factores de transporte y logística fuera del control de la parte contratante. La casa fabricante ha certificado formalmente que el despacho y entrega de los activos tecnológicos no podrá materializarse dentro de la presente vigencia fiscal, situación derivada de factores logísticos ajenos a la voluntad y control del contratista, tales como: 1. Afectación en el tránsito logístico: Retrasos en las cadenas de transporte nacional e internacional; 2. Trámites de nacionalización: Procedimientos de importación y las gestiones aduaneras, cuyos plazos actualmente se extienden más de lo habitual; 3. Estacionalidad:

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	DESARROLLO
	Congestión portuaria y logística propia de la temporada de fin de año, lo cual ha incrementado sustancialmente los tiempos de despacho y transporte de carga. Por otro lado, para el componente "COMPONENTE PROYECTO LPR VILLAVICENCIO", los puntos inicialmente definidos se encuentran ubicados en las diferentes vías concesionadas con COVIANDES, COVIORIENTE, CONCESIÓN VIAL DE LOS LLANOS, y los trámites de permisos de intervención de estos puntos han requerido de tiempos mayores a los establecidos en el contrato. Como medida provisional se ha acordado, con la Policía Metropolitana de Villavicencio (MEVIL) y la supervisión, el cambio de algunos puntos de intervención. Sin embargo, por limitaciones técnicas y funcionales no es posible el cambio de todos los puntos de intervención. Esto hace necesario contar con más tiempo para culminar los trámites pertinentes, trámites que a la fecha no se han concretado. Causas presentadas por el contratista, mediante solicitud de suspensión al contrato (ver **Anexo 01**).

MEGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA

MP-CE-2025-054

Villavicencio, 22 de diciembre de 2025

Coronel
EDGAR ALEXANDER QUITIÁN BUSTOS
Gerente de Seguridad y Convivencia Ciudadana
GOBERNACIÓN DEL META
Ciudad

REFENCIA: CONTRATO 2209 DE 2025. OBJETO: "SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION CCTV, Y MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANDO Y CONTROL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META".

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSIÓN - CONTRATO 2209 DE 2025

dahua TECHNOLOGY DAHUA TECHNOLOGY

www.dahuasecurity.com/la

Bogotá D.C., 22 de diciembre 2025

Señor:
FABIAN GUZMAN SOTO
Representante Legal
MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA S.A.S
Villavicencio, Meta

PROCESO: CONTRATO 2209 OBJETO SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN – CCTV, Y MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO Y CONTROL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META (VILLAVICENCIO, SAN JUANITO Y EL CALVARIO)

REFERENCIA: RETRASO EQUIPOS

DAHUA TECHNOLOGY COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 900.856.874-9, en calidad de representante de su casa matriz ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD., fabricante de equipos de seguridad electrónica tales como cámaras análogas, IP y PTZ; NVR; mesas controladoras; monitores; soluciones de video wall ; cámaras térmicas; cámaras de reconocimiento facial; cámaras LPR; sistemas de alarma; arcos detectores de metales; máquinas de rayos X y sistemas de control de acceso térmico, entre otros, se permite informar de manera respetuosa que, una vez obtenida la respuesta oficial por parte de la fábrica, el tiempo estimado de llegada de los equipos solicitados es de tres (03) meses, contados a partir de la orden compra, de los siguientes equipos:

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	DESARROLLO

ITEM	EQUIPO	CANTIDAD	REFERENCIA
1	CÁMARA FIJA PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR EN BORDE	12	DAHUA
2	SOLUCIÓN LPR EN BORDE	12	DAHUA
3	SERVIDOR LPR	1	DAHUA
4	MONITOR DE VISUALIZACIÓN PARA VIDEOWALL	4	DAHUA
5	LECTOR DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL	1	DAHUA
6	SOFTWARE DE ANALÍTICA AVANZADA (COMPORTAMENTAL)	16	DAHUA
7	LICENCIAMIENTO DE RECONOCIMIENTO FACIAL	12	DAHUA
8	LICENCIAMIENTO BASE DE DATOS 50.000 SUJETOS PARA RECONOCIMIENTO FACIAL	1	DAHUA
9	SOFTWARE DE GESTION CENTRALIZADA PARA PROCESAMIENTO E INTEGRACION DE MILLONES DE ROSTROS	1	DAHUA
10	SERVIDOR PARA RECONOCIMIENTO FACIAL	1	DAHUA

La variación en los tiempos de entrega se debe principalmente a la alta demanda propia de la temporada de fin de año, lo cual ha limitado la disponibilidad inmediata de inventario para despacho. A esto se suman los procedimientos de importación y las gestiones aduaneras, cuyos plazos actualmente se extienden más de lo habitual, influyendo directamente en el cronograma estimado de arribo de los equipos.

Agradecemos de antemano su entendimiento frente a esta situación, mientras se completan las etapas logísticas requeridas para la correcta atención del pedido. Nos mantendremos en comunicación para notificar oportunamente cuando los equipos estén disponibles en fábrica y se pueda iniciar el proceso de envío correspondiente.

Este documento se genera a solicitud del interesado y no podrá usarse para efectos diferentes salvo autorización expresa de **DAHUA TECHNOLOGY COLOMBIA S.A.S.** Se expide el 22 de diciembre de dos mil veinticinco (2025) y tiene validez de tres (03) meses a partir de la fecha.

Cordialmente,

HAN WEN ZHANG
REPRESENTANTE LEGAL
DAHUA TECHNOLOGY COLOMBIA S.A.S
cristobal.zhang@dahuatech.com

Solicitud que fue estudiada por esta supervisión y su apoyo jurídico, derivando en su aprobación, la cual se formalizó finalmente mediante acta de suspensión No. 1 del 24 de diciembre de 2025 (ver **Anexo 02**).

DEPARTAMENTO DEL META NIT 892.000.148-8	SUSPENSION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	

SUSPENSION N° 1 AL CONTRATO No. 2209 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA S A S

CONTRATISTA	**MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA S.A.S** NIT° 900.714.956-5 **R/L FABIAN GUZMAN SOTO** C.C. 86.079.311
OBJETO DEL CONTRATO	**"SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION CCTV, Y MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANDO Y CONTROL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"**
VALOR DEL CONTRATO	**TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($3.914.269.800).**
FECHA DE INICIO	27 de Octubre del 2025
TÉRMINO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (1) MES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16 de Diciembre de 2025
FECHA MODIFICATORIA No. 1	26 de Noviembre de 2025
PRORROGA No. 1	CATORCE (14) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de Diciembre de 2025
TERMINO DE SUSPENSIÓN	UN (1) MES
FECHA	24 DIC 2025

Esta supervisión autoriza entonces la suspensión por un (1) mes, tiempo en el que se estima se superen estas circunstancias.

<table>
<tr><th>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA</th><th>DESARROLLO</th></tr>
<tr><td></td><td>
A continuación, a manera de trazabilidad se relacionan los ítems del presupuesto de cantidades adquiridos, instalados, configurados y/o entregados a la fecha, reportados en periodos anteriores, así:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td></td><td>COMPONENTE CCTV MUNICIPIO EL CALVARIO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Punto de Cámara</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Suministro e Instalación Poste Tipo 1</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Suministro e Instalación Gabinete de poste</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Suministro e Instalación Ups 1,5 Kva (Cámara)</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Suministro e Instalación Brazo Soporte para</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Suministro e Instalación Cámara Domo PTZ</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Suministro e Instalación Corona antiescalatoria</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Suministro e Instalación Ups 1,5 Kva (Cámara)</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Suministro e Instalación Fibra óptica Monomodo</td><td>ML</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Suministro e Instalación Sistema puesta a tierra Punto de cámara</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Suministro e Instalación Canalización eléctrica de cámara</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td>COMPONENTE CCTV MUNICIPIO SAN JUANITO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Punto de Cámara</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Suministro e Instalación Poste</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Suministro e Instalación Gabinete de poste</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Suministro e Instalación Ups 1,5 Kva (Cámara)</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Suministro e Instalación Brazo Soporte para Cámaras</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Suministro e Instalación Cámara Domo PTZ Tipo 2</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Suministro e Instalación Corona antiescalatoria</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Suministro e Instalación Fibra óptica Monomodo</td><td>ML</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Suministro e Instalación Sistema puesta a tierra Punto de cámara</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Suministro e Instalación Canalización eléctrica de cámara</td><td>UNID</td><td>8</td></tr>
</table>
Los ítems anteriores se han entregado en su totalidad. Adicionalmente, en periodos anteriores se reportaron las UPS de 6KVA entregadas en sitio, pero que sin embargo aún no se han instalado.
</td></tr>
<tr><td>3. El contratista realizará todas las instalaciones y debidas adecuaciones bajo las normas establecidas para dicha puesta en marcha.</td><td>Se evidencia, de acuerdo con el informe presentado por el contratista correspondiente al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025 que, el contratista avanzó con las actividades de adaptación del centro de mando y control en el municipio de el Calvario (ítem 27 “Adaptación centro de monitoreo y</td></tr>
</table>

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	DESARROLLO
	cuarto de equipos"). Para estas actividades y las reportadas terminadas en periodos anteriores, el contratista ha dado cumplimiento al **Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)**, conforme a la Resolución 40117 del 2 de abril de 2024, a la Norma Técnica Colombiana NTC 2050, segunda actualización de 2020, y a las demás normas aplicables.
4. El contratista deberá entregar actualización de la carta de empalme del circuito cerrado de videovigilancia en medio digital.	Se evidencia, de acuerdo con el informe presentado por el contratista correspondiente al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025 que, no se han realizado avances en la instalación de la fibra óptica de Villavicencio, debido a que es necesario contar primero con los permisos de intervención de los puntos ubicados en vías concesionadas, que aún están en trámite. Para los municipios de El Calvario y San Juanito, donde se finalizó a satisfacción la instalación de la fibra óptica, se presentaron las cartas de empalme en el informe anterior.
5. El contratista deberá realizar todas las fusiones requeridas para el correcto flujo de información a través de la red de fibra óptica instalada.	Se evidencia, de acuerdo con el informe presentado por el contratista correspondiente al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025 que, no se han realizado avances en la instalación de la fibra óptica de Villavicencio, debido a que es necesario contar primero con los permisos de intervención de los puntos ubicados en vías concesionadas, que aún están en trámite. Para los municipios de El Calvario y San Juanito, donde se finalizó a satisfacción la instalación de la fibra óptica, se realizaron las respectivas fusiones requeridas para el funcionamiento de la red de fibra óptica instalada, conforme a lo reportado en periodos anteriores.
6. El contratista deberá realizar una (1) capacitación durante la ejecución contractual dirigida al personal técnico encargado del monitoreo en relación con la operación del software de administración de monitoreo de las cámaras de seguridad, dicha capacitación se realizará en fecha concertada con el supervisor del contrato.	Las capacitaciones se brindarán luego de que todos los ítems de cada uno de los municipios y/o componentes estén finalizados, teniendo en cuenta que cada solución corresponde a un sistema integral.
7. Todos los equipos deben quedar instalados, configurados, programados y operando correctamente, garantizando la visualización (monitoreo), almacenamiento y administración del vídeo de las cámaras de seguridad en el Centro de Monitoreo de cada una de las entidades beneficiarias, lo cual deberá acreditar a través de registro fotográfico.	Se evidencia, de acuerdo con el informe presentado por el contratista correspondiente al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025 que, no se realizaron avances nuevos en la adquisición, instalación y/o configuración de los equipos y elementos del proyecto, debido a las circunstancias ya descritas que motivaron la suspensión del contrato el día 24 de diciembre de 2025. Se han finalizado los ítems relacionados en el desarrollo de la obligación No. 2 del presente informe, reportado en el informe del periodo anterior. Respecto a las pruebas de monitoreo, almacenamiento y administración , se realizarán al final todos los ítems de cada municipio y/o componente, teniendo en cuenta que se tratan de sistemas integrales.
8. El contratista deberá entregar a través de un informe en medio digital, un inventario	Se evidencia, de acuerdo con el informe presentado por el contratista correspondiente al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025 que, no sean presentado avances

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	DESARROLLO
pormenorizado y georreferenciado de cada uno de los puntos de visualización a fin de ser entregado al personal de cada uno de los beneficiarios y copia del inventario general que reposará en la Secretaría de Gobierno y Seguridad del Departamento.	en las adquisiciones, por los motivos ya expuestos. Por tanto no se presentan actualizaciones en el inventario entregado por el contratista en la herramienta llamada "matriz de control de adquisiciones", en la cual se detallan los elementos, marcas, modelos o referencias, puntos de instalación y estado. Matriz que reposa en el informe del periodo anterior.
9- Entregar un (1) archivo digital KMZ actualizado del sistema CCTV de cada una de las entidades beneficiarias del sistema de videovigilancia debidamente instalado en este contrato.	Se evidencia, de acuerdo con el informe presentado por el contratista correspondiente al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025 que, no se han presentado modificaciones a la fecha de los KMZ presentados en el periodo anterior, los cuales están sujetos a ajuste, si así se requiere, luego de finalizar los trámites de permisos de intervención para los puntos en vías concesionadas.
10. El contratista deberá entregar en formato digital los planos del sistema, acompañado del registro fotográfico de la arquitectura tecnológica del CCTV.	Se evidencia, de acuerdo con el informe presentado por el contratista correspondiente al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025 que, luego de finalizadas las intervenciones para la adaptación de la sala de control y cuarto de equipos en el municipio de El Calvario-Meta, no se presentan modificaciones de los planos presentados en el informe parcial del periodo anterior, con corte al 16 de diciembre de 2025. Toda la documentación de ingeniería: Formatos Site Survey; Planos; Diagramas; Esquemas; Renders, etc., se encuentran anexos al informe del periodo anterior.
11. El contratista debe llevar a cabo con debido cuidado y diligencia todos los trabajos que realice, en las estaciones, oficinas y recintos técnicos. Además, deberá entregar los lugares limpios, libres de desechos o fungibles, así como de elementos auxiliares utilizados en la instalación, que puedan entorpecer la circulación de personas o implique un riesgo de accidente, garantizando así la utilización correcta de las señales de trabajo y permisos que requieran para la intervención.	Se evidencia, de acuerdo con el informe presentado por el contratista correspondiente al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025 que, la empresa MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA SAS llevó a cabo todos los respectivos trabajos con cuidado y diligencia, tanto en las oficinas de la Policía Nacional visitadas y/o intervenidas como en los sitios en calle definidos para los puntos de cámara. Luego de las intervenciones realizadas se realiza aseo, recolección de materiales sobrantes, recolección y separación de residuos, organización de herramienta y equipo de trabajo, así como de los elementos de seguridad utilizados durante las respectivas actividades.
12. El contratista deberá dar cumplimiento a los factores de ponderación ofrecidos, los cuales se acreditarán en la ejecución contractual.	De acuerdo a lo requerido en el pliego de condiciones del proceso **GCSJ-LP-013-2025,** se ofertó los factores de ponderación ofrecidos que aplican para el periodo de ejecución actual, como la promoción del empleo local, con el uso del personal mínimo requerido ofrecido con residencia local (DIRECTOR DEL PROYECTO; RESIDENTE DEL PROYECTO; INGENIERO DE APOYO; TÉCNICO DE APOYO; TÉCNICO DEL PROYECTO; COORDINADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) y capacitación adicional requerida, personal adicional local, así como los servicios del CONSULTOR DE SEGURIDAD ofrecido quien se encuentra vinculado al contrato.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	DESARROLLO
13. El contratista deberá entregar cada una de las entidades beneficiarias los correspondientes soportes de garantías directas de los fabricantes de los equipos (en los casos que aplique).	Se hará entrega de los certificados y/o soportes de garantía directa con fabrica de los equipos instalados luego de finalizar la implementación total de cada municipio y/o componente, teniendo en cuenta que se trata de un sistema integrado.
14. Suscribir las actas y demás documentos requeridos para dar ingreso de los elementos a adquirir de manera oportuna al Almacén Departamental, cumpliendo cabalmente con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico	Se evidencia, de acuerdo con el informe presentado por el contratista correspondiente al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025 que, no se realizaron nuevas adquisiciones diferentes a las ya reportadas en periodos anteriores. En periodos anteriores se realizó el proceso para el ingreso y salida de los elementos adquiridos y entregados instalados en sitio, para los Municipios de San Juanito y El Calvario.
15. Las demás que resulten de la descripción técnica establecida.	Se ha cumplido con las demás requeridas por esta supervisión.

Conforme a lo anterior descrito y de acuerdo al cronograma de trabajo aprobado por esta supervisión, se relaciona el seguimiento realizado a la fecha del presente informe, así:

PRESUPUESTO DE CANTIDADES DE PROPUESTA ECONÓMICA				PESOS PORCENTUALES							FECHA CORTE:		16-dic-25		AVANCE (%)		37,72%
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL COMPONENTE	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO,	TOTAL	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO,	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN DEL ÍTEM	ACUMULADO TOTAL POR PESO PORCENTUAL FINANCIERO
1	**COMPONENTE CCTV MUNICIPIO EL CALVARIO**			**24,83%**													**13,63%**
	PUNTO DE CÁMARA			**13,60%**													**11,24%**
1.1	Suministro e Instalación Poste Tipo 3	UNID	8,00	1,51%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	8	8	8		8	100,00 %	1,51%
1.2	Suministro e Instalación Gabinete de poste	UNID	8,00	1,11%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	8	8	8		8	100,00 %	1,11%
1.3	Suministro e Instalación Switch para Cámaras en gabinete de 4 puertos	UNID	8,00	0,85%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	8					20,00%	0,17%
1.4	Suministro e Instalación UPS 1,5 Kva (Cámara)	UNID	8,00	0,84%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	8	8	8	8	8	100,00 %	0,84%
1.5	Suministro e Instalación Brazo Soporte para Cámaras	UNID	8,00	0,15%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	8	8	8		8	100,00 %	0,15%
1.6	Suministro e Instalación Cámara Domo PTZ Tipo 2	UNID	8,00	3,55%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	8	8	8	8	8	100,00 %	3,55%
1.7	Suministro e Instalación Cámara Fija Tipo 1 (Seguridad Instalaciones Estación de Policía)	UNID	5,00	0,58%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	5					20,00%	0,12%
1.8	Suministro e Instalación Corona antiescalatoria	UNID	8,00	0,12%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	8	8	8		8	100,00 %	0,12%
1.9	Suministro e Instalación Fibra óptica Monomodo	ML	1.500,00	1,49%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1500	1500	1500	1500	1500	100,00 %	1,49%
1.10	Suministro e Instalación Sistema puesta a tierra Punto de cámara	UNID	8,00	0,66%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	8	8	8	8	8	100,00 %	0,66%
1.11	Suministro e Instalación Canalización eléctrica de cámara	UNID	8,00	1,22%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	8	8	8		8	100,00 %	1,22%

PRESUPUESTO DE CANTIDADES DE PROPUESTA ECONÓMICA				PESOS PORCENTUALES							FECHA CORTE:		16-dic-25		AVANCE (%)		37,72%
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL COMPONENTE	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO,	TOTAL	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO,	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN DEL ÍTEM	ACUMULADO TOTAL POR PESO PORCENTUAL FINANCIERO
1.12	Suministro e Instalación Equipo de Transmisión y Recepción de Microondas	UNID	2,00	1,51%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	2					20,00%	0,30%
	SALA DE CONTROL			6,88%													**1,38%**
1.13	Suministro e Instalación Software de visualización, control y administración	UNID	1,00	0,33%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,07%
1.14	Suministro e Instalación Joystick de Operación	UNID	1,00	0,28%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,06%
1.15	Suministro e Instalación Computador Workstation	UNID	1,00	1,07%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,21%
1.16	Suministro e Instalación Impresora Multifuncional	UNID	1,00	0,23%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,05%
1.17	Suministro e Instalación Monitor de visualización 80"	UNID	1,00	0,99%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,20%
1.18	Suministro e Instalación Aire acondicionado 12000 Btu	UNID	1,00	0,08%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,02%
1.19	Suministro e Instalación Puntos de cableado estructurado	UNID	8,00	0,39%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	8					20,00%	0,08%
1.20	Puntos de energía eléctrica normal	UNID	8,00	0,30%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	8					20,00%	0,06%
1.21	Puntos de energía eléctrica regulada	UNID	8,00	0,30%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	8					20,00%	0,06%
1.22	Sistema puesta a tierra (para todos los elementos)	UNID	1,00	0,06%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,01%
1.23	Suministro e Instalación Módulos - Puesto de trabajo	UNID	1,00	0,11%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	1					20,00%	0,02%
1.24	Suministro e Instalación Sistema de detección de incendios, estación manual, extintor, luz estroboscópica y control de acceso.	UNID	1,00	1,08%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,22%
1.25	Suministro e Instalación Control de acceso facial	UNID	1,00	0,18%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,04%
1.26	Suministro e Instalación Sistema de Apertura	UNID	1,00	0,10%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,02%
1.27	Adaptación centro de monitoreo y cuarto de equipos	UNID	1,00	1,39%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	1					20,00%	0,28%
	CUARTO DE EQUIPOS			4,35%													**1,00%**
1.28	Suministro e Instalación Sistema de Almacenamiento	UND	1,00	1,24%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,25%
1.29	Suministro e Instalación Switch 24 Puertos	UND	1,00	0,24%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,05%
1.30	Suministro e Instalación Gabinete Equipos Cuarto de Equipos	UND	1,00	0,59%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	1					20,00%	0,12%
1.31	Suministro e Instalación UPS 6 Kva	UND	1,00	0,34%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1	1				60,00%	0,20%
1.32	Suministro e Instalación Planta Eléctrica 15 kva	UND	1,00	1,94%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,39%
2	**COMPONENTE CCTV MUNICIPIO SAN JUANITO**			23,84%													**13,83%**
	PUNTO DE CÁMARA			12,58%													**11,44%**
2.1	Suministro e Instalación Poste Tipo 3	UNID	8,00	1,51%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	8	8	8		8	100,00 %	1,51%

PRESUPUESTO DE CANTIDADES DE PROPUESTA ECONÓMICA				PESOS PORCENTUALES							FECHA CORTE:		16-dic-25		AVANCE (%)		37,72%
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL COMPONENTE	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO,	TOTAL	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO,	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN DEL ÍTEM	ACUMULADO TOTAL POR PESO PORCENTUAL FINANCIERO
2.2	Suministro e Instalación Gabinete de poste	UNID	8,00	1,11%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	8	8	8		8	100,00 %	1,11%
2.3	Suministro e Instalación Switch para Cámaras en gabinete de 4 puertos	UNID	8,00	0,85%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	8					20,00%	0,17%
2.4	Suministro e Instalación UPS 1,5 Kva (Cámara)	UNID	8,00	0,84%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	8	8	8	8	8	100,00 %	0,84%
2.5	Suministro e Instalación Brazo Soporte para Cámaras	UNID	8,00	0,15%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	8	8	8		8	100,00 %	0,15%
2.6	Suministro e Instalación Cámara Domo PTZ Tipo 2	UNID	8,00	3,55%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	8	8	8	8	8	100,00 %	3,55%
2.7	Suministro e Instalación Cámara Fija Tipo 1 (Seguridad Instalaciones Estación de Policía)	UNID	5,00	0,58%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	5					20,00%	0,12%
2.8	Suministro e Instalación Corona antiescalatoria	UNID	8,00	0,12%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	8	8	8		8	100,00 %	0,12%
2.9	Suministro e Instalación Fibra óptica Monomodo	ML	2.000,00	1,99%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	2000	2000	2000	2000	2000	100,00 %	1,99%
2.10	Suministro e Instalación Sistema puesta a tierra Punto de cámara	UNID	8,00	0,66%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	8	8	8	8	8	100,00 %	0,66%
2.11	Suministro e Instalación Canalización eléctrica de cámara	UNID	8,00	1,22%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	8	8	8		8	100,00 %	1,22%
	SALA DE CONTROL			6,91%													**1,38%**
2.12	Suministro e Instalación Software de visualización, control y administración	UNID	1,00	0,33%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,07%
2.13	Suministro e Instalación Joystick de Operación	UNID	1,00	0,28%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,06%
2.14	Suministro e Instalación Computador Workstation	UNID	1,00	1,07%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,21%
2.15	Suministro e Instalación Impresora Multifuncional	UNID	1,00	0,23%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,05%
2.16	Suministro e Instalación Monitor de visualización 80"	UNID	1,00	0,99%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,20%
2.17	Suministro e Instalación Aire acondicionado 12000 Btu	UNID	1,00	0,08%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,02%
2.18	Suministro e Instalación Puntos de cableado estructurado	UNID	8,00	0,39%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	8					20,00%	0,08%
2.19	Puntos de energía eléctrica normal	UNID	8,00	0,30%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	8					20,00%	0,06%
2.20	Puntos de energía eléctrica regulada	UNID	8,00	0,30%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	8					20,00%	0,06%
2.21	Sistema puesta a tierra (para todos los elementos)	UNID	1,00	0,08%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,02%
2.22	Suministro e Instalación Módulos - Puesto de trabajo	UNID	1,00	0,11%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	1					20,00%	0,02%
2.23	Suministro e Instalación Sistema de detección de incendios, estación manual, extintor, luz estroboscópica y control de acceso.	UNID	1,00	1,08%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,22%
2.24	Suministro e Instalación Control de acceso facial	UNID	1,00	0,18%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,04%
2.25	Suministro e Instalación Sistema de Apertura	UNID	1,00	0,10%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,02%

PRESUPUESTO DE CANTIDADES DE PROPUESTA ECONÓMICA				PESOS PORCENTUALES							FECHA CORTE:		16-dic-25		AVANCE (%)		37,72%
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL COMPONENTE	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO,	TOTAL	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO,	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN DEL ÍTEM	ACUMULADO TOTAL POR PESO PORCENTUAL FINANCIERO
2.26	Adaptación centro de monitoreo y cuarto de equipos	UNID	1,00	1,39%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	1					20,00%	0,28%
	CUARTO DE EQUIPOS			4,35%													**1,00%**
2.27	Suministro e Instalación Sistema de Almacenamiento	UND	1,00	1,24%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,25%
2.28	Suministro e Instalación Switch 24 Puertos	UND	1,00	0,24%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,05%
2.29	Suministro e Instalación Gabinete Equipos Cuarto de Equipos	UND	1,00	0,59%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	1					20,00%	0,12%
2.30	Suministro e Instalación UPS 6 Kva	UND	1,00	0,34%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1	1				60,00%	0,20%
2.31	Suministro e Instalación Planta Eléctrica 15 kva	UND	1,00	1,94%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,39%
3	**COMPONENTE CCTV MUNICIPIO VILLAVICENCIO ESTADIO**			25,81%													**5,16%**
	PUNTO DE CÁMARA			8,22%													**1,64%**
3.1	Suministro e instalación postes tipo 2	UNID	4,00	1,04%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	4					20,00%	0,21%
3.2	Suministro e instalación gabinetes de poste/fachada	UNID	5,00	0,63%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	5					20,00%	0,13%
3.3	Suministro e instalación switch para cámaras en gabinete (4 puertos base t)	UNID	4,00	0,42%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	4					20,00%	0,08%
3.4	Suministro e instalación switch para cámaras en gabinete (8 puertos base t)	UNID	1,00	0,16%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,03%
3.5	Suministro e instalación UPS 2 kva (para cámara)	UNID	4,00	0,33%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	4					20,00%	0,07%
3.6	Suministro e instalación UPS 3kva para cámaras para el cai	UNID	1,00	0,12%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,02%
3.7	Suministro e instalación UPS 10kva trifasica	UNID	1,00	0,65%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,13%
3.8	Suministro e instalación brazos de soporte para cámaras coronas	UNID	4,00	0,07%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	4					20,00%	0,01%
3.9	Suministro e instalación cámaras domo PTZ. tipo 2.	UNID	4,00	1,58%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	4					20,00%	0,32%
3.10	Suministro e instalación cámara fija tipo 1	UNID	12,00	1,09%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	12					20,00%	0,22%
3.11	Suministro e instalación coronas antiescalatorias	UNID	4,00	0,06%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	4					20,00%	0,01%
3.12	Suministro e instalación fibra óptica monomodo	ML	1.136,00	0,99%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1136					20,00%	0,20%
3.13	Suministro e instalación sistemas de puesta a tierra	UNID	5,00	0,30%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	5					20,00%	0,06%
3.14	Suministro e instalación canalización eléctrica de cámaras y nodos	UNID	5,00	0,76%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	5					20,00%	0,15%
	CENTRO DE CONTROL Y MANDO - CCM			7,00%													**1,40%**
3.15	Suministro e instalación monitor de visualización para videowall	UNID	4,00	2,48%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	4					20,00%	0,50%
3.16	Suministro e instalación software de visualización, control y administración	UNID	1,00	0,31%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,06%

PRESUPUESTO DE CANTIDADES DE PROPUESTA ECONÓMICA				PESOS PORCENTUALES							FECHA CORTE:		16-dic-25		AVANCE (%)		37,72%
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL COMPONENTE	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO,	TOTAL	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO,	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN DEL ÍTEM	ACUMULADO TOTAL POR PESO PORCENTUAL FINANCIERO
3.17	Suministro e instalación joystick de operación	UNID	2,00	0,56%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	2					20,00%	0,11%
3.18	Suministro e instalación computador workstation	UNID	2,00	2,15%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	2					20,00%	0,43%
3.19	Suministro e instalación computador all in one	UNID	4,00	0,44%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	4					20,00%	0,09%
3.20	Suministro e instalación monitor operador cctv	UNID	1,00	0,04%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,01%
3.21	Suministro e instalación aire acondicionado 36.000 btu	UNID	1,00	0,26%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,05%
3.22	Suministro e instalación puntos de cableado estructurado	UNID	2,00	0,09%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	2					20,00%	0,02%
3.23	Suministro e instalación puntos de energía eléctrica normal	UNID	4,00	0,15%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	4					20,00%	0,03%
3.24	Suministro e instalación puntos de energía eléctrica regulada	UNID	4,00	0,15%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	4					20,00%	0,03%
3.25	Suministro e instalación módulos - puestos de trabajo	UNID	1,00	0,11%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	1					20,00%	0,02%
3.26	Suministro e instalación sistema de apertura	UNID	1,00	0,10%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,02%
3.27	Suministro e instalación lector de acceso facial a la sala de control	UNID	1,00	0,18%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,04%
	PUNTO DE VISUALIZACIÓN TERRITORIAL, NODOS Y KIT CAI´S				2,81%												**0,56%**
3.28	Suministro e instalación punto de visualización entidad territorial tipo 1 (CAI popular)	UND	1,00	1,92%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,38%
3.29	Suministro e instalación kit seguridad CAI's y/o estaciones de policía	UND	1,00	0,89%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,18%
	SOLUCIÓN DE ANALÍTICAS Y RECONOCIMIENTO FACIAL			7,78%													**1,56%**
3.28	Suministro e instalación software de analítica avanzada (comportamental)	UND	16,00	0,41%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	16					20,00%	0,08%
3.29	Suministro e instalación licenciamiento de reconocimiento facial	UND	12,00	0,98%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	12					20,00%	0,20%
3.30	Suministro e instalación licenciamiento base de datos 50,000 sujetos para reconocimiento facial	UND	1,00	2,35%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,47%
3.30	Suministro e instalación servidor para reconocimiento facial	UND	1,00	3,43%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,69%
3.31	Suministro e instalación software de gestion centralizada para procesamiento e integracion de millones de rostros	UND	1,00	0,61%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,12%
4	**COMPONENTE PROYECTO LPR VILLAVICENCIO**			**25,52%**													**5,10%**
	PUNTO DE CÁMARA			11,99%													**2,40%**
4.1	Suministro e instalación cámara fija para reconocimiento de placas – LPR en borde	UND	12,00	2,67%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	12					20,00%	0,53%

PRESUPUESTO DE CANTIDADES DE PROPUESTA ECONÓMICA				PESOS PORCENTUALES							FECHA CORTE:		16-dic-25		AVANCE (%)		37,72%
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL COMPONENTE	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO,	TOTAL	VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN INICIAL	IMPORTACION Y/O ENTREGA, ENTRADA Y/O REVISIÓN	MONTAJE, ENSAMBLAJE, SERVICIOS Y/U OBRAS	CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y/O PUESTA EN MARCHA	TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO,	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN DEL ÍTEM	ACUMULADO TOTAL POR PESO PORCENTUAL FINANCIERO
4.2	Suministro e instalación postes tipo 1 e instalación	UND	7,00	1,24%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	7					20,00%	0,25%
4.3	Suministro e instalación gabinetes de poste/fachada	UND	7,00	0,89%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	7					20,00%	0,18%
4.4	Suministro e instalación cámaras domo PTZ. tipo 2.	UND	6,00	2,37%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	6					20,00%	0,47%
4.5	Suministro e instalación UPS 2kva kva para cámaras	UND	7,00	0,58%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	7					20,00%	0,12%
4.6	Suministro e instalación brazos de soporte para cámaras coronas	UND	7,00	0,13%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	7					20,00%	0,03%
4.7	Suministro e instalación coronas antiescalatorias	UND	7,00	0,11%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	7					20,00%	0,02%
4.8	Suministro e instalación fibra óptica monomodo	ML	2.899,00	2,53%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	2899					20,00%	0,51%
4.9	Suministro e instalación sistemas de puesta a tierra	UND	7,00	0,42%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	7					20,00%	0,08%
4.10	Suministro e instalación canalización eléctrica de cámaras y nodos	UND	7,00	1,07%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	7					20,00%	0,21%
	CENTRO DE CONTROL Y MANDO - CCM			7,15%													**1,43%**
4.1	Suministro e instalación cámara fija para reconocimiento de placas – LPR en borde	UND	7,00	0,74%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	7					20,00%	0,15%
4.2	Suministro e instalación postes tipo 1 e instalación	UND	4,00	2,48%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	4					20,00%	0,50%
4.3	Suministro e instalación gabinetes de poste/fachada	UND	2,00	0,56%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	2					20,00%	0,11%
4.4	Suministro e instalación cámaras domo PTZ. tipo 2.	UND	2,00	2,15%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	2					20,00%	0,43%
4.5	Suministro e instalación UPS 2kva kva para cámaras	UND	4,00	0,44%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	4					20,00%	0,09%
4.6	Suministro e instalación brazos de soporte para cámaras coronas	UND	4,00	0,14%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	4					20,00%	0,03%
4.7	Suministro e instalación coronas antiescalatorias	UND	1,00	0,26%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	1					20,00%	0,05%
4.8	Suministro e instalación fibra óptica monomodo	UND	1,00	0,11%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,02%
4.9	Suministro e instalación sistemas de puesta a tierra	UND	1,00	0,10%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,02%
4.10	Suministro e instalación canalización eléctrica de cámaras y nodos	UND	1,00	0,18%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	1					20,00%	0,04%
	SOLUCIÓN DE ANALÍTICAS Y RECONOCIMIENTO FACIAL			6,38%													**1,28%**
4.1	Suministro e instalación solución LPR en borde	UND	12,00	2,10%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	12					20,00%	0,42%
4.2	Suministro e instalación servidor LPR	UND	1,00	3,43%	20%	40%	20%	10%	10%	**100%**	1					20,00%	0,69%
4.3	Suministro e instalación brazo de soporte para cámara LPR (para uso en poste)	UND	7,00	0,85%	20%	40%	30%	0%	10%	**100%**	7					20,00%	0,17%
	VALOR TOTAL			100,00 %											**TOTAL AVANCE ACUMULADO**		**37,72%**

Nota: El avance del ítem 27 "Adaptación centro de monitoreo y cuarto de equipos" del **COMPONENTE CCTV MUNICIPIO EL CALVARIO,** no se computa en este periodo, dado que debido a la suspensión del contrato no se realizado la validación en sitio. Luego del reinicio se realizará la respectiva validación y se autorizará el computo del avance, conforme a la matriz de seguimiento anterior. Por tanto, a fecha del corte 24 de diciembre de 2025 (acta de suspensión No. 01), se mantiene un avance en la ejecución del contrato del 37,72%.

AVANCE PORCENTUAL POR MUNICIPIO Y/O COMPONENTE DEL PROYECTO

De igual forma se puede observar en la misma tabla los avances en las actividades programadas por municipio y/o componente, teniendo en cuenta el "**PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL COMPONENTE",** así:

COMPONENTE	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE CCTV MUNICIPIO EL CALVARIO	**54,88%**	Visitas técnicas, documentación técnica inicial, adquisición, entrega en sitio e instalación de 8 postes tipo 3, 8 camaras PTZ, 8 brazos soportes para cámara ptz, 8 gabinetes de poste, 8 ups de 2kva, 8 coronas antiescalatoria, 8 canalizaciones eléctricas y de datos para punto de camara, 8 sistemas de puesta a tierra para punto de camara; y la entrega y puesta en sitio de UPS de 6kva.
COMPONENTE CCTV MUNICIPIO SAN JUANITO	**58,00%**	Visitas técnicas, documentación técnica inicial, adquisición, entrega en sitio e instalación de 8 postes tipo 3, 8 camaras PTZ, 8 brazos soportes para cámara ptz, 8 gabinetes de poste, 8 ups de 2kva, 8 coronas antiescalatoria, 8 canalizaciones eléctricas y de datos para punto de camara, 8 sistemas de puesta a tierra para punto de camara; y la entrega y puesta en sitio de UPS de 6kva
COMPONENTE CCTV MUNICIPIO VILLAVICENCIO ESTADIO	**20,00%**	Visitas de inspección, levantamiento de información y documentación técnica inicial (KMZ) Actualizada.
COMPONENTE PROYECTO LPR VILLAVICENCIO	**20,00%**	Visitas de inspección, levantamiento de información y documentación técnica inicial (KMZ) Actualizada.

Nota:** Resulta de dividir el **PESO PORCENTUAL FINANCIERO TOTAL DEL COMPONENTE** entre el **ACUMULADO TOTAL POR PESO PORCENTUAL FINANCIERO.

Asimismo, se valida que el personal mínimo requerido, que hace parte de la ejecución contractual, se encuentra vinculado al proyecto y que se acredita el pago de la seguridad social correspondiente del personal, de la siguiente manera:

CARGO	NOMBRE	% DEDICACIÓN
DIRECTOR DEL PROYECTO	JULIÁN ANDRÉS LOZANO FLÓREZ	50%
RESIDENTE DEL PROYECTO	CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ LANDINEZ	100%
INGENIERO DE APOYO	FREDDY ALEXANDER ACOSTA BERNAL	100%
TECNICO DE APOYO	BREZHNEV LEONARDO CHIA GOMEZ	100%
TÉCNICO DEL PROYECTO	DIEGO ALEXANDER RIVERA AVILEZ	100%
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ANGY NATHALI MORENO GUTIERREZ	100%
CONSULTOR DE SEGURIDAD	FABIAN GUZMAN SOTO	N/A

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO:

Se valida el cumplimiento del pago de la seguridad social del personal mínimo requerido. A continuación, se detalla el pago correspondiente a cada integrante del personal durante el período del presente corte, manteniéndose el personal ofertado en el contrato, así:

CARGO	DIRECTOR DEL PROYECTO
NOMBRE Y APELLIDOS	JULIÁN ANDRÉS LOZANO FLÓREZ
MES	**NOVIEMBRE**
No. DE PLANILLA	**9496484018**
SALUD	$196,800
PENSION	$786,900
ARL	$214,000

CARGO	RESIDENTE DEL PROYECTO
NOMBRE Y APELLIDOS	CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ LANDINEZ
MES	**NOVIEMBRE**
No. DE PLANILLA	**1749792018**
SALUD	$ 178.000
PENSION	$ 227.800
ARL	$ 34.700

CARGO	INENIERO DE APOYO
NOMBRE Y APELLIDOS	**FREDDY ALEXANDER ACOSTA BERNAL**
MES	**NOVIEMBRE**
No. DE PLANILLA	**91712091**
SALUD	**185.000**
PENSION	**236.800**
ARL	**7.800**

CARGO	TECNICO DE APOYO
NOMBRE Y APELLIDOS	BREZHNEV LEONARDO CHIA GOMEZ
MES	**NOVIEMBRE**
No. DE PLANILLA	**9496484018**
SALUD	$96,200
PENSION	$384,700
ARL	$167,400

CARGO	TÉCNICO DEL PROYECTO
NOMBRE Y APELLIDOS	DIEGO ALEXANDER RIVERA AVILEZ
MES	**NOVIEMBRE**
No. DE PLANILLA	**9496484018**
SALUD	$96,200
PENSION	$384,700
ARL	$167,400

CARGO	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NOMBRE Y APELLIDOS	ANGY NATHALI MORENO GUTIERREZ
MES	**NOVIEMBRE**
No. DE PLANILLA	**1749666845**
SALUD	$ 178.000
PENSION	$ 227.800
ARL	$ 34.700

CARGO	**CONSULTOR EN SEGURIDAD**
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIAN GUZMAN SOTO
MES	**NOVIEMBRE**
No. DE PLANILLA	**9496484018**
SALUD	$218,600
PENSION	$874,300
ARL	$380,300

Nota: El Decreto 780 de 2016 (Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social), específicamente en su Artículo 3.2.2.1., modificado por el Decreto 1990 de 2016, establece que el pago de los aportes se realiza de manera mensual y mes vencido, dentro de unas fechas límite que se determinan con base en los dos últimos dígitos del NIT o Cédula de Ciudadanía del aportante (empresa o independiente). Por lo que se validan las últimas planillas disponibles, garantizando el estado activo de cada uno de los miembros del personal mínimo requerido.

ÍTEMS EJECUTADOS EN EL PRESENTE PERIODO:




Se reporta avances en los siguientes ítems ejecutados durante el período comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025, los cuales se relacionan a continuación:


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	COMPONENTE CCTV MUNICIPIO EL CALVARIO				
	Sala de Control				
27	Adaptación centro de monitoreo y cuarto de equipos	UNID	1	$ 54.300.000	$ 54.300.000

Nota: El avance del ítem 27 "Adaptación centro de monitoreo y cuarto de equipos" del **COMPONENTE CCTV MUNICIPIO EL CALVARIO,** no se computa en este periodo, dado que debido a la suspensión del contrato no se realizado la validación en sitio. Luego del reinicio se realizará la respectiva validación y se autorizará el cómputo del avance, conforme a la matriz de seguimiento aprobada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SUPERVISIÓN EJERCIDA

Se relaciona el registro fotográfico mediante el cual se valida el cumplimiento de las actividades e ítems relacionados en el presente informe, así:

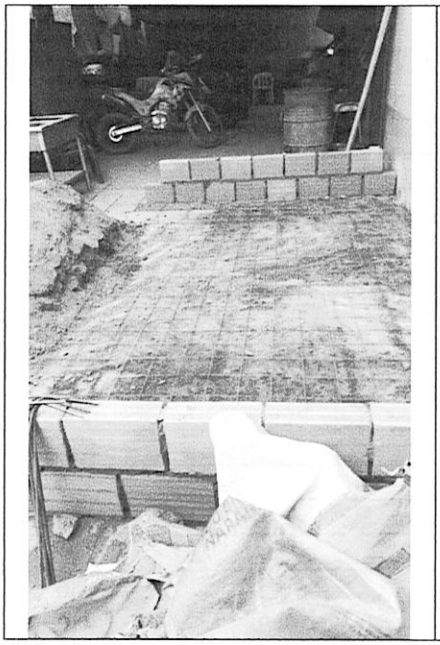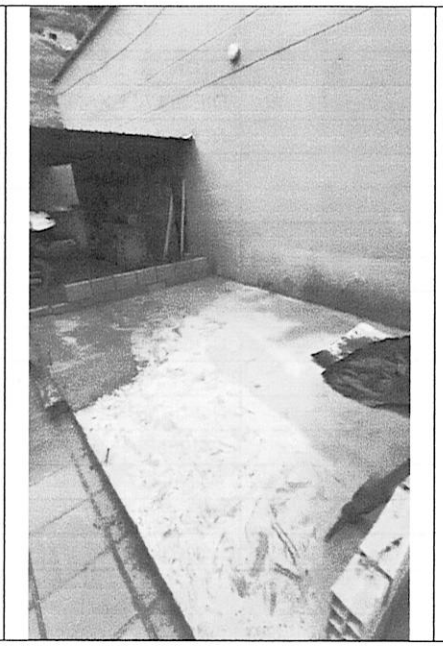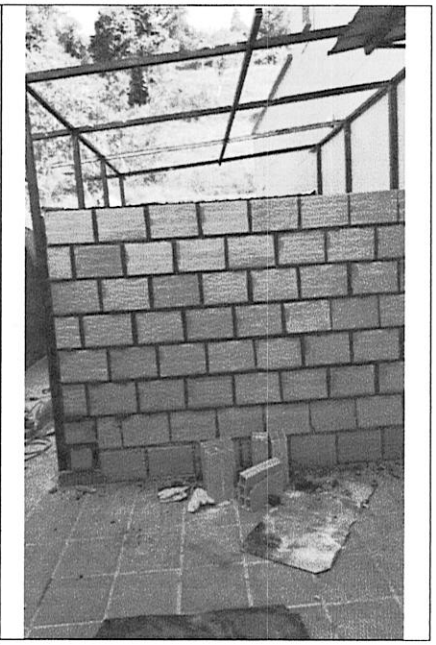

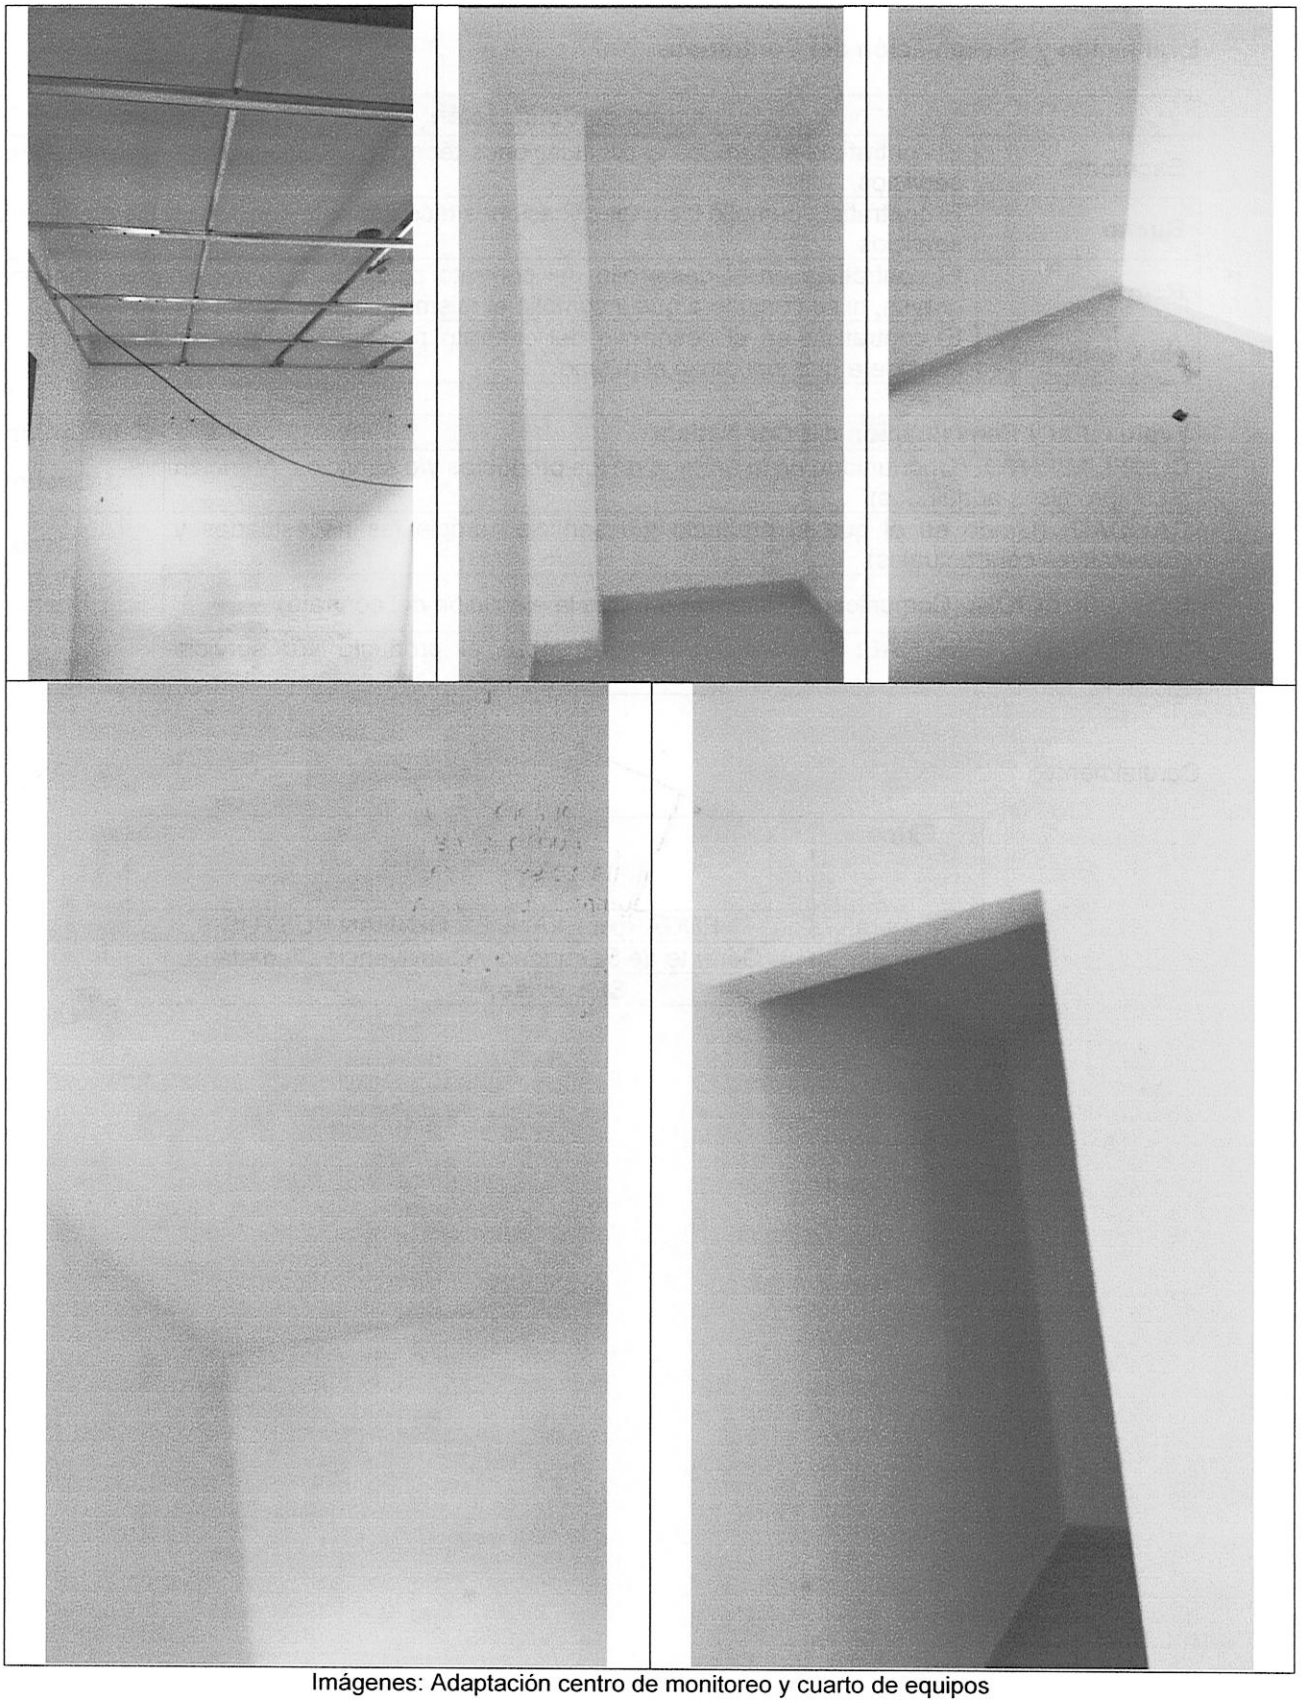Imágenes: Adaptación centro de monitoreo y cuarto de equipos

Evaluación y Reevaluación del Contratista

Rango de Calificación	
Excelente	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Bueno	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Regular	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
No Cumple	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

Evaluación y Reevaluación del Contratista	**Calificación**
CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Bueno
CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Bueno
COMUNICACIÓN: (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Bueno
EVALUACIÓN GENERAL: (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Bueno

Cordialmente;

Firma:	
Nombre:	EDGAR ALEXANDER QUITIÁN BUSTOS
Cargo:	Gerente de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Supervisor	
