INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

CÓDIGO:	F-PCT-008
VERSIÓN:	11
FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	18 DE FEBRERO DE 2026				
INFORME No.	3	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	19/01/2026	Y EL	18/02/2026

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA U'WA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES Y AUTÓNOMOS EN VIVIENDAS TRADICIONALES Y ANCESTRALES U'WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO,DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	SEIS (06) MESES
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 654.424.761,25
PROCESO No.:	CI-007-2025	FECHA DE INICIO:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO No.:	01302 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 DE MAYO DE 2026
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CERRITO	LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE CERRITO
NIT CONTRATISTA:	890.209.889-9	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ - SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
LINK DE PROCESO	<Insertar link del proceso contractual >	APOYO SUPERVISIÓN	SAUL ANTONIO CORTES DURAN

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Inicio Contrato	19/11/2025	19/11/2025	18/05/2026	6 MESES		18/05/2026	Si	

PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)	6 MESES	
% AVANCE FISICO	8%	

1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	No. 96-44-101200856	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	2	CUMPLIMIENTO	19/11/2025	19/11/2026	$ 130.884.952.20
				PAGO DE SALARIOS			
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS			
				CALIDAD DEL SERVICIO			
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL				PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			

2. EJECUCION PRESUPUESTAL

ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00
APORTE (CAS): <si aplica>	
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 654.424.761,25
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 654.424.761,25
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 654.424.761,25
VALOR PAGADO:	$ 196.327.428,00
VALOR POR PAGAR:	$ 458.097.333,25
% POR PAGAR	70,00%
% AVANCE FINANCIERO	30,00%

ADICIONES


CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL DE ADICIONES		$ -

2,1. SITUACION FINANCIERA

CONTRATO DE <Interventoria , Obra,Consultoría, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, otro>

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Parcial No 01	17 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 196.327.428,00
TOTAL		$ 196.327.428,00

3. CURVA "S"

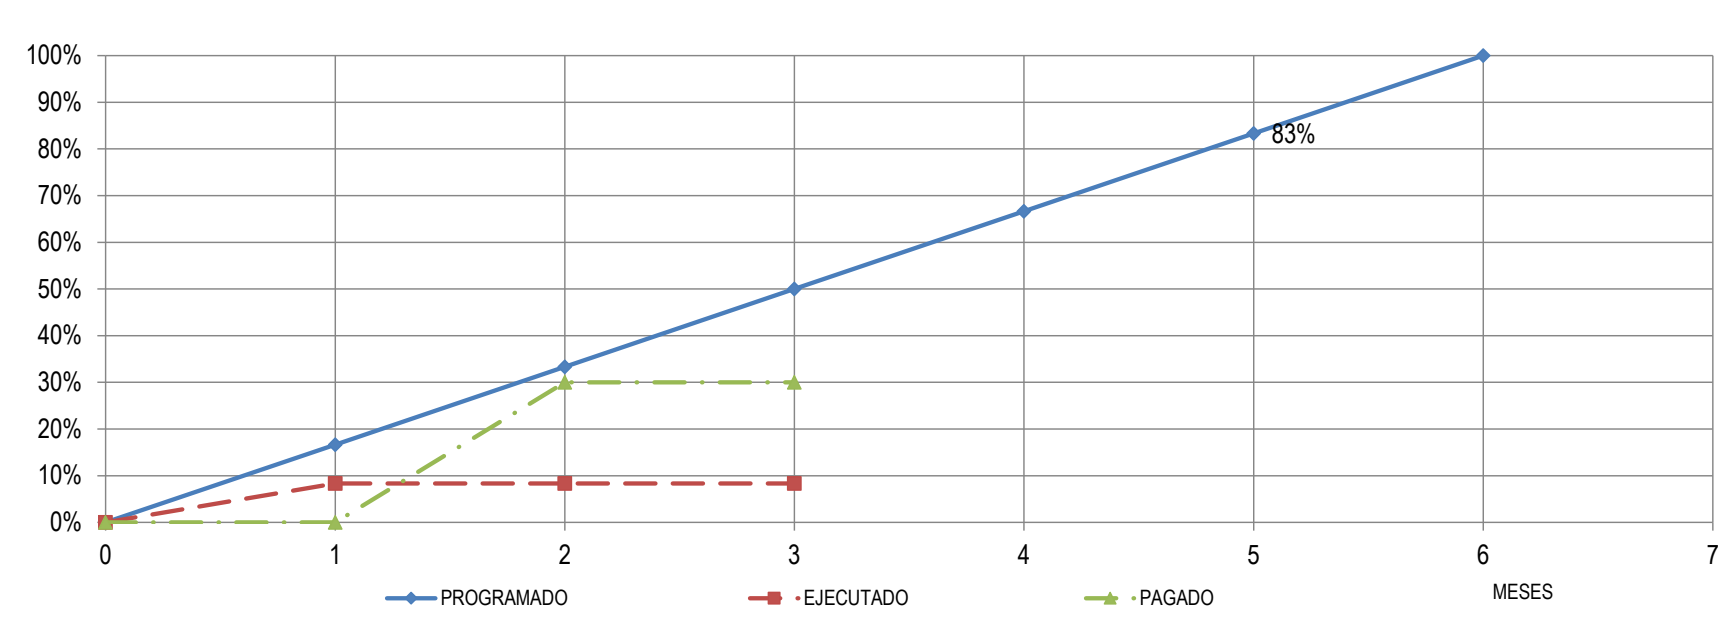

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	PAGADO
0	0%	0%	0%
1	17%	8%	0%
2	33%	8%	30%
3	50%	8%	30%
4	67%		
5	83%		
6	100%		

PROGRAMADO	50%	
EJECUTADO	8%	
ATRASOS	-42%	
DESEMPEÑO	●	0,17
% PAGADO	30%	
Cancelado	-$	196.327.428,00
Pendiente por cancelar	$	458.097.333,25
Índice de avance financiero	●	

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

En ejercicio de las funciones de supervisión asignadas, la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS emitió el oficio No. SPL.33.2026, mediante el cual requirió al municipio el cumplimiento de las obligaciones iniciales previstas en el convenio.

En ejercicio de las funciones de supervisión asignadas, la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS convocó al municipio, mediante oficio No. SPL.151.2026, a una mesa de trabajo virtual con el fin de revisar el estado de cumplimiento de las obligaciones previstas en el convenio.

En ejercicio de las funciones de supervisión asignadas, la CAS realizó la mesa técnica No. 1 (comité 1), en la cual el Municipio de Cerrito informó que remitirá oficio con las fechas proyectadas para la contratación de los derivados (obra e interventoría) y la posible solicitud de prórroga del convenio.

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

 OFICIO No. SPL.33.2026 REMITIDO AL MUNICIPIO	 COMITÉ TECNICO No. 1	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
 OFICIO No. SPL.151.2026 REMITIDO AL MUNICIPIO	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR
Nombre: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	ANGIE MICHELLE ROJAS LEÓN	CONTRATISTA-SPL	
REVISO:	SAUL ANTONIO CORTES DURAN	CONTRATISTA-SPL	
