INFORME DE INTERVENTORIA No. 34

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005-2022

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.003-2022

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

INTERVENTOR:CONSORCIO INTERGUACARI

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

INFORME DE INTERVENTORIA No. 34

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005-2022

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.003-2022

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

INTERVENTOR:CONSORCIO INTERGUACARI

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

FECHA: FEBRERO 28 DE 2026

NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

CARGO : REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA



FIRMA: _____
Representante de la Interventoria

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**		
FECHA:	**FEBRERO 28 DE 2026**	**PERIODO:**	**01 AL 28 DE FEBRE**
INFORME No.	**34**		

CONTRATO: 2000.13.12.005-2022

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES
1	INFORMACION GENERAL	S	S	
1.1	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	S	S	
2	CONTROL DE GARANTIAS	S	S	
2.1	SANCIONES	N	N	
3	CONTROL FINANCIERO	S	S	
4	CONTROL DE EJECUCION	S	S	
4,1	CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO	s	S	
5	ANEXOS	S	S	
5.1	ASPECTOS TECNICOS	S	S	
5.2	CONTROL DE CALIDAD	S	S	
5.3	ASPECTOS AMBIENTALES	S	S	
5.4	ASPECTOS SOCIALES	S	S	
5.5	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS	S	S	
5.6	RECURSO HUMANO	S	S	
5.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	S	S	

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**

INFORME No 34	PERIODO: 01 AL 2

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE P
"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DE
PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUC

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO	ESP

1. INFORMACION GENERAL

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA	1.2 CONTRATO OBJETO DE LA
CONTRATO No. 2000.13.12.005-2022	CONTRATO No. 2000.13.05.003-
OBJETO DEL CONTRATO:REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA No. 2000.46.01 .005-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA	OBJETO DEL CONTRATO: EJEC PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDA PARA "CONSTRUCCION DEL SI ADUCCION, CONDUCCION Y OR ALMACENAMIENTO Y PTAP PAR MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GU
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUACARI	CONTRATISTA:CONSORCIO RE
REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL: CARI
PLAZO INICIAL: 16 MESES	PLAZO INICIAL: 13 MESES
ACTA DE INICIO:01-DICIEMBRE-2022	ACTA DE INICIO:01 DICIEMBRE
VALOR INICIAL: $ 1.502.246.766	VALOR INICIAL: $ 29.432.080.933
CDR INICIAL No. 13041	CDR INICIAL No. 13039 - 13040
FECHA DE TERMINACION: 31-MAR-2024	FECHA DE TERMINACION: 01 EI
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): N/A	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO
VALOR ADICION (ES): $ 131.126.000	VALOR ADICION (ES): $N/A
CDR OTRO SI (1) No.16431	CDR OTRO SI (1) No.N/A
VALOR ACTUAL:$ 1.633.372.766	VALOR ACTUAL: $29.432.080.93
PLAZO ADICIONAL: N/A	PLAZO ADICIONAL: N/A
FECHA DE TERMINACION: N/A	FECHA DE TERMINACION: N/A
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO
VALOR ADICION (ES): $ N/A	VALOR ADICION (ES): $2.571.14

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P — PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE G SGC - MECI **INFORME DE INTERVEN**
INFORME No. 34	

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS U
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUE
DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X

1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUA

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la Ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido par La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	**SI**
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.	**SI**
Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventoria	**SI**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P — PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE G SGC - MECI **INFORME DE INTERVEN**
INFORME No. 34	

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS U
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUE
DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X

	Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)
1.	**Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez per ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta per ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el 30%de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.**	**SI**
2.	**Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación**	**SI**
3.	**Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.**	**SI**
4.	**Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.**	**SI**
5.	**Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.**	**SI**
	Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin	

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE G SGC - MECI **INFORME DE INTERVEN**	
INFORME No. 34		

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS U CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X

14.	**Informar periodicamente la composicion del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la informacion relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.**	**SI**
15.	**Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.**	**SI**
16.	**Informar a mas tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.**	**N/A**
17.	**El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001 :2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) hábiles siguientes a la suscripcion del contrato.**	**SI**
18.	**El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de obra contratada por la entidad.**	**SI**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P — PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE G SGC - MECI **INFORME DE INTERVEN**
INFORME No. 34	

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS U
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUE
DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X

27.	**Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la Ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.**	**SI**
28.	**Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.**	**SI**
29.	**Reportar la informacion relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida par el contratante.**	**SI**
30.	**Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando par su culpa se produzca daño o perdida, sin que esto excluya indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.**	**SI**
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato (i)		**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE G SGC - MECI **INFORME DE INTERVEN**
INFORME No.	34	

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS U
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUE
DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X

8. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidacion del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario.	**SI**
9. En case que la obra requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado. En todo caso, el interventor deberá aprobar previamente el remplazo.	**SI**
10. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que coadyude su personal o sus subcontratistas con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, por causa o con ocasion del contrato.	**N/A**
11. Asumir por su cuenta y riesgo, el page de los salaries, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vinculo laboral de tal personal con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, ni responsabilidad en los riesgo que se deriven de la contratacion. El contratista estará obligado a tramitar los documentos necesarios y requeridos por el consorcio para el pago del RETEICA	**SI**
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO.	
1. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el cumplimiento del personal mínimo exigido	

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE G SGC - MECI **INFORME DE INTERVEN**	
INFORME No. 34		

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS U
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUE
DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X

5. Deberá también responder por todos los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal vinculado en la ejecución del contrato. Presentar mensualmente a la interventoría un informe en el que se consigne el trabajo ejecutado en el mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias.	**SI**
6. También debe adjuntar fotografías (fecha y hora) y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados.	**N/A**
7. De presentarse atraso en la programaci6n inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma, a estos informes se les deberá adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. El informe deberá contener los avances acompañadas y por novedades gráficos, técnicas, cuadros, fotografías, administrativas, análisis y contables comentarios y financieras.	**N/A**
8. Suscribir con la interventor a de obra una bitácora diaria, en la que se llevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá foliarse y firmarse por el director de obra y por el director de interventoría. Al finalizar los trabajos, el contratista deberá entregar	**SI**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE G SGC - MECI **INFORME DE INTERVEN**
INFORME No. 34	

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS U
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUE
DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X

12. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesaria para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su efecto del interventor, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y)o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente.	**SI**
13. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras antes, durante y después de ejecutadas.	**SI**
14. Suministrar a la interventoría oportunamente las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnica acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán por cuenta del contratista de obra, a la cuenta mensual correspondiente se deberá adjuntar copia del informe mensual y los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberán ser hechos a los siguientes materiales: agregados fines y gruesos, concrete (cilindros y núcleos), sub-base o bases compactadas y todos aquellos que la interventoría o la supervisión estime	**N/A**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE G SGC - MECI **INFORME DE INTERVEN**	
INFORME No. 34		

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS U
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUE
DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X

17. Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el termino previsto; coordinando con el personal que designe VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., la ejecución del contrato en la medida que el cumplimiento de este lo demande.	**SI**
18. Cuando por causas imputables al Contratista, fuere necesario prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra, por ende, del Contrato del Interventor, el contratista deberá responder por los costos de honorarios adicionales originados por la prorroga. Lo anterior una vez se surta el debido proceso al contratista.	**N/A**
19. Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier memento que lo estime conveniente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**SI**
20. No interferir la interventoría pactada en el contrato y prestar la colaboración que la misma requiera. Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato.	**SI**
21. Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que presente la obra por deficiente ejecución o por no ceñirse a los planos y diseños propuestos y avalados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.requeridos para la construccion de la obra. Obrar con honradez y lealtad, no solo en la	**N/A**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P — PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE G SGC - MECI **INFORME DE INTERVEN**
INFORME No. 34	

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS U
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUE
DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X

29. Elaborar y ejecutar un Plan de gestión Social que acompañe a la comunidad beneficiada por las obras con un cubrimiento antes, durante y después de la ejecución las obras. Este será orientado, aprobado y supervisado por el Interventor, si aplica. EL CONTRATISTA presentara a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. todos los documentos exigidos en las consideraciones anteriores y los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:	**SI**
PLAN DE TRABAJO DE OBRA	
VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y PLANOS Y ESTADO DEL ÁREA DE TRABAJO	**SI**
PLAN DE INVERSIÓN - DEL ANTICIPO	**SI**
PLAN DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**SI**
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	**SI**
INFORME DE LABORES	**SI**
BITÁCORA	**SI**
ÍTEMS NO PREVISTOS	**SI**
INFORME FINAL	**N/A**
Deberá cumplir con las condiciones especiales para la ejecución	

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE G SGC - MECI **INFORME DE INTERVEN**
INFORME No. 34	

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS U
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUE
DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X

El Contratista deberá disponer todos los escombros producto de las respectivas demoliciones en la escombrera municipal autorizada, adicionalmente, los vehículos utilizados para el transporte de los escombros, deberá estar protegido con una Lona o similar, para evitar la caída de estos escombros en la vía.	**SI**
Los vehículos utilizados por el Contratista, deberán cumplir con las normas legales de transito, por lo cual deberá anexar en el momento de iniciar los trabajos objeto de este contrato el certificado ambiental, y certificado tecnico-mecanico.	**SI**
Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de construccion así sean de empresas de alquiler, deberá tener la respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y pensión, así como la dotación de seguridad industrial para este tipo de labores; la responsabilidad es directa del Contratista.	**SI**
Elaborar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los requerimientos mínimos establecidos por la ley, el interventor hará el seguimiento y control. Implementar el Plan de gestión Social, haciéndole el seguimiento y control que corresponde; así como también el proceso de capacitacion que acompañe y fortalezca a la comunidad beneficiada	**SI**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE G SGC - MECI **INFORME DE INTERVEN**	
INFORME No. 34		

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS U
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUE
DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X

El Contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregar a la interventoría los resultados de los mismos.	**SI**
Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato o que correspondan a una orden expresa o verbal de la contratante, en desarrollo de su facultad de direccion del contrato. En caso de que la ejecución del proyecto requiera la suspensión temporal del servicio de acueducto, el Contratista deberá informar con mínimo 2 días antes al operador del servicio y garantizar la gestión de comunicacion a la comunidad.	**SI**
EL CONTRATISTA será responsable de realizar las pruebas técnicas y ensayos a las tuberías, estructuras construidas, equipos suministrados e instalados, y a los sistemas generales que se construyan, de igual manera deberá realizar la puesta en marcha de las PTAP y/o PTAR que se construyan que se encuentran dentro del alcance del proyecto. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracion Municipal o a terceros	**SI**

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas c
en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PAP - PDA
PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA
VALLE DEL CAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE
SGC - MECI

INFORME DE INTERV

INFORME No. 34

PERIODO: 01 AL 28

2. CONTROL DE GARANTIA

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia		Amp
				Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24	**Cumpli**
SUSPENSION 1	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	30-Nov-24	SUSPEN
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	31-Dec-24	AMPLIA SUSPE
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	31-Jan-25	AMPLIA SUSPE
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Mar-25	AMPLIA SUSPE
REINICIO	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Mar-25	REIN
ADICIONAL EN VALOR	$ 163.337.276,00	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	5-Feb-24	14-Mar-25	ADICIO VAL
PLAZO ADICIONAL	$ 163.337.276,00	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	6-Sep-24	15-Oct-25	PLAZO AD
PLAZO ADICIONAL	$ 163.337.276,60	C-100050628 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	25-Mar-25	22-Aug-26	PLAZO AD
ADICIONAL EN VALOR 2	$ 232.399.756,50	C-100050628 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	9-Jul-25	22-Aug-26	ADICIONA VALOR 2
PLAZO ADICIONAL	$ 232.399.756,50	C-100050628 ANEXO 10	SEGUROS MUNDIAL	22-Feb-26	22-Feb-27	PLAZO AD
Buen Manejo del Anticipo	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24	**Buen Ma Anti**
SUSPENSION 1	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	30-Nov-24	SUSPEN

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PAP - PDA
PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA
VALLE DEL CAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE
SGC - MECI

INFORME DE INTERV

INFORME No. 34

PERIODO: 01 AL 28

2. CONTROL DE GARANTIA

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.2 CONT

PLAZO ADICIONAL	$ 81.668.638,30	C-100050628 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	25-Mar-25	22-Feb-29	PLAZO AD
ADICIONAL EN VALOR 2	$ 116.199.878,25	C-100050628 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	9-Jul-25	22-Aug-26	ADICIONA VALOR 2
PLAZO ADICIONAL	$ 116.199.878,25	C-100050628 ANEXO 10	SEGUROS MUNDIAL	22-Feb-26	22-Aug-29	PLAZO AD
Calidad del Servicio	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Mar-24	24-Mar-29	**Estab**
SUSPENSION 1	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	31-May-24	31-May-29	SUSPEN
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	30-Jun-24	30-Jun-29	AMPLIA SUSPE
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	31-Jul-24	31-Jul-29	AMPLIA SUSPE
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29	AMPLIA SUSPE
REINICIO	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29	REIN
ADICIONAL EN VALOR	$ 490.011.829,00	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29	ADICIO VAL
PLAZO ADICIONAL	$ 490.011.830,00	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	15-Apr-24	15-Apr-30	PLAZO AD
PLAZO ADICIONAL	$ 490.011.829,80	C-100050628 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	22-Feb-26	22-Feb-31	PLAZO AD
ADICIONAL EN VALOR 2	$ 697.199.269,50	C-100050628 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	22-Feb-26	22-Feb-31	ADICIONA VALOR 2
PLAZO ADICIONAL	$ 697.199.269,50	C-100050628 ANEXO 10	SEGUROS MUNDIAL	22-Aug-26	22-Aug-31	PLAZO AD

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PAP - PDA
PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA
VALLE DEL CAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE
SGC - MECI

INFORME DE INTERV

INFORME No.	34	PERIODO:	01 AL 28 D

3. CONTROL FINAN

3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA | **3.2 CONT**

Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar	Concepto
Anticipo (30%)	26/12/2022		%		$ 450.674.029,8	Anticipo (30 %)
Acta No. 1	31-May-23	$ 427.238.980	26,16%	$ 128.171.694	$ 299.067.286	Acta No. 1
Acta No. 2	30-Jun-23	$ 45.217.628	2,77%	$ 13.565.288	$ 31.652.340	Acta No. 2
Acta No. 3	30-Mar-24	$ 72.195.076	4,42%	$ 21.658.523	$ 50.536.553	Acta No. 3
Acta No. 4	14-Jun-24	$ 18.783.787	1,15%	$ 5.635.136	$ 13.148.651	Acta No. 4
Acta No. 5	20-Jun-24	$ 376.165.748	23,03%	$ 112.849.724	$ 263.316.024	Acta No. 5
Acta No. 6	16-Aug-24	$ 30.870.745	1,89%	$ 9.261.224	$ 21.609.521	Acta No. 6
Acta No. 7	13-Sep-24	$ 19.658.237	1,20%	$ 5.897.471	$13.760.766	Acta No. 7
Acta No. 8	30-Sep-24	$ 35.139.507	2,15%	$ 10.541.852	$24.597.655	Acta No. 8
Acta No. 9	12-Nov-24	$ 62.044.616	3,80%	$ 18.613.385	$43.431.231	Acta No. 9
Acta No. 10	2-Dec-24	$ 105.486.042	6,46%	$ 31.645.813	$73.840.229	Acta No. 1
Acta No. 11	1-Feb-25	$ 35.207.836	2,16%	$ 10.562.351	$24.645.485	Acta No. 1

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PAP - PDA
PROGRAMA HOJA PARA LA PROSPERIDAD
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA
VALLE DEL CAUCA


SISTEMA INTEGRADO DE GEST
SGC - MECI

INFORME DE INTERVENTO

INFORME No. 34

PERIODO: (

4. CONTROL DE EJECUCION

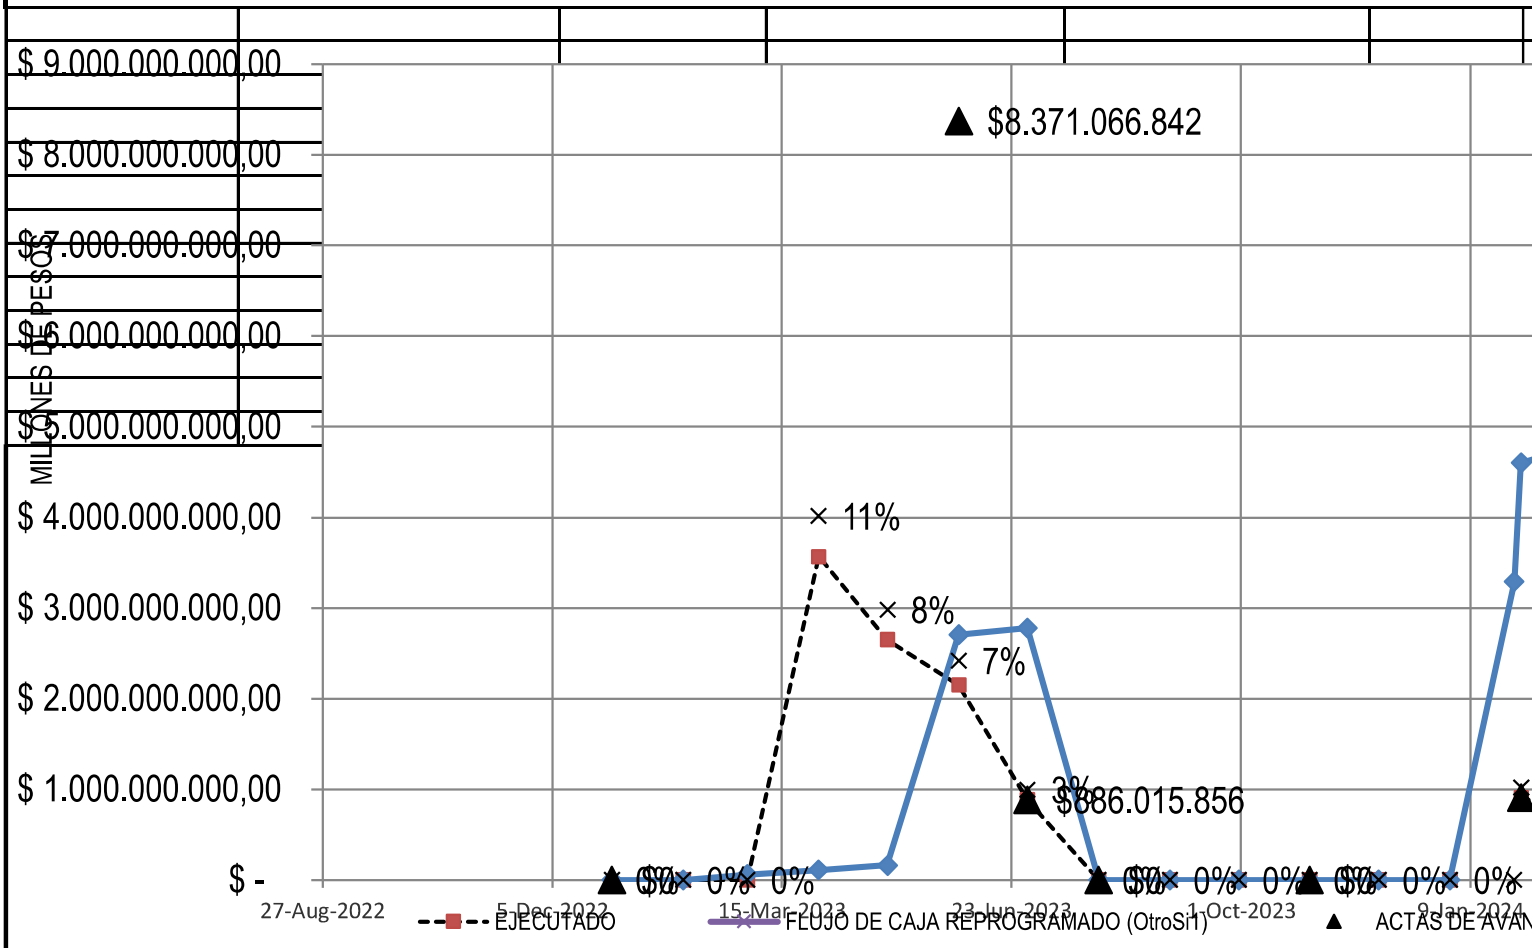

FECHA	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO (Cto Inicial)	FLUJO DE CAJA REPROGRAMADO (OtroSi1)	EJECUTADO	ACTAS DE AVANCE	%AVANCE
31-Dec-22	$ -			$ -	0,00%
31-Jan-23	$ -		$ -		0,00%
28-Feb-23	$ 62.322.903,31		$ -		0,00%
31-Mar-23	$ 111.845.778,94		$ 3.568.952.062,00		11,15%
30-Apr-23	$ 161.373.885,25		$ 2.651.489.752,00		8,29%
31-May-23	$ 2.705.571.148,99		$ 2.150.625.028,00	$ 8.371.066.842,00	6,72%

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-F Versión: 4 Fecha de Vig 01/02/2019

INFORME No. 34	PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

5. SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjunto en el último pago el certificado del Revisor Fiscal o Contador Diana Sofia Bol número de tarjeta profesional 186062-T quien certifica que el contratista CONSORCIO REDES Y PT pago conforme a la ley lo correspondiente a sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato o convenio de quienes propuesta (Si aplica). Igualmente, el contratista presentó las planillas de pago de seguridad social del se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.



Firma del Interventor Contrato No. _____

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PAP - PDA
VALLE DEL CAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE
SGC - MECI

INFORME DE INTERVE

INFORME No 34	PERIODO: 01 AL

6. ANEXOS

6.1 Aspectos Técnicos: Descripción de actividades realizadas acordes con el objeto
Bitácora).

6.2 Control de Calidad: Según especificaciones técnicas incluir información relaciona
Ensayos.

6.3 Aspectos Ambientales: Relacionar lo relacionado con Licencias Ambientales, Per
otros.

6.4 Aspectos Sociales: Relacionar documentos como actas de reuniones, constancia

6.5 Predios, Servidumbres y Permisos de Intervención: Incluir tramites prediales, se
entidades.

6.6 Recurso Humano (interventoría , contratista) : Relacionar personal utilizado pa
seg. social), plan integral de salud ocupacional

6.7 Maquinaria y Equipo (interventoría , contratista) : Relacionar la maquinaria utiliz
aplica).

6.8 Registro Fotográfico: Complementar de manera visual (si aplica) con el seguimie
fotos en alta resolución

6.9 Informe del Contratista

6. ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO

Proterritorio la continuidad con la instalacion de tuberia PEAD de 10" entre Villa Indigo a Pu
Ing. Carlos Valencia para implementar la malla Coanda, que evitara la construcción del des
Se encuentra en etapa de proyección presupuestal.

7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

• Las labores en la obra continúan desarrollándose en cuatro frentes de trabajo:

- PTAP de Guacarí: Filtración Modulo B, se termina la instalacion de tuberia en acero inoxidable entre caset
electrico.
- PTAP de Ginebra: Filtración - Se termina la impermeabilizacion de los Tanques de Almacenamiento en la
- Frente Familia Blum – Saavedra: Continuar con la instalación tubería PEAD 10 “ desde Villa Indigo hasta

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-F Versión: 4 Fecha de Vig 01/02/2019

ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS INFORME 34

I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PER

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPC
	SEDIMENTADOR No. 3 - PTAP GINEBRA	En servicio
	SEDIMENTADOR No. 2 - PTAP GINEBRA	En servicio
	SEDIMENTADOR No. 1 - PTAP GINEBRA	En servicio
	Tanque de almacenamiento La Albania y Tanque Planta PTAP GINEBRA:	Actividades por ejecutar: • Losa superior de cámaras de entrada y salida • Instalación de sistema de válvulas • Rellenos perimetrales • Instalación tubería de desagüe • Conexión al sistema existente
	FILTRACION PTAP GINEBRA:	Filtros: No. 1 , No. 02 y No. 03 se encuentran en servicio
	CASETA SOPLADORES DE FILTRACIÓN - PTAP GINEBRA:	En servicio
	MURO DE CONTENCIÓN - PTAP GINEBRA:	En comité de obra se decide que este muro no es necesario construirlo.
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN - TRAMO 2	Se termina la instalación tubería PEAD 10 ", en predio otorgado median prueba hidrostatica
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN - TRAMO 3	Ya se instaló tubería PEAD diámetro 14" en una L: 500 ml, en predio tambien a la llegada de la PTAP de Guacari. Se termina la Instalacion de presencia de roca durante la excavacion se utiliza cemento expansivo y Se instalaron los tapones para realizar la prueba hidrostática en los tram Estado General Tramo 3: se han instalado 7.567 ml en Tubería PEAD d
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN - TRAMO 01	Se inicio la instalacion de tuberia PEAD 18 " entre las abscisas K0+615 y tamaño que no sirve para rellenar, el material restante con la lluvia se vu importado. Esta en temporada de lluvias continuas . Hay acceso vehicula
		Se ejecutaron las siguientes actividades:

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**

ANEXO 2 - PRUEBAS/ENSAYOS

FECHA:	FEBRERO 28 DE 2026
MATERIAL:	
CANTIDAD PARA PRUEBA:	
NOMBRE DE LA PRUEBA/ENSAYO:	Carreras y lavados filtracion Ptap Ginebra
LOCALIZACION:	PTAP GINEBRA Y GUACARI
LABORATORIO:	GEOZAM
NORMA - ESPECIFICACION:	INV E 410 -13 / NTC 673 / NTC 3546

ÍTEM	ENSAYO REALIZADO	RESULTADO (Mpa)	ANALISIS RESULTADO	CUM
	Control de asentamiento (Tanque Ginebra)			
	Control de asentamiento (Tanque Albania)			
	Carreras y lavados filtracion Ptap Ginebra			
	Nota: Se adjuntan Resultados en El Informe Tecnico			

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 3 - ASPECTOS AMBIENTALES

PERIODO 01 AI

I. LICENCIAS AMBIENTALES

ITEM	DESCRIPCION	DETALL
	INFORME AMBIENTAL	INFORMACION CONSIGNADA DENTRO DE LOS INF ANEXO

II. PERMISOS DE VERTIMIENTOS

No.	DESCRIPCION	DETALL
1	SOLICITANTE:	
2	FUENTE RECEPTORA:	
3	PTAR:	
4	ESTADO:	
5	VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):	

III.CONCESION DE AGUAS

No.	DESCRIPCION	DETALL
1	SOLICITANTE:	
2	FUENTE DE ABASTECIMIENTO:	
3	PTAP:	
4	ESTADO:	
5	VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):	

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GEST SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTO**

ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALE

I. ASPECTOS SOCIALES

ITEM	ACTIVIDADES	
1	Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto	El contratista está cumpliendo con lo
2	Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto	En el mes de febrero de 2026 la gesti acumulado del 78.57% .
3	Programa de Información a la Comunidad	La interventoría evidencia que se ha de las socializaciones que se han rea actividad del Plan de Gestión Social, requiera para aclarar las inquietudes
4	Programa de divulgación a la comunidad	En el mes de febrero aun el contratist para la divulgación a la comunidad.
5	Reuniones con la comunidad	La interventoría evidencia que el cont comunidad planteada en el Plan de G
6	Programa de atención a la comunidad	Se continúa con el espacio dispuesto Comunidad acceda a ellos si tienen a Se realizó seguimiento a los buzones Personería de Ginebra no se encontr Se realizó seguimiento a las vallas inf dos municipios de Ginebra y Guacarí, Se realizó la aplicación del sondeo de
7	Programa de atención al ciudadano	El contratista continúa cumpliendo co atención se cumple con los horarios e Martes de 08:00 am a 12m Viernes 1:00 pm a 4:00 pm, Lugar: oficina ubicada en la calle 11 # Corregimiento de Costa Rica, Municip Existen dos buzones de sugerencias 1. Personería de Guacarí. 2.Personería de Ginebra.

ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS INFOR

ITEM	LOCALIZACION	DESCRIPCION
I. PREDIOS		
	N/A	
II. SERVIDUMBRES		
No.	**LOCALIZACION**	**DESCRIPCION**
	Vía a el Ingenio Pichichi K6+350 a K6+850 Matricula inmobiliaria N° 373-112779	Dentro de las actividades que se realizaron en la obra fue la localización y repla del trazado de la tubería y dentro de este se tiene identificado una parte del tra de la tubería fue planteado por un carreterable localizado dentro del p identificado con la matricula inmobiliaria N° 373-112779 de propiedad del Ing Pichichi. Después de realizar el levantamiento topográfico se obtuvo que continuar con el desarrollo del proyecto se requiere intervenir una longitud de 50 para la instalacion de tuberpia PEAD 350 MM PN 10 a una profundidad promed 1.45 mt.
	Vía acceso planta de Ginebra	Permiso de intervención instalación tubería diámetro PEAD 10": para la instala de la tubería de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo de servidumbre señora Blum, se encuentra ejecutado.
III. PERMISOS		
No.	**ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO**	**DESCRIPCION**
1	**CVC**	• Permiso de aprovechamiento forestal para la construcción de la boca desarenador, macromedidor y aducción.
2	**CVC**	• Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, de ac a lo solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expe por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Este estudi necesario para definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma.
		PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCES El día 7 de marzo de 2023 se realiza la notificación del acto administrativo por el cu

ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS INFOR

ITEM	LOCALIZACION	DESCRIPCION
6	Planeación Municipal Ginebra	Licencia de Espacio Público
7	Planeación Municipal Guacarí	Licencia de Espacio Público
8	Secretaria de Movilidad de Ginebra	Plan de Manejo de tránsito
9	Secretaria de Movilidad y transporte de Guacarí	Plan de Manejo de tránsito
10	Planeación Municipal Ginebra	Permiso de rotura de pavimento Se radica solicitud por segunda vez, en el Municipio de Ginebra, para los siguient tramos: Tramo 1: Inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo. Tramo 2: Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra
11	Planeación Municipal Guacarí	Permiso de rotura de pavimento Se radica solicitud en la Gobernación del Valle, para el tramo: Inicia desde la Abscisa K7+420, (Vía entre los corregimientos de Guabitas y el Pl hasta la Planta de Guacarí.

ANEXO 6 - RECURSO HUMANO INFORM

I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	
1	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	ING. CIVIL	DIR. DE OBRA	• Propo • Re • Plan com • Fo
2	LINA MARCELA BURITICÁ	ING. CIVIL	COORDINADORA DE PROYECTOS	• Propo • Re • Plan com • Fo
3	GINA LEIDY LÓPEZ	ING. SANITARIA	RESIDENTE DE OBRA HIDRAULICA	• S • Coo
4	DIANA MARCELA ECHAVARRIA	ING. AMBIENTAL	ING. AMBIENTAL	• Tram • Trami

ANEXO 6 - RECURSO HUMANO INFORM

I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	
7	JIMMY JAVIER SINISTERRA ORTIZ	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	TOPOGRAFO	
8	DIANA MARCELA MURIEL FLOR	Ingeniera ambiental	INGENIERO AUX. AMBIENTAL	• Tram • Trami
9	MONICA XIMENA HERNANDEZ	Profesional-SST	PROFESIONAL-SST	
10	ANA FERNANDA ROSERO	Ingeniera Civil	Apoyo al Residente de Obra	• • Coo

II. RECURSO HUMANO INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	
1	ALEJANDRO ESTRADA	ING SANITARIO	DIR. DE OBRA	
2	JESUS IVAN BASTIDAS	ING SANITARIO	RESIDENTE DE OBRA/ING AMBIENTAL	VERI CON
4	JORGE ENRIQUE BARONA FLOREZ	TOPOGRAFO	TOPÓGRAFO	VER
5	NEISLER ABADIA	TRAB. SOCIAL	TRAB. SOCIAL	T

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PAP - PDA
VALLE DEL CAUCA

ANEXO 7 - MAQUINARIA/EQ

7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	
PLANTA ELECTRICA	**SI**	**SI**	
PLANTA ELECTRICA	**SI**	**SI**	
PULIDORA	**SI**	**SI**	
TALADRO	**SI**	**SI**	
TALADRO	**SI**	**SI**	
VIBRADOR	**SI**	**SI**	
RETROEXCAVADORA DE LLANTA	**SI**	**SI**	
VOLQUETAS	**SI**	**SI**	

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRÁFICO | **INFORME N° 34** | **PERIODO: 01 AL 28**



CONSTRUCCION DE CABEZAL EN CONCRETO TRAMO 3



CONSTRUCCION DE CABEZAL E



INSTALACION DE FALSO FONDO FILTRO 3 PTAP GINEBRA




RETIRO DE MATERIAL FILTR





ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRÁFICO | **INFORME N° 34** | **PERIODO: 01 AL 28**

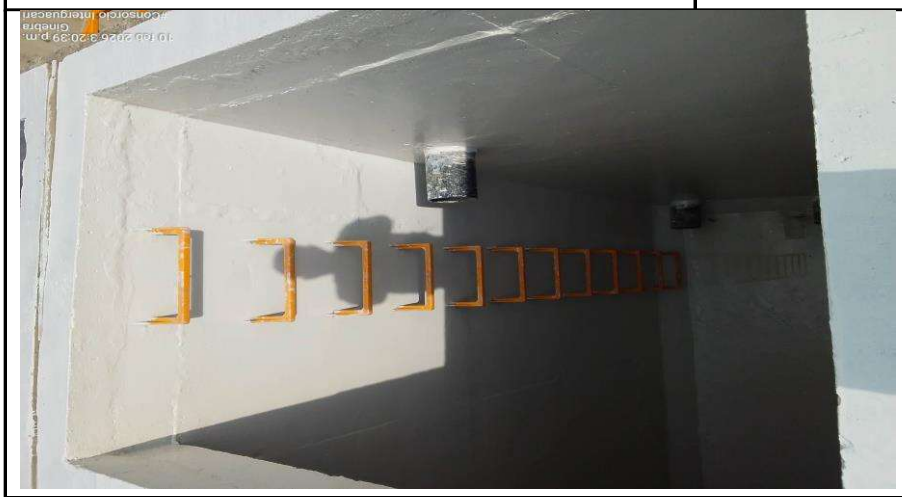

INSTALACION DE BAJANTES EN PROPILENO TANQUE LA ALBANIA



INSTALACION DE CANALETA EN ACER
GINEBRA



PRUEBAS DE AIRE DESDE SOPLADORES A FILTRO 3 PTAP GINEBRA



PRUEBAS DE AIRE DESDE SOPLADOR





ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRÁFICO	**INFORME N° 34**	**PERIODO: 01 AL 28**



INSTALACION DE TAPONES PRUEBA HIDROSTATICA TRAMO 3 TUBERIA PEAD 14" - ENTRADA



INSTALACION DE TAPONES PRUEBA HI
PEAD 14" - SA



INSTALACION DE CANALETAS EN ACERO INOXIDABLE PTAP GUACARI



INSTALACION DE CANALETAS EN ACER





ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRÁFICO | **INFORME N° 34** | **PERIODO: 01 AL 28**



DEMOLICION ROCA TRAMO 1



UNIDAD DE FILTRACION EN SE



RELLENO TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA ALBANIA



CONSTRUCCION PASE EN TUBERI







SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 9 - INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

PERIODO

CONTRATO No. :	2000.13.05.003-2022	
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UN SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMAC LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$	
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERGUACARI	
PLAZO:	22 MESES	
VALOR ANTICIPO :	30%	$

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN
1	ADMINISTRATIVOS			
2	EQUIPOS	**$ 1.744.905.661,00**	**$ -**	
3	TRANSPORTES			
4	MATERIALES	**$ 6.125.300.150,00**	**$ -**	
5	OTROS	**$ 959.418.469,00**	**$ -**	
6	OTROS	**$ 10.542.663,00**		
	TOTALES	**$ 8.829.624.279,80**	**8.829.624.279,80**	

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

INFORME DE INTERVENTORIA

FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS INFORME

FECHA:	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:	
	28	2	2026	HORA DE FINALIZACIÓN :	
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	PUENTE ROJO, LA MAGDALENA, GUABITAS			MUNICIPIO:	
TRAMO/FRENTE DE OBRA:				LONGITUD/ÁREA :	
CONSORCIO : REDES Y PTAPS VALLE				AVANCE DE OBRA (%)	

DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA

COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	SI	NO	N/A
AIRE		X	
EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO		X	
EMISIONES DE RUIDO		X	
EMISIÓN DE OLORES OFENSIVOS			
OTROS:			
SUELO	**SI**	**NO**	**N/A**
AFECTACIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA		X	
PROCESOS EROSIVOS		X	
DISPOSICIÓN INADECUADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		X	
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS (DOMÉSTICOS, ESPECIALES, PELIGROSOS)		X	
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES - RCD		X	
OTROS:			
AGUA	**SI**	**NO**	**N/A**
DEFICIENCIAS DE ABASTECIMIENTO EN OBRA		X	
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS		X	
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES		X	
MALAS INSTALACIONES SANITARIAS		X	
OTROS:			
FLORA Y FAUNA	**SI**	**NO**	**N/A**
DESCAPOTE DE COBERTURA VEGETAL	X		
INTERVENCIÓN A ESPECIES VEGETALES		X	
EXISTENCIA DE ÁREAS PROTEGIDAS		X	
AFECTACIÓN A ECOSISTEMAS		X	
AFECTACIÓN A HÁBITATS		X	
ALTERACIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS		X	
OTROS:			
PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS AMBIENTALES	**SI**	**NO**	**N/A**
CONCESIÓN DE AGUAS (SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS)	X		
OCUPACIÓN DE CAUCE Y APROBACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	X		
PERMISO DE VERTIMIENTOS		X	
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	X		
PERMISO DE EXPLANACIONES Y/O MOVIMIENTO DE TIERRAS		X	

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

INFORME DE INTERVENTORIA

FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS

FECHA:	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:	
	3	3	2026	HORA DE FINALIZACIÓN :	
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	PUENTE ROJO			MUNICIPIO:	
TRAMO/FRENTE DE OBRA:				LONGITUD/ÁREA :	
CONSORCIO :	CONSRCIO REDES Y PTAPS VALLE			AVANCE DE PLAN DE TRABAJO SS	
NOMBRE PROFESIONAL SST:	MONICA XIMENA HERNANDEZ			NOMPRE PROF. SST INTERVEN	


DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	NO	
CERTIFICADO DE AFILIACION Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL VIGENTE DE LOS TRABAJADORES, PRINCIPALMENTE DE LOS QUE REALIZAN LABORES PARA LA EVA	1		
REPORTE DE NOVEDADES DEL MES EN SEGURIDAD SOCIAL, CON RELACIÓN A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN PARA LA EVA.	1		
INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES OCURRIDOS DURANTE EL MES CON SU INVESTIGACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS	1		
PLAN DE TRABAJO DE SST, EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DEL MES Y % DE AVANCES	1		
POLITICA Y OBJETIVOS DIVULGADOS	1		
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO	1		
PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (PLAN DE EMERGENCIAS Y SU AVANCE EN EL MES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS)	1		
BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIA	1		
SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE ZONAS	1		
CAMILLA RIGIDA CON SU ARNES - INMOVILIZADOR DE CUELLO	1		
EXTINTORES	1		

RECOMENDACIONES PARA LOS INTERVENTORES

1.- Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación de mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso que el CONTRATISTA y/o INTERVENTORIA, requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser reemplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. En todo caso, el supervisor deberá aprobar

En tal sentido se reitera verificar y evidenciar en los informes mensuales, el personal profesional presentado por el Contratista y/o Interventoria (equipo de trabajo) con su cargo, formación académica, y porcentaje de dedicación propuesto.

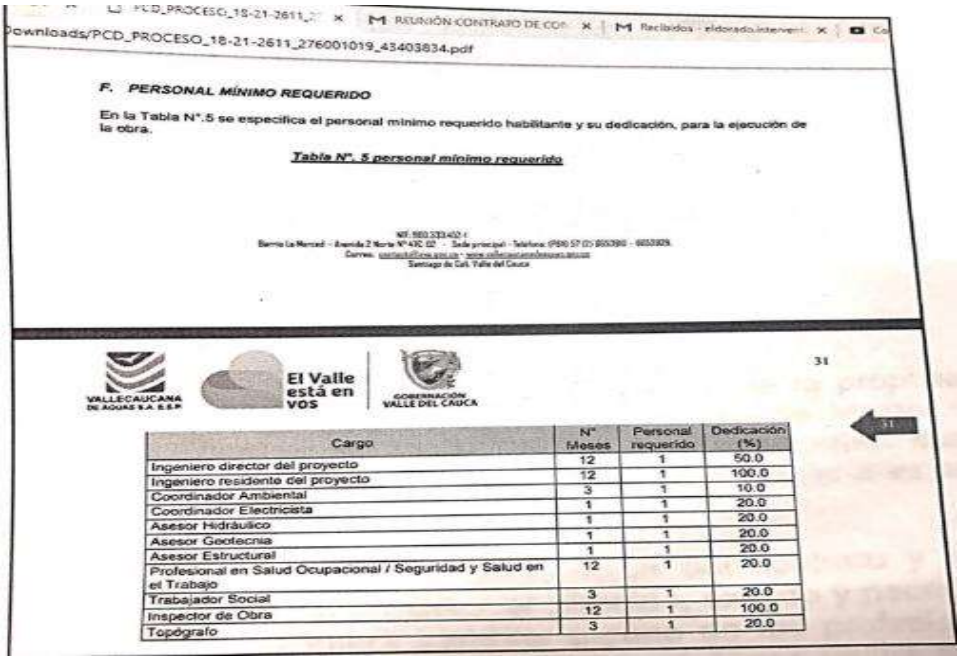

Downloads/PCD_PROCESO_18-21-2611_276001019_43403834.pdf

F. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

En la Tabla N°.5 se especifica el personal mínimo requerido habilitante y su dedicación, para la ejecución de la obra.

Tabla N°. 5 personal mínimo requerido

El Valle está en vos

31

Cargo	N° Meses	Personal requerido	Dedicación (%)
Ingeniero director del proyecto	12	1	50.0
Ingeniero residente del proyecto	12	1	100.0
Coordinador Ambiental	3	1	10.0
Coordinador Electricista	1	1	20.0
Asesor Hidráulico	1	1	20.0
Asesor Geotecnia	1	1	20.0
Asesor Estructural	1	1	20.0
Profesional en Salud Ocupacional / Seguridad y Salud en el Trabajo	12	1	20.0
Trabajador Social	3	1	20.0
Inspector de Obra	12	1	100.0
Topógrafo	3	1	20.0

En relación con el Coordinador Ambiental esté deberá presentar en su informe de activid

1.- Identificación de aspectos e impactos ambientales
2.- Plan de manejo para la mitigación de impactos ambientales identificados y generados en el
3.- Orden, limpieza y aseo en la obra.
4.- Informar y/o reportar situaciones que surjan durante la ejecución de la obra que implique un

En relación con el Coordinador Social este deberá presentar en su informe de actividades

1.- Acta de reunión con los comités de veeduría y /o ciudadanos que soliciten en el punto de ate
2.- Relación de PQRS, en cuadro indicar el número de quejas, inquietudes, reclamos y
3.- Abrir y cerrar las Actas de vecindad, que sean necesario tramitar, en los frentes de obra a intervenir por el contratista.
4.- Fijar horario de atención a la comunidad, colocándolo en una cartelera visible.
5.- Participar de los comités de técnico de obra, veeduría y comités sociales en Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P cuando se programen.

En relación con el Coordinador de seguridad y salud en el trabajo este deberá presentar e

1. Porcentaje de avance mensual de plan de trabajo SST.
2. Evidencias del desarrollo del plan de emergencia y su brigada.
3. Indicadores de EP, EG, IT, AT.
4. Evidencia de entrega de Elementos de Protección Personal.
5. Evidencia del desarrollo del programa de Capacitación.
6. Evidencia de participación y consulta de los trabajadores en actividades del SG-SST.
7. Seguridad Social Vigente de los trabajadores vinculados.
8. Otros Hallazgos, así como informar y/o reportar situaciones que surjan durante la ejecución de la obra que impliquе influyan en la Seguridad y Salud de los trabajadores.

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

INFORME No. 34 DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005- 2022

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 200.46.01.005-2022 CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRA PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOSDE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"

AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2000.13.05.003- 2022

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE INEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL

INTERVENTOR
CONSORCIO INTERGUACARI
REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

SUPERVISOR
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P.
DIEGO JOSE CALDERON VILLANUEVA

DISTRITO SANTIAGO DE CALI – FEBRERO 2026

INFORMACION GENERAL

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

Contrato No.	2000.13.05.003- 2022
Objeto:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"
Valor del Contrato:	VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933.oo) M/CTE
Valor inicial	$ 29.432.080.933.oo
Valor Adición No.01	$ 2.571.146.616.oo
Valor Adición No. 02	$ 13.531.646.339.oo
Valor Total del Contrato	$ 45.534.873.888.oo
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Interventor:	CONSORCIO INTERGUACARÍ
Fecha de Inicio:	Diciembre 1 de 2022
Plazo de ejecución delproyecto	Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio
Fecha de Terminación:	Enero 1 de 2024
Fecha de suspensión No.01:	Dos meses a partir de Julio 27 de 2023
Prorroga No. 01 a la Suspensión No.01	Un mes a partir del 27 de Septiembre del 2023
Prorroga No. 02 a la Suspensión No.01	Un mes a partir del 27 de Octubre del 2023
Prorroga No. 03 a la Suspensión No.01	45 días a partir del 27 de Noviembre del 2023
Fecha de reinicio:	Enero 10 de 2024
Nueva fecha de terminación:	Junio 14 de 2024
Adicional en Tiempo No.01	Nueve (09) meses
Fecha de terminación prorroga	Marzo 14 de 2025
Adicional en Tiempo No.02	Diez (10) meses
Fecha de terminación prorroga	Enero 22 de 2026
Adicional en Tiempo No.03	Seis (06) meses
Fecha de terminación prorroga	Julio 22 de 2026

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

En este informe mensual se resume el seguimiento técnico y financiero de los aspectos más relevantes ocurridos durante la ejecución de la obra en el periodo comprendido entre el 01 al 28 de Febrero de 2026.


2.1 COMITÉS DE OBRA

Durante este mes no se realizó comité de obra.

2.1.1. OTRAS REUNIONES

2.1.1.1 – Febrero 06 de 2026

Se realiza la reunión en las instalaciones de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P , con los Representantes de la familia Blum – Saavedra, Funcionarios de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P , contratista Redes y PTAPS Valle y la interventoría Consorcio Interguacari, para aclarar la servidumbre dada por la familia Blum – Saavedra.

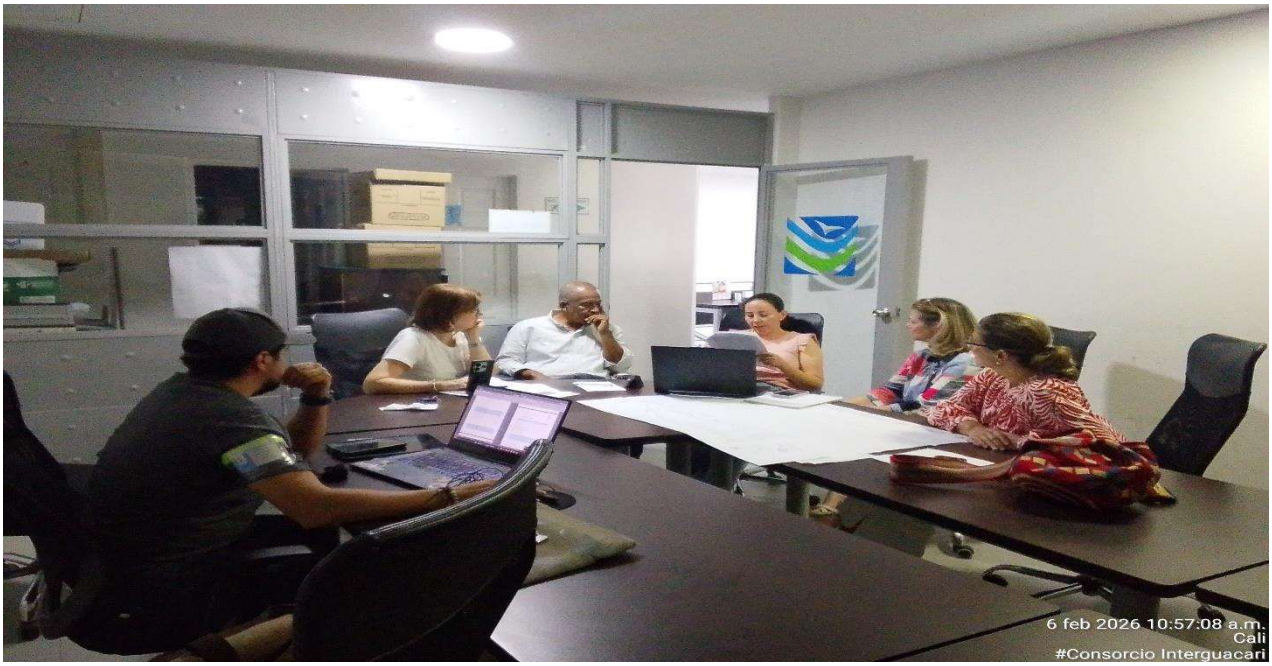

2.1.1.2 – Febrero 13 de 2026

Se realiza la reunión en las instalaciones de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P con funcionarios de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P , contratista Redes y PTAPS Valle y la interventoría Consorcio Interguacari, para finalizar y aclarar dudas por la servidumbre dada por la Familia Blum – Saavedra.



2.1.1.3 – Febrero 25 de 2026

Se realiza la reunión en las instalaciones de los Bomberos de Costa Rica , con los Representantes de la Comunidad de Puente Rojo, Funcionarios de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P , contratista Redes y PTAPS Valle y la interventoría Consorcio Interguacari, para definir los compromisos establecidos en Diciembre de 2024 entre la Gobernación del Valle y Proterritorio.



2.2 COMPONENTE FINANCIERO DEL PROYECTO

OBRA:

A la fecha se han tramitado dieciocho actas parciales de obra, durante el periodo del mes de Febrero – 2026, no se tramito acta parcial de obra.

Descripción	Valor ejecutado	Valor contrato	Porcentaje % ejecución
Valor inicial del contrato:		$ 29.432.080.933	
Valor adicionado No. 01:		$ 2.571.146.616	
Valor adicionado No. 02:		$ 13.531.646.339	
Valor total del contrato:		$ 45.534.873.888	
Valor Acta Parcial No. 1:	$ 8.371.066.842		18,38%
Valor Acta Parcial No. 2:	$ 886.015.856		1.95%
Valor Acta Parcial No. 3:	$ 907.712.127		1.99%
Valor Acta Parcial No. 4:	$ 503.892.952		1.11%
Valor Acta Parcial No. 5:	$ 369.286.058		0.81%
Valor Acta Parcial No. 6:	$ 7.371.115.364		16.19%
Valor Acta Parcial No. 7:	$ 604.131.566		1,33%
Valor Acta Parcial No. 8:	$ 385.455.620		0,85%
Valor Acta Parcial No. 9:	$ 689.009.943		1,51%
Valor Acta Parcial No. 10:	$ 1.216.561.098		2,67%
Valor Acta Parcial No. 11:	$ 2.068.353.769		4,54%
Valor Acta Parcial No.12	$ 690.349.724		1.52%
Valor Acta Parcial No.13	$ 2.313.472.543		5.08%
Valor Acta Parcial No.14	$ 1.659.841.253		3.65%
Valor Acta Parcial No. 15	$ 4.230.011.773		9.29%
Valor Acta Parcial No.16	$ 534.405.953		1.17%
Valor Acta Parcial No. 17	$ 736.963.238		1.62%
Valor Acta Parcial No. 18	$ 431.777.557		0.95%
Total, cancelado a la fecha:	**$ 33.969.423.236**		74.60%
Saldo por ejecutar:	$ 11.565.450.652		25.40%
Sumas iguales:	$ 45.534.873.888	$ 45.534.873.888	100,00%

Tabla No. 1. Relación pago actas parciales de obra al contratista

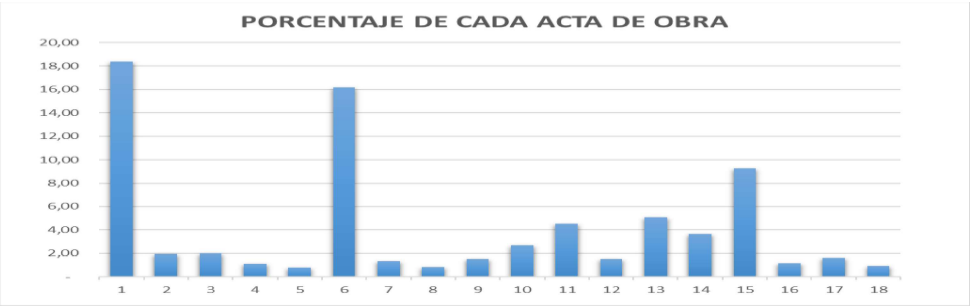


Figura No, 1. Gráfico de la relación de pagos de actas parciales de obra

Descripción	Fecha	Valor amortizado	Valor anticipo 30%	% amortización
Valor anticipo del contrato (30 %):			$ 8.829.624.279.90	
Amortización acta Parcial N° 1:	31/05/2023	$ 2.511.320.053		28,44%
Amortización acta Parcial N° 2:	30/06/2023	$ 265.804.757		3,01%
Amortización acta Parcial N° 3:	31/01/2024	$ 272.313.639		3,08%
Amortización acta Parcial N° 4:	31/03/2024	$ 151.167.886		1,71%
Amortización acta Parcial N° 5:	30/04/2024	$ 110.785.818		1,25%
Amortización acta Parcial N° 6:	31/05/2024	$ 2.211.334.610		25,04%
Amortización acta Parcial N° 7:	31/07/2024	$ 181.239.470		2,05%
Amortización acta Parcial N° 8:	31/08/2024	$ 115.636.686		1,31%
Amortización acta Parcial N° 9:	30/09/2024	$ 206.702.983		2,34%
Amortización acta Parcial N° 10:	08/11/2024	$ 364.968.330		4,13%
Amortización acta Parcial N° 11:	30/11/2024	$ 620.506.131		7,03%
Amortización acta Parcial N° 12:	31/01/2025	$ 207.104.917		2,35%
Amortización Acta Parcial No.13	10/02/2025	$ 694.041.763		7.86%
Amortización Acta Parcial No.14	10/07/2025	$ 497.952.376		5.62%
Amortización Acta Parcial No.15	13/08/2025	$ 418.744.860.90		4.76%
Valor amortizado		**$ 8.829.624.279.90**		**100.00 %**
Saldo por amortizar:		$ 0.00		**0.00%**
Sumas iguales:		**$ 8.829.624.279.90**	**$ 8.829.624.279.90**	**100,00%**

Tabla N° 2. Relación amortización anticipo

Nota: Ya se amortizó la totalidad del Anticipo

INTERVENTORIA

En este periodo de Febrero – 2026, no se tramito acta parcial de interventoría.

Relación de actas parciales de la interventoría

Descripción	Valor ejecutado	Valor contrato	Porcentaje % ejecución
Valor inicial del contrato:		$ 1.502.246.766	
Valor adicionado No. 01:		$ 131.126.000	
Valor adicionado No. 02:		$ 690.624.799	
Valor total del contrato:		$ 2.323.997.565.	

Valor Acta Parcial No. 1:	$ 427.238.980		18.38%
Valor Acta Parcial No. 2:	$ 45.217.628		1.95%
Valor Acta Parcial No. 3:	$ 72.195.076		3.1%
Valor Acta Parcial No. 4:	$ 18.783.787		0.81%
Valor Acta Parcial No. 5:	$ 376.165.748		16.17%
Valor Acta Parcial No. 6:	$ 30.870.745		1.33%
Valor Acta Parcial No. 7:	$ 19.658.237		0,85%
Valor Acta Parcial No. 8:	$ 35.139.507		1.52%
Valor Acta Parcial No. 9:	$ 62.044.616		2.67%
Valor Acta Parcial No. 10:	$ 105.486.042		4.54%
Valor Acta Parcial No. 11	$ 35.207.836		1.51%
Valor Acta Parcial No. 12	$ 117.987.100		5.08%
Valor Acta Parcial No. 13	$ 84.651.904		3.64%
Valor Acta Parcial No. 14	$ 215.730.600		9.28%
Valor Acta Parcial No. 15	$ 27.254.704		1.17%
Valor Acta Parcial No. 16	$ 37.648.761		1.62%
Valor Acta Parcial No. 17	$ 22.020.655		0.95%
Total, cancelado a la fecha:	**$ 1.733.301.926.oo**		**74.6%**
Saldo por ejecutar:	$ 590.695.639.oo		25.4%
Sumas iguales:	$ 2.323.997.565	$ 2.323.997.565	100,00%

Tabla No. 3. Relación de pagos actas parciales interventoría

Relación de la amortización del anticipo realizados a la interventoría:

Descripción	Fecha	Valor amortizado	Valor anticipo 30%	Porcentaje % amortización
Valor anticipo del contrato (30 %):			$ 450.674.029.80	
Amortización acta Parcial N° 1:	31/05/2023	$ 128.171.694		28,44%
Amortización acta Parcial N° 2:	30/06/2023	$ 13.565.288		3,01%
Amortización acta Parcial N° 3:	31/01/2024	$ 21.658.523		4,81%
Amortización acta Parcial N° 4:	31/03/2024	$ 5.635.136		1,25%
Amortización acta Parcial N° 5:	30/04/2024	$ 112.849.724		25,04%
Amortización acta Parcial N° 6:	31/05/2024	$ 9.261.224		2,05%
Amortización acta Parcial N° 7:	13/09/2024	$ 5.897.471		1,31%
Amortización acta Parcial N° 8:	30/09/2024	$ 10.541.852		2,33%
Amortización acta Parcial N° 9:	12/11/2024	$ 18.613.385		4,13%
Amortización acta Parcial N° 10:	02/12/2024	$ 31.645.813		7,02%
Amortización acta Parcial N° 11:	01/31/2025	$ 10.562.351		2,34%
Amortización Acta Parcial No. 12:	11/03/2025	$ 35.396.130		7,86%
Amortización Acta Parcial No. 13:	10/07/2025	$ 25.395.571		5.63%

Amortización Acta parcial No. 14	13/08/2025	$	21.479.867.80		4.76%
Valor amortizado		**$**	**450.674.029.80**		**100.00%**
Saldo por amortizar:		$	0.00		
Sumas iguales:		$	450.674.029.80	$ 450.674.029.80	**100,00%**

Tabla No. 4. Relación amortización del anticipo realizados a la interventoría

Nota: Ya se amortizó la totalidad del Anticipo

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento de los acueductos del casco urbano para los Municipios de Ginebra y Guacarí.

Las obras a construir son:

- Bocatoma
- Línea de Aducción
- Desarenador (No se va a construir. se está desarrollando un proyecto para construir la versión de Malla Coanda)
- Cámara de distribución de caudal – CADICA
- Viaductos en Puente Amarillo , Puente Rojo y La Magdalena
- Líneas de Conducción en tubería PEAD: Tramo 1 en 18" entre la Bocatoma y CADICA – Tramo 2 en 10 " entre CADICA y PTAP de Ginebra y Tramo 3 en 14" entre CADICA y PTAP de Guacarí.
- Intervenciones en las PTAP de Ginebra y Guacarí´

2.3 COMPONENTE TECNICO


Durante el mes de Febrero de 2026, se desarrollan actividades en:


A. BOCATOMA

1. Tipo de Bocatoma: Lateral sobre el Rio Guabas
2. Caudal de Captación: 233 Lps
3. Caudal de Derivación a Guacari: 164.5 Lps
4. Caudal de Derivación a Ginebra: 68.5 Lps

Estado Actual Bocatoma: Se contrato nuevo diseño con el Ing. Carlos Valencia para implementar la malla Coanda, que evitara la construcción del desarenador.

Nota: Se encuentra en etapa de revisión presupuestal.

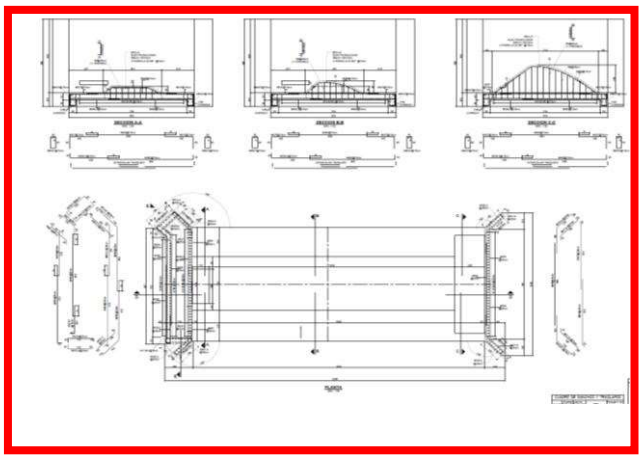

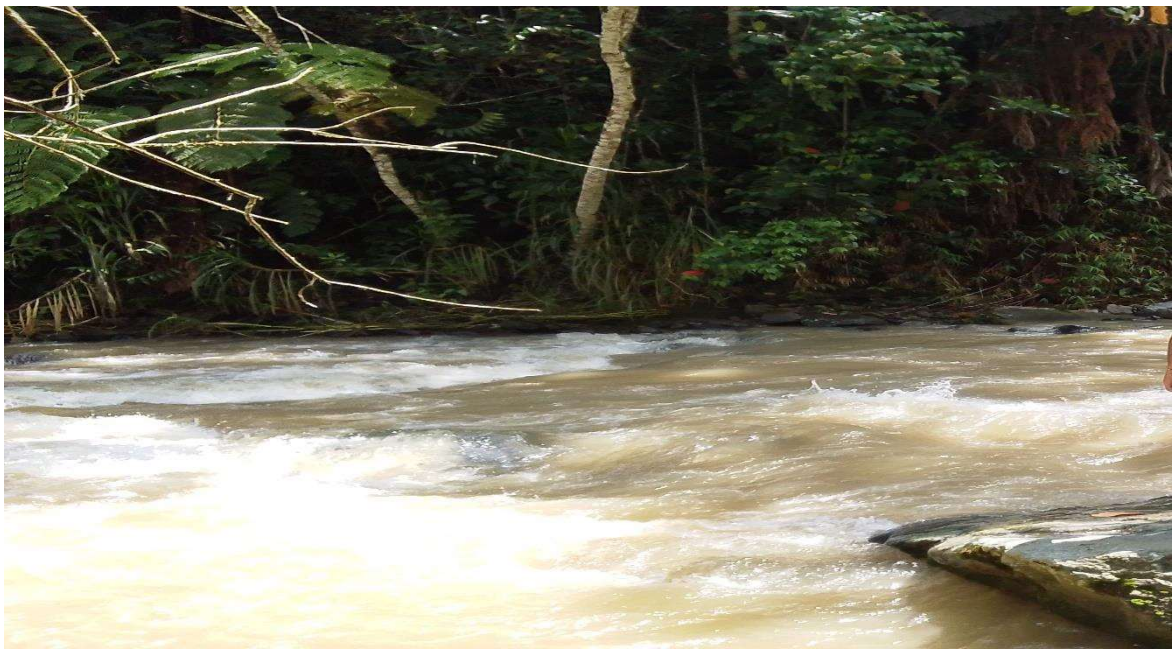

B. ADUCCIÓN


1. Línea De Aducción: Tubería PEAD DN 18" L: 6.0 ml
2. Caudal: 233 Lps

Estado Actual Línea de Aducción: Se contrato nuevo diseño con el Ing. Carlos Valencia para implementar la malla Coanda, que evitara la construcción del desarenador.
Se encuentra en etapa de revisión presupuestal.

C. DESARENADOR

1. Caudal de diseño: No aplica


Estado Actual: Según el nuevo diseño **NO** se va a construir, se va a reemplazar por la malla Coanda

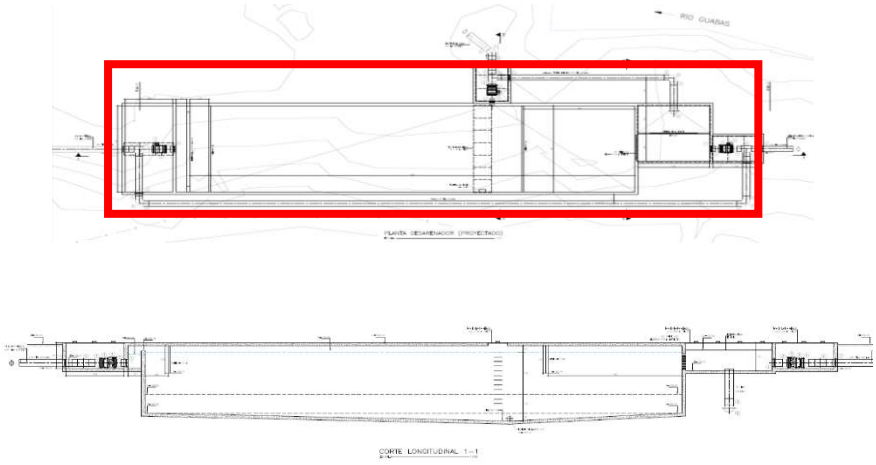

1.1 Dimensiones Exteriores (No aplica)

Largo: 38 mts
Ancho: 8 mts
Profundidad: 5 mts

D. MACROMEDIDOR

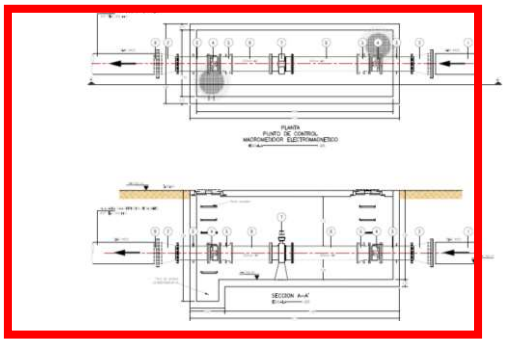


Sin ejecución.

2. CONDUCCIÓN

2.1 Tramo 1 Bocatoma – CADICA en Puente Rojo: Tubería PEAD DN 18" – L=3450ml

Estado Actual Tramo 1: En ejecución.

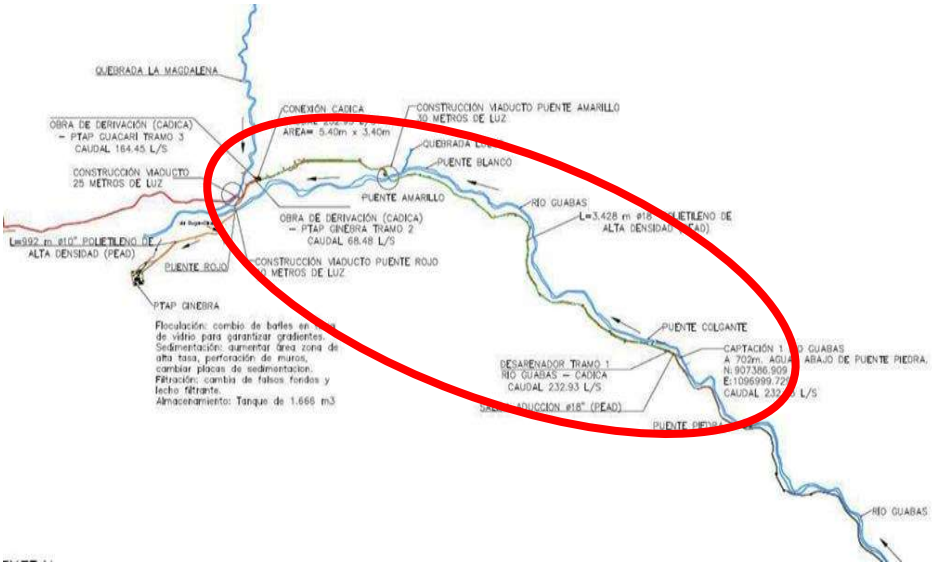
QUEBRADA LA MAGDALENA
CONEXIÓN CADICA
AREA= 5.40m x 3.40m
CONSTRUCCIÓN VIADUCTO PUENTE AMARILLO
30 METROS DE LUZ
OBRA DE DERIVACIÓN (CADICA)
– PTAP GUACARI TRAMO 3
CAUDAL 164.45 L/S
CONSTRUCCIÓN VIADUCTO
25 METROS DE LUZ
QUEBRADA LA
PUENTE BLANCO
PUENTE AMARILLO
RIO GUABAS
OBRA DE DERIVACIÓN (CADICA)
– PTAP GINEBRA TRAMO 2
CAUDAL 68.48 L/S
L=992 m ø10" POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD (PEAD)
PUENTE ROJO
CONSTRUCCIÓN VIADUCTO PUENTE ROJO
30 METROS DE LUZ
PTAP GINEBRA
Floculación: cambio de bafles en
de vidrio para garantizar gradientes.
Sedimentación: aumentar área zona de
alta tasa, perforación de muros,
cambiar placas de sedimentacion.
Filtración: cambio de falsos fondos y
lecho filtrante.
Almacenamiento: Tanque de 1.666 m3
PUENTE COLGANTE
DESARENADOR TRAMO 1
RIO GUABAS – CADICA
CAUDAL 232.93 L/S
PUENTE PIEDRA
RIO GUABAS


20 feb 2026 10:44:19 a.m.
#Consorcio Interguacari


INTERVENTORIA



25 feb 2026 12:16:49 p.m.
#Consorcio Interguacari


#Consorcio Interguacari



Porcentaje de Ejecución: 9 %

D.2 CADICA: Cámara de Distribución de caudales

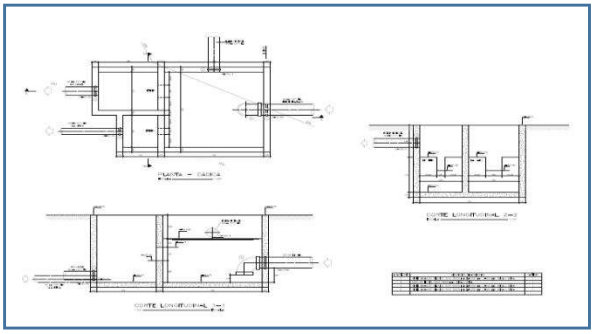

D 2.1 Dimensiones Exteriores

Largo: 5.4 mts
Ancho: 3.4 mts
Profundidad: 3 mts

Estado Actual CADICA: Sin ejecución.


Nota:

Se aprobó el cambio de lugar la CADICA, según la Ing. Gina López – encargada de la revisión hidráulica por parte del Contratista, se va a ubicar aguas arriba donde está proyectada, 81 ml aguas arriba donde estaba proyectada.

La revisión hidráulica donde la propone tiene el concepto favorable.

D.3 Tramo 2 CADICA en Puente Rojo a PTAP Ginebra: Tubería PEAD diámetro 10" – L=1000ml


Estado Actual Tramo 2: Sin ejecución.

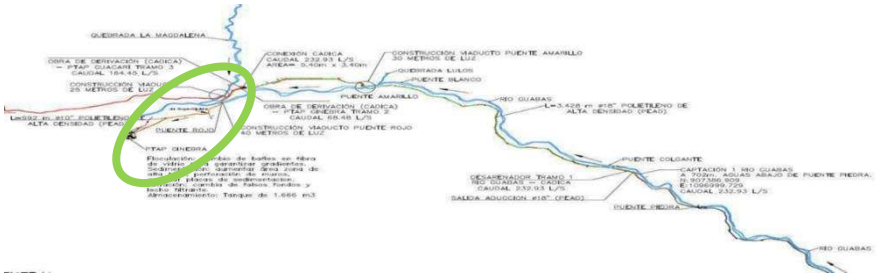


Nota: Continua sin ejecución porque la Comunidad **NO** dejo realizar ningún tipo de intervención sobre la vía.
Es a la entrada a la PTAP de Ginebra en el sitio conocido como Villa Índigo.

Porcentaje de Ejecución: 64 %

D.4 Tramo 3 CADICA en Puente Rojo a PTAP Guacarí: Tubería PEAD DN 14"



L total =8000ml





Porcentaje de Ejecución: 95 %

Estado Actual: Se instaló tubería PEAD diámetro 14" en el tramo del Balneario La Esmeralda a Puente la Magdalena


5 feb 2026 9:42:57 a.m
Puente Roj
#Consorcio Interguaca


5 feb 2026 9:43:41 a.m
Puente Roj
#Consorcio Interguaca

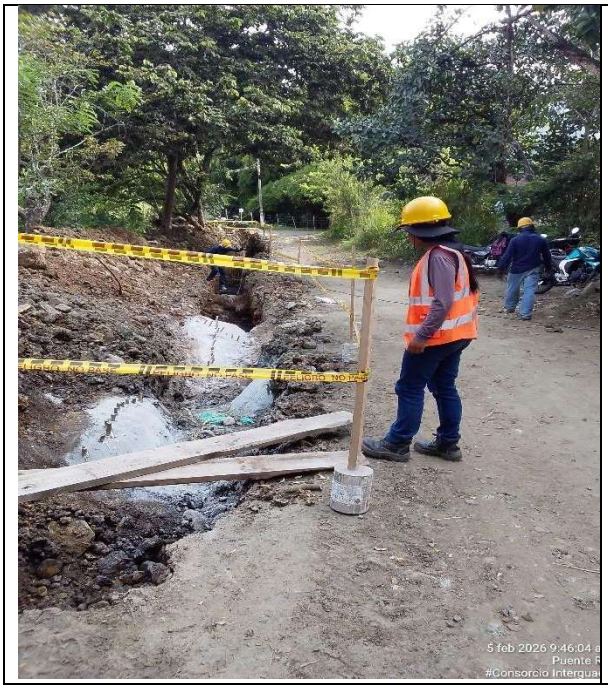
5 feb 2026 9:46:04
Puente
#Consorcio Intergus

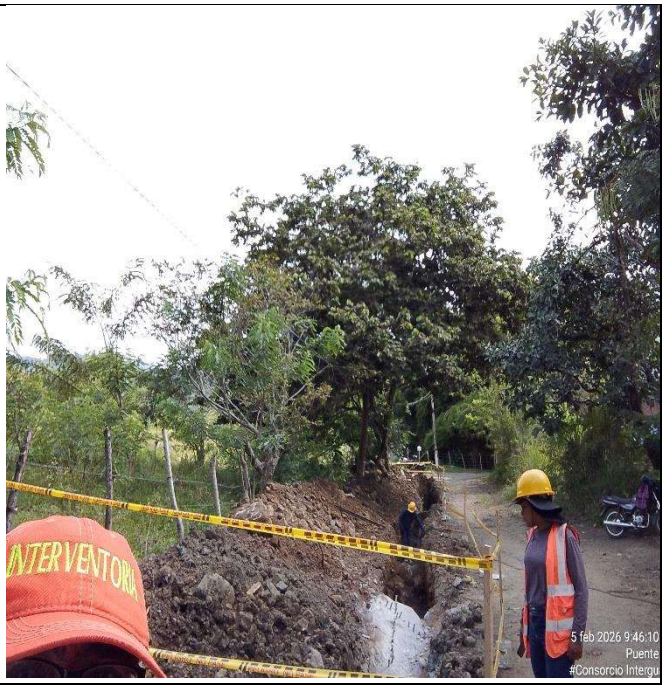
INTERVENTORÍA
5 feb 2026 9:46:10
Puente
#Consorcio Intergu

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE


PTAP GINEBRA

Floculadores: Cambio de placas de AC a Fibra de Vidrio
Concluido


Sedimentadores 1 – 2 – 3 : Concluido y en Servicio

Actividades ejecutadas:

Sistema de barrelodos
Módulos Tipo Colmena
Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada
Pasarelas

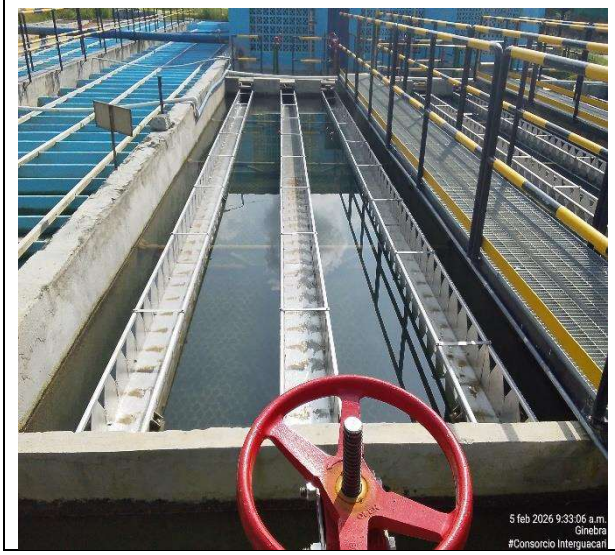



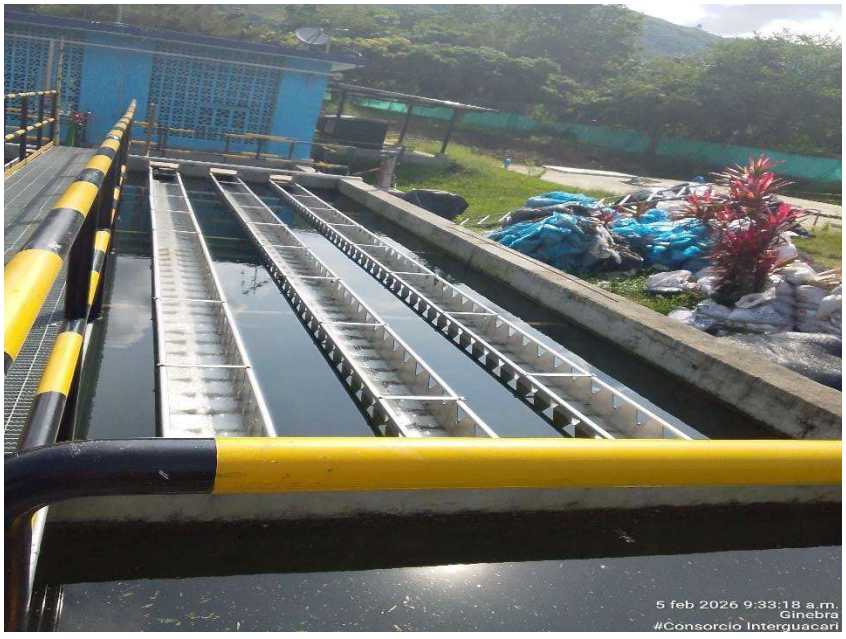

FILTRACION

Actividades ejecutadas en Módulos de Filtración:

Demolición de canales en concreto
Retiro de material filtrante
Demolición de falso fondo
Ajuste Losa de Fondo
Sistema de aireación en tubería proveniente de sopladores
Reemplazo de material filtrante
Reemplazo de válvulas de lavado
Cambio de canaletas en acero inoxidable
Canal Falso Fondo - Leopold

Estado Actual Filtración:

Filtro No. 01: Terminado y en servicio



En funcionamiento, mejoraron las tasas de lavado de 36 horas paso a 70 horas

Filtro No. 02: Terminado y en servicio



En funcionamiento, mejoraron las tasas de lavado de 36 horas paso a 70 horas

Filtro No. 03: Terminado y en servicio



En funcionamiento, mejoraron las tasas de lavado de 36 horas paso a 70 horas

Tanques de Almacenamiento

Tanque de Almacenamiento Planta

Con una capacidad de almacenamiento de 470 m3 en dos compartimientos y caja de válvulas que va abastecer a La Floresta y Villa Vanegas

Estado Actual: En ejecución 96 %

Actividades por ejecutar:

- Losa superior de cámaras de entrada y salida
- Instalación de sistema de válvulas
- Rellenos perimetrales
- Instalación tubería de desagüe
- Conexión al sistema existente

Actividades ejecutadas:

- Rellenos parciales
- Presentación tubería PEAD 10 " Entrada tanque
- Ajustes a la Impermeabilización interna
-



Caseta eléctrica



Estado Actual: En ejecución 100 % obra civil

Caseta de Sopladores: Terminada e instalación de 2 equipos de sopladores




Sistema Streaning Current



Por instalar : UPS que va a controlar la dosificación de coagulante

Tanque de almacenamiento La Albania

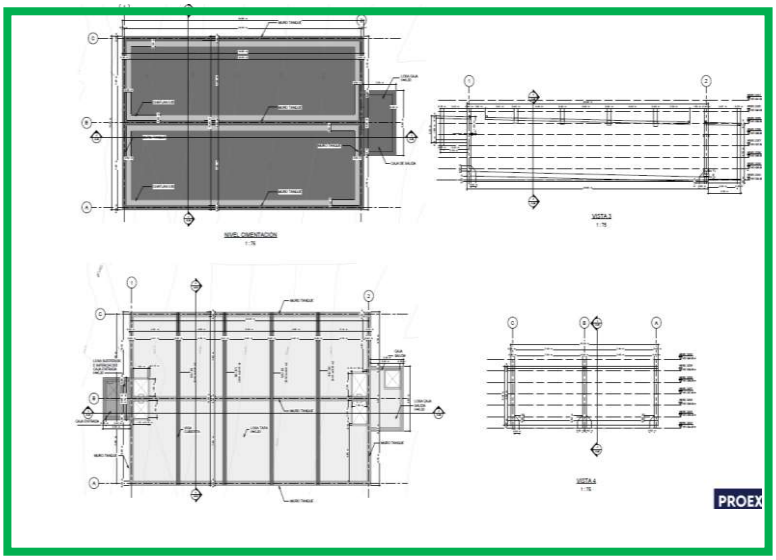

Dimensiones exteriores

Largo: 25 mts
Ancho: 15 mts
Profundidad: 5 mts

Actividades por ejecutar:

- Losa superior de cámaras de entrada y salida
- Instalación de sistema de válvulas
- Rellenos perimetrales
- Instalación tubería de desagüe
- Conexión al sistema existente


Actividades ejecutadas en este periodo:

- Rellenos perimetrales
- Detalles en la impermeabilización de los dos compartimientos





Area resaltada en rojo significa fundicion en concreto

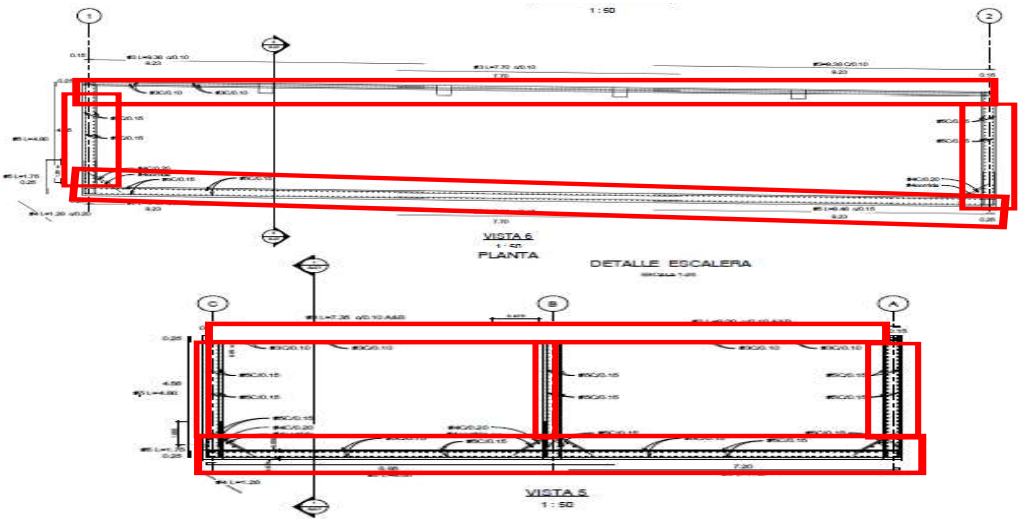

PTAP GUACARI

Floculadores: Sistema nuevo de seis paletas mecánicas para el primer circuito

Estado Actual Floculadores Línea 3 : En servicio

Se instalaron 6 moto reductores, pero hay en servicio 4 por poca capacidad eléctrica de la planta.



Sedimentadores 1 – 2- 3:

Se efectuaron las siguientes actividades en general:

Sistema de barrelodos
Módulos Tipo Colmena
Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada
Pasarelas

En Operación





Filtración:

Actividades a ejecutar:

Canal Falso Fondo - Leopold
Ajuste Losa de Fondo
Sistema tubería proveniente de los sopladores
Reemplazo de material filtrante
Reemplazo de válvulas de lavado
Cambio de canaletas en acero inoxidable

Estado Actual Filtración: Modulo A Son tres filtros - Sin ejecución, se deben terminar los del Modulo B



Estado Actual Filtración: Modulo B Son tres filtros - En ejecución









Se termino la instalación de tubería en acero inoxidable proveniente de los sopladores.
Falta por instalar el material filtrante: gravas y Filtralite

Suministro e Instalación de sopladores -Son dos unidades



Instalación de la tubería en acero inoxidable que va a conectar los sopladores al sistema de filmación en los módulos A y B.



Caseta eléctrica

Estado Actual: Obra civil terminada



Sistema Streaning Current





Por instalar: UPS que va a controlar la dosificación de coagulante

Registro fotografico de actividades en la PTAP de Guacarí.

		Inspeccion de la Interventoría Planta PTAP Guacarí, estructura en H para montaje Transformador de Potencia 150 KVA puesto en obra.
		Tableros de fuerza y control equipos , suministro por ainstalar en ubicación definitiva en cuartos tecnicos. Tableros cumplen con observaciones de la Interventoría de incluiir DPS, y con Medidor de parametros Digital Multifunsion.
		Canalización para la Malla de puesta a Tierra configuración en Delta, debe estar soterrada 0,6 mt. según reglamento. Cámara de registro cableado Acometida de Baja Tensión BT, derivada de Transformador, a Tablero General en Cuarto Técnico.

		Caseta de Sopladores Equipos instalñados con conexiones hidraulicas y electricas de fuerza y control, esperando ser probados, cona energia definitiva, solo cuando el OR Celsia Reciba la Obra de Redes de MT y energice el Proyecto.
		Inspeccion de seguimiento canalizacion de alimentadiores a Casetas de sopladores, camaras de registo SB850 norma Celsia. .
		Inspección a los Tableros de Fuerza y control de Sopladores, se verifica código de colores cableado falta fijar los respectivos diagramas Unifilares a los Tableros, Tuberías de redes eléctricas metálicas marcadas con con cinta color naranja que identifica las redes eléctricas.
		Alimentador a Tablero de Fluoculadores a instalar en Caseta de Operación y Monitoreo , tuiberia instalada cunmplienro norma, solo la tuberia PVC no puede quedar expuesta se debe cubrir con bota de concreto.

		Inspeccionde avance de obra electrica, construccion Malla de puesta a Tierra, configuraciaon en Delta o triangulo formada por 3 electrodos o varillas de Cu de 2,4 mt.
		Malla de puesta aa tierra en Cable de Cu desnauco #2/0 AWG se observa instalado en la zanja soterrado 0,6 mt. cumple norma. Se verifican los extremos con las varillas de cu enterradas para rematara con camara de inspeccion.
		Malla de puesta a Tierra construida de acuerdo al diseño consta de 3 varillas solidad de Cu. Con empalmes por Termofusión o sea soldadas con soldadura cadweld. El reglamento exige para mas de una varilla a tierra empalmar solo por Termofusión.

Registro fotografico del reinicio de actividades en la PTAP de Ginebra.

		Inspeccion a las camaras de inspeccion de electriodos de puesta a tierra, coan camaras de registo de 0,3x0,3 mt. la Tapa debe registrar el simbiolo de Tierra.. Empalmes Varilla-Cable por Termofusion.
		Cuarto Tecno de Baja TEnsion, Se verifica ainstalaciaon de Tablero Geenral de BT, incluye transfgerencia Automatica: Red-Planta . .
		Se verifica las crucetas metalicas y los herrajes para el montaje de la estreuctura en H, que sosportara en su base ela Transformador de Potencia de 150 KVA. Ademas de la existencia en obra del Equipop de medida por Media Tension, medidion de 2 elementos.
		Se verifican los posstes de redes de MT a 13,2 KV hincados y aplomnados listos para armar la estructura en H y construir el vano de red derivado, exrtentesion de MT hasrta el nodo del Transformador.

		Caseta de control y monitoreo principal de la Planta, se verifica el montaje del Tablero de Fuerza ay coantol de Fluoculadores , tablero incluye dispositivos exigidos por la Interventoria, como instalar Variadores de Velocidad.
		Tablero fuierza aya contol Fluoculadores con poroteccion general o totalizador. Registro del Voltaje de operación a 220V. Se evidencia el montaje de protecciaon Dispositivo de protecciaon coantra Sobretensiones (DPS) transitorias por descargas atmosfericas.

2.4 COMPONENTE AMBIENTAL

Con relación al tema ambiental se tiene:

- Permiso de aprovechamiento Forestal en la Bocatoma ubicada en el Municipio de Ginebra, la Alcaldía radicó oficio ante CVC el día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 206392024 y se da respuesta: Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024 - "Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca" - VIGENCIA: 23-07-2025 y en Proceso de Prorroga.

    - Permiso Resolución No.PM.300-42-2-028 18-11-2024 para rotura del pavimento del Tramo N° 3, se radico ante la Secretaria de Planeación de Guacarí, con vigencia al 18 de Noviembre de 2026.

- Por parte de la Gobernación del Valle, se recibe respuesta del oficio del 5 de agosto, el día 27 de septiembre de 2014, mediante oficio 1.360.129 radicado 2024138117, donde informan que las vías a intervenir son del Municipio de Guacarí.

    - Permiso de rotura con resolucion de aprobacion por parte del Municipio de Ginebra, para los siguientes tramos:

      Tramo 1: Inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo.
      Tramo 2: Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra

    - Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRA

      En el siguiente cuadro se registran los permisos, que se han solicitado, los que se han otorgado y los que estan en proceso de ejecución:

PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE				
TIPO DE PERMISO	**RESOLUCIÓN**	**AUTORIDAD COMPETENTE**	**VIGENCIA**	**ESTADO**
Concesión de Aguas Superficiales	Resolución 0740 No. 0741 0000576 10-07-2020	CVC	10-07-2030	"Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales a favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 890399032-8 para Los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí, Departamento del Valle del Cauca" VIGENTE
Permiso de Ocupación de Cauce	Resolución 740 No. 0741 0502 31-05-2024	CVC	31-05-2024	Solicitud Prorroga por parte de ACUAVALLE S.A E.S.P – Oficio AC-18742025 de febrero 19 de 2025. (Rad. 207222025)
Aprovechamiento Forestal Planta ACUAVALLE Ginebra	Resolución 740 No. 0741 0381 29-04-2024	CVC	08-06-2026	Entrega del informe de aprovechamiento forestal a la CVC por parte de ACUAVALLE S.A. Se espera asignación de compensación forestal y aprobación del predio propuesto para la siembra por parte de esta entidad. VIGENTE
Aprovechamiento Forestal Sector Bocatoma	Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024	CVC	23-07-2025	"Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca" VIGENTE – EN PROCESO PRÓRROGA
Licencia de Espacio Público	Resolución No. 0004-29-01-2025 29-01-2025	Planeación Municipal Ginebra	29-01-2026	Por medio de la cual se aprueba una prórroga a Licencia Urbanística de Intervención y Ocupación de Espacio Público con Resolución No. 0004-01-2023 del 26 de enero del 2023.
Licencia de Espacio Público	Resolución No. 140-23-3-002 31-01-2025	Planeación Municipal Guacarí	31-01-2026	Por medio de la cual se aprueba una prórroga a Licencia Urbanística de Intervención y Ocupación de Espacio Público con Resolución.

PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE				
TIPO DE PERMISO	**RESOLUCIÓN**	**AUTORIDAD COMPETENTE**	**VIGENCIA**	**ESTADO**
PMT	Resolución No.	Secretaría de Movilidad Ginebra	Duración del Proyecto	"Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle"
PMT	Resolución No. 900-50-020 20-03-2023	Secretaría de Movilidad y Transporte Guacarí	Duración del Proyecto	"Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle"
Permiso Rotura de Vías	EN TRAMITE	Planeación Municipal Ginebra	EN TRAMITE	Derecho de petición – solicitud respuesta solicitud permiso de rotura de vía y/o espacio público (Oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons147-2025)
Permiso Rotura de Vías	Resolución No. PM.300-42-2-028 18-11-2024	Planeación Municipal Guacarí	18-11-2026	Mediante correo electrónico de fecha 16 dic 2024 se recibe Notificación Licencia de Intervención de Espacio Público (Resolución No. PM.300-42-2-028 de fecha 18 Nov 2024)

2.4.1 Disposición de residuos sobrantes de obra:

El contratista cuenta con dos sitios autorizados para la disposición de estos residuos:

- El relleno sanitario en el corregimiento de Presidente en el Municipio de San Pedro. Este cuenta con Licencia Ambiental otorgada por la CVC
- Servi Transportes López y Recuperación Ambiental S.A.S, en el Municipio de Palmira, el cual cuenta con una capacidad de recepción de 85.000 m3 para disposición final de RCD avalado por Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.
- Como el tanque de la PTAP de Ginebra se debe rellenar debido a que el diseño inicial tenía una sección mayor, el material sobrante de las excavaciones del tramo 3 se está llevando a la planta y se está aprovechando este material para hacer el relleno.

3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El Plan de Gestión Social (PGS), es el instrumento de Gestión Social con el que cuenta para plantear las directrices que le permitirán mitigar, controlar, corregir y/o compensar los impactos generados por la ejecución de la obra desde el componente social, en el área de influencia del Proyecto.

Las estrategias trazadas en el Plan de Gestión Social se ejecutarán mediante el cumplimiento de 11 aspectos sociales:

Aspecto No. 1: Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto

Aspecto No. 2: Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto
Aspecto No. 3: Programa de Información a la Comunidad
Aspecto No. 4: Programa de divulgación a la Comunidad
Aspecto No. 5: Reuniones con la Comunidad
Aspecto No. 6: Programa de atención a la Comunidad
Aspecto No. 7: Programa de atención al Ciudadano
Aspecto No. 8: Recorridos por la Obra
Aspecto No. 9: Reunión de Avance de Obra
Aspecto No. 10: Conformación del comité de Veeduría Ciudadana
Aspecto No. 11: Vinculación de mano de obra calificada y no calificada

Objetivo: Realizar las actividades pertinentes de acuerdo al Plan de Gestión Social, que contribuyen al fortalecimiento de la participación social y el acompañamiento de la Comunidad en el proceso constructivo que viene ejecutando el Consorcio Redes y Ptaps Valle.

- **ASPECTO No. 01: DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.**

Objetivo: Realizar el diagnóstico de la zona de influencia del proyecto mediante la identificación y análisis de las características sociales, comunitarias, territoriales y de servicios presentes en el área de intervención, con el fin de reconocer las condiciones actuales de la comunidad y orientar adecuadamente las actividades del proyecto.

Acciones Desarrolladas:

El contratista está cumpliendo con lo definido en el Plan de Gestión Social.

- **ASPECTO No. 02: CENSOS DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL PROYECTO**

Objetivo: Garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser ejecutado.

Acciones Desarrolladas:

En el mes de febrero de 2026 la gestión social del contratista informó que hasta el momento hay un acumulado del 78.57%

.
Hasta ahora se han realizado las siguientes actas:

Regaderos - Ginebra: 15 actas de inicio
Sector Puente Amarillo: 6 actas de inicio
Tramo 3 Sector la Esmeralda: 23 actas de inicio
Tramo 2 Planta Ginebra: 7 actas de inicio
Sector Albania: 2 actas de vecindad
1 acta de entorno
Sector Planta de Guacarí Hacienda La Tesalia Guabitas 1 acta de entorno

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Levantamiento de Actas de Vecindad y Fachada de apertura	70	55	15	78.57%

Tabla N° 1 Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado

- **ASPECTO No. 03 : PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD**

Objetivo: Informar de manera permanente, entre las comunidades del área de influencia directa, contenidos claros y precisos sobre el proyecto, facilitando la generación de un clima de confianza, compresión y cooperación en la ciudadanía, por las actividades inherentes al mismo.

Acciones Desarrolladas:

La interventoría evidencia que se ha cumplido con brindar la información a la comunidad por medio de las socializaciones que se han realizado en meses pasados, dando cumplimiento a esta actividad del Plan de Gestión Social, sin embargo, se continuará brindando la información que se requiera para aclarar las inquietudes de la comunidad.

- **ASPECTO No. 04 : PROGRAMA DE DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD**

Objetivo: Implementar un programa de divulgación dirigido a la comunidad del área de influencia del proyecto, con el fin de informar de manera clara y oportuna sobre el alcance, avances, actividades y posibles impactos de la obra, promoviendo la participación, el acceso a la información y la adecuada relación entre la comunidad y el proyecto.

Acciones Desarrolladas:

En el mes de febrero aun el contratista no ha realizado la instalación de la cartelera informativa para la divulgación a la comunidad. La profesional social María Fernanda Martínez informó que envió solicitud a las alcaldías de Ginebra y Guacarí para la autorización de la instalación y aún no ha recibido respuesta a la solicitud, además informa que realizará la gestión con la Personería Municipal de Guacarí.

- **ASPECTO No. 05: REUNIONES CON LA COMUNIDAD**

Objetivo: Realizar reuniones con la comunidad del área de influencia del proyecto con el fin de socializar información sobre el desarrollo de la obra, presentar avances, resolver inquietudes y promover la participación comunitaria.

Acciones Desarrolladas:

La interventoría evidencia que el contratista ha cumplido con esta actividad de reuniones con la comunidad planteada en el Plan de Gestión Social.

- **ASPECTO No. 06: PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD**

Objetivo: Brindar atención oportuna y permanente a la comunidad del área de influencia del proyecto, mediante la recepción, orientación y gestión de inquietudes, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos, con el fin de contribuir a la adecuada ejecución del proyecto.

Acciones Desarrolladas:

- Se continúa con el espacio dispuesto para el PAC con los formatos de PQRS para que la Comunidad acceda a ellos si tienen alguna pregunta, queja o solicitud.

- Se realizó seguimiento a los buzones de sugerencias ubicados en la Personería de Guacarí y Personería de Ginebra no se encontró PQRS de la comunidad.

- Se realizó seguimiento a las vallas informativas ubicadas en las vías principales de ingreso de los dos municipios de Ginebra y Guacarí, brindando la información sobre el contrato.

- Se realizó la aplicación del sondeo de percepción ciudadana.

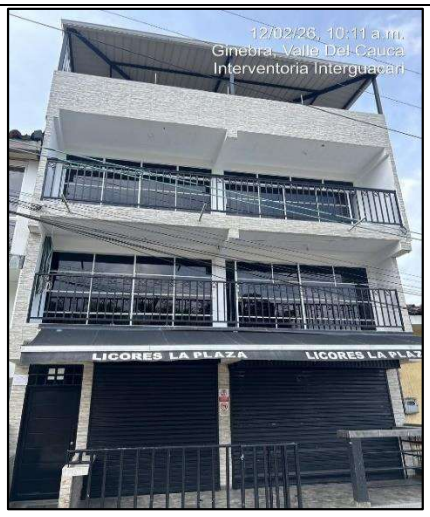


Foto N°1. Punto de Atención a la Comunidad



Foto N°2. Cartelera Informativa



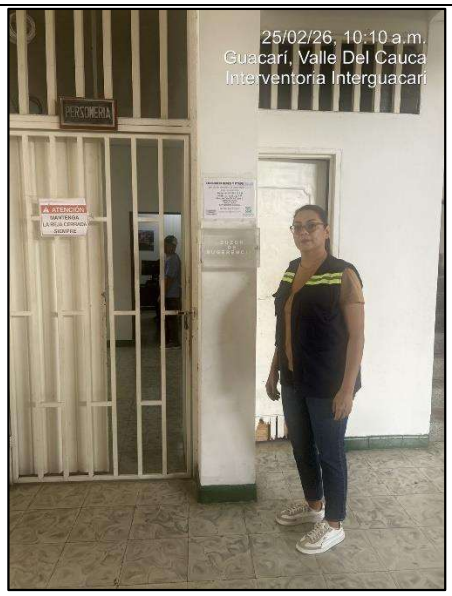


Foto N°3. Seguimiento Buzón de Ginebra

Foto N°4. Seguimiento Buzón de Personería Guacarí





Foto No. 5. Valla Informativa Ginebra

Foto No. 6. Valla informativa en Guacarí



Foto N°7. Aplicación sondeo de percepción

- **ASPECTO No. 07 : PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Objetivo: Crear y mantener un sistema de atención al ciudadano que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto.

Acciones Desarrolladas:

El contratista continúa cumpliendo con el programa de atención al ciudadano, en el punto de atención se cumple con los horarios establecidos:
Martes de 08:00 am a 12:00 am
Viernes 1:00 pm a 4:00 pm,
Lugar: oficina ubicada en la calle 11 # 4-37, tercer piso, edificio La Piscina barrio El Centro - Corregimiento de Costa Rica, Municipio Ginebra, Valle del Cauca.

Existen dos buzones de sugerencias ubicados en:

1. Personería de Guacarí.
2.Personería de Ginebra.

PROFESIONAL SOCIAL ENCARGADO	TELÉFONO	CORREO	DIRECCIÓN OFICINA
María Fernanda Martínez	3218673230	redes.pqr@gmail.com	Calle 11 # 4-37 tercer piso. edificio La Piscina barrio El Centro Corregimiento Costa Rica Municipio Ginebra.

Tabla N° 2 Información atención a la comunidad

- **ASPECTO No. 08: RECORRIDOS POR LA OBRA**

Objetivo: Realizar recorridos por la obra con la comunidad, veeduría ciudadana y demás actores interesados, con el fin de dar a conocer los avances del proyecto, las actividades que se ejecutan en campo y resolver inquietudes, promoviendo la transparencia, la participación y el seguimiento comunitario al desarrollo de la obra.

Acciones Desarrolladas:

En el mes de febrero no se programó recorrido de obra.

- **ASPECTO No. 09. REUNIÓN DE AVANCES DE OBRA**

Objetivo: Realizar reuniones de avances de obra con la comunidad y los actores involucrados, con el fin de socializar el estado de ejecución del proyecto, informar sobre las actividades desarrolladas y programadas, y atender inquietudes de la comunidad, promoviendo la transparencia y el seguimiento al desarrollo de la obra.
Acciones Desarrolladas:

Se evidenció que el componente social del contratista realizó la reunión informativa de avance de obra con los veedores ciudadanos del municipio de Ginebra; el 17 de febrero de 2026.

- El ingeniero Darío Florez – Residente de obra informó sobre las actividades realizadas desde las diferentes áreas: técnica, ambiental, SST y social.
- Informa que la nueva fecha de terminación es el 22 de julio de 2026 y actualmente se está haciendo la reformulación.
- Se está analizando si se hace un mejoramiento al diseño que se presentó por estar sobrediseñado para optimizar los recursos.
- En el tema de ejecución el único que está finalizado es el preliminar, se están ejecutando los diferentes frentes.
- Para el mes de marzo se tiene proyectado finalizar el punto de intervención en la PTAP de Ginebra – tanque de almacenamiento y el de la Albania. En Guacarí se tiene proyectado que en marzo se termine la Acometida eléctrica.
- En la instalación de la tubería desde la Cadica hasta la planta, de Guacarí, se van a enfocar en la línea de conducción, surgió un problema con la roca para instalar la tubería y se tuvo que subir el nivel de la tubería para que no quedara tan enterrada. Ya se ha empezado a hacer la instalación de los tapones para las pruebas.
- En la PTAP de Ginebra se hizo repello, impermeabilización, se hizo prueba de falso fondo para mirar que todos los orificios estuvieran bien. Se está instalando una válvula, la idea es terminar la instalación del filtro y la plataforma.
- En la PTAP de Guacarí se van a enfocar en el componente eléctrico, se tiene el trasformador de Ginebra en Guacarí porque se piensa tenerlo como plan B para hacer una provisional, para poner en prueba los equipos.
- Se ha hecho pruebas hidrostáticas con agua y presión mayor de la operativa y se deja en un tiempo determinado, para evaluar si hay pérdida de presión.
- En el tanque de almacenamiento de Ginebra, se hizo la limpieza del tanque, se tiene programado que en este mes se haga la instalación de las válvulas.

- En el tanque de almacenamiento de Ginebra, se hizo entrega y supervisión a Acuavalle, de la impermeabilización del tanque, el tanque aún no se entrega porque está pendiente la conexión.
- En el tanque de la Albania, se hizo la pintura de los dos tanques, se entregará en dos o tres días y se tiene programado que en marzo se haga entrega de las válvulas y conexiones, se ha hecho casi todo el relleno solo falta donde va la conexión.
- Los frentes pendientes son: bocatoma, por los permisos y el chequeo de la reformulación, permiso de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal.
- Por temas de costo, se va a proponer una mejor cimentación del diseño.
- En la tubería de 18" se inició en una vía no pavimentada, el Frente No. 2 está suspendido por temas sociales.
- En el componente Ambiental la ingeniera María Camila Gil Gil, informó que se viene adelantando los permisos.
- En el componente de SST, la profesional Mónica Hernández informó que se ha realizado capacitaciones, pausas activas, acompañamiento, no se han presentado accidentes de trabajo en enero y febrero.
- En el mes de febrero renunció una auxiliar vial y se hizo el ingreso de una persona nueva de Ginebra como auxiliar administrativa.
- En el componente Social, la profesional María Fernanda Martínez informó que se modificó el buzón que se tenía en el establecimiento Tas- Tas, y se trasladó a la personería de Ginebra con autorización del personero municipal. Se desinstaló el buzón de la Ptap de Ginebra y está pendiente ubicarlo en otro lugar.
- la profesional María Fernanda Martínez informó que hubo intervención por habitantes de Puente Rojo del tramo 2 y se están haciendo acercamientos con la comunidad y concejales del sector.
- Se diseñó una encuesta de percepción porque las personas no están depositando PQRS para indagar sobre la percepción, de la comunidad hacia el proyecto.





Foto N°8 y 9. Reunión comité de veeduría Ginebra

La reunión informativa para los veedores de Guacarí se programó inicialmente tenía programada para el martes 17 de febrero de 2026 y se aplazó por falta de quorum, solo asistió la Veedora Sandra Villa, los demás veedores presentaron excusas por asuntos personales, se reprogramó para el 26 de febrero de 2026, pero por solicitud de los veedores, por asuntos de gestión de riesgo presentados en el corregimiento.



Foto N°10. Reunión cancelada del comité de veeduría Guacarí por falta de quórum



Ilustración N°1. convocatoria reunión Comité de Veeduría Ginebra



- **ASPECTO No.10: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA.**

Objetivo: Promover la conformación del comité de veeduría ciudadana en el área de influencia del proyecto, con el fin de fortalecer la participación comunitaria, el control social y el seguimiento a la ejecución de la obra, garantizando la transparencia y el adecuado desarrollo del proyecto.

Acciones Desarrolladas:

Se evidenció que el contratista dio cumplimiento al aspecto No.10 del Plan de Gestión Social con la conformación de los dos Comités de Veeduría Ciudadana en los Municipios de Guacarí y Ginebra.

La interventoría social participó y constató la realización de una reunión del Comité de Veeduría, dirigida a los veedores del municipio de Ginebra realizado el 17 de febrero de 2026.

COMITÉS TÉCNICOS

- En el mes de febrero no se realizó comité técnico de obra.

- **ASPECTO No.11: VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA**

Objetivo: Promover la vinculación de mano de obra calificada y no calificada, priorizando la contratación de personal residente en el área de influencia del proyecto, con el fin de generar oportunidades de empleo local, fortalecer la participación de la comunidad y contribuir al desarrollo social y económico de la zona.

DETALLE	NOMBRE COMPLETO	CARGO	MUNICIPIO	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	GRUPO PROFESIONAL					
1	Lina Marcela Buriticá	Coordinadora de proyectos	Cali	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	17/01/2023	28/02/2026
2	Gina Leidy López	Residente Obra	Cali	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	13/02/2023	28/02/2026
3	Ana Fernanda Rosero Cajigas	Ing. Presupuesto	Ginebra	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	15/01/2024	
4	Mónica Ximena Hernández	Residente sst	Guacarí	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	22/12/2025	
5	Darío Enrique Flórez	Residente Obra	Costa rica	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	05/02/24	

6	Ana Milena Martínez	Aux administrativa	Ginebra	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	05/02/24	
7	María Fernanda Martínez	Profesional social	BUGA	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		
8	María Camila Gil	Ing. Ambiental	Ginebra	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	02/05/25	
	GRUPO OPERATIVO					
9	José Hilder López	Almacenista	Costa rica	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	10/03/2024	
10	Jorge Aponte	Ayudante de obra	Ginebra	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	2/9/2024	
11	Mauricio Fernando Soto	Ayudante obra	Puente rojo	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	14/11/24	
12	Jorge Hernán Ocampo Cortez	Ayudante obra	Ginebra	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	26/11/24	
13	Rodrigo Rodríguez	Ayudante obra	Puente rojo	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	02/07/25	
14	Saray Tonuzco	Aux vial	Guacarí	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	03/07/25	
15	John Jairo Viveros	Ayudante de obra	Guacarí	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	14/07/25	
16	Jeiner Andrés Bustos Echeverri	Topógrafo	Armenia	TOPOGRAFIA	05/01/2024	
17	Juan David satizabal Velásquez	Cadenero	Costa rica	TOPOGRAFIA	26/01/2026	
18	Yelitza Jimenes	Aux Topografía	Palmira	TOPOGRAFIA	07/10/2025	
19	Nelson Blanco	Electricista	Cali	COINGENIERIA	15/10/2025	
20	Andrés Felipe Gómez	Ayudante	Guacarí	ELECTROMONTAJES	11/11/2025	
21	Lorena Gómez	Siso	Cali	ELECTROMONTAJES	11/11/2025	
22	Iván Camilo Caicedo	Oficial	Guabitas	A7	15/07/25	
23	Eider Flores	Ayudante	Palmira	A7	31/05/25	
24	JHONATAN ANDRES HURTADO GIL	Ayudante	Guabitas	A7	10/01/2026	
25	Carolina Mora Duarte	Aux. Vial	Ginebra	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	10/02/2026	

Tabla N° 3. Información personal contratado por el contratista

SECTOR / MUNICIPIO	CARGO	CANTIDAD
GUACARÍ	Ayudante de obra	1
GUACARÍ	Ayudante	1
GUACARÍ	Auxiliar vial	1
GUACARÍ – Guabitas	Ayudante	1
GUACARÍ – Guabitas	Oficial	1
GUACARÍ – Puente Rojo	Ayudantes	2
TOTAL GUACARÍ		**7**
GINEBRA	Ayudante de obra	2
GINEBRA	Ingeniero ambiental	1
GINEBRA	Auxiliar administrativa	1
GINEBRA	Auxiliar vial	1
GINEBRA	Ingeniero de presupuesto	1
GINEBRA -Costa Rica	Almacenista	1
GINEBRA -Costa Rica	Cadenero	1
GINEBRA -Costa Rica	Residente de obra	1
TOTAL GINEBRA		9

Tabla N° 4. Mano de obra contratada por municipio.

GRUPO PROFESIONAL	FEMENINO	MASCULINO
	7	1
PERSONAL OPERATIVO	4	13

Tabla N°5. Personal por genero

%	FORMULA	PORCENTAJE
PORCENTAJE DE MUJERES	Mujeres contratadas/ Personal activo*100%	44%
PORCENTAJE DEL AREA DE INFLUENCIA	Personas de la zona de influencia contratada/Personal *100%	72%

Tabla N°6. Porcentaje personal contratado

En resumen, tenemos:

Municipio de Ginebra: 9 personas
Municipio de Guacari: 7 personas

Total personal activo en la zona 25 personas

Acciones Desarrolladas:

El contratista está fomentando y fortaleciendo la vinculación laboral del personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo y en generación de empleos directos e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra.

En el mes de febrero el contratista informó que se retiró una auxiliar vial y se contrató una auxiliar administrativa, en el mes de marzo se vinculará nuevamente la auxiliar vial.

Se evidenció que el contratista cuenta con 25 personas vinculadas al proyecto, de las cuales 11 son mujeres, lo que corresponde al 44 % del total del personal, dando cumplimiento a lo establecido en materia de contratación con enfoque de género.

Así mismo, se verificó que, del total del personal contratado, 9 personas pertenecen al municipio de Ginebra y 7 al municipio de Guacarí, para un total de 16 trabajadores de la zona, equivalente al 72 % del personal, cumpliendo con lo estipulado contractualmente respecto a la vinculación de mano de obra local.

OTRAS ACTIVIDADES

- Se realizó reunión de seguimiento de actividades del componente social.
- Se realizó seguimiento al Punto de Atención a la Comunidad, está brindando su servicio con normalidad.
- La social María Fernanda Martínez informó que está realizando la gestión con el enlace de Juntas de Acción Comunal – Sergio Salazar para solicitar la autorización para instalar la cartelera informativa en Guacarí.
- Se realizó reunión de profesionales sociales: María Fernanda Martínez – Profesional Social del contratista, Neisler Abadia - Profesional Social de Interventoría y Sandra Romero- Profesional Social de Vallecaucana de Aguas, se realizó revisión y aprobación de la encuesta de percepción para aplicarle a las personas del sector de influencia del proyecto.





Foto N°11. Reunión gestión social *Foto N°12. Reunión gestión social*

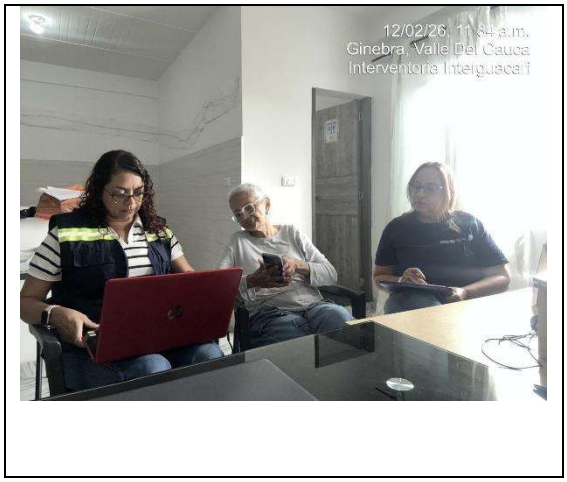


Foto N°13. Reunión gestión social con profesionales sociales de contratista, Vallecaucana de Aguas e Interventoría

CONCLUSIONES

- La interventoría social realizó seguimiento a las actividades realizadas relacionadas con este componente en el mes de febrero de 2026.
- Durante este mes de febrero de 2026, se continuó evidenciando que el contratista está desarrollando su Plan de Gestión Social.
- El Punto de Atención a la comunidad durante el mes de febrero de 2026 prestó la atención en los horarios establecidos, durante este mes no se recibió PQRS.
- La interventoría realizó seguimiento a los buzones de sugerencia y no se encontraron PQRS.
- Continúa pendiente la instalación del pendón informativo.
- Se evidenció que el componente social del contratista realizó la reunión presencial informativa de avance de obra, comité de veeduría ciudadana con los veedores ciudadanos de Ginebra, en este mes no se programó recorrido de obra.
- El contratista informó que las actividades de excavación que se tenían programadas para realizar en el sector entre la PTAP de Ginebra y Puente Rojo aún no se han iniciado por solicitud de la comunidad de no intervenir la vía, se está haciendo acercamientos con intermediación de los concejales del sector.
- Se evidenció que el contratista cuenta con 25 personas vinculadas al proyecto, de las cuales 11 son mujeres, lo que corresponde al 44 % del total del personal, dando cumplimiento a lo establecido en materia de contratación con enfoque de género.
- Así mismo, se verificó que, del total del personal contratado, 9 personas pertenecen al municipio de Ginebra y 7 al municipio de Guacarí, para un total de 16 trabajadores de la zona, equivalente al 72 % del personal, cumpliendo con lo estipulado contractualmente respecto a la vinculación de mano de obra local.

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO INTERGUACARI, a través de la gestión de la supervisión en campo, garantizará la seguridad y salud de los trabajadores y contratistas durante la ejecución de sus labores, para lo cual se tendrá en cuenta que:

- Los trabajadores reciban la formación adecuada para el trabajo que se espera de ellos
- Se apliquen las medidas de seguridad en el trabajo.
- Se realicen las afiliaciones al sistema de Riesgos profesionales.

1. OBJETIVO

Presentar el alcance del proyecto y mostrar la gestión de **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**, referente a temas de seguridad y salud en el trabajo de la ejecución de la obra en el mes del **1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.**

2. ALCANCE

El presente informe verifica las actividades aplicadas por todo el personal que realiza labores en campo, referente a seguridad, salud en el trabajo, considerando las actividades durante el mes, y así y la ejecución en los diferentes puntos de trabajo.

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DIARIAS	OBSERVACIONES GENERALES
Verificación de condiciones de salud	Se mantienen controladas las condiciones de salud, dando cumplimiento a las recomendaciones y acciones implementadas por parte del contratista con el fin de evitar la propagación del caso de tuberculosis. De igual manera, se realiza seguimiento permanente a las condiciones de salud de todo el personal frente a la aparición de cualquier virosis.
Verificación de la zona de trabajo y herramientas	Antes de iniciar las actividades, los trabajadores verifican las condiciones del área de trabajo, al igual que el estado de las herramientas a utilizar.

Uso de Elementos de Protección personal	Antes de iniciar las labores, los trabajadores hacen uso de los EPP, haciéndose responsable de su autocuidado y el de sus compañeros, en este periodo se entrega dotación al personal nuevo.

Delimitación del área de trabajo, orden y aseo	Antes de iniciar cualquier actividad, se delimita el área de trabajo, se solicitó instalar cinta como barrera de protección, para evitar cualquier caída en las excavaciones.

Diligenciamiento de ATS y permisos de trabajo en alturas	Antes de iniciar cualquier actividad, se realiza un análisis del área y los riesgos a los que están expuestos y que se deben intervenir, por esta razón se solicita como adjunto al informe del contratista ATS de las actividades de alto riesgo y permisos en alturas, para las actividades que lo requieran.

Exámenes médicos ocupacionales	Durante el mes de FEBRERO se verifica el cumplimiento del programa de medicina preventiva, con el objetivo de suministrar información clara sobre el estado de salud y procurar el estado integral de todos los colaboradores.

Plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias	En el periodo de FEBRERO se mantienen las condiciones óptimas de los elementos de atención a emergencias, las señalizaciones en oficina y obra, se realizó cambio y se encuentran en buen estado, se mantienen rutas de evacuación y puntos de encuentro. Se realiza un simulacro de emergencia en cumplimiento de la normativa nacional vigente en materia de gestión del riesgo y atención de emergencias.

Política y objetivos del SG-SST.	En este periodo de FEBRERO se realizan inducción y reinducción sobre las políticas SST, medio ambiente, sustancias psicoactivas, reglamento de higiene y seguridad industrial, definición de accidente y enfermedad laboral, clasificación de residuos sólidos, rutas de evacuación y puntos de encuentro.

Actualización curso de trabajo en alturas	En este periodo no se realiza actualización de curso de alturas.

Las CHARLAS realizadas en el mes se describen a continuación:

5.1 CUADRO ESTADÍSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES.

DESCRIPCIÓN	Número de asistentes/ Capacitaciones	Dirigido a
Posturas Forzadas y Repetidas		TRABAJADORES
Caídas a distinto nivel		TRABAJADORES
Levantamiento de cargas		TRABAJADORES
Inspección EPCC		TRABAJADORES

5.2 INSPECCIÓN

En el presente mes se han realizado las siguientes inspecciones:

ITEM	INSPECCIÓN	HALLAZGOS	No. INSPECCIONES	
			PROGRAMADAS	REALIZADAS
1	Inspección de EPP	Revisión de las condiciones y el estado de los elementos de protección personal	Por actividad	02-2026
2	Inspecciones locativas (contenedores, excavaciones campamento y oficina)	Sin hallazgos	Por actividad	02-2026
3	Inspección de herramientas (Pulidora, taladro de mano, mezclador)	Sin hallazgos	Por actividad	02-2026
4	Inspecciones de extintores, botiquín y camillas	Sin hallazgos	or actividad	02-2026

5.3 INDICADORES DE AUSENTISMO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

INDICADOR	
• Número de atenciones médicas comunes reportadas	0
• Días perdidos	0
• Número de atenciones médicas ocupacionales reportadas	0
• Días perdidos	0
Incidentes	0
Accidentes	0

Una incapacidad por enfermedad común.

a. VERIFICACION PERSONAL Y CONTRATISTA EN OBRA.

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		CARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	Aldo Gutiérrez	79.699.673	N/A		Consorciado	Sura	Sura	Colpensiones
2	Carlos Andrés Leyva	89.008.184	N/A		Director de la Obra	Sura	Sura	Protección
3	Lina Marcela Buriticá	42.136.662	01/12/22	8/02/2026	Coordinadora de proyectos	S.O.S.	Sura	Colpensiones
4	Gina Leidy López	1.144.140.957	17/02/23	8/02/2026	Residente Obra	S.O.S.	Sura	Porvenir
5	Ana Fernanda Rosero Cajigas	36.759.739	17/01/24		Ing. Presupuesto	Sanitas	Sura	Colpensiones
6	Mónica Rodríguez	1.088.276.192	22/12/25		P Apoyo SST	S.O.S.	Sura	Porvenir
7	Darío Enrique Flórez	1.026.277.221	05/02/24		Residente Obra	Sura	Sura	Colfondos
8	Ana Milena Martínez	1.144.081.242	05/02/24		Aux administrativa	Sanitas	Sura	Colpensiones
9	María Camila Gil	31.658.574	02/05/24		Ingeniera Ambiental	N EPS	Sura	Colpensiones
10	María Fernanda Martinez	38.856.496	05/01/23		Profesional social	Sura	Sura	Colpensiones
11	Diana Marcela Echavarría	31.658.574	01-02-23		Ing. Ambiental	N. EPS	sura	Colpensiones
12	José Hilder López	7.551.673	11/03/24		Almacenista	Sanidad	Sura	N/A
13	Jorge Aponte	1.112.098.988	02/09/24		Ayudante de obra	N EPS	Sura	Porvenir
14	Mauricio Fernando Soto	14.652.613	14/11/24		Ayudante obra	SOS	Sura	Porvenir
15	Jorge Hernán Ocampo Cortez	9.858.689	26/11/24		Ayudante obra	Emssanar	Sura	Porvenir

16	Carolina Mora Duarte	1.082.976.100	10-02-26		Auxiliar Vial	Salud Total	Sura	Porvenir
17	Rodrigo Rodríguez	16.860.355	02-07-25		Ayudante obra	Salud Total	Sura	Porvenir
18	Saray Tonuzco	1.005.870.273	03-07-25		Auxiliar Vial	Emssanar	Sura	Colpensiones
19	Ronald Andrés Gómez	1.112.958.420	16-01-26		Ayudante obra	Salud Total	Sura	Porvenir
20	Jhon Jairo Viveros	94.444.582	28-09-25		Ayudante obra	Salud Total	Sura	Porvenir

	PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA							
No.	NOMBRE	CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		ARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	uan David Satizabal Velásquez	1.112.966.752	22/01/26		Cadenero	S.O.S.	Colmena	Protección
2	Jeiner Andrés Bustos Echeverri	1.097.401.400	07/02/24		Topógrafo	Salud Total	Positiva	Porvenir
3	Yelitza Jiménez	1.097.408.937	08/10/25		ux. Topográfico	Salud Total	Positiva	Porvenir

PERSONAL GRUPO LOGISTICA INTEGRAL SAS								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		CARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	JOSE MIGUEL GUERRERO SÁNCHEZ	2483439	02/04/24		VIGILANTE NOCTURNO	N EPS	SURA	PORVENIR
2	BRAYAN ALEXANDER NAVARRETE	1.010.151.246	01/08/24		VIGILANTE NOCTURNO	EMSSANAR	SURA	COLFONDOS
3	YENNY MABEL BEDOYA	1006248489	08/09/25		VIGILANTE FIN DE SEMANA	ASMET SALUD	SURA	PORVENIR
4	DANILO ZAMORANO OSPINA	16929311	08/09/2025		SUPERVISOR	SOS	SURA	PORVENIR
5	ANDRES FERNANDO RAMIREZ	94073560	09/08/2025		SUPERVISOR	SOS	SURA	PORVENIR
6	JEAN KARLO RAMIREZ MONTES	1006051885	09-/08/2025		SUPERVISOR	EMSANAR	SURA	PORVENIR

7	OVIDIO MONTOYA GIRALDO	6361885	09/08/2025		SUPERVISOR	SOS	SURA	PORVENIR

PERSONAL METALMECANICA CONINGENIERIA SAS								
No.	NOMBRE	CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		CARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	
1	Carlos Fernando Labrada	16.746.176	30/08/2024		Ingeniero Residente	Comfenalco	Sura	Porvenir
2	Diego Valor	16.861.728	20/05/25		Armador	N EPS	Sura	Porvenir
3	Juan Diego Castro	1.114.813.332	01/11/24		Ayudante	SOS	Sura	Porvenir
4	Carlos Alejandro Castañeda	14.698.890	01/08/25		Soldador	Salud Total	Sura	Porvenir

PERSONAL OPERATIVO A7 CONSTRUCCIONES								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		CARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	IVAN CAMILO CAICEDO	1.114.457.595	15/07/25		MAESTRO	S TOTAL	SURA	PORVENIR
2	EIDER FLOREZ	1.114.621.798	01/12/25		AYUDANTE DE OBRA	EMSSANAR	SURA	PORVENIR
3	JHONATAN ANDRES HURTADO GIL	1.114.460.124	05/02/2026		AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR

PERSONAL OPERATIVO INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		CARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	DAVID LOZANO	16.932.279	19/08/25		ING. ENCARGADO	EMSSANAR	SURA	PORVENIR
2	MAICOL CAICEDO	1.143.938.113	19/08/25		INSPECTOR	SURA	SURA	PORVENIR

3	WALTER ASPRILLA	16.789.876	19/08/25		AYUDANTE	N EPS	SURA	PORVENIR
4	ORLEY GOMEZ	94.301.373	19/08/25		CONDUCTOR	COLPENSIONES	SURA	SANITAS
5	JOSE ALBERTO MELENDEZ	PT5523201	19/08/25		OPERADOR MAQUINA	ASMET SALUD	SURA	PORVENIR
6	ALBEIRO ARANGO	94.474.251	01/11/25		OPERADOR MAQUINA	SOS EPS	COLMENA	COLPENSIONES

PERSONAL OPERATIVO ELECTRO MONTAJES BS SAS								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		CARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	NELSON BLANCO	91.272.299	03/10/25		ELECTRICISTA	N EPS	SURA	COLPENSIONES
2	ANDRÉS FELIPE GOMEZ	1.007.555.715	03/10/25		AYUNDANTE	S TOTAL	SURA	PROTECCION
3	LORENA GOMEZ	38.595.100	27/10/25		INSP SST	N EPS	SURA	PORVENIR

Fuente de elaboración: Informe de contratista, Mónica Rodríguez 02-2026 SST

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

Personal Consorcio	18
Personal topografía	3
Personal seguridad	7
Personal Congeniaría	4
Personal Operativo A7 Construcciones	3
Personal Electro montajes	3
Personal Operativo Ingeniería y Soluciones Civiles	6
Personal Renovando Ingeniería SAS	4
TOTAL	**48**

5.5 REALIZACIÓN DE SIMULACROS

No se realizaron simulacros este mes.

6. MANEJO AMBIENTAL

6.1 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS RCD

El aprovechamiento de los Residuos De Construcción Y Demolición - RCD se plantea con dos alternativas: reutilizar en obra o transportarlos a centros de acopio temporales o centros de aprovechamiento. Los centros de aprovechamiento planteados como alternativa implican, generalmente, una tercerización de los RCD. Por otro lado, un gran o mediano generador puede pensar en la construcción de centros de acopio temporales, de tal manera que se cuente con una zona de acopio donde se reúnan los RCD aprovechables que no se utilizaron en su totalidad en las obras para ser utilizado.

Las obras civiles, en la mayoría de las etapas constructivas, generan escombros, residuos de materiales de diferentes tamaños (virutas, polvillo de corte, piezas de cerámica, etc.), residuos tóxicos y algunos contaminantes orgánicos que son conocidos como residuos de construcción y demolición (RCD) y han de ser correctamente tratados para minimizar la contaminación y potenciar su aprovechamiento, y así favorecer el entorno social y el posible ecosistema involucrado. Igualmente, la interventoría realiza control a las volquetas y máquinas usadas en obra, verificando los siguientes documentos:

- SOAT.
- Revisión técnico-mecánica
- Póliza daños a terceros

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD	CERTIFICADO
Madera	No reporta	N/A
Chatarra	No reporta	N/A
Material de Excavación RCD		
Residuos Aprovechables y no Aprovechables	No reporta	N/A.
Teja PVC otros	No se genera	N/A

6.2 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y RUIDO:

La contaminación atmosférica se produce por el uso de equipos, máquinas y/o vehículos y se mitiga mediante los mantenimientos preventivos.

Actividad que se supervisa por medio de las inspecciones que se realizan periódicamente.

❖ Señalización, cerramientos provisionales y aislamiento en de los sitios de trabajo.

6.3 INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO

TIPO DE MATERIAL	FECHA	CANTIDAD
Inspección de seguridad y ambiente (orden y aseo)	Semanal	

6.4 MAQUINARIA Y EQUIPOS

MAQUINARIA EQUIPO U/O HERRAMIENTA	CANTIDAD	MARCA SERIE - PLACA
Equipos de topografía	Estación – Nivel	NIKON SNDWAY
Retroexcavadora Llantas	1	CAT
Volquetas	1	(UFK231)
Taladro demoledor	3	
Pulidora	2	DELWAT
Sierra circular para corte de madera	1	DELWAT
Planta Generadora 6.5	2	ELITE- NUEVA
Motobomba 2 pulgadas	1	BARNES
Motobomba 3 pulgadas	1	
Mezcladora de concreto	2	TOOLCRAFT
Vibrador eléctrico	3	BOSCH 2.8 HP-NUEVO
Taladros manuales	3	
Martillo demoledor	1	SIEFKEN
Rotomartillo	1	SIEFKEN
Buggy	7	Herragro- Toolcraft
Herramienta menor (palas, picas, martillo, cancel, barra, machete, destornillador, alicate)		

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados con el contratista.
- ✓ Se adjuntan permisos de trabajo para tareas de alto riesgo trabajos en alturas, y trabajos en caliente.
- ✓ Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales.
- ✓ Se siguen los lineamientos de medicina preventiva, realizando los exámenes de ingreso para el personal nuevo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- Las labores en la obra continúan desarrollándose en tres frentes de trabajo:

- PTAP de Guacarí: Filtración Modulo B , Conexión de tubería de sopladores a Unidades de Filtración , falta la colocación del medio filtrante : gravas y Filtratlite, una vez se tenga terminado este módulo se puede intervenir el Módulo A
- PTAP de Ginebra: Filtración - Tanques de Almacenamiento en la Planta y la Albania (Detalles finales en la Impermeabilización)
- Frente Guabitas : Prueba hidrostatica a la tubería PEAD 14 " a la PTAP de Guacari, satisfatoria
- Frente La Esmeralda a Puente de la Magdalena: Instalación tubería PEAD 14 ", presencia de mucha roca en la excavación, se termina este tramo.
- Frente Tramo No. 01: se continua con la excavación, relleno material filtrante e instalación de tubería PEAD 18". La lluvias caídas y de firma permanente en el sector impiden un normal desarrollo de este frente, además el material encontrado **Roca** durante las excavaciones hace que los rendimientos sean bajos.

- Con relación a los diseños de la Bocatoma, el contratista ya hizo entrega de los Estudios de Geología y Geotecnia, Diseño Hidráulico de la Captación, Hidrulica Fluvial, Rediseño de Bocatoma y diseño estructural
- Pendiente por entregar: Presupuesto de la Bocatoma, Malla Coanda y especificaciones técnicas

- Los trabajos en las plantas se desarrollan de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato

- Los permisos que se tienen pendientes por la parte ambiental y permisos de demoliciones de pavimento ya fueron dados por parte de las entidades a quien se les ha solicitado.

- Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados con el contratista.

- Continua la situación de orden social ya que los líderes del sector de Puente Rojo y Proterritorio suspendieron los trabajos en el sector de Villa Indigo a Puente Rojo, al no permitir que se ejecute ningún tipo de intervención en la vía.
- Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales.
- Se siguen los lineamientos de medicina preventiva, realizando los exámenes de ingreso para el personal nuevo.

- Se relaciona los avances físicos y financieros hasta el 28 de Febrero de 2026:

AVANCE	(%)
FISICO	76.2
FINANCIERO	74.6

Atentamente,



EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
Representante Legal
Consorcio Interguacarí
Interventoría

ANEXO 1

SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO INTERGUACARI

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-16274754 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-01	230301	800224808	PORVENIR	1	5	320.000	1.100	321.100
Período salud:	2026-01	EPS010	800088702	EPS SURA	1	5	250.000	800	250.800
Planilla Nro.:	36083037 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	5	87.000	300	87.300
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	5	0	0	0
Fecha transacción:	2026-02-16	PASENA	899999034	SENA	0	5	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	5	0	0	0
Transacción:	68980738	PAESAP	899999054	ESAP	0	5	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	5	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 659.200

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUIS MARIO DAVILA ROCHE
IDENTIFICACIÓN:	CC-16274754
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-17
FECHA DE PAGO:	2026-02-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36083037
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36083037
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR SIN INT
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 800	
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.100	
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 300	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.200	

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/03/2026

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-10, 10:05:36 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078765033

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 09/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDUARDO CARDENAS		
Documento	CC16254057	**Dirección**	CL 0 #0 - 0
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5560163
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
CC 16254057	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ	57	02																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	6.960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.800	$ 0	$ 340.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-04, 03:22:39 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079504671

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 04/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDUARDO CARDENAS		
Documento	CC16254057	**Dirección**	CL 0 #0 - 0
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5560163
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	6	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
CC 1193047011	LUIS ARCENIO CUERO MURILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 29877443	PAULA ANDREA GUERRERO MURILLO	01	00		X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 140.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 875.453	$ 35.100	0,522	$ 875.453	$ 4.600	(CCF57) COMFANDI	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 31522120	NANCY RAMIREZ CASTRILLON	01	04																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 38460488	SANDRA PATRICIA PEÑA BURBANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 6183718	EINAR MARINO JIMENEZ SOTO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 66811813	LUZ AMERICA MONTAÑO SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.879.073	$ 9.629.978	$ 9.629.978	$ 9.629.978	$ 1.260.900	$ 385.600	$ 276.000	$ 385.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.308.100	$ 0	$ 2.308.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16865991		CARDENAS OSPINA OSCAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIl 18 3N 70	CALI-VALLE	6530679	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	129491919	9501169958	I	2026/03/20	2026/03/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,832,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$12,000,000	$2,040,000			$12,000,000	$1,500,000			$0	$0			$12,000,000		$292,400		$0	$0		$3,832,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$12,000,000	$2,040,000			$12,000,000	$1,500,000			$0	$0			$12,000,000		$292,400		$0	$0		$3,832,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																					$12,000,000	$2,040,000			$12,000,000	$1,500,000			$0	$0			$12,000,000		$292,400		$0	$0		$3,832,400
1	CC	16865991	CARDENAS OSCAR																	23030 1	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS005	30	$12,000,000	$1,500,000		0	$0	$0	14-11	30	$12,000,000	2.436%	$292,400	0	$0	$0	No	$3,832,400
Total	**Afiliados(1)**																					$12,000,000	$2,040,000			$12,000,000	$1,500,000			$0	$0			$12,000,000		$292,400		$0	$0		$3,832,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,040,000	$0	$0	$2,040,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$2,040,000	$0	$0	$2,040,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$292,400	$0	$0	$292,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$292,400	$0	$0	$292,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,500,000	$0	$0	$1,500,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,500,000	$0	$0	$1,500,000
TOTAL				**1**	**$3,832,400**	**$0**	**$0**	**$3,832,400**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-02, 07:01:44 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83337131

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 02/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JESUS IVAN BASTIDAS BENAVIDES		
Documento	CC16267590	**Dirección**	CL 47A #42 C - 78
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6669047
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
CC 16267590	JESUS IVAN BASTIDAS BENAVIDES	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 250.000	4.350	$ 2.000.000	$ 87.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 657.000	$ 0	$ 657.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16257466	JORGE ENRIQUE BARONA FLOREZ	CL 31 33 93	3960341	jorgebarona2009@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	PALMIRA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64365896	06/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$261.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	261.600	261.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16257466	JORGE ENRIQUE BARONA FLOREZ	CL 31 33 93	3960341	jorgebarona2009@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	PALMIRA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64365896	06/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$261.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 16257466	BARONA FLOREZ JORGE ENRIQUE	57	2			N	X																	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	3	42.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1107071993		IZQUIERDO MARULANDA JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 23 No 56-15	CALI-VALLE	3701768	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	110581093	9499783065	I	2026/03/20	2026/03/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1107071993 IZQUIERDO JULIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1107071993		IZQUIERDO MARULANDA JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 23 No 56-15	CALI-VALLE	3701768	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	110581093	9499783065	I	2026/03/20	2026/03/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-18, 05:01:28 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078767151

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 09/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RODRIGO OBONAGA GAITAN		
Documento	CC16608775	**Dirección**	CL 13B #66 B - 56
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3163384677
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
CC 16608775	RODRIGO OBONAGA GAITAN	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 218.900	6.960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000	$ 0	$ 621.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
