13-05-2026 / 2 ENTREGA

ACTA PARCIAL No. 01
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1420.10.1.10 DE 2025

CONTRATISTA: **PROXA INGENIEROS S.A.S** 901.654.594-8
REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA GIRALDOO FLOREZ 1.053.860.055 de Manizales

OBJETO: "REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS."

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

www.aguadas-caldas.gov.co
Calle 6# 5-25 Alcaldía Municipal, plaza principal. Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.
18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.
19. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.
20. Ejecutar la obra de acuerdo al presupuesto

PLAZO DE CONTRATO: El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben ser ejecutados desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2025.

VALOR DEL CONTRATO: El Valor del contrato es por **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($167.286.377,00)** M/CTE). INCLUIDO EL AIU, el cual incluye los costos directos e indirectos del personal requerido para llevar a cabo la ejecución de dicho contrato. Este valor Incluye todos los impuestos de ley, pólizas y la contribución especial a los contratos de obra pública a que hace referencia el artículo 6° de la ley 1106 de 2006, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato serán a cargo del contratista;

www.aguadas-caldas.gov.co
Calle 6# 5-26 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 522 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

de conformidad con el artículo 100 de la Ley 21 de 1992 el presente contrato de obra pública no será objeto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

FORMA DE PAGO: EL proceso de contratación es estructurado por el sistema de **PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE**

El municipio de Aguadas realizará pagos parciales hasta el NOVENTA Y CINCO (95%), del valor de contrato y por último se pagará un CINCO POR CIENTO (5%) a la liquidación del mismo, los pagos siempre se realizarán previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el contrato. Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite pago, que se encuentra al día con los pagos al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales, este último en caso de que aplique. En todo caso los pagos correspondientes se sujetarán a las disponibilidades de Tesorería y de caja lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda Municipal.

VALOR DEL CONTRATO: $ 167.286.377,00
VALOR A GIRAR: $ 158.085.626,00
PENDIENTE POR GIRAR: **$ 9.200.751,00**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta parcial por quienes en ella intervinieron, a los veintiséis (26) días de febrero de 2026.

TATIANA MARCELA BETANCUR RÍOS
Secretaria de Obras Públicas
Supervisora

VANESSA GIRALDO FLOREZ
R. Legal **PROXA INGENIEROS S.A.S**
Contratista

Actuación	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Elaboró:	Paula Valdés Medina		26/02/2026
Proyectó:	Tatiana Marcela Betancur Ríos		26/02/2026
Revisó:	Tatiana Marcela Betancur Ríos		26/02/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

www.aguadas-caldas.gov.co
Calle 6# 5-25 Alcaldía Municipal, plaza principal. Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	**1420.10.1.10**
NRO. PROCESO	**SAMC-SOP-029-2025**
CONTRATANTE	Municipio de Aguadas, caldas.
CONTRATISTA	**PROXA INGENIEROS S.A.S**
NIT	**901.654.594-8**
R. LEGAL **CÉDULA**	**VANESSA GIRALDO FLOREZ** 1.053.860.055 de Manizales
OBJETO CONTRATADO	**REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.**
VALOR DEL CONTRATO	$167.286.377,00
PLAZO DEL CONTRATO	El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben ser ejecutados desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2025.
PRÓRROGA No. 01	DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2026
PRÓRROGA No. 02	DESDE EL 14 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 01 DE MARZO DE 2026.
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	01 DE MARZO DE 2026.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		761
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL		1407
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**
03/12/2025	11/12/2025	26/12/2025
PLAZO FINAL TRAS PRÓRROGA No. 02		01/03/2026
SUPERVISOR (A)	**NRO DE INFORME DE SUPERVISIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN**
TATIANA BETANCUR RÍOS	No. 01	26 DE FEBRERO DE 2026

B. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-25 Alcaldía Municipal. plaza principal. Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 1		CANTIDADES Y VALORES ACTA PARCIAL No. 1	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
	PRELIMINARES								
1.0	Localizacion y replanteo	ml	159.20	$ 9,270.00	$ 1,475,784.00	354.12	$ 3,282,692.00	326.12	$ 3,023,132.00
2.0	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	173.80	$ 25,465.00	$ 4,425,817.00	199.09	$ 5,069,819.0	199.09	$ 5,069,819.0
3.0	Señal preventiva y reglamentaria	und	5.00	$ 268,854.00	$ 1,344,270.00	5.00	$ 1,344,270.0	5.00	$ 1,344,270.0
4.0	Instalacion de valla institucional 2x4	und	1.00	$ 1,373,473.00	$ 1,373,473.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	DEMOLICIONES								
5.0	Corte con disco abrasivo	ml	594.40	$ 13,483.00	$ 8,014,295.00	440.10	$ 5,933,868.0	440.10	$ 5,933,868.0
6.0	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, graderia y cañuelas	m³	45.58	$ 150,662.00	$ 6,867,174.00	63.99	$ 9,640,861.0	63.99	$ 9,640,861.0
	EXCAVACIONES								
7.0	En material comun de 0 a 2m	m³	181.85	$ 47,512.00	$ 8,640,057.00	167.15	$ 7,941,631.0	163.10	$ 7,749,207.0
8.0	En conglomerado	m³	56.35	$ 52,577.00	$ 2,962,714.00	70.16	$ 3,688,802.0	67.73	$ 3,561,040.0
9.0	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	176.25	$ 62,310.00	$ 10,982,138.00	105.08	$ 6,547,535.0	99.81	$ 6,219,404.0
	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO								
10.0	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	79.60	$ 237,550.00	$ 18,908,980.00	91.00	$ 21,617,050.0	91.00	$ 21,617,050.0
11.0	Cámara de caída D=1,2, H≤3,04, espesor de pared e=0,20m	ml	1.85	$ 1,109,012.00	$ 2,051,672.00	1.15	$ 1,275,364.0	1.15	$ 1,275,364.0
12.0	Suministro, transporte e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0.59cm para trafico pesado.	Un	3.00	$ 1,208,556.00	$ 3,625,668.00	4.00	$ 4,834,224.0	4.00	$ 4,834,224.0
13.0	Bases y Cañuelas	Un	3.00	$ 940,478.00	$ 2,821,434.00	4.00	$ 3,761,912.0	4.00	$ 3,761,912.0
14.0	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	54.00	$ 89,692.00	$ 4,843,368.00	55.10	$ 4,942,029.0	55.10	$ 4,942,029.0
15.0	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	und	18.00	$ 702,744.00	$ 12,649,392.00	20.00	$ 14,054,880.0	14.00	$ 9,838,416.0
16.0	Suministro e instalación de silletas de 12"x6"	und	18.00	$ 464,044.00	$ 8,352,792.00	19.00	$ 8,816,836.0	13.00	$ 6,032,572.0

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-25 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921

alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

17.0	Empalme a cámara	und	4.00	$ 159,843.00	$ 639,372.00	9.00	$ 1,436,587.0	9.00	$ 1,438,587.0
18.0	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 10"	ml	6.00	$ 171,028.00	$ 1,026,168.00	0.00	$ -	0.00	$ -
19.0	Suministro e instalación de Sumidero doble reja tipo sifón en concreto clase II - tapa antiruido	un	1.00	$ 3,553,477.00	$ 3,553,477.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO								
20.0	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 2" rde 21	ml	79.60	$ 29,073.00	$ 2,314,211.00	0.00	$ -	0.00	$ -
21.0	Suministro e instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	22.00	$ 113,794.00	$ 2,503,468.00	27.00	$ 3,072,438.0	21.00	$ 2,389,674.0
22.0	Empalme a tuberia existente	und	2.00	$ 492,534.00	$ 985,068.00	5.00	$ 2,462,670.0	5.00	$ 2,462,670.0
	LLENOS								
23.0	Arena para base y atraque	m³	27.49	$ 209,189.00	$ 5,750,606.00	33.11	$ 6,926,248.0	30.54	$ 6,388,632.0
24.0	Afirmado compactado	m³	36.34	$ 178,520.00	$ 6,487,417.00	71.10	$ 12,692,772.0	71.10	$ 12,692,772.0
25.0	Lleno compactado con material de la obra	m³	146.45	$ 44,300.00	$ 6,487,735.00	196.22	$ 8,692,546.0	194.60	$ 8,620,780.0
	OTROS								
26.0	Entibado horizontal Tipo I	m2	204.00	$ 59,053.00	$ 12,046,812.00	83.95	$ 4,957,499.0	83.95	$ 4,957,499.0
27.0	Techo provisional en madera y plástico	m2	581.08	$ 29,024.00	$ 16,865,266.00	0.00	$ -	0.00	$ -
28.0	Sub base granular compactada	m3	2.53	$ 245,958.00	$ 623,345.00	1.15	$ 282,852.0	1.15	$ 282,852.0
29.0	Reposicion de Pavimento en Concreto MR42, incluye curado y texturizado.	m3	2.53	$ 1,440,248.00	$ 3,643,827.00	1.04	$ 1,497,858.0	1.04	$ 1,497,858.0
30.0	Acelerante para concreto Sika-set L o similar	kg	31.20	$ 32,068.00	$ 1,000,522.00	17.53	$ 562,152.0	17.53	$ 562,152.0
31.0	Acero de refuerzo	kg	308.76	$ 13,020.00	$ 4,020,055.00	152.68	$ 1,987,894.0	152.68	$ 1,987,894.0
	ITEMS NO PREVISTOS								
INP-01	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 4" rde 21	ml		$ 215,795.55	$ -	92.50	$ 19,961,088.0	92.50	$ 19,961,088.0
SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO					**$ 167,286,377.00**		**$ 167,286,377.0**		**$ 158,085,626.0**
					$ 122,106,845.00		$ 122,106,845.00		$ 115,390,968.00
ADMINISTRACIÓN				**32.00%**	$ 39,074,190.00		$ 39,074,190.00		$ 36,925,110.00
UTILIDAD				**5.00%**	$ 6,105,342.00		$ 6,105,342.00		$ 5,769,548.00
TOTAL COSTO DEL PROYECTO					**$ 167,286,377.00**		**$ 167,286,377.00**		**$ 158,085,626.00**

www.aguadas-caldas.gov.co
Calle 6# 5-25 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

PERIODO DE PAGO	VALOR DE PAGO	ESTADO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA
DICIEMBRE - FEBRERO	$158.085.626,00	PENDIENTE		
TOTAL	**$158.085.626,00**			

C. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

Durante el periodo de supervisión no fueron impartidas o realizadas observaciones.

D. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

Durante el período que se supervisa, se realizó un Acta Modificatoria No. 01 sustentado en un balance de menores y mayores cantidades de actividades de obra y una modificación bilateral sustentada en la solicitud de prórroga No. 01 y No. 02 presentada por el contratista.

E. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

F. ANEXOS

- Informe de actividades No. 01
- Factura electrónica FE-26
- Certificación Bancaria
- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social integral.
- Copia RUT actualizado
- Informe Trabajo Social
- Informe Salud y Seguridad en el Trabajo

www.aguadas-caldas.gov.co
Calle 6# 5-26 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

G. APROBACIÓN DEL PAGO

El supervisor Certifica que a la fecha el contratista cumplió con las obligaciones específicas establecidas en el contrato y por lo tanto se puede realizar el pago de las actividades supervisadas.

Para constancia de lo anterior se firma el presente informe a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2026.

TATIANA MARCELA BETANCUR RIOS
Secretario de Obras Públicas
Municipio de Aguadas, Caldas


Actuación	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Elaboró:	Tatiana Marcela Betancur Rios		26/02/2026
Proyectó:	Tatiana Marcela Betancur Rios		26/02/2026
Revisó:	Tatiana Marcela Betancur Rios		26/02/2026


Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.


www.aguadas-caldas.gov.co


Calle 6# 5-26 Alcaldía Municipal. plaza principal. Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

ANEXO: REGISTRO FOTOGRÁFICO

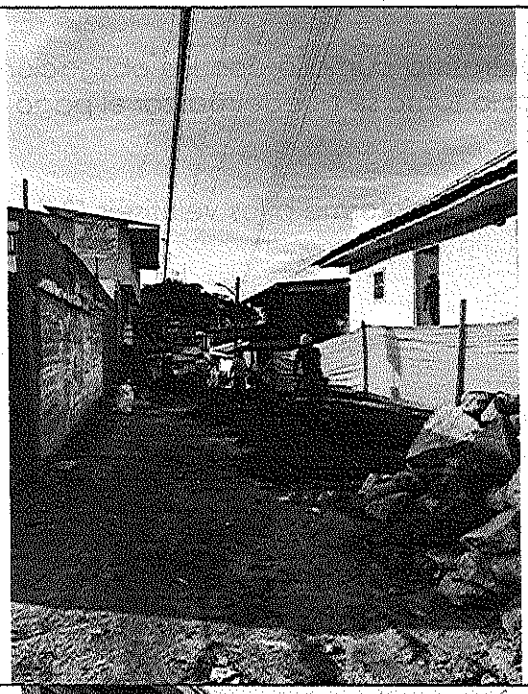

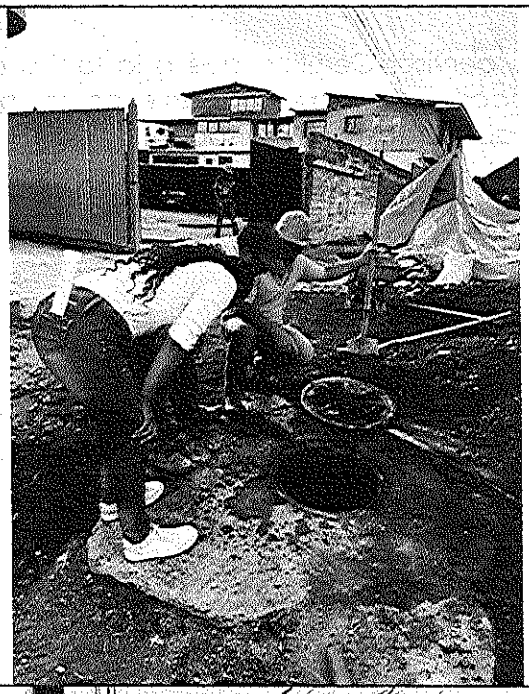

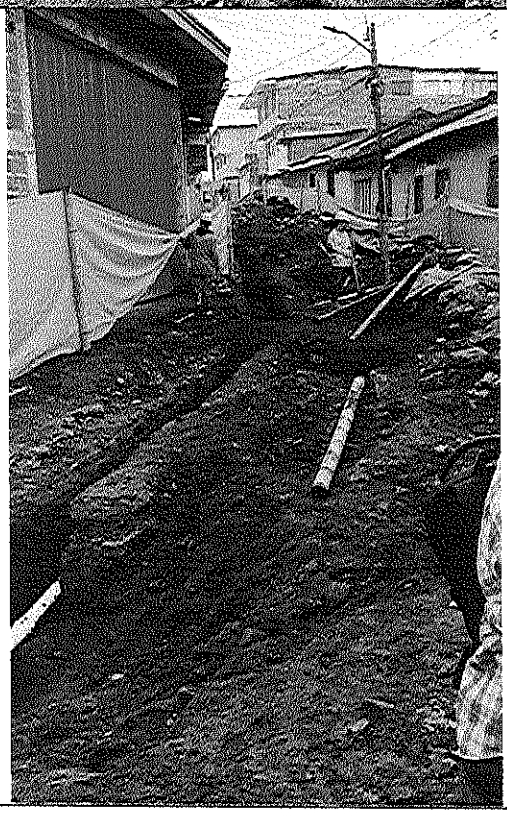


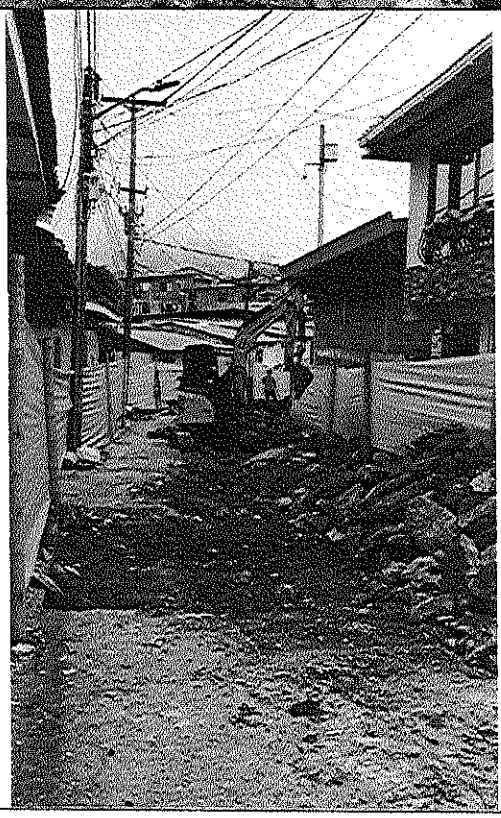

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-26 Alcaldía Municipal, plaza principal, Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921

alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co

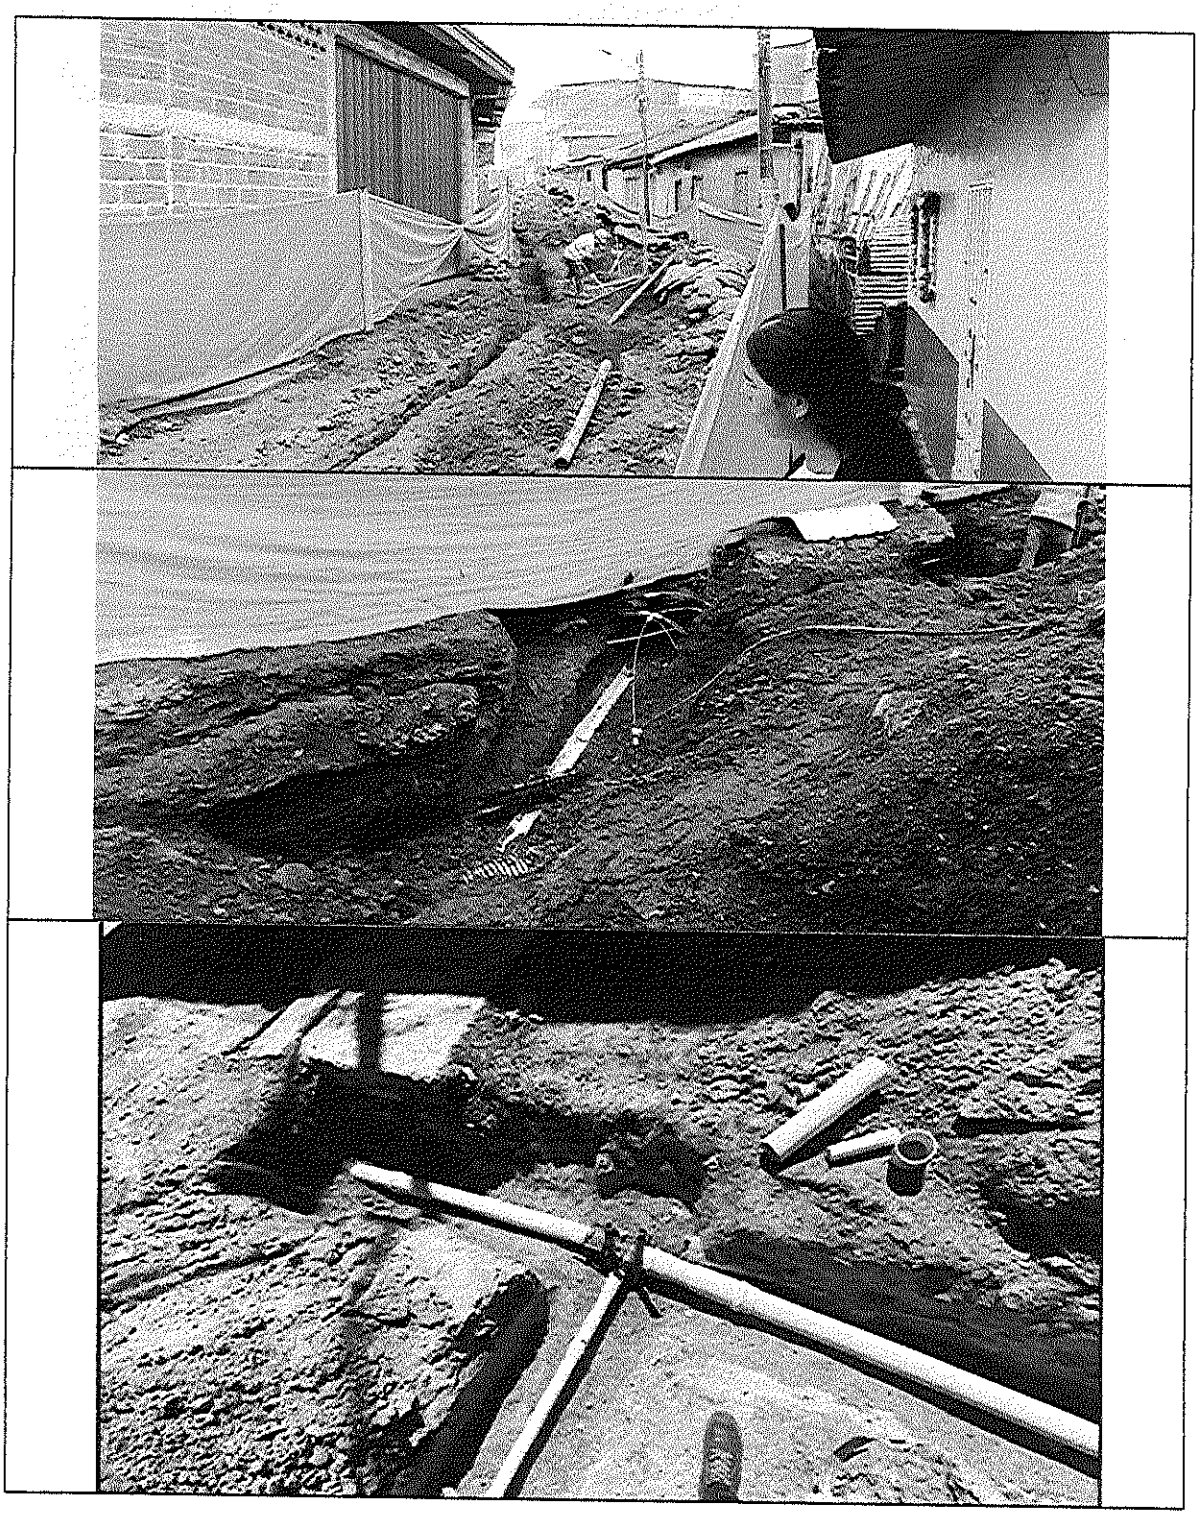

www.aguadas-caldas.gov.co

Calle 6# 5-26 Alcaldía Municipal. plaza principal. Aguadas (Caldas) | +57 322 907 2921
alcaldia@aguadas-caldas.gov.co | juridica@aguadas-caldas.gov.co



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
824f2b448fce631ae4374a595b6d7b628b341094b2dbbd6e9f8faedb839fa66fcf2d09ee7c5452d43049549bb705fd1e

Número de Factura: FE-26
Fecha de Emisión: 21/02/2026
Fecha de Vencimiento: 23/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PROXA INGENIEROS S.A.S
Nombre Comercial: PROXA INGENIEROS S.A.S
Nit del Emisor: 901654594
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 25 23 51 OF 202
Teléfono / Móvil: 6068823119
Correo: PROXAINGSAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE AGUADAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8908011320
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Aguadas
Dirección: CALLE 6 No 5-23
Teléfono / Móvil: 3229072921
Correo: hacienda@aguadas-caldas.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	ACTA PARCIAL No1	94	1,00	$ 115.390.968,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.390.968,00
2	002	ADMINISTRACION 32 PO RCIENTO	94	1,00	$ 36.925.110,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.925.110,00
3	003	UTILIDAD 5 PORCIENTO	NIU	1,00	$ 5.769.548,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.769.548,00

Notas Finales

ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO No. 1420.10.1.10 DE 2025 "REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS - ADMINISTRACION 32% - UTILIDAD 5%
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/02/2026 11:19:45
Documento validado por la DIAN:
21/02/2026 11:19:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	158085626
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	158085626
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	158085626
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 158085626

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	158.085.626,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	158.085.626,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	158.085.626,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$158.085.626,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098105545 Rango desde: 21 Rango hasta: 900 Vigencia: 2026-09-03
