
PROGRAMACIÓN DE OBRA - C.S. DON BOSCO DE CURRULAO

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Inicio | Final de actividad | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **ESTUDIOS Y DISEÑOS NUEVOS HOSPITALES DEL MAGDALENA** | **234,69 días** | **día 0** | **día 1** | |
| 2 | | **ESTAPA DE PRELIMINARES** | **20 días** | **día 0** | **día 1** | |
| 3 | | REVISION Y APROPIACIÓN DE DISEÑOS | 15 días | día 1 | día 17 | |
| 4 | | ALISTAMIENTO DE OBRA (CERRAMIENTO PROVISIONAL, CAMPAMENTO E INSTALACIONES | 20 días | día 1 | día 22,5 | |
| 5 | | **ETAPA DE CONSTRUCCIÓN** | **234,69 días** | | | |
| 6 | | **PRELIMINARES** | **10 días** | | | |
| 7 | | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | 10 días | día 1 | día 11,1875 | |
| 8 | | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | **50 días** | | | **6** |
| 9 | | DESCAPOTE | 15 días | día 11,18 | día 27,3125 | 7 |
| 10 | | RELLENOS | 35 días | día 17 | día 55 | 9FC-10 días |
| 11 | | EXCAVACIÓN MECÁNICA | 40 días | día 22,5 | día 66,25 | 10FC-30 días |
| 12 | | **CIMENTACIÓN** | **97,69 días** | | | |
| 13 | | CONCRETO DE LIMPIEZA | 20 días | día 30,187 | día 52 | 14CC-3 días |
| 14 | | ZAPATAS EN CONCRETO | 40 días | día 33 | día 76,5625 | 11FC-30 días |
| 15 | | VIGAS DE CIMENTACIÓN | 45 días | día 40,5 | día 90 | 14CC+7 días |
| 16 | | PLACA CONTRAPISO | 37 días | día 83 | día 124 | 15CC+8 días |
| 17 | | TANQUE SUBTERRÁNEO | 12 días | día 124 | día 137,125 | 16 |
| 18 | | **INSTALACIONES HIDROSANITARI** | **210 días** | | | |
| 19 | | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 210 días | día 1 | día 230,5 | 74FF-15 días |
| 20 | | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TIC Y ESPECIALES** | **210 días** | | | |
| 21 | | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TIC Y ESPECIALES | 210 días | día 1 | día 230,5 | 74FF-15 días |
| 22 | | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **52 días** | | | |
| 23 | | COLUMNAS EN CONCRETO | 29 días | día 88 | día 120,0625 | 16CC+4 días |
| 24 | | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO | 41 días | día 92,5 | día 137,125 | 23CC+4 días |
| 25 | | PLACAS MACIZAS AÉREAS | 44 días | día 96,312 | día 144,625 | 24CC+4 días |
| 26 | | **INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES** | **60 días** | | | |
| 27 | | INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES | 60 días | día 128,5 | día 194,0625 | 31CC |
| 28 | | **VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO** | **60 días** | | | |
| 29 | | VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO | 60 días | día 162 | día 227,3125 | 42CC+15 días;31FC-10 días |
| 30 | | **MAMPOSTERÍA** | **45 días** | | | |
| 31 | | MURO EN BLOQUE | 30 días | día 128,5 | día 162 | 25FC-15 días |
| 32 | | MURO PLOMADO | 10 días | día 156,12 | día 166,5 | 25FC+10 días |
| 33 | | DINTELES Y ALFAJÍAS | 25 días | día 139 | día 166,5 | 31CC+10 días |
| 34 | | FIGURAS Y PARASOLES DE FACHADA | 15 días | día 162 | día 178 | 31 |
| 35 | | **CUBIERTA E IMPERMEABILIZACI** | **49 días** | | | |
| 36 | | ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA | 20 días | día 80,1875 | día 102 | 25CF+5 días |
| 37 | | TEJA TERMOACÚSTICA | 20 días | día 102 | día 124 | 36 |
| 38 | | ALISTADO EN MORTERO | 10 días | día 90,5 | día 102 | 25CF+5 días |
| 39 | | IMPERMEABILIZACIÓN | 10 días | día 96,312 | día 107,625 | 38FC-5 días |
| 40 | | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA | 8 días | día 125 | día 134,3125 | 37FC+1 día |
| 41 | | **PAÑETES** | 40 días | | | |
| 42 | | PAÑETE SOBRE MUROS | 40 días | día 144,62 | día 188,375 | 33CC+5 días |
| 43 | | **ALISTADO DE PISOS** | **15 días** | | | |
| 44 | | ALISTADO DE PISOS EN MORTI | 15 días | día 178 | día 194,0625 | 42FC-10 días |
| 45 | | MEDIACAÑA EN MORTERO | 10 días | día 183,56 | día 194,0625 | 44CC+5 días |
| 46 | | **PISOS, ACABADOS Y ENCHAPES** | **30 días** | | | |
| 47 | | ACABADO DE PISO | 30 días | día 190,31 | día 222,5 | 45FC-4 días |
| 48 | | ENCHAPES DE MUROS | 25 días | día 194,06 | día 221,5 | 47CC+4 días |
| 49 | | POCETA DE ASEO | 20 días | día 194,06 | día 216 | 47CC+4 días |
| 50 | | REJILLA PARA PISO | 15 días | día 191,2 | día 207,375 | 45FC-3 días |
| 51 | | **CIELO RASO** | **20 días** | | | |
| 52 | | CIELO RASO | 20 días | día 198 | día 219,625 | 40FC-5 días;44FC+3 día |
| 53 | | **ESTUCO Y PINTURA** | **40 días** | | | 42FC+15 días |
| 54 | | ESTUCO | 30 días | día 205,5 | día 237,625 | 42FC+15 días |
| 55 | | PINTURA | 30 días | día 211,1 | día 243,5 | 54CC+5 días |
| 56 | | PINTURA EXTERIOR (GRANIPL | 35 días | día 211,1 | día 249,125 | 55FC-30 días |
| 57 | | **CARPINTERÍA METÁLICA Y DE M** | **40 días** | | | |
| 58 | | CARPINTERÍA DE MADERA | 30 días | día 221,5 | día 255 | 54FC-15 días |
| 59 | | CARPINTERÍA METÁLICA | 30 días | día 216 | día 249,125 | 48FC-5 días |
| 60 | | VIDRIOS Y ESPEJOS | 25 días | día 211,1 | día 237,625 | 48FC-10 días |
| 61 | | **APARATOS SANITARIOS** | **20 días** | | | |
| 62 | | APARATOS SANITARIOS | 20 días | día 228,2 | día 250,0625 | 47FC+5 días |
| 63 | | **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN** | **18 días** | | | |
| 64 | | GUARDACAMILLAS | 12 días | día 237,6 | día 251 | 55FC-5 días |
| 65 | | ESQUINEROS EN PVC | 8 días | día 249,1 | día 257,5625 | 58FC-5 días |
| 66 | | CORTINAS PARA DUCHA | 10 días | día 237,6 | día 249,125 | 60 |
| 67 | | **ÁREAS EXTERIORES** | **151,69 días** | | | |
| 68 | | ANDENES | 35 días | día 110 | día 149 | 10FC+50 días |
| 69 | | PAVIMENTOS | 60 días | día 82,5 | día 149 | 10FC+25 días |
| 70 | | SARDINELES | 20 días | día 76,562 | día 99,5 | 69CC-5 días |
| 71 | | PAISAJISMO | 15 días | día 227,3 | día 243,5 | 56FC-20 días |
| 72 | | DEMARCACIÓN PARQUEADER | 10 días | día 227,3 | día 237,625 | 71CC |
| 73 | | **ASEO** | **15 días** | | | |
| 74 | | ASEO FINAL DE OBRA | 15 días | día 230,1 | día 247,25 | 60FC-7 días |
| 75 | | **ENTREGA DE OBRA** | 20 días | día 234 | día 255,6875 | 73CC+3 días |

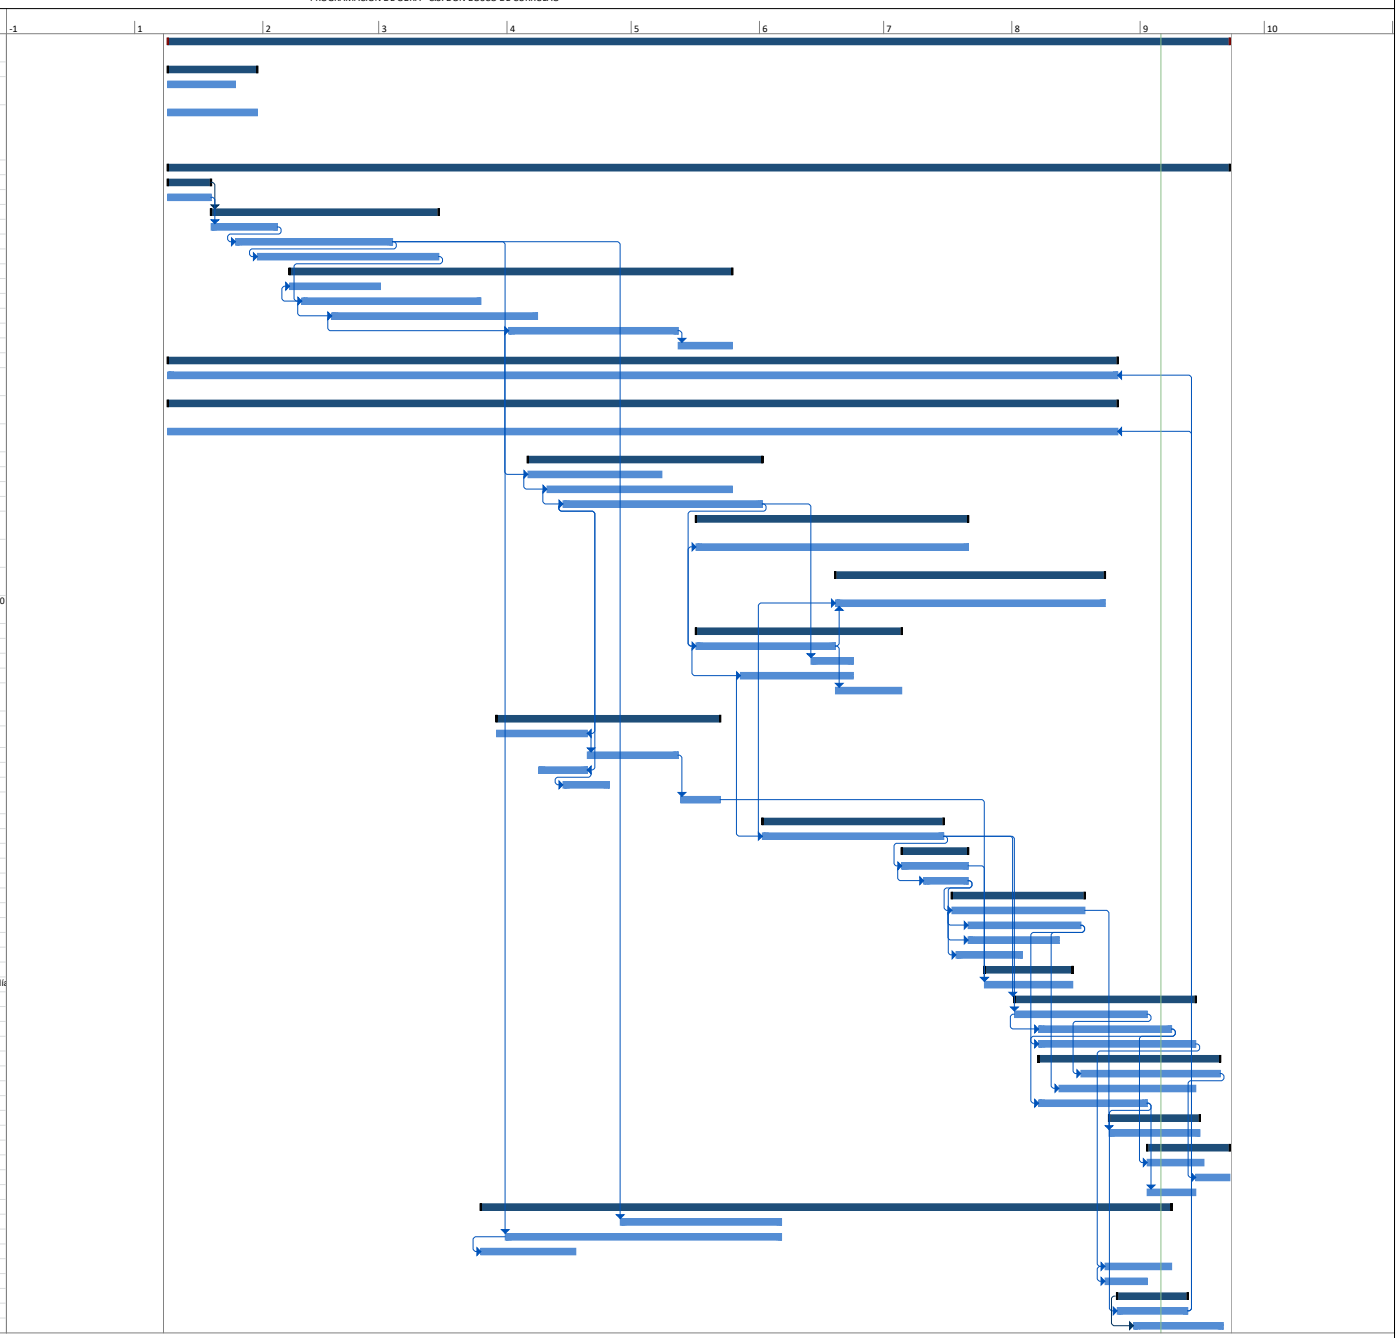


Proyecto: Programación de Obra
Fecha: mié 06/09/23

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
