*CONSORCIO SUBESTACIÓN*
*NIT: 901.987.309-4*

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

# INFORME MENSUAL DE OBRA No.1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
**CONSORCIO SUBESTACION**
R/L DEYDER COCUNUBO VARGAS
Contratista

PRESENTADO EN EL MARCO DE CONTRATO **No.0806 de 15 de septiembre de 2025**
cuyo objeto es: **"***CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.***"**

**PERIODO DE INFORME**
19 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

*AGUAZUL, CASANARE*
*2025.*

## REVISION Y APROBACION

El presente informe fue elaborado por el residente de la obra, revisado y avalado por el representante legal del contratista de obra.

Elaboro:

**DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS**
Ingeniero Civil
DIRECTOR DE OBRA

Reviso y Aprobó:

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
R/L **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS**
Contratista de Obra

## CONTENIDO

1 INTRODUCCION ..... 6
2 LOCALIZACION DEL PROYECTO ..... 7
3 ALCANCE ..... 9
3.1 Construcción del tanque de almacenamiento de agua potable ..... 9
3.2 Repotenciación del sistema de energía de emergencia ..... 9
3.3 Instalación de la red de distribución subterránea de baja tensión (BT) ..... 9
4 INFORMACION BASICA CONTRATO DE OBRA ..... 11
5 INFORME JURIDICO ..... 13
5.1 CONTROL LEGAL DEL CONTRATO ..... 13
5.2 CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO ..... 13
5.3 CONTROL PRORROGAS AL PLAZO DEL CONTRATO ..... 14
5.4 CONTROL ADICIONES AL CONTRATO ..... 14
5.5 CONTROL ACCIONES LEGALES ..... 14
5.6 ACTAS TRAMITADAS ..... 14
5.6.1 ANEXO ACTAS TRAMITADAS MES DE NOVIEMBRE ..... 16
6 INFORME ADMINISTRATIVO ..... 17
6.1 CONTROL DE PERSONAL PROPUESTO DE OBRA ..... 17
6.2 CONTROL DE PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA/NO CALIFICADA ..... 17
6.3 CONTROL DE EQUIPO ..... 17
6.4 CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA ..... 18
6.4.1 Nota: **Anexo I** Copia Correspondencia Recibida ..... 18
6.4.2 Nota: **Anexo II** Copia Correspondencia enviada ..... 19
6.5 ACTAS DE COMITÉ ..... 19
6.5.1 Nota: **Anexo III** Copia actas de comité ..... 19

7.4.1 **ANEXO I** Correspondencia Recibida ..... 20

**7.4.2 ANEXO.II** Correspondencia enviada ..... 21

**7.5.1 ANEXO.III** Actas de comité ..... 22

7 INFORME TECNICO ..... 23

7.1 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS ..... 23

7.2 CONCLUSIONES ..... 34

7.3 INCONVENIENTES ..... 35

7.4 AVANCE DE OBRA EJECUTADA ..... 36

7.5 AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO ..... 37

7.6 CLIMA ..... 38

7.7 ANEXO.I AVANCE DE OBRA EJECUTADA ..... 39

7.8 ANEXO.I BITACORA DE OBRA ..... 42

8 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE ..... 43

8.1 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DE INVERSIÓN No.1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA MA-LP-SI-006-2025 CON NUMERO INTERNO 0806 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ..... 43

8.2 APERTURA DE LA FIDUCIA ANTICIPO No.1 ..... 43

8.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.1 ..... 43

8.4 ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO No.1 ..... 44

8.5 DESEMBOLSO ANTICIPO No.1 ..... 44

8.6 SOPORTES DESEMBOLSOS DE FIDUCIA ANTICIPO No.1 ..... 44

8.7 BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO. ..... 44

8.7.1 Anexo 1. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2025 47

8.7.2 Anexo 2. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2025 ..... 48

8.7.3 Anexo 3. NÓMINA NOVIEMBRE 2025 ..... 49

9 INFORME DE GESTIÓN – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 50

## TABLA DE IMAGENES

Imagen 1 Ubicación general del proyecto ..... 7

## TABLA DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Pulidora ..... 17
Fotografía 2. Mezcladora ..... 17
Fotografía 3. Cortadora ..... 18
Fotografía 4. Inicio de la actividad de excavación manual ..... 24
Fotografía 5. Inicio de la actividad de excavación manual ..... 24
Fotografía 6. Continuación de la actividad de excavación ..... 25
Fotografía 7. Continuación de la actividad de excavación ..... 25
Fotografía 8. Inicio de la actividad de relleno ..... 26
Fotografía 9. Inicio de la actividad de relleno ..... 26
Fotografía 10. Continuación de la actividad de relleno ..... 27
Fotografía 11. Continuación de la actividad de relleno ..... 27
Fotografía 12. Inicio de la actividad de instalación de tuberías de 3" ..... 28
Fotografía 13. Inicio de la actividad de instalación de tuberías de 3" ..... 28
Fotografía 14. Continuación de la actividad de instalación de tuberías de 3" ..... 29
Fotografía 15. Continuación de la actividad de instalación de tuberías de 3" ..... 29
Fotografía 16. Inicio de la actividad de preparación para el inicio de la excavación ..... 30
Fotografía 17. Inicio de la actividad de excavación manual ..... 30
Fotografía 18. Continuación de la actividad de excavación ..... 31
Fotografía 19. Continuación de la actividad de excavación ..... 31
Fotografía 20. Inicio de la actividad de preparación para el inicio del amarre de acero estructural ..... 32
Fotografía 21. Inicio de la actividad de instalación de acero estructural ..... 32
Fotografía 22. Continuación de la actividad instalación de acero estructural ..... 33
Fotografía 23. Continuación de la actividad de instalación de acero estructural ..... 33

# 1 INTRODUCCION

El presente informe de obra tiene como fundamento exponer el desarrollo del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."** describiendo las actividades realizadas en este periodo dentro de la ejecución del contrato, y de esta manera cumplir con el objeto del contratado; esta obra tiene un plazo inicial de tres (3) meses a partir del acta de inicio firmada el 19 de noviembre de 2025 teniendo así fecha de terminación inicial el 18 de febrero de 2025.

**Ejecución de obra** a través de acta de inicio firmada el día 19 de noviembre de 2025, así las cosas, se presenta el informe mensual de obra No. 1 del contrato No. 0806 de 15 de septiembre de 2025, suscrito entre el municipio de Aguazul y el CONSORCIO SUBESTACIÓN, representado legalmente por Deyder Eufranio Cocunubo Vargas, correspondiente al periodo comprendido entre el primer (19) al (30) de agosto de 2025 y, se informa el avance parcial y financiero de las diferentes actividades realizadas en el desarrollo del contrato en mención y en general se presenta toda la información actualizada, real y veraz de la trazabilidad del contrato de obra, con la cual damos cumplimiento a lo establecido contractualmente.

## 2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecuta en el municipio de Aguazul del departamento de Casanare.

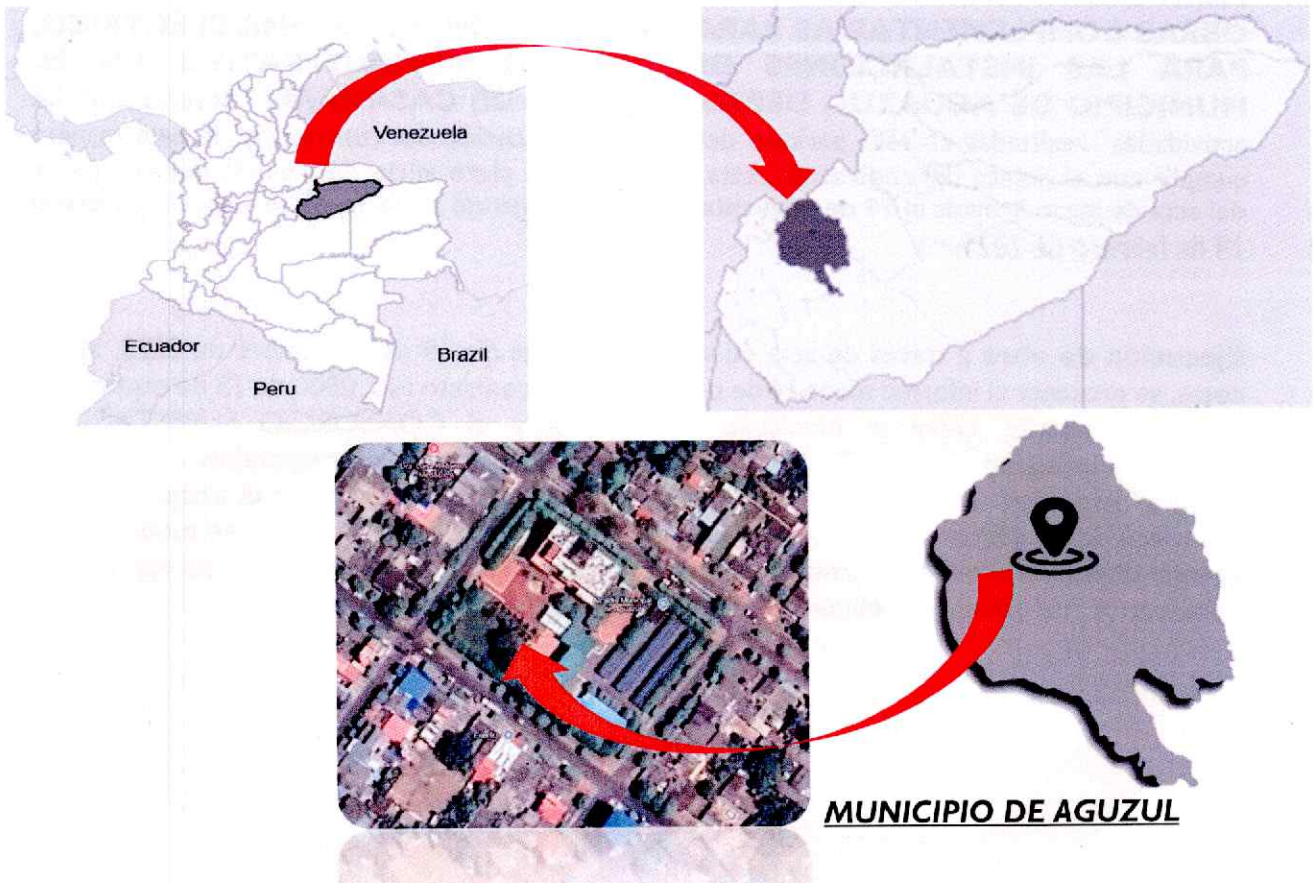



Imagen 1 Ubicación general del proyecto

El Municipio de Aguazul se encuentra ubicado en el departamento de Casanare, a una distancia de 27 km por tierra de la capital del Departamento (Yopal) y de Bogotá a 361 km. Se localiza a los 5°10'08" latitud Norte y 72°32'48" Longitud Oeste al noroccidente de la región de la Orinoquía, sobre las estribaciones de la cordillera oriental, en la zona de transición con las sábanas, el denominado piedemonte llanero, el cual comprende el borde Este de la cordillera oriental y el límite Oeste de la cuenca de los llanos orientales. Limita al norte con los municipios de Pajarito (Boyacá) y Recetor (Casanare), al sur con Tauramena y Maní (Casanare), al oriente con la capital del departamento, Yopal, y al occidente con Tauramena y Recetor (Casanare). Según la proyección de población del CENSO del 2018, para el año 2024 el municipio de Aguazul cuenta con un total de 41166 habitantes de los cuales el 49.8% (20.521) son hombres y el 50.2% (20.645), son mujeres. Tiene un total de 430 habitantes que se autor reconocen como

pertenecientes a un grupo étnico, de los cuales el 88.84% se reconoce como negro o afrocolombiano y el 13, 95 indígena. El CENSO señala que el 25.8% del total de la población vive en el área rural, mientras que el 74.2% en el área urbana.

La construcción del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE." se encuentra ubicado en la Calle 11 No.11-35 en el barrio Las Ferias, municipio de Aguazul- departamento de Casanare.

# 3 ALCANCE

El proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", ejecutado en el centro administrativo de Aguazul, Casanare, tiene como finalidad principal fortalecer la infraestructura de servicios públicos garantizando la continuidad en el abastecimiento de agua y la resiliencia del sistema eléctrico, el alcance contempla actividades de carácter civil y eléctrico, estructuradas en tres componentes principales: la ampliación del almacenamiento hídrico, repotenciación del sistema de energía de emergencia y

## 3.1 Construcción del tanque de almacenamiento de agua potable

Este componente aborda la ejecución de una estructura de contención hídrica en concreto reforzado, diseñada como un tanque totalmente enterrado, esencial para ampliar la capacidad de reserva de agua potable del centro administrativo municipal, teniendo como tareas principales las siguientes:

- Preparación del terreno: (Replanteo, la excavación mecánica y manual)
- Cimentación: (Conformación, relleno compactado y solado).
- Estructura Hídrica: (Acero de Refuerzo, placa de fondo, muros y la losa de tapa).

## 3.2 Repotenciación del sistema de energía de emergencia

Este alcance está orientado a garantizar un suministro de energía seguro y continuo en casos de contingencia, mediante la integración de una nueva planta, la adecuación de la infraestructura física y la optimización de la red de distribución.

- Suministro y puesta en marcha de la planta suministro: Adquisición y transporte de una planta eléctrica de emergencia con un rango de capacidad efectiva de 230 kVA23.
- Instalación: Montaje y puesta en marcha del equipo, que incluye la adecuación de accesorios de escape, salidas de aire caliente, aislamientos y la capacitación de uso.

## 3.3 Instalación de la red de distribución subterránea de baja tensión (BT)

Se implementa una red subterránea trifásica para optimizar la confiabilidad del sistema eléctrico.

- Canalización e infraestructura: Comprende la excavación manual, relleno compactado y la construcción de cajas de inspección CS-274, la canalización se ejecuta con ducto Conduit PVC 3".
- Acometidas y cableado: Instalación del cableado de BT subterráneo en cobre, empleando diversos calibres (incluyendo 3F\#250+1N\#250+1T\#4/0 y 3F\#4/0+1N\#4/0+1T\#2/0) para las acometidas principales y el circuito dedicado entre la Planta y la Transferencia15.
- Control y protección: Suministro e instalación de breakers tripolares de 3x200A y 3x250A para las conexiones al tablero existente.
- Se integra una transferencia automática de 230 kVA con interruptor Magnético de 3x700

## 4 INFORMACION BASICA CONTRATO DE OBRA

| CONTRATO DE OBRA PUBLICA | |
|---|---|
| Entidad Contratante | Municipio de Aguazul |
| Contratista | Consorcio Subestación |
| C.C. / NIT. | 901.987.309-4 |
| Representante Legal | Deyder Eufranio Cocunubo Vargas |
| Número del Contrato | 0806 |
| Fecha del Contrato | 15 de SEPTIEMBRE DE 2025 |
| Plazo inicial (Meses) | TRES (3) MESES |
| Valor fiscal | $ 786.159.793 |
| Valor Adicional | $ 0,00 |
| Valor Total | $ 786.159.793 |
| Fecha Acta No.1- Acta de Inicio | Miércoles, 19 de noviembre de 2025 |
| Fecha de terminación Inicial | Miércoles, 18 de febrero de 2026 |
| Fecha de terminación Actualizada | Miércoles, 18 de febrero de 2026 |
| Objeto | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| **PRORROGA No.1** | |
| Fecha de Prorroga No 1 | N. A |
| Periodo autorizado | N. A |
| Motivo | N. A |
| **SUSPENSION No.1 (Meses)** | |
| Fecha de Suspensión No 1 | N. A |
| Periodo autorizado | N. A |
| Motivo | N. A |
| **AMPLIACION A LA SUSPENSION No.1 (Meses)** | |
| Fecha de Ampliación a la Suspensión No 1 | N. A |
| Periodo autorizado | N. A |
| Motivo | N. A |
| **REINICIACION No.1 (Meses)** | |
| Fecha de Reiniciación No.1 | N. A |

| | |
|---|---|
| Periodo autorizado | N. A |
| Motivo | N. A |
| **INFORMACION FINANCIERA** | |
| Valor inicial del contrato | $ 786.159.793 |
| Valor adicional del contrato | $ 0,00 |
| Valor Total del contrato | $ 786.159.793 |
| Valor del anticipo (50%) | $ 2.022.163.243,10 |
| Fecha del plan de inversión del anticipo | 14 de noviembre de 2025 |
| Fecha del giro del anticipo | No se ha realizado |
| Valor acta parcial No.1 | N. A |
| Valor amortizado acta parcial No.1 | N. A |

# 5 INFORME JURIDICO

## 5.1 CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO SUBESTACIÓN |
| **INTERVENTOR:** | YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ |
| **SUPERVISOR:** | JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ. |

## 5.2 CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO

| **POLIZAS MINUTA DE CONTRATO** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compañía | Póliza No. | Riesgo | Vr / asegurado | VIEGENCIA | | % | Fecha aprobación |
| | | | | Desde | Hasta | | |
| SEGUROS DEL ESTADO | 62-44-101021941 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 78.615.979,30 | 15-sep-25 | 15-abr-26 | 10% | 19-sep-2025 |
| | | MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | $ 393.079.896,50 | 15-sep-25 | 15-jun-26 | 100% | |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | $ 39.307.989,65 | 15-sep-25 | 15-dic-28 | 5% | |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | $ 235.847.937,90 | 15-dic-25 | 15-dic-30 | 30% | |
| SEGUROS DEL ESTADO | 62-40-101012507 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $ 284.700.000,00 | 15-sep-25 | 15-dic-25 | 200 SMM LV | |

| **POLIZAS MINUTA DE INICIO** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compañía | Póliza No. | Riesgo | Vr / asegurado | VIEGENCIA | | % | Fecha aprobación |
| | | | | Desde | Hasta | | |
| | 62-44-101021941 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 78.615.979,30 | 19-nov-25 | 19-jun-26 | 10% | 24-nov-2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | | MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | $ 393.079.896,50 | 19-nov-25 | 19-ago-26 | 100% | |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | $ 39.307.989,65 | 19-nov-25 | 18-feb-29 | 5% | |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | $ 235.847.937,90 | 19-feb-26 | 19-feb-31 | 30% | |
| SEGUROS DEL ESTADO | 62-40-101012507 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $ 284.700.000,00 | 19-nov-25 | 18-feb-26 | 200 SMM LV | |

## 5.3 CONTROL PRORROGAS AL PLAZO DEL CONTRATO

| TIEMPO PRORROGA | NUMERO | CAUSALES | FECHA |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 5.4 CONTROL ADICIONES AL CONTRATO

| VALOR ADICION | NUMERO | CAUSALES | FECHA |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 5.5 CONTROL ACCIONES LEGALES

| CLASE | ETAPA PROCESAL | FECHA | DESPACHO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 5.6 ACTAS TRAMITADAS

| No. | OBJETO | FECHA | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINUTA | 15/09/2025 | $ 786.159.793 | Suscrita por NELSON ENRIQUE CAMACHO CAICEDO, alcalde Municipal del MUNICIPIO DE AGUAZUL, obrando en nombre y representación del |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Municipio, y por el Consorcio Subestación, representado legalmente por Deyder Eufranio Cocunubo Vargas. |
| 2 | POLIZAS MINUTA | 19/09/2024 | - | Aprobado por, GONZALO ANDRES MENDEZ LOPEZ Oficina Jurídica de la Alcaldía Municipal del Municipio de Aguazul |
| 3 | ACTA No.1 DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA | 19/11/2024 | $ 786.159.793 | Suscrita por, JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIEREZ supervisor y por YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ como Interventoría del contrato, y por el Consorcio Subestación, representado legalmente por Deyder Eufranio Cocunubo Vargas |
| 4 | POLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA | 24/11/2025 | - | Aprobado por, GONZALO ANDRES MENDEZ LOPEZ Oficina Jurídica de la Alcaldía Municipal del Municipio de Aguazul |

5.6.1 ANEXO ACTAS TRAMITADAS MES DE NOVIEMBRE

(1 Folios)

| Alcaldía de Aguazul | **ACTA DE INICIO** | |
|---|---|---|

**Acta No. 1 del 19 de noviembre de 2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | 0806 de 15-09-2025 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |
| **DEPENDENCIA** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| **MODALIDAD:** | LICITACIÓN PÚBLICA |
| **PROCESO:** | MA-LP-SI-006-2025 |
| **OBJETO** | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBESTACIÓN |
| **NIT/CC** | 901987309-4 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS |
| **CC** | 1049607835 |
| **VALOR:** | $786.159.793,00 M/CTE |
| **PLAZO:** | Tres (3) MESES |
| **FECHA INICIO:** | 19-11-2025 |
| **FECHA TERMINACIÓN:** | 18-02-2026 |

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Mediante la suscripción de la presente acta de iniciación, el Supervisor de Contrato asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, así mismo manifiesta que verificó el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución.
2) El contratista a su vez manifiesta que conoce las condiciones contractuales, que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el contrato y la normatividad vigente para dar inicio a la ejecución de actividades.

En el Municipio de Aguazul Casanare a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor,** y **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 1049607835 Tunja- Boyaca, representante legal, del CONSORCIO SUBESTACIÓN con NIT 901987309-4** en su calidad de contratista, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS R/L
CONSORCIO SUBESTACIÓN
**Contratista de Obra**

YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
**Interventoría**

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
**Supervisor Cto. De interventoría 798-2025**

Original Oficina Jurídica
1ra Copia Supervisión o Interventor
2da Copia Contratista

# 6 INFORME ADMINISTRATIVO

## 6.1 CONTROL DE PERSONAL PROPUESTO DE OBRA

| No. | Nombre personal profesional propuesto | Nombre personal actual | Cargo | Dedicación | soporte de cambio de personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCUNUBO VARGAS DEYDER EUFRANIO | COCUNUBO VARGAS DEYDER EUFRANIO | Director de Obra | 20% | N. A |
| 2 | GUTIÉRREZ PINTO JENCY SIDNEY | GUTIÉRREZ PINTO JENCY SIDNEY | Residente de Obra | 50% | N. A |
| 3 | LOZANO AMÉZQUITA DIVAGNER | LOZANO AMÉZQUITA DIVAGNER | Técnico electricista | 100% | N. A |

## 6.2 CONTROL DE PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA/NO CALIFICADA

| No. | Nombre | Cedula | Cargo |
|---|---|---|---|
| 1 | CERON PRECIADO ANGELMIRO | 80.p429.681 | Oficial de obra |

## 6.3 CONTROL DE EQUIPO

| No. | Tipo | Cantidad | Estado | Si cumple | No cumple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulidora | 1 | Bueno | x | |
| 2 | Mezcladora | 1 | Bueno | x | |
| 3 | Cortadora | 1 | Bueno | x | |


REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1. Pulidora



Fotografía 2. Mezcladora
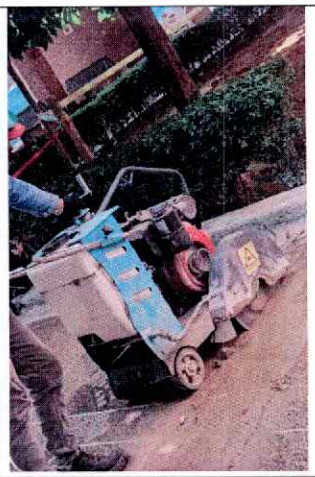
| | |
|---|---|
|  | |
| Fotografía 3. Cortadora | |

## 6.4 CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

| CORRESPONDENCIA RECIBIDA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | No. Radicado | Dependencia que envía | Asunto | No. Oficio |
| 24-oct-2025 | FISICO | Yamid Fernando Lesmes Rodríguez | Solicitud de documentación para acta de inicio | IAT-OFI-2025-10-CON-004 |
| 03-nov-2025 | FISICO | Yamid Fernando Lesmes Rodríguez | Requerimiento de documentación faltante para acta de inicio | IAT-OFI-2025-11-CON-005 |

6.4.1 Nota: **Anexo I** Copia Correspondencia Recibida

| CORRESPONDENCIA ENVIADA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | No. Radicado | Dependencia que recibe | Asunto | No. Oficio |
| 28-oct-2025 | FISICO | Yamid Fernando Lesmes Rodríguez | Respuesta de documentos de acta de inicio | OFC001_CS_2025 |
| 04-nov-2025 | FISICO | Yamid Fernando Lesmes Rodríguez | Justificación por no realización de afiliaciones a la ARL | OFC002_CS_2025 |
| 12-nov-2025 | FISICO | Yamid Fernando Lesmes Rodríguez | Solicitud de Tramite para Suscripción del Acta de Inicio de Obra – contrato 0806 de 2025 | OFC003_CS_2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19-nov-2025 | FISICO | Yamid Fernando Lesmes Rodríguez | Solicitud de coordinación para la intervención en subestación eléctrica y autorización de corte de plazoleta central del contrato 0806 del 2025 | OFC004_CS_2025 |
| 19-nov-2025 | FISICO | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Radicación pólizas acta de inicio de obra | OFC004_CS_2025 |

6.4.2 Nota: **Anexo II** Copia Correspondencia enviada

## 6.5 ACTAS DE COMITÉ

| CORRESPONDENCIA ENVIADA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | No. Acta | Hora | Lugar | No.Folios |
| 07/11/2025 | 1 | 8:00 am | Secretaria de infraestructura | 18 |

6.5.1 Nota: **Anexo III** Copia actas de comité

7.4.1 **ANEXO I** Correspondencia Recibida

(3 Folio)

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-11-CON-005

Deyder Cocunubo Vargas
Fecha: 3-Nov-2025
Hora: 9:30 am

Aguazul, 03 de noviembre de 2025

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

**Referencia:** Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

**Asunto:** Requerimiento de documentación faltante para acta de inicio

Cordial saludo,

En nuestra calidad de Interventoría del contrato de la referencia, acusamos recibo de su comunicación OFC001_CS_2025, radicada el pasado 28 de octubre de 2025, junto con los documentos adjuntos (pólizas, comprobante de aprobación, pago de estampilla, documentación de personal y programación de obra).

Una vez revisada la documentación y su respuesta, evidenciamos que aún no se ha completado la totalidad de los requisitos indispensables para proceder con la elaboración y suscripción del acta de inicio de la etapa constructiva, en su comunicación, y usted menciona estar en proceso de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)

Por lo anterior, solicitamos formalmente radicar a la mayor brevedad posible la siguiente documentación contractual pendiente:

- Soportes de afiliación a ARL (Certificado final, no solo el trámite).
- Soportes de afiliación EPS.
- Soportes de afiliación a AFP.

Reiteramos que la entrega de la totalidad de los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral del personal ofertado y aprobado es un requisito indispensable para legalizar el inicio de actividades y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

Agradecemos su pronta gestión con el fin de no generar mayores retrasos en el cronograma general del proyecto
Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
**REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA**

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-10-CON-004

Aguazul, 24 de octubre de 2025

**SEÑOR**
**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CIUDAD**

**Referencia:** Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

**Asunto:** Solicitud de documentación para acta de inicio

Cordial saludo,

En nuestra calidad de Interventoría del contrato de la referencia y en seguimiento al desarrollo de la etapa preconstructiva, nos dirigimos a ustedes con el fin de avanzar hacia la formalización de la etapa constructiva, teniendo en cuenta que el proyecto ya recibió el aval preconstructivo por parte de esta Interventoría y fue radicado informe a la entidad contratante, y considerando que se cumple el plazo estipulado para la legalización del inicio de obra, solicitamos formalmente la entrega de la siguiente documentación contractual pendiente, la cual es indispensable para proceder con la elaboración y suscripción del acta de inicio:

- Pólizas de garantías y amparos
- Comprobante de aprobación de pólizas
- Pago de estampillas del contrato
- Documentación del personal ofertado y aprobado
- Afiliaciones de ARL, EPS y AFP
- Programación de obra y flujo de caja.

Agradecemos radicar la documentación mencionada a la mayor brevedad posible, con el fin de dar cumplimiento a los términos contractuales y evitar retrasos en el cronograma general del proyecto.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
**REPRESÉNTATE LEGAL INTERVENTORÍA**

**7.4.2 ANEXO.II** Correspondencia enviada

(14 Folio)

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

**GÉMINIS CG**
Ingeniería y soluciones Integrales

OFC005_CS_2025

Aguazul 21 de noviembre de 2025

21 NOV 2025

Señor.
**GONZALO ANDRES MENDEZ LOPEZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica
E-mail: juridica@aguazul-casanare.gov.co

**Referencia:** Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

**Asunto:** Radicación pólizas Acta de inicio de obra.

Cordial saludo,

Mediante la presente, me permito radicar las pólizas actualizadas correspondientes al acta de inicio de obra. Estas son: la póliza No. 62-40-101012507 - ANEXO 2, relacionada con la responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento y la póliza No. De póliza 62-44-101021941- ANEXO 3, correspondiente a la póliza de cumplimiento. Dichos documentos se encuentran debidamente cargadas en la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación.

Por lo anterior, se adjuntan a esta solicitud pólizas para su correspondiente revisión y fines pertinentes.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

OFC004_CS_2025

Aguazul 19 de noviembre de 2025

Yamid Lesmes R.
19-11-2025

**SEÑOR:**
**YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ**
**Ciudad**

**Referencia:** Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

**Asunto:** Solicitud de coordinación para intervención en subestación eléctrica y autorización de corte en plazoleta central del contrato 0806 del 2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento del cronograma de actividades establecido para el proyecto y dando continuidad a lo estipulado en el acta de inicio de la referencia, se requiere su colaboración y aval para proceder con dos hitos cruciales para el avance de la obra:

- Coordinación para entrega y levantamiento de acta de subestación: solicitamos a la interventoría que coordine y programe la entrega física de la subestación eléctrica (SE) para la ampliación del cuarto de planta eléctrica.

  Es indispensable:
  - Entrega y acceso: Formalizar la entrega del área de la SE para poder iniciar los trabajos de obra civil.
  - Acta de Estado: Participar en el levantamiento de un acta de inspección y entrega, donde se deje evidencia documental (fotográfica y descriptiva) del estado actual de los equipos, componentes y la infraestructura existente de la Subestación, antes

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

**GÉMINIS CG**
ingeniería y soluciones integrales

de cualquier intervención, esto es vital para establecer el punto de partida y las responsabilidades sobre la custodia de los activos.

- Autorización de Intervención para instalación de banco ducto: Requerimos la autorización expresa de la Interventoría para realizar el corte y la excavación necesarios en el área de la plazoleta central y área de jardín, con el fin de ejecutar la instalación del banco ducto eléctrico.

Agradecemos su pronta gestión y coordinación para la programación de estas actividades, permitiendo así el cumplimiento de los plazos contractuales. Por favor, sírvase indicarnos la fecha y hora más adecuadas para realizar la inspección y firma del Acta.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

***CONSORCIO SUBESTACIÓN***
***NIT: 901.987.309-4***
***consorciosubestacion26@gmail.com***

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

OFC003_CS_2025

Aguazul 12 de noviembre de 2025

Yamid Lesmes R.
12-11-2025.

**SEÑOR:**
**YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ**
**Ciudad**

**Referencia:** Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

**Asunto:** Solicitud de Trámite para Suscripción del Acta de Inicio de Obra - Contrato No. 0806 de 2025.

Cordial saludo,

En seguimiento a la fase pre-constructiva del Contrato de Obra de la referencia, el CONSORCIO SUBESTACIÓN, se dirige a la Interventoría con el fin de solicitar el trámite ante la entidad contratante para la Suscripción del Acta de Inicio de Obra.

Certificamos y confirmamos que, a la fecha, se han superado y cumplido la totalidad de los requisitos que condicionaban el inicio de la ejecución, según se detalla a continuación:

- Cumplimiento legal y de seguridad social: Se ha entregado la totalidad de la documentación legal y de seguridad social requerida, lo cual incluye: soportes de afiliación al sistema de seguridad social integral (ARL, EPS y AFP) del personal operativo.

- Documentos de planeación: Se ha presentado la programación de obra ajustada y al flujo de caja correspondiente al proyecto.

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

Habiéndose verificado el cumplimiento del 100% de los requisitos, solicitamos a la Interventoría gestionar y convocar con carácter de urgencia a la entidad contratante para la firma del Acta de Inicio de Obra, permitiendo así el inicio formal de los trabajos y el cumplimiento del plazo contractual.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

GÉMINIS CG
ingeniería y soluciones integrales

OFC002_CS_2025

Aguazul 04 de noviembre de 2025

Yamid Lesmes R.
04-11-2025.

**SEÑOR:**
**YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ**
**Ciudad**

**Referencia:** Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

**Asunto:** Justificación por no realización de afiliaciones a la ARL.

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio me permito informar que no ha sido posible realizar el proceso de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) de las personas que estarán vinculadas en el contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, debido a que la empresa aún no ha sido registrada en el sistema de seguridad correspondiente, pero que son situaciones administrativas ajenas a nuestra voluntad.

Actualmente nos encontramos adelantando los tramites necesarios para la formalización y registro de la entidad ante las plataformas y organismos pertinentes, en primera instancia, se realizo el tramite de la afiliación con la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, sin embargo, dicho trámite no ha podido ser finalizado por motivos administrativos internos de esa entidad (cambio de plataformas virtuales).

Posteriormente, se procede a gestionar el registro con la ARL SURA, el tramite de sebe realizar por plataforma virtual, pero se encuentra presentando falla masiva en el portal.

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

Es importante resaltar que el Consorcio se encuentra actuado de manera diligente, realizando los trámites y siguiendo las instrucciones indicadas por las ARL involucradas. Nos mantenemos en constante comunicación para obtener la aprobación final y proceder inmediatamente con la afiliación de los trabajadores, conforme a la normatividad vigente en materia de riesgos laborales.

Agradecemos su comprensión frente a esta situación, que esperamos sea resuelta a la mayor brevedad posible. Reiteramos nuestra disposición para entregar cualquier soporte o información adicional que se requiera.


Se anexa como evidencia las respuestas por parte de las entidades a la cual se ha realizado la solicitud.


Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**


**GÉMINIS CG**
Ingeniería y soluciones integrales

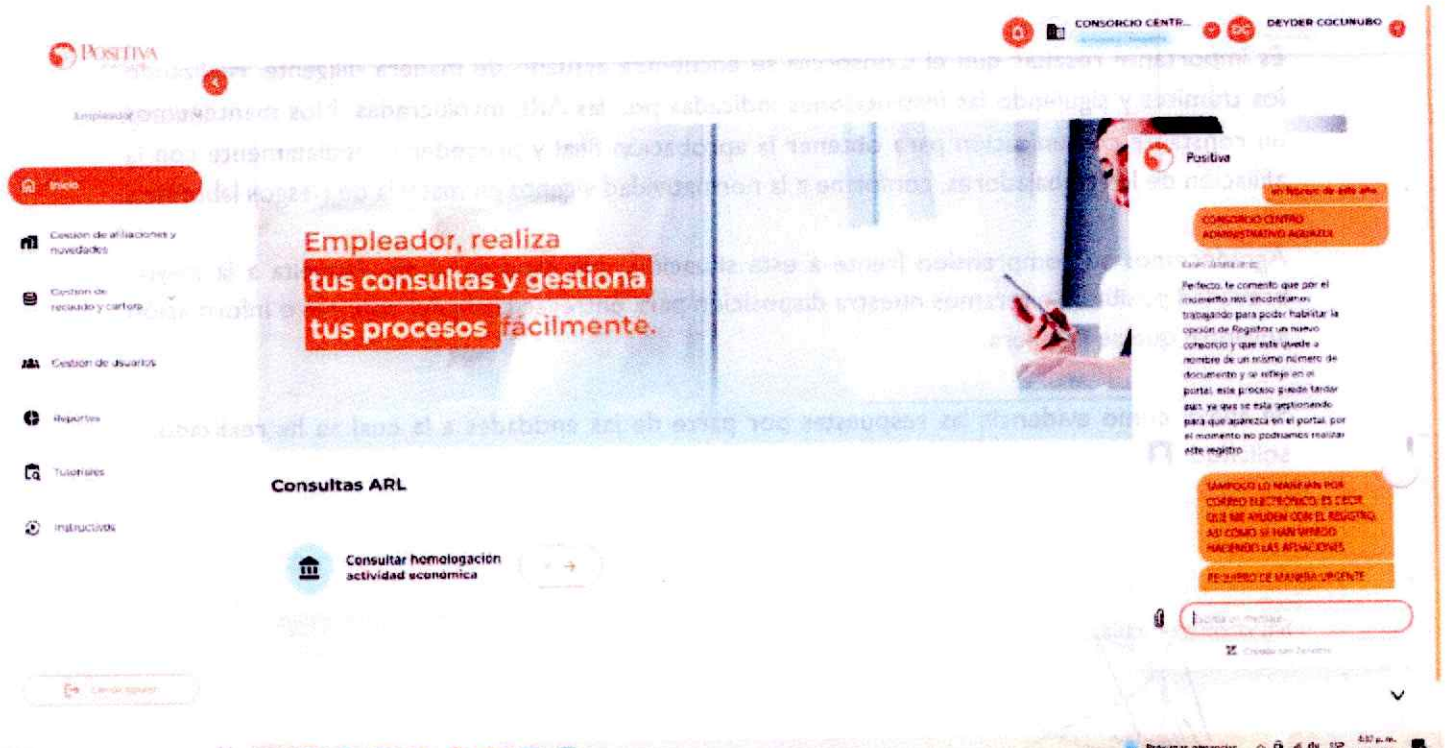


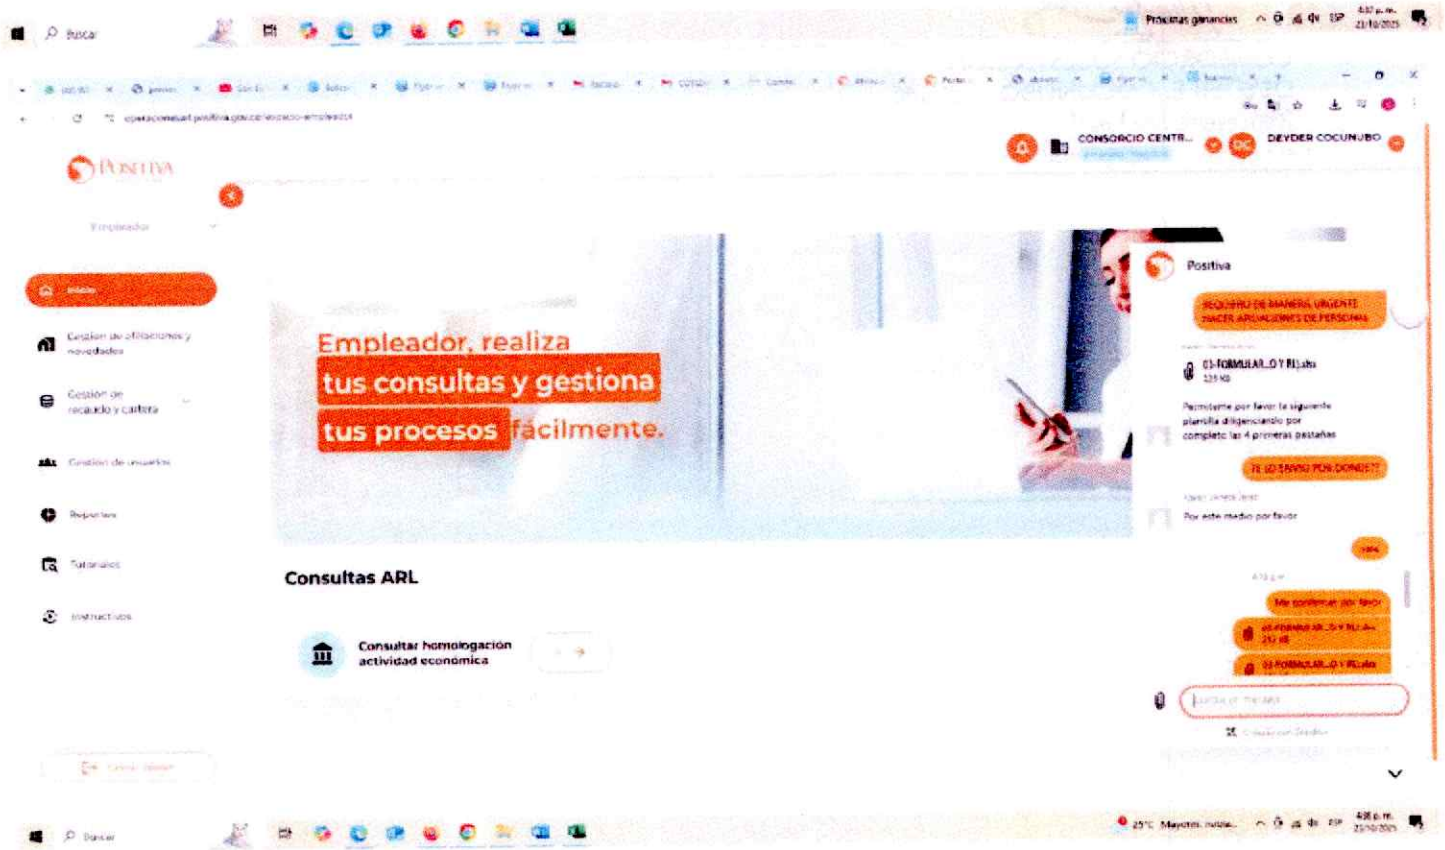**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**


**GÉMINIS CG**
Ingeniería y soluciones integrales

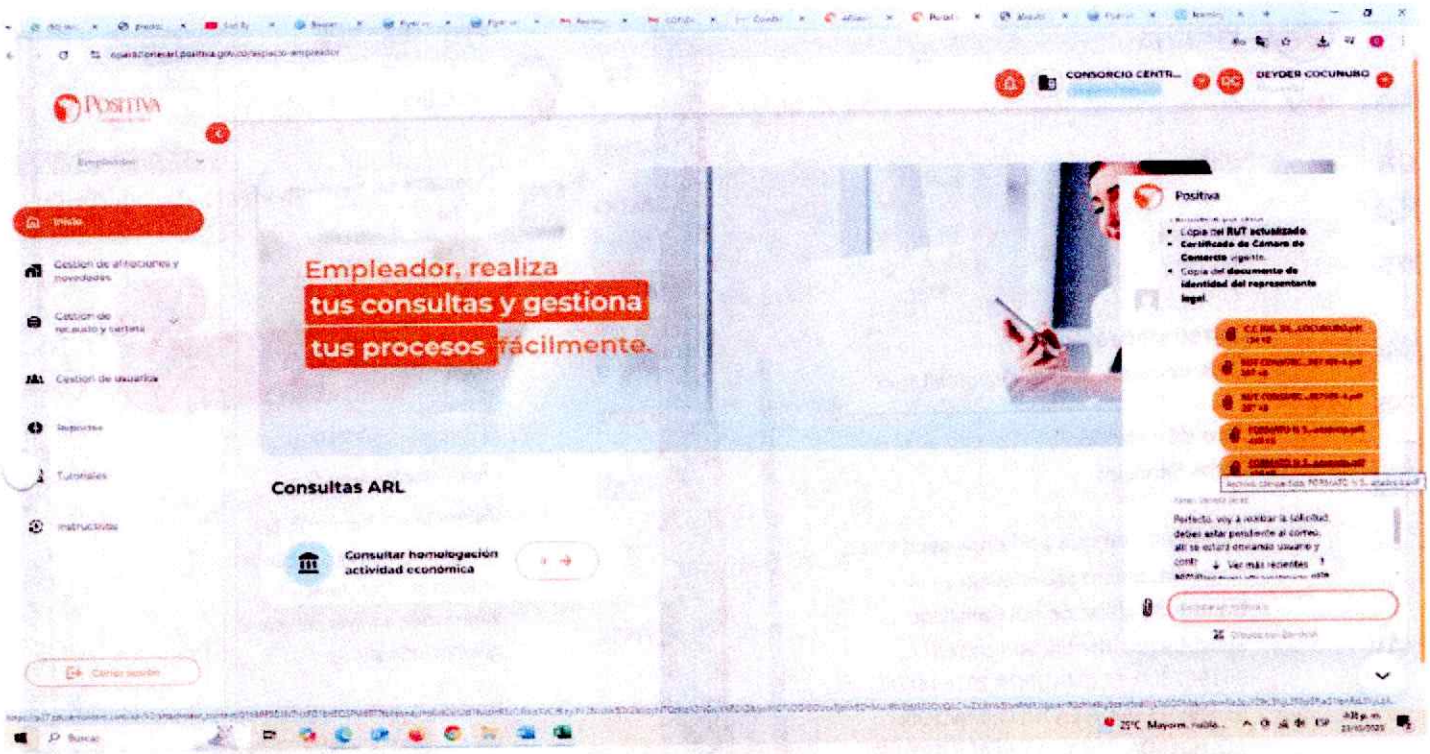


**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
consorciosubestacion26@gmail.com

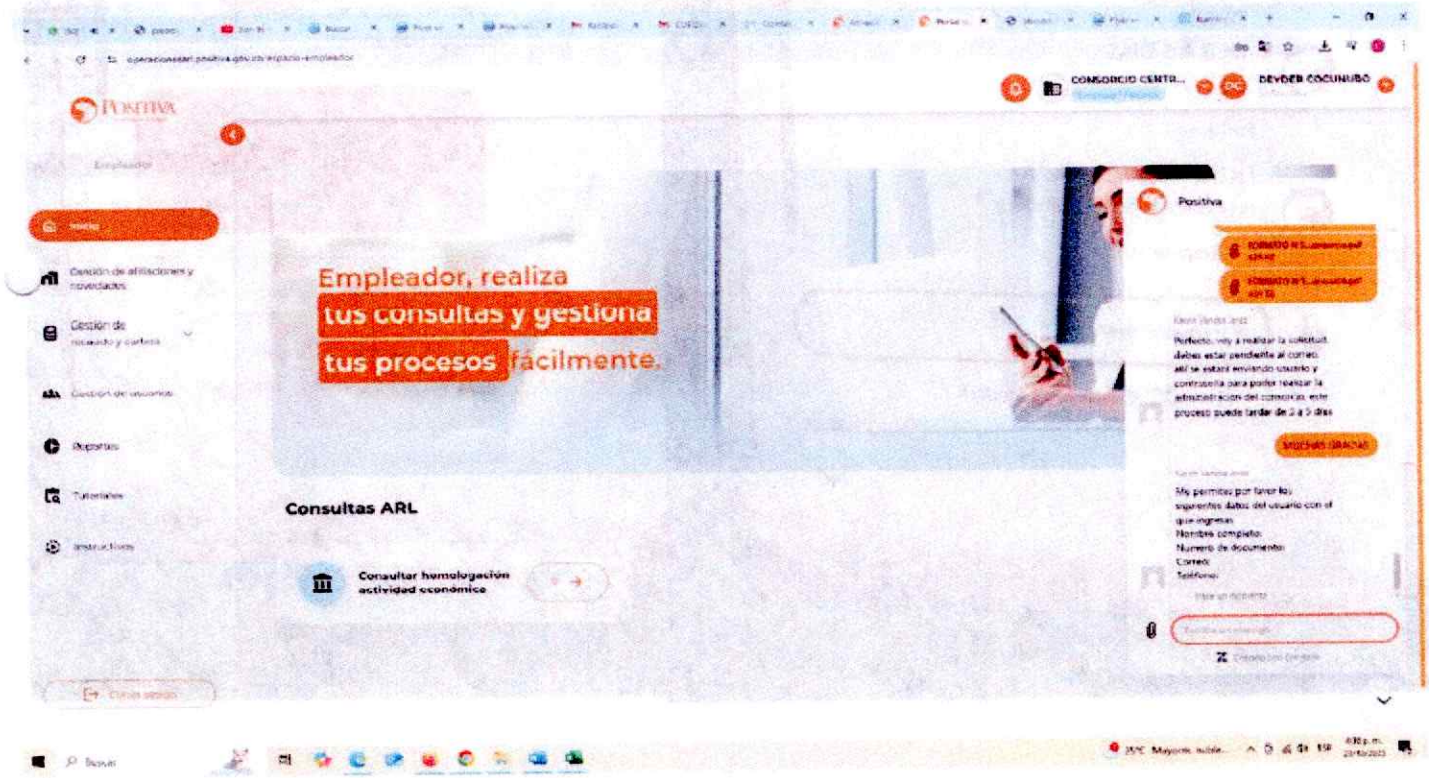
**GÉMINIS CG**
Ingeniería y soluciones integrales

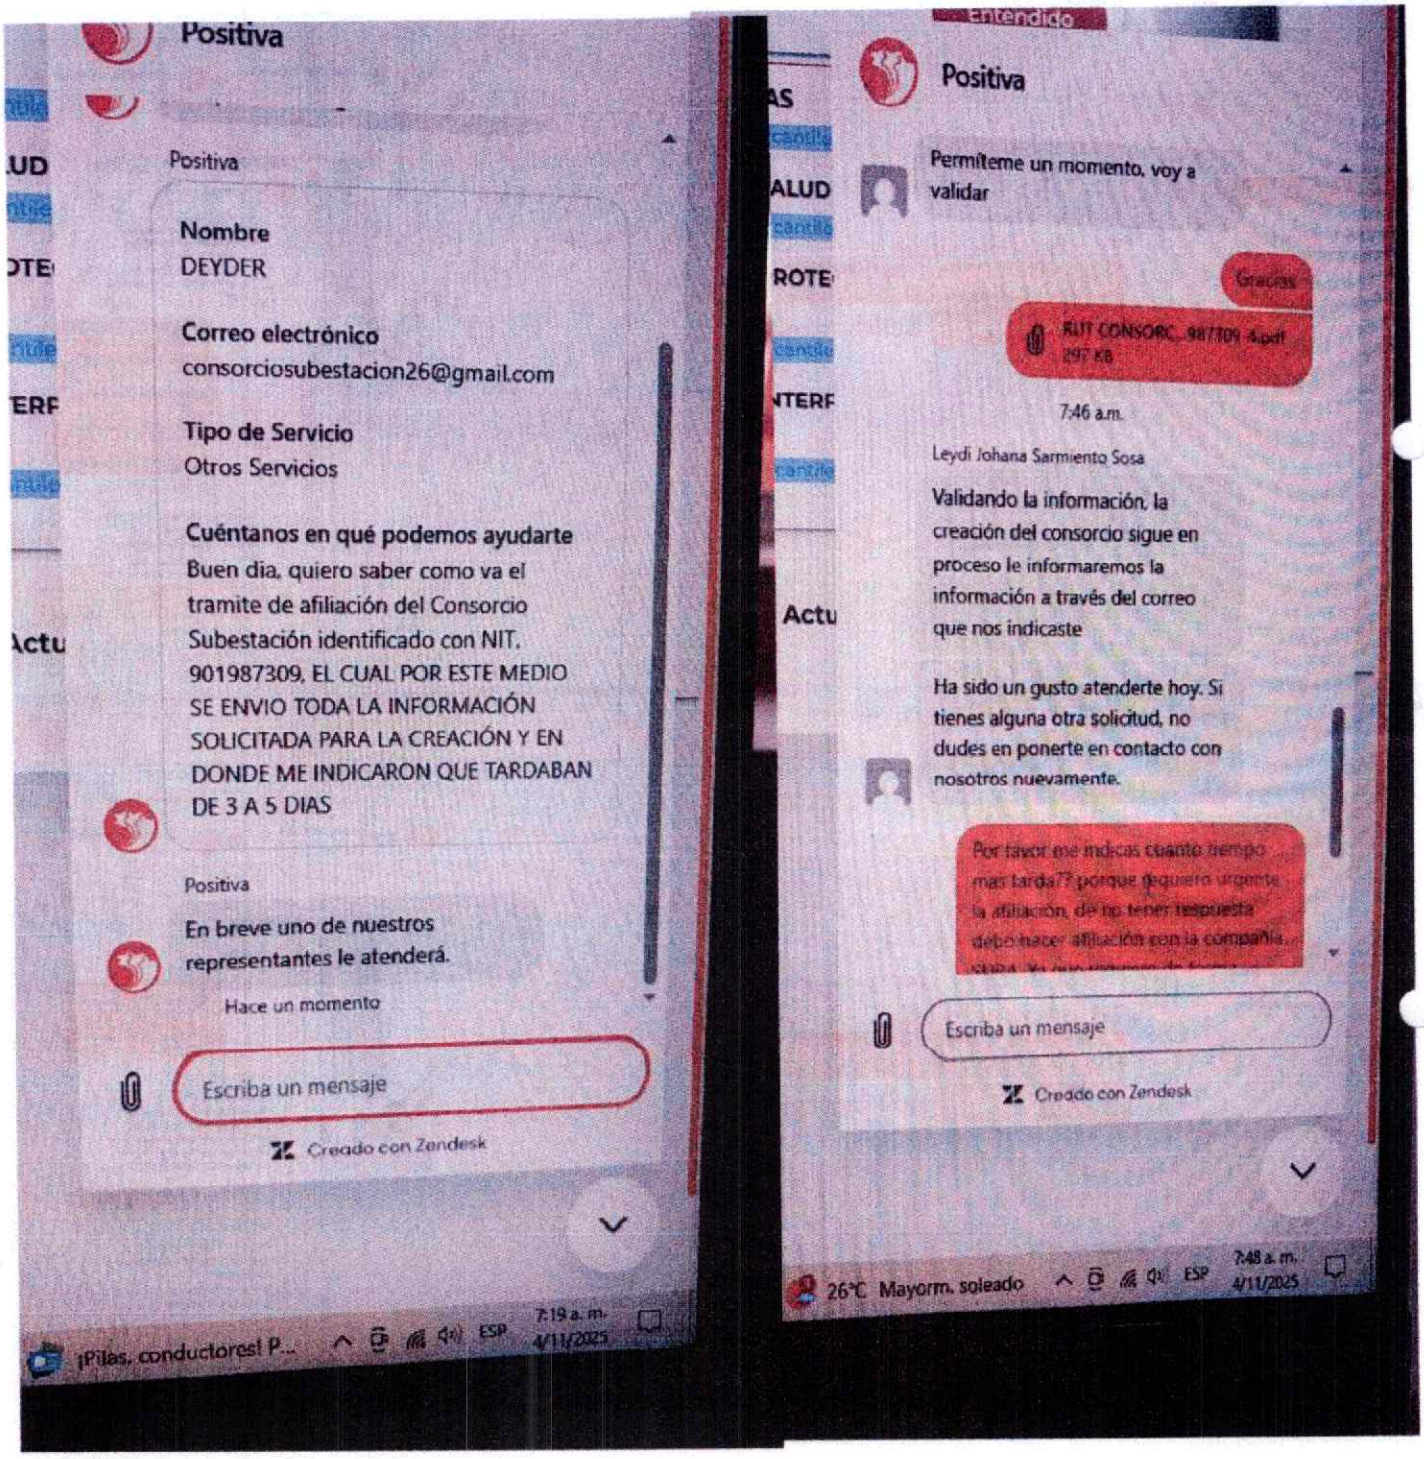

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

**GÉMINIS CG**
Ingeniería y Soluciones Integrales

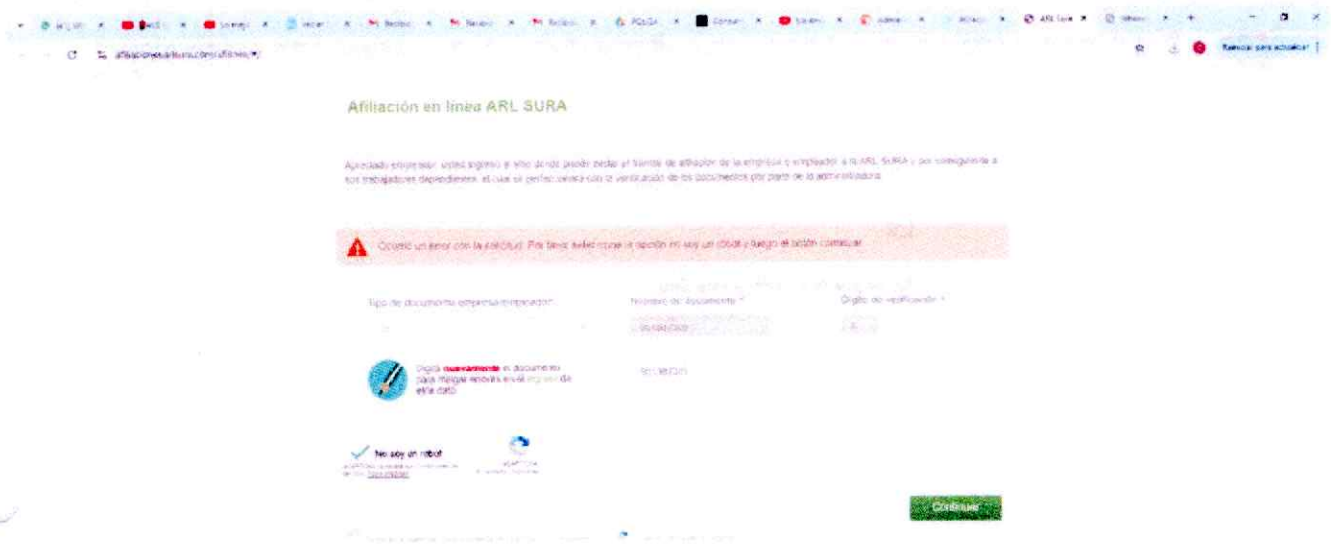

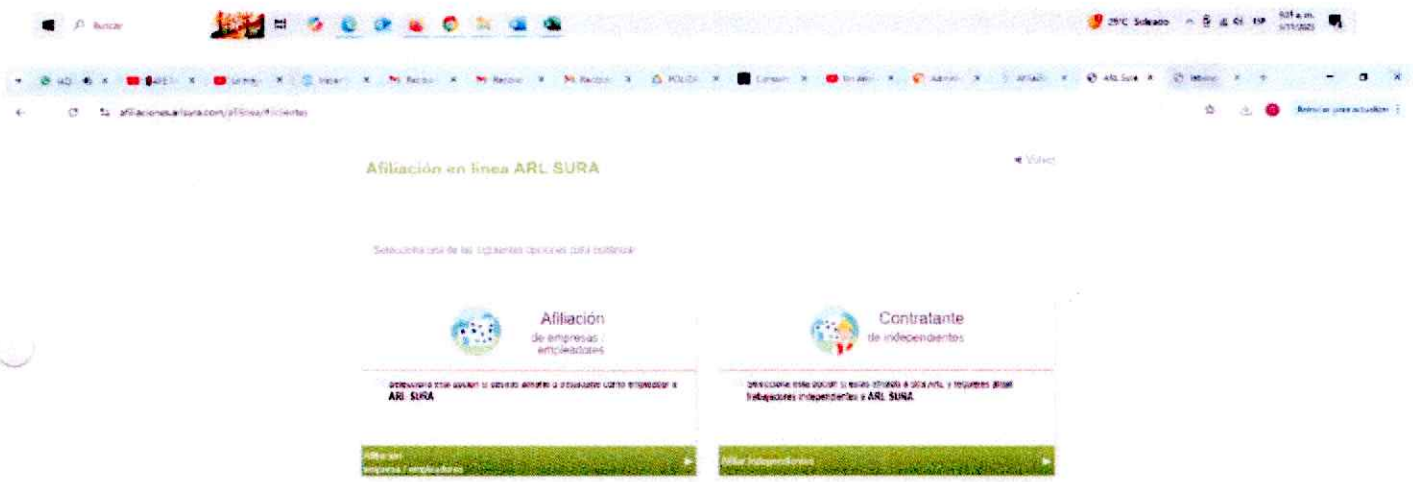**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

**GÉMINIS CG**
Ingeniería y Soluciones Integrales





No se puede acceder a este sitio



**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

OFC001_CS_2025

Aguazul 28 de octubre de 2025

Yamid Lesmes R.
28-10-2025

**SEÑOR:**
**YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ**
**Ciudad**

**Referencia:** Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

**Asunto:** Respuesta a solicitud de documentos para el acta de inicio del contrato.

Cordial saludo,

En atención al oficio mediante el cual se solicita la documentación necesaria para la elaboración del acta de inicio del contrato de obra pública 0806 de 15 de septiembre de 2025, me permito informar que actualmente me encuentro realizando el proceso de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

Una vez se formalice dicha vinculación y se obtenga el respectivo soporte, procederé a remitir el documento faltante para completar los requisitos establecidos.

Adjunto los siguientes documentos requeridos:

- Pólizas de garantías y amparos
- Comprobante de aprobación de pólizas
- Pago de estampilla del contrato
- Documentación del personal ofertado y aprobado

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

- Programación de obra y flujo de caja.

Agradecemos su comprensión y colaboración para continuar con una excelente disposición respecto al trámite.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

**7.5.1 ANEXO.III** Actas de comité

(25 folios)

**PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA**

Alcaldía de Aguazul

## ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

Código: M-GI-F- 01 Versión: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023

Contrato de Obra No: 806 De: 2025
Contrato de interventoria No: 798 De: 2025 Acta No: 1

Fecha: 7 Noviembre 2025

**OBJETO DEL CONTRATO** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**OBJETO DEL COMITÉ**

SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CCONTRATO DE CONSULTORIA No. 798 DE 2025.

**DESARROLLO DEL COMITE**

Siendo las 08:00 am en la secretaria de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare, se reúnen de forma presencial en representación de la secretaria de infraestructura, el ingeniero JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ , supervisor del contrato de consultoría No. 798 de 2025, en representación de CONSORCIO INTERVENTORIA AGUAZUL, asiste YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ, representante legal según contrato de consultoria No. 798 de 2025; En el que a continuacion se describen los argumentos y justificaciones a la solicitudes presentadas.

SOLICITUD DE SUSPENSION No.1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No 798 DE 2025

El dia seis (6) de noviembre de 2025 la interventoia radica oficio No IAT-OFI-2025-11-ENT-006 con asunto Solicitud de suspension No. 1 al contrato de consultoria No 798 de 2025, en cual manifiesta lo siguiente:

En nuestra calidad de Interventoria del Contrato de Obra Pública 0806 de 2025, y en cumplimiento de nuestras funciones, nos permitimos informar sobre la situación que actualmente impide el inicio de la etapa constructiva del proyecto y, en consecuencia, la ejecución de nuestro objeto contractual.

Con el fin de brindar claridad a la Entidad, exponemos la siguiente trazabilidad de los hechos:

• Solicitud de Interventoría: Una vez otorgado el aval preconstructivo, esta Interventoría procedió a solicitar al Contratista de Ob (Consorcio Subestación) la totalidad de la documentación contractual requerida para la elaboración y suscripción del acta de inicio de la etapa constructiva, dicha solicitud incluía, entre otros, los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (ARL, EPS y AFP) del personal ofertado.

• Primera Respuesta del Contratista (OFC001_CS_2025): Con fecha 28 de octubre de 2025, el Contratista radicó parte de documentación, sin embargo, en lo referente a las afiliaciones, se limitó a informar que se encontraba "realizando el proceso de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)".

• Segunda Solicitud de Interventoría: Al evidenciar el faltante, requerimos nuevamente al Contratista la entrega de la totalidad d los soportes (ARL, EPS y AFP), reiterando su carácter indispensable para el inicio de actividades.

• Segunda Respuesta del Contratista (OFC002_CS_2025): Con fecha 4 de noviembre de 2025, el Contratista respond nuevamente, enfocando su comunicación "Justificación por no realización de afiliaciones a la ARL". En este oficio, el Contratista argumenta que el retraso se debe a "situaciones administrativas ajenas a nuestra voluntad", relacionadas con fallas en las plataformas virtuales de ARL Positiva y ARL Sura.

A la fecha, y como lo demuestran sus comunicaciones, el Contratista no ha completado la entrega de los requisitos legales y contractuales para iniciar la obra, persiste la falta de:

•Soporte de afiliación a ARL EPS y AFP.

Dado que es imposible suscribir el acta de inicio de obra hasta que el Contratista cumpla con el 100% de los requisitos, el Contrato de Obra 0806 de 2025 se encuentra en un estado de incertidumbre para definir fecha de inicio.

Esta situación afecta directamente la ejecución de nuestro Contrato de Interventoría No. 0798 de 2025, pues nuestro objeto contractual (la supervisión de la obra) no puede materializarse.

Por lo anteriormente expuesto, y con el fin de no afectar los plazos y recursos de la Interventoría por causas ajenas a nuestra gestión, solicitamos formalmente a la Entidad Contratante (Municipio de Aguazul), la SUSPENSIÓN TEMPORAL del Contrato de Interventoría No. 0798 de 2025 y de sus plazos de ejecución, por un periodo inicial de veinte (20) días calendario, o hasta que el Contratista de Obra subsane la totalidad de los pendientes que impiden la firma del acta de inicio de obra.

2. ANÁLISIS TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Tras la verificación realizada por parte de la informacion suministrada por parte de la interventoria respecto a los documentos anexos por parte del contratists de obra, se logra evidenciar que sin el lleno total de los requisitos no se puede dar inicio al contrato de obra publico, por lo cual se requiere realizar la suspension del contrato de consultoria.

3. ANÁLISIS JURÍDICO-CONTRACTUAL

De conformidad con lo establecido en la Cláusula de Suspensión del Contrato de Consultoria No. 798 de 2025, las partes pueden acordar la suspensión de la ejecución del contrato cuando sobrevengan situaciones ajenas al contratista que impidan su normal desarrollo, previa justificación técnica y administrativa debidamente sustentada.

En este caso, la causa que origina la solicitud es completamente ajena al contratista, al depender de la afiliacion del personal del contrato de obra publica, se requiere realizar la suspension al contrato de consultoria No. 798 de 2025 por el termino de veinte (20) dias calendario.

4. CONCEPTO Y RECOMENDACIÓN

Con base en lo anterior, la supervision del contrato de Interventoria No. 798 de 2025:

Emite concepto favorable y avala la solicitud de suspensión de interventoria No. 1, por un término de veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de aprobación por parte de la entidad contratante.

Por las razones anteriormente planteadas se aprobó mediante comité técnico de interventoria del 07 de noviembre de 2025 para el plazo planteado para la interventoría. De acuerdo a las anteriores consideraciones y una vez realizado el análisis de los argumentos expuestos en el documento del contratista, el cual se anexa a la presente acta de suspensión y de acuerdo a las funciones de la interventoria.

Por su parte la supervisión ejercida por parte del secretario de infraestructura del municipio de Aguazul, una vez revisados los documentos adjuntados por parte de la interventoría, considera conveniente aprobar la suspensión No. 1, por el termino de VEINTE (20) días calendario, tanto para el contrato de interventoría 798 de 2025, contados a partir de la fecha prevista para el reinicio, a fin de dar cumplimiento al objeto contractual.

Como anexo de la presente acta de suspensión No. 1 se presenta copia del acta de comité técnico de fecha 07 de noviembre de 2025, la cual hace parte integral de este trámite, donde se exponen de manera detallada cada una de las causales que motivan a la suscripción de la presente, así mismo se establecen las consideraciones y obligaciones que le corresponden a cada una de las partes, para que en el tiempo solicitado se logren subsanar las causales que motiva a la suscripción de la presente actuación.

| | COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| 1 | Adelantar tramites que corresponden para suspension No 1 del contrato de interventoria 798 de 2025 | SUPERVISION |
| 2 | | |

**PRÓXIMA REUNIÓN**

**FECHA PREVISTA PARA PRÓXIMA REUNIÓN** DE DE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria del Municipio y la normatividad vigente, en Aguazul, a los 7 días del mes de Noviembre de 2025

**PARTICIPANTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | EMPLEO ROL QUE DESEMPENA | INSTITUCION | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Yamid Leonel Ramos R. | RL Interventoria. | Yamid Ramos R. | |
| Jua Miguel Sandoval | Secretario Despacho | Sec. Infraestructura | |

Original Oficina Juridica
1era Copia interventor o supervisor
2da Copia Contratista
3ra Copia Dependencia responsable del contrato

**PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA**

Alcaldía de Aguazul

## ACTA DE COMITÉ TÉCNICO

Código: M-GI-F- 01 Versión: 02

Vigente: Resolución No. 143 del 14 de abril del 2023

Contrato de Obra No: 806 De: 2025
Contrato de interventoria No: 798 De: 2025 Acta No: 1
Fecha: 7 Noviembre 2025

**OBJETO DEL CONTRATO** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**OBJETO DEL COMITÉ**

SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CCONTRATO DE CONSULTORIA No. 798 DE 2025.

**DESARROLLO DEL COMITÉ**

Siendo las 08:00 am en la secretaria de infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Aguazul Casanare, se reúnen de forma presencial en representación de la secretaria de infraestructura, el ingeniero JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ , supervisor del contrato de consultoría No. 798 de 2025, en representación de CONSORCIO INTERVENTORIA AGUAZUL, asiste YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ, representante legal según contrato de consultoria No. 798 de 2025; En el que a continuacion se describen los argumentos y justificaciones a la solicitudes presentadas.

SOLICITUD DE SUSPENSION No.1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No 798 DE 2025

El dia seis (6) de noviembre de 2025 la interventoia radica oficio No IAT-OFI-2025-11-ENT-006 con asunto Solicitud de suspension No. 1 al contrato de consultoria No 798 de 2025, en cual manifiesta lo siguiente:

En nuestra calidad de Interventoría del Contrato de Obra Pública 0806 de 2025, y en cumplimiento de nuestras funciones, nos permitimos informar sobre la situación que actualmente impide el inicio de la etapa constructiva del proyecto y, en consecuencia, la ejecución de nuestro objeto contractual.

Con el fin de brindar claridad a la Entidad, exponemos la siguiente trazabilidad de los hechos:

- Solicitud de Interventoría: Una vez otorgado el aval preconstructivo, esta Interventoría procedió a solicitar al Contratista de Ob (Consorcio Subestación) la totalidad de la documentación contractual requerida para la elaboración y suscripción del acta de inicio de la etapa constructiva, dicha solicitud incluía, entre otros, los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (ARL, EPS y AFP) del personal ofertado.
- Primera Respuesta del Contratista (OFC001_CS_2025): Con fecha 28 de octubre de 2025, el Contratista radicó parte de documentación, sin embargo, en lo referente a las afiliaciones, se limitó a informar que se encontraba "realizando el proceso de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)".
- Segunda Solicitud de Interventoría: Al evidenciar el faltante, requerimos nuevamente al Contratista la entrega de la totalidad d los soportes (ARL, EPS y AFP), reiterando su carácter indispensable para el inicio de actividades.
- Segunda Respuesta del Contratista (OFC002_CS_2025): Con fecha 4 de noviembre de 2025, el Contratista respond nuevamente, enfocando su comunicación "Justificación por no realización de afiliaciones a la ARL". En este oficio, el Contratista argumenta que el retraso se debe a "situaciones administrativas ajenas a nuestra voluntad", relacionadas con fallas en las plataformas virtuales de ARL Positiva y ARL Sura.

A la fecha, y como lo demuestran sus comunicaciones, el Contratista no ha completado la entrega de los requisitos legales y contractuales para iniciar la obra, persiste la falta de:

•Soporte de afiliación a ARL EPS y AFP.

Dado que es imposible suscribir el acta de inicio de obra hasta que el Contratista cumpla con el 100% de los requisitos, el Contrato de Obra 0806 de 2025 se encuentra en un estado de incertidumbre para definir fecha de inicio.

Esta situación afecta directamente la ejecución de nuestro Contrato de Interventoría No. 0798 de 2025, pues nuestro objeto contractual (la supervisión de la obra) no puede materializarse.

Por lo anteriormente expuesto, y con el fin de no afectar los plazos y recursos de la Interventoría por causas ajenas a nuestra gestión, solicitamos formalmente a la Entidad Contratante (Municipio de Aguazul), la SUSPENSIÓN TEMPORAL del Contrato de Interventoría No. 0798 de 2025 y de sus plazos de ejecución, por un periodo inicial de veinte (20) días calendario, o hasta que el Contratista de Obra subsane la totalidad de los pendientes que impiden la firma del acta de inicio de obra.

2. ANÁLISIS TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Tras la verificación realizada por parte de la informacion suministrada por parte de la interventoria respecto a los documentos anexos por parte del contratists de obra, se logra evidenciar que sin el lleno total de los requisitos no se puede dar inicio al contrato de obra publico, por lo cual se requiere realizar la suspension del contrato de consultoria.

3. ANÁLISIS JURÍDICO-CONTRACTUAL

De conformidad con lo establecido en la Cláusula de Suspensión del Contrato de Consultoria No. 798 de 2025, las partes pueden acordar la suspensión de la ejecución del contrato cuando sobrevengan situaciones ajenas al contratista que impidan su normal desarrollo, previa justificación técnica y administrativa debidamente sustentada.

En este caso, la causa que origina la solicitud es completamente ajena al contratista, al depender de la afiliacion del personal del contrato de obra publica, se requiere realizar la suspension al contrato de consultoria No. 798 de 2025 por el termino de veinte (20) dias calendario.

4. CONCEPTO Y RECOMENDACIÓN

Con base en lo anterior, la supervision del contrato de Interventoria No. 798 de 2025:

Emite concepto favorable y avala la solicitud de suspensión de interventoria No. 1, por un término de veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de aprobación por parte de la entidad contratante.

Por las razones anteriormente planteadas se aprobó mediante comité técnico de interventoria del 07 de noviembre de 2025 para el plazo planteado para la interventoría. De acuerdo a las anteriores consideraciones y una vez realizado el análisis de los argumentos expuestos en el documento del contratista, el cual se anexa a la presente acta de suspensión y de acuerdo a las funciones de la interventoría.

Por su parte la supervisión ejercida por parte del secretario de infraestructura del municipio de Aguazul, una vez revisados los documentos adjuntados por parte de la interventoría, considera conveniente aprobar la suspensión No. 1, por el termino de VEINTE (20) días calendario, tanto para el contrato de interventoría 798 de 2025, contados a partir de la fecha prevista para el reinicio, a fin de dar cumplimiento al objeto contractual.

Como anexo de la presente acta de suspensión No. 1 se presenta copia del acta de comité técnico de fecha 07 de noviembre de 2025, la cual hace parte integral de este trámite, donde se exponen de manera detallada cada una de las causales que motivan a la suscripción de la presente, así mismo se establecen las consideraciones y obligaciones que le corresponden a cada una de las partes, para que en el tiempo solicitado se logren subsanar las causales que motiva a la suscripción de la presente actuación.

| | COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| 1 | Adelantar tramites que corresponden para suspension No 1 del contrato de interventoria 798 de 2025 | SUPERVISION |
| 2 | | |

**PRÓXIMA REUNIÓN**

**FECHA PREVISTA PARA PRÓXIMA REUNIÓN** DE DE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría del Municipio y la normatividad vigente, en Aguazul, a los 7 días del mes de Noviembre de 2025

**PARTICIPANTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | EMPLEO ROL QUE DESEMPENA | INSTITUCION | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Yamid Leonardo R.<br>Juan Miguel Sandoval | R/L Interventoria.<br>Secretario Despacho | Yamid Leonardo R.<br>Sec. Infraestructura. | |

Original Oficina Juridica
1era Copia interventor o supervisor
2da Copia Contratista
3ra Copia Dependencia responsable del contrato

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-11-ENT-006

Aguazul, 6 de noviembre de 2025

SEÑOR
**ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
**CIUDAD**

**Referencia:** Contrato de interventoría 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

**Asunto:** Solicitud de suspensión del Contrato de Interventoría No. 0798 de 2025

Cordial saludo,

En nuestra calidad de Interventoría del Contrato de Obra Pública 0806 de 2025, y en cumplimiento de nuestras funciones, nos permitimos informar sobre la situación que actualmente impide el inicio de la etapa constructiva del proyecto y, en consecuencia, la ejecución de nuestro objeto contractual.

Con el fin de brindar claridad a la Entidad, exponemos la siguiente trazabilidad de los hechos:

- Solicitud de Interventoría: Una vez otorgado el aval preconstructivo, esta Interventoría procedió a solicitar al Contratista de Obra (Consorcio Subestación) la totalidad de la documentación contractual requerida para la elaboración y suscripción del acta de inicio de la etapa constructiva, dicha solicitud incluía, entre otros, los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (ARL, EPS y AFP) del personal ofertado.
- Primera Respuesta del Contratista (OFC001_CS_2025): Con fecha 28 de octubre de 2025, el Contratista radicó parte de la documentación, sin embargo, en lo referente a las afiliaciones, se limitó a informar que se encontraba "realizando el proceso de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)".
- Segunda Solicitud de Interventoría: Al evidenciar el faltante, requerimos nuevamente al Contratista la entrega de la totalidad de los soportes (ARL, EPS y AFP), reiterando su carácter indispensable para el inicio de actividades.
- Segunda Respuesta del Contratista (OFC002_CS_2025): Con fecha 4 de noviembre de 2025, el Contratista respondió nuevamente, enfocando su comunicación "Justificación por no realización de afiliaciones a la ARL". En este oficio, el Contratista argumenta que el retraso se debe a "situaciones administrativas ajenas a nuestra voluntad", relacionadas con fallas en las plataformas virtuales de ARL Positiva y ARL Sura.

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

A la fecha, y como lo demuestran sus comunicaciones, el Contratista no ha completado la entrega de los requisitos legales y contractuales para iniciar la obra, persiste la falta de:

- Soporte de afiliación a ARL EPS y AFP.

Dado que es imposible suscribir el acta de inicio de obra hasta que el Contratista cumpla con el 100% de los requisitos, el Contrato de Obra 0806 de 2025 se encuentra en un estado de incertidumbre para definir fecha de inicio.

Esta situación afecta directamente la ejecución de nuestro Contrato de Interventoría No. 0798 de 2025, pues nuestro objeto contractual (la supervisión de la obra) no puede materializarse.

Por lo anteriormente expuesto, y con el fin de no afectar los plazos y recursos de la Interventoría por causas ajenas a nuestra gestión, solicitamos formalmente a la Entidad Contratante (Municipio de Aguazul), la SUSPENSIÓN TEMPORAL del Contrato de Interventoría No. 0798 de 2025 y de sus plazos de ejecución, por un periodo inicial de veinte (20) días calendario, o hasta que el Contratista de Obra subsane la totalidad de los pendientes que impiden la firma del acta de inicio de obra.

Agradecemos su gestión y quedamos atentos a la reunión de formalización de dicha suspensión.

En consecuencia,

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
**REPRESÉNTATE LEGAL INTERVENTORÍA**

*Anexos:*
*Copia Oficio IAT-OFI-2025-10-CON-004 (Solicitud de documentación para acta de inicio) Un (1) folio*
*Copia Oficio OFC001_CS_2025 (Respuesta Contratista) Dos (2) folios*
*Copia Oficio IAT-OFI-2025-11-CON-005 (Requerimiento de documentación faltante para acta de inicio) Dos (2) folio*
*Copia Oficio OFC002_CS_2025 (Respuesta Contratista) Siete (7) folios*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-10-CON-004

Aguazul, 24 de octubre de 2025

Recibi
Deyder Cocunubo V.
24/10/2025.
2:50 pm

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
**ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS**
REPRESENTANTE LEGAL
**CIUDAD**

**Referencia:** Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

**Asunto:** Solicitud de documentación para acta de inicio

Cordial saludo,

En nuestra calidad de Interventoría del contrato de la referencia y en seguimiento al desarrollo de la etapa preconstructiva, nos dirigimos a ustedes con el fin de avanzar hacia la formalización de la etapa constructiva, teniendo en cuenta que el proyecto ya recibió el aval preconstructivo por parte de esta Interventoría y fue radicado informe a la entidad contratante, y considerando que se cumple el plazo estipulado para la legalización del inicio de obra, solicitamos formalmente la entrega de la siguiente documentación contractual pendiente, la cual es indispensable para proceder con la elaboración y suscripción del acta de inicio:

- Pólizas de garantías y amparos
- Comprobante de aprobación de pólizas
- Pago de estampillas del contrato
- Documentación del personal ofertado y aprobado
- Afiliaciones de ARL, EPS y AFP
- Programación de obra y flujo de caja.

Agradecemos radicar la documentación mencionada a la mayor brevedad posible, con el fin de dar cumplimiento a los términos contractuales y evitar retrasos en el cronograma general del proyecto.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
**REPRESÉNTATE LEGAL INTERVENTORÍA**

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

OFC001_CS_2025

Aguazul 28 de octubre de 2025

Yamid Lesmes R.
28-10-2025

**SEÑOR:**
**YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ**
**Ciudad**

**Referencia:** Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

**Asunto:** Respuesta a solicitud de documentos para el acta de inicio del contrato.

Cordial saludo,

En atención al oficio mediante el cual se solicita la documentación necesaria para la elaboración del acta de inicio del contrato de obra pública 0806 de 15 de septiembre de 2025, me permito informar que actualmente me encuentro realizando el proceso de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

Una vez se formalice dicha vinculación y se obtenga el respectivo soporte, procederé a remitir el documento faltante para completar los requisitos establecidos.

Adjunto los siguientes documentos requeridos:

- Pólizas de garantías y amparos
- Comprobante de aprobación de pólizas
- Pago de estampilla del contrato
- Documentación del personal ofertado y aprobado

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

- Programación de obra y flujo de caja.

Agradecemos su comprensión y colaboración para continuar con una excelente disposición respecto al trámite.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-11-CON-005

Deyder Cocunubo V.
Fecha: 3-Nov-2025
Hora: 9:30am

Aguazul, 03 de noviembre de 2025

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
**ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS**
REPRESENTANTE LEGAL
**CIUDAD**

**Referencia:** Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

**Asunto:** Requerimiento de documentación faltante para acta de inicio

Cordial saludo,

En nuestra calidad de Interventoría del contrato de la referencia, acusamos recibo de su comunicación OFC001_CS_2025, radicada el pasado 28 de octubre de 2025, junto con los documentos adjuntos (pólizas, comprobante de aprobación, pago de estampilla, documentación de personal y programación de obra).

Una vez revisada la documentación y su respuesta, evidenciamos que aún no se ha completado la totalidad de los requisitos indispensables para proceder con la elaboración y suscripción del acta de inicio de la etapa constructiva, en su comunicación, y usted menciona estar en proceso de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)

Por lo anterior, solicitamos formalmente radicar a la mayor brevedad posible la siguiente documentación contractual pendiente:

- Soportes de afiliación a ARL (Certificado final, no solo el trámite).
- Soportes de afiliación EPS.
- Soportes de afiliación a AFP.

Reiteramos que la entrega de la totalidad de los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral del personal ofertado y aprobado es un requisito indispensable para legalizar el inicio de actividades y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

Agradecemos su pronta gestión con el fin de no generar mayores retrasos en el cronograma general del proyecto
Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
**REPRESÉNTATE LEGAL INTERVENTORÍA**

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

**GÉMINIS CG**

OFC002_CS_2025

Aguazul 04 de noviembre de 2025

Yamid Lesmes D.
04-11-2025.

**SEÑOR:**
**YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ**
**Ciudad**

**Referencia:** Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

**Asunto:** Justificación por no realización de afiliaciones a la ARL.

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio me permito informar que no ha sido posible realizar el proceso de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) de las personas que estarán vinculadas en el contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, debido a que la empresa aún no ha sido registrada en el sistema de seguridad correspondiente, pero que son situaciones administrativas ajenas a nuestra voluntad.

Actualmente nos encontramos adelantando los tramites necesarios para la formalización y registro de la entidad ante las plataformas y organismos pertinentes, en primera instancia, se realizo el tramite de la afiliación con la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, sin embargo, dicho trámite no ha podido ser finalizado por motivos administrativos internos de esa entidad (cambio de plataformas virtuales).

Posteriormente, se procede a gestionar el registro con la ARL SURA, el tramite de sebe realizar por plataforma virtual, pero se encuentra presentando falla masiva en el portal.

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

**GÉMINIS CG**

Es importante resaltar que el Consorcio se encuentra actuado de manera diligente, realizando los trámites y siguiendo las instrucciones indicadas por las ARL involucradas. Nos mantenemos en constante comunicación para obtener la aprobación final y proceder inmediatamente con la afiliación de los trabajadores, conforme a la normatividad vigente en materia de riesgos laborales.

Agradecemos su comprensión frente a esta situación, que esperamos sea resuelta a la mayor brevedad posible. Reiteramos nuestra disposición para entregar cualquier soporte o información adicional que se requiera.


Se anexa como evidencia las respuestas por parte de las entidades a la cual se ha realizado la solicitud.


Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**


**GÉMINIS CG**

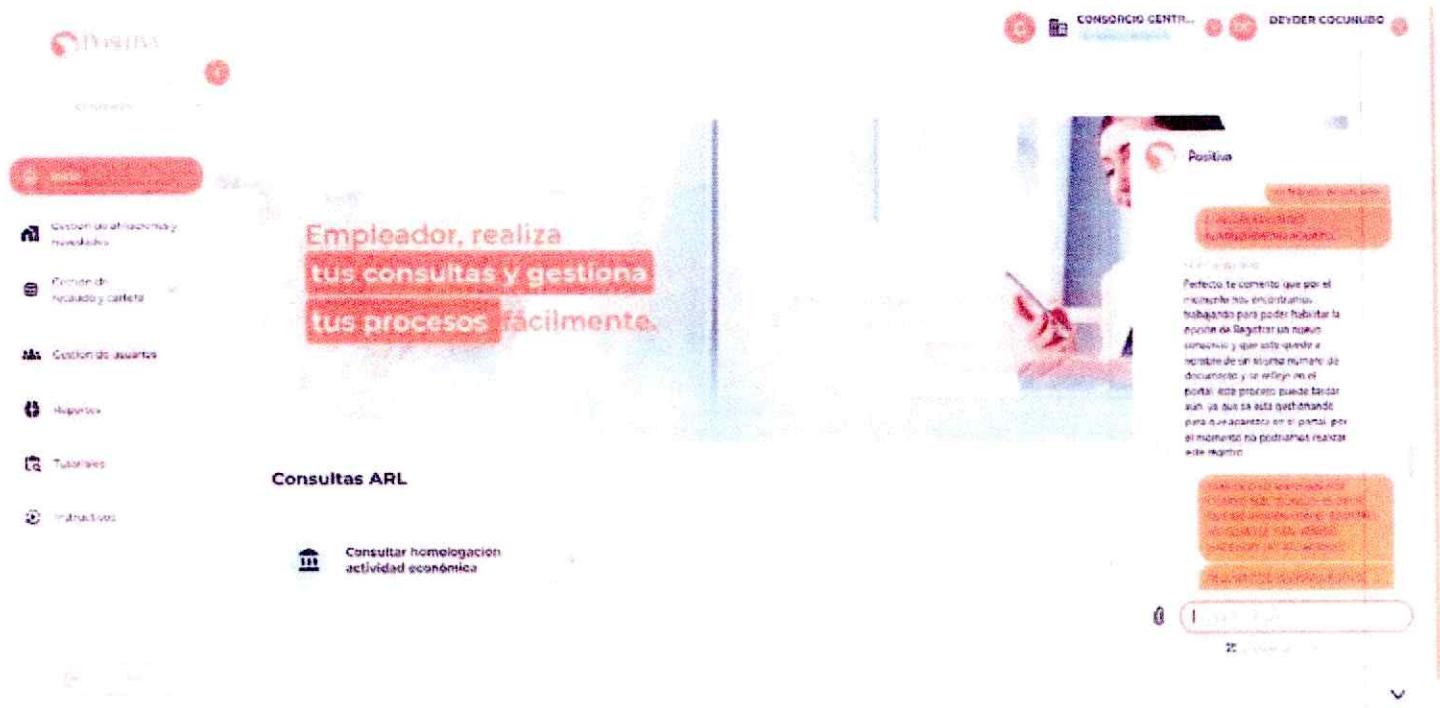


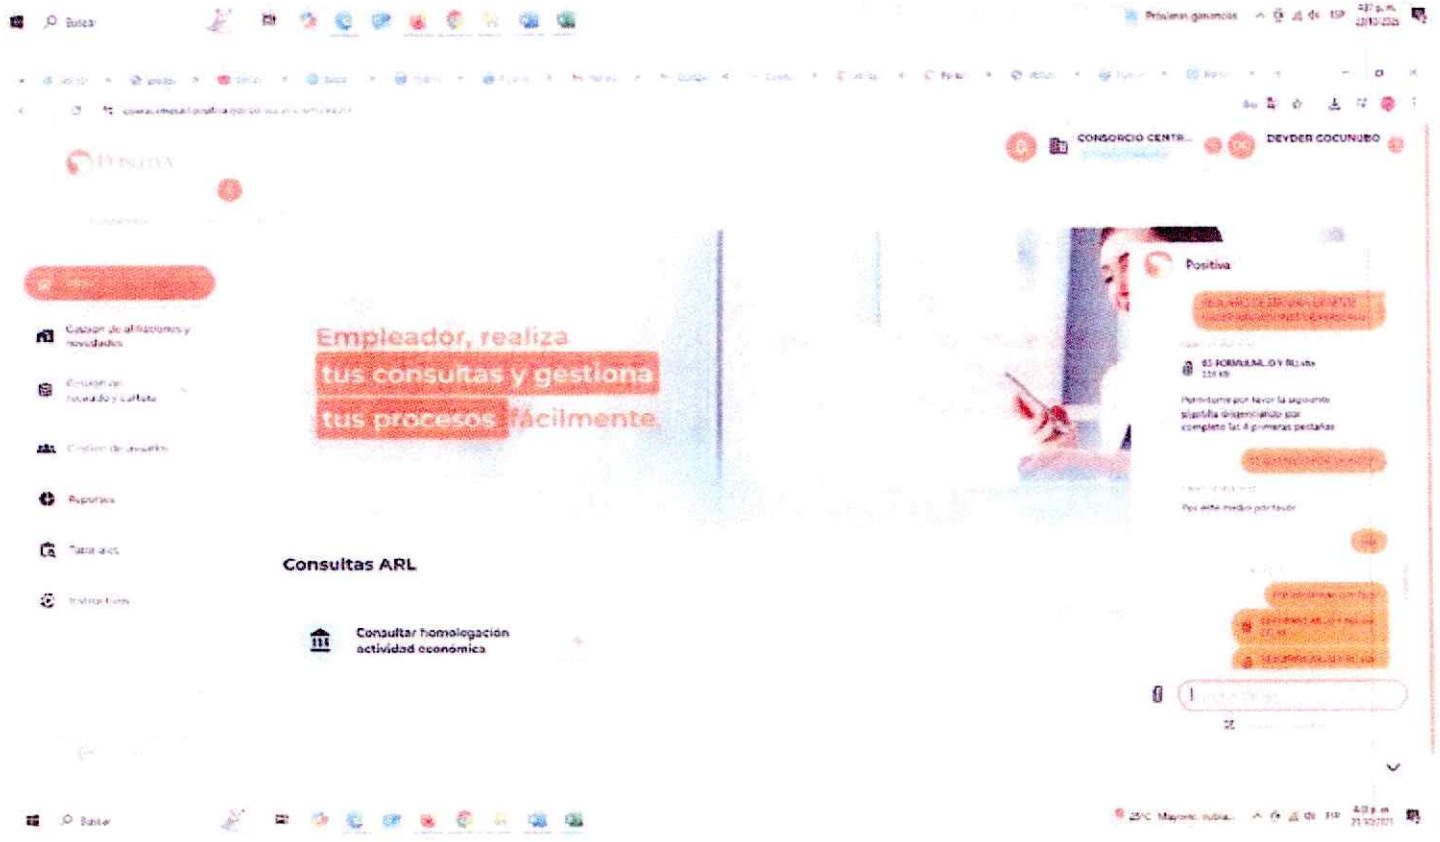**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
consorciosubestacion26@gmail.com


**GÉMINIS CG**

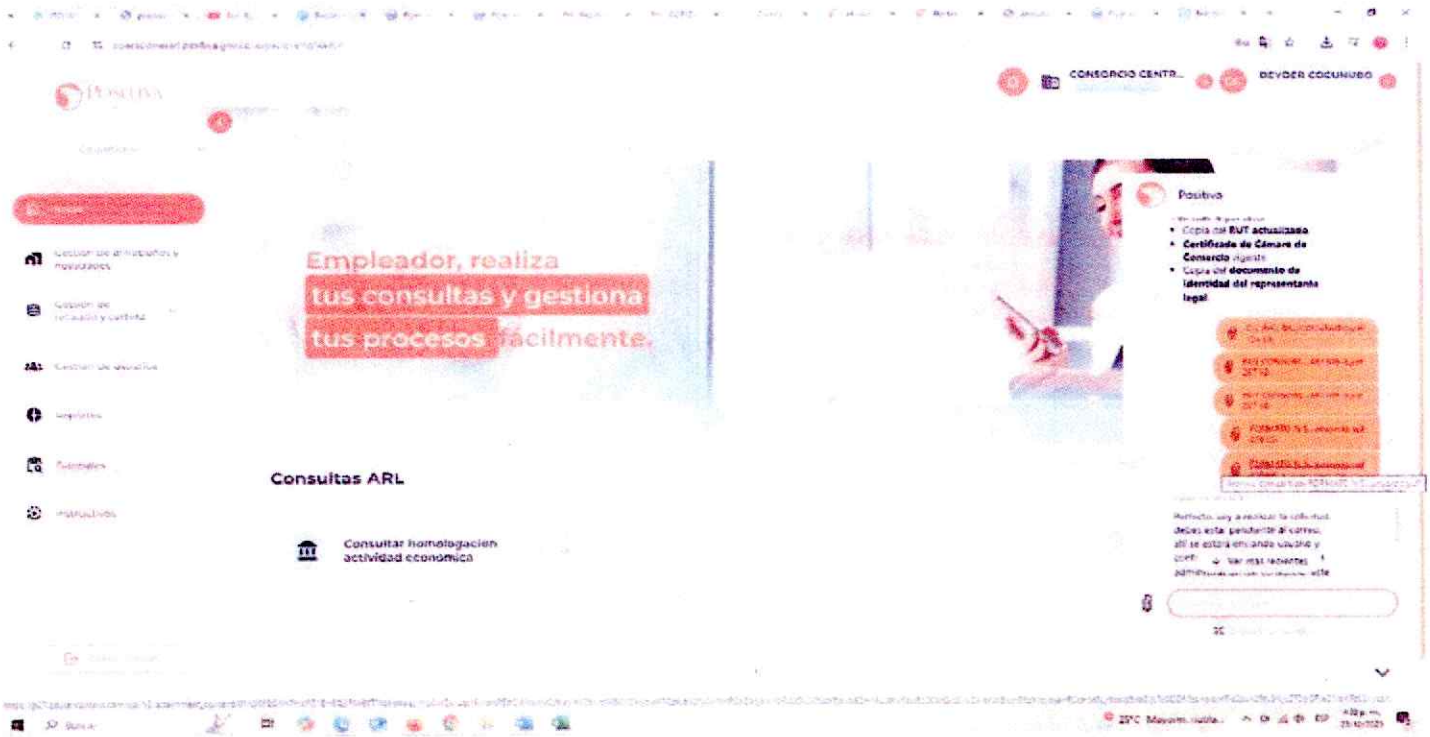


**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

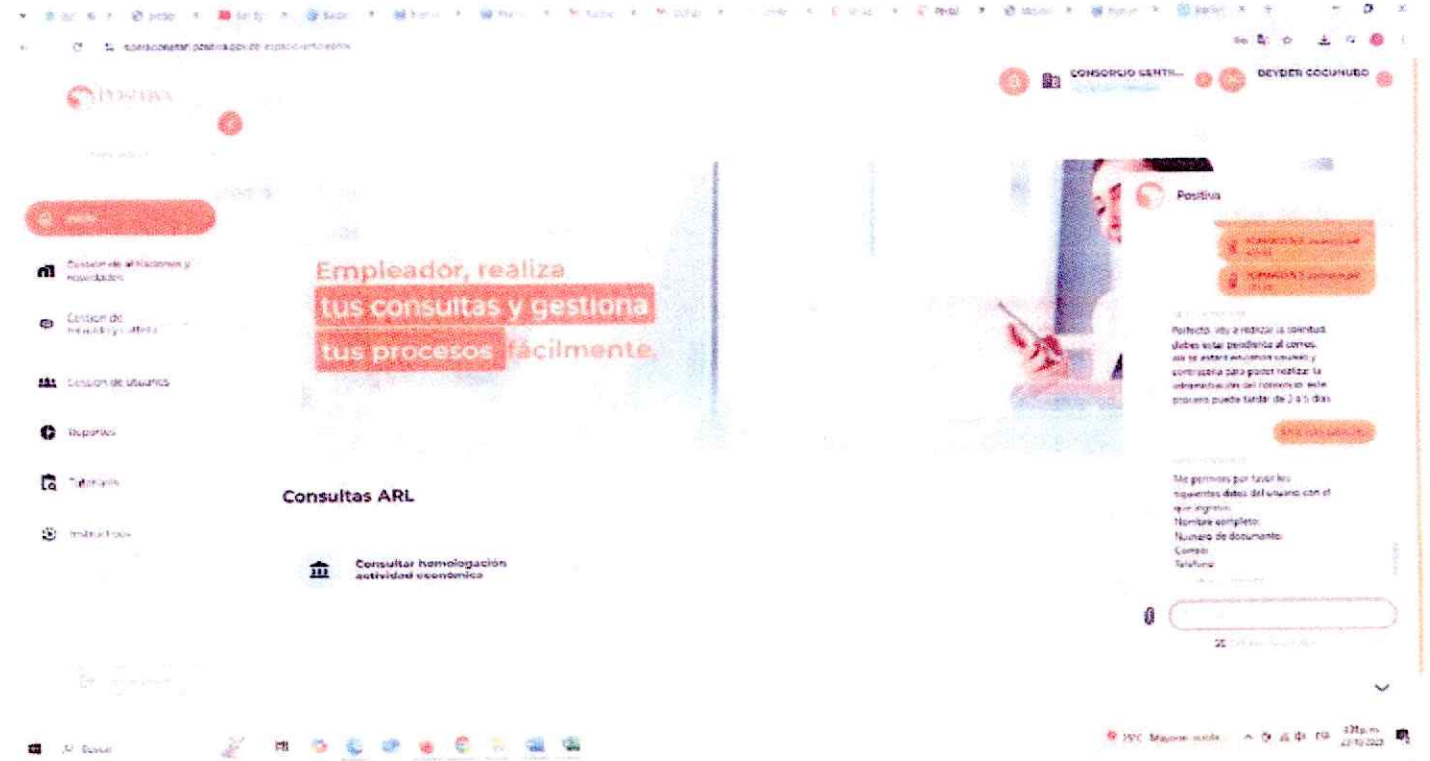
**GÉMINIS C(**

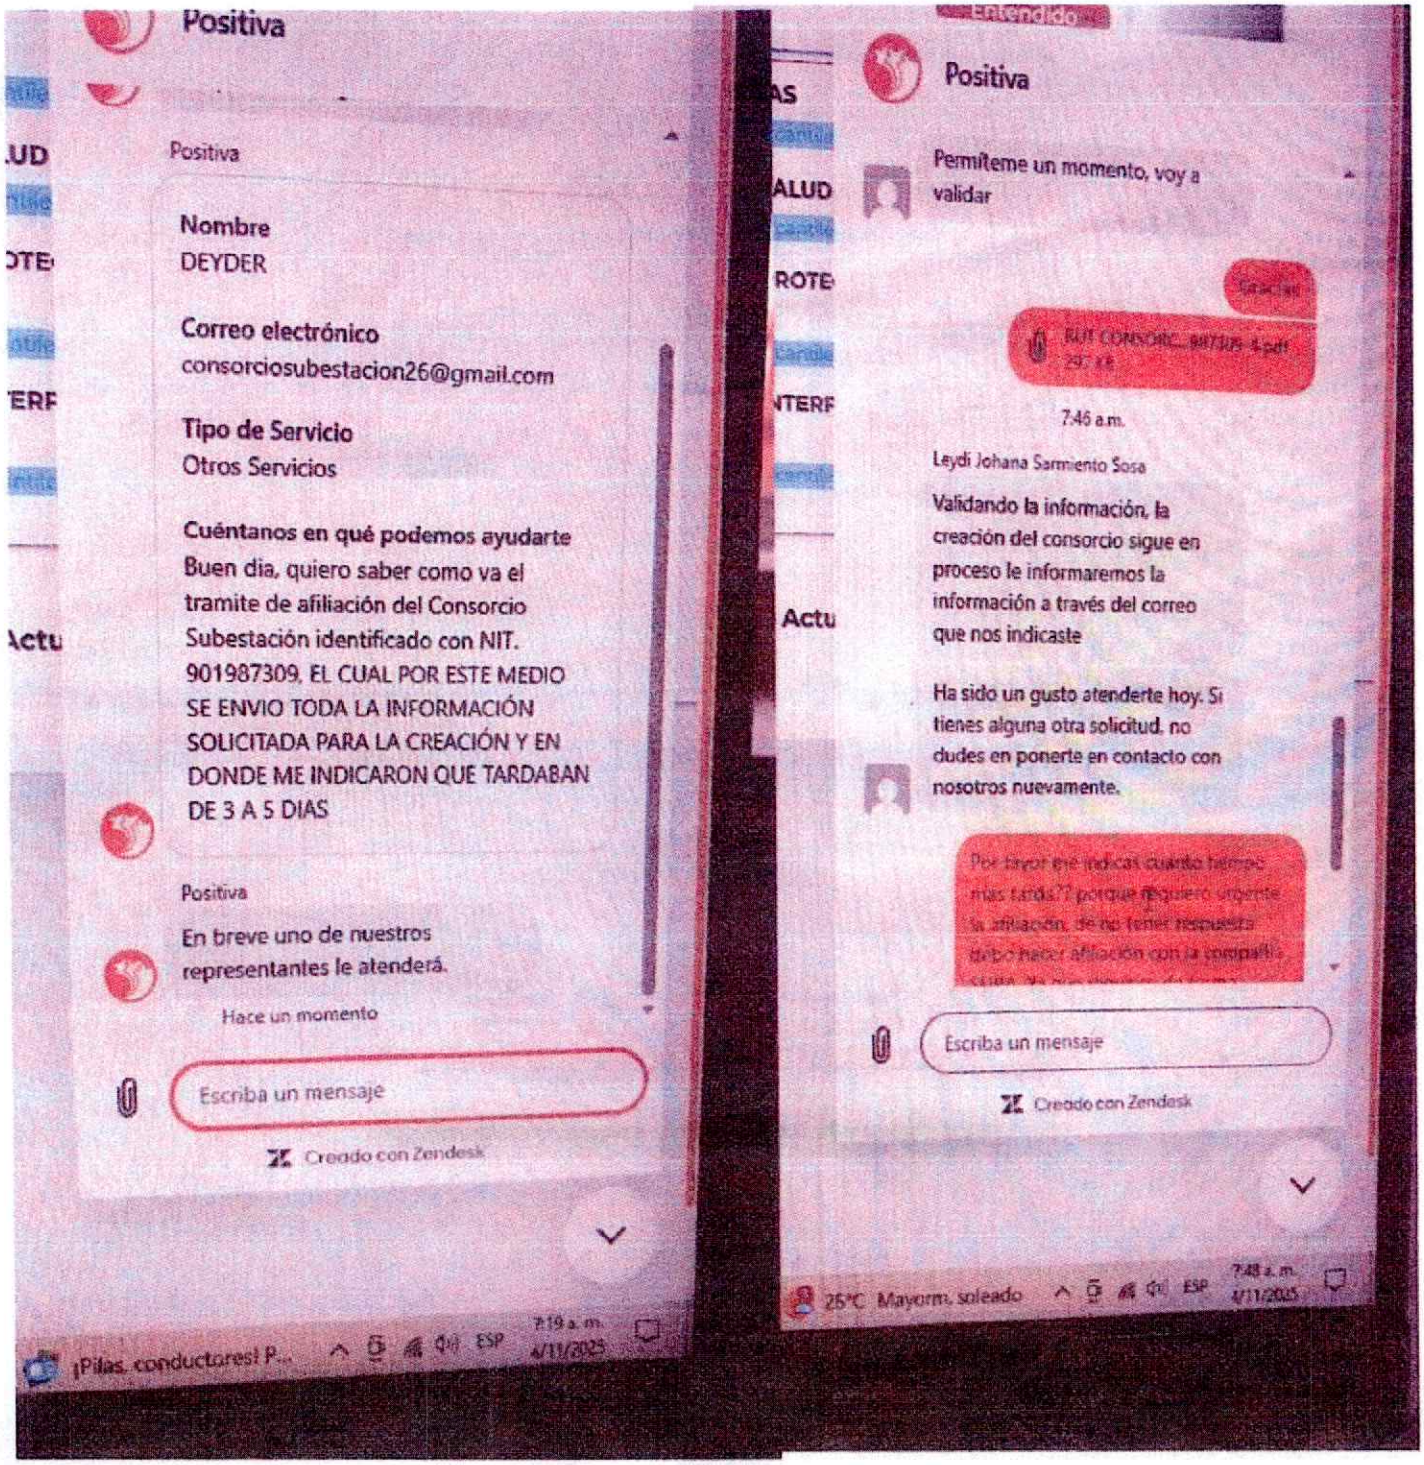

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

**GÉMINIS C(**

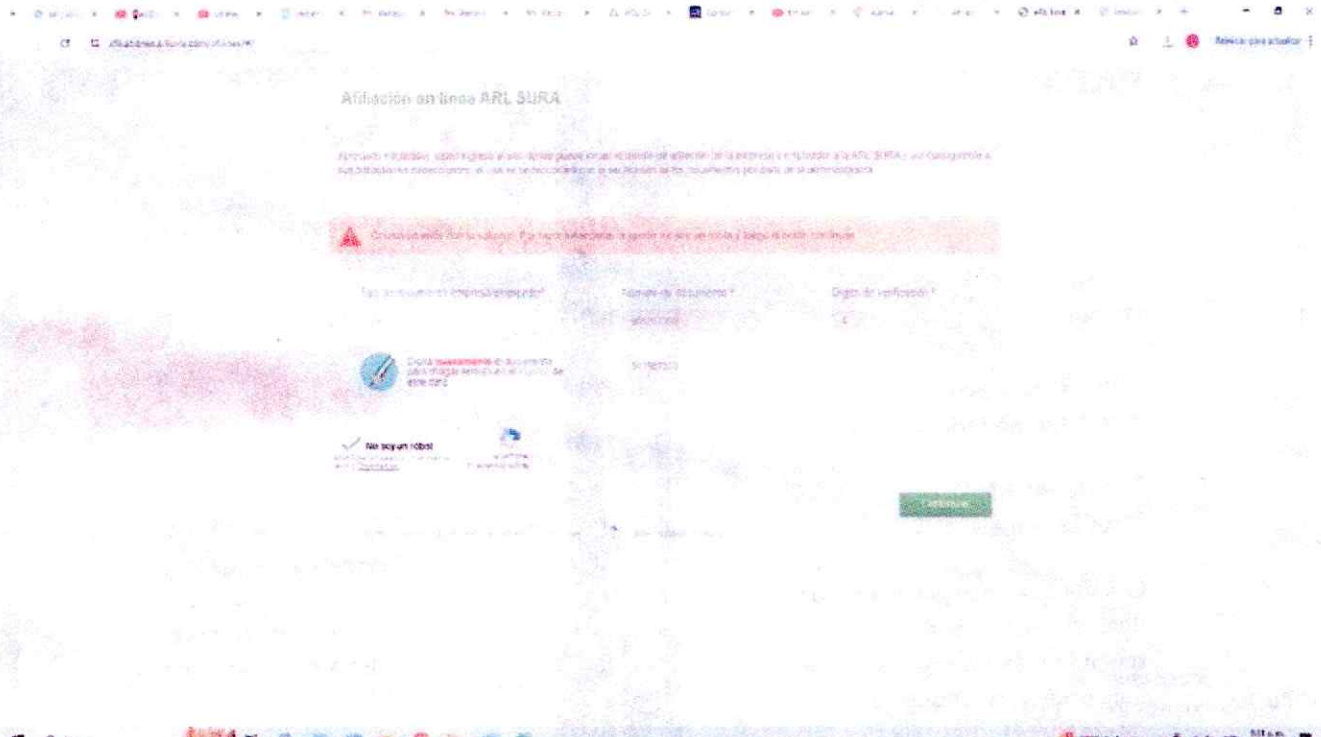

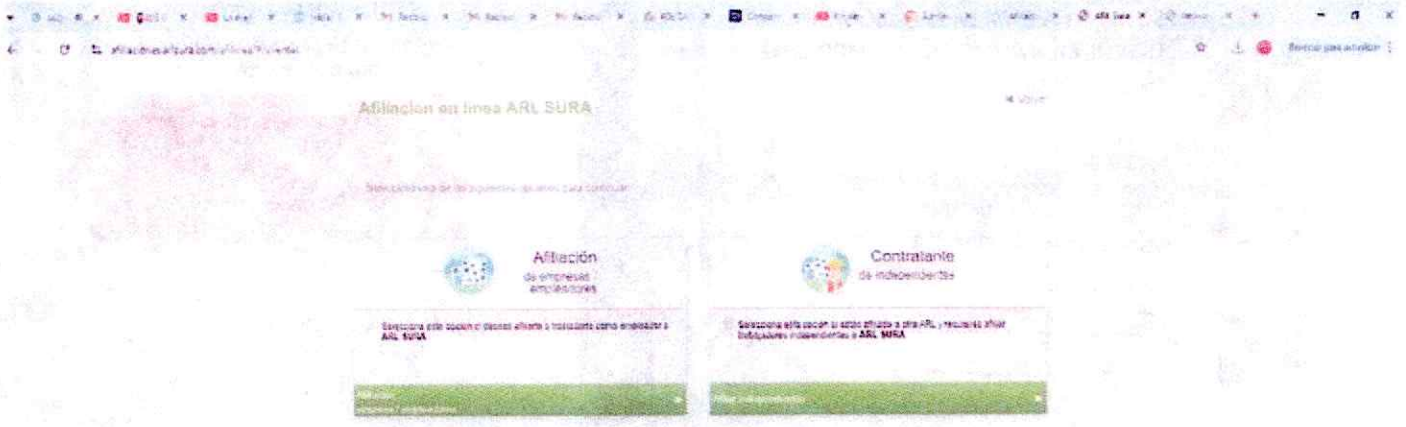**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

**GÉMINIS CG**

No se puede acceder a este sitio

# CONSORCIO SUBESTACION
## NIT: 901.987.309-4

ACTA DE INICIAL



**OBJETO:**
**CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

**ACTA No.: 1**

**CONTRATO No.: 806 de 15 septiembre de 2025**

**FECHA:** 25/11/2025

**FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES**

**1. REGRISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA**




**2. DATOS DEL PREDIO**

**Nombre del Responsable de la Unidad Social:**

**Tenencia:** [X] Propietario [ ] Arrendatario [ ] Poseedor [ ] Otro, Cual? _____

**Nombre del Propietario:** Municipio de Aguazul

**NIT: 891.855.200-9** **No.Telefono:**

**Dirección:** Calle 11 No. 11-35 **Costado:** Frente

**No Pisos:** 1 **Escritura Publica No.: 470-54567**

**2.1 SERVICIOS PUBLICOS**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. Agua | | X |
| 2. Alcantarillado | | X |
| 3. Energía | X | |
| 4. Teléfonos | | X |
| 5. Gas | | X |
| 6. Televisión cable | | X |
| 7. Otros | | |

OBSERVACIONES

La inspección realizada corresponde al cuarto donde se encuentra ubicada la planta eléctrica del centro administrativo municipal del municipio de aguazul y la plazoleta contigua al nuevo edificio del centro administrativo municipal para el paso de un banco ducto.

**2.2 TIPO DE PREDIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Monumento Nacional | [ ] | Valor normal | [x] | 7. Otro |
| [ ] | Valor Arquitectónico | [ ] | En construcción | [ ] | Cuál? INSTITUCIONAL |
| [ ] | Valor intermedio | [ ] | Sin edificar | | |

**2.3 USO ACTUAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Residencial | [ ] | Recreacional | [ ] | |
| [ ] | Comercial | [ ] | Baldío | [ ] | |
| [ ] | Industrial | [ ] | Otro | [ ] | |
| [X] | Institucional | [ ] | Cuál? | | |

**2.4 ACCESOS VEHICULARES**

Garaje: [X] SI [ ] NO

Cuantos:

Se usa como comercio: [ ] SI [X] NO

**3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)**

| | | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA: Construcción en sistema combinado, entre muros y elementos como columnas y vigas | PISOS: Placa en cemento, se encuentra con presencia de grasas y suciedad, por presencia de equipos | HUMEDADES: Presencia de manchas amarillas |
| MUROS: Muros en buen estado, se encuentran sucios por la presencia de equipos | FACHADA: En ladrillo a la vista, signos visibles de humedad y eflourenencias marcadas por manchas oscuras y verdosas a lo largo de la pared, edificación antigua | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| CUBIERTA: Placa en concreto | GRIETAS Y FISURAS: Se observa grietas en la dilatación ente muros y vigas, normales en una construcción | OTRO, CUAL?: La plazoleta se encuentra en placa con acabado en granito lavado y baldosa, estructura antigua |

SP

| | CONSORCIO SUBESTACION<br>NIT: 901.987.309-4 | |
|---|---|---|
| | ACTA DE VECINDAD INICIAL | PAGINA 2 de 5 |

**4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")**

1. Exterior del cuarto
Mamposteria/Muros: El muro exterior es de ladrillo a la vista, con junta deteriorada y signos visibles de humedad y eflorescencias marcadas por manchas oscuras y verdosas a lo largo de la pared.
Piso Exterior: El piso adyacente al muro es de concreto o baldosa rústica (posiblemente adoquín de cemento) y presenta acumulación de tierra y maleza. Se observan grietas o desgaste en el borde inferior del muro.

2. Interior del cuarto
Uso: El espacio está ocupado por una planta eléctrica o generador de color amarillo y negro, indicando su uso como cuarto de máquinas.
Muros Interiores: Los muros interiores están pañetados y pintados de blanco, presentan un aspecto de suciedad, deterioro en la parte inferior y en las esquinas, con manchas oscuras y áreas de pintura desprendida o agrietada, se aprecia una dilatación de remate en la unión del muro con el techo en todo el perímetro.
Techo: El techo está pañetado y pintado de blanco, manchas amarillentas/marrones y líneas de humedad o micro fisuras, especialmente cerca de las esquinas y en el área adyacente al ducto de extracción de gases.

3. Instalaciones eléctricas y aperturas
Punto Eléctrico Muro: En el muro interior (cercano al acceso), se observa un hueco rectangular sin tapa (posiblemente el alojamiento de una caja eléctrica) del cual sobresalen cables eléctricos expuestos (un manojo de cables finos de color rojo y negro).
Punto Eléctrico Techo: En el centro del cielorraso hay un hueco circular (posiblemente el punto de una luminaria o lámpara) del cual sobresalen cables eléctricos expuestos y colgantes.
Acceso/Puerta: Una puerta o reja corrediza/abatible de láminas metálicas horizontales (tipo persiana o rejilla) en un marco de metal gris, que proporciona ventilación y acceso al cuarto, el marco de la puerta colinda con una columna de ladrillo a la vista, se encuentra en buen estado general, mostrando pequeños puntos de oxido, no relevantes.

4. Plazoleta
Piso principal: En gravilla lavada con acabados, estructura antigua.
Estado del piso: El piso se percibe en un estado desgaste por su vida útil.
Áreas de desgaste: En la superficie de gravilla se aprecian algunas áreas que parecen tener manchas de suciedad o una coloración oscura uniforme por el uso.

| ANEXOS: | Fotografía 11 | Videos 1 | Otro: | Ninguno |
|---|---|---|---|---|

**Las personas que suscriben la presente acta de vecindad certifican que la información registrada es veridica.**

**FIRMAS**

Firma Representante Contratista
Nombre: DEYDER COCUNUBO VARGAS

VoBo.Representante Interventoría
Nombre: YAMID LESMES RODRIGUEZ

Vo.Bo Firma Supervisor
Nombre: JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

Vo.Bo Apoyo a la supervisión
Nombre: LUIS FERNANDO LEAL

Copia 1: para el propietario
Copia 2: para la Interventoria
Copia 3: para el contratista

**CONSORCIO SUBESTACION**
**NIT: 901.987.309-4**

ACTA DE VECINDAD INICIAL



**5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO**



**Fotografia 1: Puerta de acceso**



**Fotografia 2: muro lateral, salida de exosto**




**Fotografia 3: vista interna, salida del exosto**



**Fotografia 4: Vista frontal, entrada al cuarto**



**Fotografia 5: Vista lateral, equipos de manejo de planta**

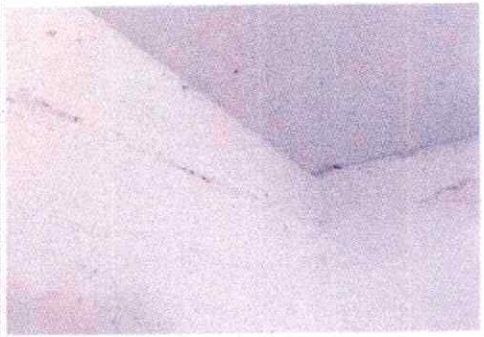

**Fotografia 6:Esquina superior izquierda del cuarto**

**FIRMAS**

Firma Representante Contratista
Nombre: DEYDER COCUNUBO VARGAS

Vo.Bo Firma Supervisor
Nombre: JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

VoBo.Representante Interventoria
Nombre: YAMID LESMES RODRIGUEZ

Vo.Bo Apoyo a la supervisión
Nombre: LUIS FERNANDO LEAL

Copia 1: para el propietario
Copia 2: para la interventoria
Copia 3: para el contratista


**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**

ACTA DE VECINDAD INICIAL






**Fotografia 7:** Vista del techo en la parte interna

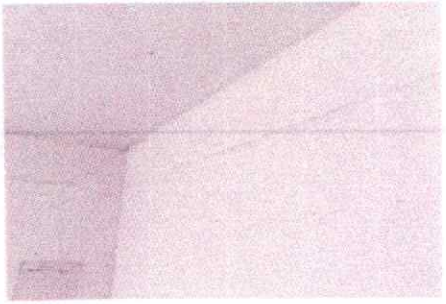

**Fotografia 8: Esquina superior derecha del cuarto**

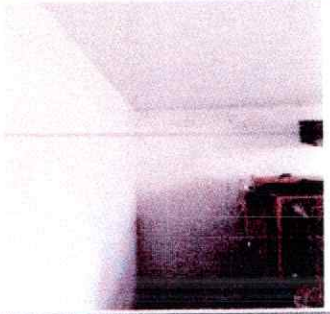

**Fotografia 9:Vista lateral parte posterior del cuarto**



**Fotografia 10: Vista lateral derecha del acceso del cuarto**



**Fotografia 11: Vista de salida del exosto**



**Fotografia 12: Vista general de espacio de la plazoleta a intervenir**

**FIRMAS**

Firma Representante Contratista
Nombre: DEYDER COCUNUBO VARGAS

Vo.Bo Firma Supervisor
Nombre: JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

VoBo.Representante Interventoria
Nombre: YAMID LESMES RODRIGUEZ

Vo.Bo Apoyo a la Supervisión
Nombre: LUIS FERNANDO LEAL

**Copia 1:** para el propietario
**Copia 2:** para la Interventoria
**Copia 3:** para el contratista

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**

ACTA DE VECINDAD INICIAL






**Grafico 1: Trazado de la canalización nueva**

**FIRMAS**

Firma Representante Contratista
Nombre: DEYDER COCUNUBO VARGAS

Vo.Bo Firma Supervisor
Nombre: JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

VoBo Representante Interventoria
Nombre: YAMID LESMES RODRIGUEZ

Vo.Bo Apoyo a la supervisión
Nombre: LUIS FERNANDO LEAL

Copia 1: para el propietario
Copia 2: para la Interventoria
Copia 3: para el contratista

| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía de Aguazul | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. | YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ |

## ACTA DE REUNIÓN DE COMITE DE OBRA/CONTRATO No. 0806 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 25 de noviembre de 2026 |
| **HORA:** | 2:30 PM |
| **LUGAR:** | OBRA |
| **ACTA No. :** | 001 |

## 1 ASISTENTES

| NOMBRE | ENTIDAD / EMPRESA | CARGO | CORRE LECTRONICO |
|---|---|---|---|
| **Yamid Fernando Lesmes Rodríguez** | Interventoría | Representante legal | interaguazultanque@gmail.com |
| **Deyder Cocunubo Vargas** | Obra | Representante legal | consorciosubestacion26@gmail.com |

## 2 DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El contratista comparte con la interventoría un análisis detallado sobre el área de ampliación del cuarto de la planta eléctrica para la subestación, se informa que, tras realizar el replanteo en sitio y verificar las dimensiones de los equipos de generación disponibles para suministro, se identifica una oportunidad de mejora en la longitud del recinto.

El contratista presenta las fichas técnicas de diversas marcas líderes, señalando que, para garantizar una operación confortable y un mantenimiento eficiente, es recomendable realizar un ajuste en las dimensiones actuales, el propósito principal es asegurar que el proyecto final no solo cumpla con las distancias de seguridad exigidas por el RETIE, sino que también facilite las maniobras técnicas y la circulación del personal, alineándose con las mejores prácticas de ingeniería.

La interventoría recibe de conformidad el detalle constructivo en planta, se coincide en que la prioridad es la funcionalidad técnica y la seguridad del proyecto, la interventoría procederá a revisar las medidas propuestas en el esquema entregado para validar su viabilidad técnica y administrativa manteniendo el flujo de trabajo coordinado que se lleva hasta la fecha.

La interventoría manifiesta que, tras realizar una revisión minuciosa del detalle constructivo en planta y de las fichas técnicas suministradas, procedió a verificar en sitio el replanteo generado y el equipo técnico del contratista, como resultado de esta inspección, la interventoría certifica la necesidad técnica de ajustar las dimensiones del cuarto de la planta eléctrica.

Se avala de manera oficial la modificación propuesta, reconociendo que la ampliación de la longitud es indispensable para garantizar el cumplimiento normativo del RETIE y la correcta instalación y operación del equipo seleccionado. Esta decisión se toma con el fin de asegurar la calidad integral y la funcionalidad de la subestación, permitiendo así la continuidad fluida en la ejecución del proyecto.

## 3 COMPROMISOS

| No. | COMPROMISO | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| 1 | Entrega de balance de actividades (mayores y menores cantidades) derivado de la ampliación. | Contratista |
| 2 | Revisión y validación de las cantidades de obra presentadas para firma de acta de balance. | Interventoría |
| 3 | Continuar con la ejecución del cuarto según las nuevas dimensiones avaladas. | Contratista |

## 4 FIRMAS

| NOMBRE | FIRMA | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|---|
| **Deyder Cocunubo Vargas** | | **Yamid Fernando Lesmes Rodríguez** | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


# 7 INFORME TECNICO

## 7.1 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS


A continuación, se describen las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 19 al 30 de noviembre del 2025, en el marco del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, estas actividades corresponden a lo establecido en el presupuesto del contrato de obra No. 0806 de 15 de septiembre de 2025, suscrito entre el MUNICIPIO DE AGUAZUL y el CONSORCIO SUBESTACIÓN AGUAZUL, representado legalmente por DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS, y al cual el Ingeniero YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ, realiza la respectiva interventoría.

| **CAPITULO 2,0** | **RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACOMETIDA BT** |
|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** |
| 2.07 | Excavación manual en conglomerado |
| **Avance de ejecución mensual %** | **33,65%** |
| Descripción de actividades: | ✓ La actividad consiste en la remoción y extracción del material térreo mediante la utilización exclusiva de herramienta manual y mano de obra, el objetivo principal es la apertura de zanjas o apiques con las dimensiones geométricas (ancho, profundidad y longitud) especificadas en los planos del proyecto o según las condiciones del terreno, para la posterior instalación de la red de distribución subterránea de baja tensión (BT).<br><br>✓ Procedimiento de ejecución<br><br>o Replanteo y demarcación: Se realiza el trazado y marcado de las líneas de la zanja o el área del apique en el terreno, conforme a las cotas y alineamientos establecidos en los planos.<br>o Dada la dureza del material conglomerado, se emplean herramientas manuales de alto impacto como picos, cinceles, barras o palanquetas metálicas y martillos.<br>o El proceso implica la fracturación progresiva del material en capas o bloques pequeños para su posterior remoción con palas. |

| | |
|---|---|
| | ○ En caso casos específicos, se puede requerir el uso de herramienta menor de percusión (ej. rotomartillos eléctricos o neumáticos), debido a la presencia de las placas en concreto en algunos tramos de las canalizaciones.<br>○ El material proveniente de la excavación se deposita de manera provisional a una distancia segura (mínimo 1.0 m) del borde de la zanja para evitar derrumbes y garantizar el libre tránsito de personal y el acceso a la zanja.<br>○ Al alcanzar la cota de fondo y las dimensiones finales requeridas (perfilado), se realiza el refinado y limpieza manual de las paredes y el fondo de la zanja, asegurando que la superficie quede nivelada (o con la pendiente requerida) y libre de material suelto, para recibir la cama de arena o la tubería. |

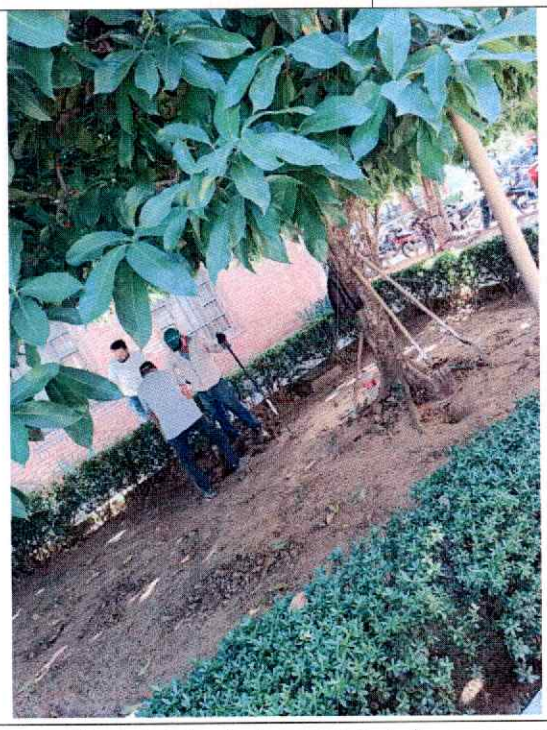

Fotografía 4. Inicio de la actividad de excavación manual

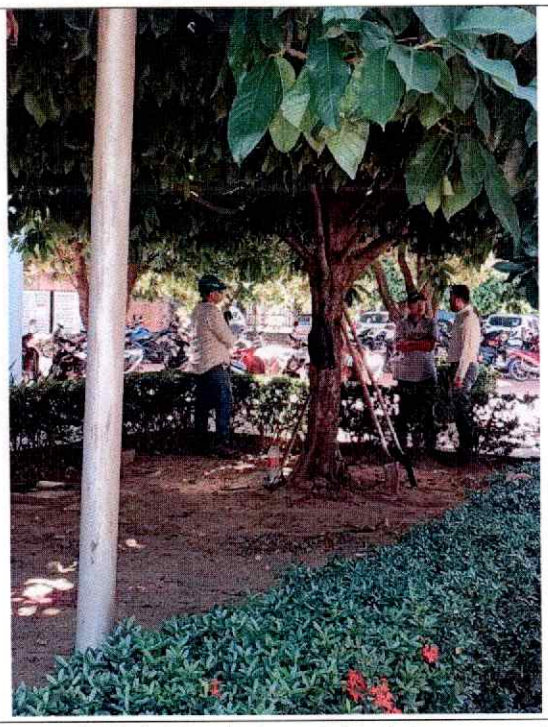


Fotografía 5. Inicio de la actividad de excavación manual

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía 6. Continuación de la actividad de excavación | Fotografía 7. Continuación de la actividad de excavación |

| ITEM | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 2.08 | Relleno en material seleccionado de la excavación compactado |
| **Avance de ejecución mensual %** | **36,06%** |
| Descripción de actividades: | ✓ La actividad consiste en la reintroducción y compactación controlada de material térreo previamente extraído de la zanja (material seleccionado de la excavación), para restituir la rasante original del terreno, una vez que la tubería ha sido instalada y verificada.<br><br>✓ La ejecución del relleno se divide en fases críticas para proteger la instalación y asegurar la compactación adecuada:<br>○ Previo al relleno estructural, se coloca y compacta una capa de material de soporte (cama), generalmente arena fina para asentar la tubería y protegerla de aristas vivas del suelo.<br>○ Cubrimiento inicial: Se aplica una segunda capa de material granular fino (arena) cubriendo la tubería hasta una altura mínima por encima de su clave (parte |


| | |
|---|---|
| | superior), esta capa se compacta cuidadosamente y de forma manual para no dañar la tubería ni desplazarla.<br>○ El resto del relleno se realiza con el material seleccionado de la excavación, que ha sido previamente clasificado.<br>○ El material se coloca en capas sucesivas y uniformes cuyo espesor suelto no exceda los 20 cm a 30 cm, según el tipo de equipo de compactación a utilizar.<br>○ La última capa de relleno se compacta hasta la rasante de diseño o el nivel de la superficie existente, considerando una posible sobre elevación, para compensar asentamientos ligeros residuales. |

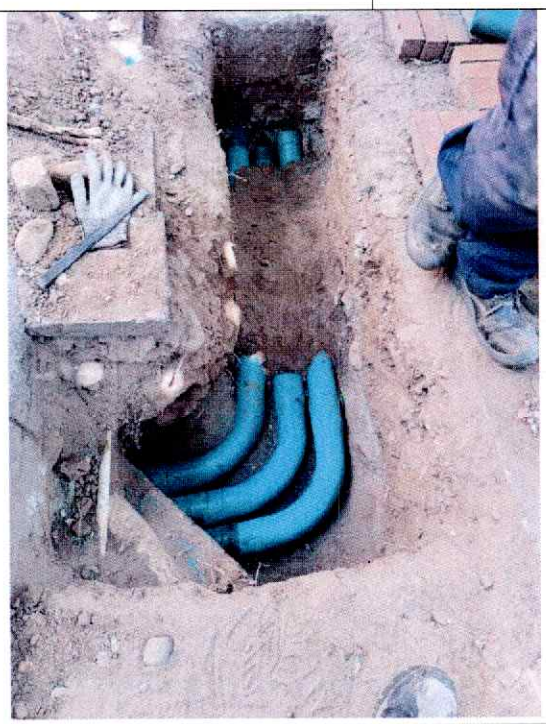

Fotografía 8. Inicio de la actividad de relleno



Fotografía 9. Inicio de la actividad de relleno
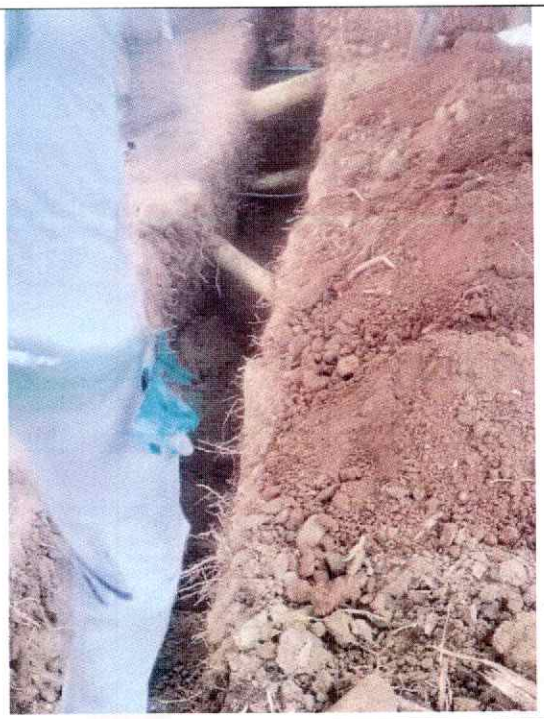
| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía 10. Continuación de la actividad de relleno | Fotografía 11. Continuación de la actividad de relleno |

| ITEM | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 2.09 | Canalización ducto Conduit PVC 3", zona blanda. No incluye excavación ni relleno |
| **Avance de ejecución mensual %** | **21,80%** |
| Descripción de actividades: | ✓ La actividad consiste en el suministro, colocación, alineación y unión de tramos de tubería Conduit de PVC rígido de 3 pulgadas de diámetro, dentro de la zanja previamente excavada y preparada.<br><br>✓ Esta actividad se ejecuta una vez que la zanja ha sido refinada y la cama de apoyo está lista:<br>o Se verifica que el fondo de la zanja esté a la cota de diseño, limpio, libre de agua y que la cama de apoyo (arena) haya sido colocada y nivelada correctamente, sin presentar elementos punzantes o piedras grandes.<br>o Los tramos de ducto PVC de 3" son inspeccionados visualmente para asegurar que estén libres de fisuras, deformaciones o daños en los extremos y superficies. |

| | |
|---|---|
| | ○ El manejo en obra debe ser cuidadoso para evitar el arrastre y el daño superficial de la tubería.<br>○ Los tramos de ducto se colocan de forma alineada y a nivel sobre la cama de apoyo.<br>○ La unión entre tramos se realiza mediante acoples y pegamento solvente específico para PVC (soldadura líquida).<br>○ El procedimiento de unión requiere la limpieza de las superficies a unir, la aplicación uniforme del pegamento y el ensamblaje inmediato para asegurar una unión rígida y hermética.<br>○ Se debe garantizar la pendiente mínima especificada, generalmente hacia las cámaras de inspección, para permitir el drenaje de cualquier condensación.<br>○ Los extremos de la tubería que terminan en cajas o cámaras, o los extremos abiertos, deben ser sellados temporalmente (tapones) para evitar la entrada de tierra, escombros, agua o fauna, lo cual afectaría la calidad del futuro cableado. |



Fotografía 12. Inicio de la actividad de instalación de tuberías de 3"



Fotografía 13. Inicio de la actividad de instalación de tuberías de 3"


| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía 14. Continuación de la actividad de instalación de tuberías de 3" | Fotografía 15. Continuación de la actividad de instalación de tuberías de 3" |

| **CAPITULO 3,0** | **CUARTO DE MAQUINAS Y SUBESTACION** |
|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** |
| 3.13 | Excavación manual en conglomerado con transporte |
| **Avance de ejecución mensual %** | **100,00%** |
| Descripción de actividades: | ✓ La actividad consiste en la remoción, extracción del material, el cual requiere el uso exclusivo de herramienta manual debido a su alta dureza o las restricciones de espacio inherentes a la ampliación de una estructura existente.<br><br>✓ La ejecución se lleva a cabo bajo condiciones de trabajo en una zona con infraestructura crítica (subestación), lo que requiere especial atención a la seguridad y la protección de los equipos existentes.<br>o Delimitación y señalización: Se demarca el área exacta de la excavación (cimentación) y se acordonan los frentes de trabajo, manteniendo las distancias de seguridad respecto a equipos eléctricos energizados.<br>o El material se disgrega en bloques manejables o trozos pequeños utilizando la herramienta manual de alto |

| | |
|---|---|
| | impacto, progresando verticalmente hasta alcanzar la cota de desplante.<br>○ El material excavado se deposita provisionalmente en la zona de acopio temporal, a una distancia que no interfiera con las maniobras ni comprometa la estabilidad de la excavación o la estructura existente.<br>○ Se realiza el refinado final de las paredes y el fondo de la excavación, el fondo debe quedar limpio y nivelado horizontalmente (o según la pendiente estructural), antes de la aprobación de la Interventoría para el vaciado del solado o la fundación. |



Fotografía 16. Inicio de la actividad de preparación para el inicio de la excavación

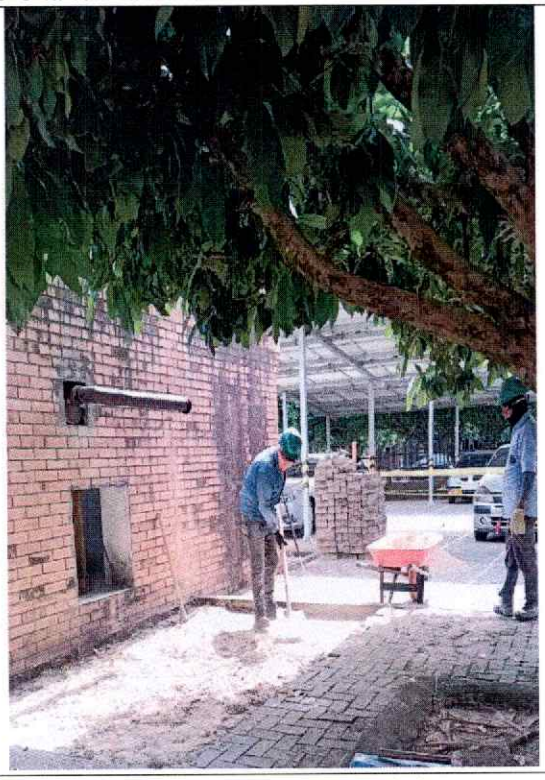

Fotografía 17. Inicio de la actividad de excavación manual

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía 18. Continuación de la actividad de excavación | Fotografía 19. Continuación de la actividad de excavación |

| ITEM | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 3.15 | Acero de Refuerzo Grado 60 |
| **Avance de ejecución mensual %** | **89,25%** |
| Descripción de actividades: | ✓ La actividad consiste en el suministro (corte y doblado) e instalación del acero de refuerzo que conformará el armazón estructural de los elementos de concreto (vigas de cimentación) de la ampliación.<br><br>✓ La instalación del acero requiere precisión en las dimensiones y amarres para asegurar el comportamiento estructural diseñado:<br>o Se verifica que el acero recibido en obra cumpla con el Grado 60 y con las especificaciones de diámetro, longitud y corrugación, se exige el certificado de calidad del fabricante.<br>o El material debe estar limpio, libre de lodo, aceites, pinturas, escamas de óxido sueltas o cualquier agente que pueda comprometer la adherencia con el concreto.<br>o El acero se coloca en el interior de la excavación (sobre el solado de limpieza o la parrilla inferior). |



| | |
|---|---|
| | ○ Las barras principales y los estribos (o flejes) se colocan respetando las separaciones, recubrimientos y traslapos especificados en los planos estructurales.<br>○ Recubrimiento: Se asegura la distancia mínima entre la barra más exterior y la formaleta, utilizando separadores de mortero.<br>○ Traslapos: Los traslapos se ejecutan en las longitudes y ubicaciones estipuladas por el diseño para asegurar la continuidad de la fuerza.<br>○ Todas las intersecciones del acero de refuerzo se fijan con alambre recocido para asegurar que la parrilla mantenga su geometría y no se mueva durante el vaciado del concreto, los amarres deben ser firmes, pero no deben dañar el acero.<br>○ Antes de la fundición del concreto, la Interventoría realiza una inspección final para verificar el diámetro correcto de las barras, las dimensiones de la parrilla, la longitud de los traslapos, la cantidad de estribos y el cumplimiento del recubrimiento. |



Fotografía 20. Inicio de la actividad de preparación para el inicio del amarre de acero estructural



Fotografía 21. Inicio de la actividad de instalación de acero estructural
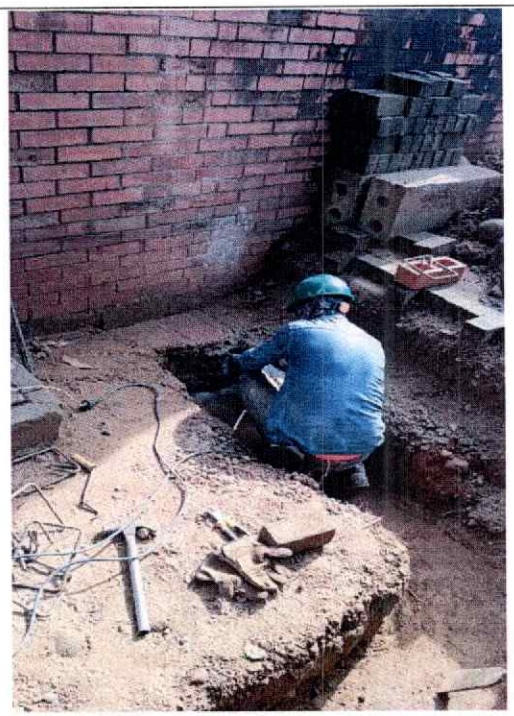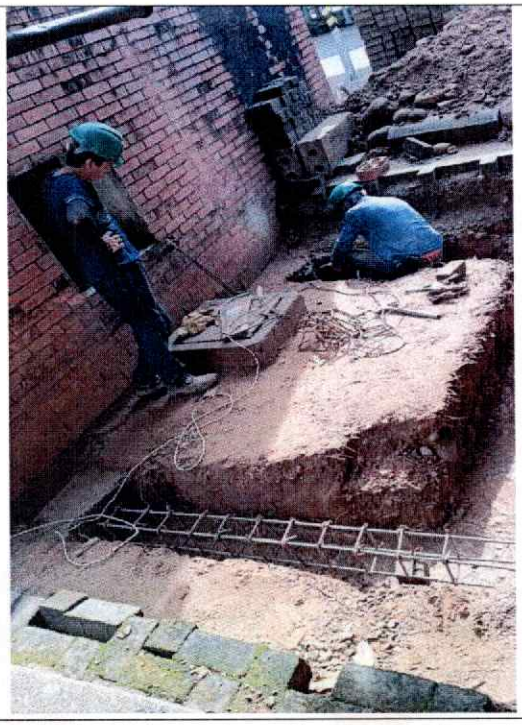
| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía 22. Continuación de la actividad instalación de acero estructural | Fotografía 23. Continuación de la actividad de instalación de acero estructural |

## 7.2 CONCLUSIONES

- ✓ Los materiales utilizados para el desarrollo de la obra, cumplieron con las especificaciones técnicas y con los requerimientos requeridos para el adecuado desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".
- ✓ El presente informe se realizó en el periodo comprendido entre el 19 al 30 de noviembre de 2025, en cumplimiento el avance de obra presenta un 0.68% para el contrato "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".
- ✓ Se da cumplimiento al pago de seguridad social, prestaciones y parafiscales para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".
- ✓ Se dio cumplimiento a las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que fueron aplicables durante la ejecución del contrato.

Como complemento a lo reportado en noviembre y en atención al desarrollo actual de las obras, se concluye:

- ✓ Validación de espacios: Basado en el detalle constructivo en planta entregado, la interventoría reconoce la necesidad de ampliar el cuarto de la planta eléctrica para asegurar las distancias de seguridad RETIE.
- ✓ Continuidad operativa: El aval dado a la modificación dimensional permite al contratista proceder con las actividades constructivas de la subestación sin detener el cronograma, sujeto al balance de cantidades solicitado.
- ✓ Compromiso de balance: El contratista entregará el cuadro de mayores y menores cantidades para ajustar el presupuesto a la realidad técnica encontrada, manteniendo el equilibrio económico del contrato.
- ✓ Se deja constancia de que, a pesar de los inconvenientes técnicos detectados, la disposición de ambas partes (obra e interventoría), ha permitido encontrar una solución que prioriza la normativa técnica y la seguridad de la infraestructura del Centro Administrativo de Aguazul.


## 7.3 INCONVENIENTES

- ✓ Una vez formalizada el acta de inicio del proyecto (19-nov-2025), se solicitó a la interventoría del proyecto la coordinación necesaria para la intervención de la subestación eléctrica y la autorización de corte en la plazoleta central, mediante el Oficio No. OFC004_CS_2025.
- ✓ En respuesta a la solicitud mencionada, el día 21 de noviembre de 2025 se realizó la inspección visual de las instalaciones y áreas a intervenir, con el apoyo de personal de la Secretaría de Infraestructura, el acta correspondiente a esta inspección se firmó el día 25 de noviembre de 2025.
- ✓ A partir de la formalización de la inspección, se iniciaron las actividades constructivas el día 26 de noviembre de 2025.
- ✓ Se identifica una discrepancia entre el espacio proyectado en los diseños originales para el cuarto de la planta eléctrica y las dimensiones reales requeridas por los equipos disponibles en el mercado nacional que cumplen con la normativa vigente, este inconveniente, detectado durante el replanteo, imposibilitaría el cumplimiento de las distancias de seguridad del **RETIE** si se continuara con la medida inicial.
- ✓ El ajuste necesario para corregir estos inconvenientes implica una variación en las cantidades de obra inicialmente previstas (mampostería, pañetes, placa y cubierta), lo cual requiere una gestión administrativa inmediata para evitar suspensiones en el flujo de actividades de este frente.

## 7.4 AVANCE DE OBRA EJECUTADA

Con ocasión a la ejecución de obra del periodo comprendido entre el 19 al 30 de noviembre del 2025, se muestra a continuación, el porcentaje de avance mensual versus el porcentaje presupuestal del proyecto, mediante la ejecución de actividades contractuales de la obra ejecutada, presentando un avance acumulado de 0.68%, con esto se realiza el control, verificación y seguimiento al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

| PERIODO | | PERIODO No. | EJECUTADO PERIODO | EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | | | |
| 19/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | 0.68% | 0.68% |

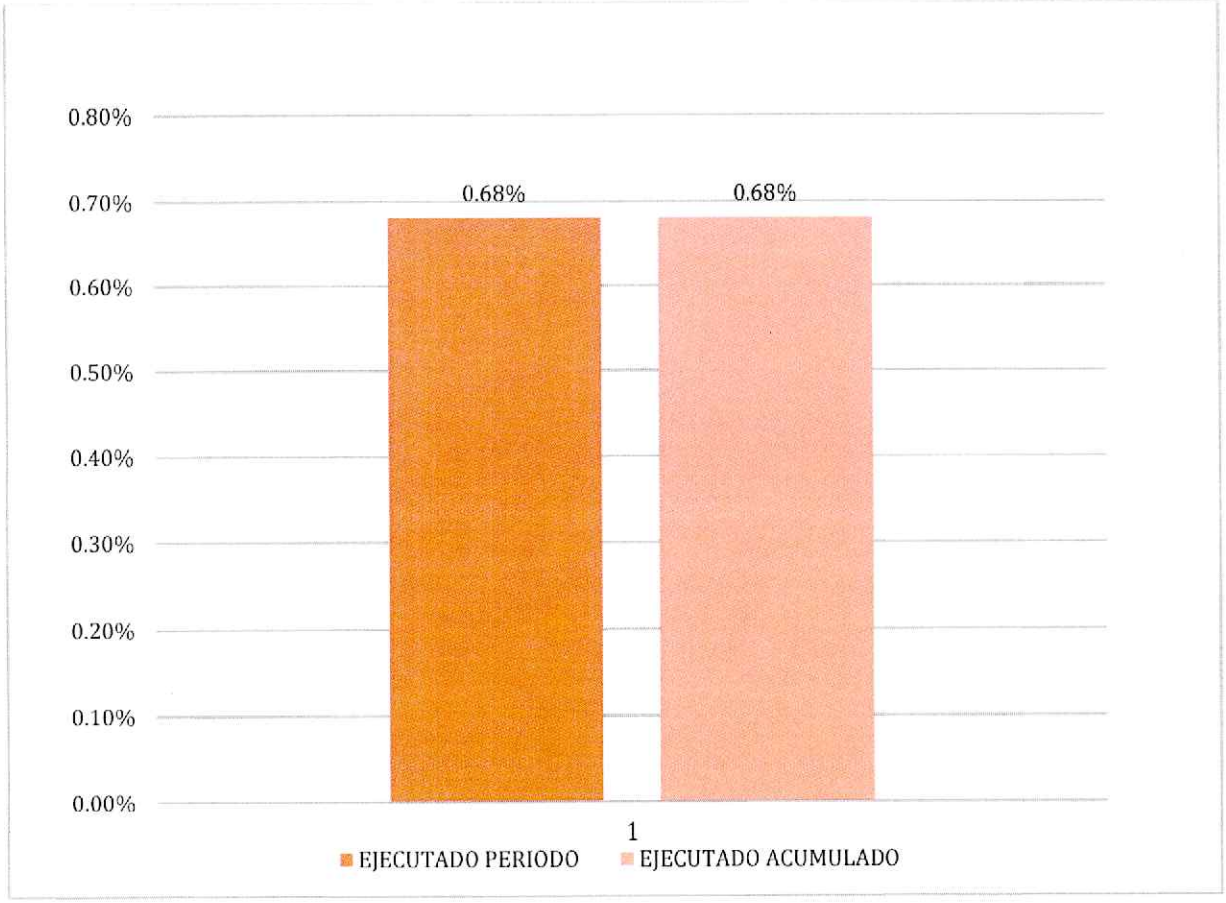

## 7.5 AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO

En el presente grafico se presenta los porcentajes de obra ejecutadas versus los programados en los periodos comprendidos entre el 19 al 30 de noviembre de 2025, se muestra a continuación, esto con relación al valor total del contrato. "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

| PERIODO | | PERIODO No. | PROGRAMADO | EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | | | |
| 19/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | 0.21% | 0.68% |



## 7.6 CLIMA

| NOVIEMBRE DE 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| NOVIEMBRE DE 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SOLEADO | SOLEADO | SOLEADO | SOLEADO | DESCANSO |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SOLEADO | SOLEADO | SOLEADO | SOLEADO | DESCANSO |

**NOTA:** No se presentaron mayores inconvenientes en temas climáticos.

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CUARTO DE MAQUINAS Y SUBESTACION | | | | $ 34,064,874.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 3.01 | Muro en ladrillo portante presnado PV Celda Circular (29*12*9) | m2 | 31.48 | $ 180,410.00 | $ 5,679,307.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 3.02 | Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones | m2 | 16.39 | $ 49,714.00 | $ 814,812.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 3.03 | Dovela sencilla en concreto 0.09*0.09 m con anclaje en varilla 1/2" con epoxico para muro estructural | m | 45.48 | $ 50,921.00 | $ 2,315,887.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 3.04 | Varilla grafil 4mm | m | 33.62 | $ 2,379.00 | $ 79,982.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 3.05 | Viga aerea de 0.12 x 0.20 en concreto de 3000 psi | m | 12.76 | $ 106,017.00 | $ 1,352,777.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 3.06 | Estructura metalica en acero astm - A500 c (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje) | Kg | 103.42 | 30,268.00 | $ 3,130,317.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 3.07 | Puerta en rejila tipo persiana con marco lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo y acabado en esmalte, Suministro e Instal. | m2 | 12.10 | $ 818,995.00 | $ 9,909,840.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 3.08 | Cielo raso dry-wall plano pintado e=1/2" | m2 | 3.75 | $ 172,729.00 | $ 647,734.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 3.09 | Estuco y vinilo 3 manos. suministro e instal. | m2 | 37.80 | $ 62,588.00 | $ 2,365,826.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 3.10 | Placa base en concreto 3000 psi e=0.10m | m2 | 4.62 | $ 127,383.00 | $ 588,509.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 3.11 | Malla Electrosoldada Q-5 o M188 | m2 | 4.62 | $ 34,174.00 | $ 157,884.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 3.12 | Teja ajover max trapezoidal color A360 foil+acero | m2 | 11.85 | $ 113,255.00 | $ 1,342,072.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 3.13 | Excavacion manual en conglomerado con transporte | m3 | 3.30 | $ 174,495.00 | $ 575,834.00 | 3.30 | 575,833.50 | 100.00% | 3.30 | 575,833.50 | 100.00% |
| 3.14 | Relleno con material crudo de rio T.m 4", compactado y transportado | m3 | 1.04 | $ 140,949.00 | $ 146,587.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 3.15 | Acero de Refuerzo Grado 60 | kg | 77.00 | $ 10,548.00 | $ 812,196.00 | 68.72 | 724,858.56 | 89.25% | 68.72 | 724,858.56 | 89.25% |
| 3.16 | Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3500 psi | m3 | 0.39 | $ 1,482,353.00 | $ 578,118.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 3.17 | Imper mur impermeabilizante muros con humedad (2 capas) | m2 | 46.98 | $ 56,821.00 | $ 2,669,451.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 3.18 | Limpieza y lavado de mamposteria a la vista con acido muriatico | m2 | 46.98 | $ 19,109.00 | $ 897,741.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 4 | PLANTA | | | | $ 221,469,333.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 4.01 | Suministro de Planta electrica de emergencia entre los marguenes de 200 kva a 260 kva efectivos, según diseño, incluye transporte al punto | und | 1.00 | $ 221,469,333.00 | $ 221,469,333.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | | | $ 773,905,795.00 | | 5,355,666.06 | 0.69% | | 5,355,666.06 | 0.69% |
| | | VALOR RETIE | | | $ 12,253,999.00 | | - | 0.00% | | - | 0.00% |
| | | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | | | $ 786,159,794.00 | | 5,355,666.06 | 0.68% | | 5,355,666.06 | 0.68% |

## 7.7 ANEXO.I AVANCE DE OBRA EJECUTADA

| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE | | | | | noviembre, 2025 | | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO | CANT. EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO |
| 1 | TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE | | | | $ 97,253,693.00 | | | | | | |
| 1.01 | Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno | m2 | 20.00 | $ 15,396.00 | $ 307,920.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 1.02 | Excavacion Mecanica con retiro y disposicion final maximo a 10 km | m3 | 85.50 | $ 50,693.00 | $ 4,334,252.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 1.03 | Excavacion manual en conglomerado | m3 | 2.09 | $ 113,203.00 | $ 236,594.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 1.04 | Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada | m3 | 9.00 | $ 148,534.00 | $ 1,336,806.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 1.05 | Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi | m3 | 1.50 | $ 942,159.00 | $ 1,413,239.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 1.06 | Acero de Refuerzo Grado 60 | kg | 2,091.20 | $ 10,548.00 | $ 22,057,978.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 1.07 | Placa o losa de fondo en concreto 4000 Psi impermeabilizado, resistencia 280 kg/cm2 | m3 | 6.00 | $ 1,561,609.00 | $ 9,369,654.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 1.08 | Muro en concreto 4000 psi impermeabilizado, resistencia 280 kg/cm² | m3 | 7.50 | $ 2,289,466.00 | $ 17,170,995.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 1.09 | Losa o placa en concreto de 4000 psi impermeabilizado para tapa en tanque semi o enterrados | m3 | 3.02 | $ 3,098,798.00 | $ 9,358,370.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 1.10 | Dilatacion en Cinta PVC-022 | m | 15.00 | $ 118,901.00 | $ 1,783,515.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 1.11 | Impermeabilizacion epoxica de muros y placas. | m2 | 52.00 | $ 425,328.00 | $ 22,117,056.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 1.12 | Relleno con material crudo de rio T.m 3", compactado y transportado | m3 | 34.68 | $ 141,392.00 | $ 4,903,475.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 1.13 | Respiradero tanque de almacenamiento tuberia H.G. 3" L=0.50 m | und | 2.00 | $ 190,930.00 | $ 381,860.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 1.14 | Tapa en lamina alfajor 1/4" (0.80 x 0.80 m) con marco | Und | 1.00 | $ 1,194,675.00 | $ 1,194,675.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 1.15 | Flotador de bronce de 1" suministro e instalacion | Und | 1.00 | $ 339,622.00 | $ 339,622.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 1.16 | Flotador electrico para tanque suministro e instalacion | Und | 2.00 | $ 242,986.00 | $ 485,972.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 1.17 | Escalera gato en angulo 2" x 1/8". Suministro e Instal. | m | 2.00 | $ 230,855.00 | $ 461,710.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 2 | RED DISTRIBUCION SUBTERRANEA ACOMETIDA BT | | | | $ 421,117,895.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 2.01 | Breaker 3x200a, para la conexión tablero existente TDGE | Und | 1.00 | $ 2,388,736.00 | $ 2,388,736.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 2.02 | Breaker 3x250a, para la conexión tablero existente TDGN | Und | 1.00 | $ 2,394,001.00 | $ 2,394,001.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 2.03 | Red Baja Tensión subterránea trifásica cable 3F#4/0+1N#4/0+1T#2/0Cu | m | 110.00 | $ 929,077.00 | $ 102,198,470.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 2.04 | Red Baja Tensión subterránea trifásica cable 3F#250KCMIL+1N#250KCMIL+1T#4/0Cu | m | 117.00 | $ 1,354,870.00 | $ 158,519,790.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 2.05 | Red Baja Tensión subterránea trifásica cable 3(3F#250KCMIL+1N#250KCMIL)+1T#250KCMIL Cu Planta - Transferencia | m | 18.00 | $ 3,682,756.00 | $ 66,289,608.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 2.06 | Caja de inspeccion CS-274 | Und | 3.00 | $ 1,354,386.00 | $ 4,063,158.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 2.07 | Excavacion manual en conglomerado | m3 | 31.20 | $ 113,203.00 | $ 3,531,934.00 | 10.50 | 1,188,631.50 | 33.65% | 10.50 | 1,188,631.50 | 33.65% |
| 2.08 | Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado | m3 | 20.80 | $ 54,117.00 | $ 1,125,634.00 | 7.50 | 405,877.50 | 36.06% | 7.50 | 405,877.50 | 36.06% |
| 2.09 | canalizacion ducto conduit PVC 3", zona blanda. No incluye excavación ni relleno | m | 289.00 | $ 39,055.00 | $ 11,286,895.00 | 63.00 | 2460,465.00 | 21.80% | 63.00 | 2.460.465.00 | 21.80% |
| 2.10 | Instalación, montaje y puesta en marcha a cero (0) metros de Planta eléctrica de emergencia de 200 kVA a 250KVA, incluye accesorios de escape, salidas de aire caliente, aislamientos, arranque, puesta en marcha y capacitación de uso de planta eléctrica. | Und | 1.00 | $ 34,315,532.00 | $ 34,315,532.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 2.11 | Transferencia automatica de 230kVA, con interruptor Magnetico de 3x700 A. | Und | 1.00 | $ 35,004,137.00 | $ 35,004,137.00 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |

## 7.8 ANEXO.I BITACORA DE OBRA

(6 Folios)

Contrato de obra No. 0806 de 15 de Septiembre de 2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

R/L DE OBRA
Deyder Coronado Vargas

Contrato de interventoria No. 0798 de 2025-09-12

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINITRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

R/L DE INTERVENTORIA
Yamid Fernando Lasmos R.

3

26 DE NOVIEMBRE 2025

personal de obra.
- Director de obra
- Residente de obra
- Tecnico Electricista
- Oficial de obra

Equipo y herramienta
- Herramienta menor (palas, picas, barras, entre otras)
- Pulidora
- Mezcladora

Descripción de actividades
- Se realiza delimitación del area de trabajo, se localiza el área de ampliación del cuarto de la Subestación y se procede a realizar el inicio de la excavación, retirando el adoquín y comenzando el proceso de excavación manual con el uso de herramienta menor.

Estado de tiempo: Soleado.
Observaciones: NO Presenta

Deyder Cocunubo Vargas.
obra

Yamid Tarmés Rodriguez
Interventoria

4

27 DE NOVIEMBRE 2025

Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- Tecnico Electricista
- Oficial de obra

Equipo y herramienta
- Herramienta Menor (palas, picas, bairas, entre otros)
- Pulidora
- Mezcladora

Descripción de Actividades
- Se continua el proceso de excavación manual con el uso de herramienta Menor, con el Fin de encontrar el nivel de cimentacion de la estructura existente, se hace empalme con los niveles encontrados y se realiza replanteo para la Ubicación de Viga de cimentacion, con el Fin de empalmar nivel de acabado de placa nueva con nivel de placa existente, se realiza excavación de viga y se funde Solado para iniciar con armado de acero.
- se realiza localización de trazado de banco ducto nuevo, se delimitan areas de trabajo y se inicia proceso de excavación llegando a niveles necesarios para la instalación de la tubería.

Estado del tiempo: soleado
Observaciones: No presentó

Deyder [illegible] Vargas
Obra

Yamer Asprilla Rodriguez
Interventoría

28 DE NOVIEMBRE 2025

Personal
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Tecnico electricista
- Oficial de Obra

Equipo y herramienta
- Herramienta menor (palas, picas, barras, entre otros)
- Pulidora
- Mezcladora.

Descripción de Actividades
- Se termina de realizar la excavación necesaria, para la instalación del primer tramo de banco ducto, se instala arena de Solado, se instala tubería de 3" para conformación de banco ductal según requerimientos en planos, posteriormente se termina de cubrir la tubería con arena y se termina de llenar con material sobrante del proceso de excavación.

6

• Se continúa con el anclaje de acero de refuerzo en columnas de cimentación existentes mediante perforación de 1/8" mayor del diámetro de la varilla de refuerzo y se realiza anclaje mediante epóxico SIKA ANCHOR- FIX, y se empieza con el armare de la parrilla de la viga de cimentación.

Estado del tiempo: soleado
Observaciones: No presenta

Deyder Coronado Vargas
Obra

Yamid Jesmel Rodriguez
Interventoría

29 DE NOVIEMBRE 2025

Personal:
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Tecnico electricista
- Oficial de Obra

Equipos y herramienta
- Herramienta Menor (palas, picas, barras, entre otros)
- Pulidora
- Mezcladora

Descripción de Actividades
- Se continua con el armado de la parrilla de la viga de cimentación, una vez terminada se continua con formaleteo de la viga, para recibir concreto de el respectivo sendero eléctrico y se deja lista para realizar fundida del respectivo elemento estructural.
- Se continua con el proceso de excavación para el siguiente tramo de banco ductos de baja tensión.

Estado del Tiempo: Soleado
Observaciones: No presenta

Deyder Coronado Vargas
OBRA

Yamid Lesmes Rodriguez
INTERVENTORIA

01 DE DICIEMBRE DE 2025

Personal
- Director de obra
- Residente de Obra
- Tecnico electricista
- Oficial de Obra
- Ayudante.

# 8 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

## 8.1 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DE INVERSIÓN No.1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA MA-LP-SI-006-2025 CON NUMERO INTERNO 0806 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

En el presente informe de inversión y buen manejo de anticipo se referencia la trazabilidad de los recursos pactados en calidad de anticipo No.1 al CONSORCIO SUBESTACIÓN en el marco de ejecución Contrato No. MA-LP-SI-006-2025 con Numero interno 0806 de fecha 15 de septiembre de 2025, de conformidad a:

- Anticipo No.1 del Contrato de Obra Pública No. 0806 de fecha 15 de septiembre de 2025, que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.", por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ML/CTE ($786.159.793,00). El contrato fiduciario a la fecha del presente informe no se encuentra liquidado.

## 8.2 APERTURA DE LA FIDUCIA ANTICIPO No.1

El día 29 de septiembre de 2025, se celebró entre FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. y el CONSORCIO SUBESTACIÓN, el contrato de fiducia Mercantil irrevocable para la administración y pago para el manejo de anticipos, de igual manera se apertura la cuenta de Ahorros No. 60600006200 – P.A. ANT. CONSORCIO SUBESTACIÓN, para el desembolso del 50% del anticipo del Contrato de Obra Pública No. 0806 de fecha 15 de septiembre de 2025. APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

## 8.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.1

Se encuentra en proceso de aprobación por parte de la entidad contratante. El Plan de Inversión del Anticipo, presentado por el Consorcio Subestación, se detalla a continuación:

**Tabla 1** - Plan de Inversión del Anticipo No.1 del Contrato

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| 1 | Pago de salarios, jornales y seguridad social | $ 19.653.994,82 | 5% |
| 2 | Compra de Materiales | $ 157.231.958,60 | 40% |
| 3 | Alquileres de equipos y/o Compra de Equipos | $ 176.885.953,43 | 45% |
| 4 | Transporte de materiales y equipos | $ 39.307.989,65 | 10% |
| TOTAL | | $ 393.079.896,50 | 100,00% |

Ver Anexo. Medio Físico. Acta Plan de inversión del anticipo.

## 8.4 ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO No.1

Se encuentra en proceso de aprobación por parte de la entidad contratante.

## 8.5 DESEMBOLSO ANTICIPO No.1

No presenta desembolso para el presente mes.

## 8.6 SOPORTES DESEMBOLSOS DE FIDUCIA ANTICIPO No.1

N/A

## 8.7 BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO.

A continuación, se relaciona el Balance financiero del proyecto que se encuentra en ejecución:

**Tabla 2** - Balance Financiero

| CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **VR CONTRATADO** | **VR ACTAS** | **VR GIROS Y/O PAGOS** |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 786.159.793,00 | | |
| VALOR ANTICIPO 50% | | | |
| VALOR ADICIONAL | | | |
| VALOR ANTICIPO ADICIONAL | | | |
| VALOR EJECUTADO (PARCIA) 1 | | | |
| ANTICIPO AMORT ACTA PARCIAL1 | | | |
| VALOR EJECUTADO (PARCIA) 2 | | | |
| ANTICIPO AMORT ACTA PARCIAL2 | | | |
| VALOR EJECUTADO (PARCIA) 3 | | | |

| CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **VR CONTRATADO** | **VR ACTAS** | **VR GIROS Y/O PAGOS** |
| ANTICIPO AMORT ACTA PARCIAL3 | | | |
| VALOR GIRADO (PARCIALES) | | | |
| VALOR POR FACTURAR | | $ 786.159.793,00 | |
| VALOR PENDIENTE DE AMORTIZAR | | | |
| **SUMAS IGUALES** | $ 786.159.793,00 | $ 786.159.793,00 | $ **786.159.793,00** |

**Tabla 3 -** Amortización del Anticipo

| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor total anticipos | Valor amortización anticipo actas anteriores | Valor amortización anticipo presente acta | Valor amortización anticipo consolidada | Valor pendiente de amortizar |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |

**Tabla 4 -** Estado Financiero del Contrato

| INFORME ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Total del Contrato | Valor Ejecutado | Valor Por Ejecutar | Valor a Pagar en el Presente |
| $ 786.159.793,00 | $ - | $ 786.159.793,00 | $ - |

# ANEXOS INFORME FINANCIERO Y CONTABLE NOVIEMBRE 2025

8.7.1 Anexo 1. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2025

**(4 folios)**

*CONSORCIO SUBESTACIÓN*
*NIT: 901.987.309-4*
*consorciosubestacion26@gmail.com*

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

## EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL

## CERTIFICAN

**DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.607.835 expedida en Tunja, en mi condición de Representante legal y **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificada con cedula de ciudadanía No. 23.434.187 de Ciénega Boyacá con tarjeta profesional No. 165.295-T inscrita a la Junta Central de Contadores de Colombia en condición de contadora pública del **CONSORCIO SUBESTACIÓN** identificado con NIT 901.987.309-4 luego de examinar la contabilidad y de más documentación del Consorcio, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, basado en pruebas selectivas de las evidencias que soportan hechos y revelaciones, ha realizado el pago de los siguientes aportes: salud, pensión, riesgos laborales, ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar, según se indica en las planillas soporte, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por las mismas durante el periodo comprendido entre el 19 de noviembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2025, en relación con el personal requerido para el desarrollo del Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
consorciosubestacion26@gmail.com

**GÉMINIS CG**
Ingeniería y soluciones integrales

| PERIODO | PLANILLA N° | IBC PENSIÓN | PENSIÓN | | IBC SALUD | SALUD | | CCF | RIESGOS | | PARAFISCALES | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | COMFACASANARE | POSITIVA | | ICBF | SENA | |
| | | | VR PAGADO | AFP | | VR PAGADO | EPS | VR PAGADO | IBC | VR PAGADO | VR PAGADO | VR PAGADO | |
| NOVIEMBRE 2025<br>DICIEMBRE 2025 | 9496339448 | $ 1.423.500 | $ 227.900 | COLPENSIONES<br>PORVENIR | $ 1.423.500 | $ 178.100 | NUEVA EPS<br>SANITAS | $ 57.000 | $ 1.423.500 | $ 99.300 | $ 42.800 | $ 28.500 | $ 633.600 |
| NOVIEMBRE 2025 | 9496339223 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.277.600 | $ 158.600 | $ - | $ - | $ 158.600 |
| TOTAL | | $ 1.423.500 | $ 227.900 | | $ 1.423.500 | $ 178.100 | | $ 57.000 | $ 3.701.100 | $ 257.900 | $ 42.800 | $ 28.500 | $ 792.200 |

Lo anterior se certifica, en Aguazul a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

**DEYDER COCUNUBO VÀRGAS**
**C.C. No. 1.049.607.835 DE TUNJA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA**
**C.C. No. 23.434.187 DE CIÉNEGA**
**T.P. No. 165295-T**
**CONTADOR PÚBLICO**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 7 C 4 6 F 6 C C A 9 C B B C 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23434187 de CIENEGA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 165295-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



165295-T

JENNY MARIBEL
ESPINOSA CEPEDA
C.C. 23434187
RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD U. P. T. C.

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 176893

FIRMA DEL TITULAR 92183

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

8.7.2 Anexo 2. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2025

**(7 folios)**

en línea

## Planilla Resumen

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901987309 | 4 | CONSORCIO SUBESTACION | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO SUBESTACION | CARRERA 16 # 36 - 41 | AGUAZUL-CASANARE | 3174320227 | No |

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 9496339448 | 9496339448 | E | 2025/12/03 | 2025/12/12 | BANCO DE BOGOTA | 9 | $637,600 |

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 80429681 | CERON PRECIADO ANGELMIRO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 4 | $189,800 | $30,400 | EPS037 | 4 | $189,800 | $23,800 | CCF69 | 4 | $189,800 | $7,600 | 14-23 | 4 | $189,800 | $13,300 | 4 | $189,800 | $9,500 | No | $84,600 |
| 2 | CC | 74753260 | LOZANO AMEZQUITA DIVAGNER | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 24 | $1,138,800 | $182,300 | EPS005 | 24 | $1,138,800 | $142,400 | CCF69 | 24 | $1,138,800 | $45,600 | 14-23 | 24 | $1,138,800 | $79,300 | 24 | $1,138,800 | $57,000 | No | $506,600 |
| 3 | CC | 1116549559 | MENDOZA GARCIA WILLIAM | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2 | $94,900 | $15,200 | EPS005 | 2 | $94,900 | $11,900 | CCF69 | 2 | $94,900 | $3,800 | 14-23 | 2 | $94,900 | $6,700 | 2 | $94,900 | $4,800 | No | $42,400 |
| **Total** | **Afiliados( 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,900 | | | $1,423,500 | $178,100 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $99,300 | | $1,423,500 | $71,300 | | $633,600 |

en línea

Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901987309 | 4 | CONSORCIO SUBESTACION | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO SUBESTACION | CARRERA 16 # 36 - 41 | AGUAZUL-CASANARE | 3174320227 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 9496339448 | 9496339448 | E | 2025/12/03 | 2025/12/12 | BANCO DE BOGOTA | 9 | $637,600 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $227,900 | $1,400 | $0 | $229,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $182,300 | $1,100 | $0 | $183,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $45,600 | $300 | $0 | $45,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $99,300 | $600 | $0 | $99,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 3 | $99,300 | $600 | $0 | $99,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $57,000 | $400 | $0 | $57,400 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 3 | $57,000 | $400 | $0 | $57,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $178,100 | $1,100 | $0 | $179,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $23,800 | $200 | $0 | $24,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $154,300 | $900 | $0 | $155,200 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $42,800 | $300 | $0 | $43,100 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 3 | $42,800 | $300 | $0 | $43,100 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $28,500 | $200 | $0 | $28,700 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 3 | $28,500 | $200 | $0 | $28,700 |
| **TOTAL** | | | | **3** | **$633,600** | **$4,000** | **$0** | **$637,600** |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901987309 | 4 | CONSORCIO SUBESTACION | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO SUBESTACION | CARRERA 16 # 36 - 41 | AGUAZUL-CASANARE | 3174320227 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-11 | 9496339223 | 9496339223 | Y | 2025/12/03 | 2025/12/12 | BANCO DE BOGOTA | 9 | $159,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1049607835 | COCUNUBO VARGAS DEYDER EUFRANIO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 24 | $1,138,800 | $79,300 | 0 | $0 | $0 | No | $79,300 |
| 2 | CC | 1116548487 | GUTIERREZ PINTO JENCY SIDNEY | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 24 | $1,138,800 | $79,300 | 0 | $0 | $0 | No | $79,300 |
| **Total** | **Afiliados( 2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $2,277,600 | $158,600 | | $0 | $0 | | $158,600 |

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901987309 | 4 | CONSORCIO SUBESTACION | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO SUBESTACION | CARRERA 16 # 36 - 41 | AGUAZUL-CASANARE | 3174320227 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-11 | 9496339223 | 9496339223 | Y | 2025/12/03 | 2025/12/12 | BANCO DE BOGOTA | 9 | $159,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $158,600 | $900 | $0 | $159,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 2 | $158,600 | $900 | $0 | $159,500 |
| **TOTAL** | | | | **2** | **$158,600** | **$900** | **$0** | **$159,500** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1049607835 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TUNJA | DEPARTAMENTO: | BOYACA |
| DIRECCIÓN: | CENTRO | TELÉFONO: | 7444444 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7995222021 | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | noviembre | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | noviembre | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | | 1 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/12/10 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1995192087 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 400.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 0 | $ 400.000 | $ 300 | $ 400.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 400.000** | **$ 300** | **$ 400.300** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR AORES | COTIZACIÓN | VALOR AORES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005 SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 312.500 | $ 0 | $ 200 | $ 0 | $ 312.500 | $ 200 | $ 0 | $ 312.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 312.500** | **$ 200** | **$ 0** | **$ 312.700** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 13.100 | $ 13.100 | $ 100 | $ 0 | $ 13.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 13.100** | **$ 100** | **$ 0** | **$ 13.200** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF10 | CCF10 COMFABOY | 1 | $ 15.400 | $ 100 | $ 15.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 15.400** | **$ 100** | **$ 15.100** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1116548487 | | GUTIERREZ PINTO JENCY SIDNEY | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 33 SUR No 43-36 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4633204 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-11 | 2087674579 | 9497978819 | I | 2025/12/19 | 2026/01/16 | BANCOLOMBIA | 28 | $436,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | irg | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $781,242 | $15,700 | | | $1,423,500 | | $7,500 | | $0 | $0 | | $429,000 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $781,242 | $15,700 | | | $1,423,500 | | $7,500 | | $0 | $0 | | $429,000 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $781,242 | $15,700 | | | $1,423,500 | | $7,500 | | $0 | $0 | | $429,000 |
| 1 | CC | 1116548487 | GUTIERREZ JENCY | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF24 | 30 | $781,242 | $15,700 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | 0.522% | $7,500 | 30 | $0 | $0 | No | $429,000 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $781,242 | $15,700 | | | $1,423,500 | | $7,500 | | $0 | $0 | | $429,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $4,000 | $0 | $231,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $227,800 | $4,000 | $0 | $231,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,500 | $200 | $0 | $7,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $7,500 | $200 | $0 | $7,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $15,700 | $300 | $0 | $16,000 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $15,700 | $300 | $0 | $16,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $3,100 | $0 | $181,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $178,000 | $3,100 | $0 | $181,100 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$429,000** | **$7,600** | **$0** | **$436,600** |

8.7.3 Anexo 3. NÓMINA NOVIEMBRE 2025

**(1 folios)**

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**
**consorciosubestacion26@gmail.com**

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**

**NIT. 901.987.309-4**

GÉMINIS CG
ingeniería y soluciones integrales

## NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2025

| No. | NOMBRE | CEDULA | CARGO | SALARIO BASICO | DIAS TRABAJADOS | DEVENGADO PLANILLA | DESCUENTOS SALUD PENSION RIESGOS | | | | | | | PARAFISCALES 9% | | | | TOTAL A PAGAR | TOTAL PLANILLA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SALUD 4% | SALUD PATRON 8.5% | TOTAL SALUD | PENSION 4% | PENSION PATRONO 12% | TOTAL PENSION | RIESGOS P. 6.960% | COMFACASANARE 4% | ICBF 3% | SENA 2% | TOTAL PARAFISCALES | | | |
| 1 | CERON PRECIADO ANGELMIRO | 4.214.504 | OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN | 1.423.500 | 4 | 189.800 | 7.592 | 16.133 | 23.725 | 7.592 | 22.776 | 30.368 | 13.210 | 7.592 | 5.694 | 3.796 | 17.082 | 174.616 | 84.385 | |
| 2 | LOZANO AMEZQUITA DIVAGNER | 1.116.547.903 | AYUDANTE DE OBRA | 1.423.500 | 24 | 1.138.800 | 45.552 | 96.798 | 142.350 | 45.552 | 136.656 | 182.208 | 79.260 | 45.552 | 34.164 | 22.776 | 102.492 | 1.047.696 | 506.310 | |
| 3 | MENDOZA GARCIA WILLIAM | 1.006.448.754 | AYUDANTE DE OBRA | 1.423.500 | 2 | 94.900 | 3.796 | 8.067 | 11.863 | 3.796 | 11.388 | 15.184 | 6.605 | 3.796 | 2.847 | 1.898 | 8.541 | 87.308 | 42.193 | |
| **TOTAL** | | | | | | **1.423.500** | **56.940** | **120.998** | **177.938** | **56.940** | **170.820** | **227.760** | **99.076** | **56.940** | **42.705** | **28.470** | **128.115** | **1.309.620** | **632.888** | |

ELABORO _____

VoBo _____

# 9 INFORME DE GESTIÓN – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

# 1 INFORME DE GESTION – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## 1.1 PERSONAL DE OBRA

1. Al personal entrante se les practican: exámenes médicos ocupacionales de ingreso, contratando solo aptos para el desarrollo de las actividades.

2. Se realiza por parte del Consorcio Subestación las respectivas afiliaciones a seguridad social y se anexan planillas SS.

3. Por último, se les realiza las respectivas Inducciones, entrega de EPP y dotación por el personal de SST, con el cual se inician las actividades de la obra.

Temas tratados en la inducción:

- ✓ Política Integral SST, objetivos de SST, generalidades del SG SST, roles y responsabilidades en SST, valores de la empresa.
- ✓ Responsabilidades, funciones del contratante y contratado.
- ✓ Concepto de accidente de trabajo, incidente de trabajo, enfermedad laboral, mecanismos de reporte de actos y condiciones inseguras, reporte de condiciones de salud.
- ✓ Uso obligatorio de EPP
- ✓ Cumplimiento del reglamento Interno de Trabajo.

## 1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se realiza charlas diarias de 5 min y calistenia con el personal

Temas tratados durante el mes:

- ✓ Salud ocupacional y ergonomía
- ✓ Comportamiento seguro y cultura SST
- ✓ Porque reportar condiciones inseguras
- ✓ Ergonomía y manejo de cargas
- ✓ Cuidado y limpieza de equipos pcc
- ✓ Trabajo en equipo

- ✓ Como reaccionar ante una emergencia
- ✓ Regla de tres R" reducir, reusar, reciclar"
- ✓ Ahorro de energía en el trabajo y en el hogar

2. Se realiza inspecciones de equipos y áreas de trabajo según las actividades:

3. Se realiza aseguramiento al personal y de las tareas que se estén ejecutando:

- ✓ Permisos de trabajo
- ✓ Análisis de Trabajo Seguro
- ✓ inspecciones


4. Se realiza el nombramiento a la ing. Martha Fonseca como representante del SG- SST de acuerdo con la Resolución 0312/2019 del Ministerio de Trabajo.

5. Se elabora matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles por cargos de acuerdo con la actividad a desarrollar.

6. Se elabora Matriz de EPP de acuerdo con la actividad a desarrollar

ELABORO:
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MARTHA LILIANA FONSECA

REGISTRO FOTOGRAFICO

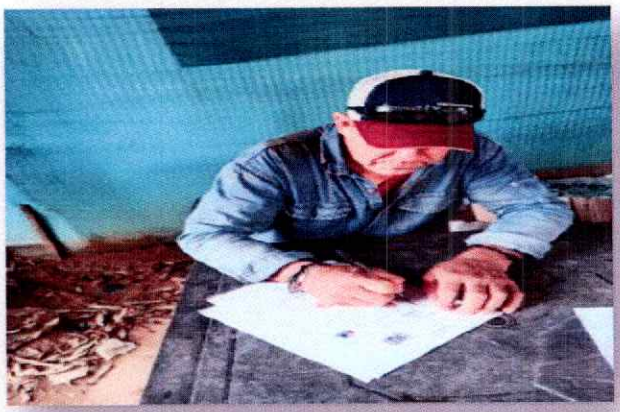




CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PAUSAS ACTIVAS, INDUCCIONES , SEÑALIZACION DE AREA ,INSPECCION DE EQUIPOS







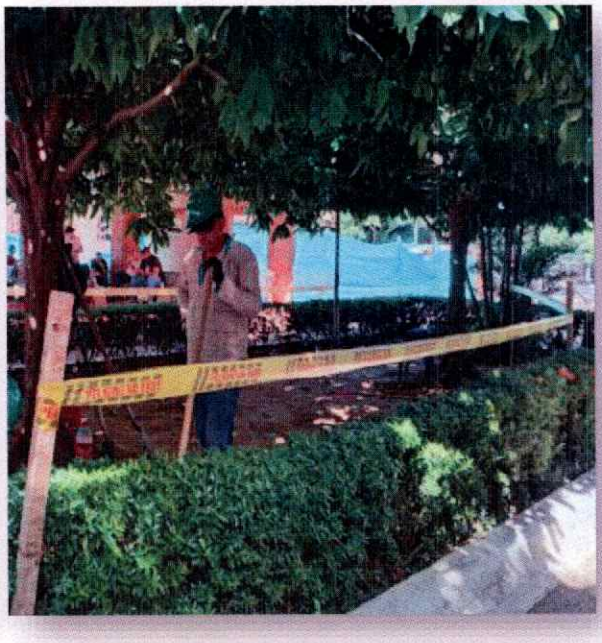





}

**CONSORCIO SUBESTACIÓN**
**NIT: 901.987.309-4**

**GÉMINIS CG**
Ingeniería y soluciones integrales

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

**CERTIFICADO DE AFILIACIÓN**

**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

**HACE CONSTAR QUE:**

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que **ANGELMIRO CERON PRECIADO**, identificado con **CC No. 80429681**, registra la siguiente información.

| Datos del Empleador | Datos de la Relación Laboral |
|---|---|
| CONSORCIO SUBESTACION - NIT 901987309 | **Fecha de inicio de cobertura:** 28/11/2025<br>**Estado Afiliación:** ACTIVO<br>**Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE<br>**Clase de Riesgo:** 5 |

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 27 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES**
**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

www.positiva.gov.co

## SALUD CASANARE LTDA

NIT 832000319-2

### CONCEPTO MÉDICO OSTEOMUSCULAR
### EXAMEN PRE INGRESO

**DATOS DEL TRABAJADOR**



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | 27/11/2025 | Nombre | CERON PRECIADO ANGELMIRO | | | | |
| Documento | 80429991 | Edad | 54.53 | Nacimiento | 31/05/1971 | Genero | M |
| Dirección | CRA 19 22-36 | Telefono | 3123411 | Ciudad | AGUAZUL- | Procedencia | AGUAZUL- |
| Estado Civil | Union Libre | Nivel Educativo | 2- Basica Primaria | | | Act. Económica | |
| Administradora | NUEVA EPS-PORVENIR | | | | | | |
| Empresa | CONSORCIO SUBESTACION | | | | | Cargo | OFICIAL DE OBRA |

**EXAMENES PARACLÍNICOS REALIZADOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espirometria | | Optometria | | Glicemia | | Rah | | Coprologico | | TGP | |
| Audiometria | | Cuadro hematico | | Serologia | | Frotis de garganta | | TGO | | RX de columna | |
| Visiometria | | Perfil lipidico | | Parcial de Orina | | Cultivo de garganta | | EKG | | RX de torax | |

Otros examenes

**CONCEPTO**

SIN LIMITACIONES O RESTRICCIONES MEDICAS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

**OBSERVACIONES**

**TRABAJOS ESPECIALES**

NA

**RECOMENDACIONES**

| Ocupacionales | Medicas | Vigilancia Epidemiologica | Hábitos | Capacitación |
|---|---|---|---|---|
| X Uso elementos Protección Personal<br>X Seguir Protocolos de Seguridad<br>X Control periodico ocupacional<br>X Utilizar ayudas ergonómicas<br>X Pausas activas<br>X Protección UV | X Control Periodico PyP por EPS | X Ergonómica<br>X Cardiovascular<br>X Estilos de vida saludables<br>X Psicosocial | X Actividad Física 3 veces por semana<br>X Higiene postural y de columna<br>X Control de peso<br>X Dieta baja en grasas y en harinas | |

Otras recomendaciones

CERON PRECIADO ANGELMIRO
TRABAJADOR

FELIX GILBERTO CABRA ACOSTA
C.C 7083332TL/C S.O 1016 / R.M 4513/80

CRA 17 N° 11-44 Telefonos: 311 885 48 29

**CONSORCIO SUBESTACION**

***NIT: 901.987.309-4***

**NOMBRE:** ANGELMIRO CERON PRECIADO

**CARGO:** OFICIAL

**OBRA/SEDE:** CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL **FECHA:** 27-11-2025

**Marque con una X:** **INDUCCIÓN:** X **REINDUCCIÓN:** ___

**1. Son políticas de CONSORCIO SUBESTACION:**

A. Alcohol y drogas  B. Política convivencia laboral 

C. Seguridad vial  D. Política SG-SST 

X Todas las anteriores

**2. La política de Alcohol y Drogas establece que está prohibido el consumo de alcohol y drogas dentro de las instalaciones, sitios de obra, talleres, vivienda o campamento que suministre la empresa**

Falso ☐ Verdadero ☒

**3. Marque con una X los elementos de protección personal**

A. X 


B. 

C. X 

D. X 

E. 

**4. Marque con una X la postura correcta al levantar una carga**

A 

X 

Powered by CamScanner

**5. ¿Cuál de estos sucesos es un accidente ambiental?**

A. Lastimarse un dedo 

X B. Un derrame de un producto químico al suelo o al agua 

C. Caída en la obra 

**6. Cuando se detecta que hay una actividad insegura usted:**

X A. Para y da aviso




B. Continua trabajando sin importarle




**7. Cuando realizo actividades con equipos y herramientas debo:**

A. Utilizar las herramientas y equipos defectuosos 


B. Realizar bromas con las herramientas y equipos 

X C. Inspeccionar los equipos y herramientas antes de iniciar el trabajo

Powered by CamScanner

CONSORCIO SUBESTACION

NIT: 901.987.309-4



**8. Qué es un accidente laboral:**



A. Lesión fuera del lugar de trabajo y fuera del horario laboral

X B. Evento que me causo daño mientras desarrollaba mi labor





C. Cuando presento síntomas de gripa

**9. Son Valores de la compañía:**

*RESPOSABILIDAD Y COMPROMISO
*LEALTAD Y HONESTIDAD
*CONFIABILIDAD Y ASERTIVIDAD
*RESPETO



Falso [ ]

Verdadero [X]

**10. Son y financiación del terrorismo objetivos del sistema de administración y gestión de riesgo de lavado de activos (SAGRLAFT):**

A. Crear controles para reducir las situaciones que generen riesgos LA/FT en las operaciones, negocios o contratos que realice SP.

Powered by CamScanner

CONSORCIO SUBESTACION

*NIT: 901.987.309-4*

B. Establecer herramientas para identificar operaciones Sospechosas, inusuales y relacionamientos con Personas Públicamente Expuestas.

C. Acreditar con soportes todas las operaciones.

D. Reportar a la UIAF operaciones inusuales y operaciones sospechosas. 

X E. Todas las anteriores.

**11. CONSORCIO SUBESTACION dispone de un código de ética y buen gobierno en el sector como una sociedad diligente, oportuna, responsable y ética en sus relaciones corporativas con todos los interesados y relacionados.**

Falso ☐ Verdadero ☒

**ME COMPROMETO A CUMPLIR LOS VALORES, NORMAS Y POLITICAS DE LA COMPAÑÍA:**

SI ☒  NO ☐ 

**Mucha Suerte y Bienvenido !!!**

**CALIFICACION:** 100

**Nota:** (Cada punto vale 0.45) La persona que obtenga un resultado inferior a 3 debe tener una reinducción en los temas que desconoce.

Powered by CamScanner

| GÉMINIS CG<br>CONSORCIO SUBESTACION<br>*NIT: 901.987.309-4* | **CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL** | **CCAA- F.EPI**<br>**Version**<br>0.1<br>**Fecha**<br>1/01/2025 |
|---|---|---|

**MARCAR CON UNA "X"**

**TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO**

| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | EQUIPO DE EMERGENCIA |
|---|---|
| | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Apellidos y Nombres del Trabajador:** | ANGELMIRO CERON PRECIADO | **Identificacion** | 80429681 |
| **Lugar del proyecto:** | SUBESTACION | **Cargo:** | OFICIAL. |
| **Fecha de Ingreso:** | 27-11-25. | | |

| N° | EPI ENTREGADO | | Fecha de Entrega | firma de Recibido |
|---|---|---|---|---|
| | Descripción | Cantidad | | |
| 1 | Casco de Seguridad (Verde) | 1 | 27-11-25 | |
| 2 | Guantes Boqueta amarillo | 1 PAR | 27-11-25 | |
| 3 | Gafas de Seguridad | 1. | 27-11-25 | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.

El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.

| RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS | | RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO |
|---|---|---|
| Nombre RECIBE | Angelmiro Ceron. | PROFESIONAL SST<br>ENTREGA: MARTHA FONSECA<br>Firma y cedula |
| Identificación | 80 429681 | |
| Cargo | oficial. | |
| Firma | | |

Powered by CamScanner

| CONSORCIO SUBESTACION<br>*NIT: 901.987.309-4* | REGISTRO DE ASISTENCIA | HSE-F-010<br>Versión: 01<br>Fecha: 01/01-2025 |
|---|---|---|

**SEDE 0887 PROYECTO: OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

| | | |
|---|---|---|
| **INDUCCION ESPECIFICA**<br>**REINDUCCION**<br>**CHARLAS**<br>**CAPACITACION**<br>**REUNION INFORMATIVA**<br>**OTROS** | ☐<br>☐<br>X<br>☐<br>☐<br>☐ | **FECHA:** 27-11-25.<br>**TEMA:** RIESGOS EXPUESTOS A LABORAS<br>**DURACION:** 20 MINUTOS.<br>**INSTRUCTOR:** MARTHA FONSECA |

| N° | NOMBRE | C.C. No. | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELMIRO CERON PRECIADO | 80429681 | OFICIAL | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| | | | | |

| OBSERVACIONES | SE REALIZA INDUCCION Y CHARLA. CON DIVULGACIÓN ATS E IMPORTANCIA |
|---|---|

Powered by CamScanner

| CONSORCIO SUBESTACION<br>*NIT: 901.987.309-4* | REGISTRO DE ASISTENCIA | HSE-F-010<br>Versión: 01<br>Fecha: 01/01-2025 |
|---|---|---|

**SEDE 0887 PROYECTO: OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

| | | |
|---|---|---|
| **INDUCCION ESPECIFICA** | ☐ | **FECHA:** 28 - 11 - 2025 |
| **REINDUCCION** | ☐ | **TEMA:** USO obligatorio EPP. |
| **CHARLAS** | ☒ | **DURACION:** 15 MINUTOS |
| **CAPACITACION** | ☐ | **INSTRUCTOR:** MARTHA FONSECA |
| **REUNION INFORMATIVA** | ☐ | |
| **OTROS** | ☐ | |

| Nº | NOMBRE | C.C. No. | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELMIRO CERON PRECIADO | 80429681 | OFICIAL | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| | | | | |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|

Powered by CamScanner

| CONSORCIO SUBESTACION<br>*NIT: 901.987.309-4* | REGISTRO DE ASISTENCIA | HSE-F-010<br>Versión: 01<br>Fecha: 01/01-2025 |
|---|---|---|

**SEDE 0887 PROYECTO: OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

| | | |
|---|---|---|
| **INDUCCION ESPECIFICA** | ☐ | **FECHA:** 29-11-2025 |
| **REINDUCCION** | ☐ | |
| **CHARLAS** | ☒ | **TEMA:** Porque reportar condiciones Inseguras |
| **CAPACITACION** | ☐ | **DURACION:** 21 minutos |
| **REUNION INFORMATIVA** | ☐ | **INSTRUCTOR:** MARTHA FONSECA |
| **OTROS** | ☐ | |

| Nº | NOMBRE | C.C. No. | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anbelmira Cerón | 80429681 | Oficial | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| | | | | |

| OBSERVACIONES | Divulgación ATS. |
|---|---|

Powered by CamScanner

| CONSORCIO SUBESTACION<br>*NIT: 901.987.309-4* | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 29-11-2025 | | | |
| **NOMBRE DEL TRABAJO:** | AMARRE DE ACERO EN VIGAS | | | |
| **GRUPO DE ANALISIS:** | PERSONAL OPERATIVO | | | |
| **NO. TAREA** | **DESCRIPCION DE TAREAS** | **PASOS ESPECIFICOS DE TAREA** | **PELIGROS / ASPECTOS** | **ACCIONES DE CONTROL** |
| 1 | Riesgos para la salud y la integridad de la persona | | * Carga física estática Posición mantenida o forzada por tiempo prolongado de cualquier segmento del cuerpo, ejemplo, flexión del tronco, del cuello, arrodillarse y mantenerse de pie<br>* Carga física dinámica Levantamiento manual de cargas<br>* Movimientos repetitivos<br>* Radiación solar<br>* Presencia de tormentas eléctricas | * Calentarse antes de iniciar el trabajo Pausas y estiramientos frecuentes<br>* Posturas ergonómicas adecuadas en la ejecución de las tareas, mantener espalda recta, flexionar piernas para el levantamiento manual de carga.<br>* Realizar descansos Periódicos<br>* utilización de camisa manga larga<br>* Divulgar Plan de emergencia a todo el personal<br>* Suspender actividades. Refugiarse en lugar seguro |
| 2 | Abstamiento | Movilizacion de equipos, herramientas y materiales al sitio de trabajo<br><br>Inspección del sitio de trabajo<br><br>Inspección de herramientas, equipos | Presencia de objetos en el área a movilizarse<br>Levantamiento mecánico con ayuda de equipos o mas personas<br>Terreno irregular (liso, humedo,)<br>Presencia de obstáculos o condiciones inseguras<br>Exposición a radiación solar<br>Exposición de manos | Caminar con precaución en piso humedo y verificar estado de las botas<br>Retirar obstáculos existentes del área y reportar condiciones inseguras al Supervisor<br>Uso de camisa manga larga y hidratación permanente<br>Identificar puntos de atrapamiento. Utilizar permanentemente EPP (guantes de carnaza) |
| 3 | amarre de acero y corte de alambre negro | Uso de pulidora | Pulidora en mal estado<br>Generación de chispa<br>Manejo inadecuado de la pulidora<br>Trabajos con equipos rotando<br>Riesgos eléctricos extensiones en mal estado y herramientas eléctricas<br>Puntas expuestas<br>Malas posturas<br>Superficies irregulares | Pulidoras en buen estado, y realizar preoperacionales y verificar su estado antes de utilizarlas.<br>Extintor en sitio<br>Personal Competente, hacer buen uso de la pulidora con disco de corte adecuado<br>Verificar el estado de la pulidora o troceadora y del disco antes de utilizarlos. Verificar el estado de las extensiones antes de utilizarse si alguna presenta posibles daños informar al supervisor para su retiro inmediato, diligenciar lista de chequeo, herramientaseléctricas carnificadas.<br>No dejar puntas expuestas. Las varillas de mas de 3 metros deben ser manipuladas por dos personas. Señalizar el área y movilizar las varillas con cuidado<br>Efectuar ejercicios de calentamientos y estiramiento al comenzar labores,<br>adoptar posturas adecuadas al realizar la labor, separar los pies colocando un pie más adelantado que el otro, flexionar las rodillas y mantener la espalda recta,<br>Verificar terreno estable para ubicación de las personas.<br>ATS actividad, permiso alturas , condiciones de salud<br>diligenciamiento |
| | | amarre de hierro con ayuda de un alicate,pique o pinza retativo.<br>2.6 trabajos en alturas | Uso de herramienta menor<br><br>Malas posturas<br><br>Exposición de manos<br>Caidas diferente nivel | Verificar el estado de las herramientas, antes de utilizarla si se encuentran en mal estado retirarlas inmediatamente y informar al supervisor<br>Efectuar ejercicios de calentamientos y estiramiento al comenzar labores,<br>adoptar posturas adecuadas al realizar la labor, separar los pies colocando un pie más adelantado que el otro, flexionar las rodillas y mantener la espalda recta<br>Verificar los puntos de atrapamiento y uso de guantes permanente de vaqueta. |
| 4 | Tareas en general | Para todas las labores a realizar se debe tener en cuenta el estado del clima | Época de lluvias y / o tormentas electricas | Suspender labores en caso de lluvias, no ubicarse debajo de árboles.<br>enlados adoptar posición de cuclillas sin colocar las manos en el piso,<br>retirarse de cuercas eléctricas. Suspender actividades en caso de lluvias o al aviso de tormentas electricas. |
| 5 | Orden y aseo | Reubicar los elementos de trabajo a sus respectivos lugar | Manejo inadecuado de los residuos | Dar buen manejo a los residuos sólidos. Clasificarlos y depositar el material sobrantes en los acopios establecidos para tal fin. |
| **OBSERVACIONES:** | | | | |

**IMPORTANTE: Verificar las condiciones del sitio o las áreas de trabajo dejando soporte en el AST**
**"SI EL TRABAJO ES INSEGURO SUSPENDALO INMEDIATAMENTE"**

***Aprobación Supervisor o Jefe:***

***Nombre:*** Martha Fonseca ***Firma***  ***Fecha*** 29-11-2025.



Powered by CamScanner

| CONSORCIO SUBESTACION<br>*NIT: 901.987.309-4* | REGISTRO DE ASISTENCIA | HSE-F-010<br>Versión: 01<br>Fecha: 01/01-2025 |
|---|---|---|

**SEDE 0887 PROYECTO: OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

| | | |
|---|---|---|
| **INDUCCION ESPECIFICA** | ☑ ATS. | **FECHA:** 29-11-2025. |
| **REINDUCCION** | ☐ | **TEMA:** Divulgacion ATS. |
| **CHARLAS** | ☐ | **DURACION:** 15 minutos. |
| **CAPACITACION** | ☐ | **INSTRUCTOR:** MARTHA FONSECA |
| **REUNION INFORMATIVA** | ☐ | |
| **OTROS** | ☒ | |

| Nº | NOMBRE | C.C. No. | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Cuan | 80462681 | Oficial | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| | | | | |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|

Powered by CamScanner
