ICN COLOMBIA
S.A.S
NIT: 900821450-9

Santander de Quilichao, cauca 17 de febrero del 2026

Ingeniero:

Adolfo Hernan Capote Sarria
Interventor

ASUNTO: Solicitud de reinicio de obra y ampliación del plazo contractual, Contrato de Obra No. 807-2025.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en mi calidad de contratista del Contrato de Obra **#.** 807-2025 cuyo objeto es: **"LOTE 1 REALIZAR MEJORAMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE COMEDORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, LOTE 2: REALIZAR MEJORAMIENTOS Y/O ADECUACIONES HIDROSANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE STDR, LOTE 4: EJECUTAR OBRAS CORRESPONDIENTES A MEJORAMIENTO O ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y OBRAS DE MITIGACIÓN EN IE. LOTE 5. EJECUTAR OBRAS CORRESPONDIENTES A MEJORA"**, Por medio de la presente me permito solicitar formalmente el **reinicio del contrato del asunto**, toda vez que las circunstancias que dieron lugar a su suspensión han sido superadas.

Cabe resaltar que, previo a la suspensión, se presentaron retrasos críticos en el despacho y entrega de materiales de obra, pese a haber efectuado los pedidos correspondientes con la debida antelación y mantener comunicación constante con los proveedores. Esta situación obedeció principalmente a las condiciones propias de la temporada decembrina y de fin de año, caracterizada por la saturación logística derivada del aumento en la demanda, escasez de transportadores, reducción de jornadas laborales, personal en vacaciones en las empresas proveedoras y demás factores asociados a dicha época, lo cual afectó los tiempos estimados de suministro.

De igual manera, durante ese mismo periodo se presentó escasez de mano de obra calificada, asociada a las celebraciones decembrinas y festividades en territorios aledaños al municipio de Santander de Quilichao, lo que impactó la disponibilidad de personal operativo requerido para el desarrollo normal de las actividades contractuales.

No obstante, es importante dejar constancia de que las causas que motivaron la suspensión ya fueron superadas, en razón a que:

1. Las empresas proveedoras han normalizado su cadena de suministro, superada la temporada de alta demanda, garantizando actualmente disponibilidad y despacho oportuno de materiales.

icncolombiasas@gmail.com
TELEFONO: 313 787 1563

6

2. La disponibilidad de mano de obra fue restablecida una vez finalizada la temporada decembrina y festiva, logrando conformar nuevamente los equipos de trabajo necesarios para la ejecución del contrato.

En consecuencia, las situaciones que dieron origen a la suspensión han sido resueltas, lo que permite solicitar formalmente el reinicio de la ejecución contractual.

Sin embargo, en la actualidad se presentan nuevas circunstancias externas, sobrevinientes y no imputables al contratista, que están afectando el normal desarrollo del cronograma inicialmente previsto, entre ellas:

• **La ola invernal a nivel nacional y regional**, ampliamente reportada por autoridades y medios de comunicación, la cual ha generado afectaciones en vías terciarias, incremento en las precipitaciones, dificultades de acceso a zonas rurales y retrasos en el transporte de materiales e insumos. En el caso específico de las veredas donde se ejecuta el contrato, la ausencia de vías pavimentadas agrava el impacto, disminuyendo las horas efectivas de trabajo y generando intermitencias operativas.

• **Situaciones de orden público en el municipio de Santander de Quilichao y sus veredas**, igualmente reportadas en medios y comunicados oficiales, que han limitado las jornadas laborales y restringido el desplazamiento seguro del personal hacia varias de las instituciones educativas objeto de intervención, reduciendo el rendimiento operativo proyectado.

Estas circunstancias han impactado directamente el avance programado, pese a las medidas adoptadas por el contratista para mitigar sus efectos y mantener la continuidad del proyecto.

En virtud de lo anterior, solicito respetuosamente a la interventoría gestionar la **ampliación del plazo contractual por el término de DOS (2) MESES**, con el fin de garantizar la adecuada, técnica, oportuna y óptima culminación del objeto contractual, sin comprometer la calidad de las obras ni el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas.

En mi calidad de contratista, reitero la plena disposición para continuar con la ejecución del contrato, ajustando la programación de obra y disponiendo los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para culminar satisfactoriamente las actividades dentro del plazo adicional solicitado. Se deja constancia de que el plazo requerido no genera costos administrativos adicionales para la entidad contratante.

Se adjunta programación de obra actualizada conforme al plazo solicitado.

De manera respetuosa, solicitamos se evalúe la presente petición y se adopte la decisión correspondiente a la mayor brevedad posible.

6

ICN COLOMBIA
S.A.S
NIT: 900821450-9

Atentamente:

CLAUDIA LORENA PAZ FINSCUE

No. C.C: **1.061.434.603**

Represéntate legal

icncolombiasas@gmail.com


TELEFONO: 313 787 1563

CRONOGRAMA DE OBRA CONTRATO No 807-2025

ICN COLOMBIA S.A.S NIT 900621950-9

CONTRATO 807-2025

NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y OBRA	FECHA INICIO OBRA	DURACION OBRA	FECHA FINAL OBRA	PORCENTAJE COMPLETADO
LOTE 1				
Realizar el mejoramiento de la cocina y mejoramiento de piso de aulas en la I.E. La Concepción sede María Auxiliadora.	23/02/2026	20 DIAS CALENDARIO	14/03/2026	50%
Realizar el mejoramiento de la cocina en la I.E. La Concepción sede escuela rural mixta La Concepción.	23/02/2026	25 DIAS CALENDARIO	19/03/2026	50%
Realizar la adecuación de aula y ampliación de la cocina-comedor en la I.E Ana Josefa Morales Duque sede escuela San José.	25/0/2026	4 DIAS CALENDARIO	1/03/2026	50%
LOTE 2				
Realizar la canalización de aguas lluvias en la I.E. José María Córdoba sede escuela rural mixta Mondomo - Santa Teresita del Niño Jesús.	26/02/2026	25 DIAS CALENDARIO	22/03/2026	50%
Realizar la adecuación de los canales de aguas lluvias en la I.E. técnico Ambiental Fernández Guerra sede Nariño Unido.	27/02/2026	25 DIAS CALENDARIO	18/03/2026	50%
Realizar el mejoramiento de la red de alcantarillado y canales de aguas lluvias de la I.E. Ana Josefa Morales Duque sede El Libertador.	2/03/2026	25 DIAS CALENDARIO	26/03/2026	30%
LOTE 4				
Realizar la adecuacion de cubierta mediante el cambio de tejas de Asbesto cemento por cubiertas en teja UPVC en la I.E. Domingullo sede Loma del Medio.	9/03/2025	18 DIAS CALENDARIO	26/03/2026	20%
Realizar la adecuacion de cubierta mediante el cambio de tejas de Asbesto cemeto por cubiertas en teja UPVC en la I.E. Tecnico Ambiental Fernandez Guerra sede El Tajo.	3/03/2025	15 DIAS CALENDARIO	17/03/2026	30%
Realizar la Construcción de espacio cubierto con teja UPVC y Construcción de muro de contención para protección área de cancha de futbol en la I.E. José María Córdoba sede La Chapa.	25/02/2026	25 DIAS CALENDARIO	21/03/2026	30%
Realizar la construcción del complemento del muro de contención en la I.E. Chayuce Yat Escuela Rural Mixta San Agustín.	9/03/2025	25 DIAS CALENDARIO	2/04/2026	30%
Realizar la construcción de cerramiento perimetral en la I.E. Agropecuaria Las Aves sede centro docente rural el Parnazo.	16/03/2026	25 DIAS CALENDARIO	9/04/2026	30%
LOTE 5				
Realizar el mejoramiento de las baterías sanitarias en la I.E. Limbania Velasco.	27/02/2026	30 DIAS CALENDARIO	28/03/2026	80%
Realizar el mejoramiento de las baterías sanitarias en la I.E. Ana Josefa Morales Duque sede La Milagrosa.	2/03/2026	25 DIAS CALENDARIO	26/03/2026	70%
Realizar la construcción de la batería sanitaria en la I.E. Agropecuaria Sat We Sx Yat Colegio Agrícola La Aurora	4/03/2026	25 DIAS CALENDARIO	28/03/2026	30%
Realizar el mejoramiento de baterías sanitarias mediante la instalación de pozo séptico en la I.E. José María Córdoba sede El Pedregal.	30/03/2026	20 DIAS CALENDARIO	18/04/2026	30%

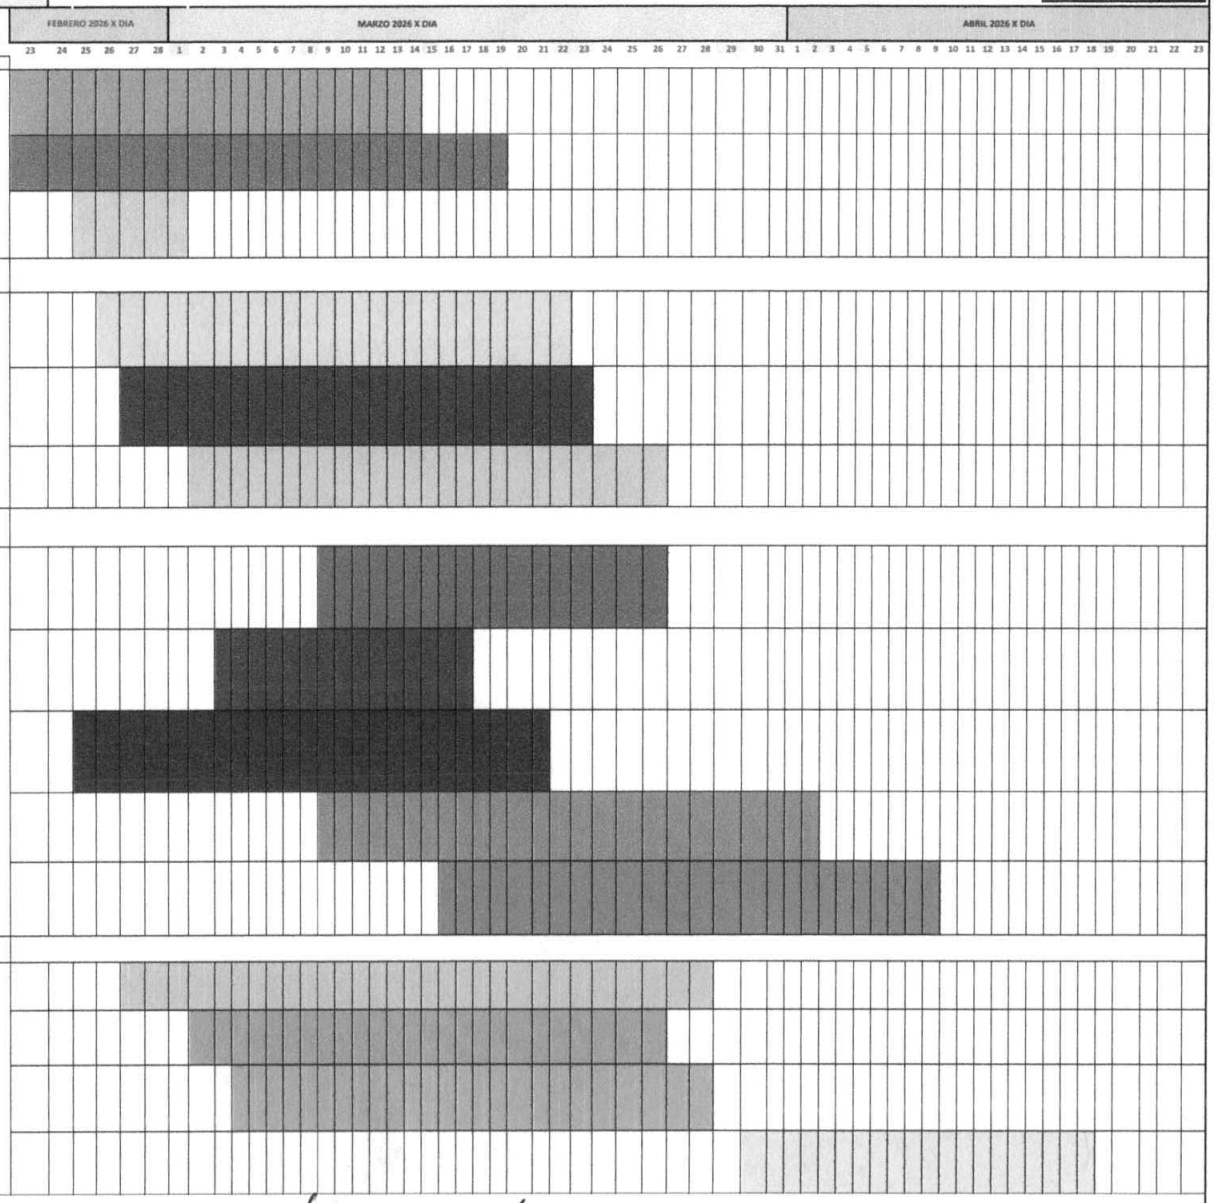

MANUEL JULIAN CAMILO PUTES
INGENIERO RESIDENTE OBRA
CONTRATISTA

ADOLFO HERNAN CAPOTE SARRIA
INGENIERO
INTERVENTORIA

Claudia L Paz F.
INGENIERIA, COMERCIO Y NEGOCIOS DE COLOMBIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIA LORENA PAZ FINSCUE
CONTRATISTA
