CONSORCIO MTR

FACTURA

CONSORCIO MTR

NIT 901.947.003-5

cll 28A 40 28
(604) 6265783
Montería - Colombia
consorciomtr2025@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: FEV 6

Fecha y hora Factura

Generación	05/03/2026, 16:55
Expedición	05/03/2026, 16:58
Vencimiento	05/03/2026
Vendedor	MAYRA ALEJANDRA BERRIO
Centro de costo	0
Cotización	

Cliente: MUNICIPIO MONTERIA
Nit: 800.096.734-1
Teléfono: (604) 7934545
Dirección: CL 27 CRR 3 ESQUINA
Ciudad: Montería - Colombia
Correo: s.infraestructura@monteria.gov.co

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 CONTRATOLP-SIM-008-2025, cuyo objeto es PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3,5,12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	1.00	1,610,833,738.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Mil seiscientos diez millones ochocientos treinta y tres mil setecientos treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Consignación $ 1,610,833,738.00

Total Bruto	1,610,833,738.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,610,833,738.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094765259 aprobado en 20250624 prefijo FEV desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 7 X 1000

CUFE:
9c79078a57be4a289c9b948aae824b4dd8804e8f035494ea3ec81985c45a22ca0072de77ef35b9d967abc7c18fa4df12

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSORCIO MTR

SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947003	5	CONSORCIO MTR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	COLOMBIA	MONTERIA-CORDOBA	3145931172	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2026-01	2069475701	9497733339	E	2026/01/05	2026/01/08	BANCO DE OCCIDENTE	3	$22,940,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (57 Afiliados)						$74,829,800	$11,974,500			$74,829,800	$2,995,600			$74,829,800	$2,995,600			$74,829,800	$4,932,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (4 Afiliados)						**$4,317,950**	**$691,000**			**$4,317,950**	**$172,900**			**$4,317,950**	**$172,900**			**$4,317,950**	**$22,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)						**$4,317,950**	**$691,000**			**$4,317,950**	**$172,900**			**$4,317,950**	**$172,900**			**$4,317,950**	**$22,700**		**$0**	**$0**
1	CC	78697705	LOPEZ ERMITAÑO	25-14	5	$237,250	$38,000	ESSC07	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$1,300	5	$0	$0
2	CC	1067874343	MENDOZA JOHN	231001	29	$1,376,050	$220,200	ESSC07	29	$1,376,050	$55,100	CCF16	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$7,200	29	$0	$0
3	CC	1003405961	OVIEDO DAILUZ	230301	27	$1,281,150	$205,000	ESSC07	27	$1,281,150	$51,300	CCF16	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$6,700	27	$0	$0
4	CC	94457528	VILLADA JAIME	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO5 (53 Afiliados)						**$70,511,850**	**$11,283,500**			**$70,511,850**	**$2,822,700**			**$70,511,850**	**$2,822,700**			**$70,511,850**	**$4,909,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (53 Afiliados)						**$70,511,850**	**$11,283,500**			**$70,511,850**	**$2,822,700**			**$70,511,850**	**$2,822,700**			**$70,511,850**	**$4,909,400**		**$0**	**$0**
5	CC	7385245	ALTAMIRANDA WILBER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	1003049369	ALVAREZ ISABELA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	10967449	ARGUMEDO ELIER	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	1062433204	ARIAS JUAN	230201	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
9	CC	78766050	ARRIETA FELIX	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
10	CC	8865915	ARROYO ERIK	230301	30	$3,300,000	$528,000	EPS010	30	$3,300,000	$132,000	CCF16	30	$3,300,000	$132,000	14-11	30	$3,300,000	$229,700	30	$0	$0
11	CC	1067860476	AVILEZ JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
12	CC	1023629283	BALLESTEROS MARIANELA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
13	CC	1069504790	BALMACEDA JOSE	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
14	CC	78752919	BARRIOS ROIS	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
15	CC	78701417	BRAVO MIGUEL	231001	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
16	CC	50940021	CAMPO MAUREN	231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
17	CC	78711074	CARE JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
18	CC	1038100389	CASTILLO GUSTAVO	230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
19	CC	1073811664	CAUSIL LUIS	230201	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$41,800	CCF16	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
20	CC	1069471894	CHIMA JOSE	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
21	CC	1073818688	CONDE LUIS	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
22	CC	1037652112	DIAZ MARITZA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
23	CC	1052067158	DIAZ OSCAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
24	CC	50907967	DUMAR DINA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
25	CC	1067863600	DURANGO FREDY	231001	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF16	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
26	CC	78734464	ESCOBAR RODRIGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
27	CC	10778793	FALON JUAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
28	CC	78699971	GARCIA JULIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
29	CC	78752074	GOMEZ ALCI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
30	CC	1148141438	GONZALEZ JORGE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
31	CC	1064308374	GONZALEZ JOSE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
32	CC	1067963915	GUERRA DALY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
33	CC	1068580861	HERNANDEZ SAMIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
34	CC	1067963537	LUGO LUIS	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
35	CC	1067850233	MARQUEZ EDWIN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC 1003398241	MARTINEZ ANDRES	231001	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$30,400	CCF16	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
37	CC 1003000996	MERCADO WILSON	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
38	CC 1003005383	MESTRA DAIVER	230201	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
39	CC 1067936600	MORA DANILO	231001	6	$400,000	$64,000	ESSC07	6	$400,000	$16,000	CCF16	6	$400,000	$16,000	14-11	6	$400,000	$27,900	6	$0	$0
40	CC 1062435624	NEGRETE DIANIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
41	CC 78759480	ORTEGA JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
42	CC 6893635	OTALVAREZ OSCAR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
43	CC 1067873734	OTALVAREZ PEDRO	230201	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
44	CC 1064310888	PALOMINO JORGE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
45	CC 1068582783	PERALTA SIRLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
46	CC 1102119794	PERDOMO LUZ	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
47	CC 1064998078	PEREIRA JESUS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
48	CC 10944674	PEREIRA RAUL	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
49	CC 1063138454	RAMOS LEIVER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
50	CC 78688889	RANGEL ROBINSON	230201	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
51	CC 1067954343	SIMANCAS JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
52	CC 1065008819	SOTELO YEINER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
53	CC 1069495784	TALAIQUE YISELA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
54	CC 1133797327	URANGO ELKIN	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF16	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
55	CC 1068417541	VANEGAS SAIRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
56	CC 1123992190	VARGAS SERGIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
57	CC 10765687	VELASQUEZ ARISTOBULO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(57)**				**$74,829,800**	**$11,974,500**			**$74,829,800**	**$2,995,600**			**$74,829,800**	**$2,995,600**			**$74,829,800**	**$4,932,100**		**$0**	**$0**

2026/01/08 04:34 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947003	5	CONSORCIO MTR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	COLOMBIA	MONTERIA-CORDOBA	3145931172	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2026-01	2069475701	9497733339	E	2026/01/05	2026/01/08	BANCO DE OCCIDENTE	3	$22,940,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				57	$11,974,500	$22,100	$0	$11,996,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	$2,272,300	$4,200	$0	$2,276,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,632,600	$3,000	$0	$1,635,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$5,976,200	$11,000	$0	$5,987,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$2,093,400	$3,900	$0	$2,097,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$4,932,100	$9,100	$0	$4,941,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	57	$4,932,100	$9,100	$0	$4,941,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$2,995,600	$5,500	$0	$3,001,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	57	$2,995,600	$5,500	$0	$3,001,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				57	$2,995,600	$5,900	$0	$3,001,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$1,900	$100	$0	$2,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$171,000	$400	$0	$171,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$246,000	$500	$0	$246,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	12	$532,800	$1,000	$0	$533,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$683,100	$1,300	$0	$684,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	$1,132,800	$2,100	$0	$1,134,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$228,000	$500	$0	$228,500
TOTAL				57	$22,897,800	$42,600	$0	$22,940,400

2026/01/08 04:34 PM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947003	5	CONSORCIO MTR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	COLOMBIA	MONTERIA-CORDOBA	3145931172	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2078839467	9497844010	N	2026/01/05	2026/01/13	BANCO DE OCCIDENTE	8	$537,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION												SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$276,600						$69,000	
																				$276,600						$69,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	($1,423,500)	16%	SIN RIESGO	($227,800)	$0	$0	$0	$0	$0	($227,800)		SALUD TOTAL	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		SALUD TOTAL	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	($1,423,500)	16%	SIN RIESGO	($227,800)	$0	$0	$0	$0	$0	($227,800)		MUTUAL SER	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		MUTUAL SER	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	($1,423,500)	16%	SIN RIESGO	($227,800)	$0	$0	$0	$0	$0	($227,800)		SANITAS	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		SANITAS	30	$2,000,000	4%	$80,000	
																				$276,600						$69,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$69,000						$69,000						$120,300				$0		$0		$0		$0	
	$69,000						$69,000						$120,300				$0		$0		$0		$0	
$0	($57,000)		COMFACOR	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	ARL SURA	30	($1,423,500)	6.96%	5	($99,100)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$80,000		COMFACOR	30	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	($57,000)		COMFACOR	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	ARL SURA	30	($1,423,500)	6.96%	5	($99,100)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$80,000		COMFACOR	30	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	($57,000)		COMFACOR	30	($1,423,500)	4%	($57,000)	ARL SURA	30	($1,423,500)	6.96%	5	($99,100)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$80,000		COMFACOR	30	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$69,000						$69,000						$120,300				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901947003	5	CONSORCIO MTR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	COLOMBIA	MONTERIA-CORDOBA	3145931172	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2078839467	9497844010	N	2026/01/05	2026/01/13	BANCO DE OCCIDENTE	8	$537,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$276,600	$1,400	$0	$278,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$276,600	$1,400	$0	$278,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$120,300	$600	$0	$120,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$120,300	$600	$0	$120,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,000	$400	$0	$69,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	$69,000	$400	$0	$69,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$69,000	$600	$0	$69,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$23,000	$200	$0	$23,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$23,000	$200	$0	$23,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$23,000	$200	$0	$23,200
TOTAL				3	$534,900	$3,000	$0	$537,900

CONSORCIO MTR

PRE-ACTA

ACTA DE PRE ENTREGA PARA PAGO PARCIAL

CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO MTR
OBJETO	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
INTERVENTORIA No.	CMA-SIM-006-2026
APOYO A LA SUPERVISION	RODRIGO MORENO
FECHA FINAL	1 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	20 DE ENERO DEL 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICION ORIGINAL	CONDICION ACTUALIZADA SEGÚN BALANCE No. XX	CANTIDAD PROYECTADA PARA COBRO	CANTIDAD VERIFICADA
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
1.02	REMOCION DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	1859,74		102,00	102,00
1.03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO F'c 0.15MO YSM CON CORTADORA	M	1859,74		444,70	444,70
1.04	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	947,59		488,00	488,00
1.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPANACIÓN Y CANALES	M3	13586,25		1661,70	1661,70
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	19087,36		2160,20	2160,20
1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ)	UND	65,00		14,00	14,00
1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ)	UND	115,00		21,00	21,00
2,00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**					
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	4337,03		830,90	830,90
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	3529,29		415,40	415,40
3,00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**					
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	3308,40		395,80	395,80
3.02	ADECUACION DE CAMARAS DE INSPECCION (MARCOS EN CONCRETO DE 3000 PSI)	UND	52,00		4,00	4,00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	3146,30		431,50	431,50
3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	50500,20		15371,10	15371,10
4,00	**SEÑALIZACION**					
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	83,00		18,00	18,00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	5,00		2,00	2,00
4.03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2 (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	879,80		163,00	163,00
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM), (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	8967,93		1417,80	1417,80
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO REFINADO	M	65,50		18,00	18,00
5,00	**CUNETAS**					
5.03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	3552,96		1308,10	1308,10
5.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	300,63		208,60	208,60
6,00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y BIOBILIARIOS**					
6.01	SA TABLETA GUIA PREF. TACTIL PARA DISCAP EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.09m COLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS RELLENAS	M	2254,76		144,00	144,00
6.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISEÑO INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS RELLENAS CON ARENA	M	2931,19		180,20	180,20
6.03	CONSTRUCCION PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0.09M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGUN DISEÑO, INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	2254,78		228,10	228,10
6.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	118,00		22,00	22,00
6.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	126,00		33,00	33,00
6.06	SA BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO MES - ICU EMPOTRADOS EN CONCRETO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	488,00		170,00	170,00
9,00	**SISTEMA DE ALCANTARILLADO**					
9.01	EXCAVACIÓN MECANICA DE MATERIAL HETEROGÍNEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MENORES A 1.5M, INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO	M3	1.888,65		345,70	345,70
9.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	883,55		145,20	145,20
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 0.10 M DE ARENA DE BRECHAS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA	M3	111,24		12,70	12,70
9.06	S.T.C DE LLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN BRECHAS COMPACTADOS MECANICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD IGUAL O MAYOR DEL 90% DE LA DENSIDAD OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	899,58		171,70	171,70
9.07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	864,25		451,10	451,10
9.08	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	3.188,97		283,00	283,00
9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" CON CARACTERISTICAS (PS 80KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR	M	610,62		25,00	25,00
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" CON CARACTERISTICAS (PS 80KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR, PARA DOMICILIARIAS	M	882		564,00	564,00
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS SILLAS YEE 8" X 6" PARA TUBERIA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO	UND	158		34,00	34,00
9.13	CONSTRUCCION DE CÁMARAS DE INSPECCION Ø 1.2 M, PROFUNDIDAD MENORES DE 2 METROS EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	10		1,00	1,00
9.14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.60MX0.60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	150		77,00	77,00

Nota 1: Las cantidades verificadas en campo y que se indican en la presente acta, corresponden única y exclusivamente a las que, por su misma naturaleza visiblemente son susceptibles de medición.

Nota 2: El porcentaje de ejecución del Contrato referenciado a fecha de la presente visita, corresponde al 54,11%.

Nota 3: Se hace la salvedad que la presente acta, de ninguna manera constituye el acta final del contrato, sino que, se hace con antelación a la fecha de terminación del contrato objeto de estudio con el fin de verificar cantidades ed pactas de su culminación y, en todo caso, como parte de la acción de mejora propuesta en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Montería el 9 de mayo de 2023.

Se firma por los que en ella intervinieron:

CONSORCIO MTR
Rep. Legal: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ
Contratista

CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
Rep. Legal: ARMANDO RAFAEL BULA OTERO
Interventoría/Supervisor

RODRIGO MORENO
APOYO A LA SUPERVISION

CONSORCIO MTR

ACTA PARCIAL Y CUMPLIMIENTO

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	**03**	**13/01/2025**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO MTR
OBJETO DEL CONTRATO	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3,5,12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	QUINCE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($15.716.097.925,00)
No. CDP	25001225 DE FECHA 19 ENERO 2026
No. CRP	25001683 DE FECHA 19 ENERO 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	07 MESES
FECHA DE INICIO	01 DE JULIO DE 2025
FECHA FINAL	01 DE FEBRERO DE 2026
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTOR CYB
PERIODO A COBRAR	01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

En la ciudad de Montería a los diecinueve (19) días del mes de enero del año 2026 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO MTR,** representado legalmente por **NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ** identificado con cédula de ciudadanía 86.051.921, el interventor **CONSORCIO INTERVENTOR CYB,** representado legalmente por **ARMANDO RAFAEL BULA OTERO**, identificado con cédula de ciudadanía 78.761.321, apoyo a la supervisión **RODRIGO MORENO PAEZ** identificado con cedula de ciudadanía 79,506,681 y la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** con el propósito de dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

El avance de la obra es del 10.33% en el periodo a cobrar, lo cual equivale a un valor **MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 1.623.037.024,00).** para un avance acumulado de 54.11%.

1. Teniendo en cuenta que a la fecha de la presente acta el contratista de obra no ha justificado los imprevistos en las actas cobradas, y que el valor de estos equivale a la suma total de $12.203.286,00; resulta pertinente indicar que los mismos solo serán pagados, al presentarse las justificaciones correspondientes.

2. El valor de la presente **ACTA PARCIAL No. 5** es **de MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 1.610.833.738,00)**

Que de conformidad con los documentos precontractuales y contractuales la forma de pago del contrato de la referencia es:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES MENSUALES POR AVANCE DE OBRA, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES EJECUTADAS Y APROBADAS POR LA INTERVENTORÍA HASTA EL 95% DEL VALOR DEL CONTRATO. EL 5% RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ CONTRA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
LA ENTIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR LAS DEMORAS PRESENTADAS EN EL TRÁMITE PARA EL PAGO AL CONTRATISTA CUANDO ELLAS FUEREN OCASIONADAS POR ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE O NO AJUSTARSE A CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.
LA ENTIDAD HARÁ LAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR SOBRE CADA PAGO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE LA MATERIA.
EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR PARA CADA PAGO DERIVADO DEL CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA.

Los pagos parciales relacionados son los siguientes:

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	ORDEN DE PAGO
Valor del contrato	$15.716.097.925,00	$0,00	
Acta parcial 1		$ 1.739.974.995,00	N° 25006198 / 14/10/2025
Acta parcial 2		$ 1.225.545.741,00	25006908 de *fecha 10/11/2025*

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

Acta parcial 3		$ 2,204,961,322.00	25007658 de fecha 04/12/2025
Acta parcial 4		$ 1.656.461.030,00	25007929 de fecha 15/12/2025
Acta parcial 5		$ 1.610.833.738,00	EN TRAMITE
Saldo por ejecutar		$ 7.278.321.099,00	
BALANCE	**$15.716.097.925,00**	**$15.716.097.925,00**	

3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

4. El contratista de obra declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

5. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista de obra para el personal relacionado en la propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de condiciones, como se relaciona a continuación:

DICIEMBRE 2025

ID	Nombre	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
			PERSONAL PROFESIONAL			
1	Erik Fabian Arroyo Muñoz	8865915	Director de obra	100%	$3.300.000	9497733339
2	Luis Miguel Lugo Cordero	1067963537	Residente de Obra	100%	$ 2.500.000	9497733339
3	Jose Alfredo Balmaceda Álvarez	1069504790	Residente de Obra	100%	$ 2.500.000	9497733339
4	Raúl Andrés Pereira López	10944674	Especialista en Estructuras	30%	$ 1.423.500	9497733339
5	Rodrigo Enrique Escobar Marsiglia	78734464	Especialista en vías	30%	$ 1.423.500	9497733339
6	Oscar Simón Diaz Pestana	1052067158	Especialista en hidráulica	30%	$ 1.423.500	9497733339
7	Edwin Eleyson Márquez Ospina	1067850233	Especialista en geotecnia	30%	$ 1.423.500	9497733339
8	Luz Angela Perdomo Morales	1102119794	Profesional Social	100%	$ 2.500.000	9497733339

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	**03**	**13/01/2025**

ID	Nombre	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
9	Mauren Yaneth Campo Morales	50940021	Seguridad y salud en el trabajo	100%	$ 2.500.000	9497733339
PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						
10	Rois Esteban Barrios Esteban	78752919	Topógrafo	100%	$ 2.000.000	9497733339
11	Dalys Sofia Guerra Ramos	1067963915	Topógrafo	100%	$ 2.000.000	9497733339 - 9497844010
12	Isabela Álvarez Villegas	1003049369	Cadenero 1	100%	$ 1.423.500	9497733339
13	Yisela María Talaique Méndez	1069495784	Cadenero 2	100%	$ 1.423.500	9497733339
14	Jose Carlos Chima Montalvo	1069471894	Cadenero 3	100%	$ 1.423.500	9497733339
15	Sergio Vargas	1123992190	Cadenero 4	100%	$ 1.423.500	9497733339
16	Jesús Alberto Pereira	1064998078	Maestro General	100%	$2.000.000	9497733339 - 9497844010
17	Jose David Simanca Ojeda	1067954343	Maestro General	100%	$2.000.000	9497733339 - 9497844010
18	Sirly Mónica Peralta Diaz	1068582783	Almacenista	100%	$ 1.423.500	9497733339
19	Saira Elena Vanegas Dumar	1068417541	Almacenista	100%	$1.423.500	9497733339
20	Marianela Ballesteros Agamez	1023629283	Personal de servicio de vigilancia	100%	$ 1.423.500	9497733339
21	Wilson José Mercado Negrete	1003000996	Personal de servicio de vigilancia	100%	$ 1.423.500	9497733339
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
22	Dina Isabel Dumar Sevilla	50907967	Conductor	100%	$2.000.000	9497733339
23	Jose Alfredo Ortega Gómez	78759480	Contador	40%	$ 1.423.500	9497733339

Para el periodo de cobro hubo los siguientes cambios de personal:

TRAZABILIDAD DE CAMBIO PERSONAL						
Nombre y Apellidos propuesto inicialmente	**N° Identificación**	**Profesión/ Cargo**	**Nombre y Apellidos reemplazo**	**N° Identificación**	**Profesión/ Cargo**	**Fecha y periodo del cambio**
EDUIN JESUS CARABALLO PEREZ	1067939788	Maestro general	JESUS ALBERTO PEREIRA	1064998078	Maestro general	01 de diciembre de 2025
MARÍA ALEJANDRA CORREA ORTIZ	1003027419	Topógrafo	*DALYS SOFIA* GUERRA RAMOS	1067963915	Topógrafo	01 de diciembre de 2025
DANILO ANDRES MORA GONZALEZ	1067936600	Maestro general	JOSE DAVID SIMANCA OJEDA	1067954343	Maestro general	09 de diciembre de 2025

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

6. Que el interventor certifica que el contratista de obra aportó a la entidad municipal las garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad.

No. Póliza	No. Del Anexo	Tipo de Amparo	Fecha del amparo	
			Desde	Hasta
No Póliza. CBC100067347	ANEXO No. 0	Cumplimiento	03/06/2025	03/07/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	03/06/2025	03/01/2029
		Estabilidad y calidad de la obra	03/01/2026	03/01/2031
No Póliza. CBC100012978	*ANEXO No. 0*	*R.C. E*	*03/06/2025*	*03/01/2026*
No Póliza. CBC100067347	ANEXO No. 1	Cumplimiento	01/07/2025	01/08/2026
		Pago de salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones	01/07/2025	01/02/2029
		Estabilidad y calidad de la obra	01/02/2026	01/02/2031
No Póliza. CBC100012978	ANEXO No. 1	R.C. E	03/06/2025	01/02/2026

7. Que en el periodo a cobrar el interventor certifica que el contratista de obra realizó y presentó los ensayos realizados en obra (si aplica), de acuerdo con los parámetros establecidos y normativa vigente y que a continuación se relacionan:

DESCRIPCIÓN ENSAYO	NORMA	CUMPLIMIENTO
OCTUBRE		
DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E - 161 - 13	Cumple
DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E - 161 - 13	Cumple
DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E - 161 - 13	Cumple
DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E - 161 - 13	Cumple
DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E - 161 - 13	Cumple
DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E - 161 - 13	Cumple
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE	I.N.V.E – 414 - 22	Cumple

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE	I.N.V.E – 414 - 22	Cumple
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE	I.N.V.E – 414 - 22	Cumple
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE	I.N.V.E – 414 - 22	Cumple
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE	I.N.V.E – 414 - 22	Cumple

8. La Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato de interventoría manifiesta que, dado que los contratistas de obra e interventoría avalan los numerales relacionados anteriormente, y es procedente suscribir la presente acta parcial.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

CONSORCIO MTR

Rep. Legal NELSON VANEGAS ORTIZ

CONSORCIO INTERVENTOR CYB

Rep. Legal ARMANDO RAFAEL BULA OTERO

APOYO A LA SUPERVISIÓN

RODRIGO MORENO PAEZ

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

IRIS SPATH CAMAÑO

Elaboró: Erik Fabian Arroyo Muñoz

Revisó: Khalil Petro – Contratista SIM

Kelly Arteaga – Contratista SIM



ACTA PARCIAL NUMÉRICA

	CONTRATO DE OBRA N°:	LP-SIM-008-2025	FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JULIO DE 2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05**
			PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	**$ 1,621,460,253.00**
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE TERMINACIÓN:	1 DE FEBRERO DE 2026	
			VALOR CONTRACTUAL:	**$ 15,716,887,375.00**	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05**
			ACTA PARCIAL DE OBRA N°5	**$ 1,621,460,253.00**	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	**$ 9,599,122,696.00**	DEL 21/12/2025 HASTA 31/12/2025
	Representante:	NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ	% AVANCE FISICO PRESENTE ACTA:	**10.32%**	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	% AVANCE ACUMULADO DE OBRA:	**56.19%**	**29/01/2026**
VERSIÓN: 02 CÓDIGO: SI-SUP-004	Representante:	ARMANDO RAFAEL BULA OTERO			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05					

			CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE x		ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACTA PARCIAL DE OBRA N°3		ACTA PARCIAL DE OBRA N°4		OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**																		
1.01	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO ANTICIALADO, IND INCLUYE RETIRO	M2	1,209.76	$3,575.00	$4,396,392.00	-	$0.00	-	$0.00	745.69	$2,665,375.00	468.00	$1,673,196.00	-	$0.00	**0.00**	**$ 0.00**	5213.00	$ 4,336,475.00
1.02	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	1,868.74	$43,686.00	$27,736,278.00	-	$0.00	158.10	$7,181,812.00	56.20	$697,680.00	63.40	$905,512.00	-	$0.00	**136.04**	**$ 1,943,980.00**	391.72	$ 5,305,869.00
1.03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.15MTS 15M CON CORTADORA	M	1,858.24	$36,603.00	$60,757,463.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	932.70	$4,857,218.00	364.00	$11,127,342.00	**444.70**	**$ 16,277,754.00**	891.40	$ 30,261,884.00
1.04	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	947.55	$30,896.00	$29,276,741.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$0.00	228.25	$7,051,394.00	25.57	$790,051.00	**405.69**	**$ 13,037,248.00**	749.50	$ 22,914,553.00
1.05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	144.59	$134,626.00	$25,140,373.00	-	$0.00	11.22	$2,100,734.00	12.50	$2,495,250.00	36.28	$7,461,268.00	-	$0.00	**0.00**	**$ 0.00**	67.00	$ 13,035,342.00
1.06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE, PROFUNDIDAD > 50 CM, NO INCLUYE RETIRO	M3	1,109.40	$70,476.00	$78,196,760.00	-	$0.00	118.00	$8,095,788.00	283.49	$17,477,338.00	32.44	$625,240.00	-	$0.00	**0.00**	**$ 0.00**	444.70	$ 11,330,066.00
1.07	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE 0 - 4 MTS EXPANCION Y CONNETS	M3	53,086.29	$67,788.00	$3,973,875,748.00	-	$0.00	7,238.63	$256,533,894.00	1,734.85	$21,998,120.00	3,750.17	$47,391,833.00	1,814.46	$22,921,945.00	**1667.79**	**$ 21,160,346.00**	10,985.89	$ 132,367,703.00
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	59,397.36	$36,675.00	$364,757,249.00	-	$0.00	3,892.25	$94,551,562.00	2,957.59	$66,741,553.00	4,021.97	$102,959,177.00	2,018.80	$51,602,265.00	**2169.28**	**$ 66,264,155.00**	14302.15	$ 453,442,976.00
1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 6 M.A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UNID	65.09	$457,036.00	$27,135,940.00	-	$0.00	7.09	$2,662,752.00	25.00	$8,456,254.00	13.00	$4,427,508.00	7.09	$2,922,152.00	**14.65**	**$ 5,991,184.00**	42.00	$ 26,997,252.00
1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE H= 6 M.A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UNID	175.09	$639,337.00	$73,052,905.00	-	$0.00	8.02	$5,747,943.00	11.00	$6,958,597.00	17.00	$7,573,674.00	-	$0.00	**31.05**	**$ 12,341,967.00**	53.09	$ 33,673,391.00
1.11	PODA DE FORMACIÓN ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 6 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UNID	1.00	$272,285.00	$272,285.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	**0.00**	**$ 0.00**	0.00	$ 0.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UNID	1,000.00	$124,716.00	$124,716,000.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	**0.00**	**$ 0.00**	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				**$ 1,205,403,676.00**		**$ 0.00**		**$ 426,696,160.00**		**$ 155,755,700.00**		**$ 284,108,995.00**		**$ 89,074,770.00**		**$ 156,599,354.00**		**$ 734,031,169.00**
2.00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**																		
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	4,357.05	$130,866.00	$569,940,549.00	$0.00	$0.00	$18,549,230.00	484.70	$63,451,270.00	1,292.96	$242,776,670.00	294.00	$57,473,706.00	**$0.00**	**$ 100,502,588.00**	3092.66	$ 482,531,369.00
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PEDRAPLEN O SIMILAR)	M3	1,269.14	$221,354.00	$280,910,513.00	$0.00	$0.00	$165,354,934.00	474.69	$105,946,116.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**0.00**	**$ 0.00**	1238.29	$ 271,396,753.00
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	3,529.26	$391,186.00	$1,380,912,709.00	$0.00	$0.00	$203,655,285.00	644.35	$144,947,688.00	972.89	$280,947,258.00	405.00	$126,487,967.00	**405.49**	**$ 129,282,105.00**	2929.90	$ 511,492,971.00
2.04	SELLO(RTA) PARA REPARACION DEL SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	17,356.99	$14,259.00	$198,852,589.00	$0.00	4,605.93	$65,691,831.00	1,735.50	$24,748,437.00	3,124.08	$73,406,870.00	1,319.00	$18,809,454.00	**0.00**	**$ 0.00**	10585.10	$ 183,736,641.00
	SUBTOTAL SUBRASANTE Y SUBBASE				**$ 2,330,862,764.00**		**$ 0.00**		**$ 479,674,249.00**		**$ 339,233,493.00**		**$ 699,840,527.00**		**$ 199,921,727.00**		**$ 229,872,193.00**		**$ 1,529,116,233.00**
3.00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**								$0.00		$0.00								
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	7,308.40	$1,470,764.00	$4,965,375,618.00	$0.00	212.16	$1,554,974.01	427.60	$3,286,777,559.00	745.69	$961,566,150.00	549.60	$836,276,411.00	**399.00**	**$ 662,139,361.00**	2634.50	$ 3,074,727,716.00
3.02	ADECUACION DE DRENAJES DE INSPECCION (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNID	12.00	$546,711.00	$37,906,932.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	2.00	$1,093,422.00	-	$0.00	**4.00**	**$ 2,186,844.00**	6.00	$ 3,280,266.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	3,146.36	$139,573.00	$439,182,575.00	$0.00	138.00	$17,736,702.00	145.50	$19,488,764.00	556.70	$72,629,356.00	465.50	$60,427,886.00	**451.00**	**$ 56,295,978.00**	1739.20	$ 225,744,723.00
3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	58,938.75	$31,555.75	$963,205,838.00	$0.00	4,660.57	$58,347,174.00	$0.00	$0.00	5,458.13	$65,804,343.00	-	$0.00	**10231.18**	**$ 103,761,349.00**	20181.63	$ 287,743,369.00
	SUBTOTAL PAVIMENTO Y BORDILLOS				**$ 6,965,863,691.00**		**$ 0.00**		**$ 1,131,976,510.00**		**$ 619,356,223.00**		**$ 1,101,112,242.00**		**$ 896,704,297.00**		**$ 824,383,776.00**		**$ 4,413,476,367.00**
4.00	**SEÑALIZACION**																		
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UNID	41.00	$382,736.50	$46,396,226.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	28.00	$10,716,538.00	**18.00**	**$ 10,486,908.00**	44.00	$ 25,439,944.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UNID	5.00	$811,143.00	$4,550,715.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	2.00	$1,622,286.00	**2.00**	**$ 1,622,286.00**	4.00	$ 3,644,572.00
4.03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE , MZ (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	679.80	$95,933.00	$64,481,953.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	83.80	$8,038,195.00	**143.80**	**$ 15,837,078.00**	346.90	$ 73,676,364.00
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE , M (12 CM), (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	8,907.00	$8,729.00	$77,746,465.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	840.00	$7,332,360.00	**1417.00**	**$ 12,375,676.00**	3257.00	$ 19,708,336.00
4.05	REFLECTORES DE VIDRIO TIPO MEDALLA PLASTICO PEGADO	M	69.00	$449,030.00	$30,975,615.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	60.00	$26,938,780.00	**19.00**	**$ 8,508,740.00**	64.00	$ 29,750,520.00
	SUBTOTAL SEÑALIZACION				**$ 224,543,704.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 53,047,457.00**		**$ 48,431,149.00**		**$ 165,434,636.00**
5.00	**CUNETAS**																		
5.01	EXCAVACION MANUAL	M3	2,254.76	$48,471.00	$109,614,044.00	-	$0.00	9.09	$440,572.00	39.16	$4,773,749.00	51.40	$2,491,980.00	169.05	$7,969,295.00	**0.00**	**$ 0.00**	326.70	$ 15,675,764.00
5.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	2,884.19	$30,675.00	$88,514,253.00	$0.00	13.97	$370,247.00	138.90	$3,964,908.00	199.83	$5,850,602.00	160.35	$5,550,852.00	**0.00**	**$ 0.00**	423.05	$ 12,969,350.00
5.03	EXCAVACION MECANICA EN SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M3	2,542.86	$14,258.00	$36,251,837.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	**1366.10**	**$ 19,482,166.00**	1366.10	$ 19,482,166.00
5.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	305.03	$112,765.00	$33,176,542.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	**294.84**	**$ 33,456,836.00**	599.87	$ 66,633,378.00
5.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPA	KG	13,674.17	$31,555.75	$431,550,538.00	$0.00	-	$0.00	2,345.69	$74,026,815.00	3,136.36	$32,347,697.00	2,341.50	$27,967,672.00	**0.00**	**$ 0.00**	7818.40	$ 94,168,777.00
5.06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	5,147.87	$1,273,940.00	$1,462,757,500.00	$0.00	-	$0.00	54.60	$69,606,304.00	36.79	$70,466,468.00	91.50	$117,075,096.00	**0.00**	**$ 0.00**	202.50	$ 257,972,503.00
5.07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UNID	58.00	$997,594.00	$57,824,632.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	7.00	$6,823,164.00	**0.00**	**$ 0.00**	7.00	$ 6,823,164.00
	SUBTOTAL CUNETAS				**$ 2,427,682,394.00**		**$ 0.00**		**$ 615,439.00**		**$ 152,369,833.00**		**$ 111,156,192.00**		**$ 254,435,183.00**		**$ 0.00**		**$ 420,696,960.00**
6.00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**																		
6.01	SILLETA GUIA PREF. TACTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.30m X 0.30m- 0.60m COLOR AMARILLO TIPO ACTUALIDAD (BALHUEVA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA (1:4) SOLO EL RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO EN SITIO (0.30m Y JUNTAS 0.01 A 0.02)	M	4,826.92	$54,843.00	$370,139,658.00	-	$0.00	148.05	$1,594,933.00	368.28	$16,131,497.00	427.93	$40,710,429.00	**144.05**	**$ 8,183,382.00**	1373.95	$ 78,845,439.00
6.02	PANELA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADICION EN CONCRETO DE 20cm X 15cm X 8cm COLOR AMARILLO PARA DIRIGIR EN MORTERO, APARICIADO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA (1:4) CM, INSTALACION, COMPACTACION, JUNTAS DE LLAGAS CON ARENA	M	4,859.62	$49,976.00	$241,691,252.00	$0.00	-	$0.00	142.00	$6,991,240.00	295.00	$14,781,880.00	166.00	$43,274,528.00	**168.29**	**$ 8,840,167.00**	1402.40	$ 79,630,347.00
6.03	CONSTRUCCION PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3,000 PSI), E=0.10MM FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGUN DISEÑO, INCLUYE EXCAVACION, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION.	M2	1,567.29	$150,366.00	$235,657,128.00	-	$0.00	-	$0.00	1798.00	$25,757,928.00	2055.15	$30,943,047.00	1025.00	$16,190,300.00	**2285.19**	**$ 34,299,465.00**	5131.20	$ 107,690,760.00
6.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE: BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANCHUELA EN CONCRETO	UNID	118.00	$1,008,354.00	$119,009,172.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	12.00	$12,712,248.00	-	$0.00	**22.00**	**$ 20,386,788.00**	34.00	$ 34,618,036.00
6.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.30M X 1.20M, INCLUYE: BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPACIO, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 8CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 3.75M DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UNID	109.00	$1,439,059.00	$183,845,476.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	19.00	$35,023,012.00	-	$0.00	**33.00**	**$ 47,386,680.00**	51.00	$ 73,187,661.00
6.06	BOLARDO ARBOLADO TIPO BARRIO TIPO MEC - 002 EMPOTRADOS EN CONCRETO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UNID	498.00	$269,643.00	$131,693,364.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	**105.00**	**$ 57,238,394.00**	139.00	$ 57,238,394.00
	SUBTOTAL ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS				**$ 1,146,941,908.00**		**$ 0.00**		**$ 26,748,599.00**		**$ 48,877,665.00**		**$ 99,427,324.00**		**$ 108,208,208.00**		**$ 155,188,694.00**		**$ 431,098,797.00**
7.00	**OTRAS ACTIVIDADES**																		
7.01	SITUACION PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4", INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	326.40	$83,347.00	$27,204,461.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	49.89	$4,159,043.00	-	$0.00	**0.00**	**$ 0.00**	49.89	$ 4,159,043.00
7.02	REPARACION DE DOMICILIARIAS ESS, ACUEDUCTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UNID	291.00	$195,844.00	$56,973,164.00	$0.00	32.00	$3,419,936.00	13.00	$1,398,572.00	14.00	$1,709,554.00	-	$0.00	**0.00**	**$ 0.00**	64.00	$ 6,817,444.00
7.03	REUBICACION TAPA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UNID	75.00	$489,334.00	$36,490,050.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	**0.00**	**$ 0.00**	0.00	$ 0.00
7.04	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6" EXCAVACION Y RELLENO	UNID	134.00	$196,918.00	$26,384,612.00	$0.00	13.00	$1,985,160.00	3.00	$458,454.00	3.00	$458,454.00	-	$0.00	**0.00**	**$ 0.00**	16.00	$ 2,443,614.00
	SUBTOTAL OTRAS ACTIVIDADES				**$ 111,052,287.00**		**$ 0.00**		**$ 5,405,096.00**		**$ 1,857,026.00**		**$ 6,049,497.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 13,430,101.00**
8.00	**BOX CULVERT**																		
8.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	615.72	$27,400.00	$16,780,305.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	37.19	$1,580,397.00	6.50	$281,172.00	**0.00**	**$ 0.00**	43.69	$ 1,796,529.00
8.02	SELLO(RTA) PARA REPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	164.70	$14,259.00	$2,348,457.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	62.49	$989,792.00	28.50	$360,685.00	**0.00**	**$ 0.00**	62.00	$ 1,350,367.00
8.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	795.04	$30,675.00	$24,388,867.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	74.30	$2,279,152.00	11.00	$337,425.00	**0.00**	**$ 0.00**	85.30	$ 2,616,578.00
8.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	156.05	$112,283.00	$23,076,908.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	24.99	$2,752,649.00	5.00	$617,941.00	**0.00**	**$ 0.00**	30.00	$ 3,370,590.00
8.05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PEDRAPLEN O SIMILAR)	M3	45.10	$201,334.00	$14,638,577.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	25.00	$7,923,757.00	8.50	$1,941,336.00	**0.00**	**$ 0.00**	44.30	$ 9,865,093.00
8.06	CONCRETO 4000 PSI/280 KG/CM2 (3 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)	M3	270.71	$1,682,443.00	$455,347,326.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	29.60	$49,806,120.00	10.00	$16,826,430.00	**0.00**	**$ 0.00**	39.60	$ 66,632,550.00
8.07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	26,794.85	$31,555.75	$329,332,503.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	3,216.10	$44,481,393.00	979.00	$10,514,433.00	**0.00**	**$ 0.00**	4195.40	$ 54,995,826.00
8.08	BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	M	33.25	$1,653,577.00	$54,995,735.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	**0.00**	**$ 0.00**	0.00	$ 0.00
8.09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UNID	3.00	$12,767,858.00	$38,303,574.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	1.00	$12,767,858.00	-	$0.00	**0.00**	**$ 0.00**	1.00	$ 12,767,858.00
8.10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	M	64.00	$73,494.00	$4,703,616.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	15.00	$1,102,404.00	16.00	$1,175,904.00	**0.00**	**$ 0.00**	32.00	$ 2,353,308.00

	CONTRATO DE OBRA N°:	LP–SIM–008-2025	FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JULIO DE 2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05**
			PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE TERMINACIÓN:	1 DE FEBRERO DE 2026	**$ 1,621,460,253.00**
			VALOR CONTRACTUAL:	**$ 15,716,897,325.00**	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05**
	CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	ACTA PARCIAL DE OBRA N°5:	**$ 1,621,460,253.00**	
	Representante:	NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ	VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	**$ 9,586,122,686.00**	**DEL** 01/12/2025 **HASTA** 31/12/2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% AVANCE FISICO PRESENTE ACTA:	10.32%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
VERSIÓN: 02 **CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYS	% AVANCE ACUMULADO DE OBRA:	54.59%	28/01/2026
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05	Representante:	ARMANDO RAFAEL BULA OTERO			

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE x		ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACTA PARCIAL DE OBRA N°3		ACTA PARCIAL DE OBRA N°4		OBRA EJECUTADA			
																ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
8.11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	94.81	$892,364.00	$11,097,811.00	-	$0.00	-	$0.00	7.50	$6,264,784.00	6.40	$5,647,130.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	13.90	$ 11,911,914.00
	SUBTOTAL 8008 CULVERT				**$ 974,173,116.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 6,264,784.00**		**$ 137,432,254.00**		**$ 30,892,224.00**		**$ 0.00**		**$ 173,749,376.00**
9.00	**SISTEMA DE ALCANTARILLADO**																		
9.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO EN SITIO HASTA BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MAYOR/IGUAL A 1.5M INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO	M3	1.665.66	$29,585.00	$24,351,707.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	349.60	$10,005,004.00	170.00	$5,017,450.00	345.70	$ 2,108,270.00	856.10	$ 17,646,927.00
9.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO EN SITIO HASTA BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MAYOR/IGUAL A 1.5M, INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO.	M3	209.28	$26,429.00	$5,709,212.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	862.53	$39,675.00	$34,408,763.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	444.69	$17,610,700.00	237.00	$9,399,950.00	145.29	$ 4,404,010.00	811.70	$ 31,883,169.00
9.04	S.T.C. DE ENTRADO EN LAMINAS DE HIERRO PARA EXCAVACIONES BAJO CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE HUMEDAD, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. SU MEDIDA SERÁ EN EL SITIO, SE TENDRÁ EN CUENTA PARA EFECTOS DE PAGO, SOLAMENTE LAS ÁREAS NETAS CUBIERTAS POR EL ENTIBADO EN NINGÚN CASO SE CONSIDERARÁ COMO ENTIBADO, LA COLOCACIÓN DE MARCOS ESPACIADOS, CONFORMADOS LIGAMENTO HORIZONTALES MINIMOS EN CUATRO PIEZAS PRESENTADAS HORIZONTALMENTE, NUDOS O CONTRAFUERTE QUE AFECTENLA CALIDAD DEL ENTIBADO	M2	169.16	$99,147.00	$33,176,797.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE 0.10 M DE ARENA EN BRECHAS PARA CIMENTACION DE TUBERIA	M3	111.24	$139,725.00	$14,541,849.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	29.79	$3,987,732.00	14.95	$1,947,453.00	10.10	$ 1,069,207.00	57.30	$ 7,490,543.00
9.06	S.T.C. DE LLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN BRECHAS COMPACTADOS MECANICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD IGUAL O MAYOR DEL 90% DE LA DENSIDAD OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	896.60	$40,266.00	$36,252,756.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	171.70	$ 6,947,156.00	171.70	$ 6,917,105.00
9.07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	994.25	$112,353.00	$74,836,440.00	-	$0.00	-	$0.00	118.69	$13,347,330.00	59.49	$6,673,788.00	463.16	$ 50,522,430.00	625.30	$ 70,703,742.00		
9.08	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	2,166.97	$14,258.00	$45,417,573.00	-	$0.00	-	$0.00	699.00	$14,190,402.00	485.00	$7,398,300.00	770.00	$ 11,693,562.00	2562.00	$ 32,768,137.00		
9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" CON CARACTERISTICAS (PS 9KN/M2- S7 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR.	M	970.62	$80,235.00	$54,508,713.00	-	$0.00	-	$0.00	330.00	$30,764,250.00	165.00	$15,385,155.00	20.60	$ 2,158,375.00	526.00	$ 48,466,120.00		
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 10" CON CARACTERISTICAS (PS 9KN/M2- S7 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR.	M	721.96	$142,395.00	$71,272,740.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" CON CARACTERISTICAS (PS 9KN/M2- S7 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR, PARA DOMICILIARIAS	M	862.00	$73,690.00	$64,508,024.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	564.00	$ 41,506,452.00	564.00	$ 41,506,452.00
9.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4" X 6" X 45 GRADOS PARA TUBERIA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO	UNO	150.69	$223,632.00	$33,698,300.00	-	$0.00	-	$0.00	10.00	$2,239,320.00	49.00	$10,958,568.00	34.00	$ 7,607,346.00	84.00	$ 18,805,443.00		
9.13	CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION D 1.2 M, TRUPI ADECUADO MENORES DE 2 METROS EN CONCRETO DE 210 KG/CM2, INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	UND	93.00	$4,493,643.00	$44,530,430.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	6.00	$26,966,256.00	1.00	$ 4,493,643.00	7.00	$ 31,459,301.00
9.14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.60M EN CONCRETO DE 21N/MM2 INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	100.00	$403,845.00	$69,577,268.00	-	$0.00	1.00	$403,845.00	-	$0.00	2.00	$807,690.00	-	$0.00	77.00	$ 30,716,256.00	80.00	$ 32,167,845.00
	SUBTOTAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO				**$ 575,159,597.00**		**$ 0.00**		**$ 403,845.00**		**$ 0.00**		**$ 57,924,225.00**		**$ 77,366,265.40**		**$ 173,376,488.00**		**$ 257,205,686.40**
10.00	**COMPONENTE ELECTRICO**																		
	RED DE MEDIA TENSION (10.2KV) VOL.						$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.01	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	4.00	$4,156,695.30	$16,474,372.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.02	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	4.00	$923,017.30	$3,657,668.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICION EN BANDERA A 13.2 KV., S. INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	3.00	$5,436,106.00	$16,308,318.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.04	SUMINISTRO, INSTAL, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA Nº 1/0 DESNUDA AEREA EN CABLE DE ALUMINIO ACSR, 6/1 - 1/0 AWG	M	660.00	$199,329.00	$69,197,468.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.05	INSTALACION CON TORNILLO DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT. SENCILLO A 13.2 KV.	UND	3.00	$5,389,199.00	$16,668,597.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.06	INSTALACION DE TENSION A 13.2 KV DE POSTE EN CONCRETO	UND	3.00	$9,952,594.00	$19,858,362.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL RED DE MEDIA TENSION (13.2KV) VOL.				**$ 159,139,787.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.																		
10.07	INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	14.00	$1,219,025.00	$17,066,350.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	
10.08	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE ORIENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	14.00	$656,140.30	$9,511,990.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO SIMPLE AL P.A. PARA ST A POSTE VOL.	UND	16.00	$1,154,894.00	$18,541,664.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.10	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA ST BANDA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	1,500.00	$94,571.00	$765,867,809.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.11	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9MTS - 1050 KGF - 750 KGF - 510 KGF).	UND	14.00	$1,284,850.50	$43,676,316.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.12	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	2,600.00	$50,973.00	$73,125,600.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.				**$ 207,297,999.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.																		
10.13	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2x4) - 1 Tx4) - 6 / 1 AWG.	M	1,234.00	$75,494.00	$93,648,596.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REMEDICION DE MEDIDOR (240/120) VOL	UND	7.00	$2,210,420.00	$8,557,940.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	10.00	$960,557.30	$9,626,076.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL				**$ 911,193,540.54**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	SUBTOTAL OBRA				**$ 10,479,993,399.00**		**$ 0.00**		**$ 1,703,106,024.00**		**$ 1,234,688,178.00**		**$ 2,227,660,374.00**		**$ 1,660,568,977.00**		**$ 1,621,460,253.00**		**$ 9,586,122,686.00**
	PAGO				$ 705,436,398.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	PAPSO				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	TRAMITES AUTORIDAD AMBIENTAL				$ 26,369,705.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	TRAMITES y LEGALIZACIONES (AFINIA)				$ 13,936,872.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 15,716,897,325.00**		**$ 0.00**		**$ 1,703,106,024.00**		**$ 1,234,688,178.00**		**$ 2,227,660,374.00**		**$ 1,660,568,977.00**		**$ 1,621,460,253.00**		**$ 9,586,122,686.00**
	ANTICIPO				0%												$ 1,621,460,253.00		
	VALOR TOTAL																		

BALANCE PRESUPUESTAL

	VR/ INICIAL CONTRATO:	**$ 15,716,897,325.00**
	VR/ ADICIONES:	**$ 0.00**
	VR/ ACTUAL CONTRATO:	**$ 15,716,897,325.00**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL INICIAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	COSTO TOTAL IMPREVISTO	% IMPREVISTO	COSTO IMPREVISTO POR ACTA				DESCUENTO IMPREVISTO	PAGO DE IMPREVISTO JUSTIFICADO	VALOR FACTURADO ACUMULADO	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1	N° 2026012196 / 04/02/2026	$1,703,106,024.00	11.19%	$0.00	$ 0.00	$170,310,602.00	1%	$10,181,629.00				$10,181,629.00	$0.00	$1,730,974,950.00		$1,730,974,950.00
2	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	2026000885 de fecha 19/02/2026	$1,234,688,178.00	7.86%	$0.00	$ 0.00	$148,360,837.00	1%	$8,284,437.00				$8,284,437.00	$0.00	$1,239,345,741.00		$2,969,320,691.00

	CONTRATO DE OBRA N°:	LP-SIM-008-2025	FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JULIO DE 2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05**
			PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE TERMINACIÓN:	1 DE FEBRERO DE 2026	**$ 1,621,460,253.00**
			VALOR CONTRACTUAL:	**$ 15,716,987,925.00**	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05**
	CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	ACTA PARCIAL DE OBRA N°5:	**$ 1,621,460,253.00**	
	Representante:	NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ	VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	**$ 8,588,122,806.00**	**DEL** 01/12/2025 **HASTA** 31/12/2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% AVANCE FISICO PRESENTE ACTA:	**10.32%**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
VERSIÓN: 02 CÓDIGO: SI-SUP-004	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	% AVANCE ACUMULADO DE OBRA:	**54.10%**	**20/01/2026**
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05	Representante:	ARMANDO RAFAEL BULA OTERO			

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE +		ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		ACTA PARCIAL DE OBRA N°3		ACTA PARCIAL DE OBRA N°4		OBRA EJECUTADA			
																ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	%UNT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3	ACTA PARCIAL DE OBRA N°3	25987556 de fecha 04/12/2025	52,021,665,574.00	14.14%	$0.00	$ 0.00	$16,190,907.03	1%	$16,794,252.02						$16,794,252.02	$0.00	$2,394,961,372.03		$5,170,460,369.03
4	ACTA PARCIAL DE OBRA N°4	25987979 de fecha 19/12/2025	51,668,909,977.00	10.62%	$0.00	$ 0.00	$16,360,527.03	1%	$12,949,947.00						$12,549,947.00	$0.00	$1,490,461,880.00		$4,836,143,386.53
5	ACTA PARCIAL DE OBRA N°5	EN TRAMITE	51,621,460,253.00	10.32%	$0.00	$ 0.00	$16,360,527.03	1%	$12,791,436.00						$12,791,436.00	$0.00		$1,609,268,823.00	$8,436,211,361.03
TOTAL			$0,000,122,806.00	54.10%	$0.00	$0.00	$48,360,527.09	3%	$42,915,635.02						$42,915,635.02	$0.00	$3,884,423,252.03	$1,609,268,823.00	$8,436,211,361.03

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, el dia 20/01/2026

TOTAL NETO A PAGAR: **$ 1,609,268,823.00**

SON: **MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

CONSORCIO MTR
NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
ARMANDO RAFAEL BULA OTERO
INTERVENTOR

Revisó: Hugo Martinez Contratista SIM
Revisó: Rodrigo Moreno- Apoyo a la supervisión

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO:	CORDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES			**SUBCAPITULO**	NA
ITEM	1.02	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO		**UNIDAD**	M


# ITEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	
ACTA PARCIAL 1							
1.02	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	**BARRIO LA GRANJA** (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5)	K0+028.00	K0+141.00	BORDILLO ANDÉN EXISTENTE	113.00	1.00	113.00
		BARRIO URBINA (CARRERA 14 ENTRE CALLES 13 Y 15A)	K0+088.80	K0+088.80	BORDILLO BOCACALLE	6.70	1.00	6.70
			K0+004.00	K0+004.00		8.40	1.00	8.40
		BARRIO RISARALDA (CRA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B	K0+160.00	K0+160.00		6.00	1.00	6.00
			K0+150.00	K0+150.00		6.00	1.00	6.00
			K0+104.00	K0+104.00		6.00	1.00	6.00
			K0+091.00	K0+091.00		6.00	1.00	6.00
			K0+003.00	K0+003.00		6.00	1.00	6.00
ACTA PARCIAL 2							
1.02	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	**BARRIO LA GRANJA** (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+000.00	K0+050.20	BORDILLO ANDÉN EXISTENTE	50.20	1.00	50.20
ACTA PARCIAL 3							
1.02	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	**BARRIO LA GRANJA** (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+000.00	K0+008.00	BORDILLO RAMPAS VEHICULARES	8.00	1.00	8.00
		BARRIO RISARALDA (CRA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	K0+203.50	K0+231.00	BORDILLO CONJUNTO - LADO DERECHO	27.50	1.00	27.50
			K0+057.10	K0+075.00	TERRAZAS - LADO IZQUIERDO	17.90	1.00	17.90
		BARRIO CHAMBACU (CALLE 22C ENTRE CARRERAS 9A Y 10)	K0+012.50	K0+022.50	BORDILLO PAVIMENTO EXISTENTE	10.00	1.00	10.00
ACTA PARCIAL 4							
NO COBRÓ							
ACTA PARCIAL 5							
1.02	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	**BARRIO LACHARME** (CARRERA 8C ENTRE CALLES 14 Y 15)	K0+000.00	K0+088.00	BORDILLO PARQUE	88.00	1.00	88.00
		BARRIO LACHARME (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 8C Y 8D)	K0+007.00	K0+039.00	BORDILLO PARQUE	32.00	1.00	32.00

TOTAL ACUMULADO	**391.70**
ACTA N°1	**158.10**
ACTA N°2	**50.20**
ACTA N°3	**63.40**
ACTA N°4	**0.00**
ACTA N°5	**120.00**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
1.02	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	**FECHA** 20/01/2026



DEMOLICION DE BORDILLO ANDEN EXISTENTE



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORIA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/03/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**SUBCAPITULO**	NA
ITEM	1.03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	**UNIDAD** M


# ÍTEM		LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA	ABSCISA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)		
ACTA PARCIAL 1								
NO COBRÓ								
ACTA PARCIAL 2								
NO COBRÓ								
ACTA PARCIAL 3								
1.03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	**BARRIO URBINA** (CARRERA 14 ENTRE CALLES 13 Y 15A)	KD+003.00	KD+088.00	TERRAZAS DERECHO	85.00	1.00	85.00
		BARRIO RISARALDA (CRA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	KD+104.30	KD+152.00	TERRAZAS - LADO IZQUIERDO	47.70	1.00	47.70
ACTA PARCIAL 4								
1.03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	**BARRIO OBRERO** (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	KD+003.00	KD+073.00	TERRAZAS DERECHO	70.00	1.00	70.00
			KD+079.00	KD+109.00	TERRAZAS DERECHO	30.00	1.00	30.00
			KD+003.00	KD+032.00	TERRAZAS - LADO IZQUIERDO	29.00	1.00	29.00
			KD+038.00	KD+073.00	TERRAZAS - LADO IZQUIERDO	35.00	1.00	35.00
			KD+079.00	KD+119.00	TERRAZAS - LADO IZQUIERDO	40.00	1.00	40.00
		BARRIO OBRERO (CRA 11 ENTRE CALLE 14 Y AV CIRCUNVALAR	KD+000.00	KD+050.00	TERRAZAS DERECHO	50.00	1.00	50.00
			KD+000.00	KD+050.00	TERRAZAS - LADO IZQUIERDO	50.00	1.00	50.00
ACTA PARCIAL 5								
1.03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	**BARRIO CHAMBACÚ** (CARRERA 19 ENTRE CALLE 22 Y 22C)	KD+045.00	KD+122.43	IZQUIERDO	77.43	1.00	77.43
		BARRIO BALBOA (CALLES 17A ENTRE CARRERAS 8B Y 9)	KD+005.00	KD+034.86	DERECHO	29.86	1.00	29.86
			KD+080.00	KD+125.52	DERECHO	45.52	1.00	45.52
		BARRIO LACHARME (CARRERA 8C ENTRE LAS CALLES 14 Y 15)	KD+038.00	KD+055.53	IZQUIERDO	17.53	1.00	17.53
		BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE LAS CALLES 15 Y 16B)	KD+016.00	KD+062.75	DERECHO	46.75	1.00	46.75
			KD+042.00	KD+049.86	IZQUIERDO	7.86	1.00	7.86
			KD+105.00	KD+135.68	IZQUIERDO	30.68	1.00	30.68
			KD+128.00	KD+151.96	DERECHO	23.96	1.00	23.96
			KD+168.00	KD+231.94	IZQUIERDO	63.94	1.00	63.94
		BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE LAS CALLES 16 Y 16B)	KD+000.00	KD+051.00	DERECHO	51.00	1.00	51.00
		BARRIO OBRERO (CALLEL 14 ENTRE LAS CARRERAS 9 Y 12)	KD+005.00	KD+037.76	IZQUIERDO	32.76	1.00	32.76
			KD+008.00	KD+073.32	DERECHO	65.32	1.00	65.32
			KD+043.00	KD+073.78	IZQUIERDO	30.78	1.00	30.78
			KD+081.00	KD+109.88	DERECHO	28.88	1.00	28.88
			KD+081.00	KD+115.68	IZQUIERDO	34.68	1.00	34.68
		BARRIO OBRERO (CARRERA 12 ENTRE AV. CIRC Y CALLE 14)	KD+007.00	KD+034.67	DERECHO	27.67	1.00	27.67
			KD+007.00	KD+065.28	IZQUIERDO	58.28	1.00	58.28
			KD+053.00	KD+076.66	DERECHO	23.66	1.00	23.66
		BARRIO OBRERO (CARRERA 11 ENTER AV. CIRC Y CALLE 14)	KD+000.00	KD+050.00	DERECHO	50.00	1.00	50.00
			KD+000.00	KD+049.80	IZQUIERDO	49.80	1.00	49.80

		BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE LAS CALLES 13 Y 15A)	K0+003.90	K0+088.00	TERRAZAS DERECHO	85.00	1.00	85.00
TOTAL ACUMULADO								**221.40**
ACTA N°1								**0.00**
ACTA N°2								**0.00**
ACTA N°3								**132.70**
ACTA N°4								**304.00**
ACTA N°5								**488.70**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1		Página 2 de 2
	1.03	**CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA**	**FECHA** 20/03/2026







CORTE DE PLANTILLA DE CONCRETO
BARRIO URBINA

CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORIA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUBCAPITULO**	**NA**		
ITEM	**1.04**	**DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO**		**UNIDAD**	**M2**

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 2											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 3											
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	**BARRIO LA GRANJA** (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+010.00	K0+050.20	ANDENES LADO IZQUIERDO	40.20	1.50		60.30	1.00	60.30
			K0+000.00	K0+010.00	ANDENES LADO IZQUIERDO	10.00	2.10		21.00	1.00	21.00
		BARRIO RISARALDA (CRA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B	K0+203.50	K0+231.00	ANDENES LADO DERECHO	27.50	1.10		30.25	1.00	30.25
			K0+057.10	K0+075.00	ANDENES LADO DERECHO	17.90	0.55		9.85	1.00	9.85
			K0+104.00	K0+153.27	ANDENES LADO IZQUIERDO	49.27	1.05		51.73	1.00	51.73
		BARRIO URBINA (CARRERA 14 ENTRE CALLES 13 Y 15A)	K0+003.00	K0+024.00	ANDENES LADO DERECHO	21.00	0.70		14.70	1.00	14.70
			K0+024.00	K0+036.00		12.00	1.25		15.00	1.00	15.00
			K0+036.00	K0+044.00		8.00	0.70		5.60	1.00	5.60
			K0+044.00	K0+088.00		44.00	0.45		19.80	1.00	19.80
ACTA PARCIAL 4											
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	**BARRIO LA GRANJA** (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+010.00	K0+050.20	ANDENES LADO IZQUIERDO	40.20	1.50		60.30	1.00	60.30
			K0+000.00	K0+010.00	ANDENES LADO IZQUIERDO	10.00	2.10		21.00	1.00	21.00
		BARRIO RISARALDA (CRA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B	K0+203.50	K0+231.00	ANDENES LADO DERECHO	27.50	1.10		30.25	1.00	30.25
			K0+057.10	K0+075.00	ANDENES LADO DERECHO	17.90	0.55		9.85	1.00	9.85
			K0+104.00	K0+153.27	ANDENES LADO IZQUIERDO	49.27	1.05		51.73	1.00	51.73
		BARRIO URBINA (CARRERA 14 ENTRE CALLES 13 Y 15A)	K0+002.00	K0+024.00	ANDENES LADO DERECHO	22.00	0.80		17.60	1.00	17.60
			K0+024.00	K0+036.00		12.00	1.25		15.00	1.00	15.00
			K0+036.00	K0+044.00		8.00	1.00		8.00	1.00	8.00
			K0+044.00	K0+088.50		44.50	0.90		40.05	1.00	40.05
ACTA PARCIAL 5											
		BARRIO CHAMBACÚ (CARRERA 10 ENTRE CALLE 22 Y 22C)	IZQUIERDO	K0+045.00	K0+122.43	77.43	0.50		38.72	1.00	38.72
		BARRIO BALBOA (CALLES 17A ENTRE CARRERAS 8B Y 9)	DERECHO	K0+005.00	K0+034.86	29.86	0.30		8.96	1.00	8.96
			DERECHO	K0+080.00	K0+125.52	45.52	0.10		4.55	1.00	4.55
		BARRIO LACHARME (*CARRERA 6C ENTRE LAS* CALLES 14 Y 15)	*IZQUIERDO*	*K0+038.00*	*K0+055.53*	*17.53*	*0.71*		*12.45*	*1.00*	*12.45*
		BARRIO RISARALDA (CRA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	DERECHO	K0+203.00	K0+231.00	28.00	1.10		30.80	1.00	30.80
			IZQUIERDO	K0+057.10	K0+075.00	17.90	0.55		9.85	1.00	9.85
			DERECHO	K0+016.00	K0+057.10	41.10	0.50		20.55	1.00	20.55
			IZQUIERDO	K0+042.00	K0+049.86	7.86	0.15		1.18	1.00	1.18
			IZQUIERDO	K0+104.00	K0+153.27	49.27	1.05		51.73	1.00	51.73
			DERECHO	K0+128.00	K0+151.96	23.96	0.40		9.58	1.00	9.58
			IZQUIERDO	K0+168.00	K0+231.94	63.94	1.20		76.73	1.00	76.73
		BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE LAS CALLES 16 Y 16B)	DERECHO	K0+051.00	K0+090.62	39.62	0.15		5.94	1.00	5.94
		BARRIO OBRERO (CALLEL 14 ENTRE LAS CARRERAS 9 Y 12)	IZQUIERDO	K0+003.30	K0+037.76	34.46	1.10		37.91	1.00	37.91
			DERECHO	K0+006.70	K0+073.32	66.62	1.00		66.62	1.00	66.62
			IZQUIERDO	K0+055.00	K0+073.78	18.78	0.90		16.90	1.00	16.90
			DERECHO	K0+081.00	K0+109.88	28.88	0.84		24.26	1.00	24.26
			IZQUIERDO	K0+081.00	K0+115.68	34.68	1.20		41.62	1.00	41.62
		BARRIO OBRERO (CARRERA 12 ENTRE AV. CIRC Y CALLE 14)	DERECHO	K0+007.00	K0+034.67	27.67	0.80		22.14	1.00	22.14
			IZQUIERDO	K0+007.00	K0+065.28	58.28	0.90		52.45	1.00	52.45
			DERECHO	K0+053.00	K0+115.68	62.68	0.80		50.14	1.00	50.14
		BARRIO OBRERO (CARRERA 11 ENTER AV. CIRC Y CALLE 14	DERECHO	K0+000.00	K0+014.39	14.39	0.80		11.51	1.00	11.51
			IZQUIERDO	K0+000.00	K0+013.54	13.54	0.80		10.83	1.00	10.83
		BARRIO URBINA (CARRERA 14 ENTRE CALLES 13 Y 15A)	-	K0+003.00	K0+044.00	41.00	0.70		28.70	1.00	28.70
			-	K0+024.00	K0+036.00	12.00	0.55		6.60	1.00	6.60
			-	K0+044.00	K0+088.00	44.00	0.45		19.80	1.00	19.80
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE LAS TRANSVERSALES 4 Y 5)	-	K0+010.00	K0+050.20	40.20	1.50		60.30	1.00	60.30
			-	K0+000.00	K0+010.00	10.00	2.10		21.00	1.00	21.00
TOTAL ACUMULADO											**741.80**
ACTA N° 1											**0.00**

ACTA N° 2	0.00
ACTA N° 3	228.23
ACTA N° 4	25.57
ACTA N° 5	488.00


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1		Página 2 de 2
	1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	FECHA 20/01/2026




DEMOLICION DE BORDILLOS BARRIO LA GRANJA



DEMOLICION DE BORDILLOS BARRIO RISARALDA





CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**SUBCAPITULO**	**NA**	
ITEM	**1.07**	**EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES**		**UNIDAD**	**M3**

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	VOLUMEN(M3)		
ACTA PARCIAL 1											
1.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	**BARRIO LA GRANJA** (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5	K0+000.00	K0+141.00	VER CARTERA	141.00	7.40	0.510	532.13	1.00	532.13
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5	K0+025.00	K0+025.00	DESCUENTO CÁRCAMO	-0.90	7.40	0.510	-3.40	1.00	-3.40
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+000.00	K0+051.00	VER CARTERA	51.00	7.40	0.452	170.58	1.00	170.60
		BARRIO RISARALDA (CRA 11 ENTRE LAS CALLES 15 Y 16B)	K0+003.00	K0+091.40	VER CARTERA	88.40	6.40	0.450	254.59	1.00	254.60
			K0+104.30	K0+152.00		47.70	6.40	0.520	158.75	1.00	158.70
			K0+163.50	K0+231.00		67.50	6.40	0.420	181.44	1.00	181.40
		BARRIO URBINA (CRA 14B ENTRE LAS CALLES 13 Y 15A)	K0+003.00	K0+088.80	VER CARTERA	85.80	6.40	0.880	483.23	1.00	483.20
		BARRIO VILLACIELO (CRA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0+294.66	K0+445.00	VER CARTERA	150.34	4.90	0.628	462.63	1.00	462.60
ACTA PARCIAL 2											
1.07		**BARRIO OBRERO** (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0+006.60	K0+078.00	VER CARTERA	71.40	5.40	0.450	173.50	1.00	173.50
			K0+003.00	K0+003.70		0.70	2.70	0.420	0.79	1.00	0.80
			K0+003.00	K0+006.60		3.60	2.70	0.500	4.86	1.00	4.90
			K0+006.00	K0+006.60		0.60	2.70	0.420	0.68	1.00	0.70
		BARRIO CHAMBACÚ (CARRERA 10 ENTRE CALLES 22 Y 22C)	K0+003.00	K0+123.00	VER CARTERA	120.00	5.40	0.910	589.68	1.00	589.70
		BARRIO VILLACIELO (CRA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0+150.00	K0+275.00	VER CARTERA	125.00	4.90	0.700	428.75	1.00	428.80
			K0+445.00	K0+497.00		52.00	4.90	0.700	178.36	1.00	178.40
			K0+000.00	K0+100.00		100.00	4.90	0.700	343.00	1.00	343.00


ACTA PARCIAL 3											
1.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	**BARRIO LA GRANJA** (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5	K0+000.00	K0+141.00	VER CARTERA	141.00	7.40	0.510	532.13	1.00	532.13
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5	K0+025.00	K0+025.00	DESCUENTO CÁRCAMO	-0.90	7.40	0.510	-3.40	1.00	-3.40
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+000.00	K0+051.00	VER CARTERA	51.00	7.40	0.452	170.58	1.00	170.58
		BARRIO RISARALDA (CRA 11 ENTRE LAS CALLES 15 Y 16B)	K0+003.00	K0+091.40	VER CARTERA	88.40	6.40	0.450	254.59	1.00	254.59
			K0+104.30	K0+152.00		47.70	6.40	0.520	158.75	1.00	158.75
			K0+163.50	K0+231.00		67.50	6.40	0.420	181.44	1.00	181.44
		BARRIO URBINA (CRA 14B ENTRE LAS CALLES 13 Y 15A)	K0+003.00	K0+088.80	VER CARTERA	85.80	6.40	0.880	483.23	1.00	483.23
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0+006.60	K0+078.00	VER CARTERA	71.40	5.40	0.450	173.50	1.00	173.50
			K0+003.00	K0+003.70		0.70	2.70	0.420	0.79	1.00	0.79
			K0+003.00	K0+006.60		3.60	2.70	0.500	4.86	1.00	4.86
			K0+006.00	K0+006.60		0.60	2.70	0.420	0.68	1.00	0.68
		BARRIO CHAMBACÚ (CARRERA 10 ENTRE CALLES 22 Y 22C)	K0+003.00	K0+123.00	VER CARTERA	120.00	5.40	0.910	589.68	1.00	589.68
			K0+000.00	K0+023.60	VER CARTERA	23.60	5.40	0.910	115.97	1.00	115.97
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0+078.00	K0+119.00	VER CARTERA	41.00	5.40	0.435	96.31	1.00	96.31
		BARRIO OBRERO (CARRERA 12 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	K0+004.00	K0+073.40	VER CARTERA	69.40	6.40	0.436	193.65	1.00	193.65
		BARRIO OBRERO (CARRERA 11 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	K0+000.00	K0+050.00	VER CARTERA	50.00	5.20	0.433	112.58	1.00	112.58
		BARRIO LACHARME (CALLE 14 ENTRE CARRERA 8C Y 8D)	K0+007.00	K0+039.00	VER CARTERA	32.00	7.40	0.631	149.42	1.00	149.42
		BARRIO LACHARME (CRA 8C ENTRE LAS CALLES 14 Y 15)	K0+003.50	K0+083.60	VER CARTERA	80.10	4.40	0.627	220.98	1.00	220.98
		BARRIO BALBOA (CALLE 17A ENTRE CARRERAS 8B Y 9)	K0+003.00	K0+115.00	VER CARTERA	112.00	5.40	0.557	336.87	1.00	336.87
		BARRIO BALBOA (CALLE 18 ENTRE CARRERAS 8B Y 9)	K0+003.00	K0+119.50	VER CARTERA	116.50	5.40	0.957	602.05	1.00	602.05
		BARRIO VILLACIELO (CRA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0+000.00	K0+150.00	VER CARTERA	150.00	4.90	0.700	514.50	1.00	514.50
			K0+150.00	K0+278.00		128.00	4.90	0.700	439.04	1.00	439.04
			K0+279.50	K0+294.60		15.10	4.90	0.700	51.79	1.00	51.79
			K0+294.60	K0+496.70		202.10	4.90	0.700	693.20	1.00	693.20
			K0+497.60	K0+498.70		1.10	4.90	0.700	3.77	1.00	3.77
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+250.00	VER CARTERA	250.00	5.40	0.958	1293.30	1.00	1293.30
			K0+250.00	K0+260.00	VER CARTERA	10.00	5.15	0.997	51.35	1.00	51.35
			K0+260.00	K0+330.00	VER CARTERA	70.00	4.90	0.849	291.21	1.00	291.21

ACTA PARCIAL 4										
	BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	K0+000.00	K0+048.00		48.00	6.40	0.510	156.67	1.00	156.67
	LA JULIA CALLE 15 ENTRE LA AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 15)	K0+000.00	K0+050.00		50.00	6.40	0.510	163.20	1.00	163.20
	LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+110.00		110.00	7.40	0.452	367.93	1.00	367.93
	BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+740.00	K0+890.00		150.00	4.90	0.450	330.75	1.00	330.75
ACTA PARCIAL 5										
	BARRIO BALBOA (CALLE 18 ENTRE CARRERAS 8B Y 9)	K0+000.00	K0+115.00		115.00	5.40	0.800	496.80	1.00	496.80
	BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+600.00	K0+897.17		297.17	4.90	0.800	1164.91	1.00	1164.91
TOTAL ACUMULADO										**10393.10**
ACTA N°1										**2239.83**
ACTA N°2										**1719.80**
ACTA N°3										**3753.17**
ACTA N°4										**1018.60**
ACTA N°5										**1661.70**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
	1.07 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	FECHA 20/01/2026



EXCAVACION MECANICA EN BARRIO LACHARME





EXCAVACION MECANICA EN BARRIO VILLA CIELO



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**SUBCAPITULO**	**NA**	
ITEM	**1.08**	**CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE**		**UNIDAD**	**M3**

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN					CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	VOLUMEN(M3)	%EXPANSION		
ACTA PARCIAL 1												
1.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	**BARRIO LA GRANJA** (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5	K0+000.00	K0+141.00	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	141.00	7.40	0.510	532.10	1.30	1.00	691.73
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5	K0+025.00	K0+025.00	DESCUENTO CÁRCAMO	-0.90	7.40	0.510	-3.40	1.30	1.00	-4.42
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+000.00	K0+051.00	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	51.00	7.40	0.452	170.60	1.30	1.00	221.78
		BARRIO RISARALDA (CRA 11 ENTRE LAS CALLES 15 Y 16B)	K0+003.00	K0+091.40		88.40	6.40	0.450	254.60	1.30	1.00	330.98
			K0+104.30	K0+152.00		47.70	6.40	0.520	158.70	1.30	1.00	206.31
			K0+163.50	K0+231.00		67.50	6.40	0.420	181.40	1.30	1.00	235.82
		BARRIO URBINA (CRA 14B ENTRE LAS CALLES 13 Y 15A)	K0+003.00	K0+088.80		85.80	6.40	0.880	483.20	1.30	1.00	628.16
		BARRIO VILLACIELO (CRA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0+294.66	K0+445.00		150.34	4.90	0.628	462.60	1.30	1.00	601.38
1.06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	**BARRIO URBINA** (CARRERA 14B ENTRE CALLE 13 Y 15A)	K0 +014.00	K0 +033.40	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	19.40	2.00	0.20	7.76	1.30	1.00	10.09
			K0 +015.00	K0 +024.00		9.00	3.00	0.20	5.40	1.30	1.00	7.02
			K0 +042.90	K0 +046.20		3.30	1.60	0.20	1.06	1.30	1.00	1.38
			K0 +050.00	K0 +053.00		3.00	2.00	0.40	2.40	1.30	1.00	3.12
			K0 +082.00	K0 +085.00		3.00	2.00	0.40	2.40	1.30	1.00	3.12
			K0 +082.80	K0 +086.40		3.60	1.30	0.40	1.90	1.30	1.00	2.47
		BARRIO VILLACIELO (ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0 +331.00	K0 +335.00		4.00	2.70	0.20	2.16	1.30	1.00	2.81
			K0 +316.70	K0 +320.00		3.30	3.21	0.20	2.12	1.30	1.00	2.76
			K0 +319.00	K0 +325.00		6.00	4.90	0.20	5.88	1.30	1.00	7.64
			K0 +340.00	K0 +347.00		7.50	1.60	0.20	2.40	1.30	1.00	3.12
			K0 +350.00	K0 +355.00		5.00	4.00	0.20	4.00	1.30	1.00	5.20
			K0 +390.00	K0 +393.10		3.10	3.20	0.30	2.98	1.30	1.00	3.87
			K0 +406.00	K0 +411.00		5.00	2.60	0.30	3.90	1.30	1.00	5.07
		BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	K0 +190.00	K0 +190.60		0.60	0.80	0.20	0.10	1.30	1.00	0.13
			K0 +210.00	K0 +210.60		0.60	0.80	0.20	0.10	1.30	1.00	0.13
		BARRIO LA GRANJA (DAIGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5)	K0 +100.00	K0 +135.00		35.00	1.30	0.60	27.30	1.30	1.00	35.49
			K0 +060.00	K0 +075.00		15.00	1.50	0.40	9.00	1.30	1.00	11.70
			K0 +108.00	K0 +127.00		19.00	2.30	0.70	30.59	1.30	1.00	39.77
			K0 +020.00	K0 +026.20		6.20	3.80	0.30	7.07	1.30	1.00	9.19
			K0 +023.00	K0 +024.00		1.00	1.00	0.30	0.30	1.30	1.00	0.39

ACTA PARCIAL 2												
1.06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	**BARRIO URBINA** (CARRERA 14B ENTRE CALLE 13 Y 15A)	K0 +014.00	K0 +033.40	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	19.40	2.60	0.20	7.76	1.30	1.00	10.09
			K0 +015.00	K0 +024.00		9.00	3.00	0.20	5.40	1.30	1.00	7.02
			K0 +042.90	K0 +046.20		3.30	1.60	0.20	1.06	1.30	1.00	1.38
			K0 +050.00	K0 +053.00		3.00	2.00	0.40	2.40	1.30	1.00	3.12
			K0 +082.00	K0 +085.00		3.00	2.00	0.40	2.40	1.30	1.00	3.12
			K0 +082.80	K0 +086.40		3.60	1.30	0.40	1.90	1.30	1.00	2.47
		BARRIO VILLACIELO (ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0 +331.00	K0 +335.00		4.00	2.70	0.20	2.16	1.30	1.00	2.81
			K0 +316.70	K0 +320.00		3.30	3.21	0.20	2.12	1.30	1.00	2.76
			K0 +319.00	K0 +325.00		6.00	4.90	0.20	5.88	1.30	1.00	7.64
			K0 +340.00	K0 +347.00		7.50	1.60	0.20	2.40	1.30	1.00	3.12
			K0 +350.00	K0 +355.00		5.00	4.00	0.20	4.00	1.30	1.00	5.20
			K0 +390.00	K0 +393.10		3.10	3.20	0.30	2.98	1.30	1.00	3.87
			K0 +406.00	K0 +411.00		5.00	2.60	0.30	3.90	1.30	1.00	5.07
		BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	K0 +190.00	K0 +190.60		0.60	0.80	0.20	0.10	1.30	1.00	0.13
			K0 +210.00	K0 +210.60		0.60	0.80	0.20	0.10	1.30	1.00	0.13
		BARRIO LA GRANJA (DAIGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5)	K0 +100.00	K0 +135.00		35.00	1.30	0.60	27.30	1.30	1.00	35.49
			K0 +060.00	K0 +075.00		15.00	1.50	0.40	9.00	1.30	1.00	11.70
			K0 +108.00	K0 +127.00		19.00	2.30	0.70	30.59	1.30	1.00	39.77
			K0 +020.00	K0 +026.20		6.20	3.80	0.30	7.07	1.30	1.00	9.19
			K0 +023.00	K0 +024.00		1.00	1.00	0.30	0.30	1.30	1.00	0.39
1.06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	**BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERA 9 Y 12)**	K0 +004.00	K0 +004.00	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	2.00	2.50	0.30	1.50	1.3	1.00	2.00
			K0 +005.00	K0 +005.00		2.00	2.00	0.30	1.20	1.3	1.00	1.60
			K0 +010.00	K0 +010.00		3.00	6.80	0.30	6.12	1.3	1.00	8.00
			K0 +060.00	K0 +063.60		3.60	1.70	0.40	2.45	1.3	1.00	3.20
			K0 +040.00	K0 +040.00		2.00	5.00	0.40	4.00	1.3	1.00	5.20
		BARRIO CHAMBACU (CARRERA 10 ENTRE CALLES 22 Y 22C)	K0 +050.00	K0 +063.50		13.50	3.30	0.30	13.37	1.3	1.00	17.40
		BARRIO VILLA CIELO (CARRERA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0 +483.00	K0 +495.00		12.00	2.00	0.30	7.20	1.3	1.00	9.40
			K0 +000.00	K0 +100.00		100.00	4.50	0.40	180.00	1.3	1.00	234.00
			K0 +130.00	K0 +160.00		30.00	4.50	0.50	67.50	1.3	1.00	87.80
			K0 +214.00	K0 +218.00		4.00	5.10	0.50	10.20	1.3	1.00	13.30
1.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	**BARRIO OBRERO** (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0+006.60	K0+078.00	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	71.40	5.40	0.450	173.50	1.3	1.00	225.60
			K0+003.00	K0+003.70		0.70	2.70	0.420	0.79	1.3	1.00	1.00
			K0+003.00	K0+006.60		3.60	2.70	0.500	4.86	1.3	1.00	6.30
			K0+006.00	K0+006.60		0.60	2.70	0.420	0.68	1.3	1.00	0.90
		BARRIO CHAMBACÚ (CARRERA 10 ENTRE CALLES 22 Y 22C)	K0+003.00	K0+123.00		120.00	5.40	0.910	589.68	1.3	1.00	766.60
		BARRIO VILLACIELO (CRA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0+150.00	K0+275.00		125.00	4.90	0.700	428.75	1.3	1.00	557.40
			K0+445.00	K0+497.00		52.00	4.90	0.700	178.36	1.3	1.00	231.90
			K0+000.00	K0+100.00		100.00	4.90	0.700	343.00	1.3	1.00	445.90


ACTA PARCIAL 3												
1.06	BARRIO CHAMBACÚ (CARRERA 10 ENTRE CALLES 22 Y 22C)	**BARRIO URBINA** (CARRERA 14B ENTRE CALLE 13 Y 15A)	K0 +014.00	K0 +033.40	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	19.40	2.60	0.20	7.76	1.3	1.00	10.10
			K0 +015.00	K0 +024.00		9.00	3.00	0.20	5.40	1.3	1.00	7.00
			K0 +042.90	K0 +046.20		3.30	1.60	0.20	1.06	1.3	1.00	1.40
			K0 +050.00	K0 +053.00		3.00	2.00	0.40	2.40	1.3	1.00	3.10
			K0 +082.00	K0 +085.00		3.00	2.00	0.40	2.40	1.3	1.00	3.10
			K0 +082.80	K0 +086.40		3.60	1.30	0.40	1.87	1.3	1.00	2.40
		BARRIO VILLACIELO (CARRERA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0 +331.00	K0 +335.00		4.00	2.70	0.20	2.16	1.3	1.00	2.80
			K0 +316.70	K0 +320.00		3.30	3.21	0.20	2.12	1.3	1.00	2.80
			K0 +319.00	K0 +325.00		6.00	4.90	0.20	5.88	1.3	1.00	7.60
			K0 +340.00	K0 +347.00		7.50	1.60	0.20	2.40	1.3	1.00	3.10
			K0 +350.00	K0 +355.00		5.00	4.00	0.20	4.00	1.3	1.00	5.20
			K0 +390.00	K0 +393.10		3.10	3.20	0.30	2.98	1.3	1.00	3.90
			K0 +406.00	K0 +411.00		5.00	2.60	0.30	3.90	1.3	1.00	5.10
		BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	K0 +190.00	K0 +190.60		0.60	0.80	0.20	0.10	1.3	1.00	0.10
			K0 +210.00	K0 +210.60		0.60	0.80	0.20	0.10	1.3	1.00	0.10
		BARRIO LA GRANJA (DAIGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5)	K0 +100.00	K0 +135.00		35.00	1.30	0.60	27.30	1.3	1.00	35.50
			K0 +060.00	K0 +075.00		15.00	1.50	0.40	9.00	1.3	1.00	11.70
			K0 +108.00	K0 +127.00		19.00	2.30	0.70	30.59	1.3	1.00	39.80
			K0 +020.00	K0 +026.20		6.20	3.80	0.30	7.07	1.3	1.00	9.20
			K0 +023.00	K0 +024.00		1.00	1.00	0.30	0.30	1.3	1.00	0.40
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERA 9 Y 12)	K0 +004.00	K0 +004.00		2.00	2.50	0.30	1.50	1.3	1.00	2.00
			K0 +005.00	K0 +005.00		2.00	2.00	0.30	1.20	1.3	1.00	1.60
			K0 +010.00	K0 +010.00		3.00	6.80	0.30	6.12	1.3	1.00	8.00
			K0 +060.00	K0 +063.60		3.60	1.70	0.40	2.45	1.3	1.00	3.20
			K0 +040.00	K0 +040.00		2.00	5.00	0.40	4.00	1.3	1.00	5.20
		BARRIO CHAMBACU (CARRERA 10 ENTRE CALLES 22 Y 22C)	K0 +050.00	K0 +063.50		13.50	3.30	0.30	13.37	1.3	1.00	17.40
		BARRIO VILLA CIELO (CARRERA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0 +483.00	K0 +495.00		12.00	2.00	0.30	7.20	1.3	1.00	9.40
			K0 +000.00	K0 +100.00		100.00	4.50	0.40	180.00	1.3	1.00	234.00
			K0 +130.00	K0 +160.00		30.00	4.50	0.50	67.50	1.3	1.00	87.80
			K0 +214.00	K0 +218.00		4.00	5.10	0.50	10.20	1.3	1.00	13.30
		BARRIO OBRERO (CARRERA 11 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	K0 +020.00	K0 +030.00		10.00	2.50	0.50	12.50	1.3	1.00	16.30
			K0 +028.00	K0 +030.50		2.50	2.00	0.50	2.50	1.3	1.00	3.30
			K0 +020.00	K0 +022.50		2.50	6.80	0.50	8.50	1.3	1.00	11.10
		BARRIO BALBOA (CALLE 17A ENTRE CARRERAS 6B Y 9)	K0+019.00	K0+022.00		3.00	2.00	0.500	3.00	1.3	1.00	3.90
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0 +060.00	K0 +063.50		3.60	3.30	0.50	5.94	1.3	1.00	7.70

1.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	**BARRIO LA GRANJA** (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5	K0+000.00	K0+141.00	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	141.00	7.40	0.510	532.13	1.30	1.00	691.77
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y TRANSVERSAL 5	K0+025.00	K0+025.60		-0.90	7.40	0.510	-3.40	1.30	1.00	-4.42
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+000.00	K0+051.00		51.00	7.40	0.452	170.58	1.30	1.00	221.76
		BARRIO RISARALDA (CRA 11 ENTRE LAS CALLES 15 Y 16B)	K0+003.00	K0+091.40		88.40	6.40	0.450	254.59	1.30	1.00	330.97
			K0+104.30	K0+152.00		47.70	6.40	0.520	158.75	1.30	1.00	206.37
			K0+163.50	K0+231.00		67.50	6.40	0.420	181.44	1.30	1.00	235.87
		BARRIO URBINA (CRA 14B ENTRE LAS CALLES 13 Y 15A)	K0+003.00	K0+088.80		85.80	6.40	0.880	483.23	1.30	1.00	628.19
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0+006.60	K0+078.00		71.40	5.40	0.450	173.50	1.30	1.00	225.55
			K0+003.00	K0+003.70		0.70	2.70	0.420	0.79	1.30	1.00	1.03
			K0+003.00	K0+006.60		3.60	2.70	0.500	4.86	1.30	1.00	6.32
			K0+006.00	K0+006.60		0.60	2.70	0.420	0.68	1.30	1.00	0.88
		BARRIO CHAMBACÚ (CARRERA 10 ENTRE CALLES 22 Y 22C)	K0+003.00	K0+123.00		120.00	5.40	0.910	589.68	1.30	1.00	766.58
			K0+000.00	K0+023.60		23.60	5.40	0.910	115.97	1.30	1.00	150.76
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0+078.00	K0+119.00		41.00	5.40	0.435	96.31	1.30	1.00	125.20
		BARRIO OBRERO *(CARRERA 12 ENTRE CALLE 14 Y* AV. CIRCUNVALAR)	*K0+004.00*	*K0+073.40*		*69.40*	*6.40*	*0.436*	*193.65*	*1.30*	*1.00*	*251.75*
		BARRIO OBRERO (CARRERA 11 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	K0+000.00	K0+050.00		50.00	5.20	0.433	112.58	1.30	1.00	146.35
		BARRIO LACHARME (CALLE 14 ENTRE CARRERA 8C Y 8D)	K0+007.00	K0+039.00		32.00	7.40	0.631	149.42	1.30	1.00	194.25
		BARRIO LACHARME (CRA 8C ENTRE LAS CALLES 14 Y 15)	K0+003.50	K0+083.60		80.10	4.40	0.627	220.98	1.30	1.00	287.27
		BARRIO BALBOA (CALLE 17A ENTRE CARRERAS 8B Y 9)	K0+003.00	K0+115.00		112.00	5.40	0.557	336.87	1.30	1.00	437.94
		BARRIO BALBOA (CALLE 18 ENTRE CARRERAS 8B Y 9)	K0+003.00	K0+119.50		116.50	5.40	0.957	602.05	1.30	1.00	782.66
		BARRIO VILLACIELO (CRA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0+000.00	K0+150.00		150.00	4.90	0.700	514.50	1.30	1.00	668.85
			K0+150.00	K0+278.00		128.00	4.90	0.700	439.04	1.30	1.00	570.75
			K0+279.50	K0+294.60		15.10	4.90	0.700	51.79	1.30	1.00	67.33
			K0+294.60	K0+496.70		202.10	4.90	0.700	693.20	1.30	1.00	901.16
			K0+497.60	K0+498.70		1.10	4.90	0.700	3.77	1.30	1.00	4.90
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+250.00		250.00	5.40	0.958	1293.30	1.30	1.00	1681.29
			K0+250.00	K0+260.00		10.00	5.15	0.997	51.35	1.30	1.00	66.75
			K0+260.00	K0+330.00		70.00	4.90	0.849	291.21	1.30	1.00	378.57
ACTA PARCIAL 4												
1.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	**BARRIO LA VICTORIA** (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	K0+000.00	K0+048.00	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	48.00	6.40	0.631	193.84	1.30	1.00	252.00
		LA JULIA CALLE 15 ENTRE LA AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 15)	K0+000.00	K0+050.00		50.00	6.40	0.627	200.64	1.30	1.00	260.83
		LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+110.00		110.00	7.40	0.557	453.40	1.30	1.00	589.42
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+740.00	K0+890.00		150.00	4.90	0.957	703.40	1.30	1.00	914.41
ACTA PARCIAL 5												
1.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	BARRIO BALBOA (CALLE 18 ENTRE CARRERAS 8B Y 9)	K0+000.00	K0+115.00	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	115.00	5.40	0.800	496.80	1.30	1.00	645.84
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+600.00	K0+897.17		297.17	4.90	0.800	1164.91	1.30	1.00	1514.38
TOTAL ACUMULADO												**14782.10**
ACTA N°1												**3066.21**
ACTA N°2												**2617.50**
ACTA N°3												**4921.59**
ACTA N°4												**2015.60**
ACTA N°5												**2160.20**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1		Página 2 de 2
	1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	FECHA 20/01/2026




CARGUE Y RETIRO EN BARRIO NISARALDA
ABSCISA K0+231 - K0+727





CARGUE Y RETIRO EN BARRIO VILLACIELO



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUBCAPITULO**	**NA**
ITEM	**1.09**	**REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)**	**UNIDAD** / **UND**

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1											
1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	**BARRIO OBRERO** (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0+021.00	K0+021.00	TALA					1.00	1.00
			K0 +025.00	K0 +025.00						1.00	1.00
			K0 +043.00	K0 +043.00						1.00	1.00
			K0 +056.00	K0 +056.00						1.00	1.00
			K0 +050.00	K0 +050.00						1.00	1.00
			K0 +068.00	K0 +068.00						1.00	1.00
			K0 +073.00	K0 +073.00						1.00	1.00

ACTA PARCIAL 2								
1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	**BARRIO OBRERO** CARRERA 11 ENTRE CALLE 14 Y CIRCUNVALAR	KD0 + 003.2 IZQUIERDA	KD0 + 003.2 IZQUIERDA	TALA		1.00	1.00
			KD0 + 003.52 DERECHA	KD0 + 003.52 DERECHA			1.00	1.00
			KD0 + 004.62 DERECHA	KD0 + 004.62 DERECHA			1.00	1.00
			KD0 + 004.62 IZQUIERDA	KD0 + 004.62 IZQUIERDA			1.00	1.00
		BARRIO RISARALDA CARRERA 11 ENTRE 16 Y 16A	*KD0 + 146 DERECHA*	*KD0 + 146 DERECHA*			*1.00*	*1.00*
			KD0 + 190 IZQUIERDA	KD0 + 190 IZQUIERDA			1.00	1.00
			KD0 + 191 IZQUIERDA	KD0 + 191 IZQUIERDA			1.00	1.00
			KD0 + 195 Izquierda	KD0 + 195 Izquierda			1.00	1.00
		BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE CALLE 13 Y 15A)	Izquierdo	Izquierdo			1.00	1.00
			Izquierdo	Izquierdo			1.00	1.00
			Izquierdo	Izquierdo			1.00	1.00
			Izquierdo	Izquierdo			1.00	1.00
			KD0 + 035 Derecha	KD0 + 035 Derecha			1.00	1.00
		BARRIO VILLA CIELO CARRERA 45 ENTRE CALLE 53 Y 58D	KD0 + 470 Derecha	KD0 + 470 Derecha			1.00	1.00
			KD0 + 475 Derecha	KD0 + 475 Derecha			1.00	1.00
			KD0 + 480 Derecha	KD0 + 480 Derecha			1.00	1.00
			KD0 + 485 Derecha	KD0 + 485 Derecha			1.00	1.00
			KD0 + 488 Derecha	KD0 + 488 Derecha			1.00	1.00
			KD0 + 490 Derecha	KD0 + 490 Derecha			1.00	1.00
			KD0 + 495 Derecha	KD0 + 495 Derecha			1.00	1.00
ACTA PARCIAL 3								
1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	**BARRIO LACHARME** (CARRERA 8C ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	KD +225.00	KD +225.00	TALA		1.00	1.00
			KD +220.00	KD +220.00			1.00	1.00
		BARRIO OBRERO (CARRERA 12 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	KD +025.00	KD +025.00			1.00	1.00
			KD +028.00	KD +028.00			1.00	1.00
			KD +031.00	KD +031.00			1.00	1.00
			KD +041.00	KD +041.00			1.00	1.00
			KD +086.00	KD +086.00			1.00	1.00
			KD +083.00	KD +083.00			1.00	1.00
		BARRIO BALBOA (CALLE 17A ENTRE CARRERAS 8B Y 9)	KD +008.00	KD +008.00			1.00	1.00
			KD +034.00	KD +034.00			1.00	1.00
			KD +040.00	KD +040.00			1.00	1.00
			KD +085.00	KD +085.00			1.00	1.00
			KD +091.00	KD +091.00			1.00	1.00
ACTA PARCIAL 4								
1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	**BARRIO OBRERO** (CARRERA 12 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	KD +067.00	KD +067.00			1.00	1.00
			KD +030.00	KD +030.00			1.00	1.00
			KD +061.00	KD +061.00			1.00	1.00
			KD +069.00	KD +069.00			1.00	1.00
			KD +065.00	KD +065.00			2.00	2.00
			KD +068.00	KD +068.00			1.00	1.00
ACTA PARCIAL 5								
1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	**BARRIO BALBOA** (CALLE 18 ENTRE CARRERAS 8B Y 9)	KD +067.00	KD +067.00			4.00	4.00
		BARRIO VILLA CIELO CALLE 53 ENTRE CARRERA 40 Y 44	KD +067.00	KD +067.00			7.00	7.00
		BARRIO VILLA CIELO CARRERA 45 ENTRE CALLE 53 Y 58D	KD +067.00	KD +067.00			3.00	3.00

TOTAL ACUMULADO	**62.00**
ACTA N°1	**7.00**
ACTA N°2	**21.00**
ACTA N°3	**13.00**
ACTA N°4	**7.00**
ACTA N°5	**14.00**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
	1.09 REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	FECHA 20/01/2026

TALA DE ÁRBOL
BARRIO OBRERO



TALA DE ÁRBOL
BARRIO LACHARME



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**SUBCAPITULO**	**NA**	
ITEM	**1.10**	**REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)**		**UNIDAD**	**UND**

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1											
1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	**BARRIO LA GRANJA** (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0+077	K0+077	TALA					1.00	1.00
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE *DIAGONAL 24 Y 25)*	K0+053.10	K0+053.10						1.00	1.00
			K0+055.30	K0+055.30						1.00	1.00
		BARRIO URBINA (CRA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15)	K0+020.00	K0+020.00						1.00	1.00
			K0+022.00	K0+022.00						1.00	1.00
			K0+025.00	K0+025.00						1.00	1.00
			K0+027.00	K0+027.00						1.00	1.00
			K0+028.00	K0+028.00						1.00	1.00
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0+043.00	K0+043.00						1.00	1.00
ACTA PARCIAL 2											
1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	**BARRIO RISARALDA** CARRERA 11 ENTRE 16A Y 16B	K00 + 187 IZQUIERDA	K00 + 187 IZQUIERDA	TALA					1.00	1.00
			K00 + 220 IZQUIERDA	K00 + 220 IZQUIERDA						1.00	1.00
			K00 + 225 IZQUIERDA	K00 + 225 IZQUIERDA						*1.00*	*1.00*
			K00 + 008 DERECHA	K00 + 008 DERECHA						1.00	1.00
			K00 + 008 IZQUIERDA	K00 + 008 IZQUIERDA						1.00	1.00
			K00 + 012 DERECHA	K00 + 012 DERECHA						1.00	1.00
			K00 + 012 IZQUIERDA	K00 + 012 IZQUIERDA						1.00	1.00
			K00 + 035 Izquierda	K00 + 035 Izquierda						1.00	1.00
			K00 + 037 Izquierda	K00 + 037 Izquierda						1.00	1.00
		BARRIO VILLA CIELO CARRERA 45 ENTRE CALLE 56 A Y 57	K00 + 004.2 DERECHA	K00 + 004.2 DERECHA						1.00	1.00
			K00 + 495.6 DERECHA	K00 + 495.6 DERECHA						1.00	1.00

ACTA PARCIAL 3								
1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	**BARRIO RISARALDA** CARRERA 11 ENTRE 16A Y 16B	K00 + 187 IZQUIERDA	K00 + 187 IZQUIERDA	TALA		1.00	1.00
			K00 + 220 IZQUIERDA	K00 + 220 IZQUIERDA			1.00	1.00
			K00 + 225 IZQUIERDA	K00 + 225 IZQUIERDA			1.00	1.00
			K00 + 008 DERECHA	K00 + 008 DERECHA			1.00	1.00
			K00 + 008 IZQUIERDA	K00 + 008 IZQUIERDA			1.00	1.00
			K00 + 012 DERECHA	K00 + 012 DERECHA			1.00	1.00
			K00 + 012 IZQUIERDA	K00 + 012 IZQUIERDA			1.00	1.00
			K00 + 035 Izquierda	K00 + 035 Izquierda			1.00	1.00
			K00 + 037 Izquierda	K00 + 037 Izquierda			1.00	1.00
		BARRIO VILLA CIELO CARRERA 45 ENTRE CALLE 56 A Y 57	K00 + 004.2 DERECHA	K00 + 004.2 DERECHA			1.00	1.00
			K00 + 495.6 DERECHA	K00 + 495.6 DERECHA			1.00	1.00
ACTA PARCIAL 4								
NO COBRO								
ACTA PARCIAL 5								
1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	**BARRIO VILLA CIELO CALLE 53 ENTRE CARRERA 40 Y 44**	K0+036.00	K0+036.00	TALA		16.00	16.00
		BARRIO BALBOA *(CALLE 18 ENTRE* CARRERAS 8B Y 9)	K0+036.00	K0+036.00			2.00	2.00
		BARRIO VILLA CIELO CARRERA 45 ENTRE CALLE 56 A Y 57	K0+036.00	K0+036.00			2.00	2.00
		BARRIO LA JULIA CALLE 15 ENTRE AV. CIRCUNVALAR Y CARRERA 13	K0+036.00	K0+036.00			1.00	1.00
TOTAL ACUMULADO								**52.00**
ACTA N°1								**9.00**
ACTA N°2								**11.00**
ACTA N°3								**11.00**
ACTA N°4								**0.00**
ACTA N°5								**21.00**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
	1.10 REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	FECHA 20/01/2026

TALA DE ÁRBOL
BARRIO LACHARME





CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	SUBRASANTE Y SUBBASE		**SUBCAPITULO**	NA	
ITEM	2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO		**UNIDAD**	M3


# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1											
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	**BARRIO VILLACIELO** (CRA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0+290.00	K0+305.00	MEJORAMIENTO	15.00	4.40	0.40	66	26.40	26.40
			K0+380.00	K0+420.00		40.00	4.90	0.20	196	39.20	39.20
			K0+430.00	K0+445.00		15.00	4.90	0.20	73.5	14.70	14.70
ACTA PARCIAL 2											
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	**BARRIO VILLACIELO** (CRA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0+180.00	K0+240.00	MEJORAMIENTO	60.00	4.90	0.40	294	117.60	117.60
			K0+470.00	K0+497.70		27.70	4.90	0.20	135.73	27.15	27.10
			K0+000.00	K0+100.00		100.00	4.90	0.40	490	196.00	196.00
		BARRIO CHAMBACÚ (CARRERA 10 ENTRE CALLES 22 Y 22C)	K0+014.50	K0+138.50		124.00	5.00	0.20	620	124.00	124.00
ACTA PARCIAL 3											
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	**BARRIO VILLACIELO** (CRA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0+000.00	K0+278.00	MEJORAMIENTO	278.00	4.90	0.40	1362.2	544.88	544.90
			K0+279.50	K0+496.70		217.20	4.90	0.40	1064.28	425.71	425.70
			K0+497.60	K0+498.70		1.10	4.90	0.40	5.39	2.16	2.20
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+250.00		250.00	5.40	0.40	1350	540.00	540.00
			K0+250.00	K0+260.00		10.00	5.15	0.40	51.5	20.60	20.60
			K0+260.00	K0+330.00		70.00	4.90	0.40	343	137.20	137.20
		BARRIO CHAMBACÚ (CARRERA 10 ENTRE CALLES 22 Y 22C)	K0+014.50	K0+138.50		124.00	5.00	0.40	620	248.00	248.00
		BARRIO BALBOA (CALLE 18 ENTRE CARRERAS 8B Y 9)	K0+003.00	K0+119.50		116.50	5.40	0.400	251.64	1.00	251.60
		BARRIO LACHARME (CRA 8C ENTRE LAS CALLES 14 Y 15)	K0+003.00	K0+083.10		80.10	4.40	0.40	352.44	140.98	141.00
		BARRIO LACHARME (CALLE 14 ENTRE CARRERA 8C Y 8D)	K0+007.00	K0+039.00		32.00	7.40	0.40	236.8	94.72	94.70
ACTA PARCIAL 4											
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	**BARRIO VILLA CIELO** (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+740.00	K0+890.00		150.00	4.90	0.40	735	294.00	294.00
ACTA PARCIAL 5											
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	BARRIO BALBOA (CALLE 18 ENTRE CARRERAS 8B Y 9)	K0+000.00	K0+115.00		115.00	5.40	0.40	621	248.40	248.40
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+600.00	K0+897.17		297.17	4.90	0.40	1456.133	582.45	582.50

TOTAL ACUMULADO	3538.80
ACTA N°1	80.30
ACTA N°2	464.70
ACTA N°3	1860.90
ACTA N°4	294.00
ACTA N°5	838.90

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	FECHA 20/01/2026




MATERIAL SELECCIONADO EN BARRIO BALBOA





MATERIAL SELECCIONADO EN BARRIO VILLACIELO





CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	SUBRASANTE Y SUBBASE	**SUBCAPITULO**	NA		
ITEM	2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE A		**UNIDAD**	M3

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1											
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE A	**BARRIO LA GRANJA** (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0+000.00	K0+141.00	SUBBASE	141.00	7.00	0.20	987	197.40	197.40
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0+025 DESCUENTO CÁRCAMO AMBOS CARRILES	K0+025 DESCUENTO CÁRCAMO AMBOS CARRILES	DESCUENTO CÁRCAMO	-0.90	7.00	0.20	-6.30	-1.26	-1.30
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+000.00	K0+051.00	SUBBASE	51.00	7.00	0.20	357	71.40	71.40
		BARRIO VILLACIELO (CARRERA 45 ENTRE LAS CALLES 53 Y 58D)	K0+294.66	K0+445.00		150.34	4.50	0.20	676.53	135.31	135.30
		BARRIO URBINA (CRA 14B ENTREE CALLES 13 Y 15)	K0+003.00	K0+088.80		85.80	6.00	0.20	514.8	102.96	103.00
		BARRIO URBINA (CRA 14B ENTREE CALLES 13 Y 15)	K0+005.00	K0+005.00	DESCUENTO CÁRCAMO	-0.90	6.00	0.20	-5.4	-1.08	-1.10
		BARRIO RISARALDA (CRA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	K0+003.00	K0+091.40	SUBBASE	88.40	6.00	0.20	530.4	106.08	106.10
			K0+104.30	K0+152.00		47.70	6.00	0.20	286.2	57.24	57.20
			K0+163.50	K0+231.00		67.50	6.00	0.20	405	81.00	81.00
ACTA PARCIAL 2											
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE A	**BARRIO CHAMBACÚ** (CARRERA 10 ENTRE CALLES 22 Y 22C)	K0+017.00	K0+138.50	SUBBASE	121.50	5.00	0.20	607.5	121.50	121.50
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERA 9 Y TRANSVERSAL 12)	K0+003.00	K0+078.00		75.00	5.00	0.20	375	75.00	75.00
		BARRIO VILLACIELO (CRA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0+245.00	K0+275.00		30.00	4.50	0.20	135	27.00	27.00
			K0+445.00	K0+497.70		52.70	4.50	0.20	237.15	47.43	47.40
			K0+150.00	K0+245.00		95.00	4.50	0.20	427.5	85.50	85.50
			K0+000.00	K0+100.00		100.00	4.50	0.20	450	90.00	90.00

ACTA PARCIAL 3										
BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONALES 24 Y 25)	K0+000 AMBOS CARRILES	K0+051 AMBOS CARRILES		51.00	7.00	0.19	357	67.83	67.80
	CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON DIAGONAL 25			2.00	2.00	0.19	2	0.38	0.40
	CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON DIAGONAL 25			2.00	2.00	0.19	2	0.38	0.40
	DESCUENTO DE MH K 0+049			1.10	1.10	0.19	0.95	-0.18	-0.20
BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0+000 AMBOS CARRILES	K0+141 AMBOS CARRILES		141.00	7.00	0.19	987.00	187.53	187.50
	K0+000 AMBOS CARRILES	K0+6 AMBOS CARRILES	BOCACALLE IZQUIERDA CON TRANSVERSAL 4	6.56	2.94	0.19	19.29	3.66	3.70
	CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON TRANSVERSAL 5			1.30	1.30	0.19	0.845	0.16	0.20
	CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON TRANSVERSAL 5			1.20	1.20	0.19	0.72	0.14	0.10
	DESCUENTO DE DOS MH K 0+020			1.20	1.20	0.19	1.13	-0.21	-0.20
	DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.15	1.15	0.19	1.04	-0.20	-0.20
	K0+025 DESCUENTO CÁRCAMO			-0.90	7.00	0.19	-6.30	-1.20	-1.20
BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A)	K0+003.00	K0+088.80		85.80	6.00	0.20	514.8	102.96	103.00
	CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 13			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
	CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 13			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
	CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 15A			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
	CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 15A			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
	DESCUENTO DE DOS MH K 0+006			1.50	1.50	0.20	1.77	-0.35	-0.40
	K0+005 DESCUENTO CÁRCAMO AMBOS CARRILES	K0+005 DESCUENTO CÁRCAMO AMBOS CARRILES		-0.90	6.00	0.20	-5.4	-1.08	-1.10
BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERA 9 Y TRANSVERSAL 12)	K0+078.00	K0+118.00		40.00	5.00	0.20	200.00	40.00	40.00
	K0+003.00	K0+078.00		75.00	5.00	0.20	375.00	75.00	75.00
	DESCUENTO DE CAJA TELECOMUNICACIONES K 0+004			2.00	1.30	0.20	2.04	-0.41	-0.40
	DESCUENTO DE MH K 0+004			1.10	1.10	0.20	0.95	-0.19	-0.20
	DESCUENTO DE MH K 0+035			1.50	1.50	0.20	1.77	-0.35	-0.40
	DESCUENTO DE MH K 0+077			1.50	1.50	0.20	1.77	-0.35	-0.40
	DESCUENTO DE MH k 0+115			1.50	1.50	0.20	1.77	-0.35	-0.40
BARRIO OBRERO (CARRERA 12 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	K0+006.50	K0+073.50		67.00	6.00	0.20	402.00	80.40	80.40
	DESCUENTO DE MH K 0+047			*1.50*	*1.50*	*0.20*	*1.77*	*-0.35*	*-0.40*
BARRIO OBRERO (CARRERA 11 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	K0+000.00	K0+050.00		50.00	4.80	0.20	240.00	48.00	48.00
	DESCUENTO DE MH K 0+050			1.50	1.50	0.20	1.77	-0.35	-0.40

		BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	K0+003 AMBOS CARRILES	K0+091,4 AMBOS CARRILES			88.40	6.00	0.20	530.40	106.08	106.10
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 15				1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 15				1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 16				1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 16		PAVIMENTO		1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+050				1.00	1.00	0.20	0.79	-0.16	-0.20
			K0+104,3 AMBOS CARRILES	K0+152 AMBOS CARRILES			47.70	6.00	0.20	286.20	57.24	57.20
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 16				1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 16				1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 16A				1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 16A				1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			K0+163,5 AMBOS CARRILES	K0+231 AMBOS CARRILES			67.50	6.00	0.20	405.00	81.00	81.00
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 16A				1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 16A				1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE A		CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 16B				1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 16B				1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+175				1.00	1.00	0.20	0.79	-0.16	-0.20
		BARRIO CHAMBACÚ (CALLE 10 ENTRE CARRERAS 20 Y 22C)	CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 22C				1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+047				1.60	1.60	0.20	2.01	-0.40	-0.40
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+130				1.10	1.10	0.20	0.95	-0.19	-0.20
			K0+019.00	K0+138.20			119.20	5.00	0.20	596.00	117.19	117.20
			K0+120.00	K0+120.00	PAVIMENTO SOBRE ANCHO EMPALME BOCACALLE EN INTERSECCION DE LA CALLE 22C CON CARRERA 10 - LADO IZQUIERDO		15.58	1.55	0.20	24.15	4.83	4.80
			K0+000.00	K0+023.60	PAVIMENTO BOCACALLE EN INTERSECCION DE LA CALLE 22C CON CARRERA 10 - LADO IZQUIERDO		23.60	6.00	0.20	141.60	28.32	28.30
		BARRIO LACHARME (CRA 8C ENTRE LAS CALLES 14 Y 15)	DESCUENTO DE DOS MH K 0+040				1.60	1.60	0.20	2.01	-0.40	-0.40
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+078				1.60	1.60	0.20	2.01	-0.40	-0.40
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 15				1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 15				1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			K0+003.50	K0+083.60			80.10	4.00	0.20	320.40	64.08	64.10
		BARRIO BALBOA (CALLE 17A ENTRE CARRERAS 8B Y 9)	DESCUENTO DE DOS MH K 0+060				1.50	1.50	0.20	1.77	-0.35	-0.40
			K0+003.00	K0+125.50			122.50	5.00	0.20	612.50	122.50	122.50
		BARRIO BALBOA (CALLE 18 ENTRE CARRERAS 8B Y 9)	DESCUENTO DE DOS MH K 0+060				1.50	1.50	0.20	1.77	-0.35	-0.40
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+119				1.50	1.50	0.20	1.77	-0.35	-0.40
			K0+003.00	K0+119.50			116.50	5.00	0.20	582.50	116.50	116.50

			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.60	1.60	0.20	2.01	-0.40	-0.40
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.20	1.20	0.20	1.13	-0.23	-0.20
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.20	1.20	0.20	1.13	-0.23	-0.20
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060		SUBBASE	1.20	1.20	0.20	1.13	-0.23	-0.20
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.60	1.60	0.20	2.01	-0.40	-0.40
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.60	1.60	0.20	2.01	-0.40	-0.40
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.60	1.60	0.20	2.01	-0.40	-0.40
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.20	1.20	0.20	1.13	-0.23	-0.20
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.20	1.20	0.20	1.13	-0.23	-0.20
		BARRIO VILLACIELO (CRA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.20	1.20	0.20	1.13	-0.23	-0.20
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.20	1.20	0.20	1.13	-0.23	-0.20
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.20	1.20	0.20	1.13	-0.23	-0.20
			K0+000.00	K0+050.00		50.00	4.50	0.20	225.00	45.00	45.00
			K0+050.00	K0+150.00		100.00	4.50	0.20	450.00	90.00	90.00
			K0+150.00	K0+272.00		122.00	4.50	0.20	549.00	109.80	109.80
			K0+272.00	K0+278.00		6.00	4.50	0.20	27.00	5.40	5.40
			K0+279.50	K0+294.66		15.16	4.50	0.20	68.22	13.64	13.60
			K0+294.66	K0+424.66		130.00	4.50	0.20	585.00	117.00	117.00
			K0+424.66	K0+496.70		72.04	4.50	0.20	324.18	64.84	64.80
			K0+496.70	K0+497.60	CÁRCAMO DE AGUAS LLUVIAS	0.90	4.50	0.00	4.05	0.00	0.00
			K0+497.60	K0+498.70		1.10	4.50	0.20	4.95	0.99	1.00
		BARRIO LACHARME (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 8C Y 8D)	K0+007.00	K0+039.00		32.00	7.00	0.20	224	44.80	44.80
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+250.00	SUBBASE	250.00	5.00	0.20	1250	250.00	250.00
			K0+250.00	K0+260.00		10.00	4.75	0.20	47.5	9.50	9.50
			K0+260.00	K0+330.00		70.00	4.50	0.20	315	63.00	63.00
ACTA PARCIAL 4											
2.03	**SUBBASE GRANULAR CLASE A**	**BARRIO LA VICTORIA** (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	K0+000.00	K0+048.00		48.00	6.00	0.20	288	57.60	57.60
		LA JULIA CALLE 15 ENTRE LA AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 15)	K0+000.00	K0+050.00		50.00	6.00	0.20	300	60.00	60.00
		LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+110.00		110.00	7.00	0.20	770	154.00	154.00
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+740.00	K0+890.00		150.00	4.50	0.20	675	135.00	135.00
ACTA PARCIAL 5											
2.03	**SUBBASE GRANULAR CLASE A**	BARRIO BALBOA (CALLE 18 ENTRE CARRERAS 8B Y 9)	K0+000.00	K0+115.00		115.00	5.40	0.20	621	124.20	124.20
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+600.00	K0+897.17		297.17	4.90	0.20	1456.133	291.23	291.20
TOTAL ACUMULADO											**2929.98**
ACTA N°1											**749.01**
ACTA N°2											**446.39**
ACTA N°3											**512.58**
ACTA N°4											**406.60**
ACTA N°5											**415.40**


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE A	FECHA 20/01/2026





SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR EN BARRIO LACHARME



SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR EN BARRIO VILLACIELO





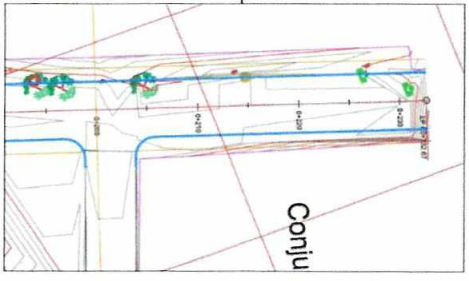

CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-009-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-S Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**		**SUBCAPITULO**	**NA**	
ITEM	3.01	**PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)**		**UNIDAD**	M3

# ITEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1											
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	**BARRIO LA GRANJA** (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0+000 AMBOS CARRILES	K0+141 AMBOS CARRILES	PAVIMENTO	141.00	7.00	0.19	987.00	187.53	187.50
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL *25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5*)	K0+025 DESCUENTO CÁRCAMO AMBOS CARRILES	K0+025 DESCUENTO CÁRCAMO AMBOS CARRILES		-0.90	7.00	0.19	-6.30	-1.20	-1.20
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONALES 24 Y 25)	K0+000 AMBOS CARRILES	K0+051 AMBOS CARRILES		51.00	7.00	0.19	357	67.83	67.80
		BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A)	K0+003 AMBOS CARRILES	K0+088.8 AMBOS CARRILES		85.80	6.00	0.20	514.8	102.96	103.00
		BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A)	K0+005 DESCUENTO CÁRCAMO AMBOS CARRILES	K0+005 DESCUENTO CÁRCAMO AMBOS CARRILES		-0.90	6.00	0.20	-5.4	-1.08	-1.10
		BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	K0+003 AMBOS CARRILES	K0+031.4 AMBOS CARRILES		88.40	6.00	0.20	530.40	106.08	106.10
			K0+104.3 AMBOS CARRILES	K0+152 AMBOS CARRILES		47.70	6.00	0.20	286.20	57.24	57.20
			K0+163.5 AMBOS CARRILES	K0+231 AMBOS CARRILES		67.50	6.00	0.20	405.00	81.00	81.00
		BARRIO VILLACIELO (CARRERA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	k0+294.66 AMBOS CARRILES	K0+424.66 AMBOS CARRILES		130.00	4.50	0.20	585	117.00	117.00
ACTA PARCIAL 2											
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	**BARRIO VILLACIELO** (CARRERA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	K0+424.66	K0+496.66	PAVIMENTO	72.00	4.50	0.20	324.00	64.80	64.80
			K0+150.00	K0+272.00		122.00	4.50	0.20	549.00	109.80	109.80
			K0+000.00	K0+050.00		50.00	4.50	0.20	225.00	45.00	45.00
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERA 9 Y 12)	DESCUENTO MH			0.00	0.00	0.00	2.01	-2.01	-2.00
			K0+003.00	K0+078.00		75.00	5.00	0.20	375.00	75.00	75.00
		BARRIO CHAMBACU (CARRERA 10 ENTRE CALLES 22 Y 22C)	DESCUENTO MH			0.00	0.00	0.20	2.01	-2.01	-2.00
			K0+019.00	K0+138.20		119.20	5.00	0.20	596.00	117.19	117.20
ACTA PARCIAL 3											
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONALES 24 Y 25)	K0+000 AMBOS CARRILES	K0+051 AMBOS CARRILES		51.00	7.00	0.19	357	67.83	67.80
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON DIAGONAL 25			2.00	2.00	0.19	2	0.38	0.40
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON DIAGONAL 25			2.00	2.00	0.19	2	0.38	0.40
			DESCUENTO DE MH K 0+049			1.10	1.10	0.19	0.95	-0.18	-0.20
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0+000 AMBOS CARRILES	K0+141 AMBOS CARRILES		141.00	7.00	0.19	987.00	187.53	187.50
			K0+000 AMBOS CARRILES	K0+6 AMBOS CARRILES	BOCACALLE IZQUIERDA CON TRANSVERSAL 4	6.56	2.94	0.19	19.29	3.66	3.70
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON TRANSVERSAL 5			1.30	1.30	0.19	0.845	0.16	0.20
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON TRANSVERSAL 5			1.20	1.20	0.19	0.72	0.14	0.10
			DESCUENTO DE MH K 0+020			1.20	1.20	0.19	1.13	-0.21	-0.20
			DESCUENTO DE MH K 0+060			1.15	1.15	0.19	1.04	-0.20	-0.20
			K0+025 DESCUENTO CÁRCAMO			-0.90	7.00	0.19	-6.30	-1.20	-1.20
		BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A)	K0+003.00	K0+088.80		85.80	6.00	0.20	514.8	102.96	103.00
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 13			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 13			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 15A			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 15A			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			DESCUENTO DE MH K 0+006			1.50	1.50	0.20	1.77	-0.35	-0.40
			K0+025 DESCUENTO CÁRCAMO AMBOS CARRILES	K0+025 DESCUENTO CÁRCAMO AMBOS CARRILES		-0.90	6.00	0.20	-5.4	-1.08	-1.10
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERA 9 Y TRANSVERSAL 12)	K0+078.00	K0+118.00		40.00	5.00	0.20	200.00	40.00	40.00
			K0+003.00	K0+078.00		75.00	5.00	0.20	375.00	75.00	75.00
			DESCUENTO DE CAJA TELECOMUNICACIONES K 0+004			2.00	1.30	0.20	2.04	-0.41	-0.40
			DESCUENTO DE MH K 0+004			1.10	1.10	0.20	0.95	-0.19	-0.20
			DESCUENTO DE MH K 0+035			1.50	1.50	0.20	1.77	-0.35	-0.40
			DESCUENTO DE MH K 0+077			1.50	1.50	0.20	1.77	0.35	0.40

			DESCUENTO DE MH k 0+115			1.50	1.50	0.20	1.77	-0.35	-0.40
		BARRIO OBRERO (CARRERA 12 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	K0+006.50	K0+073.50		67.00	6.00	0.20	482.00	80.40	80.40
			DESCUENTO DE MH K 0+047			1.50	1.50	0.20	1.77	-0.35	-0.40
		BARRIO OBRERO (CARRERA 11 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	K0+000.00	K0+050.00	PAVIMENTO	50.00	4.80	0.20	240.00	48.00	48.00
			DESCUENTO DE MH K 0+050			1.50	1.50	0.20	1.77	-0.35	-0.40
		BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	K0+003 AMBOS CARRILES	K0+091.4 AMBOS CARRILES		88.40	6.00	0.20	530.40	106.08	106.10
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 15			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 15			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 16			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 16			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			DESCUENTO DE MH K 0+050			1.00	1.00	0.20	0.79	-0.16	-0.20
			K0+104.3 AMBOS CARRILES	K0+152 AMBOS CARRILES		47.70	6.00	0.20	286.20	57.24	57.20
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 16			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 16			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 16A			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 16A			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			K0+163.5 AMBOS CARRILES	K0+231 AMBOS CARRILES		67.50	6.00	0.20	405.00	81.00	81.00
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 16A			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 16A			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 16B			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)		CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 16B			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			DESCUENTO DE MH K 0+175			1.00	1.00	0.20	0.79	-0.16	-0.20
		BARRIO CHAMBACU (CALLE 18 ENTRE CARRERAS 20 Y 22C)	CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 22C			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			DESCUENTO DE MH K 0+047			1.60	1.60	0.20	2.01	-0.40	-0.40
			DESCUENTO DE MH K 0+130			1.10	1.10	0.20	0.95	-0.19	-0.20
			K0+019.00	K0+138.20		119.20	5.00	0.20	596.00	117.19	117.20
			K0+120.00	K0+120.00	PAVIMENTO SOBRE ANCHO EMPALME BOCACALLE EN INTERSECCION DE LA CALLE 22C CON CARRERA 10 - LADO IZQUIERDO	15.60	1.60	0.20	24.96	4.99	5.00
			K0+000.00	K0+023.60	PAVIMENTO BOCACALLE EN INTERSECCION DE LA CALLE 22C CON CARRERA 10 - LADO IZQUIERDO	23.60	6.00	0.20	141.60	28.32	28.30
		BARRIO LACHARME (CRA 8C ENTRE LAS CALLES 14 Y 15)	DESCUENTO DE MH K 0+040			1.50	1.50	0.20	1.77	-0.35	-0.40
			DESCUENTO DE MH K 0+078			1.60	1.60	0.20	2.01	-0.40	-0.40
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CALLE 15			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 14			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CALLE 15			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			K0+003.50	K0+363.60		80.10	4.00	0.20	320.40	64.08	64.10
		BARRIO LACHARME (CALLE 14 ENTRE CRA 8C Y 8D)	DESCUENTO DE MH K 0+007			1.50	1.50	0.20	1.77	-0.35	-0.40
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CRA 8D			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CRA 8D			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			K0+007.00	K0+039.00		32.00	7.00	0.20	224.00	44.80	44.80
		BARRIO BALBOA (CALLE 17A ENTRE CARRERAS 8B Y 9)	DESCUENTO DE MH K 0+060			1.50	1.50	0.20	1.77	-0.35	-0.40
			CUÑAS DE GIRO IZQUIERDO EMPALME CON CRA 8B			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			CUÑAS DE GIRO DERECHO EMPALME CON CRA 8B			1.20	1.20	0.20	0.72	0.14	0.10
			K0+003.00	K0+125.50		122.50	5.00	0.20	612.50	122.50	122.50
		BARRIO VILLACIELO (CRA 45 ENTRE CALLES 53 Y 53D)	DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.60	1.60	0.20	2.01	-0.40	-0.40
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.20	1.20	0.20	1.13	-0.23	-0.20
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060		PAVIMENTO	1.20	1.20	0.20	1.13	0.23	0.20
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.20	1.20	0.20	1.13	-0.23	-0.20
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.60	1.60	0.20	2.01	-0.40	-0.40
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.60	1.60	0.20	2.01	-0.40	-0.40
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.60	1.60	0.20	2.01	-0.40	-0.40
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.20	1.20	0.20	1.13	-0.23	-0.20
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.20	1.20	0.20	1.13	-0.23	-0.20
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.20	1.20	0.20	1.13	-0.23	-0.20
			DESCUENTO DE DOS MH K 0+060			1.20	1.20	0.20	1.13	-0.23	-0.20
			K0+000.00	K0+050.00		50.00	4.50	0.20	225.00	45.00	45.00
			K0+050.00	K0+150.00		100.00	4.50	0.20	450.00	90.00	90.00
			K0+150.00	K0+272.00		122.00	4.50	0.20	549.00	109.80	109.80
			K0+272.00	K0+278.00		6.00	4.50	0.20	27.00	5.40	5.40
			K0+279.50	K0+294.60		15.10	4.50	0.20	67.95	13.59	13.60
			K0+294.60	K0+424.60		130.00	4.50	0.20	585.00	117.00	117.00
			K0+424.60	K0+496.70		72.10	4.50	0.20	324.45	64.89	64.90
			K0+496.70	K0+497.60	CÁRCAMO DE AGUAS LLUVIAS	0.90	4.50	0.00	4.05	0.00	0.00
			K0+497.60	K0+498.70		1.10	4.50	0.20	4.95	0.99	1.00
ACTA PARCIAL 4											
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	**BARRIO LA VICTORIA** (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	K0+000.00	K0+048.00		48.00	6.00	0.20	288.00	57.60	57.60
		LA JULIA CALLE 15 ENTRE LA AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 15)	K0+000.00	K0+050.00		50.00	6.00	0.20	300.00	60.00	60.00
		LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+110.00		110.00	7.00	0.20	770	154.00	154.00
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+330.00		330.00	4.50	0.20	1485	297.00	297.00
ACTA PARCIAL 5											

3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	**BARRIO BALBOA** (CALLE 18 ENTRE CARRERAS 88 Y 9)	K0+000.00	K0+115.00		115.00	5.00	0.20	575.00	115.00	115.00
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+600.00	K0+897.17		297.17	4.50	0.21	1337.265	280.83	280.80
TOTAL ACUMULADO											**2634.50**
ACTA N°1											**717.30**
ACTA N°2											**487.80**
ACTA N°3											**545.00**
ACTA N°4											**568.60**
ACTA N°5											**395.80**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
	3.01 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	FECHA 20/01/2026




BARRIO VILLACELO
ABSCISAS K0+445 - K0+439






BARRIO CHAMBACÚ
ABSCISAS K0+000 - K0+023,6







BARRIO OBRERO
ABSCISAS K0+035 - K0+960



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	CONTRATO No.	OBRA-LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	CONTRATO No:	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	OTRAS ACTIVIDADES		SUBCAPITULO	NA	
ITEM	3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI		UNIDAD	UND

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 3											
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5)	K0 +021.45	K0 +021.45	ADECUACIÓN MH					1.00	1.00
		BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A)	K0 +006.00	K0 +006.00						1.00	1.00
ACTA PARCIAL 4											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 5											
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5)	K0 +060.00	K0 +060.00	ADECUACIÓN MH					1.00	1.00
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0 +005.00	K0 +005.00						1.00	1.00
		BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLE 15 Y 16 B	K0 +003.00	K0 +231.00						2.00	2.00

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	6.00
ACTA N°1	0.00
ACTA N°2	0.00
ACTA N°3	2.00
ACTA N°4	0.00
ACTA N°5	4.00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	FECHA 20/01/2026



ADECUACION DE MH
BARRIO LA GRANJA

CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				


CAPITULO	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**			**SUBCAPITULO**	**NA**
ITEM	**3.03**	**BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO**		**UNIDAD**	**M**

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)		
ACTA PARCIAL 1								
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5)	K0+000.00	K0+000.00	BORDILLO	8.20	1.00	8.20
			K0+003.00	K0+019.80		16.80	1.00	16.80
			K0+020.64	K0+131.64		111.00	1.00	111.00
ACTA PARCIAL 2								
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	**BARRIO URBINA** (CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A)	K0+000.00	K0+088.50	BORDILLO	88.50	1.00	88.50
			K0+000.00	K0+086.90		86.90	1.00	61.00
ACTA PARCIAL 3								
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	**BARRIO RISARALDA** (CARRERA 11 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	K0+003.00	K0+091.40	BORDILLO	88.40	2.00	176.80
			K0+104.30	K0+152.00		47.70	2.00	95.40
			K0+163.50	K0+231.00		67.50	2.00	109.10
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5)	K0+023.50	K0+099.80		76.30	1.00	76.30
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+000.00	K0+059.70		59.70	1.00	59.70
			K0+000.00	K0+041.40		41.40	1.00	41.40
ACTA PARCIAL 4								
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	**BARRIO OBRERO** (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	K0+000.00	K0+114.00	BORDILLO	114.00	2.00	228.00
		BARRIO OBRERO (CARRERA 12 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	K0+000.00	K0+073.40		73.40	1.00	73.40
		BARRIO OBRERO (CARRERA 11 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	K0+000.00	K0+050.00		50.00	1.00	50.00
		BARRIO LACHARME (CALLE 14 ENTRE CARRERA 8C Y 8D)	K0+007.00	K0+039.00		32.00	1.00	32.00
		BARRIO LACHARME (CRA 8C ENTRE LAS CALLES 14 Y 15)	K0+003.50	K0+083.60		80.10	1.00	80.10
ACTA PARCIAL 5								
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	**BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16A)**	K0+000.00	K0+048.00	BORDILLO	48.00	2.00	96.00
		LA JULIA CALLE 15 ENTRE LA AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 15)	K0+000.00	K0+050.00		50.00	2.00	100.00
		BARRIO OBRERO (CARRERA 12 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	K0+000.00	K0+073.40		73.40	1.00	73.40
		BARRIO OBRERO (CARRERA 11 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	K0+000.00	K0+050.00		50.00	1.00	50.00
		BARRIO LACHARME (CALLE 14 ENTRE CARRERA 8C Y 8D)	K0+007.00	K0+039.00		32.00	1.00	32.00
		BARRIO LACHARME (CRA 8C ENTRE LAS CALLES 14 Y 15)	K0+003.50	K0+083.60		80.10	1.00	80.10

TOTAL ACUMULADO	**1739.20**
ACTA N°1	**136.00**
ACTA N°2	**149.50**
ACTA N°3	**558.70**
ACTA N°4	**463.50**
ACTA N°5	**431.50**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
	3.03 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	FECHA 20/01/2026



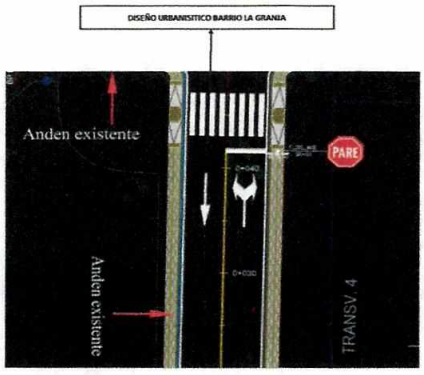

CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYS	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**		**SUBCAPITULO**	**NA**	
ITEM	**3.04**	**ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa**		**UNIDAD**	**KG**


# ÍTEM	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN									CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ANCHO	LARGO	DIAMETRO (Ø)	# DE VARILLA LADO LARGO	# DE VARILLA LADO CORTO	LONGITUD VARILLA LADO LARGO (M)	LONGITUD VARILLA LADO CORTO (M)	PESO	CANTIDAD	
ACTA PARCIAL 1													
3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	**BARRIO LA GRANJA** (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	REFUERZO PLACA 2,97M X 3,28M	2.97	3.28	1/2" @0.25	12.00	14.00	3.18	2.87	0.994	4.00	311.48
			REFUERZO PLACA 3,5M X 3,5M	3.50	3.50	1/2" @0.25	14.00	14.00	3.40	3.40	0.994	2.00	189.26
			REFUERZO PLACA MH - 3,40M X 3,50M	3.40	3.50	1/2" @0.25	14.00	14.00	3.40	3.30	0.994	2.00	186.80
			REFUERZO PLACA BOCACALLE - 3,60M X 3,50M	3.60	3.50	1/2" @0.25	15.00	14.00	3.40	3.50	0.994	4.00	397.60
			REFUERZO PLACA	2.50	2.50	1/2" @0.25	10.00	10.00	2.40	2.40	0.994	2.00	95.42
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	REFUERZO LOSA IRREGULAR	3.50	5.80	1/2" @0.25	14.00	24.00	5.70	3.40	0.994	4.00	641.73
			REFUERZO PLACA - BOCACALLE 3,5M X 2,9M	3.50	2.90	1/2" @0.25	14.00	12.00	2.80	3.40	0.994	4.00	318.08
		BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A)	REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.67	1/2" @0.25	13.00	15.00	3.57	3.00	0.994	4.00	363.45
			REFUERZO PLACA MH - BOCACALLE	3.10	3.00	1/2" @0.25	13.00	12.00	2.90	3.00	0.994	4.00	293.03
		BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	REFUERZO PLACA 3,1M X 3,4M	2.80	3.40	1/2" @0.25	12.00	14.00	3.30	2.70	0.994	2.00	153.87
			REFUERZO PLACA 3,1M X 3,4M	3.10	3.40	1/2" @0.25	13.00	14.00	3.30	3.00	0.994	2.00	168.78
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.00	3.10	1/2" @0.25	12.00	13.00	3.00	2.90	0.994	2.00	146.52
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.00	3.10	1/2" @0.25	12.00	13.00	3.00	2.90	0.994	2.00	146.52
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.00	3.25	1/2" @0.25	12.00	13.00	3.15	2.90	0.994	2.00	150.09
			REFUERZO PLACA MH	3.00	3.00	1/2" @0.25	12.00	12.00	2.90	2.90	0.994	2.00	138.36
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.00	3.25	3/8" @0.15	20.00	22.00	3.15	2.90	0.56	2.00	142.02
			REFUERZO PLACA MH	3.00	3.00	3/8" @0.15	20.00	20.00	2.90	2.90	0.56	2.00	129.92
		BARRIO VILLACIELO (CARRERA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	REFUERZO PLACA BOCACALLE	2.60	2.25	1/2" @0.25	11.00	9.00	2.15	2.50	0.994	4.00	183.49
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	2.25	2.50	1/2" @0.25	9.00	10.00	2.40	2.15	0.994	4.00	171.37
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	2.25	2.00	1/2" @0.25	9.00	8.00	1.90	2.15	0.994	1.00	34.09
			REFUERZO PLACA MH	3.00	3.00	1/2" @0.25	12.00	12.00	2.90	2.90	0.994	2.00	138.36
			REFUERZO PLACA MH	2.80	2.80	3/8" @0.15	19.00	19.00	2.70	2.70	0.56	1.00	57.46
			REFUERZO PLACA MH	2.20	2.20	1/2" @0.25	9.00	9.00	2.10	2.10	0.994	8.00	300.59
			REFUERZO PLACA MH	2.20	2.20	3/8" @0.15	15.00	15.00	2.10	2.10	0.56	1.00	35.28
ACTA PARCIAL 2													
NO COBRÓ													
ACTA PARCIAL 3													
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	REFUERZO PLACA 2,97M X 3,28M	2.97	3.28	1/2" @0.25	12.00	14.00	3.18	2.87	0.994	4.00	311.48
			REFUERZO PLACA 3,5M X 3,5M	3.50	3.50	1/2" @0.25	14.00	14.00	3.40	3.40	0.994	2.00	189.26
			REFUERZO PLACA MH - 3,40M X 3,50M	3.40	3.50	1/2" @0.25	14.00	14.00	3.40	3.30	0.994	2.00	186.47
			REFUERZO PLACA BOCACALLE - 3,60M X 3,50M	3.60	3.50	1/2" @0.25	15.00	14.00	3.40	3.50	0.994	4.00	397.60
			REFUERZO PLACA	2.50	2.50	1/2" @0.25	10.00	10.00	2.40	2.40	0.994	2.00	95.42
			REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA	1.00	2.50	1/2" @0.25	10.00	7.00	2.40	0.90	0.994	2.00	60.24
			REFUERZO GIRO BOCA CALLE IZQUIERDA	1.00	1.80	1/2" @0.25	11.00	13.00	1.70	0.90	0.994	2.00	60.44
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	REFUERZO LOSA IRREGULAR + MH	3.50	5.80	1/2" @0.25	14.00	24.00	5.70	3.40	0.994	4.00	641.73
			REFUERZO PLACA - BOCACALLE 3,5M X 2,9M CARRIL DERECHO	3.50	2.90	1/2" @0.25	14.00	12.00	2.80	3.40	0.994	4.00	318.08


		BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A)	REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.67	1/2" @0.25	13.00	15.00	3.57	3.00	0.994	4.00	363.45
			REFUERZO PLACA MH - BOCACALLE	3.10	3.00	1/2" @0.25	13.00	12.00	2.90	3.00	0.994	4.00	293.03
		BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA HACIA CALLE 16 B	1.20	1.20	1/2" @0.25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.87
			REFUERZO VIGA EMPALME CON CALLE 16B	0.30	5.00	1/2" @0.25	2.00	20.00	4.90	0.20	0.994	2.00	27.43
			REFUERZO PLACA MH	*3.00*	3.00	1/2" @0.25	12.00	12.00	2.90	2.90	0.994	2.00	138.36
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.40	1/2" @0.25	13.00	14.00	3.30	3.00	0.994	2.00	168.78
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.40	1/2" @0.25	13.00	14.00	3.30	3.00	0.994	2.00	168.78
			REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA E IZQUIERDA HACIA CALLE 16A	1.20	1.20	1/2" @0.25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
			REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA E IZQUIERDA HACIA CALLE 16A	1.20	1.20	1/2" @0.25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.00	1/2" @0.25	13.00	12.00	2.90	3.00	0.994	2.00	146.52
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.00	1/2" @0.25	13.00	12.00	2.90	3.00	0.994	2.00	146.52
3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa		REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.00	1/2" @0.25	13.00	12.00	2.90	3.00	0.994	2.00	146.52
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.00	1/2" @0.25	13.00	12.00	2.90	3.00	0.994	2.00	146.52
			REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA E IZQUIERDA HACIA CALLE 16	1.20	1.20	1/2" @0.25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
			REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA E IZQUIERDA HACIA CALLE 16	1.20	1.20	1/2" @0.25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.00	1/2" @0.25	13.00	12.00	2.90	3.00	0.994	2.00	146.52
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.00	1/2" @0.25	13.00	12.00	2.90	3.00	0.994	2.00	146.52
			REFUERZO PLACA MH	3.00	3.00	1/2" @0.25	12.00	12.00	2.90	2.90	0.994	2.00	138.36
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.00	3.25	1/2" @0.25	12.00	13.00	3.15	2.90	0.994	2.00	150.09
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.00	3.25	1/2" @0.25	12.00	13.00	3.15	2.90	0.994	2.00	150.09
			REFUERZO GIRO BOCA CALLE IZQUIERDA HACIA CRA 15	1.20	1.20	1/2" @0.25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
			REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA HACIA CRA 15	1.20	1.20	1/2" @0.25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
		BARRIO VILLACIELO (CARRERA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	REFUERZO PLACA BOCACALLE	2.25	2.60	1/2" @0.25	9.00	11.00	2.50	2.15	0.994	4.00	183.49
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	2.25	2.50	1/2" @0.25	9.00	10.00	2.40	2.15	0.994	4.00	171.37
			REFUERZO PLACA BOCACALLE	2.25	2.00	1/2" @0.25	9.00	8.00	1.90	2.15	0.994	4.00	136.38
			REFUERZO PLACA MH	2.25	3.00	1/2" @0.25	9.00	12.00	2.90	2.15	0.994	2.00	103.18
			REFUERZO PLACA MH	2.25	2.80	1/2" @0.25	9.00	12.00	2.70	2.15	0.994	2.00	99.60
			REFUERZO PLACA MH	2.25	2.20	1/2" @0.25	9.00	9.00	2.10	2.15	0.994	8.00	304.16
			REFUERZO PLACA MH	2.25	2.40	1/2" @0.25	9.00	10.00	2.30	2.15	0.994	4.00	167.80
			REFUERZO PLACA MH	2.25	2.20	1/2" @0.25	9.00	9.00	2.10	2.15	0.994	2.00	76.04
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERA 9 Y 12)	REFUERZO BOCA CALLE DERECHA CON CRA 9 Y PRESENCIA DE MH	2.50	3.60	1/2" @0.25	10.00	15.00	3.50	2.40	0.994	2.00	141.10
			REFUERZO BOCA CALLE IZQUIERDA CON CRA 9 Y PRESNCIA DE CAJA DE INSPECCIÓN	2.50	3.60	1/2" @0.25	10.00	15.00	3.50	2.40	0.994	2.00	141.10
			REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA HACIA CRA 9	1.20	1.20	1/2" @0.25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
			REFUERZO GIRO BOCA CALLE IZQUIERDA HACIA CRA 9	1.20	1.20	1/2" @0.25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
			REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA HACIA CRA 12	1.20	1.20	1/2" @0.25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
			REFUERZO PLACA MH K 0+037	2.50	2.50	1/2" @0.25	10.00	10.00	2.40	2.40	0.994	16.00	763.40
			REFUERZO PLACA MH K 0+077	2.50	2.50	1/2" @0.25	10.00	10.00	2.40	2.40	0.994	16.00	763.40
			REFUERZO PLACA MH K 0+112	3.00	2.50	1/2" @0.25	12.00	10.00	2.40	2.90	0.994	16.00	919.30
		BARRIO OBRERO (CARRERA 11 ENTRE CALLE 14 Y AV CIRCUNVALAR)	*REFUERZO PLACA MH*	*2.40*	*3.04*	*1/2" @0.25*	*10.00*	*13.00*	*2.94*	*2.30*	*0.994*	*4.00*	*235.60*
3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa		REFUERZO BOCA CALLE DERECHA CON CALLE 14	0.88	2.40	1/2" @0.25	4.00	10.00	2.30	0.78	0.994	2.00	33.80
			REFUERZO BOCA CALLE IZQUIERDA CON CALLE 14	1.02	2.40	1/2" @0.25	5.00	10.00	2.30	0.92	0.994	2.00	41.20
			REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA	1.20	1.20	1/2" @0.25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
			REFUERZO GIRO BOCA CALLE IZQUIERDA	1.20	1.20	1/2" @0.25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
		BARRIO CHAMBACU (CARRERA 10 ENTRE CALLES 22 Y 22C)	REFUERZO PLACA MH K 0+047	2.50	3.00	1/2" @0.25	10.00	12.00	2.90	2.40	0.994	4.00	229.80
			REFUERZO PLACA MH K 0+136 Y BOCA CALLE CARRIL DERECHA	2.50	2.00	1/2" @0.25	10.00	8.00	1.90	2.40	0.994	2.00	75.90
			REFUERZO PLACA MH K 0+136 Y BOCA CALLE CARRIL IZQUIERDO	2.50	2.45	1/2" @0.25	10.00	10.00	2.35	2.40	0.994	2.00	94.40
			REFUERZO PLACA IRREGULARES POR QUIEBRE (PQ) EN LA VÍA DE LA BOCA CALLE	3.00	3.15	1/2" @0.25	12.00	13.00	3.05	2.90	0.994	2.00	147.70
			REFUERZO PLACA IRREGULARES POR QUIEBRE EN LA VÍA DE LA BOCA CALLE	3.00	2.95	1/2" @0.25	12.00	12.00	2.85	2.90	0.994	2.00	137.20
			REFUERZO PLACA IRREGULARES EMPALME CON CALLE 22C LADO IZQUIERDO	1.60	15.60	1/2" @0.25	7.00	63.00	15.50	1.50	0.994	2.00	403.60
ACTA PARCIAL 4													
NO COBRÓ													
ACTA PARCIAL 5													
		BARRIO CHAMBACÚ (CARRERA 10 ENTRE CALLES 22 Y 22C)	REFUERZO PLACA MH K 0+047	2.50	3.00	1/2" @0.25	10.00	12.00	2.90	2.40	0.994	4.00	229.80
			REFUERZO PLACA MH K 0+136 Y BOCA CALLE CARRIL DERECHA	2.50	2.00	1/2" @0.25	10.00	8.00	1.90	2.40	0.994	2.00	75.90
			REFUERZO PLACA MH K 0+136 Y BOCA CALLE CARRIL IZQUIERDO	2.50	2.45	1/2" @0.25	10.00	10.00	2.35	2.40	0.994	2.00	94.40
			REFUERZO PLACA IRREGULARES POR QUIEBRE (PQ) EN LA VÍA DE LA BOCA CALLE	3.00	3.15	1/2" @0.25	12.00	13.00	3.05	2.90	0.994	2.00	147.70
			REFUERZO PLACA IRREGULARES POR QUIEBRE EN LA VÍA DE LA BOCA CALLE	3.00	2.95	1/2" @0.25	12.00	12.00	2.85	2.90	0.994	4.00	274.30
			REFUERZO PLACA IRREGULARES EMPALME CON CALLE 22	2.50	2.00	1/2" @0.25	10.00	8.00	1.90	2.40	0.994	4.00	151.90
			REFUERZO PLACA IRREGULARES EMPALME CON CALLE 22C LADO IZQUIERDO	1.60	15.60	1/2" @0.25	7.00	63.00	15.50	1.50	0.994	2.00	403.60
			REFUERZO GIRO BOCACALLE 22 CARRIL IZQUIERDO	1.20	1.20	1/2" @0.25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.87
			REFUERZO GIRO BOCACALLE 22 CARRIL DERECHO	1.20	1.20	1/2" @0.25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.87
			REFUERZO PLACA BOCA CALLE CARRIL IZQUIERDO	3.00	3.00	1/2" @0.25	12.00	12.00	2.90	2.90	0.994	2.00	138.36

BARRIO BALBOA (CALLE 17A ENTRE CARRERAS 8B Y 9)	REFUERZO PLACA BOCA CALLE CARRIL DERECHO	3.00	3.00	1/2" @0,25	12.00	12.00	2.90	2.90	0.994	2.00	138.36
	REFUERZO GIRO BOCACALLE CARRIL IZQUIERDO	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.87
	REFUERZO GIRO BOCACALLE CARRIL DERECHO	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.87
	REFUERZO PLACA MH 0+060 CARRIL IZQUIERDO	3.00	3.00	1/2" @0,25	12.00	12.00	2.90	2.90	0.994	2.00	138.36
	REFUERZO PLACA MH 0+060 CARRIL DERECHO	3.00	3.00	1/2" @0,25	12.00	12.00	2.90	2.90	0.994	2.00	138.36
	REFUERZO PLACA MH 0+121 CARRIL IZQUIERDO	3.00	3.00	1/2" @0,25	12.00	12.00	2.90	2.90	0.994	2.00	138.36
	REFUERZO PLACA MH 0+121 CARRIL DERECHO	3.00	3.00	1/2" @0,25	12.00	12.00	2.90	2.90	0.994	2.00	138.36
BARRIO LACHARME (CARRERA 8C ENTRE CALLES 14 Y 15)	REFUERZO PLACA BOCA CALLE	2.50	4.00	1/2" @0,25	10.00	16.00	3.90	2.40	0.994	2.00	153.87
	REFUERZO GIRO BOCACALLE	2.50	4.00	1/2" @0,25	10.00	16.00	3.90	2.40	1.994	4.00	617.34
	REFUERZO PLACA MH	2.34	4.00	1/2" @0,25	10.00	16.00	3.90	2.24	0.994	2.00	148.78
	REFUERZO PLACA MH	2.34	4.00	1/2" @0,25	10.00	16.00	3.90	2.24	0.994	2.00	148.78
	REFUERZO PLACA MH	2.50	4.00	1/2" @0,25	10.00	16.00	3.90	2.40	0.994	2.00	153.87
	REFUERZO PLACA MH	2.50	4.00	1/2" @0,25	10.00	16.00	3.90	2.40	0.994	2.00	153.87
	REFUERZO GIRO BOCACALLE CARRIL IZQUIERDO	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.87
	REFUERZO GIRO BOCACALLE CARRIL DERECHO	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.87
BARRIO LACHARME (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 8C Y 8D)	REFUERZO PLACA BOCA CALLE CARRIL IZQUIERDO	3.50	4.50	1/2" @0,25	14.00	18.00	4.40	3.40	0.994	2.00	244.13
	REFUERZO PLACA BOCA CALLE CARRIL DERECHO	3.50	4.50	1/2" @0,25	14.00	18.00	4.40	3.40	0.994	2.00	244.13
	REFUERZO GIRO BOCACALLE CARRIL IZQUIERDO	7.60	2.00	1/2" @0,25	31.00	8.00	1.90	7.50	0.994	2.00	236.37
	REFUERZO PLACA MH CARRIL IZQUIERDO	3.50	4.00	1/2" @0,25	14.00	16.00	3.90	3.40	0.994	2.00	216.69
	REFUERZO PLACA MH CARRIL DERECHO	3.50	4.00	1/2" @0,25	14.00	16.00	3.90	3.40	0.994	2.00	216.69
BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA HACIA CALLE 16 B	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.87
	REFUERZO VIGA EMPALME CON CALLE 16B	0.30	5.00	1/2" @0,25	2.00	20.00	4.90	0.20	0.994	2.00	27.43
	REFUERZO PLACA MH	3.00	3.00	1/2" @0,25	12.00	12.00	2.90	2.90	0.994	2.00	138.36
	REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.40	1/2" @0,25	13.00	14.00	3.30	3.00	0.994	2.00	168.78
	REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.40	1/2" @0,25	13.00	14.00	3.30	3.00	0.994	2.00	168.78
	REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA E IZQUIERDA HACIA CALLE 16A	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
	REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA E IZQUIERDA HACIA CALLE 16A	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
	REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.00	1/2" @0,25	13.00	12.00	2.90	3.00	0.994	2.00	146.52
	REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.00	1/2" @0,25	13.00	12.00	2.90	3.00	0.994	2.00	146.52
	REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.00	1/2" @0,25	13.00	12.00	2.90	3.00	0.994	2.00	146.52
	REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.00	1/2" @0,25	13.00	12.00	2.90	3.00	0.994	2.00	146.52
	REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA E IZQUIERDA HACIA CALLE 16	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
	REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA E IZQUIERDA HACIA CALLE 16	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
	REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.00	1/2" @0,25	13.00	12.00	2.90	3.00	0.994	2.00	146.52
	REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.00	1/2" @0,25	13.00	12.00	2.90	3.00	0.994	2.00	146.52
	REFUERZO PLACA MH	3.00	3.00	1/2" @0,25	12.00	12.00	2.90	2.90	0.994	2.00	138.36
	REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.00	3.25	1/2" @0,25	12.00	13.00	3,15	2.90	0.994	2.00	150.09
	REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.00	3.25	1/2" @0,25	12.00	13.00	3.15	2.90	0.994	2.00	150.09
	REFUERZO GIRO BOCA CALLE IZQUIERDA HACIA CRA 15	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
	REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA HACIA CRA 15	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	REFUERZO PLACA BOCA CALLE CARRIL IZQUIERDO	2.50	3.00	1/2" @0,25	10.00	12.00	2.90	2.40	0.994	2.00	114.91
	REFUERZO PLACA BOCA CALLE CARRIL DERECHO	2.50	3.00	1/2" @0,25	10.00	12.00	2.90	2.40	0.994	2.00	114.91
	REFUERZO GIRO BOCACALLE CARRIL IZQUIERDO	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	4.00	43.74
	REFUERZO GIRO BOCACALLE CARRIL DERECHO	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	4.00	43.74
	REFUERZO PLACA MH CARRIL IZQUIERDO	3.00	3.00	1/2" @0,25	12.00	12.00	2.90	2.90	0.994	2.00	138.36
	REFUERZO PLACA MH CARRIL DERECHO	3.00	3.00	1/2" @0,25	12.00	12.00	2.90	2.90	0.994	2.00	138.36
BARIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 Y 12)	REFUERZO BOCA CALLE DERECHA CON CRA 9 Y PRESENCIA DE MH	2.50	3.60	1/2" @0,25	10.00	15.00	3.50	2.40	0.994	2.00	141.10
	REFUERZO BOCA CALLE IZQUIERDA CON CRA 9 Y PRESNCIA DE CAJA DE INSPECCIÓN	2.50	3.60	1/2" @0,25	10.00	15.00	3.50	2.40	0.994	2.00	141.10
	REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA HACIA CRA 9	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
	REFUERZO GIRO BOCA CALLE IZQUIERDA HACIA CRA 9	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
	REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA HACIA CRA 12	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
	REFUERZO PLACA MH K 0+037	2.50	2.50	1/2" @0,25	10.00	10.00	2.40	2.40	0.994	16.00	763.40
	REFUERZO PLACA MH K 0+077	2.50	2.50	1/2" @0,25	10.00	10.00	2.40	2.40	0.994	16.00	763.40
	REFUERZO PLACA MH K 0+112	3.00	2.50	1/2" @0,25	12.00	10.00	2.40	2.90	0.994	16.00	919.30
BARRIO OBRERO (CARRERA 12 ENTRE AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 14)	REFUERZO PLACA BOCA CALLE CARRIL IZQUIERDO	3.56	2.96	1/2" @0,25	15.00	12.00	2.86	3.46	0.99	2.00	167.80
	REFUERZO PLACA BOCA CALLE CARRIL DERECHO	3.56	2.96	1/2" @0,25	15.00	12.00	2.86	3.46	0.99	2.00	167.80
	REFUERZO GIRO BOCACALLE CARRIL IZQUIERDO	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.99	2.00	21.90
	REFUERZO GIRO BOCACALLE CARRIL DERECHO	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.99	2.00	21.90
	REFUERZO PLACA MH CARRIL IZQUIERDO	3.50	3.50	1/2" @0,25	14.00	14.00	3.40	3.40	0.99	2.00	189.30
	REFUERZO PLACA MH CARRIL DERECHO	3.50	3.50	1/2" @0,25	14.00	14.00	3.40	3.40	0.99	2.00	189.30
BARIO OBRERO (CARRERA 11 ENTRE AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 14)	REFUERZO PLACA MH	2.40	3.04	1/2" @0,25	10.00	13.00	2.94	2.30	0.994	4.00	235.80
	REFUERZO BOCA CALLE DERECHA CON CALLE 14	0.90	2.40	1/2" @0,25	4.00	10.00	2.30	0.80	0.994	2.00	34.20
	REFUERZO BOCA CALLE IZQUIERDA CON CALLE 14	1.00	2.40	1/2" @0,25	4.00	10.00	2.30	0.90	0.994	2.00	36.20
	REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
	REFUERZO GIRO BOCA CALLE IZQUIERDA	1.20	1.20	1/2" @0,25	5.00	5.00	1.10	1.10	0.994	2.00	21.90
LA JULIA (CALLE 15 ENTRE AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 15)	REFUERZO PLACA BOCA CALLE CARRIL IZQUIERDO	1.64	3.00	1/2" @0,25	7.00	12.00	2.90	1.54	0.994	2.00	77.10
	REFUERZO PLACA BOCA CALLE CARRIL DERECHO	1.64	3.00	1/2" @0,26	7.00	12.00	2.90	1.54	0.994	2.00	77.10
	REFUERZO GIRO BOCACALLE CARRIL IZQUIERDO	5.60	1.50	1/2" @0,25	23.00	6.00	1.40	5.50	0.994	2.00	129.60
	REFUERZO GIRO BOCACALLE CARRIL DERECHO	5.60	0.25	1/2" @0,25	23.00	1.00	0.15	5.50	0.994	2.00	17.80
BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A)	REFUERZO PLACA BOCACALLE	3.10	3.67	1/2" @0,25	13.00	15.00	3.57	3.00	0.994	4.00	363.45
	REFUERZO PLACA MH - BOCACALLE	3.10	3.00	1/2" @0,25	13.00	12.00	2.90	3.00	0.994	4.00	293.03

BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	REFUERZO PLACA 2,97M X 3,28M	2.97	3.28	1/2" @0.25	12.00	14.00	3.18	2.87	0.994	4.00	311.48
	REFUERZO PLACA 3,5M X 3,5M	3.50	3.50	1/2" @0.25	14.00	14.00	3.40	3.40	0.994	2.00	189.26
	REFUERZO PLACA MH - 3,40M X 3,50M	3.40	3.50	1/2" @0.25	14.00	14.00	3.40	3.30	0.994	2.00	186.47
	REFUERZO PLACA BOCACALLE - 3,60M X 3,50M	3.60	3.50	1/2" @0.25	15.00	14.00	3.40	3.50	0.994	4.00	397.60
	REFUERZO PLACA	2.50	2.50	1/2" @0.25	10.00	10.00	2.40	2.40	0.994	2.00	95.42
	REFUERZO GIRO BOCA CALLE DERECHA	1.00	2.50	1/2" @0.25	10.00	7.00	2.40	0.90	0.994	2.00	60.24
	REFUERZO GIRO BOCA CALLE IZQUIERDA	1.00	1.80	1/2" @0.25	11.00	13.00	1.70	0.90	0.994	2.00	60.44
BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONALES 24 Y 25)	REFUERZO LOSA IRREGULAR + MH	3.50	5.80	1/2" @0.25	14.00	24.00	5.70	3.40	0.994	4.00	641.73
	REFUERZO PLACA - BOCACALLE 3,5M X 2,9M CARRIL DERECHO	3.50	2.90	1/2" @0.25	14.00	12.00	2.80	3.40	0.994	4.00	318.08
VILLACIELO (CARRERA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	REFUERZO PLACA BOCACALLE	2.25	2.60	1/2" @0.25	9.00	11.00	2.50	2.15	0.994	4.00	183.49
	REFUERZO PLACA BOCACALLE	2.25	2.50	1/2" @0.25	9.00	10.00	2.40	2.15	0.994	4.00	171.37
	REFUERZO PLACA BOCACALLE	2.25	2.00	1/2" @0.25	9.00	8.00	1.90	2.15	0.994	4.00	136.38
	REFUERZO PLACA BOCACALLE	2.00	5.00	1/2" @0.25	8.00	20.00	4.90	1.90	0.994	96.00	7366.73
	REFUERZO PLACA QUIEBRE GEOMÉTRICO	2.25	3.00	1/2" @0.25	9.00	12.00	2.90	2.15	0.994	8.00	412.71
	REFUERZO PLACA MH	2.25	3.00	1/2" @0.25	9.00	12.00	2.90	2.15	0.994	2.00	103.18
	REFUERZO PLACA MH	2.25	3.00	1/2" @0.25	9.00	12.00	2.90	2.15	0.994	2.00	103.18
	REFUERZO PLACA MH	2.25	3.00	1/2" @0.25	9.00	12.00	2.90	2.15	0.994	2.00	103.18
	REFUERZO PLACA MH	2.25	3.00	1/2" @0.25	9.00	12.00	2.90	2.15	0.994	2.00	103.18
	REFUERZO PLACA MH	2.25	3.00	1/2" @0.25	9.00	12.00	2.90	2.15	0.994	2.00	103.18
	REFUERZO PLACA MH	2.25	3.00	1/2" @0.25	9.00	12.00	2.90	2.15	0.994	2.00	103.18
	REFUERZO PLACA MH	2.25	3.00	1/2" @0.25	9.00	12.00	2.90	2.15	0.994	2.00	103.18
	REFUERZO PLACA MH	2.25	3.00	1/2" @0.25	9.00	12.00	2.90	2.15	0.994	2.00	103.18
	REFUERZO PLACA MH	2.25	3.00	1/2" @0.25	9.00	12.00	2.90	2.15	0.994	2.00	103.18
	REFUERZO PLACA MH	2.25	2.80	1/2" @0.25	9.00	12.00	2.70	2.15	0.994	2.00	99.60
	REFUERZO PLACA MH	2.25	2.20	1/2" @0.25	9.00	9.00	2.10	2.15	0.994	8.00	304.16
	REFUERZO PLACA MH	2.25	2.40	1/2" @0.25	8.00	10.00	2.30	2.15	0.994	4.00	167.80
	REFUERZO PLACA MH	2.25	2.20	1/2" @0.25	9.00	9.00	2.10	2.15	0.994	2.00	76.04
BARRIO VILLACIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	REFUERZO PLACA GIRO EN CURVA ENTRE 45 Y 53	2.50	2.60	1/2" @0.25	10.00	11.00	2.50	2.40	0.994	16.00	919.65
	REFUERZO PLACA BOCACALLE	2.00	5.00	1/2" @0.25	8.00	20.00	4.90	1.90	0.994	0.00	0.00
	REFUERZO PLACA MH	2.25	3.00	1/2" @0.25	9.00	12.00	2.90	2.15	0.994	2.00	103.18
	REFUERZO PLACA MH	2.25	3.00	1/2" @0.25	9.00	12.00	2.90	2.15	0.994	2.00	103.18
	REFUERZO PLACA MH	2.25	3.00	1/2" @0.25	9.00	12.00	2.90	2.15	0.994	2.00	103.18
TOTAL ACUMULADO											25741.30
ACTA N°1											4898.57
ACTA N°2											0.00
ACTA N°3											5498.13
ACTA N°4											0.00
ACTA N°5											15371.10

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
	3.04 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	FECHA 20/01/2026






BARRIO VILLACIELO
ABSCISA K0+350





BARRIO URBINA
ABSCISA K0+085

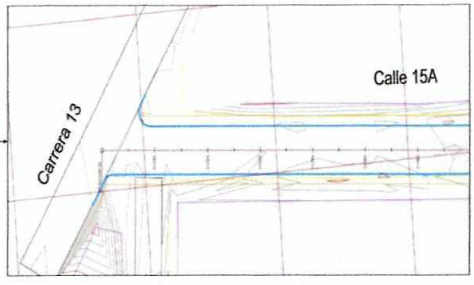



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°4

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**			**SUBCAPITULO**	
ITEM	**4.01**	**SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM**		**UNIDAD**	**UND**

# ITEM	**LOCALIZACIÓN**			**DIMENSION**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
		TRAMOS	**ABSCISA**	**DESCRIPCION**		
			ACTA PARCIAL 1			
			NO COBRÓ			
			ACTA PARCIAL 2			
			NO COBRÓ			
			ACTA PARCIAL 3			
			NO COBRÓ			
			ACTA PARCIAL 4			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	BARRIO LA GRANJA TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONALES 24 Y 25		SR-01	2.00	2.00
				SP-25A	2.00	2.00
		BARRIO LA GRANJA DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5		SR-01	2.00	2.00
				SR-30	2.00	2.00
				SP-48	2.00	2.00
				SP-25A	6.00	6.00
				SR-08	1.00	1.00
		BARRIO URBINA CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A		SR-01	2.00	2.00
				SR-08	1.00	1.00
				SP-25A	6.00	6.00
			ACTA PARCIAL 5			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 16 Y 16A)		SR-01	6.00	6.00
				SP-25A	4.00	4.00
				SI-27	1.00	1.00
		LA JULIA CALLE 15 ENTRE LA AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 15)		SR-01	1.00	1.00
				SP-25A	2.00	2.00
		BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16A)		SR-01	2.00	2.00
		BARRIO LACHARME (CALLE 14 ENTRE CARRERA 8C Y 8D)		SR-01	1.00	1.00
				SR-07	1.00	1.00
		BARRIO LACHARME (CRA 8C ENTRE LAS CALLES 14 Y 15)		SR-01	1.00	1.00
				SR-04	1.00	1.00

TOTAL	**44.00**
ACTA N° 1	**0.00**
ACTA N° 2	**0.00**
ACTA N° 3	**0.00**
ACTA N°4	**25.00**

PRESENTE ACTA N°5	18.00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°4
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
	4.01 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	FECHA 20/01/2026





CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°4

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**		**SUBCAPITULO**	
ITEM	**4.02**	**SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM**	**UNIDAD**	**UND**

# ÍTEM	**LOCALIZACIÓN**			**DIMENSION**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
		TRAMOS	**ABSCISA**	**DESCRIPCION**		
			ACTA PARCIAL 1			
			NO COBRÓ			
			ACTA PARCIAL 2			
			NO COBRÓ			
			ACTA PARCIAL 3			
			NO COBRÓ			
			ACTA PARCIAL 4			
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	BARRIO LA GRANJA TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONALES 24 Y 25	K0+040 DER	SR-01	1.00	1.00
		BARRIO LA GRANJA DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5	K0+006 IZQ	SR-01	1.00	1.00
			ACTA PARCIAL 5			
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	BARRIO LACHARME (CALLE 14 ENTRE CARRERAS 8C Y 8D)	K0+040 DER	SP-48	1.00	1.00
			K0+006 IZQ	SR-30	1.00	1.00
				TOTAL		**4.00**
				ACTA N° 1		**0.00**
				ACTA N° 2		**0.00**
				ACTA N° 3		**0.00**
				ACTA N° 4		**2.00**
				PRESENTE ACTA N°5		**2.00**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°4	
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2	
4.02	**SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM**	**FECHA**	20/01/2026





CONTRATISTA	**INTERVENTORÍA**

NOMBRE	
FIRMA	

NOMBRE	
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°3

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA MONTERIA	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-036-2024		
INTERVENTOR:	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-039-2024		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**NA**	
ITEM	**4.03**	**DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)**	**UNIDAD** / **M2**

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN			DIMENSIÓN			CANTIDAD M2	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	TIPO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD		
ACTA PARCIAL 1								
NO COBRÓ								
ACTA PARCIAL 2								
NO COBRÓ								
ACTA PARCIAL 3								
NO COBRÓ								
ACTA PARCIAL 4								
4.03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	BARRIO LA GRANJA TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONALES 24 Y 25	TRANSVERSALES	4.00	0.40	8.00	12.80	12.80
			TRANSVERSALES	3.30	0.40	1.00	1.32	1.32
			SENTIDO VIA	3.00	0.40	1.00	1.20	1.20
				5.10	0.50	1.00	2.55	2.55
		BARRIO LA GRANJA DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5	TRANSVERSALES	4.00	0.40	16.00	25.60	25.60
			TRANSVERSALES	3.30	0.40	2.00	2.64	2.64
			SENTIDO VIA	3.84	0.40	2.00	3.07	3.07
				3.00	0.40	2.00	2.40	2.40
		BARRIO URBINA CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A	TRANSVERSALES	4.00	0.40	14.00	22.40	22.40
			TRANSVERSALES	3.30	0.40	2.00	2.64	2.64
			SENTIDO VIA	3.80	0.40	1.00	1.52	1.52
				3.00	0.40	2.00	2.40	2.40
				3.21	1.00	1.00	3.21	3.21
ACTA PARCIAL 5								
4.03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	LONGITUDINALES	4.00	0.40	35.00	56.00	56.00
			TRANSVERSALES	2.80	0.40	5.00	5.60	5.60
			SENTIDO VIA	3.00	0.40	5.00	6.00	6.00
				3.90	0.82	5.00	16.07	16.07
		LA JULIA CALLE 15 ENTRE LA AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 15)	LONGITUDINALES	4.00	0.40	7.00	11.20	11.20
			TRANSVERSALES	2.80	0.40	1.00	1.12	1.12
			SENTIDO VIA	3.00	0.40	1.00	1.20	1.20
				3.84	0.40	1.00	1.54	1.54
		BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	LONGITUDINALES	4.00	0.40	14.00	22.40	22.40
			TRANSVERSALES	2.80	0.40	2.00	2.24	2.24
			SENTIDO VIA	3.00	0.40	2.00	2.40	2.40
				3.90	0.82	2.00	6.43	6.43
		BARRIO LACHARME (CALLE 14 ENTRE CARRERA 8C Y 8D) ; (CRA 8C ENTRE LAS CALLES 14 Y 15)	LONGITUDINALES	4.00	0.40	16.00	25.60	25.60
			SENTIDO VIA	3.00	0.40	1.00	1.20	1.20
				3.84	0.40	1.00	1.54	1.54
				5.10	0.50	1.00	2.55	2.55
TOTAL								**246.80**
ACTA N° 1								**0.00**
ACTA N° 2								**0.00**
ACTA N° 3								**0.00**
ACTA N°4								**83.80**
PRESENTE ACTA N°5								**163.00**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°3
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
	4.03 / **DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE,**	**FECHA** 20/01/2026



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA NELSON VANEGAS ORTIZ CONSORCIO NUEVA MONTERIA
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA LUIS HOYOS AGUIRRE PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S
FIRMA	


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**SUBCAPITULO**	**NA**		
ITEM	**4.04**	**DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)**				**UNIDAD**	**M**	
# ÍTEM		**LOCALIZACIÓN**				**DIMENSIÓN**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
		TRAMO	**ABSCISA**	**ABSCISA**	**DESCRIPCIÓN**	**LONGITUD (m)**		
		ACTA PARCIAL 1						
		NO COBRÓ						
		ACTA PARCIAL 2						
		NO COBRÓ						
		ACTA PARCIAL 3						
		NO COBRÓ						
		ACTA PARCIAL 4						
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	**BARRIO URBINA** (CARRERA 14 ENTRE CALLES 13 Y 15A)	K0+000.00	K0+088.00	DEMARCACION	88.00	3.00	264.00
		BARRIO LA GRANJA DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5	K0+000.00	K0+141.00		141.00	3.00	423.00
		BARRIO LA GRANJA TRANSVERSAL 4 ENTRE DIGAONALES 24 Y 25	K0+000.00	K0+051.00		51.00	3.00	153.00
		ACTA PARCIAL 5						
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	K0+000.00	K0+088.40	DEMARCACION	88.40	3.00	265.20
			K0+104.30	K0+152.00		47.70	3.00	143.10
			K0+163.50	K0+206.00		42.50	3.00	127.50
		LA JULIA CALLE 15 ENTRE LA AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 15)	K0+000.00	K0+141.00		141.00	3.00	423.00
		BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	K0+000.00	K0+051.00		51.00	3.00	153.00
		BARRIO LACHARME (CALLE 14 ENTRE CARRERA 8C Y 8D)	K0+000.00	K0+051.00		51.00	3.00	153.00
		BARRIO LACHARME (CRA 8C ENTRE LAS CALLES 14 Y 15)	K0+000.00	K0+051.00		51.00	3.00	153.00
		TOTAL ACUMULADO						**2257.80**
		ACTA N°1						**0.00**
		ACTA N°2						**0.00**
		ACTA N°3						**0.00**
		ACTA N°4						**840.00**
		ACTA N°5						**1417.80**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1		Página 2 de 2
	4.04	TAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON	FECHA 20/01/2026



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORIA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUBCAPITULO**	**NA**
ITEM	**4.05**	**REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO**	**UNIDAD** / **M**

# ÍTEM		LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN		
		TRAMO	ABSCISA	ABSCISA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
ACTA PARCIAL 1								
NO COBRÓ								
ACTA PARCIAL 2								
NO COBRÓ								
ACTA PARCIAL 3								
NO COBRÓ								
ACTA PARCIAL 4								
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	**BARRIO URBINA** (CARRERA 14 ENTRE CALLES 13 Y 15A)	K0+020.00			6.00	1.00	6.00
			K0+045.00			6.00	1.00	6.00
			K0+070.00			6.00	1.00	6.00
		BARRIO LA GRANJA DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5	K0+020.00			7.00	1.00	7.00
			K0+060.00			7.00	1.00	7.00
			K0+130.00			7.00	1.00	7.00
		BARRIO LA GRANJA TRANSVERSAL 4 ENTRE DIGAONALES 24 Y 25	K0+045.00			7.00	1.00	7.00
ACTA PARCIAL 5								
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	**BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)**				6.00	3.00	18.00
TOTAL ACUMULADO								**64.00**
ACTA N°1								**0.00**
ACTA N°2								**0.00**
ACTA N°3								**0.00**
ACTA N°4								**46.00**
ACTA N°5								**18.00**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1		Página 2 de 2
	4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	FECHA 20/01/2026

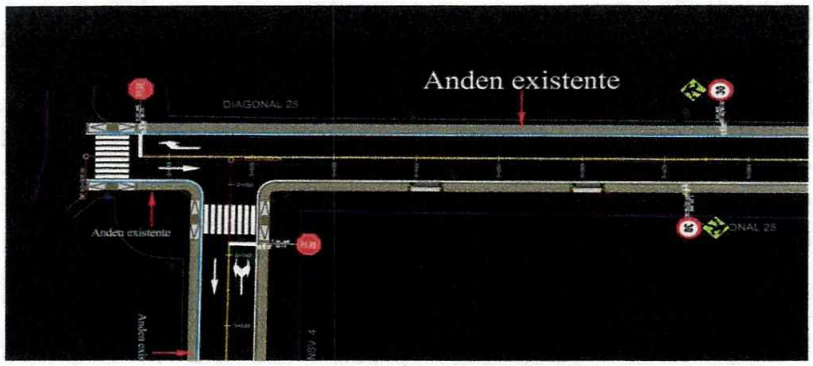

CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORIA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**CUNETAS - CANAL**		**SUBCAPITULO**	**NA**	
ITEM	**5.03**	**GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES**		**UNIDAD**	**M2**

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR MATERIAL GRANULAR (m)	PERIMETRO (m)		
ACTA PARCIAL 1											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 2											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 3											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 4											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 5											
5.03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	CARRIL DERECHO	CUNETAS	88.05	0.00	0.85	0.20	1.25	110.06	110.06
			LADO IZQUIERDO		11.40	0.00	0.90	0.20	1.30	14.82	14.82
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE	CARRIL DERECHO	CUNETAS	53.25	0.00	0.85	0.20	1.25	66.56	66.56
		BARRIO VILLACIELO (CARRERA 45 ENTRE CALLES 53 Y 58D)	AMBOS CARRILES	CUNETAS	503.45	0.00	1.80	0.20	2.20	1107.59	1107.59
			LADO IZQUIERDO		0.00	0.00	0.90	0.20	1.30	0.00	0.00
			CUNETA TRANSVERSAL		7.00	0.00	0.90	0.20	1.30	9.10	9.10
TOTAL											**1308.10**
ACTA N° 1											**0.00**
ACTA N° 2											**0.00**
ACTA N° 3											**0.00**
ACTA N° 4											**0.00**
PRESENTE ACTA N°5											**1308.10**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
	5.03 GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	FECHA 20/01/2026

CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA NELSON VANEGAS ORTIZ CONSORCIO NUEVA MONTERIA
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA LUIS HOYOS AGUIRRE PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA GYB	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**CUNETAS - CANAL**		**SUBCAPITULO**	**NA**	
ITEM	**5.04**	**RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO**		**UNIDAD**	**M3**

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 2											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 3											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 4											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 5											
5.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	CARRIL DERECHO	CUNETAS	88.05	0.00	0.85	0.20	0.17	14.97	14.97
			LADO IZQUIERDO		11.40	0.00	0.90	0.20	0.18	2.05	2.05
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE	CARRIL DERECHO	CUNETAS	53.25	0.00	0.85	0.20	0.17	9.05	9.05
		BARRIO VILLACIELO (CARRERA 45 ENTRE CALLES 83 Y 88D)	AMBOS CARRILES	CUNETAS	503.45	0.00	1.80	0.20	0.36	181.24	181.24
			LADO IZQUIERDO		0.00	0.00	0.90	0.20	0.18	0.00	0.00
			CUNETA TRANSVERSAL		7.00	0.00	0.90	0.20	0.18	1.26	1.26
TOTAL											**208.60**
ACTA N° 1											**0.00**
ACTA N° 2											**0.00**
ACTA N° 3											**0.00**
ACTA N° 4											**0.00**
PRESENTE ACTA N°5											**208.60**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
	5.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	FECHA 20/01/2026

CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA NELSON VANEGAS ORTIZ CONSORCIO NUEVA MONTERIA
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA LUIS HOYOS AGUIRRE PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-008-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**SUBCAPITULO**	**NA**
ITEM	**6.01**	**S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP, EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS**	**UNIDAD** **M**

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
	TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)		
ACTA PARCIAL 1							
NO COBRÓ							
ACTA PARCIAL 2							
6.01	**BARRIO LA GRANJA** (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0+048.00	K0+138.00	TABLA GUIA	90.00	1.00	90.00
	BARRIO URBINA (CRA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15)	K0+008.80	K0+058.80		50.00	1.00	50.00
ACTA PARCIAL 3							
6.01	***BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL*** 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0+000.00	K0+138.00	TABLA GUIA LADO DERECHO	83.00	1.00	83.00
		K0+000.00	K0+000.00	TABLA GUÍA ANDÉN POSTERIOR	15.80	1.00	15.80
		K0+003.00	K0+138.00	TABLA GUIA LADO IZQUIERDO	116.40	1.00	116.40
	BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+000.00	K0+051.00	TABLA GUIA LADO DERECHO	32.20	1.00	32.20
		K0+000.00	K0+051.00	TABLA GUIA LADO IZQUIERDO	40.60	1.00	40.60
	BARRIO URBINA (CRA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15)	K0+003.00	K0+088.80	TABLA GUIA LADO DERECHO	44.80	1.00	44.80
		K0+003.00	K0+088.80	TABLA GUIA LADO IZQUIERDO	73.40	1.00	73.40
ACTA PARCIAL 4							
6.01	**BARRIO RISARALDA** (CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	K0+163.50	K0+231.00	CARRIL IZQUIERDO	40.30	1.00	40.30
				CARRIL DERECHO	57.10	1.00	57.10
		K0+104.30	K0+152.00	CARRIL IZQUIERDO	18.50	1.00	18.50
				CARRIL DERECHO	31.10	1.00	31.10
		K0+003.00	K0+091.40	CARRIL IZQUIERDO	50.80	1.00	50.80
				CARRIL DERECHO	63.40	1.00	63.40
	BARRIO LACHARME CALLE 14 ENTRE CARREARA 8C Y 8D	K0+007.00	K0+039.00	CARRIL IZQUIERDO	25.80	1.00	25.80
		K0+007.00	K0+039.00	CARRIL DERECHO	25.80	1.00	25.80
	BARRIO LACHARME CARRERA 8C ENTRE CALLES 14 Y 15	K0+003.50	K0+083.60	CARRIL IZQUIERDO	73.90	1.00	73.90
		K0+003.50	K0+083.60	CARRIL DERECHO	73.90	1.00	73.90
	BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERA 9 Y TRANSVERSAL 12)	K0+003.00	K0+118.00	CARRIL IZQUIERDO	100.40	1.00	100.40
		K0+003.00	K0+118.00	CARRIL DERECHO	100.40	1.00	100.40
	BARRIO OBRERO (CARRERA 12 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	*K0+000.00*	*K0+073.40*	*CARRIL IZQUIERDO*	*58.80*	*1.00*	*58.80*
		K0+000.00	K0+073.40	CARRIL DERECHO	58.80	1.00	58.80
	BARRIO OBRERO (CARRERA 11 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	K0+000.00	K0+050.00	CARRIL IZQUIERDO	43.80	1.00	43.80
		K0+000.00	K0+050.00	CARRIL DERECHO	43.80	1.00	43.80
ACTA PARCIAL 5							
6.01	**LA JULIA** **CALLE 15 ENTRE LA AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 15)**	K0+000.00	K0+050.00	CARRIL IZQUIERDO	12.40	1.00	12.40
				CARRIL DERECHO	37.60	1.00	37.60
	BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	K0+000.00	K0+048.00	CARRIL IZQUIERDO	18.80	1.00	18.80
				CARRIL DERECHO	31.40	1.00	31.40
TOTAL ACUMULADO							**1373.00**

ACTA N° 1		8.00
ACTA N° 2		140.00
ACTA N° 3		266.20
ACTA N° 4		822.80
ACTA N° 5		144.00


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
	6.01 SIÑ TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	FECHA 20/01/2026




INSTALACION DE TABLETA GUIA
BARRIO URBINA



INSTALACION DE TABLETA GUIA
BARRIO RESARALDA

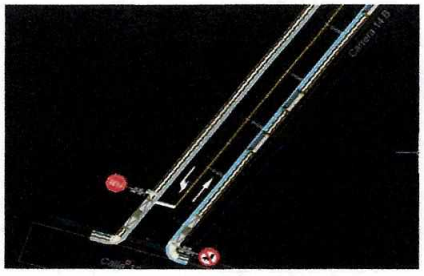

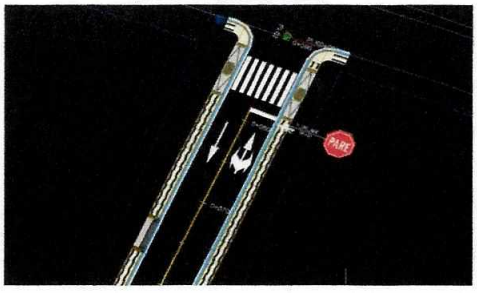

CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA I.P-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**		**SUBCAPITULO**	**NA**	
ITEM	**6.02**	**FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA**		**UNIDAD**	**M**

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)		
ACTA PARCIAL 1								
NO COBRÓ								
ACTA PARCIAL 2								
6.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	**BARRIO LA GRANJA** (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0+048.00	K0+138.00	VISUAL	90.00	1.00	90.00
		BARRIO URBINA (CRA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15)	K0+008.80	K0+058.80		50.00	1.00	50.00
ACTA PARCIAL 3								
6.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	**BARRIO LA GRANJA** (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0+000.00	K0+138.00	VISUAL LADO DERECHO	112.40	1.00	112.40
			K0+000.00	K0+000.00	VISUAL ANDÉN POSTERIOR	15.80	1.00	15.80
			K0+003.00	*K0+138.00*	*VISUAL LADO IZQUIERDO*	*116.40*	*1.00*	*116.40*
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+000.00	K0+051.00	VISUAL LADO DERECHO	32.20	1.00	32.20
			K0+000.00	K0+051.00	VISUAL LADO IZQUIERDO	40.60	1.00	40.60
		BARRIO URBINA (CRA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15)	K0+003.00	K0+088.80	VISUAL LADO DERECHO	44.80	1.00	44.80
			K0+003.00	K0+088.80	VISUAL LADO IZQUIERDO	73.40	1.00	73.40
ACTA PARCIAL 4								
6.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	**BARRIO RISARALDA** (CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	K0+163.50	K0+231.00	CARRIL IZQUIERDO	40.30	1.00	40.30
					CARRIL DERECHO	57.10	1.00	57.10
			K0+104.30	K0+152.00	CARRIL IZQUIERDO	18.50	1.00	18.50
					CARRIL DERECHO	31.10	1.00	31.10
			K0+003.00	K0+091.40	CARRIL IZQUIERDO	50.80	1.00	50.80
					CARRIL DERECHO	63.40	1.00	63.40
		BARRIO LACHARME CALLE 14 ENTRE CARREARA 8C Y 8D	K0+007.00	K0+039.00	CARRIL IZQUIERDO	25.80	1.00	25.80
			K0+007.00	K0+039.00	CARRIL DERECHO	25.80	1.00	25.80
		BARRIO LACHARME CARRERA 8C ENTRE CALLES 14 Y 15	K0+003.50	K0+083.60	CARRIL IZQUIERDO	73.90	1.00	73.90
			K0+003.50	K0+083.60	CARRIL DERECHO	73.90	1.00	73.90
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERA 9 Y TRANSVERSAL 12)	K0+003.00	K0+118.00	CARRIL IZQUIERDO	100.40	1.00	100.40
			K0+003.00	K0+118.00	CARRIL DERECHO	100.40	1.00	100.40
		BARRIO OBRERO (CARRERA 12 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	K0+000.00	K0+073.40	CARRIL IZQUIERDO	58.80	1.00	58.80
			K0+000.00	K0+073.40	CARRIL DERECHO	58.80	1.00	58.80
		BARRIO OBRERO (CARRERA 11 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	K0+000.00	K0+050.00	CARRIL IZQUIERDO	43.80	1.00	43.80
			K0+000.00	K0+050.00	CARRIL DERECHO	43.80	1.00	43.80
ACTA PARCIAL 4								
		LA JULIA CALLE 15 ENTRE LA AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 15)	K0+000.00	K0+050.00	CARRIL IZQUIERDO	12.40	1.00	12.40
					CARRIL DERECHO	37.60	1.00	37.60
		BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	K0+000.00	K0+048.00	CARRIL IZQUIERDO	18.80	1.00	18.80
					CARRIL DERECHO	31.40	1.00	31.40


TOTAL ACUMULADO		**1402.40**
ACTA N° 1		**0.00**
ACTA N° 2		**148.00**
ACTA N° 3		**295.60**
ACTA N° 4		**866.60**

ACTA N° 5		100.20

POMA CARPEAM TUA NEPOTES MONTERÍA	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
	6.02 PRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ALADUAN EN CONCRETO DE 28MPA REFT A 60M COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS	FECHA 20/01/2026

BARRIO RISARALDA
COMUNA 5



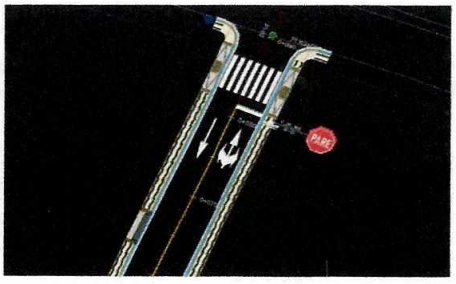

CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**		**SUBCAPITULO**	**NA**	
ITEM	**6.03**	**CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.**		**UNIDAD**	**M2**

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN			CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (M)	AREA (M2)		
ACTA PARCIAL 1										
NO COBRÓ										
ACTA PARCIAL 2										
6.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	**BARRIO LA GRANJA** (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0+048.00	K0+138.00	ANDÉN LADO IZQUIERDO	90.00	0.60	54.00	2.00	108.00
		BARRIO URBINA (CRA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15)	K0+008.80	K0+058.80	ANDÉN LADO IZQUIERDO	50.00	0.50	25.00	2.00	50.00
ACTA PARCIAL 3										
6.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	**BARRIO LA GRANJA** (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0+000.00	K0+138.00	ANDÉN LADO DERECHO	112.40	0.35	39.34	2.00	78.68
			K0+000.00	K0+000.00	ANDÉN POSTERIOR	15.80	0.35	5.53	2.00	11.06
			K0+003.00	K0+138.00	VISUAL LADO IZQUIERDO	116.40	0.60	69.84	2.00	139.68
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0+000.00	K0+051.00	VISUAL LADO DERECHO	32.20	0.35	11.27	2.00	22.54
			K0+000.00	K0+051.00	VISUAL LADO IZQUIERDO	40.60	0.35	14.21	2.00	28.42
		BARRIO URBINA (CRA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15)	K0+003.00	K0+088.80	VISUAL LADO DERECHO	44.80	0.35	15.68	2.00	31.36
			K0+003.00	K0+088.80	VISUAL LADO IZQUIERDO	73.40	0.35	25.69	2.00	51.38
ACTA PARCIAL 4										
6.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	**BARRIO RISARALDA** (CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	K0+163.50	K0+231.00	CARRIL IZQUIERDO	40.30	0.60	24.18	1.00	24.18
					CARRIL DERECHO	57.10	0.60	34.26	1.00	34.26
			K0+104.30	K0+152.00	CARRIL IZQUIERDO	18.50	0.60	11.10	1.00	11.10
					CARRIL DERECHO	31.10	0.60	18.66	1.00	18.66
			K0+003.00	K0+091.40	CARRIL IZQUIERDO	50.80	0.60	30.48	1.00	30.48
					CARRIL DERECHO	63.40	0.60	38.04	1.00	38.04
		BARRIO LACHARME CALLE 14 ENTRE CARREARA 8C Y 8D	K0+007.00	K0+039.00	CARRIL IZQUIERDO	25.80	0.60	15.48	1.00	15.48
			K0+007.00	K0+039.00	CARRIL DERECHO	25.80	0.60	15.48	1.00	15.48
		BARRIO LACHARME CARRERA 8C ENTRE CALLES 14 Y 15	K0+003.50	K0+083.60	CARRIL IZQUIERDO	73.90	0.60	44.34	1.00	44.34
			K0+003.50	K0+083.60	CARRIL DERECHO	73.90	0.60	44.34	1.00	44.34
		BARRIO OBRERO (CALLE 14 ENTRE CARRERA 9 Y TRANSVERSAL 12)	K0+003.00	K0+118.00	CARRIL IZQUIERDO	100.40	0.60	60.24	1.00	60.24
			K0+003.00	K0+118.00	CARRIL DERECHO	100.40	0.60	60.24	1.00	60.24
		BARRIO OBRERO (CARRERA 12 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	~~K0+000.00~~	~~K0+073.40~~	~~CARRIL IZQUIERDO~~	~~58.80~~	~~0.60~~	~~35.28~~	~~1.00~~	~~35.28~~
			K0+000.00	K0+073.40	CARRIL DERECHO	58.80	0.60	35.28	1.00	35.28
		BARRIO OBRERO (CARRERA 11 ENTRE CALLE 14 Y AV. CIRCUNVALAR)	K0+000.00	K0+050.00	CARRIL IZQUIERDO	43.80	0.60	26.28	1.00	26.28
			K0+000.00	K0+050.00	CARRIL DERECHO	43.80	0.60	26.28	1.00	26.28

ACTA PARCIAL 5									
		LA JULIA CALLE 15 ENTRE LA AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 15)	K0+000.00	K0+050.00	CARRIL IZQUIERDO	12.40	0.30	3.72	2.00	7.44
					CARRIL DERECHO	37.60	4.00	150.40	1.00	150.40
		BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	K0+000.00	K0+048.00	CARRIL IZQUIERDO	18.80	0.35	6.58	4.00	26.32
					CARRIL DERECHO	31.40	0.35	10.99	4.00	43.96
TOTAL										1111.20
ACTA N° 1										0.00
ACTA N° 2										158.00
ACTA N° 3										285.10
ACTA N° 4										520.00
ACTA N° 5										228.10

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
6.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	FECHA: 20/01/2026

BARRIO RISARALDA
COMUNA 5





CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°3

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	OTRAS ACTIVIDADES	**SUBCAPITULO**	NA		
ITEM	6.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO		**UNIDAD**	UND


# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 2											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 3											
6.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	**BARRIO URBINA** (CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A)	K0 +005.40	K0 +005.40	RAMPA PEATONAL					2.00	2.00
			K0 +083.40	K0 +083.40						2.00	2.00
		BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	K0 +005.00	K0 +005.00						2.00	2.00
			K0 +023.45	K0 +023.45						2.00	2.00
			K0 +140.00	K0 +140.00						2.00	2.00
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	K0 +045.00	K0 +045.00						2.00	2.00
ACTA PARCIAL 4											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 5											
6.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)			RAMPA PEATONAL					10.00	10.00
		BARRIO LACHARME CALLE 14 ENTRE CARRERA 8C Y 8D								2.00	2.00
		BARRIO LACHARME CARRERA 8C ENTRE CALLES 14 Y 15								2.00	2.00
		LA JULIA CALLE 15 ENTRE LA AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 15)								4.00	4.00
		BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16A)								4.00	4.00

TOTAL	**34.00**
ACTA N° 1	**0.00**
ACTA N° 2	**0.00**
ACTA N° 3	**12.00**
ACTA N° 4	**0.00**
ACTA N° 5	**22.00**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°3
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
	6.04 RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	FECHA 20/01/2026


RAMPA PEATONAL
BARRIO RISARALDA - COMUNA 5



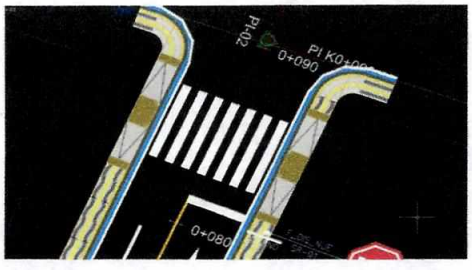

RAMPA PEATONAL
BARRIO LA GRANJA - COMUNA 3



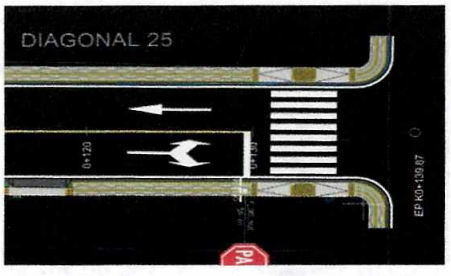

CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2 ACTA PARCIAL DE OBRA N°3

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTE	**CONTRATO No.**	OBRA-LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3,5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				


CAPITULO	OBRAS ACTIVIDADES		**SUBCAPITULO**	**NA**	
ITEM	6.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO		**UNIDAD**	**UND**

# ITEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)	
ACTA PARCIAL 1										
NO COBRÓ										
ACTA PARCIAL 2										
NO COBRÓ										
ACTA PARCIAL 3										
6.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	**BARRIO LA GRANJA** (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 3)	KO +000.00	KO +111.58	RAMPA VEHICULAR				8.00	8.00
		BARRIO URBINA (CARRERA 140 ENTRE CALLES 33 Y 31A)	KO +003.00	KO +088.80					7.00	7.00
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 21)	KO +000.00	KO +053.00					3.00	3.00
ACTA PARCIAL 4										
NO COBRÓ										
ACTA PARCIAL 5										
6.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	BARRIO RISARALDA (CARRERA 13 ENTRE CALLES 15 Y 16B)			RAMPA PEATONAL				19.00	19.00
		BARRIO LACHARME CALLE 14 ENTRE CARRERA 8C Y 8D							1.00	1.00
		BARRIO LACHARME CARRERA 8C ENTRE CALLES 14 Y 15							5.00	5.00
		LA JULIA CALLE 15 ENTRE LA AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 15)							7.00	7.00
		BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16A)							1.00	1.00
TOTAL										**31.00**
ACTA N° 1										**0.00**
ACTA N° 2										**0.00**
ACTA N° 3										**10.00**
ACTA N° 4										**0.00**
ACTA N° 5										**33.00**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°3
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
6.05	BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCA	FECHA 20/01/2026

RAMPA VEHICULAR
BARRIO LA GRANJA - COMUNA 3





CONTRATISTA		**INTERVENTORÍA**	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTE	**NOMBRE**	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PIÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA		**FIRMA**	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N°2

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA MONTERIA	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-036-2024		
INTERVENTOR:	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-039-2024		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**			**SUBCAPITULO**	**NA**
ITEM	**6.06**	**S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN RELLENO CON**		**UNIDAD**	**UND**

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANT. BXR		
ACTA PARCIAL 1							
NO COBRÓ							
ACTA PARCIAL 2							
NO COBRÓ							
ACTA PARCIAL 3							
NO COBRÓ							
ACTA PARCIAL 4							
NO COBRÓ							
ACTA PARCIAL 5							
6.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 25 ENTRE TRANSVERSALES 4 Y 5)	RAMPAS PEATONALES	6.00	2.00	12.00	12.00
			RAMPA VEHICULAR	8.00	2.00	16.00	16.00
		BARRIO URBINA (CARRERA 14B ENTRE CALLES 13 Y 15A)	RAMPAS PEATONALES	4.00	2.00	8.00	8.00
			RAMPA VEHICULAR	7.00	2.00	14.00	14.00
		BARRIO LA GRANJA (TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25)	RAMPAS PEATONALES	2.00	2.00	4.00	4.00
			RAMPA VEHICULAR	3.00	2.00	6.00	6.00
		BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	RAMPAS PEATONALES	10.00	2.00	20.00	20.00
			RAMPA VEHICULAR	19.00	2.00	38.00	38.00
		BARRIO LACHARME CALLE 14 ENTRE CARREARA 8C Y 8D	RAMPAS PEATONALES	2.00	2.00	4.00	4.00
			RAMPA VEHICULAR	1.00	2.00	2.00	2.00
		BARRIO LACHARME CARRERA 8C ENTRE CALLES 14 Y 15	RAMPAS PEATONALES	*2.00*	*2.00*	*4.00*	*4.00*
			RAMPA VEHICULAR	5.00	2.00	10.00	10.00
		LA JULIA CALLE 15 ENTRE LA AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 15)	RAMPAS PEATONALES	4.00	2.00	8.00	8.00
			RAMPA VEHICULAR	4.00	2.00	8.00	8.00
		BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16A)	RAMPAS PEATONALES	4.00	2.00	8.00	8.00
			RAMPA VEHICULAR	4.00	2.00	8.00	8.00
TOTAL							**138.00**
ACTA N° 1							**0.00**

ACTA N° 2	0.00
ACTA N° 3	0.00
ACTA N° 4	0.00
ACTA N° 5	138.00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
6.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO	FECHA 20/01/2026





CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA NELSON VANEGAS ORTIZ CONSORCIO NUEVA MONTERIA
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA LUIS HOYOS AGUIRRE PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA I.P-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-005-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				

CAPITULO	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**SUBCAPITULO**	**NA**	
ITEM	**9.01**	**EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MENORES A 1.5M; INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO.**		**UNIDAD**	**M3**


# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	VOLUMEN(M3)		
ACTA PARCIAL 1											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 2											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 3											
9.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MENORES A 1.5M; INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO.	**BARRIO VILLA CIELO** (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+330.00	VER CARTERA	330.00	0.90	1.150	341.55	1.00	341.60
ACTA PARCIAL 4											
9.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MENORES A 1.5M; INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO.	**BARRIO LA VICTORIA** (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	K0+000.00	K0+050.00	VER CARTERA	50.00	0.90	1.150	51.75	1.00	51.80
		BARRIO LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+115.00	VER CARTERA	115.00	0.90	1.150	119.03	1.00	119.00
ACTA PARCIAL 5											
9.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MENORES A 1.5M; INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO.	**BARRIO VILLA CIELO** (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+350.00	MH1-MH6	350.00	1.10	1.500	577.50	1.00	577.50
		BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	K0+000.00	K0+025.00	MH1-MH2	25.00	1.10	1.500	41.25	1.00	41.30
		BARRIO LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+115.00	MH1-MH2	115.00	1.10	1.500	189.75	1.00	189.80
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+030.00	TRAMOS AUXILIARES HACIA CALLEJONES	30.00	1.10	1.500	49.50	1.00	49.50

TOTAL ACUMULADO	**858.10**
ACTA N°1	**0.00**
ACTA N°2	**0.00**
ACTA N°3	**341.60**
ACTA N°4	**170.80**
ACTA N°5	**345.70**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
9.01	L HETEROGÉNEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MENORES A 1.5M; INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA	FECHA 20/01/2026



EXCAVACIÓN A PROFUNDIDAD MENOR A 1.5M
BARRIO VILLA CIELO - COMUNA 12



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUBCAPITULO**	**NA**		
ITEM	**9.03**	**CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE**		**UNIDAD**	**M3**

# ITEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN					CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	PROFUNIDAD (M)	VOLUMEN(M3)	%EXPANSION		
ACTA PARCIAL 1												
NO COBRÓ												
ACTA PARCIAL 2												
NO COBRÓ												
ACTA PARCIAL 3												
9.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	**BARRIO VILLA CIELO** (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+330.00	VER CARTERA	330.00	0.90	1.150	341.55	1.3	1.00	444.00
ACTA PARCIAL 4												
9.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	**BARRIO LA VICTORIA** (CARRERA 12 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	K0+000.00	K0+050.00	VER CARTERA	50.00	0.90	1.150	51.75	1.3	1.00	67.30
		BARRIO LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+115.00	VER CARTERA	115.00	0.90	1.150	119.03	1.3	1.00	154.70
ACTA PARCIAL 5												
9.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	**BARRIO VILLA CIELO** (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+350.00	MH1-MH6	350.00	0.80	1.500	420.00	1.3	1.00	546.00
		BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 15 Y 16B)	K0+000.00	K0+025.00	MH1-MH2	25.00	0.60	1.500	30.00	1.3	1.00	39.00
		BARRIO LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+115.00	MH1-MH2	115.00	0.80	1.500	138.00	1.3	1.00	179.40
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+030.00	TRAMOS AUXILIARES HACIA CALLEJONES	30.00	0.80	1.500	36.00	1.3	1.00	46.80

TOTAL ACUMULADO	**811.20**
ACTA N°1	**0.00**
ACTA N°2	**0.00**
ACTA N°3	**444.00**
ACTA N°4	**222.00**
ACTA N°5	**145.20**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

SOPORTE GRÁFICO No.1

9.03 **CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE** **FECHA** 20/01/2026



CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL
BARRIO VILLA CIELO - COMUNA 12



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	CONTRATO No.	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	CONTRATO No:	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				


CAPITULO	SUBRASANTE Y SUBBASE		SUBCAPITULO	NA	
ITEM	9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 0,10 M DE ARENA DE BRECHAS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA.		UNIDAD	M3

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 2											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 3											
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 0,10 M DE ARENA DE BRECHAS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA.	BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+330.00		330.00	0.90	0.10	297	29.70	29.70
ACTA PARCIAL 4											
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 0,10 M DE ARENA DE BRECHAS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA.	BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	K0+000.00	K0+050.00		50.00	0.90	0.10	45	4.50	4.50
		BARRIO LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+115.00		115.00	0.90	0.10	103.5	10.35	10.40
ACTA PARCIAL 5											
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 0,10 M DE ARENA DE BRECHAS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA.	BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+350.00	TRAMOS AUXILIARES HACIA CALLEJONES	350.00	1.10	0.10	385	38.50	38.50
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+030.00		30.00	1.10	0.10	33	3.30	3.30
		BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	K0+000.00	K0+025.00		25.00	1.10	0.10	27.5	2.75	2.80
		BARRIO LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+115.00		115.00	1.10	0.10	126.5	12.65	12.70

TOTAL ACUMULADO	57.30
ACTA N°1	0.00
ACTA N°2	0.00
ACTA N°3	29.70
ACTA N°4	14.90
ACTA N°5	12.70

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 0,10 M DE ARENA DE BRECHAS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA.	FECHA 20/01/2026



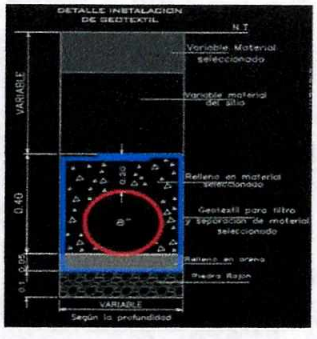

SUMINISTRO DE ARENA
BARRIO VILLACIELO - COMUNA 12

CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	



	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	SUBRASANTE Y SUBBASE		**SUBCAPITULO**	NA	
ITEM	9.06	S.T.C. DE LLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN EN BRECHAS COMPACTADOS MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD IGUAL O MAYOR DEL 90% DE LA DENSIDAD OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	**UNIDAD**	M3	


# ÍTEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
	TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1										
NO COBRÓ										
ACTA PARCIAL 2										
NO COBRÓ										
ACTA PARCIAL 3										
NO COBRÓ										
ACTA PARCIAL 4										
NO COBRÓ										
ACTA PARCIAL 5										
9.06	S.T.C. DE LLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN EN BRECHAS COMPACTADOS MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD IGUAL O MAYOR DEL 90% DE LA DENSIDAD OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	**BARRIO VILLA CIELO** (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+350.00		350.00	1.10	0.30	385	115.50	115.50
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+030.00		30.00	1.10	0.30	33	9.90	9.90
		BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	K0+000.00	K0+025.00		25.00	1.10	0.30	27.5	8.25	8.30
		BARRIO LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+115.00		115.00	1.10	0.30	126.5	37.95	38.00

TOTAL ACUMULADO	**171.70**
ACTA N°1	**0.00**
ACTA N°2	**0.00**
ACTA N°3	**0.00**
ACTA N°4	**0.00**
ACTA N°5	**171.70**

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
9.06	NIENTE DE LA EXCAVACIÓN EN BRECHAS COMPACTADOS MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD IGUAL O MAYOR DEL 90% DE LA DENSIDA	FECHA 20/01/2026



SUMINISTRO DE MATERIAL SELECCIONADO
BARRIO VILLACIELO - COMUNA 12

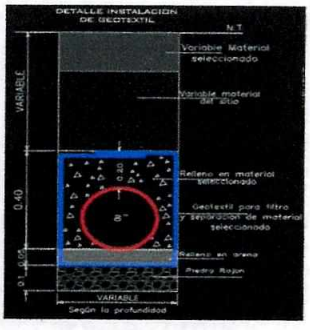

CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	



	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	CONTRATO No.	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	CONTRATO No:	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				


CAPITULO	SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO	NA		
ITEM	9.07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO		UNIDAD	M3

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 2											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 3											
9.07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+330.00		330.00	0.90	0.40	297	118.80	118.80
ACTA PARCIAL 4											
9.07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	K0+000.00	K0+050.00		50.00	0.90	0.40	45	18.00	18.00
		BARRIO LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+115.00		115.00	0.90	0.40	103.5	41.40	41.40
ACTA PARCIAL 5											
9.07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+350.00		350.00	1.10	1.10	385	423.50	423.50
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+030.00		30.00	1.10	1.10	33	36.30	36.30
		BARRIO VILLA CIELO (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	K0+000.00	K0+025.00		25.00	1.10	1.10	27.5	30.25	30.30
		BARRIO LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+115.00		115.00	1.10	1.10	126.5	139.15	139.20

TOTAL ACUMULADO	629.30
ACTA N°1	0.00
ACTA N°2	0.00
ACTA N°3	118.80
ACTA N°4	59.40
ACTA N°5	451.10

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
9.07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	FECHA 20/01/2026



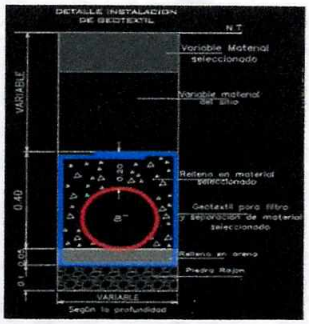

SUMINISTRO DE MATERIAL SELECCIONADO
BARRIO VILLACIELO - COMUNA 12

CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**SUBCAPITULO**	**NA**
ITEM	**9.08**	**GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES**	**UNIDAD** **M2**

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN		CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	PERIMETRO (m)		
ACTA PARCIAL 1									
NO COBRÓ									
ACTA PARCIAL 2									
NO COBRÓ									
ACTA PARCIAL 3									
9.08	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	**BARRIO VILLA CIELO** (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+330.00	GEOTEXTIL	330.00	3.00	990.00	990.00
ACTA PARCIAL 4									
9.08	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	**BARRIO LA VICTORIA** (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	K0+000.00	K0+050.00	GEOTEXTIL	50.00	3.00	150.00	150.00
		BARRIO LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+115.00	GEOTEXTIL	115.00	3.00	345.00	345.00
ACTA PARCIAL 4									
9.08	0.00	**BARRIO VILLA CIELO** (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+350.00	GEOTEXTIL	350.00	3.40	1190.00	1190.00
9.08	0.00	**BARRIO VILLA CIELO** (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+030.00	GEOTEXTIL	30.00	3.40	102.00	102.00
9.08	0.00	**BARRIO LA VICTORIA** (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	K0+000.00	K0+025.00	GEOTEXTIL	25.00	3.40	85.00	85.00
		BARRIO LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+115.00	GEOTEXTIL	115.00	3.40	391.00	391.00

TOTAL ACUMULADO	**1768.00**
ACTA N°1	**0.00**
ACTA N°2	**0.00**
ACTA N°3	**990.00**
ACTA N°4	**485.00**
ACTA N°5	**778.00**


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
9.08	**GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES**	**FECHA** 20/01/2026

SUMINISTRO DE GEOTEXTIL
BARRIO VILLACIELO - COMUNA 12









CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAM	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	20/01/2026
CONTRATI	CONSORCIO MTR	CONTRATO No.	OBRA LP-SM-008-2025		
INTERVENT	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYS	CONTRATO No.	CMA-SM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO	NA	
ITEM	9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" CON CARACTERISTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO	UNIDAD	M


#ITEM		LOCALIZACION				DIMENSION	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCION	LONGITUD (m)		
				ACTA PARCIAL 1				
				NO COBRÓ				
				ACTA PARCIAL 2				
				NO COBRÓ				
				ACTA PARCIAL 3				
9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" CON CARACTERÍSTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR.	BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+330.00	TUBERIA PVC 8"	330.00	1.00	330.00
				ACTA PARCIAL 4				
9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" CON CARACTERÍSTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR.	BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	K0+000.00	K0+050.00	TUBERIA PVC 8"	50.00	1.00	50.00
		BARRIO LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+115.00	TUBERIA PVC 8"	115.00	1.00	115.00
				ACTA PARCIAL 5				
9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" CON CARACTERÍSTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR.	BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+350.00	TUBERIA PVC 8"	350.00	1.00	350.00
9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" CON CARACTERÍSTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR.	BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0+000.00	K0+030.00	TUBERIA PVC 8"	30.00	1.00	30.00
9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" CON CARACTERÍSTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR.	BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	K0+000.00	K0+025.00	TUBERIA PVC 8"	25.00	1.00	25.00
		BARRIO LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+115.00	TUBERIA PVC 8"	115.00	1.00	115.00

TOTAL ACUMULADO	535.00
ACTA N°1	0.00
ACTA N°2	0.00
ACTA N°3	330.00
ACTA N°4	105.00
ACTA N°5	20.00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No. 1	Página 2 de 2
9.09	DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" CON CARACTERISTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI)	FECHA 20/01/2026

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 8"
BARRIO VILLACIELO - COMUNA 12





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR	NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYS
FIRMA		FIRMA	

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2
		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAM:	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA		
CONTRATI:	CONSORCIO MTR	CONTRATO No.	OBRA LP-SIM-008-2025	FECHA	20/01/2026
INTERVENT:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYS	CONTRATO No.	CMA-382-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VIAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO:	ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO	NA
ITEM	9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" CON CARACTERISTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI)	UNIDAD	M


# ITEM		LOCALIZACION			DESCRIPCION	DIMENSION	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL		LONGITUD (m)		
ACTA PARCIAL 1								
NO COBRÓ								
ACTA PARCIAL 2								
NO COBRÓ								
ACTA PARCIAL 3								
ACTA PARCIAL 4								
ACTA PARCIAL 5								
9.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" CON CARACTERISTICAS (PS 8KN/M2-57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR, PARA DOMICILIARIAS.	BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	KD+000.00	KD+350.00	TUBERIA PVC 6"	6.00	59.00	354.00
		BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	KD+000.00	KD+025.00	TUBERIA PVC 6"	6.00	10.00	60.00
		CHAMBACU	KD+000.00	KD+119.00	MH AB 2	6.00	7.00	36.00
		RISARALDA	KD+000.00	KD+231.00	MH CALLE 16 A	6.00	1.00	6.00
		BALBOA CALLE 17 A	KD+000.00	KD+125.00		6.00	6.00	36.00
		BARRIO LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	KD+000.00	KD+115.00	TUBERIA PVC 6"	5.00	23.00	115.00

TOTAL ACUMULADO	584.00
ACTA N°1	0.00
ACTA N°2	0.00
ACTA N°3	0.00
ACTA N°4	0.00
ACTA N°5	584.00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No. 1	Página 2 de 2
9.11	NC DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" CON CARACTERISTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DU	FECHA 20/01/2026

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 6"
BARRIO VILLACIELO - COMUNA 12





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR	NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYS
FIRMA		FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	26/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-008-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**SUBCAPITULO**	**NA**	
ITEM	**9.12**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS SILLAS YEE 8" X 6" PARA TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO.**		**UNIDAD**	**UND**

# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA(M2)		
ACTA PARCIAL 1											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 2											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 3											
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS SILLAS YEE 8" X 6" PARA TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO.	**BARRIO VILLA CIELO** (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0 +225.00	K0 +325.00	SILLAS YEE 8" X 6"					10.00	10.00
ACTA PARCIAL 4											
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS SILLAS YEE 8" X 6" PARA TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO.	**BARRIO LA VICTORIA** (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	K0+000.00	K0+050.00	SILLAS YEE 8" X 6"					10.00	10.00
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0 +225.00	K0 +325.00	SILLAS YEE 8" X 6"					30.00	30.00
ACTA PARCIAL 4											
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS SILLAS YEE 8" X 6" PARA TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO.	**BARRIO VILLA CIELO** (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0 +000.00	K0 +350.00	SILLAS YEE 8" X 6"					10.00	10.00
		BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	K0+000.00	K0+025.00	SILLAS YEE 8" X 6"					10.00	10.00
		BARRIO LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+115.00	SILLAS YEE 8" X 6"					30.00	30.00
ACTA PARCIAL 5											
ACTA PARCIAL 4	0.000	**BARRIO VILLA CIELO** (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0 +000.00	K0 +350.00	SILLAS YEE 8" X 6"					58.00	58.00
		BARRIO LA VICTORIA (CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	K0+000.00	K0+025.00	SILLAS YEE 8" X 6"					10.00	10.00
		BARRIO LA JULIA (CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14)	K0+000.00	K0+115.00	SILLAS YEE 8" X 6"					15.00	15.00

TOTAL ACUMULADO	**84.00**
ACTA N°1	**0.00**
ACTA N°2	**0.00**
ACTA N°3	**10.00**
ACTA N°4	**40.00**
ACTA N°5	**34.00**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

SOPORTE GRÁFICO No.1

9.12	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS SILLAS YEE 8" X 6" PARA TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO.**	**FECHA**	26/01/2026

INSTALACION SILLA YEE 8" X 6"
BARRIO VILLA CIELO - COMUNA 12



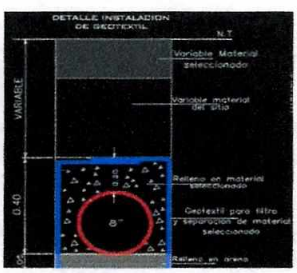





CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-006-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-S Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**SUBCAPITULO**	**NA**	
ITEM	**9.13**	**CONSTRUCCION DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN Ø 1,2 M, PROFUNDIDAD MENORES DE 2 METROS EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.**		**UNIDAD**	**UND**

# ÍTEM	**LOCALIZACIÓN**				**DIMENSIÓN**				**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
		TRAMO	**ABSCISA INICIAL**	**ABSCISA FINAL**	**DESCRIPCIÓN**	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**	**ESPESOR PROMEDIO (m)**	**AREA(M2)**	
ACTA PARCIAL 1										
NO COBRÓ										

ACTA PARCIAL 2								
NO COBRÓ								
ACTA PARCIAL 3								
NO COBRÓ								
ACTA PARCIAL 4								
9.13	CONSTRUCCION DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN Ø 1,2 M, PROFUNDIDAD MENORES DE 2 METROS EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	K0 +000.00	K0 +330.00			1.00	1.00
							1.00	1.00
							1.00	1.00
							1.00	1.00
							1.00	1.00
							1.00	1.00
ACTA PARCIAL 4								
0.00	0.000	LA VICTORIA	K0 +000.00	K0 +330.00			1.00	1.00
TOTAL ACUMULADO								7.00
ACTA N°1								0.00
ACTA N°2								0.00
ACTA N°3								0.00
ACTA N°4								6.00
ACTA N°5								1.00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05
	SOPORTE GRÁFICO No.1	Página 2 de 2
	9.13 CONSTRUCCION DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN Ø 1,2 M, PROFUNDIDAD MENORES DE 2 METROS EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FECHA 20/01/2026

TALA DE ÁRBOL
BARRIO OBRERO



TALA DE ÁRBOL
BARRIO LACHARME



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	20/01/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**CONTRATO No.**	OBRA LP-SIM-006-2025		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**CONTRATO No:**	CMA-SIM-006-2025		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	**OTRAS ACTIVIDADES**		**SUBCAPITULO**	**NA**	
ITEM	**9.14**	**CAJAS DE INSPECCION DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.**		**UNIDAD**	**UND**

# ITEM		LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA/ M2)		
ACTA PARCIAL 1											
9.14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BARRIO RISARALDA (CARRERA 11 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	KD +160.00	KD +160.00	REPARACION DE DOMICILIARIAS					1.00	1.00
ACTA PARCIAL 2											
NO COBRO											
ACTA PARCIAL 3											
9.14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	**BARRIO RISARALDA** (CARRERA 11 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	KD +160.00	KD +160.00	REPARACION DE DOMICILIARIAS					1.00	1.00
		BARRIO ORIENTE (CALLE 14 CARRERA 11)	KD +042.00	KD +042.00	REPARACION DE DOMICILIARIAS					1.00	1.00
			KD +025.00	KD +025.00						1.00	1.00
ACTA PARCIAL 4											
NO COBRO											
ACTA PARCIAL 5											
9.14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	**BARRIO RISARALDA** (CARRERA 11 ENTRE CALLES 16 Y 16B)	KD +160.00	KD +160.00	REPARACION DE DOMICILIARIAS					1.00	1.00
		BARRIO ORIENTE (CALLE 14 CARRERA 11)	KD +042.00	KD +042.00						1.00	1.00
			KD +025.00	KD +025.00						1.00	1.00
		BARRIO ORIENTE (CARRERA 12 ENTRE CALLE 14 VIA CIRCUNVALAR)	KD +042.00	KD +042.00						1.00	1.00
			KD +025.00	KD +025.00						1.00	1.00
		BARRIO VILLA CIELO (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 44)	KD +000.00	KD +330.00						59.00	59.00
		CHUCHURUBÍ	KD +003.00	KD +053.00						0.00	0.00
		BALBOA CALLE 17 A	KD +003.00	KD +125.00						3.00	3.00
		LA JULIA CALLE 15A	KD +000.00	KD +115.00						0.00	0.00
		LA VICTORIA	KD +000.00	KD +050.00						10.00	10.00
		CHAMBACU	KD +000.00	KD +118.00						3.00	3.00
TOTAL ACUMULADO											**98.00**
ACTA N°1											**1.00**
ACTA N°2											**0.00**
ACTA N°3											**2.00**
ACTA N°4											**0.00**
ACTA N°5											**77.00**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3

SOPORTE GRÁFICO No.1

9.14	**CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.**	**FECHA**	20/01/2026



CONTRATISTA	
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ CONSORCIO MTR
FIRMA	

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
FIRMA	

CONSORCIO MTR

INFORMES SEMANALES (INTERVENTORÍA)

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	6
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	1	12	2025	SEMANA No.:	22	DEL	25-nov-25	AL	1-dic-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	Pavimentacion de vias en barrios de la comuna 3,5 y 12 en el municipio de Monteria			OBJETO:	Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y contable al contrato cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"		
CONTRATISTA:	Consorcio MTR			CONTRATISTA:	Consorcion Interventor Montería CYB		
REP. LEGAL:	Nelson Fernando Vanegas Ortiz			REP. LEGAL:	ARMANDO BULA OTERO		
CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025	VALOR INICIAL:	$ 15,716,097,925.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-006-2025	VALOR INICIAL:	$ 1,058,618,839.00
PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ 0.00	PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ 0.00
PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 15,716,097,925.00	PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 1,058,618,839.00
SUSPENSIÓN 1:	NA			SUSPENSIÓN 1:	NA		
REINICIO 1:	NA			REINICIO 1:	NA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	0%	$ 0.00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$ 5,209,652,376.00	
PARCIAL 1:	$ 1,753,156,624.00	% AVANCE FINANCIERO:	33.16%	
PARCIAL 2:	$ 1,234,830,178.00			
PARCIAL 3:	$ 2,221,665,574.00			
FINAL:	$ -			


III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,01	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. NO INCLUYE RETIRO	M2	0.00	1408.00
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	0.00	271.70
1,03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	M	82.70	436.70
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	16.00	253.80
1,05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	0.00	67.00
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	0.00	444.70
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	264.00	8731.40
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	501.00	12621.90
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	7.00	48.00
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UN	0.00	32.00
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	112.00	2699.90
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	0.00	1226,20
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	103.60	2514.50
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	264.90	12885.10
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	175.00	2238.70
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UN	0.00	2.00
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	132.50	1307.70
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	0.00	10370.70
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	26.00	26.00
4,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	2.00	2.00

4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	83.80	83.80
4,04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	840.00	840.00
4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	46.00	46.00
5,01	EXCAVACION MANUAL	M3	79.00	325.70
5,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	15.20	422.80
5,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	600.00	7878.40
5,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	10.00	202.50
5,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	M3	7.00	7.00
6,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	ML	73.80	1229.00
6,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	ML	148.00	1302.20
6,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3,000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	ML	94.00	883.10
6,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UN	0.00	12.00
6,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UN	0.00	18.00
7,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	0.00	69.00
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	0.00	61.00
7,04	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.	UN	0.00	16.00
8,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	0.00	65.60
8,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M3	0.00	87.90
8,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	85.30
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	5.50	30.00
8,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	0.00	44.30
8,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)	M3	10.00	39.60
8,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	M3	399.50	4598.60
8,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	M3	0.00	1.00
8,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	M3	16.00	32.00
8,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	0.00	16.50
9,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MENORES A 1.5M; INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO.	UN	170.80	512.40
9,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	UN	74.00	666.00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 0,10 M DE ARENA DE BRECHAS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA.	UN	5.00	44.60
9,07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	UN	19.80	178.20
9,08	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	UN	165.00	1485.00
9,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" CON CARACTERÍSTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR.	UN	55.00	495.00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS SILLAS YEE 8" X 6" PARA TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO.	UN	40.00	50.00
9,14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UN	0.00	3.00

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	31.57%	40.48%	
DURANTE EL PERIODO	2.23%	3.31%	9.99%
ACUMULADO ACTUAL	33.80%	43.79%	

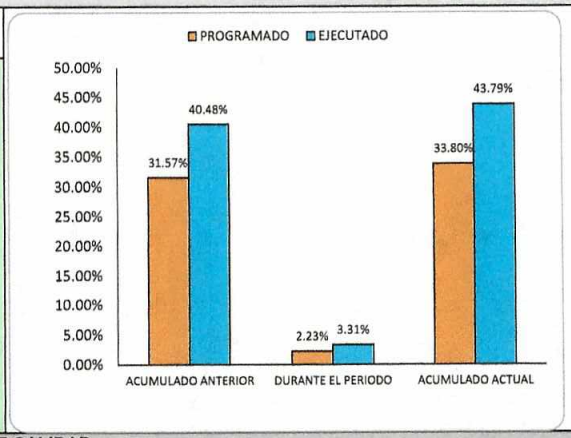

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

1. En la Transversal 4, entre las Diagonales 24 y 25 (La Granja), en las abscisas K 0+003 – K 0+050 se continuaron las actividades urbanísticas con la fundida en sitio de bordillos, conformación de rampas vehiculares y peatonales y sellado de juntas longitudinales y transversales del pavimento rígido, así como la instalación de reductores de velocidad y señales verticales.

2. En la Diagonal 25, entre las Transversales 4 y 5 (La Granja), en las abscisas K 0+000 – K 0+140, se continuaron las actividades urbanísticas con la fundida en sitio de bordillos, conformación de rampas vehiculares y peatonales y sellado de juntas longitudinales y transversales del pavimento rígido, así como la instalación de reductores de velocidad y señales verticales.

3. En la Carrera 14B, entre las Calles 13 y 15 (Barrio Urbina), en las abscisas K 0+003 – K 0+088.8 se continuaron las actividades urbanísticas con instalación de bordillos, relleno de andenes, colocación de tablas guía y elementos visuales, suministro de concreto hidráulico de 3000 psi, sellado de juntas longitudinales y transversales del pavimento rígido, así como la instalación de reductores de velocidad y señales verticales.

4. En la Carrera 11, entre las Calles 15 y 16B (Barrio Risaralda), en las abscisas K 0+003 – K 0+150, se continúan las actividades urbanísticas correspondientes a la instalación de bordillos, relleno de andenes, colocación de tablas guía y elementos visuales, retiro de troncos, así como el suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para andenes y bordillos para rampa vehicular y peatonal.

5.En la Carrera 12, entre la Avenida Circunvalar y la Calle 14 (Barrio Obrero), en las abscisas K0+070 – K0+050 (carril derecho e izquierdo) se realizó suministro de subbase granular, instalación de rieles y colocación de concreto MR-40 con sus procesos de compactación, extensión, vibrado, allanado, texturizado y curado y se atendieron reparaciones de domiciliarias en K0+030 y mejoramiento de subrasante en K0+025 – K0+030; y en las abscisas K0+040 – K0+000 se continuó con el suministro de subbase granular con acompañamiento de la comisión topográfica.

6.En la Carrera 10, entre las Calles 22 y 22C (Barrio Chambacú), sin actividades a la espera de suministro de bordillos prefabricados. Se realizó orden y aseo al tramo.

7.En la Carrera 8C, entre Calle 14 y 15 (Barrio Lacharme), Se iniciaron las excavaciones para la instalación de los bordillos prefabricados para organizar andenes, y se suministró concreto MR-40 a los radios de giro del pavimento.

8. En la Calle 14, entre las Carreras 8C y 8D (Barrio Lacharme), en las abscisas K0+000 – K0+030 se ejecutó la adecuación y suministro de subbase granular, el amarre de acero de refuerzo, instalación de rieles y posterior suministro y colocación de concreto MR-40 con sus procesos de compactación, extensión, vibrado, allanado, texturizado y curado; en el mismo tramo (carriles derecho e izquierdo) y se iniciaron las excavaciones para la instalación de bordillos prefabricados, así como actividades de orden y aseo en andenes.

9.En la Calle 17A, entre las Carreras 8B y 9 (Barrio Balboa), en las abscisas K 0+060 – K 0+110, excavación de material común e instalación de subbase granular también se realizo arreglos de domiciliaria de alcantarillado.

10. En la Carrera 12, entre las Calles 16 y 16A (Barrio Risaralda), se finaliza el suministro de subbase granular. Está a la espera de inicio de alcantarillado el día lunes 1 de diciembre.


11. En la Carrera 45, entre las Calles 53 y 58D (Barrio Villa Cielo), en las abscisas K0+137 – K0+145 (carril izquierdo) se realizó la adecuación y suministro de subbase granular se ejecutó el vaciado de concreto MR-40 con sus procesos de compactación, extensión, vibrado, allanado, texturizado y curado; adicionalmente, en las abscisas K0+137 – K0+154 se ejecutaron excavaciones en material común, mejoramiento de la subrasante con piedra rajón y el amarre de acero de refuerzo para cunetas y cárcamo.

12. En la Calle 53, entre las Carreras 40 y 45 (Barrio Villa Cielo), en las abscisas K 0+030 – K 0+080, se realizó excavación mecánica menor a 1.5 m para proceder a la instalación de tubería de alcantarillado con apoyo con la comisión topográfica y se realiza suministro de concreto 3000 psi de muro superior de MH #3 y losa inferior y muros M H #2. Se realiza excavaciones en material común para la caja de soporte de la estructura de pavimento.

13. Actividades SST: Se realizó la respectiva señalización del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para las actividades de pavimentación.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

1. Excavaciones mecánicas con excavadora para fallos en sub rasante. profundidad > 50 cm. no incluye retiro
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre
4. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
5. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura entre h= 5.1m a 10m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
6. SUBBASE GRANULAR CLASE C
7. GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
8. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)
9. ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa
10. BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
11. EXCAVACION MANUAL
12. CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE
13. ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA
14. CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
15. S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS
16. FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA
17. CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.
18. REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
19. REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.
20. CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)
21. CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

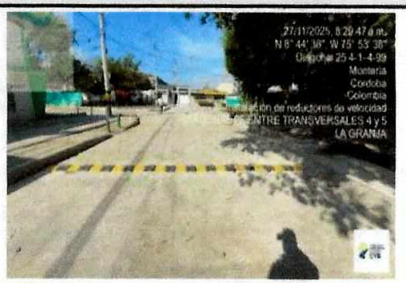Diagonal 25 entre transversal 4 y 5 ; transversal 4 entre diagonal 25 y Carrera 12, entre la Avenida Circunvalar y la Calle 14 (Barrio Obrero)			IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO
			
INSTALACION DE BOLARDOS EN RAMPAS	INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	ORDEN Y ASEO

Carrera 14 B, entre las Calles 13 y 15 (Barrio Urbina) | **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**



SELLO DE JUNTAS LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE PAVIMENTO



INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD




INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES



ORDEN Y ASEO

Calle 17A, entre las Carreras 8B y 9 (Barrio Balboa) y Carrera 12, entre las Calles 16 y 16A (Barrio Risaralda) | **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**

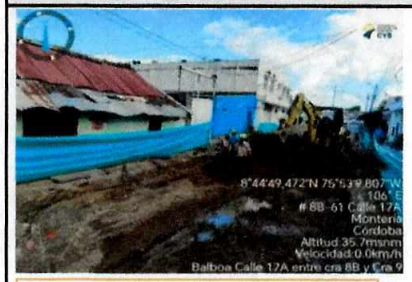

EXCAVACION DE MATERIAL COMUN



SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR



INSTALACION DE GEOTEXTIL Y SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR



CHARLAS POR PARTE AREA SOCIAL

Carrera 12, entre la Avenida Circunvalar y la Calle 14 (Barrio Obrero) y en la Calle 14, entre las Carreras 8C y 8D (Barrio Lacharme) | **IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**



SUMINISTRO DE CONCRETO MR-40 PARA PAVIMENTO



TEXTURIZADO Y SUMINISTRO DE ANTISOL



SUMINISTRO DE CONCRETO MR-40 PARA PAVIMENTO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO



COMITE DE OBRA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	6	DE	6
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

carrera 45 entre las calles 53 y 58D (villa cielo) y En la Calle 53, entre las Carreras 40 y 45 (Barrio Villa Cielo)	IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO



INSTALCION DE GEOTEXTIL Y SUMUNISTRO DE PIEDRA RAJON PARA MEJORAMIENTO



EXCAVACION MECANICA DE MATERIAL COMUN



INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO



CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION PMT

VII. FIRMAS

CONSORCIO MTR	**CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB**
ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ	**GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA**
Director de Obra	Director de Interventoria

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	6
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
FECHA DE PRESENTACIÓN:	8	12	2025	SEMANA No.:	23	DEL	2-dic-25	AL	8-dic-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	Pavimentacion de vias en barrios de la comuna 3,5 y 12 en el municipio de Monteria			OBJETO:	Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y contable al contrato cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"		
CONTRATISTA:	Consorcio MTR			CONTRATISTA:	Consorcion Interventor Montería CYB		
REP. LEGAL:	Nelson Fernando Vanegas Ortiz			REP. LEGAL:	ARMANDO BULA OTERO		
CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025	VALOR INICIAL:	$ 15,716,097,925.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-006-2025	VALOR INICIAL:	$ 1,058,618,839.00
PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ 0.00	PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ 0.00
PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 15,716,097,925.00	PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 1,058,618,839.00
SUSPENSIÓN 1:	NA			SUSPENSIÓN 1:	NA		
REINICIO 1:	NA			REINICIO 1:	NA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA					
ANTICIPO			PORCENTAJE%	0%	$ 0.00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$ 5,209,652,376.00	
PARCIAL 1:	$ 1,753,156,624.00		% AVANCE FINANCIERO:	33.16%	
PARCIAL 2:	$ 1,234,830,178.00				
PARCIAL 3:	$ 2,221,665,574.00				
PARCIAL 4:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO


ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,01	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. NO INCLUYE RETIRO	M2	0.00	1408.00
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	0.00	271.70
1,03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	M	85.00	521.70
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	98.00	351.80
1,05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	0.00	67.00
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE, PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	0.00	444,70
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	354.70	9086.10
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	461.10	13083.00
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	0.00	48.00
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	0.00	32.00
1,11	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	0.00	0.00
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	215.00	2914.90
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	0.00	1226.20
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	101.00	2615.50
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	0.00	12885.10
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	66.60	2305.30
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	0.00	2.00
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	150.00	1457.70
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	3521.00	13891.70
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	0.00	26.00

4,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	0.00	2.00
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	0.00	83.80
4,04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	0.00	840.00
4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	0.00	46.00
5,01	EXCAVACION MANUAL	M3	0.00	325.70
5,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	422.80
5,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	0.00	7878.40
5,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	0.00	202.50
5,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND	0.00	7.00
6,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	0.00	1229.00
6,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	0.00	1302.20
6,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	0.00	883.10
6,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	0.00	12.00
6,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	0.00	18.00
7,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4", INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	0.00	69.00
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	61.00
7,04	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.	UND	0.00	16.00
8,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	0.00	65.60
8,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	0.00	87.90
8,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	85.30
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	0.00	30.00
8,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	0.00	44.30
8,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)	M3	0.00	39.60
8,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	0.00	4598.60
8,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND	0.00	1.00
8,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	M	0.00	32.00
8,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	0.00	16.50
9,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MENORES A 1.5M; INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO.	M3	70.80	583.20
9,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	22.80	688.80
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 0,10 M DE ARENA DE BRECHAS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA.	M3	2.80	47.40
9,06	S.T.C. DE LLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN EN BRECHAS COMPACTADOS MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD IGUAL O MAYOR DEL 90% DE LA DENSIDAD OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	57.30	57.30
9,07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	130.57	308.77
9,08	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	260.00	1745.00
9,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" CON CARACTERÍSTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR.	M	0.00	495.00

9,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" CON CARACTERISTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR. PARA DOMICILIARIAS.	M	253.00	253.00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS SILLAS YEE 8" X 6" PARA TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO.	UND	25.00	75.00
9,13	CONSTRUCCION DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN Ø 1,2 M, PROFUNDIDAD MENORES DE 2 METROS EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	0.00	6.00
9,14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	59.00	62.00

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	33.80%	43.79%	7.58%
DURANTE EL PERIODO	4.45%	2.03%	
ACUMULADO ACTUAL	38.24%	45.82%	

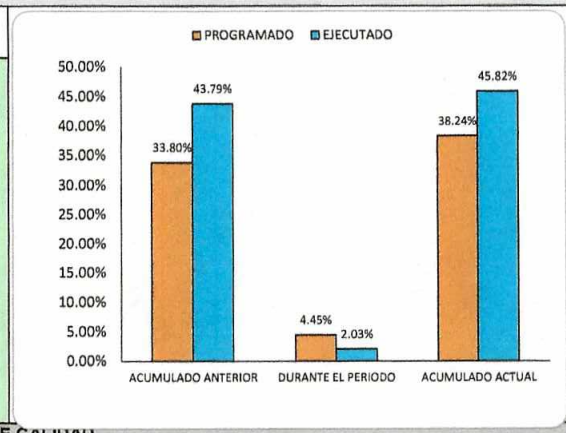

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

1.En la Transversal 4, entre las Diagonales 24 y 25, y en la Diagonal 25, entre las Transversales 4 y 5 (Barrio La Granja), se realiza la inauguración de las vías por parte del alcalde ante la comunidad.
2.En la Carrera 14B, entre las Calles 13 y 15 (Barrio Urbina), en las abscisas K 0+003 – K 0+088.8 se realiza la inauguración de las vías por parte del alcalde ante la comunidad.
3.En la Carrera 11, entre las Calles 15 y 16B (Barrio Risaralda), en las abscisas K 0+003 – K 0+213, se continúan las actividades urbanísticas correspondientes a la instalación de bordillos, relleno de andenes, colocación de tablas guía y elementos visuales, así como el suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para andenes y Bordillos, para rampa vehicular y peatonal.
4.En la Carrera 12, entre la Avenida Circunvalar y la Calle 14 (Barrio Obrero), en las abscisas K 0+040 – K 0+000, se realizó el retiro de material saturado por lluvias y suministro de material seco; posteriormente se ejecutó el suministro de subbase granular y nivelación para rieles de losas de pavimento con acompañamiento topográfico, el amarre de acero e instalación de rieles para concreto MR-40 (no recibido en una jornada por fallas en planta), y finalmente, en el carril derecho, se efectuó el suministro, verificación de compactación, extensión, vibrado, allanado, texturizado y curado de concreto MR-40.
5.En la Carrera 10, entre las Calles 22 y 22C (Barrio Chambacú), sin actividades a la espera de suministro de bordillos prefabricados. Se solicitó al contratista reingresar la cuadrilla de andenes para dejar el tramo intervenido en pavimento terminado.
6.En la Carrera 8C, entre las Calles 14 y 15 (Barrio Lacharme), se continuó con la instalación de bordillos prefabricados y bordillos fundidos in situ por el costado izquierdo, así como la demolición de pisos y andenes existentes.
7.En la Calle 14, entre las Carreras 8C y 8D (Barrio Lacharme), excavaciones e instalación de los bordillos prefabricados para organizar andenes.
8.En la Calle 17A, entre las Carreras 8B y 9 (Barrio Balboa), en las abscisas K 0+090 – K 0+120 y K 0+110 – K 0+118, se realizó excavación de material común, reparación de acometidas de agua potable, evacuación de aguas estancadas, suministro de subbase granular y construcción de caja de registro de alcantarillado.
9.En la Calle 14 entre Cra 9 y Cra 12, Obrero, se continúa la excavación e instalación de los Bordillos prefabricados.

10. En la Carrera 12, entre las Calles 16 y 16A (Barrio Risaralda), se realiza la exploración y excavación de la tubería de alcantarillado con el fin de identificar las conexiones existentes y proceder con la instalación de la nueva tubería para la construcción del sistema de alcantarillado.
11. En la Calle 15 con la Avenida Circunvalar (Barrio 14 de Julio), en las abscisas K 0+005 – K 0+060, se inició y continuó la excavación mecánica de material común, instalación de geotextil y suministro de subbase granular; adicionalmente, se realizaron dos talas de árboles, se presentaron tres daños en acometidas de agua potable durante la jornada de la tarde y se contó con la visita del alcalde para la verificación del inicio de obra.
12. En la Carrera 45, entre las Calles 53 y 58D (Barrio Villa Cielo), en las abscisas K 0+138 – K 0+150 (carril izquierdo) y K 0+450 – K 0+400, se ejecutó el suministro, verificación de compactación, extensión, vibrado, allanado, texturizado y curado de concreto MR-40, la fundida de losa inferior de cárcamos en las abscisas K 0+108 y K 0+139, el amarre de acero de refuerzo y el encofrado y construcción de muros de cunetas y cárcamos con concreto de 3.000 psi, incluyendo la toma de muestras para ensayos de compresión.
13. En la Calle 53, entre las Carreras 40 y 45 (Barrio Villa Cielo), en las abscisas K 0+005 – K 0+015, K 0+190, K 0+210 y K 0+000 – K 0+080, se realizó la instalación de tubería de alcantarillado y extensiones de conexión en los MH #2, MH #3 y MH #4 con apoyo topográfico, el suministro de concreto de 3.000 psi para muros de manholes, y posteriormente el lleno y suministro de material seleccionado granular con su respectiva compactación, con el fin de permitir el drenaje futuro de los barrios aledaños sin afectar las losas de pavimento a construir.
14. Actividades Sociales: Se realiza actas de vecindad de cierre en los tramos terminados de Urbina (1) y la Granja (2).
15. Actividades SST: Se realizó la respectiva señalización y orden y aseo.
16. Se realiza recorrido por parte del municipio, el contratista y la interventoría para la medición de preacta en la comuna 3 y 5 en algunos tramos como Granja , Urbina, Balboa y Obrero.

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**PÁGINA**	4	DE	6
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	**CODIGO DEL PROCESO:**	SI-SUP-F-039		

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

1. Excavaciones mecánicas con excavadora para fallos en sub rasante. profundidad > 50 cm. no incluye retiro

2. Excavación en material común de la explanación y canales

3. Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre

4. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)

5. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura entre h= 5.1m a 10m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)

6. SUBBASE GRANULAR CLASE C

7. GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES

8. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)

9. ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa

10. BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

11. EXCAVACION MANUAL

12. CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE

13. ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA

14. CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

15. S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS

16. FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA

17. CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.

18. REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

19. REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.

20. CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)

21. CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Diagonal 25 entre transversal 4 y 5 ; transversal 4 entre diagonal 25 y Carrera 14 B, entre las Calles 13 y 15 (Barrio Urbina)



DEMARCACION DE SEÑALIZACION



DEMARCACION VERTICAL Y HORIZONTAL



DEMARCACION VERTICAL Y HORIZONTAL

IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO



ENTREGA DE PAVIMENTO

Carrera 12, entre la Avenida Circunvalar y la Calle 14 (Barrio Obrero) y En la Carrera 12, entre las Calles 16 y 16A (Barrio Risaralda)			IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO
			
INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR	SUMINISTRO DE CONCRETO MR-40 PARA PAVIMENTO	EXCAVACION MECANICA PARA INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO	SEÑALIZACION PMT
Calle 17A, entre las Carreras 8B y 9 (Barrio Balboa) y En la Calle 15 con la Avenida Circunvalar (Barrio 14 de Julio)			**IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**
			
EXCAVACION DE MATERIAL COMUN	EXCAVACION DE MATERIAL COMUN	RETICO DE TRONCOS DE ARBOLES	PODA RADICULAR
En la Carrera 11, entre las Calles 15 y 16B (Barrio Risaralda) y en la Calle 14, entre las Carreras 8C y 8D (Barrio Lacharme)			**IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO**
			
CONSTRUCCION DE RAMPA VEHICULAR	CONSTRUCCION DE RAMPA PEATONAL	INSTALACION DE BODILLOS PREFABRICADOS	RECORRIDO PARA MEDICION DE PREACTA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	6	DE	6
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

carrera 45 entre las calles 53 y 58D (villa cielo) y En la Calle 53, entre las Carreras 40 y 45 (Barrio Villa Cielo)	IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO



INSTALCION DE GEOTEXTIL Y SUMUNISTRO DE PIEDRA RAJON PARA MEJORAMIENTO



SUMINISTRO DE CONCRETO MR-40 PARA PAVIMENTO



SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS DE CUNETAS



CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION PMT

VII. FIRMAS

CONSORCIO MTR	**CONSORCIO INTERVENTORIA MONTERIA CYB**
ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ	**GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA**
Director de Obra	Director de Interventoria

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	5
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
FECHA DE PRESENTACIÓN:	15	12	2025	SEMANA No.:	24	DEL	8-dic-25	AL	15-dic-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	Pavimentacion de vias en barrios de la comuna 3,5 y 12 en el municipio de Monteria			OBJETO:	Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y contable al contrato cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"		
CONTRATISTA:	Consorcio MTR			CONTRATISTA:	Consorcion Interventor Montería CYB		
REP. LEGAL:	Nelson Fernando Vanegas Ortiz			REP. LEGAL:	ARMANDO BULA OTERO		
CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025	VALOR INICIAL:	$ 15,716,097,925.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-006-2025	VALOR INICIAL:	$ 1,058,618,839.00
PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ 0.00	PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ 0.00
PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 15,716,097,925.00	PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 1,058,618,839.00
SUSPENSIÓN 1:	NA			SUSPENSIÓN 1:	NA		
REINICIO 1:	NA			REINICIO 1:	NA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA				
ANTICIPO		PORCENTAJE%	0%	$ 0.00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$ 6,878,662,357.00	
PARCIAL 1:	$ 1,753,156,624.00	% AVANCE FINANCIERO:	43.78%	
PARCIAL 2:	$ 1,234,830,178.00			
PARCIAL 3:	$ 2,221,665,574.00			
PARCIAL 4:	$ 1,669,009,981.00			
FINAL:	$ -			

III. AVANCE FÍSICO


ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,01	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. NO INCLUYE RETIRO	M2	0.00	1408.00
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	0.00	271,70
1,03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	M	95.00	616,70
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	95.00	446.80
1,05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	0.00	67.00
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	0.00	444,70
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	445.00	9531.10
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	578.20	13661,20
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	0.00	48.00
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	0.00	32.00
1,11	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	0.00	0.00
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	230.00	3144.90
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	0.00	1226.20
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	102.00	2717,50
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	0.00	12885.10
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	110.00	2415.30
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	0.00	2.00
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	95.00	1552.70
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	3825.00	17716.70
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	0.00	26.00

4,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	0.00	2.00
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	0.00	83.80
4,04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	0.00	840.00
4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	0.00	46.00
5,01	EXCAVACION MANUAL	M3	0.00	325.70
5,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	422.80
5,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	0.00	7878.40
5,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	0.00	202.50
5,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND	0.00	7.00
6,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	0.00	1229.00
6,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	0.00	1302.20
6,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	39.10	922.20
6,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	0.00	12.00
6,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	0.00	18.00
7,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4", INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	0.00	69.00
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	61.00
7,04	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.	UND	0.00	16.00
8,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	0.00	65.60
8,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	0.00	87.90
8,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	85.30
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	0.00	30.00
8,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	0.00	44.30
8,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)	M3	0.00	39.60
8,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	0.00	4598.60
8,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND	0.00	1.00
8,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	M	0.00	32.00
8,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	0.00	16.50
9,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MENORES A 1.5M; INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO.	M3	174.90	758.10
9,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	74.00	762.80
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 0,10 M DE ARENA DE BRECHAS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA.	M3	5.00	52.40
9,06	S.T.C. DE LLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN EN BRECHAS COMPACTADOS MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD IGUAL O MAYOR DEL 90% DE LA DENSIDAD OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	57.30	114.60
9,07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	19.80	328.57
9,08	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	165.00	1910.00
9,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" CON CARACTERÍSTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR.	M	0.00	495.00

9,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" CON CARACTERISTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR. PARA DOMICILIARIAS.	M	290.00	543.00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS SILLAS YEE 8" X 6" PARA TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO.	UND	9.00	84.00
9,13	CONSTRUCCION DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN Ø 1,2 M, PROFUNDIDAD MENORES DE 2 METROS EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	1.00	7.00
9,14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	10.00	72.00

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	38.24%	45.82%	5.49%
DURANTE EL PERIODO	4.45%	2.36%	
ACUMULADO ACTUAL	42.69%	48.18%	

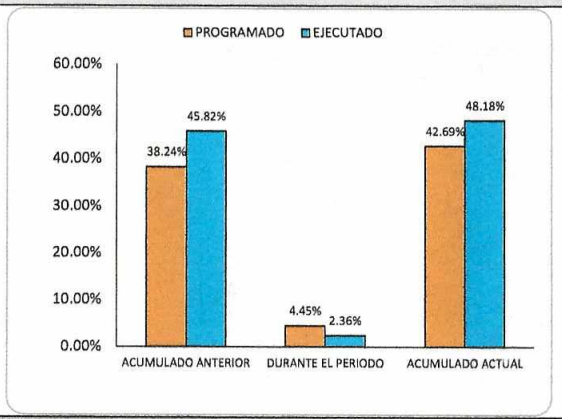

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

1.En la Carrera 11, entre las Calles 15 y 16B (Barrio Risaralda), en las abscisas K 0+003 – K 0+231, se continúan las actividades urbanísticas correspondientes a la instalación de bordillos, relleno de andenes, colocación de tablas guía y elementos visuales, así como el suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para andenes, caja de registro y Bordillos, para rampa vehicular y peatonal.
2.En la Carrera 12, entre la Avenida Circunvalar y la Calle 14 (Barrio Obrero), se ejecutó en el carril izquierdo el suministro de subbase para cero en las abscisas K 0+040 – K 0+000 y posteriormente el suministro de concreto MR-40 con su respectivo texturizado y aplicación de antisol, además de la excavación para instalación de bordillos prefabricados en las abscisas K 0+000 – K 0+070.
3.En la Carrera 10, entre las Calles 22 y 22C (Barrio Chambacú), sin actividades a la espera de suministro de bordillos prefabricados. Se solicitó al contratista reingresar las cuadrilla de andenes para dejar el tramo intervenido en pavimento terminado y proceder con la demolición de los andenes existentes para que la empresa Veolia pueda instalar la red de agua potable.
4.En la Carrera 8C, entre Calle 14 y 15 (Barrio Lacharme), se continúa instalación de bordillos prefabricados, fundidos in situ e instalación de tabletas guía y visuales por el costado izquierdo.
5.En la Calle 14, entre las Carreras 8C y 8D (Barrio Lacharme), excavaciones e instalación de los bordillos prefabricados para organizar andenes.
6.En la Calle 14 entre Cra 9 y Cra 12, Obrero, se continúa la excavación e instalación de los Bordillos prefabricados. Orden y aseo del tramo.
7.En la Calle 17A, entre las Carreras 8B y 9 (Barrio Balboa), se ejecutó el suministro y compactación de subbase granular con acompañamiento de comisión topográfica en las abscisas K 0+090 – K 0+120 y K 0+060 – K 0+110 (carril izquierdo), así como el suministro de concreto MR-40 en el carril derecho en las abscisas K 0+060 – K 0+110, con su respectivo texturizado, aplicación de antisol, verificación de compactación y corte de juntas en las losas de concreto.
8.En la Carrera 12, entre las Calles 16 y 16A (Barrio Risaralda), se realizaron actividades de excavación para identificación de conexiones existentes, instalación de nueva tubería del sistema de alcantarillado y acometidas, suministro y atraque con arena, organización de acero de refuerzo, suministro e instalación de formaletas y vaciado de concreto de 3000 psi para la losa de fondo del MH, en la abscisa K 0+021.

9.En la Calle 15 con la Avenida Circunvalar (Barrio 14 de Julio), se ejecutó el suministro de subbase granular con acompañamiento de comisión topográfica en las abscisas K 0+005 – K 0+065, incluida la reparación de una domiciliaria de acueducto en la abscisa K 0+060, así como el suministro de concreto MR-40 en ambos carriles en las abscisas K 0+003 – K 0+039 y K 0+039 – K 0+063, con verificación de compactación, texturizado y aplicación de antisol.
10. En la Carrera 45, entre las Calles 53 y 58D (Barrio Villa Cielo), se ejecutaron actividades de amarre de acero de refuerzo y suministro de concreto de 3000 psi para cunetas y cárcamos en las abscisas K 0+350 – K 0+400 y K 0+360 – K 0+380, así como el suministro de concreto MR-40 para losa de pavimento y tapa de cárcamo en las abscisas K 0+135 – K 0+129 y K 0+137.8 – K 0+135, incluyendo fondos y muros en las abscisas K 0+388 – K 0+488.
11. En la Calle 53, entre las Carreras 40 y 45 (Barrio Villa Cielo), se realizaron actividades de excavación mecánica de material común, suministro y compactación de material seleccionado, e instalación de acometidas del nuevo sistema de alcantarillado en las abscisas K 0+800 – K 0+880 y K 0+000 – K 0+327, así como el suministro de concreto MR-40 en ambos carriles en las abscisas K 0+877 – K 0+897, con su respectivo texturizado y verificación de funcionalidad de la red.
12. Actividades SST: Se realizó la respectiva señalización y orden y aseo en los tramos.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

1. Excavaciones mecánicas con excavadora para fallos en sub rasante. profundidad > 50 cm. no incluye retiro
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre
4. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)

5. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura entre h= 5.1m a 10m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)

6. SUBBASE GRANULAR CLASE C

7. GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES

8. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)

9. ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa

10. BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

11. EXCAVACION MANUAL

12. CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE

13. ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA

14. CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

15. S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS

16. FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA

17. CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.

18. REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

19. REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.

20. CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)

21. CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Carrera 11, entre las Calles 15 y 16B (Barrio Risaralda) y Carrera 12, entre la Avenida Circunvalar y la Calle 14 (Barrio Obrero)



SUMINISTRO DE CONCRETO 3000 PSI PARA RAMPAS Y ANDENES



INSTALACION DE TABLETAS GUIAS Y VISUALES



EXCAVACION E INTALACION DE BORDILLOS

IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO



VERIFICACION DE COMPACTACION

Carrera 12, entre la Avenida Circunvalar y la Calle 14 (Barrio Obrero) y En la Carrera 12, entre las Calles 16 y 16A (Barrio Risaralda)

IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO



SUMINISTRO DE CONCRETO MR-40 PARA PAVIMENTO



INSTALACION DE TUBERIAS DE 8" ALCANTARILLADO




EXCAVACION MECANICA PARA INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO



CHARLAS POR PARTE DE SST PARA USOS EPPS

Calle 17A, entre las Carreras 8B y 9 (Barrio Balboa) y En la Calle 15 con la Avenida Circunvalar (Barrio 14 de Julio)			IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO
			
SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR	SUMINISTRO DE CONCRETO MR-40 PARA PAVIMENTO	SUMINISTRO DE CONCRETO MR-40 PARA PAVIMENTO	REUNION POR PARTE SOCIAL CON LA COMUNIDAD

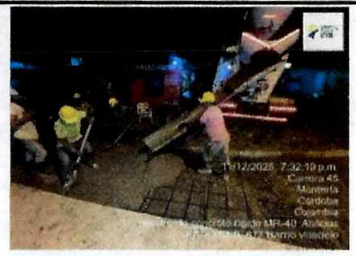carrera 45 entre las calles 53 y 58D (villa cielo) y En la Calle 53, entre las Carreras 40 y 45 (Barrio Villa Cielo)			IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO
			
INSTALCION DE GEOTEXTIL Y SUMUNISTRO DE PIEDRA RAJON PARA MEJORAMIENTO	SUMINISTRO DE CONCRETO MR-40 PARA PAVIMENTO	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS DE CUNETAS	VISITA POR PARTE DE CONTRATISTA DE AFINIA

VII. FIRMAS

CONSORCIO MTR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ	GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA
Director de Obra	Director de Interventoria

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	6
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	22	12	2025	SEMANA No.:	25	DEL	16-dic-25	AL	22-dic-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	Pavimentacion de vias en barrios de la comuna 3,5 y 12 en el municipio de Monteria			OBJETO:	Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y contable al contrato cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"		
CONTRATISTA:	Consorcio MTR			CONTRATISTA:	Consorcion Interventor Montería CYB		
REP. LEGAL:	Nelson Fernando Vanegas Ortiz			REP. LEGAL:	ARMANDO BULA OTERO		
CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025	VALOR INICIAL:	$ 15,716,097,925.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-006-2025	VALOR INICIAL:	$ 1,058,618,839.00
PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ 0.00	PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ 0.00
PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 15,716,097,925.00	PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 1,058,618,839.00
SUSPENSIÓN 1:	NA			SUSPENSIÓN 1:	NA		
REINICIO 1:	NA			REINICIO 1:	NA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0%	$ 0.00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$ 6,878,662,357.00	
PARCIAL 1:	$ 1,753,156,624.00		% AVANCE FINANCIERO:	43.78%	
PARCIAL 2:	$ 1,234,830,178.00				
PARCIAL 3:	$ 2,221,665,574.00				
PARCIAL 4:	$ 1,669,009,981.00				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO


ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,01	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. NO INCLUYE RETIRO	M2	0.00	1408.00
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	120.00	391.70
1,03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	M	125.00	741.70
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	196.00	642.80
1,05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	0.00	67.00
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	0.00	444.70
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	652.00	10183.10
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	847.60	14508.80
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	0.00	48.00
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	21.00	53.00
1,11	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	0.00	0.00
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	102.00	3246.90
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	0.00	1226.20
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	100.00	2817.50
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	0.00	12885.10
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	120.00	2535.30
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	0.00	2.00
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	86.00	1638.70
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	4893.00	22609.70
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	0.00	26.00

4,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	0.00	2.00
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	0.00	83.80
4,04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	0.00	840.00
4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	0.00	46.00
5,01	EXCAVACION MANUAL	M3	0.00	325.70
5,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	422.80
5,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	0.00	7878.40
5,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	0.00	202.50
5,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND	0.00	7.00
6,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	35.00	1264.00
6,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	0.00	1302.20
6,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	95.00	1017.20
6,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	0.00	12.00
6,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	0.00	18.00
7,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	0.00	69.00
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	61.00
7,04	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.	UND	0.00	16.00
8,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	0.00	65.60
8,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	0.00	87.90
8,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	85.30
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	0.00	30.00
8,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	0.00	44.30
8,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)	M3	0.00	39.60
8,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	0.00	4598.60
8,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND	0.00	1.00
8,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	M	0.00	32.00
8,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	0.00	16.50
9,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MENORES A 1.5M; INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO.	M3	100.00	858.10
9,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	48.40	811.20
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 0,10 M DE ARENA DE BRECHAS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA.	M3	4.90	57.30
9,06	S.T.C. DE LLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN EN BRECHAS COMPACTADOS MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD IGUAL O MAYOR DEL 90% DE LA DENSIDAD OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	57.10	171.70
9,07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	150.37	478.94
9,08	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	260.00	2170.00
9,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" CON CARACTERÍSTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR.	M	25.00	520.00

9,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" CON CARACTERISTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR. PARA DOMICILIARIAS.	M	21.00	564.00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS SILLAS YEE 8" X 6" PARA TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO.	UND	0.00	84.00
9,13	CONSTRUCCION DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN Ø 1,2 M, PROFUNDIDAD MENORES DE 2 METROS EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	0.00	7.00
9,14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	8.00	80.00

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	42.69%	48.18%	3.64%
DURANTE EL PERIODO	4.45%	2.60%	
ACUMULADO ACTUAL	47.14%	50.78%	

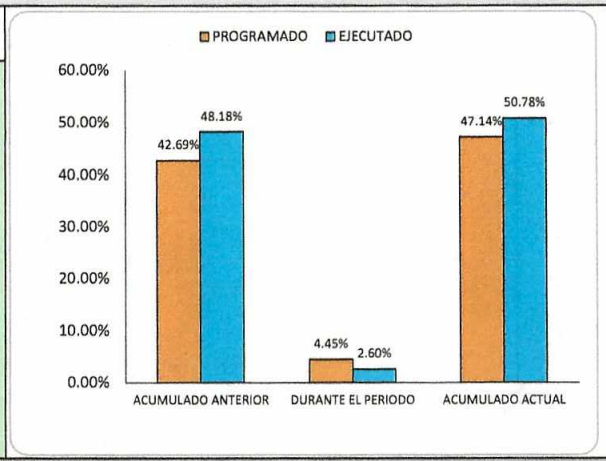

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

1. En la Carrera 11, entre las Calles 15 y 16B (Barrio Risaralda), en las abscisas K 0+003 – K 0+231, se continúan las actividades urbanísticas correspondientes a la instalación de bordillos, relleno de andenes, colocación de tablas guía y elementos visuales, así como el suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para andenes y Bordillos, para rampa vehicular y peatonal.

2.En la Carrera 12, entre la Av Circunvalar y la Calle 14 (Barrio Obrero), en las abscisas K 0+000 – K 0+070 se continúa la excavación e instalación de bordillos prefabricados.

3.En la Carrera 10, entre las Calles 22 y 22C (Barrio Chambacú), se continúa demolición de terrazas, andenes existentes del costado izquierdo entre el K 0+020 a K 0+120.

4.En la Carrera 8C, entre Calle 14 y 15 (Barrio Lacharme), se continúan las actividades urbanísticas correspondientes a la instalación de bordillos, relleno de andenes, colocación de tablas guía y elementos visuales, así como el suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para andenes.

5.En la Calle 14, entre las Carreras 8C y 8D (Barrio Lacharme), excavaciones e instalación de los bordillos prefabricados, rellenos en material seleccionado para organizar andenes del costado contiguo al parque

6.En la Calle 14 entre Cra 9 y Cra 12, Obrero, se continúa la excavación e instalación de los Bordillos prefabricados.

7.En la Calle 17A, entre las Carreras 8B y 9 (Barrio Balboa), se realizó el suministro de concreto MR-40 en los carriles izquierdo y derecho en las abscisas K 0+060 – K 0+110 y K 0+102 – K 0+119, respectivamente, incluyendo cereo, instalación de rieles, texturizado y aplicación de antisol, se ejecutaron cortes de pavimento para completar el tramo K 0+003 – K 0+119.

8.En la Carrera 12, entre las Calles 16 y 16A (Barrio Risaralda), se ejecutó la instalación de la tubería para las acometidas del sistema de alcantarillado, relleno y compactación de zanjas, conformación de la calzada en las abscisas K 0+021 – K 0+050, demolición de vigas de concreto existentes para empalmes, adecuación del terreno y suministro e instalación de subbase granular con acompañamiento de comisión topográfica.

9.En la Calle 15 con la Avenida Circunvalar (Barrio 14 de Julio), en el carril izquierdo, abscisas K 0+039 – K 0+063, se realizaron actividades de adecuación de subbase granular, cereo e instalación de rieles para la programación del suministro de concreto MR-40, el cual fue ejecutado con verificación de compactación, extensión, vibrado, allanado, texturizado y curado, así como la excavación del terreno y la instalación de bordillos prefabricados.

10. En la Calle 18, entre las Carreras 8B y 9 (Barrio Balboa), se realizó la demolición del box culvert en la abscisa K 0+123 con señalización PMT y excavación mecánica de material común entre las abscisas K 0+120 – K 0+070, así como el suministro e instalación de subbase granular en las abscisas K 0+115 – K 0+090; adicionalmente, en la Calle 15 con Av. Circunvalar (Barrio 14 de Julio), en las abscisas K 0+039 – K 0+063, se efectuaron cortes de losas de concreto.

11. En la Carrera 45, entre las Calles 53 y 58D (Barrio Villa Cielo), se realizaron actividades de amarre de acero de refuerzo y suministro de concreto de 3000 psi para cunetas y cárcamos en las abscisas K 0+320 – K 0+390.

12. En la Calle 53, entre las Carreras 40 y 45 (Barrio Villa Cielo), se ejecutaron excavaciones mecánicas de material común y mejoramiento con piedra rajón entre las abscisas K 0+760 – K 0+810, instalación de rieles con acompañamiento topográfico en las abscisas K 0+868 – K 0+840, así como el suministro y compactación de subbase granular y el suministro de concreto MR-40 con sus actividades de compactación, acabado, texturizado y curado en los tramos comprendidos entre las abscisas K 0+800 – K 0+860.

13. Actividades SST: Se realizó la respectiva señalización y orden y aseo en los tramos.

14. Se realizó recorrido por todos los tramos activos del proyecto con el supervisor del municipio, directores del contratista y de la interventoría, y personal técnico, social, SST y ambiental, con el fin de verificar el avance de obra y levantar acta de compromisos.

15. Se realizaron reuniones en la Comuna 5, en la Calle 18 entre las Carreras 8B y 9 (Barrio Balboa) y en la Carrera 11 entre las Calles 15 y 16B (Barrio Risaralda), con el fin de socializar observaciones, explicar los cambios en los diseños de pavimento y escuchar las sugerencias de la comunidad, con participación del área social y del director de la interventoría.

16. Se realizaron reuniones en la Comuna 5, en la Calle 14 entre las Carreras 9 y 12 (Barrio Obrero) con el fin de socializar observaciones, explicar los ajustes en los diseños de urbanisticos y escuchar las sugerencias de la comunidad, con participación del área social y del director de la interventoría.

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	4	DE	6
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

1. Excavaciones mecánicas con excavadora para fallos en sub rasante. profundidad > 50 cm. no incluye retiro
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre
4. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
5. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura entre h= 5.1m a 10m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
6. SUBBASE GRANULAR CLASE C
7. GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
8. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)
9. ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa
10. BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
11. EXCAVACION MANUAL
12. CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE
13. ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA
14. CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
15. S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS
16. FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA
17. CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.
18. REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
19. REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.
20. CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)
21. CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Carrera 11, entre las Calles 15 y 16B (Barrio Risaralda)



CONSTRUCCION DE RAMPA VEHICULAR



INSTALACION DE TABLETAS GUIAS Y VISUALES



INSTALACION DE TABLETAS GUIAS Y VISUALES

IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO



REUNION POR PARTE SOCIAL PARA ACLARAR TEMAS A LA COMUNIDAD

En la Carrera 12, entre las Calles 16 y 16A (Barrio Risaralda)			IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO
			
EXCAVACION MECANICA PARA INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PARA CONSTRUCCION DE MH	EXCAVACION MANUAL PARA ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO	RECORRIDO Y COMITE DE OBRA

en la Calle 14, entre las Carreras 8C y 8D (Barrio Lacharme)			IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO
			
SUMINISTRO DE CONCRETO 3000 PSI PARA ANDENES	CORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDEN	INSTALACION DE TABLETAS GUIAS Y VISUALES	REUNION POR PARTE SOCIAL PARA ACLARAR TEMAS A LA COMUNIDAD

En la Calle 15 con la Avenida Circunvalar (Barrio 14 de Julio) y la Calle 18, entre las Carreras 8B y 9 (Barrio Balboa)			IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO
			
EXCAVACION E INSTALACION DE BORDILLOS PREFABRICADOS	SUMINISTRO DE CONCRETO MR-40 PARA PAVIMENTO	DEMOLICION DE BOX COULVERT EXISTENTE	PODA RADICULAR

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	6	DE	6
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

carrera 45 entre las calles 53 y 58D (villa cielo) y En la Calle 53, entre las Carreras 40 y 45 (Barrio Villa Cielo)	IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO



SUMINISTRO Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR



SUMINISTRO DE CONCRETO MR-40 PARA PAVIMENTO



SUMINISTRO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS DE CUNETAS



TEXTURIZADO DE PAVIMENTO

VII. FIRMAS

CONSORCIO MTR	**CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB**
ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ	**GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA**
Director de Obra	Director de Interventoria

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	5
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	30	12	2025	SEMANA No.:	26	DEL	23-dic-25	AL	30-dic-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	Pavimentacion de vias en barrios de la comuna 3,5 y 12 en el municipio de Monteria			OBJETO:	Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y contable al contrato cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"		
CONTRATISTA:	Consorcio MTR			CONTRATISTA:	Consorcion Interventor Montería CYB		
REP. LEGAL:	Nelson Fernando Vanegas Ortiz			REP. LEGAL:	ARMANDO BULA OTERO		
CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025	VALOR INICIAL:	$ 15,716,097,925.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-006-2025	VALOR INICIAL:	$ 1,058,618,839.00
PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ 0.00	PLAZO INICIAL:	7 meses	ADICIONES:	$ 0.00
PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 15,716,097,925.00	PRORROGA 1:	NA	VALOR TOTAL	$ 1,058,618,839.00
SUSPENSIÓN 1:	NA			SUSPENSIÓN 1:	NA		
REINICIO 1:	NA			REINICIO 1:	NA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	0%	$ 0.00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$ 6,878,662,357.00	
PARCIAL 1:	$ 1,753,156,624.00	% AVANCE FINANCIERO:	43.78%	
PARCIAL 2:	$ 1,234,830,178.00			
PARCIAL 3:	$ 2,221,665,574.00			
PARCIAL 4:	$ 1,669,009,981.00			
FINAL:	$ -			

III. AVANCE FÍSICO


ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,01	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. NO INCLUYE RETIRO	M2	0.00	1408.00
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	0.00	391.70
1,03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	M	139.70	881.40
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	99.00	741.80
1,05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	0.00	67.00
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	0.00	444.70
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	210.00	10393.10
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	273.30	14782.10
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	14.00	62.00
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	0.00	53.00
1,11	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	0.00	0.00
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	254.00	3500.90
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	0.00	1226.20
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	103.60	2921.10
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	0.00	12885.10
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	65.00	2600.30
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	0.00	2.00
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	85.00	1723.70
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	2800.00	25409.70
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	0.00	26.00

4,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	0.00	2.00
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	0.00	83.80
4,04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	672.80	1512.80
4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	0.00	46.00
5,01	EXCAVACION MANUAL	M3	0.00	325.70
5,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	422.80
5,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	0.00	7878.40
5,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	0.00	202.50
5,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND	0.00	7.00
6,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	73.80	1337.80
6,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	55.00	1357.20
6,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	94.00	1111.20
6,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	22.00	34.00
6,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	33.00	51.00
7,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	0.00	69.00
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	61.00
7,04	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.	UND	0.00	16.00
8,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	0.00	65.60
8,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	0.00	87.90
8,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	85.30
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	0.00	30.00
8,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	0.00	44.30
8,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)	M3	0.00	39.60
8,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	0.00	4598.60
8,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND	0.00	1.00
8,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	M	0.00	32.00
8,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	0.00	16.50
9,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MENORES A 1.5M; INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO.	M3	0.00	858.10
9,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	811.20
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 0,10 M DE ARENA DE BRECHAS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA.	M3	0.00	57.30
9,06	S.T.C. DE LLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN EN BRECHAS COMPACTADOS MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD IGUAL O MAYOR DEL 90% DE LA DENSIDAD OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	0.00	171.70
9,07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	150.36	629.30
9,08	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	93.00	2263.00
9,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" CON CARACTERÍSTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR.	M	0.00	520.00

9,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" CON CARACTERISTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR. PARA DOMICILIARIAS.	M	0.00	564.00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS SILLAS YEE 8" X 6" PARA TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO.	UND	0.00	84.00
9,13	CONSTRUCCION DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN Ø 1,2 M, PROFUNDIDAD MENORES DE 2 METROS EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	0.00	7.00
9,14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	0.00	80.00

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	47.14%	50.78%	1.45%
DURANTE EL PERIODO	4.45%	2.25%	
ACUMULADO ACTUAL	51.58%	53.03%	

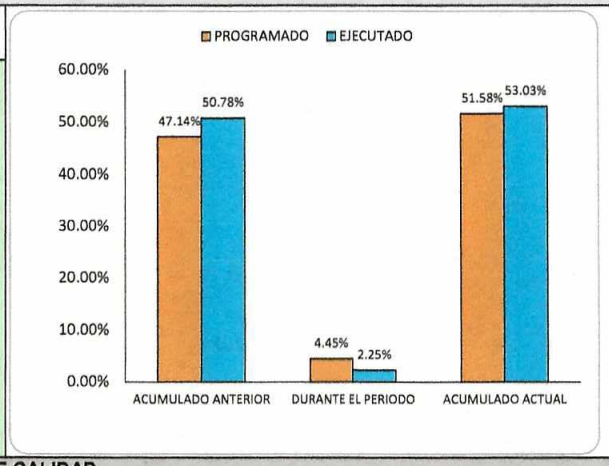

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

1. En la Carrera 11, entre las Calles 15 y 16B (Barrio Risaralda), en las abscisas K 0+003 – K 0+231, se realiza instalación de reductores de velocidad y señales verticales.
2. En la Carrera 8C, entre Calle 14 y 15 (Barrio Lacharme), se continúan las actividades urbanísticas correspondientes a la instalación de bordillos, relleno de andenes, colocación de tablas guía y elementos visuales, así como el suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para andenes
3. En la Calle 14, entre las Carreras 8C y 8D (Barrio Lacharme), se continúan las actividades urbanísticas correspondientes a la instalación de bordillos, relleno de andenes, colocación de tablas guía y elementos visuales, así como el suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para andenes
4. En la Calle 15 con Av Circunvalar y Calle 15 (Barrio 14 de Julio), se continúa excavación del terreno e instalación de bordillos prefabricados y se realiza orden y aseo.
5. En la Carrera 12, entre las Calles 16 y 16A (Barrio Risaralda), se realizó el suministro e instalación de subbase granular con acompañamiento topográfico e instalación de rieles en las abscisas K 0+001 – K 0+051, así como el suministro y colocación de concreto MR-40 en ambos carriles entre las abscisas K 0+001 – K 0+051, incluyendo verificación de compactación, acabado, texturizado y curado, finalizando con labores de orden y aseo del tramo.

6. En la Calle 18, entre las Carreras 8B y 9 (Barrio Balboa), se ejecutó la excavación mecánica de material común entre las abscisas K 0+070 – K 0+000, así como el suministro, instalación y compactación de subbase granular con acompañamiento de comisión topográfica en las abscisas K 0+115 – K 0+080, finalizando con labores de orden y aseo.
7. En la Carrera 45, entre las Calles 53 y 58D (Barrio Villa Cielo), se ejecutaron actividades de amarre de acero de refuerzo y suministro de concreto de 3000 psi para cunetas, cárcamos y bocacalles en las abscisas comprendidas entre K 0+290 - K 0+340 y en los puntos K 0+425 y K 0+450, incluyendo la tapa de cárcamo y un bocacalle en la abscisa K 0+332.
8. En la Calle 53, entre las Carreras 40 y 45 (Barrio Villa Cielo), en las abscisas K 0+787 – K 0+812 (calzada completa), se efectuó el suministro y colocación de concreto MR-40 con verificación de compactación, acabado, texturizado y curado, se realizó señalización, orden y aseo del tramo, y se dejó en observación la abscisa K 0+813 (carril derecho) por agrietamiento de la losa, ejecutándose corte preventivo para control de fisura y programando su solución definitiva para 2026.
9. Actividades SST: Se realizó la respectiva señalización y orden y aseo en todos los tramos

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

1. Excavaciones mecánicas con excavadora para fallos en sub rasante. profundidad > 50 cm. no incluye retiro
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre
4. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
5. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura entre h= 5.1m a 10m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
6. SUBBASE GRANULAR CLASE C
7. GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
8. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)

. ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa

0. BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

1. EXCAVACION MANUAL

2. CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE

3. ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA

4. CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

5. S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS

6. FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA

7. CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.

8. REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

9. REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.

0. CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)

1. CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Carrera 11, entre las Calles 15 y 16B (Barrio Risaralda) y Carrera 8C, entre Calle 14 y 15 (Barrio Lacharme)



SUMINISTRO DE CONCRETO 3000 PSI DE RAMPAS VEHICULARES



INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD



INSTALACION DE TABLETAS GUIAS Y VISUALES

IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO



ORDEN Y ASEO

Calle 14, entre las Carreras 8C y 8D (Barrio Lacharme) y Calle 18, entre las Carreras 8B y 9 (Barrio Balboa)



EXCAVACION PARA INSTALACION DE BORDILLOS PREFABRICADOS



EXCAVACION DE MATERIAL COMUN



RETICO DE TRONCOS DE ARBOLES

IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO



SEÑALIZACIONES PMT

Carrera 12, entre las Calles 16 y 16A (Barrio Risaralda)			IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO
			
INSTALACION DE RIELES	SUMINISTRO DE CONCRETO MR-40 PARA PAVIMENTO	TEXTURIZADO DE PAVIMENTO	ORDEN Y ASEO

carrera 45 entre las calles 53 y 58D (villa cielo) y En la Calle 53, entre las Carreras 40 y 45 (Barrio Villa Cielo)			IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO
			
SUMINISTRO DE CONCRETO MR-40 PARA PAVIMENTO	SUMINISTRO DE CONCRETO 3000 PSI DE TAPA DE CARCAMO	TOMA DE MUESTRAS DE FLEXION DE PAVIMENTO MR-40	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

VII. FIRMAS

CONSORCIO MTR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ	GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA
Director de Obra	Director de Interventoria

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					**PÁGINA**	1	DE	5
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					**CODIGO DEL PROCESO:**	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	5	1	2026	SEMANA No.:	27	DEL	29-dic-25	AL	5-ene-26

CONTRATO DE OBRA				**CONTRATO DE INTERVENTORIA**			
OBJETO:	Pavimentacion de vias en barrios de la comuna 3,5 y 12 en el municipio de Monteria			**OBJETO:**	Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y contable al contrato cuyo objeto es "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"		
CONTRATISTA:	Consorcio MTR			**CONTRATISTA:**	Consorcion Interventor Montería CYB		
REP. LEGAL:	Nelson Fernando Vanegas Ortiz			**REP. LEGAL:**	ARMANDO BULA OTERO		
CONTRATO No.	LP-SIM-008-2025	**VALOR INICIAL:**	$ 15,716,097,925.00	**CONTRATO No.**	CMA-SIM-006-2025	**VALOR INICIAL:**	$ 1,058,618,839.00
PLAZO INICIAL:	7 meses	**ADICIONES:**	$ 0.00	**PLAZO INICIAL:**	7 meses	**ADICIONES:**	$ 0.00
PRORROGA 1:	NA	**VALOR TOTAL**	$ 15,716,097,925.00	**PRORROGA 1:**	NA	**VALOR TOTAL**	$ 1,058,618,839.00
SUSPENSIÓN 1:	NA			**SUSPENSIÓN 1:**	NA		
REINICIO 1:	NA			**REINICIO 1:**	NA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			**PORCENTAJE%**	0%	$ 0.00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			**TOTAL PAGADO:**	$ 6,878,662,357.00	
PARCIAL 1:	$ 1,753,156,624.00				
PARCIAL 2:	$ 1,234,830,178.00		**% AVANCE FINANCIERO:**	**43.78%**	
PARCIAL 3:	$ 2,221,665,574.00				
PARCIAL 4:	$ 1,669,009,981.00				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO


ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,01	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. NO INCLUYE RETIRO	M2	0.00	1408.00
1,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	0.00	391.70
1,03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	M	0.00	881.40
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	0.00	741.80
1,05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	0.00	67.00
1,06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	2825.90	3270.60
1,07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	0.00	10393.10
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	14782.10
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	0.00	62.00
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	0.00	53.00
1,11	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	0.00	0.00
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	29.90	3530.80
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	1364.70	2590.90
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	8.80	2929.90
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	2014.90	14900.00
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	34.20	2634.50
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	4.00	6.00
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	15.50	1739.20
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	332.10	25741.80
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	18.00	44.00

4,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	2.00	4.00
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	163.00	246.80
4,04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	745.00	2257.80
4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	52.00	98.00
5,01	EXCAVACION MANUAL	M3	0.00	325.70
5,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	422.80
5,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	1308.10	1308.10
5,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	208.60	208.60
5,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	0.00	7878.40
5,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	0.00	202.50
5,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND	0.00	7.00
6,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	35.20	1373.00
6,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	45.20	1402.40
6,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	0.00	1111.20
6,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	0.00	34.00
6,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	0.00	51.00
7,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	0.00	69.00
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	61.00
7,04	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.	UND	0.00	16.00
8,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	0.00	65.60
8,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	0.00	87.90
8,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	85.30
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	0.00	30.00
8,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	0.00	44.30
8,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)	M3	0.00	39.60
8,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	0.00	4598.60
8,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND	0.00	1.00
8,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	M	0.00	32.00
8,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	0.00	16.50
9,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MENORES A 1.5M; INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO.	M3	0.00	858.10
9,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	811.20
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 0,10 M DE ARENA DE BRECHAS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA.	M3	0.00	57.30
9,06	S.T.C. DE LLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN EN BRECHAS COMPACTADOS MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD IGUAL O MAYOR DEL 90% DE LA DENSIDAD OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	0.00	171.70
9,07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	0.00	629.30
9,08	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	0.00	2263.00
9,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" CON CARACTERÍSTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR.	M	0.00	520.00

9,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" CON CARACTERISTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR. PARA DOMICILIARIAS.	M	0.00	564.00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS SILLAS YEE 8" X 6" PARA TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO.	UND	0.00	84.00
9,13	CONSTRUCCION DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN Ø 1,2 M, PROFUNDIDAD MENORES DE 2 METROS EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	0.00	7.00
9,14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	0.00	80.00

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	51.58%	53.03%	0.73%
DURANTE EL PERIODO	4.45%	3.73%	
ACUMULADO ACTUAL	56.03%	56.76%	

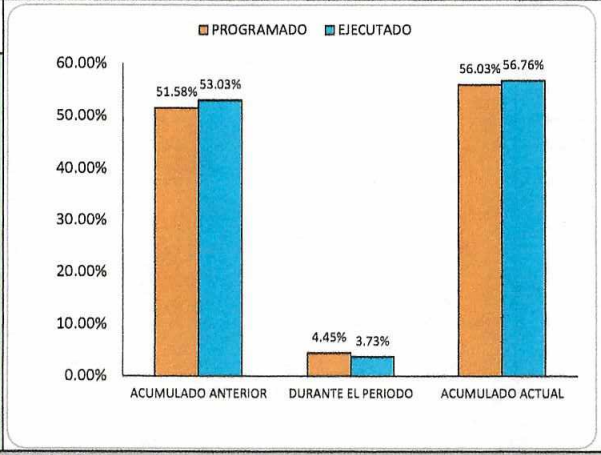

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

1. En la Carrera 11, entre las Calles 15 y 16B (Barrio Risaralda), en las abscisas K 0+003 – K 0+231, se realiza instalacion de sellos de juntas de pavimento.
2. En la Carrera 8C, entre Calle 14 y 15 (Barrio Lacharme), Se realizaron labores de orden y aseo del frente de obra, con la instalación de la señalización correspondiente, con el fin de garantizar la seguridad durante el período de fin de año.
3. En la Calle 14, entre las Carreras 8C y 8D (Barrio Lacharme), Se realizaron labores de orden y aseo del frente de obra, con la instalación de la señalización correspondiente, con el fin de garantizar la seguridad durante el período de fin de año.
4. En la Calle 15 con Av Circunvalar y Calle 15 (Barrio 14 de Julio), Se realizaron labores de orden y aseo del frente de obra, con la instalación de la señalización correspondiente, con el fin de garantizar la seguridad durante el período de fin de año.
5. En la Carrera 12, entre las Calles 16 y 16A (Barrio Risaralda), Se realizaron labores de orden y aseo del frente de obra, con la instalación de la señalización correspondiente, con el fin de garantizar la seguridad durante el período de fin de año.

6. En la Calle 18, entre las Carreras 8B y 9 (Barrio Balboa), Se realizaron labores de orden y aseo del frente de obra, con la instalación de la señalización correspondiente, con el fin de garantizar la seguridad durante el período de fin de año.
7. En la Carrera 45, entre las Calles 53 y 58D (Barrio Villa Cielo), en la abscisas K0+425 y K0+455 se realiza suministro de concreto MR-40 para tapas de carcamo y bocacalles y tambien se realizaron labores de orden y aseo del frente de obra, con la instalación de la señalización correspondiente, con el fin de garantizar la seguridad durante el período de fin de año.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

1. Excavaciones mecánicas con excavadora para fallos en sub rasante. profundidad > 50 cm. no incluye retiro
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre
4. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura menor o igual h= 5 m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
5. Remoción de especies vegetales (tala de árboles altura entre h= 5.1m a 10m incluye transporte de residuos, incluye extracción de raiz)
6. SUBBASE GRANULAR CLASE C
7. GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
8. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)
9. ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa
10. BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
11. EXCAVACION MANUAL
12. CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE
13. ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA
14. CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
15. S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS
16. FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA
17. CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.
18. REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
19. REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.
20. CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)
21. CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Carrera 11, entre las Calles 15 y 16B (Barrio Risaralda) y Carrera 8C, entre Calle 14 y 15 (Barrio Lacharme)



ORDEN Y ASEO



INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO




SEÑALIZACIONES PMT

IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO



ORDEN Y ASEO

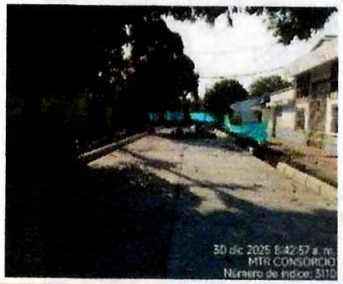Calle 14, entre las Carreras 8C y 8D (Barrio Lacharme) y Calle 18, entre las Carreras 8B y 9 (Barrio Balboa)			IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO
			
SEÑALIZACIONES PMT	SEÑALIZACIONES PMT	SEÑALIZACIONES PMT	SEÑALIZACIONES PMT

carrera 45 entre las calles 53 y 58D (villa cielo) y En la Calle 53, entre las Carreras 40 y 45 (Barrio Villa Cielo)			IMPLEMENTACIÓN PMT / PGIO
			
AMARRE DE ACERO DE REFUERZO DE TAPA DE CARCAMO Y BOCACALLE	SUMINISTRO DE CONCRETO 3000 PSI DE TAPA DE CARCAMO	SEÑALIZACIONES PMT (MH)	SEÑALIZACIONES PMT

VII. FIRMAS

CONSORCIO MTR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
ERIK FABIAN ARROYO MUÑOZ	GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA
Director de Obra	Director de Interventoria
