INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL A NIVEL FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURRUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORMACIÓN DEL FUNCIONARIO	
Nombre:	EDLY STELLA RENTERÍA MENA
Cargo	Directora de Consultoría
Periodo informado	01 al 31 de Marzo de 2025

Actividades realizadas:

- Planear las actividades a ejecutar para el cumplimiento del objeto contractual.
- Solicitud de hojas de vida de los diferentes profesionales del proyecto, revisión y selección para ser enviada a la interventoría.
- Supervisión directa del equipo técnico y administrativo, asegurando el cumplimiento de los cronogramas establecidos.
- Gestión y coordinación de reuniones periódicas con los especialistas encargados de cada volumen técnico.
- Coordinación en la elaboración y revisión del Plan de Calidad y la metodología general.
- Comités de seguimiento al contrato de estudios y diseños del corredor vial Curundó – San José del Palmar – Cruce El Cairo, con participación del INVIAS (SPI), Consultoría (UTCH) e Interventoría (UPTC).
- Reunión técnica con el ingeniero experto en BIM, quien asumirá el rol de Coordinador BIM – SIG, para definir los requerimientos relacionados con el equipo de apoyo (modeladores BIM), selección de los softwares para la gestión

técnica de la información y las actividades pendientes a realizar en el componente, entre ellas el Plan de Ejecución BIM (BEP).

- Reunión técnica entre el equipo de especialistas de la consultoría y el Coordinador BIM – SIG, en la cual se realizó la presentación del Plan de Ejecución BIM ajustado a los requerimientos del proyecto.
- Capacitaciones en la metodología BIM con la participación de los especialistas de la consultoría y la interventoría.

Responsable



Ing. Edily Stella Rentería Mena
Directora Consultoría

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA	VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	12/03/2025	84926805	$2.240.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	768.000	0		0		0	0	0	0	768.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	983.100	0	0	30.800	30.800	0	0		1.044.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	427.700				427.700	0	0	427.700			4.277	427.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	768.000	768.000
Pensión	1	1.044.700	1.044.700
Riesgos Laborales	1	427.700	427.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.240.400	2.240.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA		VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	12/03/2025	84926805	$2.240.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	54255569	RENTERIA MENA EDLY STELLA	57	0			N																	25-14	6.144.000	983.100	0	0	30.800	30.800	EPS037	6.144.000	768.000	14-23	6.144.000	5	427.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Quibdó, 31 de marzo de 2025

CUENTA DE COBRO

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO
"DIEGO LUIS CORDOBA"
NIT. 891680089-4

Debe a:
JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS
C.C. 1.077.476.234

La suma de:

OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($8.775.000) MCTE.

POR CONCEPTO DE:

Pago por prestar servicios profesionales **COMO INGENIERA RESIDENTE DE ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA 4227 - 2024 ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.**

- Valor de los honorarios fijados en el contrato para la Residente de Estudios es de $5.850.000
- Factor prestacional para pensionados 1.50
- Valor total de honorarios $8.775.000

Jhoana Marcela Mosquera P.

JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS
Cédula: 1.077.476.234 de Quibdó
Celular: 3147252673

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL A NIVEL FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURRUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORMACIÓN DEL FUNCIONARIO	
Nombre:	JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS
Cargo	Ingeniera Residente de Estudios
Periodo informado	Marzo de 2025 (01 al 31)

Actividades realizadas

Como ingeniera residente de estudios realicé las siguientes actividades:

- Apoyar la dirección del proyecto.
- Organizar y participar en los comités técnicos de la consultoría.
- Revisar y generar oficios desde la consultoría.
- Coadyuvar en la organización y logística de todas las actividades del proyecto para el cumplimiento del objeto contractual.
- Participar en los comités de seguimiento al contrato de estudios y diseños del corredor vial Curundó – San José del Palmar – Cruce El Cairo, con participación del INVIAS (SPI), Consultoría (UTCH) e Interventoría (UPTC).
- Participar en la reunión técnica con el ingeniero experto en BIM, quien asumirá el rol de Coordinador BIM – SIG, para definir los requerimientos relacionados con el equipo de apoyo (modeladores BIM), selección de los softwares para la gestión técnica de la información y las actividades pendientes a realizar en el componente, entre ellas el Plan de Ejecución BIM (BEP).

- Participar reunión técnica entre el equipo de especialistas de la consultoría y el Coordinador BIM – SIG, en la cual se realizó la presentación del Plan de Ejecución BIM ajustado a los requerimientos del proyecto.
- Capacitaciones en la metodología BIM con la participación de los especialistas de la consultoría y la interventoría.
- Reportar el avance del proyecto mediante informes semanales del mes de marzo de 2025.

Responsable

Jhoana Marcela Mosquera P.

Jhoana Marcela Mosquera Palacios
Ingeniera Residente de Estudios

Vo. Bo.

Ing. Edly Stella Rentería Mena
Directora Consultoría

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1077476234	JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS	la Cascorba	3147252673	marcliths97@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	09/04/2025	85685219	$1.040.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	438.800	0		0		0	1	300	0	439.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	561.600	0	0	0	0	1	400	0	562.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	18.400				18.400	1	100	18.500			184	18.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF29	Caja Fliar Choco	891600091-8	21.100	1	100	21.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	438.800	439.100
Pensión	1	561.600	562.000
Riesgos Laborales	1	18.400	18.500
CCF	1	21.100	21.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.039.900	1.040.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1077476234	JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS		la Cascorba	3147252673	marcliths97@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	09/04/2025	85685219	$1.040.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1077476234	MOSQUERA PALACIOS JHOANA MARCELA	57	0			N		X															25-14	3.510.000	561.600	0	0	0	0	EPS037	3.510.000	438.800	14-11	3.510.000	1	18.400	CCF29	3.510.000	21.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL A NIVEL FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURRUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORMACIÓN DEL FUNCIONARIO	
Nombre:	LUZ YANETH OCORÓ VELÁSQUEZ
Cargo	Coordinador Ambiental y Social
Periodo informado	01 al 31 de marzo de 2025

Actividades realizadas:

- En conjunto con el coordinador técnico del proyecto se elaboró la metodología general del proyecto para el desarrollo de los estudios y diseños correspondientes a 19 volúmenes, en la cual se describe la información general del proyecto, la estrategia para el manejo de información primaria y secundaria a utilizar en la ejecución del proyecto, la programación general y otros elementos que permitan la articulación del equipo de trabajo, conforme los objetivos y alcances establecidos en los requerimientos técnicos del proyecto.
- Comités de seguimiento (4) al contrato de estudios y diseños del corredor vial Curundó – San José del Palmar – Cruce El Cairo, con participación del INVIAS (SPI), Consultoría (UTCH) e Interventoría (UPTC).
- Reunión técnica con el ingeniero experto en BIM, quien asumirá el rol de Coordinador BIM – SIG, para definir los requerimientos relacionados con el equipo de apoyo (modeladores BIM), selección de los softwares para la gestión técnica de la información y las actividades pendientes a realizar en el componente, entre ellas el Plan de Ejecución BIM (BEP).


- En conjunto con el coordinador técnico y el coordinador BIM-SIG se elaboró y ajustó el documento denominado Control de calidad de los estudios y diseños (Plan de calidad), de conformidad con lo exigido en el Anexo 01 - Anexo Técnico Consultoría de Estudios de Ingeniería de Infraestructura de Transporte, en el cual se incorporaron las estrategias para la verificación de la consistencia de los estudios y diseños.
- Reunión técnica entre el equipo de especialistas de la consultoría y el Coordinador BIM – SIG, en la cual se realizó la presentación del Plan de Ejecución BIM ajustado a los requerimientos del proyecto.
- Capacitaciones en la metodología BIM con la participación de los especialistas de la consultoría y la interventoría.

Responsable



Luz Yaneth Ocoró Velásquez
Coordinadora Ambiental y Social

Vo. Bo.



Ing. Edly Stella Rentería Mena
Directora Consultoría

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52102426	LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ	Trasversal 19 #24 - 43	6733535	luyove@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	15/04/2025	85769533	$1.383.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	603.400	0		0		0	8	3.200	0	606.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	772.400	0	0	0	0	8	4.000	0	776.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	603.400	606.600
Pensión	1	772.400	776.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.375.800	1.383.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52102426	LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ		Trasversal 19 #24 - 43	6733535	luyove@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	15/04/2025	85769533	$1.383.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52102426	OCORO VELASQUEZ LUZ YANETH	3	0			N																	25-14	4.827.000	772.400	0	0	0	0	EPS037	4.827.000	603.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL A NIVEL FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURRUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORMACIÓN DEL FUNCIONARIO	
Nombre:	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA
Cargo	Coordinador Técnico
Periodo informado	01 al 31 de marzo de 2025

Actividades realizadas:

- En conjunto con la coordinadora ambiental y social se elaboró la metodología general del proyecto para el desarrollo de los estudios y diseños correspondientes a 19 volúmenes, en la cual se describe la información general del proyecto, la estrategia para el manejo de información primaria y secundaria a utilizar en la ejecución del proyecto, la programación general y otros elementos que permitan la articulación del equipo de trabajo, conforme los objetivos y alcances establecidos en los requerimientos técnicos del proyecto.
- Cuatro comités de seguimiento al contrato de estudios y diseños del corredor vial Curundó – San José del Palmar – Cruce El Cairo, con participación del INVIAS (SPI), Consultoría (UTCH) e Interventoría (UPTC).
- Reunión técnica con el ingeniero experto en BIM, quien asumirá el rol de Coordinador BIM – SIG, para definir los requerimientos relacionados con el equipo de apoyo (modeladores BIM), selección de los softwares para la gestión técnica de la información y las actividades pendientes a realizar en el componente, entre ellas el Plan de Ejecución BIM (BEP).
- En conjunto con el coordinador BIM-SIG y la coordinadora ambiental y social se elaboró y ajustó el documento denominado Control de calidad de los estudios y

diseños (Plan de calidad), de conformidad con lo exigido en el Anexo 01 - Anexo Técnico Consultoría de Estudios de Ingeniería de Infraestructura de Transporte, en el cual se incorporaron las estrategias para la verificación de la consistencia de los estudios y diseños.

- Reunión técnica entre el equipo de especialistas de la consultoría y el Coordinador BIM – SIG, en la cual se realizó la presentación del Plan de Ejecución BIM ajustado a los requerimientos del proyecto.
- Capacitaciones en la metodología BIM con la participación de los especialistas de la consultoría y la interventoría.

Responsable

Eulogio Palacios Chaverra
Coordinador Técnico

Vo. Bo.

Ing. Edly Stella Rentería Mena
Directora Consultoría

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	10/04/2025	85763666	$1.376.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	603.400	0		0		0	1	400	0	603.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	772.400	0	0	0	0	1	500	0	772.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	603.400	603.800
Pensión	1	772.400	772.900
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.375.800	1.376.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA		Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	10/04/2025	85763666	$1.376.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11788838	PALACIOS CHAVERRA EULOGIO	3	0			N																	25-14	4.827.000	772.400	0	0	0	0	EPS037	4.827.000	603.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Quibdó, 31 de marzo de 2025

CUENTA DE COBRO

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO
"DIEGO LUIS CORDOBA"
NIT. 891680089-4

Debe a:
LLECELI MOSQUERA TELLO
C.C. 1.077.463.135


La suma de:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($5.835.000) MCTE.

POR CONCEPTO DE:

Pago por prestar servicios profesionales **COMO INGENIERA AUXILIAR PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA 4227 - 2024 ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.**

- Valor de los honorarios fijados en el contrato para la Residente de Estudios es de $3.890.000
- Factor prestacional para pensionados 1.50
- Valor total de honorarios $5.835.000



LLECELI MOSQUERA TELLO
Cédula: 1.077.463.135 de Quibdó
Celular: 3197244152

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORMACIÓN PERSONAL	
Nombre:	Lleceli Mosquera Tello
No. Identificación	1.077.463.135
Cargo	Ingeniera Auxiliar
Periodo informado	marzo de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 02 DEL MES MARZO DE 2025.

- **Gestión de comunicación digital:** Monitoreo continuo durante la mayor parte del día de la información proporcionada y/o proyectada a través de los medios digitales, con especial énfasis en el correo institucional, para transmitir de manera eficiente la información relevante a los especialistas.

- **Participación y asistencia en reuniones del proyecto:** Consistió en brindar asistencia a las reuniones programadas por la consultoría, interventoría y/o el INVIAS, específicamente en los pre-comité y comités, con el objetivo de levantar las actas, registrar evidencia de las reuniones y recopilar la información que pudiera ser requerida.

  Durante el mes de marzo, se participó y asistió a un total de 13 reuniones: 9 de las 12 convocadas por la consultoría para sus profesionales y 4 reuniones de comité de seguimiento convocadas por la interventoría. Se realizó un registro de asistencia y fotográfico en cada una de las reuniones, con el fin de incluirlos posteriormente en los informes semanales y en las actas de las reuniones de la consultoría.

- **Revisión y envío de la documentación técnica:** Teniendo en cuenta la información proporcionada por el Instituto Nacional de Vías sobre los estudios y diseños de la fase II, se llevó a cabo una revisión preliminar y se elaboró una lista de chequeo con el fin de verificar la precisión de la información. Además, se compartieron los resultados con los especialistas.

  Es importante resaltar que esta actividad se realiza de manera continua, debido a la constante necesidad de verificar la información entregada.

- **Gestión y registro continuo de información:** Se trata de mantener un registro detallado de toda la información recibida y enviada, incluyendo las actas de las reuniones de consultoría y aquellas proporcionadas por la interventoría.

  Durante este período, se registraron un total de 29 correspondencias enviadas y 35 recibidas, así como 2 actas de consultoría y 3 actas entregadas por la interventoría. Cabe destacar que estas correspondencias y documentos fueron gestionados tanto por correo electrónico como en formato físico, asegurando una comunicación efectiva en ambos medios.

- **Elaboración y preparación de actas:** Elaboración y organización de las actas correspondientes a las reuniones coordinadas por la Consultoría. Estas actas incluyen detalles como los objetivos de la reunión, los temas tratados, el desarrollo de la sesión, el registro fotográfico, la toma de asistencia de los especialistas y los compromisos acordados. Durante este período, se redactaron un total de dos actas.

- **Contribución en la estructuración de informes semanales:** Una vez definida la programación final del proyecto, se procedió a organizar las actividades de manera detallada, respetando los plazos establecidos. Además, se tuvo en cuenta la participación y asistencia en las reuniones del proyecto, así como la programación de reuniones y otras actividades adicionales con el equipo de consultoría. Durante este mes, se contribuyó a la elaboración de 4 informes semanales.

- **Colaborar en la elaboración y el seguimiento de cronogramas y planes de trabajo:** Planificación de actividades y asegurar su cumplimiento según los plazos y objetivos establecidos.

- **Coordinar y agendar reuniones con el equipo de consultoría y actores claves**: Se organizaron y programaron las reuniones necesarias con el equipo de consultoría. Para ello, se coordinaron y agendaron un total de 12 reuniones

- **Elaboración y emisión de oficios y/o solicitudes de información requerida:** Durante el mes de marzo, se redactaron 15 y enviaron un total de 29 oficios dirigidos a diversas entidades y dependencias del Instituto Universitario, con el objetivo de obtener la información requerida de manera eficiente y clara.

- **Gestión de documentación y trámites administrativos:** Apoyo en la recopilación de información solicitada por los especialistas y en el seguimiento de los trámites administrativos internos de la consultoría.

- **Comunicación efectiva**: Garantizar que todas las partes involucradas estén correctamente informadas sobre los cambios y avances del proyecto, así como proporcionar la información solicitada por los profesionales y especialistas del grupo 1. Asimismo, se mantuvo una comunicación fluida con la gestora del INVÍAS para la revisión y recopilación de la información preliminar del proyecto, garantizando, además, el suministro oportuno de la información requerida.

Responsable

Lleceli Mosquera Tello
Ingeniera Auxiliar

Vo. Bo.

Ing. Edily Stella Rentería Mena
Directora Consultoría

ANEXOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO 4227 de 2024

CONTROL DE REUNIONES DE LA CONSULTORIA

REUNIÓN N°	FECHA DE PROGRAMACI	FECHA DE REUNION	HORA	OBJETIVOS DE LA REUNION	PROYECTADO POR	DIRIGIDO A	MODALIDAD	OBSERVACIÓNES
1	27/02/2025	4/03/2025	09:00-10:00	Materialización y trabajo coloborativo de el Volumen Predial	Consultoria	Erika Palacios Bermúdez Lleceli Mosquera Tello Juana Maria Pino Pino Yasir Velasquez Parra Carlos Alberto Tello Mosquera Blanca Nieves Valencia Perea	Presencial	
2	4/03/2025	4/03/2025	15:00-15:30	Socializacion sobre contrato	Consultoria	Bertonis	Presencial	
3	5/03/2025	8/03/2025	11:00-12:00	Materialización y socializacion sobre contrato	Consultoria	Especialistas del Volumen de Geologia	Virtual	
4	15/03/2025	15/03/2025	8:30	Aclaraciones contractuales de profesion.	Consultoria	Luz Yaneth Ococó Velásquez Jhoana Marcela Mosquera Palacios Eulogio Palacios Chaverra Lleceli Mosquera Tello Edly Stella Pentería Mena Elvis Ferney Mosquera Trelles	Presencial	
5	13/03/2025	15/03/2025	9:30-11:30	Materializacion de los volumenes y el BEI	Consultoria	Manager BIM y especialistas de Consultoria del Grupo 1	Virtual	
6	15/03/2025	21/03/2025	17:00-19:00	Materializacion de volumenes con especialistas de la consultoria y	Consultoria	ESPECIALISTAS DE CONSULTORIA	Virtual	
7	25/03/2025	28/03/2025	08:00-9:00	Secciones con los especialistas de los volumenes de Transito, Geometrico, Pavimento y el Manager BIM	MANAGER BIM	Karina Victoria Martínez Lora Yussy Yaritza Moreno Andrade Lucy Hernández Domínguez	Virtual	
8	25/03/2025	28/03/2025	09:00-10:00	Secciones con los especialistas del volumen de Geotecnia y el Manager	MANAGER BIM	José Alberto Córdoba Arias Javinson Mosquera Borrero	Virtual	
9	25/03/2025	28/03/2025	10:00-11:00	Secciones con los especialistas del volumen Predia y el Manager BIM	MANAGER BIM	Erika Palacios Bermúdez Juana Maria Pino Pino Yasir Velasquez Parra Carlos Alberto Tello Mosquera Blanca Nieves Valencia Perea	Virtual	
10	25/03/2025	29/03/2025	08:00-9:00	Secciones con los especialistas del volumen de Hidraulica y el Manager	MANAGER BIM	Jesus Armando Mena Manjarres	Virtual	
11	25/03/2025	29/03/2025	09:00-10:00	Secciones con los especialistas del volumen Estructural y el Manager BIM	MANAGER BIM	Francisco Abrahán Palacios Mena Héctor Fabian Chaparro Carlos Alberto Parra	Virtual	
12	25/03/2025	29/03/2025	10:00-11:00	Secciones con los especialistas del volumen de Geologia y el Manager BIM	MANAGER BIM	Diana Paola Granados Cely Néstor Geovanni Agamez Verjan	Virtual	

Ilustración 1.Control de reuniones de la Consultoría.

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO 4227 de 2024

CONTROL DE REUNIONES DE COMITÉ CONSULTORIA E INTERVENTORIA

REUNIÓN N°	FECHA DE PROGRAMACIÓN	FECHA DE REUNION	HORA	OBJETIVOS DE LA REUNION	PROYECTADO POR	DIRIGIDO A	MODALIDAD	OBSERVACIÓNES
1	5/03/2025	6/03/2025	09:30-11:00	Comité de seguimiento	Interventoria	Consultoria	Virtual	
2	11/03/2025	13/03/2025	09:30-11:00	Comité de seguimiento mensual de consultoria, interventoria e INVIAS	Interventoria	Consultoria	Virtual	
3	18/03/2025	20/03/2025	09:30-11:00	Comité de seguimiento	Interventoria	Consultoria	Virtual	
4	25/03/2025	27/03/2025	09:30-11:00	Comité de seguimiento	Interventoria	Consultoria	Virtual	

Ilustración 2. Control de reuniones de comité de seguimiento

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA CONTRATO 4227 de 2024						CODIGO:F-CAL-CONS-00-03 VERSION: 1 FECHA:02/12/2024
CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
NÙMERO	**FECHA**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**	**PROYECTADO POR**	**MEDIO DE ENTREGA**	**OBSERVACIONES**
F-GCOM-11	3/03/2025	Cuenta de cobro arriendo	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	FINANCIERA	Correo electrónico	Oficio no impreso.
SIN NUMERACIÓN	3/03/2025	Requerimientos de sostenibilidad	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	LUZ YANETH OCORÓ COORDINADORA	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	5/03/2025	Entrega de Metodologia SIG	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	ERIKA PALACIOS BERMUDEZ	Correo electrónico	
2025E-VUVRAZ-025681	10/03/2025	RADICADO-ACTA DE COSTOS No 03 CONTRATO 4227 2024 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO NIT	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	INTERVENTORIA		
C4262 023-2025 C4262 032-2025	10/03/2025	Aprobación de las 10 metodologias C4262 023-2025 al C4262 031-2025	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	INTERVENTORIA	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	12/03/2025	Solicitud firmas actas de reunión 6 , 7 y 8	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	INTERVENTORIA		
SIN NUMERACIÓN	12/03/2025	Entrega de Metodologia general para ser entregada a la Interventoria	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	LUZ YANETH OCORÓ COORDINADORA	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	13/03/2025	Terminación de vinculación al proyecto de Manager BIM	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	ELVIS FERNEY MOSQUERA TRELLES	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	13/03/2025	CTO 4227-2024 / Aprobacion garancios según orden de inicio	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA GESTORA- INVIAS	Correo electrónico	
2025E-VUVR-015347	14/03/2025	Solicitar información sobre la posible existencia de Proyectos, obras o actividades que se ejecuten o que se proyecten ejecutar en la zona a corto y mediano plazo.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	JANNIER SALAS QUEJADA DIRECTOR TERRITORIAL CHOCO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Correo electrónico	Documento adjunto en carpeta de Oficios Abogado
N° 2025I-VBOG-010646	15/03/2025	Respuesta al radicado N° 2025I-VBOG-010646	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA GESTORA- INVIAS	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	15/03/2025	CTO 4227-24 / Consultoria Curundo San Jose del Palmar/ Observaciones poliza anexo 4	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA GESTORA- INVIAS		
SIN NUMERACIÓN	16/03/2025	Consolidado control de calidad según BEP	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	MANAGER BIM	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	17/03/2025	ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No 1 - CTO 4227-24 / CONSULTORIA CURUNDO, firmada por las partes	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA GESTORA- INVIAS	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	17/03/2025	Acuerdo INVIAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA		
SIN NUMERACIÓN	17/03/2025	Solicitud de informaci6n sobre registro de titulaci6n de predios.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	ANT	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	17/03/2025	Firma acta, reunion N° 9	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	INTERVENTORIA	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	17/03/2025	Acta de Modificacion de Costos N° 1	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA GESTORA- INVIAS	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	18/03/2025	Manual de lineamientos y lista de chequeo para la revisión y	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	EDLY STELLA RENTERIA MENA	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	18/03/2025	Entrega de la Metodologia del volumen 13. Estudio de Redes.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	JESUS ARMANDO MENA MANJARRES	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	20/03/2025	Entrega de la Metodologia del volumen VI. Estudio de	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	DIANA GRANADOS CELY GEÓLOGA	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	21/03/2025	Formatos	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	OFICINA DE CONTRATACION UTCH	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	21/03/2025	Entrega del Plan de Calidad	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	LUZ YANETH OCORÓ COORDINADORA	Correo electrónico	

Ilustración 3. Control de correspondencias recibidas-1.

SIN NUMERACIÓN	24/03/2025	Entrega de la Metodologia del volumen XIV.Estudio de Riesgos	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	LUZ YANETH OCORÓ COORDINADORA	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	24/03/2025	Entrega de la Metodologia del volumen XVII.ASPS	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	LUZ YANETH OCORÓ COORDINADORA	Correo electrónico	
202520004762	25/03/2025	Respuesta Oficio No. DC – 033-2025. Solicitud información estadística en los municipios del área de influencia del proyecto de la referencia. Radicado DANE No. 202520004762	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	DANE	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	25/03/2025	Entrega del informe Preliminar del Volumen III	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	LUCY HERNANDEZ DOMINGUEZ ESP. DISEÑO GEOMETRICO	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	25/03/2025	Entrega de la Metodologia del volumen XII. Estudio de Urbanismo y Paisajismo	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	YASIR VELASQUEZ PARRA ESP. URBANISMO	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	25/03/2025	Solicitud firma acta de reunión 10 de fecha 20-03-2025	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	INTERVENTORIA	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	26/03/2025	216-Entrega de volumenes I y II Finales de la fase II tramo 2 con sus anexos y planos-INFROMACION PRELIMINAR	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA GESTORA- INVIAS	Correo electrónico	Informacion en Drive
SIN NUMERACIÓN	28/03/2025	OFERTA COMERCIAL - UNI CHOCO - AUTODESK	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	28/03/2025	Concepto juridico pago de bonificaciones a docentes y administrativos	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	DIEGO ARMANDO VALENCIA MATALLANA Docente – Facultad de Derecho	Correo electrónico	Numero de documentos adjuntos 2
SIN NUMERACIÓN	31/03/2025	Propuesta para accesos al CDE y licencias de software a adquirir.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	MANAGER BIM	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	31/03/2025	Certificado de REDAM del Rector	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	RECTOR	Correo electrónico	
SIN NUMERACIÓN	31/03/2025	Entrega de la Metodologia del volumen XVI.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ	JULIO RICARDO SANABRIA BOTERO	Correo electrónico	

Ilustración 4.Control de correspondencias recibidas-2.

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO 4227 de 2024

CONTROL DE ACTAS

ACTA N°	FECHA DE REUNION	OBJETIVOS DE LA REUNION	DIRIGIDO A	PROYECTADO POR
1	15/03/2025	Contextualización del documento BEP y materialización de los volúmenes en la metodologia BIM	PROFESIONALES DEL GRUPO 1 Y MANAGER BIM	EDLY STELLA RENTERIA MENA
2	21/03/2025	Materializacion de volumenes y el BEP con especialistas de la Consultoria y Manager BIM	PROFESIONALES DE CONSULTORIA	EDLY STELLA RENTERIA MENA

Ilustración 5. Control de actas de consultoría.


ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO 4227 de 2024


CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

NÚMERO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	PROYECTADO POR	MEDIO DE ENTREGA	OBSERVACIONES
DC-061	3/03/2025	Solicitud de información sobre softwware, laboratorios y equipos a utilizar en el desarrollo del volumen correspondiente.	PROFESIONALES DE CONSULTORIA	LLECELI MOSQUERA TELLO	Correo electrónico	
SIN NUMERACION	3/03/2025	Apendice F. Gestion predial	PROFESIONALES DE CONSULTORIA VOLUMEN PREDIAL	LLECELI MOSQUERA TELLO	Correo electrónico	
DC-062	3/03/2025	Solicitud de modificacion de las clausulas decimo y decimo primero del contrato interadministrativo 4227-2024	SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO-INVIAS.	LUIS ALFREDO GIRALDO ALVARES RECTOR	Correo electrónico	
DC-063	3/03/2025	Compromiso de pago de seguridad social	SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO-INVIAS.	LUIS ALFREDO GIRALDO ALVARES RECTOR	Correo electrónico	
DC-064	4/03/2025	Entrega de hoja de vida profesional	INTERVENTORIA	EDLY STELLA RENTERIA MENA	Correo electrónico	
SIN NUMERACION	5/03/2025	Acta de costos del mes de febrero y semanal 13	INTERVENTORIA	JHOANA MARCELA PALACIOS MOSQUERA	Correo electrónico	
SIN NUMERACION	10/03/2025	Semanal 14 firmado	INTERVENTORIA	LLECELI MOSQUERA TELLO	Correo electrónico	
SIN NUMERACION	10/03/2025	Iniciativa PDE	PROFESIONALES DE CONSULTORIA VOLUMEN PREDIAL	LLECELI MOSQUERA TELLO	Correo electrónico	
DC-065	10/03/2025	Reiteración de alerta por incumplimiento contractual	RECTORIA	EDLY STELLA RENTERIA MENA	Correo físico	
DC-066	11/03/2025	Terminación de vinculación al proyecto	ELVIS FERNEY MOSQUERA TRELLES RECTORIA	EDLY STELLA RENTERIA MENA	Correo electrónico	
DC-067	12/03/2025	Nota aclaratoria del tiempode de vinculacion de profesionales de Grupi 1	RECTORIA	EDLY STELLA RENTERIA MENA	Correo físico	
DC-068	12/03/2025	Entrega de la Metodologia General	INTERVENTORIA	EDLY STELLA RENTERIA MENA	Correo electrónico	
SIN NUMERACION	13/03/2025	Entrega del acta 6, 7 y 8 firmadas.	INTERVENTORIA	LLECELI MOSQUERA TELLO	Correo electrónico	
SIN NUMERACION	18/03/2025	Entrega del acta 9 y 15 firmadas.	INTERVENTORIA	LLECELI MOSQUERA TELLO	Correo electrónico	
SIN NUMERACION	19/03/2025	Entrega de Metodología Volumen VI Estudio De Hidrogeología De Detalle, Volumen V Estudio De Geología Y Geomorfología Local y Volumen XIII Estudio De Redes Hidrosanitarias Y Secas	INTERVENTORIA	LLECELI MOSQUERA TELLO	Correo electrónico	
DC-069	19/03/2025	Aclaracion de perfil de pregrado Carlos Fernando Cadavid	INTERVENTORIA	EDLY STELLA RENTERIA MENA	Correo electrónico	
DC-070	19/03/2025	Aclaracion de perfil de pregrado Julio Ricardo Sanabria	INTERVENTORIA	EDLY STELLA RENTERIA MENA	Correo electrónico	
DC-071	19/03/2025	Entrega de Hoja de Vida de profesionales de Consultoria	INTERVENTORIA	EDLY STELLA RENTERIA MENA	Correo electrónico	
DC-072	19/03/2025	Entrega de Metodologías de los Volúmenes V, VI y XIII	INTERVENTORIA	EDLY STELLA RENTERIA MENA	Correo electrónico	
DC-073	21/03/2025	Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	LUZ STELLA MONTOYA DE TRUJILLO VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	JHOANA MARCELA PALACIOS MOSQUERA	Correo físico	
DC-074	21/03/2025	Entrega del Plan de Calidad	INTERVENTORIA	EDLY STELLA RENTERIA MENA	Correo electrónico	
DC-062	22/03/2025	Documentos firmados de solicitud de modificacion de las clausulas	YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA GESTORA-INVIAS			
SIN NUMERACION	25/03/2025	Entrega del SEMANASL 16	INTERVENTORIA	LLECELI MOSQUERA TELLO	Correo electrónico	
DC-075	25/03/2025	Entrega de Metodologias del Volumen XIV y XVII	INTERVENTORIA	EDLY STELLA RENTERIA MENA	Correo electrónico	
DC-076	25/03/2025	Entrega del BEP	INTERVENTORIA	EDLY STELLA RENTERIA MENA	Correo electrónico	
DC-077	25/03/2025	Entrega del Informe Preliminar del Volumen III	INTERVENTORIA	EDLY STELLA RENTERIA MENA	Correo electrónico	
SIN NUMERACION	27/03/2025	Entrega del acta 10 firmadas.	INTERVENTORIA	EDLY STELLA RENTERIA MENA	Correo electrónico	
DC-078		Entrega de Metodologías de los Volúmenes X y XII	INTERVENTORIA	EDLY STELLA RENTERIA MENA	Correo electrónico	
DC-079		Entrega de Metodología del Volúmenes	INTERVENTORIA	EDLY STELLA RENTERIA MENA	Correo electrónico	

Ilustración 6. Control de correspondencias enviadas.

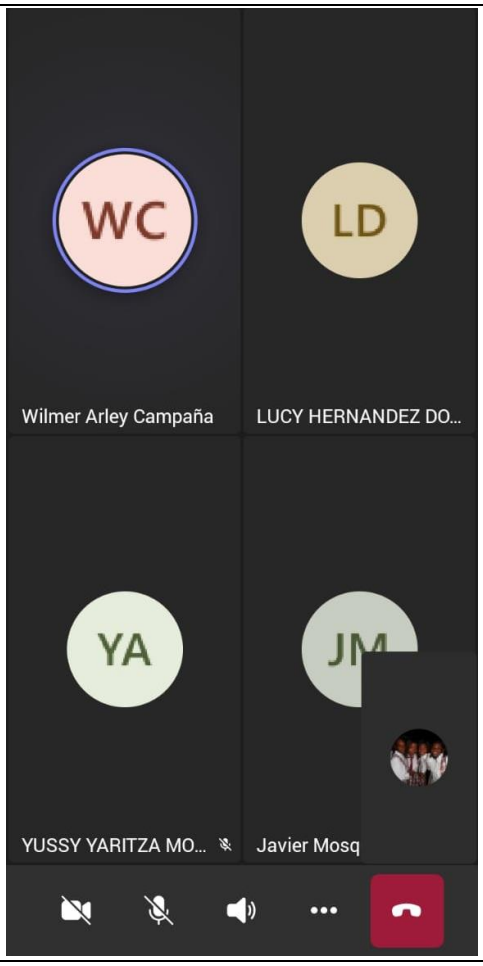


Secciones con los especialistas de los volumenes de Transito, Geometrico, Pavimento y el Manager BIM

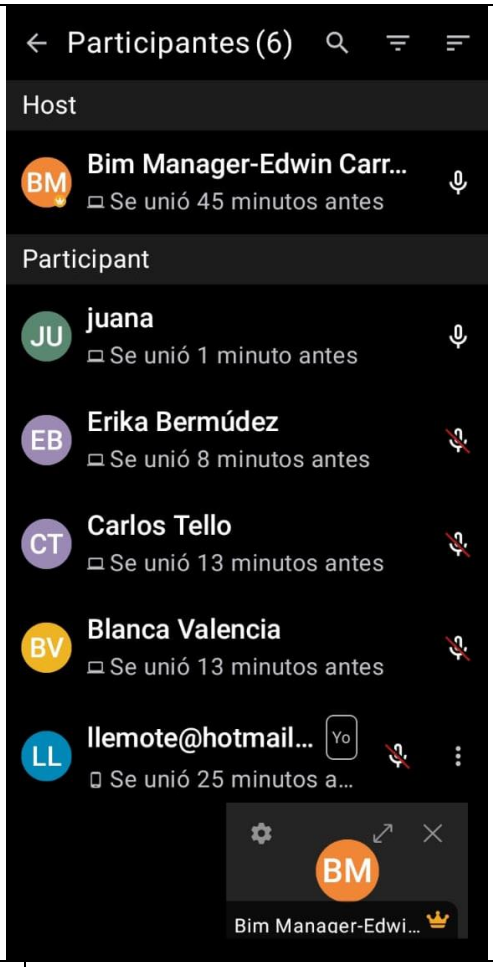


Secciones con los especialistas del volumen Predia y el Manager BIM



Participacion y apoyo en reunion con los especialostas de la consultoria

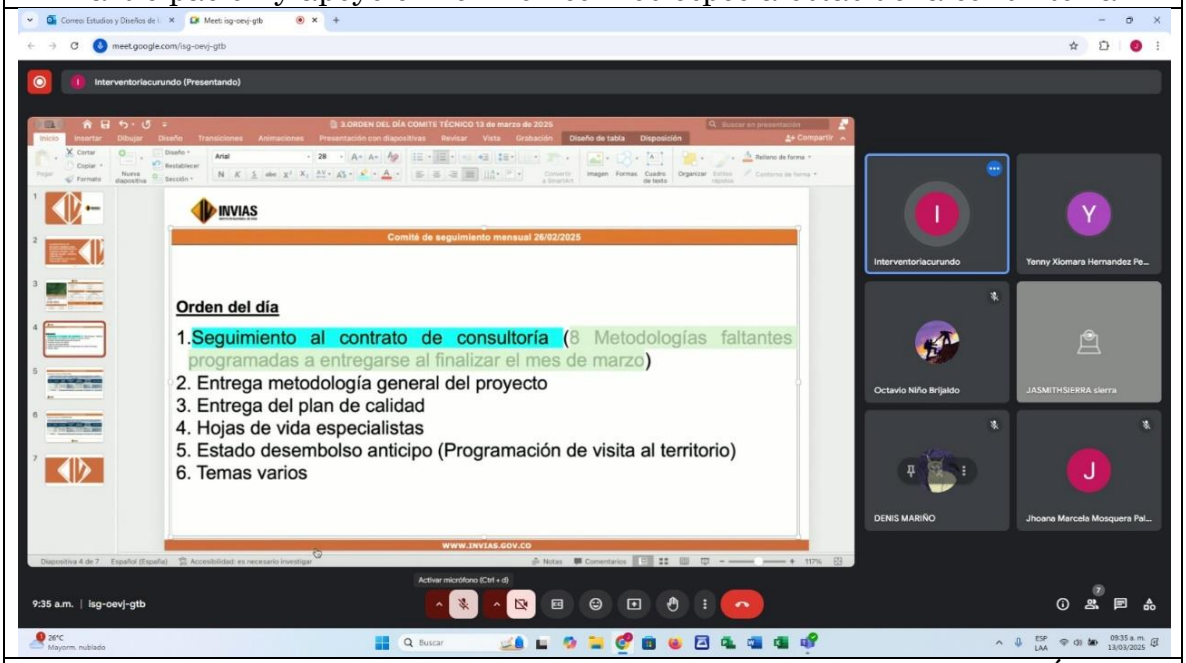

Reunion de comité mensual de la consultoria, interventoria e INVÍAS

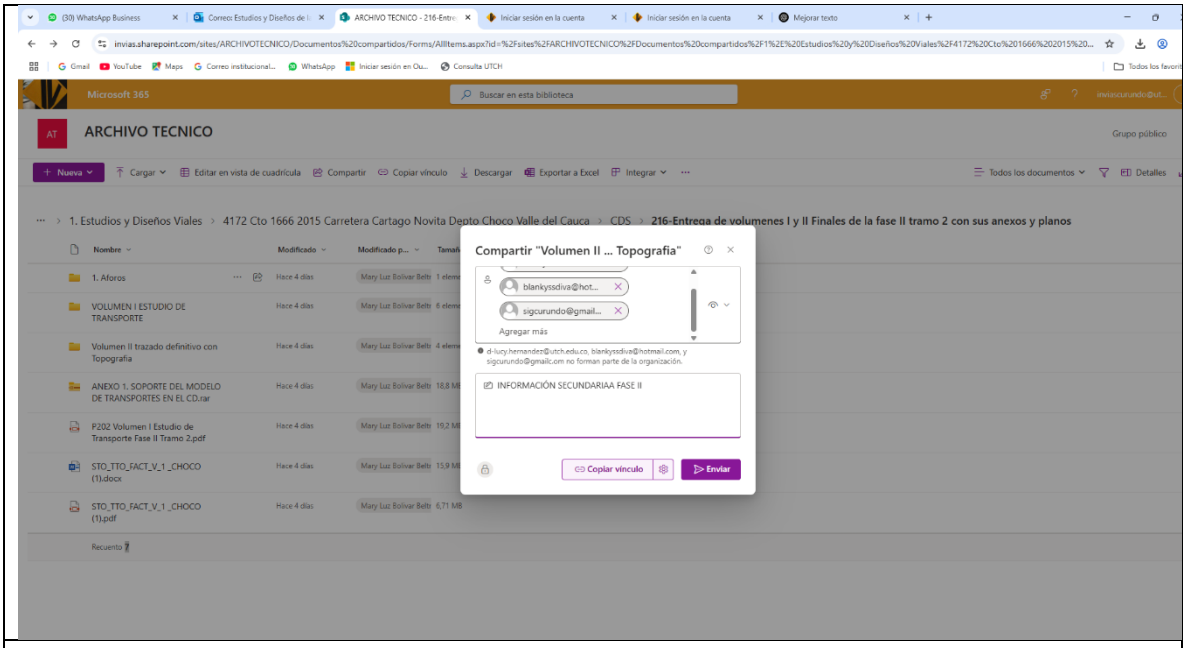

Revisión y entrega de información preliminar de la fase II a los profesionales de Consultoría

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077463135		MOSQUERA TELLO LLECELI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 33 #5-10	QUIBDO-CHOCO	3197244152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1399941988	9484507805	I	2025/04/08	2025/04/09	BANCOLOMBIA	1	$678,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1077463135	MOSQUERA TELLO LLECELI		X																230301	30	EPS041	30		0	14-23	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077463135		MOSQUERA TELLO LLECELI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 33 #5-10	QUIBDO-CHOCO	3197244152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1399941988	9484507805	I	2025/04/08	2025/04/09	BANCOLOMBIA	1	$678,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$373,500	$300	$0	$373,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$373,500	$300	$0	$373,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$100	$0	$12,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,200	$100	$0	$12,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$291,800	$200	$0	$292,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$291,800	$200	$0	$292,000
TOTAL				**1**	**$677,500**	**$600**	**$0**	**$678,100**

Tunja, 04 de abril de 2025

C4262-048-2025

Ing. Edly Stella Rentería Mena.
Directora de consultoría.
Contrato interadministrativo No 4227 de 2024
Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba
Tunja / Boyacá.

Ref.: Contrato Interadministrativo No 4227 de 2024, "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Aprobación Metodología VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL

Por medio del presente y una vez adelantada la revisión detallada del documento METODOLOGÍA VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL esta interventoría se permite informar que aprueba el documento METODOLOGÍA VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL del contrato de consultoría referencia del presente oficio, no obstante, se informa al consultor que este documento denominado metodología deberá ser ajustado según sea el caso en razón al desarrollo del proyecto

"El documento a presentar por el consultor debe cumplir a cabalidad lo estipulado en el contrato de consultoría No 4227 de 2024 el cual señala en la *"CLAUSULA 2: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO – (…) EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. (…)*

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Tunja, 04 de abril de 2025

C4262-049-2025

Ing. Edly Stella Rentería Mena.
Directora de consultoría.
Contrato interadministrativo No 4227 de 2024
Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba
Tunja / Boyacá.

Ref.: Contrato Interadministrativo No 4227 de 2024, "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Aprobación Metodología VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE

Por medio del presente y una vez adelantada la revisión detallada del documento METODOLOGÍA VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE esta interventoría se permite informar que aprueba el documento METODOLOGÍA VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE del contrato de consultoría referencia del presente oficio, no obstante, se informa al consultor que este documento denominado metodología deberá ser ajustado según sea el caso en razón al desarrollo del proyecto

"El documento a presentar por el consultor debe cumplir a cabalidad lo estipulado en el contrato de consultoría No 4227 de 2024 el cual señala en la *"CLAUSULA 2: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO – (…) EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. (…)*

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Tunja, 04 de abril de 2025

C4262-050-2025

Ing. Edly Stella Rentería Mena.
Directora de consultoría.
Contrato interadministrativo No 4227 de 2024
Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba
Tunja / Boyacá.

Ref.: Contrato Interadministrativo No 4227 de 2024, "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Aprobación Metodología VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS

Por medio del presente y una vez adelantada la revisión detallada del documento METODOLOGÍA VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS esta interventoría se permite informar que aprueba el documento METODOLOGÍA VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS del contrato de consultoría referencia del presente oficio, no obstante, se informa al consultor que este documento denominado metodología deberá ser ajustado según sea el caso en razón al desarrollo del proyecto

"El documento a presentar por el consultor debe cumplir a cabalidad lo estipulado en el contrato de consultoría No 4227 de 2024 el cual señala en la *"CLAUSULA 2: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO – (…) EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. (…)*

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Tunja, 04 de abril de 2025

C4262-051-2025

Ing. Edly Stella Rentería Mena.
Directora de consultoría.
Contrato interadministrativo No 4227 de 2024
Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba
Tunja / Boyacá.

Ref.: Contrato Interadministrativo No 4227 de 2024, "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Aprobación Metodología VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO

Por medio del presente y una vez adelantada la revisión detallada del documento METODOLOGÍA VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO esta interventoría se permite informar que aprueba el documento METODOLOGÍA VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO del contrato de consultoría referencia del presente oficio, no obstante, se informa al consultor que este documento denominado metodología deberá ser ajustado según sea el caso en razón al desarrollo del proyecto

"El documento a presentar por el consultor debe cumplir a cabalidad lo estipulado en el contrato de consultoría No 4227 de 2024 el cual señala en la *"CLAUSULA 2: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO – (…) EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. (…)*

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Tunja, 04 de abril de 2025

C4262-052-2025

Ing. Edly Stella Rentería Mena.
Directora de consultoría.
Contrato interadministrativo No 4227 de 2024
Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba
Tunja / Boyacá.

Ref.: Contrato Interadministrativo No 4227 de 2024, "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Aprobación Metodología VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS

Por medio del presente y una vez adelantada la revisión detallada del documento METODOLOGÍA VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS esta interventoría se permite informar que aprueba el documento METODOLOGÍA VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS contrato de consultoría referencia del presente oficio, no obstante, se informa al consultor que este documento denominado metodología deberá ser ajustado según sea el caso en razón al desarrollo del proyecto

"El documento a presentar por el consultor debe cumplir a cabalidad lo estipulado en el contrato de consultoría No 4227 de 2024 el cual señala en la *"CLAUSULA 2: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO – (…) EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. (…)*

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Tunja, 04 de abril de 2025

C4262-053-2025

Ing. Edly Stella Rentería Mena.
Directora de consultoría.
Contrato interadministrativo No 4227 de 2024
Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba
Tunja / Boyacá.

Ref.: Contrato Interadministrativo No 4227 de 2024, "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Aprobación Metodología VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS

Por medio del presente y una vez adelantada la revisión detallada del documento METODOLOGÍA VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS esta interventoría se permite informar que aprueba el documento METODOLOGÍA VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS contrato de consultoría referencia del presente oficio, no obstante, se informa al consultor que este documento denominado metodología deberá ser ajustado según sea el caso en razón al desarrollo del proyecto

"El documento a presentar por el consultor debe cumplir a cabalidad lo estipulado en el contrato de consultoría No 4227 de 2024 el cual señala en la *"CLAUSULA 2: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO – (…) EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. (…)*

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Tunja, 04 de abril de 2025

C4262-054-2025

Ing. Edly Stella Rentería Mena.
Directora de consultoría.
Contrato interadministrativo No 4227 de 2024
Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba
Tunja / Boyacá.

Ref.: Contrato Interadministrativo No 4227 de 2024, "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Aprobación Metodología VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

Por medio del presente y una vez adelantada la revisión detallada del documento METODOLOGÍA VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO esta interventoría se permite informar que aprueba el documento METODOLOGÍA VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO contrato de consultoría referencia del presente oficio, no obstante, se informa al consultor que este documento denominado metodología deberá ser ajustado según sea el caso en razón al desarrollo del proyecto

"El documento a presentar por el consultor debe cumplir a cabalidad lo estipulado en el contrato de consultoría No 4227 de 2024 el cual señala en la *"CLAUSULA 2: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO – (…) EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. (…)*

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Tunja, 04 de abril de 2025

C4262-055-2025

Ing. Edly Stella Rentería Mena.
Directora de consultoría.
Contrato interadministrativo No 4227 de 2024
Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba
Tunja / Boyacá.

Ref.: Contrato Interadministrativo No 4227 de 2024, "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Aprobación Metodología VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD

Por medio del presente y una vez adelantada la revisión detallada del documento METODOLOGÍA VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD esta interventoría se permite informar que aprueba el documento METODOLOGÍA VOLUMEN XVII. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD PROYECTO contrato de consultoría referencia del presente oficio, no obstante, se informa al consultor que este documento denominado metodología deberá ser ajustado según sea el caso en razón al desarrollo del proyecto

"El documento a presentar por el consultor debe cumplir a cabalidad lo estipulado en el contrato de consultoría No 4227 de 2024 el cual señala en la *"CLAUSULA 2: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO – (…) EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. (…)*

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Tunja, 04 de abril de 2025

C4262-056-2025

Ing. Edly Stella Rentería Mena.
Directora de consultoría.
Contrato interadministrativo No 4227 de 2024
Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba
Tunja / Boyacá.

Ref.: Contrato Interadministrativo No 4227 de 2024, "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA"

Asunto: Aprobación Informe Preliminar VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO

Por medio del presente y una vez adelantada la revisión detallada del documento Informe Preliminar VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO esta interventoría se permite informar que aprueba el documento Informe Preliminar VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO contrato de consultoría referencia del presente oficio, no obstante, se informa al consultor que este documento denominado informe preliminar deberá ser ajustado según sea el caso en razón al desarrollo del proyecto

"El documento a presentar por el consultor debe cumplir a cabalidad lo estipulado en el contrato de consultoría No 4227 de 2024 el cual señala en la *"CLAUSULA 2: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO – (…) EL CONSULTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo técnico, estudio y documentos previos de la Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. (…)*

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Contrato Interadministrativo No 4262 de 2024

VIGILADA MINEDUCACIÓN

CUENTA DE COBRO No.002-2025

EL CONTRATO NO.4227 DE 2024 QUE TIENE COMO OBJETO ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINTIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSE DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA - INVIAS

DEBE A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO "DIEGO LUIS CORDOBA" NIT: 891.680.089-4

LA SUMA DE: UN MILLON CIEN MIL PESOS ($1.100.000) M/CTE.

POR CONCEPTO DE: Alquiler de la oficina del proyecto Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto), del contrato de consultoría No. 4227 de 2024, correspondiente al mes de MARZO de 2025.

FECHA: Abril 11 de 2025

MERLEN MARIA DIAZ ARRIAGA
Jefa Financiera

Datos de la cuenta para consignación:

ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	NOMBRE CTA	No. CUENTA
Banco Avvillas	Ahorros	Fiduagraria EF UTCH Rentas Propias -Libre Destinación	530-11442-0

Favor enviar comprobante de pago a email: financiera@utch.edu.co

Elaboró :Sara Chamat Cargo: Profesional Esp Fecha: Abril 11 de 2025	Revisó Merlen M.Diaz Arriaga Cargo: Jefa Financiera Fecha: Abril 11 de 2025	Aprobó: Luz Stella Montoya de T., Cargo: Vicerectora Adm y Financiera Fecha: Abril 11 de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

ACTA No: 1

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
- POR PRÓRROGA ☑
- POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 de 2024

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ - DIEGO LUIS CÓRDOBA
INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024

PLAZO INICIAL: 1mes (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 8,700,000,000.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8,700,000,000.00

PLAZO ACUMULADO: 1 mes (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.				MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.__1___ de fecha ___diciembre de 2024			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
	1	**GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**																	
	1	Director de Consultoria	$ 10,240,000.00	$ -	2.00	$ 20,480,000.00	-	-		$ -	+	11.0	$ 112,640,000.00		1.00	$ 10,240,000.00	13.00	$ 133,120,000.00	
	1	Ingeniero residente de Estudios	$ 5,850,000.00	$ -	2.00	$ 11,700,000.00	-	-		$ -	+	11.0	$ 64,350,000.00		1.00	$ 5,850,000.00	13.00	$ 76,050,000.00	
	1	Ingeniero residente de Campo	$ 5,850,000.00	$ -	2.00	$ 11,700,000.00				$ -	+	5.5	$ 32,175,000.00			$ -	7.50	$ 43,875,000.00	
	1	Coordinador ambiental y social	$ 8,045,000.00	$ -	2.00	$ 16,090,000.00	-	-		$ -	+	11.0	$ 88,495,000.00		1.00	$ 8,045,000.00	13.00	$ 104,585,000.00	
	1	Coordinador técnico	$ 8,045,000.00	$ -	2.00	$ 16,090,000.00	-	-		$ -	+	11.0	$ 88,495,000.00		1.00	$ 8,045,000.00	13.00	$ 104,585,000.00	
	1	Coordinador BIM SIG	$ 8,045,000.00	$ -	2.00	$ 16,090,000.00	-	-		$ -	+	5.5	$ 44,247,500.00		0.50	$ 4,022,500.00	7.50	$ 60,337,500.00	
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3,890,000.00	$ -	2.00	$ 7,780,000.00	-	-		$ -	+	11.0	$ 42,790,000.00		1.00	$ 3,890,000.00	13.00	$ 50,570,000.00	
	1	Técnico de la zona	$ 3,070,000.00	$ -	2.00	$ 6,140,000.00	-	-		$ -	+	5.5	$ 16,885,000.00			$ -	7.50	$ 23,025,000.00	
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 106,070,000.00**				**$ -**			**$ 490,077,500.00**			**$ 40,092,500.00**		**$ 596,147,500.00**	
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.4			2.40			2.40		2.40	
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 254,568,000.00**				**$ -**			**$ 1,176,186,000.00**			**$ 96,222,000.00**		**$ 1,430,754,000.00**	

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO		VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO		VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO		VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO		VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO %		VALOR
				Und	%				Und	%			Und	%							
		% DE PAGO SOBRE EL VALOR DEL VOLUMEN																			
1	1	**VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS**				**$ 69,000,000.00**	-	-	-		**$ -**				**$ -**			**$ -**			**$ 69,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 69,000,000.00	1	5.00%	$ 3,450,000.00	-	-												5.00%	$ 3,450,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 41,400,000.00	-	-												60.00%	$ 41,400,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 24,150,000.00	-	-												35.00%	$ 24,150,000.00
2	1	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRÁNSITO,**	$ 60,000,000.00			**$ 60,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 60,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL		1	5.00%	$ 3,000,000.00	-	-												5.00%	$ 3,000,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 36,000,000.00	-	-												60.00%	$ 36,000,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 21,000,000.00	-	-												35.00%	$ 21,000,000.00
3	1	**VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO**	$ 165,000,000.00			**$ 165,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 165,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL		1	5.00%	$ 8,250,000.00	-	-												5.00%	$ 8,250,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 99,000,000.00	-	-												60.00%	$ 99,000,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 57,750,000.00	-	-												35.00%	$ 57,750,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

ACTA No: 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 de 2024

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ - DIEGO LUIS CÓRDOBA
INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024

PLAZO INICIAL: 1mes (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 8,700,000,000.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8,700,000,000.00

PLAZO ACUMULADO: 1 mes (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

4	1	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL**					**$ 42,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 42,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 42,000,000.00	1	5.00%	$ 2,100,000.00	-	-												5.00%	$ 2,100,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 25,200,000.00	-	-												60.00%	$ 25,200,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 14,700,000.00	-	-												35.00%	$ 14,700,000.00
5	1	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL**					**$ 106,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 106,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 106,000,000.00	1	5.00%	$ 5,300,000.00	-	-												5.00%	$ 5,300,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 63,600,000.00	-	-												60.00%	$ 63,600,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 37,100,000.00	-	-												35.00%	$ 37,100,000.00
6	1	**VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE**					**$ 125,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 125,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 125,000,000.00	1	5.00%	$ 6,250,000.00	-	-												5.00%	$ 6,250,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 75,000,000.00	-	-												60.00%	$ 75,000,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 43,750,000.00	-	-												35.00%	$ 43,750,000.00
7	1	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES**					**$ 368,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 368,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 368,000,000.00	1	5.00%	$ 18,400,000.00	-	-									-			5.00%	$ 18,400,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 220,800,000.00	-	-									-			60.00%	$ 220,800,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 128,800,000.00	-	-									-			35.00%	$ 128,800,000.00
8	1	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS**					**$ 235,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 235,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 235,000,000.00	1	5.00%	$ 11,750,000.00	-	-									-			5.00%	$ 11,750,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 141,000,000.00	-	-									-			60.00%	$ 141,000,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 82,250,000.00	-	-									-			35.00%	$ 82,250,000.00
9	1	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN**					**$ 190,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 190,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 190,000,000.00	1	5.00%	$ 9,500,000.00	-	-									-			5.00%	$ 9,500,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 114,000,000.00	-	-									-			60.00%	$ 114,000,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 66,500,000.00	-	-									-			35.00%	$ 66,500,000.00
10	1	**VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS**					**$ 73,000,000.00**	-	-										**$ -**			**$ 73,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 73,000,000.00	1	5.00%	$ 3,650,000.00	-	-									-			5.00%	$ 3,650,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 43,800,000.00	-	-									-			60.00%	$ 43,800,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 25,550,000.00	-	-									-			35.00%	$ 25,550,000.00
11	1	**VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS**					**$ 481,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 481,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 481,000,000.00	1	5.00%	$ 24,050,000.00	-	-									-			5.00%	$ 24,050,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 288,600,000.00	-	-									-			60.00%	$ 288,600,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 168,350,000.00	-	-									-			35.00%	$ 168,350,000.00
12	1	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO**					**$ 57,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 57,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 57,000,000.00	1	5.00%	$ 2,850,000.00	-	-									-			5.00%	$ 2,850,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 34,200,000.00	-	-									-			60.00%	$ 34,200,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 19,950,000.00	-	-									-			35.00%	$ 19,950,000.00
13	1	**VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS**					**$ 47,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 47,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 47,000,000.00	1	5.00%	$ 2,350,000.00	-	-									-			5.00%	$ 2,350,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 28,200,000.00	-	-									-			60.00%	$ 28,200,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 16,450,000.00	-	-									-			35.00%	$ 16,450,000.00
14	1	**VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS**					**$ 93,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 93,000,000.00**
		METODOLOGIA GENERAL	$ 93,000,000.00	1	5.00%	$ 4,650,000.00	-	-									-			5.00%	$ 4,650,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR		1	60.00%	$ 55,800,000.00	-	-									-			60.00%	$ 55,800,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 32,550,000.00	-	-									-			35.00%	$ 32,550,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

ACTA No: 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 de 2024

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ - DIEGO LUIS CÓRDOBA
INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024

PLAZO INICIAL: 1mes (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 8,700,000,000.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8,700,000,000.00

PLAZO ACUMULADO: 1 mes (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

15	1	**VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES**				**$ 56,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 56,000,000.00**
		METODOLOGÍA GENERAL		1	5.00%	$ 2,800,000.00	-	-								-				5.00%	$ 2,800,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR	$ 56,000,000.00	1	60.00%	$ 33,600,000.00	-	-								-				60.00%	$ 33,600,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 19,600,000.00	-	-								-				35.00%	$ 19,600,000.00
16	1	**VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO**				**$ 54,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 54,000,000.00**
		METODOLOGÍA GENERAL		1	5.00%	$ 2,700,000.00	-	-								-				5.00%	$ 2,700,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR	$ 54,000,000.00	1	60.00%	$ 32,400,000.00	-	-								-				60.00%	$ 32,400,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 18,900,000.00	-	-								-				35.00%	$ 18,900,000.00
17	1	**VOLUMEN XVII. AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD**				**$ 423,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 423,000,000.00**
		METODOLOGÍA GENERAL		1	5.00%	$ 21,150,000.00	-	-								-				5.00%	$ 21,150,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR	$ 423,000,000.00	1	60.00%	$ 253,800,000.00	-	-								-				60.00%	$ 253,800,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 148,050,000.00	-	-								-				35.00%	$ 148,050,000.00
		VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TECNICO BIM				**$ 46,000,000.00**	-	-							**$ -**			**$ -**			**$ 46,000,000.00**
18	1	METODOLOGÍA GENERAL		1	5.00%	$ 2,300,000.00	-	-								-				5.00%	$ 2,300,000.00
		ENTREGA PRELIMINAR	$ 46,000,000.00	1	60.00%	$ 27,600,000.00	-	-								-				60.00%	$ 27,600,000.00
		ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA		1	35.00%	$ 16,100,000.00	-	-								-				35.00%	$ 16,100,000.00
		INFORME FINAL EJECUTIVO				**$ -**	-	-	-		**$ -**				**$ -**			**$ -**			**$ -**
19	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ -	%	100.00%	$ -	-	-	-		-										
		TOTAL COSTOS DE VOLÚMENES (B)				**$ 2,690,000,000.00**					**$ -**							**$ -**			**$ 2,690,000,000.00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO		VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																
	1	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 300,000	Día	72.00	21,600,000.00	-	-								72.00		$ 21,600,000.00
	1	Viáticos Especialistas y Otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 300,000	Día	520.00	156,000,000.00	-	-								520.00		$ 156,000,000.00
	1	Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 800,000	Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.)	12.00	9,600,000.00	-	-								12.00		$ 9,600,000.00
	1	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 800,000	Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.)	26.00	20,800,000.00	-	-								26.00		$ 20,800,000.00
	1	Adquisición de información secundaria (fotografia aérea, planchas catastrales, Registro 1 y 2 del IGAC, implica tota la información jurídica que se requiera) S/Comprobante Pago	$ 15,000,000	Km	1.00	15,000,000.00	-	-								1.00		$ 15,000,000.00
	1	Levantamiento Topografico y Materialización del Eje (Incluye personal, equipos, transporte)	$ 2,200,000	Ha	51.00	112,200,000.00	-	-								51.00		$ 112,200,000.00
	1	Levantamiento topográfico detallado (incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte)	$ 1,800,000	Par de puntos	60.00	108,000,000.00	-	-								60.00		$ 108,000,000.00
	1	Georeferenciación (incluye par de puntos con gps de precisión milimétrica materializdos en campo con mojones en concreto y plantina de bronce, estimando ubicar en cada punto un par de mojones de concreto). incluye equipo, material, transportes y personal.	$ 1,200,000	Mes	26.00	31,200,000.00	-	-								26.00		$ 31,200,000.00
	1	Alquiler de Vehiculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 10,000,000	Mes	7.50	75,000,000.00	-	-								7.50		$ 75,000,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

ACTA No: 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 de 2024

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ - DIEGO LUIS CÓRDOBA
INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024

PLAZO INICIAL: 1mes (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 8,700,000,000.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8,700,000,000.00

PLAZO ACUMULADO: 1 mes (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

	1	Alquiler de Vehículo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 10,000,000	Mes	7.50	75,000,000.00	-	-									7.50		$ 75,000,000.00
	1	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	$ 1,100,000	Mes	7.50	8,250,000.00	-	-									7.50		$ 8,250,000.00
	1	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	$ 1,100,000	Un	15.00	16,500,000.00	-	-									15.00		$ 16,500,000.00
	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	$ 220,000	Ml	25.00	5,500,000.00	-	-									25.00		$ 5,500,000.00
	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	$ 270,000	Global	2,870.00	774,900,000.00	-	-									2,870.00		$ 774,900,000.00
	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	$ 351,000	Global	1,230.00	431,730,000.00	-	-									1,230.00		$ 431,730,000.00
	1	Ensayos de Laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural de puentes, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica, asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, batimetrías, entre otros)	$ 1,629,346,000	Global	1.00	1,629,346,000.00	-	-									1.00		$ 1,629,346,000.00
	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y dos copias en archivos magnéticos)	$ 150,000,000	Global	1.00	$ 150,000,000											1.00		$ 150,000,000.00
	1	Estudios complementarios (Aprobados por la Interventoria)	$ 1,184,806,000	Global	1.00	$ 1,184,806,000					-	-0.99	$ (1,176,186,000.00)				0.01		$ 8,620,000.00
	1	Toma de información de Tránsito	$ 30,000,000	Global	1.00	$ 30,000,000											1.00		$ 30,000,000.00
	1	Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de sostenibilidad (s/comprobante) (adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, costos de gestiones arqueológicas, monitoreo, muestreos ambientales etc.)	$ 900,000,000	Global (S/comprobante)	1.00	900,000,000.00	-	-									1.00		$ 900,000,000.00
		Ajuste al peso y/o valor remanente																	
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (C)				**$ 5,755,432,000.00**				$ -			**$ (1,176,186,000.00)**			**$ -**			**$ 4,579,246,000.00**
		* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				8,700,000,000.00				0.00			0.00			96,222,000.00			$ 8,700,000,000.00
		* IVA (G) = (F) * (19% IVA)				0.00				$ -									$ -
		* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				8,700,000,000.00				0.00			0.00			96,222,000.00			$ 8,700,000,000.00
		*																	
		* Costo Total = (F) + (G)				**8,700,000,000.00**				**0.00**			**$ -**			**$ 96,222,000.00**			**$ 8,700,000,000.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 8,700,000,000.00		$ 8,700,000,000.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 96,222,000.00		$ 96,222,000.00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -		$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 8,603,778,000.00		$ 8,603,778,000.00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	1.0
ADICIONAL	12.00
ACUMULADO	13.00
FALTANTE	12.00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Prorroga No 1 del contrato de consultoria por 12 meses desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2025.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: Sally Cretia Renteria Mena
Directora de consultoria
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: Jose Octavio Niño Brijaldo
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC BYC

Firma:
Nombre: Jannier Salas Quejada
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Revisión:
Director Territorial — Nombre: Jannier Salas Quejada — Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT — Firma (Suscribe según su competencia)

Ordenador del pago — Nombre: Sirley Dabeiba Merchán Carreño — Matrícula Profesional No.: 011131-0666 CPITVC — Firma (Suscribe según su competencia)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: Darbin Antonio Mosquera M. — Matrícula Profesional No.: 25202125013 CND — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO			MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN			1
		PÁGINA			
		FECHA			02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4227 de 2024
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

JUSTIFICACIÓN:
Del Registro Presupuestal No. 1124124 de fecha 2024-11-14 Valor $8.700.000.000,00 para un valor total de anticipo de $ 4.350.000.000 equivalente al 50% como se estipula en la cláusula septima "Forma de pago" del contrato interadminsitrativo No 4227 de 2024.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago de salarios personal consultoria	96,222,000.00	96,222,000.00	176,130,000.00	181,130,000.00	130,130,000.00	117,630,000.00	$ 797,464,000.00	18.33%
2	Viaticos personal de consultoria	6,400,000.00	37,850,000.00	37,850,000.00	37,850,000.00	37,850,000.00	3,750,000.00	$ 161,550,000.00	3.71%
3	Adquisición de información secundaria		15,000,000.00					$ 15,000,000.00	0.34%
4	Levantamiento topografico		30,000,000.00	50,200,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	$ 220,200,000.00	5.06%
5	Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de sostenibilidad (s/comprobante) (adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, costos de gestiones arqueológicas, monitoreo, muestreos ambientales etc.)		80,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	$ 680,000,000.00	15.63%
6	Toma de muestras para laboratorio(en suelo, en roca, Apiques) y ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural de puentes, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, batimetrías, entre otros)		1,136,590,400.00	304,647,600.00	305,047,600.00	307,547,600.00	329,852,800.00	$ 2,383,686,000.00	54.80%
7	Toma de información de transito		15,000,000.00	15,000,000.00				$ 30,000,000.00	0.69%
8	Dotacion de oficina (compra de computadores y softwares)		50,000,000.00					$ 50,000,000.00	1.15%
9	Campamento	1,100,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	$ 12,100,000.00	0.28%
	TOTAL	**$ 103,722,000.00**	**$ 1,462,862,400.00**	**$ 686,027,600.00**	**$ 776,227,600.00**	**$ 727,727,600.00**	**$ 593,432,800.00**	**$ 4,350,000,000.00**	**100%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: Edly Stella Rentería Mena
Directora de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: José Octavio Niño Brijaldo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4227 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1.095 (En meses segun contrato principa)

PLAZO ACUMULADO: 37 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CON 02/12/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) $ 8,700,000,000.00 (Según contrato principal)

,OR ADICIONES (Incluido IVA) $

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) $ 8,700,000,000.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ajustado / % Ejecutado	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
	VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos															
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 254,568,000.00	2.93%	2.21%	% P	1.16%	1.24%	1.34%	1.34%	1.68%	1.34%	1.68%	1.34%	1.14%	1.16%	0.93%	0.93%	1.16%	
	$ 1,430,754,000.00	16.45%	$ 192,444,000.00	$ P	$ 100,774,210.53	$ 107,902,723.26	$ 116,997,174.87	$ 116,997,174.87	$ 146,246,468.59	$ 116,997,174.87	$ 146,246,468.59	$ 116,997,174.87	$ 99,805,271.65	$ 100,774,210.53	$ 80,619,368.42	$ 80,619,368.42	$ 100,774,210.53	
				$ E	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	1.11%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.11%	
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES																		
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	$ 69,000,000.00	0.79%	0.00%	% P	0.04%	0.48%	0.00%	0.00%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 69,000,000.00	0.79%	$ -	$ P	$ -	$ 3,450,000.00	$ 41,400,000.00	$ -	$ 24,150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO	$ 60,000,000.00	0.69%	0.00%	% P	0.00%	0.41%	0.00%	0.00%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 60,000,000.00	0.69%	$ -	$ P	$ -	$ 3,000,000.00	$ 36,000,000.00	$ -	$ 21,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 165,000,000.00	1.90%	0.00%	% P	0.00%	1.14%	0.00%	0.00%	0.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 165,000,000.00	1.90%	$ -	$ P	$ -	$ 6,250,000.00	$ 99,000,000.00	$ -	$ 57,750,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 42,000,000.00	0.48%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.31%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 42,000,000.00	0.48%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,300,000.00	$ -	$ 14,700,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	$ 106,000,000.00	1.22%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%	0.00%	0.00%	
	$ 106,000,000.00	1.22%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,300,000.00	$ -	$ -	$ 53,000,000.00	$ -	$ -	$ 37,100,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	$ 125,000,000.00	1.44%	0.00%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 125,000,000.00	1.44%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,250,000.00	$ -	$ -	$ 75,000,000.00	$ -	$ -	$ 43,750,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	$ 368,000,000.00	4.23%	0.00%	% P	0.00%	0.21%	0.00%	0.00%	2.54%	0.00%	1.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$ 368,000,000.00	4.23%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ 18,400,000.00	$ -	$ 220,800,000.00	$ -	$ 129,200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	$ 235,000,000.00	2.70%	0.00%	% P														
	$ 235,000,000.00	2.70%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,750,000.00	$ 141,000,000.00	$ -	$ 82,250,000.00	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	$ 190,000,000.00	2.18%	0.00%	% P														
	$ 190,000,000.00	2.18%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,500,000.00	$ 114,000,000.00	$ -	$ 66,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 73,000,000.00	0.84%	0.00%	% P														
	$ 73,000,000.00	0.84%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,650,000.00	$ 43,800,000.00	$ -	$ 25,550,000.00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 481,000,000.00	5.53%	0.00%	% P														
	$ 481,000,000.00	5.53%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24,050,000.00	$ -	$ -	$ 288,600,000.00	$ -	$ -	$ 168,350,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 57,000,000.00	0.66%	0.00%	% P														
	$ 57,000,000.00	0.66%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,850,000.00	$ 34,200,000.00	$ 19,950,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	$ 47,000,000.00	0.54%	0.00%	% P														
	$ 47,000,000.00	0.54%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,350,000.00	$ 28,200,000.00	$ 16,450,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE RIESGOS	$ 93,000,000.00	1.07%	0.00%	% P														
	$ 93,000,000.00	1.07%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,650,000.00	$ -	$ -	$ 55,800,000.00	$ -	$ -	$ 32,550,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 56,000,000.00	0.64%	0.00%	% P														
	$ 56,000,000.00	0.64%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,800,000.00	$ 33,600,000.00	$ -	$ 19,600,000.00	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	$ 54,000,000.00	0.62%	0.00%	% P														
	$ 54,000,000.00	0.62%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ 2,700,000.00	$ -	$ 32,400,000.00	$ -	$ -	$ 18,900,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 423,000,000.00	4.86%	0.00%	% P	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.47%	
	$ 423,000,000.00	4.86%	$ -	$ P	$ 21,150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 253,980,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 148,050,000.00	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
VOLUMEN TECNICO BIM	$ 46,000,000.00	0.53%	0.00%	% P														
	$ 46,000,000.00	0.53%	$ -	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,300,000.00	$ -	$ -	$ 27,600,000.00	$ -	$ 16,100,000.00	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E														
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 5,755,432,000.00	66.15%	0.00%	% P	0.46%	1.14%	8.95%	10.48%	8.18%	5.57%	5.85%	1.15%	1.04%	1.13%	0.92%	1.70%	2.09%	
	$ 4,579,246,000.00	52.64%	$ -	$ P	$ 39,797,368.42	$ 447,252,894.74	$ 778,748,061.40	$ 909,610,076.75	$ 711,748,061.40	$ 484,473,686.40	$ 509,789,451.75	$ 100,357,894.74	$ 90,607,894.74	$ 98,347,368.42	$ 80,357,894.74	$ 147,474,561.40	$ 181,680,701.75	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
VALOR BÁSICO DE consultoría (A)	$ 8,700,000,000.00	100.00%	2.21%															
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO (A')	$ 8,700,000,000.00	100.00%	$ 192,444,000.00															

REPROGRAMACIÓN

		DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA MES	%	1.62%	6.79%	12.54%	11.80%	14.03%	6.91%	9.18%	7.01%	2.18%	2.29%	2.78%	2.62%	4.95%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 140,571,578.95	$ 591,005,701.35	$ 1,093,245,236.27	$ 1,026,607,251.62	$ 1,298,344,529.99	$ 780,170,861.27	$ 846,685,920.34	$ 1,180,555,089.61	$ 220,866,166.39	$ 327,971,578.95	$ 492,427,263.16	$ 253,643,929.82	$ 450,104,912.28	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1.62%	8.41%	20.97%	32.78%	47.68%	54.64%	63.38%	70.34%	72.48%	74.25%	77.01%	79.63%	84.63%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 140,571,578.95	$ 731,577,280.30	$ 1,824,822,516.57	$ 2,851,429,768.19	$ 4,147,774,298.18	$ 4,927,945,159.45	$ 5,774,631,079.79	$ 6,955,186,149.40	$ 7,175,052,315.79	$ 7,503,023,894.74	$ 7,996,251,157.90	$ 8,249,895,087.72	$ 8,700,000,000.00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA MES	%	1.11%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	%	1.11%	2.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96,222,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	$ 192,444,000.00	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de consultoría aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la consultoría (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la consultoría programada se calcula con respecto al Valor Básico de consultoría (A) o el Valor Básico de consultoría Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de consultoría que no se puedan agrupar por GPP, se debe

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Aprueba Firma:
Nombre: EDAY OYELLA RENTERÍA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 0820251733 ATL

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRUALDO
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC BYC

Revisó Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA consultoría PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1 de 1

CODIGO	MEPI-MNI-INS-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA No. 4 **DE** mar-25 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA: $ 613,134,000.00

SEGUIMIENTO No. 4 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4227 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CARO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1 mes (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 13 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/12/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 8,700,000,000.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 8,700,000,000.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 254,568,000.00	2.93%	2.21%
	$ 1,430,754,000.00	16.45%	$ 192,444,000.00
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES			
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	$ 69,000,000.00	0.79%	0.04%
	$ 69,000,000.00	0.79%	$ 3,450,000.00
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO	$ 60,000,000.00	0.69%	0.03%
	$ 60,000,000.00	0.69%	$ 3,000,000.00
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 165,000,000.00	1.90%	1.25%
	$ 165,000,000.00	1.90%	$ 107,250,000.00
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 42,000,000.00	0.48%	0.02%
	$ 42,000,000.00	0.48%	$ 2,100,000.00
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	$ 106,000,000.00	1.22%	0.06%
	$ 106,000,000.00	1.22%	$ 5,300,000.00
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	$ 125,000,000.00	1.44%	0.07%
	$ 125,000,000.00	1.44%	$ 6,250,000.00
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	$ 368,000,000.00	4.23%	0.21%
	$ 368,000,000.00	4.23%	$ 18,400,000.00
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	$ 235,000,000.00	2.70%	0.14%
	$ 235,000,000.00	2.70%	$ 11,750,000.00
ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	$ 190,000,000.00	2.18%	0.11%
	$ 190,000,000.00	2.18%	$ 9,500,000.00
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 73,000,000.00	0.84%	0.04%
	$ 73,000,000.00	0.84%	$ 3,650,000.00
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 481,000,000.00	5.53%	0.28%
	$ 481,000,000.00	5.53%	$ 24,050,000.00
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 57,000,000.00	0.66%	0.03%
	$ 57,000,000.00	0.66%	$ 2,850,000.00
ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	$ 47,000,000.00	0.54%	0.03%
	$ 47,000,000.00	0.54%	$ 2,350,000.00
ESTUDIO DE RIESGOS	$ 93,000,000.00	1.07%	0.02%
	$ 93,000,000.00	1.07%	$ 4,650,000.00
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 56,000,000.00	0.64%	0.03%
	$ 56,000,000.00	0.64%	$ 2,800,000.00
EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	$ 54,000,000.00	0.62%	0.03%
	$ 54,000,000.00	0.62%	$ 2,700,000.00
AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 423,000,000.00	4.86%	0.24%
	$ 423,000,000.00	4.86%	$ 21,150,000.00
VOLUMEN TECNICO BIM	$ 46,000,000.00	0.53%	0.00%
	$ 46,000,000.00	0.53%	$ -
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 5,755,432,000.00	66.15%	0.00%
	$ 4,579,246,000.00	52.64%	$ -
VALOR BASICO DE consultoría (A)	**$ 8,700,000,000.00**	**100.00%**	**4.07%**
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO (A1)	**$ 8,700,000,000.00**	**100.00%**	**$ 423,444,000.00**

% Programado		DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
$ Valor programado															
$ Valor Ejecutado															
% ejecutado															
	% P	1.11%	1.11%	1.11%	1.23%	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	1.22%	1.22%	
	$ P	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ 106,936,000.00	$ 117,630,000.00	$ 117,630,000.00	$ 117,630,000.00	$ 117,630,000.00	$ 117,630,000.00	$ 117,630,000.00	$ 117,630,000.00	$ 105,876,000.00	$ 105,876,000.00	
	$ E	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ 106,936,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	% E	1.11%	1.11%	1.11%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	% P			0.04%		0.48%		0.28%							
	$ P	$ -	$ -	$ 3,450,000.00		$ 41,400,000.00		$ 24,150,000.00							
	$ E	$ -	$ -	$ 3,450,000.00		$ -		$ -							
	% E			0.03%		0.33%		0.24%							
	% P			0.03%		0.41%		0.24%							
	$ P	$ -	$ -	$ 3,000,000.00		$ 36,000,000.00		$ 21,000,000.00							
	$ E	$ -	$ -	$ 3,000,000.00		$ -		$ -							
	% E			0.03%											
	% P			0.09%	1.14%		0.68%								
	$ P	$ -		$ 8,250,000.00	$ 99,000,000.00		$ 87,780,000.00								
	$ E	$ -	$ -	$ 8,250,000.00	$ 99,000,000.00	$ -	$ -								
	% E			0.09%	1.14%			0.00%							
	% P			0.02%			0.29%		0.17%						
	$ P	$ -		$ 2,100,000.00			$ 25,200,000.00		$ 14,700,000.00						
	$ E	$ -		$ 2,100,000.00		$ -	$ -	$ -	$ -						
	% E			0.02%				0.00%	0.00%						
	% P				0.08%		0.73%	0.43%				0.09%			
	$ P	$ -			$ 6,300,000.00		$ 63,900,000.00	$ 37,100,000.00							
	$ E	$ -			$ 6,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -			
	% E				0.06%			0.00%	0.00%			0.00%			
	% P				0.07%		0.88%	0.50%	0.00%			0.09%			
	$ P	$ -			$ 8,250,000.00		$ 76,650,000.00	$ 43,750,000.00							
	$ E	$ -			$ 8,250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -			
	% E				0.07%			0.00%	0.00%			0.00%			
	% P			0.21%				2.54%		1.48%					
	$ P	$ -		$ 18,450,000.00				$ 220,800,000.00		$ 128,850,000.00					
	$ E	$ -	$ -	$ 18,450,000.00		$ -		$ -		$ -					
	% E			0.21%				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
	% P			0.34%				2.62%		0.00%	0.00%				
	$ P	$ -	$ -	$ 11,750,000.00				$ 141,000,000.00		$ 82,250,000.00					
	$ E	$ -	$ -	$ 11,750,000.00				$ -		$ -					
	% E			0.14%											
	% P						1.31%	0.76%							
	$ P	$ -	$ -				$ 114,660,000.00	$ 66,500,000.00							
	$ E	$ -	$ -	$ 9,500,000.00		$ -	$ -	$ -							
	% E			0.11%											
	% P				0.04%			0.50%	0.29%	0.00%	0.00%		0.00%		
	$ P	$ -	$ -		$ 3,650,000.00			$ 43,800,000.00	$ 25,550,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ E	$ -	$ -		$ 3,650,000.00			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	% E				0.04%										
	% P				0.28%			3.32%	0.00%	1.94%		0.00%			
	$ P	$ -	$ -		$ 24,050,000.00			$ 292,600,000.00		$ 169,550,000.00					
	$ E	$ -	$ -	$ 24,050,000.00				$ -		$ -					
	% E			0.28%											
	% P				0.03%		0.39%	0.00%	0.23%						
	$ P	$ -	$ -		$ 2,850,000.00		$ 34,200,000.00		$ 19,950,000.00						
	$ E	$ -	$ -		$ 2,850,000.00		$ -		$ -						
	% E				0.03%										
	% P				0.03%		0.32%	0.19%							
	$ P	$ -	$ -		$ 2,350,000.00		$ 28,200,000.00	$ 16,450,000.00							
	$ E	$ -	$ -		$ 2,350,000.00		$ -	$ -							
	% E				0.03%										
	% P				0.05%			0.64%	0.00%	0.37%		0.00%			
	$ P	$ -	$ -		$ 4,650,000.00			$ 55,800,000.00		$ 32,550,000.00					
	$ E	$ -	$ -		$ 4,650,000.00			$ -	$ -	$ -					
	% E				0.05%										
	% P								0.38%		0.00%	0.00%		0.20%	
	$ P	$ -	$ -						$ 33,600,000.00					$ 19,600,000.00	
	$ E	$ -	$ -	$ 2,800,000.00					$ -		$ -	$ -		$ -	
	% E			0.03%											
	% P			0.00%					0.37%		0.22%				
	$ P	$ -	$ -		$ 2,700,000.00				$ 32,400,000.00		$ 18,900,000.00				
	$ E	$ -	$ -		$ 2,700,000.00				$ -		$ -				
	% E				0.03%										
	% P				0.24%				0.00%	2.92%				1.70%	
	$ P	$ -			$ 21,150,000.00					$ 253,800,000.00				$ 148,050,000.00	
	$ E	$ -	$ -		$ 21,150,000.00				$ -	$ -				$ -	
	% E				0.24%				0.00%					0.00%	
	% P			0.03%			0.32%		0.00%			0.19%			
	$ P	$ -	$ -	$ 2,300,000.00			$ 27,600,000.00					$ 16,150,000.00			
	$ E	$ -	$ -	$ 2,300,000.00			$ -					$ -			
	% E			0.03%											
	% P	0.01%	0.01%	0.01%	5.08%	16.54%	12.74%	7.69%	5.50%	0.94%	0.96%	0.55%	0.15%	2.00%	
	$ P	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 442,347,000.00	$ 1,439,101,000.00	$ 1,108,469,000.00	$ 668,386,000.00	$ 504,266,000.00	$ 81,350,000.00	$ 83,750,000.00	$ 48,250,000.00	$ 13,100,000.00	$ 173,525,000.00	
	$ E	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 3,300,000.00	$ 1,100,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	% E			0.04%	0.01%										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se pueden agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA MES	%	1.12%	1.12%	1.69%	8.91%	10.70%	10.90%	20.26%	8.60%	9.94%	2.53%	2.03%	1.37%	5.14%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 97,322,000.00	$ 97,322,000.00	$ 146,672,000.00	$ 697,285,500.00	$ 1,634,131,500.00	$ 1,651,649,000.00	$ 1,762,566,500.00	$ 746,116,500.00	$ 864,730,000.00	$ 220,288,000.00	$ 176,550,000.00	$ 118,976,000.00	$ 447,446,000.00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1.12%	2.24%	3.92%	11.94%	36.72%	48.70%	69.97%	78.57%	88.51%	91.04%	93.07%	94.44%	99.58%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 97,322,000.00	$ 194,644,000.00	$ 341,316,000.00	$ 1,038,424,500.00	$ 2,672,556,000.00	$ 4,324,205,000.00	$ 5,967,171,500.00	$ 6,835,265,000.00	$ 7,763,918,000.00	$ 7,935,288,000.00	$ 8,097,228,000.00	$ 8,216,204,000.00	$ 8,663,650,000.00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA MES	%	1.11%	1.11%	2.13%	2.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96,222,000.00	$ 96,222,000.00	$ 185,122,000.00	$ 235,586,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	%	1.11%	2.21%	4.34%	7.11%	7.11%	7.11%	7.11%	7.11%	7.11%	7.11%	7.11%	7.11%	7.11%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96,222,000.00	$ 192,444,000.00	$ 377,566,000.00	$ 613,134,000.00	$ 613,134,000.00	$ 613,134,000.00	$ 613,134,000.00	$ 613,134,000.00	$ 613,134,000.00	$ 613,134,000.00	$ 613,134,000.00	$ 613,134,000.00	$ 613,134,000.00	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B1)	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C1=(A+B1)	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Consultor y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:

Nombre: EDUAR RICARDO MENTERA NIÑA

Dirección de consultoría

Matrícula Profesional No.: 08202517334TL

Aprueba Firma:

Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 01193-0243

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
