ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

BOGOTÁ

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ZONA SUR ORIENTE

CTO SDM 2024-3653

INFORME MENSUAL No. 11

24 DE NOVIEMBRE A 23 DE DICIEMBRE

UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024

DICIEMBRE 2025

ICOVÍAS INGENIERIA VIAL S.A.S.
UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
DISEÑÓ Y APROBÓ	Luis Fernando Rubiano Barrero	Director De Proyecto MSc. Planeación de Transporte e Ingeniería	
REALIZÓ	Alba Avendaño Cipagauta	Coordinadora	

INTERVENTORÍA JOYCO S.A.S

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	Ing. Sergio Valderrama Camargo	Director de interventoría	
APROBÓ	Ing. Julián Álvarez	Residente de interventoría	

MODIFICACIONES		

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
2.1 LOCALIZACIÓN 7
3. PERIODO DE REPORTE 9
4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE/EN ACTUALIZACIÓN) 10
5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 11
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 15
6.1 HORIZONTAL 15
6.2 VERTICAL 17
7. PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO 18
8. ASPECTOS TÉCNICOS 19
9. ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES 21
10. PLAN DE CALIDAD 22
11. PROTOCOLO DE MANEJOS DE RESIDUOS 23
12. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CORREDORES 24
13. REPORTE ESTADISTICO 25
13.1 EJECUCIÓN POR COMPONENTE 25
13.2 ZONAS ESCOLARES 25
14. CERTFICADOS DE CALIBRACIÓN, FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ESTADO DE LOS EQUIPOS 26
15. SEÑALIZACIÓN ENTREGADA A ALMACÉN 27
16. REPORTE DE SEÑALIZACIÓN RETIRADA EN VÍA Y ENTREGADA A ALMACÉN 30
17. ASPECTOS VARIOS 31
18. RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CONTRATO DE OBRA 35

18.1 PERSONAL 35
18.2 EQUIPO 35
18.3 INSTRUMENTOS USADOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 35
19. VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE. 37
20. VINCULACIÓN DE PORCENTAJE DE MUJERES. 38
21. FACTOR SOCIAL 39
22. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 40
23. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 41
24. PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO 42
25. CERTIFICACIÓN SALARIOS Y HONORARIOS 43
26. LISTADO DE PROVEEDORES 44
27. CERTIFICACIÓN PAGOS PROVEEDORES 45
28. ESTADO PRESUPUESTAL 46
29. PUNTAJE 50
30. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 51
31. ANEXOS 52

Gráfica 1 Gráfica Curva S 47

Ilustración 1 Localización Zona 7 8
Ilustración 2 Precipitación mes de diciembre 20

Tabla de contenido (Tablas)

Tabla 1 Datos generales del Contrato 7
Tabla 2 UPZ localidades asignadas 8

Tabla 3 Vigencia Pólizas CTO 2024-3563 10
Tabla 4 Diseños Asignados para Implementación 11
Tabla 5 PMTs solicitados cuenta 10 18
Tabla 6 Inspecciones realizadas 19
Tabla 7 Actividades por componente 25
Tabla 8 Zonas Escolares Intervenidas 25
Tabla 9 Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados 27
Tabla 10 Estado Georeferenciación 31
Tabla 11 Personal mínimo 35
Tabla 12 Equipos empleados para la ejecución de las actividades 35
Tabla 13 Cantidades ejecutadas por ID 46
Tabla 14 Balance presupuestal 48

1. INTRODUCCIÓN

Con el propósito de atender las necesidades de señalización de la ciudad de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, como autoridad de tránsito y en cumplimiento de sus funciones establecidas por el Decreto 672 del 22 de ENERO de 2018[1], se encarga de ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la señalización vertical y horizontal de la ciudad, así como los demás elementos y dispositivos que propendan por garantizar la seguridad vial, el buen uso del espacio público y la gestión del tránsito en la ciudad.

Es así que la SDM generó un programa para implementar las medidas necesarias y realizar el mantenimiento rutinario y correctivo de la señalización de la ciudad, que incluye la señalización de ciclorrutas, medidas de gestión, carriles preferenciales, carriles de alta ocupación vehicular, proyectos de urbanismo táctico, plazas, corredores verdes, distritos verdes, barrios vitales y mantener en condiciones óptimas de señalización para todos los usuarios de la vía; integrando por grupos las veinte (20) localidades y dividiendo el perímetro urbano y rural en siete (7) zonas y en catorce (14) corredores principales.

En marco de este programa la SDM celebro el contrato SDM-2024-3653 con la firma Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024, el cual tiene por objeto "*Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. Zona Sur Oriente*", para la atención integral de las actividades de implementación de señalización, donde se incluye el suministro e instalación de la señalización vertical de pedestal, la aplicación de señalización horizontal y la implementación de otros dispositivos de señalización horizontal en la malla vial de las localidad de Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar y y en los corredores de la Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Via al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano), o en las zonas diferentes a la asignada en la ciudad, de acuerdo a la definición de puntos o actividades a desarrollarse que establezca el comité técnico.

En el siguiente informe mensual No 11, se presenta un resumen sobre las principales actividades de señalización vertical, horizontal e implementación y/o suministro de dispositivos viales, realizadas por la Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024, durante el periodo 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, en cumplimiento de los compromisos contractuales del contrato de obra SDM-2024-3653.

[1] "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital, de Movilidad y se dictan otras disposiciones"

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Datos generales del Contrato

Número de Contrato de Obra	SDM 2024-3653
Objeto del Contrato	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. – ZONA SUR ORIENTE"
Contratante:	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Contratista	UT ECOSEÑALIZACION 2024
Plazo de ejecución:	34 meses
Fecha de acta de Inicio:	24 de enero 2025
Fecha de Terminación:	23 de noviembre del 2027
Valor Inicial:	$18.771.473.428
Lugar de Ejecución	Bogotá D.C., Localidades: San Cristobal, Usme y Sumapaz, Corredores de Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Via al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano)
Interventoría:	JOYCO S.A.S BIC
Número de Contrato de Interventoría	SDM 2024-3668

Fuente: Elaboración propia

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C., y se concentra en la Zona 7 Sur Oriente , conformada por las localidades : San Cristobal, Usme y Sumapaz , también se ejecutarán actividades en los corredores asignados Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Vía al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano) como se muestra en la siguiente figura:

Ilustración 1 Localización Zona 7



Fuente: Elaboración propia a partir de imagen en internet

Estas localidades se encuentran conformadas por las siguientes Unidades de Planificación Zonal UPZ:

Tabla 2 UPZ localidades asignadas

4. San Cristóbal	5. Usme	20. Sumapaz
32 San Blas 33 Sosiego 34. 20 de Julio 50. La Gloria 51 Los Libertadores	52 La Flora 56 Danubio 57 Gran Yomasa 58 Comuneros 59 Alfonso Lopez 60 Parque Entre Nubes	Rio Blanco Río Sumapaz

Fuente: Elaboración propia

3. PERIODO DE REPORTE

Este informe presenta el detalle de las actividades de señalización horizontal, señalización vertical e Instalación de dispositivos de tránsito y/o elementos canalizadores del tráfico, realizadas por la Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024 en cumplimiento del Contrato SDM-2024-3653, para el periodo del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2025.

4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE/EN ACTUALIZACIÓN)

Una vez firmada el Acta de Inicio No. SDM 2024-3653 (del 24 de enero de 2025), entre la Unión Temporal Ecoseñalización 2024 y la SDM, se remitieron las pólizas emitidas por parte de la compañía de seguros Mundial de Seguros a la Entidad, conforme las exigencias establecidas en el contrato, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la SDM.

En el mes de mayo se presentaron observaciones a algunos amparos que cubren estas pólizas, las mismas fueron atendidas y ya cuentan con aprobación por parte de la SDM.

La ejecución de este contrato está amparada por las siguientes pólizas (las cuales se presentan en el Anexo 1. Pólizas) que cubren los respectivos riesgos.:

Tabla 3 Vigencia Pólizas CTO 2024-3563

Amparos Firma del Contrato	Porcentaje	Valor	Vigencia	
			Inicio	Vencimiento
Cumplimiento	(30% sobre el valor del contrato)	$5.631.442.029	27-12-2024	27-05-2030
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	(__% sobre el valor del anticipo)			
Calidad del Servicio Ofrecido	(30% sobre el valor del contrato)	$5.631.442.029	27-12-2024	27-05-2030
Estabilidad y Calidad de la Obra	(30% sobre el valor del contrato)	$5.631.442.029	27-12-2024	27-05-2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	(20% sobre el valor del contrato)	$3.754.294.686	27-12-2024	27-11-2030
Responsabilidad Civil Extracontractual	(30% sobre el valor del contrato)	$5.631.442.029	27-12-2024	24-11-2030

Fuente: Elaboración propia

5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta los Identificadores de Diseño (ID) asignados, en la siguiente tabla se expone el estado de los diseños entregados para implementación:

Tabla 4 Diseños Asignados para Implementación

No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
1	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3	29/01/2025	USME	EJECUTADO
2	MV_05_122_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
3	EX_05_119_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
4	EX_05_93_1244_11	29/01/2025	USME	EJECUTADO
5	EX_05_110_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
6	EX_05_053_1744_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
7	EX_05_108_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
8	EX_05_003_1073_24	29/01/2025	USME	EJECUTADO
9	EX_05_113_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
10	EX_05_005_1073_24	29/01/2025	USME	EJECUTADO
11	EX_05_004_1073_24	29/01/2025	USME	NO SE EJECUTA
12	EX_04_261_1561_10	29/01/2025	SAN CRISTOBAL	NO SE EJECUTA
13	EX_05_352_1561_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
14	EX_05_101_1244_11	29/01/2025	USME	EJECUTADO
15	EX_05_002_1073_24	29/01/2025	USME	NO SE EJECUTA
16	EX_05_006_1744_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
17	EX_05_001_1073_24	29/01/2025	USME	EJECUTADO
18	EX_05_280_1561_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
19	EX_05_007_1073_24	29/01/2025	USME	NO SE EJECUTA
20	EX_05_007_1445_14	29/01/2025	USME	NO SE EJECUTA
21	EX_05_310_1561_10	29/01/2025	USME	NO SE EJECUTA
22	EX_05_307_1561_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
23	EX_05_008_1073_24	29/01/2025	USME	EJECUTADO
24	MV_20_526_943_10	29/01/2025	SUMAPAZ	NO SE EJECUTA
25	MV_20_025_670_11	29/01/2025	SUMAPAZ	NO SE EJECUTA
26	MV_20_021_670_11	29/01/2025	SUMAPAZ	NO SE EJECUTA
27	SH_SV_PUNTO4_TMSA_V1	10/02/2025	USME	EJECUTADO
28	SDM-202461204315912 Y SDM-202461204636702	14/02/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
29	SDM-202461204158462	14/02/2025	USME	EJECUTADO
30	SDM- 202461203879272	14/02/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
31	SDM- 202461204426482	14/02/2025	SUMAPAZ	EJECUTADO
32	SDM-202561200270682	14/02/2025	USME	EJECUTADO
33	SUMINISTRO 1	18/02/2025	NA	EJECUTADO
34	SDM-202461204137592	20/02/2025	USME	EJECUTADO
35	ASIGNACIÓN CP Reposición de Hitos Ciclorrutas	21/03/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO

No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
37	CP 202561200744162 RETIRO DE SEÑAL	8/04/2025	USME	EJECUTADO
38	CP-202561200703942	8/04/2025	USME	EJECUTADO
39	CP COLEGIO FLORENTINO Y FRANCISCO JOSE	14/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
40	IMPLEMENTACION PMT de EMERGENCIA AV LOS CERROS	14/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
41	CP Carrera 6 entre Calle 24 Sur y Av. Primero de Mayo.	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
42	CP Carrera 4 entre Av. Primero de Mayo y Calle 19A Sur Calle 19A Sur entre Carrera 6 y Carrera 5A.	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
43	CP Av. Primero de Mayo entre Carrera 9A y Carrera 1B	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
44	SIRE 5453567	6/05/2025	USME	EJECUTADO
45	CP AV BOYACA - TV 3 F (TRAMO SUR-NORTE; NORTE-SUR)	8/05/2025	USME	EJECUTADO
46	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561201777022	6/06/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
47	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561201795562	13/06/2025	USME	EJECUTADO
48	CP BIKE BOX CARACAS	14/06/2025	USME	EJECUTADO
49	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202098412	3/07/2025	USME	EJECUTADO
50	SUMINISTRO IDIPRON SI-35	7/07/2025	N/A	EJECUTADO
51	SDM-202561202230222	15/07/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
52	SUMINISTRO IDIPRON SI-35 Y DUPLEX	17/07/2025	N/A	EJECUTADO
53	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202378942	24/07/2025	USME	EJECUTADO
54	PMT DE EMERGENCIA Evento SIRE-5456812	24/07/2025	USME	EJECUTADO
55	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202286462	24/07/2025	USME	EJECUTADO
56	SUMINISTRO IDIPRON SR-28/ PLAQUETA	29/07/2025	N/A	EJECUTADO
57	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202284382	4/08/2025	USME	EJECUTADO
58	CP PASACALLES AV BOYACÁ	5/08/2025	FONTIBON	EJECUTADO
59	SUMINISTRO IDIPRON SR-17	13/08/2025	N/A	EJECUTADO
61	CP COLEGIO NUEVA ROMA	15/08/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
61	SUMINISTRO IDIPRON SI-35, SR-30	20/08/2025	N/A	EJECUTADO
62	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202379632	20/08/2025	USME	EJECUTADO


No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
63	CP BARRIO LA MARIA	20/08/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
64	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202439322	29/08/2025	USME	EJECUTADO
65	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202657962	29/08/2025	USME	EJECUTADO
66	EX_04_030_1561_10	2/09/2025	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
67	EX_04_051_414_11_V2	2/09/2025	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
68	EX_04_241_1561_10_V9	2/09/2025	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
69	EX_04_488_826_10_V7	2/09/2025	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
70	MV_05_99_1244_11_V3	2/09/2025	USME	NO SE EJECUTA
71	EX_05_213_1561_10_V5	2/09/2025	USME	EN EJECUCIÓN
72	EX_05_286_1561_10_V3	2/09/2025	USME	EN EJECUCIÓN
73	SUMINISTRO MALETINES	3/09/2025	N/A	EJECUTADO
74	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202584052 y SDM-202561202664192	4/09/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
75	CP_05_1524	9/09/2025	USME	EN EJECUCIÓN
76	SUMINISTRO IDIPRON SI-35, SR-30	9/09/2025	N/A	EJECUTADO
77	CP-05-1631	15/09/2025	USME	INSPECCIONADO
78	CP_04_1627	22/09/2025	USME	INSPECCIONADO
79	CP_04_1625	22/09/2025	USME	INSPECCIONADO
80	SUMINISTRO IDIPRON SR-06	25/09/2025	N/A	EJECUTADO
81	SUMINISTRO IDIPRON SI-35, SR-30	25/09/2025	N/A	EJECUTADO
82	PÉNDONES AK 7	25/09/2025	VARIAS	INSPECCIONADO
83	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561203372182	29/09/2025	USME	INSPECCIONADO
84	CP_04_1630	30/09/2025	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
85	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561203329962 –DI -22669 - CL 111 Sur Quebrada Mediania (VIA AL LLANO)	1/10/2025	USME	EJECUTADO
86	CP_05_1669	7/10/2025	USME	EJECUTADO
87	CP_05_1670	7/10/2025	USME	EJECUTADO
88	CP_05_1671	7/10/2025	USME	EJECUTADO
89	CP_05_1672	7/10/2025	USME	INSPECCIONADO
90	CP_05_1673	7/10/2025	USME	EJECUTADO
91	CP_05_1674	7/10/2025	USME	INSPECCIONADO
92	CP_05_1646	7/10/2025	USME	INSPECCIONADO
93	CP_05_1647	7/10/2025	USME	EJECUTADO
94	CP_05_1648	7/10/2025	USME	INSPECCIONADO
95	CP_04_1594	9/10/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
96	CP_05_1690	9/10/2025	USME	INSPECCIONADO
97	CP_ AK 10X CL 13 SUR	9/10/2025	USME	NO SE EJECUTA

No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
98	CP_ AUTOPISTA AL LLANO X 91 SUR	9/10/2025	USME	EJECUTADO
99	Suministro Idipron Sp-48, Sr-plaqueta (9)	9/10/2025	NA	EJECUTADO
100	CP_05_1693	16/10/2025	USME	ASIGNADO
101	Suministro Idipron (10). SI-35	17/10/2025	NA	EJECUTADO
102	Ciclorruta AC75 entre AV boyacá y Kr 76	22/10/2025	ENGATIVÁ	NO SE EJECUTA
103	Suministro SDM (3), EJE AMBIENTAL	27/10/2025	NA	ASIGNADO
104	Suministro Idipron Coltanques (11)	30/10/2025	NA	ASIGNADO
105	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561203642132	30/10/2025	USME	INSPECCIONADO
106	Diseño Proyecto Zona Rosa	5/11/2025	CHAPINERO	INSPECCIONADO
107	CP Av Boyacá con KR 14I	11/11/2025	USME	EN EJECUCIÓN
108	Diseño Proyecto Zona Rosa Fase II	12/11/2025	CHAPINERO	INSPECCIONADO
109	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561203802572	19/11/2025	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
110	Suministro SDM tableros (4)	19/11/2025	NA	ASIGNADO
111	CP_05_1678	25/11/2025	USME	SUSPENDIDO
112	Suminitros Idipron SITP Vereda el Hato - PERSONERIA (Memorando STP-202522100235523) (12)	1/12/2025	NA	EJECUTADO
113	CP_04_1771	17/12/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO


Fuente: Elaboración propia

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.1 HORIZONTAL

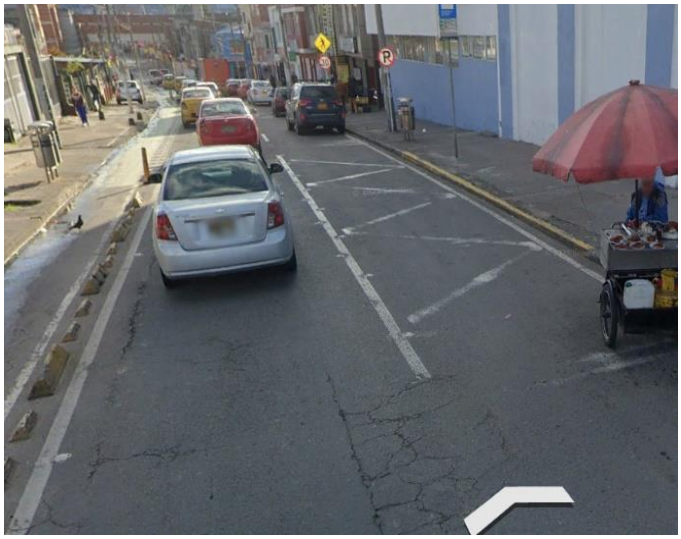
EX_04_030_1561_10	
ANTES	**DESPUÉS**
AK 6 CL 23	
	
KR 7 CL 1A	
	

KR 2 CL 64

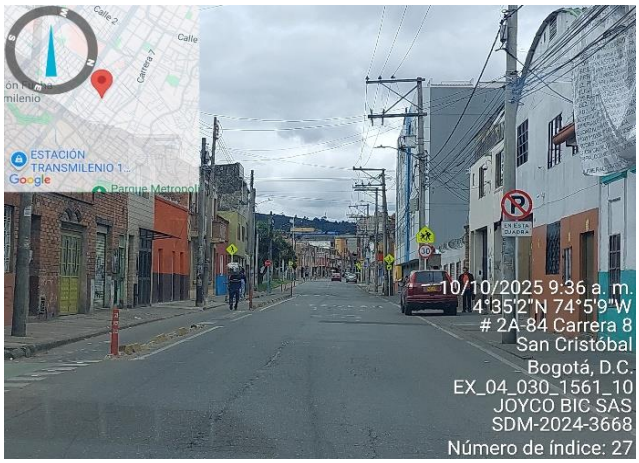




KR 6C CL 79


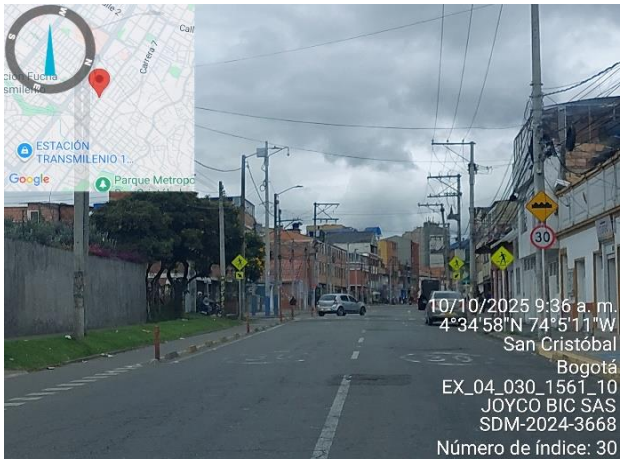




KR 6C CL 48



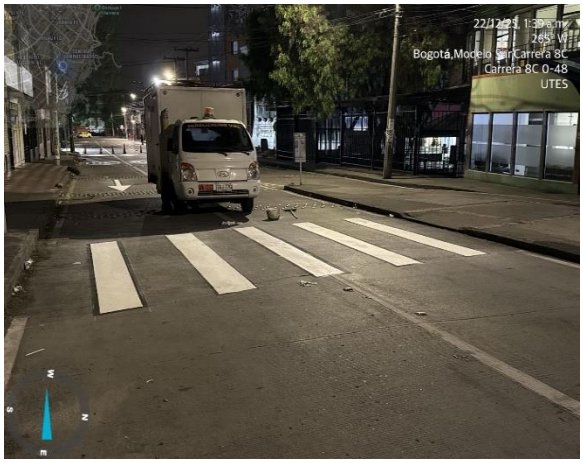

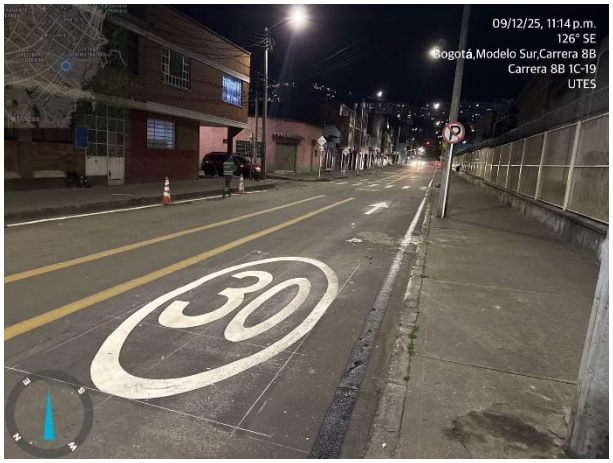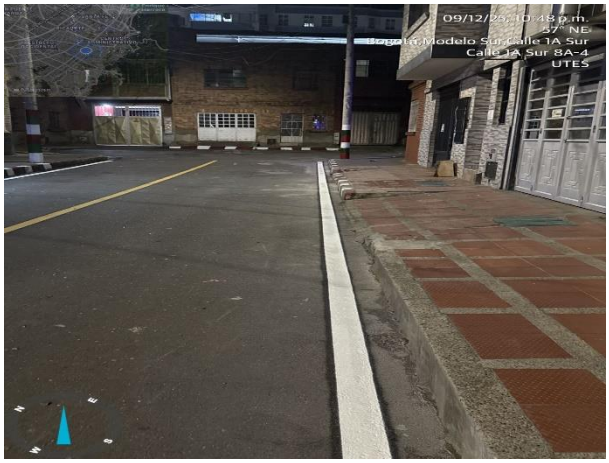KR 6B CL 1C	
	
CL 1ª SUR KR 6A	
	

6.2 VERTICAL

En este período no se realizó instalación de señales verticales.

7. PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

Respecto al Plan de Manejo (PMT) General, se radico en la interventoría el 17 de enero de 2025, a su vez la Interventoría remitió a la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito SPMT de la Secretaría Distrital de Movilidad con radicado SDM 202561200352442. Posteriormente la SPMT con oficio SPTM 202531200443941 del 04 de febrero de 2025, informo que "…una vez revisado el documento técnico y los esquemas típicos propuestos para el manejo de tráfico durante las actividades de demarcación e instalación de señalización vertical de la zona 7 localidades de Usme, San Cristóbal y Sumapaz,, mediante el contrato del asunto, se emite autorización a la propuesta…" e indica que la vigencia de la autorización es desde la fecha del comunicado hasta el 03 de febrero de 2026.

En el periodo de este informe del 24 de octubre al 23 de noviembre de 2025, se solicitaron y tramitaron los siguientes PMTs:

Tabla 5 PMTs solicitados cuenta 10

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
49	4/12/2025	33665	5002753	5002775	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 14G	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 14DBIS	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	5/12/2025	29/01/2026
49	4/12/2025	33666	5002753	5002775	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 14G	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 14DBIS	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	5/12/2025	29/01/2026
50	11/12/2025	34928	2000791	N/A	CL 82 KR 12	CL 82 AK 11	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	12/12/2025	29/01/2026
50	11/12/2025	34929	2000791	N/A	CL 82 KR 12	CL 82 AK 11	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	12/12/2025	29/01/2026

Fuente: elaboración propia

Igualmente, en el Anexo 2. se adjuntan los COI mencionados en la tabla anterior, donde se encuentra la información detallada de cada autorización.

8. ASPECTOS TÉCNICOS

8.1 MODIFICACIONES REALIZADAS

- En el periodo al que pertenece el presente informe no se realizaron modificaciones.

8.2 ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se describen las actividades ejecutadas a la fecha:

- Revisión en plataforma SIGIDU
- Se realiza la solicitud de los planes de manejo de tránsito PMT para los puntos a intervenir.
- Socialización de actividades de implementación en colegios y zonas de alto flujo peatonal.
- Implementación de señalización horizontal y vertical de acuerdo a los planos inspeccionados e instalación de dispositivos según diseños.

8.3 INSPECCIONES

- A continuación, se relacionan los diseños inspeccionados en el periodo al que hace referencia este informe (24 de noviembre a 23 de diciembre de 2025)

Tabla 6 Inspecciones realizadas

ID Diseño	Fecha de Asignación	ESTADO
CP_04_1771	17/12/2026	INSPECCIONADO


Fuente: Elaboración propia

En el Anexo 3 (3.1 Inspecciones) se encuentran los formatos de inspecciones.

8.4 ESTADO DEL TIEMPO

En el periodo al que hace referencia este informe (24 de noviembre a 23 de diciembre de 2025) se presentaron 13 días de lluvias.

Ilustración 2 Precipitación mes de diciembre

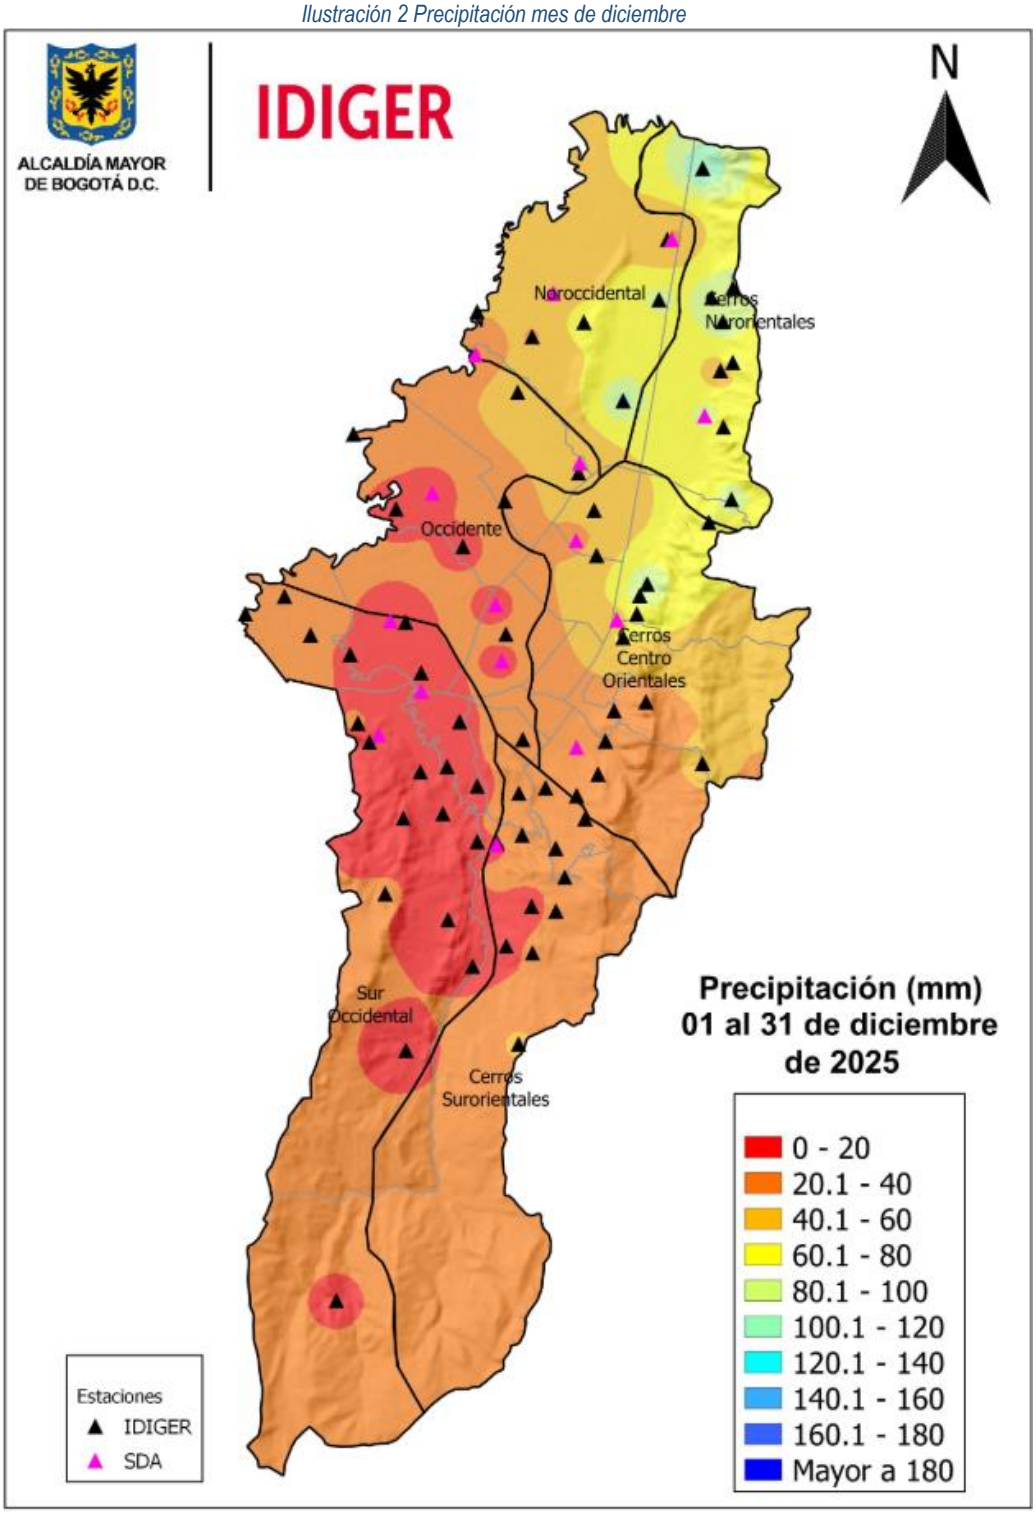

9. ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

Durante el periodo del presente informe no se realizó consulta con otras entidades pues ya se habían echo las consultas de todos los diseños, sin embargo se adjuntan las respuestas que llegaron por parte de la entidades.

En el Anexo 4, se encuentran las cartas radicadas a las diferentes entidades..

10. PLAN DE CALIDAD

La información referente al Plan de Calidad se encuentra en el Anexo 5.

11. PROTOCOLO DE MANEJOS DE RESIDUOS

La información respecto al protocolo de manejos de residuos se encuentra en el Anexo 6

12. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CORREDORES

En el periodo al que se hace referencia en este informe no se ejecutaron actividades en corredores asignados.

13. REPORTE ESTADISTICO

13.1 EJECUCIÓN POR COMPONENTE

De acuerdo con la ejecución de las obras durante el periodo se tienen subdividido por componente (señalización vertical y horizontal) de la siguiente forma:

Tabla 7 Actividades por componente

Corredor / Diseños	Localidad	Señalización Vertical	% Ejecutado en el ID en Señalización vertical del periodo	Señalización Horizontal	% Ejecutado en el ID en Señalización Horizontal del periodo	Total, ejecutado en el periodo de informe
Suministro 3 SDM IDU	NA	$ 17.812.334,00	100%		0%	$ 17.812.334,00
Suministro 11 SP/SR, COLTANQUES	NA	$ 6.155.838,00	100%		0%	$ 6.155.838,00
Suministro 12 SITP	NA	$ 9.397.833,00	100%		0%	$ 9.397.833,00
EX_04_030_1561_10	San Cristóbal		0%	$ 88.023.748,40	100%	$ 88.023.748,40
Suministro 4 SDM SR-30	NA	$ 693.508,00	100%		0%	$ 693.508,00
TOTAL		**$ 34.059.513,00**		**$88.023.748,40**		**$ 122.083.261**

Fuente: Elaboración propia

El valor total ejecutado en el periodo al que hace referencia este informe es de **$122.083.261**, en la localidad de San Cristóbal se se ejecutó un valor de $88.023.748 lo que corresponde al 72.10% de la ejecución total y en suministro un valor de $34.059.513 lo que corresponde a un 27.90% de la ejecución total. La demarcación horizontal un 72.1%.

13.2 ZONAS ESCOLARES

En este periodo no se realizaron actividades de demarcación de Zonas Escolares.:

Tabla 8 Zonas Escolares Intervenidas
Fuente: Elaboración propia

14. CERTFICADOS DE CALIBRACIÓN, FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ESTADO DE LOS EQUIPOS

En el Anexo 7 se encuentra la información respecto a los certificados de calibración.

15. SEÑALIZACIÓN ENTREGADA A ALMACÉN

Para el periodo del presente informe, a continuación, se presenta el detalle de la señalización vertical implementada, dispositivos de control al tránsito implementados y entregada al almacén de la SDM.

En el Anexo 8. Acta de entrega de señalización, se presenta el comprobante de ingreso de elementos emitido por la subdirección Administrativa de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde se relaciona la señalización vertical y los dispositivos viales instalados en el periodo del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2025:

Tabla 9 Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	21,16	$ 364.850,76	$ 116.752,24	N/A	$ 481.603,00	$ 10.190.719,48
2	UND	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	30	$ 116.052,27	$ 37.136,73	30,00	$ 153.189,00	$ 4.595.670,00
3	UND	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	4	$ 145.683,33	$ 46.618,67	4,00	$ 192.302,00	$ 769.208,00
70	UND	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa	162	$ 12.064,39	$ 3.860,61	162,00	$ 15.925,00	$ 2.579.850,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		de la NTC 4745 (Tabla 1).						
73	UND	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	1289	$ 12.179,55	$ 3.897,45	1289,00	$ 16.077,00	$ 20.723.253,00
75	UND	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	4	$ 76.252,27	$ 24.400,73	4,00	$ 100.653,00	$ 402.612,00
TOTAL								**$ 39.261.312**

VALOR EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS

A continuación se relacionan los suministros:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	COSTO DIRECTO	SUBTOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2 21,31	51 tableros	$ 481.603	$ 10.262.960

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	COSTO DIRECTO	SUBTOTAL
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	Und	40	$ 153.189	$ 6.127.560
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	Und	11	$ 192.302	$ 2.115.322
TOTAL, SUMINISTROS MES					**$ 18.505.842**

16. REPORTE DE SEÑALIZACIÓN RETIRADA EN VÍA Y ENTREGADA A ALMACÉN

En el periodo al que hace referencia este informe se realizó entrega de señales retiradas en vía, , la información se encontrará en el Anexo 9.

17. ASPECTOS VARIOS

17.1 GEOREFERENCIACIÓN

Durante el periodo de presentación del informe se realizó la entrega de Georreferenciación perteneciente a la implementación del Obra, lo siguiente es el listado de ID's entregados a fecha de corte 23 de diciembre de 2025.

Tabla 10 Estado Georeferenciación

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
1	EX_05_93_1244_11	6-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_05_119_1867_12	6-mar-25	APROBADO SDM
1	MV_05_122_1867_12	20-mar-25	APROBADO SDM
1	MV_AV_BOYACA_941_09	21-mar-25	APROBADO SDM
1	MV_04_230_1561_10	17-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_04_044_1561_10	6-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_04_211_1561_10	17-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_05_320_1561_10	11-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_05_341_1561_10	11-mar-25	APROBADO SDM
2	MV_05_052_1744_10 SDM-202561200270682	9-abr-25	APROBADO SDM
2	MV_AV_BOYACA_941_09	2-may-25	APROBADO SDM
2	EX_05_119_1867_12	29-abr-25	APROBADO SDM
2	MV_05_122_1867_12	5-may-25	APROBADO SDM
2	EX_05_053_1744_10	2-may-25	APROBADO SDM
2	EX_04_211_1561_10 (pasacalle SDM-202461204137592)	21-abr-25	APROBADO SDM
3	EX_04_001_1073_24	27-may-25	APROBADO SDM
3	EX_04_262_1561_10_	29-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_119_1867_12	29-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_108_1867_12	19-may-25	APROBADO SDM
3	EX_04_241_1561_10	28-may-25	APROBADO SDM
3	MV_04_511_676_09	20-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_053_1744_10	7-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_110_1867_12	21-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_93_1244_11_V5	5-jun-25	APROBADO SDM
3	MV_05_122_1867_12	27-may-25	APROBADO SDM
3	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3 (CP 202561200744162)	29-may-25	APROBADO SDM
4	EX_04_211_1561_10 PMT de EMERGENCIA AV LOS CERROS	25-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_04_261_1561_10 (CP_04_1049)	1-jul-25	APROBADO SDM
4	EX_04_001_1073_24	13-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_003_1073_24	13-jun-25	APROBADO SDM

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
4	EX_05_110_1867_12	1-jul-25	APROBADO SDM
4	EX_05_119_1867_12	18-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_113_1867_12	20-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_053_1744_10	20-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_108_1867_12	19-jun-25	APROBADO SDM
4	MV_05_052_1744_10 PMT CAUCE SIRE 5453567	25-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_04_241_1561_10	17-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_04_262_1561_10	25-jun-25	APROBADO SDM
4	MV_05_122_1867_12	27-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_307_1561_10 CP-202561200703942	25-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_93_1244_11	20-jun-25	APROBADO SDM
5	EX_05_93_1244_11	8-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_307_1561_10 CP-202561200703942	16-jul-25	APROBADO SDM
5	MV_04_511_676_09_V11	10-jul-25	APROBADO SDM
5	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	16-jul-25	APROBADO SDM
5	MV_05_122_1867_12_V7	24-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_001_1073_24_V2	11-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_241_1561_10	16-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_003_1073_24	29-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_108_1867_12_V6	16-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_113_1867_12	29-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_262_1561_10	24-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_005_1073_24	24-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_119_1867_12	14-jul-25	APROBADO SDM
5	PMT SIRE 5453778	24-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_264_1561_10 PMT SDM-202561201385182	18-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_211_1561_10 SIRE 2561201777022	18-jul-25	APROBADO SDM
5	PMT EMBALSE LA REGADERA	24-jul-25	APROBADO SDM
6	EX_05_005_1073_24	14-ago-25	APROBADO SDM
6	EX_05_113_1867_12	13-ago-25	APROBADO SDM
6	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	13-ago-25	APROBADO SDM
6	EX_05_119_1867_12	13-ago-25	APROBADO SDM
6	EX_05_001_1073_24	15-may-25	APROBADO SDM
6	EX_05_101_1244_11	15-may-25	APROBADO SDM
6	EX_05_008_1073_24	15-ago-25	APROBADO SDM
6	EX_05_003_1073_24	13-ago-25	APROBADO SDM
6	MV_AV_CARACAS_585_24 CP_BYKE_BOX	19-ago-25	APROBADO SDM
7	MV_05_122_1867_12	19-sep-25	APROBADO SDM

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
7	EX_05_213_1561_10 SDM-202561202098412	15-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_04_126_1867_12 SDM-202561202230222	15-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_101_1244_11	2-sep-25	APROBADO SDM
7	MV_AV_CARACAS_585_24 CP_BYKE_BOX	2-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_006_1561_10	10-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_001_1073_24	8-sep-25	APROBADO SDM
7	MV_AV_BOYACA_941_09	15-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_008_1073_24	8-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_307_1561_10	18-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_310_1561_10	2-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_280_1561_10	11-sep-25	APROBADO SDM
8	EX_05_001_1073_24	28-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_006_1744_10	15-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_124_1867_12 CP_ BARRIO_LA_MARIA	23-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_006_1561_10 (CP_NUEVA_ROMA)	27-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_044_1561_10 (CP NUEVA ROMA)	28-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_280_1561_10	15-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_008_1561_10	10-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_213_1561_10	4-nov-25	APROBADO SDM
8	EX_05_310_1561_10	10-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT_CL_37D_S_KR_3B (SDM-202561202584052 y SDM- 202561202664192)	27-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_93_1244_11 (CP_05_124)	15-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_316_1561_10 (PMT SDM-202561202439322)	15-oct-25	APROBADO SDM
8	MV_05_99_1244_11 (PMT SDM-202561202657962)	15-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT BARRIO LA FISCALA (PMT SDM- 202561202378942)	10-oct-25	APROBADO SDM
8	MV_05_052_1744_10 (PMT SDM-202561202284382 VDA LAS MARGARITAS)	28-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT VEREDA OLARTE SDM-202561202284382	27-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT_JUAN_REY_LA_FLORA SDM- SIRE 5456812	27-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_040_1561_10 SDM- 202561202286462	27-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT_USME_SECTOR RURAL CL 137D_ KR 1 SDM-202561202379632	28-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_307_1561_10	7-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_119_1867_12	10-oct-25	APROBADO SDM
9	EX_05_352_1561_10	2-dic-25	APROBADO SDM
9	EX_05_286_156_10	2-dic-25	APROBADO SDM
9	CPS_676_MV_01_04 (pendones kr 7)	25-nov-25	APROBADO SDM
9	EX_04_241_1561_10	25-nov-25	APROBADO SDM
9	EX_04_488_826_10	1-dic-25	APROBADO SDM
9	MV_05_122_1867_12 CP DE VIA AL LLANO	11-nov-25	APROBADO SDM

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
9	EX_04_124_1867_12 CP_ BARRIO_LA_MARIA	26-nov-25	APROBADO SDM
9	EX_04_006_1561_10 (CP_NUEVA_ROMA)	25-nov-25	APROBADO SDM
9	EX_04_044_1561_10 (CP NUEVA ROMA)	3-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_05_341_1561_10 CP_05_1669	12-dic-25	APROBADO SDM
10	MV_05_052_1744_10 CP_05_1670 5. CP_05_1671 CP_05_1673	12-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_05_002_1073_24 CP_05_1648	12-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_04_134_1867_12 CP_04_1594	12-dic-25	APROBADO SDM
10	MV_15_78_1244_11 CP_04_1630	15-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_05_320_1561_10 SDM-20256120339962-DI-22669	16-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_04_488_826_10	16-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_04_241_1561_10	16-ene-25	EN REVISION INTERVENTORIA
10	MV_05_122_1867_12 CP DE VIA AL LLANO	17-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_04_051_414_11	14-ene-26	APROBADO SDM
10	EX_04_030_1561_10	16-ene-25	EN REVISION SDM
11	EX_04_030_1561_10		EN DESARROLLO

Elaboración: Fuente propia

18. RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CONTRATO DE OBRA

18.1 PERSONAL

Tabla 11 Personal mínimo

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DEL PROYECTO	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	DIANA PAOLA PARADA SIERRA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA DIURNO	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO	DIEGO GUALTEROS CHAVEZ
TRABAJADOR SOCIAL	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBÓN
PROFESIONAL STT	YULID LILIANA GELVES HERRERA
TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	GIOVANNY ALEXANDER BRITO NÚÑEZ
CONDUCTOR DIURNO	WILMER SIERRA
CONDUCTOR NOCTURNO	HUGO ALEJANDRO MORENO CRISTANCHO
SECRETARIA	YOLIMA PATIÑO LOBATON
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA

Fuente: Elaboración propia

18.2 EQUIPO

Tabla 12 Equipos empleados para la ejecución de las actividades

Maquina	Serie	Tipo de Vehículo	Placa	Marca
Aplicación de pintura liquida	-	Camión	VFB357	Chevrolet
Maquina autopropulsable TITAN 1000	TAPT002	Camión	WEP027	Jac
Aplicación de plástico en frio	IAPT001	Camión	WNN061	Jac
Powrliner 8950, 2GUN Powrliner 8950, 2GUN Powrliner 8950, 2GUN	1. 1439800069 2. 1439800007 3. 1439800083	N/A	N/A	Titan
Featherlite	2001-454	N/A	N/A	ThermoMark II
Hydra M 4000, W FILTE/ (433- 801)	120700042	N/A	N/A	Titan

Fuente: Elaboración propia

18.3 INSTRUMENTOS USADOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

A continuación, se listan los instrumentos usados en los frentes de obra, para el control de calidad de la señalización implementada:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Velocímetro	1
Galgas para la verificación de espesores húmedos	1
Medidor de espesores secos para tomar lecturas de la demarcación sobre testigos	1
Retrorreflectómetro horizontal	1

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Lupa con aumento de 80X	1
Cinta métrica / Odómetro	1
Equipo para medir temperatura ambiente y de la superficie por demarcar.	1
Equipo para medir humedad relativa (Termohigrómetro)	1
Equipo para medir velocidad del viento	1
Equipo para medir punto de rocío	1

Fuente: Elaboración propia

19. VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE.

Esta información se encuentra en el Anexo 10. Gestión social.

20. VINCULACIÓN DE PORCENTAJE DE MUJERES.

Esta información se encuentra en el Anexo 10. Gestión social.

21. FACTOR SOCIAL

Esta información se encuentra en el Anexo 10. Gestión social.

22. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La información referente a la gestión de seguridad y salud en el trabajo se encuentra en el Anexo 11.

23. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

24.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO

En el tercer mes de ejecución del contrato comprendido entre el periodo del 24 de noviembre al 23 de diciembre del 2025 se realizaron actividades administrativas como:

- Revisión de documentación contractual.
- Revisión de Anexo técnico.
- Requerimientos mediante oficios.
- Respuestas a requerimientos de Secretaría Distrital de Movilidad e Interventoría,
- Asistencia a comités técnicos y mesas de trabajo y revisión de acta de comité.
- Asistencia comités de representantes legales.
- Entrega y firma de planillas de implementación señalización horizontal y vertical.
- Atención a las solicitudes de Interventoría y la Secretaría Distrital de Movilidad, en desarrollo del objeto del contrato vigilado.
- Entrega financiera del contrato de obra

24.2 ASPECTO JURIDICO

En el primer mes de ejecución del contrato comprendido entre el periodo del 24 de noviembre al 23 de diciembre del 2025 se realizaron actividades jurídicas como
:

- Ejecución del Contrato de Obra dentro del plazo, montos, calidades y demás términos establecidos para el mismo.
- Solicitudes de reclamaciones por parte de la interventoría.
- No se generaron reclamaciones por parte del contratista .
- No se generaron requerimientos de suspensión o prórroga del contrato de obra.

24. PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO

Estas planillas se encuentran en el Anexo 11, Gestión SST, anexos, anexo A Seguridad Social.

25. CERTIFICACIÓN SALARIOS Y HONORARIOS

Esta certificación se encuentra en el Anexo 12 Certificación salarios y honorarios.

26. LISTADO DE PROVEEDORES

La Unión Temporal cuenta con los siguientes proveedores:

- Pintuflex :Pintura en plástico en frio metilmetacrilato (spray) :
- Ecotraffic: Pintura de plástico en frio metilmetacrilato (llana)
- Ecotraffic: Imprimante acrílico negro

27. CERTIFICACIÓN PAGOS PROVEEDORES

Esta certificación se encuentra en el Anexo 13 Certificación pago proveedores.

28. ESTADO PRESUPUESTAL

28.1 RESUMEN CUENTA 11

Tabla 13 Cantidades ejecutadas por ID

No	Corredor / Diseños	Localidad	Valor Presupuestado	Valor Ejecutado	% Ejecutado
1	Suministro 3 SDM IDU	NA	$ 17.812.334,00	$ 17.812.334,00	100,00%
2	Suministro 11 SP/SR, COLTANQUES	NA	$ 17.812.334,00	$ 6.155.838,00	34,56%
3	Suministro 12 SITP	NA	$ 17.812.334,00	$ 9.397.833,00	52,76%
4	EX_04_030_1561_10	San Cristóbal	$ 888.788.852,71	$ 88.023.748,40	9,90%
5	Suministro 4 SDM SR-30	NA	$ 28.089,00	$ 693.508,00	2468,97%
TOTAL			**$ 942.253.944**	**$ 122.083.261**	


GEO APROPADA C10	$	172.858.163
GEO SIN APROBAR C11	$	13.203.562
VALOR X COBRAR	**$**	**281.737.862**

En el Anexo 14 se encuentran las planillas de obra, acta parcial de obra y suministro.

28.2 AVANCE PARCIAL

A continuación , se presenta el avance parcial y acumulado respecto al mes de ejecución, en proporción con los porcentajes mínimos establecidos para ejecutar de acuerdo con lo estipulado por la interventoría, el cual representa un valor de **2,76%** del valor total del contrato, lo ejecutado en este periodo equivale al **1,50 %** lo que indica que se está por encima de la curva de ejecución en un **8,24%**

Gráfica 1 Gráfica Curva S

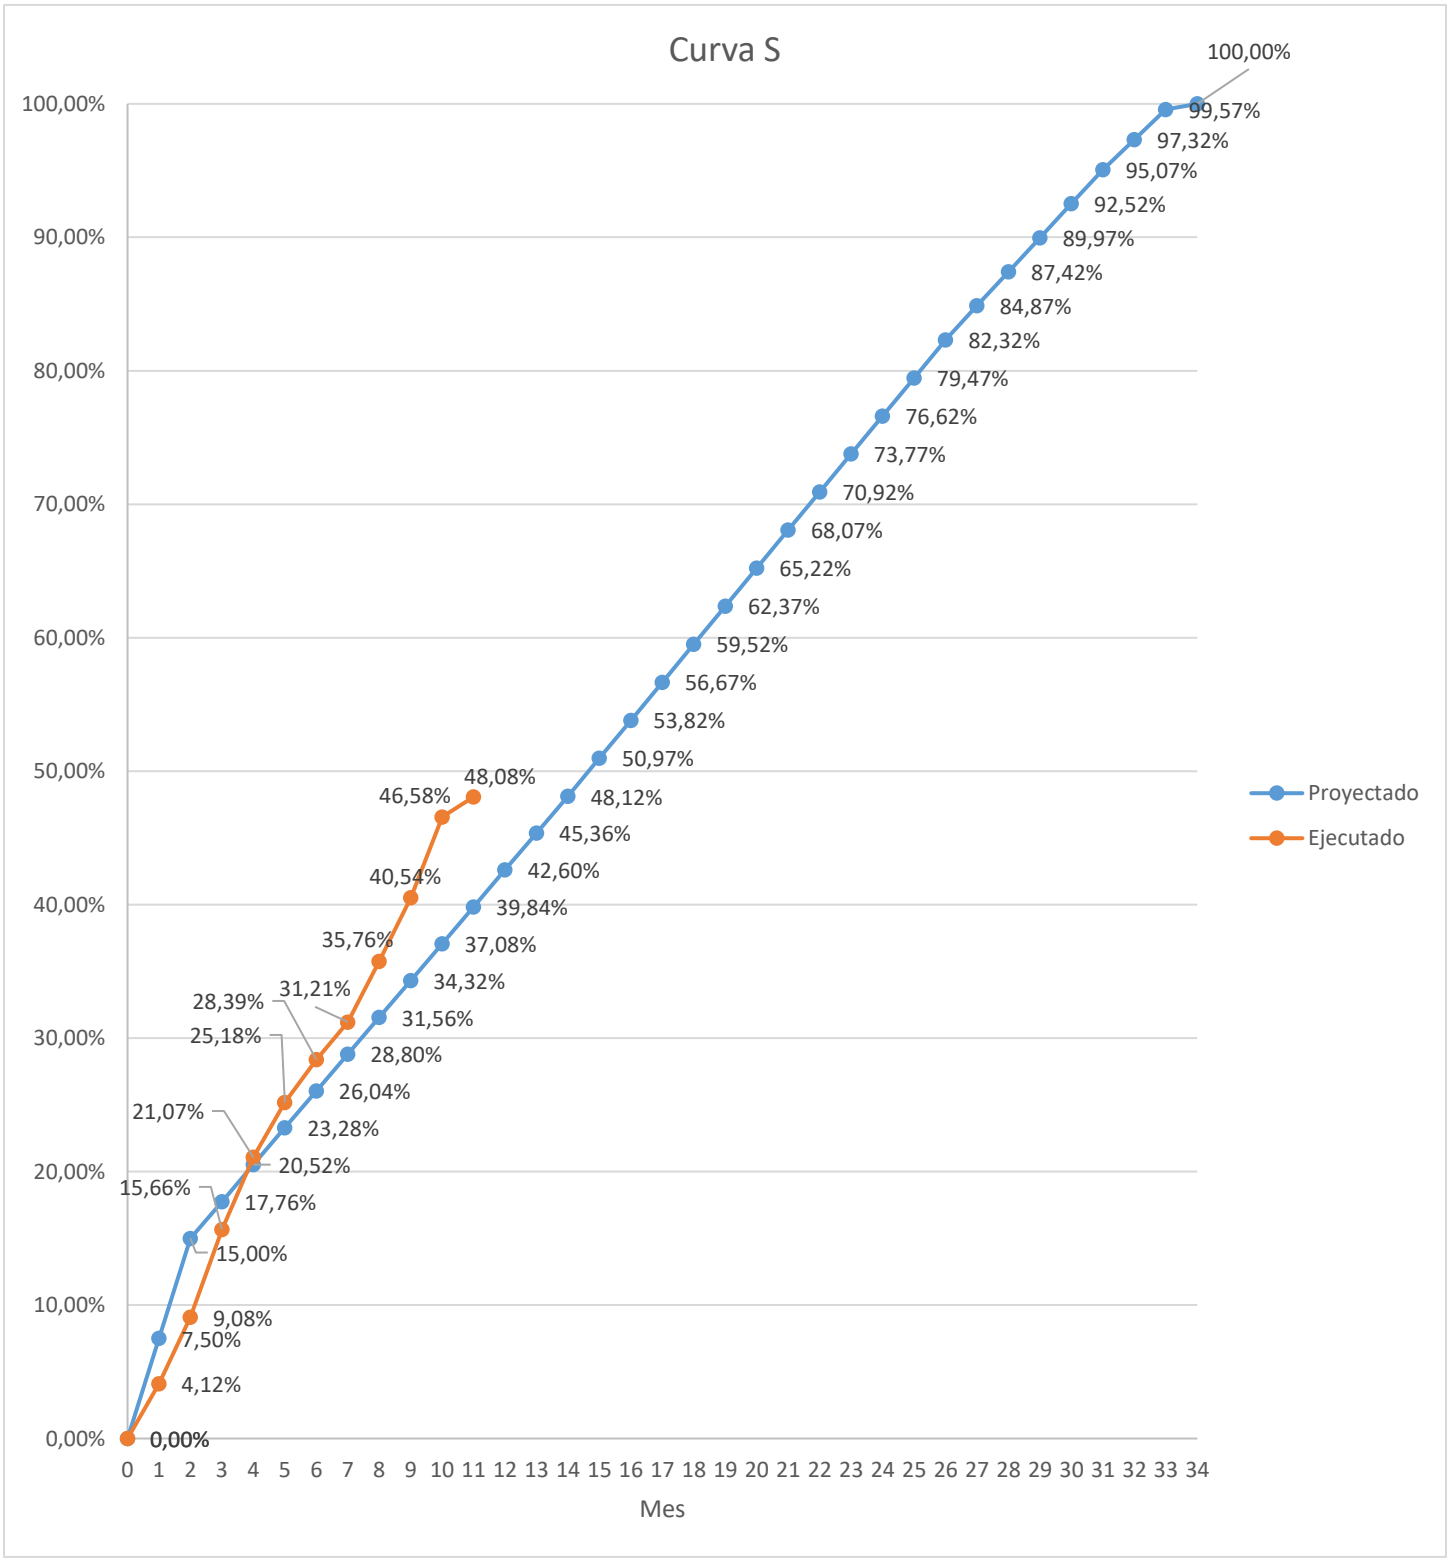

28.3 BALANCE PRESUPUESTAL

Tabla 14 Balance presupuestal

VALOR VIGENCIA 2024	$	2.815.721.000,00
VALOR VIGENCIA 2025	$	6.209.487.857,00
VALOR VIGENCIA 2026	$	6.423.895.143,00
VALOR VIGENCIA 2027	$	3.322.369.428,00
VALOR TOTAL	**$**	**18.771.473.428,00**

Pagos Efectuados	Periodo	Costos Directos	AIU	Suministro	Valor Total Acta	Retegarantía 5%	Total, a Girar	Estado
Cuenta 1	24 de febrero 23 de marzo de 2025	$ 518.247.080,00	$ 165.839.066,00	$ 88.935.514,00	$ 773.021.660,00	$ 38.651.083,00	$ 734.370.577,00	PAGO
Cuenta 1	24 de febrero 23 de marzo de 2025	$ 669.831.615,05	$ 214.346.116,81	$ 47.682.975,00	$ 931.860.707	$ 46.593.035,00	$ 885.267.671,86	PAGO
Cuenta 3	24 de marzo 23 de abril de 2025	$ 935.014.969,90	$ 299.204.790,37		$ 1.234.219.760	$ 61.710.988,00	$ 1.172.508.772,26	PAGO
Cuenta 4	24 de abril 23 de mayo de 2025	$ 770.290.040,60	$ 246.492.812,99		$ 1.016.782.854	$ 50.839.143,00	$ 965.943.710,59	PAGO
Cuenta 5	24 de mayo a 23 de junio de 2025	$ 583.227.126,05	$ 186.632.680,34		$ 769.859.806	$ 38.492.990,00	$ 731.366.816,38	PAGO
Cuenta 6	24 de junio a 23 de julio de 2025	$ 456.710.661,60	$ 146.147.411,71		$ 602.858.073	$ 30.142.904,00	$ 572.715.169,31	PAGO

Pagos Efectuados	Periodo	Costos Directos	AIU	Suministro	Valor Total Acta	Retegarantía 5%	Total, a Girar	Estado
Cuenta 7	24 de julio a 23 de agosto de 2025	$ 401.305.466,12	$ 128.417.749,16		$ 529.723.215	$ 26.486.161,00	$ 503.237.054,27	PAGO
Cuenta 8	24 de agosto a 23 de septiembre de 2025	$ 579.980.185,61	$ 185.593.659,39	$ 87.952.800,00	$ 853.526.645	$ 42.676.332,00	$ 810.850.313,00	PAGO
Cuenta 9	24 de septiembre 23 de octubre de 2025	$ 680.043.365,15	$ 217.613.876,85		$ 897.657.242	$ 44.882.862,00	$ 852.774.380,00	PAGO
Cuenta 10	24 de octubre 23 de noviembre de 2025	$ 859.061.386,12	$ 274.899.643,56		$ 1.133.961.030	$ 56.698.051,00	$ 1.077.262.978,68	PAGO
Cuenta 11	24 de noviembre 23 de diciembre de 2025	$ 213.437.774,54	$ 68.300.087,85		$ 281.737.862	$ 14.086.893,00	$ 267.650.969,39	EN TRAMITE
TOTAL		**$ 6.667.149.670,72**	**$ 2.133.487.895,03**		**$ 9.025.208.854,75**	**$ 451.260.442,00**	**$ 8.573.948.412,75**	

TOTAL, FACTURADO ACTA No 11	$	281.737.862
TOTAL FACTURADO , ACUMULADO	$	9.025.208.855
SALDO POR FACTURAR	**$**	**9.746.264.573**

29. PUNTAJE

Esta información se encuentra en el Anexo 15. Puntaje.

30. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se presenta un avance del 8,24% en la ejecución respecto a lo solicitado en el anexo técnico, sin embargo, se informa que en este noveno mes las condiciones climáticas no fueron favorables lo cual tiene una incidencia directa en la ejecución de actividades.

- Para la cuenta 1 se tienen 9 ID's, los 9 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 2 se tienen 6 ID's, 6 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 3 se tienen 11 ID's, 11 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 4 se tienen 15 ID's, 15 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 5 se tienen 17 ID's, 17 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 6 se tienen 9 ID's, 9 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 7 se tienen 12 ID's, 12 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 8 se tienen 21 ID's, 21 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 9 se tienen 9 ID's, 9 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 10 se tienen 11 ID's, 9 están APROBADOS por SDM, 1 en revisión de SDM y 1 en revisión de Interventoría.
- Para la cuenta 11 se tiene 1 ID en desarrollo de georreferenciación.

31. ANEXOS

ANEXO 1. Pólizas

ANEXO 2. Plan de Manejo de Tránsito

ANEXO 3. Aspectos Técnicos

ANEXO 4. Consultas Reservas

ANEXO 5. Plan de Calidad

ANEXO 6. Protocolo de Manejos y Residuos

ANEXO 7. Acta de entrega a almacén

ANEXO 8. Certificados de calibración

ANEXO 9. Señales retiradas en vía

ANEXO 10. Gestión social

ANEXO 11. Gestión seguridad y salud en el trabajo

ANEXO 12. Certificación honorarios y parafiscales

ANEXO 13. Certificación pago de proveedores

ANEXO 14. Balance presupuestal

ANEXO 15. Puntaje
