ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

BOGOTÁ

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ZONA SUR ORIENTE

CTO SDM 2024-3653

INFORME MENSUAL No. 12

24 DE DICIEMBRE A 23 DE ENERO DE 2026

UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024



ENERO 2026

ICOVÍAS INGENIERIA VIAL S.A.S.
UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
DISEÑÓ Y APROBÓ	Luis Fernando Rubiano Barrero	Director De Proyecto MSc. Planeación de Transporte e Ingeniería	
REALIZÓ	Alba Avendaño Cipagauta	Coordinadora	

INTERVENTORÍA JOYCO S.A.S

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	Ing. Sergio Valderrama Camargo	Director de interventoría	
APROBÓ	Ing. Julián Álvarez	Residente de interventoría	

MODIFICACIONES		

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
2.1 LOCALIZACIÓN 7
3. PERIODO DE REPORTE 9
4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE/EN ACTUALIZACIÓN) 10
5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 11
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 15
6.1 HORIZONTAL 15
6.2 VERTICAL 22
7. PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO 25
8. ASPECTOS TÉCNICOS 34
9. ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES 36
10. PLAN DE CALIDAD 37
11. PROTOCOLO DE MANEJOS DE RESIDUOS 38
12. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CORREDORES 39
13. REPORTE ESTADISTICO 40
13.1 EJECUCIÓN POR COMPONENTE 40
13.2 ZONAS ESCOLARES 40
14. CERTFICADOS DE CALIBRACIÓN, FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ESTADO DE LOS EQUIPOS 48
15. SEÑALIZACIÓN ENTREGADA A ALMACÉN 49
16. REPORTE DE SEÑALIZACIÓN RETIRADA EN VÍA Y ENTREGADA A ALMACÉN 53
17. ASPECTOS VARIOS 54
18. RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CONTRATO DE OBRA 58

18.1 PERSONAL 58
18.2 EQUIPO 58
18.3 INSTRUMENTOS USADOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 58
19. VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE. 60
20. VINCULACIÓN DE PORCENTAJE DE MUJERES. 61
21. FACTOR SOCIAL 62
22. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 63
23. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 64
24. PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO 65
25. CERTIFICACIÓN SALARIOS Y HONORARIOS 66
26. LISTADO DE PROVEEDORES 67
27. CERTIFICACIÓN PAGOS PROVEEDORES 68
28. ESTADO PRESUPUESTAL 69
29. PUNTAJE 74
30. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 75
31. ANEXOS 76

Gráfica 1 Gráfica Curva S 70

Ilustración 1 Localización Zona 7 8
Ilustración 2 Precipitación mes de enero 35

Tabla de contenido (Tablas)

Tabla 1 Datos generales del Contrato 7
Tabla 2 UPZ localidades asignadas 8

Tabla 3 Vigencia Pólizas CTO 2024-3563 10
Tabla 4 Diseños Asignados para Implementación 11
Tabla 5 PMTs solicitados cuenta 10 25
Tabla 6 Inspecciones realizadas 34
Tabla 7 Actividades por componente 40
Tabla 8 Zonas Escolares Intervenidas 40
Tabla 9 Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados 49
Tabla 10 Estado Georeferenciación 54
Tabla 11 Personal mínimo 58
Tabla 12 Equipos empleados para la ejecución de las actividades 58
Tabla 13 Cantidades ejecutadas por ID 69
Tabla 14 Balance presupuestal 71

1. INTRODUCCIÓN

Con el propósito de atender las necesidades de señalización de la ciudad de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, como autoridad de tránsito y en cumplimiento de sus funciones establecidas por el Decreto 672 del 22 de ENERO de 2018[1], se encarga de ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la señalización vertical y horizontal de la ciudad, así como los demás elementos y dispositivos que propendan por garantizar la seguridad vial, el buen uso del espacio público y la gestión del tránsito en la ciudad.

Es así que la SDM generó un programa para implementar las medidas necesarias y realizar el mantenimiento rutinario y correctivo de la señalización de la ciudad, que incluye la señalización de ciclorrutas, medidas de gestión, carriles preferenciales, carriles de alta ocupación vehicular, proyectos de urbanismo táctico, plazas, corredores verdes, distritos verdes, barrios vitales y mantener en condiciones óptimas de señalización para todos los usuarios de la vía; integrando por grupos las veinte (20) localidades y dividiendo el perímetro urbano y rural en siete (7) zonas y en catorce (14) corredores principales.

En marco de este programa la SDM celebro el contrato SDM-2024-3653 con la firma Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024, el cual tiene por objeto "*Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. Zona Sur Oriente*", para la atención integral de las actividades de implementación de señalización, donde se incluye el suministro e instalación de la señalización vertical de pedestal, la aplicación de señalización horizontal y la implementación de otros dispositivos de señalización horizontal en la malla vial de las localidad de Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar y y en los corredores de la Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Via al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano), o en las zonas diferentes a la asignada en la ciudad, de acuerdo a la definición de puntos o actividades a desarrollarse que establezca el comité técnico.

En el siguiente informe mensual No 12, se presenta un resumen sobre las principales actividades de señalización vertical, horizontal e implementación y/o suministro de dispositivos viales, realizadas por la Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024, durante el periodo 24 de diciembre del 2025 al 23 de enero de 2026, en cumplimiento de los compromisos contractuales del contrato de obra SDM-2024-3653.

[1] "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital, de Movilidad y se dictan otras disposiciones"

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Datos generales del Contrato

Número de Contrato de Obra	SDM 2024-3653
Objeto del Contrato	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. – ZONA SUR ORIENTE"
Contratante:	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Contratista	UT ECOSEÑALIZACION 2024
Plazo de ejecución:	34 meses
Fecha de acta de Inicio:	24 de enero 2025
Fecha de Terminación:	23 de noviembre del 2027
Valor Inicial:	$18.771.473.428
Adición 1	$ 1.482.594.137
Valor Total	$ 20.254.067.385
Lugar de Ejecución	Bogotá D.C., Localidades: San Cristobal, Usme y Sumapaz, Corredores de Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Via al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano)
Interventoría:	JOYCO S.A.S BIC
Número de Contrato de Interventoría	SDM 2024-3668

Fuente: Elaboración propia

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C., y se concentra en la Zona 7 Sur Oriente , conformada por las localidades : San Cristobal, Usme y Sumapaz , también se ejecutarán actividades en los corredores asignados Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Vía al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano) como se muestra en la siguiente figura:

Ilustración 1 Localización Zona 7



Fuente: Elaboración propia a partir de imagen en internet

Estas localidades se encuentran conformadas por las siguientes Unidades de Planificación Zonal UPZ:

Tabla 2 UPZ localidades asignadas

4. San Cristóbal	5. Usme	20. Sumapaz
32 San Blas 33 Sosiego 34. 20 de Julio 50. La Gloria 51 Los Libertadores	52 La Flora 56 Danubio 57 Gran Yomasa 58 Comuneros 59 Alfonso Lopez 60 Parque Entre Nubes	Rio Blanco Río Sumapaz

Fuente: Elaboración propia

3. PERIODO DE REPORTE

Este informe presenta el detalle de las actividades de señalización horizontal, señalización vertical e Instalación de dispositivos de tránsito y/o elementos canalizadores del tráfico, realizadas por la Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024 en cumplimiento del Contrato SDM-2024-3653, para el periodo del 24 de diciembre del 2025 al 23 de enero de 2026.

4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE/EN ACTUALIZACIÓN)

Una vez firmada el Acta de Inicio No. SDM 2024-3653 (del 24 de enero de 2025), entre la Unión Temporal Ecoseñalización 2024 y la SDM, se remitieron las pólizas emitidas por parte de la compañía de seguros Mundial de Seguros a la Entidad, conforme las exigencias establecidas en el contrato, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la SDM.

En el mes de mayo se presentaron observaciones a algunos amparos que cubren estas pólizas, las mismas fueron atendidas y ya cuentan con aprobación por parte de la SDM.

El 29 de diciembre de 2025 se aprueba la adición 1 y se entregan las pólizas actualizadas con esta Adición)

La ejecución de este contrato está amparada por las siguientes pólizas (las cuales se presentan en el Anexo 1. Pólizas) que cubren los respectivos riesgos.:

Tabla 3 Vigencia Pólizas CTO 2024-3563

Amparos Firma del Contrato	Porcentaje	Valor	Vigencia	
			Inicio	Vencimiento
Cumplimiento	(30% sobre el valor del contrato)	$6.076.220.269.5	27-12-2024	27-05-2030
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	(__% sobre el valor del anticipo)			
Calidad del Servicio Ofrecido	(30% sobre el valor del contrato)	$6.076.220.269.5	27-12-2024	27-05-2030
Estabilidad y Calidad de la Obra	(30% sobre el valor del contrato)	$6.076.220.269.5	27-12-2024	27-05-2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	(20% sobre el valor del contrato)	$4.050.813.513	27-12-2024	27-11-2030
Responsabilidad Civil Extracontractual	(30% sobre el valor del contrato)	$6.076.220.269.5	27-12-2024	24-11-2030

Fuente: Elaboración propia

5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta los Identificadores de Diseño (ID) asignados, en la siguiente tabla se expone el estado de los diseños entregados para implementación:

Tabla 4 Diseños Asignados para Implementación

No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
1	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3	29/01/2025	USME	EJECUTADO
2	MV_05_122_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
3	EX_05_119_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
4	EX_05_93_1244_11	29/01/2025	USME	EJECUTADO
5	EX_05_110_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
6	EX_05_053_1744_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
7	EX_05_108_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
8	EX_05_003_1073_24	29/01/2025	USME	EJECUTADO
9	EX_05_113_1867_12	29/01/2025	USME	EJECUTADO
10	EX_05_005_1073_24	29/01/2025	USME	EJECUTADO
11	EX_05_004_1073_24	29/01/2025	USME	NO SE EJECUTA
12	EX_04_261_1561_10	29/01/2025	SAN CRISTOBAL	NO SE EJECUTA
13	EX_05_352_1561_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
14	EX_05_101_1244_11	29/01/2025	USME	EJECUTADO
15	EX_05_002_1073_24	29/01/2025	USME	NO SE EJECUTA
16	EX_05_006_1744_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
17	EX_05_001_1073_24	29/01/2025	USME	EJECUTADO
18	EX_05_280_1561_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
19	EX_05_007_1073_24	29/01/2025	USME	NO SE EJECUTA
20	EX_05_007_1445_14	29/01/2025	USME	NO SE EJECUTA
21	EX_05_310_1561_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
22	EX_05_307_1561_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
23	EX_05_008_1073_24	29/01/2025	USME	EJECUTADO
24	MV_20_526_943_10	29/01/2025	SUMAPAZ	NO SE EJECUTA
25	MV_20_025_670_11	29/01/2025	SUMAPAZ	NO SE EJECUTA
26	MV_20_021_670_11	29/01/2025	SUMAPAZ	NO SE EJECUTA
27	SH_SV_PUNTO4_TMSA_V1	10/02/2025	USME	EJECUTADO
28	SDM-202461204315912 Y SDM-202461204636702	14/02/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
29	SDM-202461204158462	14/02/2025	USME	EJECUTADO
30	SDM- 202461203879272	14/02/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
31	SDM- 202461204426482	14/02/2025	SUMAPAZ	EJECUTADO
32	SDM-202561200270682	14/02/2025	USME	EJECUTADO
33	SUMINISTRO 1	18/02/2025	NA	EJECUTADO
34	SDM-202461204137592	20/02/2025	USME	EJECUTADO
35	ASIGNACIÓN CP Reposición de Hitos Ciclorrutas	21/03/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO

No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
37	CP 202561200744162 RETIRO DE SEÑAL	8/04/2025	USME	EJECUTADO
38	CP-202561200703942	8/04/2025	USME	EJECUTADO
39	CP COLEGIO FLORENTINO Y FRANCISCO JOSE	14/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
40	IMPLEMENTACION PMT de EMERGENCIA AV LOS CERROS	14/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
41	CP Carrera 6 entre Calle 24 Sur y Av. Primero de Mayo.	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
42	CP Carrera 4 entre Av. Primero de Mayo y Calle 19A Sur Calle 19A Sur entre Carrera 6 y Carrera 5A.	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
43	CP Av. Primero de Mayo entre Carrera 9A y Carrera 1B	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
44	SIRE 5453567	6/05/2025	USME	EJECUTADO
45	CP AV BOYACA - TV 3 F (TRAMO SUR-NORTE; NORTE-SUR)	8/05/2025	USME	EJECUTADO
46	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561201777022	6/06/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
47	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561201795562	13/06/2025	USME	EJECUTADO
48	CP BIKE BOX CARACAS	14/06/2025	USME	EJECUTADO
49	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202098412	3/07/2025	USME	EJECUTADO
50	SUMINISTRO IDIPRON SI-35	7/07/2025	N/A	EJECUTADO
51	SDM-202561202230222	15/07/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
52	SUMINISTRO IDIPRON SI-35 Y DUPLEX	17/07/2025	N/A	EJECUTADO
53	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202378942	24/07/2025	USME	EJECUTADO
54	PMT DE EMERGENCIA Evento SIRE-5456812	24/07/2025	USME	EJECUTADO
55	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202286462	24/07/2025	USME	EJECUTADO
56	SUMINISTRO IDIPRON SR-28/ PLAQUETA	29/07/2025	N/A	EJECUTADO
57	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202284382	4/08/2025	USME	EJECUTADO
58	CP PASACALLES AV BOYACÁ	5/08/2025	FONTIBON	EJECUTADO
59	SUMINISTRO IDIPRON SR-17	13/08/2025	N/A	EJECUTADO
61	CP COLEGIO NUEVA ROMA	15/08/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
61	SUMINISTRO IDIPRON SI-35, SR-30	20/08/2025	N/A	EJECUTADO
62	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202379632	20/08/2025	USME	EJECUTADO

No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
63	CP BARRIO LA MARIA	20/08/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
64	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202439322	29/08/2025	USME	EJECUTADO
65	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202657962	29/08/2025	USME	EJECUTADO
66	EX_04_030_1561_10	2/09/2025	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
67	EX_04_051_414_11_V2	2/09/2025	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
68	EX_04_241_1561_10_V9	2/09/2025	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
69	EX_04_488_826_10_V7	2/09/2025	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
70	MV_05_99_1244_11_V3	2/09/2025	USME	NO SE EJECUTA
71	EX_05_213_1561_10_V5	2/09/2025	USME	EN EJECUCIÓN
72	EX_05_286_1561_10_V3	2/09/2025	USME	EN EJECUCIÓN
73	SUMINISTRO MALETINES	3/09/2025	N/A	EJECUTADO
74	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561202584052 y SDM-202561202664192	4/09/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
75	CP_05_1524	9/09/2025	USME	EN EJECUCIÓN
76	SUMINISTRO IDIPRON SI-35, SR-30	9/09/2025	N/A	EJECUTADO
77	CP-05-1631	15/09/2025	USME	INSPECCIONADO
78	CP_04_1627	22/09/2025	USME	INSPECCIONADO
79	CP_04_1625	22/09/2025	USME	INSPECCIONADO
80	SUMINISTRO IDIPRON SR-06	25/09/2025	N/A	EJECUTADO
81	SUMINISTRO IDIPRON SI-35, SR-30	25/09/2025	N/A	EJECUTADO
82	PÉNDONES AK 7	25/09/2025	VARIAS	INSPECCIONADO
83	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561203372182	29/09/2025	USME	INSPECCIONADO
84	CP_04_1630	30/09/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
85	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561203329962 –DI -22669 - CL 111 Sur Quebrada Mediania (VIA AL LLANO)	1/10/2025	USME	EJECUTADO
86	CP_05_1669	7/10/2025	USME	EJECUTADO
87	CP_05_1670	7/10/2025	USME	EJECUTADO
88	CP_05_1671	7/10/2025	USME	EJECUTADO
89	CP_05_1672	7/10/2025	USME	EJECUTADO
90	CP_05_1673	7/10/2025	USME	EJECUTADO
91	CP_05_1674	7/10/2025	USME	EJECUTADO
92	CP_05_1646	7/10/2025	USME	EJECUTADO
93	CP_05_1647	7/10/2025	USME	EJECUTADO
94	CP_05_1648	7/10/2025	USME	EJECUTADO
95	CP_04_1594	9/10/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
96	CP_05_1690	9/10/2025	USME	EJECUTADO
97	CP_ AK 10X CL 13 SUR	9/10/2025	USME	NO SE EJECUTA

No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
98	CP_ AUTOPISTA AL LLANO X 91 SUR	9/10/2025	USME	EJECUTADO
99	Suministro Idipron Sp-48, Sr-plaqueta (9)	9/10/2025	NA	EJECUTADO
100	CP_05_1693	16/10/2025	USME	EJECUTADO
101	Suministro Idipron (10). SI-35	17/10/2025	NA	EJECUTADO
102	Ciclorruta AC75 entre AV boyacá y Kr 76	22/10/2025	ENGATIVÁ	NO SE EJECUTA
103	Suministro SDM (3), EJE AMBIENTAL	27/10/2025	NA	EJECUTADO
104	Suministro Idipron Coltanques (11)	30/10/2025	NA	EJECUTADO
105	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561203642132	30/10/2025	USME	EJECUTADO
106	Diseño Proyecto Zona Rosa	5/11/2025	CHAPINERO	INSPECCIONADO
107	CP Av Boyacá con KR 14I	11/11/2025	USME	EN EJECUCIÓN
108	Diseño Proyecto Zona Rosa Fase II	12/11/2025	CHAPINERO	INSPECCIONADO
109	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561203802572	19/11/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
110	Suministro SDM tableros (4)	19/11/2025	NA	EJECUTADO
111	CP_05_1678	25/11/2025	USME	SUSPENDIDO
112	Suminitros Idipron SITP Vereda el Hato - PERSONERIA (Memorando STP-202522100235523) (12)	1/12/2025	NA	EJECUTADO
113	CP_04_1771	17/12/2025	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
114	CP - SDQS 6495012025	2/01/2026	USME	INSPECCIONADO
115	EX_04_044_1561_10	7/01/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
116	EX_04_263_1561_10	7/01/2026	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
117	EX_04_125_1867_12	7/01/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
118	EX_05_004_1073_24	7/01/2026	USME	EN EJECUCIÓN
119	CP- Rad. 202561204421652	19/01/2026	USME	INSPECCIONADO
120	CP-04-1703 SDQS-5109132025	19/01/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
121	CP_04_1868-SDQS-6847412025	19/01/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
122	SDM-202561204690292	20/01/2026	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO

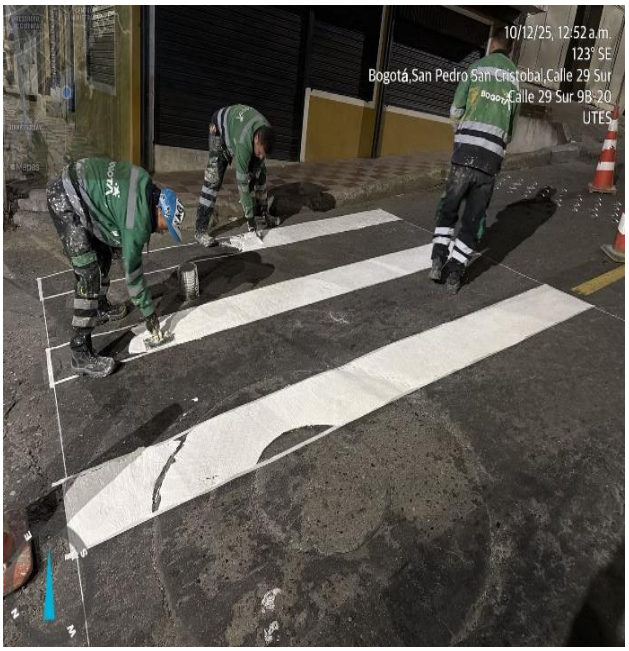
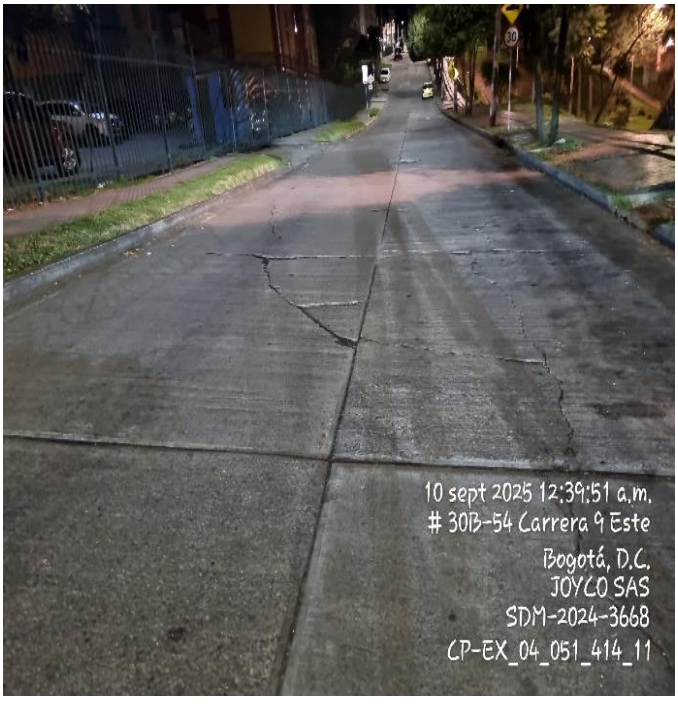
Fuente: Elaboración propia

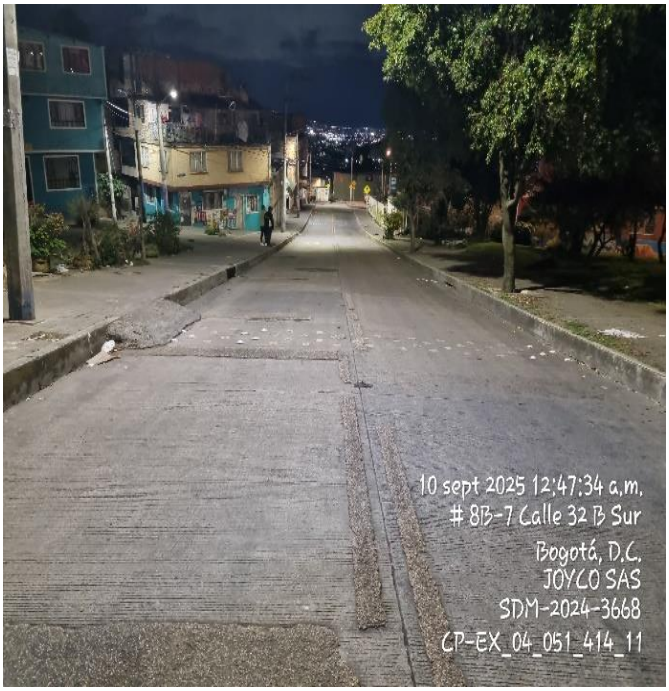
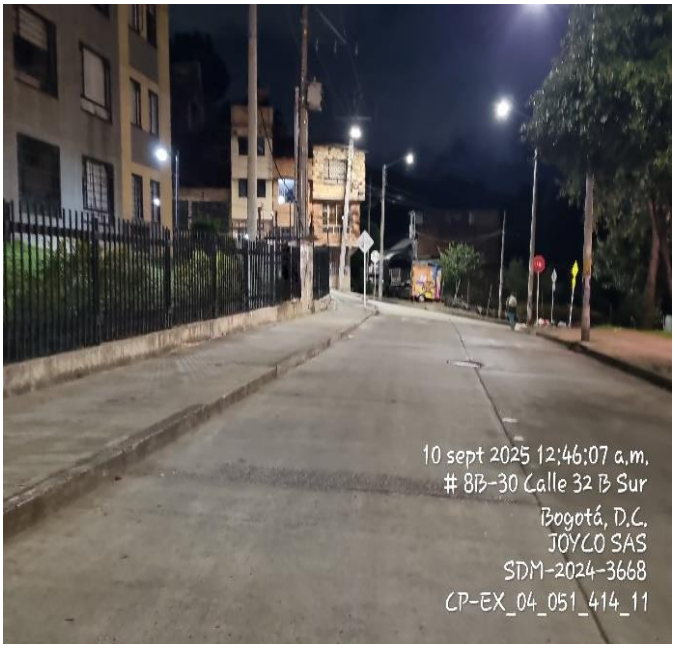
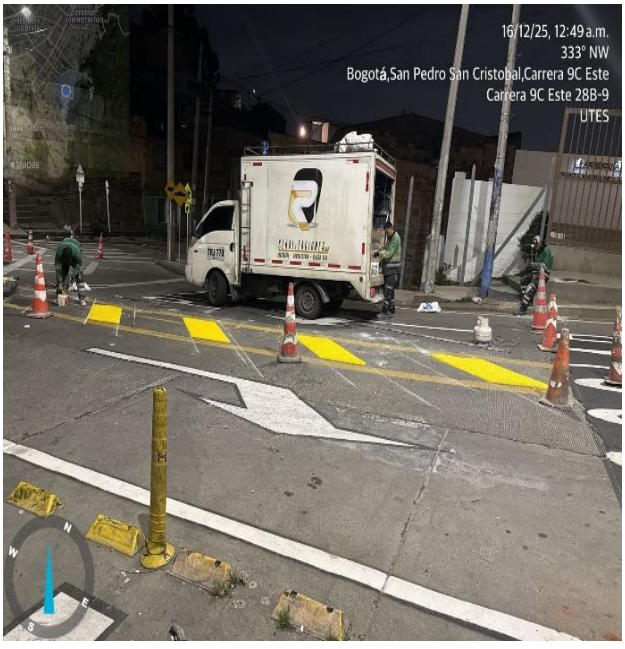
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

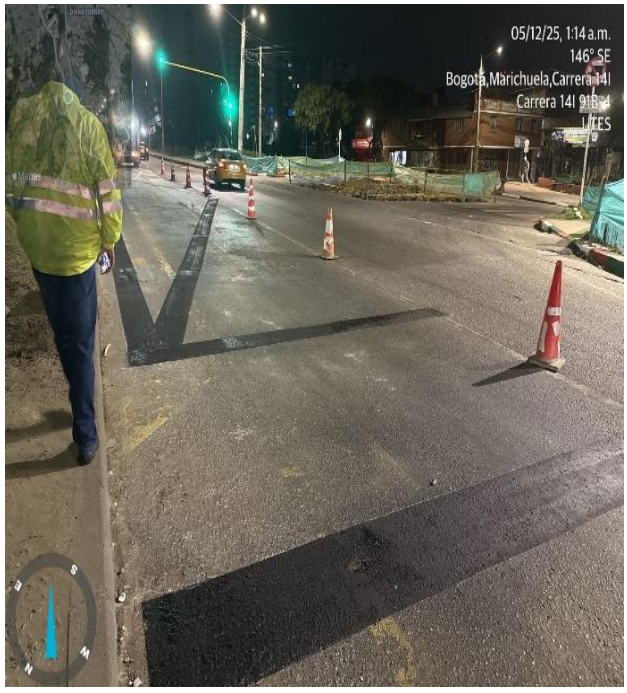
6.1 HORIZONTAL

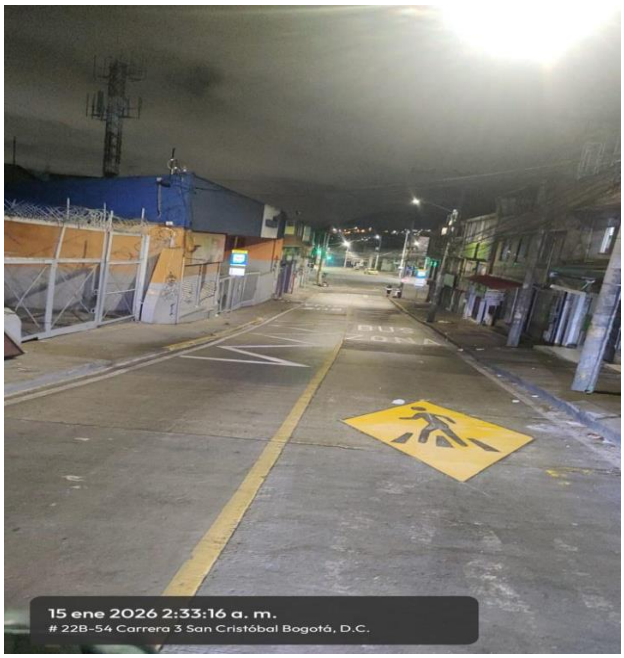
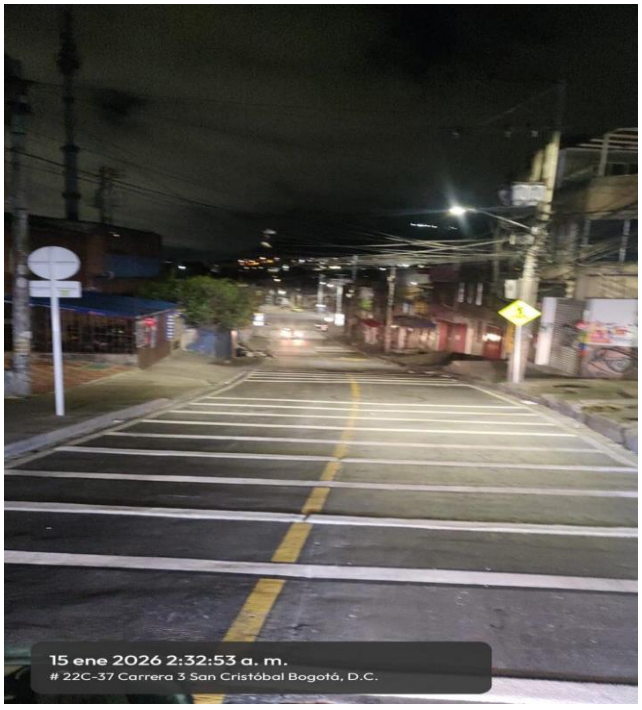
EX_04_030_1561_10	
ANTES	**DESPUÉS**
AK 6 CL 23	
	
KR 7 CL 23	
	

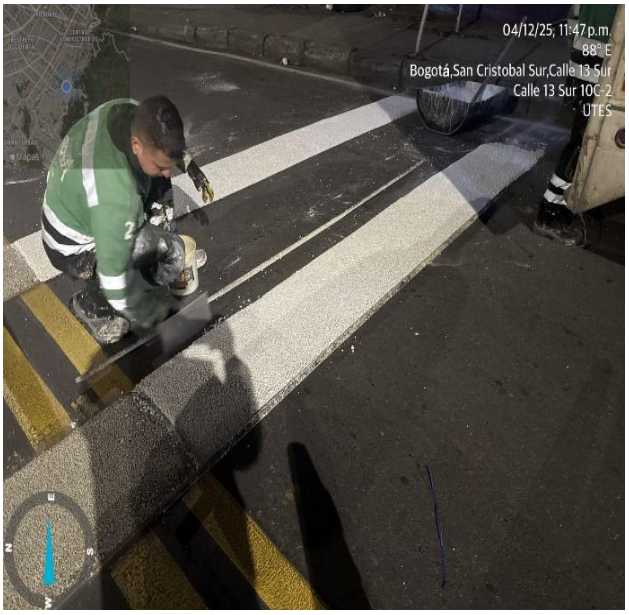
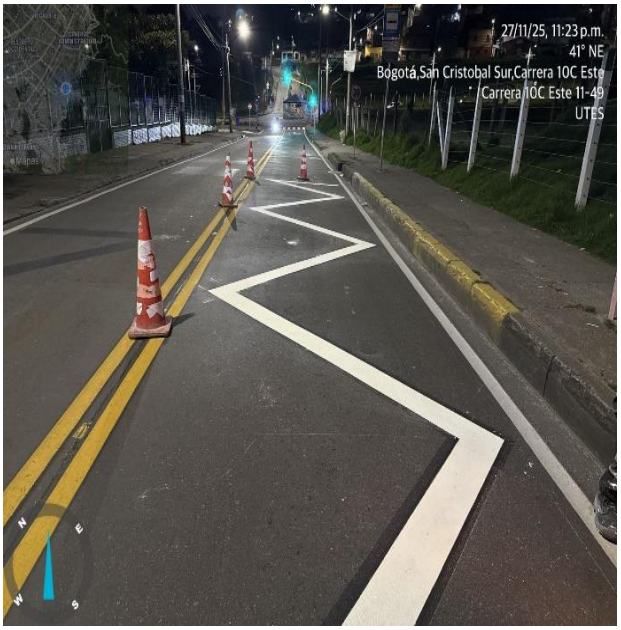
CL 1 SUR KR 7	
	
AK 6 CL 45	
	

EX_04_051_414_11	
ANTES	**DESPUÉS**
CL 29 SUR KR 9B	
	
KR 9B ESTE CL 28B SUR	
	

KR 9C ESTE CL 28C	
	
KR 9C ESTE CL 28B	
	

CP_AV_BOYACA_KR 14I	
ANTES	**DESPUÉS**
AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 14I	
	
AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 14I	
	

CP_04_1627	
ANTES	**DESPUÉS**
KR 3 CL 22	
	
KR 3 CL 22	
	

CP_04_1630	
ANTES	**DESPUÉS**
KR 10C ESTE CL 13 SUR	
	
KR 10C ESTE CL 11	
	

6.2 VERTICAL

EX_05_213_1561	
USME	
	
	


6 ene 2026 10:13:47 a.m.


PARE
6 ene 2026 11:48:17 a.m.
4B-5 Calle 84C Sur
Usme
Bogotá, D.C.


30
6 ene 2026 10:08:08 a.m.
4A-3 Calle 84C Sur
Usme
Bogotá, D.C.


30
6 ene 2026 11:36:34 a.m.
3A-29 Calle 84C Sur
Usme
Bogotá, D.C.


6 ene 2026 8:15:15 a.m.
6-47 Calle 84C Sur
Usme
Bogotá, D.C.


6 ene 2026 9:52:43 a.m
6-61 Calle 84C Su
Usme
Bogotá, D.C


5 ene 2026 10:03:50 a.m.
10D-9 Calle 81a Bis Sur
Usme


5 ene 2026 12:31:33 p.m.
81A-25 Carrera 10 Bis Este
Usme

7. PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

Respecto al Plan de Manejo (PMT) General, se radico en la interventoría el 17 de enero de 2025, a su vez la Interventoría remitió a la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito SPMT de la Secretaría Distrital de Movilidad con radicado SDM 202561200352442. Posteriormente la SPMT con oficio SPTM 202531200443941 del 04 de febrero de 2025, informo que "…una vez revisado el documento técnico y los esquemas típicos propuestos para el manejo de tráfico durante las actividades de demarcación e instalación de señalización vertical de la zona 7 localidades de Usme, San Cristóbal y Sumapaz,, mediante el contrato del asunto, se emite autorización a la propuesta…" e indica que la vigencia de la autorización es desde la fecha del comunicado hasta el 03 de febrero de 2026.

En el periodo de este informe del 24 de octubre al 23 de enero de 2026, se solicitaron y tramitaron los siguientes PMTs:

Tabla 5 PMTs solicitados cuenta 10

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
3	15/01/2026	1076	2000650	N/A	KR 13 CL 85	KR 13 CL 86A	ANDÉNES Y CALZADA	CHAPINERO	SI	16/01/2026	3/02/2026
3	15/01/2026	1077	5004006	5004619	CL 93 SUR AV CARACAS (KR 14)	CL 93 SUR KR 5	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1078	5004611	5004542	KR 5 CL 93 SUR	KR 5 CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1079	5004564	5003613	KR 8 CL 94A SUR	KR 8 CL 87A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1080	5003756	5004045	CL 89 SUR KR 8	CL 89 SUR TV 4C	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1081	5004012	5003822	DG 88 SUR TV 4C	DG 88 SUR TV 4	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1082	5003743	N/A	CL 87B SUR TV 4	CL 87B SUR TV 3A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1083	5003742	5004064	KR 10 CL 91 SUR	KR 10 CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1084	5004113	N/A	KR 10 CL 93 SUR	KR 10 CL 93A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1085	5004152	5004711	KR 10 CL 93A SUR	KR 10 CL 96BIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1086	5003581	N/A	KR 13 CL 91A SUR	KR 13 20m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1087	5003902	N/A	KR 13 CL 93 SUR	KR 13 15m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1088	5003778	5003633	KR 9 CL 91 SUR	KR 9 60m AL NORTE DE LA CL 90 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1089	5004680	5004324	KR 6 CL 93B SUR	KR 6 CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1090	5004140	N/A	KR 8C CL 93 SUR	KR 8C CL 92ABIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1091	5003908	5003749	KR 12 CL 92B SUR	KR 12 CL 91B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1092	5003957	5003909	CL 92B SUR KR 12	CL 92B SUR KR 13	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
3	15/01/2026	1093	5003946	N/A	CL 92C SUR KR 12	CL 92C SUR KR 13	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1094	50000624	50000625	KR 11 CL 91 SUR	KR 11 CL 91B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1095	30000742	30001326	CL 91A SUR KR 13	CL 91A SUR KR 11	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1096	5003685	N/A	CL 91B SUR KR 13	CL 91B SUR KR 12	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1097	5003772	N/A	CL 91B SUR KR 10	CL 91B SUR KR 11	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1098	5003750	5003819	CL 92 SUR KR 13	CL 92 SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1099	5003794	5003875	CL 92A SUR KR 13	CL 92A SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1100	5003851	5003927	CL 92ABIS SUR KR 13	CL 92ABIS SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1101	5004114	5004343	CL 93A SUR KR 13	CL 93A SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1102	5004153	5004385	CL 93ABIS SUR KR 13	CL 93ABIS SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1103	5004341	5004427	CL 93B SUR KR 10	CL 93B SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1104	5004387	5004506	CL 94 SUR KR 10	CL 94 SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1105	5004436	5004565	CL 94A SUR KR 10	CL 94A SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1106	5004435	5004206	KR 8C CL 94A SUR	KR 8C CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1107	5004484	5004681	CL 93B SUR KR 8	CL 93B SUR KR 6	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1108	5004188	N/A	CL 93B SUR AV CARACAS (KR 14)	CL 93B SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1109	5004249	N/A	CL 94 SUR KR 13	CL 94 SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1110	5004321	N/A	CL 94BIS SUR AV CARACAS (KR 14)	CL 94BIS SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1111	5004376	N/A	CL 94A SUR KR 13	CL 94A SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1112	5004432	N/A	CL 95 SUR KR 13	CL 95 SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1113	5004509	N/A	CL 95BIS SUR KR 13	CL 95BIS SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1114	5004577	N/A	CL 95A SUR KR 13	CL 95A SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
3	15/01/2026	1115	5004645	N/A	CL 96 SUR KR 13	CL 96 SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1116	5004666	N/A	CL 96BIS SUR KR 13	CL 96BIS SUR KR 12	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1117	5004749	N/A	KR 12 CL 96BIS SUR	KR 12 CL 96ASUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1118	5004750	N/A	CL 96A SUR KR 13	CL 96A SUR KR 12	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1119	5004570	5003993	KR 13 CL 96 SUR	KR 13 CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1120	5004088	N/A	KR 9B CL 93 SUR	KR 9B CL 92ABIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1121	5004183	N/A	KR 8B CL 93 SUR	KR 8B CL 92ABIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1122	5004223	N/A	KR 8A CL 93 SUR	KR 8A CL 92ABIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1123	5003971	N/A	CL 92ABIS SUR KR 10	CL 92ABIS SUR KR 9B	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1124	5004121	5004149	CL 92ABIS SUR KR 8B	CL 92ABIS SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1125	5004483	N/A	KR 7B CL 93B SUR	KR 7B CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1126	5004534	N/A	KR 7A CL 93B SUR	KR 7A CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1127	5004578	N/A	KR 7 CL 93B SUR	KR 7 CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1128	5004624	N/A	KR 6A CL 93 SUR	KR 6A 20m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1129	5004661	N/A	KR 7B CL 93B SUR	KR 7B 20m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1130	50005213	N/A	KR 7A CL 93B SUR	KR 7A 20m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1131	5004610	N/A	KR 7 CL 93B SUR	KR 7 20m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1132	5003981	N/A	CL 92A SUR KR 10	CL 92A SUR KR 9	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1133	5003931	N/A	CL 92 SUR KR 10	CL 92 SUR 25m AL ORIENTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1134	5003890	5004033	CL 91B SUR KR 10	CL 91B SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1135	5003768	5003837	CL 91A SUR KR 10	CL 91A SUR KR 9	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1136	5003802	N/A	KR 9A CL 91A SUR	KR 9A CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1137	5003836	5003889	KR 9 CL 91A SUR	KR 9 CL 91B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1138	5003917	N/A	KR 8C CL 91B SUR	KR 8C CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1139	5003949	N/A	KR 8B CL 91B SUR	KR 8B CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1140	5003990	N/A	KR 8A CL 91B SUR	KR 8A CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
3	15/01/2026	1141	5004388	5004106	KR 7 CL 93 SUR	KR 7 CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1142	5004423	5004275	KR 6A CL 93 SUR	KR 6A CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1143	5004526	5004367	KR 5C CL 93 SUR	KR 5C CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1144	5004566	5004404	KR 5B CL 93 SUR	KR 5B CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1145	5004620	5004437	KR 5A CL 93 SUR	KR 5A CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1146	5004276	5004492	CL 92A SUR KR 7	CL 92A SUR KR 5BIS	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1147	5004337	N/A	CL 92B SUR KR 8	CL 92B SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1148	5004285	N/A	CL 92ABIS SUR KR 8	CL 92ABIS SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1149	5004173	N/A	CL 92 SUR KR 8	CL 92 SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1150	5004139	N/A	CL 91B SUR KR 8	CL 91B SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1151	5004107	N/A	CL 91A SUR KR 8	CL 91A SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1152	5004038	N/A	KR 7A CL 91 SUR	KR 7A 25m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1153	5003995	N/A	KR 7B CL 91 SUR	KR 7B 25m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1154	50000675	N/A	KR 5BIS CL 91 SUR	KR 5BIS 25m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1155	5003587	N/A	KR 12 CL 91 SUR	KR 12 15m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1156	5003603	N/A	KR 11 CL 91 SUR	KR 11 25m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1157	5003653	N/A	KR 10 CL 91 SUR	KR 10 25m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1158	5003698	N/A	CL 89 SUR KR 8	CL 89 SUR 30m AL OCCIDENTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1159	5003741	N/A	CL 88B SUR KR 8	CL 88B 25m AL ORIENTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1160	5003687	N/A	CL 88A SUR KR 8	CL 88A 25m AL ORIENTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
3	15/01/2026	1161	5003646	N/A	CL 88 SUR KR 8	CL 88 SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	10/01/2026	24/01/2026
4	22/01/2026	1421	4000016	4000037	KR 8 CL 1	KR 8 CL 2A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	1422	4000078	4000105	KR 8 CL 2A SUR	KR 8 CL 7 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	1423	4000011	4000068	CL 1C SUR KR 8C	CL 1C SUR KR 7BIS	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	1424	4000138	4000169	KR 8 CL 8 SUR	KR 8 CL 10 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	1425	4000224	4000022	KR 7 CL 10 SUR	KR 7 CL 1	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	1426	5003604	30000741	CL 91 SUR KR 12	CL 91 SUR KR 5	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2174	4000130	N/A	KR 8 CL 7 SUR	KR 8 CL 8 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2175	4000061	4000044	KR 6 CL 1A SUR	KR 6 CL 1	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
4	22/01/2026	2176	4000007	4000003	KR 8C CL 1C SUR	KR 8C CL 1	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2177	4000008	N/A	CL 1C SUR KR 10	CL 1C SUR KR 8C	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2178	4000026	N/A	KR 8B CL 1C SUR	KR 8B CL 2A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2179	4000039	4000102	KR 8B CL 2A SUR	KR 8B CL 8 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2180	4000086	50005946	KR 6 CL 3 SUR	KR 6 CL 1A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2181	4000071	4000137	CL 7 SUR KR 10	CL 7 SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2182	4000103	4000167	CL 8 SUR KR 10	CL 8 SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2183	4000100	4000165	CL 8A SUR KR 10	CL 8A SUR KR 7A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2184	4000065	4000158	KR 8A CL 3 SUR	KR 8A CL 11 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2185	4000126	4000145	CL 10 SUR KR 10	CL 10 SUR KR 8A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2186	4000141	4000134	KR 9 CL 11 SUR	KR 9 CL 10 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2187	4007653	4000175	KR 7B CL 11 SUR	KR 7B CL 8A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2188	4000228	4000149	KR 7A CL 11 SUR	KR 7A CL 7 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2189	4000025	4007647	KR 7C CL 1 SUR	KR 7C CL 6 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2190	4000080	4000111	KR 7B CL 2 SUR	KR 7B CL 6 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2191	4000089	4000116	KR 7A CL 2 SUR	KR 7A CL 6 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2192	4000108	4000059	KR 7BIS KR 7A	KR 7BIS CL 1A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2193	4000112	4000123	CL 6 SUR KR 7C	CL 6 SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2194	4000036	4000079	CL 4 SUR KR 10	CL 4 SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2195	4000070	N/A	KR 9 CL 7 SUR	KR 9 CL 4 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2196	4000035	4000030	KR 9A CL 4 SUR	KR 9A CL 3 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2197	4000040	4000047	CL 3 SUR KR 9A	CL 3 SUR KR 8A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2198	4000050	N/A	CL 3A SUR KR 9A	CL 3A SUR KR 8B	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2199	4000038	4000027	CL 2A SUR KR 8	CL 2A SUR 20m AL OCCIDENTE DE LA KR 8B	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2200	4000191	4000154	CL 9 SUR KR 7A	CL 9 SUR 20m AL OCCIDENTE DE LA KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2201	4000225	N/A	CL 10 SUR KR 7A	CL 10 SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2202	4000193	N/A	CL 8B SUR KR 7A	CL 8B SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
4	22/01/2026	2203	4000055	4000064	CL 2 SUR KR 7C	CL 2 SUR KR 7A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2204	4000032	4000042	CL 1B SUR KR 7C	CL 1B SUR KR 7A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2205	4000018	4000021	CL 1 SUR KR 7C	CL 1 SUR KR 7A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2206	4000031	N/A	KR 7B CL 1B SUR	KR 7B CL 1 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2207	4000028	4000041	KR 7A CL 1 SUR	KR 7A CL 1B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2208	4000043	4000052	CL 1A SUR KR 7A	CL 1A SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2209	4000010	4000017	CL 1A SUR KR 8C	CL 1A SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2210	4000014	4000009	KR 8A CL 1C SUR	KR 8A 20m AL NORTE DE LA CL 1A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2211	5004006	5004619	CL 93 SUR AV CARACAS (KR 14)	CL 93 SUR KR 5	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2212	5004611	5004542	KR 5 CL 93 SUR	KR 5 CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2213	5004564	5003613	KR 8 CL 94A SUR	KR 8 CL 87A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2214	5003756	5004045	CL 89 SUR KR 8	CL 89 SUR TV 4C	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2215	5004012	5003822	DG 88 SUR TV 4C	DG 88 SUR TV 4	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2216	5003743	N/A	CL 87B SUR TV 4	CL 87B SUR TV 3A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2217	5003742	5004064	KR 10 CL 91 SUR	KR 10 CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2218	5004113	N/A	KR 10 CL 93 SUR	KR 10 CL 93A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2219	5004152	5004711	KR 10 CL 93A SUR	KR 10 CL 96BIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2220	5003581	N/A	KR 13 CL 91A SUR	KR 13 20m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2221	5003902	N/A	KR 13 CL 93 SUR	KR 13 15m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2222	5003778	5003633	KR 9 CL 91 SUR	KR 9 60m AL NORTE DE LA CL 90 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2223	5004680	5004324	KR 6 CL 93B SUR	KR 6 CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2224	5004140	N/A	KR 8C CL 93 SUR	KR 8C CL 92ABIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2225	5003908	5003749	KR 12 CL 92B SUR	KR 12 CL 91B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2226	5003957	5003909	CL 92B SUR KR 12	CL 92B SUR KR 13	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2227	5003946	N/A	CL 92C SUR KR 12	CL 92C SUR KR 13	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2228	50000400	N/A	KR 12 CL 91A SUR	KR 12 CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2229	50000624	50000625	KR 11 CL 91 SUR	KR 11 CL 91B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
4	22/01/2026	2230	30000742	30001326	CL 91A SUR KR 13	CL 91A SUR KR 11	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2231	5003685	N/A	CL 91B SUR KR 13	CL 91B SUR KR 12	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2232	5003772	N/A	CL 91B SUR KR 10	CL 91B SUR KR 11	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2233	5003750	5003819	CL 92 SUR KR 13	CL 92 SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2234	5003794	5003875	CL 92A SUR KR 13	CL 92A SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2235	5003851	5003927	CL 92ABIS SUR KR 13	CL 92ABIS SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2236	5004114	5004343	CL 93A SUR KR 13	CL 93A SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2237	5004153	5004385	CL 93ABIS SUR KR 13	CL 93ABIS SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2238	5004341	5004427	CL 93B SUR KR 10	CL 93B SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2239	5004387	5004506	CL 94 SUR KR 10	CL 94 SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2240	5004436	5004565	CL 94A SUR KR 10	CL 94A SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2241	5004435	5004206	KR 8C CL 94A SUR	KR 8C CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2242	5004484	5004681	CL 93B SUR KR 8	CL 93B SUR KR 6	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2243	5004188	N/A	CL 93B SUR AV CARACAS (KR 14)	CL 93B SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2244	5004249	N/A	CL 94 SUR KR 13	CL 94 SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2245	5004321	N/A	CL 94BIS SUR AV CARACAS (KR 14)	CL 94BIS SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2246	5004376	N/A	CL 94A SUR KR 13	CL 94A SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2247	5004432	N/A	CL 95 SUR KR 13	CL 95 SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2248	5004509	N/A	CL 95BIS SUR KR 13	CL 95BIS SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2249	5004577	N/A	CL 95A SUR KR 13	CL 95A SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2250	5004645	N/A	CL 96 SUR KR 13	CL 96 SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
4	22/01/2026	2251	5004666	N/A	CL 96BIS SUR KR 13	CL 96BIS SUR KR 12	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2252	5004749	N/A	KR 12 CL 96BIS SUR	KR 12 CL 96ASUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2253	5004750	N/A	CL 96A SUR KR 13	CL 96A SUR KR 12	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2254	5004570	5003993	KR 13 CL 96 SUR	KR 13 CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2255	5004088	N/A	KR 9B CL 93 SUR	KR 9B CL 92ABIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2256	5004183	N/A	KR 8B CL 93 SUR	KR 8B CL 92ABIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2257	5004223	N/A	KR 8A CL 93 SUR	KR 8A CL 92ABIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2258	5003971	N/A	CL 92ABIS SUR KR 10	CL 92ABIS SUR KR 9B	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2259	5004121	5004149	CL 92ABIS SUR KR 8B	CL 92ABIS SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2260	5004483	N/A	KR 7B CL 93B SUR	KR 7B CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2261	5004534	N/A	KR 7A CL 93B SUR	KR 7A CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2262	5004578	N/A	KR 7 CL 93B SUR	KR 7 CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2263	5004624	N/A	KR 6A CL 93 SUR	KR 6A 20m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2264	5004661	N/A	KR 7B CL 93B SUR	KR 7B 20m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2265	50005213	N/A	KR 7A CL 93B SUR	KR 7A 20m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2266	5004610	N/A	KR 7 CL 93B SUR	KR 7 20m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2267	5003981	N/A	CL 92A SUR KR 10	CL 92A SUR KR 9	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2268	5003931	N/A	CL 92 SUR KR 10	CL 92 SUR 25m AL ORIENTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2269	5003890	5004033	CL 91B SUR KR 10	CL 91B SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2270	5003768	5003837	CL 91A SUR KR 10	CL 91A SUR KR 9	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2271	5003802	N/A	KR 9A CL 91A SUR	KR 9A CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2272	5003836	5003889	KR 9 CL 91A SUR	KR 9 CL 91B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2273	5003917	N/A	KR 8C CL 91B SUR	KR 8C CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2274	5003949	N/A	KR 8B CL 91B SUR	KR 8B CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2275	5003990	N/A	KR 8A CL 91B SUR	KR 8A CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2276	5004388	5004106	KR 7 CL 93 SUR	KR 7 CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
4	22/01/2026	2277	5004423	5004275	KR 6A CL 93 SUR	KR 6A CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2278	5004526	5004367	KR 5C CL 93 SUR	KR 5C CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2279	5004566	5004404	KR 5B CL 93 SUR	KR 5B CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2280	5004620	5004437	KR 5A CL 93 SUR	KR 5A CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2281	5004276	5004492	CL 92A SUR KR 7	CL 92A SUR KR 5BIS	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2282	5004337	N/A	CL 92B SUR KR 8	CL 92B SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2283	5004285	N/A	CL 92ABIS SUR KR 8	CL 92ABIS SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2284	5004173	N/A	CL 92 SUR KR 8	CL 92 SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2285	5004139	N/A	CL 91B SUR KR 8	CL 91B SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2286	5004107	N/A	CL 91A SUR KR 8	CL 91A SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2287	5003895	N/A	KR 8A CL 91 SUR	KR 8A 25m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	23/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2288	5004038	N/A	KR 7A CL 91 SUR	KR 7A 25m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026
4	22/01/2026	2289	5003995	N/A	KR 7B CL 91 SUR	KR 7B 25m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/01/2026	3/02/2026

Fuente: elaboración propia

Igualmente, en el Anexo 2. se adjuntan los COI mencionados en la tabla anterior, donde se encuentra la información detallada de cada autorización.

8. ASPECTOS TÉCNICOS

8.1 MODIFICACIONES REALIZADAS

- En el periodo al que pertenece el presente informe no se realizaron modificaciones.

8.2 ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se describen las actividades ejecutadas a la fecha:

- Revisión en plataforma SIGIDU
- Se realiza la solicitud de los planes de manejo de tránsito PMT para los puntos a intervenir.
- Socialización de actividades de implementación en colegios y zonas de alto flujo peatonal.
- Implementación de señalización horizontal y vertical de acuerdo a los planos inspeccionados e instalación de dispositivos según diseños.

8.3 INSPECCIONES

- A continuación, se relacionan los diseños inspeccionados en el periodo al que hace referencia este informe (24 de diciembre de 2025 a 23 de enero de 2026)

Tabla 6 Inspecciones realizadas

ID Diseño	Fecha de Asignación	ESTADO
EX_04_044_1561_10	7/01/2026	INSPECCIONADO
EX_04_263_1561_10	7/01/2026	EN EJECUCIÓN
EX_04_125_1867_12	7/01/2026	INSPECCIONADO
EX_05_004_1073_24	7/01/2026	EN EJECUCIÓN
CP- Rad. 202561204421652	19/01/2026	INSPECCIONADO
CP-04-1703 SDQS-5109132025	19/01/2026	INSPECCIONADO
CP_04_1868-SDQS-6847412025	19/01/2026	INSPECCIONADO
SDM-202561204690292	20/01/2026	INSPECCIONADO

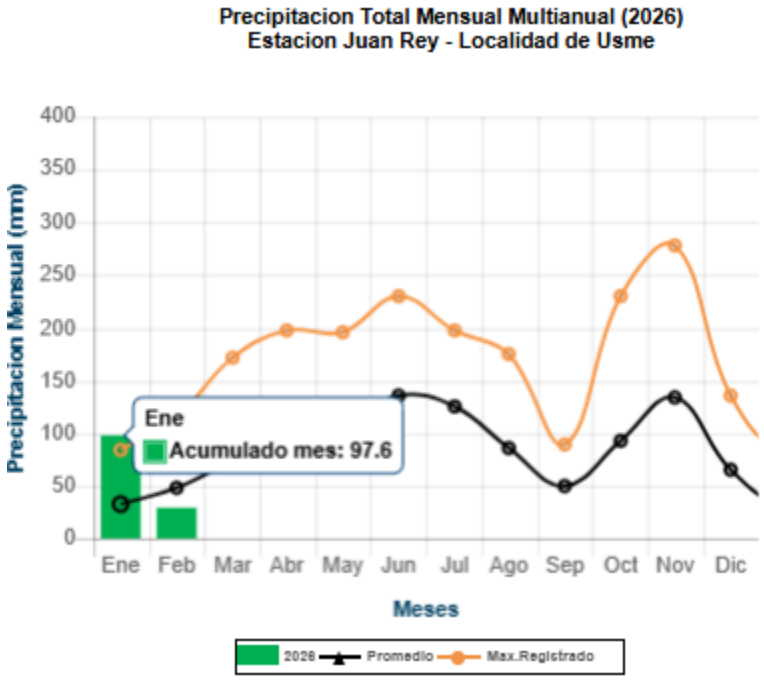
Fuente: Elaboración propia

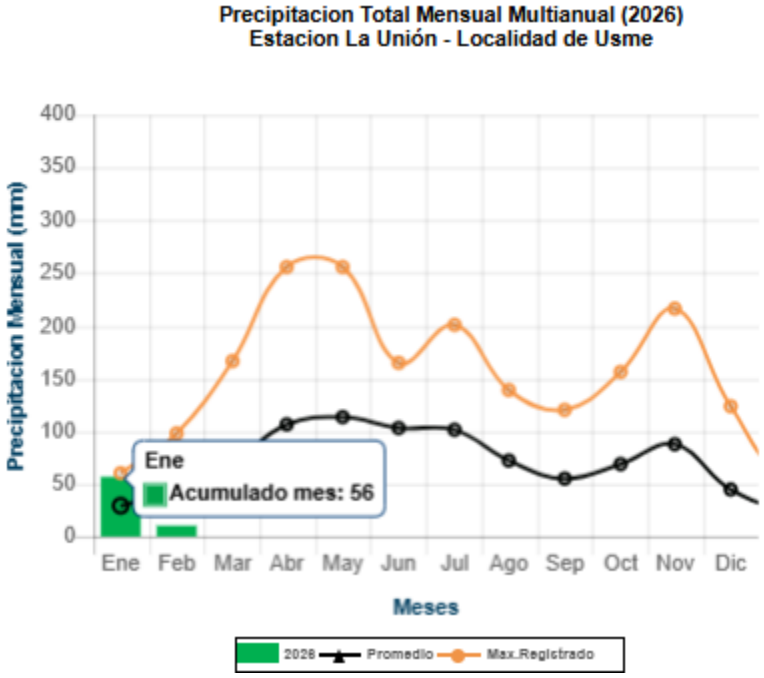
En el Anexo 3 (3.1 Inspecciones) se encuentran los formatos de inspecciones.

8.4 ESTADO DEL TIEMPO

En el periodo al que hace referencia este informe (24 de diciembre a 23 de enero de 2026) se presentaron 13 días de lluvias.

Ilustración 2 Precipitación mes de enero





9. ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

A continuación, se relacionas las actividades de consulta por diseño, en los visores y entidades correspondientes.

DISEÑO	Geoportales		ENTIDADES CONSULTADAS
	https://movilidadbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=219e91e4397f4f8d99c4c1aaa66ba2c4	https://webidu.idu.gov.co/sigidu/	
EX_05_004_1073_24	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) -EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU

En el Anexo 4, se encuentran las cartas radicadas a las diferentes entidades..

10. PLAN DE CALIDAD

La información referente al Plan de Calidad se encuentra en el Anexo 5.

11. PROTOCOLO DE MANEJOS DE RESIDUOS

La información respecto al protocolo de manejos de residuos se encuentra en el Anexo 6

12. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CORREDORES

En el periodo al que se hace referencia en este informe no se ejecutaron actividades en corredores asignados.

13. REPORTE ESTADISTICO

13.1 EJECUCIÓN POR COMPONENTE

De acuerdo con la ejecución de las obras durante el periodo se tienen subdividido por componente (señalización vertical y horizontal) de la siguiente forma:

Tabla 7 Actividades por componente

Corredor / Diseños	Localidad	Señalización Vertical	% Ejecutado en el ID en Señalización vertical del periodo	Señalización Horizontal	% Ejecutado en el ID en Señalización Horizontal del periodo	Total, ejecutado en el periodo de informe
EX_04_030_1561_10	San Cristóbal		0%	$ 511.270.431,36	100%	$ 511.270.431,36
CP_05_1690	Usme	$ 3.294.915,00	100%		0%	$ 3.294.915,00
EX_04_051_414_11_FASE I	San Cristóbal		0%	$ 26.222.231,00	100%	$ 26.222.231,00
EX_04_051_414_11 FASE II	San Cristóbal		0%	$ 137.313.736,95	100%	$ 137.313.736,95
CP_04_1630	San Cristóbal		0%	$ 26.697.505,82	100%	$ 26.697.505,82
CP_04_1625	San Cristóbal	$ 1.023.334,32	100%		0%	$ 1.023.334,32
CP_04_1627	San Cristóbal	$ 1.597.118,00	9%	$ 16.213.470,74	91%	$ 17.810.588,54
CP_AV_BOYACA - KR14I	Usme		0%	$ 17.948.115,29	100%	$ 17.948.115,29
EX_05_213_1561_10	Usme	$ 53.002.881,44	100%		0%	$ 53.002.881,44
TOTAL		**$ 58.918.248,76**		**$ 735.665.491,16**		**$ 794.583.740**

Fuente: Elaboración propia

El valor total ejecutado en el periodo al que hace referencia este informe es de **$794.583.740**, en la localidad de San Cristóbal se se ejecutó un valor de $727.337.828 lo que corresponde al 90.66% de la ejecución total y en Usme un valor de $74.245.911 lo que corresponde a un 9.34% de la ejecución total. La demarcación horizontal representa un 92.6% y la vertical 7,41%.

13.2 ZONAS ESCOLARES

Tabla 8 Zonas Escolares Intervenidas

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
1	50005014	EX_05_119_1867_12	COLEGIO SAN GREGORIO HERNANDEZ	170
2	5002304			

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
1	50005014 5002168 5002154 5002131 5002117 5002087 5002065 5002064	EX_05_119_1867_12	IED COLEGIO SANTA LIBRADA	850
4	5002045			
2	5002174 5002169 5002324 5002132			
1	50005013 5002211 5002210 5002130 5002117	EX_05_119_1867_12	COLEGIO JUAN RULFO	175
1	5002162 5002094 5002084	EX_05_119_1867_12	JARDÍN SOCIAL CENTRO CRECER TEJAR	50
1	5008374	EX_05_119_1867_12	HOGAR INFANTIL BARQUITO DE PAPEL	150
1	5002574 5002492 5002403	EX_05_119_1867_12	COLEGIO ALMIRANTE PADILLA	320
2	5002660 5002566 5002565			
4	5002567			
1	5002171	EX_05_119_1867_12	JARDIN LOS PAYASITOS ICBF	125
2	5002391 5002349			
2	5002530 5002463 5002458 5002434 5002415	EX_05_119_1867_12	JARDIN INFANTIL BETANIA	120
2	5002502 5002499	EX_05_119_1867_12	JARDIN INFANTIL BALOO	45
2	5002502 5002499	EX_05_119_1867_12	COLEGIO SUMAPAZ	450
2	5002502 5002499	EX_05_119_1867_12	COLEGIO SAN JUAN DE LOS PASTOS	180
2	5002118	EX_05_119_1867_12	COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES	600
3	5007874 5001805 5001282	EX_05_93_1244_11		

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
2	5003204 5003333	EX_05_53_1744_11	JARDIN INFANTIL GRAN YOMASA	150
2	5003163	EX_05_53_1744_11	LICEO MAX	210
2	5003176	EX_05_53_1744_11	LICEO MARIA NELL	340
2	5003057	EX_05_53_1744_11	IED GRAN YOMASA	1630
3	5002420 5002726 5002709	EX_05_93_1244_11	COLEGIO MIRAVALLE	1500
3	5007842 5001893 5001856	EX_05_110_1867_12	COLEGIO DISTRITAL PAULO FREIRE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA ACTICULADO EDUCACIÓN SUPERIOR	3000
4	50009090 50009093			
3	5002441	EX_05_93_1244_11	COLEGIO CIUDAD BOLIVAR	210
3	5001360 5001353	EX_05_93_1244_11	JARDÍN INFANTIL ICBF	30
3	5001804 5001788	EX_05_93_1244_11	JARDIN INFANTIL MI TRIGAL	13
3	50009087	EX_04_262_1561_10	CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL FLORENTINO GONZALEZ	2000
5	4001107 4001166 4001254			
3	4001167 4001407 4001464 4001465	EX_04_262_1561_10	I.E.D FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE B	750
3	4001497 4001543 4001570	EX_04_241_1561_10	I.E.D FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A	2500
4	4001604			
4	5000132 5000160 5000162 5000189	EX_05_108_1867_12	LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	300
4	5000132	EX_05_108_1867_12	JARDIN INFANTIL VOZ DE ALERTA	50
	5000160			
	5000162			
	5000189			
4	5000531	EX_05_110_1867_12	JARDÍN SOCIAL NEBRUSKA	215
4	5000531	EX_05_110_1867_12	I.E.D LA SALLE JUAN LUIS LONDOÑO	1410
4	5004655 5004970 5004946 5005104	EX_05_003_1073_24	COLEGIO DISTRITAL DIEGO MONTAÑA CUELLAR I.E.D	7500
4	5004418	EX_05_003_1073_24	COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA	2800
	5004488			

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
4	5004418 5004488	EX_05_003_1073_24	JARDÍN ICBF EL CISNE CANTAR	13
5	5001319 5001273 5001378	EX_05_93_1244_11	COLEGIO CENTRO CULTURAL	700
5	5001090 5001091 5008288 5000826 5000875	EX_05_113_1867_12	COLEGIO I.E.D LA AURORA	1500
5	5001192 5001226 5001234	EX_05_113_1867_12	JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DEL FUTURO - MI ENSUEÑO	13
5	5001031 5001127 5001142	EX_05_113_1867_13	HOGAR INFANTIL ICBF MI BELLO HOGAR	13
5	5000921	EX_05_113_1867_13	COLEGIO EDUCATIVO DISTRITAL NUEVO SAN ANDRES DE LOS SANTOS	2000
6	5000727 5000825 5000906 5000674	EX_05_113_1867_13		
5	5001021	EX_05_113_1867_13	JARDIN INFANTIL LA AURORA	100
6	5000940 50005061			
6	5001836 5001833	EX_05_101_1244_11	IED PROVINCIA DE QUEBEC	2500
6	5002109 5002098	EX_05_101_1244_12	COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED) SEDE A y SEDE B	3200
6	5002109 5002098	EX_05_101_1244_12	JARDÍN INFANTIL SOCIAL LA ESPERANZA	110
6	5003313 5003194 5003132	EX_05_005_1073_24	I.E.D COLEGIO ATABANZHA	1800
7	5005351 5005175	EX_05_307_1561_10	COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ	1385
7	5000347 5008328	EX_05_280_1561_10	JARDIN INFANTIL LA FISCALA	59
7	5000376 50007670	EX_05_280_1561_10	I.E.D FABIO LOZANO LIMONELLI	1900
7	5001827 5001826 5001917 5002110	EX_05_101_1244_11	I.E.D PROVINCIA DE QUEBEC	1080
			ICBF HOGAR COMUNITRARIO PIOLIN	12
			HCB EL NUEVO AMANECER	39
			CENTRO MARIA ADELAIDA	80
7	5002126 5009132	EX_05_101_1244_11	SOCIAL JARDÍN INFANTIL LA ESPERANZA	95

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
	5002267 5002387		COLEGIO NUEVA ESPERANZA	1080
8	5006413 5006843	EX_05_001_1073_24	CENTRO EDUCATIVO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE	132
8	5006673 5006721 5006736 5006763 5006709 5006765	EX_05_001_1073_24	COLEGIO DISTRITAL EDUARDO UMAÑAN MENDOZA	1740
8	5006075 5006219	EX_05_006_1744_10	JARDIN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA	90
8	5006166 5006221	EX_05_006_1744_10	COLEGIO USMINIA SEDE A	330
8	4000421 4000433 4000461 4000494 4000464	CP_BARRIO_LA_MARIA_ EX_04_124_1867_12	CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL CRECER BALCONES	60
8	4000421 4000433 4000461 4000494 4000464	CP_BARRIO_LA_MARIA_ EX_04_124_1867_12	CENTRO EDUCATIVO MI TALLER	50
8	4000421 4000433	CP_BARRIO_LA_MARIA_ EX_04_124_1867_12	CASA DE JUVENTUD DAMAWHA	30
8	4005329 4005164 4005064	CP_NUEVA_ROMA EX_04_006_1561_10 CP_NUEVA_ROMA EX_04_044_1561_10	COLEGIO IED NUEVA ROMA	1154
8	4005561 50007877	CP_NUEVA_ROMA EX_04_006_1561_10	JARDIN SOCIAL NUEVA ROMA	187
8	5003826 5003773 5003704 5008234	EX_05_213_1561_10	COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA	2900
8	5003704 5008234	EX_05_213_1561_10	JARDIN SOCIAL BOLONIA	160
9	5004618 5004402 5003865	EX_05_286_1561_10	JARDIN INFANTIL CASA LOMA	75
9	5001008	EX_05_352_1561_10	LICEO SANTA ANA DEL SUR	280
9	4002101 4002022 4001982 4002278	EX_04_488_826_10	IED TOMAS RUEDA VARGAS	766

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
9	4002220 4001982 4002250	EX_04_488_826_10	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES	250
9	4002001 4002022 4001982 4002160 4002250	EX_04_488_826_10	JARDIN INFANTIL CANADA SANTA INES	220
9	4000767 4000793 4000897	EX_04_241_1561_10	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	784
9	4001327 4001285 4001326	EX_04_241_1561_10	JARDIN INFANTIL MANITAS CREATIVAS POR LA NIÑEZ	10
10	4001648 4002160 4002250	EX_04_488_826_10	IED TOMAS RUEDA VARGAS	1100
10	4001564 4001639	EX_04_241_1561_10		
10	4001694 4001776 4001891 4001202 4001362 4001305 4001184 4001765 4001238	EX_04_241_1561_10	COLEGIO DISTRITAL MONTEBELLO	2000
10	4001386 4001798 4001363	EX_04_241_1561_10	LICEO INTEGRAL SAN AGUSTIN	126
10	4001386 4001798	EX_04_241_1561_10	HOGAR COMUNITARIO AGRUPANDO MIS AMIGOS LOS DUENDECITOS	14
10	4001655 4001764 4001656	EX_04_241_1561_10	LICEO SENDERO DEL SABER	130
10	4001363 4001362 4001305 4001442	EX_04_241_1561_10	INSTITUTO CARMENZA DE SANCHEZ	150
10	4001571	EX_04_241_1561_10	JARDÍN ARTISTICO GRANDES PASOS	20
10	4001765 4001672	EX_04_241_1561_10	CASA JUVENIL DON BOSCO	500
10	4001672 4001765	EX_04_241_1561_10	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN DAMIAN	99

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
10	4002456 4002491 4002553 4002526 4002403 4002402 4002492 30000503	EX_04_051_414_11	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	350
12	4002331 4001974 4001975 40001526			
10	4002403 4002492 4002491 4002402 4002610	EX_04_051_414_11	CDI SAN DAMIAN	120
10	4000113 4000103 4000102 4000124 4000165 4000114	EX_04_030_1561_10	JARDIN INFANTIL PEQUEÑAS MARAVILLAS	130
12	4000164			
10	4000106 4000127 4000066 4000057 4000079 4000084 4000093 4000094 4000049 4000085	EX_04_030_1561_10	COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA	240
10	No se presento instalación de zonas escolares durante este periodo			0
12	4000164 4000149 4000137	EX_04_030_1561_10	COLEGIO NUEVA ALIANZA INTEGRAL	214
12	4000164 4000149	EX_04_030_1561_10	LICEO PSICOPEDAGOGICO FRANK FRUT	214
12	4000080 4000089 4000108 4000042 4000041	EX_04_030_1561_10	GIMNASIO EDEN PRESCOLAR	50

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
12	4000080 4000089 4000108 4000042 4000041	EX_04_030_1561_10	JARDIN INFANTIL ANGELES	80
12	4000164 40001526 50007938 4001975 4001974	EX_04_051_414_11	HOGAR COMUNITARIO MANITAS TRAVIESAS	70
TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS EN EL PROYECTO				**60347**

Fuente: Elaboración propia

14. CERTFICADOS DE CALIBRACIÓN, FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ESTADO DE LOS EQUIPOS

En el Anexo 7 se encuentra la información respecto a los certificados de calibración.

15. SEÑALIZACIÓN ENTREGADA A ALMACÉN

Para el periodo del presente informe, a continuación, se presenta el detalle de la señalización vertical implementada, dispositivos de control al tránsito implementados y entregada al almacén de la SDM.

En el Anexo 8. Acta de entrega de señalización, se presenta el comprobante de ingreso de elementos emitido por la subdirección Administrativa de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde se relaciona la señalización vertical y los dispositivos viales instalados en el periodo del 24 de diciembre al 23 de enero de 2026:

Tabla 9 Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	0,3	$ 376.635,61	$ 120.523,39	N/A	$ 497.159,00	$ 149.147,70
2	UND	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	1	$ 119.800,76	$ 38.336,24	1,00	$ 158.137,00	$ 158.137,00
3	UND	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	6	$ 150.388,64	$ 48.124,36	6,00	$ 198.513,00	$ 1.191.078,00
5	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	43	$ 292.988,64	$ 93.756,36	43,00	$ 386.745,00	$ 16.630.035,00
6	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	25	$ 463.812,12	$ 148.419,88	25	$ 612.232,00	$ 15.305.800,00
7		Fabricación, suministro e instalación de Señal doble	2	$ 568.224,24	$ 181.831,76	2,00	$ 750.056,00	$ 1.500.112,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.						
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	2,19	$ 359.616,67	$ 115.077,33	N/A	$ 474.694,00	$ 1.039.579,86
9	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	4	$ 467.840,15	$ 149.708,85	4,00	$ 617.549,00	$ 2.470.196,00
10	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	4	$ 367.910,61	$ 117.731,39	4,00	$ 485.642,00	$ 1.942.568,00
13	UND	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.	10	$ 189.830,30	$ 60.745,70	10,00	$ 250.576,00	$ 2.505.760,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	UND	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	10	$ 220.315,91	$ 70.501,09	10,00	$ 290.817,00	$ 2.908.170,00
17	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	7	$ 273.428,79	$ 87.497,21	7,00	$ 360.926,00	$ 2.526.482,00
18	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	14	$ 363.000,76	$ 116.160,24	14,00	$ 479.161,00	$ 6.708.254,00
22	UND	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	6	$ 145.928,79	$ 46.697,21	6,00	$ 192.626,00	$ 1.155.756,00
26	UND	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones)	7	$ 40.962,88	$ 13.108,12	N/A	$ 54.071,00	$ 378.497,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		cumpliendo normatividad vigente.						
28	UND	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	81	$ 21.966,67	$ 7.029,33	N/A	$ 28.996,00	$ 2.348.676,00
70	UND	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	661	$ 12.454,55	$ 3.985,45	661,00	$ 16.440,00	$ 10.866.840,00
73	UND	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	8150	$ 12.572,73	$ 4.023,27	8150,00	$ 16.596,00	$ 135.257.400,00
75	UND	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	83	$ 78.714,39	$ 25.188,61	83,00	$ 103.903,00	$ 8.623.949,00
80	UND	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	28	$ 49.536,36	$ 15.851,64	28,00	$ 65.388,00	$ 1.830.864,00
TOTAL								**$ 215.497.302**

16. REPORTE DE SEÑALIZACIÓN RETIRADA EN VÍA Y ENTREGADA A ALMACÉN

En el periodo al que hace referencia este informe se realizó entrega de señales retiradas en vía, , la información se encontrará en el Anexo 9.

17. ASPECTOS VARIOS

17.1 GEOREFERENCIACIÓN

Durante el periodo de presentación del informe se realizó la entrega de Georreferenciación perteneciente a la implementación del Obra, lo siguiente es el listado de ID's entregados a fecha de corte 23 de enero de 2026.

Tabla 10 Estado Georeferenciación

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
1	EX_05_93_1244_11	6-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_05_119_1867_12	6-mar-25	APROBADO SDM
1	MV_05_122_1867_12	20-mar-25	APROBADO SDM
1	MV_AV_BOYACA_941_09	21-mar-25	APROBADO SDM
1	MV_04_230_1561_10	17-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_04_044_1561_10	6-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_04_211_1561_10	17-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_05_320_1561_10	11-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_05_341_1561_10	11-mar-25	APROBADO SDM
2	MV_05_052_1744_10 SDM-202561200270682	9-abr-25	APROBADO SDM
2	MV_AV_BOYACA_941_09	2-may-25	APROBADO SDM
2	EX_05_119_1867_12	29-abr-25	APROBADO SDM
2	MV_05_122_1867_12	5-may-25	APROBADO SDM
2	EX_05_053_1744_10	2-may-25	APROBADO SDM
2	EX_04_211_1561_10 (pasacalle SDM-202461204137592)	21-abr-25	APROBADO SDM
3	EX_04_001_1073_24	27-may-25	APROBADO SDM
3	EX_04_262_1561_10_	29-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_119_1867_12	29-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_108_1867_12	19-may-25	APROBADO SDM
3	EX_04_241_1561_10	28-may-25	APROBADO SDM
3	MV_04_511_676_09	20-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_053_1744_10	7-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_110_1867_12	21-may-25	APROBADO SDM
3	EX_05_93_1244_11_V5	5-jun-25	APROBADO SDM
3	MV_05_122_1867_12	27-may-25	APROBADO SDM
3	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3 (CP 202561200744162)	29-may-25	APROBADO SDM
4	EX_04_211_1561_10 PMT de EMERGENCIA AV LOS CERROS	25-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_04_261_1561_10 (CP_04_1049)	1-jul-25	APROBADO SDM
4	EX_04_001_1073_24	13-jun-25	APROBADO SDM

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
4	EX_05_003_1073_24	13-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_110_1867_12	1-jul-25	APROBADO SDM
4	EX_05_119_1867_12	18-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_113_1867_12	20-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_053_1744_10	20-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_108_1867_12	19-jun-25	APROBADO SDM
4	MV_05_052_1744_10 PMT CAUCE SIRE 5453567	25-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_04_241_1561_10	17-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_04_262_1561_10	25-jun-25	APROBADO SDM
4	MV_05_122_1867_12	27-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_307_1561_10 CP-202561200703942	25-jun-25	APROBADO SDM
4	EX_05_93_1244_11	20-jun-25	APROBADO SDM
5	EX_05_93_1244_11	8-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_307_1561_10 CP-202561200703942	16-jul-25	APROBADO SDM
5	MV_04_511_676_09_V11	10-jul-25	APROBADO SDM
5	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	16-jul-25	APROBADO SDM
5	MV_05_122_1867_12_V7	24-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_001_1073_24_V2	11-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_241_1561_10	16-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_003_1073_24	29-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_108_1867_12_V6	16-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_113_1867_12	29-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_262_1561_10	24-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_005_1073_24	24-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_05_119_1867_12	14-jul-25	APROBADO SDM
5	PMT SIRE 5453778	24-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_264_1561_10 PMT SDM-202561201385182	18-jul-25	APROBADO SDM
5	EX_04_211_1561_10 SIRE 2561201777022	18-jul-25	APROBADO SDM
5	PMT EMBALSE LA REGADERA	24-jul-25	APROBADO SDM
6	EX_05_005_1073_24	14-ago-25	APROBADO SDM
6	EX_05_113_1867_12	13-ago-25	APROBADO SDM
6	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	13-ago-25	APROBADO SDM
6	EX_05_119_1867_12	13-ago-25	APROBADO SDM
6	EX_05_001_1073_24	15-may-25	APROBADO SDM
6	EX_05_101_1244_11	15-may-25	APROBADO SDM
6	EX_05_008_1073_24	15-ago-25	APROBADO SDM
6	EX_05_003_1073_24	13-ago-25	APROBADO SDM
6	MV_AV_CARACAS_585_24 CP_BYKE_BOX	19-ago-25	APROBADO SDM

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
7	MV_05_122_1867_12	19-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_213_1561_10 SDM-202561202098412	15-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_04_126_1867_12 SDM-202561202230222	15-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_101_1244_11	2-sep-25	APROBADO SDM
7	MV_AV_CARACAS_585_24 CP_BYKE_BOX	2-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_006_1561_10	10-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_001_1073_24	8-sep-25	APROBADO SDM
7	MV_AV_BOYACA_941_09	15-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_008_1073_24	8-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_307_1561_10	18-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_310_1561_10	2-sep-25	APROBADO SDM
7	EX_05_280_1561_10	11-sep-25	APROBADO SDM
8	EX_05_001_1073_24	28-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_006_1744_10	15-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_124_1867_12 CP_ BARRIO_LA_MARIA	23-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_006_1561_10 (CP_NUEVA_ROMA)	27-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_044_1561_10 (CP NUEVA ROMA)	28-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_280_1561_10	15-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_008_1561_10	10-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_213_1561_10	4-nov-25	APROBADO SDM
8	EX_05_310_1561_10	10-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT_CL_37D_S_KR_3B (SDM-202561202584052 y SDM-202561202664192)	27-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_93_1244_11 (CP_05_124)	15-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_316_1561_10 (PMT SDM-202561202439322)	15-oct-25	APROBADO SDM
8	MV_05_99_1244_11 (PMT SDM-202561202657962)	15-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT BARRIO LA FISCALA (PMT SDM- 202561202378942)	10-oct-25	APROBADO SDM
8	MV_05_052_1744_10 (PMT SDM-202561202284382 VDA LAS MARGARITAS)	28-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT VEREDA OLARTE SDM-202561202284382	27-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT_JUAN_REY_LA_FLORA SDM- SIRE 5456812	27-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_04_040_1561_10 SDM- 202561202286462	27-oct-25	APROBADO SDM
8	PMT_USME_SECTOR RURAL CL 137D_ KR 1 SDM-202561202379632	28-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_307_1561_10	7-oct-25	APROBADO SDM
8	EX_05_119_1867_12	10-oct-25	APROBADO SDM
9	EX_05_352_1561_10	2-dic-25	APROBADO SDM
9	EX_05_286_156_10	2-dic-25	APROBADO SDM
9	CPS_676_MV_01_04 (pendones kr 7)	25-nov-25	APROBADO SDM
9	EX_04_241_1561_10	25-nov-25	APROBADO SDM
9	EX_04_488_826_10	1-dic-25	APROBADO SDM

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
9	MV_05_122_1867_12 CP DE VIA AL LLANO	11-nov-25	APROBADO SDM
9	EX_04_124_1867_12 CP_ BARRIO_LA_MARIA	26-nov-25	APROBADO SDM
9	EX_04_006_1561_10 (CP_NUEVA_ROMA)	25-nov-25	APROBADO SDM
9	EX_04_044_1561_10 (CP NUEVA ROMA)	3-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_05_341_1561_10 CP_05_1669	12-dic-25	APROBADO SDM
10	MV_05_052_1744_10 CP_05_1670 5. CP_05_1671 CP_05_1673	12-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_05_002_1073_24 CP_05_1648	12-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_04_134_1867_12 CP_04_1594	12-dic-25	APROBADO SDM
10	MV_15_78_1244_11 CP_04_1630	15-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_05_320_1561_10 SDM-20256120339962-DI-22669	16-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_04_488_826_10	16-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_04_241_1561_10	4-feb-26	APROBADO SDM
10	MV_05_122_1867_12 CP DE VIA AL LLANO	17-dic-25	APROBADO SDM
10	EX_04_051_414_11	14-ene-26	APROBADO SDM
10	EX_04_030_1561_10	19-ene-26	APROBADO SDM
11	EX_04_030_1561_10	4-feb-26	APROBADO SDM
12	EX_04_030_1561_10		EN DESARROLLO
12	CP_05_1690		EN DESARROLLO
12	EX_04_051_414_11		EN DESARROLLO
12	CP_04_1630		EN DESARROLLO
12	CP_04_1625		EN DESARROLLO
12	CP_04_1627		EN DESARROLLO
12	CP_AV_BOYACA - KR14I		EN DESARROLLO
12	EX_05_213_1561_10		EN DESARROLLO

Elaboración: Fuente propia

18. RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CONTRATO DE OBRA

18.1 PERSONAL

Tabla 11 Personal mínimo

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DEL PROYECTO	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	DIANA PAOLA PARADA SIERRA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA DIURNO	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO	DIEGO GUALTEROS CHAVEZ
TRABAJADOR SOCIAL	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBÓN
PROFESIONAL STT	YULID LILIANA GELVES HERRERA
TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	GIOVANNY ALEXANDER BRITO NÚÑEZ
CONDUCTOR DIURNO	WILMER SIERRA
CONDUCTOR NOCTURNO	HUGO ALEJANDRO MORENO CRISTANCHO
SECRETARIA	YOLIMA PATIÑO LOBATON
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA

Fuente: Elaboración propia

18.2 EQUIPO

Tabla 12 Equipos empleados para la ejecución de las actividades

Maquina	Serie	Tipo de Vehículo	Placa	Marca
Aplicación de pintura liquida	-	Camión	VFB357	Chevrolet
Maquina autopropulsable TITAN 1000	TAPT002	Camión	WEP027	Jac
Aplicación de plástico en frio	IAPT001	Camión	WNN061	Jac
Powrliner 8950, 2GUN Powrliner 8950, 2GUN Powrliner 8950, 2GUN	1. 1439800069 2. 1439800007 3. 1439800083	N/A	N/A	Titan
Featherlite	2001-454	N/A	N/A	ThermoMark II
Hydra M 4000, W FILTE/ (433- 801)	120700042	N/A	N/A	Titan

Fuente: Elaboración propia

18.3 INSTRUMENTOS USADOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

A continuación, se listan los instrumentos usados en los frentes de obra, para el control de calidad de la señalización implementada:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Velocímetro	1
Galgas para la verificación de espesores húmedos	1
Medidor de espesores secos para tomar lecturas de la demarcación sobre testigos	1
Retrorreflectómetro horizontal	1

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Lupa con aumento de 80X	1
Cinta métrica / Odómetro	1
Equipo para medir temperatura ambiente y de la superficie por demarcar.	1
Equipo para medir humedad relativa (Termohigrómetro)	1
Equipo para medir velocidad del viento	1
Equipo para medir punto de rocío	1

Fuente: Elaboración propia

19. VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE.

Esta información se encuentra en el Anexo 10. Gestión social.

20. VINCULACIÓN DE PORCENTAJE DE MUJERES.

Esta información se encuentra en el Anexo 10. Gestión social.

21. FACTOR SOCIAL

Esta información se encuentra en el Anexo 10. Gestión social.

22. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La información referente a la gestión de seguridad y salud en el trabajo se encuentra en el Anexo 11.

23. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

24.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO

En el tercer mes de ejecución del contrato comprendido entre el periodo del 24 de diciembre al 23 de enero del 2026 se realizaron actividades administrativas como:

- Revisión de documentación contractual.
- Revisión de Anexo técnico.
- Requerimientos mediante oficios.
- Respuestas a requerimientos de Secretaría Distrital de Movilidad e Interventoría,
- Asistencia a comités técnicos y mesas de trabajo y revisión de acta de comité.
- Asistencia comités de representantes legales.
- Entrega y firma de planillas de implementación señalización horizontal y vertical.
- Atención a las solicitudes de Interventoría y la Secretaría Distrital de Movilidad, en desarrollo del objeto del contrato vigilado.
- Entrega financiera del contrato de obra

24.2 ASPECTO JURIDICO

En el primer mes de ejecución del contrato comprendido entre el periodo del 24 de diciembre al 23 de enero del 2026 se realizaron actividades jurídicas como
:

- Ejecución del Contrato de Obra dentro del plazo, montos, calidades y demás términos establecidos para el mismo.
- Solicitudes de reclamaciones por parte de la interventoría.
- No se generaron reclamaciones por parte del contratista .
- No se generaron requerimientos de suspensión o prórroga del contrato de obra.

24. PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO

Estas planillas se encuentran en el Anexo 11, Gestión SST, anexos, anexo A Seguridad Social.

25. CERTIFICACIÓN SALARIOS Y HONORARIOS

Esta certificación se encuentra en el Anexo 12 Certificación salarios y honorarios.

26. LISTADO DE PROVEEDORES

La Unión Temporal cuenta con los siguientes proveedores:

- Pintuflex :Pintura en plástico en frio metilmetacrilato (spray) :
- Ecotraffic: Pintura de plástico en frio metilmetacrilato (llana)
- Ecotraffic: Imprimante acrílico negro

27. CERTIFICACIÓN PAGOS PROVEEDORES

Esta certificación se encuentra en el Anexo 13 Certificación pago proveedores.

28. ESTADO PRESUPUESTAL

28.1 RESUMEN CUENTA 12

Tabla 13 Cantidades ejecutadas por ID

No	Corredor / Diseños	Localidad	Valor Presupuestado	Valor Ejecutado	% Ejecutado
1	EX_04_030_1561_10	San Cristóbal	$ 888.788.852,71	$ 511.270.431,36	57,52%
2	CP_05_1690	Usme	$ 15.679.103,00	$ 3.294.915,00	21,01%
3	EX_04_051_414_11_FASE I	San Cristóbal	$ 386.360.216,00	$ 26.222.231,00	6,79%
4	EX_04_051_414_11 FASE II	San Cristóbal	$ 386.360.216,00	$ 137.313.736,95	35,54%
5	CP_04_1630	San Cristóbal	$ 28.039.869,82	$ 26.697.505,82	95,21%
6	CP_04_1625	San Cristóbal	$ 1.023.334,32	$ 1.023.334,32	100,00%
7	CP_04_1627	San Cristóbal	$ 17.810.588,54	$ 17.810.588,54	100,00%
8	CP_AV_BOYACA - KR14I	Usme	$ 17.948.115,29	$ 17.948.115,29	100,00%
9	EX_05_213_1561_10	Usme	$ 53.002.881,44	$ 53.002.881,44	100,00%
TOTAL			**$ 1.795.013.177**	**$ 794.583.740**	

GEO APROPADA C11	$	13.203.562
GEO SIN APROBAR C12	$	119.187.561
VALOR X COBRAR	**$**	**688.599.741**

En el Anexo 14 se encuentran las planillas de obra, acta parcial de obra y suministro.

28.2 AVANCE PARCIAL CTO INICIAL

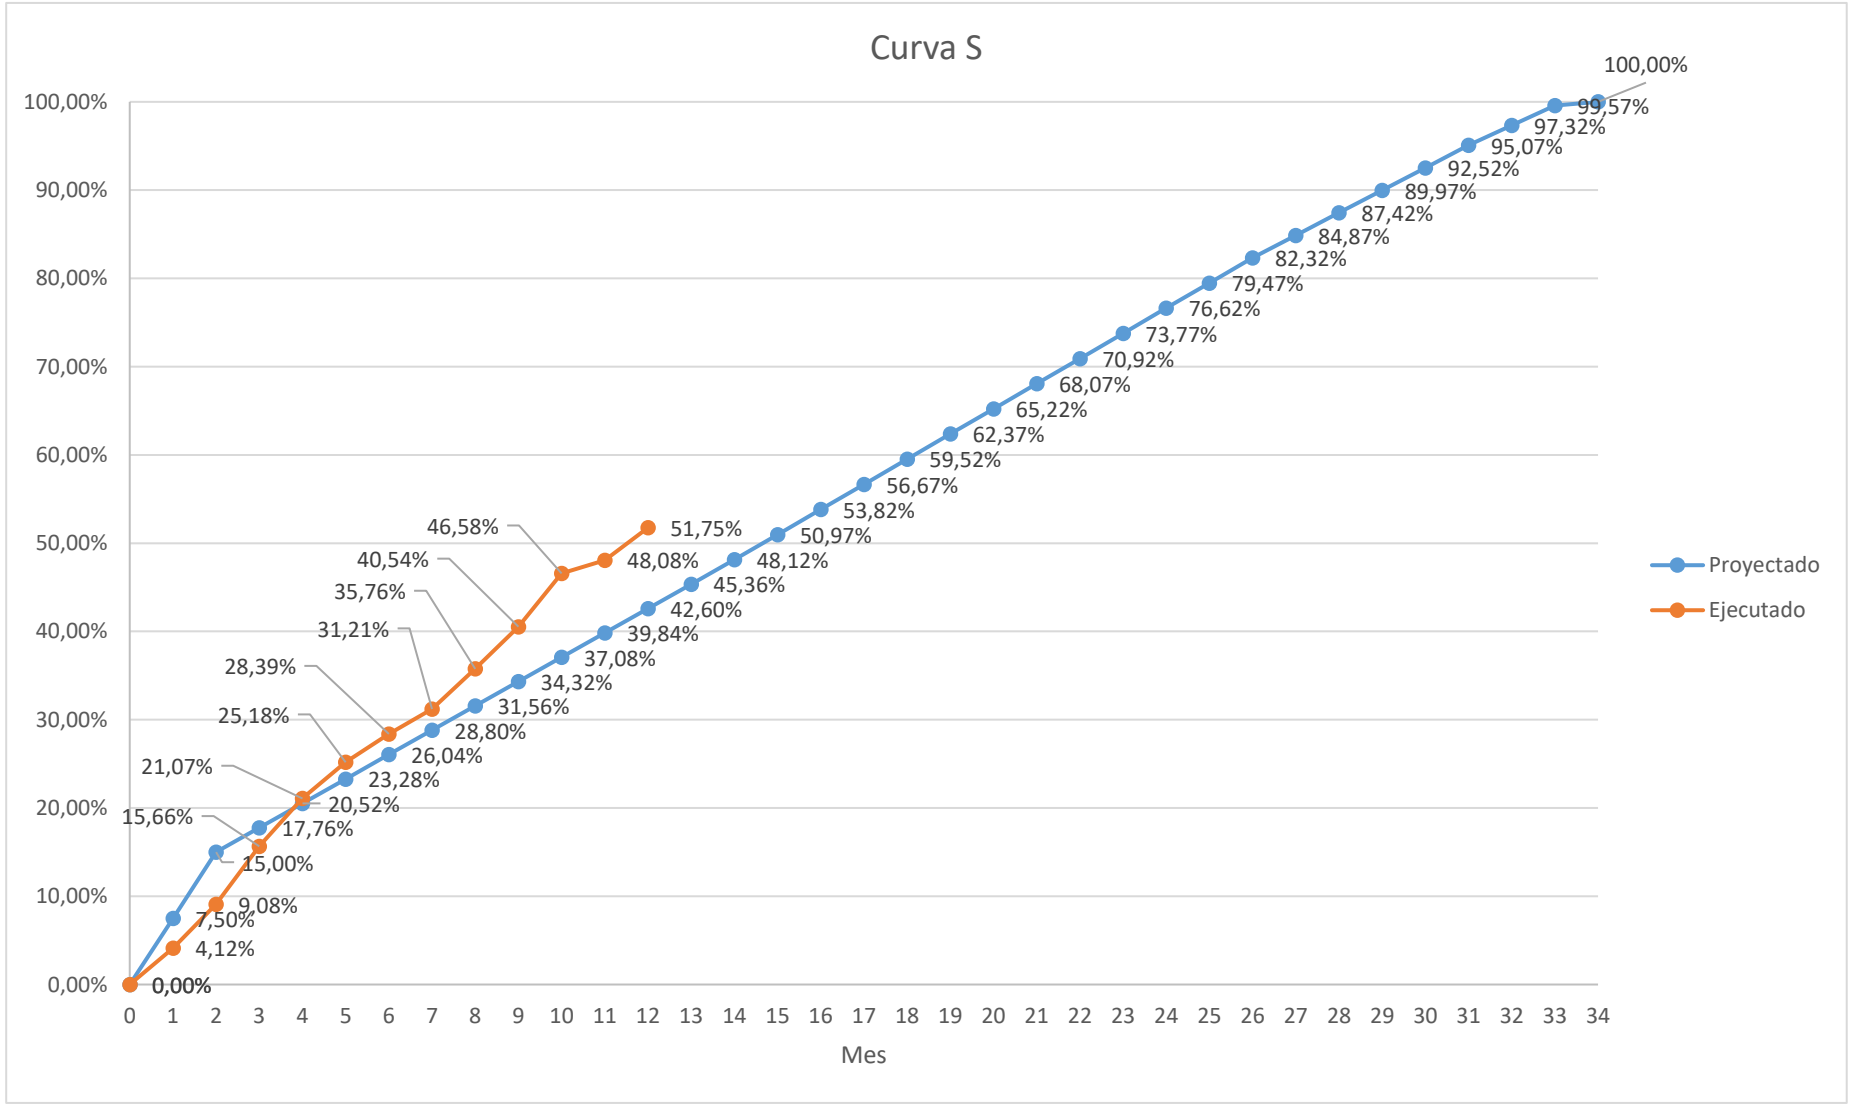
A continuación , se presenta el avance parcial y acumulado respecto al mes de ejecución, en proporción con los porcentajes mínimos establecidos para ejecutar de acuerdo con lo estipulado por la interventoría, el cual representa un valor de **2,76%** del valor total del contrato, lo ejecutado en este periodo equivale al **1,50 %** lo que indica que se está por encima de la curva de ejecución en un **3,67%**

28.3 AVANCE ADICIÓN 1

En el periodo al que hace referencia este informe se realizó la inspección de los diseños asignados a la Adición 1:

ID	FECHA ASIGNACIÓN	LOCALIDAD
EX_04_044_1561_10	7/01/2026	SAN CRISTOBAL
EX_04_263_1561_10	7/01/2026	SAN CRISTOBAL
EX_04_125_1867_12	7/01/2026	SAN CRISTOBAL
EX_05_004_1073_24	7/01/2026	USME

Gráfica 1 Gráfica Curva S



28.4 BALANCE PRESUPUESTAL

Tabla 14 Balance presupuestal

VALOR VIGENCIA 2024	$	2.815.721.000,00
VALOR VIGENCIA 2025	$	6.209.487.857,00
VALOR VIGENCIA 2026	$	6.423.895.143,00
VALOR VIGENCIA 2027	$	3.322.369.428,00
ADICIÓN 1	$	1.482.594.137,00
VALOR TOTAL	**$**	**20.254.067.565,00**

Pagos Efectuados	Periodo	Costos Directos	AIU	Suministro	Valor Total Acta	Retegarantía 5%	Total, a Girar	Estado
Cuenta 1	24 de febrero 23 de marzo de 2025	$ 518.247.080,00	$ 165.839.066,00	$ 88.935.514,00	$ 773.021.660,00	$ 38.651.083,00	$ 734.370.577,00	PAGO
Cuenta 1	24 de febrero 23 de marzo de 2025	$ 669.831.615,05	$ 214.346.116,81	$ 47.682.975,00	$ 931.860.707	$ 46.593.035,00	$ 885.267.671,86	PAGO
Cuenta 3	24 de marzo 23 de abril de 2025	$ 935.014.969,90	$ 299.204.790,37		$ 1.234.219.760	$ 61.710.988,00	$ 1.172.508.772,26	PAGO
Cuenta 4	24 de abril 23 de mayo de 2025	$ 770.290.040,60	$ 246.492.812,99		$ 1.016.782.854	$ 50.839.143,00	$ 965.943.710,59	PAGO
Cuenta 5	24 de mayo a 23 de junio de 2025	$ 583.227.126,05	$ 186.632.680,34		$ 769.859.806	$ 38.492.990,00	$ 731.366.816,38	PAGO

Pagos Efectuados	Periodo	Costos Directos	AIU	Suministro	Valor Total Acta	Retegarantía 5%	Total, a Girar	Estado
Cuenta 6	24 de junio a 23 de julio de 2025	$ 456.710.661,60	$ 146.147.411,71		$ 602.858.073	$ 30.142.904,00	$ 572.715.169,31	PAGO
Cuenta 7	24 de julio a 23 de agosto de 2025	$ 401.305.466,12	$ 128.417.749,16		$ 529.723.215	$ 26.486.161,00	$ 503.237.054,27	PAGO
Cuenta 8	24 de agosto a 23 de septiembre de 2025	$ 579.980.185,61	$ 185.593.659,39	$ 87.952.800,00	$ 853.526.645	$ 42.676.332,00	$ 810.850.313,00	PAGO
Cuenta 9	24 de septiembre 23 de octubre de 2025	$ 680.043.365,15	$ 217.613.876,85		$ 897.657.242	$ 44.882.862,00	$ 852.774.380,00	PAGO
Cuenta 10	24 de octubre 23 de noviembre de 2025	$ 859.061.386,12	$ 274.899.643,56		$ 1.133.961.030	$ 56.698.051,00	$ 1.077.262.978,68	PAGO
Cuenta 11	24 de noviembre 23 de diciembre de 2025	$ 213.437.773,48	$ 68.300.087,52		$ 281.737.861	$ 14.086.893,00	$ 267.650.968,00	EN TRAMITE
Cuenta 12	24 de diciembre 2025 a 23 de enero de 2026	$ 521.666.470,27	$ 166.933.270,49		$ 688.599.741	$ 34.429.987,00	$ 654.169.753,76	EN TRAMITE
TOTAL		**$ 6.667.149.669,67**	**$ 2.133.487.894,69**		**$ 9.713.808.594,12**	**$ 451.260.442,00**	**$ 8.573.948.411,36**	

TOTAL, FACTURADO ACTA No 12	$	688.599.741
TOTAL FACTURADO , ACUMULADO	$	9.713.808.594,12
SALDO POR FACTURAR	**$**	**10.540.258.970,88**

29. PUNTAJE

Esta información se encuentra en el Anexo 15. Puntaje.

30. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se presenta un avance del 8,24% en la ejecución respecto a lo solicitado en el anexo técnico, sin embargo, se informa que en este noveno mes las condiciones climáticas no fueron favorables lo cual tiene una incidencia directa en la ejecución de actividades.

- Para la cuenta 1 se tienen 9 ID's, los 9 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 2 se tienen 6 ID's, 6 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 3 se tienen 11 ID's, 11 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 4 se tienen 15 ID's, 15 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 5 se tienen 17 ID's, 17 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 6 se tienen 9 ID's, 9 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 7 se tienen 12 ID's, 12 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 8 se tienen 21 ID's, 21 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 9 se tienen 9 ID's, 9 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 10 se tienen 11 ID's, 11 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 11 se tiene 1 ID, 1 están APROBADOS por SDM.
- Para la cuenta 12 se tiene 8 ID's en proceso de Georreferenciación.

31. ANEXOS

ANEXO 1. Pólizas

ANEXO 2. Plan de Manejo de Tránsito

ANEXO 3. Aspectos Técnicos

ANEXO 4. Consultas Reservas

ANEXO 5. Plan de Calidad

ANEXO 6. Protocolo de Manejos y Residuos

ANEXO 7. Acta de entrega a almacén

ANEXO 8. Certificados de calibración

ANEXO 9. Señales retiradas en vía

ANEXO 10. Gestión social

ANEXO 11. Gestión seguridad y salud en el trabajo

ANEXO 12. Certificación honorarios y parafiscales

ANEXO 13. Certificación pago de proveedores

ANEXO 14. Balance presupuestal

ANEXO 15. Puntaje
