20 Anexo VI – CORRESPONDENCIA RECIBIDA
(24 folio)

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

OFC001_CS_2025

Aguazul 28 de octubre de 2025

Yamid Lesmes R.
28-10-2025

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Respuesta a solicitud de documentos para el acta de inicio del contrato.

Cordial saludo,

En atención al oficio mediante el cual se solicita la documentación necesaria para la elaboración del acta de inicio del contrato de obra pública 0806 de 15 de septiembre de 2025, me permito informar que actualmente me encuentro realizando el proceso de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

Una vez se formalice dicha vinculación y se obtenga el respectivo soporte, procederé a remitir el documento faltante para completar los requisitos establecidos.

Adjunto los siguientes documentos requeridos:

- Pólizas de garantías y amparos
- Comprobante de aprobación de pólizas
- Pago de estampilla del contrato
- Documentación del personal ofertado y aprobado

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

- Programación de obra y flujo de caja.

Agradecemos su comprensión y colaboración para continuar con una excelente disposición respecto al trámite.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

OFC002_CS_2025

Aguazul 04 de noviembre de 2025

Yamid Lesmes R.
04-11-2025.

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Justificación por no realización de afiliaciones a la ARL.

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio me permito informar que no ha sido posible realizar el proceso de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) de las personas que estarán vinculadas en el contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, debido a que la empresa aún no ha sido registrada en el sistema de seguridad correspondiente, pero que son situaciones administrativas ajenas a nuestra voluntad.

Actualmente nos encontramos adelantando los tramites necesarios para la formalización y registro de la entidad ante las plataformas y organismos pertinentes, en primera instancia, se realizo el tramite de la afiliación con la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, sin embargo, dicho trámite no ha podido ser finalizado por motivos administrativos internos de esa entidad (cambio de plataformas virtuales).

Posteriormente, se procede a gestionar el registro con la ARL SURA, el tramite de sebe realizar por plataforma virtual, pero se encuentra presentando falla masiva en el portal.

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

Es importante resaltar que el Consorcio se encuentra actuado de manera diligente, realizando los trámites y siguiendo las instrucciones indicadas por las ARL involucradas. Nos mantenemos en constante comunicación para obtener la aprobación final y proceder inmediatamente con la afiliación de los trabajadores, conforme a la normatividad vigente en materia de riesgos laborales.

Agradecemos su comprensión frente a esta situación, que esperamos sea resuelta a la mayor brevedad posible. Reiteramos nuestra disposición para entregar cualquier soporte o información adicional que se requiera.


Se anexa como evidencia las respuestas por parte de las entidades a la cual se ha realizado la solicitud.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com


GÉMINIS CG

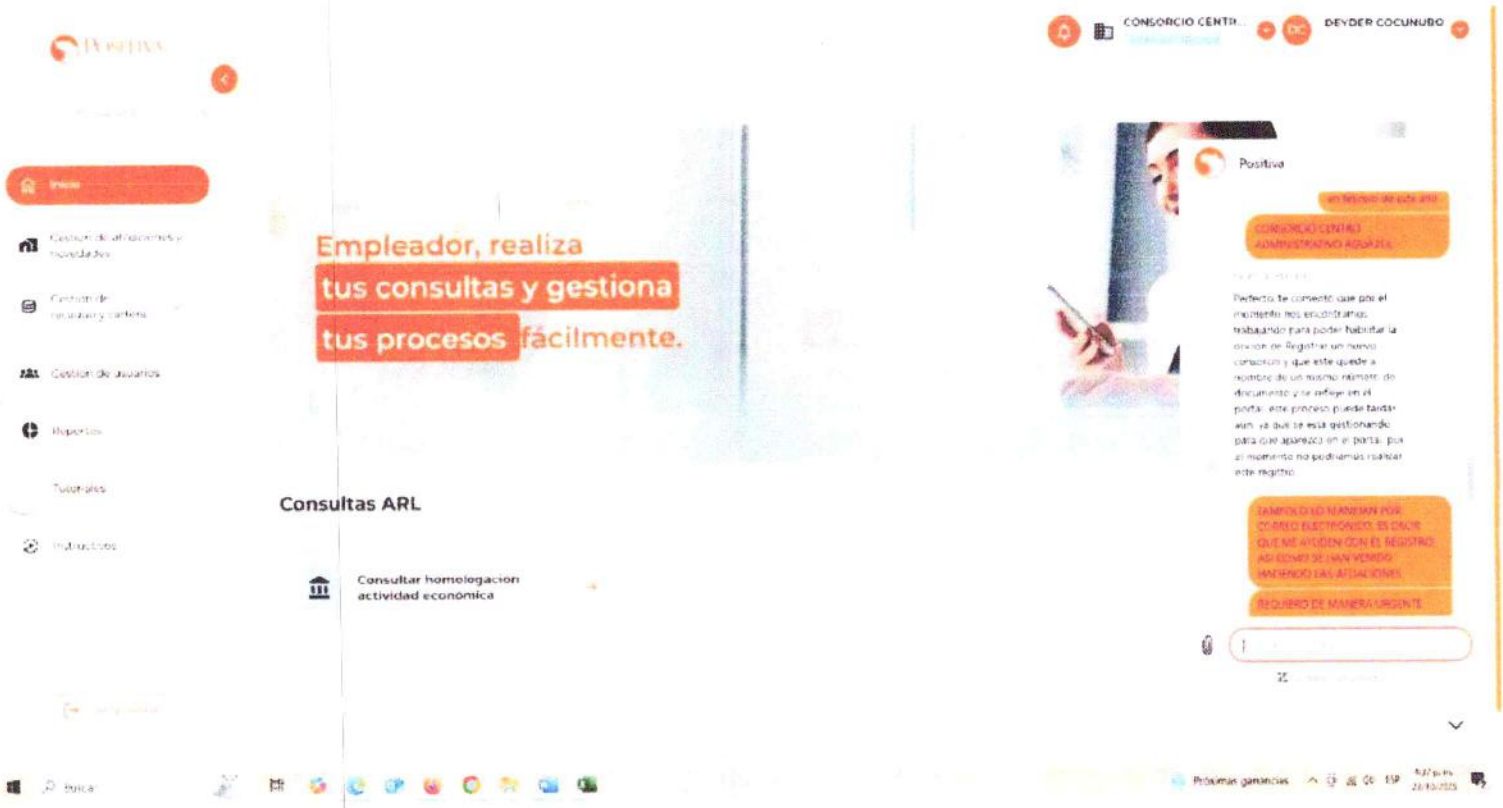




CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com


GÉMINIS CG

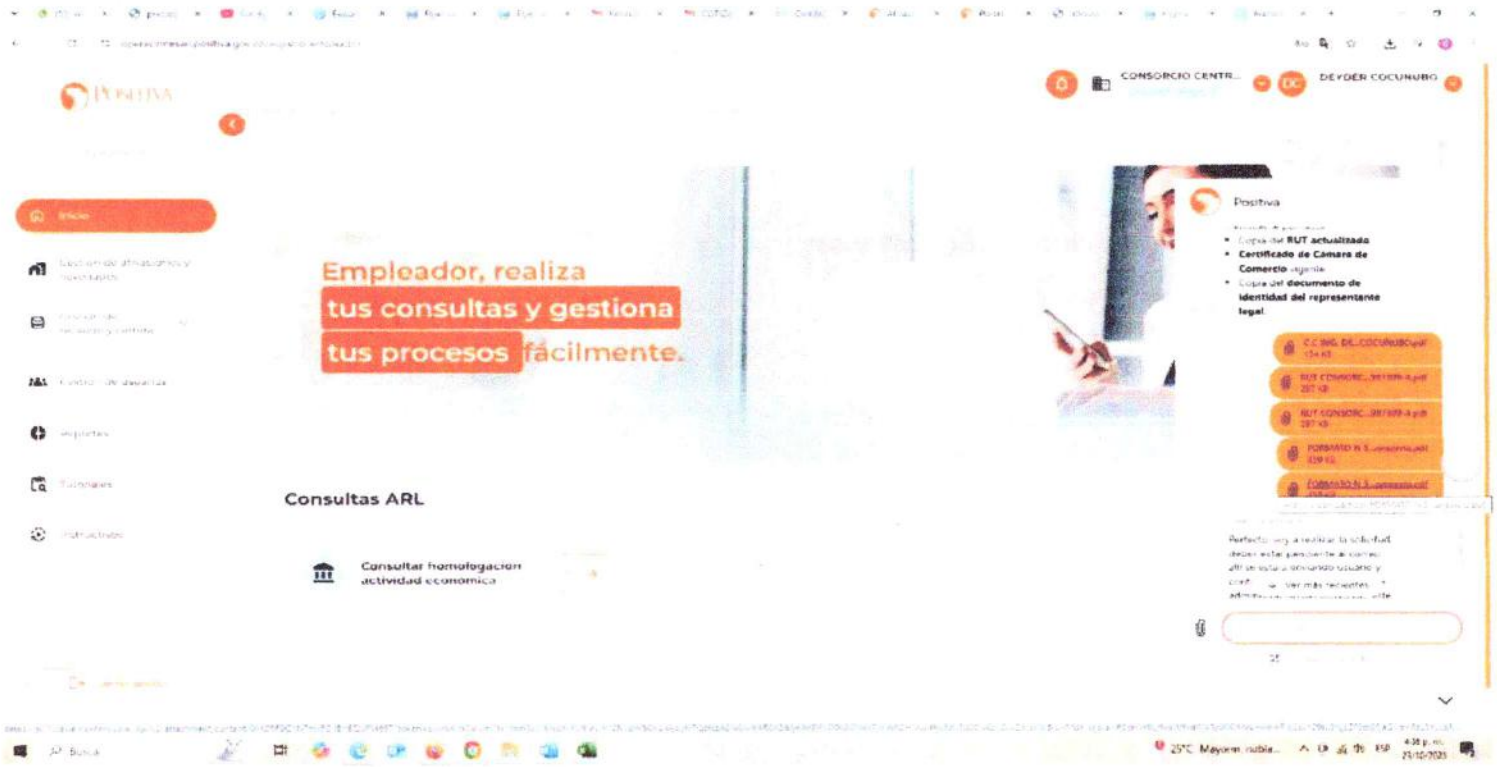

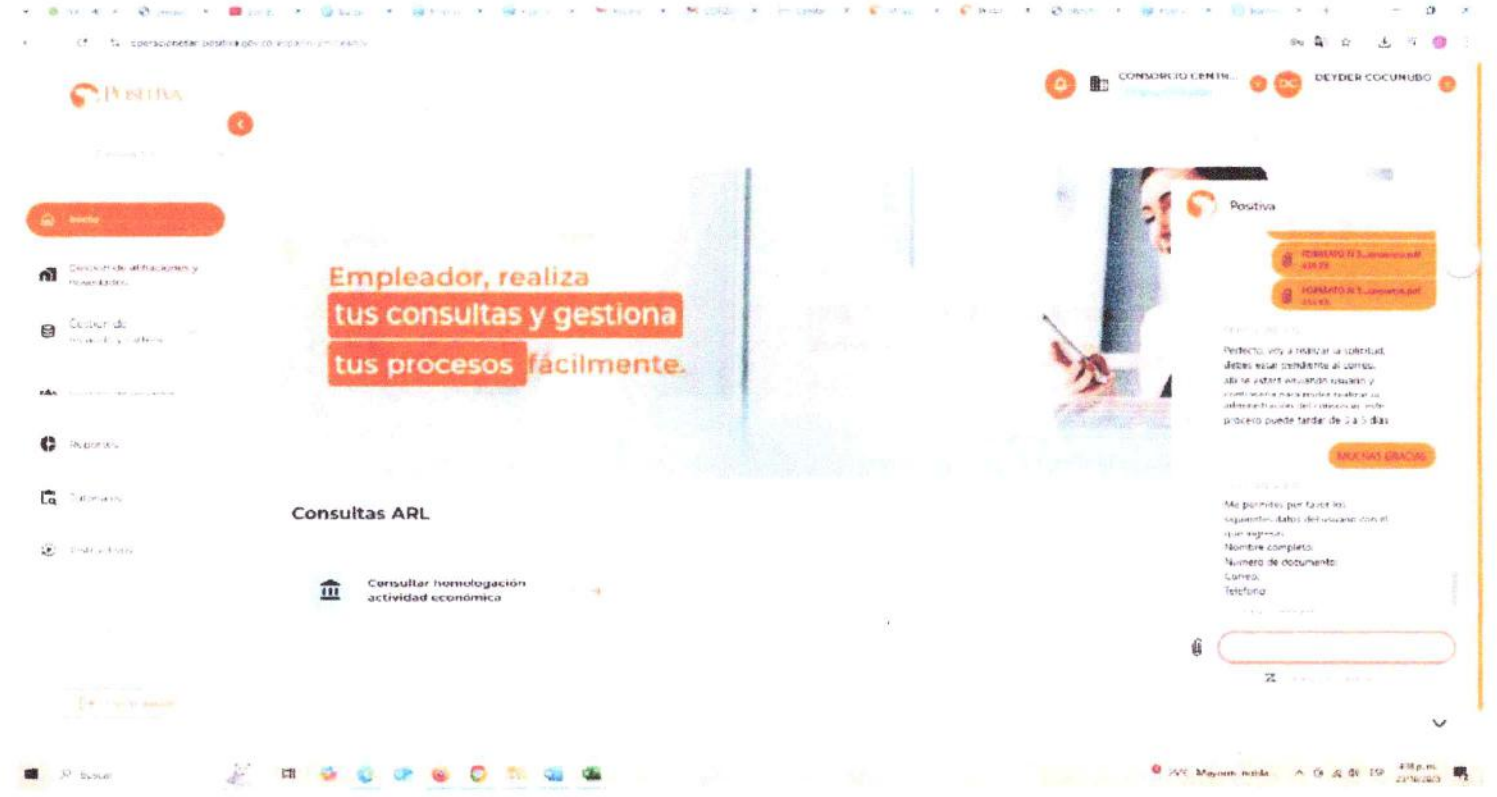


CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com


GÉMINIS CG

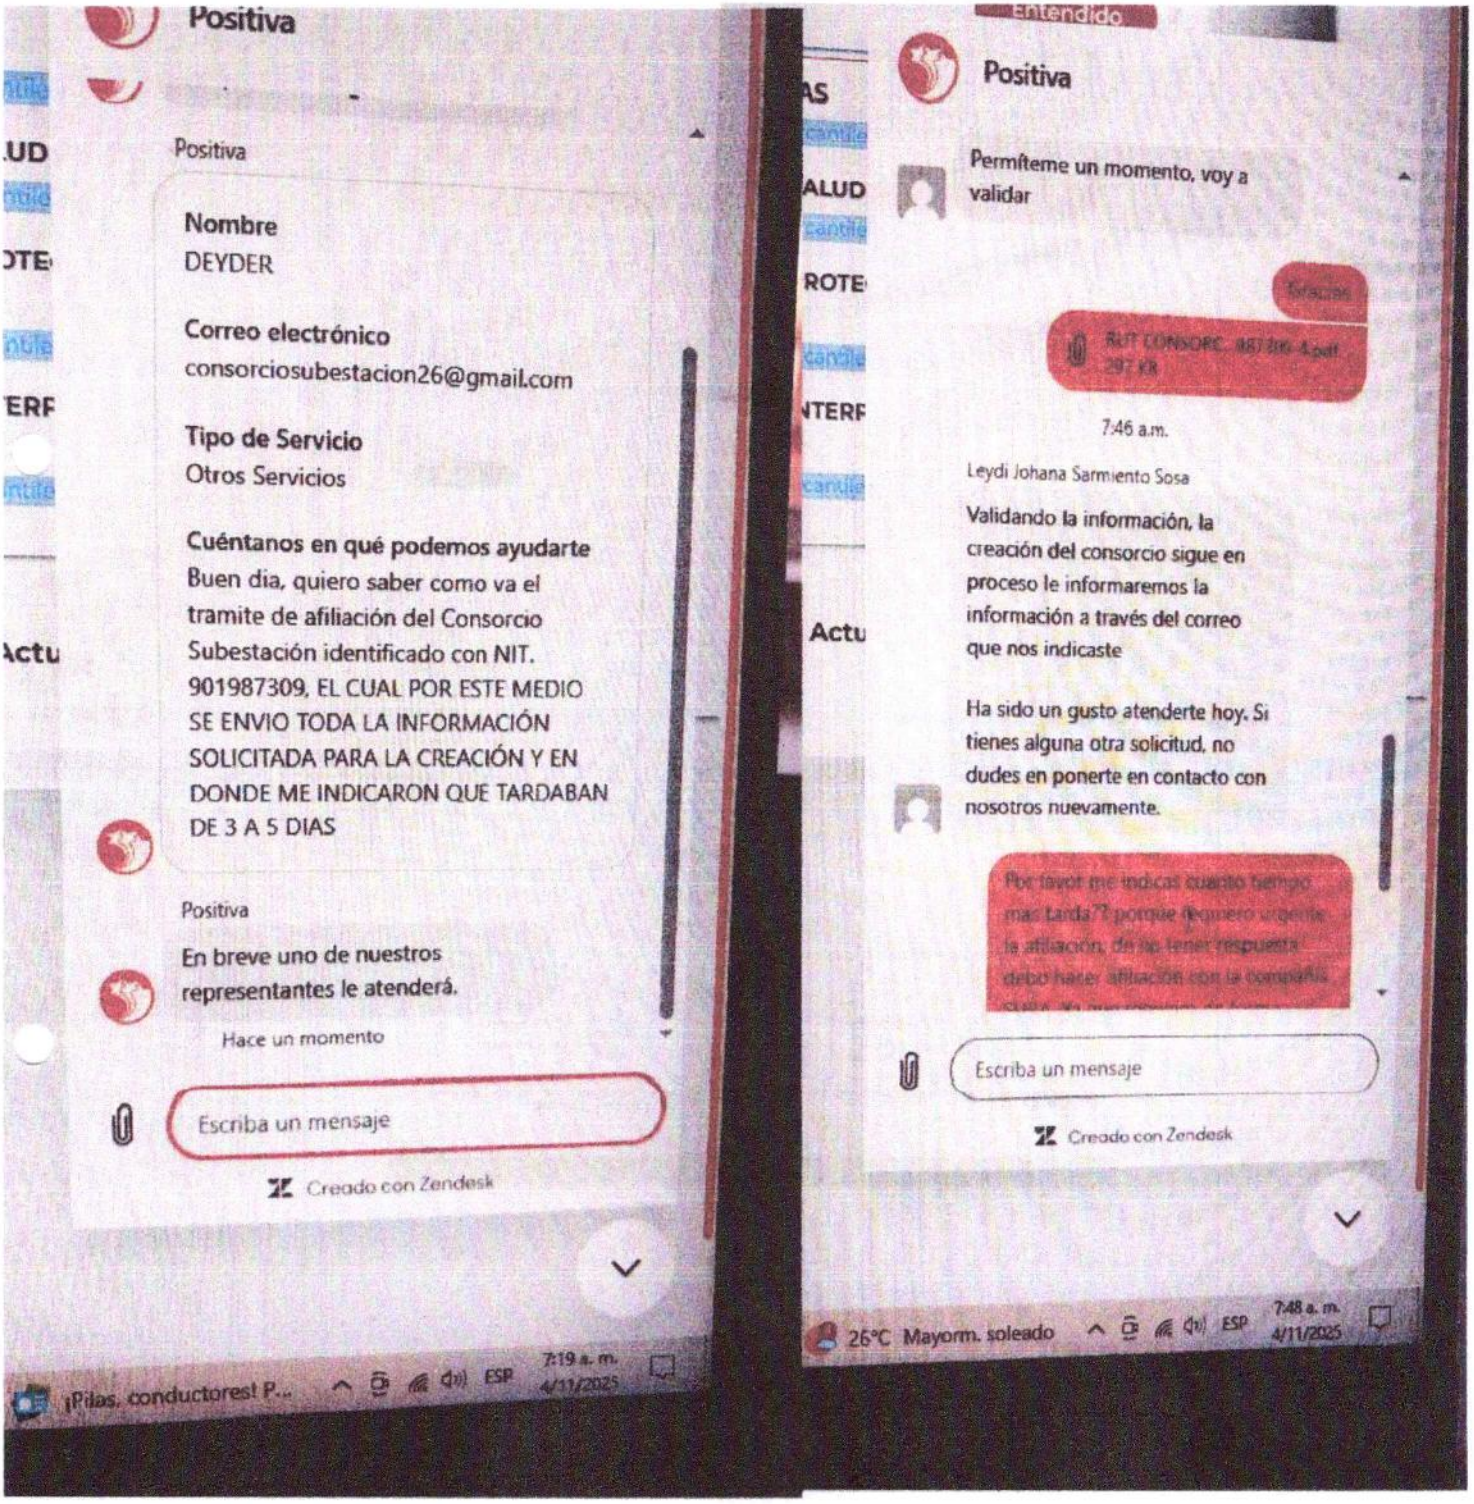

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com


GÉMINIS CG

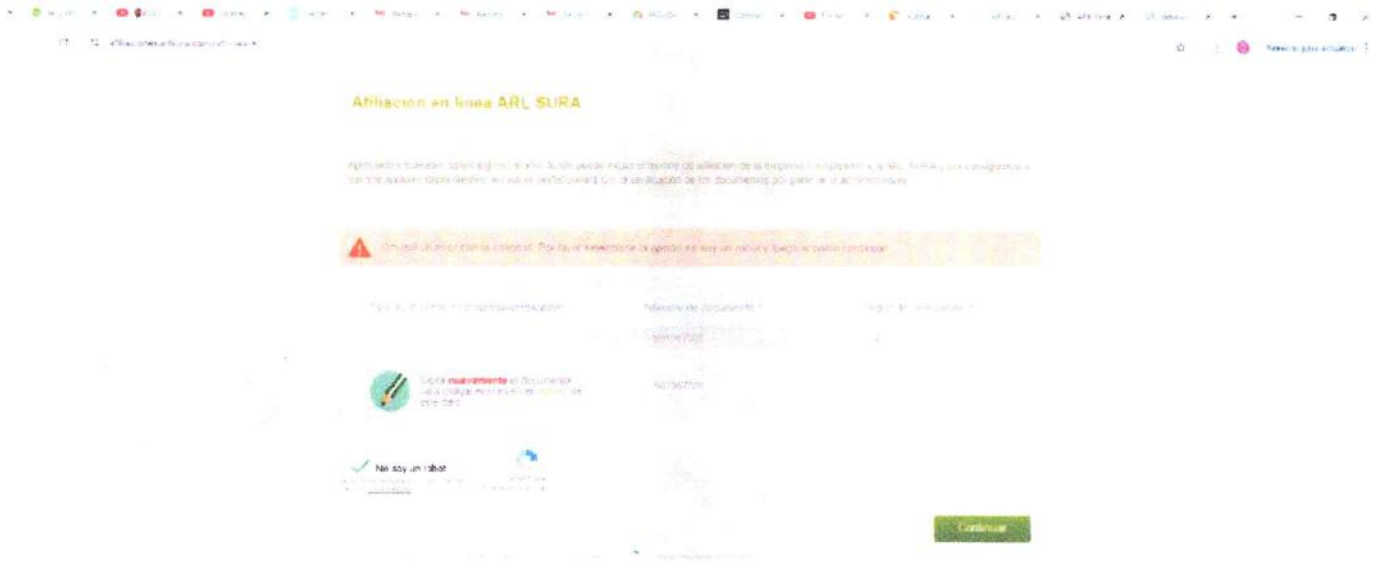

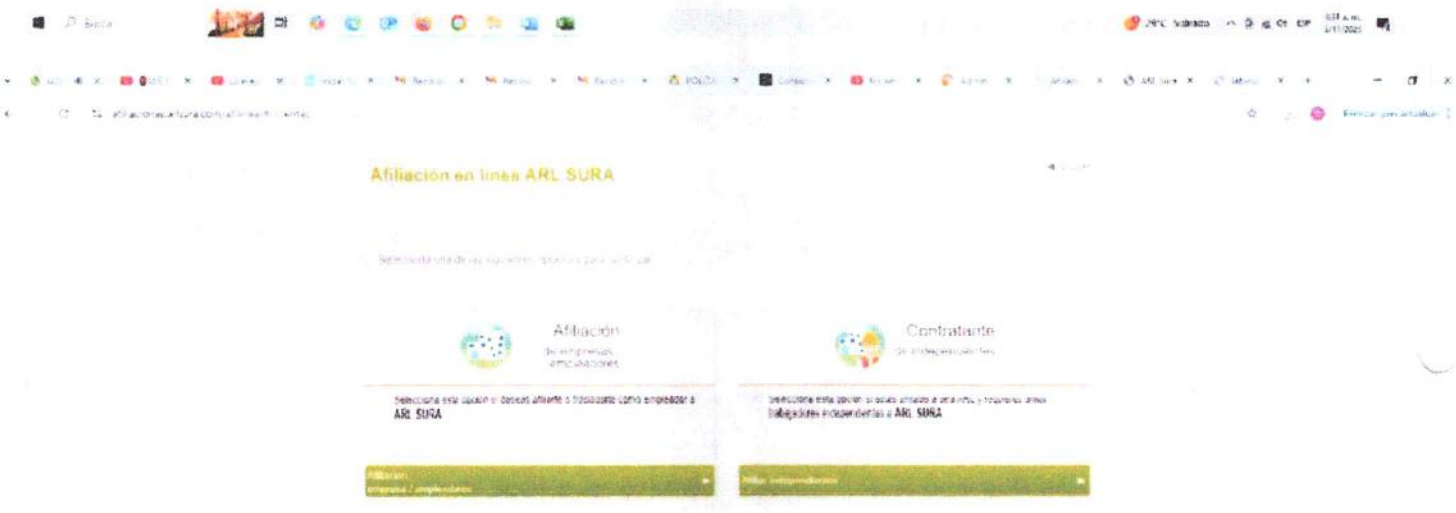

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG

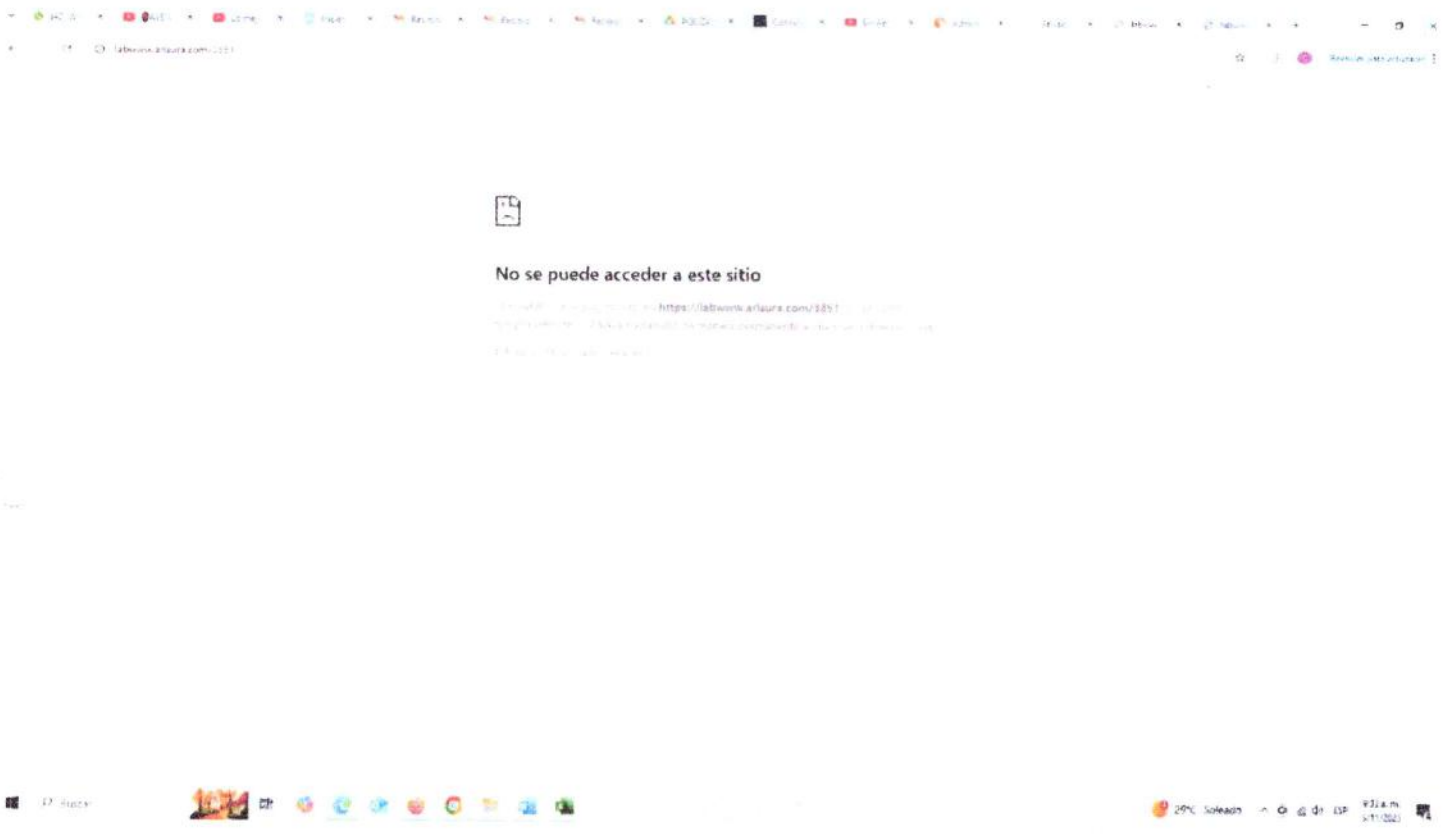

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

OFC003_CS_2025

Aguazul 12 de noviembre de 2025

12-11-2025.
Yamid Lesmes R

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de Trámite para Suscripción del Acta de Inicio de Obra - Contrato No. 0806 de 2025.

Cordial saludo,

En seguimiento a la fase pre-constructiva del Contrato de Obra de la referencia, el CONSORCIO SUBESTACIÓN, se dirige a la Interventoría con el fin de solicitar el trámite ante la entidad contratante para la Suscripción del Acta de Inicio de Obra.

Certificamos y confirmamos que, a la fecha, se han superado y cumplido la totalidad de los requisitos que condicionaban el inicio de la ejecución, según se detalla a continuación:

- Cumplimiento legal y de seguridad social: Se ha entregado la totalidad de la documentación legal y de seguridad social requerida, lo cual incluye: soportes de afiliación al sistema de seguridad social integral (ARL, EPS y AFP) del personal operativo.
- Documentos de planeación: Se ha presentado la programación de obra ajustada y al flujo de caja correspondiente al proyecto.

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG
ingeniería y soluciones integrales

Habiéndose verificado el cumplimiento del 100% de los requisitos, solicitamos a la Interventoría gestionar y convocar con carácter de urgencia a la entidad contratante para la firma del Acta de Inicio de Obra, permitiendo así el inicio formal de los trabajos y el cumplimiento del plazo contractual.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

OFC004_CS_2025

Aguazul 19 de noviembre de 2025

Yamid Lesmes R.
19-11-2025

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de coordinación para intervención en subestación eléctrica y autorización de corte en plazoleta central del contrato 0806 del 2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento del cronograma de actividades establecido para el proyecto y dando continuidad a lo estipulado en el acta de inicio de la referencia, se requiere su colaboración y aval para proceder con dos hitos cruciales para el avance de la obra:

- Coordinación para entrega y levantamiento de acta de subestación: solicitamos a la interventoría que coordine y programe la entrega física de la subestación eléctrica (SE) para la ampliación del cuarto de planta eléctrica.

  Es indispensable:
  - Entrega y acceso: Formalizar la entrega del área de la SE para poder iniciar los trabajos de obra civil.
  - Acta de Estado: Participar en el levantamiento de un acta de inspección y entrega, donde se deje evidencia documental (fotográfica y descriptiva) del estado actual de los equipos, componentes y la infraestructura existente de la Subestación, antes

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

de cualquier intervención, esto es vital para establecer el punto de partida y las responsabilidades sobre la custodia de los activos.

- Autorización de Intervención para instalación de banco ducto: Requerimos la autorización expresa de la Interventoría para realizar el corte y la excavación necesarios en el área de la plazoleta central y área de jardín, con el fin de ejecutar la instalación del banco ducto eléctrico.

Agradecemos su pronta gestión y coordinación para la programación de estas actividades, permitiendo así el cumplimiento de los plazos contractuales. Por favor, sírvase indicarnos la fecha y hora más adecuadas para realizar la inspección y firma del Acta.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG
ingeniería y soluciones integrales

OFC005A_CS_2025

Yamid Lesmes R
11-12-2025
9:50 AM

Aguazul 11 de diciembre de 2025

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega de informe mensual de obra No. 01del contrato 0806 del 2025.

Cordial saludo,

Dando respuesta a su solicitud, adjuntamos formalmente el Informe Mensual de Obra No. 01, correspondiente al mes de noviembre de 2025, el cual incluye los componentes requeridos.

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración o revisión técnica que considere necesaria para la aprobación del mismo.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

OFC006_CS_2026

Aguazul 05 de enero de 2026

Yamid Lesmes R.
05-01-2026
8:30 AM

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Información de llegada de equipo nuevo y solicitud urgente de retiro de planta existente.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos informarles que, de acuerdo con el cronograma de suministros y ejecución del proyecto, la nueva planta eléctrica está programada para arribar a la obra el día de mañana 06 de enero de 2026.

Al respecto, es imperativo precisar que el equipo de trabajo ha optimizado los rendimientos mediante la ejecución de la mayor cantidad posible de actividades en frentes externos y periféricos. No obstante, el avance de la obra ha alcanzado un punto de inflexión en su ruta crítica, donde el inicio de las adecuaciones locativas internas del cuarto técnico es de carácter obligatorio para la continuidad del cronograma.

Por lo anterior, solicitamos su gestión inmediata para el retiro de la planta eléctrica existente, la desocupación total de este espacio es un prerrequisito técnico indispensable para proceder con:

- Adecuaciones civiles y mecánicas: Intervención en bases, sistemas de anclaje y acabados superficiales del recinto.

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

- Acondicionamiento ambiental: Ajustes en los sistemas de ventilación y ductería de escape específicos para las dimensiones del nuevo equipo.
- Protocolos de maniobra: Disposición del radio de giro y espacio necesario para el ingreso seguro de la nueva unidad.

Dada la llegada inminente del equipo, cualquier demora en el retiro de la planta existente impactará directamente en los tiempos de instalación y puesta en marcha.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG
ingeniería y soluciones integrales

OFC007_CS_2026

Aguazul 05 de enero de 2026

Yamid Lesmes R.
05-01-2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega de la versión ajustada de informe mensual de obra No. 01

Cordial saludo,

En atención a su comunicación de devolución, nos permitimos hacer entrega nuevamente del Informe Mensual de Obra No. 01, correspondiente al mes de noviembre de 2025.

Informamos que se realizó una revisión integral del documento, atendiendo cada una de las observaciones y precisiones de forma que fueron señaladas por su equipo en los diferentes apartes del cuerpo del informe, con estos ajustes, el documento cumple con los requerimientos técnicos y administrativos establecidos.

Agradecemos su gestión para la validación final y posterior trámite de aprobación del mismo.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

Yamid Lesmes R.
17-01-2026

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

OFC008_CS_2026

Aguazul 17 de enero de 2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega de informe mensual de obra No. 02 del contrato 0806 del 2025.

Cordial saludo,

Dando respuesta a su solicitud, adjuntamos formalmente el Informe Mensual de Obra No. 02, correspondiente al mes de diciembre de 2025, el cual incluye los componentes requeridos.

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración o revisión técnica que considere necesaria para la aprobación del mismo.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG
ingeniería y soluciones integrales

OFC009_CS_2026

Aguazul 19 de enero de 2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de ventana de operación y desconexión programada – Cambio de planta eléctrica

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la Dirección de Obra se permite informar a la Interventoría que ya se encuentran en sitio la totalidad de los elementos, equipos y materiales necesarios para proceder con el cambio definitivo de la planta eléctrica existente por el nuevo equipo suministrado, cumpliendo así con las especificaciones técnicas del proyecto.

En atención a los compromisos adquiridos en los distintos comités técnicos realizados entre las partes, y entendiendo la criticidad del servicio eléctrico para el funcionamiento del Centro Administrativo, se ha determinado que dicha maniobra debe ejecutarse fuera de la jornada laboral ordinaria.

Por lo anterior, solicitamos formalmente la gestión y autorización de una ventana de operación para los días:

- Sábado 24 de enero de 2026
- Domingo 25 de enero de 2026

Durante este periodo, se requiere realizar el corte de energía total de las instalaciones de la Alcaldía, con el fin de ejecutar las maniobras de retiro del equipo existente, adecuación de conexiones, puesta en marcha y pruebas de carga de la nueva planta eléctrica de manera segura y eficiente.

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

Solicitamos a la Interventoría realizar las gestiones pertinentes ante la Entidad para la aprobación de este horario y coordinar de manera conjunta los planes de contingencia y maniobra necesarios, garantizando que el día lunes 26 de enero el sistema se encuentre operando en condiciones óptimas.
Quedamos atentos a su pronta respuesta para proceder con la logística de personal y equipos de apoyo.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

Yamid Lesmes R.
19-01-2026

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

OFC010_CS_2026

Aguazul 19 de enero de 2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Respuesta al oficio IAT-OFI-2026-01-CON-014 – Entrega de balance de mayores y menores cantidades

Cordial saludo,

En atención a su requerimiento mediante el oficio de la referencia, por medio del cual solicita la entrega del informe de balance de mayores y menores cantidades del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", nos permitimos hacer entrega formal del documento técnico solicitado para su respectiva revisión y aprobación.

Como es de su conocimiento, la ejecución de la obra se ha visto supeditada a eventos externos y situaciones de fuerza mayor ajenas al control de este contratista, estos factores han derivado en la necesidad de ajustar técnicamente los ítems de ejecución, garantizando siempre la estabilidad y funcionalidad de la obra. El informe adjunto contiene:

- Balance técnico y financiero: Cuadro comparativo con el detalle de las cantidades del presupuesto inicial frente a las ejecutadas, incluyendo las variaciones resultantes de los ajustes de diseño y obra.
- Justificación de variaciones: Análisis pormenorizado de cada ítem (mayores y menores cantidades), debidamente sustentado en las condiciones reales del terreno y los requerimientos técnicos surgidos durante la ejecución.
- Anexos de soporte: Memorias de cálculo actualizadas y soportes gráficos que evidencia la necesidad de los ajustes propuestos.

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento del cronograma y la calidad técnica de la obra, quedando atentos a sus observaciones o validación del presente balance para proceder con el trámite administrativo de las actas correspondientes.

Agradecemos su atención y quedamos a su entera disposición.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

229

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

Yamid Lesmes R.
27-01-2026

GÉMINIS CG
Ingeniería y soluciones integrales

OFC011_CS_2026

Aguazul 27 de enero de 2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de ventana de operación y desconexión programada – Logística de retiro de equipo existente

Cordial saludo,

Hacemos referencia al oficio OFC009_CS_2026 radicado el pasado 19 de enero de 2026, mediante el cual se solicitó la autorización de una ventana de operación para el cambio de la planta eléctrica del Centro Administrativo. Al respecto, nos permitimos manifestar lo siguiente:

- Urgencia de coordinación: A la fecha no se ha recibido confirmación formal sobre la ventana de trabajo solicitada, esta validación es indispensable para coordinar de manera efectiva el desplazamiento y la intervención de los distintos profesionales, técnicos y proveedores especializados que deben concurrir simultáneamente para la ejecución segura de la tarea.
- Estado de la planta existente: Se informa que, una vez finalizada la maniobra y puesta en funcionamiento la nueva planta eléctrica, el equipo existente quedará totalmente desconectado del sistema.
- Retiro de equipo: Por lo anterior, solicitamos que la Administración Municipal, a través de su gestión, programe de manera inmediata el retiro y la movilización de la planta eléctrica antigua. Lo anterior es necesario para liberar los espacios técnicos y evitar obstrucciones que impidan la normal finalización de las obras complementarias.

Reiteramos que el personal y los materiales se encuentran listos en sitio, pero dependen de su pronta respuesta para asegurar la logística y evitar retrasos en el cronograma de obra.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT: 901.987.309-4
consorciosubestacion26@gmail.com

Yamid Lesmes R.
28-01-2026.

GÉMINIS CG
ingeniería y soluciones integrales

OFC012_CS_2026

Aguazul 28 de enero de 2026

SEÑOR:
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Ciudad

Referencia: Contrato de obra pública 0806 del 15 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Validación de cronograma y horarios para la ventana de operación.

Cordial saludo,

En alcance a nuestra solicitud de ventana de operación y conforme a lo concertado en el comité técnico realizado con la entidad y su despacho, nos permitimos presentar por escrito el cronograma detallado de horarios para la intervención programada de la nueva planta eléctrica.

El propósito de este oficio es formalizar los tiempos de ejecución acordados y obtener su validación para el inicio de las maniobras.

- Fechas de intervención: sábado 31 de enero y domingo 01 de febrero de 2026.
- Franja horaria autorizada: Se ha establecido el siguiente horario de trabajo continuo para garantizar la ejecución de las actividades sin afectar la jornada laboral administrativa:
  - Inicio de labores (Corte y bloqueo): 07:00 a.m.
  - Cierre de actividades (Restablecimiento provisional): 05:00 p.m.
- Actividades Críticas:
  - Sábado 31/01: Desconexión de acometidas existentes e izaje de componentes.
  - Domingo 01/02: Pruebas de carga, transferencia automática y verificación de niveles de combustible (se garantiza suministro de 40 galones).

Agradecemos firmar el recibido a satisfacción de este cronograma como constancia de la autorización para el ingreso del personal y el inicio de las actividades en los horarios estipulados.

Sin otro particular,

CONSORCIO SUBESTACIÓN
DEYDER E. COCUNUBO VARGAS
Representante Legal

21 Anexo VII – CORRESPONDENCIA ENVIADA

(27 folios)

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-10-ENT-001

Aguazul, 03 de octubre de 2025

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

03 OCT 2025

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 y No. SECOP II RSC-CM-003-2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACION DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Plan de inversión del anticipo

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito presentar el plan de inversión del anticipo, para su revisión y aprobación para el desarrollo del contrato en referencia, suscrito entre YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.607.262 de Tunja y el Municipio de Aguazul.

Así mismo solicitamos se autorice el trámite para el desembolso del anticipo por un valor de **VEINTE TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS** ($ 23.913.880,00)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	%
1	Pago de salarios y seguridad social	$ 17.935.410,00	75,00%
2	Alquileres y arriendos	$ 2.989.235,00	12,50%
3	Papelería y compra de equipos	$ 2.989.235,00	12,50%
TOTAL		$ 23.913.880	100%

Así mismo adjuntamos copia de la certificación bancaria para el manejo de los recursos del BANCO BBVA – CTA ahorros 001309810002000016289.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-10-ENT-002

Aguazul, 14 de octubre de 2025

14 OCT 2025

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoría 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega informe preconstructivo

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio, la Interventoría remite, para su revisión y aprobación, el informe preconstructivo del contrato cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

En el documento se certifica que los estudios y diseños suministrados han sido verificados y cumplen con la ingeniería de detalle, la normativa aplicable y los estándares de diseño requeridos para el proyecto.

Se solicita su aprobación formal del informe para autorizar el inicio de la etapa de construcción de las obras.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESÉNTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-10-ENT-003

Aguazul, 16 de octubre de 2025

16 OCT 2025
9:04 am

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoría 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de reunión de socialización para inicio de actividades

Cordial saludo,

En nuestra calidad de Interventoría y en cumplimiento de las obligaciones contractuales y las buenas prácticas de la ingeniería, nos permitimos solicitar formalmente a la Entidad contratante (Municipio de Aguazul), la convocatoria a una reunión de socialización con los actores involucrados y la comunidad beneficiaria del proyecto, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", esta reunión es un hito fundamental y un requisito para poder proceder con la suscripción del acta de inicio de la Obra.

El objetivo principal es realizar la presentación formal del proyecto, asegurando la correcta comprensión y el consenso necesario para un desarrollo armónico de las actividades.

Agradecemos su gestión para citar a los actores que consideren pertinentes, de igual forma, solicitamos su apoyo en la coordinación de la fecha, lugar y los medios audiovisuales necesarios para la presentación.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESÉNTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-10-CON-004

Aguazul, 24 de octubre de 2025

Recibi
Deyder Cocunubo V.
24/10/2025
2:50 pm

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

Referencia: Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de documentación para acta de inicio

Cordial saludo,

En nuestra calidad de Interventoría del contrato de la referencia y en seguimiento al desarrollo de la etapa preconstructiva, nos dirigimos a ustedes con el fin de avanzar hacia la formalización de la etapa constructiva, teniendo en cuenta que el proyecto ya recibió el aval preconstructivo por parte de esta Interventoría y fue radicado informe a la entidad contratante, y considerando que se cumple el plazo estipulado para la legalización del inicio de obra, solicitamos formalmente la entrega de la siguiente documentación contractual pendiente, la cual es indispensable para proceder con la elaboración y suscripción del acta de inicio:

- Pólizas de garantías y amparos
- Comprobante de aprobación de pólizas
- Pago de estampillas del contrato
- Documentación del personal ofertado y aprobado
- Afiliaciones de ARL, EPS y AFP
- Programación de obra y flujo de caja.

Agradecemos radicar la documentación mencionada a la mayor brevedad posible, con el fin de dar cumplimiento a los términos contractuales y evitar retrasos en el cronograma general del proyecto.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-11-CON-005

Deyder Cuanbo V.
Fecha: 3-Nov-2025
Hora. 9:30am

Aguazul, 03 de noviembre de 2025

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

Referencia: Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Requerimiento de documentación faltante para acta de inicio

Cordial saludo,

En nuestra calidad de Interventoría del contrato de la referencia, acusamos recibo de su comunicación OFC001_CS_2025, radicada el pasado 28 de octubre de 2025, junto con los documentos adjuntos (pólizas, comprobante de aprobación, pago de estampilla, documentación de personal y programación de obra).

Una vez revisada la documentación y su respuesta, evidenciamos que aún no se ha completado la totalidad de los requisitos indispensables para proceder con la elaboración y suscripción del acta de inicio de la etapa constructiva, en su comunicación, y usted menciona estar en proceso de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)

Por lo anterior, solicitamos formalmente radicar a la mayor brevedad posible la siguiente documentación contractual pendiente:

- Soportes de afiliación a ARL (Certificado final, no solo el trámite).
- Soportes de afiliación EPS.
- Soportes de afiliación a AFP.

Reiteramos que la entrega de la totalidad de los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral del personal ofertado y aprobado es un requisito indispensable para legalizar el inicio de actividades y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

Agradecemos su pronta gestión con el fin de no generar mayores retrasos en el cronograma general del proyecto
Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESÉNTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-11-ENT-008

Aguazul, 13 de noviembre de 2025

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
14 NOV 2025
Recibido por:
Hora: 3:38 AM ☐ PM ☑
Radicado No. _____ Folios: _____

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoría 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de acta de inicio de obra Contrato No. 0806 de 2025.

Cordial saludo,

En nuestra calidad de Interventoría y en cumplimiento con lo establecido en las obligaciones contractuales, nos dirigimos a ustedes para solicitar formalmente la convocatoria para la suscripción del Acta de Inicio de Obra del Contrato No. 0806 de 2025.

Esta solicitud se fundamenta en la superación de los impedimentos que motivaron la suspensión temporal de la Interventoría y la consecuente imposibilidad de iniciar la Obra, tal como se detalla a continuación:

I. Aprobación del Informe Pre-Constructivo

Confirmamos que el Informe Pre-constructivo, que incluye la revisión y el aval técnico de los documentos de planeación inicial, ha sido APROBADO.

II. Subsanación de Requisitos Legales

Se informa que el Contratista de Obra (Consorcio Subestación) ha subsanado la totalidad de la documentación legal y de seguridad social requerida, la cual era indispensable para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y poder dar inicio a la ejecución. Específicamente, se ha verificado la entrega de:

- Soportes de Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (ARL, EPS y AFP).
- Programación de Obra ajustada y aprobada por la Interventoría.
- Flujo de Caja.

III. Solicitud de Suscripción del Acta de Inicio

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

II. SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA

Con el fin de garantizar el equilibrio contractual y que el plazo de ejecución de la interventoría se equipare al plazo total y real del contrato de obra, se requiere la siguiente modificación:

- Plazo Afectado y Consumido:
  - El contrato de interventoría estuvo activo por un total de 30 días calendario en la etapa pre-constructiva, espera de los documentos por parte del contratista para la firma del acta de inicio de obra, hasta el momento de la suspensión.
  - El plazo contractual de la Interventoría es de ciento cinco (105) dias calendario, mientras que el contrato de obra tiene un plazo de tres (3) meses de ejecución (aproximadamente 90 días).

- Necesidad de Equiparación: La diferencia en los plazos originales de ejecución (105 días interventoría vs. 90 días obra), genera una inconsistencia en la capacidad de la Interventoría para acompañar toda la fase de Obra, la diferencia de 15 días en la fecha de terminación del Contrato de Obra respecto al de la Interventoría debe ser subsanada para asegurar la supervisión de las labores finales.

Prórroga Solicitada: Solicitamos la prórroga del plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 0798 de 2025 por un término de 15 DÍAS CALENDARIO, que corresponde al tiempo requerido para equiparar las fechas de terminación de los dos contratos (obra e interventoría) y garantizar la cobertura total de la fase constructiva y los trámites de cierre.

En consecuencia,

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-11-ENT-009

Aguazul, 14 de noviembre de 2025

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
14 NOV 2025
Recibido por:
Hora: 3:14 AM PM
Radicado No. Folios:

Referencia: Contrato de interventoría 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud anticipo de obra y entrega de plan de inversión del contrato de obra No. 0806 de 2025.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito presentar el plan de inversión del anticipo del contrato de obra No. 0806 de 2025, para su revisión y aprobación para el desarrollo de dicho contrato, suscrito entre CONSORCIO SUBESTACIÓN con NIT 901.987.309-4, representado legalmente por DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS y el Municipio de Aguazul.

Así mismo solicitamos se autorice el trámite para el desembolso del anticipo por un valor de **TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS** ($ 393.079.896,50)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	%
1	Pago de salarios, jornales y seguridad social	$ 19,653,994.82	5.00%
2	Compra Materiales	$ 157,231,958.60	40.00%
3	Alquileres de equipos y/o Compra de Equipos	$ 176,885,953.43	45.00%
4	Transporte de materiales y equipos	$ 39,307,989.65	10.00%
TOTAL		**$ 393,079,896.50**	**100.00%**

Notas: Los porcentajes se toman sobre el 100% del anticipo recibido por el contratista.

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

Así mismo adjuntamos copia de la certificación bancaria para el manejo de los recursos de la fiduciaria Bancolombia S.A – CTA ahorros 60600006200 denominada P.A. ANT CONSORCIO SUBESTACIÓN.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Copia Certificación bancaria (1 folio)*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-11-ENT-010

Aguazul, 20 de noviembre de 2025

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
20 NOV 2025
Recibido por:
Hora: 11:57 AM PM
Folios:
Radicado No.

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoría 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de acta de inspección y entrega de subestación y plazoleta central, para la autorización de intervención de las áreas.

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del contrato de obra No. 0806 de 2025 y dando continuidad a lo estipulado en el acta de inicio, esta Interventoría se permite radicar ante su despacho la solicitud emitida por el CONSORCIO SUBESTACIÓN (Contratista), la cual requiere la autorización de la entidad contratante para el inicio de actividades que afectan activos críticos y áreas comunes.

La solicitud del Contratista, avalada por esta Interventoría, se centra en la necesidad de obtener la entrega física de la subestación eléctrica (SE) para la ampliación del cuarto de planta, esta acción debe estar precedida por una inspección conjunta (Entidad, Interventoría y Contratista) para levantar un acta de estado y custodia, que deje registro documental del estado actual de los equipos antes de cualquier obra civil, lo cual es vital para establecer responsabilidades.

Adicionalmente, se requiere la autorización expresa para intervenir, mediante corte y excavación, el área de la plazoleta central y área de jardín, esta intervención es indispensable para la correcta instalación del banco ducto eléctrico conforme a los diseños aprobados, elemento esencial para la conexión al sistema eléctrico objeto del contrato.

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

Considerando que estas gestiones son cruciales para el avance de la obra y el cumplimiento del cronograma, solicitamos a la impartir la autorización formal a la mayor brevedad posible, esto permitirá a la Interventoría coordinar la inspección y la entrega formal de las áreas.

Agradecemos su gestión y pronta respuesta.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESÉNTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Copia Oficio de solicitud de obra No. OFC004_CS_2025 (2 folio)*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-12-CON-010A

Deyder Cocunubo
5/12/2025
Hora: 8:15am

Aguazul, 5 de diciembre de 2025

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

Referencia: Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Requerimiento de entrega informe mensual de obra No. 01 (noviembre 2025)

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa y financiera que competen a esta Interventoría, nos permitimos solicitar de manera formal la entrega del Informe Mensual de Obra No. 01, correspondiente al periodo ejecutado en el mes de noviembre de 2025.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de referencia y el pliego de condiciones, es responsabilidad del contratista de obra presentar los reportes que evidencien el avance físico y financiero del proyecto, al respecto, recordamos que dicho informe debe contener, como mínimo, los siguientes soportes como mínimo:

i. Informe jurídico
ii. Informe administrativo
iii. Informe técnico
iv. Informe financiero y contable

La entrega oportuna de este documento es indispensable para proceder con la revisión, validación y posterior trámite de aprobación del mismo, actas de recibo parcial y demás gestiones administrativas necesarias para el normal flujo del contrato.

Agradecemos la remisión de este informe en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la recepción del presente oficio.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2025-12-CON-010B

Aguazul, 22 de diciembre de 2025

Deyder Cocunubo
22 de Dic 2025
Hora: 2:35pm

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

Referencia: Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Devolución para ajustes - Informe Mensual de Obra No. 01

Cordial saludo,

Tras realizar la revisión técnica del informe mensual de obra No. 01 recibido en días pasados, nos permitimos hacer la devolución del mismo con el fin de que se realicen algunas precisiones y ajustes menores.

Es importante mencionar que las observaciones identificadas son, en su gran mayoría, de forma y presentación, y no afectan el contenido técnico de fondo, sin embargo, estos ajustes son necesarios para garantizar que el documento cumpla con los estándares de calidad requeridos para su archivo y aprobación definitiva.

Las observaciones y comentarios se han consignado detalladamente en cada uno de los apartes dentro del cuerpo del informe, para que procedan con la corrección correspondiente, una vez realizados los ajustes, agradecería remitir nuevamente el informe para proceder de inmediato con su validación.

Quedamos atentos a cualquier duda técnica para agilizar esta entrega.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-ENT-011

Aguazul, 05 de enero de 2026

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
05 ENE 2026
Recibido por:
Hora: 3:00 AM PM
Folios:
Radicado No.

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoría 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de retiro de planta eléctrica existente.

Cordial saludo,

En ejercicio de las facultades de seguimiento y control que competen a esta Interventoría sobre el contrato de obra, de manera muy atenta nos permitimos hacer entrega del requerimiento formal emitido por el contratista CONSORCIO SUBESTACIÓN a través del oficio OFC006_CS_2026, y radicado a esta interventoría el día 05 de enero de 2026.

Mediante la citada comunicación, el contratista informa que, en cumplimiento del cronograma de suministros, se tiene programado el arribo de la nueva planta eléctrica para el día 06 de enero de 2026, es pertinente resaltar que el equipo de trabajo de obra ha optimizado los rendimientos ejecutando las actividades en áreas externas y periféricas; no obstante, el avance del proyecto ha alcanzado un punto crítico donde es imperativo intervenir el recinto técnico para garantizar la continuidad de la ruta crítica.

Por lo anteriormente expuesto, y con el fin de evitar traumatismos en la ejecución, solicitamos respetuosamente su valiosa intermediación para gestionar, a la mayor brevedad posible, el retiro de la planta eléctrica existente, la desocupación total de este espacio se constituye como un prerrequisito técnico indispensable para proceder con las siguientes actividades:

i. Adecuaciones civiles y mecánicas: Intervención en bases y sistemas de anclaje.
ii. Acondicionamiento: Ajustes en ventilación y ductería de escape.
iii. Protocolos de maniobra: Disposición de espacio para el ingreso seguro del nuevo equipo

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

Agradecemos de antemano su gestión y diligencia, la cual permitirá prevenir retrasos en los tiempos de instalación y puesta en marcha del sistema, asegurando así el cumplimiento de los objetivos contractuales en beneficio de la comunidad de Aguazul.

Agradecemos su atención y diligencia ante esta necesidad técnica prioritaria.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Copia Oficio de solicitud de obra No. OFC006_CS_2026 (2 folio)*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-CON-012

Aguazul, 08 de enero de 2026

Deyder Cocunubo
8-01-2026
Hora: 8:00am

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

Referencia: Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Requerimiento de entrega informe mensual de obra No. 02 (diciembre 2025)

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa y financiera que competen a esta Interventoría, nos permitimos solicitar de manera formal la entrega del Informe Mensual de Obra No. 02, correspondiente al periodo ejecutado en el mes de diciembre de 2025.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de referencia y el pliego de condiciones, es responsabilidad del contratista de obra presentar los reportes que evidencien el avance físico y financiero del proyecto, al respecto, recordamos que dicho informe debe contener, como mínimo, los siguientes soportes como mínimo:

i. Informe jurídico
ii. Informe administrativo
iii. Informe técnico
iv. Informe financiero y contable

La entrega oportuna de este documento es indispensable para proceder con la revisión, validación y posterior trámite de aprobación del mismo, actas de recibo parcial y demás gestiones administrativas necesarias para el normal flujo del contrato.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-ENT-013

Aguazul, 19 de enero de 2026

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
19 ENE 2026
Recibido por:
Hora: 2:26 AM PM
Folios:
Radicado No.

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoría 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Solicitud de autorización de ventana de operación y corte de energía programado – Contrato de Obra 0806 de 2025

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de control y seguimiento al Contrato de Obra Pública No. 0806 de 2025, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO", remito formalmente la solicitud de ventana de operación presentada por el contratista Consorcio Subestación mediante el oficio OFC009_CS_2026.

El contratista informa que dispone en sitio de la totalidad de los equipos y materiales para el cambio definitivo de la planta eléctrica existente por la nueva unidad, con el fin de garantizar la puesta en funcionamiento de dicho equipo y minimizar el impacto en la operación administrativa, se requiere un corte total de energía en las instalaciones de la Alcaldía durante el siguiente periodo:

- Sábado 24 de enero de 2026
- Domingo 25 de enero de 2026

Esta Interventoría ha revisado la pertinencia técnica de la solicitud y considera necesario que la Entidad y la Supervisión realicen las coordinaciones internas y los planes de comunicación pertinentes para autorizar esta ventana de trabajo, lo anterior es fundamental para ejecutar de manera segura el retiro del equipo anterior, la adecuación de conexiones y las pruebas de carga necesarias.

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

Agradecemos su gestión ante la Administración Municipal para confirmar la disponibilidad de estas fechas, con el fin de que el sistema se encuentre operando en condiciones óptimas para el inicio de la jornada laboral el lunes 26 de enero.

Agradecemos su atención y diligencia ante esta necesidad técnica prioritaria.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Copia Oficio de solicitud de obra No. OFC009_CS_2026 (2 folio)*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-CON-014

Aguazul, 19 de enero de 2026

Deyder Cocunubo
19/01/2026
Hora: 8:00am

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

Referencia: Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Requerimiento de entrega informe balance No. 1

Cordial saludo,

En mi calidad de Interventor del contrato de la referencia, y en ejercicio de las facultades de seguimiento, control y vigilancia técnica y administrativa que me corresponden, me permito solicitar de manera inmediata la entrega del informe de balance de mayores y menores cantidades.

Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de consolidar el estado actual de la ejecución técnica y financiera del proyecto, teniendo en cuenta los eventos externos de fuerza mayor y/o situaciones imprevisibles que han afectado el desarrollo normal de las actividades y que han requerido el análisis, ajuste y validación de las cantidades inicialmente pactadas. El informe deberá contener, como mínimo, los siguientes puntos:

- Cuadro comparativo: Relación detallada de las cantidades del presupuesto inicial frente a las ejecutadas y por ejecutar.
- Justificación Técnica: Sustento detallado de cada ítem que presente variación (mayores o menores cantidades), vinculándolos directamente con los eventos externos reportados en comités de obra.
- Análisis financiero: Impacto económico de los ajustes en el valor total del contrato y disponibilidad de recursos.
- Soportes: Soportes gráficos y memorias de cálculo que respalden las variaciones solicitadas.

Es imperativo contar con este documento para garantizar la correcta liquidación de actas y la continuidad del flujo de inversión, evitando traumatismos en el cronograma de entrega final, se otorga un plazo de 5 días hábiles a partir de la recepción de esta comunicación para la radicación del informe ante esta Interventoría.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESÉNTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-ENT-015

Aguazul, 27 de enero de 2026

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
27 ENE 2026
Recibido por:
Hora: 2:42 AM PM
Radicado No. Folios:

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: REITERACIÓN – Solicitud de ventana de operación y logística de retiro de equipo existente – Contrato de Obra 0806 de 2025.

Cordial saludo,

En ejercicio de nuestras funciones de control al contrato de obra No. 0806 de 2025, de manera atenta reiteramos la solicitud enviada mediante el oficio IAT-OFI-2026-01-ENT-013 con fecha del 19 de enero, la cual aún se encuentra pendiente de respuesta formal por parte de la Administración Municipal.

El contratista CONSORCIO SUBESTACIÓN, a través del oficio OFC011_CS_2026, ha manifestado la urgencia de definir la ventana de operación debido a que el retraso en la confirmación está afectando la programación con proveedores y especialistas, adicionalmente, se requiere que la Entidad considere los siguientes puntos críticos para la ejecución de la maniobra:

- Reactivación de la ventana de trabajo: Al no haberse podido ejecutar la actividad en las fechas anteriormente propuestas, solicitamos definir a la mayor brevedad un nuevo horario (preferiblemente fin de semana) para realizar el cambio de la planta eléctrica y las pruebas de carga.
- Desconexión y retiro de equipo existente: Es importante informar que, una vez entre en funcionamiento el nuevo equipo, la planta eléctrica antigua quedará totalmente fuera de servicio, por tanto, se requiere que la administración municipal organice la logística para el retiro y traslado de este activo, liberando así el espacio necesario para terminar las obras complementarias.
- Coordinación de profesionales: La falta de una fecha definida impide al contratista asegurar la presencia simultánea de los técnicos necesarios, lo que podría derivar en mayores tiempos de ejecución o retrasos en la entrega final del proyecto

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

Dada la relevancia del sistema eléctrico para la operatividad del Centro Administrativo, solicitamos su valiosa gestión para formalizar esta autorización y coordinar los planes de contingencia necesarios.

Agradecemos su atención y diligencia ante esta necesidad técnica prioritaria.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESÉNTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Copia Oficio de solicitud de obra No. OFC011_CS_2026 (1 folio)*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-ENT-016

Aguazul, 29 de enero de 2026

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
29 ENE 2026
Recibido por:
Hora: 10:33 AM PM
Folios:
Radicado No.

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoría 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega del informe de obra No. 01 – Contrato de Obra No. 806 del 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega del informe de obra número uno (01) correspondiente al contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Se informa a la entidad que dicho documento ya ha sido revisado y avalado en su totalidad por la interventoría, verificando que su contenido se ajusta a las actividades ejecutadas en campo, se remite para su conocimiento, fines pertinentes y control por parte de la Administración Municipal.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESÉNTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Una (1) carpeta, con 126 folios*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-ENT-017

Aguazul, 29 de enero de 2026

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
29 ENE 2026
Recibido por:
Hora: 10:34 AM PM
Folios:
Radicado No.

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoria 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Entrega de informe de interventoría No. 01.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega del Informe de Interventoría número uno (01) correspondiente al contrato de la referencia.

Se informa a la entidad que este documento contiene el seguimiento y control detallado de las actividades realizadas por esta Interventoría durante el periodo reportado. Se remite para su conocimiento, fines pertinentes y control por parte de la Administración Municipal.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Una (1) carpeta, con 94 folios*

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-CON-018

Aguazul, 29 de enero de 2026

Deyder Cocunubo
29-01-2026
Hora: 3:00 pm

SEÑOR
CONSORCIO SUBESTACIÓN
ING. DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

Referencia: Contrato de obra No. 806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Devolución y solicitud de ajustes a memorias de cantidades y soportes gráficos del balance de obra.

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento y control técnico al contrato de la referencia, esta interventoría se permite realizar la devolución del informe de balance de mayores y menores cantidades radicado recientemente.

Tras realizar la revisión detallada de la documentación aportada, se han identificado observaciones que requieren de su inmediata corrección y ajuste, bajo los siguientes lineamientos:

i. Ajuste de medidas y cantidades: Se observan discrepancias entre las cantidades relacionadas en el cuadro comparativo y las medidas mostradas en los soportes gráficos. Es necesario que las memorias de cálculo se ajusten estrictamente a los lineamientos técnicos del proyecto y a las dimensiones finales de los elementos construidos.
ii. Soportes gráficos: Los soportes gráficos aportados no guardan una relación uniforme con los ítems de mayores cantidades reportados. Se requiere que cada soporte gráfico esté debidamente identificado y vinculado a la memoria de cálculo correspondiente para facilitar su trazabilidad.

Por lo anterior, se solicita al CONSORCIO SUBESTACIÓN realizar los ajustes pertinentes y radicar nuevamente el paquete documental completo para proceder con la validación definitiva. Contar con soportes precisos es un requisito indispensable para garantizar la transparencia en la liquidación de las actas y la estabilidad financiera del contrato.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

IAT-OFI-2026-01-ENT-019

Aguazul, 30 de enero de 2026

MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
30 ENE 2026
Recibido por:
Hora: 4:00 AM PM
Radicado No. Folios:

SEÑOR
ING. JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE AGUAZUL
CIUDAD

Referencia: Contrato de interventoría 0798 de 2025-09-12 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Remisión y concepto técnico sobre puesta en marcha de planta eléctrica – Contrato 0806 de 2025.

Cordial saludo,

En nuestra calidad de interventoría del contrato 0806 de 2025, nos permitimos remitir para su gestión el oficio OFC013_CS_2026 presentado por el Consorcio Subestación.

Al respecto, la interventoría ha validado la necesidad técnica y el cronograma propuesto por el contratista para la entrada en funcionamiento de la nueva planta eléctrica, resaltando los siguientes puntos ante la Administración Municipal:

- El contratista ha programado la puesta en marcha para los días 31 de enero y 01 de febrero de 2026, conforme a los acuerdos de coordinación técnica previos.
- Es imperativo que la entidad integre este nuevo equipo en su plan de suministro de combustible de manera inmediata.
- El contratista suministrará 40 galones para las pruebas iniciales de funcionamiento.
- Se informa que el equipo posee un tanque con capacidad aproximada de 120 galones, por directrices del proveedor y para garantizar la seguridad técnica, el nivel debe mantenerse entre el 50% y el 70% de su capacidad.
- Esta medida es esencial para asegurar la autonomía del sistema una vez se realice la desconexión definitiva de la planta antigua, evitando riesgos por bajo nivel de combustible.

interaguazultanque@gmail.com
(+57) 311 5922421
YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
NIT: 1.049.607.262-9

Esta Interventoría considera viable y necesaria la ejecución de estas maniobras para dar cumplimiento al cronograma y asegurar la continuidad del servicio eléctrico en el Centro Administrativo.

Cordialmente,

YAMID FERNANDO LESMES RODRÍGUEZ
REPRESÉNTATE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexos:

- *Copia Oficio de solicitud de obra No. OFC013_CS_2026 (2 folio)*

22 Anexo VIII – SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LABORATORIOS OBRA
(7 folios)

Alcaldía de Aguazul	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**	YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ

SEGUIMIENTO A INFORMES DE LABORATORIO DENSIDADES - CONSORCIO SUBESTACIÓN

MUESTRAS OBRA

TOMA DE DENSIDADES A MATERIAL GRANULOMETRICO

NUMERO DE TOMA	UBICACIÓN	ELEMENTO	TIPO DE MATERIAL	FECHA DE TOMA DE MUESTRA	RESULTADO
D_1	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	CIMENTACION	SUB BASE GRANULAR	30/12/2025	98.10%
D_2	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	CIMENTACION	SUB BASE GRANULAR	30/12/2025	98.40%

EMSAC

PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS INV E 142-13
(ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION)

Correo: laboratorioemsac@gmail.com

Empresa: CONSORCIO SUBESTACIÓN **Fecha:** 27/12/2025

Proyecto: CONTRATO No.0806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Tipo de material: SUB BASE GRANULAR **Rio:** UNETE **Cantera:** ALEJANDRA

Descripcion: GRAVAS ANGULARES Y REDONDEADAS ENTRE 1/2" Y 2" CON MATRIZ DE ARENA GRANO MEDIO COLOR CAFÉ

MUESTRA	1	2	3
Humedad natural de la muestra %	4,70	4,70	4,60
Humedad adicional %	1,00	4,00	7,00
Masa de muestra humeda g	6000,0	6000,0	6000,0
Masa de la muestra seca g	5730,7	5730,7	5736,1
Agua adicional c.c	60,0	240,0	420,0
N° de Molde	3	3	3
Masa muestra humeda y molde g	7.424	7.696	7.590
Masa del molde grs	2.771	2.771	2.771
Masa de la muestra humeda g	4.653	4.925	4.819
% Humedad de moldeo	5,7	8,7	11,6
Masa de la muestra seca g	4.402,1	4.530,8	4.318,1
Volumen del molde cm^3	2.128,0	2.128,0	2.128,0
Masa unitaria seca g/cm^3	2,07	2,13	2,03
Masa unitaria seca Kg/m^3	2.069	2.129	2.029

RESULTADO


Masa unitaria maxima $Kg./m^3$

2.130

Humedad optima

8,4

Masa unitaria maxima Corregida $Kg./m^3$	% Finos
2.287	65,9
Peso especifico	**% Gruesos**
2,67	34,1

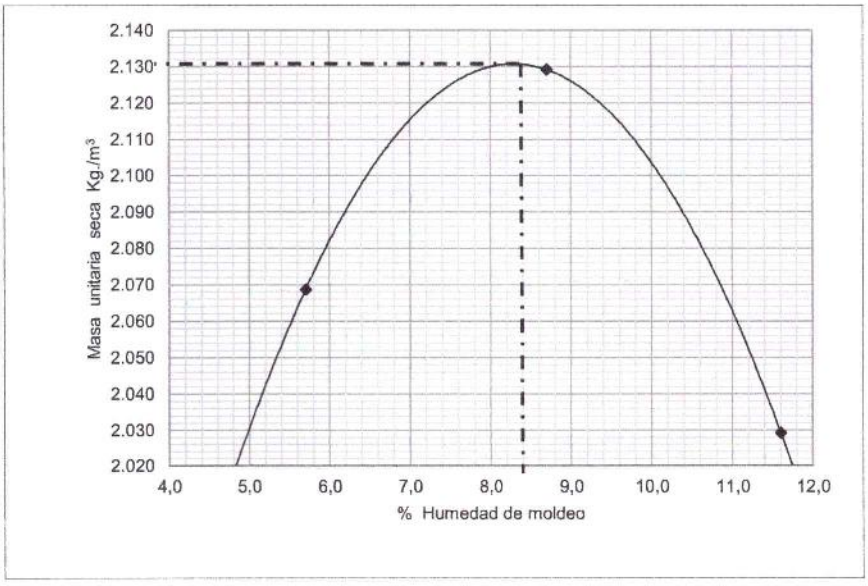

OBSERVACIONES

Maria Camila Castro Rincon
Ingeniera Civil

EMSAC	MASA UNITARIA DEL TERRENO - MÉTODO DEL CONO Y ARENA I.N.V.E-161-13
	Correo: laboratorioemsac@gmail.com

Fecha: 30/12/2025

Empresa: CONSORCIO SUBESTACIÓN

Proyecto: CONTRATO No.0806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Material	SUB BASE GRANULAR				
Peso arena inicial (g)	7524	7486			
Peso arena final (g)	3618	3740			
Peso arena usada (g)	3906	3746			
Constante del cono (g)	1620	1620			
Peso arena en el hueco (g)	2286	2126			
Densidad de la arena (g/cm3)	1,40	1,40			
Volumen del hueco (cm3)	1633	1519			
Peso material extraído, pasa 3/4" (g)	2672	2422			
Peso material extraído, retiene 3/4" (g)	1290	1288			
Porcentaje de Humedad	8,5	8,4			
Peso seco total del material (g)	3652	3423			
Peso seco del material fino (g)	2463	2234			
Peso seco del material grueso (g)	1189	1188			
Porcentaje fraccion fina	67,4	65,3			
Porcentaje fraccion gruesa	32,6	34,7			
Peso especifico tamaños > 3/4"	2,670	2,670			
Masa unitaria seca en campo (g/cm3)	2,236	2,254			
Masa unitaria maxima (grs/cm3)	2,130	2,130			
Porcentaje humedad optimo	8,4	8,4			
Peso unitario corregido campo (grs/cm3)	2,280	2,291			
Porcentaje compactacion individual	**98,1**	**98,4**			
Porcentaje compactacion requerido	**95,0**				

Peso unitario corregido (grs/cm3)	**2,285**	Peso unitario promedio	**2,245**
Porcentaje compactacion del lote	**98,3**	Porcentaje compactacion lote ≥ 95%	**VERDADERO**

	OBSERVACIONES
Maria Camila Castro Rincon Ingeniera Civil	

Alcaldía de Aguazul	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ

SEGUIMIENTO A INFORMES DE LABORATORIO DENSIDADES - CONSORCIO SUBESTACIÓN

MUESTRAS OBRA

NUMERO MUESTRA	CANTIDAD	RESISTENCIA ESPERADA Y FECHA DE TOMA	UNIDADES	ROTURA				CUMPLE O NO CUMPLE	UBICACIÓN	ELEMENTO
				7	14	28	T			
M1	1-2-3-4	4,000	P.S.I	3,078.60	3,647.80	-	---	PENDIENTE	TANQUE SUBTERRANEO	PLACA PISO Y ARRANQUE MURO
		27/01/2026	DD/MM/AAAA	3/02/2026	10/02/2026	24/02/2026	---			
M2	1-2-3-4	4,000	P.S.I	2,754.60	3,549.90	-	---	PENDIENTE	TANQUE SUBTERRANEO	MURO Y PLACA SUPERIOR
		5/02/2026	DD/MM/AAAA	12/02/2026	19/02/2026	5/03/2026	---			

concretec S.A.S

CERTIFICACION DISEÑO DE MEZCLA

Yopal, 29 de enero de 2026

Señores
CONSORCIO SUBESTACION
La ciudad

Referencia: Certificación concreto de 280 kg/cm2, grava 3/4", 28 días, asentamiento 5+/-1".Baja permeabilidad.

El concreto de 280 kg/cm2, grava 3/4", 28 días, asentamiento 5+/-1" es diseñado para obtener la resistencia específica a los 28 días, es un concreto común que permite mantener la calidad del producto sin requerir condiciones especiales de colocación con aditivo para reducir permeabilidad en el concreto.

Especificaciones técnicas concreto 280 kg/cm2, grava 3/4", 28 días.Baja permeabilidad.

CRITERIOS DE DISEÑO	% DISEÑO	OBSERVACIONES
CEMENTO	13.80%	CEMENTO INDUSTRIAL FUERTE TIPO ART.
AGREGADO GRUESO	28,5%	AGREGADOS PETREOS CRAVO SUR PETRIORIENTE
AGREGADO FINO (Arena triturada y lavada)	50,05%	AGREGADOS PETREOS GRAVO SUR PETRIORIENTE
ADITIVO 1	0.65%	HOLCIM
ADITIVO 2	0,5%	TOXEMENT EUCON IM 100
AGUA	6,5%	
RELACION AGUA CEMENTO	0.5	
ASENTAMIENTO	5" +/- 1"	Evaluado de Acuerdo con la NTC 396
RESISTENCIA FINAL COMPRESION	28 Días	Evaluado de Acuerdo con la NTC 673

Coordinadora de Calidad
CONCRETOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S

EMSAC

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO INV E 410 - 12

Correo: laboratorioemsac@gmail.com

EMPRESA: CONSORCIO SUBESTACIÓN

FECHA: 10/02/2026

PROYECTO: CONTRATO No.0806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

MUESTRA: M1

N°	Edad de rotura	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Carga (kN)	Resistencia de fallo	Resistencia requerida	Resistencia posible a 28 dias	% de resistencia de fallo	Tipo de falla	Ubicación	Elemento
1	7	27/01/2026	3/02/2026	172,0	3078,6	4.000	4465,7	77,0%	5		PLACA Y MURO
2	14	27/01/2026	10/02/2026	203,8	3647,8	4.000	4231,4	91,2%	5		
3	28	27/01/2026	24/02/2026			4.000					
4	T	27/01/2026	TESTIGO			4.000					

TIPOS DE FALLA



Observaciones:

Maria Camila Castro Rincon
Ingeniera Civil

EMSAC

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO INV E 410 - 12

Correo: laboratorioemsac@gmail.com

EMPRESA: CONSORCIO SUBESTACIÓN

FECHA: 19/02/2026

PROYECTO: CONTRATO No.0806 de 15 de septiembre de 2025 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

MUESTRA: M2

N°	Edad de rotura	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Carga (kN)	Resistencia de fallo	Resistencia requerida	Resistencia posible a 28 dias	% de resistencia de fallo	Tipo de falla	Ubicación	Elemento
1	7	5/02/2026	12/02/2026	153,9	2754,6	4.000	4066,7	68,9%	1		PLACA
2	14	5/02/2026	19/02/2026	198,3	3549,9	4.000	4117,8	88,7%	5		
3	28	5/02/2026	5/03/2026			4.000					
4	T	5/02/2026	TESTIGO			4.000					

TIPOS DE FALLA



Observaciones:

Maria Camila Castro Rincon
Ingeniera Civil

23 Anexo IX – SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LABORATORIOS INTERVENTORÍA

(6 folios)

Alcaldía de Aguazul	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**	YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ

SEGUIMIENTO A INFORMES DE LABORATORIO DENSIDADES - YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ

MUESTRAS INTERVENTORIA

TOMA DE DENSIDADES A MATERIAL GRANULOMETRICO

NUMERO DE TOMA	UBICACIÓN	ELEMENTO	TIPO DE MATERIAL	FECHA DE TOMA DE MUESTRA	RESULTADO
DI_1	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	CIMENTACION	SUB BASE GRANULAR	30/12/2025	98.40%
DI_2	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	CIMENTACION	SUB BASE GRANULAR	30/12/2025	98.60%

INGENIERIA & LABORATORIO	**RELACIONES DE HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO DE COMPACTACION NORMAL O MODIFICADO)**	Versión: 5 Código:R-OPE-19
	Carrera 17 Nº 15-61 Aguazul-Casanare Cel. 3112878638 - 3162854499 laboratoriowi@hotmail.com	Fecha de Aprobación: 28/01/2020

INTERESADO	YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ	**FECHA**	29/12/2025
PROYECTO	CONTRATO: 0798 DE 2025-09-12, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
DESCRIPCION	GRAVAS ANGULARES Y SUB ANGULARES CON TAMAÑOS ENTRE 1/2" Y 2" CON MATRIZ DE ARENA GRANO MEDIO COLOR CAFÉ		
CANTERA	ALEJANDRA	**FUENTE**	RIO UNETE
MATERIAL	SUB BASE GRANULAR		

NORMA DE ENSAYO INVIAS 142 y 143-13				
MUESTRA	1	2	3	
Humedad natural de la muestra %	5,40	5,40	5,40	
Humedad adicional %	1,00	4,00	7,00	
Masa de muestra humeda g	6000,0	6000,0	6000,0	
Masa de la muestra seca g	5692,6	5692,6	5692,6	
Agua adicional c.c	60,0	240,0	420,0	
N° de Molde	3	3	3	
Masa muestra humeda y molde g	7.470	7.684	7.502	
Masa del molde grs	2.741	2.741	2.741	
Masa de la muestra humeda g	4.729	4.943	4.761	
% Humedad de moldeo	6,4	9,4	12,4	
Masa de la muestra seca g	4.444,4	4.518,1	4.235,6	
Volumen del molde cm^3	2.124,0	2.124,0	2.124,0	
Masa unitaria seca g/cm^3	2,092	2,127	1,994	

DATOS DE ENSAYO	
Metodo	C
Nº Golpes	56
N° Capas	5
Diametro Molde	6"
Material	Pasa 3/4"

RESULTADO


Masa unitaria maxima g/cm^3

2,135

Humedad optima

8,6

Masa unitaria maxima Corregida g/cm^3	% Finos
2,272	70,7
Peso especifico	% Gruesos
2,69	29,3

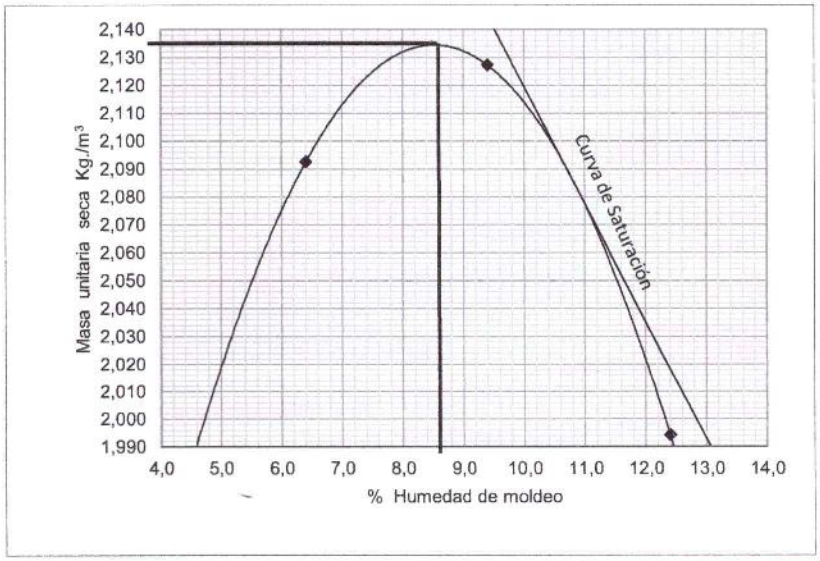

LABORATORISTA		**OBSERVACIONES**
INGENIERIA Y LABORATORIO WLADIMIR CASTRO NIT. 79863108-3 AGUAZUL CASANARE	Instructivo: I-OPE-19	
WLADIMIR CASTRO	Equipo utilizado: Balanza 30 Kg	
	Equipo utilizado: Balanza 6000 g	
	Certificados de Calibración: REM-LM-2765	

INGENIERIA & LABORATORIO	DENSIDADES EN EL TERRENO CONO Y ARENA	Versión: 5 Código:R-OPE-09-SBG Fecha de Aprobación: 10/01/2025
	Carrera 17 Nº 15-61 Cel. 3112878638 - 3162854499 laboratoriowi@hotmail.com	

INTERESADO YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ **FECHA:** 30/12/2025

PROYECTO CONTRATO: 0798 DE 2025-09-12, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

NORMA DE ENSAYO INVIAS 161-13					
Material	SUB-BASE GRANULAR				
Peso Frasco y Arena Inicial (g)	7022	6988			
Peso Frasco y Arena Final (g)	3228	3104			
Peso Arena Total Usada (g)	3794	3884			
Constante Cono y Placa (g)	1620	1620			
Peso Arena en el Hueco (g)	2174	2264			
Densidad de la Arena (g/cm3)	1,40	1,40			
Volumen del Hueco (cm3)	1553	1617			
Peso material extraído, pasa 3/4" (g)	2658	2792			
Peso material extraído, retiene 3/4" (g)	1107	1146			
% de Humedad	8,4	8,7			
Masa seca total del material (g)	3473	3623			
Masa seca del material fino (g)	2452	2569			
Masa seca del material grueso (g)	1021	1054			
Proporcion de fraccion fina (%)	70,6	70,9			
Proporcion de fraccion gruesa (%)	29,4	29,1			
Gravedad especifica sobretamaños	2,690	2,690			
Densidad seca en campo (g/cm3)	2,237	2,240			
Densidad max. laboratorio (grs/cm3)	2,135	2,135			
Humedad optima laboratorio %	8,6	8,6			
Densidad max. Corregida (grs/cm3)	2,273	2,271			
Grado compactacion individual (Gci)	**98,4**	**98,6**			

gd,max. Corregido (grs/cm3)	**2,272**	**γm =**	**2,238**	
GC_i(90) del lote,%	**98,5**	**GC_i(90) mínimo, %**	**95**	

REALIZO	REVISO Y APROBO		**OBSERVACIONES**
YEISON LAVERDE Laboratorista Junior	WLADIMIR CASTRO Gerente	Instructivo: I-OPE-09 Equipo utilizado: Balanza ALAXKA 15 Kg Certificados de Calibración: REM-LM-2766 Equipo utilizado: Manometro Humedometro 912 Certificado de Calibración: REM-LR-818	

Alcaldía de Aguazul	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ

SEGUIMIENTO A INFORMES DE LABORATORIO DENSIDADES - YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ

MUESTRAS INTERVENTORIA

NUMERO MUESTRA	CANTIDAD	RESISTENCIA ESPERADA Y FECHA DE TOMA	UNIDADES	ROTURA				CUMPLE O NO CUMPLE	UBICACIÓN	ELEMENTO
				7	14	28	T			
MI_1	1-2-3-4	4,000	P.S.I	3,276.000	3,863	-	---	PENDIENTE	TANQUE SUBTERRANEO	PLACA PISO + ARRANQUE MURO
		27/01/2026	DD/MM/AAAA	3/02/2026	10/02/2026	24/02/2026	---			
MI_2	1-2-3-4	4,000	P.S.I	2,736.000	3,609.000	-	---	PENDIENTE	TANQUE SUBTERRANEO	MURO + PLACA SUPERIOR
		5/02/2026	DD/MM/AAAA	12/02/2026	19/02/2026	5/03/2026	---			

INGENIERIA & LABORATORIO	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	Versiòn: 3 Còdigo: R-OPE-05 Fecha de Aprobación: 10/01/2025
	Carrera 17 Nº 15-61 Cel. 3112878638 - 31628554499 laboratoriowi@hotmail.com	

INTERESADO YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ

FECHA INFORME 19 de febrero de 2026

PROYECTO 0798 DE 2025-09-12, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

REPORTE M2

NORMA DE ENSAYO INV E-410-13

Muestra N°	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad Dias	Fuerza en		Diametro	Area	Esfuerzo Obtenido		Resistencia deseada		Resistencia Posible a 28 dias		% de Resistencia	Tipo de Falla	Elemento	Localizacion
				kN	lbf	mm	mm^2	lbf/pg^2	Mpa	P.S.I	Mpa	lbf/pg^2	Mpa				
1	5/2/2026	12/2/2026	7	148,18	33.312	100,0	7.854	2.736	18,87	4.000	27,6	4.044	27,9	68,4%	5	PLACA	
2	5/2/2026	19/2/2026	14	195,44	43.937	100,0	7.854	3.609	24,88	4.000	27,6	4.187	28,9	90,2%	5		
3	5/2/2026	5/3/2026	28			100,0	7.854			4.000	27,6						
4	5/2/2026	TESTGO	T			100,0	7.854			4.000	27,6						


LABORATORISTA

INGENIERIA Y LABORATORIO WLADIMIR CASTRO NIT. 79.643.0893 5 AGUAZUL CASANARE

WLADIMIR CASTRO
Tecnologo en Obras Civiles

Observaciones; Las muestras fueron tomadas y transportadas por el interesado hasta nuestras instalaciones.

Instructivo: I-OPE-05
Equipo utilizado: Máquina Digital Doble Rango PC-42D
Certificado de Calibración Nº REM-LF-441 y N° REM-LF-437

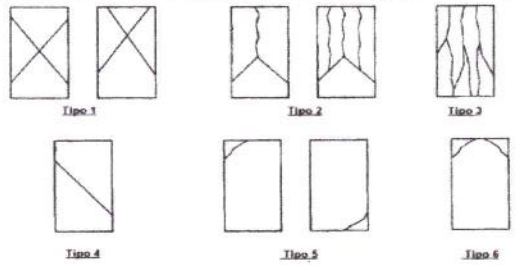

TIPOS DE FALLA

INGENIERIA & LABORATORIO	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	Versiòn: 3 Còdigo: R-OPE-05 Fecha de Aprobación: 10/01/2025
	Carrera 17 Nº 15-61 Cel. 3112878638 - 31628554499 laboratoriowi@hotmail.com	

INTERESADO YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ

FECHA INFORME 10 de febrero de 2026

PROYECTO 0798 DE 2025-09-12, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

REPORTE M1


NORMA DE ENSAYO INV E-410-13

Muestra Nº	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad Dias	Fuerza en		Diametro	Area	Esfuerzo Obtenido		Resistencia deseada		Resistencia Posible a 28 dias		% de Resistencia	Tipo de Falla	Elemento	Localizacion
				kN	lbf	mm	mm^2	lbf/pg^2	Mpa	P.S.I	Mpa	lbf/pg^2	Mpa				
1	27/1/2026	3/2/2026	7	177,41	39.883	100,0	7.854	3.276	22,59	4.000	27,6	4.707	32,5	81,9%	5	PLACA Y MURO	
2	27/1/2026	10/2/2026	14	209,18	47.026	100,0	7.854	3.863	26,63	4.000	27,6	4.481	30,9	96,6%	4		
3	27/1/2026	24/2/2026	28			100,0	7.854			4.000	27,6						
4	27/1/2026	TESTGO	T			100,0	7.854			4.000	27,6						

LABORATORISTA

INGENIERIA Y LABORATORIO
WLADIMIR CASTRO
NIT. 79.663.093-3
AGUAZUL CASANARE

Observaciones; Las muestras fueron tomadas y transportadas por el interesado hasta nuestras instalaciones.

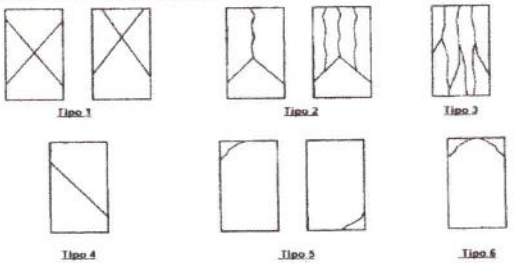

TIPOS DE FALLA

WLADIMIR CASTRO
Tecnologo en Obras Civiles

Instructivo: I-OPE-05
Equipo utilizado: Máquina Digital Doble Rango PC-42D
Certificado de Calibración Nº REM-LF-441 y Nº REM-LF-437

42

24 **Anexo X. INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA PARCIAL No. 01**
(5 folios)

Alcaldía de Aguazul	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**	**YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ**

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se evidenciara el seguimiento y verificación al cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo aprobado en el contrato de obra, con el fin de verificar que el contrastita cumpla con las normas y manetnga un entorno seguro para los colaboradores del proyecto, cuyo objeto es " CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE". Este informe tiene como objetivo presentar el trabajo en conjunto con el contratista y la interventoría en el acompañamiento de las actividades del proyecto, el cual se comprende entre el (19) de noviembre al (20) de febrero de 2026.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

OBRA	
Contratista	CONSORCIO SUBESTACIÓN
Objeto del Proyecto de la Obra	CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
Contrato No.	806
Fecha de Iniciación	DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2025.
Plazo de ejecución	TRES (03) MESES.
Fecha Terminación Inicial	DIECIOCHO (18) DE FEBRERO DE 2026
Prorroga No.01	18 DE FEBRERO 2026
Plazo Prorroga No.01	Un (1) mes
Fecha de Temrinación del Contrato	18 de marzo 2026
Localización del proyecto	MUNICIPIO DE AGUAZUL
INTERVENTORÍA	
Contratista	YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Objeto del contrato de interventoría	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Contrato No.	0798 DE 2025-09-12
Fecha de Iniciación	06 de Octubre de 2025
Plazo de ejecución inicial	CIENTO CINCO (105) DÍAS
Fecha Terminación Inicial	18 de enero de 2026
Fecha Suspensión No. 1	07 de noviembre de 2025
Plazo de suspensión	Doce (12) días
Fecha Reinicio No. 1	19 de noviembre de 2025
Prorroga No.01	30 de enero de 2026
Plazo Prorroga No.01	Diecinueve (19) días

Alcaldía de Aguazul	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**	**YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ**

Prorroga No.02	Un (1) mes
Plazo Prorroga No.02	18 de marzo 2026
Fecha de Temrinación Actual del Contrato	18 de marzo 2026
Localización del proyecto	MUNICIPIO DE AGUAZUL

Alcaldía de Aguazul	MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ

INFORME AMBIENTAL PARCIAL DE OBRA No.01 — **19 de noviembre 2025- 20 de febrero de 2026**

SEGUIMIENTO	OBJETIVO	MEDIO DE VERIFICACION ACCIONES DE MANEJO, CORRECCION O COMPENSACIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
			C	NC	N/A		
INDUCCION Y CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OBRA	verificar que el personal en la obra reciba las inducciones y charlas diarias en materia de SST .	se llevan a cabodos inducciones para presente periodo, por parte de el contratista.	1			Durante el periodo de la parcial que corresponde desde 19 de noviembre al 20 de enero del 2026,el contratista llevo a cabo socialización del proyecto .Se evidencia en el informe tecnico de interventroia Anexo XI (CERTIFICACION DE PAGO DE SS PARCIAL NUMERO	VER INFORME DE GESTION – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA
		Se evidencia charlas SST antes de iniciar actividades.	1			Se evidencia charlas en el anexo Anexo XI (INFORME TECNICO DE OBRA)	VER INFORME DE GESTION – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	* Minimizar la ocurrencia de accidentes comunes que sean previsibles. * Definir los mecanismos operativos, de gestión en seguridad y salud ene l trabajo. * Mantener y Mejorar las condiciones de vida y de salud de todos los trabajadores en cuanto a la seguridad social y bienestar.	Para el periodo del presente informe de parcial se verificó que el contratista realice la afiliación y el pago de la Seguridad Social de cada trabajador, entrega de EPP, exámenes de ingreso, charlas y/o capacitaciones SSt, diligenciamiento de permisos de trabajo	1			Se evidencia en el informe tecnico de interventroia Anexo IV (CERTIFICACION DE PAGO DE SS PARCIAL NUMERO	VER INFORME DE GESTION – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA
SEÑALIZACIÓN	Prevenir los impactos que se generen por la falta de una adecuada señalización de los frentes de obra y de los sitios de uso temporal.	Se verificó que el contratista realice la respectiva demarcación de los sitios de trabajo que generen alto riesgo a los para los trabajadores y/o visitantes de la obra. También se verifica que se esté instalando la señalización (informativa, preventiva y de peligro) garantizando la prevención, información.	1			Se evidencia señalización en los frentes de obta Anexo XI (INFORME TECNICO DE OBRA)	VER INFORME DE GESTION – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA

Alcaldía de Aguazul	MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ


INFORME AMBIENTAL PARCIAL DE OBRA No.01 — **19 de noviembre 2025- 20 de febrero de 2026**

MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	Hacer seguimiento al cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo para todos los equipos, vehículos y maquinaria al servicio de la obra en condiciones óptimas para su operación, cumpliendo con las normas ambientales.	De acuerdo a las actividades ejecutadas en este periodo el contratista realiza inspecciones planeadas a los equipos y maquinaria usada en la obra	1			Ver Anexo XI (INFORME TECNICO DE OBRA)	VER INFORME DE GESTION – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN RCD	Controlar los efectos ambientales ocasionados por el manejo de concretos, materiales granulares y demás materiales necesarios para la construcción y desarrollo de la obra.	El material de RCD generado de las demoliciones de la estructura anterior de la obra y material sobrante de excavación es acopiado debidamente. El cemento utilizado en la obra es ubicado en estibas y en lugares seco para preservar su composición y evitar su contaminación	1			Ver Anexo XI (INFORME TECNICO DE OBRA)	VER INFORME DE GESTION – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Verificar las medidas para el manejo adecuado de material reutilizable, material reciclable, desechos no aprovechables y peligrosos que se generarán dentro de los procesos constructivos de la obra.	El contratista instalo un punto ecológico en la obra para la disposición de los Residuos sólidos generados, se encuentran con sus respectivos habladores y código de colores para clasificación. El consorcio efectuó charlas en los temas decuidado del agua	1			Ver Anexo XI (INFORME TECNICO DE OBRA)	VER INFORME DE GESTION – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA
PROTECCIÓN DE FAUNA Y FLORA	Proteger la fauna y flora que se encuentra en el área directa de intervención	El consorcio en pro de proteger la flora y fauna que abarca el área del proyecto, demarca las especies vegetales protegidas, con el fin no ser afectadas por las actividades de la obra.	1			Ver Anexo XI (INFORME TECNICO DE OBRA)	VER INFORME DE GESTION – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA
			8	**0**	**0**		
		NO CUMPLIMIENTO					
		NO CUMPLIMIENTO +					
		N/A					

Alcaldía de Aguazul	MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ

INFORME AMBIENTAL PARCIAL DE OBRA No.01 — **19 de noviembre 2025- 20 de febrero de 2026**

NOMBRE	CANTIDAD
# CUMPLIMIENTO	8
# NO CUMPLE	0
NO APLICA	0

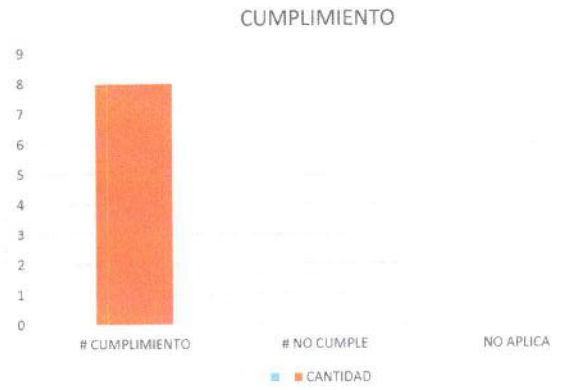

Conclusiones:

La presente interventoría desde el seguimiento ambiental y de seguridad y salud en el trabajo cumplió y llevo a cabo las actividades de seguimiento y verificación delegadas para el cumplimento de las normas vigentes y contractuales del proyecto tales como:
-Vigilar el cumplimiento de los pagos de Seguridad Social al personal del proyecto.
-Verificación de los Analís de trabajo seguro del proyecto.
-Verificación de la correcta clasificación, acopio y disposición de los residuos sólidos y peligros generados en el proyecto
-Verificación de la accidentalidad que para el presente periodo de la parcial fue reportada en 0.
