OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI.

INFORME MENSULA DE OBRA

LOCALIZACIÓN: Barranquilla, Atlántico- Colombia

BARRANQUILLA, ATLANTICO- COLOMBIA

SEPTIEMBRE 2025

INTRODUCCIÓN

El **informe mensual de avance del proyecto** de pavimentación en concreto hidráulico para el Programa de Barrios a la Obra Etapa IX Módulo III en las localidades Metropolitanas del Distrito de Barranquilla será una herramienta clave para el seguimiento y gestión eficiente del proyecto. Este documento permitirá actualizar periódicamente la información sobre el estado de ejecución, identificando avances, dificultades, y ajustes necesarios para cumplir con los objetivos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

1. OBJETO:

Obras de construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de vías urbanas, canales, Boxcoulvert, y obras complementarias para el programa barrios a la obra etapa IX, en todas las localidades y corregimientos del distrito de barranquilla. módulos I, II, III, IV, V Y VI.

2. ALCANCE:

El proyecto se encuentra localizado en la ciudad de Barranquilla en dos etapas una etapa de Reparcheo de pavimento malla vial en las localidades norte-este en los barrios: Riomar (Altos de Riomar, Golf, el Limoncito y Riomar) Norte Centro Histórico (Alto Prado, America, Barrio Abajo, Bellavista, Betania, Boston, Centro, Ciudad jardín e Industrial vía 40) y la segunda etapa Pavimentación en las localidades de metropolitana (Villa San Carlos, Villa Sevilla y Villa Blanca), Riomar (La playa, Las Flores y San Salvador), Norte Centro Histórico (Abajo, Barlovento, Campo Alegre, El Rosario, El Golf, La Concepción, Modelo, Montecristo, Recreo, San Francisco, Tres Ave María y Villa Nueva) y sur occidente (Buena Esperanza, Carlos Meisel, Ciudad Modesto, Cordialidad, Cuchilla de Villate, El Bosque, El Carmen, El Pueblo, El Romance y El Rubí)

A continuación, se presentará la ubicación de los 21 barrios donde se desarrollará el proyecto por localidad:

- Las Flores
- Villa Sevilla
- Villa Blanca
- Barrio Abajo
- Barrio Barlovento
- Campo Alegre
- El Rosario
- El Golf
- La Concepción
- Montecristo
- El Recreo
- Tres Ave Maria
- Villa Country

- Villanueva
- Barrio la Playa
- San Salvador
- Buena Esperanza
- El Bosque
- Carlos Meisel
- El Romance

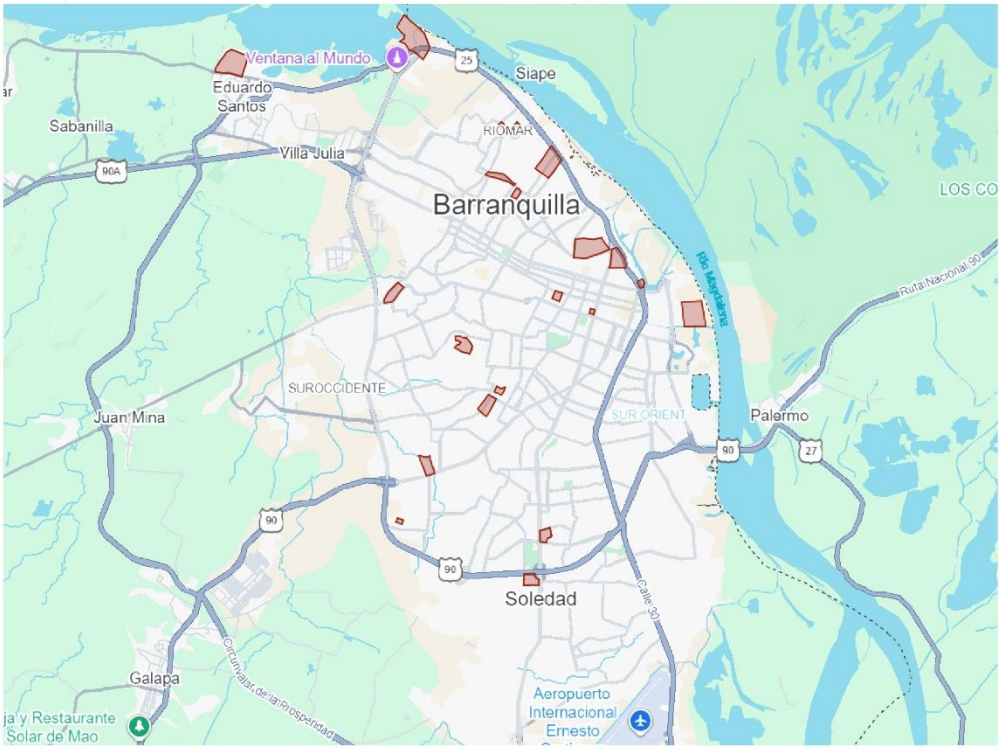


Ilustración 1.Localizaciones de los barrios

3. GENERALIDADES

En la siguiente tabla se recopila información clave sobre el desarrollo del proyecto, incluyendo las fechas de inicio, terminación, prórrogas, suspensiones y reinicios. Este registro ofrece una visión estructurada del historial de ejecución, facilitando el seguimiento y la toma de decisiones para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Tabla 1. Información general del contrato de obra modulo III

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MODULO III	
Contrato No.:	LP-026-2024
Contratante:	Distrito de Barranquilla
Contratista:	UNION TEMPORAL PAVIMENTO 2025
Supervisor:	María Teresa Fernández Iglesias, Secretaria General del Distrito de Barranquilla
Interventoría:	Juan Sanper, EDUBAR S.A.
Objeto:	Obras de construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de vías urbanas, canales, Boxcoulvert, y obras complementarias para el programa barrios a la obra etapa IX, en todas las localidades y corregimientos del distrito de barranquilla. módulos I, II, III, IV, V Y VI.
Valor Inicial del Contrato:	$ 52.104.102,82
Fecha de Suscripción:	21 abril de 2025
Fecha de Inicio:	15 de mayo de 2025
Fecha de Terminación Inicial:	11 de noviembre de 2026
Prórroga No. 1:	N/A
Fecha de Terminación según Prórroga No. 1:	N/A

4. INFORMACION TECNICA

El apartado de Información Técnica recopila los datos clave sobre el desarrollo del proyecto, proporcionando un seguimiento detallado de su ejecución. Se incluirá un análisis del avance físico de las obras, reflejando el progreso alcanzado en comparación con la planificación inicial. Además, se presentarán las cantidades ejecutadas a la fecha, permitiendo evaluar el cumplimiento de los objetivos constructivos.

Tabla 2. Porcentaje ejecutado reparcheo Barranquilla

REPARCHEO NORTE DE BARRANQUILLA		
	CANTIDADES	**SEPT-25**
INICIAL (M2)	12000	
EJECUTADO (M2)		12000
%EJECUTADO		100%

Las cantidades ejecutadas a presentar a continuación son los barrios: El Bosque, Carlos Meisel, El Romance, Campo Alegre y Las Flores, Villa San Carlos, Buena Esperanza y la Concepción.

Tabla 3.Construcción de Pavimento barrio el Bosque

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO								
BARRIO	EL BOSQUE							
TRAMO	72					67	70	**TOTAL**
ACTIVIDAD	**CALLE 64 B ENTRE 14-13B**	**CALLE 64 B ENTRE 13B-13**	**CALLE 64 B ENTRE 13-12A**	**CALLE 64 B ENTRE 12A-12**	**CALLE 64 B ENTRE 12-11**	**CARRERA 11 ENTRE CALLE 64B Y BOLSILLO**	**CALLE 75 DIAGONAL 9 CON CARRERA 64B**	
LONGITUD EJECUTADA (ML)	110	64	43	53	113	50.4	56	489.4
DEMOLICION (5%)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	35%
NIVEL Y REPLANTEO (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	70%
EXCAVACION (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	70%
TUBERIA Y ALCANTARILLADO (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	70%
RELLENO (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	70%
FLUIDO S-C (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	70%
PAVIMENTO (35%)	35.0%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	245%
ANDENES Y BORDILLO (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	70%
PORCENTAJE EJECUTADO	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Tabla 4.Construcción de Pavimento barrio Villa San Carlos

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				
BARRIO	VILLA SAN CARLOS			
TRAMO	1	2		**TOTAL**
ACTIVIDAD	**CALLE 99C ENTRE CARRERAS 1 SUR Y 3 SUR**	**CALLE 99B ENTRE CARRERAS 1 SUR Y 3 SUR**	**CARRERA 3 SUR ENTRE 99B1 Y 98**	
LONGITUD EJECUTADA (ML)	93.2	934	145.9	1027.2
DEMOLICION (5%)	0%	0%	0%	0%
NIVEL Y REPLANTEO (5%)	10%	0%	10%	10%
EXCAVACION (10%)	10%	0%	10%	10%
TUBERIA Y ALCANTARILLADO (10%)	10%	0%	0%	10%
RELLENO (10%)	10%	0%	0%	10%
FLUIDO S-C (10%)	10%	0%	8%	10%
PAVIMENTO (35%)	35.0%	0%	0.0%	35.0%
ANDENES Y BORDILLO (10%)	0%	0%	0%	0%
PORCENTAJE EJECUTADO	**85%**	**0%**	**28%**	**12%**

Tabla 5.Construcción de pavimento barrio las Flores

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO						
BARRIO	LAS FLORES					
TRAMO	47		48	45	44	**TOTAL**
ACTIVIDAD	**CRA 79 ENTRE VIA 40 A CALLE 108A**	**CRA 79 ENTRE CALLE 108A y 108**	**CRA 89 ENTRE CL 106 AL RIO**	**CALLE 110 ENTRE CR 91 A LA CIENAGA**	**CALLE 109 ENTRE CR 81D A VIA 40**	
LONGITUD EJECUTADA (ML)	170	102	70	466	70	878
DEMOLICION (5%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
NIVEL Y REPLANTEO (10%)	15%	15%	15%	15%	0%	60%
EXCAVACION (10%)	10%	10%	10%	8%	0%	38%
TUBERIA Y ALCANTARILLADO (10%)	10%	10%	10%	10%	0%	40%
RELLENO (10%)	10%	10%	10%	10%	0%	40%
FLUIDO o S-C (10%)	10%	10%	10%	8%	0%	38%
PAVIMENTO (35%)	35%	35%	35%	27%	0%	132%
ANDENES Y BORDILLO (10%)	10%	10%	10%	0%	0%	30%
PORCENTAJE EJECUTADO	**100%**	**100%**	**100%**	**78%**	**0%**	**81%**

Tabla 6.Construcción de pavimento barrio el Buena Esperanza

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		
BARRIO	BUENA ESPERANZA	
TRAMO	50	**TOTAL**
ACTIVIDAD	**CARRERA 15A ENTRE CALLES 63B Y 64B**	
LONGITUD EJECUTADA (ML)	228	228
DEMOLICION (5%)	5%	0%
NIVEL Y REPLANTEO (5%)	5%	0%
EXCAVACION (10%)	10%	0%
TUBERIA Y ALCANTARILLADO (10%)	10%	0%
RELLENO (10%)	10%	0%
FLUIDO S-C (10%)	2%	0%
PAVIMENTO (35%)	0.0%	0.0%
ANDENES Y BORDILLO (10%)	0%	0%
PORCENTAJE EJECUTADO	**42%**	**42%**

Tabla 7.Construcción y reconstrucción de pavimento barrio Campo Alegre

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					
BARRIO	CAMPO ALEGRE				
TRAMO	13	14	15	16	
ACTIVIDAD	**CALLE 84 ENTRE CARRERAS 39 Y 41**	**CARRERA 40 ENTRE CALLES 84 Y 84A (RECONSTRUCCION)**	**CARRERA 40A ENTRE CALLES 84 Y 84B (RECONSTRUCCION)**	**CARRERA 41 ENTRE CALLES 84 Y 84A (RECONSTRUCCION)**	**TOTAL**
LONGITUD EJECUTADA (ML)	380	106	110	160	756
DEMOLICION (5%)	5%	5%	0%	3%	13%
NIVEL Y REPLANTEO (10%)	6%	0%	0%	6%	12%
EXCAVACION (10%)	8%	0%	0%	6%	14%
TUBERIA Y ALCANTARILLADO (10%)	6%	3%	0%	6%	15%
RELLENO (10%)	6%	0%	0%	6%	12%
FLUIDO o S-C (10%)	6%	0%	0%	6%	12%
PAVIMENTO (35%)	21%	0%	0%	22%	43%
ANDENES Y BORDILLO (10%)	3%	0%	0%	0%	3%
PORCENTAJE EJECUTADO	**60%**	**8%**	**0%**	**56%**	**43%**

Tabla 8.Construcción de Pavimento barrio La Concepción

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			
BARRIO	CONCEPCION		
TRAMO	19		**TOTAL**
ACTIVIDAD	**CALLE77B ENTRE CARRERA 70 Y 74**	**CARRERA 70 ENTRE CALLE 77 Y 77B**	
LONGITUD EJECUTADA (ML)	392	92	392
DEMOLICION (5%)	5%	5%	5%
NIVEL Y REPLANTEO (5%)	5%	0%	5%
EXCAVACION (10%)	10%	0%	10%
TUBERIA Y ALCANTARILLADO (10%)	10%	0%	10%
RELLENO (10%)	10%	0%	10%
FLUIDO S-C (10%)	10%	0%	10%
PAVIMENTO (35%)	30.0%	0.0%	30.0%
ANDENES Y BORDILLO (10%)	0%	0%	0%
PORCENTAJE EJECUTADO	**80%**	**5%**	**81%**

Tabla 9. Construcción de Pavimento barrio El Romance

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO						
BARRIO	EL ROMANCE					
TRAMO	76	78	79	80	REPARCHEO	**TOTAL**
ACTIVIDAD	**CRA 6 H ENTRE CL 91 AL ARROYO**	**CRA 6E-2 ENTRE CL 90 A 91**	**CRA 6J-1 ENTRE CL 90B A 91**	**CALLE 90 B ENTRE CR 6E-2 A 6J-1**	**CALLE 89A-1 ENTRE CR 6E-2 A 6H**	
LONGITUD EJECUTADA (ML)	180	78	40	216	15	529
DEMOLICION (5%)	5%	5%	5%	5%	5%	25%
NIVEL Y REPLANTEO (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	50%
EXCAVACION (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	50%
TUBERIA Y ALCANTARILLADO (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	50%
RELLENO (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	50%
FLUIDO o S-C (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	50%
PAVIMENTO (35%)	35%	35%	35%	35%	35%	175%
ANDENES Y BORDILLO (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	50%
PORCENTAJE EJECUTADO	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Tabla 10.Construcción de Pavimento barrio Carlos Meisel

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				
BARRIO	CARLOS MEISEL			
TRAMO	52	53	REPARCHEO	**TOTAL**
ACTIVIDAD	**CRA 23 C ENTRE 74 B - 74 C**	**CRA 24 C ENTRE 74 B - 74 C**	**CLL 25 A ENTRE CRA 24 A - 24B**	
LONGITUD EJECUTADA (ML)	130	60	50	240
DEMOLICION (5%)	5%	5%	5%	15%
NIVEL Y REPLANTEO (10%)	10%	10%	10%	30%
EXCAVACION (10%)	10%	10%	10%	30%
TUBERIA Y ALCANTARILLADO (10%)	10%	10%	10%	30%
RELLENO (10%)	10%	10%	10%	30%
FLUIDO o S-C (10%)	10%	10%	10%	30%
PAVIMENTO (35%)	35%	35%	35%	105%
ANDENES Y BORDILLO (10%)	10%	10%	10%	30%
PORCENTAJE EJECUTADO	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

5. ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS.

En este apartado se documentan los ensayos de laboratorio efectuados para verificar la calidad del material. Se incluyen pruebas fundamentales como análisis de granulometría, CBR y otras verificaciones técnicas clave.

5.1. Barrio Campo Alegre

Dentro de este apartado se incluyen mediciones de densidad del suelo y materiales, proporcionando información clave sobre la compactación y estabilidad del terreno, garantizando condiciones óptimas para la pavimentación.

REFERENCIA: CALLE 84 CON CARRERA 40 - BARRIO CAMPO ALEGRE

ENSAYO N°	1	2	3	4	5
LOCALIZACION					
PROFUNDIDAD (CM)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gr)	7375	7370	7369	7368	7368
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (gr)	3300	3555	3554	3550	3545
PESO TOTAL ARENA USADA (gr)	4075	3815	3815	3818	3823
CONSTANTE DEL CONO	1654	1654	1654	1654	1654
PESO ARENA EN EL HUECO	2421	2161	2161	2164	2169
DENSIDAD DE LA ARENA	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
VOLUMEN DEL HUECO	1717	1533	1533	1535	1538
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (gr)	3373	3383	3353	3358	3468
% HUMEDAD	8,6	8,0	9,2	9,4	8,2
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (gr)	3106	3132	3071	3069	3205
DENSIDAD DEL MATERIAL (gr/cm3)	1,81	2,04	2,00	2,00	2,08
DENSIDAD MAX.LABORATORIO (gr/cm3)	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
%HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%
% DE COMPACTACION TERRENO	92,29	104,28	102,22	102,04	106,31
% DE COMPACTACION MINIMA ESPECIFICADA	95%	95%	95%	95%	95%
CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ilustración 2.Resultado de densidades barrio Campo Alegre

REFERENCIA: CALLE 84 CON CARRERA 40 - BARRIO CAMPO ALEGRE

ENSAYO N°	1	2	3	4
LOCALIZACION	K0+00 EJE	K0+20 IZQ	K0+46 DR	
PROFUNDIDAD (CM)	15,0	15,0	15,0	15,0
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gr)	7245	7235	7230	7220
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (gr)	3310	3370	3500	3540
PESO TOTAL ARENA USADA (gr)	3935	3865	3730	3680
CONSTANTE DEL CONO	1654	1654	1654	1654
PESO ARENA EN EL HUECO	2281	2211	2076	2026
DENSIDAD DE LA ARENA	1,41	1,41	1,41	1,41
VOLUMEN DEL HUECO	1618	1568	1472	1437
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (gr)	3318	3133	3123	3133
% HUMEDAD	8,2	7,8	7,4	8,0
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (gr)	3067	2906	2908	2901
DENSIDAD DEL MATERIAL (gr/cm3)	1,90	1,85	1,97	2,02
DENSIDAD MAX.LABORATORIO (gr/cm3)	1,96	1,96	1,96	1,96
%HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%
% DE COMPACTACION TERRENO	96,71	94,56	100,76	103,01
% DE COMPACTACION MINIMA ESPECIFICADA	95%	95%	95%	95%
CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ilustración 3.Resultado de densidades barrio Campo Alegre

REFERENCIA: CALLE 84 CON CARRERA 40 - BARRIO CAMPO ALEGRE

ENSAYO N°	1	2	3	4
LOCALIZACION	K0+00 EJE	K0+20 IZQ	K0+46 DR	
PROFUNDIDAD (CM)	15,0	15,0	15,0	15,0
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gr)	7245	7235	7230	7220
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (gr)	3310	3370	3500	3540
PESO TOTAL ARENA USADA (gr)	3935	3865	3730	3680
CONSTANTE DEL CONO	1654	1654	1654	1654
PESO ARENA EN EL HUECO	2281	2211	2076	2026
DENSIDAD DE LA ARENA	1,41	1,41	1,41	1,41
VOLUMEN DEL HUECO	1618	1568	1472	1437
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (gr)	3318	3133	3123	3133
% HUMEDAD	8,2	7,8	7,4	8,0
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (gr)	3067	2906	2908	2901
DENSIDAD DEL MATERIAL (gr/cm3)	1,90	1,85	1,97	2,02
DENSIDAD MAX.LABORATORIO (gr/cm3)	1,96	1,96	1,96	1,96
%HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%
% DE COMPACTACION TERRENO	96,71	94,56	100,76	103,01
% DE COMPACTACION MINIMA ESPECIFICADA	95%	95%	95%	95%
CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ilustración 4.Resultado de densidades barrio Campo Alegre

5.2. Barrio Villa San Carlos

Se incluyen mediciones de densidad del suelo y materiales, proporcionando información clave sobre la compactación y estabilidad del terreno, garantizando condiciones óptimas para la pavimentación. Estas fueron tomadas en fechas diferentes para mejor precisión de resultados.

REFERENCIA: VILLA SAN CARLOS

ENSAYO N°	1	2	3	4
LOCALIZACION	K0+00 EJE	K0+20 DR	K0+40 IZQ	K0+60 DR
PROFUNDIDAD (CM)	15,0	15,0	15,0	15,0
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gr)	7525	7485	7669	7435
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (gr)	3725	3780	3785	3793
PESO TOTAL ARENA USADA (gr)	3800	3705	3884	3642
CONSTANTE DEL CONO	1654	1654	1654	1654
PESO ARENA EN EL HUECO	2146	2051	2230	1988
DENSIDAD DE LA ARENA	1,41	1,41	1,41	1,41
VOLUMEN DEL HUECO	1522	1455	1582	1410
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (gr)	3139	2988	3348	2870
% HUMEDAD	8,4	8,4	9,0	9,4
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (gr)	2896	2756	3072	2623
DENSIDAD DEL MATERIAL (gr/cm3)	1,90	1,89	1,94	1,86
DENSIDAD MAX.LABORATORIO (gr/cm3)	1,96	1,96	1,96	1,96
%HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%
% DE COMPACTACION TERRENO	97,07	96,68	99,09	95
% DE COMPACTACION MINIMA ESPECIFICADA	95%	95%	95%	95%
CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ilustración 5.Resultado Densidades Barrio el Bosque

REFERENCIA: VILLA SAN CARLOS

ENSAYO N°	1	2	3	4
LOCALIZACION				
PROFUNDIDAD (CM)	15,0	15,0	15,0	15,0
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gr)	7330	7290	7255	7254
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (gr)	3550	3405	3440	3442
PESO TOTAL ARENA USADA (gr)	3780	3885	3815	3812
CONSTANTE DEL CONO	1654	1654	1654	1654
PESO ARENA EN EL HUECO	2126	2231	2161	2158
DENSIDAD DE LA ARENA	1,41	1,41	1,41	1,41
VOLUMEN DEL HUECO	1508	1582	1533	1530
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (gr)	3268	3138	3192	3252
% HUMEDAD	9,0	9,5	8,8	8,0
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (gr)	2998	2866	2934	3011
DENSIDAD DEL MATERIAL (gr/cm3)	1,99	1,81	1,91	1,97
DENSIDAD MAX.LABORATORIO (gr/cm3)	1,96	1,96	1,96	1,96
%HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO	11,9%	11,9%	11,9%	11,9%
% DE COMPACTACION TERRENO	101,45	92,41	97,67	100,4
% DE COMPACTACION MINIMA ESPECIFICADA	95%	95%	95%	95%
CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Ilustración 6.Resultado Densidades Barrio el Bosque

6. ANEXOS

- Registro fotográfico

En los siguientes anexos fotográficos se presentan los procesos ejecutados durante el mes de septiembre, detallando las actividades realizadas, avances registrados en cada etapa del proyecto.

Barrio Carlos Meisel











Barrio Las Flores












Barrio El Bosque

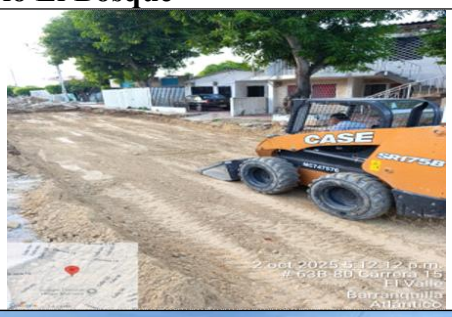










Reparcheo



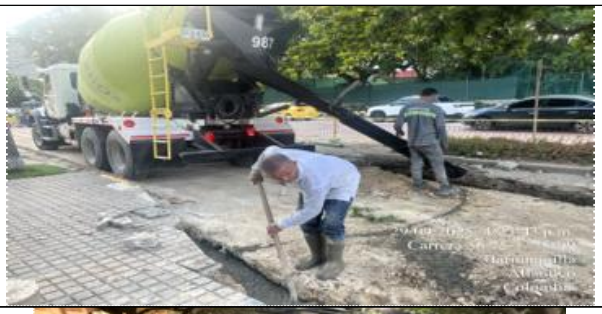









Campo Alegre

Buena Esperanza













Villa San Carlos













Concepción


2/09/2025 8:19:09 a. m.
70-43 Calle 77B
La Concepción
Barranquilla
Atlántico


4/09/2025 8:49:01 a. m.
77A-37 Carrera 71
La Concepción
Barranquilla
Atlántico


2/09/2025 3:43:21 p. m.
77A-36 Carrera 70
La Concepción
Barranquilla
Atlántico


5/09/2025 4:08:33 p. m.
77-96 Carrera 72
La Concepción
Barranquilla
Atlántico


5/09/2025 2:36:28 p. m.
70-43 Calle 77B
La Concepción
Barranquilla
Atlántico
