ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT. 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 1	**CÓDIGO DEL ITEM:** 1.1	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	NIVELACION, REPLANTEO Y SEÑALIZACION DE VIAS



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
13	CALLE 84 CON CRA 39 A	378.70	380.00	INTERCEPCION	1.30	6.30					8.19	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	0.00	67.00	TRAMO DE VIA	67.00	0.20					13.40	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	67.00	100.00	TRAMO DE VIA (SC)	33.00	10.20					336.60	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	100.00	133.00	TRAMO DE VIA (F)	33.00	10.20					336.60	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	133.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL IZQUIERDO	33.00	4.00					132.00	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	148.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL DERECHO	18.00	4.00					72.00	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	148.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL DERECHO	21.00	4.00					84.00	
												982.79

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		

CAPITULO:	2	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2.1	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
13	CALLE 84 CON CRA 39 A	378.70	380.00	INTERCEPCION	1.30	6.30					8.19	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	0.00	67.00	TRAMO DE VIA	67.00	0.20					13.40	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	67.00	100.00	TRAMO DE VIA (SC)	33.00	10.20					336.60	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	100.00	133.00	TRAMO DE VIA (F)	33.00	10.20					336.60	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	133.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL IZQUIERDO	33.00	4.00					132.00	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	148.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL DERECHO	18.00	4.00					72.00	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	148.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL DERECHO	21.00	4.00					84.00	
												982.79

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 3	**CÓDIGO DEL ITEM:** 3.1	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
13	CALLE 84 ENTRE CRA 40 A 39 C	0.00	280.00	INSTALACION DE TUBERIA ACUEDUCTO	280.00	0.40	0.50					56.00
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	14.00	114.00	INSTALACION DE TUBERIA ACUEDUCTO	100.00	0.40	0.50					20.00
												76.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 0 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
13	CALLE 84 CON CRA 39 A	378.70	380.00	INTERCEPCION	1.30	6.30	0.20					1.64
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	0.00	67.00	TRAMO DE VIA	67.00	0.20	0.20					2.68
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	67.00	100.00	TRAMO DE VIA (SC)	33.00	10.20	0.20					67.32
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	100.00	133.00	TRAMO DE VIA /F)	33.00	10.20	0.15					50.49
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	133.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL IZQUIERDO	33.00	4.00	0.15					19.80
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	148.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL DERECHO	18.00	4.00	0.15					10.80
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	148.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL DERECHO	21.00	4.00	0.15					12.60
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	14.00	54.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8	40.00	0.80	1.80					57.60
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	14.00	54.00	MANHOLE INICIAL	2.30	2.20	1.40					7.08
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	54.00	54.00	MANHOLE FINAL	2.30	2.30	2.20					11.64
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	48.00	54.00	EXCAVACION PARA CAMARA DE CAIDA	6.00	0.80	0.60					2.88
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 C A 39 B	235.00	299.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8	64.00	0.80	1.69					86.53
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	300.00	316.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8	16.00	0.80	1.69					21.63
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	317.00	380.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8	63.00	0.80	1.69					85.18
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 C A 39 B	180.00	224.40	ESTABILIZACION DE VIA LADO DERECHO	44.40	3.15	0.40					55.94

55.-



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 C A 39 B	180.00	210.00	ESTABILIZACION DE VIA LADO IZQUIERDO	30.00	3.15	0.40					37.80
13	CALLE 84 ENTRE CRA 40 A 39 C	130.00	140.00	ESTABILIZACION DE VIA LADO DERECHO	10.00	3.15	0.40					12.60
13	CALLE 84 ENTRE CRA 40 A 39 C	118.00	148.00	ESTABILIZACION DE VIA LADO IZQUIERDO	30.00	3.15	0.40					37.80
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	0.00	27.40	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 1	27.40	0.80	1.40					30.69
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	0.00	0.00	MANHOLE INICIAL	2.30	2.30	1.40					7.41
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	27.40	27.40	MANHOLE INTERMEDIO #1	2.30	2.30	1.20					6.35
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	27.40	43.40	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 2	16.00	0.80	1.50					19.20
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	43.40	43.40	MANHOLE INTERMEDIO #2	2.30	2.30	1.62					8.57
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	43.40	75.70	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 3	32.30	0.80	1.20					31.01
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	75.70	75.70	MANHOLE INTERMEDIO #3	2.30	2.30	1.00					5.29
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	75.70	95.20	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 4	19.50	0.80	1.20					18.72
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	95.20	95.20	MANHOLE INTERMEDIO # 4	2.30	2.30	1.10					5.82
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	95.20	105.60	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 5	10.40	0.80	1.40					11.65
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	105.60	105.60	MANHOLE FINAL	2.30	2.30	1.50					7.94
13	CALLE 84 CON CRA 39 B	289.70	372.70	ESTABILIZACION DE TRAMO VIA POR LLUVIA	83.00	6.10	1.00					506.30
												1,240.94

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO IX
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
13	CALLE 84 ENTRE CRA 40 A 39 C	0.00	280.00	RELLENO DE TUBERIA ACUEDUCTO	280.00	0.40	0.50					56.00
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	14.00	62.00	RELLENO DE TUBERIA ACUEDUCTO	100.00	0.40	0.50					20.00
												76.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE				
FECHA DE CORTE:	7/11/2025				
CAPITULO:	3	**CÓDIGO DEL ITEM:**	3.4	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	14.00	54.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8	40.00	0.80	1.60					51.20
				DESCUENTO DE TUBERIA					-0.63			-0.63
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	14.00	54.00	MANHOLE INICIAL	2.30	2.20	1.40					7.08
				MANHOLE DESCUENTO					-2.47			-2.47
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	54.00	54.00	MANHOLE FINAL	2.30	2.30	2.20					11.64
				MANHOLE DESCUENTO					-3.89			-3.89
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	48.00	54.00	EXCAVACION PARA CAMARA DE CAIDA	6.00	0.80	0.60					2.88
				DESCUENTO DE TUBERIA					-0.09			-0.09
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	235.00	299.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8	64.00	0.80	1.49					76.29
				DESCUENTO DE TUBERIA					-1.01			-1.01
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	300.00	316.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8	16.00	0.80	1.49					19.07
				DESCUENTO DE TUBERIA					-0.25			-0.25
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	317.00	380.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8	63.00	0.80	1.49					75.10
				DESCUENTO DE TUBERIA					-0.99			-0.99
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	0.00	27.40	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 1	27.40	0.80	1.20					26.30
				DESCUENTO DE TUBERIA					-0.43			-0.43
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	0.00	0.00	MANHOLE INICIAL	2.30	2.30	1.40					7.41
				MANHOLE DESCUENTO					-2.47			-2.47

55.



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	27.40	27.40	MANHOLE INTERMEDIO #1	2.30	2.30	1.20					6.35
				MANHOLE DESCUENTO					-2.12			-2.12
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	27.40	43.40	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 2	16.00	0.80	1.30					16.64
				DESCUENTO DE TUBERIA					-0.25			-0.25
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	43.40	43.40	MANHOLE INTERMEDIO #2	2.30	2.30	1.62					8.57
				MANHOLE DESCUENTO					-2.86			-2.86
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	27.40	75.70	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 3	48.30	0.80	1.00					38.64
				DESCUENTO DE TUBERIA					-0.76			-0.76
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	75.70	75.70	MANHOLE INTERMEDIO #3	2.30	2.30	1.00					5.29
				MANHOLE DESCUENTO					-1.77			-1.77
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	75.70	95.20	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 4	19.50	0.80	1.00					15.60
				DESCUENTO DE TUBERIA					-0.31			-0.31
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	95.20	95.20	MANHOLE INTERMEDIO # 4	2.30	2.30	1.10					5.82
				MANHOLE DESCUENTO					-1.94			-1.94
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	95.20	105.60	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 5	10.40	0.80	1.20					9.98
				DESCUENTO DE TUBERIA					-0.16			-0.16
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	105.60	105.60	MANHOLE FINAL	2.30	2.30	1.50					7.94
				MANHOLE DESCUENTO					-2.65			-2.65
13	CALLE 84 CON CRA 39 B	289.70	372.70	ESTABILIZACION DE TRAMO POR LLUVIA	83.00	6.10	0.20					101.26
												467.99

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3.8	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL DE DEMOLICION DE PAVIMENTO PARA ESTABILIZACION



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 C A 39 B	180.00	224.40	ESTABILIZACION DE VIA LADO DERECHO	44.40	3.15	0.40					55.94
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 C A 39 B	180.00	210.00	ESTABILIZACION DE VIA LADO IZQUIERDO	30.00	3.15	0.40					37.80
13	CALLE 84 ENTRE CRA 40 A 39 C	130.00	140.00	ESTABILIZACION DE VIA LADO DERECHO	10.00	3.15	0.40					12.60
13	CALLE 84 ENTRE CRA 40 A 39 C	118.00	148.00	ESTABILIZACION DE VIA LADO IZQUIERDO	30.00	3.15	0.40					37.80
13	CALLE 84 CON CRA 39 B	289.70	372.70	ESTABILIZACION DE TRAMO POR LLUVIA	83.00	6.10	0.65					329.10
												473.24

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8901020181

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		

CAPITULO:	4	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.1	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
13	CALLE 84 CON CRA 39 A	378.70	380.00	INTERCEPCION	1.30	6.30					8.19	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	0.00	67.00	TRAMO DE VIA	67.00	0.20					13.40	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	67.00	100.00	TRAMO DE VIA (SC)	33.00	10.20					336.60	
												358.19

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 0 1 0 0 0 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,15



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	100.00	133.00	TRAMO DE VIA (F)	33.00	10.20					336.60	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	133.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL IZQUIERDO	33.00	4.00					132.00	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	148.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL DERECHO	18.00	4.00					72.00	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	148.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL DERECHO	21.00	4.00					84.00	
											624.60	

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 9 0 1 0 1 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
13	CALLE 84 CON CRA 39 A	378.70	380.00	INTERCEPCION	1.30	6.30					8.19	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	0.00	67.00	TRAMO DE VIA	67.00	0.20					13.40	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	67.00	100.00	TRAMO DE VIA	33.00	10.20					336.60	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	100.00	133.00	TRAMO DE VIA	33.00	10.20					336.60	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	133.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL IZQUIERDO	33.00	4.00					132.00	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	148.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL DERECHO	18.00	4.00					72.00	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	148.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL DERECHO	21.00	4.00					84.00	
												982.79

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO:	4	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.5 / **DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:** PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE. /



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
13	CALLE 84 CON CRA 39 A	378.70	380.00	INTERCEPCION	1.30	6.30					8.19	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	0.00	67.00	TRAMO DE VIA	67.00	0.20					13.40	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	67.00	100.00	TRAMO DE VIA	33.00	10.20					336.60	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	100.00	133.00	TRAMO DE VIA	33.00	10.20					336.60	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	133.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL IZQUIERDO	33.00	4.00					132.00	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	148.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL DERECHO	18.00	4.00					72.00	
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	148.00	166.00	TRAMO DE VIA CARRIL DERECHO	21.00	4.00					84.00	
												982.79 /

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT. 8 9 0 1 0 2 0 1 8 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		

CAPITULO:	4	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.13	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.

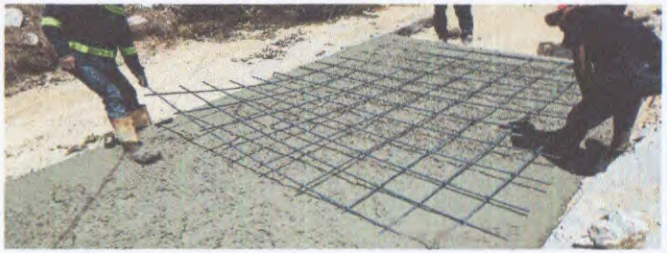

LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	KG/M	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	KG
13	CLL 84 ENTRE CRA 41 Y 39 A	73.83	80.54	PLACA REFORZADA CURVA LADO DERECHO	6.71	3.15			6.66			140.77
13	CLL 84 ENTRE CRA 41 Y 39 A	73.83	83.52	PLACA REFORZADA CURVA LADO IZQUIERDO	9.69	3.15			6.66			203.29
13	CLL 84 ENTRE CRA 41 Y 39 A	138.50	160.00	PLACA REFORZADA CURVA LADO IZQUIERDO	21.50	3.15			6.66			451.05
13	CLL 84 ENTRE CRA 41 Y 39 A	138.50	160.00	PLACA REFORZADA CURVA LADO DERECHO	21.50	3.15			6.66			451.05
13	CLL 84 ENTRE CRA 41 Y 39 A	203.50	207.90	PLACA REFORZADA MANHOLE MH	4.40	3.15			6.66			92.31
												1,338.46

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 6	CÓDIGO DEL ITEM: 6.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
13	CALLE 84 ENTRE CRA 41 A 40 B	48.00	94.00	BODILLO DE TRAMO LADO DERECHO	46.00					46.00		
13	CALLE 84 ENTRE CRA 41 A 40 B	41.25	63.95	BODILLO DE TRAMO LADO IZQUIERDO	22.70					22.70		
13	CALLE 84 ENTRE CRA 40 A 39 C	109.00	112.40	BODILLO DE TRAMO LADO DERECHO	3.40					3.40		
13	CALLE 84 ENTRE CRA 40 A 39 C	80.70	93.00	BODILLO DE TRAMO LADO IZQUIERDO	12.30					12.30		
										84.40		

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 7	CÓDIGO DEL ITEM: 7.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	14.00	54.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8					8.00			
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 C A 39 B	235.00	299.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8					5.00			
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	300.00	316.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8					4.00			
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	317.00	380.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8					6.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	0.00	27.40	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 1					3.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	27.40	43.40	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 2					4.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	43.40	75.70	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 3					6.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	78.70	95.20	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 4					4.00			
												32.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 7	**CÓDIGO DEL ITEM:** 7.7	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLEND



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	14.00	54.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8					8.00			
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 C A 39 B	235.00	299.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8					5.00			
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	300.00	316.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8					4.00			
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	317.00	380.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8					6.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	0.00	27.40	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 1					3.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	27.40	43.40	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 2					4.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	43.40	75.70	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 3					6.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	75.70	95.20	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 4					4.00			
												40.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 7	**CÓDIGO DEL ITEM:** 7.9	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	14.00	54.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8					9.00			
									9.00			

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8901020181

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		

CAPITULO:	11	**CÓDIGO DEL ITEM:**	11.9	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	14.00	54.00	EXCAVACIÓN PARA TUBERIA DE 8					8.00			
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	14.00	14.00	CAMARA DE CAIDA					1.00			
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 C A 39 B	235.00	299.00	EXCAVACIÓN PARA TUBERIA DE 8					5.00			
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	300.00	316.00	EXCAVACIÓN PARA TUBERIA DE 8					4.00			
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	317.00	380.00	EXCAVACIÓN PARA TUBERIA DE 8					6.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	0.00	27.40	EXCAVACIÓN PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 1					3.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	27.40	43.40	EXCAVACIÓN PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 2					4.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	43.40	75.70	EXCAVACIÓN PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 3					6.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	75.70	95.20	EXCAVACIÓN PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 4					4.00			
												41.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 11	CÓDIGO DEL ITEM: 11.11	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	14.00	54.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8	40.00					40.00		
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	235.00	299.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8	64.00					64.00		
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	300.00	316.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8	16.00					16.00		
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	317.00	380.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8	63.00					63.00		
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	0.00	27.40	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 1	27.40					27.40		
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	27.40	43.40	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 2	16.00					16.00		
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	43.40	75.70	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 3	32.30					32.30		
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	75.70	95.20	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 4	19.50					19.50		
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84 A	95.20	105.60	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 5	10.40					10.40		
												288.60

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 11	**CÓDIGO DEL ITEM:** 11.13	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	14.00	14.00	MANHOLE INICIAL					1.00			
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	54.00	54.00	MANHOLE FINAL					1.00			
13	CALLE 84 CON CRA 39 C	235.00	335.00	MANHOLE INTERSEPCION					1.00			
13	CALLE 84 CON CRA 39 B	299.00	299.00	MANHOLE INTERSEPCION					1.00			
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	317.00	317.00	MANHOLE INTERSEPCION					1.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	0.00	0.00	MANHOLE INICIAL					1.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	27.40	27.40	MANHOLE INTERMEDIO #1					1.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	43.40	43.40	MANHOLE INTERMEDIO #2					1.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	75.70	75.70	MANHOLE INTERMEDIO #3					1.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	95.20	95.20	MANHOLE INTERMEDIO # 4					1.00			
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	105.60	105.60	MANHOLE FINAL					1.00			
												11.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 8901022018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 11	**CÓDIGO DEL ITEM:** 11.14	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	14.00	54.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8	40.00	0.80	0.20					6.40
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	235.00	299.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8	64.00	0.80	0.20					10.24
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	300.00	316.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8	16.00	0.80	0.20					2.56
13	CALLE 84 ENTRE CRA 39 B A 39 A	317.00	380.00	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8	63.00	0.80	0.20					10.08
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	0.00	27.40	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 1	27.40	0.80	0.20					4.38
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	27.40	43.40	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 2	16.00	0.80	0.20					2.56
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	27.40	75.70	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 3	48.30	0.80	0.20					7.73
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	27.40	95.20	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 4	67.80	0.80	0.20					10.85
14	CRA 40 ENTRE CALLE 84 A LA 84	27.40	105.60	EXCAVACION PARA TUBERIA DE 8 TRAMO 5	78.20	0.80	0.20					12.51
												67.31

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	CAMPO ALEGRE		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		

CAPITULO:	11	**CÓDIGO DEL ITEM:**	11.21	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 90MM PN10



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
13	CALLE 84 ENTRE CRA 40 A 39 C	0.00	280.00	INSTALACION DE TUBERIA ACUEDUCTO	280.00					280.00		
16	CRA 41 ENTRE CALLE 84 A LA 84	14.00	114.00	INSTALACION DE TUBERIA ACUEDUCTO	100.00					100.00		
												380.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

