	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Consultoría No. 4227 DE 2024 **Consultoría:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

Contrato de Interventoría No. 4262 DE 2024 **Interventoría:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Objeto Contrato de Consultoría: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORME MENSUAL No. 10 **MES O PERIODO:** 01 al 30 de septiembre de 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	x		1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	x		2
1	**INTRODUCCIÓN**				3
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**				5
2.1	Localización				6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto				14
2.3	Inventario y estado inicial de la vía				15
2.4	Características técnicas del proyecto				15
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE CONSULROTÍA**				17
3.1	Información general del contrato				17
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes				17
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA**				30
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	x		34
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-4		x	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	x		53
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	x		65
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	x		67
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11		x	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	x		70
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Consultoría	MEPI-MN-1IN-15-FR-14		x	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual				80
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	x		81
		MEPI-MN-IN-3-FR-2		x	
	• Seguimiento Programa de Consultoría		x		82
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	x		82
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	x		84
	• Actas de Comité de Consultoría	MEPI-MN-IN-14-FR-1		x	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	x		86
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato				
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor			x	
5.3	Informes especialistas y profesionales			x	
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC			x	
5.5	Informe matriz de riesgos.			x	
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Consultoría e Interventoría			x	
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.			x	
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**			x	
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5		x	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7		x	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9		x	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		x	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15		x	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual			x	
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1		x	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2		x	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2		x	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3		x	
7	**Conclusiones y recomendaciones**				
8	**Anexos**			x	
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo			x	
8.2	Registro fotográfico y video del avance de la Consultoría			x	
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas			x	
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente			x	

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: José Ricardo Acosta Sichaca
DIRECTOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 4227 - 2024

INFORME MENSUAL – SEPTIEMBRE 2025

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

Quibdó, septiembre de 2025

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891.680.089-4
Carrera 22 #18B-10 B. Nicolás Medrano – Ciudadela Universitaria
Tel: (+57) 6046726565, Línea gratuita: 018000938824
contactenos@utch.edu.co, notificacionesjudiciales@utch.edu.co
utch.edu.co
Quibdó, Chocó (Colombia)

INTRODUCCIÓN.

El Gobierno Nacional a través del programa "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA (…)", ha priorizado un conjunto de proyectos de infraestructura vial de carácter regional con impacto en todo el territorio colombiano, dirigidos a mejorar vías secundarias y terciarias, generando conexiones y fortaleciendo la comunicación entre las diversas poblaciones y regiones del país; frente a lo cual se debe adelantar la coordinación interinstitucional entre el Instituto y las entidades regionales para la estructuración de los proyectos que permita la ejecución de los mismos. Entre esos está el proyecto denominado como Nóvita – Curundó – San José del Palmar – Crucero El Cairo, que para el alcance trata específicamente la “CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO”[1].

Con base a lo anterior el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, suscribió el contrato interadministrativo con la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba tendiente a adelantar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA”, que incluye dentro de sus alcances la elaboración de los volúmenes o productos técnicos entregables a nivel de Fase 3 (Estudios y diseños definitivos, a partir del máximo aprovechamiento del resultado de los Estudios y Diseños a nivel de Fase II llevados a cabo por la Entidad en vigencias anteriores).

[1] Tomado del Anexo 1 – Anexo Técnico Consultoría

El objetivo de esta fase es proyectar la materialización en campo del proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción), para el mejoramiento de la conexión existente Curundó - San José del Palmar – Cruce El Cairo, que podrá incluir la revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o optimización y/o complementación conteniendo obligatoriamente la interventoría para la elaboración de nuevos estudios y diseños, con sus cálculos respectivos o trabajos similares, para todas aquellas obras requeridas de las especialidades que conservan relación directa con la infraestructura vial sobre el corredor de atención.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato 4227 de 2024, en este documento se presenta el informe correspondiente a las actividades del mes de septiembre de 2025.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1. Localización


El corredor vial Curundó – San José del Palmar – Cruce El Cairo presenta una clasificación, según su función, y conforme al Manual de Diseño Geométrico del INVÍAS, de la siguiente manera:

- Sector: Corregimiento de Curundó – San José del Palmar, en el departamento del Chocó, es vía secundaria.
- Sector: San José del Palmar – Cruce El Cairo, en el departamento del Valle del Cauca, es vía secundaria.

El corredor geográfico objeto de estudio, se encuentra ubicado entre las poblaciones del municipio de Curundó – San José del Palmar y el Cruce El Cairo entre los departamentos del Chocó y Valle, cruza la vertiente occidental de la Cordillera Occidental en jurisdicción del departamento del Chocó y en su tramo final su estribación oriental sobre la cuenca alta del río San Juan.

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891.680.089-4
Carrera 22 #18B-10 B. Nicolás Medrano – Ciudadela Universitaria
Tel: (+57) 6046726565, Línea gratuita: 018000938824
contactenos@utch.edu.co, notificacionesjudiciales@utch.edu.co
utch.edu.co
Quibdó, Chocó (Colombia)

Figura 1. Localización del proyecto

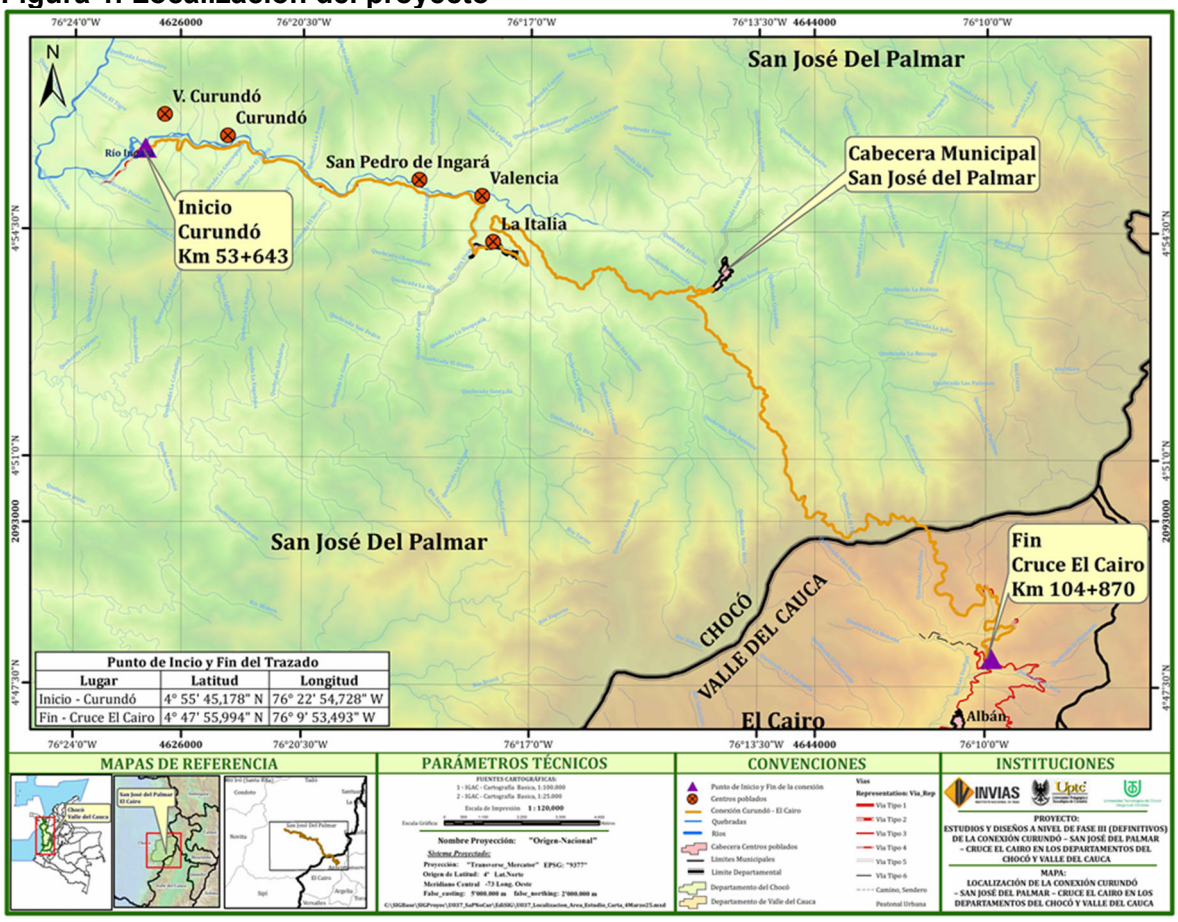


Fuente: Consultoría UTCH, 2025.

El corredor se encuentra subdividido en 5 tramos conforme a los estudios y diseños realizados en el desarrollo del contrato 1666 de 2015 de la siguiente manera:

- **Tramo 1: K53+643 – K57+235**

  El tramo está comprendido entre el sitio conocido como La Punta en K53+643.016 y el caserío de Curundó en el K57+235, en una longitud aproximada de 3592 m.

Figura 1. Localización del tramo 1. K53+643 – K57+235

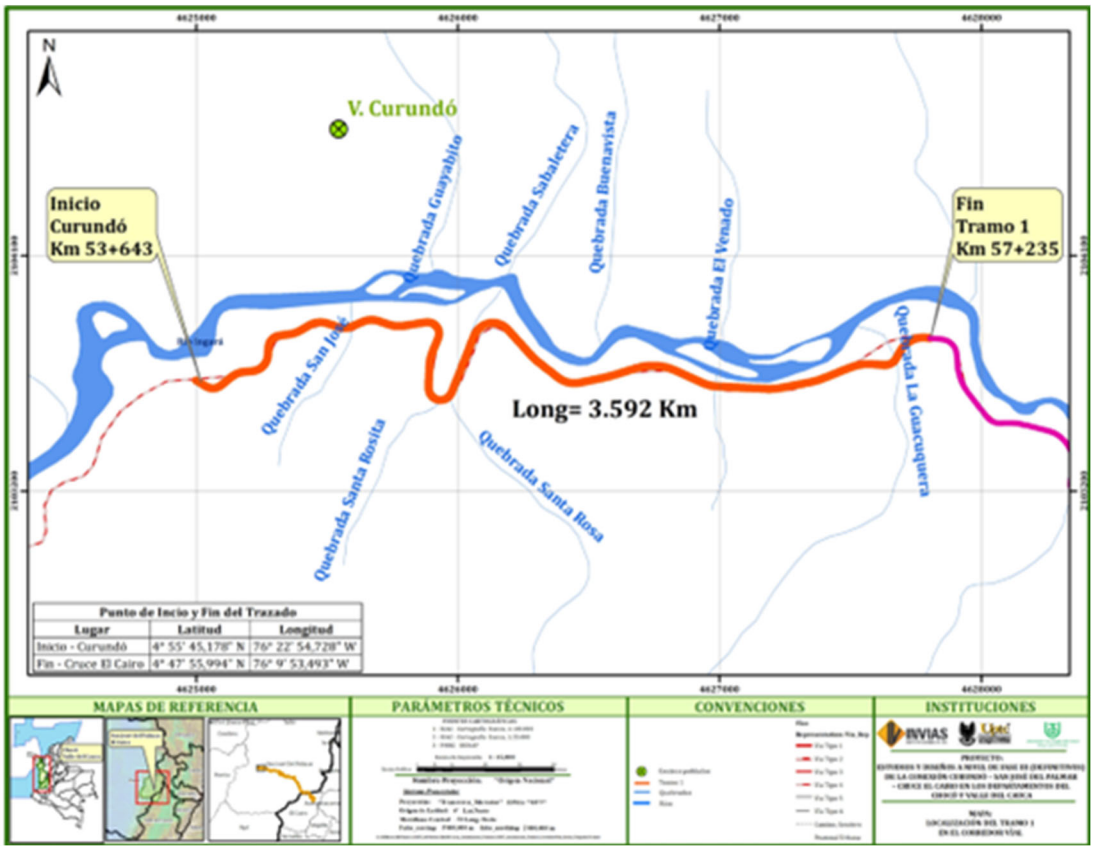


Fuente: Consultoría UTCH, 2025.

En este tramo el corredor se desarrolla en un terreno entre ondulado y montañoso presentando pendientes longitudinales que varían entre el 2% y el 6.0%. Su recorrido circula mayoritariamente paralelo a la margen izquierda del río Ingará cruzando diferentes afluentes a este río como las quebradas San José, Santa Rosa, y la Guacuquera. En su recorrido alcanza alturas promedio de 300 m s.n.m. (Figura 2).

- **Tramo 2: K57+235 – K68+562**

  El tramo 2, está comprendido entre el sitio conocido como Curundó en el K57+235 hasta el caserío del Corregimiento La Italia en el K68+562, en una longitud de 11327 m.

Figura 2. Localización del tramo 2. K57+235 – K68+562

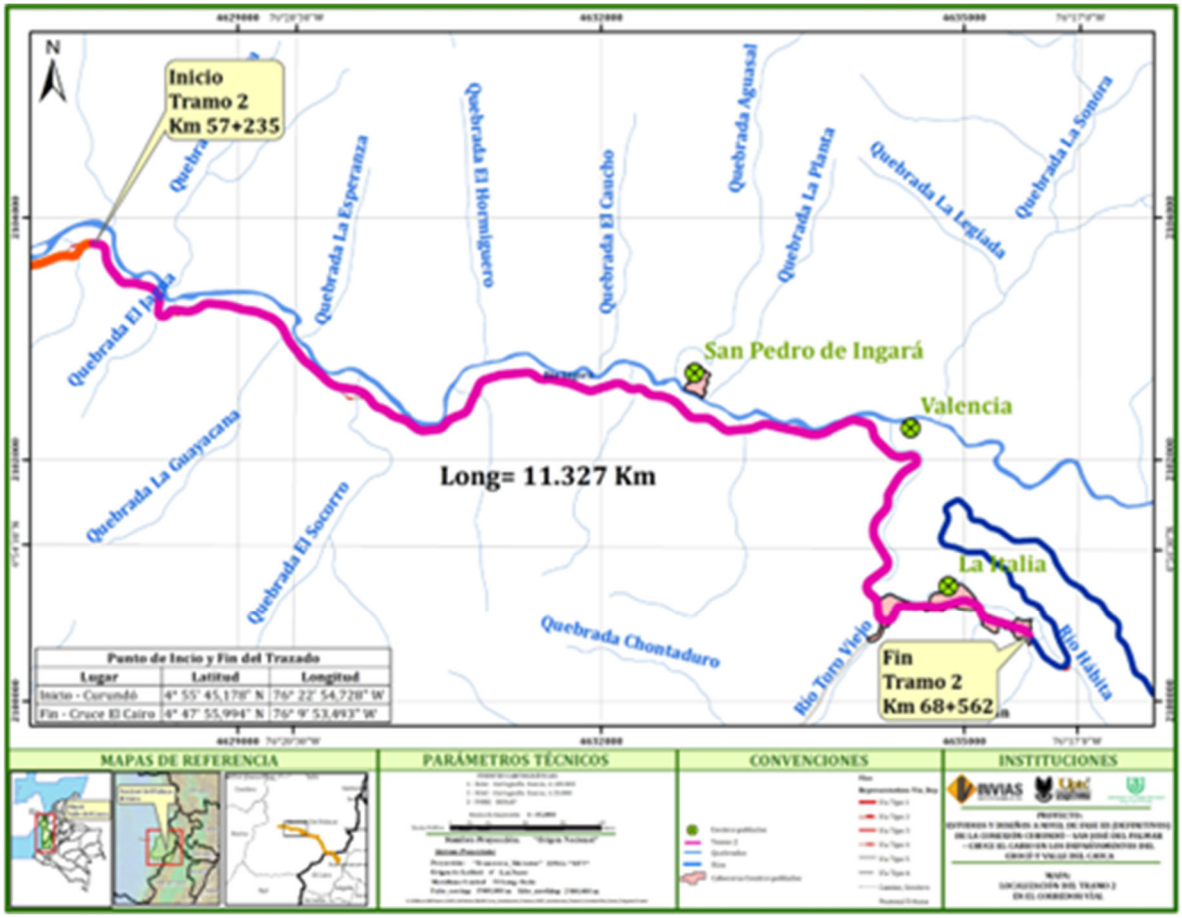

Fuente: Consultoría UTCH, 2025.

En este tramo el corredor continúa su recorrido paralelo al río Ingará, discurriendo sobre terrenos entre montañoso y ondulado. Entre el K57+235 y el K65+400 presenta pendientes longitudinales ascendentes que oscilan entre el 2% y el 8%,


pasando por las quebradas como La Jagua, La Guayacana y el Socorro, afluentes todos del río Ingará. Además, pasa tangencialmente por las veredas de San pedro de Ingará y Valencia.

En el último sector entre las abscisas K65+400 y K68+562 el terreno presenta pendientes longitudinales más bajas que varían entre el 2% y el 4%, pasando por el río Toro viejo y afluentes de menor escala terminando su recorrido en el corregimiento de La Italia, con una altura de 405 m.s.n.m. (Figura 3)

- **Tramo 3: K68+562 – 78+995**

  El tramo 3, está comprendido entre el corregimiento La Italia en el K68+562 y el K78+995 en cercanías a la cabecera municipal de San José del Palmar, en una longitud de 10433 m.

Figura 3. Localización del tramo 3. K68+562 – K78+995

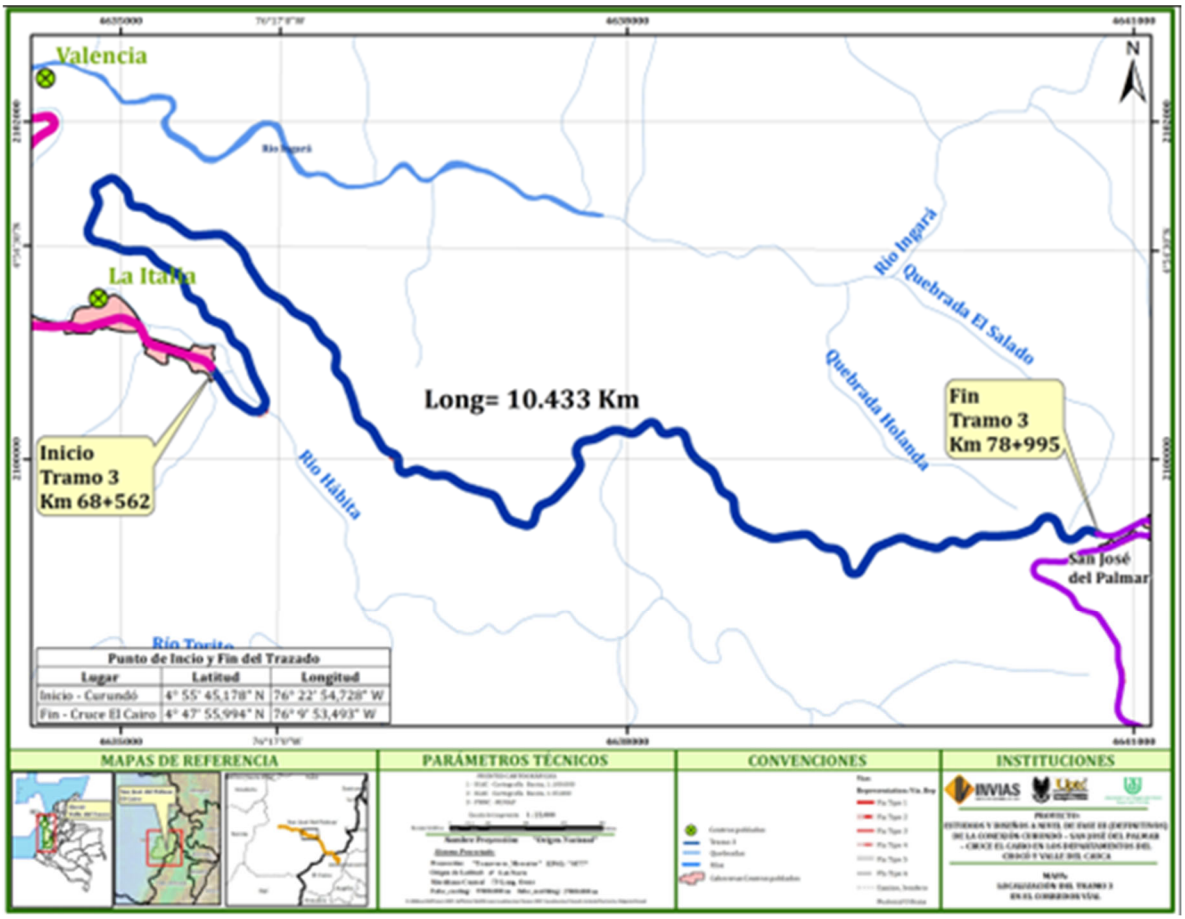

Fuente: Consultoría UTCH, 2025.

En este tramo el corredor deja el valle del río Ingará para ir ascendiendo sobre la cordillera occidental, atravesando terrenos entre montañosos y escarpados presentándose pendientes ascendentes muy fuertes que oscilan entre el 6% y el 10%, alcanzando una altura de 1080 m s.n.m. (Figura 4).


- **Tramo 4: K78+995 – K88+619**

  El tramo 4, está comprendido entre cercanías a la cabecera municipal de San José del Palmar en el K78+995 y el K88+619, en una longitud de 9624 m.

  Al igual que el tramo 3, este tramo continúa en ascenso sobre la cordillera, alcanzando una altura de 1685 m s.n.m.; en su recorrido pasa por la entrada a la cabecera del municipio de San José del Palmar en el K80+370 configurándose en una oportunidad para mejorar el acceso a las comunidades apostadas en el territorio. Se presentan pendientes fuertes entre el 6% y el 9%.

  En su trayectoria el corredor atraviesa por quebradas como Moja Huevos y otra gran cantidad de fuentes de agua de menor escala y que sugieren la construcción de un gran número obras de drenajes de menor tamaño. (Figura 5).

Figura 4. Localización del tramo 4. K78+995 – K88+619

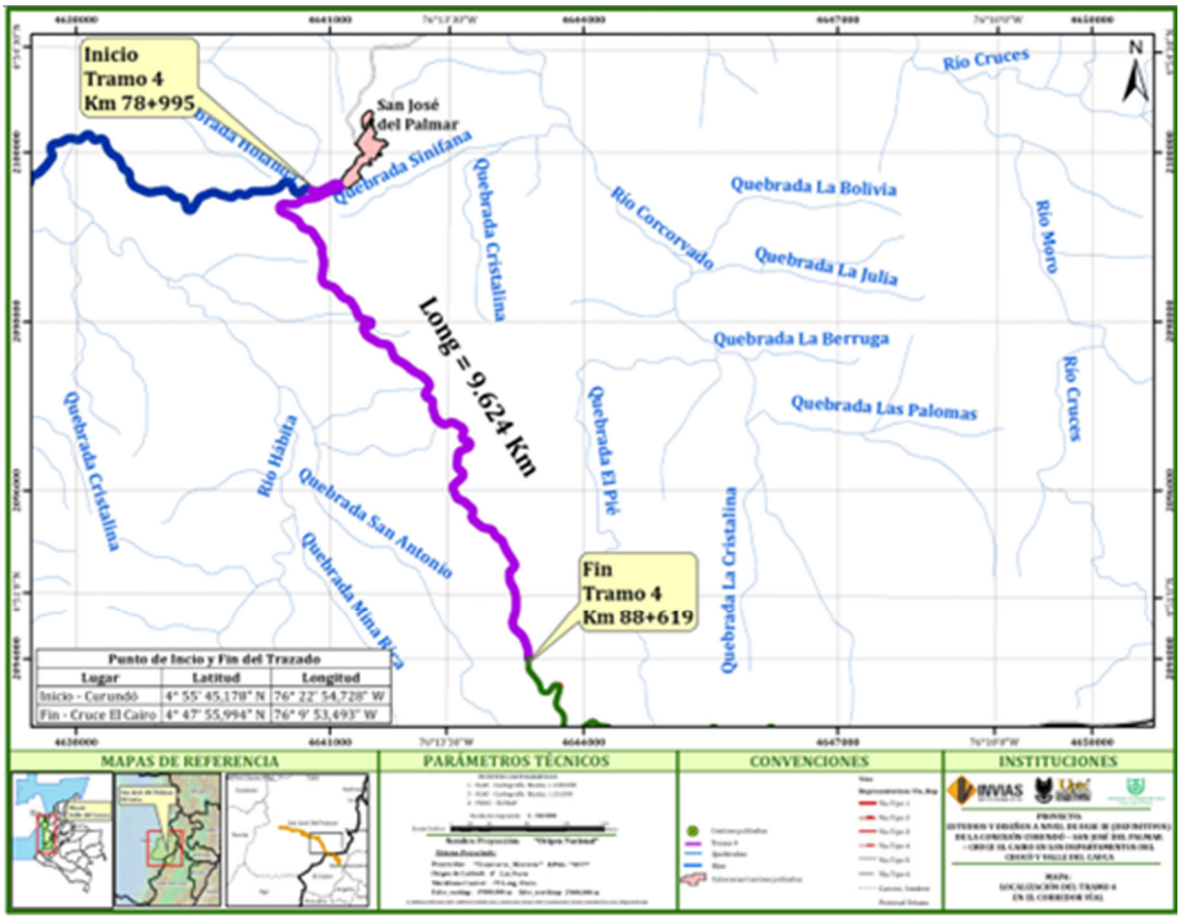

Fuente: Consultoría UTCH, 2025.


- **Tramo 5: K88+619 – K104+870**

  El tramo 5, está comprendido entre el K88+619 y el K104+870 en el sitio conocido como cruce a El Cairo, en una longitud de 16251 m.

  En este sector el corredor continúa su ascenso sobre la cordillera hasta llegar a la divisoria en el sitio conocido como Altos de Galápagos (K94+200 – K94+400) en los límites entre los dos departamentos, alcanzando una altura de 2050

m.s.n.m.; sitio donde se presentan temperaturas muy bajas en la mayor parte del tiempo y precipitaciones mínimas constantes.

Figura 5. Localización del tramo 5. K88+619 – K104+870

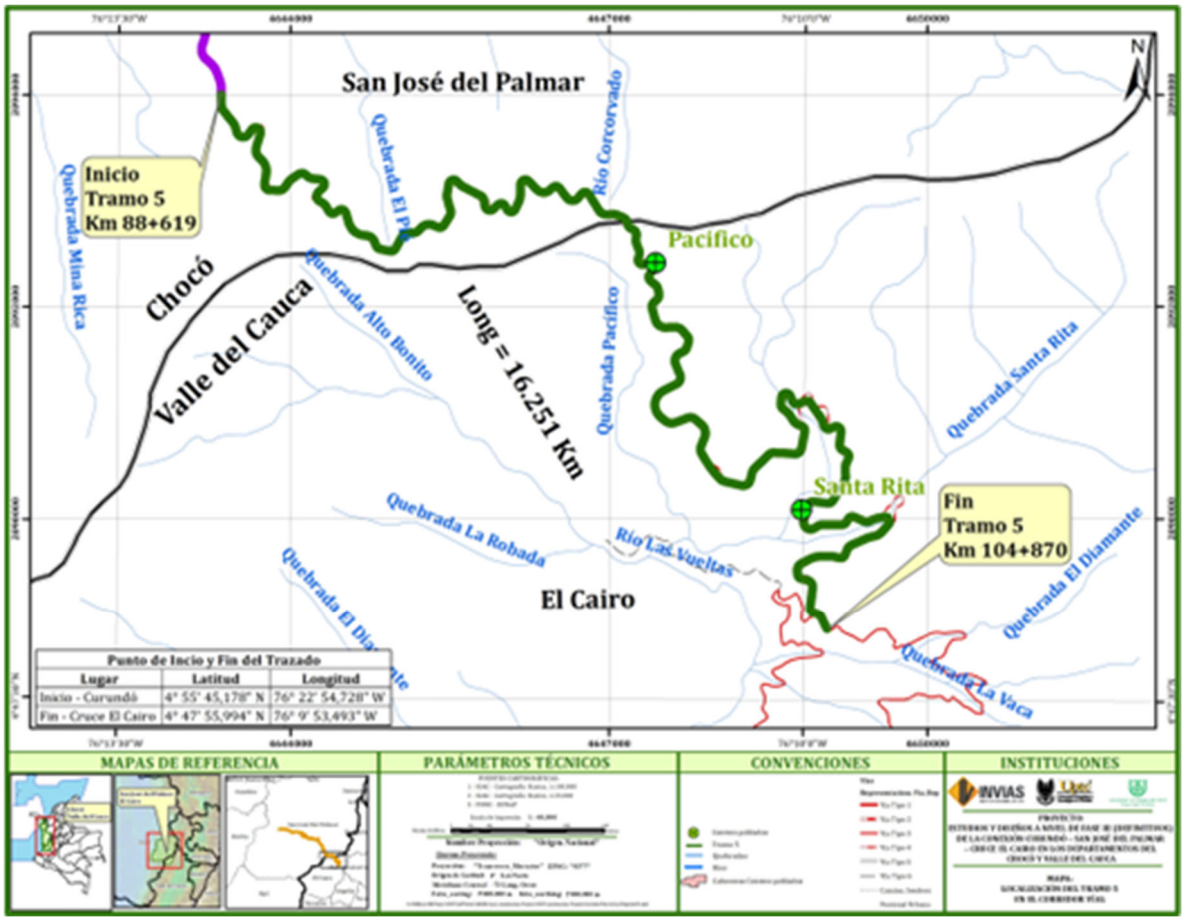

Fuente: Consultoría UTCH, 2025.

A partir del K94+400 el corredor inicia su descenso sobre un terreno montañoso con pendientes longitudinales entre el 4% y el 7% hasta llegar al K102+800, pasando por gran número de fuentes hídricas de menor tamaño. Hacia adelante se presenta un corto ascenso con una pendiente longitudinal promedio del 6.5% hasta llegar al

K103+900. Hacia el final del tramo se presenta un sector en descenso con pendiente promedio del 7% hasta llegar al cruce a El Cairo, a una altura de 1645 m s.n.m. (Figura 6).

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

En el ámbito local la zona de influencia directa e inmediata de la obra está relacionada de manera parcial con las cuencas económicas de los municipios de El Cairo y San José del Palmar en el departamento de Chocó y Valle del Cauca.

En el contexto regional la zona de influencia del proyecto abarca el área sur oriental del Departamento de Chocó, permitiendo que el Municipio de San José del Palmar quede integrado a la Capital del Departamento por una conexión directa, dentro de esta conectividad se incluye los municipios de Novita, Condoto, Istmina, Unión Panamericana (Las Ánimas), Cértegui y Quibdó.

Dentro del marco nacional la red vial en la zona de influencia se extiende a los municipios del Occidente desde el Corregimiento de Curundó hasta Cartago.

El municipio de El Cairo en el departamento del Valle del Cauca tiene una extensión total de 283 km², dista 252 km de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

Según las proyecciones del DANE, para el año 2015 el municipio cuenta con 9.976 habitantes, de los cuales 2.812 (28%) habitan en la cabecera municipal y 7164 (72%) habitan en la zona rural del municipio.

Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura y el comercio. Los principales cultivos son café, plátano, caña, yuca, fríjol, tomate, aguacate, mora, lulo, granadillas y hortalizas. Las actividades comerciales más destacadas en el municipio guardan relación con los productos de origen agrícola.

El Municipio de San José del Palmar actualmente su economía está consolidada principalmente en la Agricultura, y sus productos bandera son el Chontaduro, Borojó y Cacao. El sector maderero ha representado por muchas décadas la economía del municipio, pero en los últimos años se ha recortado esta labor debido a la campaña existente de la preservación y conservación de bosques y cuencas hidrográficas. El 90% de la actividad económica es de subsistencia, con pocos excedentes para comercialización o acumulación.

2.3. Características técnicas del proyecto

Realizar los ESTUDIOS y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

Los volúmenes que conforman la **Fase III de mejoramiento y pavimentación** a los cuales se requiere llevar a cabo las actividades necesarias para la elaboración de los estudios y diseños (vía existente) son los siguientes:

Volumen 1. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS.
Volumen 2 ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISIS DE SERVICIO.
Volumen 3 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO.
Volumen 4 ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.

Volumen 5 ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL.

Volumen 6 ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE.

Volumen 7 ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES.

Volumen 8 ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Volumen 9 HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.

Volumen 10 ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS.

Volumen 11 ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.

Volumen 12 ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.

Volumen 13 ESTUDIO REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.

Volumen 14 ESTUDIO DE RIESGOS.

Volumen 15 ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Volumen 16 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.

Volumen 17. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.

Volumen 18. VOLUMEN TÉCNICO BIM

Volumen 19. INFORME FINAL EJECUTIVO.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Las condiciones básicas del contrato de consultoría se resumen en los siguientes términos:

CONTRATO N°	4227 - 2024
Objeto	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA
Consultor	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ
Valor	$ 8.700.000.000
Plazo	1 mes
Fecha de Inicio	02 de diciembre de 2024
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2024
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2025
Prórroga N°1	12 meses hasta el 31 de diciembre de 2025
Interventor	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Fuente: Elaboración propia.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se detallan las actividades desarrollas por el equipo consultor en el mes de septiembre:

- ✓ **Revisión de información secundaria**
- ✓ **Adquisición de cartografía y demás información técnica:** Durante el mes de llevo a cabo las siguientes actividades:

1. Delimitación de cuencas hidrográficas.

Además, se llevó a cabo una reunión con la especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) e hidráulica, hidrología y socavación para tratar la delimitación de cuencas hidrográficas. Durante el encuentro se revisaron los criterios técnicos, herramientas geoespaciales y metodologías a emplear para definir con precisión los límites de las cuencas, así como la integración de esta información en los estudios previos. También se discutieron aspectos relacionados con la planificación de trabajo de campo y el procesamiento de datos para garantizar la consistencia y calidad de los resultados.

2. Cálculo de parámetros morfométricos de las cuencas asociadas al corredor vial y a la elaboración de cartografía segmentada por tramos.

3. Proceso de diagramación y cuantificación de las coberturas vegetales en cada una de las subcuencas, con el propósito de generar insumos técnicos que fortalezcan el análisis del volumen de Hidráulica e Hidrología, permitiendo una mejor comprensión de la relación entre la vegetación, la dinámica hídrica y la gestión integral de los recursos naturales.

✓ **Comité de seguimiento:** Con participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), se desarrollaron sesiones de comité en las cuales se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos adquiridos en reuniones anteriores y se verificó su cumplimiento.

✓ **Mesa de trabajo de la consultoría para la revisión y ajustes del Acta de Modificación No. 02 y del Acta de Costos No. 09 - 01 septiembre de 2025:**

Se desarrolló una mesa de trabajo entre los equipos de la consultoría con el propósito de revisar, realizar ajustes y analizar en detalle el contenido del Acta de Modificación No. 02 y del Acta de Costos No. 09.

- ✓ **Revisión sobre la caracterización de las comunidades del corredor vial – 02 de septiembre de 2025:** Se realizó una reunión de trabajo con el objetivo de revisar y analizar la caracterización de las comunidades ubicadas a lo largo del corredor vial. Durante el encuentro se evaluó la información recopilada, se discutieron aspectos sociales, culturales y ambientales relevantes, y se identificaron posibles ajustes o complementaciones necesarias para garantizar que la caracterización refleje adecuadamente las condiciones y necesidades de las comunidades.

- ✓ **Revisión de los informes de apropiación de especialistas – 01 de septiembre de 2025:** En el marco de las actividades de seguimiento y articulación contractual, se llevó a cabo una reunión con la participación de especialistas de la consultoría, con el propósito de revisar el informe de aprovechamiento de los estudios desarrollados en la Fase II – Contrato N.° 1666 de 2015, en relación con la Fase III – Contrato N.° 4227 de 2024.

  Durante las sesiones se socializaron los principales resultados del informe, se analizaron los insumos técnicos provenientes de la Fase II que pueden ser aplicados en la Fase III y se identificaron aspectos que requieren ajustes o complementación para garantizar la continuidad y coherencia entre ambas fases.

El espacio permitió intercambiar observaciones entre los especialistas, definir criterios de aprovechamiento de la información existente y establecer lineamientos preliminares para la integración de los estudios, con el fin de optimizar tiempos, recursos y asegurar la calidad técnica del proyecto.

- ✓ **Reunión de la programación de la salida a campo del componente forestal – 04 de septiembre de 2025:** Se realizó una reunión con el equipo responsable del componente forestal con el objetivo de coordinar y definir la programación de la salida a campo, prevista para la realización de actividades de levantamiento de información y caracterización de la vegetación. Durante el encuentro se discutieron aspectos logísticos, distribución de tareas, cronograma de actividades y medidas de seguridad para el personal participante, con el fin de garantizar la eficiencia y calidad del trabajo de campo

- ✓ **Mesa de trabajo para la elaboración del informe de aprovechamiento de estudios fase II Contrato N° 1666 2015 en relación con fase III - Contrato 4227 -2024.** Durante la semana, el Grupo 1 desarrolló varias reuniones con el objetivo de realizar una revisión detallada de los informes de aprovechamiento de estudios correspondientes a la Fase II (Contrato N° 1666 de 2015) en relación con la Fase III (Contrato N° 4227 de 2024), previamente elaborados y presentados por los especialistas.

- ✓ **Comité de seguimiento virtual realizado el 04 de septiembre de 2025,** con participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS). Durante la sesión se socializaron los avances

técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en reuniones anteriores y se abordaron los siguientes temas.

- ✓ **Levantamiento de información y recolección de muestras – 01 al 06 de septiembre de 2025:** Durante la semana del 01 al 06 de septiembre de 2025 se llevaron a cabo actividades técnicas en el marco de los estudios de suelos, las cuales incluyeron el levantamiento de información detallada, la ejecución de perforaciones, la recolección de muestras y el desarrollo de exploraciones geotécnicas a lo largo del eje vial. Asimismo, se efectuó el análisis patológico de las estructuras existentes.
- ✓ **Reunión técnica para revisión de requerimientos de información para el volumen ambiental - 11 de septiembre de 2025:** En esta sesión se llevó a cabo el análisis detallado de los insumos necesarios para la elaboración del volumen ambiental, verificando los alcances de la información disponible y definiendo los requerimientos adicionales a solicitar a las partes responsables. Se establecieron lineamientos para consolidar la documentación técnica y se asignaron compromisos a fin de garantizar la integridad y coherencia del contenido ambiental en el proyecto.

- ✓ **Comité de seguimiento virtual realizado entre el 08 y el 11 de septiembre de 2025,** con participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS). Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

- ✓ **Logística de comisión para el ingreso a campo de los profesionales de la consultoría de los componentes de social, taludes y seguridad vial - 12 de septiembre de 2025**, durante la reunión se abordaron los requerimientos y necesidades logísticas para facilitar la presencia de los profesionales del componente social, taludes y seguridad vial, para las visitas de campo. Se discutieron los elementos necesarios para garantizar que el ingreso y la movilidad de los participantes se realicen de manera organizada, incluyendo la coordinación previa de accesos, la definición de responsables y el establecimiento de un recorrido claro para las actividades programadas.

- ✓ **Levantamiento de información en campo del componente de Topografía y Patología entre el 08 al 13 de septiembre de 2025:** durante la semana se realizaron las siguientes actividades: Entre el 08 y el 13 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el levantamiento de información en campo correspondiente al componente de Topografía, dentro del cual se desarrollaron actividades orientadas a la materialización del eje en su Fase III, mediante el establecimiento físico de puntos de control que aseguran visibilidad, estabilidad y precisión para las labores posteriores; el posicionamiento y georreferenciación de dichos puntos utilizando equipos de topografía y sistemas GNSS, con el fin de garantizar la correspondencia de los datos con el sistema de referencia oficial adoptado para el proyecto; y la georreferenciación específica de los mojones que materializan el eje, asegurando su ubicación espacial, permanencia y trazabilidad dentro del levantamiento topográfico y el desarrollo del proyecto.

- ✓ **Reunión del Componente BIM con participación de la Consultoría, la Interventoría, el INVÍAS y los Líderes BIM – 15 de septiembre de 2025:** Se revisaron los avances del proyecto BIM, resaltando la necesidad de un plan de ejecución como bitácora y el seguimiento a contratos. Se presentó el documento con alcance, especialidades modelables, gestión de información y actualización del BEP. Se definió un nivel de desarrollo geométrico 300, con posibilidad de llegar a 350 en estructuras de drenaje representativas.

  En la parte técnica, se trataron la federación de modelos y el uso de Autodesk Construction Cloud. También se discutió la contratación de modeladores y la adquisición de licencias (AS Collection y otras adicionales). Finalmente, se acordó revisar la propuesta de la consultoría, actualizar el plan de ejecución BIM y coordinar la gestión documental y ajustes previos al envío.

- ✓ **Reunión con el equipo del componente biótico para revisión de requerimientos de levantamiento de información y aspectos logísticos – 17 de septiembre de 2025:** El 17 de septiembre de 2025 se realizó una reunión con el equipo técnico responsable del componente biótico, con el objetivo de revisar y precisar los requerimientos necesarios para el levantamiento de información en campo. Asimismo, se abordaron aspectos logísticos y la identificación de insumos requeridos para la planeación de las actividades, el cronograma preliminar y los lineamientos de coordinación que garantizarán el adecuado desarrollo de los trabajos programados.

- ✓ **Coordinación logística para el ingreso a campo de los especialistas del Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad, y del personal de la consultoría, interventora e invias**: El equipo de 20

profesionales del componente biótico conformado por biólogos en las diferentes áreas e Ingenieros forestales, realizarán el levantamiento de información técnica necesaria para el componente ambiental de los estudios y diseños del proyecto. Esta actividad se llevó a cabo en el corredor vial desde el 25 de septiembre hasta el 06 de octubre de 2025, y requiere la articulación previa con las entidades y actores involucrados para garantizar el acceso, la seguridad y el cumplimiento del cronograma establecido.

Adicionalmente, se organizó la logística para el ingreso a campo del personal que participará en el Comité de Seguimiento Mensual, programado del 25 al 27 de septiembre de 2025, así como para la realización de un recorrido técnico en la zona de influencia del proyecto. El propósito de esta jornada es verificar el avance de las actividades, evaluar el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

- ✓ **Reunión para atender observaciones al acta de modificación – 19 de septiembre de 2025:** Encuentro destinado a la revisión, análisis y respuesta a las observaciones presentadas frente al acta de modificación, con el fin de precisar ajustes y garantizar su aprobación definitiva.

- ✓ **Reunión BIM- Actualización BEP y Software – 19 de septiembre de 2025:** Se discutió la actualización del BEP y el uso de software en el contrato 4227, resaltando la urgencia de garantizar licencias suficientes para el componente BIM. La consultoría presentó propuestas y cotizaciones, señalando que adquirir paquetes sería más rentable.

Ante la falta de recursos y el riesgo de limitar el alcance del proyecto, se propuso escalar la situación a la subdirección. Asimismo, se reiteró la necesidad de avanzar con las actas de modificación para no generar más retrasos.

- ✓ **Actividades en campo entre el 15 y el 20 de septiembre de 2025:**

  Entre el 15 y el 20 de septiembre de 2025, un equipo de especialistas y profesionales de los componentes de topografía, social, taludes y patología realizaron actividades en campo orientadas a la recopilación de información técnica y comunitaria. Estas acciones tuvieron como objetivo identificar condiciones actuales, levantar datos específicos y aportar insumos clave para la caracterización y análisis de cada componente, fortaleciendo la comprensión integral del proyecto y aportando elementos para su adecuada planificación y ejecución.

Volumen de Estabilidad y Estabilización de Taludes:

Durante la presente semana se llevó a cabo un levantamiento topográfico en la zona de la vía rural, con el propósito de obtener información precisa sobre las condiciones de las laderas o taludes presentes en el corredor vial. En paralelo, se realizó la identificación y georreferenciación de zonas potenciales para la explotación de materiales aluviales en cauces fluviales, ejercicio desarrollado mediante inspecciones directas en campo.

De manera complementaria, se ejecutó el levantamiento topográfico de taludes y zonas críticas, con el fin de caracterizar la geometría, las pendientes y las

condiciones de estabilidad del terreno, de acuerdo con los requerimientos geotécnicos y de seguridad vial establecidos.

Componente social: Se adelantó la Caracterización del medio social, económico y cultural de las comunidad de Valencia, San Antonio, Partidas y Torito, con el propósito de contar con información de base que contribuya a la adecuada concertación y planeación del proyecto.

Compoetede Patologia:

Se realización de perforaciones en elementos estructurales de concreto mediante equipo extractor de núcleos cilíndricos, con el fin de obtener muestras representativas para la evaluación de la resistencia a la compresión, conforme a los procedimientos establecidos en la norma ASTM C42/C42M.

Las actividades se realizaron en los siguientes puntos:

(Puente el socorro) en tramo dos (2)
(Puente Toro viejo), oreel rio toro viejo

Se realización de perforaciones en elementos estructurales de concreto mediante equipo extractor de núcleos cilíndricos, con el fin de obtener muestras representativas para la evaluación de la resistencia a la compresión, conforme a los procedimientos establecidos en la norma ASTM C42/C42M.

Topografia:

Las actividades se enfocaron en la verificación geométrica y la definición precisa de puntos de control geodésico, mediante los siguientes trabajos:

1. Reconocimiento y registro de los mojones existentes en campo y determinación precisa de coordenadas mediante sistemas GNSS (como GPS, GLONASS, Galileo) entre la ubicación física y los registros cartográficos o planos oficiales para validar su correspondencia.

2. Determinación de coordenadas longitudinales para la verificación geométrica del alineamiento del eje vial, a partir de un análisis de la congruencia entre el diseño teórico del eje y su materialización en campo y la correcta disposición del eje de la vía en planta, asegurando que cumpla con los parámetros de diseño geométrico establecidos.

3. Establecer físicamente los mojones en el terreno para la identificación visual y cartográfica de los puntos y/o instalación permanente de estructuras que marcan límites o puntos de control geodésico, desde el punto conocido como cruce el Cairo, tramo (5), K104+870 m.

4. Implantar físicamente los vértices en el terreno para la materialización de la poligonal, mediante el posicionamiento de mojones o hitos georreferenciados, garantizando su estabilidad, visibilidad y exactitud conforme a los parámetros del levantamiento topográfico entre las abscisas K101+200 - K102+000

5. Se avanzó en las actividades de replanteo y demarcación de la poligonal correspondiente al tramo comprendido entre las progresivas K100+200 y K101+200, aproximadamente. Estas labores incluyeron la implantación física de los vértices en el terreno, mediante el posicionamiento de mojones o hitos georreferenciados que garantizan estabilidad, visibilidad y exactitud, en cumplimiento con los parámetros establecidos para el levantamiento topográfico.

6. De manera complementaria, se efectuó el levantamiento y posicionamiento geodésico para la georreferenciación de las estaciones GPS 23 y GPS 23A, aplicando técnicas de posicionamiento satelital de alta precisión.

7. Para finalizar, se efectuó la Ubicación, señalización y construcción de mojones de concreto para la materialización de la poligonal, en donde cada punto fue georreferenciado con coordenadas específicas y debidamente marcado en campo para su posterior identificación y así mismo establecer físicamente los mojones en el terreno para la identificación visual y cartográfica de los puntos y/o instalación permanente de estructuras que marcan límites o puntos de control geodésico, en el K94.

✓ **Componente de suelos: Posibles puntos de extracción de material de río**

Se realizó una visita técnica a diferentes puntos del río con el objetivo de identificar y registrar las zonas destinadas a la extracción de material. Durante el recorrido se tomaron evidencias de los sectores aledaños, los

accesos y los puntos de acumulación de material, con el propósito de evaluar las condiciones actuales y establecer lineamientos para el seguimiento ambiental y de control.

- ✓ **Comité de seguimiento virtual realizado el 22 de septiembre de 2025, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS:** Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.
- ✓ **Equipo de Consultoría, Interventoría e Invías:** El 26 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el comité de seguimiento en el municipio de San José del Palmar, con la participación de los equipos técnicos de cada entidad. Durante la jornada se revisaron los avances del proyecto, se analizaron los compromisos establecidos en reuniones anteriores y se definieron acciones para optimizar el desarrollo de las actividades.

Finalizado el comité, se realizó un recorrido por la zona de influencia con el fin de verificar en campo las condiciones actuales, constatar los avances reportados y levantar observaciones para el control y seguimiento interinstitucional.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

4.1. Informe semanal

Para el contrato 4227 de 2024 en el mes de septiembre se generaron 4 informes semanales los cuales se presentan en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-3.**

4.2 Maquinaria y equipo contrato de consultoría.

Para este periodo no aplica el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-4**. No se presenta.

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social de consultoría

El control diario del personal del consultor se presentará en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-6**, con sus respectivos soportes del mes de septiembre de 2025.

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de consultoría

Se anexa el informe financiera y presupuestal (Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-9).**

4.5 Estado general del tiempo.

El control del estado general del tiempo contemplado en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-10** se presenta para este mes.

4.6 Resumen ensayos de laboratorio.

Ya que no se realizaron ensayos de laboratorio durante el presente periodo no se presenta el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-11**.

4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de consultoría

Se presenta formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13**.

4.8 Seguimiento al plan de calidad contrato de consultoría

No se presenta el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-14**.

4.9. Otros documentos seguimiento mensual:

- **Seguimiento al plan de inversión del anticipo:** se anexa formato **MEPI-MN1-IN-3-FR-1** Plan de inversión de anticipo aprobado por la interventoría.
- **Seguimiento programa de consultoría:** Con respecto al contrato 4227 de 2024 se tiene que para el mes de septiembre de 2025 un porcentaje ejecutado de 7.87% y un porcentaje programado de 8.67%.
- **Seguimiento Programa de inversiones:** se anexan formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1**, y el formato **MEPI-MN-IN-6-FR-2.**
- **Actas de comité de obra:** No aplica para este proyecto
- **Actas de reunión:** Se anexa las actas **MEPI-MN1-IN-14-FR-2.**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Durante el mes de septiembre, se continuó con el desarrollo de múltiples frentes de trabajo, incluyendo levantamientos topográficos, exploraciones geotécnicas para el eje de la vía, estudios de patología, análisis ambientales, sociales, así como el fortalecimiento del componente BIM. Esta simultaneidad ha permitido mantener el dinamismo en la ejecución del contrato.

2. Los avances relevantes en levantamiento de información primaria y validación en campo han sido significativos dado que se han realizado jornadas de campo con enfoque integral, donde participó el responsable del volumen de estabilidad de taludes, patología, componente social y topográfico. Se recopilaron datos cruciales como muestras estructurales, información geodésica, material de cobertura vegetal y caracterizaciones comunitarias, lo cual nutre técnicamente cada volumen del proyecto.

3. La articulación interinstitucional sigue siendo un pilar clave porque la realización de comités de seguimiento, reuniones técnicas y mesas de trabajo con participación de INVÍAS, la interventoría ha permitido evaluar avances, revisar compromisos y concertar decisiones oportunas para garantizar la continuidad y calidad del proceso.

4. Se consolida el enfoque territorial y participativo del proyecto teniendo en cuenta que las visitas a comunidades (Valencia, San Antonio, Torito, entre otras), así como la caracterización social, ambiental y cultural, reafirman el compromiso del proyecto con un enfoque territorial que reconoce

los contextos locales y la participación comunitaria como elementos fundamentales.

RECOMENDACIONES

1. Finalizar el levantamiento topográfico y asegurar su validación técnica, dado el papel central del componente topográfico en la articulación de todos los volúmenes, se recomienda culminar y validar rigurosamente esta actividad, asegurando que todos los mojones, vértices y estaciones estén debidamente georreferenciados y documentados.
2. Consolidar la implementación del enfoque BIM dado que es de carácter urgente avanzar con la actualización del BEP, definir los recursos requeridos (licencias, software, modeladores), y formalizar las mesas de trabajo para garantizar una implementación eficaz y sostenible del enfoque BIM en todos los volúmenes.
3. Mantener la comunicación permanente entre contratante, interventoría y consultor en el desarrollo del proyecto.

8. ANEXOS

Acta de costos (Formato **MEPI-MN1-IN-8-FR-1**)

Informes mensuales grupo 1 del mes de septiembre de 2025.

SEMANALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 6/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 40 del 1 al 6 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **APOYO A LA SUPERVISION:** YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÀSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.367.468.537,54	38,71%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.370.472.335,00	38,74%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ 3.003.797,46	0,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.367.468.537,54	38,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.370.472.335,00	38,74%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 3.003.797,46	0,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 79.561.400,00	0,91%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.931.400,00	0,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 38,71%
Meta Física Ejecutada % 38,74%

Avance o Atraso Físico % 0,03%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 24.491.400,00			$ 24.491.400,00	0,28%
					Ejec	$ 24.491.400,00			$ 24.491.400,00	0,28%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ -	
						Total Ejec				$ -	

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de consultoria por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024	Prog	$ 55.070.000,00			$ 55.070.000,00	0,63%
					Ejec	$ 440.000,00			$ 440.000,00	0,01%

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	42	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ..... 42 .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ..... 3 .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Revisión de información secundaria: Consistió en examinar y evaluar la información secundaria disponible, como estudios previos, informes técnicos, bases de datos y documentación relacionada con el proyecto. El objetivo es asegurar que los datos sean fiables, pertinentes y útiles para la toma de decisiones, la planificación de actividades y la elaboración de informes técnicos, contribuyendo a la solidez y coherencia del proyecto.

Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa: Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

Gestión administrativa orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto

Adquisición de cartografía y demás información técnica: Consistió en la delimitación de cuencas hidrográficas.

Además, se llevó a cabo una reunión con la especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) e hidráulica, hidrología y socavación para tratar la delimitación de cuencas hidrográficas. Durante el encuentro se revisaron los criterios técnicos, herramientas geoespaciales y metodologías a emplear para definir con precisión los límites de las cuencas, así como la integración de esta información en los estudios previos. También se discutieron aspectos relacionados con la planificación de trabajo de campo y el procesamiento de datos para garantizar la consistencia y calidad de los resultados.

Comité de seguimiento virtual realizado el 01 de septiembre de 2025, con participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS).
Durante la sesión se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en reuniones anteriores y se abordaron los siguientes temas:

1.Envío formal del acta de modificaciones según orden y documentos establecidos por INVÍAS.
2.Acta de costos correspondiente al mes de agosto.
3.Cronograma de trabajos de campo de Topografía y Geotecnia.
4.Informe de aprovechamiento de los estudios de fase II (Contrato N° 1666 de 2015) en relación con la fase III (Contrato N° 4227 de 2024) y documentos establecidos por el INVÍAS.
Finalmente, se definieron acciones orientadas a fortalecer la ejecución del contrato de consultoría.

Mesa de trabajo de la consultoría para la revisión y ajustes del Acta de Modificación No. 02 y del Acta de Costos No. 09 - 01 septiembre de 2025: Se desarrolló una mesa de trabajo entre los equipos de la consultoría con el propósito de revisar, realizar ajustes y analizar en detalle el contenido del Acta de Modificación No. 02 y del Acta de Costos No. 09.

Revisión sobre la caracterización de las comunidades del corredor vial – 02 de septiembre de 2025: Se realizó una reunión de trabajo con el objetivo de revisar y analizar la caracterización de las comunidades ubicadas a lo largo del corredor vial. Durante el encuentro se evaluó la información recopilada, se discutieron aspectos sociales, culturales y ambientales relevantes, y se identificaron posibles ajustes o complementaciones necesarias para garantizar que la caracterización refleje adecuadamente las condiciones y necesidades de las comunidades

Revisión de los informes de apropiación de especialistas – 01 de septiembre de 2025: En el marco de las actividades de seguimiento y articulación contractual, se llevó a cabo una reunión con la participación de especialistas de la consultoria, con el propósito de revisar el informe de aprovechamiento de los estudios desarrollados en la Fase II – Contrato N.° 1666 de 2015, en relación con la Fase III – Contrato N.° 4227 de 2024.

Durante las sesiones se socializaron los principales resultados del informe, se analizaron los insumos técnicos provenientes de la Fase II que pueden ser aplicados en la Fase III y se identificaron aspectos que requieren ajustes o complementación para garantizar la continuidad y coherencia entre ambas fases.

El espacio permitió intercambiar observaciones entre los especialistas, definir criterios de aprovechamiento de la información existente y establecer lineamientos preliminares para la integración de los estudios, con el fin de optimizar tiempos, recursos y asegurar la calidad técnica del proyecto

Reunión de la programación de la salida a campo del componente forestal – 04 de septiembre de 2025: Se realizó una reunión con el equipo responsable del componente forestal con el objetivo de coordinar y definir la programación de la salida a campo, prevista para la realización de actividades de levantamiento de información y caracterización de la vegetación. Durante el encuentro se discutieron aspectos logísticos, distribución de tareas, cronograma de actividades y medidas de seguridad para el personal participante, con el fin de garantizar la eficiencia y calidad del trabajo de campo

Mesa de trabajo para la elaboración del informe de aprovechamiento de estudios fase II Contrato N° 1666 2015 en relación con fase III - Contrato 4227 -2024-
Durante la semana, el Grupo 1 desarrolló varias reuniones con el objetivo de realizar una revisión detallada de los informes de aprovechamiento de estudios correspondientes a la Fase II (Contrato N° 1666 de 2015) en relación con la Fase III (Contrato N° 4227 de 2024), previamente elaborados y presentados por los especialistas.,

En estas reuniones, el grupo analizó cada informe, verificó la información presentada, identificó vacíos o aspectos que requieren ajustes, y definió acciones para complementar y consolidar los datos. Esta revisión busca asegurar que el contenido sea coherente, completo y útil para la planificación y ejecución de la Fase III, fortaleciendo la calidad y consistencia de la información recopilada.

Comité de seguimiento virtual realizado el 04 de septiembre de 2025, con participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS). Durante la sesión se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en reuniones anteriores y se abordaron los siguientes temas

Levantamiento de información y recolección de muestras – 01 al 06 de septiembre de 2025: Durante la semana del 01 al 06 de septiembre de 2025 se llevaron a cabo actividades técnicas en el marco de los estudios de suelos, las cuales incluyeron el levantamiento de información detallada, la ejecución de perforaciones, la recolección de muestras y el desarrollo de exploraciones geotécnicas a lo largo del eje vial. Asimismo, se efectuó el análisis patológico de las estructuras existentes, con el fin de evaluar su estado actual y definir posibles intervenciones. Estas acciones permitieron consolidar insumos técnicos de gran relevancia para el avance de los estudios y diseños del proyecto, asegurando una base sólida para la toma de decisiones en las fases posteriores.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
Volumen 16. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto
Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.
Volumen 18. Técnico BIM


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Mesa de trabajo de la consultoría para la revisión y ajustes del Acta de Modificación No. 02 y del Acta de Costos No. 09 - 01 septiembre de 2025



Comité de seguimiento virtual realizado el 01 de septiembre de 2025



Revisión sobre la caracterización de las comunidades del corredor vial – 02 de septiembre de 2025



Revisión de los informes de apropiación de especialistas – 01 de septiembre de 2025:



Revisión de los informes de apropiación de especialistas – 01 de septiembre de 2025:




Reunión con la especialista SIG se trató el tema de la delimitación de cuencas hidrográficas - 04 de septiembre de 2025



Reunión de la programación de la salida a campo del componente forestal – 04 de septiembre de 2025



Mesa de trabajo para la elaboración del informe de aprovechamiento de estudios fase II Contrato N° 1666 2015 en relación con fase III - Contrato 4227 -2024



Comité de seguimiento virtual realizado el 04 de septiembre de 2025



Levantamiento de información y recolección de muestras – 01 al 06 de septiembre de 2025



Levantamiento de información y recolección de muestras – 01 al 06 de septiembre de 2025



Levantamiento de información y recolección de muestras – 01 al 06 de septiembre de 2025



Levantamiento de información y recolección de muestras – 01 al 06 de septiembre de 2025



Levantamiento de información y recolección de muestras – 01 al 06 de septiembre de 2025



Levantamiento de información y recolección de muestras – 01 al 06 de septiembre de 2025



Levantamiento de información y recolección de muestras – 01 al 06 de septiembre de 2025



Levantamiento de información y recolección de muestras – 01 al 06 de septiembre de 2025



Levantamiento de información y recolección de muestras – 01 al 06 de septiembre de 2025



Levantamiento de información y recolección de muestras – 01 al 06 de septiembre de 2025



Levantamiento de información y recolección de muestras – 01 al 06 de septiembre de 2025



Levantamiento de información de Topografía – 01 al 06 de septiembre de 2025



Levantamiento de información de Topografía – 01 al 06 de septiembre de 2025



Levantamiento de información de Topografía – 01 al 06 de septiembre de 2025



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTORA DE CONSULTORÍA** FIRMA NOMBRE: EDLY STELLA RENTERÍA MENA Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 41 del 8 al 13 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **APOYO A LA SUPERVISION:** YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE CONSULTORÍA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.488.429.937,54	40,10%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.395.403.735,00	39,03%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ (93.026.202,54)	-1,07%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.488.429.937,54	40,10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.395.403.735,00	39,03%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (93.026.202,54)	-1,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 120.961.400,00	1,39%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.931.400,00	0,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 40,10%
Meta Física Ejecutada % 39,03%
Avance o Atraso Físico % -1,07%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 24.491.400,00			$ 24.491.400,00	0,28%
					Ejec	$ 24.491.400,00			$ 24.491.400,00	0,28%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog				$ 41.400.000,00	0,48%
						Ejec				$ -	
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ 41.400.000,00	0,48%
						Total Ejec				$ -	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de consultoría por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....
TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024	Prog	$ 55.070.000,00			$ 55.070.000,00	0,63%
					Ejec	$ 440.000,00			$ 440.000,00	0,01%

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: .....
.....
PERMISO MINERO: SI ..... NO .....
LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

UBICACIÓN: .....
.....
PERMISO MINERO: SI ..... NO .....
LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	42	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

□Revisión de información secundaria: Consistió en examinar y evaluar la información secundaria disponible, como estudios previos, informes técnicos, bases de datos y documentación relacionada con el proyecto. El objetivo es asegurar que los datos sean fiables, pertinentes y útiles para la toma de decisiones, la planificación de actividades y la elaboración de informes técnicos, contribuyendo a la solidez y coherencia del proyecto.

□Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa: Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

□Adquisición de cartografía y demás información técnica: Durante la semana se llevaron a cabo actividades orientadas al cálculo de parámetros morfométricos de las cuencas asociadas al corredor vial y a la elaboración de cartografía segmentada por tramos.

□Gestión administrativa: Orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto

□Reunión técnica para revisión de requerimientos de información para el volumen ambiental - 11 de septiembre de 2025: En esta sesión se llevó a cabo el análisis detallado de los insumos necesarios para la elaboración del volumen ambiental, verificando los alcances de la información disponible y definiendo los requerimientos adicionales a solicitar a las partes responsables. Se establecieron lineamientos para consolidar la documentación técnica y se asignaron compromisos a fin de garantizar la integridad y coherencia del contenido ambiental en el proyecto.
□Comité de seguimiento virtual realizado entre el 08 y el 11 de septiembre de 2025, con participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS).

Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

□Logística de comisión para el ingreso a campo de los profesionales de la consultoría de los componentes de social, taludes y seguridad vial - 12 de septiembre de 2025, durante la reunión se abordaron los requerimientos y necesidades logísticas para facilitar la presencia de los profesionales del componente social, taludes y seguridad vial, para las visitas de campo. Se discutieron los elementos necesarios para garantizar que el ingreso y la movilidad de los participantes se realicen de manera organizada, incluyendo la coordinación previa de accesos, la definición de responsables y el establecimiento de un recorrido claro para las actividades programadas. Asimismo, se identificaron los recursos técnicos y operativos requeridos para el cumplimiento de los objetivos de las visitas, haciendo énfasis en la importancia de anticipar la información para asegurar una ejecución eficiente. Como parte de los acuerdos, se establecerán procedimientos para la recolección de necesidades individuales y se definirá un plan de acción que permita la correcta articulación entre los equipos involucrados.

Además, se revisó la metodología de trabajo propuesta para cada uno de los componentes técnicos, incluyendo lo social, taludes y seguridad vial, con el fin de garantizar una ejecución coordinada y conforme a los requerimientos específicos de cada disciplina.

□Levantamiento de información en campo del componente de Topografía y Patología entre el 08 al 13 de septiembre de 2025: durante la semana se realizaron las siguientes actividades: Entre el 08 y el 13 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el levantamiento de información en campo correspondiente al componente de Topografía, dentro del cual se desarrollaron actividades orientadas a la materialización del eje en su Fase II, mediante el establecimiento físico de puntos de control que aseguran visibilidad, estabilidad y precisión para las labores posteriores; el posicionamiento y georreferenciación de dichos puntos utilizando equipos de topografía y sistemas GNSS, con el fin de garantizar la correspondencia de los datos con el sistema de referencia oficial adoptado para el proyecto; y la georreferenciación específica de los mojones que materializan el eje, asegurando su ubicación espacial, permanencia y trazabilidad dentro del levantamiento topográfico y el desarrollo del proyecto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS
VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO
VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL
VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS
VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS
VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS
VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Comité de seguimiento virtual realizado el 08 de septiembre de 2025



Comité de seguimiento virtual realizado el 11 de septiembre de 2025



Comité de seguimiento virtual realizado el 11 de septiembre de 2025



Reunión técnica para revisión de requerimientos de información para el volumen ambiental - 11 de septiembre de 2025



Logística de comisión para el ingreso a campo de los profesionales de la consultoría de los componentes de social, taludes y seguridad vial - 12 de septiembre de 2025



Logística de comisión para el ingreso a campo de los profesionales de la consultoría de los componentes de social, taludes y seguridad vial - 12 de septiembre de 2025



Levantamiento de información Topografía entre el 08 al 13 de septiembre de 2025



Levantamiento de información Topografía entre el 08 al 13 de septiembre de 2025



Levantamiento de información Topografía entre el 08 al 13 de septiembre de 2025



Levantamiento de información Topografía entre el 08 al 13 de septiembre de 2025



Levantamiento de información Topografía entre el 08 al 13 de septiembre de 2025



Levantamiento de información Topografía entre el 08 al 13 de septiembre de 2025



Levantamiento de información Topografía entre el 08 al 13 de septiembre de 2025



Levantamiento de información Topografía entre el 08 al 13 de septiembre de 2025



Levantamiento de información Topografía entre el 08 al 13 de septiembre de 2025



Levantamiento de información Topografía entre el 08 al 13 de septiembre de 2025



Levantamiento de información Topografía entre el 08 al 13 de septiembre de 2025



Levantamiento de información Topografía entre el 08 al 13 de septiembre de 2025



Levantamiento de información Topografía entre el 08 al 13 de septiembre de 2025



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTORA DE CONSULTORÍA
	FIRMA NOMBRE: EDLY STELLA RENTERIA MENA Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 20/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 42 del 15 al 20 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **APOYO A LA SUPERVISION:** YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÀSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.611.791.337,54	41,51%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.432.985.135,00	39,46%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ (178.806.202,54)	-2,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.611.791.337,54	41,51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.432.985.135,00	39,46%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (178.806.202,54)	-2,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 123.361.400,00	1,42%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37.581.400,00	0,43%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 41,51%
Meta Física Ejecutada % 39,46%
Avance o Atraso Físico % -2,06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 24.491.400,00			$ 24.491.400,00	0,28%
					Ejec	$ 24.491.400,00			$ 24.491.400,00	0,28%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog				$ 43.800.000,00	0,50%
						Ejec				$ -	
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ 43.800.000,00	0,50%
						Total Ejec				$ -	

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de consultoria por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....
TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024	Prog	$ 55.070.000,00			$ 55.070.000,00	0,63%
					Ejec	$ 13.090.000,00			$ 13.090.000,00	0,15%

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	42	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Revisión de información secundaria: Consistió en examinar y evaluar la información secundaria disponible, como estudios previos, informes técnicos, bases de datos y documentación relacionada con el proyecto. El objetivo es asegurar que los datos sean fiables, pertinentes y útiles para la toma de decisiones, la planificación de actividades y la elaboración de informes técnicos, contribuyendo a la solidez y coherencia del proyecto.

Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa: Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

Adquisición de cartografía y demás información técnica: Durante la semana se llevó a cabo el proceso de diagramación y cuantificación de las coberturas vegetales en cada una de las subcuencas, con el propósito de generar insumos técnicos que fortalezcan el análisis del volumen de Hidráulica e Hidrología, permitiendo una mejor comprensión de la relación entre la vegetación, la dinámica hídrica y la gestión integral de los recursos naturales.

Gestión administrativa: Orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto

Ingreso a campo para levantamiento de información: El 15 de septiembre de 2025 se realizó el ingreso del equipo profesional de la consultoría correspondiente al Volumen VII Estabilidad y Estabilización de Taludes y al Volumen XVII Ambiental, Social, Predial y de Sostenibilidad, específicamente en el componente social. El objetivo principal de esta actividad fue llevar a cabo el levantamiento de información.

Comité de seguimiento virtual realizado entre el 15 y el 18 de septiembre de 2025, con participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS). .

Reunión del Componente BIM con participación de la Consultoría, la Interventoría, el INVÍAS y los Líderes BIM – 15 de septiembre de 2025: Se revisaron los avances del proyecto BIM, resaltando la necesidad de un plan de ejecución como bitácora y el seguimiento a contratos. Se presentó el documento con alcance, especialidades modelables, gestión de información y actualización del BEP. Se definió un nivel de desarrollo geométrico 300, con posibilidad de llegar a 350 en estructuras de drenaje representativas.

En la parte técnica, se trataron la federación de modelos y el uso de Autodesk Construction Cloud. También se discutió la contratación de modeladores y la adquisición de licencias (AS Collection y otras adicionales). Finalmente, se acordó revisar la propuesta de la consultoría, actualizar el plan de ejecución BIM y coordinar la gestión documental y ajustes previos al envío.

Reunión con el equipo del componente biótico para revisión de requerimientos de levantamiento de información y aspectos logísticos – 17 de septiembre de 2025: El 17 de septiembre de 2025 se realizó una reunión con el equipo técnico responsable del componente biótico, con el objetivo de revisar y precisar los requerimientos necesarios para el levantamiento de información en campo. Asimismo, se abordaron aspectos logísticos y la identificación de insumos requeridos para la planeación de las actividades, definiendo los recursos disponibles, el cronograma preliminar y los lineamientos de coordinación que garantizarán el adecuado desarrollo de los trabajos programados.

Coordinación logística para el ingreso a campo de los especialistas del Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad, y del personal de la consultoría, interventora e invias: El equipo de 20 profesionales del componente biótico conformado por biólogos en las diferentes áreas e Ingenieros forestales, realizarán el levantamiento de información técnica necesaria para el componente ambiental de los estudios y diseños del proyecto. Esta actividad se llevará a cabo en el corredor vial desde el 22 de septiembre hasta el 06 de octubre de 2025, y requiere la articulación previa con las entidades y actores involucrados para garantizar el acceso, la seguridad y el cumplimiento del cronograma establecido.

Adicionalmente, se organizó la logística para el ingreso a campo del personal que participará en el Comité de Seguimiento Mensual, programado del 25 al 27 de septiembre de 2025, así como para la realización de un recorrido técnico en la zona de influencia del proyecto. El propósito de esta jornada es verificar el avance de las actividades, evaluar el cumplimiento de los requerimientos establecidos y concertar, junto con los actores involucrados, las fases pendientes de desarrollo.

Logística para la adquisición de insumos y materiales requeridos en la ejecución de las actividades del componente biótico: Se estableció la planeación y organización de los procesos necesarios para garantizar la compra oportuna de insumos y materiales. Esto incluye la identificación de los elementos requeridos, la definición de proveedores, la gestión de cotizaciones, la programación de compras y el control de inventarios, asegurando así la disponibilidad de recursos en cantidad, calidad y tiempo adecuados para el desarrollo de las actividades en campo.

Reunión para atender observaciones al acta de modificación – 19 de septiembre de 2025: Encuentro destinado a la revisión, análisis y respuesta a las observaciones presentadas frente al acta de modificación, con el fin de precisar ajustes y garantizar su aprobación definitiva.

Reunión BIM- Actualización BEP y Software – 19 de septiembre de 2025: Se discutió la actualización del BEP y el uso de software en el contrato 4227, resaltando la urgencia de garantizar licencias suficientes para el componente BIM. La consultoría presentó propuestas y cotizaciones, señalando que adquirir paquetes sería más rentable.

Ante la falta de recursos y el riesgo de limitar el alcance del proyecto, se propuso escalar la situación a la subdirección. Asimismo, se reiteró la necesidad de avanzar con las actas de modificación para no generar más retrasos.

Actividades en campo entre el 15 y el 20 de septiembre de 2025:

Entre el 15 y el 20 de septiembre de 2025, un equipo de especialistas y profesionales de los componentes de topografía, social, taludes y patología realizaron actividades en campo orientadas a la recopilación de información técnica y comunitaria. Estas acciones tuvieron como objetivo identificar condiciones actuales, levantar datos específicos y aportar insumos clave para la caracterización y análisis de cada componente, fortaleciendo la comprensión integral del proyecto y aportando elementos para su adecuada planificación y ejecución.

Volumen de Estabilidad y Estabilización de Taludes: Durante la presente semana se llevó a cabo un levantamiento topográfico en la zona de la vía rural, con el propósito de obtener información precisa sobre las condiciones de las laderas o taludes presentes en el corredor vial. En paralelo, se realizó la identificación y georreferenciación de zonas potenciales para la explotación de materiales aluviales en cauces fluviales, ejercicio desarrollado mediante inspecciones directas en campo.

De manera complementaria, se ejecutó el levantamiento topográfico de taludes y zonas críticas, con el fin de caracterizar la geometría, las pendientes y las condiciones de estabilidad del terreno, de acuerdo con los requerimientos geotécnicos y de seguridad vial establecidos.

Componente social: Se adelantó la Caracterización del medio social, económico y cultural de las comunidad de Valencia, San Antonio, Partidas y Torito, con el propósito de contar con información de base que contribuya a la adecuada concertación y planeación del proyecto.

Compoetede Patologia: Se realización de perforaciones en elementos estructurales de concreto mediante equipo extractor de núcleos cilíndricos, con el fin de obtener muestras representativas para la evaluación de la resistencia a la compresión, conforme a los procedimientos establecidos en la norma ASTM C42/C42M.

Las actividades se realizaron en los siguientes puntos:

(Puente el socorro) en tramo dos (2)
(Puente Toro viejo), oreel rio toro viejo

Volumen de Topografia: Las actividades se enfocaron en la verificación geométrica y la definición precisa de puntos de control geodésico, mediante los siguientes trabajos:

1.Reconocimiento y registro de los mojones existentes en campo y determinación precisa de coordenadas mediante sistemas GNSS (como GPS, GLONASS, Galileo) entre la ubicación física y los registros cartográficos o planos oficiales para validar su correspondencia.

2. Determinación de coordenadas longitudinales para la verificación geométrica del alineamiento del eje vial, a partir de un análisis de la congruencia entre el diseño teórico del eje y su materialización en campo y la correcta disposición del eje de la vía en planta, asegurando que cumpla con los parámetros de diseño geométrico establecidos.

3.Establecer físicamente los mojones en el terreno para la identificación visual y cartográfica de los puntos y/o instalación permanente de estructuras que marcan límites o puntos de control geodésico, desde el punto conocido como cruce el Cairo, tramo (5), K104+870 m.

4.Implantar físicamente los vértices en el terreno para la materialización de la poligonal, mediante el posicionamiento de mojones o hitos georreferenciados, garantizando su estabilidad, visibilidad y exactitud conforme a los parámetros del levantamiento topográfico.

Componente de suelos: Posibles puntos de extracción de material de río
Se realizó una visita técnica a diferentes puntos del río con el objetivo de identificar y registrar las zonas destinadas a la extracción de material. Durante el recorrido se tomaron evidencias de los sectores aledaños, los accesos y los puntos de acumulación de material, con el propósito de evaluar las condiciones actuales y establecer lineamientos para el seguimiento ambiental y de control.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
Volumen 16. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto
Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.
Volumen 18. Técnico BIM


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Reunión del Componente BIM con participación de la Consultoría, la Interventoría, el INVIAS y los Líderes BIM – 15 de septiembre de 2025



Reunión del Componente BIM con participación de la Consultoría, la Interventoría, el INVIAS y los Líderes BIM – 15 de septiembre de 2025




Reunión con el equipo del componente biótico para revisión de requerimientos de levantamiento de información y aspectos logísticos – 17 de septiembre de 2025



Reunión con el equipo del componente biótico para revisión de requerimientos de levantamiento de información y aspectos logísticos – 17 de septiembre de 2025



Reunión con el equipo del componente biótico para revisión de requerimientos de levantamiento de información y aspectos logísticos – 17 de septiembre de 2025



Comité de seguimiento virtual realizado el 18 de septiembre de 2025



Comité de seguimiento virtual realizado el 18 de septiembre de 2025



Levantamiento de información en campo del volumen de Topografía



Levantamiento de información en campo del volumen de Topografía



Levantamiento de información en campo del volumen de Topografía



Levantamiento de información en campo del volumen de Topografía



Levantamiento de información en campo del componente Social en la comunidad de Valencia



Levantamiento de información en campo del componente Social en la comunidad de Valencia



Levantamiento de información en campo del componente Social en la comunidad de Valencia



Levantamiento de información en campo del componente Social en la comunidad de Valencia



Levantamiento de información en campo del componente Social en la comunidad de Torito



Levantamiento de información en campo del componente Social en la comunidad de Torito



Levantamiento de información en campo del componente Social en la comunidad de Torito



Levantamiento de información en campo del componente Social en la comunidad de San Antonio



Levantamiento de información en campo del componente Social en la comunidad de San Antonio



Levantamiento de información en campo del componente Social en la comunidad de San Antonio



Levantamiento de información en campo del componente Social en la comunidad de San Antonio



Levantamiento de información en campo del componente Social en la comunidad de Partidas



Levantamiento de información en campo del componente Social en la comunidad de Partidas



Levantamiento de información en campo del componente Social en la comunidad de Partidas



Levantamiento de información en campo del componente Social en la comunidad de Partidas



Componente de suelos: Posibles puntos de extracción de material de río



Componente de suelos: Posibles puntos de extracción de material de río



Componente de suelos: Posibles puntos de extracción de material de río





Levantamiento de información en campo del volumen de Taludes



Levantamiento de información en campo del volumen de Taludes



Levantamiento de información en campo del volumen de Taludes



Levantamiento de información en campo del volumen de Taludes



Toma de muestras en campo del componente de Patologia



Toma de muestras en campo del componente de Patologia




Toma de muestras en campo del componente de Patologia



Toma de muestras en campo del componente de Patologia



Toma de muestras en campo del componente de Patologia

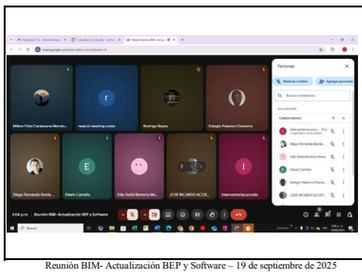

Reunión BIM- Actualización BEP y Software – 19 de septiembre de 2025



Reunión para atender observaciones al acta de modificación – 19 de septiembre de 2025



Toma de muestras en campo del componente de Patologia



Toma de muestras en campo del componente de Patologia



Toma de muestras en campo del componente de Patologia

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTORA DE CONSULTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: EDLY STELLA RENTERÍA MENA Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 27/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 43 del 22 al 27 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **APOYO A LA SUPERVISION:** YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÀSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.042.448.337,54	46,46%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 4.029.977.283,00	46,32%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ (12.471.054,54)	-0,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.042.448.337,54	46,46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.029.977.283,00	46,32%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (12.471.054,54)	-0,14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 430.657.000,00	4,95%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 596.992.148,00	6,86%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 46,46% Avance o Atraso Físico % -0,14%
Meta Física Ejecutada % 46,32%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 24.491.400,00			$ 24.491.400,00	0,28%
					Ejec	$ 24.491.400,00			$ 24.491.400,00	0,28%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog				$ 21.000.000,00	0,24%
						Ejec				$ -	
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog				$ 141.000.000,00	1,62%
						Ejec				$ -	
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog				$ 28.200.000,00	0,32%
						Ejec				$ -	
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec				$ 32.400.000,00	0,37%
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ 190.200.000,00	2,19%
						Total Ejec				$ 32.400.000,00	0,37%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de consultoria por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024	Prog	$ 215.965.600,00			$ 215.965.600,00	2,48%
					Ejec	$ 540.100.748,00			$ 540.100.748,00	6,21%

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	42	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Revisión de información secundaria

Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa

Adquisición de cartografía y demás información técnica: Durante la semana se llevó a cabo el proceso de diagramación y cuantificación de las coberturas vegetales en cada una de las subcuencas, con el propósito de generar insumos técnicos que fortalezcan el análisis del volumen de Hidráulica e Hidrología, permitiendo una mejor comprensión de la relación entre la vegetación, la dinámica hídrica y la gestión integral de los recursos naturales.

Gestión administrativa: Orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto

Comité de seguimiento virtual realizado el 22 de septiembre de 2025, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

Planeación y logística para personal en campo: Se llevó a cabo la planeación y organización de los procesos necesarios para garantizar la adquisición oportuna de insumos y materiales. Adicionalmente, fue necesaria una ardua logística para el desplazamiento del personal, debido a las restricciones y cierres de vías en la zona, lo que implicó una coordinación especial para garantizar la continuidad de las labores programadas.

Ingreso a campo para levantamiento de información biótica y forestal y realización del comité de seguimiento mensual: El 25 de septiembre de 2025 se efectuó el ingreso a campo en el área de influencia del proyecto, con la participación del equipo profesional del Volumen XVII – Ambiental, Social, Predial y de Sostenibilidad, específicamente del componente biótico y forestal, encargado de adelantar el levantamiento de información técnica sobre especies y coberturas vegetales.

De manera complementaria, el Grupo I de la consultoría, junto con funcionarios de la Interventoría y del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), ingresó al área de influencia del proyecto para llevar a cabo el comité de seguimiento mensual y realizar un recorrido de verificación. Esta actividad tiene como propósito evaluar avances, revisar compromisos y fortalecer los mecanismos de control interinstitucional.

La jornada permitirá articular las labores de caracterización ambiental con los procesos de seguimiento y supervisión en campo, garantizando coherencia, continuidad y trazabilidad en la gestión integral del proyecto.

Actividades en campo entre el 22 y el 27 de septiembre de 2025:

Entre el 22 y el 27 de septiembre de 2025, un equipo de especialistas y profesionales de los componentes de topografía, ambiental (biología y forestales) y patología realizaron actividades en campo orientadas a la recopilación de información técnica. Estas acciones tuvieron como objetivo identificar condiciones actuales, levantar datos específicos y aportar insumos clave para la caracterización y análisis de cada componente, fortaleciendo la comprensión integral del proyecto y aportando elementos para su adecuada planificación y ejecución.
Volumen XVII Ambiental, social y de sostenibilidad, específicamente del componente biótico y forestal:

- **Componente de Suelos:** Se llevaron a cabo levantamientos batimétricos en cada uno de los cuerpos de agua que interceptan la vía comprendida entre el sector denominado El Socorro y el punto conocido como El Crucero. Así mismo, se recolectaron muestras de sedimentos en cada fuente hídrica, a partir de puntos de muestreo ubicados entre 100 y 150 metros aguas arriba y aguas abajo del eje vial, con el propósito de caracterizar el material transportado y evaluar posibles procesos de erosión, sedimentación o alteración morfológica.
De igual forma, se efectuó la toma de muestras en potenciales yacimientos de materiales pétreos localizados en las proximidades del trazado vial, con el fin de analizar su densidad aparente y otras propiedades geotécnicas de interés. Esta caracterización preliminar busca determinar la viabilidad de dichos materiales para su eventual utilización en actividades constructivas de la vía, tales como la conformación de terraplenes, la conformación de capas de pavimento o la ejecución de estructuras de soporte.

- **Componente de patología:** Se realización de perforaciones en elementos estructurales de concreto mediante equipo extractor de núcleos cilíndricos, con el fin de obtener muestras representativas para la evaluación de la resistencia a la compresión, conforme a los procedimientos establecidos en la norma ASTM C42/C42M.

- **Componente de Topografía:** Implantar físicamente los vértices en el terreno para la materialización de la poligonal, mediante el posicionamiento de mojones o hitos georreferenciados, garantizando su estabilidad, visibilidad y exactitud conforme a los parámetros del levantamiento topográfico entre las abscisas K101+200 - K102+000

Se avanzó en las actividades de replanteo y demarcación de la poligonal correspondiente al tramo comprendido entre las progresivas K100+200 y K101+200, aproximadamente. Estas labores incluyeron la implantación física de los vértices en el terreno, mediante el posicionamiento de mojones o hitos georreferenciados que garantizan estabilidad, visibilidad y exactitud, en cumplimiento con los parámetros establecidos para el levantamiento topográfico.

De manera complementaria, se efectuó el levantamiento y posicionamiento geodésico para la georreferenciación de las estaciones GPS 23 y GPS 23A, aplicando técnicas de posicionamiento satelital de alta precisión.

Para finalizar, se efectuó la Ubicación, señalización y construcción de mojones de concreto para la materialización de la poligonal, en donde cada punto fue georreferenciado con coordenadas específicas y debidamente marcado en campo para su posterior identificación y así mismo establecer físicamente los mojones en el terreno para la identificación visual y cartográfica de los puntos y/o instalación permanente de estructuras que marcan límites o puntos de control geodésico, en el K94.

- **Equipo de Consultoría, Interventoría e Invías:** El 26 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el comité de seguimiento en el municipio de San José del Palmar, con la participación de los equipos técnicos de cada entidad. Durante la jornada se revisaron los avances del proyecto, se analizaron los compromisos establecidos en reuniones anteriores y se definieron acciones para optimizar el desarrollo de las actividades.

Finalizado el comité, se realizó un recorrido por la zona de influencia con el fin de verificar en campo las condiciones actuales, constatar los avances reportados y levantar observaciones para el control y seguimiento interinstitucional.

- **Levantamiento de información del componente biótico y forestal – Volumen XVII. Ambiental, Social y de Sostenibilidad:** En el marco del componente ambiental se llevaron a cabo actividades de levantamiento, registro y sistematización de información biológica y físico-natural, con el propósito de consolidar la línea base del área de estudio. Estas acciones incluyeron la recopilación de datos relacionados con suelos, vegetación forestal, plantas vasculares y no vasculares, aves, mamíferos, herpetofauna, insectos, comunidades hidrobiológicas e ictiología.

El proceso comprendió la identificación taxonómica preliminar, la descripción de características relevantes de cada grupo, la evaluación de su representatividad y patrones de distribución, así como la obtención de insumos necesarios para los análisis posteriores de diversidad, conservación y funcionalidad ecosistémica. La información recolectada fue organizada y consolidada como insumo técnico que servirá de soporte para la interpretación integral del medio biótico y su interacción con los demás componentes ambientales, asegurando un enfoque científico y riguroso en la valoración del territorio.

Reunión plan de trabajo del grupo de biólogos y agroforestal para levantamiento de información primaria 26 de septiembre de 2025: Se llevó a cabo una reunión con el grupo de biólogos y el profesional agroforestal con el propósito de estructurar el plan de trabajo para el levantamiento de información primaria en el área de influencia del proyecto. Durante el encuentro se socializaron los objetivos en campo, se definieron los roles y responsabilidades de cada integrante del equipo, y las condiciones logísticas del territorio.

Así mismo, se revisaron los protocolos de recolección de datos para los componentes biótico y forestal, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos aplicables.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
Volumen 16. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto
Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.
Volumen 18. Técnico BIM

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Comité de seguimiento virtual realizado el 22 de septiembre de 2025



Comité de seguimiento virtual realizado el 22 de septiembre de 2025



Recorrido en campo realizado por los profesionales de la Consultoría, la Interventoría y el INVIAS en el área de influencia del proyecto



Recorrido en campo realizado por los profesionales de la Consultoría, la Interventoría y el INVIAS en el área de influencia del proyecto




Recorrido en campo realizado por los profesionales de la Consultoría, la Interventoría y el INVIAS en el área de influencia del proyecto



Recorrido en campo realizado por los profesionales de la Consultoría, la Interventoría y el INVIAS en el área de influencia del proyecto



Instalaciones de Mojones - Topografía



Levantamieno de informacion Topografica



Levantamieno de informacion Topografica



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Suelos



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Suelos



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Suelos



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente Forestal




Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente Forestal



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Plantas No Vasculares



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Plantas Vasculares

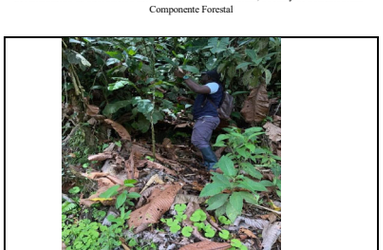

Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Plantas Vasculares



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Plantas Vasculares



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Plantas Vasculares




Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Aves




Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Aves



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Mamíferos




Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Mamíferos



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Herpetofauna



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Herpetofauna



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Herpetofauna



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Insectos



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Hidrobiológico




Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Hidrobiológico



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Hidrobiológico




Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Ictiología



Levantamiento de información del Volumen XVII: Ambiental, Social y de Sostenibilidad – Componente de Biología y Especies de Ictiología



Excavación manual previa a la instalación de mojón - Topografia



Levantamiento topográfico con estación total en la vía



Registro del detalle de la placa de identificación en el mojón - Topografia



Instalación de mojón en terreno lateral a la vía - Topografia



Comité de seguimiento virtual realizado el 26 de septiembre de 2025



Reunión plan de trabajo del grupo de biólogos y agroforestal para levantamiento de información primaria 26 de septiembre de 2025



Reunión plan de trabajo del grupo de biólogos y agroforestal para levantamiento de información primaria 26 de septiembre de 2025

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTORA DE CONSULTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: EDLY STELLA RENTERÍA MENA Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE COONSULTORÍA No: 4227 - 2024 **CONSULTOR:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4262 - 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACHOCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Tarifa Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDLY STELLA RENTERIA MENA	54.255.569	DIRECTORA	$ 10.240.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 427.700	V	NUEVA EPS	89900912	$ 768.000	Colpensiones	89900912	$ 1.044.700	$ -	$ -	$ -	
2	JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS	1.077.476.234	RESIDENTE DE ESTUDIOS	$ 5.850.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 458.100	V	NUEVA EPS	9491845466	$ 822.700	Colpensiones	9491845466	$ 1.119.000	$ 263.300	$ -	$ 197.500	
3	BERTONIS RENTERIA VALENCIA	11.811.142	RESIDENTE DE CAMPO	$ 5.850.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 407.200	V	NUEVA EPS	9491845466	$ 731.300	Colpensiones	9491845466	$ 994.600	$ 234.000		$ 175.500	
4	EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA	1010190981	COORDINADOR BIM SIG	$ 2.574.400															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 16.400	V	COMPENSAR EPS	89841272 - 90188574	$ 196.200	Colpensiones	89841272 - 90188574	$ 251.100	$ 9.500			
5	LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ	52.102.426	COORDINADORA AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 8.045.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 909.900	V	NUEVA EPS	9491845466	$ 1.634.200	Colpensiones	9491845466	$ 2.222.500	$ 523.000	$ -	$ 392.200	
6	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	11.788.838	COORDINADOR TÉCNICO	$ 8.045.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ -	V	NUEVA EPS	90126059	$ 603.400	Colpensiones	90126059	$ 772.400		$ -		
7	LLECELI MOSQUERA TELLO	1.077.463.135	INGENIERA AUXILIAR	$ 3.890.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 304.600	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9491845466	$ 547.100	Porvenir	9491845466	$ 700.200	$ 175.100	$ -	$ 131.300	
8	JEISON STIVEN GOMEZ GARCIA	1.112.789.406	TECNICO DE LA ZONA	$ 3.070.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 128.300	V	NUEVA EPS	9491910509	$ 230.300	Porvenir	9491910509	$ 294.800		$ -		
9																																													
10																																													
11																																													
N																																													

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERIA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 01183 - 0234 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA	VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	18/09/2025	89900912	$2.240.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	768.000	0		0		0	0	0	0	768.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	983.100	0	0	30.800	30.800	0	0		1.044.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	427.700				427.700	0	0	427.700			4.277	427.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	768.000	768.000
Pensión	1	1.044.700	1.044.700
Riesgos Laborales	1	427.700	427.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.240.400	2.240.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA		VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	18/09/2025	89900912	$2.240.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	54255569	RENTERIA MENA EDLY STELLA	57	0			N																	25-14	6.144.000	983.100	0	0	30.800	30.800	EPS037	6.144.000	768.000	14-23	6.144.000	5	427.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Medellín, 04 de Julio de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO, en el centro de trabajo 0005451201 - PLANEAMIENTO FISICO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C54256750	PINO PINO JUANA MARIA	06/04/2011		222Y2391	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C12020854	QUINTO MOSQUERA HARLEY	12/03/2012		A28M7133	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C35891192	MOSQUERA MURILLO ZULEYMA	01/10/2012		17618414	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C11807170	VALOIS CUESTA HAMLETH	18/01/2010		1779X222	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C19259580	BARRIOS MATURANA FRANKLIN	01/06/2002		207141DP	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C11800408	SANABRIA BOTERO JULIO RICARDO	01/07/2010		29144168	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C35851298	RENTERIA MORENO ELSY JOSEFA	05/04/2024		15344302	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C52102426	OCORO VELASQUEZ LUZ YANETH	01/01/2015		183Q9126	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C54255569	RENTERIA MENA EDLY STELLA	01/04/2019		22319724	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11311855672518539349

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/07/2025 10:55:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.1.126.190, 192.230.104.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891680089	4	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO	CRA 22 N° 18B 10	QUIBDO-CHOCO	6726565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1834569323	9491845466	E	2025/10/22	2025/10/07	BANCO AV VILLAS	0	$14,039,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROYECTO (5 Afiliados)						$32,880,625	$5,516,300			$32,880,625	$4,110,300			$32,880,625	$1,315,400			$32,880,625	$2,111,200		$32,880,625	$986,500
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$31,400		$3,000,000	$90,000
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$31,400		$3,000,000	$90,000
1	CC	1193520881	MAYO LISETH	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF29	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$31,400	30	$3,000,000	$90,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)						$29,880,625	$5,036,300			$29,880,625	$3,735,300			$29,880,625	$1,195,400			$29,880,625	$2,079,800		$29,880,625	$896,500
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (4 Afiliados)						$29,880,625	$5,036,300			$29,880,625	$3,735,300			$29,880,625	$1,195,400			$29,880,625	$2,079,800		$29,880,625	$896,500
2	CC	1077476234	MOSQUERA JHOANA	25-14	30	$6,581,250	$1,119,000	EPS037	30	$6,581,250	$822,700	CCF29	30	$6,581,250	$263,300	14-11	30	$6,581,250	$458,100	30	$6,581,250	$197,500
3	CC	1077463135	MOSQUERA LLECELI	230301	30	$4,376,250	$700,200	EPS041	30	$4,376,250	$547,100	CCF29	30	$4,376,250	$175,100	14-11	30	$4,376,250	$304,600	30	$4,376,250	$131,300
4	CC	52102426	OCORO LUZ	25-14	30	$13,073,125	$2,222,500	EPS037	30	$13,073,125	$1,634,200	CCF29	30	$13,073,125	$523,000	14-11	30	$13,073,125	$909,900	30	$13,073,125	$392,200
5	CC	11811142	RENTERIA BERTONIS	25-14	30	$5,850,000	$994,600	EPS037	30	$5,850,000	$731,300	CCF29	30	$5,850,000	$234,000	14-11	30	$5,850,000	$407,200	30	$5,850,000	$175,500
Total Afiliados(5)						$32,880,625	$5,516,300			$32,880,625	$4,110,300			$32,880,625	$1,315,400			$32,880,625	$2,111,200		$32,880,625	$986,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891680089	4	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO	CRA 22 N° 18B 10	QUIBDO-CHOCO	6726565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1834569323	9491845466	E	2025/10/22	2025/10/07	BANCO AV VILLAS	0	$14,039,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$5,516,300	$0	$0	$5,516,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$4,336,100	$0	$0	$4,336,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$700,200	$0	$0	$700,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$2,111,200	$0	$0	$2,111,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$2,111,200	$0	$0	$2,111,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,315,400	$0	$0	$1,315,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	5	$1,315,400	$0	$0	$1,315,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$4,110,300	$0	$0	$4,110,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$3,188,200	$0	$0	$3,188,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$547,100	$0	$0	$547,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$0	$0	$375,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$986,500	$0	$0	$986,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$986,500	$0	$0	$986,500
TOTAL				5	$14,039,700	$0	$0	$14,039,700

2025/10/07 05:04 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	02/10/2025	90126059	$1.375.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	603.400	0		0		0	0	0	0	603.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	772.400	0	0	0	0	0	0		772.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	603.400	603.400
Pensión	1	772.400	772.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.375.800	1.375.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA		Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	02/10/2025	90126059	$1.375.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11788838	PALACIOS CHAVERRA EULOGIO	3	0			N																	25-14	4.827.000	772.400	0	0	0	0	EPS037	4.827.000	603.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Medellín, 04 de Julio de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO, en el centro de trabajo 0005451201 - PLANEAMIENTO FISICO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C11788838	PALACIOS CHAVERRA EULOGIO	01/06/2002		I1622521	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11311855672518539471

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/07/2025 10:57:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.1.126.190, 192.230.104.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112789406		GOMEZ GARCIA JEISON STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 N° 13 - 12 Barrio El Milagroso	SAN JOSE DEL PALMAR-CHOCO	3212407750	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1794121623	9491910509	I	2025/10/02	2025/09/22	BANCOLOMBIA	0	$653,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL PALMAR Depto: CHOCO (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
1	CC	1112789406 GOMEZ JEISON	230301	30	$1,842,000	$294,800	EPS037	30	$1,842,000	$230,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,842,000	$128,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112789406		GOMEZ GARCIA JEISON STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 N° 13 - 12 Barrio El Milagroso	SAN JOSE DEL PALMAR-CHOCO	3212407750	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1794121623	9491910509	I	2025/10/02	2025/09/22	BANCOLOMBIA	0	$653,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,800	$0	$0	$294,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$294,800	$0	$0	$294,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,300	$0	$0	$128,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$128,300	$0	$0	$128,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,300	$0	$0	$230,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$230,300	$0	$0	$230,300
TOTAL				**1**	**$653,400**	**$0**	**$0**	**$653,400**

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 - 2024

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 3.200.000.000,00	$ -
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402015-02 ADQUIS. DE BYS PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CH	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 5.500.000.000,00	$ -
							$ -
							$ -
				TOTAL		$ 8.700.000.000,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 8.700.000.000

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 4.350.000.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.350.000.000,00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $3.200,000,000
								RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.350.000.000,00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $5.500,000,000
1	**DICIEMBRE 2024.**	$ 96.222.000,00	$ -	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.301.889.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.301.889.000,00	$ 8.603.778.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
2	**ENERO 2025.**	$ 96.222.000,00	$ -	$ 192.444.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.253.778.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.253.778.000,00	$ 8.507.556.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
3	**FEBRERO 2025**	$ 185.122.000,00		$ 377.566.000,00	$ 92.561.000,00	$ 92.561.000,00	$ 4.161.217.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.161.217.000,00	$ 8.322.434.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
4	**MARZO 2025**	$ 235.568.000,00		$ 613.134.000,00	$ 117.784.000,00	$ 117.784.000,00	$ 4.043.433.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.043.433.000,00	$ 8.086.866.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
5	**ABRIL 2025**	$ 114.126.000,00		$ 727.260.000,00	$ 57.063.000,00	$ 57.063.000,00	$ 3.986.370.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 3.986.370.000,00	$ 7.972.740.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
6	**MAYO 2025**	$ 182.492.000,00		$ 909.752.000,00	$ 91.246.000,00	$ 91.246.000,00	$ 3.895.124.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 3.895.124.000,00	$ 7.790.248.000,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
7	**JUNIO 2025**	$ 156.047.952,00		$ 1.065.799.952,00	$ 78.023.976,00	$ 78.023.976,00	$ 3.817.100.024,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 3.817.100.024,00	$ 7.634.200.048,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
8	**JULIO 2025.**	$ 266.818.400,00		$ 1.332.618.352,00	$ 133.409.200,00	$ 133.409.200,00	$ 3.683.690.824,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 3.683.690.824,00	$ 7.367.381.648,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
9	**AGOSTO 2025**	$ 1.958.563.885,74		$ 3.291.182.237,74	$ 979.281.942,87	$ 979.281.942,87	$ 2.704.408.881,13	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 2.704.408.881,13	$ 5.408.817.762,26		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
10	**SEPTIEMBRE 2025**	$ 873.915.077,01		$ 4.165.097.314,75	$ 436.957.538,51	$ 436.957.538,51	$ 2.267.451.342,62	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 2.267.451.342,62	$ 4.534.902.685,25		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
TOTALES		**$ 4.165.097.314,75**		**$ 4.165.097.314,75**	**$ 2.082.548.657,38**	**$ 2.082.548.657,38**	**$ 2.267.451.342,62**		**$ 2.267.451.342,62**	**$ 4.534.902.685,25**		

Todas las Actas aprobadas por el Interventor del Contrato de Consultoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA N°1 DICIEMBRE 2024	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00
ACTA N°2 ENERO 2025	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00
ACTA N°3 FEBRERO 2025	$ 185.122.000,00		$ 185.122.000,00
ACTA N°4 MARZO 2025	$ 235.568.000,00		$ 235.568.000,00
ACTA N°5 ABRIL 2025	$ 114.126.000,00		$ 114.126.000,00
ACTA N°6 MAYO 2025	$ 182.492.000,00		$ 182.492.000,00
ACTA N°7 JUNIO 2025	$ 156.047.952,00		$ 156.047.952,00
ACTA N°8 JULIO 2025	$ 266.818.400,00		$ 266.818.400,00
ACTA N°9 AGOSTO 2025	$ 1.958.563.885,74		$ 1.958.563.885,74
ACTA N°10 SEPTIEMBRE 2025	$ 873.915.077,01		$ 873.915.077,01
	$ -		
	$ -		
VALOR TOTAL	**$ 4.165.097.314,75**		**$ 4.165.097.314,75**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERIA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: 4227 - 2024 **CONSULTOR:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-25 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4262 - 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	23,7	23	21,5	22	24	24	23,5	23,5	24	24	24	24	23,8	24	24	24	24	23,7	23,7	24	23,5	22	23,7	23,5	22	21,5	23,7	23,5	24	24	727,75
Lluvias moderadas		0,3	1	2,5	2	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0,3	0,3	0	0,5	2	0,3	0,5	2	2,5	0,3	0,5	0	0	16,25
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
No hubo lluvias durante las horas del dia en el Municipio de San José del Palmar, las lluvias sepresentan generalmente en las horas de la madrugada. Estas son moderadas.

Firma Bertonis Renteria V.
Nombre BERTONIS RENTERIA ALENCIA
Residente de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 011037-057907 ANT

Firma
Nombre: JHON STEVENS BEJARANO COPETE
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: MP. 05202-207216 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: 4227 - 2024 **CONSULTOR:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4262 - 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	18	23	24	24	24	24	23,8	24	24	22	14	23	23	24	24	23	24	23,5	22	21,5	23,7	23,5	5	0	672,95
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0,25	0	0	2	10	1	1	0	0	1	0	0,5	2	2,5	0,3	0,5	19	0	47,05
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
No hubo lluvias durante las horas del dia en el Municipio de San José del Palmar, las lluvias sepresentan generalmente en las horas de la madrugada. Estas son moderadas.

Firma Bertonis Renteria V.
Nombre BERTONIS RENTERIA ALENCIA
Residente de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 011037-057907 ANT

Firma
Nombre: JHON STEVENS BEJARANO COPETE
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: MP. 05202-207216 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No. 4227 - 2024 **CONTRATISTA:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 2/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 8.700.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 8.700.000.000,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.700.000.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.700.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8,92%	$ 870.000.000,00	7	11	2024	1	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	44,62%	$ 4.350.000.000,00	7	11	2024	1	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17,85%	$ 1.740.000.000,00	7	11	2024	1	1	2028
Calidad de Estudios y Diseños	26,77%	$ 2.610.000.000,00	31	12	2024	31	12	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002762

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 2/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8,92%	$ 870.000.000,00	23	12	2024	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	44,62%	$ 4.350.000.000,00	23	12	2024	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17,85%	$ 1.740.000.000,00	23	12	2024	1	1	2029
Calidad de Estudios y Diseños	26,77%	$ 2.610.000.000,00	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002762

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/02/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 y 2 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 3002762 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/04/2025

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: EDNY STELLA RENTERIA MENA
Directora de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma
Nombre: JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0234 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Escaneado con CamScanner

PÓLIZA Nº
3002762

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
26	11	2024	EXPEDICIÓN	0			NO

TOMADOR	403745-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	NIT	891.680.089-4
DIRECCIÓN	BR JARDIN CD UNIVERSI.QUIBDO, QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO	6726565
ASEGURADO	1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL 25 G 73 BIS 90, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7056000

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
MONEDA Pesos														
TIPO CAMBIO 1,00	17	17	26	11	2024	7	11	2024	00:00	31	12	2029	00:00	1880

CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1. CONTADO	$9.570.000.000,00

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800.215.807-2

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	870.000.000,00	SI	07/11/2024	01/05/2025	1.251.369,86
2	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4.350.000.000,00	SI	07/11/2024	01/05/2025	6.256.849,32
3	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	1.740.000.000,00	SI	07/11/2024	01/01/2028	16.446.575,34
4	CALIDAD DEL SERVICIO	2.610.000.000,00	SI	31/12/2024	31/12/2029	39.150.000,00

CUP-003-16
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4227 DE 2024 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2.024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCOY VALLE DEL CAUCA.

"QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONSULTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA CONSULTORÍA".

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$***63.104.794,52
GASTOS	$********9.999,99
IVA	$***11.991.810,96
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$***75.106.605,47

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://facturaseguros.transfiriendo.com/FacturaPrevisora/portaledquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

28/11/2024 16:58:55

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
1	1	COMPAVÍA DE SEGUROS		

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3002762 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: EXPEDICIÓN	0

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

Escaneado con CamScanner

IDENTIFICACION DEL PAGO

POLIZA No. 3002762 **CERTIFICADO No.** 0

PREVISORA SEGUROS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554

Ramo	Sucursal
CUMPLIMIENTO	QUIBDO

Valor Prima	Valor IVA	Tomador
$63.104.794,52	$11.991.810,96	403745-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA	F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA
26/11/2024	$*******9.999,99	$***63.104.794,52	$***11.991.810,96				

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el Árticulo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

SISE-CAR-010-1

CONVENIO DE PAGO:
1. CONTADO

PREVISORA SEGUROS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1066 del Código de Comercio, las partes de común acuerdo establecen que las primas, impuestos a las ventas y gastos que se causen por concepto de expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total $75106605,00

Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva.	Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva.
1	26/11/2024	$*******9.999,99	$***63.104.794,52	$***11.991.810,96					

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que éste se presente, y dará derecho a la Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas :

POLIZA	RAMO	CERTIFICADO	VALOR ASEGURADO
3002762	CUMPLIMIENTO	0	$9.570.000.000,00

En constancia se firma el presente documento en la ciudad de QUIBDO a los 26 días del mes de noviembre de 2024

AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑÍA , para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativas al manejo financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguros al que accede la presente cláusula.

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automatica del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

SISE-CAR-009-2

Escaneado con CamScanner

PÓLIZA Nº
3002762

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
26	12	2024	MODIFICACIÓN	4			NO

TOMADOR	403745-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	NIT	891.680.089-4
DIRECCIÓN	BR JARDIN CD UNIVERSI.QUIBDO, QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO	6726565
ASEGURADO	1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL 25 G 73 BIS 90, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7056000

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
QUIBDO	17	17	26	12	2024	23	12	2024	00:00	31	12	2030	00:00	2199

MONEDA	TIPO CAMBIO	CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
Pesos	1,00	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1. CONTADO	$9.570.000.000,00

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800.215.807-2

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	870.000.000,00	SI	23/12/2024	01/07/2026	3.923.342,00
2	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4.350.000.000,00	SI	23/12/2024	01/07/2026	19.616.712,00
3	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	1.740.000.000,00	SI	23/12/2024	01/01/2029	6.960.000,00
4	CALIDAD DEL SERVICIO	2.610.000.000,00	SI	31/12/2025	31/12/2030	0,00

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4227 DE 2024 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2.024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCOY VALLE DEL CAUCA.

"QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONSULTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA CONSULTORÍA".

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$***30.500.054,00
GASTOS	$**********0,00
IVA	$****5.795.010,26
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$***36.295.064,26

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://lfacturaseguros.transfiriendo.com/lFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el Estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

26/12/2024 14:40:12

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
1	1	COMPAVÍA DE SEGUROS		

Powered by CamScanner

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3002762 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN	4

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA DE LA REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, PREVISORA SEGUROS, DE ACUERDO A LA PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DE 2024, AL CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO 4227 DE 2024, REALIZA EL AJUSTE Y/O DESPLAZAMIENTO DE LA VIGENCIA DE CADA UNO DE LOS AMPAROS.

.

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA: DESDE EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2.024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.030.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.

Powered by CamScanner

PÓLIZA N°
3002762

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	N° CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER N°	CERTIFICADO LÍDER N°	A.P.
6	6	2025	MODIFICACIÓN	5			NO

TOMADOR	403745-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	NIT	891.680.089-4
DIRECCIÓN	BR JARDIN CD UNIVERSI.QUIBDO, QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO	6726565
ASEGURADO	1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL 25 G 73 BIS 90, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7056000

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
QUIBDO	17	17	6	6	2025	5	6	2025	00:00	31	12	2030	00:00	2035

MONEDA	TIPO CAMBIO
Pesos	1,00

CARGAR A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

FORMA DE PAGO: 1. CONTADO

VALOR ASEGURADO TOTAL: $9.570.000.000,00

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800.215.807-2

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	870.000.000,00	SI	23/12/2024	01/07/2026	0,00
2	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4.350.000.000,00	SI	23/12/2024	01/07/2026	0,00
3	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	1.740.000.000,00	SI	23/12/2024	01/01/2029	0,00
4	CALIDAD DEL SERVICIO	2.610.000.000,00	SI	31/12/2025	31/12/2030	0,00

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4227 DE 2024 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2.024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCOY VALLE DEL CAUCA.

"QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONSULTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA CONSULTORÍA".

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$**********0,00
GASTOS	$**********0,00
IVA	$**********0,00
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$**********0,00

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

06/06/2025 15:34:04

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
1	1	COMPAYÍA DE SEGUROS		

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3002762 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN	5

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA DE REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, PREVISORA SEGUROS, EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION, PARA HACER CONSTAR QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2025 Y ACLARACIÓN NÚMERO UNO (01) Y MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2025.

.

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA: DESDE EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2.024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.030.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO			MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN			1
		PÁGINA			

FECHA: 03/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4227 de 2024 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

JUSTIFICACIÓN:
Del Registro Presupuestal No. 1124124 de fecha 2024-11-14 Valor $8.700.000.000,00 para un valor total de anticipo de $ 4.350.000.000 equivalente al 50% como se estipula en la cláusula septima "Forma de pago" del contrato interadminsitrativo No 4227 de 2024.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1- ABRIL	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago de salarios personal consultoria	300,000,000.00	176,130,000.00	181,130,000.00	130,130,000.00			$ 787,390,000.00	18.10%
2	Viaticos personal de consultoria	44,250,000.00	75,700,000.00	37,850,000.00	37,850,000.00			$ 195,650,000.00	4.50%
3	Adquisición de información secundaria	15,000,000.00	15,000,000.00					$ 30,000,000.00	0.69%
4	Levantamiento topografico	30,000,000.00	30,000,000.00	50,200,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		$ 210,200,000.00	4.83%
5	Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de sostenibilidad (s/comprobante) (adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, costos de gestiones arqueológicas, monitoreo, muestreos ambientales etc.)		220,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00	180,000,000.00		$ 900,000,000.00	20.69%
6	Toma de muestras para laboratorio(en suelo, en roca, Apiques) y ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural de puentes, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, batimetrías, entre otros)		1,136,590,400.00	440,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	67,569,600.00	$ 1,994,160,000.00	45.84%
7	Toma de información de transito	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00				$ 45,000,000.00	1.03%
8	Dotacion de oficina (compra de computadores y softwares)	120,000,000.00	50,000,000.00					$ 170,000,000.00	3.91%
9	Campamento	4,400,000.00	8,800,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00			$ 17,600,000.00	0.40%
	TOTAL	**$ 528,650,000.00**	**$ 1,727,220,400.00**	**$ 926,380,000.00**	**$ 720,180,000.00**	**$ 380,000,000.00**	**$ 67,569,600.00**	**$ 4,350,000,000.00**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: Edly Stella Renteria Mena
Directora de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: Jose Octavio Niño Brijaldo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE CONSULTORÍA

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4227 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1 mes (In meses según contrato principa)

PLAZO ACUMULADO: 13 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CON 2/12/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 8.700.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C $ 8.700.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	DICIEMBRE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		MAYO	JUNIO	JULIO		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
	VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos																		
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 254.568.000,00	2,93%	10,94%	% P	1,11%		1,11%	1,11%	1,11%	1,11%		1,35%	1,35%	1,35%		1,35%	1,35%	1,35%	1,46%	1,34%	
	$ 1.430.754.000,00	16,45%	$ 951.630.000,00	$ P	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00		$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00		$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 127.284.000,00	$ 116.590.000,00	
				$ E	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00		$ 127.284.000,00	$ 127.284.000,00	$ 127.284.000,00		$ 127.284.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	1,11%		1,11%	1,11%	1,11%	1,11%		1,46%	1,46%	1,24%		1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES																					
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	$ 69.000.000,00	0,79%	0,04%	% P				0,04%									0,48%	0,28%			
	$ 69.000.000,00	0,79%	$ 3.450.000,00	$ P	$ -			$ 3.450.000,00									$ 41.400.000,00	$ 24.150.000,00			
				$ E	$ -			$ 3.450.000,00									$ -	$ -			
				% E				0,04%									0,00%	0,00%			
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO	$ 60.000.000,00	0,69%	0,03%	% P				0,03%					0,41%				0,24%				
	$ 60.000.000,00	0,69%	$ 3.000.000,00	$ P	$ -			$ 3.000.000,00					$ 36.000.000,00				$ 21.000.000,00				
				$ E	$ -			$ 3.000.000,00					$ 36.000.000,00				$ -				
				% E				0,03%					0,41%				0,00%				
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 165.000.000,00	1,90%	1,23%	% P				0,09%	1,14%									0,66%			
	$ 165.000.000,00	1,90%	$ 107.250.000,00	$ P	$ -			$ 8.250.000,00	$ 99.000.000,00									$ 57.750.000,00			
				$ E	$ -			$ 8.250.000,00	$ 99.000.000,00									$ -			
				% E				0,09%	1,14%									0,00%			
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 42.000.000,00	0,48%	0,02%	% P				0,02%						0,29%				0,17%			
	$ 42.000.000,00	0,48%	$ 2.100.000,00	$ P	$ -			$ 2.100.000,00						$ 25.200.000,00				$ 14.700.000,00			
				$ E	$ -			$ 2.100.000,00						$ 25.200.000,00				$ -			
				% E				0,02%						0,29%				0,00%			
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	$ 106.000.000,00	1,22%	0,06%	% P					0,06%					0,73%			0,43%				
	$ 106.000.000,00	1,22%	$ 5.300.000,00	$ P	$ -				$ 5.300.000,00					$ 63.600.000,00			$ 37.100.000,00				
				$ E	$ -				$ 5.300.000,00					$ 63.600.000,00			$ -				
				% E					0,06%					0,73%			0,00%				
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	$ 125.000.000,00	1,44%	0,07%	% P					0,07%							0,86%		0,50%			
	$ 125.000.000,00	1,44%	$ 6.250.000,00	$ P	$ -				$ 6.250.000,00							$ 75.000.000,00		$ 43.750.000,00			
				$ E	$ -				$ 6.250.000,00							$ 75.000.000,00		$ -			
				% E					0,07%							0,86%		0,00%			
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	$ 368.000.000,00	4,23%	0,21%	% P				0,21%								2,54%		1,46%			
	$ 368.000.000,00	4,23%	$ 18.400.000,00	$ P	$ -			$ 18.400.000,00								$ 220.800.000,00		$ 128.800.000,00			
				$ E	$ -			$ 18.400.000,00								$ 220.800.000,00		$ -			
				% E				0,21%								2,54%		0,00%			
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	$ 235.000.000,00	2,70%	0,14%	% P				0,14%									1,62%	0,93%			
	$ 235.000.000,00	2,70%	$ 11.750.000,00	$ P	$ -			$ 11.750.000,00									$ 141.000.000,00	$ 82.250.000,00			
				$ E	$ -			$ 11.750.000,00									$ -	$ -			
				% E				0,14%									0,00%	0,00%			
ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	$ 190.000.000,00	2,18%	0,11%	% P				0,11%								1,31%		0,76%			
	$ 190.000.000,00	2,18%	$ 9.500.000,00	$ P	$ -			$ 9.500.000,00								$ 114.000.000,00		$ 66.500.000,00			
				$ E	$ -			$ 9.500.000,00								$ 114.000.000,00		$ -			
				% E				0,11%								1,31%		0,00%			
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 73.000.000,00	0,84%	0,04%	% P					0,04%								0,50%	0,29%			
	$ 73.000.000,00	0,84%	$ 3.650.000,00	$ P	$ -				$ 3.650.000,00								$ 43.800.000,00	$ 25.550.000,00			
				$ E	$ -				$ 3.650.000,00								$ -	$ -			
				% E					0,04%								0,00%	0,00%			
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 481.000.000,00	5,53%	0,28%	% P				0,28%								3,32%		1,94%			
	$ 481.000.000,00	5,53%	$ 24.050.000,00	$ P	$ -			$ 24.050.000,00								$ 288.600.000,00		$ 168.350.000,00			
				$ E	$ -			$ 24.050.000,00								$ 288.600.000,00		$ -			
				% E				0,28%								3,32%		0,00%			
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 57.000.000,00	0,66%	0,03%	% P					0,03%							0,39%		0,23%			
	$ 57.000.000,00	0,66%	$ 2.850.000,00	$ P	$ -				$ 2.850.000,00							$ 34.200.000,00		$ 19.950.000,00			
				$ E	$ -				$ 2.850.000,00							$ 34.200.000,00		$ -			
				% E					0,03%							0,39%		0,00%			
ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	$ 47.000.000,00	0,54%	0,03%	% P					0,03%								0,32%	0,19%			
	$ 47.000.000,00	0,54%	$ 2.350.000,00	$ P	$ -				$ 2.350.000,00								$ 28.200.000,00	$ 16.450.000,00			
				$ E	$ -				$ 2.350.000,00								$ -	$ -			
				% E					0,03%								0,00%	0,00%			
ESTUDIO DE RIESGOS	$ 93.000.000,00	1,07%	0,05%	% P					0,05%							0,64%		0,37%			
	$ 93.000.000,00	1,07%	$ 4.650.000,00	$ P	$ -				$ 4.650.000,00							$ 55.800.000,00		$ 32.550.000,00			
				$ E	$ -				$ 4.650.000,00							$ 55.800.000,00		$ -			
				% E					0,05%							0,64%		0,00%			
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 56.000.000,00	0,64%	0,03%	% P				0,03%								0,39%		0,23%			
	$ 56.000.000,00	0,64%	$ 2.800.000,00	$ P	$ -			$ 2.800.000,00								$ 33.600.000,00		$ 19.600.000,00			
				$ E	$ -			$ 2.800.000,00								$ 33.600.000,00		$ -			
				% E				0,03%								0,39%		0,00%			
EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	$ 54.000.000,00	0,62%	0,03%	% P					0,03%								0,37%	0,22%			
	$ 54.000.000,00	0,62%	$ 2.700.000,00	$ P	$ -				$ 2.700.000,00								$ 32.400.000,00	$ 18.900.000,00			
				$ E	$ -				$ 2.700.000,00								$ -	$ -			
				% E					0,03%								0,00%	0,00%			
AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 423.000.000,00	4,86%	0,24%	% P				0,00%	0,24%							2,92%		1,70%			
	$ 423.000.000,00	4,86%	$ 21.150.000,00	$ P	$ -				$ 21.150.000,00							$ 253.800.000,00		$ 148.050.000,00			
				$ E	$ -				$ 21.150.000,00							$ 253.800.000,00		$ -		$ -	
				% E				0,00%	0,24%							2,92%		0,00%			
VOLUMEN TECNICO BIM	$ 46.000.000,00	0,53%	0,00%	% P				0,03%								0,32%		0,19%			
	$ 46.000.000,00	0,53%	$ -	$ P	$ -		$ -	$ 2.300.000,00								$ 27.600.000,00		$ 16.100.000,00			
				$ E	$ -		$ -	$ 2.300.000,00								$ 27.600.000,00		$ -			
				% E				0,03%								0,32%		0,00%			
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 5.755.432.000,00	66,15%	0,00%	% P	0,01%		0,01%	0,01%	0,01%	0,09%		0,65%	0,32%	0,39%		8,50%	5,01%	33,81%	2,83%	1,33%	
	$ 4.579.246.000,00	52,64%	$ -	$ P	$ 1.100.000,00		$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 8.250.000,00		$ 66.408.000,00	$ 27.863.952,00	$ 34.042.400,00		$ 743.912.785,54	$ 436.245.600,00	$ 2.924.172.314,46	$ 228.417.448,00	$ 115.833.500,00	
				$ E	$ 1.100.000,00		$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 8.250.000,00		$ 66.408.000,00	$ 27.863.952,00	$ 34.042.400,00		$ 747.196.949,10	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0,01%		0,01%	0,01%	0,01%	0,09%		0,65%	0,32%	0,39%		8,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
VALOR BÁSICO DE consultoría (A)	$ 8.700.000.000,00	100,00%	13,60%																		
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO (A')	$ 8.700.000.000,00	100,00%	$ 1.182.830.000,00																		

INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA MES	%	1,12%		1,12%	2,10%	2,82%	1,20%		2,00%	3,10%	1,74%		22,59%	10,33%	45,12%	4,09%	2,67%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 97.322.000,00		$ 97.322.000,00	$ 182.922.000,00	$ 245.222.000,00	$ 104.472.000,00		$ 174.938.000,00	$ 269.993.952,00	$ 151.672.400,00		$ 1.964.942.785,54	$ 898.775.600,00	$ 3.926.202.314,46	$ 355.701.448,00	$ 232.413.500,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,12%		2,24%	4,34%	7,16%	8,36%		10,36%	13,46%	15,21%		37,79%	48,12%	93,24%	97,33%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 97.322.000,00		$ 194.644.000,00	$ 377.566.000,00	$ 622.788.000,00	$ 727.260.000,00		$ 901.298.000,00	$ 1.171.291.952,00	$ 1.322.964.352,00		$ 3.287.907.137,54	$ 4.186.682.737,54	$ 8.111.885.052,00	$ 8.467.586.500,00	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA MES	%	1,11%		1,11%	2,13%	2,71%	1,31%		2,10%	3,23%	0,00%		22,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00	$ 183.122.000,00	$ 233.568.000,00	$ 114.128.000,00		$ 182.492.000,00	$ 280.847.952,00	$ 142.618.400,00		$ 1.938.534.949,10	$ -	$ -	$ -	$ -	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	%	1,11%		2,21%	4,34%	7,05%	8,36%		10,46%	13,69%	15,32%		37,83%	37,83%	37,83%	37,83%	37,83%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96.222.000,00		$ 192.444.000,00	$ 377.566.000,00	$ 611.134.000,00	$ 727.260.000,00		$ 909.752.000,00	$ 1.190.599.952,00	$ 1.332.618.352,00		$ 3.291.183.301,10	$ 3.291.183.301,10	$ 3.291.183.301,10	$ 3.291.183.301,10	$ 3.291.183.301,10	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
-	$ -	$ -	%
-	$ -		
-	$ -	$ -	%
-	$ -		
-	$ -	$ -	%
-	$ -		
-	$ -	$ -	%
-	$ -		
-	$ -	$ -	%
-	$ -		
-	$ -	$ -	%
-	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de consultoría aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de consultoría oroarmada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la consultoría (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la consultoría programada se calcula con respecto al Valor Básico de consultoría (A) o el Valor Básico de consultoría Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de consultoría que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de consultoría.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: EMILY STELLA RENTERIA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 0820251733 ATL

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0254 CPITVC

Revisó Firma:
Nombre: JANNER SALAS QUEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Revisó Firma:
Nombre: YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ
Apoyo a la Supervisión
Matrícula Profesional No.: 1106-0841 CPITV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1 de 1

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 10 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4227 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1 mes (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 13 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/12/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 8.700.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8.700.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	(%) consultoría PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	DICIEMBRE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		MAYO	JUNIO	JULIO		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 254.568.000,00	2,93%	12,25%	% P	1,11%		1,11%	1,11%	1,11%	1,11%		1,35%	1,35%	1,35%		1,35%	1,35%	1,35%	1,46%	1,34%	
	$ 1.430.754.000,00	16,45%	$ 1.085.784.560,00	$ E	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00		$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00		$ 117.630.000,00	$ 117.630.000,00	$ 127.284.000,00	$ 116.580.000,00	$ 116.580.000,00	
				% E	1,11%		1,11%	1,11%	1,00%	1,22%		1,46%	1,46%	1,24%		1,24%	1,31%	0,00%	0,00%	0,00%	
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES																					
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	$ 69.000.000,00	0,79%	0,04%	% P				0,04%									0,48%	0,28%			
	$ 69.000.000,00	0,79%	$ 3.450.000,00	$ E	$ -			$ 3.450.000,00									$ 41.400.000,00	$ 24.150.000,00			
				% E				0,04%									0,00%	0,00%			
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO	$ 60.000.000,00	0,69%	0,03%	% P				0,03%					0,41%				0,24%				
	$ 60.000.000,00	0,69%	$ 3.000.000,00	$ E	$ -			$ 3.000.000,00					$ 36.000.000,00				$ 21.000.000,00				
				% E				0,03%					0,41%				0,24%				
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 165.000.000,00	1,90%	1,23%	% P				0,09%	1,14%									0,68%			
	$ 165.000.000,00	1,90%	$ 107.250.000,00	$ E	$ -			$ 8.250.000,00	$ 99.000.000,00									$ 97.750.000,00			
				% E				0,09%	1,14%									0,00%			
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 42.000.000,00	0,48%	0,02%	% P				0,02%					0,29%					0,17%			
	$ 42.000.000,00	0,48%	$ 2.100.000,00	$ E	$ -			$ 2.100.000,00					$ 25.200.000,00					$ 14.700.000,00			
				% E				0,02%					0,29%				0,17%	0,09%			
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	$ 106.000.000,00	1,22%	0,06%	% P					0,06%				0,73%				0,43%				
	$ 106.000.000,00	1,22%	$ 5.300.000,00	$ E	$ -				$ 5.300.000,00				$ 63.600.000,00				$ 37.100.000,00				
				% E					0,06%				0,73%				0,00%				
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	$ 125.000.000,00	1,44%	0,07%	% P					0,07%									0,00%			
	$ 125.000.000,00	1,44%	$ 6.250.000,00	$ E	$ -				$ 6.250.000,00									$ 43.750.000,00			
				% E					0,07%									0,00%			
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	$ 368.000.000,00	4,23%	0,21%	% P				0,21%									0,86%	0,00%			
	$ 368.000.000,00	4,23%	$ 18.400.000,00	$ E	$ -			$ 18.400.000,00									$ 75.600.000,00	$ 52.000.000,00			
				% E				0,21%									0,86%	0,00%			
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	$ 235.000.000,00	2,70%	0,14%	% P				0,14%									2,94%	1,48%			
	$ 235.000.000,00	2,70%	$ 11.750.000,00	$ E	$ -			$ 11.750.000,00									$ 223.800.000,00	$ 128.800.000,00			
				% E				0,14%									2,54%	0,00%			
ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	$ 190.000.000,00	2,18%	0,11%	% P				0,11%										1,62%	0,99%		
	$ 190.000.000,00	2,18%	$ 9.500.000,00	$ E	$ -			$ 9.500.000,00										$ 141.000.000,00	$ 82.250.000,00		
				% E				0,11%										1,62%	0,00%		
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 73.000.000,00	0,84%	0,04%	% P					0,04%								1,31%		0,76%		
	$ 73.000.000,00	0,84%	$ 3.650.000,00	$ E	$ -				$ 3.650.000,00								$ 114.000.000,00		$ 66.500.000,00		
				% E					0,04%								1,31%		0,00%		
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 481.000.000,00	5,53%	0,28%	% P				0,28%										0,50%	0,29%		
	$ 481.000.000,00	5,53%	$ 24.050.000,00	$ E	$ -			$ 24.050.000,00									$ -	$ 43.800.000,00	$ 25.550.000,00		
				% E				0,28%										0,50%	0,00%		
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 57.000.000,00	0,66%	0,03%	% P					0,03%								3,32%		1,94%		
	$ 57.000.000,00	0,66%	$ 2.850.000,00	$ E	$ -				$ 2.850.000,00								$ 288.600.000,00		$ 168.350.000,00		
				% E					0,03%								3,32%		0,00%		
ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	$ 47.000.000,00	0,54%	0,03%	% P					0,03%								0,39%		0,23%		
	$ 47.000.000,00	0,54%	$ 2.350.000,00	$ E	$ -				$ 2.350.000,00								$ 34.200.000,00		$ 19.950.000,00		
				% E					0,03%								0,39%		0,00%		
ESTUDIO DE RIESGOS	$ 93.000.000,00	1,07%	0,06%	% P					0,06%									0,32%	0,19%		
	$ 93.000.000,00	1,07%	$ 4.650.000,00	$ E	$ -				$ 4.650.000,00									$ 28.200.000,00	$ 16.450.000,00		
				% E					0,06%									0,00%	0,00%		
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 56.000.000,00	0,64%	0,03%	% P				0,03%									0,64%		0,37%		
	$ 56.000.000,00	0,64%	$ 2.800.000,00	$ E	$ -			$ 2.800.000,00									$ 56.000.000,00		$ 32.550.000,00		
				% E				0,03%									0,64%		0,00%		
EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	$ 54.000.000,00	0,62%	0,03%	% P					0,03%								0,08%		0,23%		
	$ 54.000.000,00	0,62%	$ 2.700.000,00	$ E	$ -				$ 2.700.000,00								$ 33.600.000,00		$ 19.600.000,00		
				% E					0,03%								0,09%		0,00%		
AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 423.000.000,00	4,86%	0,24%	% P					0,24%									0,37%	0,22%		
	$ 423.000.000,00	4,86%	$ 21.150.000,00	$ E	$ -				$ 21.150.000,00									$ 32.400.000,00	$ 18.900.000,00		
				% E					0,24%									0,37%	0,00%		
VOLUMEN TECNICO BIM	$ 46.000.000,00	0,53%	0,00%	% P				0,00%									2,92%		1,70%		
	$ 46.000.000,00	0,53%	$ -	$ E	$ -		$ -	$ 2.300.000,00									$ 253.800.000,00		$ 148.050.000,00		
				% E				0,00%									2,92%		0,00%		
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 5.755.432.000,00	66,15%	0,00%	% P	0,01%		0,01%	0,01%	0,09%			0,65%	0,32%	0,39%		0,32%	0,32%	0,19%			
	$ 4.579.246.000,00	52,64%	$ -	$ E	$ 1.100.000,00		$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	$ 8.250.000,00			$ 56.408.000,00	$ 27.563.952,00	$ 34.042.400,00		$ 27.600.000,00	$ 27.600.000,00	$ 16.100.000,00			
				% E	0,01%		0,01%	0,01%	0,09%			0,65%	0,32%	0,39%		0,32%	0,32%	0,19%			
VALOR BÁSICO DE consultoría (A)	**$ 8.700.000.000,00**	**100,00%**	**14,91%**																		
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO (A')	**$ 8.700.000.000,00**	**100,00%**	**$ 1.296.984.560,00**																		

INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA MES	%	1,12%		1,12%	2,10%	2,82%	1,29%		2,00%	3,10%	1,74%		22,89%	10,33%	45,12%	4,09%	2,67%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 97.322.000,00		$ 97.322.000,00	$ 182.922.000,00	$ 245.222.000,00	$ 104.472.000,00		$ 174.038.000,00	$ 269.993.952,00	$ 151.672.400,00		$ 1.994.942.765,54	$ 898.775.600,00	$ 3.925.202.314,46	$ 355.701.448,00	$ 232.413.500,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,12%		2,24%	4,34%	7,16%	8,36%		10,36%	13,46%	15,21%		37,79%	48,12%	93,24%	97,33%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 97.322.000,00		$ 194.644.000,00	$ 377.566.000,00	$ 622.788.000,00	$ 727.260.000,00		$ 901.298.000,00	$ 1.171.291.952,00	$ 1.322.964.352,00		$ 3.287.907.137,54	$ 4.186.682.737,54	$ 8.111.885.052,00	$ 8.467.586.500,00	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA MES	%	1,11%		1,11%	2,13%	2,71%	1,31%		2,10%	3,23%	1,63%		22,91%	10,09%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00	$ 185.122.000,00	$ 235.568.000,00	$ 114.126.000,00		$ 182.492.000,00	$ 280.847.952,00	$ 142.618.400,00		$ 1.993.583.885,74	$ 878.915.077,01	$ -	$ -	$ -	
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	%	1,11%		2,21%	4,34%	7,05%	8,36%		10,45%	13,68%	15,32%		37,83%	47,87%	47,87%	47,87%	47,87%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96.222.000,00		$ 192.444.000,00	$ 377.566.000,00	$ 613.134.000,00	$ 727.260.000,00		$ 909.752.000,00	$ 1.190.599.952,00	$ 1.332.618.352,00		$ 3.291.182.237,74	$ 4.165.097.314,75	$ 4.165.097.314,75	$ 4.165.097.314,75	$ 4.165.097.314,75	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ -	$ -	%
-	$ -		
-	$ -	$ -	%
-	$ -		
-	$ -	$ -	%
-	$ -		
	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -		
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de consultoría aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de consultoría programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la consultoría (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la consultoría programada se calcula con respecto al Valor Básico de consultoría (A) o el Valor Básico de consultoría Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de consultoría que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de consultoría.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: EDILY ETELA RENTERIA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 0820251733 ATL

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE RICARDO ACOSTA SCHACA
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC

Revisó Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Revisó Firma:
Nombre: YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ
Apoyo a la Supervisión
Matrícula Profesional No.: 1105-0841 CPITV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE REUNIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 17/09/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoria)

ACTA DE REUNIÓN No. 31
(La numeración será consecutiva)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Reunión con equipo del componente biótico para revisión de requerimientos para levantar información en campo y los aspectos logísticos

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1.Logística para ingreso a campo 2.Insumos (materiales) 3.Requerimientos para levantar información en campo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión convocada por la consultoría dio inicio a las 4:30 p.m., con la participación de los profesionales del equipo: la ingeniera en SIG, Erika Palacios Bermúdez; la coordinadora, Edly Stella Rentería Mena; el coordinador técnico, Eulogio Palacios Chaverra; la ingeniera de estudios, Jhoana Marcela Mosquera Palacios; la coordinadora ambiental y social, Luz Yaneth Ocoró; la ingeniera auxiliar, Lleceli Mosquera Tello, y el grupo de biólogos del Volumen XVII.

Punto 1. Logística para ingreso a campo:

Se revisaron las condiciones necesarias para garantizar la movilidad, transporte y acceso del equipo profesional a las zonas de estudio.

Punto 2. Insumos (materiales):

Se identificaron los materiales y equipos requeridos para el desarrollo de las actividades en campo, con el fin de prever su adquisición y disponibilidad.

Adicionalmente, se revisaron los insumos proporcionados por el grupo de biólogos entre los cuales se encuentran por especies Plantas vasculares, Plantas no vasculares, Aves, Mamiferos, Herpetofauna, Ictiofauna, Hidrobiota, Insectos, los cuales serán utilizados para las actividades previstas en campo.

Punto 3. Requerimientos para levantar información en campo:

Se establecieron las herramientas técnicas, personal de apoyo y lineamientos metodológicos que permitirán un levantamiento de información eficiente y acorde a los objetivos del proyecto.

Así mismo, se revisaron los requerimientos consignados en el documento PAGA, el cual servirá como base para orientar la recopilación y validación de información en campo.

Durante este punto, la ingeniera en SIG, Erika Palacios Bermúdez, dio las instrucciones sobre el uso de la aplicación Avenza Maps, explicando la forma correcta de manejarla en campo para la ubicación, georreferenciación y marcación de puntos de interés, garantizando la precisión y organización de la información recolectada.

De igual forma, se habló del suministro de información cartográfica necesaria para complementar las actividades de levantamiento y apoyar el trabajo en campo de los diferentes equipos profesionales.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba	INVIAS	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
		VERSIÓN	1
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA		PÁGINA	
		FECHA	17/09/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS | **FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)** | **RESPONSABLES**


.....

.....

.....

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

ADJUNTO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES

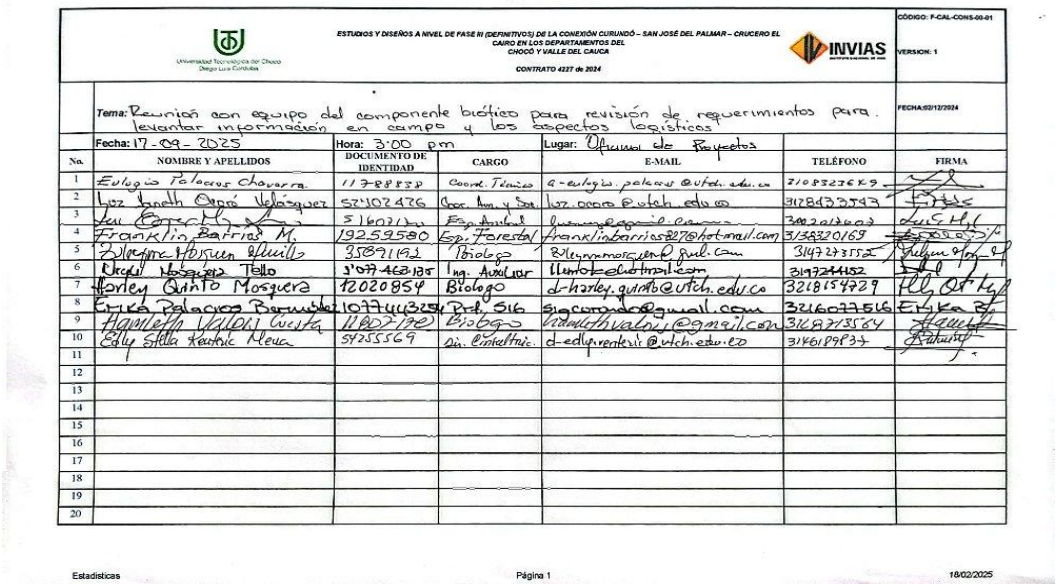

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO 4227 de 2024

INVIAS

CÓDIGO: F-CAL-CONS-00-01 | VERSION: 1 | FECHA:02/12/2024

Tema: Reunión con equipo del componente biótico para revisión de requerimientos para levantar información en campo y los aspectos logísticos

Fecha: 17-09-2025 | Hora: 3:00 pm | Lugar: Oficinas de Proyectos

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Eulogio Palacios Chavarra.	11788838	Coord. Técnico	e-eulogio.palacios@utch.edu.co	2108327649	
2	Luz Dareth Oppo Velasquez	57407476	Coor. Amb y Soc.	luz.oppo@utch.edu.co	3128433343	
3	Luis Cotes M.	5160711	Esp. Ambiental	luismcotes@gmail.com	3002012603	
4	Franklin Barrios M.	192559580	Esp. Foresta/	franklinbarrios8278@hotmail.com	3138320169	
5	Dayana Mosquera Murillo	35891193	Biologa	Dayanamosquera@gmail.com	3147273552	
6	Ricardo Vasquez Tello	3'077.463.135	Ing. Auxiliar	Ricardotello@hotmail.com	3197244152	
7	Harley Quinto Mosquera	12020854	Biologo	d-harley.quinto@utch.edu.co	3218154729	
8	Erika Palacios Bermudez	1077443254	Prof. 516	Sigcomando@gmail.com	3216077516	
9	Hamleth Valoy Cuesta	1192192190	Biologo	Hamleth.valoy@gmail.com	3148735564	
10	Edly Stella Rentería Mena	54255569	Dir. Etnoetnic.	d-edlyrenteria@utch.edu.co	3146189837	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Estadisticas | Página 1 | 18/02/2025

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial
