
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	
OBJETO DEL INFORME	Informe de supervisión Convenio STI -344-2023
NOMBRE DEL PROYECTO	Convenio Interadministrativo STI -344-2023
FECHA DEL INFORME	01 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024
PERSONAL QUE ADELANTA EL INFORME - SUPERVISOR	**Mayor. DIEGO FRANCISCO CEPEDA SÁNCHEZ** Supervisor Convenio Interadministrativo **STI -344-2023**
II. DATOS GENERALES DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
CONVENIO O CONTRATO N°	Convenio Interadministrativo STI -344-2023
INTERVINIENTES	Alcaldía Municipal de Sevilla – Valle del Cauca Brigada de Ingenieros de Construcciones Batallón de Ingenieros de Construcción No.52 “General. Francisco Tamayo Cortes”
OBJETO DEL CONVENIO	“Anuar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre el municipio de Sevilla – Valle del Cauca y el ministerio de defensa – Ejército nacional – comando de ingenieros – Brigada de ingenieros de Construcciones – Batallón de ingenieros de construcciones No.52 (BICON52) a través de la CENAC - ING, con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial del Municipio de Sevilla – Valle del Cauca”
CANTIDAD A EJECUTAR	Construcción de 16 Alcantarillas Construcción de 01 Box Culvert (Sector la Virgen) Construcción de 01 Alcantarilla Doble cabezal (Sector Totoro) Construcción de 02 Muros de Contención (Sector el Jardin) Material sobrante en cunetas y obras complementarias
UNIDAD EJECUTORA	Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52 “Gral. Francisco Tamayo Cortes” (BICON52)
POBLACIÓN BENEFICIADA	Se beneficiará una población de 45.142 habitantes correspondiente a la zona urbana y rural del municipio.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de junio del 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.710.935.833 millones de pesos

BICON52

FECHA DE ACTA DE INICIO	12 de octubre del 2023
FECHA DE ENTREGA	20 de octubre del 2024
MODIFICATORIOS	Modificatorio No. 1. Cláusula Décima Tercera – Garantías del convenio STI-344-2023 Modificatorio No. 2. Cláusula Segunda – Alcance del convenio. Cláusula Décima – Formas de desembolsos correspondiente al valor del demerito y desgaste y gastos de administración por parte de la alcaldía de Sevilla. **Clausula Decima Segunda – Plazo de ejecución**

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO

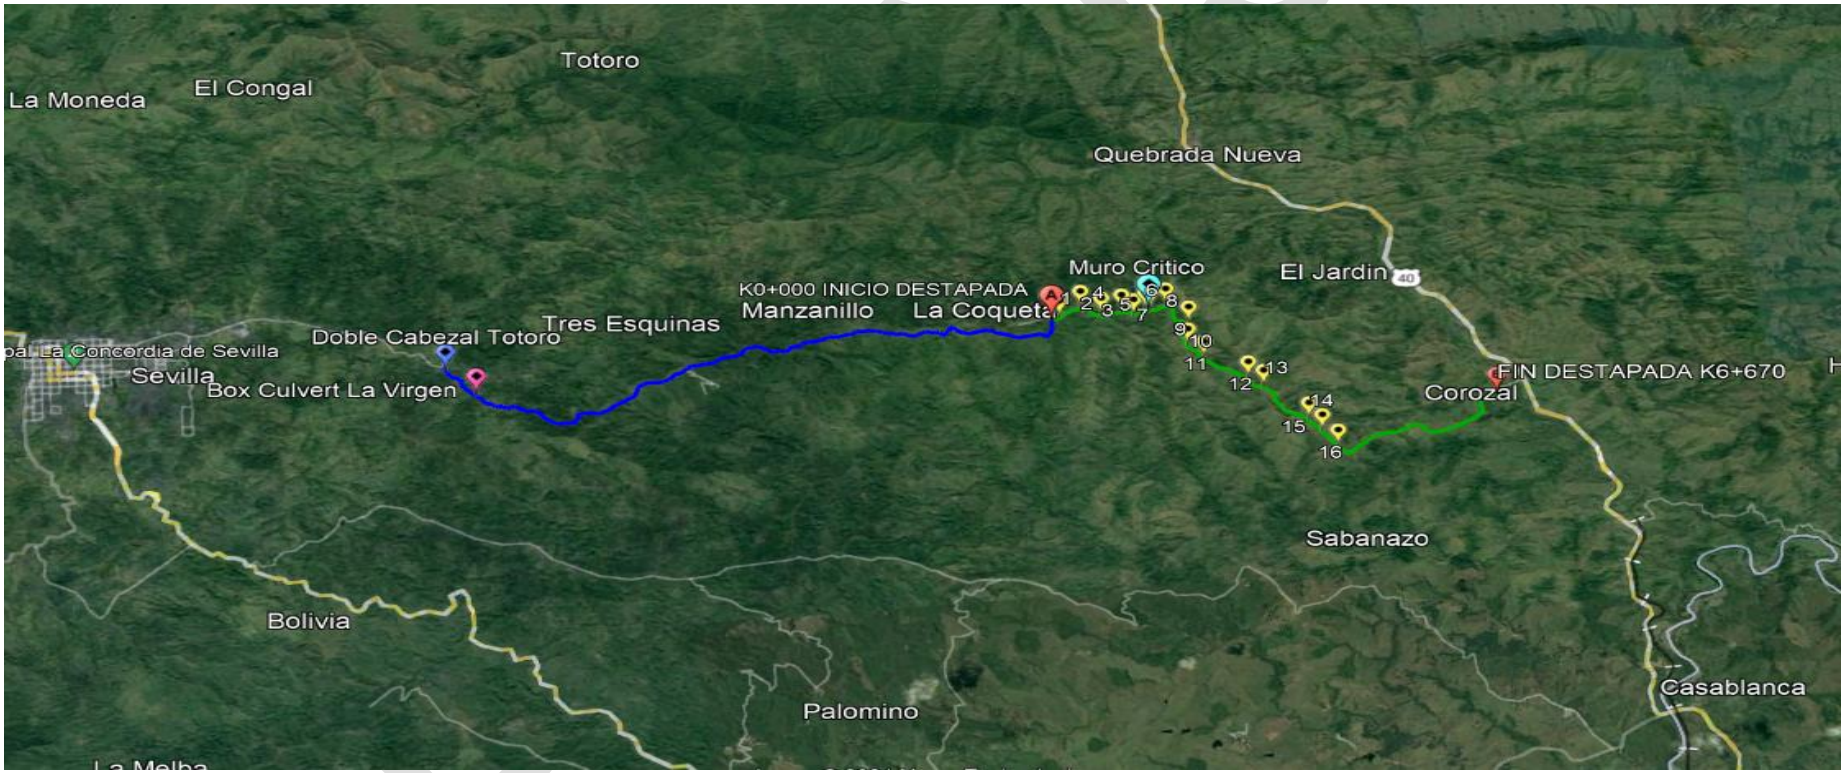

IV. INFORMACIÓN JURÍDICA

Se continúan las obras con base al modificatorio No. 2 del Convenio STI 344-2023.

V. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS

Se presenta la información inicial y de planeación para el presente Proyecto, así:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL OBRA, BIENES Y SERVICIOS	VALOR OBRA, SUMINISTRO Ó BIEN	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	POLIZA	APROB. POLIZA	ACTA DE INICIO	EJECUTADO
3550	MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL SAS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	$ 872.786.910,00	12 de octubre de 2023	12 de Junio de 2024	POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	24/07/23	12/10/23	$472.306.641,26
111487	SODEXO S.A.S	COMBUSTIBLE ACPM , COMBUSTIBLE GAL	$ 289.364.834	12 de Junio de 2023	12 de Junio de 2024	-	-		$ 100.200.670,00
STI -391-2023	TRACTODIESEL	TALLER, GRASAS Y LUBRICANTES	$ 199.549.000	13 de octubre de 2023	12 de Junio de 2024	-	-		$ 121.464.000
113515	CENCOSUD COLOMBIA S.A - POLYFLEX - HAS LTDA-FERRICENTROS-PROVEEER INSTITUCIONAL SAS	PAPELERIA, HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	$ 5.334.800	12 de Julio de 2023	09 de Agosto de 2023	-	-		$ 32.439.785
113516			$ 5.001.979,00						
113517			$ 5.257.836,00						
113518			$ 5.315.560,00						
113519			$ 1.312.270,00						

BICO52

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL OBRA, BIENES Y SERVICIOS	VALOR OBRA, SUMINISTRO Ó BIEN	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	POLIZA	APROB. POLIZA	ACTA DE INICIO	EJECUTADO
124863			10.217.340						
STI 354	ALCALDIA DE SEVILLA - VALLE DE CAUCA	PROFESIONALES	$ 10.000.000,00	13 de octubre de 2023	30 de diciembre de 2023	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	25/07/23		$ 45.000.000
STI 375			$ 16.000.000,00						
STI 370			$ 8.000.000,00						
STI371			$ 8.000.000,00						
STI381			$ 12.000.000,00						
STI 490			$ 3.000.000,00						
STI - 2024 - 111			$ 10.500.000						
STI-2024-101	COMPAÑÍA COLOMBIANA GESTIÓN Y SERVICIOS	EQUIPO MENOR	$ 35.200.000,00	12 de Junio de 2023	30 de diciembre de 2023	-	-		$ 31.163.720
126924	INVESAKK SAS	MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMPAMENTO	5.352.636	04 de Abril de 2024	18 de Abril de 2024	-	-		$ 5.352.636
126902	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMPAMENTO	1.366.542	04 de Abril de 2024	18 de Abril de 2024	-	-		$ 1.366.542
126894	FERRICENTROS	MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMPAMENTO	12.119.989	04 de Abril de 2024	18 de Abril de 2024	-	-		$ 12.119.989

BRIGADA

2. MATERIAL RECIBIDO (EJECUTADO)

A continuación, se relacionan **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- BICON 52** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista del Convenio STI 344-2023 BICON 52 de acuerdo al concepto técnico:

CONTRATO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SALIDA TOTAL	QUEDA
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	VARILLA DE ACERO FIGURADO CORRUGADO N° 3- N°4 - N°6	KG	22817.6	16125.45	6692.15
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18 ALAMBRE NEGRO	UND	1000	711	289
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	CEMENTO (TIPO PORLAND) X 50 KG	UND	4080	2061	2019
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	TUBERIA 24 PULG TUBERIA PARA AGUAS	UND	20	20	0
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	TRITURADO DE 1"	MTC	600	350.30	249.7
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	ARENA MEDIA	CMQ	600	225.82	374.18
OC-113519	ROLLO CINTA PELIGRO 500 MTS X 7.5CMS	UND	6	6	0
OC-113519	GUANTE CARNAZA-TELA WORK	UND	60	35	25
OC-113519	TAPABOCAS DESECHABLE X 50 UND	UND	3	3.00	0
OC-113519	GAFAS SEGURIDAD POLIC NARASAFE	UND	30	13	17
OC-113519	TAPAOIDOS DESECHABLES X 6 PARES	UND	10	3.00	7
OC-113518	BARRA 18 LB	UND	4	4.00	0
OC-113518	ALMADANA 10 LB CON CABO	UND	2	2.00	0
OC-113518	BOTAS INDUSTRIALES PUNTA DE ACERO	UND	30	30	0
OC-113518	PALETA PARE Y SIGA XUND	UND	2	2.00	0
OC-113517	PUNTILLA CON CABEZA DE 2 X 12	UND	6	6.00	0
OC-113517	PUNTILLA CON CABEZA DE 3 X 9	UND	6	6.00	0
OC-113517	CARRETILLA PLASTICA NEGRA RUEDA ANTIPINCHAZO	UND	6	6.00	0
OC-113517	PALA REDONDA # 2 CON CABO	UND	5	5.00	0
OC-113517	PALA CUADRADA # 2 CON CABO	UND	8	7.00	1
OC-113517	PALIN PALMERO SIN MANGO. MARCA COLIMA	UND	8	8.00	0
OC-113517	Anilina colores surtidos	UND	3	3.00	0

BICON 52

OC-113517	DECAMETRO DE 30MT EN FIBRA DE VIDRIO	UND	2	2.00	0
OC-113517	LLANA LISA METALICA MANGO MADERA	UND	4	4.00	0
OC-113517	PLASTICO NEGRO X 2MTS, POR METRO CUADRADO 50 CM	UND	100	100.00	0
OC-113517	MARCO DE SEGUETA 12" STANLEY	UND	6	6.00	0
OC-113517	EXTENSION ELECTRICA NARANJA 30MT	UND	4	4.00	0
OC-113517	GUANTE VAQUETA REFORZADO TIPO INGENIERO AMARILLO	PAR	60	60	0
OC-113517	COLOMBINA VIAL NARANJA DE 1.30 CON 3 FRANJAS REFLECTIVAS ALTA INTENSIDAD	UND	6	6.00	0
OC-113517	Resma Reprograf de papel CARTA 75 gr	UND	10	6	4
OC-113517	Resma Reprograf de papel OFICIO 75 g	UND	6	4.00	2
OC-113516	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210	UND	1	1.00	0
OC-113516	COMPUTADOR EMPRESARIAL HP 400	UND	1	1.00	0
OC-113515	LAPIZ ROJO KORES CAJA X 12	UND	5	5.00	0
OC-113515	BOLIGRAFO BIC CRISTAL CON TAPA X12	UND	5	3.00	2
OC-113515	MARTILLO MAZO 8 OZ - T	UND	4	4.00	0
OC-113515	FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 5MTR	UND	2	2.00	0
OC-113515	PALUSTRES 8 PUL MANGO MADERA	UND	4	4.00	0
OC-113515	LLANA DENTADA - T	UND	6	0.00	6
OC-113515	BARRERA O MALETA VIAL	UND	4	4.00	0
OC-113515	MARCADOR BORRABLE ERGONOMICO	UND	1	1.00	0
OC-113515	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS PASTA DURA	UND	10	9	1
OC-113515	CONO No. 30CM POLIETILENO SPG	UND	6	6.00	0
OC-124863	OVEROL TIPO PILOTO 12 CREMALLERAS Y 8 BOLSILLOS TALLA S	UND	10	10	0
OC-124863	OVEROL TIPO PILOTO 12 CREMALLERAS Y 8 BOLSILLOS TALLA M	UND	10	10.00	0
OC-124863	OVEROL TIPO PILOTO 12 CREMALLERAS Y 8 BOLSILLOS TALLA L	UND	10	10.00	0
OC-124863	CASCO MILEMIUM FULL BRIM AMARILLO CON CINTAS REFLECTIVAS	UND	30	24.00	6
OC-124863	TAFILETE ARNES MILEMIUM RACHET	UND	30	0.00	30
STI-2024-101	CARPA DE 6 x 6	UND	2	2.00	0
STI-2024-101	CARPA DE 6 x 12	UND	1	1.00	0
STI-2024-101	LATERALES SIN VENTANAS, CERRADOS TOTALMENTE	UND	11	11.00	0
OC-126894	CABLE No. 10 AWG 600V 200C° X METRO	UND	100	100.00	0
OC-126894	CABLE No. 12 AWG 600V 200C° X METRO	UND	400	400.00	0
OC-126894	TELA NEGRA POLISOMBRA 80% 4MTS ANCHO X 100MTS	UND	1	1.00	0
OC-126894	INTERRUPTOR SENCILLO GALICIA BLANCO	UND	5	5.00	0

BICON52

OC-126894	CABO MADERA PARA AZADON CORRIENTE	UND	3	3.00	0
OC-126894	APISONADOR MOTOR DIESEL	UND	1	1.00	0
OC-126894	SEGUETA DE MANO PARA METALES DE 12 X 18 DIENTES B	UND	20	20.00	0
OC-126894	PUNTILLA CABEZA DE 2. 1/2	UND	20	20.00	0
OC-126894	PUNTILLA CABEZA DE 1. 1/2	UND	20	20.00	0
OC-126902	YEE SANITARIA 3 X UND	UND	3	3.00	0
OC-126902	TUB. PRESION RDE 9-500 PSI 1/2 X UND	UND	30	30.00	0
OC-126902	CODO PRESION 90 1/2 X UND	UND	30	30.00	0
OC-126902	UNION CONDUIT 1/2 PULGADA X UND	UND	30	30.00	0
OC-126902	CINTA AISLANTE 3M X 5M	UND	3	3.00	0
OC-126924	TUBO VENTILACION 4*6MT GERFOR 100147	UND	6	6.00	0
OC-126924	TUBO VENTILACION 3*6MT GERFOR 100146	UND	4	4.00	0
OC-126924	TUBO VENTILACION 2*6MT GERFOR 100145 (ATADOS*10 UNID)	UND	4	4.00	0
OC-126924	BUJE SANITARIO 4*3 GERFOR 100580 UE(36)	UND	2	2.00	0
OC-126924	BUJE SANITARIO 4*2 GERFOR 100579 UE(36)	UND	2	2.00	0
OC-126924	CODO SANITARIO 90* 3 PULG DURMAN 2012852 (UE20)	UND	8	8.00	0
OC-126924	CODO SANITARIO C*C 2 ECONOMICO PVCECO UE (200) AUROPLAST	UND	10	10.00	0
OC-126924	UNION SANITARIA 2 PULGADAS 2012873 (UE 45) DURMAN	UND	3	3.00	0
OC-126924	UNION SANITARIA 3 PULGADAS GERFOR 100606 (CAJA*36 UNID)	UND	3	3.00	0
OC-126924	UNION SANITARIA 4 PULGADAS 2012875 DURMAN (UE 24)	UND	3	3.00	0
OC-126924	VALVULA COMPUERTA PVC 1/2 STAN STANPROF (U.E. 144)	UND	10	10.00	0
OC-126924	TOMA CILES DOBLE SOBRE PONER BLACA (UE 40) (UE120) 44015	UND	5	5.00	0
OC-126924	TUBO CONDUIT 1/2 * 3MTS DURMAN (UE 1) 2016185	UND	10	10.00	0
OC-126924	LLAVE TERMINAL PVC 1/2*3/4 BLANCA AKKUA LINE (UE=200)	UND	20	20.00	0
OC-126924	CURVA CONDUIT 1/2 * 90 C*E GERFOR 100427 UE(100)	UND	10	10.00	0
OC-126924	SOLDADURA PVC 1/4 DURMAN 2030641	UND	2	2.00	0
OC-126924	LIMPIADOR PVC-CPVC 1/8 GERFOR 101041 UE(24)	UND	1	1.00	0
OC-126924	TEJA ONDULADA METALUM C-35 80CM *3.048MTS PESO 3.048KG ACESCO	UND	30	30.00	0
OC-126924	REFLECTOR LED 50W BLANCA LUZ DIA 6500K MEGAWATT 30000H 75-8OL W-T6004-3-50/RF-008 (U.E.:20)	UND	4	4.00	0
OC-126924	AMARRE C / PLASTICO C18 UNIDAD PARA TEJAS ETERNIT	UND	197	197.00	0
OC-126924	BOMBILLO SYLVANIA TOLEDO LED HW 30W 6.5K E27 100-240V 2380LM *UNIDAD P24892-19 UE10	UND	10	10.00	0

BRIGADA

OC-126924	SANITARIO LAGUNA BLANCO C/ASIENTO CORONA REF 340011001 CAMBIO 340021001	UND	2	2.00	0
OC-126924	LAVAMANOS MILANO CON PEDESTAL BLANCO CORONA	UND	2	2.00	0
OC-126924	TUBO SANITARIO LIVIANO 6` DURMAN 2020072	UND	1	1.00	0
OC-126924	DISCO CORTE METAL 7*1/8*7/8 STANPROF	UND	20	20.00	0
OC-126924	AZADON FORJADO 4230-30 SIN CABO 242MM*100MM HERRAGRO	UND	3	3.00	0
OC-126924	PUNTILLA ACERO ESTRIADA 2 1/2 CORSAN	UND	20	20.00	0
OC-126924	PUNTILLA ACERO ESTRIADO 1 1/2 CORSAN	UND	20	20.00	0
OC-126924	MARTILLO PULIDO M/MADERA 32 75150132 MARTILLO PULIDO	UND	2	2.00	0
OC-126924	MANGUERA NIVEL TRANSPARENTE 1/4` *100MTS BORO	UND	1	1.00	0
OC-126924	MACHETE BARRIGON PULIDO 22` HERRAGRO T1214160020 UE(36)	UND	8	8.00	0
OC-126924	GUANTE TIPO INGENIERO (UE12)	UND	30	30.00	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE REF. OLP-014	UND	1	1.00	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO REF. FLP-340	UND	1	1.00	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO REF. FLP-317	UND	1	1.00	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO REF. AIP-543	UND	1	1.00	0
STI-391-2023 (TALLER)	LLANTA TRACCION 7,5 R 15 122-118 REF. 12R22.5	UND	2	0.00	2
STI-391-2023 (TALLER)	LLANTA DIRECCION REF. 7,5 R 15 122-118	UND	4	0.00	4
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE REF. BT8850-MPG	UND	2	0.00	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO REF. BF7557	UND	2	0.00	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO BF1365 REF. P550904 - BF1365	UND	2	0.00	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO DA2570 REF. P828889 - RS3544	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO DA4570 REF. P829333 - RS3545	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO B7328 REF. B163	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	BATERIA 31H REF. 31H1250	UND	13	9	4
STI-391-2023 (TALLER)	AUTOMATICO AUXILIAR ARRANQUE HELLA REF. 101011505	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	MOTOR DE ARRANQUE DELCO REMY REF. KB1214	UND	1	1.00	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE BT7237	UND	2	0.00	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO REF. FS1251-BF1226	UND	3	1.00	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO BF7922	UND	2	1.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO RS3544 REF. P828889 - RS3544 (RETROEXCAVADORA)	UND	2	0.00	2

RECONSTRUCCIÓN

STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO RS3545 REF. P829333 - RS3545 (RETROEXCAVADORA)	UND	2	0.00	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO P569206 REF. PT91	UND	1	1.00	0
STI-391-2023 (TALLER)	EMPAQUETADURA CILINDRO DIRECCION CNH REF. 34056500	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	EMPAQUETADURA BOOM CNH REF. SK210-8 BO	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE BD7154 REF. P559000- BD7154	UND	3	2.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO TIPO CARTUCHO PF7748 REF. FS19624-PF7748	UND	2	1.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO REF. RS4862	UND	3	2.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF. RS4863	UND	2	1.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO REF. B5134	UND	2	0.00	2
STI-391-2023 (TALLER)	DISCO DE EMBRAGUE 14" REF. 20121445	UND	1	1.00	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE REF. BT339	UND	2	1.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF. PA2836- P776696	UND	1	1.00	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO BT9422 REF. 1R-0722	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	LLANTA 14.00-24 PN 14 G2/L4 REF. 1400X24LL	UND	4	2.00	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO BF587-D REF. P550587-BF7772	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO A-1204SP REF. 26460201-4816636	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO 21905023 REF. 22777449-PA4997	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO P553004 REF. BF988-P553004	UND	1	1.00	0
STI-391-2023 (TALLER)	PASTILLA FRENO DE PARQUEO CNH REF. 2799	UND	1	1.00	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE P502465 REF. B7350	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO REF. P551313-BF970	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO RS3544 REF. P828889 - RS3544 (VIBROCOMPACTADOR)	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO RS3545 REF. P829333 - RS3545 (VIBROCOMPACTADOR)	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	RERPARACION SISTEMA ELECTRICO REF. 2446521	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE 02/600888 REF. 23047	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO BF7141 REF. PM1730SP	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO BF4029 REF. 23142	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO RS7170 REF. RS30223	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF. RS32 REF. RS30224	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO 2611/00281 REF. PT9424	UND	1	0.00	1

PUBLICO

STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE REF. B76	UND	1	1.00	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO REF. BF7814	UND	1	1.00	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO 2020MP-OR REF. 23046	UND	1	1.00	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO 180521 MACK REF. 2277448-CA4996	UND	1	1.00	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO BF1277-SPS REF. BF1272-SPS	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO TIPO CARTUCHO PF7748 BALDWIN REF. FS19624-PF7748	UND	1	1.00	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AGUA AW- 2127 REF. A-5813SP	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	FITRO AIRE PRIMARIO R 1963 REF. 23036	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	ACEITE HIDRAULICO ISO 68	GAL	88	6.00	82
STI-391-2023 (TALLER)	ACEITE MOTOR 15W40 GALON	GAL	65	25.00	40
STI-391-2023 (TALLER)	GRASA KP 2 G 40 (EP2)	LB	17	1.00	16
STI-391-2023 (TALLER)	ACEITE 80W90	GAL	6	0.00	6
STI-391-2023 (TALLER)	REPARACION BOMBA DE INYECCION	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	REPARACION MODULO DE MOTOR	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	LLANTA 305/70-16.5	UND	2	0.00	2
STI-391-2023 (TALLER)	EMPAQUETADURA MARTILLO HIDRAULICO CHN	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	REPARACION EXOSTO KRTV279	UND	1	0.00	1
STI-391-2023 (TALLER)	BUJIA BP6EXMAX	UND	2	0.00	2

3. DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL CONVENIO STI 344-2023

A la fecha se ha facturado lo siguiente por parte de la Alcaldía de Sevilla – Valle del Cauca:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No. 1	Pago Orden de Compra No. 113515 y Nota Debito No. D-402-4, en relación a cumplimiento del Plan de Necesidades del Convenio STI 344 de 2023	16/11/2023	$ 5.334.800,00
PAGO No. 2	Pago Orden de Compra No. 113516, en relación a cumplimiento del Plan de Necesidades del Convenio STI 344 de 2023	17/11/2023	$ 5.001.979,00

BICON52

PAGO No. 3	Adquisición de productos de ferretería con el fin de realizar obras en la vía de manzanillo corozal	22/12/2023	$114.417.087,02
PAGO No. 4	Prestación de servicios como maestro de obra en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla -valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No. 52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial	27/12/2023	$ 10.000.000,00
PAGO No. 5	Prestación de servicios como topógrafo en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla -valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No. 52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial	27/12/2023	$ 16.000.000,00
PAGO No. 6	Prestación de servicios como profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla -valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No. 52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial	27/12//2023	$ 8.000.000,00
PAGO No. 7	Adquisición de productos de ferretería con el fin de realizar obras en la vía de manzanillo corozal	28/12/2023	$ 183.368.974,25
PAGO No. 8	Suministro de repuestos, filtros, grasas y lubricantes para la maquinaria pesada y el parque automotor puesto a disposición por el comando de ingenieros y el BICON52	02/01/2024	$ 12.775.000,00
PAGO No. 9	Suministro de repuestos, filtros, grasas y lubricantes para la maquinaria pesada y el parque automotor puesto a disposición por el comando de ingenieros y el BICON52	02/01/2024	$ 66.309.000,00
PAGO No. 10	Prestación de servicios como mecánico de maquinaria pesada en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla -valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No. 52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial	04/01/2024	$ 8.000.000,00
PAGO No. 11	Adquisición de productos de ferretería con el fin de realizar obras en la vía de manzanillo corozal	04/01/2024	$ 196.804.614,09

BICON52

PAGO No. 12	Prestación de servicios como maestro de obra en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla -valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No. 52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial	04/01/2024	$ 3.000.000,00
TOTAL			**$ 629.011.454,36**

A la fecha está pendiente por realizarse los siguientes pagos. (se realiza oficio a la Alcaldía de Sevilla – Valle del Cauca solicitando la relación de pagos realizados y pagos pendientes).

No.	CONTRATO	CONCEPTO	FACTURA	VALOR
1	OC 113517, 113518, 113519	Pago Orden de Compra No. 113517, 113518, 113519, en relación al cumplimiento del Plan de Necesidades del Convenio STI 344 de 2023	OC 113517, 113518, 113519	$ 11.885.666,00
2	OC 111487	Combustible ACPM, combustible GAL	OC 111487	$ 289.364.834,00
3	CONVENIO	50% DEMERITO Y DESGASTE	DE ACUERDO A CONVENIO	$131.714.285,72
4	OC 124863	Pago Orden de Compra No. 124863 Overoles y Cascos	OC 124863	$10.217.340,00
5	STI-2024-101	Suministro de carpas	STI-2024-101	$ 31.163.120
6	STI-2024-110	Arriendo de Formaletas Metálicas	STI-2024-110	$26.490.136

BIC 52

7	STI - 2024 - 111	Pago mecánico	STI - 2024 - 111	$ 10.500.000
TOTAL				**$511,335,381.72**

1. BALANCE CONTRACTUAL POR MODIFICATORIO DE ACUERDO A ACTA DE COMITÉ OPERATIVO.

	FECHA	VALOR
Valor Total Convenio	12/10/2023	$ 2.710.935.883,00
Valor disponible obra	31/07/2024	$ 413.794.166,80
Valor comprometido	31/07/2024	$1,549,820,799.00
Valor por comprometer	31/07/2024	$350,179,201.00
Total, Contratos	31/07/2024	$1.900.000.000,00

VI. INFORMACIÓN TÉCNICA

Para el presente mes el Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52 “Gral. Francisco Tamayo Cortes” realizó las siguientes actividades:

- Se inician actividades de obra sobre la alcantarilla N°16 hacia arriba en dirección opuesta al abscisado para no realizar cruce de actividades con el proyecto que se encuentra desarrollando invias a petición de la alcaldía.
- Se inicia con la construcción de los disipadores del BoxCulvert con pilotes de 1,70 m anclados a la zapata de las aletas.
- Se inicia con la construcción de los disipadores de las alcantarillas sencillas, Alcantarilla N°3.
- La alcaldía emite un informe técnico para la intervención de la alcantarilla N°9, que está presentando socavación en la zapata del cabezal.
- Se inicia el Terraceo sobre el talud del BoxCulvert.

- **% EJECUTADO CONVENIO= 53,81%**
- **% PROYECTADO = 64,39%**
- **% ATRASO = 10,58%**

- **VR. A EJECUTAR = $1.900.000.000,00**
- **VR. EJECUTADO = $861.689.300,27**
- **% EJECUTADO = 45,35%**

BICONEZ

PROGRAMACIÓN DE OBRA CONVENIO STI-344-2023 (PROGRAMACIÓN – PROJECT)

Id		EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	UNIC DE MED	CANTID	CANTIDAD EJECUTAD	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	% PROGR.	% EJECUT.	% completac	CPTP	CPTR	Nomb de los recurs	Costo
1		1		<				224,25 dí	lun 4/12/23	sáb 19/10/24		100	53,81	64%	$ 946.767.363,80	$ 509.442.324,26		$ 432.459.060,07
2		1.1		CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y DE CONTENCIÓN				224,25 días	lun 4/12/23	sáb 19/10/24		100	53,81	64%	$ 946.767.363,80	$ 509.442.324,26		$ 432.459.060,07
3	✓	1.1.1		CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA DE DOBLE CABEZAL TOTORO K0+050				105,63 días	lun 4/12/23	jue 2/05/24		100	100	100%	$ 34.865.609,16	$ 34.865.609,16		$ 0,00
21		1.1.2		CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT LA VIRGEN K0+500 + OBRAS COMPLEMENTARIAS				172 días	vie 16/02/24	sáb 19/10/24		100	82,12	76%	$ 209.266.734,11	$ 171.851.881,67		$ 36.881.215,44
58		1.1.3		CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 1				20 días	mié 15/05/24	mié 12/06/24		100	86,34	88%	$ 22.281.221,70	$ 19.238.327,98		$ 2.228.250,22
74		1.1.4		CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 2				20 días	jue 16/05/24	jue 13/06/24		100	90,29	88%	$ 22.281.337,23	$ 20.116.835,75		$ 2.228.250,22
90		1.1.5		CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 3				20 días	jue 16/05/24	jue 13/06/24		100	100	99%	$ 22.282.693,23	$ 22.282.693,23		$ 0,00
106		1.1.6		CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 4				19 días	mié 12/06/24	mar 9/07/24		100	88,34	88%	$ 22.283.182,57	$ 19.683.997,36		$ 2.228.589,22
122		1.1.7		CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 5				19,75 día	jue 13/06/24	jue 11/07/24		100	89,79	88%	$ 22.284.049,23	$ 20.009.306,12		$ 2.228.589,22
138		1.1.8		CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 6				19 días	jue 13/06/24	jue 11/07/24		100	89,79	88%	$ 22.284.049,23	$ 20.009.306,12		$ 2.228.589,22
154		1.1.9		CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 7				20 días	mié 10/07/24	mié 7/08/24		100	86,35	88%	$ 22.284.049,23	$ 19.241.412,02		$ 2.228.589,22
170		1.1.10		CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 8				20 días	mié 10/07/24	mié 7/08/24		100	65,71	70%	$ 22.284.049,23	$ 14.643.806,92		$ 6.551.752,08
186		1.1.11		CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 9				20 días	mié 10/07/24	mié 7/08/24		100	68,05	75%	$ 22.284.049,23	$ 15.165.279,79		$ 5.723.148,12
202		1.1.12		CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 10				20 días	mié 7/08/24	jue 5/09/24		100	85,38	85%	$ 22.284.049,23	$ 19.025.593,09		$ 3.602.660,74
218		1.1.13		CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 11				20 días	mié 7/08/24	jue 5/09/24		100	68,42	70%	$ 22.284.049,23	$ 15.245.947,20		$ 6.551.752,08
234		1.1.14		CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 12				20 días	mié 7/08/24	jue 5/09/24		100	70,81	74%	$ 22.284.049,23	$ 15.780.384,60		$ 6.070.623,90
250		1.1.15		CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 13				20 días	jue 5/09/24	jue 3/10/24		100	77,31	75%	$ 22.284.049,23	$ 17.228.305,27		$ 5.723.148,12
266		1.1.16		CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 14				20 días	jue 5/09/24	jue 3/10/24		100	85,38	85%	$ 22.284.049,23	$ 19.025.593,09		$ 3.602.660,74
282		1.1.17		CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 15				20 días	jue 5/09/24	jue 3/10/24		100	91,54	88%	$ 22.284.049,23	$ 20.399.664,61		$ 2.228.589,22
298		1.1.18		CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 16				11 días	jue 3/10/24	sáb 19/10/24		100	90,06	90%	$ 22.284.049,23	$ 20.069.544,70		$ 2.228.589,22
314		1.1.19		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN N°1				47 días	mar 25/06/24	vie 30/08/24		100	6,85	5%	$ 40.603.468,38	$ 2.779.417,79		$ 37.515.226,38
327		1.1.20		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN N°2				52 días	mar 6/08/24	vie 18/10/24		99,99	6,84	5%	$ 40.603.468,38	$ 2.779.417,79		$ 37.517.778,48
340		1.1.21		CONSTRUCCION DE CUNETAS				73 días	lun 8/07/24	sáb 19/10/24		100	0	0%	$ 264.891.058,25	$ 0,00		$ 264.891.058,25

VII. EVIDENCIAS VISUALES

RESEÑA FOTOGRÁFICA	DESCRIPCIÓN
	CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES EN LA ALCANTARILLA N°3
	INICIO TERRACEO DEL TALUD DEL BOXCULVERT CON 2 TERRAZAS SOBRE EL TERRENO.

BIO52

	FUNDICIÓN DE POCETAS Y CABEZALES DESDE LA ALCANTARILLA N°16 (ULTIMA) INVERSO AL ABSCISADO.

VIII. INFORMACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

- Se realiza socializaciones del proyecto con los presidentes de la junta de acción comunal de las veredas, Manzanillo, La cuchilla, El jardín y Corozal.
- Se realiza socialización de las obras en la casa social de la vereda Corozal.

IX. INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

- La alcaldía solicito la estructuración y aval a través de un informe de la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca), cuyo objetivo fue emitir el concepto técnico ambiental sobre el proyecto denominado “Mejoramiento de la vía mediante la construcción de pavimento entre la vereda de la cuchilla y la vereda corozal, Municipio de Sevilla – Valle del Cauca” donde se manifiesta dentro de la consideración que la actividad NO requiere de trámite de un permiso o autorización, ya que se encuentra expresamente normalizado, ya que no tiene algún procedimiento especial por lo que el concepto técnico ambiental a emitir es fundamentado de manera general en las competencia otorgadas en el decreto 1076 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”. La alcaldía de Sevilla – Valle del Cauca a través del Secretario de Transito e Infraestructura realizó una

BICON52

certificación el 30 de agosto del 2023, donde se evidencia que manifiesta que no se requieren permisos de ocupación de cause por parte de la corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

- Mediante documento de radicado 0733-146992024 del 13 de febrero del 2024, emitido por la CVC, coordenadas geográficas 4° 17’ 57,56’’ de Latitud Norte y 75° 55’ 44,32’’ de longitud Oeste y 4° 18’ 06,72’’ de latitud Norte y 75° 55’ 32.98’’ de longitud Oeste, correspondientes a las ABS K0+050 y K0+500 Alcantarilla De doble cabezal y Box Culvert respectivamente, se emite concepto en el cual manifiestan que “*se considera ambientalmente viable la construcción de las obras de drenaje para el manejo de las aguas lluvias de escorrentía, tales como una alcantarilla de doble cabezal… un box culvert… por considerar que las actividades a realizar ocasionaran un impacto ambiental bajo. Igualmente se considera ambientalmente viable la construcción de las 24 alcantarillas a lo largo de la vía y las cunetas para el manejo de las aguas lluvias”*

- Se solicita a la CVC la erradicación de un árbol ubicado en las coordenadas 4°18.07.55"N - 75°55'32.95"W, lugar en el que se construirá el Box Culvert, ABS K0+500 por riesgo de volcamiento sobre talud por perdida de banca de la vía y riesgo de afectación a la infraestructura de una vía carreteable del municipio, quien mediante Documento de radicado 0733-208512024 del 5 de marzo del 2024, emitido por la CVC, manifiesta *“…teniendo en cuenta lo anterior, se considera viable autorizar la erradicación del árbol…”*

- Se recibe la visita de la CVC el día jueves 23 de mayo en el punto de intervención llamado Box culvert en el sector de la virgen, debido al riesgo en sitio con el desprendimiento del talud existente sobre la parte superior de la obra, realizan las recomendaciones para intervenir el talud y retirar la capa vegetal existente, sin embargo, aún se espera informe técnico de la visita de campo donde aprueban la intervención por parte de la corporación.

- La Alcaldía es la responsable de los tramites ambientales y a su vez debe dar cumplimiento de los mismos en los frentes de obra para la construcción de las obras de arte, obras de contención y campamento los cuales deben ser tramitados que ante la CVC.

- La CVC emite un concepto técnico de la visita realizada en campo, el día 23 de mayo, para avalar la intervención del talud debido a la perdida de especies vegetales y la remosión de masa sobre el BoxCulvert, y al ser un estado emergencia y riesgo para la comunidad que transita sobre la via.

BICON52

X. INFORMACIÓN SALUD OCUPACIONAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIONES REALIZADAS				
ACTA N°	**FECHA**	**TEMA**	**CANTIDAD PERSONAL CAPACITADO**	**OBSERVACIONES**
00915545	7/08/2024	TRABAJO EN EQUIPO	15	OMITIDO
2024544009561986	14/08/2024	PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN EL ÁMBITO LABORAL	20	OMITIDO
00987937	21/08/2024	PAUSAS ACTIVAS	21	OMITIDO
01018210	28/08/2024	¿QUE ES UN INCIDENTE DE TRABAJO?	20	OMITIDO

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
ELEMENTO ENTREGADO	**FECHA**	**CANTIDAD**	**PERSONAL QUE RECIBE EPP**	**TIPO (PRIMERA VEZ O REPOSICIÓN)**	**OBSERVACIONES**
No se hace entrega de EPP durante el mes	A la fecha el personal cuenta con sus EPP	N/A	-	-	La Alcaldía no ha realizado entrega de los EPP y herramienta menor solicitada.

ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO					
FECHA	**TIPO (ACCIDENTE O INCIDENTE)**	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**PERSONAL AFECTADO**	**MEDIDA CORRECTIVA**
No se reportan accidentes	omitido	omitido	omitido	omitido	omitido

NOTA: Se recaba que la unidad ejecutora ha realizado la salvedad y la solicitud en reuniones del uso de elementos de protección personal para trabajos en alturas (arnés, cinturón, puntos de anclaje, líneas de vida, silletas y guindolas, salva caídas) de acuerdo a resolución 4272 de 2021. sin tener respuesta por parte de la alcaldía de Sevilla Valle del Cauca.

XI. CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. Se llevo a cabo la modificación y prórroga del convenio, con fecha de entrega el día 20 de octubre del 2024.
2. La alcaldía realiza la entrega de los diseños de los disipadores el día 14-08-24
3. La alcaldía realiza la entrega de los diseños del BoxCulvert y las obras complementarias para la estabilización del talud el día 26-08-24
4. Se realiza comité técnico operativo N°6
5. Se aclara a la alcaldía por medio de las actas de seguimiento de obra el cumplimiento de los compromisos, entre ellos el de los pagos de servicios públicos, el alquiler de la formaleta, la compra de material para el desarrollo de obras complementarias, el inicio de la perforación de los pilotajes de los muros críticos, el mantenimiento y entrega de repuestos del equipo.
6. A la fecha la alcaldía no le ha dado gestión a los pagos del contratista del servicio de mecánico, por el cual no contamos con el servicio, quien a su vez se ha presentado novedades e imprevistos en la maquinaria y no se han podido solucionar.

XII. CONCLUSIONES

1. La Alcaldía es la responsable de los tramites ambientales y a su vez debe dar cumplimiento de los mismos en los frentes de obra para la construcción de las obras de arte, obras de contención y campamento los cuales deben ser tramitados que ante la CVC.
2. Se requiere los diseños para la estabilización del talud en el sector del Box Culvert para poder ejecutar al 100 % esta obra de arte en el tiempo establecido en la prórroga.
3. La alcaldía debe cumplir con varios compromisos pendientes que se han adquirido, con el fin de continuar con el avance del proyecto en ejecución.

XIII. RECOMENDACIONES

omitido

BICON52

FIRMAN:

FIRMA _____

Mayor CEPEDA SÁNCHEZ DIEGO
Ejecutivo y Segundo comandante del Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52
Supervisor Convenio Interadministrativo STI - 344 -2023

Capitán VÁSQUEZ MEJÍA PAULA ANDREA
Oficial Coordinador de Ingenieros BICON 52

Subteniente ORDOÑEZ HERNANDEZ JOHAN
Ingeniero Residente de Obra Convenio STI - 344 -2023

BICON52
