
INFORME DEL CONTRATISTA N° 7

CIVCOL.
OBRAS QUE CONSTRUYEN CALIDAD QUE PERDURA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 12 DE 2024 "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA"

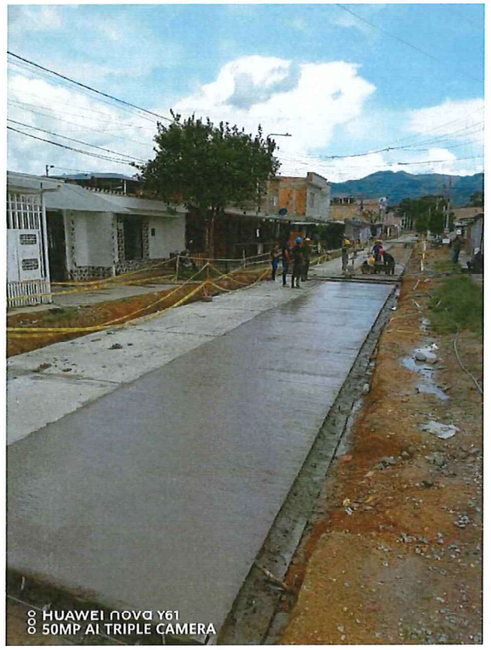

INTERVENTORIA: OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS

PERIODO:

10-DIC-2025 AL 21-ENE-26

PITALITO – HUILA

TABLA DE CONTENIDO

1. **INTRODUCCIÓN** 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
3. INVENTARIO Y ESTADO GENERAL DE LA VIAS EXISTENTES 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 4
5. ESTUDIOS Y DISEÑOS 5
6. CANTERAS Y BOTADEROS 6
7. MAQUINARIA Y EQUIPO 6
8. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 7
9. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
10. **VEEDURÍAS** 8
11. ACTIVIDADES **REALIZADAS** 8
12. REGISTRO **FOTOGRÁFICO** 10
13. INFORMACIÓN **FINANCIERA** 14
14. ENSAYOS DE LABORATORIO 16
15. **IMPREVISTOS** 16
16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17
17. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA 18
18. **CONCLUSIONES** 33
19. FIRMAS 33


1. INTRODUCCIÓN


La gobernación del Huila a través de la secretaria de vías e infraestructura contrató a CIVCOL S.A.S. para realizar el contrato de obra pública número 12 de 2024 que tiene por objeto: "**MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA**".

El presente informe reporta las actividades contempladas durante el periodo comprendido entre el 10 de diciembre de 2025 y el 21 de enero de del 2026, en el desarrollo de la obra por parte de CIVCOL S.A.S.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ubica en el sur de la República de Colombia, en el departamento del Huila, municipio de PITALITO en los barrios Venecia, Villa Catarina, La pradera, Cámbulos, Sucre, Siglo XXI, Juan Pablo II, Altos de la magdalena, El Jardín y Solarte todos dentro de la cabecera municipal.

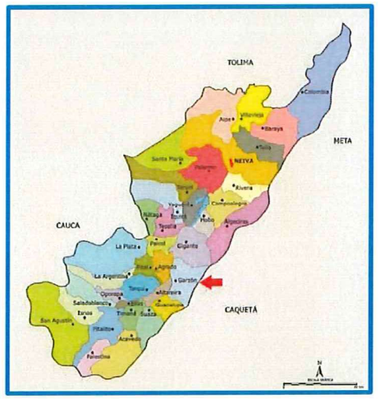

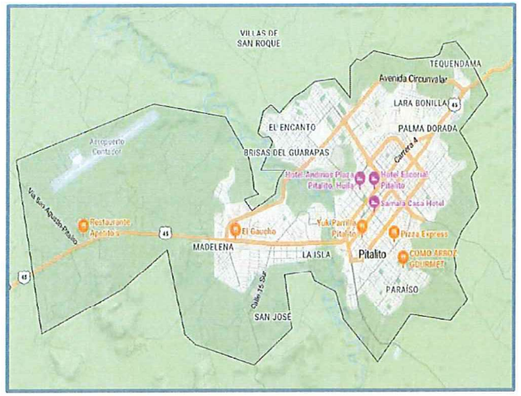

3. INVENTARIO Y ESTADO GENERAL DE LA VIAS EXISTENTES

Las cuadras para pavimentar, su estado presentaba dificultad para transitar por la condición de la capa de rodadura y de la falta de mantenimiento, algunas de ella sin capa de afirmado, otras sin mantenimiento desde hace mucho tiempo, el departamento del Huila y el municipio no cuentan con recursos económicos para pavimentar todas sus calles, ya que ningún otro ente realiza inversión en ellos y es de mucha importancia mejorar estas vías para mejorar la superficie de rodadura y descongestionar el tráfico desde los barrios hacia el centro de la ciudad.

Pitalito necesita contar con calles pavimentadas para facilitar la movilidad, hacer menos traumático el desplazamiento, mermar el polvo en épocas de verano y barro en épocas de invierno, el estado actual de estas vías presenta disminución en la velocidad promedio dentro del pueblo.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato contempla la pavimentación de 15 tramos en los barrios Venecia, Villa Catarina, La pradera, Cámbulos, Sucre, Siglo XXI, altos de la magdalena, Juan Pablo II, El Jardín y Solarte en concreto hidráulico o concreto rígido como se le denomina en el argot de la ingeniería en una longitud total de 1604.30 m con un ancho variable entre los 4.00 y 8.00 m libre entre sardineles los cuales son

de 15 centímetros de ancho. Para garantizar la estabilidad de la estructura del pavimento es necesario construir bordillos en ambos costados de las losas.

La estructura del pavimento cuenta con una capa de mejoramiento o afirmado, otra capa de subbase y la losa de concreto, con las respectivas dilataciones.

En el siguiente cuadro se muestra el listado de cuadras a pavimentar con las respectivas longitudes y anchos respectivamente

Tramo	Direccion	Barrio	Long	Ancho
1	Cl 3B entre cr 5A este y 6 Este	Venecia	69,50	5,00
2	Cr 1 entre Cl 14 sur y 15 sur	El Jardin	93,83	6,50
3	Cl 13A entre Cr 7 y 8	Sucre	66,00	5,05
4	Cl 19 B sur entre Cr 6 y 7	Siglo XXI	112,17	5,50
5	Cr 6 Este entre Cl 2C sur y 2B sur	Villa catarina	53,10	4,45
6	Transv 4A entre Cl 12 sur y 14 sur	Juan Pablo II	90,35	5,00
7	Cl 14 sur entre Trans 4 y 5	Juan Pablo II	113,50	5,00
8	Cl 3A bis entre Cr 16A y 18	Altos del Magda	153,74	6,00
9	Cl 2 sur entre Cr 4 este y 5 este	Las villas	43,29	5,00
10	Cl 16 sur entre Cr 2 y 3	El jardin solarte	86,34	7,00
11	Cr 1 entre Cl 15 sur y 16 sur	El jardin	76,50	7,50
12	Cr 2 este entre Cl 13 y 14	Cambulos	98,78	5,50
13	Cr 9A este entre Cl 3 sur y 3D sur	La pradera	166,00	4,00
14	Cl 3 sur entre Cr 9 este y 11 este	La pradera	213,00	5,00
15	Cl 4 entre Cr 5 este y 7 este	Venecia	168,20	8,00

Para recoger el agua lluvia cuando se presente, se hará a través de la construcción de sumideros en las partes más bajas de las calles y estos se conectarán a pozos existentes del alcantarillado municipal, la mayoría de ellos alcantarillados combinados.

Para dar información a los conductores de vehículos que utilizaran esta calle se colocaran las respectivas señales de tránsito y pintaran líneas en el piso de división de carril.

5. ESTUDIOS Y DISEÑOS

El municipio de Pitalito elaboró estudios y diseños completos, levantamiento topográfico, diseño estructural de la losa de concreto, de conteo de vehículos, de estudio hidráulico, con los cuales solicitaron los recursos y se pudo corroborar en campo (grupo integrado por contratista de obra, de interventoría y secretaria de planeación de municipio de Pitalito), con el respectivo levantamiento topográfico y los apiques respectivos.

6. CANTERAS Y BOTADEROS

Todos los materiales granulares que se utilizaran en la producción de concreto se están llevando desde la empresa CANTERA BUENOS AIRES, ubicada en el municipio de Pitalito a unos 7 km, la cual cuenta con el título minero respectivo vigente.

Relacionado a los botaderos, se puede decir, que en Pitalito no existe la escombrera con licencia, por ello el material proveniente de las excavaciones son depositados en predios particulares a solicitud de los mismos, para subir el nivel actual, previa validación por parte de la Alcaldía Municipal y controlando no se generen afectaciones ambientales ni sociales.

En ningún momento se depositara material proveniente de excavación sobre fuentes hídricas, bosques primarios, zonas de reserva forestal, zonas de alto contenido de valor vegetal, zonas arqueológicas.

7. MAQUINARIA Y EQUIPO

La empresa constructora cuenta con el siguiente equipo en el sitio de trabajo:

Volqueta sencilla	3
Vibro compactador	1
Retro excavadora de llantas	1
Retro excavadora sobre oruga	1

8. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA**			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	CIVCOL S.A.S		
	NIT O CC:	900817409-0		
	DIRECCIÒN:	Calle 5 No. 12 – 25 Int. 3	**TEL:**	(608) 8666831
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ**		
	CC:	**79.957.561 Bogotá D.C**		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 1424 FECHA (dd/mm/aa): 09/02/2024			
REGISTRO PRESUPUESTAL OTROSI 1:	No. 33425 FECHA (dd/mm/aa): 18/12/2025			
VALOR INICIAL:	**$ 2.294.982.856,69**			
	Valor en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.			
VALOR ADICIONAL:	**$ 501.697.386,69**			
	Valor en Letras: QUINIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE			
VALOR TOTAL:	**$ 2.796.680.243,38**			
	DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE.			
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL:	DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES			
PLAZO TOTAL:	NUEVE PUNTO CINCO (9.5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			

FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	15/04/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: (dd/mm/aa)	01/11/2024
FECHA DE REINICIO 1: (dd/mm/aa)	10/12/2025
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	04/03/2026

9. PÓLIZAS DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	NUMERO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	785-47-994000000014	15/04/2024	08/09/2026
ANTICIPO	785-47-994000000014	15/04/2024	08/09/2026
PAGO SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E IND	785-47-994000000014	15/04/2024	10/03/2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	785-47-994000000014	15/04/2024	5 AÑOS
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	785-74-994000000016	15/04/2024	10/03/2026

9. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

El objeto del contrato es "**MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA",** Los funcionarios de la Gobernación del Huila y de la Alcaldía municipal convocaron y realizaron la reunión en un sitio equidistante de la obra, congregando a los habitantes de las cuadras, presidentes de juntas de acción comunal y líderes de las los barrios beneficiarios, reunión a la cual asistieron: el representante legal de CIVCOL S.A.S., de ARQTEK S.A.S., GOBERNACIÓN DEL HUILA, ALCALDE DE PITALITO, SECRETARIA DE VÍAS DEL DEPARTAMENTO Y DEL MUNICIPIO. en dicha reunión se informó de la firma de acta de inicio del contrato, de plazo de ejecución, valor del contrato, contratista de obra y de interventoría, se da participación a los asistentes a la socialización.

10. VEEDURÍAS

Por procedimiento y para conformar la Veeduría ciudadana como exige la norma, se eligen tres personas para que conformen dicho comité con ellos se debe inscribir en personería municipal para que tenga validez.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Tramo 1: Suministro e instalación de señales de tránsito.

Tramo 3: Excavación chaflanes, demolición estructuras en concreto, concreto para pozos de inspección de alcantarillado, construcción de sumideros, suministro e instalación de señales de tránsito.

Tramo 5: Demolición estructuras en concreto, construcción de sumideros, suministro e instalación de señales de tránsito.

Tramo 6: Demolición estructuras en concreto, construcción de sumideros, suministro e instalación de señales de tránsito.

Tramo 7: Se realiza nivelación de pozos de inspección, demolición estructuras en concreto, afirmado relleno espaldón bordillo, fundición de placa de concreto, construcción de bordillo, construcción de filtro, construcción de sumideros, suministro e instalación de señales de tránsito.

Tramo 8: Demolición estructuras en concreto, construcción de filtro, construcción de sumideros, suministro e instalación de señales de tránsito.

Tramo 9: Suministro e instalación de señales de tránsito.

Tramo 10: Se realiza nivelación de pozos de inspección, demolición estructuras en concreto, relleno en afirmado tubería sumideros, fundición de placa de concreto, construcción de bordillo, construcción de sumideros, suministro e instalación de señales de tránsito.
Tramo 12: Demolición estructuras en concreto, concreto sumidero, construcción de sumideros, suministro e


instalación de señales de tránsito.

Tramo 13: Excavación chaflanes, se realiza nivelación de pozos de inspección, demolición estructuras en concreto, fundición de placa de concreto, construcción de bordillo, construcción de filtro, construcción de sumideros, suministro e instalación de señales de tránsito.

Tramo 14: Excavación tramo, pozos de inspección de alcantarillado, sumideros, mejoramiento sub rasante, se realiza nivelación de pozos de inspección, afirmado para tubería sumideros, fundición de placa de concreto, construcción de bordillo, construcción de sumideros, suministro e instalación de señales de tránsito.

Tramo 15: Demolición estructuras en concreto, construcción de sumideros, suministro e instalación de señales de tránsito.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO
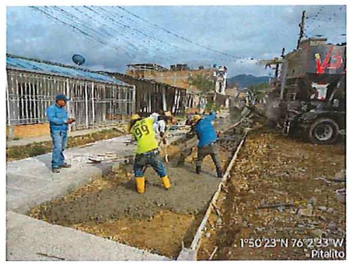
<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>


1°50'24"N 76°2'34"W
Pitalito


1°50'24"N 76°2'34"W
Pitalito


1°50'24"N 76°2'34"W
Pitalito



1°50'24"N 76°2'34"W
Pitalito


1°50'25"N 76°2'35"W
Pitalito


1°50'25"N 76°2'34"W
Pitalito


1°50'24"N 76°2'34"W
Pitalito



1°50'25"N 76°2'35"W
Pitalito

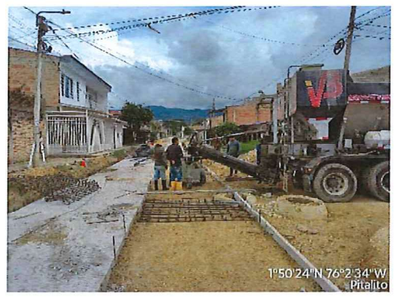 1°50'24"N 76°2'34"W Pitalito	 1°50'24"N 76°2'34"W Pitalito

 1°50'24"N 76°2'34"W Pitalito	 1°50'24"N 76°2'34"W Pitalito
 1°50'24"N 76°2'34"W Pitalito	 1°50'25"N 76°2'36"W Pitalito



1°50'24"N 76°2'32"W
Pitalito


1°50'21"N 76°2'30"W
Pitalito

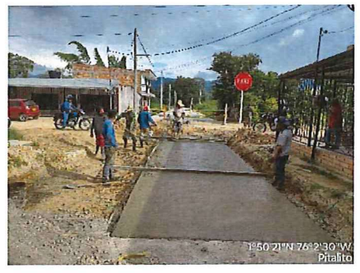
1°50'21"N 76°2'30"W
Pitalito


1°50'53"N 76°3'42"W
Pitalito



1°51'29"N 76°3'21"W
Pitalito

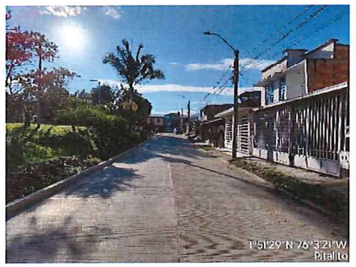
1°51'29"N 76°3'21"W
Pitalito







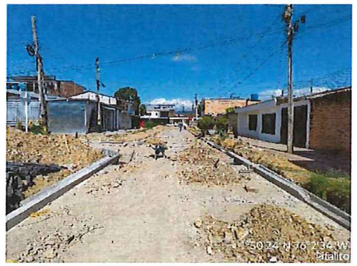

13. INFORMACIÓN FINANCIERA

Se presentó acta parcial de obra #1, #2, #3, #4, #5 y #6 por valores correspondientes al 9.19%, 13.29%, 10.08%, 13.25%, 14.44% y 11.68% respectivamente como lo permite el contrato en la cláusula referente a forma de pago, las cuales fueron pagadas, contemplando una ejecución acumulada del 71.93% hasta el 31 de octubre de 2024. Lo anterior, de acuerdo con el OTROSI 1 de balance de mayores y menores cantidades, creación de nuevos ítems que llevó a la adición de recursos y plazo al proyecto, generó que se actualizara el porcentaje ejecutado acumulado a 59.02% hasta el acta #6. Para el presente periodo de del 10 al 31 de diciembre de 2025 y 01 al 20 de enero de 2026 se presenta el acta #7 por un valor de 15.31% del valor contractual y un valor acumulado de 74.33%, el resumen se muestra en el siguiente cuadro:

	FECHA	VALOR	% Valor inicial	% Ajustado OTROSI1
Valor contrato	2024-01-24	$2,294,982,856.69	100%	
Anticipo		$688,494,857.00	30.00%	
Valor adicional OTROSI 1	2025-12-17	$501.697.386,69		
Valor total actualizado	2025-12-17	$2.796.680.243,38		100%
Valor Acta 1	2024-05-31	$210,920,882.27	9.19%	7.54%
Amortización por anticipo Acta 1	2024-05-31	$63,276,264.68	30.00%	
Valor a pagar acta 1	2024-05-31	$147,644,617.59		
Valor Acta 2	2024-06-30	$304,897,658.45	13.29%	10.90%

Plazo total: Nueve punto cinco (9.5) meses contados a partir del acta de inicio
Fecha Acta de inicio: 15 de abril de 2024.
Fecha acta de suspensión 1: 01 de noviembre de 2024.
Fecha de reinicio 1: 10 de diciembre de 2025.
Fecha de Terminación: 04 de marzo de 2026.

AVANCE FINANCIERO:

Valor total contrato de obra:	$2.796.680.243,38
Valor ejecutado Acta No. 7:	$2.078.800.331,03
Avance Financiero:	74.33%

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO:

319227- PA ANT CIVCOL PITALITO

PLAN DE INVERSIÓN NTICPO CUENTA BANCARIA 500-805-52755-5 REGALIAS

ITEM	PLAN DE INVERSION	VALOR ANTICIPO POR RUBRO	OP 01	OP 02	OP 03	SALDO ANTICIPO POR RUBRO
1	Suministro de materiales-combustibles-insumos	$ 415,000,000.00	$ 415,000,000.00			$ -
2	Transporte de materiales-vehículos	$ 73,500,000.00	$ 40,000,000.00	$ 33,500,000.00		$ -
3	Mano de obra directa o por contrato	$ 65,570,114.01			$ 65,522,262.00	$ 47,852.01
4	Alquiler de equipos-contratos de maquinaria	$ 100,000,000.00	$ 50,000,000.00	$ 50,000,000.00		$ -
	TOTAL PLAN DE INVERSION	**$ 654,070,114.01**	**$ 505,000,000.00**	**$ 83,500,000.00**	**$ 65,522,262.00**	**$ 47,852.01**
	TOTAL PLAN DE INVERSION /Recursos que ingresaron por concepto de anticipo 19/04/2024	**$ 654,070,114.01**				

REVISÓ

Jose David Castilla Rovira — Firmado digitalmente por Jose David Castilla Rovira. Fecha: 2024.08.27 10:17:03 -05'00'

Yudy Yohanna Nivia Lizarazo — Firmado digitalmente por Yudy Yohanna Nivia Lizarazo. Fecha: 2024.08.27 13:20:04 -05'00'

14. ENSAYOS DE LABORATORIO

CIVCOL S.A.S. cuenta con contrato con un el laboratorio MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS en la ciudad de Pitalito, quienes se encargan de elaborar el diseño de concreto, tomar las muestras de concreto en las fundiciones, toma de densidades de los rellenos con afirmado y subbase y de la caracterización de los materiales utilizados en obra.

15. IMPREVISTOS

DETALLE	VALOR IMPREVISTO		ACUMULADO
	ACTAS ANTERIORES	ACTA 7	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PITALITO	$1.265.525,00		$1.265.525,00
FIC	$1.495.000,00		$1.722.500,00
ELEMENTOS HURTADOS	$5.550.000,00		$5.550.000,00

17. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA

- **Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST**

La Seguridad y salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella su competitividad.

Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en todo momento la creación de una cultura en Seguridad y salud en el Trabajo que debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, productividad, desarrollo del talento humano y la reducción de los costos operacionales.

Es por ello por lo que CIVCOL S.A.S., tiene entre sus propósitos desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los Accidentes y las Enfermedades Laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante todo generar ambientes sanos para los que allí trabajan.

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones.

El presente subcapítulo contiene la descripción de las actividades y documentación del eje de seguridad y salud en el trabajo para el Contrato de Obra Pública No. 012 de 2024 que tiene por objeto el "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA", para el periodo correspondiente.

Exámenes Médicos Laborales de Egreso

Se le notifica a los empleados que renuncian que tienen derecho a realizarse los exámenes médicos laborales de egreso, conforme a la normativa vigente. Estos exámenes son importantes para evaluar su estado de salud al finalizar su relación laboral con la empresa y asegurar que cualquier condición relacionada con su trabajo sea debidamente registrada. Es responsabilidad del trabajador presentarse al examen médico de egreso dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación por parte de la empresa para su realización.

Afiliaciones a Seguridad Social

A todos los trabajadores cuyo certificado médico laboral de ingreso emitió el concepto de "Sin restricciones para el cargo", se les afilió a la ARL, EPS, AFP y CCF, con el fin de asegurar su cobertura respaldo en caso de presentarse alguna situación anormal dentro de los frentes de trabajo, en cumplimiento de la normatividad correspondiente. En el caso del personal subcontratado, la responsabilidad de realizar las afiliaciones a la seguridad social, como lo son la ARL, EPS y AFP, recae en el subcontratista. Como empresa, el personal de SISOMA se encarga de verificar y exigir que dichas afiliaciones estén al día para todo el personal subcontratado, garantizando así que todos los trabajadores cuenten con las coberturas necesarias ante cualquier riesgo o eventualidad en el entorno laboral.

El personal activo ya cuenta con todas las afiliaciones pertinentes, garantizando la cobertura adecuada para la

culminación segura de las labores.

Relación de Personal de Obra – Planilla de Seguridad Social

A continuación, se relaciona el personal del contrato 012 de 2024, tanto operativo como administrativo de obra para el periodo correspondiente.

PLANILLA SSO DICIEMBRE		
No.	**NOMBRE Y APELLIDO**	**CARGO**
1	JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA
2	ABRAHAM ARAGON VASQUEZ	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA
3	NATALIA TORO ANDRADE	PROFESIONAL HSEQ
4	JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ	ESPECIALISTA EN VIAS
5	JUAN FELIPE VALDERRAMA ESTEBAN	INSPECTOR DE OBRA
6	VALENTINA VIEDA CERQUERA	INSPECTOR DE OBRA
7	MILENA SANCHEZ OTALORA	SECRETARIA
8	LAURA FERNANDA BAUTISTA GARRIDO	ALMACENISTA

Anexo 1. Relación de Personal de Obra – Planilla de Seguridad Social

Relación de Personal Subcontratado de Obra – Seguridad Social

En el presente periodo sólo se cuenta con subcontrato de topografía y maquinaria amarilla.

PERSONAL SUBCONTRATADO-TOPOGRAFÍA		
No.	**NOMBRE Y APELLIDO**	**CARGO**
1	Jose Carlos Brito Espina	Comisión topográfica
2	John Fredy Lopez Ruiz	Comisión topográfica

PERSONAL SUBCONTRATADO-MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS		
No.	**NOMBRE Y APELLIDO**	**CARGO**
1	Juan Camilo Vargas Coy	Operador Volqueta
2	Cristian Mauricio Cruz Bolaños	Operador Volqueta
3	Diego Mauricio Cruz Molina	Operador Volqueta
4	Jairo Chavarro Castro	Operador Retroexcavadora
5	Pedro Pablo Roa Vargas	Operador Excavadora de Orugas
6	Deiber Guilombo Salcedo	Operador Vibrocompactador
7	Arlinson Castro Piamba	Oficial

Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

En cumplimiento con las normas de seguridad y salud ocupacional, y con el objetivo de promover un ambiente de trabajo seguro, CIVCOL ha implementado la práctica de realizar los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) el primer día laboral de cada semana. Esta medida tiene como propósito identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a las actividades laborales, asegurando así la protección y bienestar de todos los empleados.

Los ATS son una herramienta fundamental para la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, ya que permiten un enfoque sistemático y proactivo en la gestión de riesgos. Durante estas sesiones, se llevarán a cabo las siguientes actividades:

- **Identificación de Peligros**: Reconocer y documentar los peligros potenciales presentes en el entorno de trabajo.
- **Evaluación de Riesgos**: Analizar la probabilidad y las consecuencias de los peligros identificados.
- **Implementación de Controles**: Establecer medidas preventivas y correctivas para mitigar los riesgos.

La participación de todos los trabajadores es esencial para el éxito de estos análisis, por lo que se les exhorta a colaborar y aportar sus conocimientos y experiencias. La seguridad es una responsabilidad compartida, y mediante el compromiso y la cooperación de todos, podemos crear un entorno laboral más seguro y saludable.

Inspección, Mantenimiento y/o Limpieza de los Recursos para Emergencia:

Para el presente periodo se realizaron las inspecciones a los equipos y elementos para la prevención y atención de emergencias. Se realizaron inspecciones con el fin de asegurar que se encuentran en buen estado y disponibles, conforme al artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015 "Documentación del SG-SST" y 2.2.4.6.25 "Prevención, preparación y respuesta ante emergencias". Se realizaron inspecciones a:

- Camillas
- Extintores

Todas estas inspecciones se realizan con una periodicidad mensual a excepción del Formato "Control de Consumo de Elementos del Botiquín y Primeros Auxilios" que se realiza cada vez que se consuma algún elemento de este.

Control de Vehículos Livianos, Pesados y Maquinaria Amarilla:

CIVCOL S.A.S., para el presente periodo, se contó con vehículos pesados y maquinaria amarilla para el inicio de la ejecución de las actividades de obra como: Excavaciones, Cajeo, Céreo de subrasante y subbase y transporte de material de relleno.

A continuación, se relacionan todos los vehículos, maquinaria y/o equipos existentes durante el período comprendido en el presente informe:

LISTADO DE MAQUINARIA AMARILLA					
MAQUINARIA	MARCA	REFERENCIA	MODELO	TARJETA REGISTRO	DECLARACION IMPORTACION
Retroexcavadora	Caterpillar	420F IT	2014	38797	482017000003170
Excavadora de Orugas	Caterpillar	320GC	2024	147032	352024000187620
Vibrocompactador	Caterpillar	CS433B	1994	4FK00214	000002151

LISTADO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS						
VEHICULO	MARCA	PLACA	MODELO	LICENCIA DE TRANSITO	VIGENCIA SOAT	VIGENCIA REVISIÓN TM
Volqueta	Ford	SBA 969	1947	10023885255	2026-05-26	2026-03-24
Volqueta	Chevrolet	XMD625	2009	10032677916	2026-10-02	2026-10-12
Volqueta	Dodge	HLD914	1973	10032198201	2026-09-16	2026-09-16

Inspecciones Preoperacionales a Vehículos y Maquinaria Amarilla

CIVCOL S.A.S., a través del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, planea, ejecuta y hace seguimiento a las inspecciones preoperacionales que se realizan a vehículos, maquinaria y equipos existentes en obra; estas se realizan diariamente.

Instalación de Señalización Vertical

Se dispone en obra de los dispositivos de señalización necesarios para informar a usuarios de vehículos y a peatones de las restricciones del flujo vehicular y la existencia de los frentes de obra.

- **GESTIÓN AMBIENTAL**

El presente informe reporta el seguimiento a la Gestión Ambiental en la ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 012 DE 2024 "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA".

Punto Ecológico – Acopio General

Se realizó mantenimiento al punto ecológico, cambiando de manera constante de bolsa y evacuando residuos para evitar el desorden. Los residuos de bolsas de cementos son almacenados dentro tulas de fibra debido a su capacidad y con el fin de no generar mayor impacto con las bolsas de plástico, estas tulas de fibra son entregadas a INTERASEO quien realiza la disposición final.

Recepción de Material y Acopio

Se registró el ingreso de materiales como afirmado, subbase y grava según las actividades programadas. Además, para corregir algunos fallos en ciertos tramos, se requirió la utilización adicional de subbase. Cabe destacar que cualquier material remanente fue almacenado en el trayecto correspondiente.

Certificados de Calidad de Materiales y Hojas de Seguridad

En los tramos en ejecución se manejó la hoja de seguridad del cemento, debido a que se está manipulando en mayor cantidad este tipo de material; adicional se está manejando gasolina para la operación canguro compactador, vibrador de concreto, regla vibratoria para concreto y motobomba. El combustible de ACPM se utiliza en pequeñas cantidades en una rana para compactar la subbase y en la cortadora de concreto.

Los galones que transporta el combustible se encuentran debidamente rotulado. En las charlas de 5 minutos diarios se refuerza las fichas técnicas de seguridad de estos dos químicos al personal de obra se le expone y se hace referencia al cuidado de manipular el combustible y el cemento, teniendo en cuenta los elementos de protección personal y las medidas de manejo que se deben tomar en caso de un derrame.

Para la ejecución de actividades de construcción de pavimentación de vías urbanas en concreto hidráulico, se adquirieron materiales tales como varillas de acero de media pulgada y tubos de PVC para alcantarillado de 12 pulgadas.

En el mes de octubre, se continuó el proceso de dilatación de juntas utilizando el sellante de poliuretano VULKEM 45 SSL de TREMCO. Previamente, se revisó la ficha de seguridad del producto y se dieron recomendaciones a los trabajadores para su uso adecuado.

Brigada de Orden y Aseo

Se realizaron brigadas de orden y aseo en los diferentes tramos en donde participaron voluntarios y quienes están a cargo de jornadas de limpieza en el frente de trabajo una vez finalizada la jornada laboral, esto con el fin de dar orden y recoger todo tipo de residuo que se encuentre alterando el paisaje y contaminando el suelo, fuentes hídricas y el aire; además, el personal encargado de realizar la jornada garantiza que los frentes de trabajo queden con materiales de acopio bien organizados, residuos en el punto ecológico y las herramientas en su puesto.

Para las jornadas de limpieza en cada frente de trabajo, se utilizan los equipos y herramientas suministradas por CIVCOL S.A.S para que sea más fácil y rápida la limpieza de las áreas, de manera regular se recolectan los residuos que genera la obra para no generar desorden, estas son dispuestas en un punto de acopio para luego ser entregadas a Inter Aseo.

Canteras (Materiales Pétreos)

En el mes de octubre, se emplearon materiales en las actividades de pavimentación en los distintos tramos. Los materiales fueron suministrados por la cantera Buenos Aires, la cual cuenta con toda la documentación vigente y al día, garantizando así el cumplimiento de los requisitos legales y normativos para el suministro de materiales.

Permisos para Disposición Final de Material de Excavación

Los escombros generados durante la ejecución del proyecto son utilizados como material de relleno en lotes de propiedad de particulares. Estos residuos son manejados y controlados desde su fuente hasta su disposición final, dados los numerosos impactos que pueden causar el manejo inadecuado de los mismos. Las acciones que se ejecutan para el manejo de los escombros que no se pueden reutilizar en los mismos frentes de obra es la disposición final en una escombrera autorizada.

La escombrera autorizada cuenta con licencia de urbanismo (Resolución 783 del 26 de diciembre de 2023) concedido por planeación municipal de Pitalito. Los lotes particulares VILLA CAMILA están ubicados en la calle 10 con carrera 9 este y en el área de influencia de estos lotes no existen fuentes hídricas cercanas, ni zonas de alto valor vegetal.

Cargue, Descargue y Transporte de Residuos

Los vehículos que transportan material desde las canteras hasta los frentes de obra lo realizan carpados para evitar esparcir partículas en la vía. Una vez ingresan al frente de obra realizan el descargue de manera adecuada y en un sitio destinado para acopiar material, esto con el fin de dar cumpliendo a la resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente.

Frentes de Trabajos Limpios y Ordenados

Una vez realizadas las actividades diarias, al finalizar el día se realiza una inspección en los frentes de trabajo, con el fin de organizar, limpiar y asear todas las zonas. El grupo encargado de la limpieza es quien realiza la recolección de residuos y disposición en el punto ecológico de acuerdo con el código de colores y tipo de residuos a depositar. Esta actividad va de la mano con la brigada de orden y aseo.

- **GESTIÓN SOCIAL**


Descripción de actividades sociales en el municipio de Pitalito Barrio Venecia (Tramo 15 Calle 4 Carrera 5 Este y 7 Este), Tramo 1 (Calle 3b Carrera 5a Este y 6 Este), Barrio Villa Catarina (Tramo 5 Carrera 6 Este entre Calle 2c Sur y 2b Sur), Barrio Las Villas (Tramo 9 Calle 2 Sur entre Carreras 4 y 5 Este), Barrio Pradera (Tramo 13 Carrera 9a entre Calle 3 Sur y 3d Sur), Barrio Cámbulos (Tramo 12 Carrera 2 Este entre Calle 13 y 14), Barrio el Jardín Solarte

(Tramo 10 Calle 16 sur entre Carrera 2 y 3), Altos del Magdalena (Tramo 8 Calle 3ª bis entre carrera 16ª Y 18), Barrio Juan Pablo II (Tramo 6 Transversal 4ª entre Calle 12 Sur y 14 sur y Tramo 7 Calle 14 sur entre transversal 4 y 5) y Barrio la Pradera (Calle 13 Sur entre Carrera 9 Este y 11 Este)

Identificación del Área de Influencia


El Municipio de Pitalito se localiza en el suroriente del Departamento del Huila con una extensión de 625,55 Km2 a unos 195 km de Neiva por una carretera en buenas condiciones y con un alto flujo de vehículos de transporte público y particular. Desde Bogotá es posible llegar directamente por vía aérea. Pitalito limita por el norte con los Municipios de Saladoblanco, Timaná y Elías; por el sur con el Municipio de Palestina y el Departamento del Cauca; por el oriente con el Municipio de Acevedo y por el occidente con los Municipios de Isnos y San Agustín. Pitalito se ubica a los 1° 51' 07" de Latitud Norte y 76° 02' 14" de Longitud Oeste. De acuerdo con la nomenclatura del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" (IGAC), la zona urbana pertenece a la plancha topográfica 388 IV B a escala 1:25000. Pitalito está ubicado sobre el valle del Magdalena y en el vértice que forman las cordilleras central y oriental a 1.318 metros sobre el nivel del mar y una temperatura media de 18 y 21oC; es considerado la Estrella Vial del sur colombiano por su localización estratégica, que permite la comunicación con los Departamentos vecinos del Cauca, Caquetá y Putumayo. Población: El municipio de Pitalito cuenta con una población de 135.691 habitantes, de ellos 80.170 son de la zona urbana y 55.521 pertenecen a la zona rural. (DANE, Demografía y Población, 2005; Proyecciones a 2019).


Localización municipio de Pitalito

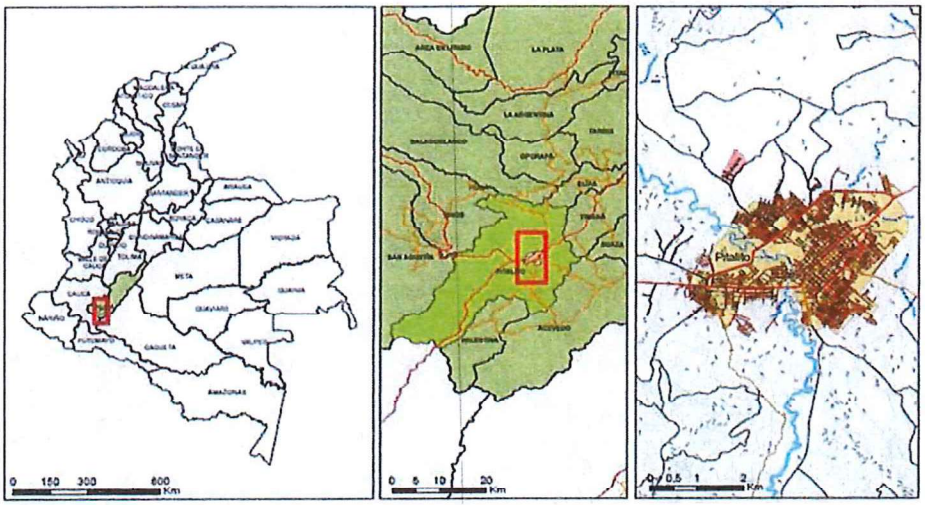


Fuente: Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA 2022) "Mejoramiento de Vías Urbanas Mediante la Construcción de Pavimentación de Cuadras en Concreto Hidráulico en el Municipio de Pitalito, Departamento del Huila"


Localización barrio Venecia (tramo 15 calle 4 carrera 5 este y 7 este)

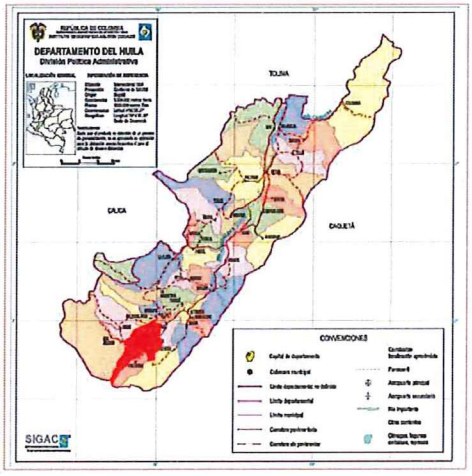

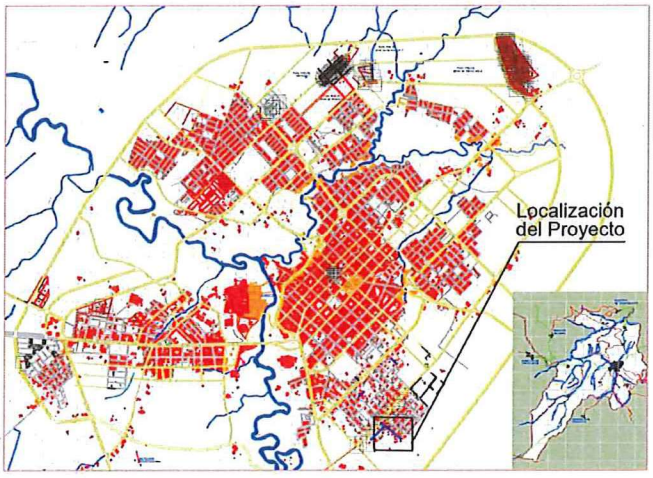



Localización barrio Venecia (tramo 1 calle 3b carrera 5ª este y 6 este)

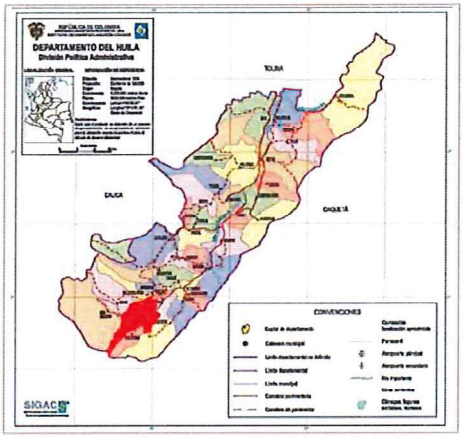

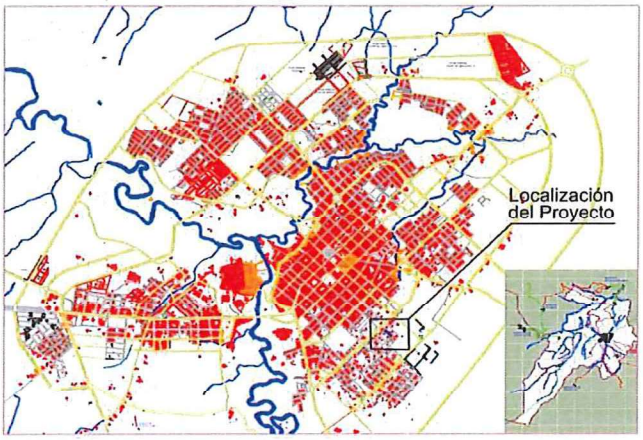


Localización barrio Villa Catarina (tramo 5 carrera 6 este entre calle 2c sur y 2b sur)

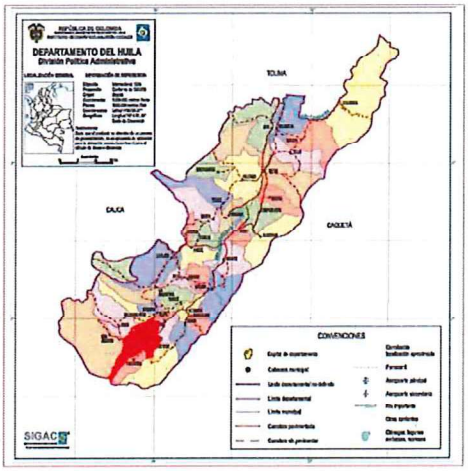


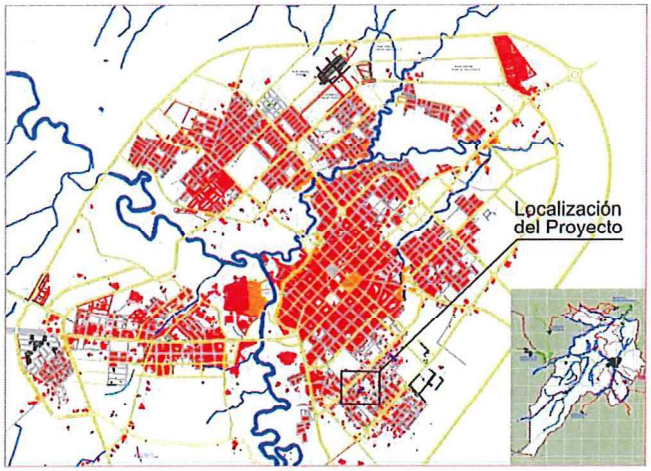


Localización barrio las Villas (tramo 9 calle 2 sur entre carreras 4 y 5 este)

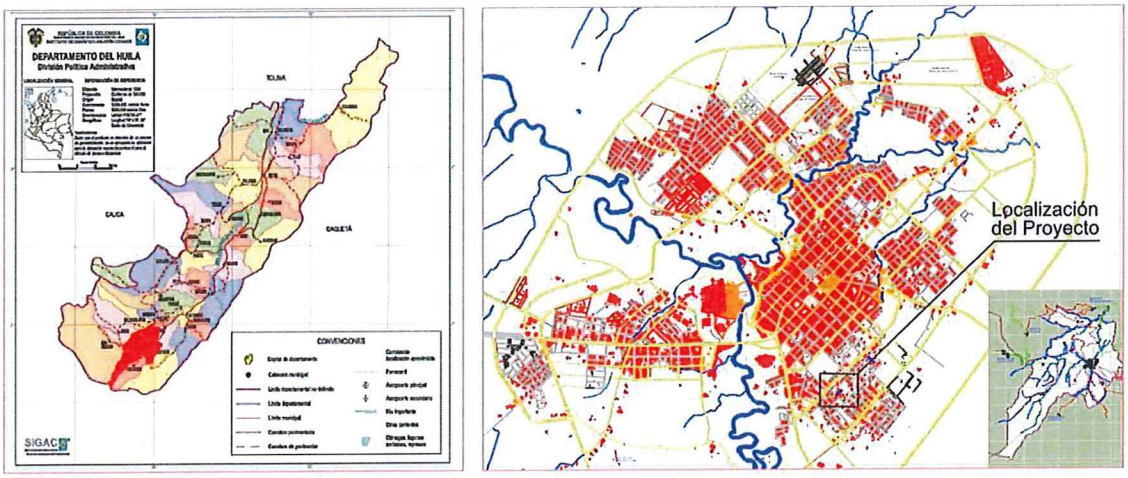


Localización barrio Pradera (tramo 13 carrera 9a entre calle 3 sur y 3d sur)

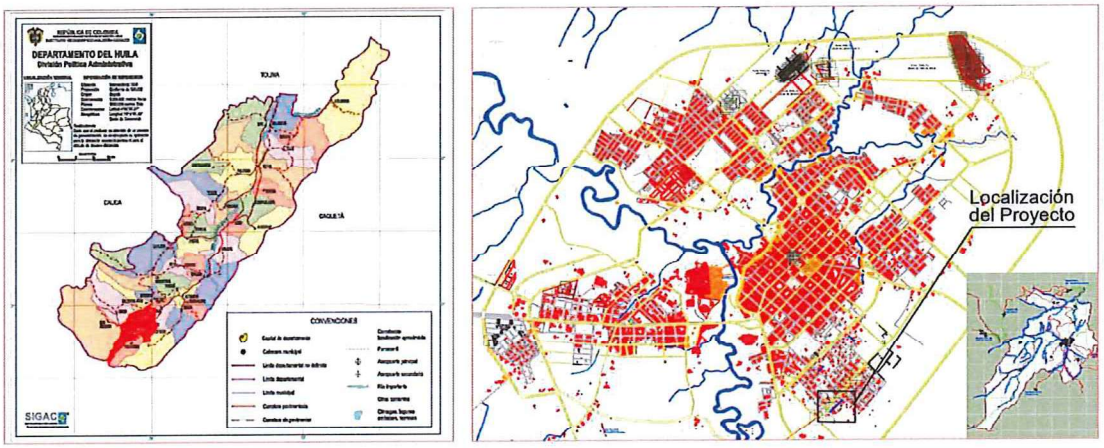


Localización Barrio Cámbulos (Tramo 12 Carrera 2 Este Entre Calle 13 y 14)

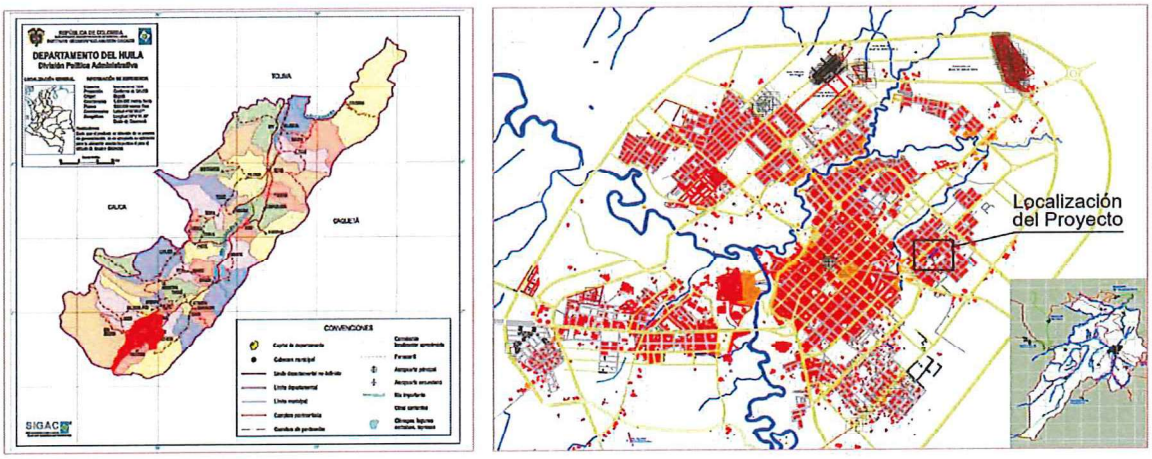


Localización barrio el Jardín Solarte (Tramo 10 Calle 16 sur entre Carrera 2 y 3)

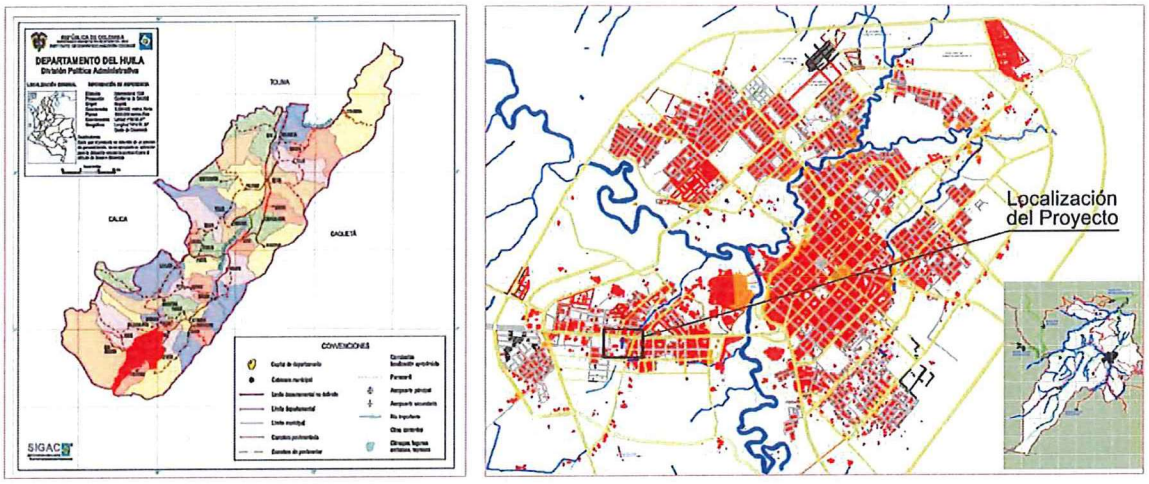


Localización barrio Altos del Magdalena (Tramo 8 Calle 3ª bis entre carrera 16ª Y 18)

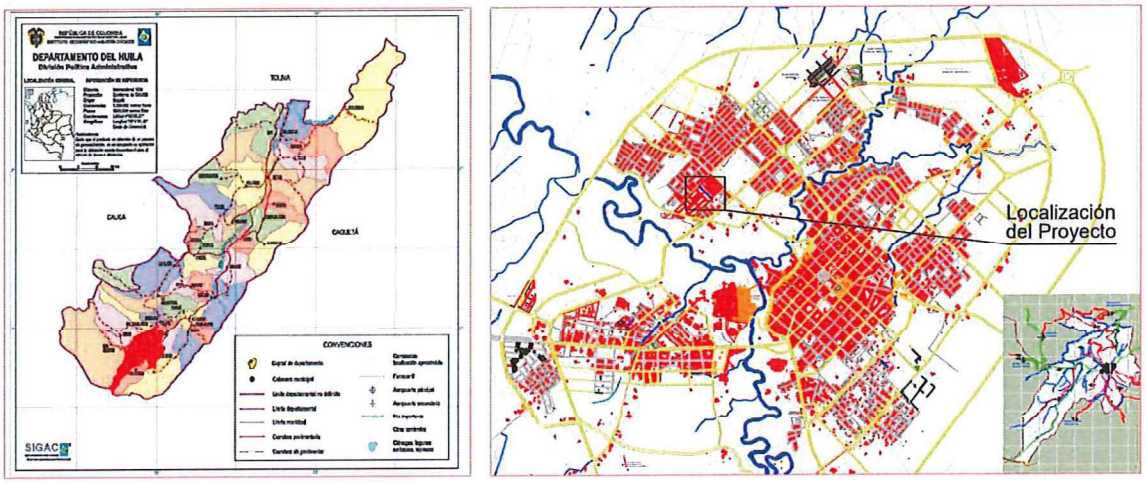


Localización Barrio Juan Pablo II (Tramo 6 Transversal 4ª entre Calle 12 Sur y 14 sur)

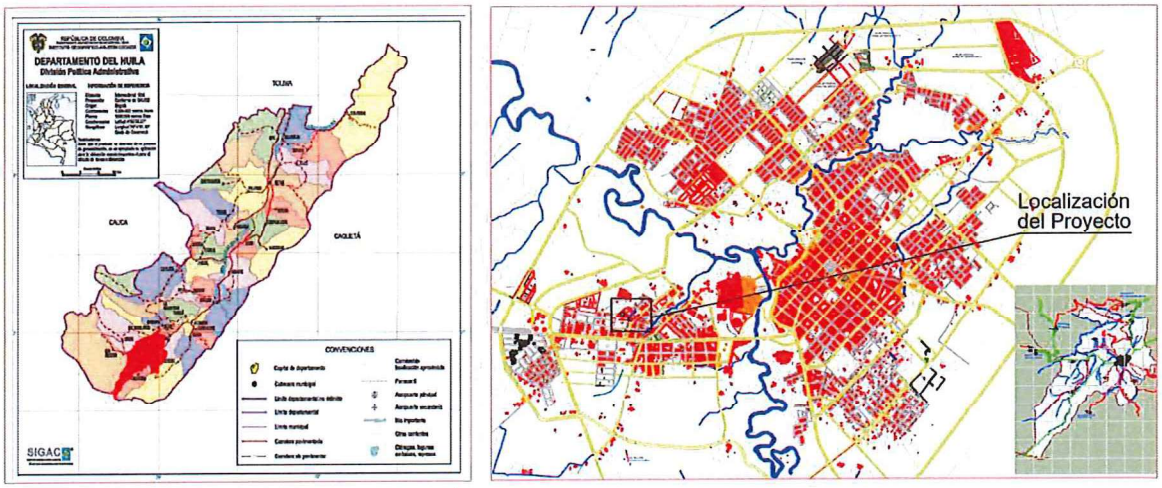

Localización Barrio Juan Pablo II (Tramo 7 Calle 14 sur entre transversal 4 y 5)

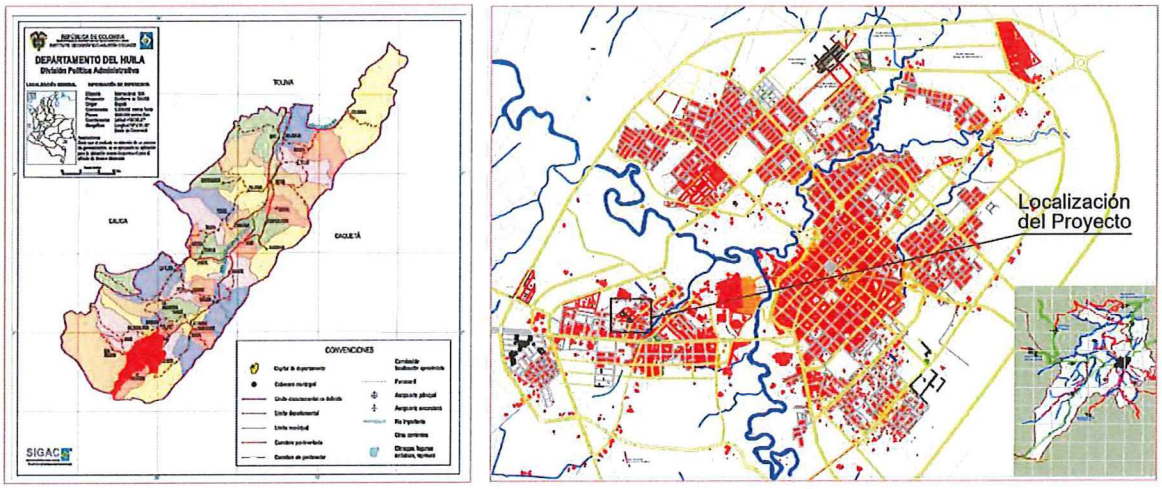

Localización Barrio la Pradera (Calle 13 Sur entre Carrera 9 Este y 11 Este)

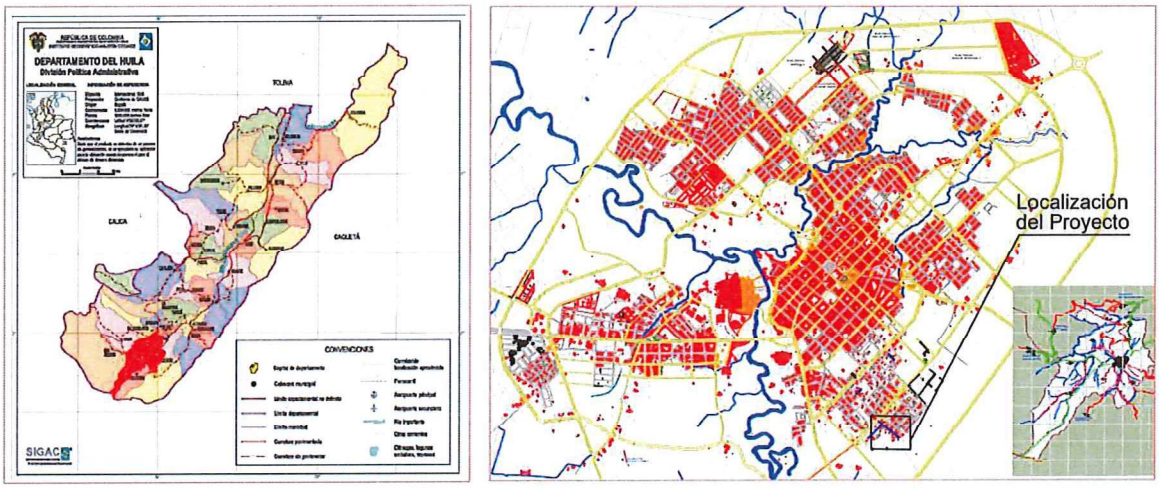

Caracterización de Población

Desde la estructuración del proyecto, este se encuentra direccionado a una población afectada y objetivo. Teniendo en cuenta que desde la priorización de necesidades del plan de desarrollo municipal y a partir de su estrategia de construcción de pavimentos, se evidencio que el problema más latente es en la comuna uno del municipio, por lo que el proyecto plantea la solución al problema, centrado en 76.203 habitantes de la zona urbana, y la población objetivo en la comuna uno es de 13.052 habitantes en la ejecución de este proyecto. Proyecciones población municipios DANE 2018 2026

Reuniones de Participación.

Se realizan acercamientos con la comunidad en cada tramo del proyecto para atender sus requerimientos y preocupaciones de manera efectiva. Estas reuniones permiten un diálogo abierto y constructivo, asegurando que las decisiones tomadas reflejen las necesidades y expectativas de todos los involucrados. Al fomentar la participación, garantizamos un proceso más transparente y colaborativo, fortaleciendo la confianza y el compromiso de la comunidad con el proyecto.

Directorio Municipio de Pitalito

A continuación, se relaciona las entidades públicas para las diferentes atenciones a la comunidad del Municipio de Pitalito:

Nombre	Institución/ comunidad	Cargo	Correo/ Celular
Yider Luna Joven	Alcaldía de Pitalito	Alcalde Municipal	3153047681
Armando Saavedra Perdomo	Alcaldía de Pitalito	Secretaría de Planeación	3182269900
Milton Stiven Hoyos Hermida	Alcaldía de Pitalito	Secretaría de Vías e Infraestructura	3227727027
Sofia Ardila Ortíz	Alcaldía de Pitalito	Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo	3103256830
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito	Bomberos de Colombia	Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito	6088362222 6088360011 60883527 77
Policía Nacional – estación Pitalito	Policía Nacional	Policía Nacional – estación Pitalito	3187080510
Heraldo Roberth Ordoñez Espinosa	Presidente J.A.C	Presidente J.A.C barrio Venecia	3138903432
Cristian Camilo	Presidente J.A.C	Presidente J.A.C barrio Villa Catarina	3186994151
Ernesto	Presidente J.A.C	Presidente J.A.C barrio La Pradera	3115998786
Yolanda Correa	Presidente J.A.C	Presidente J.A.C barrio El Jardín Solarte	3144462321

Actas de Vecindad

Se realiza acercamiento con anterioridad por parte del residente civil y social con los propietarios de las casas de los tramos con el fin de informarles acerca del proyecto y el inicio del levantamiento de las actas de vecindad. A continuación, se relaciona las actas de vecindad realizadas para los diferentes tramos a intervenir.


- El tramo 15 intervenido en el barrio Venecia cuenta con un numero de 21 actas de vecindad levantadas durante el periodo de abril, mes en el que se inició la ejecución del proyecto.
- El tramo 1 intervenido en el barrio Venecia cuenta con un numero de 13 actas de vecindad levantadas durante el periodo de abril.
- El tramo 5 intervenido en el barrio Villa Catarina cuenta con un

numero de 11 actas de vecindad levantadas durante el mes de mayo, se menciona que debido a que el propietario de un predio no pudo recibir la visita para levantamiento del acta, se realizó el levantamiento del acta al predio y la firmó el presidente de la junta de acción comunal del barrio.

- El tramo 9 intervenido en el barrio Las Villas cuenta con un numero de 09 actas de vecindad levantadas durante el mes de mayo.
- El tramo 13 intervenido en el barrio La Pradera cuenta con un numero de 27 actas de vecindad levantadas durante el mes de mayo.
- El tramo 12 intervenido en el barrio Cámbulos cuenta con un número de 21 actas de vecindad levantadas durante el mes de mayo.
- El tramo 10 intervenido en el barrio Jardín Solarte cuenta con un número de 10 actas de vecindad levantadas durante el mes de julio de 2024
- El tramo 08 intervenido en el barrio Altos del Magdalena cuenta con un número de 23 actas de vecindad levantadas durante el mes de julio de 2024
- El tramo 03 intervenido en el barrio Sucre cuenta con un número de 15 actas de vecindad levantadas durante el mes de junio de 2024
- El tramo 06 intervenido en el barrio Juan Pablo II cuenta con un número de 21 actas de vecindad levantadas durante el mes de agosto de 2024
- El tramo 07 intervenido en el barrio Juan Pablo II cuenta con un número de 13 actas de vecindad levantadas durante el mes de agosto de 2024
- El tramo 14 intervenido en el barrio Juan Pablo II cuenta con un número de 46 actas de vecindad levantadas durante el mes de septiembre de 2024
- El tramo 2 intervenido en el barrio Jardin cuenta con un número de 14 actas de vecindad levantadas durante el mes de septiembre de 2024
- El tramo 4 intervenido en el barrio siglo XXI cuenta con un número de 28 actas de vecindad levantadas durante el mes de julio de 2024

Punto de Atención a la Comunidad - PAC

En el mes de octubre continúa en funcionamiento el Punto de Atención Comunitaria (PAC) en el municipio de Pitalito, ubicado en la Calle 6 #1A-104. En este lugar se gestionarán todas las solicitudes relacionadas con la comunidad y el personal de obra, así como las PQRS (Peticiones,Quejas, Reclamos y Sugerencias). Para mayor comodidad, también se brindará atención a través de correo electrónico.

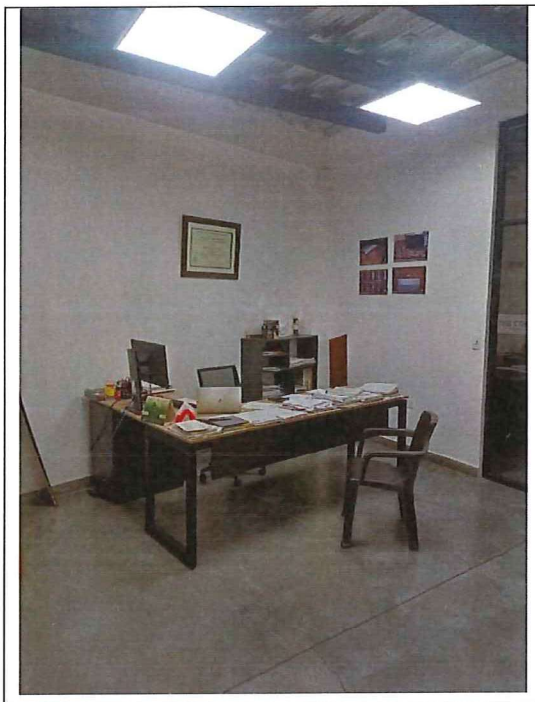



El punto de atención al ciudadano se ubica en la oficina del municipio de Pitalito. Aquí se encuentra un escritorio, una silla ergonómica, sillas para atención a los peticionarios, baño común, teléfono celular con numero 312 577 9921 - 317 861 5199 para cualquier duda e inquietud, impresora y un archivador, todo esto con el fin de dar atención de la mejor manera a la comunidad. En su mayoría la atención a la comunidad se brinda de manera personal.

Contacto para presentar sus PQR:

NATALIA TORO ANDRADE: 3133940635
Correo Electrónico de PQRS: residentesst.puentepalma@gmail.com

Por favor, asegúrense de incluir la siguiente información al presentar su PQR:
Nombre completo. Número
de contacto.
Detalles claros y específicos de la petición, queja o reclamo.
Esto nos permitirá gestionar de manera rápida y organizada sus inquietudes, garantizando una respuesta oportuna. Además, facilitará la documentación y el seguimiento de cada caso.
Entendemos la importancia de una comunicación efectiva en nuestra comunidad y estamos comprometidos a garantizar un proceso transparente y receptivo.Jornadas de Armonización

El acercamiento a la comunidad se está llevando a cabo de manera personal. Este enfoque busca fomentar un diálogo directo y transparente con los habitantes, permitiendo socializar temas cruciales como el proceso de contratación, la reparación de daños ocasionados durante la ejecución del proyecto, y resolver dudas generales

relacionadas con el desarrollo de las obras. Al priorizar la atención personal, se facilita una comunicación más efectiva, lo que genera confianza entre la comunidad y los responsables del proyecto, garantizando que todas las inquietudes sean atendidas de manera oportuna y clara. Además, este método promueve un mejor entendimiento del impacto de las obras y refuerza el compromiso de mitigar cualquier inconveniente que pueda surgir

Registro de PQR´S por la Comunidad

Durante el mes de octubre, en la ejecución de labores constructivas en diferentes tramos correspondientes al contrato de obra pública N° 12 de 2024, no se recibieron PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) por parte de la comunidad. Este resultado refleja un buen manejo de las actividades y una comunicación efectiva con los habitantes de las áreas impactadas por el proyecto.

18. CONCLUSIONES

El contrato de obra fue reiniciado el pasado 10 de diciembre de 2025 después de un largo tramite realizado ante la Gobernación del Huila, efectuando el ajuste al proyecto, la creación de nuevos ítems, la prorroga del plazo y la adición de recursos.

Se destaca que la totalidad de las obras ejecutadas se encuentran en óptimas condiciones de calidad, siendo del recibo por parte de la interventoría.

19. FIRMAS

ABRAHAM ARAGON VASQUEZ	**NATALIA TORO ANDRADE**
Residente de Obra	**Profesional de SST**

(IV)

Transacción aprobada

9 Ene 2026 - 11:10 A. M.

Valida la ejecución de la transacción

Para confirmar que la transacción se ejecuto correctamente, consulta su estado y novedades en los historiales.

Historiales

Datos de aprobación

Aprobada

Tipo de transacción
Pagar Pse

Fecha de preparación
9 Ene 2026

Usuario preparador
Javier Valderrama

Fecha de aprobación
9 ene 2026

Usuario aprobador
Laura Bautista

Producto Origen

Tipo de cuenta
Ahorros - Bancolombia

Numero de cuenta
45500005797

Campo presta Civcol.

Campo [redacted]

Informacion de la transaccion

Descripcion
PAGO Banco de Occidente Leasing Vivienda y Constructor

LVP687

Entidad a la que se paga por PSE
GOU PAYMENTS S.A EASPBV

Valor

Valor del pago
COP $ 2706741

Costo
COP $ 0,00

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

29 Dic 2025 10:15
NIT: 900817409
Usuario: LAURA FERNANDA BAUTISTA GARRIDO

Pago exitoso
CUS 2043529658

Comercio
Aseguradora Solidaria de Colombia

Referencia 1
192.230.104.3

Fecha
29 Dic 2025 10:15

Referencia 2
7850004396

Número de factura
78500043961

Referencia 3
NIT - 900817409

Descripción del pago
POLIZAS

Valor del Pago
$1.268.866

Número de comprobante
78500043961

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0521**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

29 Dic 2025 10:09
NIT: 900817409
Usuario: LAURA FERNANDA BAUTISTA GARRIDO

Pago exitoso
CUS 2043495972

Comercio
Aseguradora Solidaria de Colombia

Referencia 1
192.230.104.3

Fecha
29 Dic 2025 10:09

Referencia 2
7850004388

Número de factura
78500043881

Referencia 3
NIT - 900817409

Descripción del pago
POLIZAS

Valor del Pago
$4.668.686

Número de comprobante
78500043881

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0521** → Cucol Adm.

Prestamo de cucol a pitalito

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
7850004388

PÓLIZA No: 785-47-994000000014 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS PARQUE 93 COD. AGENCIA: 785 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	16	12	2025
FECHA DE IMPRESIÓN	16	12	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CIVCOL SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 900.817.409-0

DIRECCIÓN: CARRERA 15 92 70 OF 202 ED CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3138925432

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: , GOBERNACION DEL HUILA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4

BENEFICIARIO: , GOBERNACION DEL HUILA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	15/04/2024	25/06/2026	458,996,571.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	15/04/2024	25/06/2026	688,494,857.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	15/04/2024	25/12/2028	229,498,285.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	458,996,571.40

BENEFICIARIOS
NIT 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.12, DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMIENTACION DE CUADRA EN CONCRETO HIDRUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

NOTA ACLARATORIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,835,986,285.60	$ ********3,129,728	$******6,000.00	$ ******595,788	$ ********3,731,516

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
LOPEZ Y SOHM CIA LTDA ASESORES DE SE	4854	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclan/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSURADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000785000439

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C9D025780F08F97A5D

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS PARQUE 93 COD. AGENCIA: 785 RAMO: 74 No POLIZA: 994000000016 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CIVCOL SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 900.817.409-0

ASEGURADO: CIVCOL SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 900.817.409-0

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO SERAN MODIFICADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000000016 ANEXO: 2 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: CIVCOL SAS IDENTIFICACION: 900.817.409-0

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CIVCOL SAS	900817409-0	CALLE 0 No. 0-0	PITALITO	390,000,000.00	859,068	1,023,432

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
859,068	1,023,432

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
7850004388

PÓLIZA No: 785-47-994000000014 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS PARQUE 93 COD. AGENCIA: 785 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	12	2025	19	12	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CIVCOL SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 900.817.409-0

DIRECCIÓN: CARRERA 15 92 70 OF 202 ED CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3138925432

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: . GOBERNACION DEL HUILA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4

BENEFICIARIO: . GOBERNACION DEL HUILA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	15/04/2024	08/09/2026	559,336,048.60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	15/04/2024	08/09/2026	839,004,072.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	15/04/2024	10/03/2029	279,668,024.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	559,336,048.60

BENEFICIARIOS
NIT 800103913 - GOBERNACION DEL HUILA, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.12, DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMIENTACION DE CUADRA EN CONCRETO HIDRUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

NOTA ACLARATORIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *2,237,344,194.40	$ **********781,538	$*****6,000.00	$ ******149,692	$ **********937,170

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
LOPEZ Y SOHM CIA LTDA ASESORES DE SE	4854	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA VIA SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000785000438

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C9D025780F08FA7E59

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS PARQUE 93 COD. AGENCIA: 785 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000000014 ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CIVCOL SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 900.817.409-0

ASEGURADO: . GOBERNACION DEL HUILA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4

BENEFICIARIO: . GOBERNACION DEL HUILA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.103.913-4

TEXTO ITEM 1

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, SEGÚN OTROSÍ No. 01, FIRMADO ENTRE LAS PARTES EL 17 DE DICIEMBRE DE 2025, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.12, DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMIENTACION DE CUADRA EN CONCRETO HIDRUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO SERAN MODIFICADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
7850004396

PÓLIZA No: 785 -74 - 994000000016 ANEXO 3

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS PARQUE 93 COD. AGE: 785 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
19	12	2025	VIGENCIA DESDE 25	12	2025	A LAS 23:59	10	03	2026	A LAS 23:59	75	19	12	2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL
TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
VIGENCIA DESDE 25	12	2025	A LAS 23:59	10	03	2026	A LAS 23:59	75

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: CIVCOL SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.817.409-0
DIRECCIÓN: CARRERA 15 92 70 OF 202 ED — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3138925432

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CIVCOL SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT 900,817.409-0
DIRECCIÓN: CARRERA 15 92 70 OF 202 ED — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3138925432
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CIVCOL SAS NIT : 900817409

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: HUILA CIUDAD: PITALITO

DIRECCION: CALLE 0 No. 0-0

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: -1-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 475,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	475,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	475,000,000.00		
	RCE PATRONAL	475,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	475,000,000.00		
	GASTOS MEDICOS	475,000,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	475,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5,000,000.00 $ en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/GASTOS MEDICOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO #12-2024 REFERENTE A RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMIENTACION DE CUADRA EN CONCRETO HIDRUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.

NOTA ACLARATORIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***475,000,000.00	$ **********195,205	$*****6,000.00	$ *******38,229	$ **********239,435

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
LOPEZ Y SOHM CIA LTDA ASESORES DE SE	4854	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070007850004 39

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

JQUECAN 0

C9D025780F08FA7E57

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS PARQUE 93 COD. AGENCIA: 785 RAMO: 74 No POLIZA: 994000000016 ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CIVCOL SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 900.817.409-0

ASEGURADO: CIVCOL SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 900.817.409-0

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, SEGÚN OTROSÍ No. 01, FIRMADO ENTRE LAS PARTES EL 17 DE DICIEMBRE DE 2025, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.12, DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMIENTACION DE CUADRA EN CONCRETO HIDRUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO SERAN MODIFICADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000000016 ANEXO: 3 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: CIVCOL SAS IDENTIFICACION: 900.817.409-0

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CIVCOL SAS	900817409-0	CALLE 0 No. 0-0	PITALITO	475,000,000.00	195,205	233,435

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
195,205	233,435

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
7850004396

PÓLIZA No: 785 -74 - 994000000016 ANEXO: 4

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS PARQUE 93 COD. AGE: 785 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
29	12	2025	29	12	2025	23:59	10	03	2026	23:59	71	29	12	2025

VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO MODIFICACION

VIGENCIA DEL ANEXO DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
29	12	2025	23:59	10	03	2026	23:59	71

VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: CIVCOL SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 900.817.409-0

DIRECCIÓN: CARRERA 15 92 70 OF 202 ED CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3138925432

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CIVCOL SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 900.817.409-0

DIRECCIÓN: CARRERA 15 92 70 OF 202 ED CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3138925432

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CIVCOL SAS NIT : 900817409

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: HUILA CIUDAD: PITALITO

DIRECCION: CALLE 0 No. 0-0

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: -1-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 427,050,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	427,050,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	427,050,000.00		
	RCE PATRONAL	427,050,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	427,050,000.00		
	GASTOS MEDICOS	427,050,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	427,050,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 5,000,000.00 $ en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/GASTOS MEDICOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO #12-2024 REFERENTE A RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMIENTACION DE CUADRA EN CONCRETO HIDRUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

NOTA ACLARATORIA:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO, TENIENDO PRESENTE EL SALARIO MINIMO DEL 2025 (1,423,500)

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **(47,950,000.00)	$ ********(-18,655)	$*********0.00	$ *****(-3,544)	$ *********(22,199)

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
LOPEZ Y SOHM CIA LTDA ASESORES DE SE	4854	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000785000439

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

JRVELASQUEZ 0

C9D025780F08FB7D5A

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 024 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS PARQUE 93 COD. AGENCIA: 785 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000000016 ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CIVCOL SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 900.817.409-0

ASEGURADO: CIVCOL SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 900.817.409-0

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

SE ACLARA LA VIGENCIA TOTAL DE LA POLIZA 24/01/2024 HASTA 10/03/2026.

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN SIN MODIFICAR.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000000016 ANEXO: 4 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: CIVCOL SAS IDENTIFICACION: 900.817.409-0

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CIVCOL SAS	900817409-0	CALLE 0 No. 0-0	PITALITO	-47,950,000.00	-18,655	-22,199

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
-18,655	-22,199

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Civcol Sas - Nit: 900817409

Martes, 30 de diciembre de 2025, 9:59:55 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
22 Dic 2025

Nombre del destinatario
Departamento Del H

Identificación destinatario
800103913

Producto destino
442 - 6370 - 47

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco De Bogota

Valor
COP $ 20.328.500,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 181.57.84.217

Gobernación del Huila

Recibo oficial de pago de rentas varias

RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/12/22 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31 **Recibo Nº** 4102500040451

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA-EXCEPCION 41

(2%) - Pro Desarrollo	$10.034.000
(1,50%) - Pro Cultura	$7.525.000
(0,50%) - Pro Desarrollo Universidad Surcolombiana	$2.508.000
(100) - Venta de bienes y servicios	$5.500
(100) - Contrato con gaceta ord. 004 de febrero del 202'	$256.000
Total	**$20.328.500**
Total a Pagar	**$20.328.500**

Con destino a: Gobernación de Huila - NEIVA

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 9008174090
Nombre CIVCOL SAS
Teléfono

(415)7709998017207(8020)041025000404 51(3900)00000020328500(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO	2.796.680.243
FECHA CONTRATO	17/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	501.697.386
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	501.697.386
NRO. CONTRATO	12

Banco de Occidente efecty Punto Pago puntored SuChance pse

Formato RE.OP-10L 18/07/2025 V 0.1

Soporte trámite

Gobernación del Huila

Recibo oficial de pago de rentas varias

Recibo Nº 4102500040451

Fecha de Expedición 2025/12/22 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA-EXCEPCION 41

(2%) - Pro Desarrollo	$10.034.000
(1,50%) - Pro Cultura	$7.525.000
(0,50%) - Pro Desarrollo Universidad Surcolombiana	$2.508.000
(100) - Venta de bienes y servicios	$5.500
(100) - Contrato con gaceta ord. 004 de febrero del 202'	$256.000
Total	**$20.328.500**
Total a Pagar	**$20.328.500**

Con destino a: Gobernación de Huila - NEIVA

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 9008174090
Nombre CIVCOL SAS
Teléfono

(415)7709998017207(8020)041025000404 51(3900)00000020328500(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO	2.796.680.243
FECHA CONTRATO	17/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	501.697.386
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	501.697.386
NRO. CONTRATO	12

Banco de Occidente efecty Punto Pago puntored SuChance pse

Formato RE.OP-10L 18/07/2025 V 0.1

Soporte Entidad

Gobernación del Huila

Recibo oficial de pago de rentas varias

Recibo Nº 4102500040451

Fecha de Expedición 2025/12/22 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA-EXCEPCION 41

(2%) - Pro Desarrollo	$10.034.000
(1,50%) - Pro Cultura	$7.525.000
(0,50%) - Pro Desarrollo Universidad Surcolombiana	$2.508.000
(100) - Venta de bienes y servicios	$5.500
(100) - Contrato con gaceta ord. 004 de febrero del 202'	$256.000
Total	**$20.328.500**
Total a Pagar	**$20.328.500**

Con destino a: Gobernación de Huila - NEIVA

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 9008174090
Nombre CIVCOL SAS
Teléfono

(415)7709998017207(8020)041025000404 51(3900)00000020328500(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO	2.796.680.243
FECHA CONTRATO	17/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	501.697.386
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	501.697.386
NRO. CONTRATO	12

Banco de Occidente efecty Punto Pago puntored SuChance pse

Formato RE.OP-10L 18/07/2025 V 0.1

miércoles, 10 de diciembre de 2025	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, oficial
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Frente 1	Instalación de señales de tránsito
Frente 3	Instalación de señales de tránsito
Observaciones:	Solicitado por interventoría iniciar ejecución tramos faltantes
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría (Fabio Mejia)

jueves, 11 de diciembre de 2025	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, oficial
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Frente 5	Instalación de señales de tránsito
Frente 6	Instalación de señales de tránsito
Observaciones:	Solicitado por interventoría iniciar ejecución tramos faltantes
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría (Fabio Mejia)

viernes, 12 de diciembre de 2025	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, oficial
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Frente 7	Instalación de señales de tránsito
Frente 8	Instalación de señales de tránsito
Observaciones:	Solicitado por interventoría iniciar ejecución tramos faltantes
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría (Fabio Mejia)

sábado, 13 de diciembre de 2025	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, oficial
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Frente 9	Instalación de señales de tránsito
Frente 10	Instalación de señales de tránsito
Observaciones:	Solicitado por interventoría iniciar ejecución tramos faltantes
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría (Fabio Mejia)

domingo, 14 de diciembre de 2025

Clima:	soleado
Personal contratista:	NA
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Sin actividades día domingo.	
Observaciones:	NA

Firmas:

Residente de obra

Fabio Mejia
Residente de interventoría

lunes, 15 de diciembre de 2025

Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, oficial
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Frente 12	Instalación de señales de tránsito
Frente 13	Instalación de señales de tránsito
Observaciones:	Solicitado por interventoría iniciar ejecución tramos faltantes

Firmas:

Residente de obra

Fabio Mejia
Residente de interventoría

martes, 16 de diciembre de 2025

Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, oficial
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Frente 14	Instalación de señales de tránsito
Observaciones:	Solicitado por interventoría iniciar ejecución tramos faltantes

Firmas:

Residente de obra

Fabio Mejia
Residente de interventoría

miércoles, 17 de diciembre de 2025

Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, oficial
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Frente 15	Instalación de señales de tránsito
Observaciones:	Solicitado por interventoría iniciar ejecución tramos faltantes

Firmas:

Residente de obra

Fabio Mejia
Residente de interventoría

jueves, 18 de diciembre de 2025	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 3	Excavación chaflanes, demolición estructuras en concreto
Frente 5	Demolición estructuras en concreto, construcción de sumideros
Frente 6	Demolición estructuras en concreto, construcción de sumideros
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra / Fabio Mejia Residente de interventoría

viernes, 19 de diciembre de 2025	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 3	Excavación chaflanes, demolición estructuras en concreto
Frente 5	Demolición estructuras en concreto, construcción de sumideros
Frente 6	Demolición estructuras en concreto, construcción de sumideros
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra / Fabio Mejia Residente de interventoría

sábado, 20 de diciembre de 2025	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 3	Excavación chaflanes, demolición estructuras en concreto
Frente 5	Demolición estructuras en concreto, construcción de sumideros
Frente 6	Demolición estructuras en concreto, construcción de sumideros
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra / Fabio Mejia Residente de interventoría

domingo, 21 de diciembre de 2025	
Clima:	soleado
Personal contratista:	NA
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Frente 1	
Observaciones:	NA
Firmas:	Residente de obra / Fabio Mejia Residente de interventoría

lunes, 22 de diciembre de 2025	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 3	concreto para pozos de inspección de alcantarillado, construcción de sumideros
Frente 7	Se realiza nivelación de pozos de inspección, demolición estructuras en concreto, afirmado relleno espaldón bordillo
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra / Fabio Mejia Residente de interventoría

martes, 23 de diciembre de 2025	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 3	concreto para pozos de inspección de alcantarillado, construcción de sumideros
Frente 7	Se realiza nivelación de pozos de inspección, demolición estructuras en concreto, afirmado relleno espaldón bordillo
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra / Fabio Mejia Residente de interventoría

miércoles, 24 de diciembre de 2025

Clima:	soleado
Personal contratista:	NA
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Cese de actividades por solicitud de la comunidad	
Observaciones:	NA

Firmas:

Residente de obra

Residente de interventoría

jueves, 25 de diciembre de 2025

Clima:	soleado
Personal contratista:	NA
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Sin actividades por festivo.	
Observaciones:	NA

Firmas:

Residente de obra

Residente de interventoría

viernes, 26 de diciembre de 2025

Clima:	soleado
Personal contratista:	NA
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Cese de actividades por solicitud de la comunidad	
Observaciones:	NA

Firmas:

Residente de obra

Residente de interventoría

sábado, 27 de diciembre de 2025

Clima:	soleado
Personal contratista:	NA
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Cese de actividades por solicitud de la comunidad	
Observaciones:	NA

Firmas:

Residente de obra

Residente de interventoría

domingo, 28 de diciembre de 2025	
Clima:	soleado
Personal contratista:	NA
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Frente 1	
Observaciones:	NA
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría: Fabio Mejia

lunes, 29 de diciembre de 2025	
Clima:	soleado
Personal contratista:	NA
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Cese de actividades por solicitud de la comunidad	
Observaciones:	NA
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría: Fabio Mejia

martes, 30 de diciembre de 2025	
Clima:	soleado
Personal contratista:	NA
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Cese de actividades por solicitud de la comunidad	
Observaciones:	NA
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría: Fabio Mejia

miércoles, 31 de diciembre de 2025	
Clima:	soleado
Personal contratista:	NA
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Cese de actividades por solicitud de la comunidad	
Observaciones:	NA
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría: Fabio Mejia

jueves, 1 de enero de 2026

Clima: soleado
Personal contratista: NA
Maquinaria: NA
Actividades:
Sin actividades por festivo.
Observaciones: NA

Firmas:
Residente de obra
Fabio Mejia
Residente de interventoría

viernes, 2 de enero de 2026

Clima: soleado
Personal contratista: NA
Maquinaria: NA
Actividades:
Cese de actividades por solicitud de la comunidad
Observaciones: NA

Firmas:
Residente de obra
Fabio Mejia
Residente de interventoría

sábado, 3 de enero de 2026

Clima: soleado
Personal contratista: NA
Maquinaria: NA
Actividades:
Cese de actividades por solicitud de la comunidad
Observaciones: NA

Firmas:
Residente de obra
Fabio Mejia
Residente de interventoría

domingo, 4 de enero de 2026

Clima: soleado
Personal contratista: NA
Maquinaria: NA
Actividades:
Frente 1
Observaciones: NA

Firmas:
Residente de obra
Fabio Mejia
Residente de interventoría

lunes, 5 de enero de 2026

Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 7	Fundición de placa de concreto, construcción de bordillo, construcción de filtro, construcción de sumideros
Frente 8	Demolición estructuras en concreto, construcción de filtro, construcción de sumideros
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra — Residente de interventoría (Fabio Mejia)

martes, 6 de enero de 2026

Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 7	Fundición de placa de concreto, construcción de bordillo, construcción de filtro, construcción de sumideros
Frente 8	Demolición estructuras en concreto, construcción de filtro,
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra — Residente de interventoría (Fabio Mejia)

miércoles, 7 de enero de 2026

Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 7	Fundición de placa de concreto, construcción de bordillo, construcción de filtro, construcción de sumideros
Frente 8	Demolición estructuras en concreto, construcción de filtro, construcción de sumideros
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra — Residente de interventoría (Fabio Mejia)

jueves, 8 de enero de 2026	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 7	Fundición de placa de concreto, construcción de bordillo, construcción de filtro, construcción de sumideros
Frente 8	Demolición estructuras en concreto, construcción de filtro, construcción de sumideros
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra — Fabio Mejia — Residente de interventoría

viernes, 9 de enero de 2026	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 10	Se realiza nivelación de pozos de inspección, demolición estructuras en concreto, relleno en afirmado tubería sumideros
Frente 13	Excavación chaflanes, se realiza nivelación de pozos de inspección,
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra — Fabio Mejia — Residente de interventoría

sábado, 10 de enero de 2026	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 10	Se realiza nivelación de pozos de inspección, demolición estructuras
Frente 13	Excavación chaflanes, se realiza nivelación de pozos de inspección,
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra — Fabio Mejia — Residente de interventoría

domingo, 11 de enero de 2026	
Clima:	soleado
Personal contratista:	NA
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Frente 1	
Observaciones:	NA
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría

lunes, 12 de enero de 2026	
Clima:	soleado
Personal contratista:	NA
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Sin actividades por festivo.	
Observaciones:	NA
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría

martes, 13 de enero de 2026	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 10	Se realiza nivelación de pozos de inspección, demolición estructuras
Frente 13	Excavación chaflanes, se realiza nivelación de pozos de inspección,
Frente 14	Excavación tramo, pozos de inspección de alcantarillado, sumideros,
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría

miércoles, 14 de enero de 2026	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 10	Fundición de placa de concreto, construcción de bordillo,
Frente 13	Fundición de placa de concreto, construcción de bordillo,
Frente 14	Excavación tramo, pozos de inspección de alcantarillado, sumideros,
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría

jueves, 15 de enero de 2026	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 10	Fundición de placa de concreto, construcción de bordillo,
Frente 12	Demolición estructuras en concreto, concreto sumidero,
Frente 13	Fundición de placa de concreto, construcción de bordillo,
Frente 14	Excavación tramo, pozos de inspección de alcantarillado, sumideros,
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría (Fabio Mejía)

viernes, 16 de enero de 2026	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 10	Fundición de placa de concreto, construcción de bordillo,
Frente 12	Demolición estructuras en concreto, concreto sumidero,
Frente 13	Fundición de placa de concreto, construcción de bordillo,
Frente 14	Excavación tramo, pozos de inspección de alcantarillado, sumideros,
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría (Fabio Mejía)

sábado, 17 de enero de 2026	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 10	Fundición de placa de concreto, construcción de bordillo, construcción de sumideros
Frente 12	Demolición estructuras en concreto, concreto sumidero, construcción de sumideros
Frente 13	Fundición de placa de concreto, construcción de bordillo, construcción de filtro, construcción de sumideros
Frente 14	Fundición de placa de concreto, construcción de bordillo, construcción de sumideros
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría (Fabio Mejía)

domingo, 18 de enero de 2026	
Clima:	soleado
Personal contratista:	NA
Maquinaria:	NA
Actividades:	
Frente 1	
Observaciones:	NA
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría

lunes, 19 de enero de 2026	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 14	Fundición de placa de concreto, construcción de bordillo, construcción de sumideros
Frente 15	Demolición estructuras en concreto, construcción de sumideros
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría

martes, 20 de enero de 2026	
Clima:	lluvia
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 14	Fundición de placa de concreto, construcción de bordillo, construcción de sumideros
Frente 15	Demolición estructuras en concreto, construcción de sumideros
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra / Residente de interventoría

miércoles, 21 de enero de 2026	
Clima:	soleado
Personal contratista:	Residente de obra, comisión topografía, operarios de maquinaria, oficial
Maquinaria:	3 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora de llantas, 1 excavadora de oruga, 1 vibrocompactador
Actividades:	
Frente 14	Fundición de placa de concreto, construcción de bordillo, construcción de sumideros
Frente 15	Demolición estructuras en concreto, construcción de sumideros
Observaciones:	
Firmas:	Residente de obra / Fabio Mesa — Residente de interventoría

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERO, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 6 de 2024



INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERO, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 6 de 2024

ELABORÓ:

ING. FABIO MEJIA MEDINA

Residente de Interventoría

APROBÓ:

ARQ. JAVIER FELIPE CASAS

Representante legal de interventoría

Gobernación del Huil-

PITALITO (HUILA)
ENERO 2026.

72

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

TABLA DE CONTENIDO

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 5
3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 6
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
5. FINALIDAD DEL PROYECTO 9
6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
7. ACTAS DEL PROYECTO Y ESTADO DE CUENTAS DEL PROYECTO 11
   7.1 ACTAS DE OBRA 11
   7.2 ACTAS DE INTERVENTORIA 11
8. CURVA S - PROGRAMACION 14
9. CONTROL Y AJUSTE DE LA PROGRAMACION Y AVANCE 16
10. PROGRAMACION DE OBRA 19
11. BALANCE DE OBRA 23
12. ENSAYOS 31
13. ITEMS NO PREVISTOS 34
14. DETALLE DE ACTIVIDADES 35
15. REGISTRO FOTOGRAFICO 42
17. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA 50
18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 50

1. INTRODUCCIÓN

Una vía urbana se define como una vía pública dentro de una población bien sea un pueblo o una ciudad. En este contexto, la planificación, mantenimiento y mejora de las vías urbanas se revela en este sentido la calidad de vida de una sociedad.

El presente informe mensual correspondiente al proyecto de MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA, una iniciativa que busca transformar y mejorar significativamente la infraestructura vial de la comunidad del Municipio de Pitalito-Huila. Patrocinada por el programa fondo de regalías de la gobernación del Huila. El documento expuesto a continuación denota de los avances, superados y logros obtenidos durante el último mes, destacando el compromiso continuo con la excelencia y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

El presente documento constituye el informe mensual de Interventoría No. 07, periodo comprendido entre el 10 de diciembre de 2025 y 21 de enero de 2026, de conformidad a lo estipulado en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 6 de 2024 y demás anexos que hacen parte integral del contrato, dando cumplimiento al objeto contractual: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTYRATIVA, FINANCIERO, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

2. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato de Interventoría No.		6 de 2024
Objeto Contractual:		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTYRATIVA, FINANCIERO, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.
Valor Inicial Del Contrato De Interventoría		CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE IVA INCLUIDO ($166.297.871,00).
Valor Adicional (Modificación 01)		$ 36.353.738,79 M/TE
Valor Total Actualizado		$ 202.651.609,79 M/TE IVA INCLUIDO
Plazo Inicial		SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
Fecha de Inicio		15 DE ABRIL DE 2024.
Fecha de Terminación Inicial		14 DE NOVIEMBRE DE 2024.
Suspensión Temporal de Plazo 01		01 DE NOVIEMBRE DE 2024
Acta de Reinicio		10 DE DICIEMBRE DE 2025
Tiempo Total Suspendido		405 DIAS
Tiempo Adicional (Modificación 01)		DOS PUNTO CINCO (2,5) MESES
Nueva fecha de Terminación		04 DE MARZO DE 2026
Contratista		OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS
NIT		900923533-1
Representante Legal		ARQ. JAVIER FELIPE CASAS CASTRO
Director de interventoria		ING. YICELA YASMIN MEDINA
Residente de interventoria		ING. FABIO MEJIA MEDINA

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.		012 DE 2024
Objeto Contractual:		MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
Valor Inicial Del Contrato De Obra		DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($2.294.982.856,69).
Valor Adicional (Modificación 01) Obra		QUINIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/TE ($ 501.697.386,69).
Valor Total Actualizado **Plazo Inicial**		DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 2.796.680.243,38). SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
Fecha de Inicio		15 DE ABRIL DE 2024.
Fecha de Terminación Inicial		14 DE NOVIEMBRE DE 2024.
Suspensión Temporal de Plazo 01		01 DE NOVIEMBRE DE 2024
Acta de Reinicio		10 DE DICIEMBRE DE 2025
Tiempo Total Suspendido		405 DIAS
Tiempo Adicional (Modificación 01)		DOS PUNTO CINCO (2,5) MESES
Nueva fecha de Terminación		04 DE MARZO DE 2026
Contratista		CIVCOL SAS
NIT		900.817.409-0
Representante Legal		JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

Director de Obra		JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ
Residente de Obra		ABRAHAM ARAGON VASQUEZ

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para dar cumplimiento al plan de desarrollo "HUILA CRECE 2020-2023", en el sector: transporte, se estableció el programa HUILA CRECE EN INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL cuyo objeto es el de garantizar condiciones de movilidad vehicular en las vías a cargo del departamento en la conservación, rehabilitación y mejoramiento asegurando la conectividad entre los territorios y la integración de su región; fomentando el turismo y el agro. De igual manera apoyar a los 37 municipios del departamento mediante el mejoramiento de sus vías.

Para dar cumplimiento al programa HUILA CRECE EN INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL, Se logró celebrar el contrato que tiene como objeto "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA", el cual contempla la construcción de pavimento rígido de una longitud total de intervención de 1.6043 kilómetros con anchos variables y confinada con sardineles de concreto en ambos extremos , los tramos a intervenir son 15 tramos, 18 cuadras en los siguientes barrios del municipio de Pitalito – Huila.

77

TRAMO	DIRECCION	BARRIO	COMUNA
1	CALLE 3B ENTRE CARRERAS 5A ESTE Y 7 ESTE	VENECIA	2
2	CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 SUR Y 15 SUR	EL JARDIN	4
3	CALLE 13A ENTRE CARRERAS 7 Y 8	SUCRE	3
4	CALLE 19 SUR ENTRE CARRERAS 6 Y 7	SIGLO XXI	4
5	CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLES 2C SUR Y 2B SUR	VILLA CATARINA	2
6	TRANSVERSAL 4A ENTRE CALLES 12 SUR Y 14 SUR	JUAN PABLO II	4
7	CALLE 14 SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 5	JUAN PABLO II	4
8	CALLE 3A BIS ENTRE CARRERAS 16A Y 18	ALTOS DEL MAGDALENA	1
9	CALLE 2 SUR ENTRE CARRERAS 4 ESTE Y 5 ESTE	LAS VILLAS	2
10	CALLE 16 SUR ENTRE CARRERAS 2 Y 3	EL JARDIN SOLARTE	4
11	CARRERA 1 ENTRE CALLES 15 SUR Y 16 SUR	EL JARDIN	4
12	CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14	CAMBULOS	2
13	CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR	LA PRADERA	2
14	CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 9 ESTE Y 11 ESTE	LA PRADERA	2
15	CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 ESTE Y 7 ESTE	VENECIA	2

Para la ejecución del contrato y cumplimiento de su objeto contractual, se contemplan las siguientes actividades construcción de vía nueva en todos los tramos:

- Excavación a máquina (Cajeo).
- Retiro escombros a maquina <= 3 kms.
- Afirmado compactad0 3 km tipo INVIAS.
- Subbase compactada 3 km tipo INVIAS.
- Pavimento en concreto MR=39 E=entre 16 cms a 20cms
- bordillo en concreto fundido en sitio
- Refuerzos en hierro de 60.000PSI.
- Obras de drenaje tipo sumidero.
- Señalización vertical
- Marcación vial

De acuerdo al plazo contractual la duración total inicial del proyecto se ha planteado para 7 meses, para el contrato de obra y 7 meses para el contrato de Interventoría.

El contrato de obra tuvo una adición en valor por $ 501.697.386,69 y una prórroga en tiempo por 2,5 meses.

El presente informe tiene un periodo de cobertura inicial del 10 de diciembre de 2025 hasta el 21 de enero de 2026.


5. FINALIDAD DEL PROYECTO

Construcción de vías en concreto rígido MR=39 en las cuatro comunas y diferentes barrios en el municipio de Pitalito, en el departamento del Huila.

6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Huila, específicamente en el municipio de Pitalito, Zona Urbana, Barrios VENECIA, EL JARDIN, SUCRE, SIGLO XXI, VILLA CATARINA, JUAN PABLO II, ALTOS DEL MAGDALENA, LAS VILLAS, EL JARDIN-SOLARTE, CAMBULOS, LA PRADERA.

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

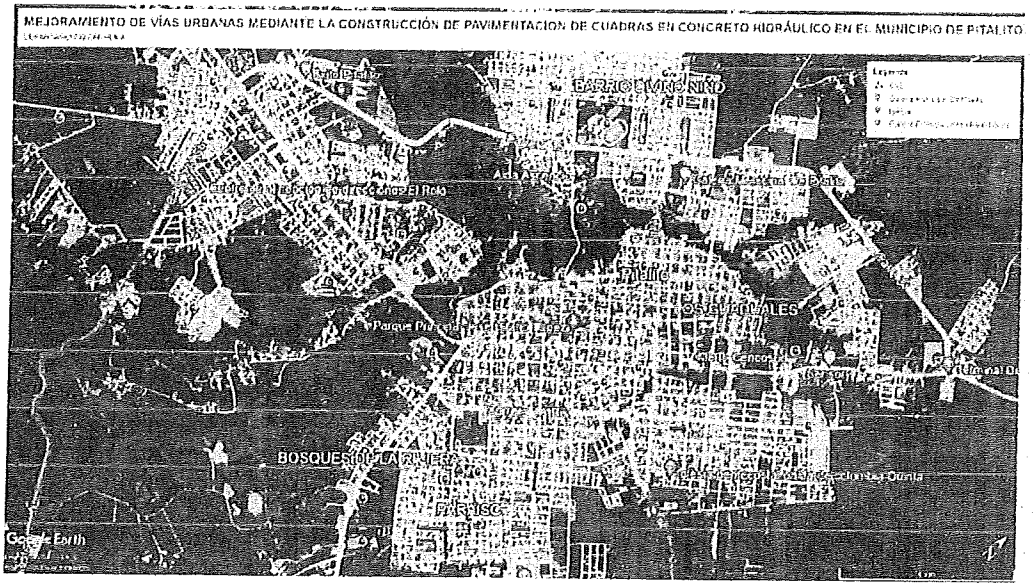

Localización y límites del municipio: El Municipio de Pitalito se localiza en el suroriente del Departamento del Huila con una extensión de 625,55 Km2 a unos 195 km de Neiva por una carretera en buenas condiciones y con un alto flujo de vehículos de transporte público y particular. Desde Bogotá es posible legar directamente por vía aérea. Pitalito limita por el norte con los Municipios de Saladoblanco y Elías; por el sur con el Municipio de Palestina y el Departamento del Cauca; por el oriente con el Municipio de Acevedo y por el occidente con los Municipios de Isnos y San Agustín.

Pitalito se ubica a los 1° 51' 07" de Latitud Norte y 76° 02' 14" de Longitud Oeste. De acuerdo a la nomenclatura del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" (IGAC), la zona urbana pertenece a la plancha topográfica 388 IV B a escala 1:25000. Pitalito está ubicado sobre el valle del Magdalena y en el vértice que forman as cordilleras central y oriental a 1.318 metros sobre el nivel del mar y una temperatura media de 18 y 212c; es considerado la Estrella Vial del Sur colombiano por su localización estratégica, que permite la comunicación con los Departamentos vecinos del Cauca, Caquetá y Putumayo.

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

7. ACTAS DEL PROYECTO Y ESTADO DE CUENTAS DEL PROYECTO

A la fecha del presente periodo de cobertura del informe mensual, el contratista de obra tramito el acta parcial de pago # 006, igualmente Interventoría tramito cuenta.

7.1 ACTAS DE OBRA


	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.294.982.856,69	100%
VALOR MODIFICACION 01	$ 501.697.386,69	21,86%
VALOR ACTUALIZADO	$ 2.796.680.243,38	100%
ACTAS PARCIALES		
ACTA PARCIAL 01	$ 210.920.882,27	9,19%
ACTA PARCIAL 02	$ 304.394.643,08	13.26%
ACTA PARCIAL 03	$ 231.232.057,73	10.08%
ACTA PARCIAL 04	$ 304.116.620,36	13.25%
ACTA PARCIAL 05	$ 331.497.854,66	14,44%
ACTA PARCIAL 06	$ 268.024.110,64	11,67%
VALOR TOTAL COBRADO	**$ 1.650.689.184,11**	71,92%

7.2 ACTAS DE INTERVENTORIA

	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INT	$ 166.297.871,00	100%
VALOR MODIFICACION 01	$ 36.353.738,79	21,86%
VALOR ACTUALIZADO	$ 202.651.609,79	100%
ACTAS PARCIALES		
ACTA PARCIAL 01	$ 15.282.774,34	9,19%
ACTA PARCIAL 02	$ 22.051.097,69	13,26%
ACTA PARCIAL 03	$ 16.762.825,39	10.08%
ACTA PARCIAL 04	$ 22.034.467,90	13.25%
ACTA PARCIAL 05	$ 24.013.412,57	14,44%

ACTA PARCIAL 06	$19.421.425,67	11,67%
VALOR TOTAL COBRADO	**$ 119.611.393,43**	71,92%

Curva "S" avance financiero contrato de obra. Con reprogramación vigente.

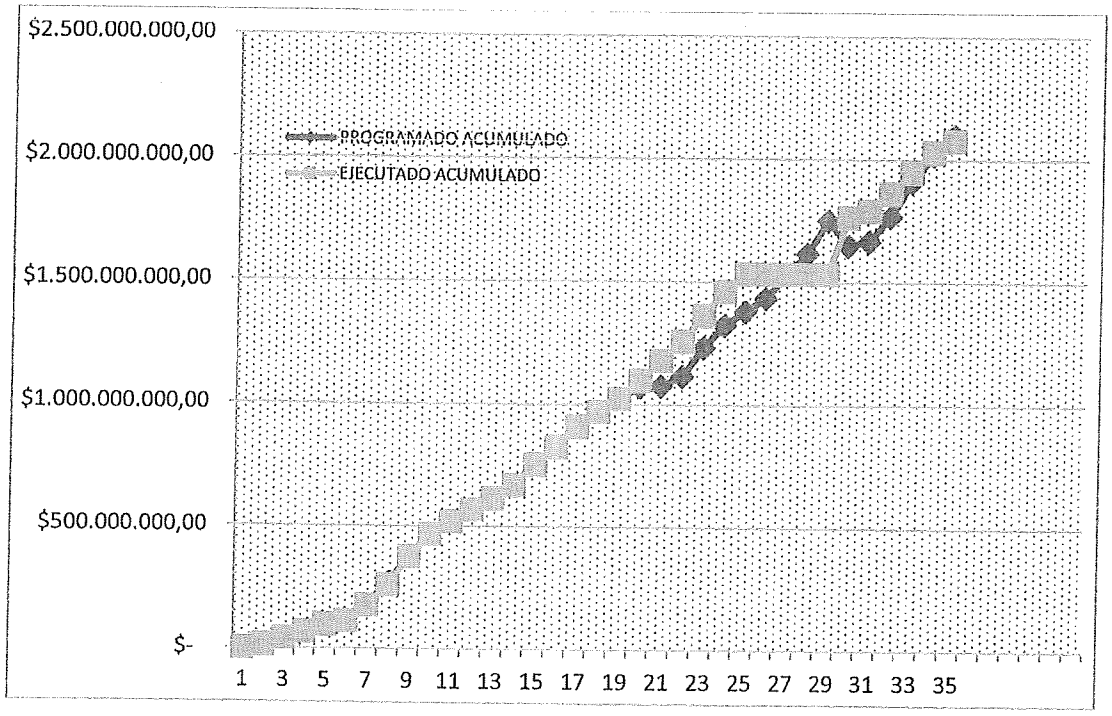

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

CANTIDADES FINANCIERA SEMANA				
SEMANA	REPROGRAMADO	REPROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 9.642.338,35	$ 9.642.338,35	$ -	$ -
2	$ 9.642.338,35	$ 19.284.676,70	$ 14.512.121,29	$ 14.512.121,29
3	$ 5.913.549,36	$ 25.198.226,06	$ 26.694.278,56	$ 41.206.399,85
4	$ 11.419.865,62	$ 36.618.091,68	$ 24.870.291,19	$ 66.076.691,04
5	$ 15.160.184,18	$ 51.778.275,86	$ 31.301.878,91	$ 97.378.569,95
6	$ 17.875.549,36	$ 69.653.825,22	$ 15.598.940,37	$ 112.977.510,32
7	$ 17.875.549,36	$ 87.529.374,59	$ 63.878.557,32	$ 176.856.067,64
8	$ 30.585.803,37	$ 118.115.177,95	$ 91.598.890,30	$ 268.454.957,94
9	$ 30.585.803,37	$ 148.700.981,32	$ 107.198.718,50	$ 375.653.676,44
10	$ 32.390.763,27	$ 181.091.744,60	$ 92.550.081,38	$ 468.203.757,82
11	$ 128.975.891,56	$ 310.067.636,16	$ 50.970.507,49	$ 519.174.265,31
12	$ 128.975.891,56	$ 439.043.527,72	$ 50.302.960,19	$ 569.477.225,50
13	$ 128.975.891,56	$ 568.019.419,28	$ 46.909.727,59	$ 616.386.953,09
14	$ 128.975.891,56	$ 696.995.310,84	$ 52.400.468,95	$ 668.787.422,04
15	$ 128.975.891,56	$ 825.971.202,40	$ 85.003.114,53	$ 753.790.536,57
16	$ 128.904.979,09	$ 954.876.181,49	$ 72.899.748,07	$ 826.690.284,64
17	$ 128.904.979,09	$ 1.083.781.160,58	$ 83.032.448,47	$ 909.722.733,11
18	$ 125.164.660,53	$ 1.208.945.821,11	$ 60.542.459,63	$ 970.265.192,74
19	$ 125.164.660,53	$ 1.334.110.481,63	$ 55.278.749,57	$ 1.025.543.942,31
20	$ 125.164.660,53	$ 1.459.275.142,16	$ 73.600.192,84	$ 1.099.144.135,15
21	$ 119.322.023,63	$ 1.578.597.165,79	$ 81.503.074,25	$ 1.180.647.209,40
22	$ 119.322.023,63	$ 1.697.919.189,43	$ 78.068.010,18	$ 1.258.715.219,58
23	$ 129.416.314,09	$ 1.827.335.503,52	$ 105.487.504,85	$ 1.364.202.724,43
24	$ 121.194.632,66	$ 1.948.530.136,17	$ 98.042.767,47	$ 1.462.245.491,90
25	$ 121.194.632,66	$ 2.069.724.768,83	$ 71.950.547,80	$ 1.534.196.039,70
26	$ 108.484.378,65	$ 2.178.209.147,49	$ 66.621.764,26	$ 1.600.817.803,96
27	$ 106.679.418,75	$ 2.284.888.566,23	$ 54.293.921,03	$ 1.655.111.724,99
28	$ 10.094.290,46	$ 2.294.982.856,69	$ 87.598.711,30	$ 1.742.710.436,29
29	$ -	$ 2.294.982.856,69	$ 43.260.539,40	$ 1.785.970.975,69
30	$ 1.163.292,54	$ 1.651.852.476,66	$ 1.398.340,12	$1.766.363.713,52


31	$ 17.426.426,53	$ 1.669.278.903,19	$ 27.966.802,43	$1.794.330.515,96
32	$ 101.856.143,67	$ 1.771.135.046,86	$ 69.917.006,08	$1.864.247.522,04
33	$ 140.970.231,39	$ 1.912.105.278,25	$ 86.697.087,54	$1.950.944.609,59
34	$ 109.641.873,01	$ 2.021.747.151,26	$ 81.103.727,06	$ 2.032.048.336,64
35	$ 78.976.534,56	$ 2.100.723.685,82	$ 27.407.466,39	$ 2.078.800.331,03

8. CURVA S - PROGRAMACION

PORCENTAJES SEMANA						
SEMANA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	15/04/2024	21/04/2024	0,420%	0,42%	0,00%	0,00%
2	22/04/2024	28/04/2024	0,420%	0,84%	0,63%	0,63%
3	29//04/2024	5/05/2024	0,258%	1,10%	1,16%	1,80%
4	6/05/2024	12/05/2024	0,498%	1,60%	1,08%	2,88%
5	13/05/2024	19/05/2024	0,661%	2,26%	1,36%	4,24%
6	20/05/2024	26/05/2024	0,779%	3,04%	0,68%	4,92%
7	27/05/2024	2/06/2024	0,779%	3,81%	2,78%	7,71%
8	3/06/2024	9/06/2024	1,333%	5,15%	3,99%	11,70%
9	10/06/2024	16/06/2024	1,333%	6,48%	4,67%	16,37%
10	17/06/2024	23/06/2024	1,411%	7,89%	4,03%	20,40%
11	24/06/2024	30/06/2024	5,620%	13,51%	2,22%	22,62%
12	1/07/2024	7/07/2024	5,620%	19,13%	2,19%	24,81%
13	8/07/2024	14/07/2024	5,620%	24,75%	2,04%	26,86%
14	15/07/2024	21/07/2024	5,620%	30,37%	2,28%	29,14%
15	22/07/2024	28/07/2024	5,620%	35,99%	3,70%	32,85%
16	29/07/2024	4/08/2024	5,617%	41,61%	3,18%	36,02%
17	5/08/2024	11/08/2024	5,617%	47,22%	3,62%	39,64%
18	12/08/2024	18/08/2024	5,454%	52,68%	2,64%	42,28%
19	19/08/2024	25/08/2024	5,454%	58,13%	2,41%	44,69%
20	26/08/2024	1/09/2024	5,454%	63,59%	3,21%	47,89%
21	2/09/2024	8/09/2024	5,199%	68,785%	3,551%	51,445%
22	9/09/2024	15/09/2024	5,199%	73,984%	3,402%	54,846%
23	16/09/2024	22/09/2024	5,639%	79,623%	4,596%	59,443%
24	23/09/2024	29/09/2024	5,281%	84,904%	4,272%	63,715%
25	30/09/2024	6/10/2024	5,281%	90,185%	3,135%	66,850%
26	7/10/2024	13/10/2024	4,727%	94,912%	2,903%	69,753%
27	14/10/2024	20/10/2024	4,648%	99,560%	2,366%	72,119%
2	21/10/2024	27/10/2024	0,440%	100,000%	3,817%	75,936%
29	28/10/2024	3/11/2024	0,000%	100,000%	1,885%	77,821%

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

30	10/12/2025	16/12/2025	0,05%	50,11%	0,05%	63,85%
31	17/12/2025	23/12/2025	0,76%	50,87%	1,00%	64,85%
32	24/12/2025	30/12/2025	4,44%	55,31%	2,50%	67,35%
33	31/12/2025	6/01/2026	6,14%	61,45%	3,10%	70,45%
34	7/01/2026	13/01/2026	4,78%	66,23%	2,90%	73,35%
35	14/01/2026	20/01/2026	3,44%	69,67%	0,98%	74,33%

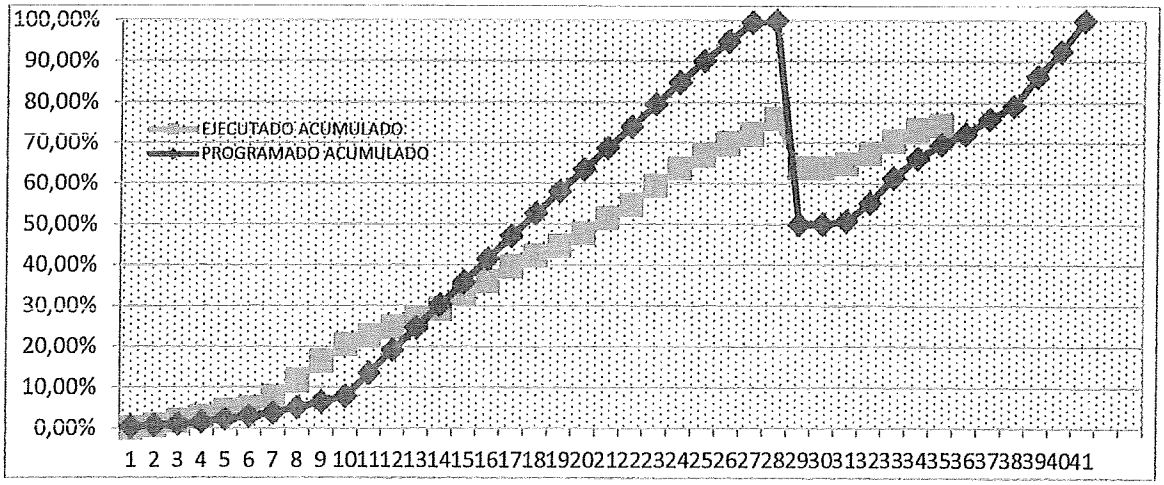

En esta reprogramación ya se tiene en cuenta la prórroga del contrato y adición en costos, se evidencia un 69,67% de actividades programadas acumuladas vs un 74,33% de actividades ejecutadas acumuladas a la fecha, presentando así un adelanto del 4,66% de acuerdo a la reprogramación presentada por el contratista.

9. CONTROL Y AJUSTE DE LA PROGRAMACION Y AVANCE


El contrato de obra dio inicio el día 15 de abril de 2024, con un plazo contractual de 7 meses.
El contrato se suspendió el 01 de noviembre de 2024 y se reinicio el 10 de diciembre de 2025.

A la fecha de corte del presente periodo de cobertura han trascurrido 243 días calendario para el contrato de obra.

CONTRATO DE OBRA			
FECHA DE INICIO	15-abril-2024		
FECHA INICIAL DE TERMINACION	14-noviembre-2024		
DURACION INICIAL	7 meses		
	DESDE	**HASTA**	**DURACION**
SUSPENSION	01/11/2024	09/12/2025	N/A
PRORROGA 01			2,5 MESES
ACTA DE REINICIO 01	10/12/2025	04/03/2026	2,5 MESES
TOTAL, DE DIAS SUSPENDIDOS	405 DIAS		
TIEMPO ADICIONADO MODIFICACION 01	2,5 MESES		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	04 de marzo de 2026.		
FECHA CORTE PRESENTE INFORME	21 de enero de 2026		
% TIEMPO TRANSCURRIDO	84,08 %		

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

TIEMPO TRANSCURRIDO

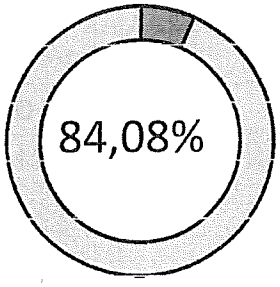

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se da inicio al contrato de interventoría el día 15 de abril de 2024, con un plazo contractual inicial de 7 meses.

El contrato se suspendió el 01 de noviembre de 2024 y se reinicio el 10 de diciembre de 2025.


A la fecha de corte del presente periodo de cobertura han trascurrido 243 días calendario para el contrato de obra.

CONTRATO DE INTERVENTORIA				
FECHA DE INICIO		15-abril-2024		
FECHA INICIAL DE TERMINACION		14-noviembre-2024		
DURACION		7 MESES		
		DESDE	**HASTA**	**DURACION**

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

SUSPENSION	01/11/2024	09/12/2025	N/A
PRORROGA 01			2,5 MESES
ACTA DE REINICIO 01	10/12/2025	04/03/2026	2,5 MESES
TOTAL, DE DIAS SUSPENDIDOS	405 DIAS		
TIEMPO ADICIONADO MODIFICACION 01	2,5 MESES		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	04 de marzo de 2026.		
FECHA CORTE PRESENTE INFORME	21 de enero de 2026		
% TIEMPO TRANSCURRIDO	84,08 %		

TIEMPO TRANSCURRIDO

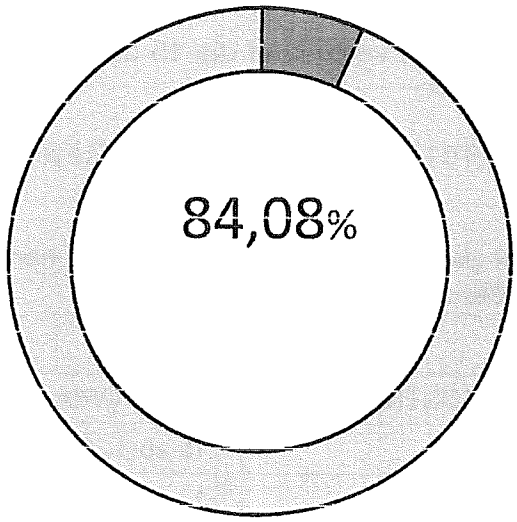


	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

10. PROGRAMACION DE OBRA

SEM	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO
1	15/04/2024	21/04/2024	0,420%	0,42%
2	22/04/2024	28/04/2024	0,420%	0,840%
3	29//04/2024	5/05/2024	0,258%	1,098%
4	6/05/2024	12/05/2024	0,498%	1,596%
5	13/05/2024	19/05/2024	0,661%	2,256%
6	20/05/2024	26/05/2024	0,779%	3,035%
7	27/05/2024	2/06/2024	0,779%	3,814%
8	3/06/2024	9/06/2024	1,333%	5,147%
9	10/06/2024	16/06/2024	1,333%	6,479%
10	17/06/2024	23/06/2024	1,411%	7,891%
11	24/06/2024	30/06/2024	5,620%	13,511%
12	1/07/2024	7/07/2024	5,620%	19,131%
13	8/07/2024	14/07/2024	5,620%	24,750%
14	15/07/2024	21/07/2024	5,620%	30,370%
15	22/07/2024	28/07/2024	5,620%	35,990%
16	29/07/2024	4/08/2024	5,617%	41,607%
17	5/08/2024	11/08/2024	5,617%	47,224%
18	12/08/2024	18/08/2024	5,454%	52,678%
19	19/08/2024	25/08/2024	5,454%	58,132%
20	26/08/2024	1/09/2024	5,454%	63,585%
21	2/09/2024	8/09/2024	5,199%	68,785%
22	9/09/2024	15/09/2024	5,199%	73,984%
23	16/09/2024	22/09/2024	5,639%	79,623%
24	23/09/2024	29/09/2024	5,281%	84,904%
25	30/09/2024	6/10/2024	5,281%	90,185%
26	7/10/2024	13/10/2024	4,727%	94,912%

27	14/10/2024	20/10/2024	4,648%	99,560%
28	21/10/2024	27/10/2024	0,440%	100,000%
29	28/10/2024	3/11/2024	0,00%	100,00%
30	4/11/2024	10/11/2024	0,00%	100,00%
30	10/12/2025	16/12/2025	0,00%	100,00%
31	17/12/2025	23/12/2025	0,76%	50,87%
32	24/12/2025	30/12/2025	4,44%	55,31%
33	31/12/2025	6/01/2026	6,14%	61,45%
34	7/01/2026	13/01/2026	4,78%	66,23%

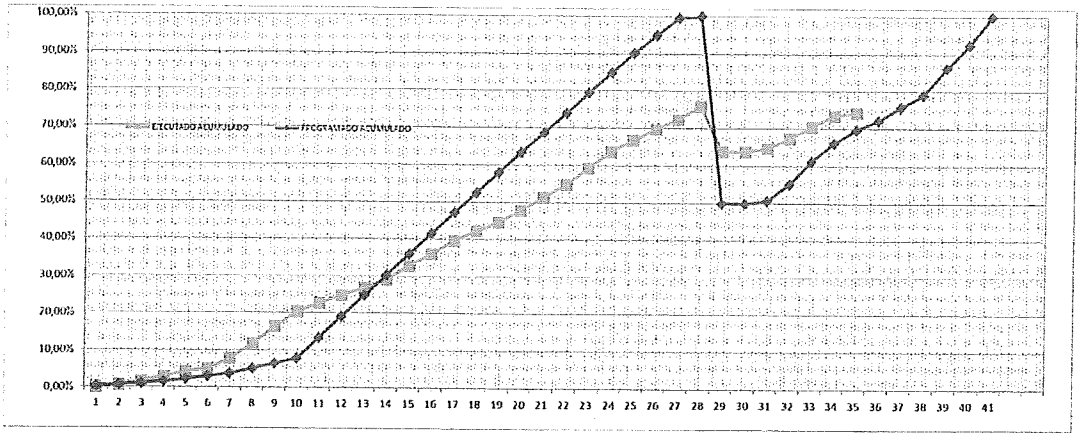


	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

CANTIDADES FINANCIERAS		
SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO
1	$ 9.642.338,35	$ 9.642.338,35
2	$ 9.642.338,35	$ 19.284.676,70
3	$ 5.913.549,36	$ 25.198.226,06
4	$ 11.419.865,62	$ 36.618.091,68
5	$ 15.160.184,18	$ 51.778.275,86
6	$ 17.875.549,36	$ 69.653.825,22
7	$ 17.875.549,36	$ 87.529.374,59
8	$ 30.585.803,37	$ 118.115.177,95
9	$ 30.585.803,37	$ 148.700.981,32
10	$ 32.390.763,27	$ 181.091.744,60
11	$ 128.975.891,56	$ 310.067.636,16
12	$ 128.975.891,56	$ 439.043.527,72
13	$ 128.975.891,56	$ 568.019.419,28
14	$ 128.975.891,56	$ 696.995.310,84
15	$ 128.975.891,56	$ 825.971.202,40
16	$ 128.904.979,09	$ 954.876.181,49
17	$ 128.904.979,09	$ 1.083.781.160,58
18	$ 125.164.660,53	$ 1.208.945.821,11
19	$ 125.164.660,53	$ 1.334.110.481,63
20	$ 125.164.660,53	$ 1.459.275.142,16
21	$ 119.322.023,63	$ 1.578.597.165,79
22	$ 119.322.023,63	$ 1.697.919.189,43
23	$ 129.416.314,09	$ 1.827.335.503,52
24	$ 121.194.632,66	$ 1.948.530.136,17
25	$ 121.194.632,66	$ 2.069.724.768,83
26	$ 108.484.378,65	$ 2.178.209.147,49

27	$ 106.679.418,75	$ 2.284.888.566,23
28	$ 10.094.290,46	$ 2.294.982.856,69

29	$ -	$ 1.650.669.184,12
30	$ 1.163.292,54	$ 1.651.852.476,66
31	$ 17.426.426,53	$ 1.669.278.903,19
32	$ 101.856.143,67	$ 1.771.135.046,86
33	$ 140.970.231,39	$ 1.912.105.278,25
34	$ 109.641.873,01	$ 2.021.747.151,26
35	$ 78.976.534,56	$ 2.100.723.685,82

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

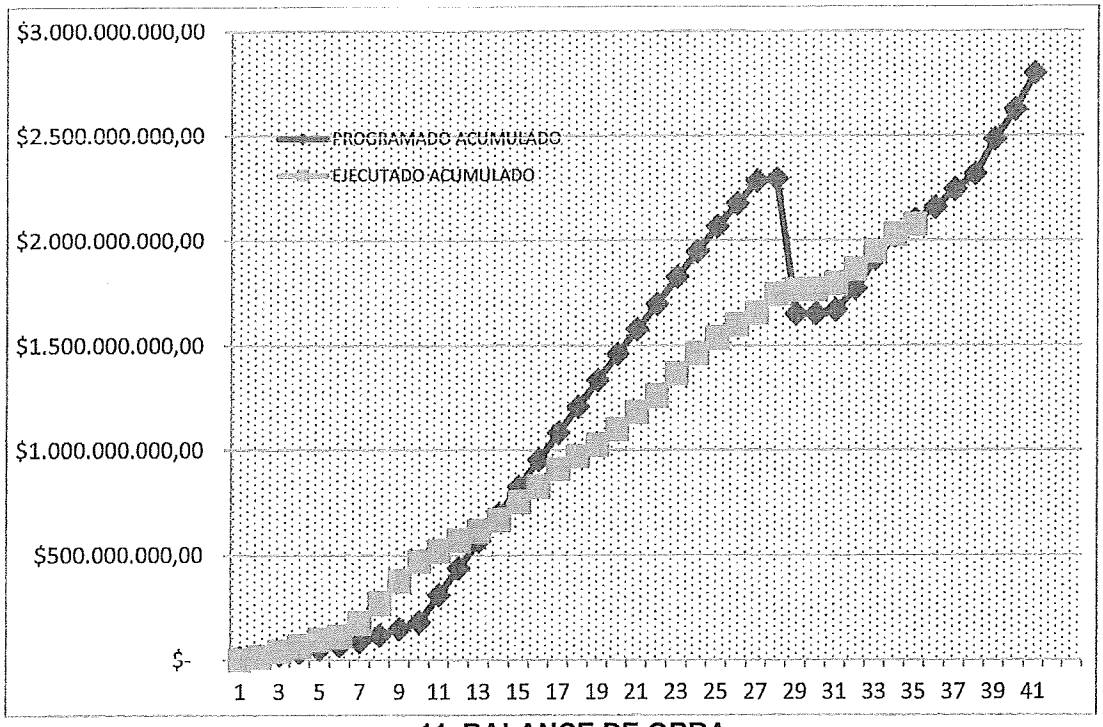

11. BALANCE DE OBRA

Se presentó un balance nuevo de acuerdo al replanteo y actividades nuevas que se han encontrado en el proceso de ejecución del mismo; necesitándose de una adición y prorroga al contrato de obra e interventoria, el cual fue aprobado por la interventoria y posteriormente fue aprobado por la entidad contratante, lo que se oficializo mediante un otrosi No. 1 de fecha 18 de diciembre de 2025.

CONDICIONES ACTUALES					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	V/UNIT CON AIU	CANT.	V/TOTAL
1	PRELIMINARES				

1,1	Trazado, Localización y Replanteo.	m2	$ 1.961,00	9579,38	$ 18.785.154,38
1,2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales. Incluye transporte.	m3	$ 18.393,00	7705,55	$ 141.728.191,98
1,3	Demolición, adecuación y reposición de pozos colectores alcantarillado, no incluye Tapa.	UND	$ 267.122,00	28,00	$ 7.479.416,00
NP1	Demolición de estructuras en concreto	m3	$ 198.266,00	9,17	$ 1.817.702,69
	SUBTOTAL				**$ 169.810.465,05**
2	**ESTRUCTURA**				
2,1	Afirmado en materiai granuiar proveniente de cantera de la zona.	m3	$ 62.494,00	2259,62	$ 141.212.948,51
2,2	Subbase granular clase A	m3	$ 150.746,00	1505,84	$ 226.999.122,98
2,31	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.16 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con	m3	$ 876.679,00	683,09	$ 598.651.008,78

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

	material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85 m separadas 1.2 m segun ancho de Carril, curado con Antisol				
2,32	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.17 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de	m3	$ 887.141,00	92,71	$ 82.247.001,80

	1/2" de diametro ,longitud 0.85 m separadas 1.2M segun ancho de Carril, curado con Antisol				
2,33	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.18 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85 m separadas 1.2 m segun ancho de Carril, curado con Antisol	m3	$ 896.033,00	532,27	$ 476.935.427,46

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

2,34	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesor 0.20 m, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 m., pasadores trasversales en hierro liso de 1" de diametro, longitud 0.35 m, espaciados cada 0.30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85 m separadas 1.2 m segun ancho de Carril, curado con Antisol	m3	$ 910.336,00	270,32	$ 246.082.027,52
2,4	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa para zonas de Losas Irregulares	kg	$ 10.965,00	27061,14	$ 296.725.427,51
2,5	Bordillo de Concreto de 3.000 PSI de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU.	m	$ 62.655,00	3308,65	$ 207.303.465,75
2,6	Transporte de materiales petreos para distancias	m3-km	$ 1.667,00	38612,80	$ 64.367.540,10

	mayore a 1.000 metros (Afirmado, Subbase, filtro)				
NP2	Corte de placa	m	$ 14.419,00	78,80	$ 1.136.217,20
NP3	Conformacion de sub rasante	m2	$ 2.098,00	9579,38	$ 20.097.528,75
	SUBTOTAL				**$ 2.361.957.716,36**
3	**OBRAS DE DRENAJE**				
3,1	Excavación Manual sin clasificar. Incluye Retiro.	m3	$ 41.197,00	577,39	$ 23.786.851,18
3,3	Sumidero en concreto clase D, 3.000 PSI, Cajilla de 0.90m x 0.90m. Incluye tubería de 12" PVC conectada a Pozo de Inspección del Sistema de Alcantarillado, Rejilla Plástica 0.40m x 0,70m y solado de limpieza.	UND	$ 1.706.549,00	0,00	$ 0,00
NP4	Filtro en geotextil no tejido de 0.40M x 0.60M, Incluye tubería drenaje 4"	m	$ 112.900,00	399,24	$ 45.074.196,00

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

NP5	Construcción de sumidero tipo B para evacuación de aguas lluvias en concreto impermeabilizado de 3000 PSI de dimensión de 1.36 X 0.6 m. externo, muros espesor de 0.13 m. Tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8" separados cada 0.09 en ambos sentidos y rejilla Plástica 0.40m x 0,70m. tabique desarenador. Incluye: producción, formaleta, vaciado, desencofrado, tubería PVC sanitaria 12", cama de grava y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	Und	$ 2.355.501,00	44,00	$ 103.642.044,00
	SUBTOTAL				**$ 172.503.091,18**
4	**SEÑALIZACION**				
4,1	Señal Vertical de tránsito tipo 1 con lamina	UND	$ 476.671,00	38,00	$ 18.113.498,00

	retrorreflectiva tipo III (0.75M x 0.75M).				
4,2	Marca Vial con Pintura en frio.	m2	$ 26.403,00	1310,93	$ 34.612.484,79
	SUBTOTAL				**$ 52.725.982,79**
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE EL IVA					**$ 2.756.997.255,38**
	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO P.M.T.				**$ 25.571.024,00**
	PLANDE MANEJO AMBIENTAL P.A.G.A.				**$ 14.111.964,00**
VALOR TOTAL					**$ 2.796.680.243,38**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.734.846.052,84**		**$ 2.120.767.119,52**
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	**24%**	$ 416.363.052,68	$ 508.984.108,68
COSTOS DE IMPREVISTOS	**1%**	$ 17.348.460,53	$ 21.207.671,20
COSTOS DE UTILIDAD	**5%**	$ 86.742.302,64	$ 106.038.355,98
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**30%**	**$ 520.453.815,85**	**$ 636.230.135,86**
PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO P.M.T.	**$ 25.571.024,00**		**$ 25.571.024,00**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL P.A.G.A.	**$ 14.111.964,00**		**$ 14.111.964,00**
VALOR TOTAL	**$ 2.294.982.856,69**		**$ 2.796.680.243,38**

Se realizo balance del contrato, encontrando que es necesario para el proyecto la adición de recursos y prorroga al mismo en tiempo, esto en aras de culminar al 100% el alcance físico del proyecto, el cual se aprobó con el otrosi No. 1 de fecha 18 de diciembre de 2025.

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

12. ENSAYOS

Se ha realizado seguimiento a los materiales respecto al control de calidad de los mismos, para lo cual se ha recibido y revisado el cumplimiento del plan de calidad de acuerdo a cada material utilizado en la obra.

Material de afirmado

Para el material de afirmado se recibió por parte del contratista los siguientes ensayos realizados para el material de afirmado de la zona proveniente de la planta de agregados buenos aires:

De acuerdo al CBR del material de afirmado, se han venido tomando las muestras de densidades del mismo para corroborar el cumplimiento del material.

Material de subbase granular

Para el material de subbase se recibió por parte del contratista los siguientes ensayos realizados para el material de la planta de agregados buenos aires:

De acuerdo al CBR del material de subbase, se tomaron las muestras de densidades del mismo para corroborar el cumplimiento del material.

Tubería pavco 12" para sumideros

Se solicito el certificado de la tubería al contratista, este certificado lo suministra el fabricante de la misma, en este caso tubosa SA, el cual se anexa, hasta el momento se han suministrado 4 tubos de 12" Novafort de 6 mts cada uno.

Acero de refuerzo

Se solicito el certificado del acero de refuerzo al contratista, este certificado lo suministra el fabricante de la misma, por medio de la ferretería que lo suministra.

Sidoc

REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TECHAR SAS
Sucursal:
Ciudad: Pitalito
Dirección:
Fecha Impresión: viernes, 21 de enero de 2024

CDP#: 165101
Placa: KUL101
Tiquete: 143.566
Despacho: 126.404
Tren: PONINI

Icontec Sistema de Calidad — NTC ISO 9001 Sistema completo y bien diligenciado, cumple con los requisitos de la norma.
Icontec Sistema Ambiental — El sistema implementado cumple con los requisitos de la norma que le aplica.
Icontec ISO 9001 — Certificado No. SC 6761.

Producto: Redondo Corrugado de (1/2) 12.7 mm — Área Nom. (mm2): 129.00 — Marcado: CDI SID 4 W 60 — Norma: NTC 2289 — Grado: 60 (420)

	PROPIEDADES MECANICAS					CARACTERISTICAS DIMENSIONALES						CARACTERISTICAS QUIMICAS											
Fecha Despacho / Colada	N° Rollo / Barra	Grado	Esfuerzo Fluencia (Mpa)	Esfuerzo Máximo (Mpa)	Relación (fu/fy)	% de Elong.	Cumple	Peso Lineal (kg/m)	Altura de Resalte (mm)	Espacio Promedio Resaltes (mm)	Espacio de Resalte (%)	Espacio entre Resaltes (mm)	C. Equiv.	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Ni	%Cr	%Mo	%Cu	%CE
02/01/2024	113218	300/34	437	640	1.43	16.00	SI	0.995	0.81	9.20	55	2.67	290.74	0.214	1.210	0.014	0.035	0.160	0.0001	0.230	0.003	0.015	0.410	0.024	0.503
02/01/2024	113219	300/34	436	635	1.39	16.00	SI	0.992	0.82	9.20	55	2.72	290.74	0.219	1.230	0.014	0.033	0.160	0.0001	0.230	0.002	0.015	0.411	0.024	0.445
05/01/2024	113220	300/34	441	645	1.43	16.00	SI	0.993	0.80	9.20	57	2.73	290.74	0.215	1.230	0.012	0.029	0.160	0.0001	0.230	0.002	0.015	0.411	0.024	0.502
Especificación Estándar		Mínimo	420	600	1.25	14	SI	0.935	0.51		45														0.570
		Máximo	540				NO			6.50	70	4.20		0.505	1.500	0.035	0.045	0.500							OK
		Verificación	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							

Producto: Redondo Corrugado de (3/4) 19.1 mm — Área Nom. (mm2): 284.00 — Marcado: CDI SID 6 W 60 — Norma: NTC 2289 — Grado: 60 (420)

	PROPIEDADES MECANICAS					CARACTERISTICAS DIMENSIONALES						CARACTERISTICAS QUIMICAS											
Fecha Despacho / Colada	N° Rollo / Barra	Grado	Esfuerzo Fluencia (Mpa)	Esfuerzo Máximo (Mpa)	Relación (fu/fy)	% de Elong.	Cumple	Peso Lineal (kg/m)	Altura de Resalte (mm)	Espacio Promedio Resaltes (mm)	Espacio de Resalte (%)	Espacio entre Resaltes (mm)	C. Equiv.	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Ni	%Cr	%Mo	%Cu	%CE
04/01/2024	113221	300/34	465	655	1.44	15.00	SI	2.774	1.28	17.50	52	5.50	267.03	0.227	1.215	0.010	0.032	0.230	0.0007	0.230	0.003	0.015	0.412	0.025	0.498
Especificación Estándar		Mínimo	420	550	1.25	14	SI	2.101	0.97		45														0.555
		Máximo	540				NO			13.50	70	7.30		0.300	1.600	0.035	0.045	0.600							OK
		Verificación	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							

Producto: Redondo Corrugado de (5/8) 15.87 mm — Área Nom. (mm2): 199.00 — Marcado: CDI SID 5 W 60 — Norma: NTC 2289 — Grado: 60 (420)

	PROPIEDADES MECANICAS					CARACTERISTICAS DIMENSIONALES						CARACTERISTICAS QUIMICAS											
Fecha Despacho / Colada	N° Rollo / Barra	Grado	Esfuerzo Fluencia (Mpa)	Esfuerzo Máximo (Mpa)	Relación (fu/fy)	% de Elong.	Cumple	Peso Lineal (kg/m)	Altura de Resalte (mm)	Espacio Promedio Resaltes (mm)	Espacio de Resalte (%)	Espacio entre Resaltes (mm)	C. Equiv.	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Ni	%Cr	%Mo	%Cu	%CE
03/01/2024	113222	300/45	447	650	1.45	17.00	SI	1.995	0.97	10.50	52	3.50	267.03	0.217	1.210	0.012	0.030	0.190	0.0001	0.230	0.002	0.015	0.410	0.025	0.490
Especificación Estándar		Mínimo	420	550	1.25	14	SI	1.435	0.71		45														0.555
		Máximo	540				NO			9.10	70	5.10		0.305	1.500	0.035	0.045	0.600							OK
		Verificación	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							

102

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

Sidoc

REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TECHAR SAS
Sucursal:
Ciudad: Pitalito
Dirección:
Fecha Impresión: viernes, 21 de enero de 2024

ODP#: 186101
Placa: KUL101
Tiquete: 143 006
Despacho: 128 404
Tren: POMINI RCLI

Producto: Redondo Corrugado de 9.0 mm

Área Nom. [cm2]: 0.637 — Norma: NTC 2289
Marcado: COL 50 2M W 420 — Grado: 60 [420]

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES					CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS											
Fecha Despacho y Ensayo	N° Rig. Rollo	Calidad	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Fy/Fu]	%Elon Ensay	%Elon	Peso Lineal [Kg/m]	Área Sección [cm2]	Diámetro Nominal [mm]	Corrugación Promedio [mm]	Separación Promedio [mm]	N° Rig. Corrugas	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE
15/01/2024	197440	60/420	421	626	1.49	17.0	10	0.499	0.59	9.0	0.6	7.5	10	0.215	0.930	0.012	0.005	0.129	0.012	0.210	0.030	0.012	0.011	0.425	0.456
Especificaciones Solicitadas		Mínimo	420	630	1.25	14	10	0.479	0.56		0.56		10												
		Máximo	540				NO				0.90		16	0.30	1.65	0.035	0.045	0.550						0.55
		Verificación	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Observaciones

Los métodos usados para la realización de los ensayos relacionados en este reporte de calidad fueron: NTC 2289 "Productos de acero laminados en caliente. Barras corrugadas y lisas para hormigón estructural. Especificaciones", NTC 161 "Ensayo de tracción", NTC 126 "Ensayo de doblamiento", NTC 3353 "Ensayo de composición química", NTC 2289 - NTC 1907 "Requisitos Dimensionales". Utilizo un procedimiento de inspección propio interno de complemento de los ensayos del laboratorio de acuerdo con la NTC 6570 "Plan de Inspección y Ensayo". SIDOC S.A.S. realiza el suplemento de los ensayos exigidos en la resolución 1826 de 2017 "Norma sismoresistente de cada edificación para edificios se deberán de cumplir los requisitos mínimos necesarios". Este informe no podrá reproducirse total o parcialmente sin autorización escrita del laboratorio (Sidoc y Cemtec S.A.S.). Los resultados de ensayos aquí reportados se refieren exclusivamente a los materiales recibidos, muestreados y/o ensayados por parte de la persona solicitante de SIDOC S.A.S.

FIN DEL REPORTE

NEIR ARLEX MOSQUERA
Asesora Técnica

HENRY BONILLA LOPEZ
Auxiliar Químico

Ing. EFREN RAMON
Jefe Técnico Control Calidad
Asesor de la Red

equipos topográficos

Igualmente, para el seguimiento de cantidades, diseños, cotas se está utilizando equipos topográficos por parte del contratista como son:

- estación total GEOMAX ZIPP10RPRO serie 2108537.
- nivel de precisión GEOMAX serie 303532.

Concreto hidráulico de pavimento

Se realizaron pruebas a las viguetas del pavimento hidráulico módulo de rotura MR-39, de las losas fundidas en el presente periodo.

13. ITEMS NO PREVISTOS

De acuerdo a la ejecución del proyecto y a los diseños entregados por la entidad contratante, se adicionaron los siguientes ítems, los cuales son:

- NP1 Demolición de estructuras en concreto (m3).
- NP2 Corte de placa (ml).
- NP3 Conformación de la subrasante (M2).
- NP4 Filtro en geotextil no tejido de 0.40M x 0.60M, Incluye tubería drenaje 4".
- NP5 Construcción de sumidero tipo B para evacuación de aguas lluvias en concreto impermeabilizado de 3000 PSI de dimensión de 1.36 X 0.6 m. externo, muros espesor de 0.13 m.

Los cuales fueron aprobados por la entidad contratante mediante el otrosi No. 1 de fecha 18 de diciembre de 2025.

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

14. DETALLE DE ACTIVIDADES

Del 10 al 14 de diciembre de 2025

10 diciembre de 2025
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 1:** instalación de señales de tránsito. **Frente 3:** instalación de señales de tránsito.
11 de diciembre de 2025
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 5:** instalación de señales de tránsito. **Frente 6:** instalación de señales de tránsito.
12 de diciembre de 2025
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 7:** instalación de señales de tránsito. **Frente 8:** instalación de señales de tránsito.
13 de diciembre de 2025
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 9:** instalación de señales de tránsito. **Frente 10:** instalación de señales de tránsito.
14 de diciembre de 2025
DOMINICAL

Del 15 al 21 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 12:** instalación de señales de tránsito. **Frente 13:** instalación de señales de tránsito.
16 de diciembre de 2025

Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 14:** instalación de señales de tránsito.
17 de diciembre de 2025
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 15:** instalación de señales de tránsito.
18 de diciembre de 2025
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 3:** se realizó excavación de chaflanes, demolición de estructura de concretos. **Frente 5:** se realizó demolición de estructuras de concreto, construcción de sumideros. **Frente 6:** se realizó demolición de estructuras de concreto, construcción de sumideros.
19 de diciembre de 2025
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 3:** se realizó excavación de chaflanes, demolición de estructura de concretos. **Frente 5:** se realizó demolición de estructuras de concreto, construcción de sumideros. **Frente 6:** se realizó demolición de estructuras de concreto, construcción de sumideros.
20 de diciembre de 2025
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 3:** se realizó excavación de chaflanes, demolición de estructura de concretos. **Frente 5:** se realizó demolición de estructuras de concreto, construcción de sumideros. **Frente 6:** se realizó demolición de estructuras de concreto, construcción de sumideros.
21 de diciembre de 2025

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

DOMINICAL

Del 22 al 28 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 3:** se realizo actividad de concreto para pozos de alcantarillado, construcción de sumideros. **Frente 7:** se realizó nivelación de pozos de inspección, demolición de estructuras en concreto, afirmado con relleno en espaldón de bordillo.
23 de diciembre de 2025
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 3:** se realizo actividad de concreto para pozos de alcantarillado, construcción de sumideros. **Frente 7:** se realizó nivelación de pozos de inspección, demolición de estructuras en concreto, afirmado con relleno en espaldón de bordillo.
24 de diciembre de 2025
No se realizó actividad, por solicitud de la comunidad.
25 de diciembre de 2025
No se realizó actividad, por ser día festivo.
26 de diciembre de 2025
No se realizó actividad, por solicitud de la comunidad.
27 de diciembre de 2025
No se realizó actividad, por solicitud de la comunidad.

26 de diciembre de 2025
DOMINICAL

Del 29 de diciembre de 2025 al 04 de enero de 2026

29 de diciembre de 2025
No se realizó actividad, por solicitud de la comunidad.
30 de diciembre de 2025
No se realizó actividad, por solicitud de la comunidad.
31 de diciembre de 2025
No se realizó actividad, por solicitud de la comunidad.
01 de enero de 2026
No se realizó actividad, por solicitud de la comunidad.
02 de enero de 2026
No se realizó actividad, por solicitud de la comunidad.
03 de enero de 2026
No se realizó actividad, por solicitud de la comunidad.
04 de enero de 2026
DOMINICAL

Del 05 al 11 de enero de 2026.

05 de enero de 2026
Se realizaron las siguientes actividades:


	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

Frente 7: se realizó fundición de placa de concretos, construcción de bordillos, construcción de filtro, construcción de sumideros. **Frente 8:** se realizó demolición de estructuras de concreto, construcción de filtro, construcción de sumideros.
06 de enero de 2026
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 7:** se realizó fundición de placa de concretos, construcción de bordillos, construcción de filtro, construcción de sumideros. **Frente 8:** se realizó demolición de estructuras de concreto, construcción de filtro.
07 de enero de 2026
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 7:** se realizó fundición de placa de concretos, construcción de bordillos, construcción de filtro, construcción de sumideros. **Frente 8:** se realizó demolición de estructuras de concreto, construcción de filtro, construcción de sumideros.
08 de enero de 2026
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 7:** se fundió placas de concreto, construcción de bordillos, construcción de filtro, construcción de sumideros. **Frente 8:** demolición de estructuras de concreto, construcción de filtro, construcción de sumideros.
09 de enero de 2026
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 10:** se realizó la nivelación de pozos de inspección, demolición de estructuras en concreto, relleno con afirmado para tubería de sumidero. **Frente 13:** excavación para chaflanes, nivelación de pozos de inspección.
10 de enero de 2026

Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 10:** se realizó la nivelación de pozos de inspección, demolición de estructuras en concreto. **Frente 13:** excavación para chaflanes, nivelación de pozos de inspección.
11 de enero de 2026
DOMINICAL
Del 12 al 18 de enero de 2026.
12 de enero de 2026
Dia festivo, no hubo actividad.
13 de enero de 2026
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 10:** nivelación de pozos de inspección, demolición de estructuras. **Frente 13:** excavación de chaflanes, nivelación pozos de inspección. **Frente 14:** Excavación sin clasificar, pozos de inspección de alcantarillado, sumideros.
14 de enero de 2026
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 10:** fundición de placa de concreto, construcción de bordillos. **Frente 13:** fundición de placa de concreto, construcción de bordillos. **Frente 14:** Excavación sin clasificar, pozos de inspección de alcantarillado, sumideros.
15 de enero de 2026
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 10:** fundición de placa de concreto, construcción de bordillos. **Frente 12:** demolición estructuras de concreto, fundición de sumideros. **Frente 13:** fundición de placa de concreto, construcción de bordillos. **Frente 14:** Excavación sin clasificar, pozos de inspección de alcantarillado, sumideros.
16 de enero de 2026
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 10:** fundición de placa de concreto, construcción de bordillos. **Frente 12:** demolición estructuras de concreto, fundición de sumideros.

Frente 13: fundición de placa de concreto, construcción de bordillos. **Frente 14:** Excavación sin clasificar, pozos de inspección de alcantarillado, sumideros.
17 de enero de 2026
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 10:** fundición de placa de concreto, construcción de bordillos, construcción de sumideros. **Frente 12:** demolición estructuras de concreto, fundición de sumideros. **Frente 13:** fundición de placa de concreto, construcción de bordillos, construcción de filtro, construcción de sumideros. **Frente 14:** fundición placas de concreto, construcción de bordillo, construcción de sumideros.
18 de enero de 2026
Dominical.
Del 19 al 21 de enero de 2026.
19 de enero de 2026
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 14:** fundición placas de concreto, construcción de bordillo, construcción de sumideros. **Frente 15:** demolición estructuras de concreto, fundición de sumideros.
20 de enero de 2026
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 14:** fundición placas de concreto, construcción de bordillo, construcción de sumideros. **Frente 15:** demolición estructuras de concreto, fundición de sumideros.
21 de enero de 2026
Se realizaron las siguientes actividades: **Frente 14:** fundición placas de concreto, construcción de bordillo, construcción de sumideros. **Frente 15:** demolición estructuras de concreto, fundición de sumideros.

15. REGISTRO FOTOGRAFICO

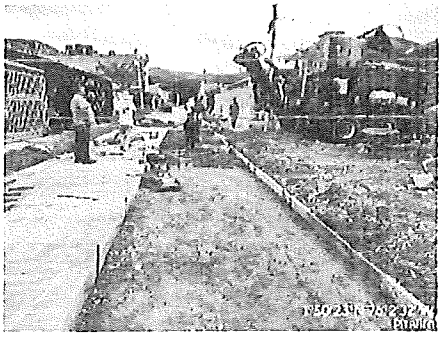








	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026







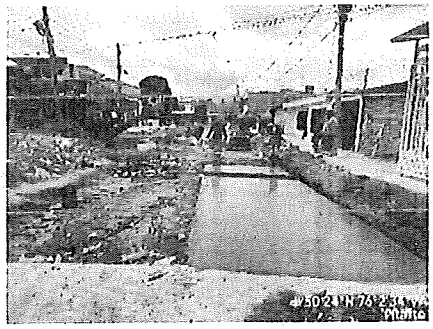



	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

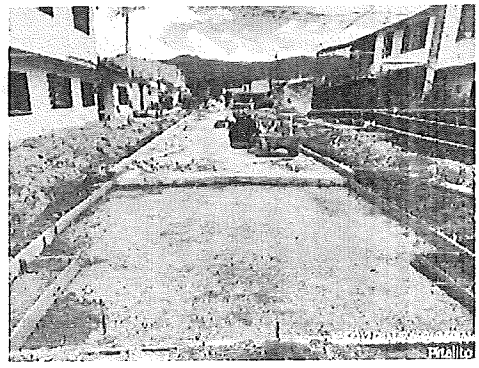

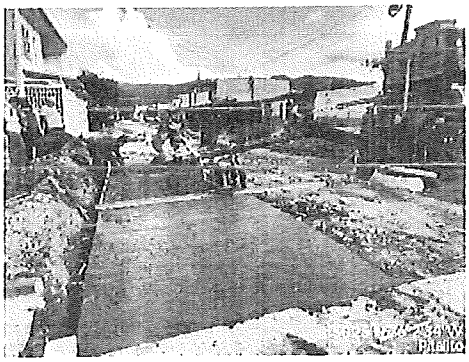





	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026














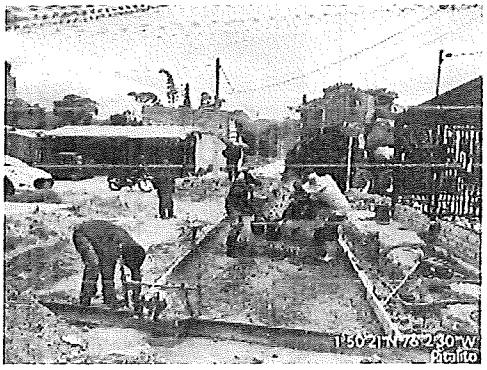


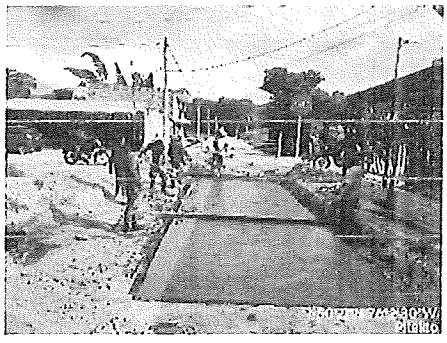





	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

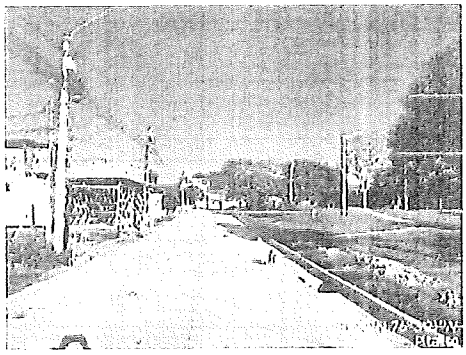

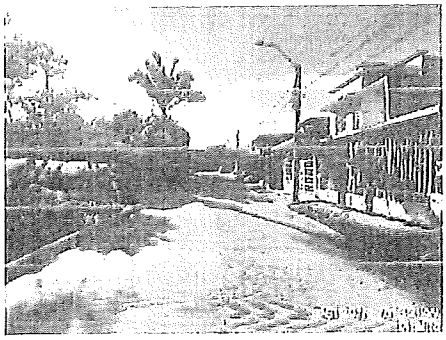



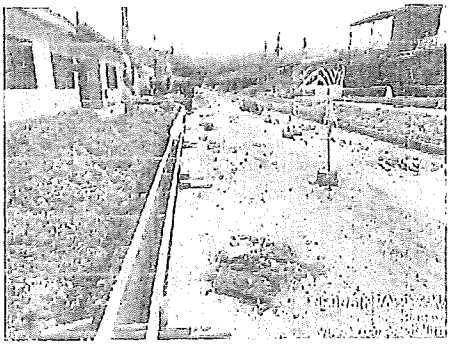

16. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PLANILLA SSO DICIEMBRE		
No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
1	JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA
2	ABRAHAM ARAGON VASQUEZ	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA
3	NATALIA TORO ANDRADE	PROFESIONAL HSEQ
4	JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ	ESPECIALISTA EN VIAS
5	JUAN FELIPE VALDERRAMA ESTEBAN	INSPECTOR DE OBRA
6	VALENTINA VIEDA CERQUERA	INSPECTOR DE OBRA
7	MILENA SANCHEZ OTALORA	SECRETARIA
8	LAURA FERNANDA BAUTISTA GARRIDO	ALMACENISTA

	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1		
	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"	CONTRATO No	06 de 2024
		GOBERNACION DEL HUILA	
INFORME MENSUAL # 7		FECHA	21 – 01 – 2026

PERSONAL SUBCONTRATADO-TOPOGRAFÍA		
No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
1	Jose Carlos Brito Espina	Comisión topográfica
2	John Fredy Lopez Ruiz	Comisión topográfica

PERSONAL SUBCONTRATADO-MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS		
No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
1	Juan Camilo Vargas Coy	Operador Volqueta
2	Cristian Mauricio Cruz Bolaños	Operador Volqueta
3	Diego Mauricio Cruz Molina	Operador Volqueta
4	Jairo Chavarro Castro	Operador Retroexcavadora
5	Pedro Pablo Roa Vargas	Operador Excavadora de Orugas
6	Deiber Guilombo Salcedo	Operador Vibrocompactador
7	Arlinson Castro Piamba	Oficial

17. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PERSONAL PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 6 DEL 2024				
1. PERSONAL PROFESIONAL				
CARGO	CANT	PROFESIONAL APROBADO	DEDICACION (%)	FECHA DE INGRESO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	Manuela Vallejo Corrales	30%	
INGENIERO RESIDENTE	1	Fabio Mejia Medina	100%	10/12/2025
profesional HSEQ	1	Sebastián Hernández Londoño	20%	20/05/2024
PROFESIONAL AMBIENTAL	1	Sebastián Hernández Londoño	20%	
TOPOGRAFO	1	Cesar Alejandro Losada	100%	
ESPECIALISTA EN VIAS	1	Manuela Vallejo Corrales	10%	
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1	Daniela Coy	100%	20/05/2024
SECRETARIA	1	Natalia Mossos	50%	

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. La Interventoría realiza control al procedimiento constructivo y calidad de materiales el contratista cumple con la dedicación de tiempo en la obra.
B. El contratista se encuentra al 84,08% del plazo del contrato.
C. El contratista presenta un adelanto en el avance de 4,66% con respecto al cronograma actual con el que se está evaluando el contrato.
D. Se ha cumplido con los requerimientos exigidos para comprobar la calidad del material, se solicitaron los ensayos de caracterización del material los cuales fueron aportados por el contratista y se encuentran consignados en los informes semanales y en este mismo informe.
E. Se han presentado roturas en las tuberías de acometidas domiciliarias de acueducto de ½" y de la red principal de acueducto de 4" debido a la poca profundidad que se encontraban esta las mismas lo cual era a 50 cm aproximadamente y la profundidad de la excavación según diseño entregado por la entidad contratante corresponde a 60 cm, sin embargo, los daños fueron reparados por el contratista de las acometidas

domiciliarias de acueducto de ½" , en la red principal de acueducto el contratista cuenta con el apoyo de la empresa de servicios públicos del municipio EMPITALITO.

F. La obra cuenta con los equipos y maquinaria necesarios para obtener los niveles de compactación requeridos en el material granular.

Bogotá, 21 de enero de 2026
Señores:
CIVCOL S.A.S.
Att: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ
Representante Legal
Ciudad

OBJETO: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.**

ASUNTO: APROBACION DE EJECUCION DE COSTOS DE ADMINISTRACION ACTA CORTE 7

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y en función de las actividades inherentes al contrato de interventoría No. 06 de 2024 que tiene como objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA; después de realizar la respectiva revisión a los documentos entregados por el contratista CIVCOL S.A.S., en los cuales se relacionaron los gastos de administración por el valor de $79.035.904, como se muestra a continuación:

COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE 2025
CONTRATO 012 PITALITO

Descripcion	Valor
Gastos de personal	30.407.329
Estampillas	20.238.500
Contribución Especial 5%	9.345.728
Pólizas	1.154.408
Transporte Personal	4.783.698
TOTAL	**65.929.663**

COSTOS ADMINSTRATIVOS DEL 01 AL 21 DE ENERO 2026
CONTRATO 012 PITALITO

Descripción	Valor
Gastos de personal	10.943.012
Transporte personal	1.663.229
Topografía	500.000
TOTAL	**13.106.241**

Se procede a realizar la aprobación de los gastos referentes a la administración para el acta No. 7 de obra, por el valor de $79.035.904.

Atentamente,

OBRAS Y CONSULTORÍAS ARTEK S.A.S.
Javier Felipe Casas
Representante Legal
Proyecto: Interventoría – Seguimiento administrativo
C.C. Copia carpeta contrato
