	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Consultoría No. 4227 DE 2024 **Consultoría:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

Contrato de Interventoría No. 4262 DE 2024 **Interventoría:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Objeto Contrato de Consultoría: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INFORME MENSUAL No. 14 **MES O PERIODO:** Enero de 2026

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	x		1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	x		2
1	**INTRODUCCIÓN**				3
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**				5
2.1	Localización				6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto				14
2.3	Inventario y estado inicial de la vía				14
2.4	Características técnicas del proyecto				15
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				17
3.1	Información general del contrato				17
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes				17
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA**				25
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	x		30
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-4		x	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	x		70
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	x		116
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	x		118
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11		x	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Consultoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	x		120
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Consultoría	MEPI-MN-1IN-15-FR-14		x	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	x		132
		MEPI-MN-IN-3-FR-2		x	
	• Seguimiento Programa de Consultoría		x		134
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	x		135
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	x		136
	• Actas de Comité de Consultoría	MEPI-MN-IN-14-FR-1		x	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	x		138
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**			x	
5.1	Información general del contrato			x	
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor			x	
5.3	Informes especialistas y profesionales			x	
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC			x	
5.5	Informe matriz de riesgos.			x	
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Consultoría e Interventoría			x	
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.			x	
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**			x	
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5		x	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7		x	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9		x	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		x	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15		x	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual			x	
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1		x	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2		x	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2		x	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3		x	
7	**Conclusiones y recomendaciones**			x	
8	**Anexos**			x	
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo			x	
8.2	Registro fotográfico y video del avance de la Consultoría			x	
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas			x	
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente			x	

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA
DIRECTOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 4227 - 2024

INFORME MENSUAL – ENERO 2026

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

Quibdó, enero de 2026

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891.680.089-4
Carrera 22 #18B-10 B. Nicolás Medrano – Ciudadela Universitaria
Tel: (+57) 6046726565, Línea gratuita: 018000938824
contactenos@utch.edu.co, notificacionesjudiciales@utch.edu.co
utch.edu.co
Quibdó, Chocó (Colombia)

INTRODUCCIÓN.

El Gobierno Nacional a través del programa "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA (…)", ha priorizado un conjunto de proyectos de infraestructura vial de carácter regional con impacto en todo el territorio colombiano, dirigidos a mejorar vías secundarias y terciarias, generando conexiones y fortaleciendo la comunicación entre las diversas poblaciones y regiones del país; frente a lo cual se debe adelantar la coordinación interinstitucional entre el Instituto y las entidades regionales para la estructuración de los proyectos que permita la ejecución de los mismos. Entre esos está el proyecto denominado como Nóvita – Curundó – San José del Palmar – Crucero El Cairo, que para el alcance trata específicamente la “CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO”[1].

Con base a lo anterior el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, suscribió el contrato interadministrativo con la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba tendiente a adelantar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA”, que incluye dentro de sus alcances la elaboración de los volúmenes o productos técnicos entregables a nivel de Fase 3 (Estudios y diseños definitivos, a partir del máximo aprovechamiento del resultado de los Estudios y Diseños a nivel de Fase II llevados a cabo por la Entidad en vigencias anteriores).

[1] Tomado del Anexo 1 – Anexo Técnico Consultoría

El objetivo de esta fase es proyectar la materialización en campo del proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción), para el mejoramiento de la conexión existente Curundó - San José del Palmar – Cruce El Cairo, que podrá incluir la revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o optimización y/o complementación conteniendo obligatoriamente la interventoría para la elaboración de nuevos estudios y diseños, con sus cálculos respectivos o trabajos similares, para todas aquellas obras requeridas de las especialidades que conservan relación directa con la infraestructura vial sobre el corredor de atención.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato 4227 de 2024, en este documento se presenta el informe correspondiente a las actividades del mes de enero de 2026.

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891.680.089-4
Carrera 22 #18B-10 B. Nicolás Medrano – Ciudadela Universitaria
Tel: (+57) 6046726565, Línea gratuita: 018000938824
contactenos@utch.edu.co, notificacionesjudiciales@utch.edu.co
utch.edu.co
Quibdó, Chocó (Colombia)

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.


2.1. Localización

El corredor geográfico objeto de estudio, se encuentra localizado entre el municipio de San José del Palmar y El Cairo, pertenecientes a los departamentos del Chocó y Valle del Cauca respectivamente. En su parte inicial, el trazado cruza la vertiente occidental de la Cordillera Occidental en jurisdicción del departamento del Chocó, y en su tramo final, recorre la estribación oriental de la cordillera pasando sobre la cuenca alta del río San Juan en el departamento del Valle del Cauca; ubicándose el corredor en un terreno mayoritariamente montañoso. El mapa de localización general se indica en la figura 1 y se anexa al presente documento.

La carretera San José del Palmar – Cruce El Cairo presenta una clasificación, según su función, y conforme al Manual de Diseño Geométrico del INVÍAS, de la siguiente manera:

- Sector: El Socorro (San José del Palmar) – Altos de Galápagos (zona limítrofe departamental), en el departamento del Chocó, es vía secundaria.
- Sector: Altos de Galápagos – Cruce El Cairo, en el departamento del Valle del Cauca, es vía secundaria.

Figura 1. Localización del proyecto

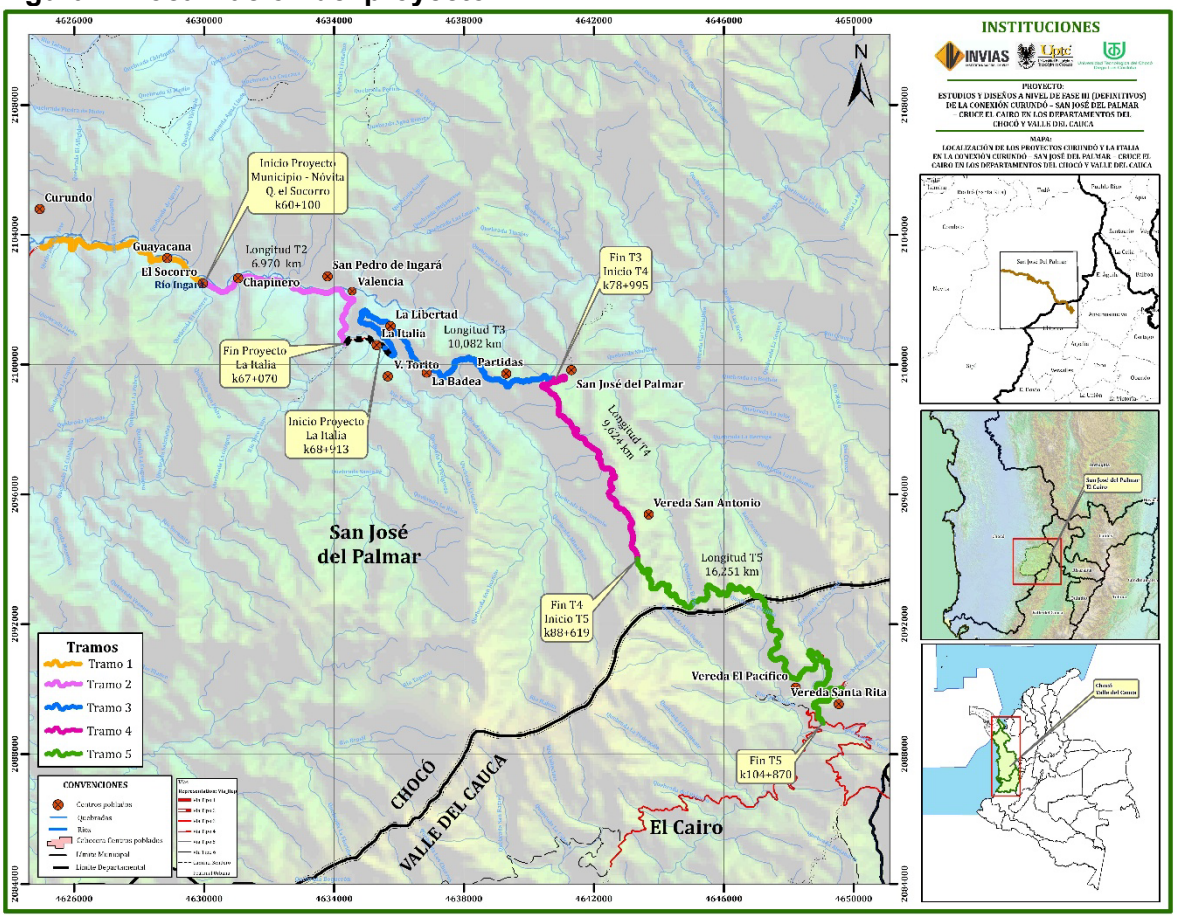

Fuente: Consultoría UTCH, 2025.

Teniendo en cuenta las condiciones del terreno, los parámetros generales del diseño geométrico que conforman proyecto vial se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Parámetros del diseño geométrico de la nueva carretera

PARÁMETRO	VALOR	UNIDAD
Tipo de terreno	Montañoso	
Funcionalidad	Secundaria	
Velocidad de diseño	40	Km/h
Número de calzadas	1.0	Unidad
Número de carriles	2	Unidad

PARÁMETRO	VALOR	UNIDAD
Ancho de los carriles	3.3	m
Ancho de la calzada	6.6	m
Ancho de la berma	0.5	m
Ancho de las cunetas	1.0	m
Ancho de corona	7.6	m
Ancho de banca	9.6	m

Fuente: Consultoría UTCH, 2026

Con base en los estudios realizados en el contrato 1666 de 2015, en los cuales se dividió el corredor en cinco (5) subtramos iniciando en el sitio de Curundó (La Punta) K53+643 hasta el Cruce a El Cairo (K104+870), y como consecuencia de la armonización[2] con los proyectos viabilizados por las alcaldías de Nóvita (Tramo 1) y San José del Palmar (La Italia), los estudios y diseños producto de la presente consultoría tendrán un alcance en la longitud total de 43 km, divididos en 4 tramos[3], así:

- Tramo 2: K60+100 – K67+070
- Tramo 3: K68+913 – 78+995
- Tramo 4: K78+995 – K88+619
- Tramo 5: K88+619 – K104+870

A continuación, se describen cada uno de los tramos del corredor vial objeto de estudios y diseños a Fase III:

[2] Como resultado de la armonización con otros proyectos, se excluyeron del alcance de los presentes estudios y diseños los segmentos del corredor comprendidos entre las siguientes abscisas: K53+643,016 – K57+235 (Tramo 1) y K57+235+K60+100.


[3] Para continuar con la trazabilidad de la Fase II, se continua con la misma denominación de los tramos.

Tramo 2: K60+100 – K67+070

El tramo 2, está comprendido entre la quebrada el Socorro en el K60+100 hasta inicio del Corregimiento La Italia en el K67+070, con una longitud de 6970 m. En este tramo el corredor realiza su recorrido paralelo al río Ingará, desarrollándose sobre terrenos entre montañoso y ondulado. Entre el K60+100 y el K65+400 presenta pendientes longitudinales ascendentes que oscilan entre el 2% y el 8%. Además, el trazado avanza tangencialmente por las veredas de Chapinero, San Pedro de Ingará y Valencia.

En el último sector entre las abscisas K65+400 y K67+070 el trazado se separa del río Ingará, y continúa en un terreno con pendientes longitudinales más moderadas que varían entre el 2% y el 4%, atravesando el río Toro viejo y afluentes de menor orden. El tramo termina en el acceso al corregimiento de La Italia, a una altura de 405 m s.n.m. Figura 2.

Figura 2. Localización del tramo 2. K60+100 – K67+070

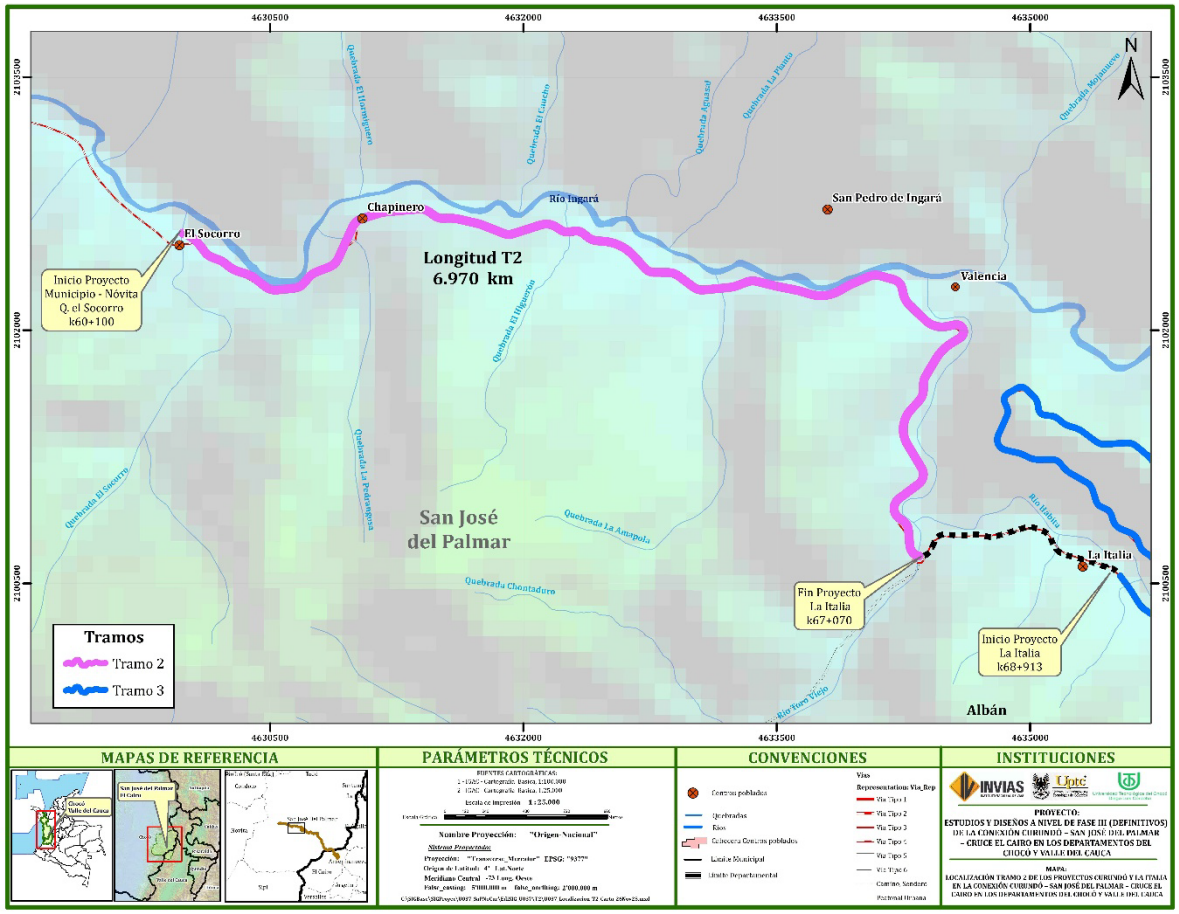

Fuente: Consultoría UTCH, 2026


Tramo 3: K68+913 – 78+995

El tramo 3, está ubicado entre la salida del corregimiento La Italia en el K68+913 y el K78+995 en cercanías a la cabecera municipal de San José del Palmar, en una longitud de 10082 m.

En este tramo el corredor deja el valle del río Ingará para ir ascendiendo sobre la cordillera occidental, atravesando terrenos entre montañosos y escarpados presentándose pendientes ascendentes muy fuertes que oscilan entre el 6% y el

10%, alcanzando una altura de 1080 m s.n.m., en su recorrido el trazado pasa en proximidad a las poblaciones de La libertad y La Badea. Figura 3.

Figura 3. Localización del tramo 3. K68+913 – K78+995

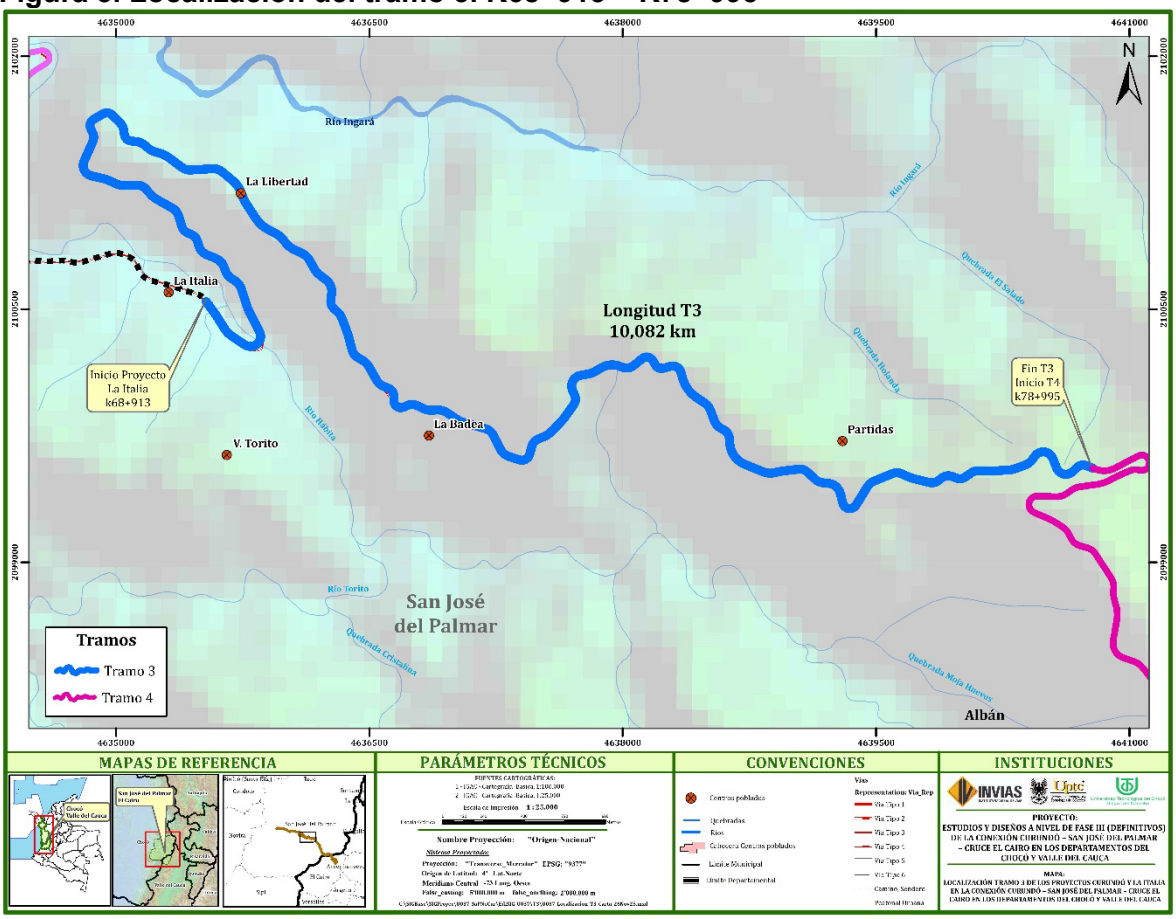


Fuente: Consultoría UTCH, 2026

Tramo 4: K78+995 – K88+619

El tramo 4, está comprendido entre cercanías a la cabecera municipal de San José del Palmar en el K78+995 y el K88+619, con una longitud de 9624m.

Al igual que el tramo 3, este tramo continúa en ascenso sobre la cordillera, alcanzando una altura de 1685 m s.n.m. y pendientes fuertes que varían entre el 6% y el 9%, en su recorrido pasa por la entrada a la cabecera del municipio de San José del Palmar en el K80+370. En su trayectoria el corredor atraviesa por la quebrada Moja huevos, así como numerosas fuentes hídricas de menor escala. Figura 4.

Figura 4. Localización del tramo 4. K78+995 – K88+619

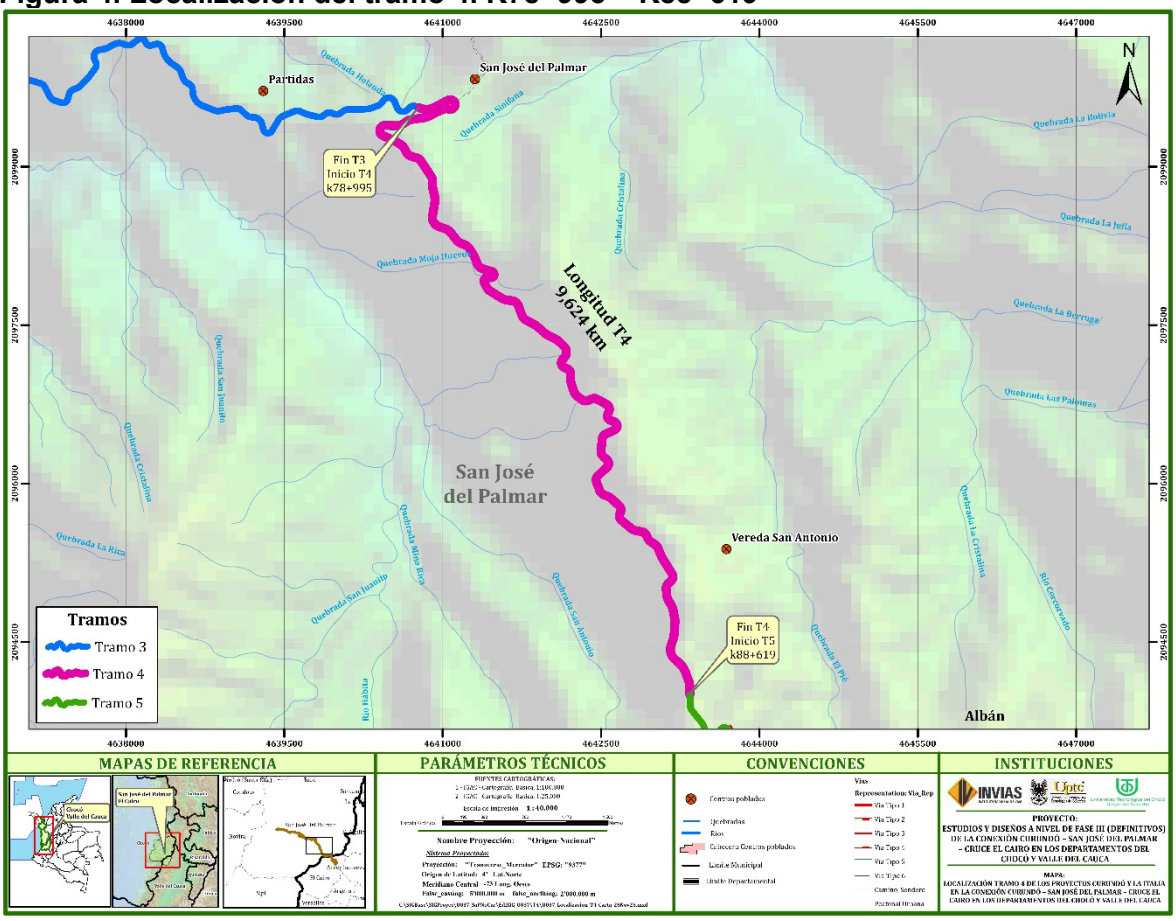


Fuente: Consultoría UTCH, 2026

Tramo 5: K88+619 – K104+870

El tramo 5, está comprendido entre el K88+619 y el K104+870 en el sitio conocido como cruce a El Cairo, en una longitud de 16251m. En este sector el corredor continúa su ascenso sobre la cordillera hasta llegar a la divisoria en el sitio conocido como Altos de Galápagos (K94+200 – K94+400) en los límites entre los dos departamentos de Chocó y el Valle del Cauca, alcanzando una altura de 2050 m s.n.m.; en esta zona se presentan temperaturas muy bajas en la mayor parte del año y precipitaciones moderadas constantes.

A partir del K94+400 el corredor inicia su descenso sobre un terreno montañoso con pendientes longitudinales entre el 4% y el 7% hasta llegar al K102+800, atravesando un número significativo de fuentes hídricas de menor caudal. Posteriormente se presenta un tramo corto en ascenso con una pendiente longitudinal promedia del 6.5% hasta llegar al K103+900, finalizando el tramo se presenta un sector en descenso con pendiente promedio del 7% hasta llegar al cruce a El Cairo, a una altura de 1645 m s.n.m. Figura 5.

Figura 5. Localización del tramo 5. K88+619 – K104+870

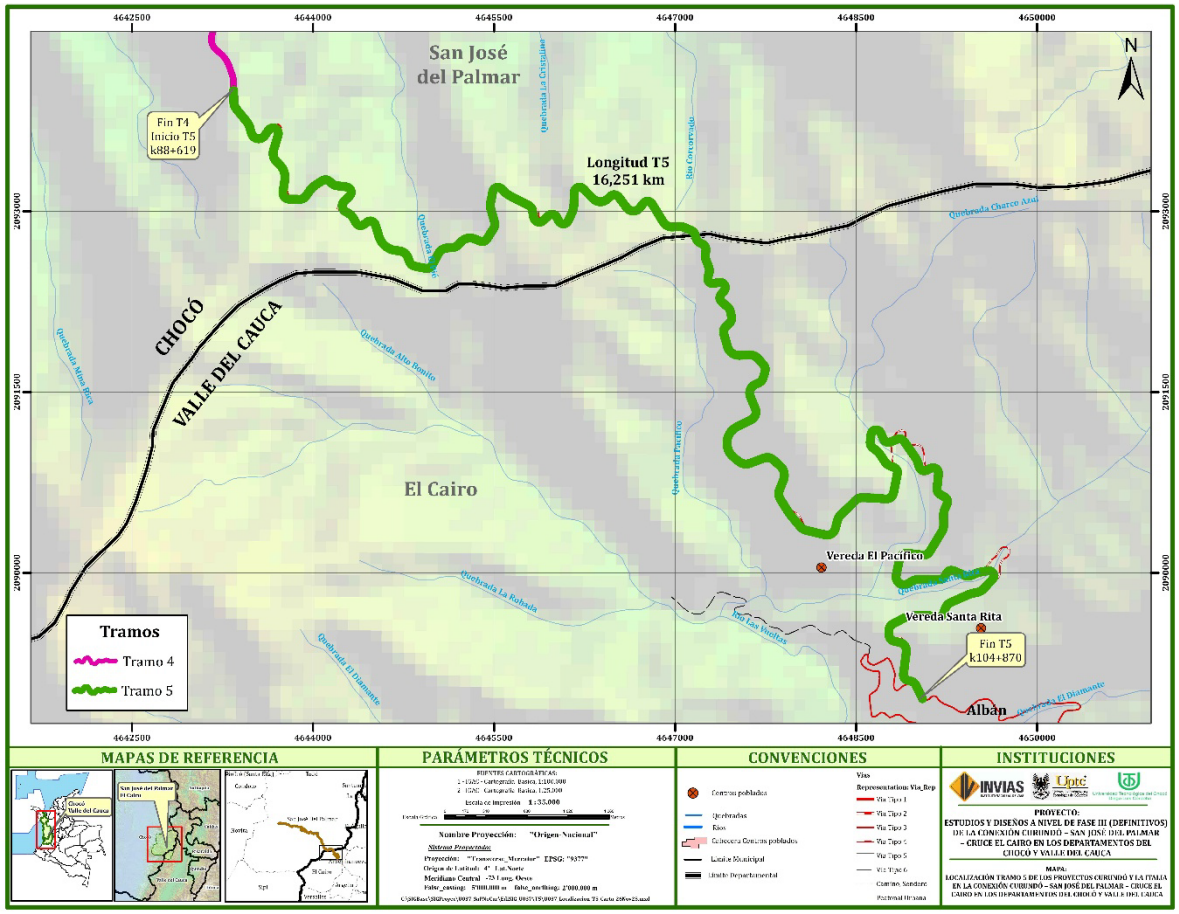

Fuente: Consultoría UTCH, 2026

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

En el ámbito local la zona de influencia directa e inmediata de la obra está relacionada de manera parcial con las cuencas económicas de los municipios de El Cairo y San José del Palmar en el departamento de Chocó y Valle del Cauca.

En el contexto regional la zona de influencia del proyecto abarca el área sur oriental del Departamento de Chocó, permitiendo que el Municipio de San José del Palmar quede integrado a la Capital del Departamento por una conexión directa, dentro de esta conectividad se incluye los municipios de Novita, Condoto, Istmina, Unión Panamericana (Las Ánimas), Cértegui y Quibdó.

Dentro del marco nacional la red vial en la zona de influencia se extiende a los municipios del Occidente desde el Corregimiento de Curundó hasta Cartago.

El municipio de El Cairo en el departamento del Valle del Cauca tiene una extensión total de 283 km², dista 252 km de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

Según las proyecciones del DANE, para el año 2015 el municipio cuenta con 9.976 habitantes, de los cuales 2.812 (28%) habitan en la cabecera municipal y 7164 (72%) habitan en la zona rural del municipio.

Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura y el comercio. Los principales cultivos son café, plátano, caña, yuca, fríjol, tomate, aguacate, mora, lulo, granadillas y hortalizas. Las actividades comerciales más destacadas en el municipio guardan relación con los productos de origen agrícola.

El Municipio de San José del Palmar actualmente su economía está consolidada principalmente en la Agricultura, y sus productos bandera son el Chontaduro, Borojó y Cacao. El sector maderero ha representado por muchas décadas la economía del municipio, pero en los últimos años se ha recortado esta labor debido a la campaña existente de la preservación y conservación de bosques y cuencas hidrográficas. El 90% de la actividad económica es de subsistencia, con pocos excedentes para comercialización o acumulación.

2.3. Características técnicas del proyecto

Realizar los ESTUDIOS y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

Los volúmenes que conforman la **Fase III de mejoramiento y pavimentación** a los cuales se requiere llevar a cabo las actividades necesarias para la elaboración de los estudios y diseños (vía existente) son los siguientes:

Volumen 1. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS.
Volumen 2 ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISIS DE SERVICIO.
Volumen 3 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO.
Volumen 4 ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL.
Volumen 5 ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL.
Volumen 6 ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE.
Volumen 7 ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE

MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES.

Volumen 8 ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Volumen 9 HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN.

Volumen 10 ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS.

Volumen 11 ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS.

Volumen 12 ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.

Volumen 13 ESTUDIO REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS.

Volumen 14 ESTUDIO DE RIESGOS.

Volumen 15 ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Volumen 16 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.

Volumen 17. AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD.

Volumen 18. VOLUMEN TÉCNICO BIM

Volumen 19. INFORME FINAL EJECUTIVO.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Las condiciones básicas del contrato de consultoría se resumen en los siguientes términos:

CONTRATO N°	4227 - 2024
Objeto	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.
Consultor	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA
Valor inicial	$ 8.700.000.000
Fecha de Inicio	02 de diciembre de 2024
Fecha de Terminación N°1	31 de diciembre de 2024
Plazo inicial	1 mes
Prórroga N°1	12 meses hasta el 31 de diciembre de 2025
Adición N°1	$ 52.567.320
Valor total	$ 8.752.567.320
Prórroga N°2	30 de abril de 2026
Interventor	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.

Fuente: Elaboración propia.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se detallan las actividades desarrollas por el equipo consultor en el mes de enero:

Durante el mes de enero se desarrollaron actividades orientadas a la organización, análisis y revisión de las obligaciones contractuales y administrativas del proyecto.

Adicionalmente, se llevaron a cabo mesas de trabajo correspondientes a los diferentes componentes (volúmenes), así como actividades de campo, las cuales se relacionan a continuación:

Reunión técnica de avances del componente de Topografía – 09 de enero de 2026: Se llevó a cabo una reunión técnica en la que se abordaron temas relevantes para el desarrollo del proyecto, centrados en aspectos de la topografía. Durante la jornada, se discutieron observaciones, preocupaciones y lineamientos técnicos, permitiendo un espacio de análisis y retroalimentación entre los participantes.

Actividades en campo – 05 al 10 de enero de 2026: En el marco del proyecto **"ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO"**, durante el período reportado las labores fueron ejecutadas por un equipo de profesionales, apoyados en equipos topográficos de alta precisión y herramientas especializadas, quienes realizaron levantamientos, verificaciones y procesos de georreferenciación necesarios para asegurar la calidad y confiabilidad de la información. Los resultados obtenidos constituyen un insumo fundamental para la elaboración y validación de los diseños definitivos, garantizando el cumplimiento de los alcances técnicos y contractuales del proyecto.

Específicamente las actividades se dividieron en:

El 5 de enero de 2026. Equipo de trabajo dividido en dos frentes, realizaron la actividad de nivelación y contra nivelación del Tramo No. 2 desde el K 60 + 100 hasta el k 67 + 070, dando por finalizada esta actividad en todo este tramo.

Se realizo llevantamiento de la poligonal en una parte del Tramo No. 2 Iniciando desde el GPS 4, el K 61 + 100 hasta el K 61 + 900, abarcando una longitud de 800 ml aproximadamente, debido a que cuando se tomó la información con equipos de RTK, por la vegetación y árboles que se encontraban al constado de la vía, la información no fue tomada con precisión, por tal motivo se debió hacer nuevamente utilizando los equipos de estación total.

El 6 de enero de 2026. Levantamiento de la poligonal de una parte del Tramo No. 2 abarcando una longitud de 200 ml aproximadamente entre el GPS 7 y el GPS 6, debido a que cuando se tomó la información con equipos de RTK, por la vegetación y árboles que se encontraban al constado de la vía, la información no fue tomada con precisión, por tal motivo se debió hacer nuevamente utilizando los equipos de estación total.

Equipo de trabajo dividido en dos frentes, realizaron la actividad de nivelación y contra nivelación del Tramo No. 3, donde el primer equipo inicio a realizar levantamiento desde el GPS 13 llegando hasta el GPS 12 y el segundó inicio desde el GPS 11 llegando hasta el GPS 9.

El 7 de enero de 2026. Equipo de trabajo dividido en dos frentes, realizaron la actividad de nivelación y contra nivelación del Tramo No. 3, donde el primer equipo inicio a realizar levantamiento desde el GPS 12 llegando hasta el GPS 11 y el segundó inicio desde el GPS 9 llegando hasta el GPS auxiliar N° 1 ubicado en el K 67 + 070 del corregimiento de La Italia, donde finaliza el tramo N° 2 donde como finalizada esta actividad en el tramo N° 3 y en general de todo el proyecto.

Entre el 8, 9 y 10 de enero de 2026, se realizó labores administrativas y trabajos de oficina, correspondientes a los procesos de cálculo de gabinete, incluyendo los cálculos aritméticos de la poligonal de amarre, nivelación y contra nivelación, así como el procesamiento de nubes de puntos, generación y ajuste de modelos digitales del terreno entre los diferentes abscisados del proyecto.

Mesa de trabajo del volumen de Topografía, equipo consultoría, interventoría y equipo de campo – 13 y 14 de enero de 2026: En la mesa de trabajo se revisó el estado de la información topográfica y su preparación como insumo para el diseño geométrico, se resaltó la necesidad de validar la información antes de su uso, con el fin de evitar reprocesos y duplicidades.

Así mismo, se abordó la importancia de revisar los archivos georreferenciados, la correcta delimitación del contorno de la vía y la integración adecuada de la información proveniente de diferentes métodos de levantamiento, incluyendo la verificación del modelo digital del terreno. Se concluyó que la precisión y consolidación adecuada de la información es fundamental para garantizar un diseño geométrico confiable.

Reunión de articulación técnica volumen de Topografía y Taludes - 13 de enero de 2026: La reunión se desarrolló como un espacio de articulación técnica entre los equipos del Volumen de Topografía y Taludes, con el objetivo de realizar la verificación preliminar de los posibles botaderos, los posibles campamentos y los sitios de acopio asociados al proyecto.

Durante la jornada se analizaron las condiciones generales del terreno, la viabilidad técnica de los sitios identificados y su relación con los estudios topográficos y de estabilidad de taludes, con el fin de garantizar coherencia entre ambos volúmenes.

Mesa de Trabajo Técnica del equipo de Consultoría e Interventoría con los especialistas de los volúmenes de Topografía, Diseño Geométrico, Pavimentos, Tránsito, Seguridad Vial, Hidráulica y Geología– 16 de enero de 2026: La Mesa de Trabajo Técnica tuvo como propósito realizar la revisión integral de los avances presentados en cada uno de los volúmenes técnicos Topografía, Diseño Geométrico, Pavimentos, Tránsito, Seguridad Vial, Hidráulica y Geología, a partir del análisis y acompañamiento del equipo de Interventoría. Durante la sesión se evaluó el estado de desarrollo de los estudios, se verificó su coherencia técnica y normativa, y se formularon observaciones y ajustes necesarios orientados a fortalecer la calidad, consistencia y completitud de los productos, con miras a la entrega de un resultado técnico integral, confiable y conforme a los requerimientos del proyecto.

Mesa Técnica de los volúmenes de Topografía, Taludes, Geotecnia, Diseño Geométrico, Pavimentos, Transito, Hidráulica - 16 de enero de 2026: Tuvo como objetivo analizar la situación actual del corredor vial, a partir de la revisión técnica de los estudios y la información disponible. Durante la sesión, los especialistas expusieron el estado del componente físico y funcional de la vía, identificaron las principales condiciones y problemáticas presentes, y formularon recomendaciones técnicas orientadas a la definición de alternativas, ajustes y acciones necesarias para el desarrollo de estudios consistentes, integrales y acordes con las condiciones

reales del territorio, garantizando así la calidad y viabilidad de los diseños propuestos.

Coordinación logística para el desplazamiento del Grupo 1 de la Consultoría a la ciudad de Bogotá: Se llevó a cabo la coordinación logística para el desplazamiento de la directora, el Coordinador Técnico y la coordinadora ambiental y social a la ciudad de Bogotá, incluyendo la gestión de itinerarios, reservas y demás requerimientos necesarios, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la agenda prevista con el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, en el marco de la asistencia al comité de seguimiento.

Reunión técnica para la evaluación de alternativas desde el punto de vista geotécnico frente al punto crítico denominado “La Virgen”, con el fin de analizar las condiciones del sector y plantear posibles soluciones de intervención – 19 de enero de 2026.

Revisión técnica de las fichas sociales – 19 de enero de 2026: Actividad orientada a la revisión, verificación y ajuste de las fichas sociales, con el fin de garantizar la consistencia, completitud y calidad de la información recopilada.

Revisión de matrices de identificación y evaluación de impactos – Medio socioeconómico - 19 de enero de 2026: Se realizó una reunión técnica con el fin de revisar y validar las matrices de identificación y evaluación de impactos del componente socioeconómico, analizando los criterios aplicados, las observaciones presentadas y los ajustes requeridos para su correcta consolidación dentro del estudio.

Revisión de fichas del Plan de Manejo Ambiental – Componente biótico (servicios ecosistémicos) - 19 de enero de 2026: Se llevó a cabo una reunión técnica con el objetivo de revisar y ajustar las fichas correspondientes al Plan de Manejo Ambiental del componente biótico, específicamente en lo relacionado con los servicios ecosistémicos, evaluando su coherencia técnica y los ajustes necesarios para su correcta implementación.

Mesa técnica de volúmenes de Topografía y Diseño Geométrico – 19 de enero de 2026: Espacio de articulación técnica implementado con el propósito de definir y unificar el sistema de coordenadas a emplear en el diseño geométrico del corredor vial, garantizando la coherencia entre la información topográfica y los criterios de diseño. Esta instancia permitió mejorar la comunicación y el intercambio de información entre los ingenieros de las diferentes disciplinas, así como asegurar la correcta interpretación y compatibilidad de los insumos técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto.

Mesa técnica para la estructuración del Plan de Contingencia y la reprogramación de entrega de volúmenes – 23 y 24 de enero de 2026: Espacio técnico de análisis y concertación orientado a definir medidas de contingencia y ajustar el cronograma de entrega de volúmenes, garantizando la continuidad y el adecuado desarrollo del proyecto.

Entre el 19 y 24 de enero de 2026: El Volumen de Topografía desarrolló la proyección de la información de los diseños a un origen único, junto con la elaboración del PTL del plano topográfico local.

Revisión de información secundaria: Consistió en examinar y evaluar la información secundaria disponible, como estudios previos, informes técnicos, bases de datos y documentación relacionada con el proyecto. El objetivo es asegurar que los datos sean fiables, pertinentes y útiles para la toma de decisiones, la planificación de actividades y la elaboración de informes técnicos, contribuyendo a la solidez y coherencia del proyecto.

Socialización del Diseño Geométrico (DG) y la definición de avances que puedan desarrollarse de manera articulada con cada uno de los volúmenes, así como la presentación de alternativas para el punto crítico denominado *La Virgen*, con el fin de presentar dichas alternativas a los especialistas de los demás volúmenes – 28 de enero de 2026: Se realizó mesa de trabajo para la socialización del Diseño Geométrico (DG), en la cual se revisaron avances articulables entre los diferentes volúmenes y se analizaron alternativas para el punto crítico denominado *La Virgen*, con el fin de su validación técnica interdisciplinaria.

Actividades – Volumen de Topografía - 02 de enero al 31 de enero de 2026: Durante el mes de enero, el volumen de Topografía desarrolló actividades orientadas a la verificación y validación de la información recolectada en campo. De manera paralela, se realizó la proyección de la información correspondiente a los diseños hacia un origen único, así como la elaboración del PTL del plano topográfico local.

Comité de seguimiento: Con participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), se desarrollaron sesiones de comité en las cuales se socializaron los avances técnicos y administrativos, se

revisaron los compromisos adquiridos en reuniones anteriores y se verificó su cumplimiento.

Las reuniones se llevaron a cabo en las siguientes fechas:

- 15 de enero de 2026 – modalidad virtual
- 22 de enero de 2026 – modalidad virtual
- 26 de enero de 2026 – modalidad presencial en la ciudad de Bogotá
- 29 de enero de 2026 – modalidad virtual
- 30 de enero de 2026 – modalidad virtual

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

4.1. Informe semanal

Para el contrato 4227 de 2024, durante el mes de diciembre de 2025 se presentaron (5) informes semanales y durante el mes de enero 2026 cuatro (4) informes semanales, los cuales se elaboraron y presentan en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

4.2 Maquinaria y equipo contrato de consultoría.

Para este periodo no aplica el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-4**. No se presenta.

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social de consultoría

El control diario del personal del consultor se presentará en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-6**, con sus respectivos soportes del mes de noviembre, diciembre de 2025 y enero de 2026.

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de consultoría

Se anexa el informe financiera y presupuestal (Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-9).**

4.5 Estado general del tiempo.

El control del estado general del tiempo contemplado en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-10** se presenta para este mes del mes de diciembre.

4.6 Resumen ensayos de laboratorio.

Ya que no se realizaron ensayos de laboratorio durante el presente periodo no se presenta el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-11**.

4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de consultoría

Se presenta formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13**. Con las respectivas pólizas.

4.8 Seguimiento al plan de calidad contrato de consultoría

No se presenta el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-14**.

4.9. Otros documentos seguimiento mensual:

- **Seguimiento al plan de inversión del anticipo:** se anexa formato **MEPI-MN1-IN-3-FR-1** Plan de inversión de anticipo aprobado por la interventoría.

- **Seguimiento programa de consultoría:** Con respecto al contrato 4227 de 2024 se tiene que para el mes de enero de 2026 un porcentaje ejecutado de 0.15% y un porcentaje programado de 0.15%.
- **Seguimiento Programa de inversiones:** se anexan formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1**, y el formato **MEPI-MN-IN-6-FR-2.**
- **Actas de comité de obra:** No aplica para este proyecto
- **Actas de reunión:** Se anexan las actas en el formato **MEPI-MN1-IN-14-FR-2.**

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891.680.089-4
Carrera 22 #18B-10 B. Nicolás Medrano – Ciudadela Universitaria
Tel: (+57) 6046726565, Línea gratuita: 018000938824
contactenos@utch.edu.co, notificacionesjudiciales@utch.edu.co
utch.edu.co
Quibdó, Chocó (Colombia)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante enero se avanzó bastante en poner en orden los temas contractuales y administrativos del proyecto, lo que ayudó a tener mayor claridad para organizar y coordinar las actividades técnicas.

Las actividades de campo del equipo de topografía permitieron completar el levantamiento y nivelaciones en los tramos programados, logrando información confiable que sirve como base para los diseños definitivos. En algunos sectores, la vegetación afectó la precisión de los equipos RTK, por lo que fue necesario repetir levantamientos con estación total. Esta decisión permitió mejorar la calidad de la información obtenida y el trabajo de oficina realizado posteriormente fue clave para procesar, ajustar y consolidar la información recolectada en campo, especialmente en la generación de modelos del terreno y cálculos topográficos.

Las mesas de trabajo entre los diferentes volúmenes facilitaron la comunicación entre los equipos, ayudaron a aclarar dudas técnicas y permitieron detectar a tiempo observaciones, evitando reprocesos más adelante para así entregar los informes definitivos conforme a los requerimientos técnicos del INVIAS.

La socialización de los avances de los diferentes volúmenes, en especial del componente de estabilidad, contribuyó al análisis de alternativas para el punto crítico denominado “La Virgen”, lo que permitió avanzar en la evaluación de posibles soluciones, considerando los distintos enfoques técnicos de los especialistas.

Seguir realizando mesas de trabajo entre los diferentes volúmenes antes de las entregas definitivas, para asegurar que la información esté bien articulada conforme a los requerimientos técnicos y evitar retrocesos.

Mantener la comunicación permanente entre contratante, interventoría y consultor en el desarrollo del proyecto

SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/11/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 52 del 24 al 29 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **APOYO A LA SUPERVISION:** YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÈ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	**VIGENCIA**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
CONSULTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÀSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.347.610.652,00	95,95%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.347.610.652,00	95,95%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.347.610.652,00	95,95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.347.610.652,00	95,95%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 67.689.000,00	0,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 388.364.606,54	4,46%

	SI	**NO**
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	**NO**
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 95,95% Avance o Atraso Físico % .....
Meta Física Ejecutada % 95,95%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 30.614.250,00			$ 30.614.250,00	0,35%
					Ejec	$ 30.614.250,00			$ 30.614.250,00	0,35%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ -	
						Total Ejec				$ -	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de consultoría por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024	Prog	$ 37.074.750,00			$ 37.074.750,00	0,43%
					Ejec	$ 357.750.356,54			$ 357.750.356,54	4,11%

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

□ **Revisión de información secundaria:** Consistió en examinar y evaluar la información secundaria disponible, como estudios previos, informes técnicos, bases de datos y documentación relacionada con el proyecto. El objetivo es asegurar que los datos sean fiables, pertinentes y útiles para la toma de decisiones, la planificación de actividades y la elaboración de informes técnicos, contribuyendo a la solidez y coherencia del proyecto.

□ **Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa:** Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

□ **Adquisición de cartografía y demás información técnica:** Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

□ **Gestión administrativa:** Orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto

□ **Comité de seguimiento virtual realizado el 24 de noviembre de 2025,** con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

□ **Ingreso a la ciudad de Paipa – Tunja – 27 de noviembre de 2025:**

Se efectuó el desplazamiento e ingreso al área de trabajo por parte de los equipos profesionales, con el fin de llevar a cabo el comité de seguimiento mensual y avanzar en las actividades previstas para el proyecto.

□ **Comité de seguimiento mensual:** Se llevó a cabo el 28 de noviembre de 2025 en la ciudad de Paipa - Tunja, con participación presencial del equipo de consultoría, interventoría y del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)

□ **Reunión para la revisión de criterios de sostenibilidad con especialistas – 25 de noviembre de 2025:**

Se llevó a cabo una reunión de revisión de los criterios de sostenibilidad con la participación de los especialistas de las áreas de estructuras, geotecnia, sostenibilidad, pavimentos, presupuestos, diseño geométrico y taludes.

Durante el encuentro se analizaron los lineamientos técnicos de cada disciplina, se evaluó la incorporación de prácticas sostenibles en el diseño y se definieron ajustes orientados a optimizar la estabilidad, eficiencia y viabilidad de las soluciones propuestas para el proyecto. Esta reunión permitió alinear criterios y fortalecer la articulación interdisciplinaria.

□ **Entrega del informe de georreferenciación del volumen I. Estudios de Topografía:**

Se realizó la entrega formal del informe de georreferenciación, acompañado de los resultados del levantamiento de información topográfica. Estos documentos consolidan la información técnica obtenida en campo y constituyen un insumo fundamental para las fases posteriores del proyecto.

□ **Pruebas Funcionales del Entorno Común de Datos (CDE):** Se realizaron pruebas básicas de funcionamiento del Entorno Común de Datos (CDE) para verificar la correcta gestión, trazabilidad y control de la información del proyecto. Durante estas pruebas se evaluó la carga y descarga de documentos, el control automático de versiones, la modulación de documentos en línea, la creación de comentarios y anotaciones, así como la validación de permisos y accesos por carpeta. Adicionalmente, se probó la publicación de archivos en las etapas WIP, Shared y Published, confirmando el adecuado flujo de información y la eficiencia del sistema para soporte técnico y documental del proyecto.

□ **Actividades en campo – 24 al 29 de noviembre de 2025:** Entre el 24 y el 29 de noviembre de 2025, los profesionales del volumen de Topografía, desarrollaron actividades en campo orientadas a la recolección de información técnica. Estas labores permitieron obtener datos clave para el avance y consolidación de los estudios del proyecto, garantizando la precisión, coherencia y suficiencia de los insumos necesarios para las fases de análisis y diseño.

Estas labores incluyeron:

1. Se realizó el levantamiento topográfico a detalle. Adicionalmente, se efectuaron elevaciones con dron, lo que permitió obtener la fotogrametría necesaria para cubrir aproximadamente 8,4 km de la zona del proyecto, garantizando una franja de 100 metros a cada lado de la vía. Gracias a las condiciones favorables registradas en algunos momentos de la jornada, fue posible obtener información precisa y suficiente para el adecuado desarrollo del trabajo técnico.

2. Levantamiento topográfico de la poligonal mediante RTK: Se adelantó el levantamiento topográfico de la poligonal con el fin de obtener coordenadas precisas a través de métodos de recolección de datos empleando la tecnología RTK (Real Time Kinematic). En el tramo 5 fue necesario realizar correcciones adicionales, debido a que las inclemencias del clima impidieron obtener información suficientemente precisa en algunos puntos.

3. Determinación de diferencias de altura mediante nivelación y contra nivelación: Se determinó, a través de procesos de nivelación y contra nivelación, las diferencias de altura entre puntos consecutivos que conformaban la poligonal. Este procedimiento permitió establecer las cotas o elevaciones relativas de cada estación, asegurando una adecuada definición del perfil topográfico.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Comité de seguimiento virtual realizado el 24 de noviembre de 2025



Comité de seguimiento virtual realizado el 24 de noviembre de 2025


Comité de seguimiento virtual realizado el 24 de noviembre de 2025


Reunión para la revisión de criterios de sostenibilidad con especialistas – 25 de noviembre de 2025


Reunión para la revisión de criterios de sostenibilidad con especialistas – 25 de noviembre de 2025



Reunión para la revisión de criterios de sostenibilidad con especialistas – 25 de noviembre de 2025

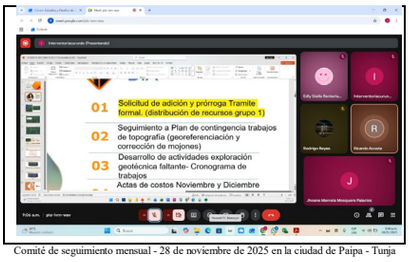

Comité de seguimiento mensual - 28 de noviembre de 2025 en la ciudad de Paipa - Tunja



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica




Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Levantamiento de Infomacion Topografica



Pruebas Funcionales del Entorno Común de Datos (CDE)



Levantamiento de Infomacion Topografica

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTORA DE CONSULTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: EDLY STELLA RENTERÍA MENA Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/12/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 53 del 1 al 6 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **APOYO A LA SUPERVISION:** YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÈ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÀSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.415.255.248,03	96,73%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.415.255.248,03	96,73%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.415.255.248,03	96,73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.415.255.248,03	96,73%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 71.854.881,74	0,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 71.854.881,74	0,83%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 96,73%
Meta Física Ejecutada % 96,73%

Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 23.192.657,14			$ 23.192.657,14	0,27%
					Ejec	$ 23.192.657,14			$ 23.192.657,14	0,27%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ -	
						Total Ejec				$ -	

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de consultoria por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024	Prog	$ 48.662.224,60			$ 48.662.224,60	0,56%
					Ejec	$ 48.662.224,60			$ 48.662.224,60	0,56%

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO		
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO		
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO		

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

□ **Revisión de información secundaria:** Consistió en examinar y evaluar la información secundaria disponible, como estudios previos, informes técnicos, bases de datos y documentación relacionada con el proyecto. El objetivo es asegurar que los datos sean fiables, pertinentes y útiles para la toma de decisiones, la planificación de actividades y la elaboración de informes técnicos, contribuyendo a la solidez y coherencia del proyecto.

□ **Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa:** Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

□ **Adquisición de cartografía y demás información técnica:** Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

□ **Gestión administrativa:** Orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto

□ **Coordinación logística para el desplazamiento de la Rectora de la UTCH, la directora y el Coordinador Técnico de la Consultoría a la ciudad de Bogotá:** Se realizó la coordinación logística para el desplazamiento de la Rectora de la UTCH, la directora y el Coordinador Técnico de la Consultoría a la ciudad de Bogotá, gestionando itinerarios, reservas y demás requerimientos necesarios para el adecuado cumplimiento de la agenda prevista con el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.

□ **Comité de seguimiento virtual realizado el 01 de diciembre de 2025,** con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

□ **Reunión del 2 de diciembre de 2025, con los Coordinadores BIM de la Consultoría e Interventoría,** convocada para abordar asuntos relacionados con la implementación de la metodología BIM en el proyecto, con el objetivo de resolver las inquietudes presentadas y acordar las acciones a seguir.

□ **Comité de seguimiento virtual realizado el 04 de diciembre de 2025**, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

□ **Mesa de trabajo coordinación BIM – Entorno Común de Datos – 04 de diciembre de 2025:** Se desarrolló la mesa de trabajo de coordinación BIM, enfocada en la revisión, organización y actualización del Entorno Común de Datos, garantizando la articulación efectiva entre los equipos y la consolidación de la información del proyecto.

□ **Reunión con rectores de la UTCH, UPTC e INVÍAS – 05 de diciembre de 2025:** La reunión sostenida entre los Rectores de la UTCH y la UPTC, junto con representantes del INVÍAS, se desarrolló de manera productiva. Durante el encuentro se presentó el estado actual del proyecto, se revisaron los avances y los aspectos críticos, y se aclararon inquietudes planteadas por las partes. Así mismo, se fortalecieron los mecanismos de articulación institucional y se establecieron compromisos orientados a garantizar la continuidad, el seguimiento y el adecuado avance del proyecto.

□ **Actividades en campo – 01 al 06 de diciembre de 2025:** Entre el 01 y el 06 de diciembre de 2025, los profesionales del volumen de Topografía, desarrollaron actividades en campo orientadas a la recolección de información técnica. Estas labores permitieron obtener datos clave para el avance y consolidación de los estudios del proyecto, garantizando la precisión, coherencia y suficiencia de los insumos necesarios para las fases de análisis y diseño.

Estas labores incluyeron:

□ Se realizó el levantamiento topográfico detallado del tramo 5 de la vía, utilizando la metodología de fotogrametría.

□ Levantamiento topográfico de la poligonal:

Se realizó el levantamiento topográfico de la poligonal para obtener coordenadas mediante métodos de recolección con estación total, así como la toma de datos altimétricos para generar un modelo tridimensional del terreno, tomando como referencia los vértices previamente establecidos en campo. Para ello, se emplearon instrumentos de medición de alta precisión, garantizando la correcta georreferenciación de cada punto. A partir de estos vértices.

□ Determinación de diferencias de altura mediante nivelación y contra nivelación:
Se determinó, a través de procesos de nivelación y contra nivelación, las diferencias de altura entre puntos consecutivos que conformaban la poligonal. Este procedimiento permitió establecer las cotas o elevaciones relativas de cada estación, asegurando una adecuada definición del perfil topográfico.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Comité de seguimiento virtual realizado el 01 de diciembre de 2025





Reunión Coordinaciín BIM, Consultoria e Interventoria - 2 de diciembre de 2025



Comité de seguimiento virtual realizado el 04 de diciembre de 2025


Comité de seguimiento virtual realizado el 04 de diciembre de 2025


Mesa de trabajo coordinación BIM – Entorno Común de Datos – 04 de diciembre de 2025

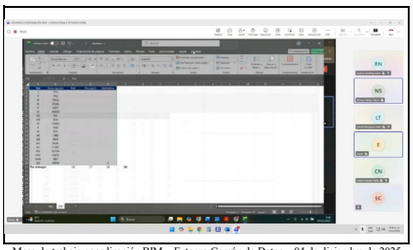
Mesa de trabajo coordinación BIM – Entorno Común de Datos – 04 de diciembre de 2025


Reunión con rectores de la UTCH, UPTC e INVÍAS – 05 de diciembre de 2025


Levantamiento de Infomacion Topografica


Levantamiento de Infomacion Topografica


Levantamiento de Infomacion Topografica


Levantamiento de Infomacion Topografica

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTORA DE CONSULTORÍA

FIRMA
NOMBRE: EDEY STELLA RENTERÍA MENA
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 13/12/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 54 del 8 al 13 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **APOYO A LA SUPERVISION:** YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÈ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÀSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.487.110.129,77	97,55%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.487.110.129,77	97,55%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.487.110.129,77	97,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.487.110.129,77	97,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 71.854.881,74	0,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 71.854.881,74	0,83%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 97,55%
Meta Física Ejecutada % 97,55%
Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 23.192.657,14			$ 23.192.657,14	0,27%
					Ejec	$ 23.192.657,14			$ 23.192.657,14	0,27%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ -	
						Total Ejec				$ -	

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de consultoria por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024	Prog	$ 48.662.224,60			$ 48.662.224,60	0,56%
					Ejec	$ 48.662.224,60			$ 48.662.224,60	0,56%

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	42	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

□ **Revisión de información secundaria:** Consistió en examinar y evaluar la información secundaria disponible, como estudios previos, informes técnicos, bases de datos y documentación relacionada con el proyecto. El objetivo es asegurar que los datos sean fiables, pertinentes y útiles para la toma de decisiones, la planificación de actividades y la elaboración de informes técnicos, contribuyendo a la solidez y coherencia del proyecto.

□ **Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa:** Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

□ **Adquisición de cartografía y demás información técnica:** Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

□ **Gestión administrativa:** Orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto

□ **Comité de seguimiento virtual realizado el 11 de diciembre de 2025,** con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

□ **Reunión técnica sobre la batimetría** – 13 de diciembre de 2025: Espacio de coordinación técnica en el que se revisaron y analizaron los puntos donde se podría presentar la batimetría del corredor vial, con el fin de verificar condiciones actuales y definir acciones a seguir.

□ **Actividades en campo – 08 al 13 de diciembre de 2025:** Entre el 08 y el 13 de diciembre de 2025, los profesionales del volumen de Topografía, desarrollaron actividades en campo orientadas a la recolección de información técnica. Estas labores permitieron obtener datos clave para el avance y consolidación de los estudios del proyecto, garantizando la precisión, coherencia y suficiencia de los insumos necesarios para las fases de análisis y diseño.

Estas labores incluyeron:

□ Levantamiento topográfico de la poligonal para obtener coordenadas mediante métodos de recolección de datos con estación total. así como la toma de datos altimétricos para generar un modelo tridimensional del terreno, tomando como referencia los vértices previamente establecidos en campo.

□ Nivelación y contra nivelación, las diferencias de altura entre puntos consecutivos a lo largo de los puntos que determinan la poligonal. Este procedimiento permite establecer las cotas o elevaciones relativas de cada estación. Este método permite obtener valores precisos de desnivel entre estaciones, garantizando la confiabilidad del perfil altimétrico del trazado

□ Elevaciones con dron para obtener la topografía del área mediante la técnica de fotogrametría, complementando así la información recopilada en campo.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.
Volumen 19. Informe final ejecutivo


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Comité de seguimiento virtual realizado el 11 de diciembre de 2025


Comité de seguimiento virtual realizado el 11 de diciembre de 2025


Reunión técnica sobre batimetría – 13 de diciembre de 2025

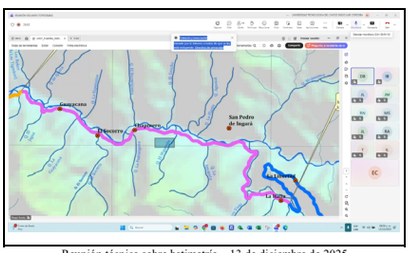

Reunión técnica sobre batimetría – 13 de diciembre de 2025


Reunión técnica sobre batimetría – 13 de diciembre de 2025


Levantamiento de Infomacion Topografica


Levantamiento de Infomacion Topografica


Levantamiento de Infomacion Topografica


Levantamiento de Infomacion Topografica

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTORA DE CONSULTORÍA

FIRMA
NOMBRE: EDEY STELLA RENTERÍA MENA
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 20/12/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 55 del 15 al 20 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **APOYO A LA SUPERVISION:** YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÈ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÀSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.700.000.000,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.558.965.011,51	98,38%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.558.965.011,51	98,38%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.558.965.011,51	98,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.558.965.011,51	98,38%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 71.854.881,74	0,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 71.854.881,74	0,83%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 98,38%
Meta Física Ejecutada % 98,38%

Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 23.192.657,14			$ 23.192.657,14	0,27%
					Ejec	$ 23.192.657,14			$ 23.192.657,14	0,27%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ -	
						Total Ejec				$ -	

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de consultoria por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024	Prog	$ 48.662.224,60			$ 48.662.224,60	0,56%
					Ejec	$ 48.662.224,60			$ 48.662.224,60	0,56%

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	42	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Revisión de información secundaria: Consistió en examinar y evaluar la información secundaria disponible, como estudios previos, informes técnicos, bases de datos y documentación relacionada con el proyecto. El objetivo es asegurar que los datos sean fiables, pertinentes y útiles para la toma de decisiones, la planificación de actividades y la elaboración de informes técnicos, contribuyendo a la solidez y coherencia del proyecto.

Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa: Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

Adquisición de cartografía y demás información técnica: Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

Gestión administrativa: Orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto

Revisión y análisis de los criterios de sostenibilidad aplicables a los diseños en ejecución (Urbanismo, Tránsito y Seguridad Vial) – 15 de diciembre de 2025: Durante la jornada se realizó la revisión técnica de los criterios de sostenibilidad incorporados en los diseños en ejecución de los componentes de urbanismo, tránsito y seguridad vial, verificando su coherencia con la normativa vigente, los lineamientos del proyecto y las condiciones del entorno. Asimismo, se evaluó la integración de medidas orientadas a la movilidad segura, la accesibilidad, la eficiencia en el uso del espacio público y la mitigación de impactos ambientales y sociales, con el fin de asegurar soluciones técnicas sostenibles y funcionales.

Mesa Técnica - Volumen XVII (Componentes de Ambiental, Social y Sostenibilidad) – 15 de diciembre de 2025: Se desarrolló la Mesa Técnica del Volumen XVII con el fin de revisar y articular los componentes Ambiental, Social y de Sostenibilidad, mediante un ejercicio de análisis técnico conjunto que permitió evaluar los avances alcanzados, aclarar el método de trabajo para la consolidación de la información y la presentación del estado de las solicitudes de información previamente gestionadas ante las entidades competentes, en el marco del cronograma del proyecto.

Comité de seguimiento virtual realizado el 16 de diciembre de 2025, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

Mesa Técnica – Volumen XVII (Componente Predial y SIG) – 17 de diciembre de 2025: Espacio técnico orientado a la revisión de las observaciones formuladas a la información del Componente Predial, así como al seguimiento del avance de las actividades ejecutadas y programadas, incluyendo las visitas de campo. Adicionalmente, se abordó el estado y la gestión de la información del Sistema de Información Geográfica (SIG), con el fin de garantizar su actualización, consistencia y correcta articulación con el proyecto.

Mesa de trabajo BIM – 17 de diciembre de 2025: La reunión se centró en la revisión del Plan de Ejecución BIM (BEP) y de la metodología asociada, destacándose la necesidad de precisar y ajustar el alcance del proyecto en función de las limitaciones de tiempo y presupuesto, así como la correcta gestión, organización y trazabilidad de la información dentro del Entorno Común de Datos (CDE)

Reunión Metodología BIM con el componente de Taludes – 18 de diciembre de 2025: Espacio de articulación técnica orientado a la integración del componente de taludes dentro de la metodología BIM, en el cual se socializaron y analizaron los aportes del volumen de taludes como insumo fundamental para la modelación.

Secciones de trabajo de la Metodología BIM – Entorno Común de Datos (CDE) – 18 de diciembre de 2025: Orientada a la organización, estructuración y estandarización de la información dentro del Entorno Común de Datos (CDE), garantizando la correcta gestión, trazabilidad y coordinación de los insumos del proyecto.

Actividades en campo – 15 al 20 de diciembre de 2025: En el marco del proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO", el equipo de topografía desarrolló durante el período reportado una serie de actividades técnicas en el cierre del Tramo No. 5 y el inicio del Tramo No. 4, las cuales son fundamentales para garantizar la correcta georreferenciación, precisión altimétrica y planimétrica, y generación de insumos confiables para los estudios y diseños definitivos del proyecto.

Específicamente las actividades se dividieron en:
Se realizó la marcación de puntos de control de vuelo para coordenadas terrestres, necesarios para el correcto procesamiento de la información fotogramétrica y LiDAR, asegurando el amarre al sistema de referencia oficial. Esta actividad permitió el cierre del Tramo No. 5 y el inicio del Tramo No. 4, dejando aproximadamente 1 kilómetro del Tramo No. 4 debidamente marcado, lo cual garantiza la continuidad geométrica y topográfica del corredor vial.

Complementariamente, se realizó el vuelo con dron para la toma de información fotogramétrica, identificando la vía en general y sus diferentes componentes, tales como cunetas, obras de drenaje, líneas y postes eléctricos, entre otros elementos existentes. A partir de esta información se generaron productos técnicos como el Ortofoto - mosaico, el Modelo Digital del Terreno (MDT) y curvas de nivel preliminares, los cuales sirven de base para los análisis geométricos, hidráulicos y de diseño vial.

Así mismo, se ejecutó el levantamiento de la poligonal del cierre del Tramo No. 5, verificando y ajustando las coordenadas mediante puntos de control previamente instalados y medidos con tecnología GPS, con el fin de asegurar la precisión planimétrica y la coherencia espacial de toda la información levantada en campo.

Se finalizaron las actividades de nivelación y contra nivelación del Tramo No. 5, garantizando el cierre altimétrico del tramo.

Adicionalmente, se desarrollaron actividades de topografía LiDAR para el cierre del Tramo No. 5, lo que permitió la captura masiva de datos del terreno con alta densidad y precisión, especialmente en sectores de difícil acceso y con cobertura vegetal. Esta información constituye un insumo clave para la generación de modelos digitales y el análisis detallado del relieve.

De manera complementaria a las actividades de campo, a cargo del profesional topógrafo, realizó labores administrativas y trabajos de oficina, correspondientes a los procesos de cálculo de gabinete, incluyendo los cálculos aritméticos de la poligonal de amarre, nivelación y contra nivelación, así como el procesamiento de nubes de puntos, generación y ajuste de modelos digitales del terreno entre los diferentes abscisados del proyecto. Estas actividades son indispensables para la validación, control de calidad y entrega de información técnica confiable.

Observaciones en la ejecución de las actividades.

Se deja constancia de que, durante el período reportado, las actividades de topografía se han visto afectadas por condiciones climáticas adversas, dado que actualmente la zona del proyecto se encuentra en temporada de invierno, presentándose lluvias constantes a diferentes horas del día y alta nubosidad, lo cual ha limitado la ejecución normal de las labores programadas, especialmente aquellas que requieren vuelos con dron y mediciones precisas en campo. Esta situación ha reducido significativamente el tiempo efectivo de trabajo y ha generado ajustes en la programación y el cronograma de actividades.

Adicionalmente, debido a labores realizadas por la comunidad, consistentes en rocería y limpieza de los costados de la vía, se presentó la obstrucción y pérdida visual de algunos mojones GPS, ocasionada por material vegetal y árboles cortados. Esta situación ha requerido la búsqueda, destape y verificación de dichos puntos, y en algunos casos la construcción de nuevos mojones, lo cual ha generado retrasos adicionales en la continuidad del levantamiento de la poligonal y demás actividades topográficas asociadas.

Actividades Diarias

Específicamente, las actividades se desarrollaron de la siguiente manera:

•**El 15 y 16 de diciembre de 2025**, profesional topógrafo realizo trabajos de oficina correspondiente a los procesos de cálculo de gabinete, haciendo procesos aritméticos de cálculo de poligonal de amarre, cálculo de nivelación y contra nivelación; así mismos procesos de cálculo de nubes de puntos y modelos digitales de terreno entre los abscisado que corresponden desde el k 96 + 890 hasta el k 95 + 724 y desde el K 95+724 hasta el k93+300 pertenecientes al tramo # 5. Adicional, también se recopila la información del estado del tiempo, dejando registrado en el formato asignado, las condiciones climáticas que se van presentando durante el día.

•**El 17 de diciembre de 2025,** se realizaron actividades de campo correspondiente a:

Marcación de puntos de control de vuelo para coordenadas terrestres desde el K 92 + 750 hasta el k 90 + 050.
Vuelo con dron para la toma de información fotogramétrica desde el K 93 + 300 hasta el K 92 + 750.
Levantamiento de la poligonal del Tramo No. 5 hasta el GPS 20, desde el K 94 + 250 hasta el K 92 + 750.
Nivelación y contra nivelación del Tramo No. 5 desde el K 93 + 750 hasta el k 89 + 000.
A cargo del profesional topógrafo, realizó labores administrativas y trabajos de oficina correspondiente a la digitación y programación de la información recopilada en la jornada laboral de la presente fecha.

Observaciones:

oPor condiciones climáticas de lluvia y neblina, no permiten avanzar en tramos largos para el levantamiento y recopilación de la información topográfica en su totalidad. Por ciertos lapsos de tiempo hubo que suspender actividades por completo debidos a las fuertes lluvias.

oMojones del costado de la vía, se encontraban tapados por material vegetal y arboles cortados de la rocería que hicieron la comunidad, por lo tanto, se procedió a destaparlos nuevamente.

•**El 18 de diciembre de 2025,** se realizaron actividades de campo correspondiente a:

Marcación de puntos de control de vuelo para coordenadas terrestres desde el k 90 + 050 hasta el k 88 + 000 (Se realizo 1 kilometro que está dentro del tramo # 4).
Vuelo con dron para la toma de información fotogramétrica desde el K 92 + 750 hasta el K 91 + 9660.
Levantamiento de la poligonal del Tramo No. 5 Iniciando desde el GPS 20, el K 92 + 750 hasta el K 91 + 750 aproximadamente.
Se realizo de niveles de la poligonal en tramo que va desde el mojón punto 172 hasta el punto 175, corroborando información recopilada con anterioridad y dando continuidad a las demás actividades.
Interventoría realizo visita de campo, verificando avance y ejecución de las actividades por parte del equipo de topografía, corroborando labores realizadas.

Observaciones:

oPor condiciones climáticas de lluvia y neblina, que no permitieron avanzar en tramos largos para el levantamiento y recopilación de la información topográfica en su totalidad. Por ciertos lapsos de tiempo hubo que suspender actividades por completo debidos a las fuertes lluvias.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.
Volumen 19. Informe final ejecutivo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

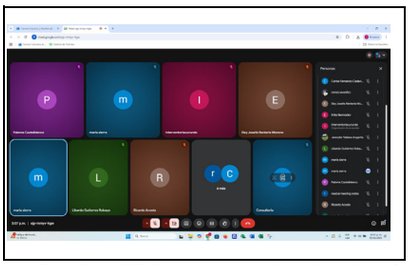

Mesa Técnica - Volumen XVII (Componentes de Ambiental, Social y Sostenibilidad) – 15 de diciembre de 2025



Revisión y análisis de los criterios de sostenibilidad aplicables a los diseños en ejecución (Urbanismo, Tránsito y Seguridad Vial) – 15 de diciembre de 2025:




Revisión y análisis de los criterios de sostenibilidad aplicables a los diseños en ejecución (Urbanismo, Tránsito y Seguridad Vial) – 15 de diciembre de 2025:




Comité de seguimiento virtual realizado el 16 de diciembre de 2025




Comité de seguimiento virtual realizado el 16 de diciembre de 2025

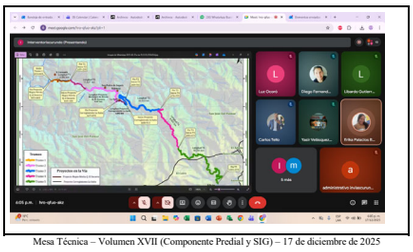

Mesa Técnica – Volumen XVII (Componente Predial y SIG) – 17 de diciembre de 2025



Mesa Técnica – Volumen XVII (Componente Predial y SIG) – 17 de diciembre de 2025




Mesa Técnica – Volumen XVII (Componente Predial y SIG) – 17 de diciembre de 2025




Mesa de trabajo BIM – 17 de diciembre de 2025




Mesa de trabajo BIM – 17 de diciembre de 2025



Seccione de trabajo de la Metodología BIM – Entorno Común de Datos (CDE) – 18 de diciembre de 2025



Seccione de trabajo de la Metodología BIM – Entorno Común de Datos (CDE) – 18 de diciembre de 2025

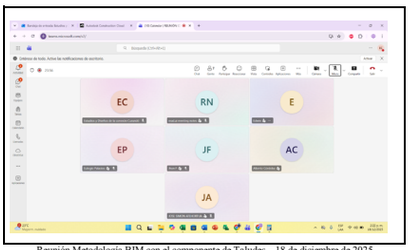

Reunión Metodología BIM con el componente de Taludes – 18 de diciembre de 2025



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTORA DE CONSULTORÍA
	FIRMA NOMBRE: EDLY STELLA RENTERÍA MENA Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/12/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 56 del 22 al 27 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **APOYO A LA SUPERVISION:** YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.752.567.320,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.637.560.821,26	98,69%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.637.560.821,26	98,69%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.637.560.821,26	98,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.637.560.821,26	98,69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 78.595.809,74	0,90%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 78.595.809,74	0,90%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 98,69%
Meta Física Ejecutada % 98,69%

Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 23.192.657,14			$ 23.192.657,14	0,26%
					Ejec	$ 23.192.657,14			$ 23.192.657,14	0,26%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ -	
						Total Ejec				$ -	

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de consultoría por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024	Prog	$ 55.403.152,60			$ 55.403.152,60	0,63%
					Ejec	$ 55.403.152,60			$ 55.403.152,60	0,63%

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	.....	NO .....
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI	.....	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	.....	NO .....
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI	.....	NO .....

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	.....	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	.....	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	42	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

.....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....

FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....

AVALÚOS APROBADOS: .....

PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Revisión de información secundaria: Consistió en examinar y evaluar la información secundaria disponible, como estudios previos, informes técnicos, bases de datos y documentación relacionada con el proyecto. El objetivo es asegurar que los datos sean fiables, pertinentes y útiles para la toma de decisiones, la planificación de actividades y la elaboración de informes técnicos, contribuyendo a la solidez y coherencia del proyecto.

Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa: Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

Adquisición de cartografía y demás información técnica: Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

Gestión administrativa: Orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto

Entrega de modelo digital – Tramos 4 y 5:
Se realiza la entrega del modelo digital correspondiente a los tramos 4 y 5 del proyecto, con el fin de dar inicio a su revisión técnica y análisis, de acuerdo con el cronograma establecido y los requerimientos definidos para esta fase.

Actividades en campo – 22 al 27 de diciembre de 2025: En el marco del proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO", el equipo de topografía desarrolló durante el período reportado una serie de actividades técnicas las cuales son fundamentales para garantizar la correcta georreferenciación, precisión altimétrica y planimétrica, y generación de insumos confiables para los estudios y diseños definitivos del proyecto.

Específicamente las actividades se dividieron en:

•**El 21 de diciembre de 2025**, se realizaron actividades de campo correspondiente a:

Marcación de puntos de control de vuelo para coordenadas terrestres abarcando toda la longitud del tramo #4.
Vuelo con dron para la toma de información fotogramétrica del tramo #4, desde el K 88 + 619 hasta el K 78 + 995.
Levantamiento de la poligonal del Tramo # 4 Iniciando desde el K 84 + 000 hasta el K 86 + 516 aproximadamente.
Del tramo 3, se corrigióo la instalación de mojones para puntos de GPS y poligonal ya que habían sido instalados de una manera incorrecta por comisión de trabajo anterior a la presente que había realizado la labor. Se instalaron 2 mojes nuevos.
Marcación de puntos de control de vuelo para coordenadas terrestres abarcando una parte de la longitud del tramo #3. Iniciando desde el K 78 + 995 hasta el K 76 + 000 aproximadamente.
Vuelo con dron para la toma de información fotogramétrica de una parte del tramo #3, desde el K 78 + 995 hasta el K 76 + 000 aproximadamente
Levantamiento de la poligonal finalizando el tramo # 5 e iniciando tramo # 4. Dando iiniciando desde el K91 + 750 hasta el K88 + 000 aproximadamente.
Del tramo #3, se inició a georreferenciación con equipos de GPS tomando como punto de partido el GPS 15, el cual ya se tenía la información, avanzando a los GPS 14 - 15 y 16. Se instalaron 6 pares de equipos GPS, georreferenciando una longitud de vía aproximadamente de 2.955 ml hasta desde el K 78 + 99 hasta el K 76 + 000 aproximadamente.

El 22 de diciembre de 2025, se realizaron actividades de campo correspondiente a:

Marcación de puntos de control de vuelo para coordenadas terrestres abarcando una parte de la longitud del tramo #3. Iniciando desde el K 76 + 000 hasta el K 72 + 000 aproximadamente.
Levantamiento de la poligonal finalizando el tramo # 4. Dando iniciando desde el K 88 + 000 hasta el K 86 + 516 aproximadamente, finalizando esta actividad en los tramos # 4 y 5.
Del tramo #3, se continuo con la georreferenciación con equipos de GPS tomando como punto de partido el GPS 12, el cual ya se tenía la información, Se instalaron 6 pares de equipos GPS, georreferenciando una longitud de vía aproximadamente de 4.000 ml hasta desde el K 76 + 000 hasta el K 72 + 00 aproximadamente.
Del tramo 3, se realizó la instalación de nuevos mojones para puntos de GPS y poligonal ya que habían sido instalados de una manera incorrecta por comisión de trabajo anterior a la presente que había realizado la labor. Se instalaron 2 mojes nuevos.

•**El 23 de diciembre de 2025**, se realizaron actividades de campo correspondiente a:

Finalización de llevantamiento de la poligonal del tramo # 4.
Del tramo #3, se continuo con la georreferenciación con equipos de GPS tomando como punto de partido el GPS 10, el cual ya se tenía la información. Se tomo información del GPS 9 Y 8, culminando esta actividad en todo el tramo # 3, llegando hasta el corregimiento de la Italia, georreferenciando una longitud de vía aproximadamente de 3.087 ml, desde el K 72 + 000 hasta el K 68 + 913 aproximadamente.
Del tramo #2, se realizó la instalación de nuevos mojones para puntos de GPS y poligonal. Se construyeron 4 mojes para los GPS 7 Y 6.

•**El 26 de diciembre de 2025, se** realizaron actividades de campo correspondiente a:

Del tramo #2, se continuo con la georreferenciación con equipos de GPS tomando como punto de partido el GPS 8, el cual ya se tenia la información. Se tomo la información del GPS 7 Y 6, dando continuidad con esta actividad, llegando hasta el corregimiento de San Pedro de Ingara, georreferenciando una longitu de vía aproximadamente de 5,323 ml, desde el K 68 + 913 hasta el K 63 + 590 aproximadamente.
Del tramo #2, se realizó la instalación de nuevos mojones para puntos de GPS y poligonal. Se construyeron 2 mojes para los GPS # 5 en el K 61 + 805 aproximadamente, dando como finalizada esta actividad en específica sobre tomo el recorrido de la vía ya que el mojón # 4 ya estaba construido y se encuentra en vereda el socorro, específicamente en el sector del puente.

•**El 27 de diciembre de 2025**, se realizaron actividades de campo correspondiente a:

Del tramo #2, se continuo con la georreferenciación con equipos de GPS tomando como punto de partido el GPS 6, el cual ya se tenía la información. Se tomo la información del GPS 5 y 4, dando continuidad con esta actividad, llegando hasta la vereda el socorro en el K 60 + 100 y quedando finalizada es actividad en todos los tramos que abarca la longitud del proyecto. Ggeorreferenciando una longitud de vía aproximadamente de 3.490 ml, desde el K 63 + 590 hasta el K 60 + 100 aproximadamente.
Del tramo #4, se realizó actividad de llevantamiento de la poligonal desde el GPS 16 hasta el GPS 13 por el motivo de verificación por tal motivo, equipo de profesionales actuales decidieron tomar la información nuevamente utilizando los equipos de RTK. Dando iniciando desde el K 83 + 834 hasta el K 78 + 02 del tramo # 4 y una parte del final del tramo # 3, una longitud de 1,049 ml aproximadamente.
Marcación de puntos de control de vuelo para coordenadas terrestres abarcando una parte de la longitud del tramo #2. Iniciando desde el GPS 4 que se encuentra ubicado en la vereda el socorro, sector el puente, desde el K 61 + 100 hasta el K 62 + 100, una longitud de 1 kilometro aproximadamentee; y a su ve también se realizó actividad de vvuelo con dron para la toma de información fotogramétrica del inicio del tramo # 2, abarcando la misma longitud mencionada con anterioridad.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.
Volumen 19. Informe final ejecutivo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTORA DE CONSULTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: EDLY STELLA RENTERÍA MENA Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/12/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 57 del 29 al 31 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **APOYO A LA SUPERVISION:** YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÈ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.700.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÀSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.752.567.320,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.700.000.000,00	99,40%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.700.000.000,00	99,40%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.700.000.000,00	99,40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.700.000.000,00	99,40%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 62.439.178,74	0,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 62.439.178,74	0,71%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99,40%
Meta Física Ejecutada % 99,40%

Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 23.192.657,14			$ 23.192.657,14	0,26%
					Ejec	$ 23.192.657,14			$ 23.192.657,14	0,26%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ -	
						Total Ejec				$ -	

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de consultoria por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024	Prog	$ 39.246.521,60			$ 39.246.521,60	0,45%
					Ejec	$ 39.246.521,60			$ 39.246.521,60	0,45%

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	42	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

□ **Revisión de información secundaria:** Consistió en examinar y evaluar la información secundaria disponible, como estudios previos, informes técnicos, bases de datos y documentación relacionada con el proyecto. El objetivo es asegurar que los datos sean fiables, pertinentes y útiles para la toma de decisiones, la planificación de actividades y la elaboración de informes técnicos, contribuyendo a la solidez y coherencia del proyecto.

□ **Apropiación de los estudios y diseños y/o documentación técnica previa:** Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

□ **Adquisición de cartografía y demás información técnica:** Se enfoca en familiarizarse con los estudios, diseños y documentación técnica previa para comprender su alcance, metodología y resultados. El objetivo es integrar esta información al desarrollo del proyecto, identificar elementos relevantes para la planificación y ejecución, y garantizar que las decisiones se tomen con base en información técnica sólida y coherente.

□ **Gestión administrativa:** Orientada a la recolección y entrega mensual de la documentación requerida, con el fin de elaborar el acta de costos y cumplir con los trámites internos de la consultoría en el marco del proyecto

□ **Comité de seguimiento virtual realizado el 29 de diciembre de 2025,** con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

□ **Actividades en campo – 29 al 31 de diciembre de 2025:** En el marco del proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO", el equipo de topografía desarrolló durante el período reportado una serie de actividades técnicas las cuales son fundamentales para garantizar la correcta georreferenciación, precisión altimétrica y planimétrica, y generación de insumos confiables para los estudios y diseños definitivos del proyecto.

Específicamente las actividades se dividieron en:

□ Marcación de puntos de control de vuelo para coordenadas terrestres abarcando una parte de la longitud del tramo # 3. Iniciando desde el GPS 12 hasta el GPS 11 que se encuentra desde el K 76 + 000 hasta el K 72 + 720, abarcando una longitud aproximada de 3,280 ml aproximadamente, y a su vez, también se realizó actividad de vvuelo con dron para la toma de información fotogramétrica del tramo # 3, abarcando la misma longitud mencionada con anterioridad.

□ Del tramo # 3, se realizó actividad de llevantamiento de la poligonal desde el GPS 13 hasta el GPS 11, dando iniciando desde el K 78 + 020 hasta el K 73 + 720, abarcando una longitud aproximada de 4,300 ml aproximadamente, utilizando los equipos de RTK.

□ Se realizo actividad de nivelación y contra nivelación de una parte del Tramo # 4, desde el K 89 + 000 hasta el k 84 + 790, abarcando una longitud aproximada de 4,210 ml aproximadamente.

□ Marcación de puntos de control de vuelo para coordenadas terrestres abarcando una parte de la longitud del tramo # 3. Iniciando desde el GPS 11 hasta el GPS 8 que se encuentra desde el K 72 + 720 hasta el K 69 + 000, abarcando una longitud aproximada de 4,720 ml aproximadamente, y a su vez, también se realizó actividad de vvuelo con dron para la toma de información fotogramétrica del tramo # 3, abarcando la misma longitud mencionada con anterioridad, dando como terminada esta actividad en los tramos # 5, 4 y 3.

□ Del tramo # 3, se realizó actividad de llevantamiento de la poligonal desde el GPS 11 hasta el GPS 8, dando iniciando desde el K 73 + 720 hasta el K 69 + 000, abarcando una longitud aproximada de 4,720 ml aproximadamente, utilizando los equipos de RTK, dando como terminada esta actividad en los tramos # 5, 4 y 3.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.
Volumen 19. Informe final ejecutivo


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Comité de seguimiento virtual realizado el 29 de diciembre de 2025

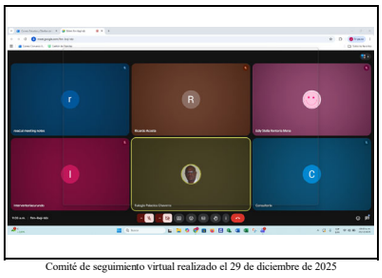

Comité de seguimiento virtual realizado el 29 de diciembre de 2025



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTORA DE CONSULTORÍA
	FIRMA NOMBRE: EDLY STELLA RENTERÍA MEÑA Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 10/01/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 58 del 5 al 10 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** YENNY XIOMARA HERNÁNDEZ PEÑARANDA

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÈ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ 52.567.320,00	FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ 48.037.920,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.752.567.320,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.423.037.920,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2026	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2026	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ 4.350.000.000,00			VALOR AMORTIZADO:	$ 1.187.500.000,00
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE CONSULTORIA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÀSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.752.567.320,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.702.920.406,67	99,43%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.702.920.406,67	99,43%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.702.920.406,67	99,43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.702.920.406,67	99,43%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.920.406,67	0,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.920.406,67	0,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99,43%
Meta Física Ejecutada % 99,43%

Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 2.920.406,67			$ 2.920.406,67	0,03%
					Ejec	$ 2.920.406,67			$ 2.920.406,67	0,03%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ -	
						Total Ejec				$ -	

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de consultoria por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024	Prog				$ -	
					Ejec				$ -	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	42	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se realizaron actividades para organizar y revisar las obligaciones contractuales

□Reunión técnica de avances del componente de Topografía: Se llevó a cabo una reunión técnica en la que se abordaron temas relevantes para el desarrollo del proyecto, centrados en aspectos de la topografía. Durante la jornada, se discutieron observaciones, preocupaciones y lineamientos técnicos, permitiendo un espacio de análisis y retroalimentación entre los participantes.

□Actividades en campo: En el marco del proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCE EL CAIRO", durante el período reportado las labores fueron ejecutadas por un equipo de profesionales, apoyados en equipos topográficos de alta precisión y herramientas especializadas, quienes realizaron levantamientos, verificaciones y procesos de georreferenciación necesarios para asegurar la calidad y confiabilidad de la información. Los resultados obtenidos constituyen un insumo fundamental para la elaboración y validación de los diseños definitivos, garantizando el cumplimiento de los alcances técnicos y contractuales del proyecto.

Específicamente las actividades se dividieron en:

□Equipo de trabajo dividido en dos frentes, realizaron la actividad de nivelación y contra nivelación del Tramo No. 2 desde el K 60 + 100 hasta el k 67 + 070, dando por finalizada esta actividad en todo este tramo.

□Se realizo llevantamiento de la poligonal en una parte del Tramo No. 2 Iniciando desde el GPS 4, el K 61 + 100 hasta el K 61 + 900, abarcando una longitud de 800 ml aproximadamente, debido a que cuando se tomó la información con equipos de RTK, por la vegetación y árboles que se encontraban al constado de la vía, la información no fue tomada con precisión, por tal motivo se debió hacer nuevamente utilizando los equipos de estación total.

Observaciones:

oPor condiciones climáticas de lluvia, no permiten avanzar en un tramo más largo para el levantamiento y recopilación de la información topográfica en su totalidad. Las lluvias se presentaron en horas de la tarde, aproximadamente desde las 4 pm en adelante.

•El 6 de enero de 2026,

□Levantamiento de la poligonal de una parte del Tramo No. 2 abarcando una longitud de 200 ml aproximadamente entre el GPS 7 y el GPS 6, debido a que cuando se tomó la información con equipos de RTK, por la vegetación y árboles que se encontraban al constado de la vía, la información no fue tomada con precisión, por tal motivo se debió hacer nuevamente utilizando los equipos de estación total.

□Equipo de trabajo dividido en dos frentes, realizaron la actividad de nivelación y contra nivelación del Tramo No. 3, donde el primer equipo inicio a realizar levantamiento desde el GPS 13 llegando hasta el GPS 12 y el segundó inicio desde el GPS 11 llegando hasta el GPS 9.

Observaciones:
oPor condiciones climáticas de lluvia, no permiten avanzar en un tramo más largo para el levantamiento y recopilación de la información topográfica en su totalidad. Las lluvias se presentaron en horas de la tarde, aproximadamente desde las 4 pm en adelante.

•El 7 de enero de 2026,

Equipo de trabajo dividido en dos frentes, realizaron la actividad de nivelación y contra nivelación del Tramo No. 3, donde el primer equipo inicio a realizar levantamiento desde el GPS 12 llegando hasta el GPS 11 y el segundó inicio desde el GPS 9 llegando hasta el GPS auxiliar N° 1 ubicado en el K 67 + 070 del corregimiento de La Italia, donde finaliza el tramo N° 2 donde como finalizada esta actividad en el tramo N° 3 y en general de todo el proyecto.

•Entre el 8, 9 y 10 de enero de 2026, se realizó labores administrativas y trabajos de oficina, correspondientes a los procesos de cálculo de gabinete, incluyendo los cálculos aritméticos de la poligonal de amarre, nivelación y contra nivelación, así como el procesamiento de nubes de puntos, generación y ajuste de modelos digitales del terreno entre los diferentes abscisados del proyecto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Ajuste a los informes se los siguientes volumenes:
Volumen 1. Estudios topográficos
Volumen 2. Estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio
Volumen 4. Estudio de seguridad vial
Volumen 5. Estudio de geología y geomorfología local
Volumen 6. Estudio de hidrogeología de detalle
Volumen 7. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales.
Volumen 8. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
Volumen 9. Estudio de hidráulica, hidrología y socavación
Volumen 10. Estudio de diseño de pavimento
Volumen 11. Estudios de diseño de estructuras
Volumen 12. Estudio de urbanismo y paisajismo
Volumen 13. Estudio de redes hidrosanitarias y secas
Volumen 14. Estudio de riesgos
Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
Volumen 16. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto
Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.
Volumen 18. Técnico BIM

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica




Levantamiento de Información Topografica




Levantamiento de Información Topografica



Levantamiento de Información Topografica



Reunión técnica de avances del componente de Topografía



Reunión técnica de avances del componente de Topografía

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTORA DE CONSULTORÍA
	FIRMA NOMBRE: EDLA STELLA RENTERÍA MENA Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/01/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 59 del 12 al 17 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** YENNY XIOMARA HERNÁNDEZ PEÑARANDA

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÈ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ 52.567.320,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.752.567.320,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2026	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ 4.350.000.000,00
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ 48.037.920,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.423.037.920,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2026	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.187.500.000,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÀSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.752.567.320,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.705.840.813,33	99,47%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.705.840.813,33	99,47%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.705.840.813,33	99,47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.705.840.813,33	99,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.920.406,67	0,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.920.406,67	0,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99,47%
Meta Física Ejecutada % 99,47%

Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 2.920.406,67			$ 2.920.406,67	0,03%
					Ejec	$ 2.920.406,67			$ 2.920.406,67	0,03%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ -	
						Total Ejec				$ -	

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de consultoria por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024	Prog	$ -			$ -	
					Ejec	$ -			$ -	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	42	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se realizaron actividades para organizar y revisar las obligaciones contractuales

Mesa de trabajo del volumen de Topografía, equipo consultoría, interventoría y equipo de campo – 13 y 14 de enero de 2026: En la mesa de trabajo se revisó el estado de la información topográfica y su preparación como insumo para el diseño geométrico, se resaltó la necesidad de validar la información antes de su uso, con el fin de evitar reprocesos y duplicidades.

Así mismo, se abordó la importancia de revisar los archivos georreferenciados, la correcta delimitación del contorno de la vía y la integración adecuada de la información proveniente de diferentes métodos de levantamiento, incluyendo la verificación del modelo digital del terreno. Se concluyó que la precisión y consolidación adecuada de la información es fundamental para garantizar un diseño geométrico confiable.

Reunión de articulación técnica volumen de Topografía y Taludes - 13 de enero de 2026: La reunión se desarrolló como un espacio de articulación técnica entre los equipos del Volumen de Topografía y Taludes, con el objetivo de realizar la verificación preliminar de los posibles botaderos, los posibles campamentos y los sitios de acopio asociados al proyecto.

Durante la jornada se analizaron las condiciones generales del terreno, la viabilidad técnica de los sitios identificados y su relación con los estudios topográficos y de estabilidad de taludes, con el fin de garantizar coherencia entre ambos volúmenes.

Comité de seguimiento virtual realizado el 15 de enero de 2026, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

Mesa de Trabajo Técnica del equipo de Consultoría e Interventoría con los especialistas de los volúmenes de Topografía, Diseño Geométrico, Pavimentos, Tránsito, Seguridad Vial, Hidráulica y Geología– 16 de enero de 2026: La Mesa de Trabajo Técnica tuvo como propósito realizar la revisión integral de los avances presentados en cada uno de los volúmenes técnicos Topografía, Diseño Geométrico, Pavimentos, Tránsito, Seguridad Vial, Hidráulica y Geología, a partir del análisis y acompañamiento del equipo de Interventoría. Durante la sesión se evaluó el estado de desarrollo de los estudios, se verificó su coherencia técnica y normativa, y se formularon observaciones y ajustes necesarios orientados a fortalecer la calidad, consistencia y completitud de los productos, con miras a la entrega de un resultado técnico integral, confiable y conforme a los requerimientos del proyecto.

Mesa Técnica de los volúmenes de Topografía, Taludes, Geotecnia, Diseño Geométrico, Pavimentos, Transito, Hidráulica - 16 de enero de 2026: Tuvo como objetivo analizar la situación actual del corredor vial, a partir de la revisión técnica de los estudios y la información disponible. Durante la sesión, los especialistas expusieron el estado del componente físico y funcional de la vía, identificaron las principales condiciones y problemáticas presentes, y formularon recomendaciones técnicas orientadas a la definición de alternativas, ajustes y acciones necesarias para el desarrollo de estudios consistentes, integrales y acordes con las condiciones reales del territorio, garantizando así la calidad y viabilidad de los diseños propuestos.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Ajuste a los informes se los siguientes volumenes:
Volumen 1. Estudios topográficos
Volumen 2. Estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio
Volumen 4. Estudio de seguridad vial
Volumen 5. Estudio de geología y geomorfología local
Volumen 6. Estudio de hidrogeología de detalle
Volumen 7. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales.
Volumen 8. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
Volumen 9. Estudio de hidráulica, hidrología y socavación
Volumen 10. Estudio de diseño de pavimento
Volumen 11. Estudios de diseño de estructuras
Volumen 12. Estudio de urbanismo y paisajismo
Volumen 13. Estudio de redes hidrosanitarias y secas
Volumen 14. Estudio de riesgos
Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
Volumen 16. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto
Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.
Volumen 18. Técnico BIM


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

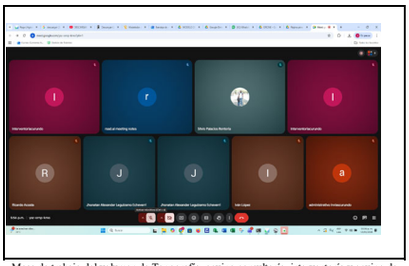

Mesa de trabajo del volumen de Topografía, equipo consultoría, interventoría y equipo de campo – 13 de enero de 2026:

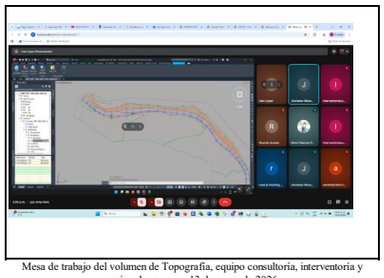

Mesa de trabajo del volumen de Topografía, equipo consultoría, interventoría y equipo de campo – 13 de enero de 2026:




Mesa de trabajo del volumen de Topografía, equipo consultoría, interventoría y equipo de campo – 14 de enero de 2026:




Reunión de articulación técnica volumen de Topografía y Taludes - 13 de enero de 2026:



Reunión de articulación técnica volumen de Topografía y Taludes - 13 de enero de 2026:

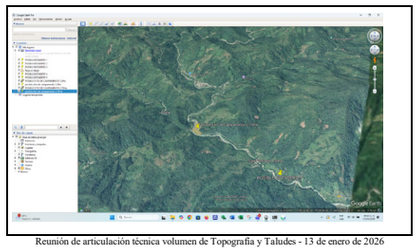

Reunión de articulación técnica volumen de Topografía y Taludes - 13 de enero de 2026




Reunión de articulación técnica volumen de Topografía y Taludes - 13 de enero de 2026




Comité de seguimiento virtual realizado el 15 de enero de 2026




Comité de seguimiento virtual realizado el 15 de enero de 2026




Mesa de Trabajo Técnica del equipo de Consultoría e Interventoría con los especialistas de los volúmenes de Topografía, Diseño Geométrico, Pavimentos, Tránsito, Seguridad Vial, Hidráulica y Geología– 16 de enero de 2026



Mesa de Trabajo Técnica del equipo de Consultoría e Interventoría con los especialistas de los volúmenes de Topografía, Diseño Geométrico, Pavimentos, Tránsito, Seguridad Vial, Hidráulica y Geología– 16 de enero de 2026



Mesa Técnica de los volúmenes de Topografía, Taludes, Geotecnia, Diseño Geométrico, Pavimentos, Transito, Hidráulica - 16 de enero de 2026

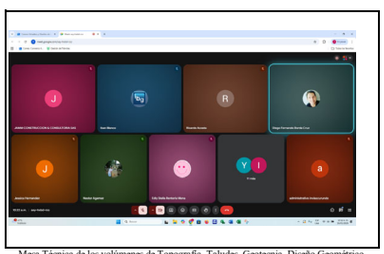

Mesa Técnica de los volúmenes de Topografía, Taludes, Geotecnia, Diseño Geométrico, Pavimentos, Transito, Hidráulica - 16 de enero de 2026

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTORA DE CONSULTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EDLY STELLA RENTERÍA MENA

Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/01/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 60 del 19 al 24 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** YENNY XIOMARA HERNÁNDEZ PEÑARANDA

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ 52.567.320,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.752.567.320,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2026	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ 4.350.000.000,00
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ 48.037.920,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.423.037.920,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2026	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.187.500.000,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.752.567.320,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.708.761.220,00	99,50%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.708.761.220,00	99,50%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.708.761.220,00	99,50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.708.761.220,00	99,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.920.406,67	0,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.920.406,67	0,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99,50%
Meta Física Ejecutada % 99,50%

Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 2.920.406,67			$ 2.920.406,67	0,03%
					Ejec	$ 2.920.406,67			$ 2.920.406,67	0,03%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ -	
						Total Ejec				$ -	

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de consultoria por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024	Prog				$ -	
					Ejec				$ -	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN: ……
……

PERMISO MINERO: SI …… NO ……
LICENCIA AMBIENTAL: SI …… NO ……

UBICACIÓN: ……
……

PERMISO MINERO: SI …… NO ……
LICENCIA AMBIENTAL: SI …… NO ……

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ……	NO ……	N/A ……
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ……	NO ……	N/A ……
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ……	NO ……	N/A ……
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ……	NO ……	N/A ……
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ……	NO ……	N/A ……
VERTIMIENTOS:	SI ……	NO ……	N/A ……
EMISIONES:	SI ……	NO ……	N/A ……
OTROS (Especificar cual)	SI ……	NO ……	N/A ……

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ……

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ……

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ……
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ……
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ……
……

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ……
FICHAS PREDIALES APROBADAS: ……
AVALÚOS APROBADOS: ……
PREDIOS ADQUIRIDOS: ……

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se realizaron actividades para organizar y revisar las obligaciones contractuales

Coordinación logística para el desplazamiento del Grupo 1 de la Consultoría a la ciudad de Bogotá: Se llevó a cabo la coordinación logística para el desplazamiento de la directora, el Coordinador Técnico y la coordinadora ambiental y social a la ciudad de Bogotá, incluyendo la gestión de itinerarios, reservas y demás requerimientos necesarios, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la agenda prevista con el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, en el marco de la asistencia al comité de seguimiento.

Reunión técnica para la evaluación de alternativas desde el punto de vista geotécnico frente al punto crítico denominado "La Virgen", con el fin de analizar las condiciones del sector y plantear posibles soluciones de intervención – 19 de enero de 2026.

Revisión técnica de las fichas sociales – 19 de enero de 2026: Actividad orientada a la revisión, verificación y ajuste de las fichas sociales, con el fin de garantizar la consistencia, completitud y calidad de la información recopilada.

Revisión de matrices de identificación y evaluación de impactos – Medio socioeconómico - 19 de enero de 2026: Se realizó una reunión técnica con el fin de revisar y validar las matrices de identificación y evaluación de impactos del componente socioeconómico, analizando los criterios aplicados, las observaciones presentadas y los ajustes requeridos para su correcta consolidación dentro del estudio.

Revisión de fichas del Plan de Manejo Ambiental – Componente biótico (servicios ecosistémicos) - 19 de enero de 2026: Se llevó a cabo una reunión técnica con el objetivo de revisar y ajustar las fichas correspondientes al Plan de Manejo Ambiental del componente biótico, específicamente en lo relacionado con los servicios ecosistémicos, evaluando su coherencia técnica y los ajustes necesarios para su correcta implementación.

Mesa técnica de volúmenes de Topografía y Diseño Geométrico – 19 de enero de 2026: Espacio de articulación técnica implementado con el propósito de definir y unificar el sistema de coordenadas a emplear en el diseño geométrico del corredor vial, garantizando la coherencia entre la información topográfica y los criterios de diseño. Esta instancia permitió mejorar la comunicación y el intercambio de información entre los ingenieros de las diferentes disciplinas, así como asegurar la correcta interpretación y compatibilidad de los insumos técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto.

Comité de seguimiento virtual realizado el 22 de enero de 2026, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.
Mesa técnica para la estructuración del Plan de Contingencia y la reprogramación de entrega de volúmenes – 23 y 24 de enero de 2026: Espacio técnico de análisis y concertación orientado a definir medidas de contingencia y ajustar el cronograma de entrega de volúmenes, garantizando la continuidad y el adecuado desarrollo del proyecto.

Entre el 19 y 24 de enero de 2026: El Volumen de Topografía desarrolló la proyección de la información de los diseños a un origen único, junto con la elaboración del PTL del plano topográfico local.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Ajuste a los informes se los siguientes volumenes:
Volumen 1. Estudios topográficos
Volumen 2. Estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio
Volumen 4. Estudio de seguridad vial
Volumen 5. Estudio de geología y geomorfología local
Volumen 6. Estudio de hidrogeología de detalle
Volumen 7. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales.
Volumen 8. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
Volumen 9. Estudio de hidráulica, hidrología y socavación
Volumen 10. Estudio de diseño de pavimento
Volumen 11. Estudios de diseño de estructuras
Volumen 12. Estudio de urbanismo y paisajismo
Volumen 13. Estudio de redes hidrosanitarias y secas
Volumen 14. Estudio de riesgos
Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
Volumen 16. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto
Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.
Volumen 18. Técnico BIM

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

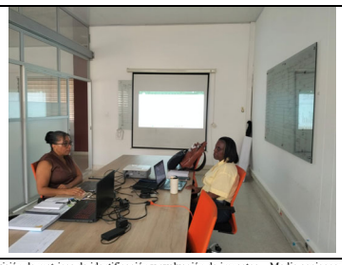


Revisión de matrices de identificación y evaluación de impactos – Medio socioeconómico - 19 de enero de 2026




Revisión de fichas del Plan de Manejo Ambiental – Componente biótico (servicios ecosistémicos) - 19 de enero de 2026

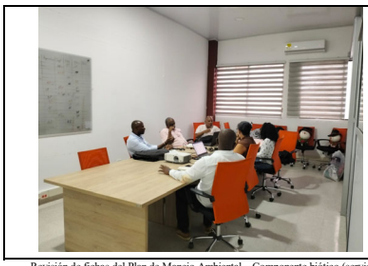


Revisión de fichas del Plan de Manejo Ambiental – Componente biótico (servicios ecosistémicos) - 19 de enero de 2026




Revisión técnica de las fichas sociales – 19 de enero de 2026



Mesa técnica de volúmenes de Topografía y Diseño Geométrico – 19 de enero de 2026



Mesa técnica de volúmenes de Topografía y Diseño Geométrico – 19 de enero de 2026



Comité de seguimiento virtual realizado el 22 de enero de 2026,



Mesa técnica para la estructuración del Plan de Contingencia y la reprogramación de entrega de volúmenes – 23 de enero de 2026



Mesa técnica para la estructuración del Plan de Contingencia y la reprogramación de entrega de volúmenes – 23 de enero de 2026



Mesa técnica para la estructuración del Plan de Contingencia y la reprogramación de entrega de volúmenes – 24 de enero de 2026



Mesa técnica para la estructuración del Plan de Contingencia y la reprogramación de entrega de volúmenes – 24 de enero de 2026

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTORA DE CONSULTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EDILY STELLA RENTERÍA MENA

Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **SEMANA No:** 61 del 26 al 31 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** YENNY XIOMARA HERNÁNDEZ PEÑARANDA

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VOLÚMENES O PRODUCTOS TÉCNICOS ENTREGABLES DE FASE III: 1. Entregable estudios topográficos; 2 entregable estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio; 3 entregable estudio de trazado y diseño geométrico; 4 entregable estudio de seguridad vial; 5 entregable estudio de geología y geomorfología local; 6 entregable estudio de hidrogeología de detalle; 7 entregable estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y puentes de materiales; 8 entregable estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras; 9 entregable hidráulica, hidrología, y socavación; 10 entregable estudio y diseño de pavimentos; 11 entregable estudio y diseño de estructuras; 12 entregable estudio de urbanismo y paisajismo; 13 estudio redes hidrosanitarias y secas; 14 entregable estudio de riesgos; 15 entregable estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones; 16 entregable evaluación socioeconómica y financiera del proyecto; 17 entregable ambiental, social, predial y sostenibilidad; 18 entregable volumen técnico de BIM; 19 entregable informe final.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO- SAN JOSÉ DEL PALMAR- CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA, lo cual incluye el desarrollo de 19 volúmenes.

CONTRATO DE CONSULTORÍA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONSULTORÍA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA			INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4227-2024	VALOR INICIAL:	$ 8.700.000.000,00	CONTRATO No.	4262 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.375.000.000,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ 52.567.320,00	FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ 48.037.920,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 8.752.567.320,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.423.037.920,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2026	VALOR ANTICIPO	$ 4.350.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 DE ABRIL DE 2026	VALOR ANTICIPO:	$ 1.187.500.000,00
		VALOR AMORTIZADO	$ 4.350.000.000,00			VALOR AMORTIZADO:	$ 1.187.500.000,00
		SALDO POR AMORTIZAR	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.350.000.000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORÍA

VALOR BÀSICO CONTRATO DE CONSULTORÍA (A):	$ 8.752.567.320,00	
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.713.141.830,00	99,55%
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.713.141.830,00	99,55%
AVANCE O ATRASO DE CONSULTORÍA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.713.141.830,00	99,55%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.713.141.830,00	99,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.285.457,50	0,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.285.457,50	0,04%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 4.350.000.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.187.500.000,00
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99,55%
Meta Física Ejecutada % 99,55%

Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	UND		2024	2024	Prog	$ 3.285.457,50			$ 3.285.457,50	0,04%
					Ejec	$ 3.285.457,50			$ 3.285.457,50	0,04%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANÁLISS DE SERVICIO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICO ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS Y SECAS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE RIESGOS	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
	TÉCNICO BIM	UND		2024	2024	Prog					
						Ejec					
*	**COSTO TOTAL VOLUMUNES**					**Total Prog**				$ -	
						Total Ejec				$ -	

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de consultoria por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico				Total	%
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		2024	2024	Prog				$ -	
					Ejec				$ -	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONS	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	42	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	29	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se realizaron actividades orientadas a la organización y revisión de las obligaciones contractuales y administrativas.

El 26 de enero de 2026. Se realizó de manera presencial el Comité de Seguimiento mensual, con la participación del equipo de la consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, en las instalaciones de esta entidad en la ciudad de Bogotá: Durante la jornada se socializaron los avances técnicos y administrativos, se revisaron los compromisos establecidos en sesiones anteriores y se definieron acciones para fortalecer la ejecución del contrato de la Consultoría.

Socialización del Diseño Geométrico (DG) y la definición de avances que puedan desarrollarse de manera articulada con cada uno de los volúmenes, así como la presentación de alternativas para el punto crítico denominado La Virgen, con el fin de presentar dichas alternativas a los especialistas de los demás volúmenes – 28 de enero de 2026: Se realizó mesa de trabajo para la socialización del Diseño Geométrico (DG), en la cual se revisaron avances articulables entre los diferentes volúmenes y se analizaron alternativas para el punto crítico denominado La Virgen, con el fin de su validación técnica interdisciplinaria y se establecieron entregas definitivas ademas de reuniones entre especialista de la interventoría

Comité de seguimiento virtual realizado el 29 y 30 de enero de 2026, con la participación del equipo de consultoría, la interventoría y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS: Durante el espacio se socializaron los avances técnicos para la entregas definitivas de los volumenes que dependen de Topografia y Diseño Geometrico.

Actividades – Volumen de Topografia - 26 y 31 de enero de 2026: Durante la semana, el volumen de Topografía desarrolló actividades orientadas a la verificación y validación de la información recolectada en campo. De manera paralela, se realizó la proyección de la información correspondiente a los diseños hacia el origen único, así como la elaboración del PTL del plano topográfico local.

Se realizó mesa de trabajo entre los especialistas del componente de Geotecnia (Interventoría - Consultoría) con el fin de revisar los avances técnicos, modificar la metodología de acuerdo al alcance actual y la entrega del informe definitivos en su primera versión.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Ajuste a los informes se los siguientes volumenes:
Volumen 1. Estudios topográficos
Volumen 2. Estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio
Volumen 4. Estudio de seguridad vial
Volumen 5. Estudio de geología y geomorfología local
Volumen 6. Estudio de hidrogeología de detalle
Volumen 7. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales.
Volumen 8. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
Volumen 9. Estudio de hidráulica, hidrología y socavación
Volumen 10. Estudio de diseño de pavimento
Volumen 11. Estudios de diseño de estructuras
Volumen 12. Estudio de urbanismo y paisajismo
Volumen 13. Estudio de redes hidrosanitarias y secas
Volumen 14. Estudio de riesgos
Volumen 15. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones
Volumen 16. Evaluación socioeconómica y financiera del proyecto
Volumen 17. Ambiental, social, predial y de sostenibilidad.
Volumen 18. Técnico BIM

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Comité de Seguimiento mensual en la ciudad de Bogotá - 26 de enero de 2026




Comité de Seguimiento mensual en la ciudad de Bogotá - 26 de enero de 2026




Comité de Seguimiento mensual en la ciudad de Bogotá - 26 de enero de 2026




Socialización del Diseño Geométrico (DG) y analisis de alternativas para los puntos críticos – 28 de enero de 2026

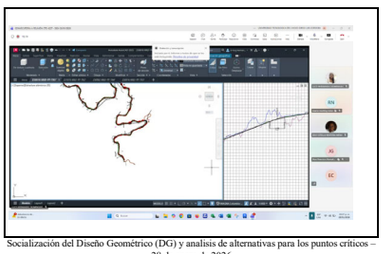


Socialización del Diseño Geométrico (DG) y analisis de alternativas para los puntos críticos – 28 de enero de 2026

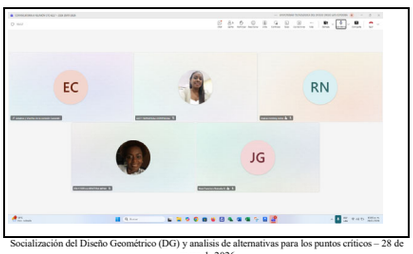

Socialización del Diseño Geométrico (DG) y analisis de alternativas para los puntos críticos – 28 de enero de 2026



Socialización del Diseño Geométrico (DG) y analisis de alternativas para los puntos críticos – 28 de enero de 2026




Comité de seguimiento virtual realizado el 29 de enero de 2026



Comité de seguimiento virtual realizado el 29 de enero de 2026



Comité de seguimiento virtual realizado el 30 de enero de 2026



Comité de seguimiento virtual realizado el 30 de enero de 2026



Comité de seguimiento virtual realizado el 30 de enero de 2026

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTORA DE CONSULTORÍA
	FIRMA NOMBRE: EDLAY STELLA RENTERÍA MENA Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE COONSULTORÍA No: 4227 - 2024 **CONSULTOR:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-25 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4262 - 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACHOCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Tarifa Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDLY STELLA RENTERIA MENA	54.255.569	DIRECTORA	$ 10.240.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 427.700	V	NUEVA EPS	91737364	$ 768.000	Colpensiones	91737364	$ 1.044.700	$ -	$ -	$ -	
2	JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS	1.077.476.234	RESIDENTE DE ESTUDIOS	$ 5.850.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 458.100	V	NUEVA EPS	9494908726	$ 822.700	Colpensiones	9494908726	$ 1.119.000	$ 263.300	$ -	$ 197.500	
3	BERTONIS RENTERIA VALENCIA	11.811.142	RESIDENTE DE CAMPO	$ 5.850.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 407.200	V	NUEVA EPS	9494908726	$ 731.300	Colpensiones	9494908726	$ 994.600	$ 234.000		$ 175.500	
4	EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA	1010190981	COORDINADOR BIM SIG	$ 7.160.050	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 45.000	V	COMPENSAR EPS	91870058 - 91503642	$ 538.100	Colpensiones	91870058 - 91503642	$ 688.700	$ 25.900			
5	LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ	52.102.426	COORDINADORA AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 8.045.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 909.900	V	NUEVA EPS	9494908726	$ 1.634.200	Colpensiones	9494908726	$ 2.222.500	$ 523.000	$ -	$ 392.200	
6	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	11.788.838	COORDINADOR TÉCNICO	$ 8.045.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ -	V	NUEVA EPS	91744331	$ 603.400	Colpensiones	91744331	$ 772.400		$ -		
7	LLECELI MOSQUERA TELLO	1.077.463.135	INGENIERA AUXILIAR	$ 3.890.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 304.600	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9494908726	$ 547.100	Porvenir	9494908726	$ 700.200	$ 175.100	$ -	$ 131.300	
8	JEISON STIVEN GOMEZ GARCIA	1.112.789.406	TECNICO DE LA ZONA	$ 3.070.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 128.300	V	NUEVA EPS	9494695699	$ 230.300	Porvenir	9494695699	$ 294.800		$ -		
9																																													
10																																													
11																																													
N																																													

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERIA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de interventoria
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA	VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	25/11/2025	91737364	$2.240.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	768.000	0		0		0	0	0	0	768.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	983.100	0	0	30.800	30.800	0	0		1.044.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	427.700				427.700	0	0	427.700			4.277	427.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	768.000	768.000
Pensión	1	1.044.700	1.044.700
Riesgos Laborales	1	427.700	427.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.240.400	2.240.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA		VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	25/11/2025	91737364	$2.240.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	54255569	RENTERIA MENA EDLY STELLA	57	0			N																	25-14	6.144.000	983.100	0	0	30.800	30.800	EPS037	6.144.000	768.000	14-23	6.144.000	5	427.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Medellín, 04 de Julio de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO, en el centro de trabajo 0005451201 - PLANEAMIENTO FISICO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C54256750	PINO PINO JUANA MARIA	06/04/2011		222Y2391	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C12020854	QUINTO MOSQUERA HARLEY	12/03/2012		A28M7133	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C35891192	MOSQUERA MURILLO ZULEYMA	01/10/2012		17618414	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C11807170	VALOIS CUESTA HAMLETH	18/01/2010		1779X222	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C19259580	BARRIOS MATURANA FRANKLIN	01/06/2002		207141DP	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C11800408	SANABRIA BOTERO JULIO RICARDO	01/07/2010		29144168	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C35851298	RENTERIA MORENO ELSY JOSEFA	05/04/2024		15344302	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C52102426	OCORO VELASQUEZ LUZ YANETH	01/01/2015		183Q9126	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C54255569	RENTERIA MENA EDLY STELLA	01/04/2019		22319724	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11311855672518539349

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/07/2025 10:55:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.1.126.190, 192.230.104.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891680089	4	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO	CRA 22 N° 18B 10	QUIBDO-CHOCO	6726565	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROYECTO (5 Afiliados)							$32,880,625	$5,516,300			$32,880,625	$4,110,300			$32,880,625	$1,315,400			$32,880,625	$2,095,500		$32,880,625	$986,500
Centro de Trabajo: RIESGO 01 (1 Afiliados)							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,700		$3,000,000	$90,000
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,700		$3,000,000	$90,000
1	CC	1193520881	MAYO LISETH		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF29	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$3,000,000	$90,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)							$29,880,625	$5,036,300			$29,880,625	$3,735,300			$29,880,625	$1,195,400			$29,880,625	$2,079,800		$29,880,625	$896,500
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (4 Afiliados)							$29,880,625	$5,036,300			$29,880,625	$3,735,300			$29,880,625	$1,195,400			$29,880,625	$2,079,800		$29,880,625	$896,500
2	CC	1077476234	MOSQUERA JHOANA		25-14	30	$6,581,250	$1,119,000	EPS037	30	$6,581,250	$822,700	CCF29	30	$6,581,250	$263,300	14-11	30	$6,581,250	$458,100	30	$6,581,250	$197,500
3	CC	1077463135	MOSQUERA LLECELI		230301	30	$4,376,250	$700,200	EPS041	30	$4,376,250	$547,100	CCF29	30	$4,376,250	$175,100	14-11	30	$4,376,250	$304,600	30	$4,376,250	$131,300
4	CC	52102426	OCORO LUZ		25-14	30	$13,073,125	$2,222,500	EPS037	30	$13,073,125	$1,634,200	CCF29	30	$13,073,125	$523,000	14-11	30	$13,073,125	$909,900	30	$13,073,125	$392,200
5	CC	11811142	RENTERIA BERTONIS		25-14	30	$5,850,000	$994,600	EPS037	30	$5,850,000	$731,300	CCF29	30	$5,850,000	$234,000	14-11	30	$5,850,000	$407,200	30	$5,850,000	$175,500
Total			**Afiliados(5)**				**$32,880,625**	**$5,516,300**			**$32,880,625**	**$4,110,300**			**$32,880,625**	**$1,315,400**			**$32,880,625**	**$2,095,500**		**$32,880,625**	**$986,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1998947528	9494908726	E	2025/12/22	2025/12/11	BANCO AV VILLAS	0	$14,024,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$5,516,300	$0	$0	$5,516,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$4,336,100	$0	$0	$4,336,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$700,200	$0	$0	$700,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$2,095,500	$0	$0	$2,095,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$2,095,500	$0	$0	$2,095,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,315,400	$0	$0	$1,315,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	5	$1,315,400	$0	$0	$1,315,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$4,110,300	$0	$0	$4,110,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$3,188,200	$0	$0	$3,188,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$547,100	$0	$0	$547,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$0	$0	$375,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$986,500	$0	$0	$986,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$986,500	$0	$0	$986,500
TOTAL				**5**	**$14,024,000**	**$0**	**$0**	**$14,024,000**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	25/11/2025	91744331	$1.375.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	603.400	0		0		0	0	0	0	603.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	772.400	0	0	0	0	0	0		772.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	603.400	603.400
Pensión	1	772.400	772.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.375.800	1.375.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA		Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	25/11/2025	91744331	$1.375.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11788838	PALACIOS CHAVERRA EULOGIO	3	0			N																	25-14	4.827.000	772.400	0	0	0	0	EPS037	4.827.000	603.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Medellín, 04 de Julio de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO, en el centro de trabajo 0005451201 - PLANEAMIENTO FISICO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C11788838	PALACIOS CHAVERRA EULOGIO	01/06/2002		I1622521	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11311855672518539471

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/07/2025 10:57:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.1.126.190, 192.230.104.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010190981	EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA	Kra 50 No 136 44	3138371310	LOREDWIN@HOTMAIL.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	18/11/2025	91503642	$458.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	190.000	0		0		0	0	0	0	190.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	243.200	0	0	0	0	0	0		243.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.900				15.900	0	0	15.900			159	15.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	9.200	0	0	9.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	190.000	190.000
Pensión	1	243.200	243.200
Riesgos Laborales	1	15.900	15.900
CCF	1	9.200	9.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	458.300	458.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1010190981	EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA		Kra 50 No 136 44	3138371310	LOREDWIN@HOTMAIL.ES
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	18/11/2025	91503642	$458.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010190981	CARREÑO GARCIA EDWIN LIBARDO	57	0			N																	25-14	1.520.000	243.200	0	0	0	0	EPS008	1.520.000	190.000	14-23	1.520.000	2	15.900	CCF24	1.520.000	9.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010190981	EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA	Kra 50 No 136 44	3138371310	LOREDWIN@HOTMAIL.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
91503642	18/11/2025				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	N	01/12/2025	91870058	$839.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	348.100	0		0		0	0	0	0	348.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	445.500	0	0	0	0	0	0		445.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	29.100				29.100	0	0	29.100			291	29.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	16.700	0	0	16.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	348.100	348.100
Pensión	1	445.500	445.500
Riesgos Laborales	1	29.100	29.100
CCF	1	16.700	16.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	839.400	839.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010190981	EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA	Kra 50 No 136 44	3138371310	LOREDWIN@HOTMAIL.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
91503642	18/11/2025				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	N	01/12/2025	91870058	$839.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010190981	CARREÑO GARCIA EDWIN LIBARDO	57	0			N																	25-14	4.304.080	688.700	0	0	0	0	EPS008	4.304.080	538.100	14-23	4.304.080	2	45.000	CCF24	4.304.080	25.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112789406		GOMEZ GARCIA JEISON STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 N° 13 - 12 Barrio El Milagroso	SAN JOSE DEL PALMAR-CHOCO	3212407750	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1952970519	9494695699	I	2025/12/02	2025/11/25	NEQUI	0	$653,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL PALMAR Depto: CHOCO (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
1	CC	1112789406	GOMEZ JEISON	230301	30	$1,842,000	$294,800	EPS037	30	$1,842,000	$230,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,842,000	$128,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112789406		GOMEZ GARCIA JEISON STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 N° 13 - 12 Barrio El Milagroso	SAN JOSE DEL PALMAR-CHOCO	3212407750	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1952970519	9494695699	I	2025/12/02	2025/11/25	NEQUI	0	$653,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,800	$0	$0	$294,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$294,800	$0	$0	$294,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,300	$0	$0	$128,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$128,300	$0	$0	$128,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,300	$0	$0	$230,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$230,300	$0	$0	$230,300
TOTAL				**1**	**$653,400**	**$0**	**$0**	**$653,400**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE COONSULTORÍA No: 4227 - 2024 **CONSULTOR:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-25 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4262 - 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACHOCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDLY STELLA RENTERIA MENA	54.255.569	DIRECTORA	$ 10.240.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 427.700	V	NUEVA EPS	92229281	$ 768.000	Colpensiones	92229281	$ 1.044.700	$ -	$ -	$ -	
2	JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS	1.077.476.234	RESIDENTE DE ESTUDIOS	$ 5.850.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 458.100	V	NUEVA EPS	9497755284	$ 822.700	Colpensiones	9497755284	$ 1.119.000	$ 263.300	$ -	$ 197.500	
3	BERTONIS RENTERIA VALENCIA	11.811.142	RESIDENTE DE CAMPO	$ 5.850.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 407.200	V	NUEVA EPS	9497755284	$ 731.300	Colpensiones	9497755284	$ 994.600	$ 234.000		$ 175.500	
4	EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA	1010190981	COORDINADOR BIM SIG	$ 7.160.050	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 45.400	V	COMPENSAR EPS	92041557 - 49087010	$ 538.300	Colpensiones	92041557 - 49087010	$ 694.000	$ 26.100			
5	LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ	52.102.426	COORDINADORA AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 8.045.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 909.900	V	NUEVA EPS	9497755284	$ 1.634.200	Colpensiones	9497755284	$ 2.222.500	$ 523.000	$ -	$ 392.200	
6	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	11.788.838	COORDINADOR TÉCNICO	$ 8.045.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ -	V	NUEVA EPS	92650589	$ 603.400	Colpensiones	92650589	$ 772.400		$ -		
7	LLECELI MOSQUERA TELLO	1.077.463.135	INGENIERA AUXILIAR	$ 3.890.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 304.600	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9497755284	$ 547.100	Porvenir	9497755284	$ 700.200	$ 175.100	$ -	$ 131.300	
8	JEISON STIVEN GOMEZ GARCIA	1.112.789.406	TECNICO DE LA ZONA	$ 3.070.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 128.300	V	NUEVA EPS	9496267556	$ 230.300	Porvenir	9496267556	$ 294.800		$ -		
9																																												
10																																												
11																																												
N																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalas con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERIA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de interventoria
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA	VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	09/12/2025	92229281	$2.240.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	768.000	0		0		0	0	0	0	768.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	983.100	0	0	30.800	30.800	0	0		1.044.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	427.700				427.700	0	0	427.700			4.277	427.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	768.000	768.000
Pensión	1	1.044.700	1.044.700
Riesgos Laborales	1	427.700	427.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.240.400	2.240.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA		VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	09/12/2025	92229281	$2.240.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	54255569	RENTERIA MENA EDLY STELLA	57	0			N																	25-14	6.144.000	983.100	0	0	30.800	30.800	EPS037	6.144.000	768.000	14-23	6.144.000	5	427.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891680089	4	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO	CRA 22 N° 18B 10	QUIBDO-CHOCO	6726565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2094550326	9497755284	E	2026/01/23	2026/01/19	BANCO AV VILLAS	0	$14,024,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$5,516,300						$4,110,300	
																				$480,000						$375,000	
																				$480,000						$375,000	
						$3,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		SANITAS	30	$3,000,000	12.5%	$375,000	
																				$5,036,300						$3,735,300	
																				$5,036,300						$3,735,300	
						$6,581,250	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$6,581,250	16%	SIN RIESGO	$1,053,000	$0	$0	$33,000	$33,000	$0	$1,119,000		NUEVA E.P.S.	30	$6,581,250	12.5%	$822,700	
						$4,376,250	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,376,250	16%	SIN RIESGO	$700,200	$0	$0	$0	$0	$0	$700,200		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$4,376,250	12.5%	$547,100	
						$13,073,125	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$13,073,125	16%	SIN RIESGO	$2,091,700	$0	$0	$65,400	$65,400	$0	$2,222,500		NUEVA E.P.S.	30	$13,073,125	12.5%	$1,634,200	
						$5,850,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$5,850,000	16%	SIN RIESGO	$936,000	$0	$0	$29,300	$29,300	$0	$994,600		NUEVA E.P.S.	30	$5,850,000	12.5%	$731,300	
																				$5,516,300						$4,110,300	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$4,110,300						$1,315,400						$2,095,500				$0		$986,500		$0		$0	
	$375,000						$120,000						$15,700				$0		$90,000		$0		$0	
	$375,000						$120,000						$15,700				$0		$90,000		$0		$0	
$0	$375,000		COMFACHOCÓ	30	$3,000,000	4%	$120,000	ARL SURA	30	$3,000,000	0.522%	1	$15,700	30	$3,000,000	0%	$0	3%	$90,000	0%	$0	0%	$0	No
	$3,735,300						$1,195,400						$2,079,800				$0		$896,500		$0		$0	
	$3,735,300						$1,195,400						$2,079,800				$0		$896,500		$0		$0	
$0	$822,700		COMFACHOCÓ	30	$6,581,250	4%	$263,300	ARL SURA	30	$6,581,250	6.96%	5	$458,100	30	$6,581,250	0%	$0	3%	$197,500	0%	$0	0%	$0	No
$0	$547,100		COMFACHOCÓ	30	$4,376,250	4%	$175,100	ARL SURA	30	$4,376,250	6.96%	5	$304,600	30	$4,376,250	0%	$0	3%	$131,300	0%	$0	0%	$0	No
$0	$1,634,200		COMFACHOCÓ	30	$13,073,125	4%	$523,000	ARL SURA	30	$13,073,125	6.96%	5	$909,900	30	$13,073,125	0%	$0	3%	$392,200	0%	$0	0%	$0	No
$0	$731,300		COMFACHOCÓ	30	$5,850,000	4%	$234,000	ARL SURA	30	$5,850,000	6.96%	5	$407,200	30	$5,850,000	0%	$0	3%	$175,500	0%	$0	0%	$0	No
	$4,110,300						$1,315,400						$2,095,500				$0		$986,500		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891680089	4	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO	CRA 22 N° 18B 10	QUIBDO-CHOCO	6726565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2094550326	9497755284	E	2026/01/23	2026/01/19	BANCO AV VILLAS	0	$14,024,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$5,516,300	$0	$0	$5,516,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$4,336,100	$0	$0	$4,336,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$700,200	$0	$0	$700,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$2,095,500	$0	$0	$2,095,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$2,095,500	$0	$0	$2,095,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,315,400	$0	$0	$1,315,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	5	$1,315,400	$0	$0	$1,315,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$4,110,300	$0	$0	$4,110,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$3,188,200	$0	$0	$3,188,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$547,100	$0	$0	$547,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$0	$0	$375,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$986,500	$0	$0	$986,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$986,500	$0	$0	$986,500
TOTAL				5	$14,024,000	$0	$0	$14,024,000

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	14/01/2026	92650589	$1.376.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	603.400	0		0		0	1	400	0	603.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	772.400	0	0	0	0	1	500	0	772.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	603.400	603.800
Pensión	1	772.400	772.900
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.375.800	1.376.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA		Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	14/01/2026	92650589	$1.376.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11788838	PALACIOS CHAVERRA EULOGIO	3	0			N																	25-14	4.827.000	772.400	0	0	0	0	EPS037	4.827.000	603.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010190981	EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA	Kra 50 No 136 44	3138371310	LOREDWIN@HOTMAIL.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	03/12/2025	92041557	$458.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	190.000	0		0		0	0	0	0	190.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	243.200	0	0	0	0	0	0		243.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.900		0	0	15.900	0	0	15.900		0	159	15.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	9.200	0	0	9.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	190.000	190.000
Pensión	1	243.200	243.200
Riesgos Laborales	1	15.900	15.900
CCF	1	9.200	9.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	458.300	458.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010190981	EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA		Kra 50 No 136 44	3138371310	LOREDWIN@HOTMAIL.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	03/12/2025	92041557	$458.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010190981	CARREÑO GARCIA EDWIN LIBARDO	57	0			N																	25-14	1.520.000	243.200	0	0	0	0	EPS008	1.520.000	190.000	14-23	1.520.000	2	15.900	CCF24	1.520.000	9.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010190981	EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA	Kra 50 No 136 44	3138371310	LOREDWIN@HOTMAIL.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
92041557	03/12/2025				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	N	09/02/2026	49087010	$849.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	348.100	0		0		0	19	4.200	0	352.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	445.500	0	0	0	0	19	5.300	0	450.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	29.100				29.100	19	400	29.500			291	29.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	16.700	19	200	16.900	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	19	0	0	0
ICBF				
0	19	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	348.100	352.300
Pensión	1	445.500	450.800
Riesgos Laborales	1	29.100	29.500
CCF	1	16.700	16.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	839.400	849.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010190981	EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA	Kra 50 No 136 44	3138371310	LOREDWIN@HOTMAIL.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
92041557	03/12/2025	N	09/02/2026	49087010	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12				$849.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010190981	CARREÑO GARCIA EDWIN LIBARDO	57	0			N								X								25-14	4.304.080	688.700	0	0	0	0	EPS008	4.304.080	538.100	14-23	4.304.080	2	45.000	CCF24	4.304.080	25.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112789406		GOMEZ GARCIA JEISON STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 N° 13 - 12 Barrio El Milagroso	SAN JOSE DEL PALMAR-CHOCO	3212407750	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2008324203	9496267556	I	2026/01/05	2025/12/15	BANCOLOMBIA	0	$653,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL PALMAR Depto: CHOCO (1 Afiliados)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0
1	CC	1112789406 GOMEZ JEISON	230301	30	$1,842,000	$294,800	EPS037	30	$1,842,000	$230,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,842,000	$128,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000	$128,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112789406		GOMEZ GARCIA JEISON STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 N° 13 - 12 Barrio El Milagroso	SAN JOSE DEL PALMAR-CHOCO	3212407750	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2008324203	9496267556	I	2026/01/05	2025/12/15	BANCOLOMBIA	0	$653,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,800	$0	$0	$294,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$294,800	$0	$0	$294,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,300	$0	$0	$128,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$128,300	$0	$0	$128,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,300	$0	$0	$230,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$230,300	$0	$0	$230,300
TOTAL				**1**	**$653,400**	**$0**	**$0**	**$653,400**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE COONSULTORÍA No: 4227 - 2024 **CONSULTOR:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-26 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4262 - 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACHOCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDLY STELLA RENTERIA MENA	54.255.569	DIRECTORA	$ 1.280.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 427.700	V	NUEVA EPS	45467643	$ 768.000	Colpensiones	45467643	$ 983.100	$ -	$ -	$ -	
2	JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS	1.077.476.234	RESIDENTE DE ESTUDIOS	$ 731.250	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 407.200	V	NUEVA EPS	9499417182	$ 731.300	Colpensiones	9499417182	$ 936.000	$ 234.000	$ -		
4	EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA	1010190981	COORDINADOR BIM SIG	$ 583.262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 9.200	I	EPS SURA	1079590739	$ 218.900	Porvenir	1079590739	$ 280.200				
5	LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ	52.102.426	COORDINADORA AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 1.005.625	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%		V	NUEVA EPS	45474826	$ 603.400	Colpensiones	45474826	$ 772.400		$ -		
6	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	11.788.838	COORDINADOR TÉCNICO	$ 1.005.625	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ -	V	NUEVA EPS	43541483	$ 603.400	Colpensiones	43541483	$ 772.400		$ -		
7	LLECELI MOSQUERA TELLO	1.077.463.135	INGENIERA AUXILIAR	$ 486.250	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 270.800	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9499417182	$ 486.300	Porvenir	9499417182	$ 622.400	$ 155.600	$ -		
8	JEISON STIVEN GOMEZ GARCIA	1.112.789.406	TECNICO DE LA ZONA	$ 383.750	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 9.200	I	NUEVA EPS	9498506203	$ 218.900	Porvenir	9498506203	$ 280.200		$ -		
9																																												
10																																												
11																																												
N																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERIA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA	VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	09/02/2026	45467643	$2.178.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	768.000	0		0		0	0	0	0	768.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	983.100	0	0	0	0	0	0		983.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	427.700				427.700	0	0	427.700			4.277	427.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	768.000	768.000
Pensión	1	983.100	983.100
Riesgos Laborales	1	427.700	427.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.178.800	2.178.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA		VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	09/02/2026	45467643	$2.178.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	54255569	RENTERIA MENA EDLY STELLA	57	0			N																	25-14	6.144.000	983.100	0	0	0	0	EPS037	6.144.000	768.000	14-23	6.144.000	5	427.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-11, 03:42:13 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079590739

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 11/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILMER ARLEY CAMPAÑA DIAZ		
Documento	CC1123209028	**Dirección**	CL 3B #96 - 19 APTO 702C
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3143862146
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1123209028	WILMER ARLEY CAMPAÑA DIAZ	59	00		X															0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 1.700	$ 510.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891680089	4	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO	CRA 22 N° 18B 10	QUIBDO-CHOCO	6726565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	68240862	9499417182	E	2026/02/20	2026/02/16	BANCO AV VILLAS	0	$4,135,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROYECTO (2 Afiliados)					$9,740,000	$1,558,400			$9,740,000	$1,217,600			$9,740,000	$389,600			$9,740,000	$678,000		$9,740,000	$292,200
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)					$9,740,000	$1,558,400			$9,740,000	$1,217,600			$9,740,000	$389,600			$9,740,000	$678,000		$9,740,000	$292,200
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (2 Afiliados)					$9,740,000	$1,558,400			$9,740,000	$1,217,600			$9,740,000	$389,600			$9,740,000	$678,000		$9,740,000	$292,200
1	CC	1077476234 MOSQUERA JHOANA	25-14	30	$5,850,000	$936,000	EPS037	30	$5,850,000	$731,300	CCF29	30	$5,850,000	$234,000	14-11	30	$5,850,000	$407,200	30	$5,850,000	$175,500
2	CC	1077463135 MOSQUERA LLECELI	230301	30	$3,890,000	$622,400	EPS041	30	$3,890,000	$486,300	CCF29	30	$3,890,000	$155,600	14-11	30	$3,890,000	$270,800	30	$3,890,000	$116,700
Total Afiliados(2)					$9,740,000	$1,558,400			$9,740,000	$1,217,600			$9,740,000	$389,600			$9,740,000	$678,000		$9,740,000	$292,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891680089	4	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO	CRA 22 N° 18B 10	QUIBDO-CHOCO	6726565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	68240862	9499417182	E	2026/02/20	2026/02/16	BANCO AV VILLAS	0	$4,135,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$1,558,400	$0	$0	$1,558,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$936,000	$0	$0	$936,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$622,400	$0	$0	$622,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$678,000	$0	$0	$678,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$678,000	$0	$0	$678,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$389,600	$0	$0	$389,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	$389,600	$0	$0	$389,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$1,217,600	$0	$0	$1,217,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$731,300	$0	$0	$731,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$486,300	$0	$0	$486,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$292,200	$0	$0	$292,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$292,200	$0	$0	$292,200
TOTAL				**2**	**$4,135,800**	**$0**	**$0**	**$4,135,800**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	06/02/2026	43541483	$1.375.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	603.400	0		0		0	0	0	0	603.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	772.400	0	0	0	0	0	0		772.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	603.400	603.400
Pensión	1	772.400	772.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.375.800	1.375.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA		Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	06/02/2026	43541483	$1.375.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11788838	PALACIOS CHAVERRA EULOGIO	3	0			N																	25-14	4.827.000	772.400	0	0	0	0	EPS037	4.827.000	603.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52102426	LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ	Trasversal 19 #24 - 43	3128433543	luyove@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	04/02/2026	45474826	$1.375.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	603.400	0		0		0	0	0	0	603.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	772.400	0	0	0	0	0	0		772.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	603.400	603.400
Pensión	1	772.400	772.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.375.800	1.375.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52102426	LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ		Trasversal 19 #24 - 43	3128433543	luyove@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	04/02/2026	45474826	$1.375.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52102426	OCORO VELASQUEZ LUZ YANETH	3	0			N																	25-14	4.827.000	772.400	0	0	0	0	EPS037	4.827.000	603.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112789406		GOMEZ GARCIA JEISON STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 N° 13 - 12 Barrio El Milagroso	SAN JOSE DEL PALMAR-CHOCO	3212407750	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	9855643	9498506203	I	2026/02/03	2026/01/26	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1112789406	GOMEZ JEISON																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total			**Afiliados(1)**																				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112789406		GOMEZ GARCIA JEISON STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 N° 13 - 12 Barrio El Milagroso	SAN JOSE DEL PALMAR-CHOCO	3212407750	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	9855643	9498506203	I	2026/02/03	2026/01/26	NEQUI	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 - 2024

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2026

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 3.200.000.000,00	$ -
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402015-02 ADQUIS. DE BYS PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CH	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 5.500.000.000,00	$ -
2025	880125	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02 ADQUIS. DE BYS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	10	NACIÓN	ADICIÓN N°1	$ 52.567.320,00	$ -
							$ -
				TOTAL		**$ 8.752.567.320,00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 8.752.567.320**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 4.350.000.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.350.000.000,00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $3.200,000,000
								RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.350.000.000,00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $5.500,000,000
1	**DICIEMBRE 2024.**	$ 96.222.000,00	$ -	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.301.889.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.301.889.000,00	$ 8.656.345.320,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
2	**ENERO 2025.**	$ 96.222.000,00	$ -	$ 192.444.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.253.778.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.253.778.000,00	$ 8.560.123.320,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
3	**FEBRERO 2025**	$ 185.122.000,00		$ 377.566.000,00	$ 92.561.000,00	$ 92.561.000,00	$ 4.161.217.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.161.217.000,00	$ 8.375.001.320,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
4	**MARZO 2025**	$ 235.568.000,00		$ 613.134.000,00	$ 117.784.000,00	$ 117.784.000,00	$ 4.043.433.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.043.433.000,00	$ 8.139.433.320,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
5	**ABRIL 2025**	$ 114.126.000,00		$ 727.260.000,00	$ 57.063.000,00	$ 57.063.000,00	$ 3.986.370.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 3.986.370.000,00	$ 8.025.307.320,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
6	**MAYO 2025**	$ 182.492.000,00		$ 909.752.000,00	$ 91.246.000,00	$ 91.246.000,00	$ 3.895.124.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 3.895.124.000,00	$ 7.842.815.320,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
7	**JUNIO 2025**	$ 156.047.952,00		$ 1.065.799.952,00	$ 78.023.976,00	$ 78.023.976,00	$ 3.817.100.024,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 3.817.100.024,00	$ 7.686.767.368,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
8	**JULIO 2025.**	$ 266.818.400,00		$ 1.332.618.352,00	$ 133.409.200,00	$ 133.409.200,00	$ 3.683.690.824,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 3.683.690.824,00	$ 7.419.948.968,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
9	**AGOSTO 2025**	$ 1.958.563.885,74		$ 3.291.182.237,74	$ 979.281.942,87	$ 979.281.942,87	$ 2.704.408.881,13	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 2.704.408.881,13	$ 5.461.385.082,26		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
10	**SEPTIEMBRE 2025**	$ 873.915.077,01		$ 4.165.097.314,75	$ 349.566.030,80	$ 524.349.046,21	$ 2.354.842.850,33	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 2.180.059.834,92	$ 4.587.470.005,25		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
11	**OCTUBRE 2025**	$ 3.042.224.041,15		$ 7.207.321.355,90	$ 1.216.889.616,46	$ 1.825.334.424,69	$ 1.137.953.233,87	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 354.725.410,23	$ 1.545.245.964,10		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
12	**NOVIEMBRE 2025**	$ 947.717.873,90		$ 8.155.039.229,80	$ 710.788.405,43	$ 236.929.468,48	$ 427.164.828,44	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 117.795.941,76	$ 597.528.090,20		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
13	**DICIEMBRE 2024.**	$ 544.960.770,20		$ 8.700.000.000,00	$ 427.164.828,44	$ 117.795.941,76	$ -	RP Nº 880125 DE 23 12 2025	$ 52.567.320,00	$ 52.567.320,00		RP Nº 880125 DE 23 12 2025 $52,567,320 ADICIÓN 01
14	**ENERO 2026.**	$ 13.141.830,00		$ 8.713.141.830,00	$ -	$ 13.141.830,00	$ -		$ 39.425.490,00	$ 39.425.490,00		RP Nº 880125 DE 23 12 2025 $52,567,320 ADICIÓN 01
TOTALES		**$ 8.713.141.830,00**		**$ 8.713.141.830,00**	**$ 4.350.000.000,00**	**$ 4.363.141.830,00**			**$ 39.425.490,00**	**$ 39.425.490,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Interventor del Contrato de Consultoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA N°1 DICIEMBRE 2024	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00
ACTA N°2 ENERO 2025	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00
ACTA N°3 FEBRERO 2025	$ 185.122.000,00		$ 185.122.000,00
ACTA N°4 MARZO 2025	$ 235.568.000,00		$ 235.568.000,00
ACTA N°5 ABRIL 2025	$ 114.126.000,00		$ 114.126.000,00
ACTA N°6 MAYO 2025	$ 182.492.000,00		$ 182.492.000,00
ACTA N°7 JUNIO 2025	$ 156.047.952,00		$ 156.047.952,00
ACTA N°8 JULIO 2025	$ 266.818.400,00		$ 266.818.400,00
ACTA N°9 AGOSTO 2025	$ 1.958.563.885,74		$ 1.958.563.885,74
ACTA N°10 SEPTIEMBRE 2025	$ 873.915.077,01		$ 873.915.077,01
ACTA N°11 OCTUBRE 2025	$ 3.042.224.041,15		$ 3.042.224.041,15
ACTA N°12 NOVIEMBRE 2025	$ 947.717.873,90		$ 947.717.873,90
ACTA N°13 DICIEMBRE 2025	$ 544.960.770,20		$ 544.960.770,20
ACTA N°14 ENERO 2026	$ 13.141.830,00		$ 13.141.830,00
VALOR TOTAL	**$ 8.713.141.830,00**		**$ 8.713.141.830,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: EDWY STELLA RENTERIA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	12 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4227 - 2024 **CONTRATISTA:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ - DIEGO LUIS CÓRDOBA.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-25 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4262 - 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	17	22	20	19	24	24	24	22	21	16	17	19	20	19	19	20	22	21	22	22	21	22	19	20	22	21	24	23			606
Lluvias moderadas	0	6	2	3	5	0	0	0	2	3	8	7	2	3	3	5	4	2	3	1	2	3	1	3	2	2	2	0	1			75
Lluvias intensas	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0	1	0	0			15
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Bertonis Rentería V.
Nombre: Bertonis Rentería Valencia
Residente de Consultoría
Matrícula No.:

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

SEGUIMIENTO GARANTÍAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) | 1 (Mes) | 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No. 4227 - 2024 **CONTRATISTA:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 2/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 8.700.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 8.752.567.320,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.700.000.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.752.567.320,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4262 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8,92%	$ 870.000.000,00	7	11	2024	1	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	44,62%	$ 4.350.000.000,00	7	11	2024	1	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17,85%	$ 1.740.000.000,00	7	11	2024	1	1	2028
Calidad de Estudios y Diseños	26,77%	$ 2.610.000.000,00	31	12	2024	31	12	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002762

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 2/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día)	(Mes)	(Año)	VIGENCIA Hasta (Día)	(Mes)	(Año)
Cumplimiento	8,92%	$ 870.000.000,00	23	12	2024	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	44,62%	$ 4.350.000.000,00	23	12	2024	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17,85%	$ 1.740.000.000,00	23	12	2024	1	1	2029
Calidad de Estudios y Diseños	26,77%	$ 2.610.000.000,00	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002762

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/02/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 y 2 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día)	(Mes)	(Año)	VIGENCIA Hasta (Día)	(Mes)	(Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 3002762 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/04/2025

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día)	(Mes)	(Año)	VIGENCIA Hasta (Día)	(Mes)	(Año)
Cumplimiento	9,04%	$ 875.256.732,00	22	12	2025	1	11	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	45,18%	$ 4.376.283.660,00	22	12	2025	1	11	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	18,07%	$ 1.750.513.464,00	22	12	2025	1	5	2029
Calidad de Estudios y Diseños	27,11%	$ 2.625.770.196,00	30	4	2026	30	4	2031
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002762

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/02/2026

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2026 (Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: EDZY STELLA RENTERIA MENA
Directora de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma
Nombre: JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0234 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Escaneado con CamScanner

PÓLIZA Nº
3002762

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
26	11	2024	EXPEDICIÓN	0			NO

TOMADOR	403745-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	NIT	891.680.089-4
DIRECCIÓN	BR JARDIN CD UNIVERSI.QUIBDO, QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO	6726565
ASEGURADO	1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL 25 G 73 BIS 90, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7056000

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
MONEDA Pesos														
TIPO CAMBIO 1,00	17	17	26	11	2024	7	11	2024	00:00	31	12	2029	00:00	1880

CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1. CONTADO	$9.570.000.000,00

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800.215.807-2

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	870.000.000,00	SI	07/11/2024	01/05/2025	1.251.369,86
2	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4.350.000.000,00	SI	07/11/2024	01/05/2025	6.256.849,32
3	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	1.740.000.000,00	SI	07/11/2024	01/01/2028	16.446.575,34
4	CALIDAD DEL SERVICIO	2.610.000.000,00	SI	31/12/2024	31/12/2029	39.150.000,00

CUP-003-16
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4227 DE 2024 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2.024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCOY VALLE DEL CAUCA.

"QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONSULTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA CONSULTORÍA".

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$***63.104.794,52
GASTOS	$********9.999,99
IVA	$***11.991.810,96
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$***75.106.605,47

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://facturaseguros.transfiriendo.com/FacturaPrevisora/portaledquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

28/11/2024 16:58:55

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
1	1	COMPAVÍA DE SEGUROS		

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3002762 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: EXPEDICIÓN	0

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

Escaneado con CamScanner

IDENTIFICACION DEL PAGO

POLIZA No. 3002762 **CERTIFICADO No.** 0

PREVISORA SEGUROS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554

Ramo	Sucursal
CUMPLIMIENTO	QUIBDO

Valor Prima	Valor IVA	Tomador
$63.104.794,52	$11.991.810,96	403745-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA	F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA
26/11/2024	$*******9.999,99	$***63.104.794,52	$***11.991.810,96				

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el Árticulo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

SISE-CAR-010-1

CONVENIO DE PAGO:
1. CONTADO

PREVISORA SEGUROS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1066 del Código de Comercio, las partes de común acuerdo establecen que las primas, impuestos a las ventas y gastos que se causen por concepto de expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total $75106605,00

Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva.	Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva.
1	26/11/2024	$*******9.999,99	$***63.104.794,52	$***11.991.810,96					

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que éste se presente, y dará derecho a la Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas :

POLIZA	RAMO	CERTIFICADO	VALOR ASEGURADO
3002762	CUMPLIMIENTO	0	$9.570.000.000,00

En constancia se firma el presente documento en la ciudad de QUIBDO a los 26 días del mes de noviembre de 2024

AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑÍA , para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativas al manejo financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguros al que accede la presente cláusula.

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automatica del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

SISE-CAR-009-2

Escaneado con CamScanner

PÓLIZA Nº
3002762

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
26	12	2024	MODIFICACIÓN	4			NO

TOMADOR	403745-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	NIT	891.680.089-4
DIRECCIÓN	BR JARDIN CD UNIVERSI.QUIBDO, QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO	6726565
ASEGURADO	1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL 25 G 73 BIS 90, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7056000

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
QUIBDO	17	17	26	12	2024	23	12	2024	00:00	31	12	2030	00:00	2199

MONEDA	TIPO CAMBIO	CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
Pesos	1,00	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1. CONTADO	$9.570.000.000,00

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800.215.807-2

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	870.000.000,00	SI	23/12/2024	01/07/2026	3.923.342,00
2	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4.350.000.000,00	SI	23/12/2024	01/07/2026	19.616.712,00
3	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	1.740.000.000,00	SI	23/12/2024	01/01/2029	6.960.000,00
4	CALIDAD DEL SERVICIO	2.610.000.000,00	SI	31/12/2025	31/12/2030	0,00

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4227 DE 2024 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2.024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCOY VALLE DEL CAUCA.

"QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONSULTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA CONSULTORÍA".

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$***30.500.054,00
GASTOS	$**********0,00
IVA	$****5.795.010,26
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$***36.295.064,26

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://lfacturaseguros.transfiriendo.com/lFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el Estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

26/12/2024 14:40:12

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
1	1	COMPAVÍA DE SEGUROS		

Powered by CamScanner

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3002762 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN	4

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA DE LA REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, PREVISORA SEGUROS, DE ACUERDO A LA PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DE 2024, AL CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO 4227 DE 2024, REALIZA EL AJUSTE Y/O DESPLAZAMIENTO DE LA VIGENCIA DE CADA UNO DE LOS AMPAROS.

.

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA: DESDE EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2.024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.030.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.

Powered by CamScanner

PÓLIZA N°
3002762

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	N° CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER N°	CERTIFICADO LÍDER N°	A.P.
6	6	2025	MODIFICACIÓN	5			NO

TOMADOR	403745-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	NIT	891.680.089-4
DIRECCIÓN	BR JARDIN CD UNIVERSI.QUIBDO, QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO	6726565
ASEGURADO	1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL 25 G 73 BIS 90, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7056000

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
QUIBDO	17	17	6	6	2025	5	6	2025	00:00	31	12	2030	00:00	2035

MONEDA	TIPO CAMBIO
Pesos	1,00

CARGAR A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

FORMA DE PAGO: 1. CONTADO

VALOR ASEGURADO TOTAL: $9.570.000.000,00

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800.215.807-2

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	870.000.000,00	SI	23/12/2024	01/07/2026	0,00
2	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4.350.000.000,00	SI	23/12/2024	01/07/2026	0,00
3	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	1.740.000.000,00	SI	23/12/2024	01/01/2029	0,00
4	CALIDAD DEL SERVICIO	2.610.000.000,00	SI	31/12/2025	31/12/2030	0,00

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4227 DE 2024 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2.024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCOY VALLE DEL CAUCA.

"QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONSULTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA CONSULTORÍA".

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$**********0,00
GASTOS	$**********0,00
IVA	$**********0,00
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$**********0,00

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

06/06/2025 15:34:04

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
1	1	COMPAYÍA DE SEGUROS		

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3002762 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN	5

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA DE REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, PREVISORA SEGUROS, EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION, PARA HACER CONSTAR QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2025 Y ACLARACIÓN NÚMERO UNO (01) Y MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2025.

.

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA: DESDE EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2.024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.030.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.

PÓLIZA N°
3002762

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	N° CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER N°	CERTIFICADO LÍDER N°	A.P.
31	12	2025	MODIFICACIÓN	6			NO

TOMADOR	403745-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	**NIT**	891.680.089-4
DIRECCIÓN	BR JARDIN CD UNIVERSI.QUIBDO, QUIBDO, CHOCO	**TELÉFONO**	6726565
ASEGURADO	1943-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CL 25 G 73 BIS 90, BOGOTA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO**	7056000

		CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
EMITIDO EN	QUIBDO														
MONEDA	Pesos														
TIPO CAMBIO	1,00	17	17	31	12	2025	22	12	2025	00:00	30	4	2031	00:00	1955

CARGAR A:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	FORMA DE PAGO	1. CONTADO
		VALOR ASEGURADO TOTAL	$9.627.824.052,00

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800.215.807-2

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	875.256.732,00	SI	22/12/2025	01/11/2026	893.879,00
2	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4.376.283.660,00	SI	22/12/2025	01/11/2026	4.469.393,00
3	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	1.750.513.464,00	SI	22/12/2025	01/05/2029	1.834.031,00
4	CALIDAD DEL SERVICIO	2.625.770.196,00	SI	30/04/2026	30/04/2031	236.683,00

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4227 DE 2024 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2.024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCOY VALLE DEL CAUCA.

"QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONSULTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA CONSULTORÍA".

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$****7.433.986,00
GASTOS	$*********0,00
IVA	$****1.412.457,34
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$****8.846.443,34

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

31/12/2025 12:15:40

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
1	1	COMPA¥ÍA DE SEGUROS		

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3002762 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN	**6**

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA DE LA REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE LA ADICIÓN No. 01 Y PRÓRROGA No. 02 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO 4227 DE 2024, EN TAL SENTIDO ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

.

FECHA DE INICIO: 07/11/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 30/04/2026
VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA: DESDE 07/11/2024 HASTA 30/04/2031.

.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO			MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN			1
		PÁGINA			

FECHA: 03/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Planificación de Infraestructura **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Chocó

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4227 de 2024 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

JUSTIFICACIÓN:
Del Registro Presupuestal No. 1124124 de fecha 2024-11-14 Valor $8.700.000.000,00 para un valor total de anticipo de $ 4.350.000.000 equivalente al 50% como se estipula en la cláusula septima "Forma de pago" del contrato interadminsitrativo No 4227 de 2024.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1- ABRIL	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago de salarios personal consultoria	300,000,000.00	176,130,000.00	181,130,000.00	130,130,000.00			$ 787,390,000.00	18.10%
2	Viaticos personal de consultoria	44,250,000.00	75,700,000.00	37,850,000.00	37,850,000.00			$ 195,650,000.00	4.50%
3	Adquisición de información secundaria	15,000,000.00	15,000,000.00					$ 30,000,000.00	0.69%
4	Levantamiento topografico	30,000,000.00	30,000,000.00	50,200,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		$ 210,200,000.00	4.83%
5	Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de sostenibilidad (s/comprobante) (adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, costos de gestiones arqueológicas, monitoreo, muestreos ambientales etc.)		220,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00	180,000,000.00		$ 900,000,000.00	20.69%
6	Toma de muestras para laboratorio(en suelo, en roca, Apiques) y ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural de puentes, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, batimetrías, entre otros)		1,136,590,400.00	440,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	67,569,600.00	$ 1,994,160,000.00	45.84%
7	Toma de información de transito	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00				$ 45,000,000.00	1.03%
8	Dotacion de oficina (compra de computadores y softwares)	120,000,000.00	50,000,000.00					$ 170,000,000.00	3.91%
9	Campamento	4,400,000.00	8,800,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00			$ 17,600,000.00	0.40%
	TOTAL	**$ 528,650,000.00**	**$ 1,727,220,400.00**	**$ 926,380,000.00**	**$ 720,180,000.00**	**$ 380,000,000.00**	**$ 67,569,600.00**	**$ 4,350,000,000.00**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: Edly Stella Renteria Mena
Directora de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: Jose Octavio Niño Brijaldo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE CONSULTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPIMAN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: Diciembre/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4027 DE 2024

PLAZO INICIAL: 11 mes (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 17.13 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/12/2024 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2026 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 8.700.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 52.587.320,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4262 de 2024

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)** $ 8.752.587.320,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos																		
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 254.568.000,00	2,91%	16,35%	% P	1,10%	1,10%	1,10%	0,99%	1,51%	1,45%	1,45%	1,45%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,33%	1,33%	0,15%		
	$ 1.430.321.320,00	16,35%	$ 1.430.754.000,00	$ P	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 89.366.000,00	$ 132.974.000,00	$ 127.264.000,00	$ 127.264.000,00	$ 127.276.000,00	$ 127.276.000,00	$ 122.457.000,00	$ 122.457.000,00	$ 122.457.000,00	$ 117.316.000,00	$ 13.141.830,00	$ 13.141.830,00	$ 13.141.830,00	$ 13.141.830,00
				$ E	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 89.366.000,00	$ 132.974.000,00	$ 127.264.000,00	$ 127.264.000,00	$ 127.276.000,00	$ 127.276.000,00	$ 122.457.000,00	$ 122.457.000,00	$ 122.457.000,00	$ 117.316.000,00	$ 13.141.830,00	$ 13.141.830,00	$ 13.141.830,00	$ 13.141.830,00
				% E	1,10%	1,10%	1,10%	0,99%	1,51%	1,45%	1,45%	1,45%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,33%	0,15%			
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES																					
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	$ 69.000.000,00	0,79%	0,79%	% P			0,04%							0,47%		0,08%					
	$ 69.000.000,00	0,79%	$ 69.000.000,00	$ P	$ -		$ 3.460.000,00							$ 41.400.000,00	$ 24.150.000,00						
				$ E	$ -		$ 3.460.000,00							$ -	$ 41.400.000,00	$ 24.150.000,00						
				% E			0,04%								0,00%	0,47%	0,28%					
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO	$ 60.000.000,00	0,69%	0,69%	% P			0,03%				0,41%				0,24%						
	$ 60.000.000,00	0,69%	$ 60.000.000,00	$ P	$ -		$ 3.000.000,00				$ 36.000.000,00				$ 21.000.000,00						
				$ E	$ -		$ 3.000.000,00				$ 36.000.000,00				$ 21.000.000,00						
				% E			0,03%				0,41%				0,24%						
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 165.000.000,00	1,89%	1,89%	% P			0,09%	1,13%								0,66%					
	$ 165.000.000,00	1,89%	$ 165.000.000,00	$ P	$ -		$ 8.250.000,00	$ 99.000.000,00								$ 57.750.000,00					
				$ E	$ -		$ 8.250.000,00	$ 99.000.000,00								$ 57.750.000,00					
				% E			0,09%	1,13%								0,66%					
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 42.000.000,00	0,48%	0,48%	% P							0,29%					0,17%					
	$ 42.000.000,00	0,48%	$ 42.000.000,00	$ P	$ -		$ 2.100.000,00				$ 25.200.000,00					$ 14.700.000,00					
				$ E	$ -		$ 2.100.000,00				$ 25.200.000,00				$ 16.800.000,00						
				% E			0,02%				0,29%				0,17%						
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	$ 106.000.000,00	1,21%	1,21%	% P				0,68%			0,68%				0,00%						
	$ 106.000.000,00	1,21%	$ 106.000.000,00	$ P	$ -			$ 5.300.000,00			$ 53.000.000,00				$ 37.100.000,00						
				$ E	$ -			$ 5.300.000,00			$ 53.000.000,00	$ -			$ 37.100.000,00						
				% E				0,06%			0,72%				0,00%						
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE	$ 125.000.000,00	1,43%	1,43%	% P				0,07%						0,80%		0,80%					
	$ 125.000.000,00	1,43%	$ 125.000.000,00	$ P	$ -			$ 6.250.000,00						$ 70.000.000,00		$ 70.000.000,00					
				$ E	$ -			$ 6.250.000,00						$ 70.000.000,00		$ 70.000.000,00					
				% E				0,07%						0,80%		0,80%					
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	$ 368.000.000,00	4,20%	4,20%	% P			0,21%							2,52%		1,61%					
	$ 368.000.000,00	4,20%	$ 368.000.000,00	$ P	$ -		$ 18.400.000,00							$ 220.800.000,00		$ 147.200.000,00					
				$ E	$ -		$ 18.400.000,00							$ 220.800.000,00		$ 147.200.000,00					
				% E			0,21%							2,52%		1,61%					
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS	$ 235.000.000,00	2,68%	2,68%	% P			0,13%								1,61%	0,96%					
	$ 235.000.000,00	2,68%	$ 235.000.000,00	$ P	$ -		$ 11.750.000,00								$ 141.000.000,00	$ 82.250.000,00					
				$ E	$ -		$ 11.750.000,00								$ 141.000.000,00	$ 82.250.000,00					
				% E			0,13%								1,61%	0,96%					
ESTUDIOS DE HIDRAULICA, HIDROLOGIA Y SOCAVACIÓN	$ 190.000.000,00	2,17%	2,17%	% P			0,11%							1,30%		0,76%					
	$ 190.000.000,00	2,17%	$ 190.000.000,00	$ P	$ -		$ 9.500.000,00							$ 114.000.000,00		$ 66.500.000,00					
				$ E	$ -		$ 9.500.000,00							$ 114.000.000,00		$ 66.500.000,00					
				% E			0,11%							1,30%		0,76%					
ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 73.000.000,00	0,83%	0,83%	% P				0,04%							0,00%	0,00%					
	$ 73.000.000,00	0,83%	$ 73.000.000,00	$ P	$ -			$ 3.650.000,00							$ 43.800.000,00	$ 29.200.000,00					
				$ E	$ -			$ 3.650.000,00							$ -	$ 43.800.000,00	$ 29.200.000,00					
				% E				0,04%							0,00%	0,00%					
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 481.000.000,00	5,50%	5,50%	% P			0,27%							3,20%		1,92%					
	$ 481.000.000,00	5,50%	$ 481.000.000,00	$ P	$ -		$ 24.050.000,00							$ 288.600.000,00		$ 168.350.000,00					
				$ E	$ -		$ 24.050.000,00							$ 288.600.000,00		$ 168.350.000,00					
				% E			0,27%							3,20%		1,92%					
ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 57.000.000,00	0,65%	0,65%	% P				0,03%						0,39%		0,00%					
	$ 57.000.000,00	0,65%	$ 57.000.000,00	$ P	$ -			$ 2.850.000,00						$ 34.200.000,00		$ 19.950.000,00					
				$ E	$ -			$ 2.850.000,00						$ 34.200.000,00		$ 19.950.000,00					
				% E				0,03%						0,39%		0,00%					
ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS	$ 47.000.000,00	0,54%	0,54%	% P				0,03%							0,32%	0,19%					
	$ 47.000.000,00	0,54%	$ 47.000.000,00	$ P	$ -			$ 2.350.000,00							$ 28.200.000,00	$ 16.450.000,00					
				$ E	$ -			$ 2.350.000,00							$ -	$ 28.200.000,00	$ 16.450.000,00					
				% E				0,03%							0,00%	0,32%	0,19%					
ESTUDIO DE RIESGOS	$ 93.000.000,00	1,06%	1,06%	% P				0,05%						0,64%		0,38%					
	$ 93.000.000,00	1,06%	$ 93.000.000,00	$ P	$ -			$ 4.650.000,00						$ 55.800.000,00		$ 32.550.000,00					
				$ E	$ -			$ 4.650.000,00						$ 55.800.000,00		$ 32.550.000,00					
				% E				0,05%						0,64%		0,38%					
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 56.000.000,00	0,64%	0,64%	% P			0,03%								0,21%						
	$ 56.000.000,00	0,64%	$ 56.000.000,00	$ P	$ -		$ 2.800.000,00							$ 33.600.000,00		$ 19.600.000,00					
				$ E	$ -		$ 2.800.000,00							$ 33.600.000,00		$ 19.600.000,00					
				% E			0,03%							0,39%		0,22%					
EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	$ 54.000.000,00	0,62%	0,62%	% P				0,03%							0,21%						
	$ 54.000.000,00	0,62%	$ 54.000.000,00	$ P	$ -			$ 2.700.000,00							$ 32.400.000,00	$ 18.900.000,00					
				$ E	$ -			$ 2.700.000,00							$ 32.400.000,00	$ 18.900.000,00					
				% E				0,03%							0,37%	0,22%					
AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 423.000.000,00	4,83%	4,83%	% P			0,00%								2,80%						
	$ 423.000.000,00	4,83%	$ 423.000.000,00	$ P	$ -			$ 21.150.000,00							$ 253.800.000,00						
				$ E	$ -			$ 21.150.000,00							$ 253.800.000,00						
				% E			0,00%								2,90%						
VOLUMEN TECNICO BIM	$ 46.000.000,00	0,53%	0,53%	% P			0,03%								0,32%						
	$ 46.000.000,00	0,53%	$ 46.000.000,00	$ P	$ -		$ 2.300.000,00								$ 27.600.000,00						
				$ E	$ -		$ 2.300.000,00								$ 27.600.000,00						
				% E			0,03%								0,32%						
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 5.755.432.000,00	65,76%	52,32%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	0,51%	0,39%			4,37%						
	$ 4.579.246.000,00	52,32%	$ 4.579.246.000,00	$ P	$ -		$ -	$ 1.760.000,00	$ 2.200.000,00	$ 56.400.000,00	$ 27.843.000,00	$ 34.642.456,00			$ 743.912.765,54						
				$ E	$ -		$ -	$ 1.760.000,00	$ 2.200.000,00	$ 56.400.000,00	$ 27.843.000,00	$ 34.642.456,00			$ 743.912.765,54						
				% E	0,00%			0,00%	0,00%	0,64%	0,31%	0,39%			8,37%						
VALOR BÁSICO DE consultoría (A)	$ 8.700.000.000,00	99,48%	95,48%																		
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO (B)	$ 8.752.587.320,00	100,00%	$ 8.700.000.000,00																		

REPROGRAMACIÓN

REPROGRAMACIÓN

REPROGRAMACIÓN

ADICIÓN N°1 Y PRORROGA N°2

INVERSIÓN CONSULTORA PROGRAMADA MES	%	1,10%	1,10%	2,12%	2,69%	1,35%	2,10%	2,20%	1,62%	22,34%	9,71%	45,12%	2,96%	4,03%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 185.122.000,00	$ 233.868.000,00	$ 114.139.000,00	$ 183.662.000,00	$ 279.447.992,00	$ 142.916.456,00	$ 1.955.280.765,54	$ 849.767.000,00	$ 3.949.640.514,46	$ 261.156.000,00	$ 352.380.348,00	$ 13.141.830,00	$ 13.141.830,00	$ 13.141.830,00	$ 13.141.830,00			
INVERSIÓN CONSULTORA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,10%	2,20%	4,31%	7,01%	8,31%	10,41%	12,60%	15,23%	37,57%	47,27%	92,39%	95,37%	99,40%	99,55%	99,70%	99,85%	100,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96.222.000,00	$ 192.444.000,00	$ 377.566.000,00	$ 613.134.000,00	$ 727.260.000,00	$ 910.922.000,00	$ 1.190.369.992,00	$ 1.333.286.392,00	$ 3.287.567.157,54	$ 4.137.814.157,54	$ 8.066.454.652,00	$ 8.347.610.652,00	$ 8.700.000.000,00	$ 8.713.141.830,00	$ 8.726.283.660,00	$ 8.739.425.490,00	$ 8.752.587.320,00			
INVERSIÓN CONSULTORA EJECUTADA MES	%	1,10%	1,10%	2,12%	2,69%	1,35%	2,09%	3,21%	1,62%	22,34%	9,91%	34,78%	10,83%	6,23%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 185.122.000,00	$ 233.868.000,00	$ 114.139.000,00	$ 183.662.000,00	$ 279.447.992,00	$ 142.916.456,00	$ 1.955.280.765,54	$ 867.767.000,00	$ 3.042.223.041,32	$ 948.737.757,54	$ 545.438.348,00	$ 13.141.830,00	$ -	$ -	$ -			
INVERSIÓN CONSULTORA EJECUTADA ACUMULADA	%	1,10%	2,20%	4,31%	7,01%	8,31%	10,39%	13,60%	15,23%	37,57%	47,49%	82,26%	93,11%	99,35%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 96.222.000,00	$ 192.444.000,00	$ 377.566.000,00	$ 611.434.000,00	$ 725.573.000,00	$ 909.235.000,00	$ 1.188.682.992,00	$ 1.331.599.392,00	$ 3.286.880.157,54	$ 4.154.647.157,54	$ 7.197.321.305,86	$ 8.145.929.229,86	$ 8.691.367.577,86	$ 8.704.509.407,86	$ 8.704.509.407,86	$ 8.704.509.407,86	$ 8.704.509.407,86			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica ajustada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe nutrir el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL: VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B')	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de consultoría aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de consultoría cocontratada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la consultoría (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $$.

6. El porcentaje programado mensual (%) del Programa de la consultoría programada se calcula con respecto al Valor Básico de consultoría (A) o el Valor Básico de consultoría Actualizado (A').

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de consultoría que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de consultoría.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Aprueba Firma:
Nombre: EDWIN PENILLA RENTERIA MENA
Director de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202517733 ATL

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPTVC

Revisó Firma:
Nombre: JINNNER SALAS OCEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Revisó Firma:
Nombre: YENNY ACHIMIRA HERNANDEZ FERNANDA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

SECRETARÍA DE OBRAS
PROGRAMA ESPECIAL DE MOVILIDAD PARA LA SEGURIDAD PEATONAL Y CICLISTA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VIAL A LOS EJES DE
MEJORAMIENTO AL TRANSPORTE PÚBLICO

CÓDIGO	SOPT-DOP-I-04-FT-02
REVISIÓN	0
FECHA	01/03/2022
PÁGINA	Hoja 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CACICO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA No.** 10 **DE** ONCE (11) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA:** $ -

SEGUIMIENTO No. 10
(se consecutivo desde una intervención y no reinicia cada año fiscal ni cambio periodo de obra)

CONTRATO No: ____SOPT DIE 2020____

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS a la NIVEL DE FASE III DEFINITIVO DE LA CONEXIÓN CURUNDÚ - SAN JOSÉ DEL TALMAR - DELGADO EL CARO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

CONTRATISTA: ARKOTECNO TECNOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO LIMITADA
CONSULTOR DE INTERVENTORÍA No.1: ADD de 2020 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1 Año (Ver Anexo Plazos, Cantidad, Unidades) PLAZO ADICIONALMES: 11 (5 meses (Ver cuadro siguiente de prórrogas en el seguimiento)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/1/2021 (Ver Acta de Inicio) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/31/2022 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 7/26/2021 (Ver Acta de Suspensión) FECHA DE REANUDACIÓN: 4/6/2021 (Ver Acta de Reanudación)
VALOR INICIAL (Incluidos IVA) ($): $ 5,750,000,000.00 VALOR ADICIONES (Incluidos IVA) ($): $ 53,587,328.00
VALOR ACUMULADO (Incluidos IVA) ($): $ 5,753,587,328.00

ETAPA	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROGRAMADO (Ver Anexo)	VALOR PROGRAMADO	% PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO (Ver Anexo)	% EJECUTADO
		COSTOS PARTIDAS DE PAGO (GPP)							
	1	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	GLB	1	$ 414,533,333.33	6.91%	72.00%	$ 414,533,333.33	7.20%
	2		GLB	1	$ 4,603,521,333.33	76.69%	1.00%	$ 5,753,587,328.00	100.00%
		ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III DEFINITIVO							
	3	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	GLB	1	$ 93,600,000.00	1.56%	4.76%		
	4		GLB	1	$ 93,600,000.00	1.56%		$ 93,600,000.00	1.63%
	5	ESTUDIO DE TRÁNSITO, EXPANSIÓN Y ANALISIS DE CAPACIDAD	GLB	1	$ 50,000,000.00	0.83%	2.86%		
	6		GLB	1	$ 50,000,000.00	0.83%		$ 50,000,000.00	0.87%
	7	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	GLB	1	$ 105,600,000.00	1.76%	1.90%		
	8		GLB	1	$ 105,600,000.00	1.76%		$ 105,600,000.00	1.84%
	9	ESTUDIO DE GEOTECNIA Vía	GLB	1	$ 42,000,000.00	0.70%	2.40%		
	10		GLB	1	$ 42,000,000.00	0.70%		$ 42,000,000.00	0.73%
	11	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	GLB	1	$ 135,600,000.00	2.26%	1.90%		
	12		GLB	1	$ 105,600,000.00	1.76%		$ 105,600,000.00	1.84%
	13	ESTUDIO DE HORIZONTAL VIAL DE DETALLE	GLB	1	$ 125,600,000.00	1.93%	1.90%		
	14		GLB	1	$ 105,600,000.00	1.76%		$ 105,600,000.00	1.84%
	15	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	GLB	1	$ 668,600,000.00	11.15%	4.80%		
	16		GLB	1	$ 268,600,000.00	4.48%		$ 268,600,000.00	4.67%
	17	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS DE TUNELES, Y OTRAS ESTRUCTURAS	GLB	1	$ 105,600,000.00	1.76%	2.86%		
	18		GLB	1	$ 105,600,000.00	1.76%		$ 105,600,000.00	1.84%
	19	ESTUDIOS DE HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	GLB	1	$ 132,000,000.00	2.21%	2.86%		
	20		GLB	1	$ 105,600,000.00	1.76%		$ 105,600,000.00	1.84%
	21	ESTUDIO Y DISEÑO DE PLUVIALES OA	GLB	1	$ 73,600,000.00	1.23%	1.90%		
	22		GLB	1	$ 73,600,000.00	1.23%		$ 73,600,000.00	1.28%
	23	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	GLB	1	$ 451,600,000.00	7.56%	2.86%		
	24		GLB	1	$ 451,600,000.00	7.56%		$ 451,600,000.00	7.85%
	25	ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	GLB	1	$ 47,600,000.00	0.80%	0.95%		
	26		GLB	1	$ 47,600,000.00	0.80%		$ 47,600,000.00	0.83%
	27	ESTUDIO DE RIESGO HIDROCAVITARIAS SOCIAL	GLB	1	$ 47,600,000.00	0.80%	0.95%		
	28		GLB	1	$ 47,600,000.00	0.80%		$ 47,600,000.00	0.83%
	29	ESTUDIO DE PARQUIS	GLB	1	$ 83,600,000.00	1.40%	1.90%		
	30		GLB	1	$ 83,600,000.00	1.40%		$ 83,600,000.00	1.45%
	31	ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, Y PLIEGO DE CONDICIONES	GLB	1	$ 50,000,000.00	0.83%	2.86%		
	32		GLB	1	$ 50,000,000.00	0.83%		$ 50,000,000.00	0.87%
	33	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	GLB	1	$ 168,600,000.00	2.82%	1.90%		
	34		GLB	1	$ 105,600,000.00	1.76%		$ 105,600,000.00	1.84%
	35	GABRETAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD	GLB	1	$ 451,600,000.00	7.56%	2.86%		
	36		GLB	1	$ 451,600,000.00	7.56%		$ 451,600,000.00	7.85%
	37	VOLUMEN TÉCNICO BIM	GLB	1	$ 42,000,000.00	0.70%	2.40%		
	38		GLB	1	$ 42,000,000.00	0.70%		$ 42,000,000.00	0.73%
		OTROS COSTOS DIRECTOS							
	39		GLB	1	$ 4,603,521,333.33	76.69%	72.00%	$ 4,603,521,333.33	80.00%
		VALOR PROGRAMADO (Incluidos IVA)			$ 5,753,587,328.00	95.84%	100.00%	$ 5,753,587,328.00	100.00%
		VALOR EJECUTADO (Incluidos IVA)			$ 5,753,587,328.00	100.00%		$ 5,753,587,328.00	100.00%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Incluir los ítems de pago agregados en cada GPP.
2. El Valor Ejecutado debe ser igual al valor del ítem en el Programa de Obra ejecutado.
3. El Porcentaje de Ejecución de cada ítem se calcula como el valor ejecutado en el mes/su valor total del ítem en el GPP y el "Valor básico de obra programada"
4. El Programa de Inversiones se carga mensualmente en Valor básico de la obra (sin incluir presidencias de IVA.).
5. Para mes/semana en ejecución se recogen mensualmente ítems de obra que no se ejecutan agregan por GPP, se debe ACgarcial el formato con los ítems de obra.

GRAFICO DE CURVA	
CURVA DE S	PROGRAMADO
PROGRAMADO	EJECUTADO
EJECUTADO	

				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	%
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	
				1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	
				$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	$ 69,088,888.89	
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00

ACTAS DE REUNIÓN

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba		CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	VERSIÓN	1
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA		PÁGINA	

FECHA	2/12/2025
	(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoria)

ACTA DE REUNIÓN No. 39
(La numeración será consecutiva)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Aclaracion a las Observaciones de Metodologia BIM

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Revisión de observaciones al Plan de Ejecución BIM (BEP)
Contexto de la implementación BIM en el proyecto
Definición del alcance real de la metodología BIM
Identificación de los volúmenes que contarán con modelación BIM
Necesidad de ajustar el BEP
Implementación del Entorno Común de Datos (CDE)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


La reunión inició con la manifestación por parte de la interventoría de la necesidad de aclarar el alcance real de la metodología BIM, debido a inquietudes surgidas tras la respuesta de la consultoría a las observaciones realizadas al BEP, especialmente frente a la afirmación de un supuesto desconocimiento del contexto del proyecto.

La consultoría explicó que el componente BIM ha estado sujeto a múltiples ajustes a lo largo del proyecto, derivados principalmente de restricciones presupuestales, cambios en el kilometraje inicial, limitaciones en licencias de software y recursos humanos, así como decisiones institucionales del INVÍAS frente a la incorporación progresiva del BIM. En este sentido, se aclaró que el alcance actual del BIM responde a una implementación ajustada y viable, previamente avalada por la interventoría y el INVÍAS.

Se precisó que la metodología BIM no se desarrollará de manera integral, sino como una herramienta de gestión de la información y control documental, apoyada en el Entorno Común de Datos, y que únicamente cinco (5) volúmenes técnicos contarán con procesos de modelación, los cuales se consolidarán principalmente en los modelos de diseño geométrico y estructuras. Los demás volúmenes harán parte del BIM desde la perspectiva documental, sin modelación.

La interventoría señaló la importancia de que estas definiciones queden expresamente consignadas en el BEP, de manera clara y desde el inicio del documento, con el fin de evitar interpretaciones erróneas, observaciones posteriores por parte del INVÍAS y eventuales riesgos de incumplimiento contractual.

REGISTRO FOTOGRAFICO

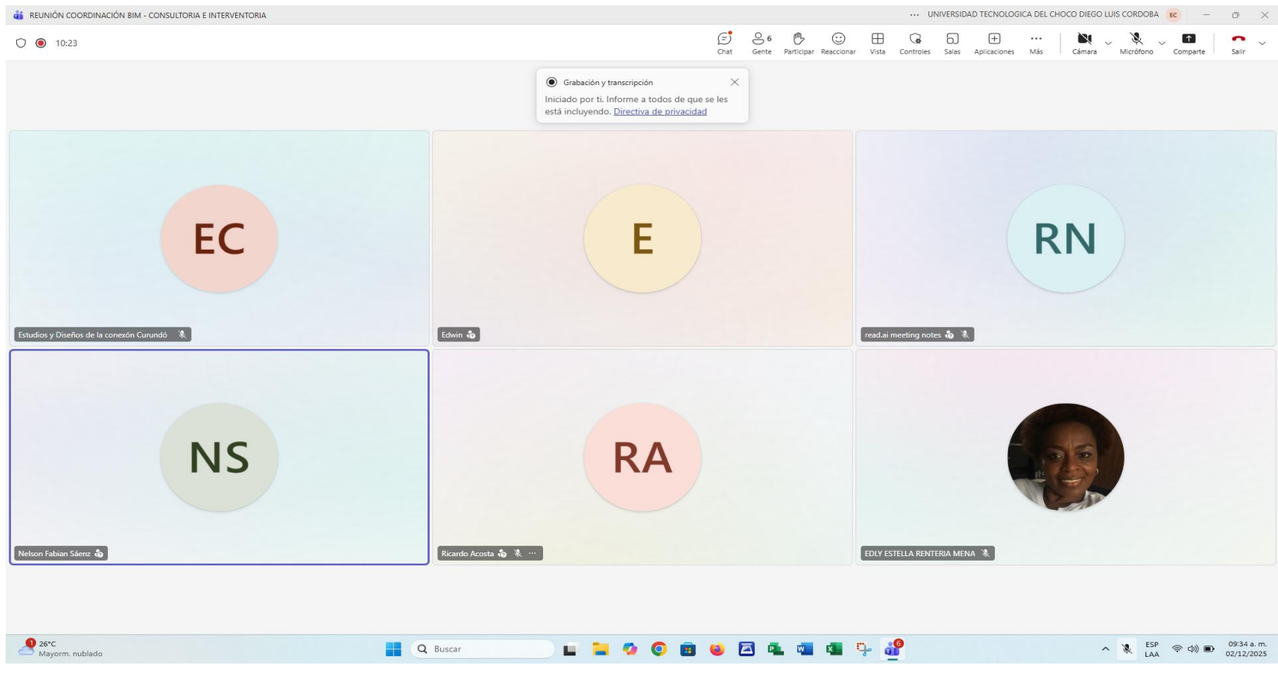

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 2/12/2025
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Reunión para definir indicadores de desempeño.		Coordinadores BIM

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba		CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	VERSIÓN	1
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA		PÁGINA	
		FECHA	13/12/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoria)

ACTA DE REUNIÓN No. 40
(La numeración será consecutiva)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Reunión técnica sobre la batimetría del corredor vial

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
mportancia del manejo de aguas y su impacto en la estabilidad de la vía. Revisión de información de la fase 2 y su relevancia para el diseño actual.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Ingebiero Diego Borda; explicó que el proyecto inicia en el K60 +100, en Quebrada del Socorro, y abarca un total de 97 kilómetros. Se discutió la necesidad de realizar batimetrías y levantamientos topográficos en los tramos 2, 3, 4 y 5, haciendo hincapié en los puntos críticos que afectan la transitabilidad en el corredor vial.


En la revisión del tramo 2, se identificaron cinco (5) fuentes hídricas y se acordó la necesidad de enviar un plano con coordenadas para facilitar la verificación. Jhonatan Leguizamo sugirió que se incluya un archivo KMZ para una mejor ubicación de las fuentes.


Ivan Blanco mencionó la posibilidad de que se requieran obras para controlar el caudal en la zona, sugiriendo que se debe considerar la hidrología local.

Se abordaron los desafíos de erosión en el tramo 3, donde se identificaron puntos críticos relacionados con el río Hábitat.

El Ing Jhonatan Leguizamo; sugirió la importancia de incluir obras de disipación en los diseños de drenaje para prevenir avalanchas. Ricardo Acosta y otros oradores coincidieron en la necesidad de realizar un trabajo de campo para recopilar información adicional.

REGISTRO FOTOGRAFICO

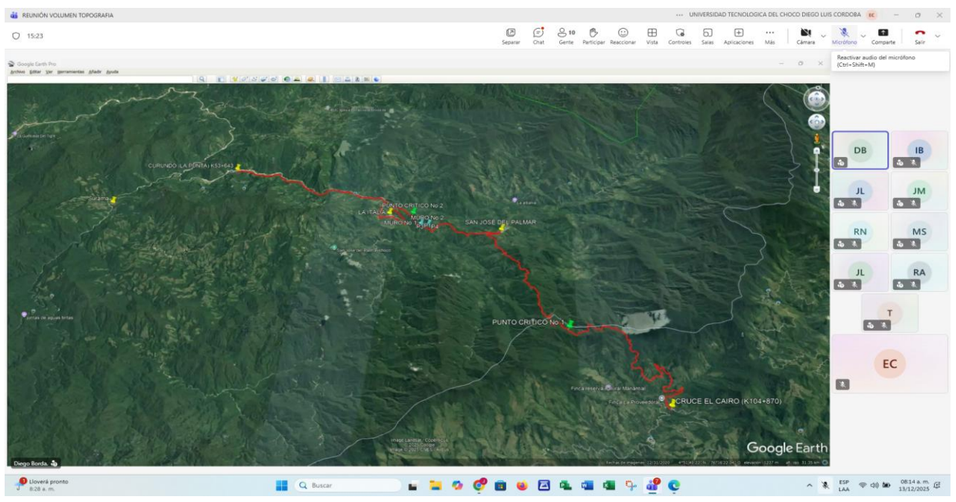

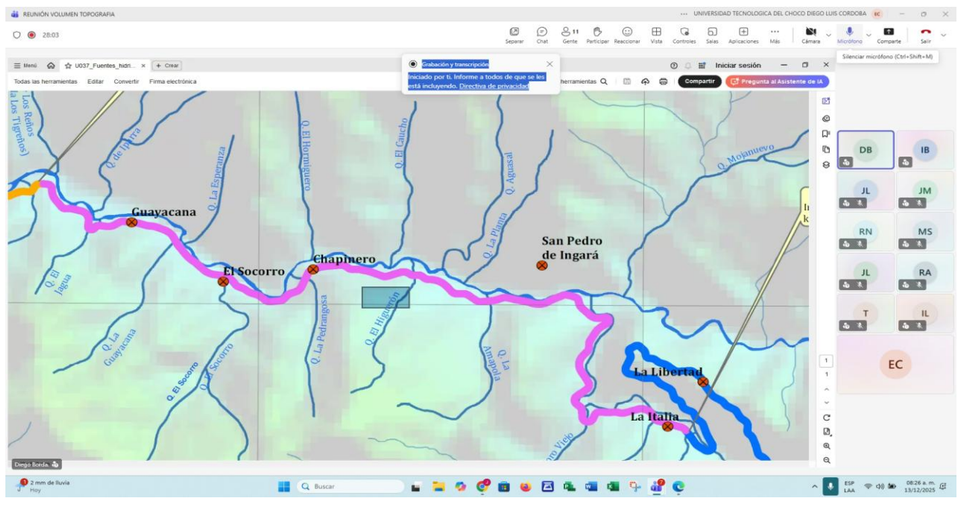

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba		CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	VERSIÓN	1
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA		PÁGINA	
		FECHA	13/12/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

ADJUNTO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba		CÓDIGO: CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	VERSIÓN: 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA		PÁGINA:

FECHA: 18/12/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoria)

ACTA DE REUNIÓN No. 41
(La numeración será consecutiva)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Aporte del volumen de estabilidad de taludes a la implementación de la metodología BIM del proyecto, estableciendo los alcances de modelado, criterios técnicos y nivel de desarrollo.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Contexto general del proyecto y ajustes en la implementación BIM.
Estado actual del cronograma y limitaciones de tiempo y recursos.
Revisión de los alcances BIM definidos en el BEP.
Modelado del corredor vial y disciplinas asociadas.
Alcance del modelado de estabilidad de taludes y definición de puntos críticos.
Avance y entrega de información topográfica preliminar.
Requerimientos de la interventoría y estructura de entrega según INVÍAS.
Entregas parciales y validación técnica previa al envío oficial.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la reunión se presentó el contexto general del proyecto, señalando los diferentes ajustes y reactivaciones que ha tenido el proceso, así como las dificultades que han afectado el ritmo de avance, particularmente en la implementación BIM, debido a limitaciones de tiempo y recursos.

Se recordó que inicialmente se definieron unos alcances BIM para el proyecto, los cuales posteriormente fueron ajustados en función de los recursos disponibles y del cronograma vigente. Actualmente, considerando que la prórroga del contrato se extiende únicamente hasta el mes de abril y que el avance en topografía aún se encuentra en etapa de georreferenciación, se evidenció que el tiempo disponible es limitado para mantener todos los compromisos inicialmente planteados.

Se explicó que los alcances BIM previstos incluían el modelado del corredor vial asociado al diseño geométrico, pavimentos, estructuras hidráulicas y estabilidad de taludes, con énfasis en las obras geotécnicas requeridas en puntos críticos. Para optimizar tiempos, se había planteado que el equipo de estabilidad de taludes realizara levantamientos específicos en sectores críticos, de manera independiente al avance general de la topografía.

En relación con la estabilidad de taludes, los especialistas manifestaron que es viable mantener el alcance de modelado para los puntos críticos, considerando que el tipo de obra (terrazas, anclajes y posibles muros anclados) no variaría sustancialmente, aunque algunos parámetros técnicos podrían ajustarse una vez se cuente con la información definitiva de la fase 3, derivada de las perforaciones y estudios de campo.


Se aclaró que el modelado geotécnico se limitará exclusivamente a los puntos críticos identificados, mientras que los cortes normales del corredor no requerirán obras complementarias ni modelación específica, al tratarse de taludes estables.

Respecto a un punto crítico particular (conocido como El Volcán o La Virgen, se discutió la problemática recurrente de inestabilidad de la banca. Se planteó evaluar alternativas técnicas adicionales, incluyendo la posibilidad de un túnel falso, sujeto a los resultados de los estudios geotécnicos detallados que se realicen en la fase correspondiente.

Adicionalmente, se informó que la interventoría solicitó la entrega de un modelo digital preliminar de aproximadamente un kilómetro para revisión y aprobación de la topografía. Se acordó compartir dicho modelo, en el estado actual en que se encuentre, con los especialistas en geotecnia y con la coordinación BIM, con el fin de realizar observaciones previas antes de su envío oficial a la interventoría. También se indicó la necesidad de organizar la información topográfica conforme a la estructura de carpetas exigida por el INVÍAS.

Finalmente, se concluyó que, bajo las condiciones actuales de tiempo y recursos, es posible mantener los alcances definidos para el componente de estabilidad de taludes en el BEP, limitándolos a los puntos críticos, y continuar con la implementación BIM de manera

REGISTRO FOTOGRAFICO

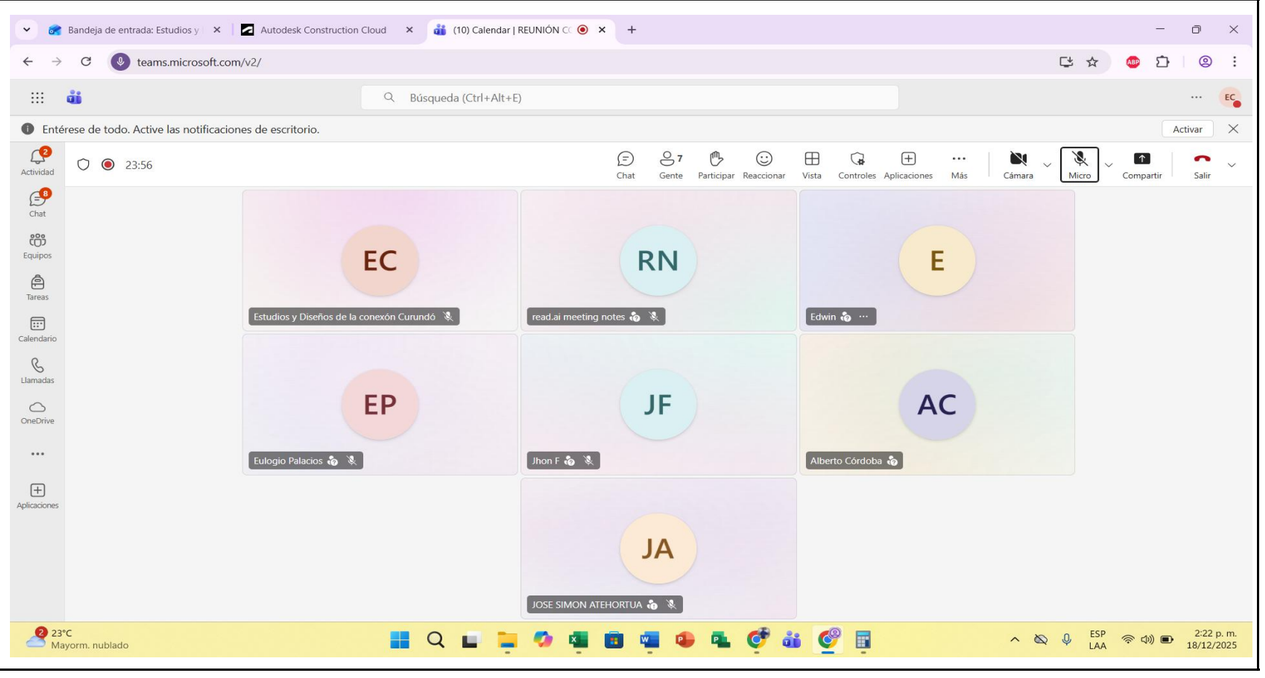

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba		CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	VERSIÓN	1
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA		PÁGINA	
		FECHA	18/12/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

ADJUNTO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba / INVIAS	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
	VERSIÓN	1
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	PÁGINA	

FECHA	16/01/2026
	(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoria)

ACTA DE REUNIÓN No. 42
(La numeración será consecutiva)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Analizar y concertar los aspectos técnicos relacionados con las especificidades de la consultoría, mediante la revisión de los avances presentados por cada volumen, con el fin de unificar criterios, resolver observaciones y definir lineamientos técnicos que orienten el adecuado desarrollo de los estudios y diseños.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Revisión de las especificidades técnicas de la consultoría. Presentación y análisis de avances por cada volumen del proyecto. Discusión de observaciones técnicas y aclaración de criterios. Definición de lineamientos y acciones a seguir para el desarrollo de los estudios y diseños.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión virtual dio inicio a las 3:00 p. m., con la participación de la directora de consultoria Edly Stella Renteria Mena; coordinador Tecnico Eulogio Palacios Chaverra, La coordinadora ambiental y social Luz Yaneth Ocoró; la residente de estudios Jhoana Marcela Mosquera Palacios; Ingeniera Auxiliar Lleceli Mosquera Tello; y especialistas de la consultoria en las areas de Topografia, Diseño Geometrico, Transito, Seguridad Vial, Pavimentos, Taludes e Hidraulica, en el marco de la mesa de trabajo correspondiente a la consultoría, con el fin de abordar los avances del proyecto.

Durante la mesa de trabajo se realizó la revisión técnica integral de los diferentes volúmenes de la consultoría, con énfasis en el diseño geométrico, hidráulico, pavimentos, geotecnia y topografía, para el proyecto de Estudios y Diseños de la conexión Curundó – San José del Palmar – Cruce El Cairo.

En relación con el diseño geométrico, se indicó que este se viene desarrollando conforme a lo establecido en el Manual de Diseño Geométrico vigente, aprovechando en lo posible el alineamiento existente.

Se resaltó la necesidad de integrar al diseño geométrico los criterios de otras especialidades, particularmente:

Hidráulica, para la definición de cunetas, manejo de aguas superficiales, alcantarillas, tuberías cerradas, puntos de conexión y disipadores.

Pavimentos, para la definición de espesores, materiales y especificaciones técnicas, considerando los métodos de diseño (INVÍAS y otros) y la necesidad de realizar análisis comparativos.

Geotecnia, para la definición de taludes en corte y en relleno, incluyendo inclinaciones, alturas y anchos de terrazas, diferenciando entre sectores en suelo y sectores en roca.

Para el prediseño, se acordó trabajar con información correspondiente a fase II, mientras se consolida la información definitiva de campo. Se dejó establecido que, una vez se cuente con la topografía implantada y con mayor nivel de detalle, se deberán introducir los ajustes necesarios para obtener un producto más avanzado y consistente.

En cuanto al diseño hidráulico, se acordó que, para el nivel preliminar, se trabajará con cunetas tipo de 1,00 m de ancho en ambos costados de la vía, y que en puntos específicos se evaluará la implementación de sistemas cerrados mediante tubería, conexiones y disipadores, una vez se cuente con el diseño geométrico y la topografía definitiva. Asi mismo, se señaló la importancia de definir oportunamente la ubicación y el espaciamiento de las alcantarillas para evitar reboces y problemas de reblandecimiento del terreno.

Respecto al diseño de pavimentos, se discutieron los espesores preliminares obtenidos a partir de los análisis realizados, señalando la necesidad de mantener coherencia entre los métodos empleados y dejar claramente consignadas las consideraciones técnicas en las conclusiones del diseño. Se acordó avanzar en la definición de espesores y especificaciones para permitir la selección temprana de los APU y el avance del presupuesto.

En relación con la geotecnia, se analizó el punto crítico (La Virgen) identificado en el corredor, el cual presenta recurrentes problemas de inestabilidad asociados principalmente al manejo inadecuado de aguas. Se planteó como alternativa técnica viable la implementación de un falso túnel, complementado con un adecuado sistema de manejo y encauzamiento de aguas, con el fin de minimizar la interacción del flujo hídrico con el talud y reducir los procesos de remoción en masa. Esta alternativa deberá ser evaluada de manera conjunta entre los especialistas de geotecnia, estructuras, hidráulica y los pares de la interventoría, analizando sus ventajas y desventajas frente a otras opciones como el cambio de alineamiento o soluciones tradicionales de terraceo.


Adicionalmente, se señaló que existen otros sectores con potencial condición crítica que deberán ser evaluados directamente en campo por los especialistas antes de ser clasificados formalmente como puntos críticos, considerando la variabilidad climática y la dinámica del terreno en temporada de lluvias.

Finalmente, se acordó avanzar en el desarrollo del proyecto por subtramos, permitiendo entregas parciales de información técnica (diseño geométrico, topografía y demás volúmenes) para no detener el avance de los otros componentes de la consultoría, mientras se definen las soluciones definitivas en los sectores con mayor nivel de incertidumbre.

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba	INVIAS	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
		VERSIÓN	1
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA		PÁGINA	

FECHA	16/01/2026
	(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRAFICO

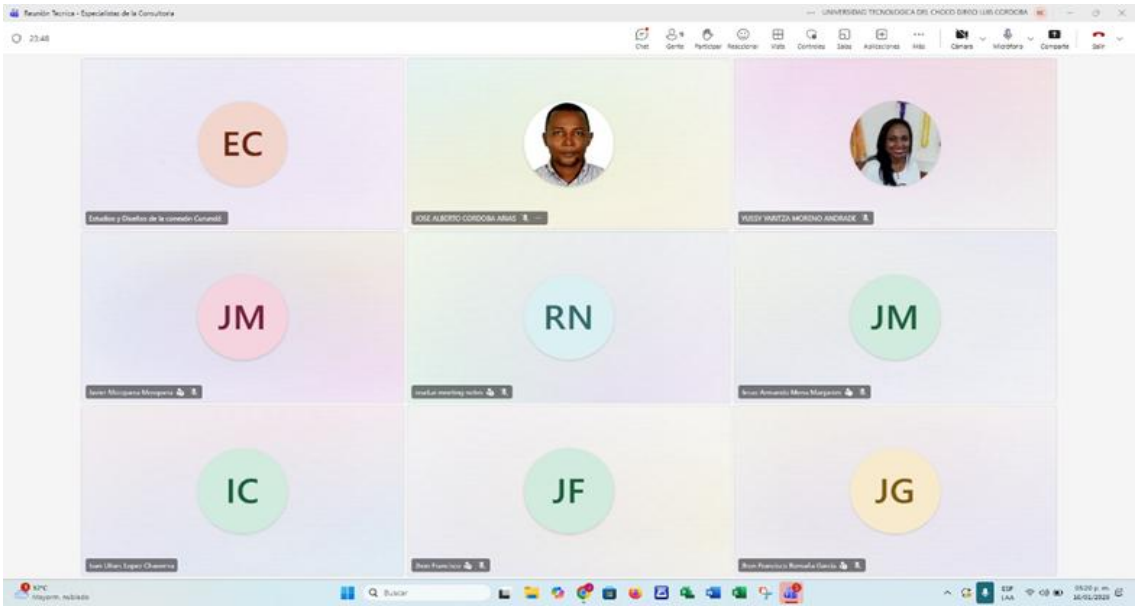

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 16/01/2026
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba	INVIAS	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
		VERSIÓN	1
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA		PÁGINA	

FECHA	19/01/2026
	(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoria)

ACTA DE REUNIÓN No. 43
(La numeración será consecutiva)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Aclarar y unificar criterios técnicos respecto al sistema de referencia y sistema de coordenadas que debe adoptarse para el desarrollo de los levantamientos topográficos y el diseño geométrico del corredor vial del proyecto Conexión Curundó.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Revisión de los requerimientos técnicos asociados a los sistemas de referencia horizontal y vertical aplicables en Colombia.
Marco normativo: MAGNA-SIRGAS, CTM12, Origen Único Nacional y Resoluciones IGAC vigentes.
Análisis de la aplicabilidad del Plano Topográfico Local (PTL) para el desarrollo de los diseños.
Procedimiento para la transformación de información entre sistemas de coordenadas (CTM12, Origen Único Nacional y PTL).
Definición del flujo de trabajo entre topografía y diseño geométrico para evitar reprocesos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


Se dio inicio a reunión con profesioanles de la consultoria a las 17:00 pm, con especialistas de los volumenes de Topografia, Diseño Geometrico, el coordinador tecnico, la coordinadora ambiental y social, la ingeniera residente de estudios y la ingeniera auxiliar en la que se inició con la contextualización de la inquietud planteada respecto al sistema de coordenadas utilizado en los levantamientos topográficos y su incidencia en el diseño geométrico del proyecto. El ingeniero Iván Ulises López explicó el sustento normativo de los requerimientos técnicos, haciendo referencia al uso del marco de referencia MAGNA-SIRGAS, el sistema CTM12 y el Origen Único Nacional, conforme a las resoluciones del IGAC.

Posteriormente, se analizó la metodología adoptada para el proyecto, indicando que, si bien el producto final debe entregarse en Origen Único Nacional, los levantamientos topográficos, cálculos, modelos digitales, carteras y diseños deben desarrollarse en PTL, tal como lo establecen los requerimientos técnicos, con el fin de minimizar errores y evitar observaciones por parte de la interventoría.

El ingeniero Elkin sustentó la necesidad de trabajar el diseño directamente en PTL, explicando el procedimiento para la definición de los parámetros del sistema (meridiano central del corredor, altura promedio, factor de escala, falsos norte y este), así como las implicaciones técnicas de no hacerlo, especialmente en proyectos de gran longitud como el corredor en estudio.

Finalmente, se discutió el flujo de conversión de información entre topografía y diseño, acordando que la información topográfica se suministrará en PTL para que el diseño geométrico se ajuste sobre dicha base, y que únicamente el producto final de localización general se presentará en CTM12 – Origen Único Nacional, conforme a la normativa del IGAC.

REGISTRO FOTOGRAFICO

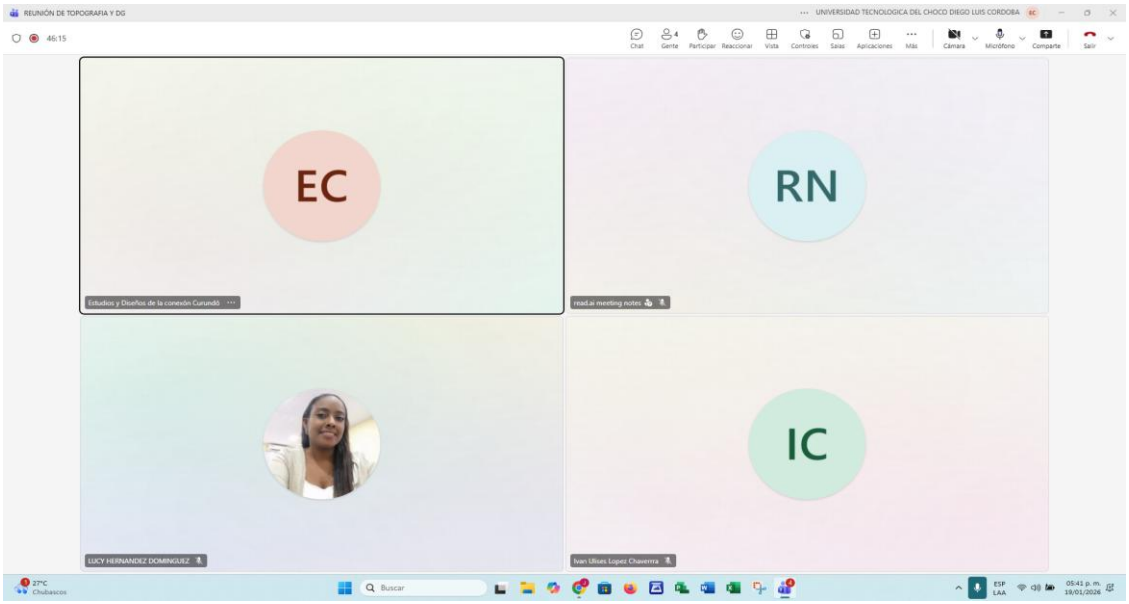

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 19/01/2026
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 28/01/2026
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Consultoria)

ACTA DE REUNIÓN No. 44
(La numeración será consecutiva)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Analizar el estado de avance de los estudios y diseños del proyecto, revisar los condicionantes técnicos, administrativos y contractuales que afectan el cumplimiento del cronograma, evaluar alternativas de solución para puntos críticos del corredor vial (geotécnicos, hidráulicos y estructurales), y definir lineamientos para la entrega de productos preliminares y definitivos, garantizando la integralidad del alcance contractual.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Alcance contractual del proyecto y responsabilidades de entrega integral.
Estado del cronograma y fechas de entrega de los diferentes componentes.
Avance y limitaciones en la exploración geotécnica.
Análisis de alternativas para puntos críticos del corredor vial.
Estado de la topografía, insumos técnicos y requerimientos adicionales.
Identificación de puntos críticos (taludes, quebradas, etc.).
Localización y diseño de campamentos, botaderos y fuentes de materiales.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión presencial / virtual convocada por la consultoría a las 3:00 PM, con la participación del grupo 1 de la consultoría y los especialistas de los volúmenes de Topografía, transito, diseño geométrico, Seguridad vial, hidráulica, redes, estructuras, urbanismo, predial, y evaluación socioeconómica y financiera.

Durante la reunión se reiteró que el alcance del proyecto corresponde a la entrega integral de todos los componentes contractuales, y no a entregas parciales de información.

Se revisó el cronograma del proyecto, confirmándose que las fechas contractuales de los volúmenes se mantienen, sin posibilidad de modificación. Se acordó avanzar con la entrega de los productos que se alcancen a desarrollar dentro de los plazos establecidos, dejando claramente identificados aquellos componentes que se presenten en nivel preliminar (versión 1), anexando los diseños disponibles y explicando las restricciones técnicas existentes.

Se destacó que la exploración geotécnica es un insumo crítico para la definición de soluciones estructurales, estabilidad de taludes y viabilidad de alternativas como terraceo, viaductos o falsos túneles. Se identificaron puntos críticos, los cuales presentan problemáticas asociadas a inestabilidad de taludes, pendientes pronunciadas y presencia de agua.


Para estos puntos, se discutieron alternativas preliminares de solución, principalmente el terraceo de taludes, con pendientes y alturas variables según el sector, complementadas con manejo de aguas superficiales, drenajes y accesos para maquinaria. Se indicó que estas soluciones deberán ajustarse una vez se cuente con los resultados definitivos de la exploración geotécnica.


Se resaltó que la topografía definitiva es indispensable para avanzar en los diseños, especialmente en los puntos críticos. Se solicitó expresamente el levantamiento detallado del terreno con perfiles transversales cada 5 metros, que permitan definir terrazas, analizar pendientes y establecer el punto más bajo para el adecuado manejo y entrega de aguas. Se informó que actualmente se cuenta con información topográfica del tramo cinco, mientras que otros sectores se encuentran en proceso de procesamiento y validación.

En relación con los campamentos y botaderos, se revisaron las alternativas disponibles, identificándose al menos dos áreas viables para campamento, una de ellas con una extensión aproximada de 5,3 hectáreas, con condiciones favorables de acceso, disponibilidad de agua y señal. Se indicó que tanto los campamentos como los botaderos deberán ser objeto de diseño técnico y validación ambiental, una vez se cuente con la topografía definitiva y los volúmenes estimados.

REGISTRO FOTOGRAFICO



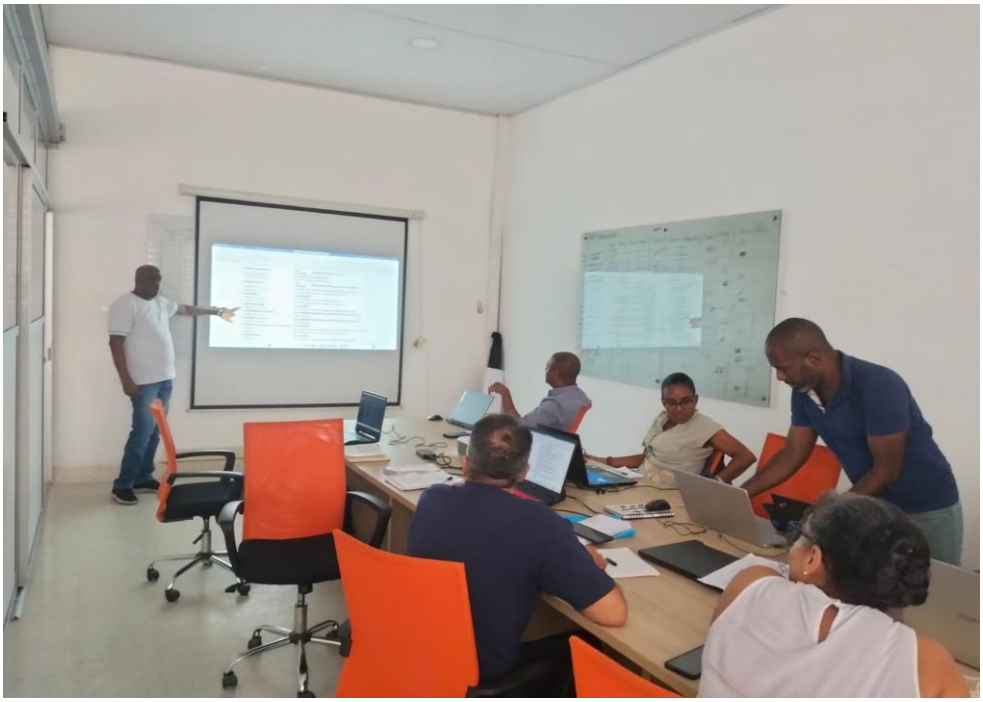

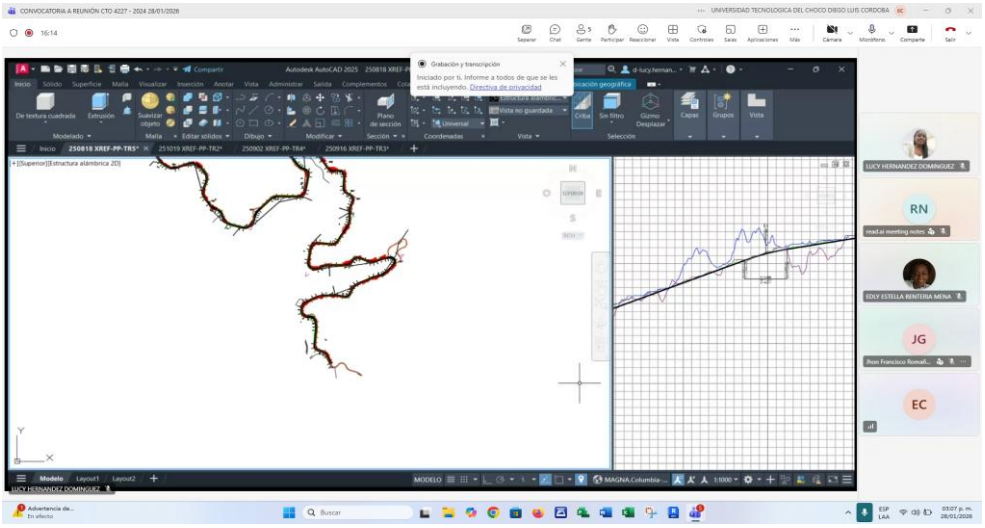
CONVOCATORIA A REUNIÓN CTO 4227 - 2024 28/01/2026
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA
Autodesk AutoCAD 2025
Grabación y transcripción
Iniciado por ti. Informe a todos de que se les está incluyendo. Directiva de privacidad
LUCY HERNANDEZ DOMINGUEZ
RN
IDLY ESTELLA RENTERIA MENA
JG
EC

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba	INVIAS	CÓDIGO	CÓDIGO:F-CAL- CONS-00-04
		VERSIÓN	1
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA		PÁGINA	
		FECHA	28/01/2026 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS | **FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)** | **RESPONSABLES**


.....

.....

.....

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

ADJUNTO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES

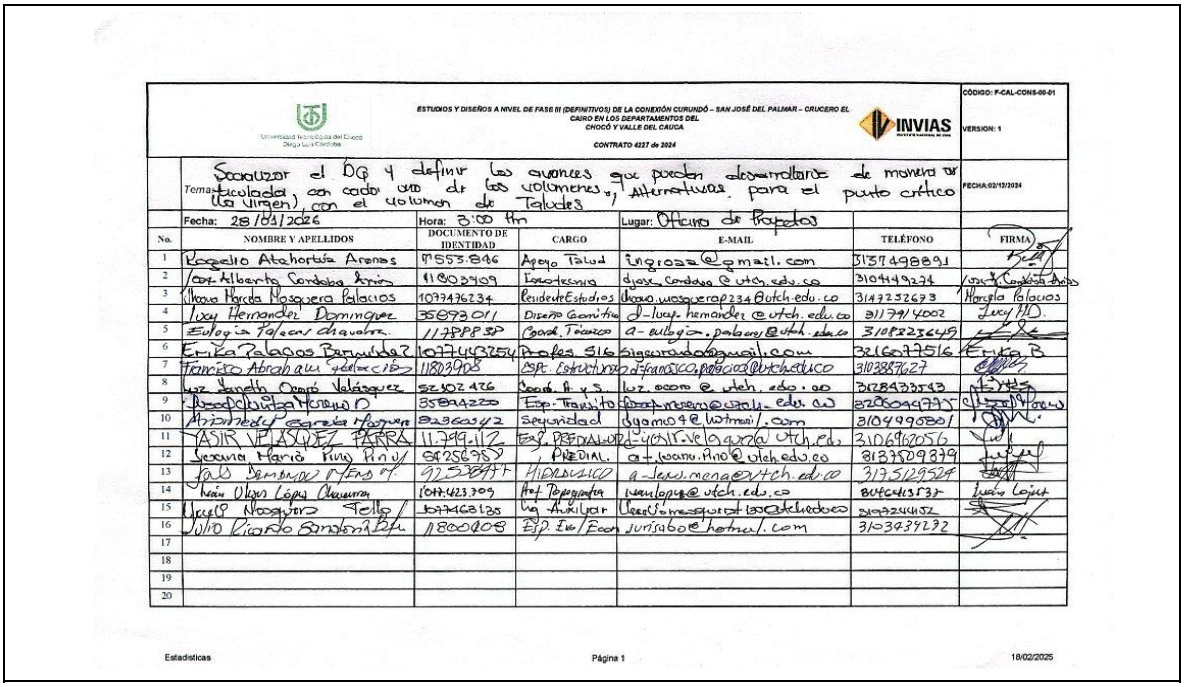

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDÓ – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO 4227 de 2024

CÓDIGO: F-CAL-CONS-00-01 | VERSION: 1 | FECHA:02/12/2024

Tema: Socializar el DG y definir los avances que pueden desarrollarse de manera articulada, con cada uno de los volumenes y/ Alternativas para el punto crítico (La Virgen), con el volumen de Taludes

Fecha: 28/01/2026 | Hora: 3:00 Pm | Lugar: Oficina de Proyectos

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Rogelio Atahortúa Arenas	9555896	Apoyo Talud	ingroaa@gmail.com	3137498891	
2	Prof. Alberto Córdoba Arias	11903709	Fotogrametría	djoax_cordoba@utch.edu.co	3104449274	
3	Jhoan Marcelo Mosquera Palacios	1077476234	Residente Estudios	jhoan.mosquerap234@utch.edu.co	3147232693	
4	Lixy Hernandez Dominguez	35893011	Diseño Geométrico	d-lixy.hernandez@utch.edu.co	3117914002	
5	Eulogia Palacios Arauhua	1178888	Coord. Técnico	a-eulogia.palacios@utch.edu.co	3108223645	
6	Erika Palacios Barrueta?	1077463254	Profes. SIG	sigcurundo@gmail.com	3216077516	
7	Francisco Abrahan Valencia	11803908	Esp. Estructuras	d-francisco.palacios@utch.edu.co	3103887627	
8	Luz Yaneth Osorio Velásquez	52402426	Coord. H. y S.	luz.osorio@utch.edu.co	3128933593	
9	Jhon Quintero Moreno	35894220	Esp. Tránsito	jhonmoreno@utch.edu.co	3206949735	
10	Arizmendy Garcés Mosquera	8236032	Seguridad	dyamos9@hotmail.com	3104990801	
11	YASIR VELASQUEZ PARRA	11.799.112	Esp. PREDIAL	d-yasir.velasquez@utch.edu	3106902056	
12	Jeovanny María Ruiz Rivas	9825695	PREDIAL	a-jeovanny.ruiz@utch.edu.co	8133509379	
13	Jairo Demberly Meneses	9232977	HIDRAULICO	a-jairo.meneses@utch.edu.co	3175129529	
14	Iván Ulises López Chaverra	1077423709	Arq Topografía	ivanlopez@utch.edu.co	3145413732	
15	Ubaldo Mosquera Tello	5377638	Ing Auxiliar	Ubaldomosquera100@hotmail.com	3103244432	
16	Julio Ricardo Sandoval Bolaños	11800808	Esp. Eco/Econ	juris600@hotmail.com	3103439292	
17						
18						
19						
20						

Estadísticas | Página 1 | 18/02/2025

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial
