Para Cualquier Requesta Cite este Radicado:
Rad No. 2026-04000-006132-3
2026-03-10 18:10 -INFRAESTRU
Destino: 4000
60
Rem/D: MIGUEL DAN JENSSEN D
Asunto: ORDEN DE PAGO No. 00
Folios: 1433
Anexos: CUENTA DE COBRO

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE VÍAS

ORDEN DE PAGO No. 000046

10 MAR 2026

Para: Adriana Boada Arguello, Profesional Especializado
De: Arq. Mary Fabiana Leal Garay – secretaria de Vías
Asunto: Presentación de documentos

Cumpliendo con las disposiciones establecidas por la secretaria de hacienda para la presentación de documentos para el pago de la obligación contraída por este despacho a favor de:
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S, NIT 901.485.484-3 por concepto de pago al contrato interadministrativo CTOI-SV-02532-2023 cuyo objeto es GERENCIA INTEGRAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE PROYECTOS GISAP, MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER. Factura por valor de **DOS MIL SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 2.070.850.890,00).**

Pago que debe realizarse a nombre de **CONSORCIO VIA CENTRO** identificado con NIT No. 301740307-9 de conformidad con la autorización enviada por la **EICE FARO DEL CATATUMBO** en cumplimiento del modificatorio No. 5 al contrato interadministrativo No. 02532-2023 correspondiente al ACTA PARCIAL No. 11 del contrato **LP-FC-38-2023** cuyo objeto es **MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRANDO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATAMTUMBO S.A.S.**

El valor neto a pagar será por la suma de **MIL SESICIENTOS CINCUENTA Y SÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($ 1.856.680.712,00); CON CARGO AL RP-000853 de 25 de marzo de 2025, con fuente de recursos 1.3.3.11.07- RB –TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL.** El valor anterior teniendo en cuenta que de la factura presentada se amortiza la suma de **CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 414.170.178,00); correspondiente al 20% del valor a pagar por concepto de amortización del anticipo entregado mediante FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA U CONSTRUCTORA CARGET S.A.S, CONSTRUCTORA MATICCES, EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA.**

Atentamente,

Arquitecta MARY FABIANA LEAL GARAY
Secretaria de Vías

Revisó técnica	Ing. Manuel Alberto Florez	Profesional Universitario
Revisó Jurídica	Doc. Jenyffer Berbesi Medina	Profesional Universitario
Proyectó	Ing. Jonathan Lizcano	Profesional Contratista

Powered by CamScanner

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

San José de Cúcuta 10 de marzo de 2026

ARQ.
MARY FABIANA LEAL GARAY
Secretaria de Vías
Gobernación de Norte de Santander

Asunto: Entrega acta parcial de obra N°11

Referencia: Contrato interadministrativo CTOI-SV-02532-2023.

Cordial saludo,

Me permito presentar el documento técnico de acta parcial de obra N°11 del proyecto LP-FC-038-2023 MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GÓMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

Anexos: Soportes correspondientes al ACTA PARCIAL N°11

Agradeciendo la atención prestada.

Atentamente.

FREDDY A FONTIVEROS

FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS
Gerente General (E)
EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

Proyectó: Ramon Alejandro Rodríguez Redondo - Profesional Contratado
N° DE FOLIOS_____

Powered by CamScanner

Faro del Catatumbo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
A-001071
FECHA: 10/03/2026
FORMA PAGO : CREDITO-dias: 0
FEC. VENCE: 30/06/2026

CUFE: 3bc858c2660a52535940f17472373812bcffe97bb2bbebdb1c95d547ceab55d70a73460946bfca5966fce531c821d17b

Datos del Emisor	Adquiriente
Razón social/Nombre: EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S.	**Razón social/Nombre:** DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 901485464-3	**NIT:** 800103927-7
Dirección: AV 5 13-82 BARRIO CENTRO	**Dirección:** A
Teléfonos: 310221490	**Teléfonos:** 5
	Email: tesoreria@nortedesantander.gov.co

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	% IVA	Vr. Total
1	0002	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CORREDOR VIAL 2.0	1.00	unidad	2,070,850,890.00	0.00	2,070,850,890.00

Obs:RECURSOS PARA EL MANEJO DE OPERACIONES SIN SITUACION DE FONDOS - OFSS- EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

Código	Descripción	Vr. Total

Total base:	2,070,850,890.00
IVA:	0.00
SubTotal	2,070,850,890.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
TOTAL:	2,070,850,890.00

Monto en letras: DOS MIL SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS.

RECURSOS PARA EL MANEJO DE OPERACIONES SIN SITUACION DE FONDOS -OFSS- EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. VALOR FACTURA $2.070.850.890,00
COSORCIO VIA CENTRO FACT FE-22 $2.058.353.690 Y FE-23 $12.497.200 RR

Resolución Dian N° 18764102226472 prefijo A desde 1001 al 1501 Fecha 28/11/2025 Vigencia 28/11/2027

Powered by CamScanner

FACTURA

Factura Electrónica de Venta FE - 22

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099611761 de 02/10/2025 - 02/10/2026 autoriza FE - 11 a FE - 50

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/03/2026 12:53
Fecha de Vencimiento	06/03/2026 12:53
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

SIN VALIDAR

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO VIA CENTRO
NIT	901740307-9
Obligación	IVA
Email	consorcioviacentro@gmail.com
Teléfono	3202358957
Dirección Fiscal	CL 10 0 E 94 OF 4 120 CENTRO DE NEGOCIO VENTURA PLAZA, CUCUTA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
NIT	901485464-3
Obligación	IVA
Email	farodelcatatumbotesoreria@gmail.com
Teléfono	3102214908
Dirección	AVENIDA 5 13-82 CENTRO
Ciudad, Depart.	CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01	COSTO DE OBRA	1.0	EA	$1,583,348,992.00		$1,583,348,992.00	$1,583,348,992.00
2	02	A.I.U 30 %	1.0	EA	$475,004,698.00		$475,004,698.00	$475,004,698.00

2

Subtotal	$2,058,353,690.00
Total a Pagar	**$2,058,353,690.00**

PAGO ACTA PARCIAL 11 CONTRATO DE OBRA LP-FC-38-2023
OBJETO: MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO - PUENTE GÓMEZ - SALAZAR - ARBOLEDAS - CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
AMORTIZACIÓN 20 % ANTICIPO POR VALOR DE $ 411.670.738
SALDO A PAGAR: $ 1.646.682.952
Periodo diciembre 2025 y enero 2026
PARTICIPACION:
CONSTRUCTORA CCC SAS - 35%
EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA - 30%
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA - 30%
CONSTRUCTORA CARGET SAS - 5%

Unidades de medida: EA = cada

Factura Electrónica de Venta FE - 22

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099611761 de 02/10/2025 - 02/10/2026 autoriza FE - 11 a FE - 50

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/03/2026 12:53
Fecha de Vencimiento	06/03/2026 12:53
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

SIN VALIDAR

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Factura Electrónica de Venta FE - 23

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099611761 de 02/10/2025 - 02/10/2026 autoriza FE - 11 a FE - 50

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/03/2026 17:39
Fecha de Vencimiento	05/03/2026 17:39
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

SIN VALIDAR

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO VIA CENTRO
NIT	901740307-9
Obligación	IVA
Email	consorcioviacentro@gmail.com
Teléfono	3202358957
Dirección Fiscal	CL 10 0 E 94 OF 4 120 CENTRO DE NEGOCIO VENTURA PLAZA, CUCUTA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
NIT	901485464-3
Obligación	IVA
Email	farodelcatatumbotesoreria@gmail.com
Teléfono	3102214908
Dirección	AVENIDA 5 13-82 CENTRO
Ciudad, Depart.	CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	05	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL (PERMISOS)	1.0	EA	$12,497,200.00		$12,497,200.00	$12,497,200.00

1

Subtotal	$12,497,200.00
Total a Pagar	**$12,497,200.00**

PAGO ACTA PARCIAL 11 CONTRATO DE OBRA LP-FC-38-2023
OBJETO: MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GÓMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
AMORTIZACIÓN 20% ANTICIPO POR VALOR DE $ 2.499.440
SALDO A PAGAR DE FE-17: $ 9.997.760
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL (PERMISOS) Periodo- diciembre 2025
PARTICIPACION:
CONSTRUCTORA CCC SAS - 35%
EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA - 30%
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA - 30%
CONSTRUCTORA CARGET SAS - 5%

Unidades de medida: EA = cada

Factura Electrónica de Venta FE - 23

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099611761 de 02/10/2025 - 02/10/2026 autoriza FE - 11 a FE - 50

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/03/2026 17:39
Fecha de Vencimiento	05/03/2026 17:39
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

SIN VALIDAR

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

ESTAMPILLA PROHOSPITAL

CONSORCIO VIA CENTRO

NIT: 901740307-9

San José de Cúcuta, 03 de marzo de 2026

Señores
EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S
Avenida 5 N 13-82 Centro de Negocios 5ta Avenida, Oficina 208
Cúcuta, Norte De Santander, Colombia.

Referencia: LP-FC-038-2023 MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GÓMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

Por medio de la presente y en mi facultad de representante legal del **CONSORCIO VIA CENTRO con NIT: 901740307-9**, autorizo a la Empresa **EICE FARO DEL CATATUMBO SAS**, identificada con NIT: 901485464-3, en virtud del contrato de obra de la referencia en llevar a cabo el descuento del 2% del valor del acta en trámite.

Atentamente,

CONSORCIO VIA CENTRO
NIT: 901740307-9
R/L MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ

CERTIFICACION BANCARIA

Certificado
Bancario

martes, 3 de febrero de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO VIA CENTRO identificado(a) con NIT 901740307, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	83400007022	2023/08/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortes Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141067916309

(415)7707212489984(8020) 000014106791630 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 3 0 7	9	Impuestos de Cúcuta	7	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 1 0 3 7 2 6	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA CCC S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 5	2 0 2 3 0 7 2 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 5 0 5 6 4 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 3 0 7 2 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 2 4 7 9 6 1	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 3 0 7 2 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 4 5 1 1 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA CARGET S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 3 0 7 2 1	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141067916309

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 3 0 7	9	7	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 9 0 4 7 3 1 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DURAN	PAEZ	MIGUEL	DAN JENSSEN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 8 2 1 2 3 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	ALVAREZ	HUGO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CONTROLADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141067916309

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 3 0 7	9	Impuestos de Cúcuta	7	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 7 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 7 2 1	
81. Hasta	2 0 2 6 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141067916309

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9017403079		Impuestos de Cúcuta	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO VIA CENTRO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Norte de Santander 54	Cúcuta 001

41. Dirección principal: CL 10 0 E 94 OF 4 120 CENTRO DE NEGOCIO VENTURA PLAZA

42. Correo electrónico: consorcioviacentro@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3202358957	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	2023 08 04							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 14 48 52 55

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 25 | 61. Fecha: 2024-07-25 11:27:56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos, sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

884. Nombre: RODRIGUEZ ESPITIA MARIO ALONSO

883. Cargo: Gestor III

Fecha generación documento PDF: 25-07-2024 02:31:09PM

CERT. RETEICA

CONSORCIO VIA CENTRO

NIT: 901740307-9

San José de Cúcuta, 03 de marzo de 2026

Señores
EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S
Avenida 5 N 13-82 Centro de Negocios 5ta Avenida, Oficina 208
Cúcuta, Norte De Santander, Colombia.

Referencia: LP-FC-038-2023 MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GÓMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

ASUNTO: CERTIFICADO RETENCION ICA

Cordial saludo,

Con la presente el CONSORCIO VIA CENTRO en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, certifica que el cobro del acta parcial de obra No 11 por valor de $ 2.070.850.890,00 que se ejecutó en:

- corresponde al municipio de SALAZAR, con el 37.45% ($ 775.433.854,00) del valor parcial del acta de obra No 11.
- corresponde al municipio de SANTIAGO, con el 58.17% ($ 787.931.054,00) del valor parcial del acta de obra No 11.
- corresponde al municipio de ARBOLEDAS, con el 4.39% ($ 90.876.547,00) del valor parcial del acta de obra No 11.

Los cuales fueron desarrolladas en el periodo del 01 de diciembre del 2025 al 31 de enero del 2026 en el desarrollo del contrato de obra No **LP-FC-038-2023 MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GÓMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.**

Atentamente,

CONSORCIO VIA CENTRO
NIT: 901740307-9
R/L MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ

MODIFICATORIOS

CDP

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
NIT : 901485464-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 00 000053

Fecha: 10/02/2026 1 - 1

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

OBRA MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GÓMEZ- SALAZAR ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER/t1.3.1.1.07/otras TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO EN G. - Servicios para la comunidad sociales y personales

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.61	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER/t1.3.1.1.07/tOTRAS TRANFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO EN G	37,485,464,309.20

Fuente Recurso: 1.3.1.1.07-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE DEL GOBIERNO EN GENERAL
Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN

TOTALES **37,485,464,309.20**

VIGENCIA: 2026
VALOR: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON 20 CENTAVOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS
CARGO: GERENTE GENERAL
DEPENDENCIA: GERENCIA
DOCUMENTO DE SOLICITUD:

GERMAN PRADA DUARTE
ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

RP

21

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
NIT : 901485464-3

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 000064

FECHA : 03/03/2026
A FAVOR DE : CONSORCIO VIA CENTRO NIT: 901740307-9
COMPROMISO : OBRA MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GÓMEZ- SALAZAR ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER/t1.3.1.1.07/otras TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO EN G. - Servicios para la comunidad sociales y personales
DISPONIBILIDAD : 00 000053 -- 10/02/2026
DEPENDENCIA : GERENCIA

TIPO CONTRATO :04 - NO APLICA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DISPONIBILIDAD	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.61	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER/t1.3.1.1.07/tOTRAS TRANFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO EN G	000053 - 10/02/2026	37,485,464,309.20

Fuente Recurso: 1.3.1.1.07-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE DEL GOBIERNO EN GENERAL
Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN

TOTALES **37,485,464,309.20**

VIGENCIA : 2026
VALOR : TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON 20 CENTAVOS.

GERMAN PRADA DUARTE
ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PREACTA Y MEMORIAS

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

A los tres (03) días del mes de febrero de 2026 se reunieron los residentes de obra o interventoria para realizar las cantidades de obra de la preacta del Acta de Obra Parcial No. 11 del contrato de la referencia

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACTA PARCIAL No. 11	
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	V/R UNIT	CANT	V/R PARC
1		CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900				916.956.376,00
1.2		OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES				68.720.174,00
1.2.1		ALCANTARILLAS				10.868.808,00
1.2.1.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	19.220,00	13,50	259.470,00
1.2.1.6	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.042,00	13,00	143.546,00
1.2.1.9	835	Tubería de PVC Ø20" incluye colchón de arena.	m	392.958,00	12,00	4.715.496,00
1.2.1.18		Demolicion manual en roca	m3	326.510,00	14,00	4.571.140,00
1.2.1.19		Excavación manual en material sin clasificar	m3	71.464,00	16,50	1.179.156,00
1.2.2		CUNETA, GEODREN Y BORDILLO				29.513.304,00
1.2.2.3	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.042,00	2.160,00	23.850.720,00
1.2.2.6	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	9.165,00	70,20	643.383,00
1.2.2.9	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	19.220,00	56,30	1.082.086,00
1.2.2.10		Tubo Ø 4" perforado para filtros	m	32.744,00	13,00	425.672,00
1.2.2.15	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	17.925,75	13,40	240.205,00
1.2.2.18		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa	m3	1.055.238,00	3,10	3.271.238,00
1.2.5		BOXCULVERT				$ 28.338.062,00
1.2.5.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	19.220,00	244,90	4.706.978,00
1.2.5.5	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	71.464,00	1,50	107.196,00
1.2.5.14		Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	458.207,00	48,00	21.993.936,00
1.2.5.15		Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	191.244,00	8,00	1.529.952,00
1.3		OBRAS DE ESTABILIDAD, AMPLIACION Y CONFINAMIENTO.				378.144.672,00
1.3.2		OBRA K5+255-K5+355: Muro en gaviones H=2.00m L=45.00m				$ 439.920,00
1.3.2.9	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	9.165,00	48,00	439.920,00
1.3.5		MURO CAISSON K4+140				377.704.752,00
1.3.5.5	405	Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 4 - 12mt, sin dinamita	m3	2.215.149,90	69,40	153.731.403,00
1.3.5.6	701	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	m3	1.663.451,00	6,60	10.978.777,00
1.3.5.7	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 - 12mt	m3	2.444.680,47	19,10	46.693.397,00
1.3.5.9	767	Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas	m3	1.712.800,00	5,20	8.906.560,00
1.3.5.12	1802	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada	m3	2.382.438,00	12,10	28.827.500,00
NP-02 1.3		Anclajes Pasivo DE 1" Incluye suministro, perforacion e inyeccion, tuerca y platina abovedada 15x15	m	262.118,38	24,00	6.290.841,00
NP-13 1.3		Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 0 - 4mt, sin dinamita	m3	2.215.149,90	55,20	122.276.274,00
1.4		MOVIMIENTO DE TIERAS				39.621.991,00
1.4.1	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	19.220,00	1.596,10	30.677.042,00
1.4.2	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	17.925,75	499,00	8.944.949,00
1.5		PAVIMENTOS				429.309.043,00
1.5.6	1206	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	1.229.422,75	312,00	383.579.898,00
1.5.7		Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2	12.873,90	2.139,00	27.537.272,00
NP-11 1.5		Riego de liga con emulsion asfaltica	m2	3.059,00	5.947,00	18.191.873,00
1.6		SEÑALIZACION VIAL				658.566,00

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

A los tres (03) dias del mes de febrero de 2026 se reunieron los residentes de obra e interventoria para realizar las cantidades de obra de la preacta del Acta de Obra Parcial No. 11 del contrato de la referencia

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACTA PARCIAL No. 11	
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	V/R UNIT	CANT	V/R PARC
NP-09 1.6		Delineador vial tipo corona	Un	109.761,00	6,00	658.566,00
1.7		**OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO**				**501.930,00**
1.7.1		**ZODME K6+580**				**501.930,00**
1.7.1.2	204	Roceria y Limpieza	m2	1.287,00	390,00	501.930,00
3		**ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900**				**586.487.580,00**
3.2		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**169.400.764,00**
3.2.1		**CUNETA, GEODREN Y BORDILLO**				**169.400.764,00**
3.2.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.447,00	4.583,00	52.461.601,00
3.2.1.17	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	1.265.396,00	2,60	3.290.030,00
3.2.1.18		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa		1.055.238,00	107,70	113.649.133,00
3.3		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**20.372.497,00**
3.3.1		**ALCANTARILLAS + MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO**				**4.902.654,00**
3.3.1.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	19.220,00	14,40	276.768,00
3.3.1.6	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3	1.657.370,00	1,00	1.657.370,00
3.3.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.447,00	53,00	606.691,00
3.3.1.19	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	m3	787.275,00	3,00	2.361.825,00
3.3.2		**BOXCULVERT**				**15.469.843,00**
3.3.2.4	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	193.409,00	5,30	1.025.068,00
3.3.2.14	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.447,00	418,00	4.784.846,00
3.3.2.22	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	458.207,00	18,80	8.614.292,00
3.3.2.27	742	Concreto ciclopeo para piso y solados	m3	787.275,00	1,10	866.003,00
3.3.2.31		Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	9.165,00	19,60	179.634,00
3.5		**OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES**				**22.148.957,00**
3.5.6	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	71.464,00	4,00	285.856,00
3.5.18	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	405.590,00	1,60	648.944,00
3.5.32	811	Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"	m	85.732,90	5,20	445.811,00
3.5.34	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	458.207,00	14,00	6.414.898,00
3.5.40	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	9.165,00	36,00	329.940,00
NP-05 3.5		Cuneta para zanja corona en geomembrana 30mils	m	118.043,00	118,80	14.023.508,00
3.6		**PUNTOS CRITICOS**				**36.747.213,00**
3.6.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	19.220,00	70,80	1.360.776,00
3.6.6	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	71.464,00	1,90	135.782,00
3.6.14	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	1.265.396,00	0,20	253.079,00
3.6.16	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3	1.657.370,00	11,80	19.556.966,00
3.6.21	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.447,00	1.005,00	11.504.235,00
3.6.53	742	Concreto ciclopeo para piso y solados	m3	787.275,00	5,00	3.936.375,00
3.8		**PAVIMENTOS**				**347.818.149,00**
3.8.4	1205	Riego de Imprimacion	m2	12.667,00	2.880,10	36.482.227,00
3.8.5	1206	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	1.358.848,00	227,20	308.730.266,00
NP-11 3.8		Riego de liga con emulsion asfaltica	m2	3.059,00	851,80	2.605.656,00
4		**ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920**				**69.905.036,00**

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

A los tres (03) días del mes de febrero de 2026 se reunieron los residentes de obra e interventoria para realizar las cantidades de obra de la preacta del Acta de Obra Parcial No. 11 del contrato de la referencia

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACTA PARCIAL No. 11	
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÒN	UND	V/R UNIT	CANT	V/R PARC
4.2		OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES				69.905.036,00
4.2.4		BOXCULVERT				69.905.036,00
4.2.4.1	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	238.519,00	17,90	4.269.490,00
4.2.4.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	19.220,00	127,00	2.440.940,00
4.2.4.4	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	1.265.396,00	1,70	2.151.173,00
4.2.4.5	767	Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	1.654.832,00	11,00	18.203.152,00
4.2.4.6	1012	Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas	m3	1.712.800,00	6,70	11.475.760,00
4.2.4.7	1201	Concreto 28 Mpa para vigas y losa	m3	1.849.526,00	3,80	7.028.199,00
4.2.4.11	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.447,00	2.126,00	24.336.322,00
				TOTAL COSTO DIRECTO		1.583.348.992,00
				A.I.U (30%):		475.004.698,00
				VALOR TOTAL DE OBRA FISICA:		2.058.353.690,00
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL (PERMISOS,						12.497.200,00
				SUBTOTAL PRESENTE ACTA		2.070.850.890,00
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20,00%):		414.170.178,00
				VALOR TOTAL PRESENTE ACTA		1.656.680.712,00

VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

ING. WILLIAM QUINTERO PABON
MP. No 54202230225 NTS
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO VÍA CENTRO

ING. YORIS ALEXANDER MONTAÑO
MP. No 54202106093 NTS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA CONSORCIO R&Q - JOYCO

ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
MP. No 54202380648 NTS
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VÍA CENTRO

ING. SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
MP. No 54202209738 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA CONSORCIO R&Q - JOYCO

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-58-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02132-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R& ING. MIGUEL DAN JENSSEN TIJMAN PAEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R& ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+020 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
ITEM No.:	1.2.1.A	DESCRIPCION:	Excavación y corte en tierra con retroquina, incluye cargue

FECHA DE INICIO:				FECHA FINAL:			UND:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	KINICIAL	KFINAL	VOLUMEN M3	ANCHO ML	LONGITUD ML	ALTO ML	DESCUENTO M3	TOTAL M3
excavacion para tuberia de 20"	k05+370	k05+370		1,42	12,00	0,79		13,48
							AJUSTE AL DECIMAL	0.02
							TOTAL	13,50

OBSERVACION:

HELLIAN QUINTERO PADRON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVERDUGO CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INFORME CANTIDAD DE EXCAVACION TUB 20 PULGADAS ABSCISA K4+390 EN TRAMO 1.

OBJETO CONTRATO, "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S."

DICIEMBRE – ENERO

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S


NIT. 900.794.329-9


INSTALACION TUB 20 PULGADAS TRAMO 1				
ABSCISA	DISTANCIA	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
K4+390	12	1.42	0.79	13.46
		TOTAL EXCAVACION		13.5

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9

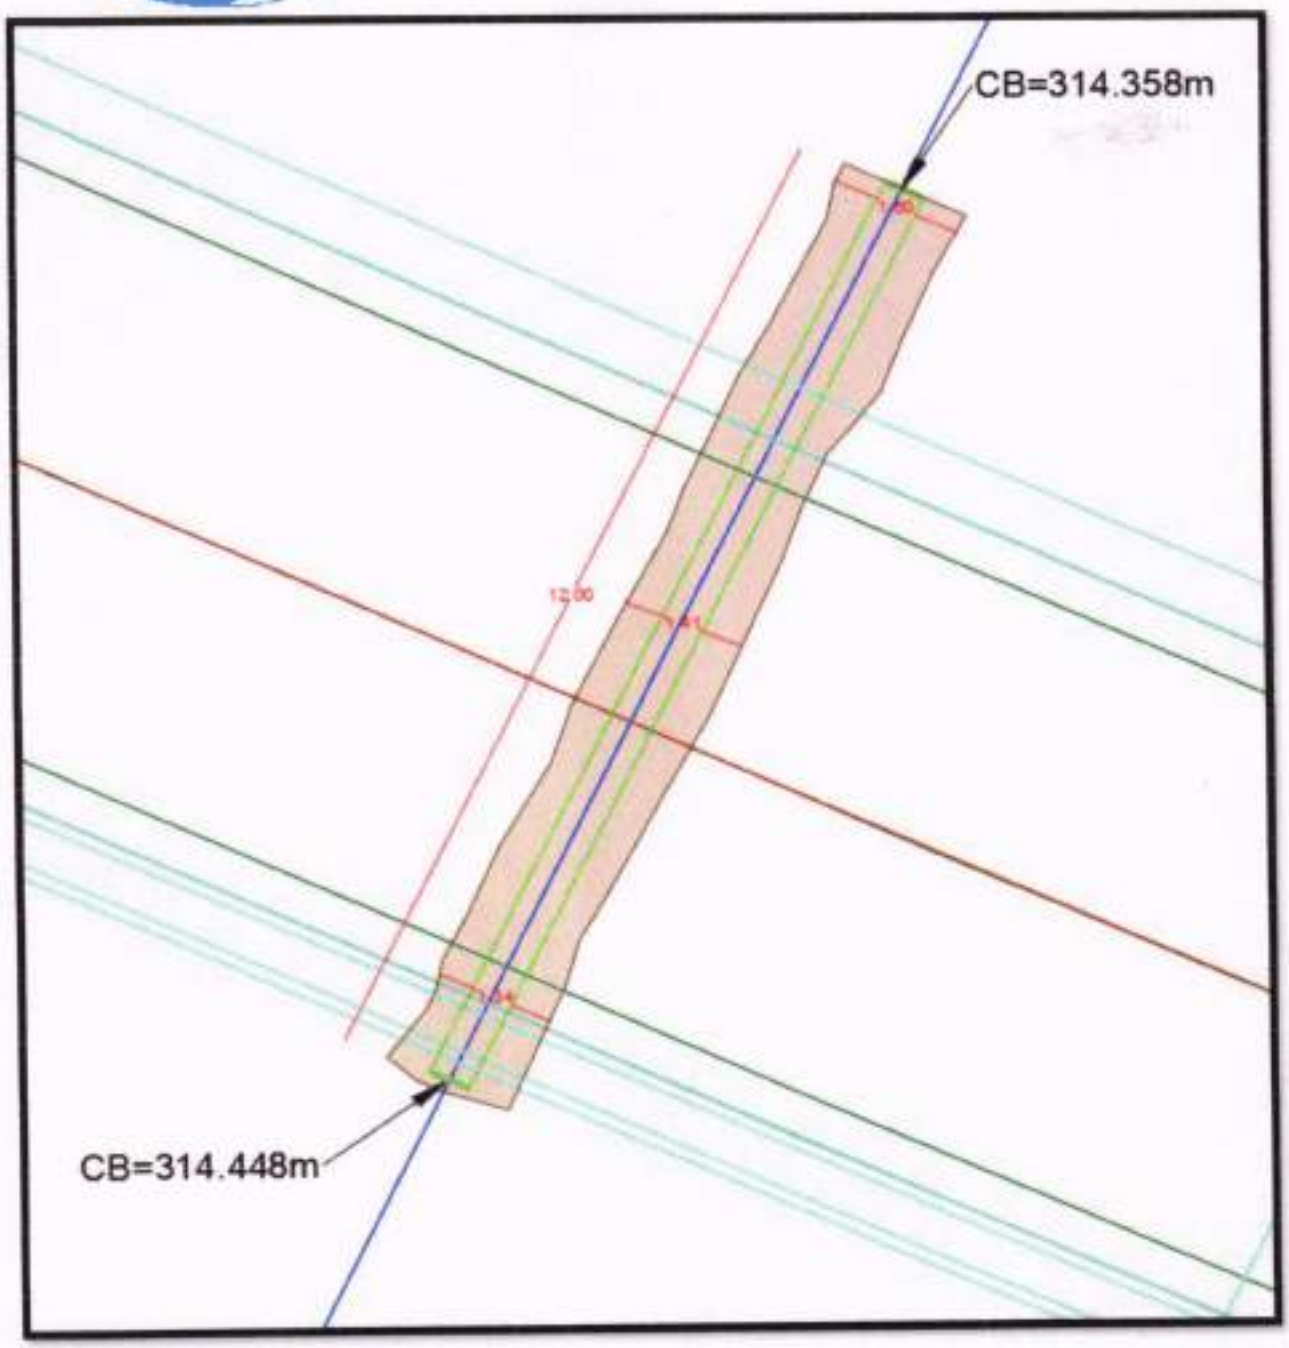

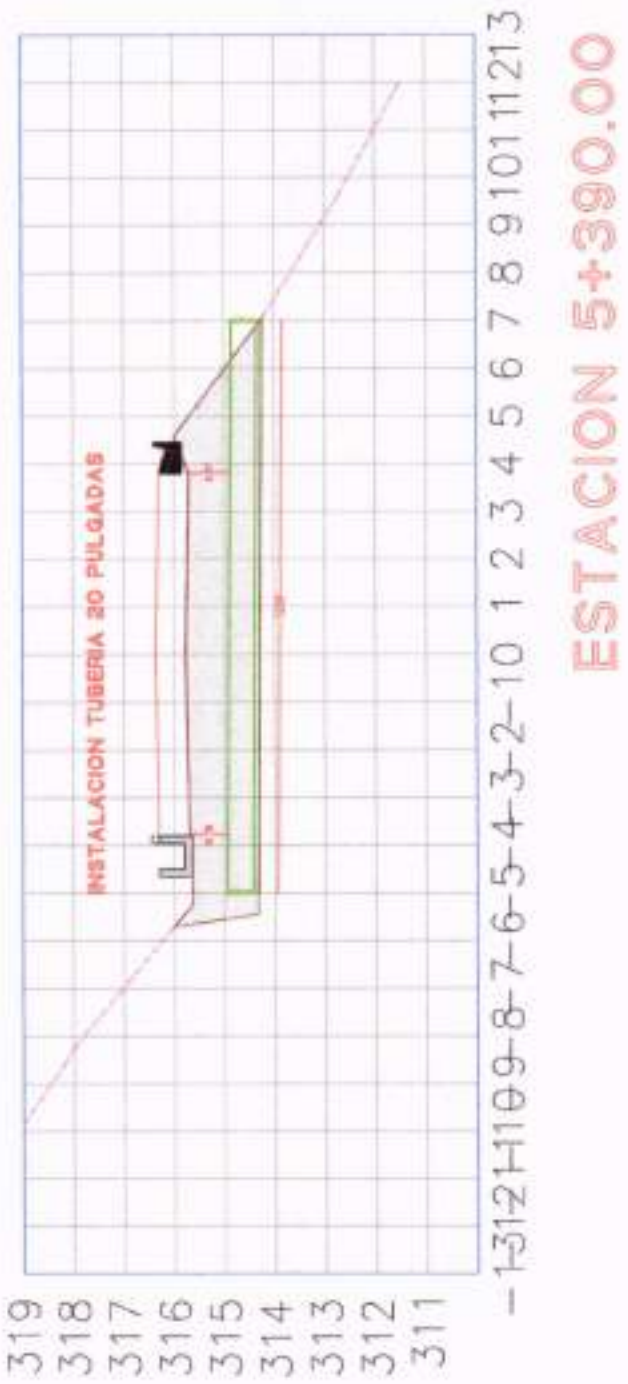
ESTACION 5+390.00
INSTALACION TUBERIA 30 PULGADAS
319
318
317
316
315
314
313
312
311
-1 3 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – BALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
ITEM No.:	1.2.1.6	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación) disipadores
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	Kg		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEJORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
ACERO MUROS CANAL ENCOLE OBRA #12 K5+158- K5+158					
1.10	4,00	1,10	0,994	3,00	3,28
0.60	4,00	0,60	0,994	6,00	3,58
ACERO MUROS CANAL DESCOLE OBRA #18 K5+383- K5+383					
1.15	4,00	1,15	0,994	3,00	3,43
0.50	4,00	0,50	0,994	6,00	2,98
				AJUSTE AL DECIMAL	-0,27
				TOTAL	**13,00**

WILLIAM QUINTERO GIRON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVERO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-39-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTCH-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JEHISSEN DURAN PAEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+800	SUB-CAPITULO:	1.2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
ITEM No.:	1.2.1.0	DESCRIPCION:	Tubería de PVC Ø20" incluye colchón de arena
FECHA DE INICIO:		FECHA FINAL:	
UND:	ML		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTO ML	TOTAL ML
	tuberia 20"	k05+390	k05+390	12,00				12,00
								0,00
							AJUSTE AL DECIMAL	0,00
							TOTAL	12,00

OBSERVACION:

WILLIAN QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTDI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBÓ S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO / PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+800	SUB-CAPITULO:	1.2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
ITEM No.:	1.2.1.18	DESCRIPCION:	Demolición manual de roca
FECHA DE INICIO:			FECHA FINAL:
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTOS M3	TOTAL M3
demolicion roca via	k05+630	k05+700	1,60	1,70	0,40		1,09
demolicion roca via	k05+630	k05+700	2,00	1,70	0,60		2,04
demolicion roca via	k05+630	k05+700	1,05	0,85	0,30		0,27
demolicion roca via	k05+630	k05+700	2,05	0,90	0,45		0,83
demolicion roca via	k05+630	k05+700	0,50	0,80	0,35		0,40
demolicion roca box	k04+740	k04+740	3,00	2,80	1,12		9,41
						AJUSTE AL DECIMAL	-0,04
						TOTAL	14,00

OBSERVACION:

WILLIAM SUNTECO PARRA
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO PEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-36-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTIS-INV-02003-2021, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO		
	RS. ING. MIGUEL DAN JENSSEN CUBAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO		
	RS. ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO – SANTIAGO – PUENTE GOMEZ, ARBOLEDAS KM+000 – KM+900	SUB-CAPITULO:	1.2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
ITEM No.:	1.2.1.10	DESCRIPCION:	Excavación manual en material sin clasificar.
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ALTO ML	ANCHO ML	AREA M2	TOTAL M3
	dentellon muro z	k05+840	k05+870	30,00	0,30	0,50		4,50
	excavacion canal descole cuneta rectangular	k04+176	k04+178	3,35	1,90	0,50		3,18
	excavacion canal descole cuneta rectangular	k04+176	k04+178	2,30	1,35	0,60		1,86
	excavacion canal descole cuneta rectangular	k05+120	k05+122	1,50	1,40	0,30		0,63
	excavacion canal descole cuneta rectangular	k05+120	k05+122	1,50	0,90	0,55		0,74
	excavacion canal descole cuneta rectangular	k05+120	k05+122	1,65	1,28	0,20		0,42
	excavacion canal descole cuneta rectangular	k05+120	k05+122	1,65	0,85	0,50		0,70
	excavacion canal descole cuneta rectangular	k05+613	k05+616	2,65	1,20	0,20		0,64
	excavacion canal descole cuneta rectangular	k05+613	k05+616	1,90	1,75	0,35		1,16
	excavacion canal descole cuneta rectangular	k05+870	k05+873	3,23	1,60	0,25		1,29
	excavacion canal descole cuneta rectangular	k05+870	k05+873	2,07	1,30	0,50		1,35
								0,02
							TOTAL	16,50

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO PEREZ CARRIÑO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA CENTRO RVL ING. MIGUEL DAN JENISSEN DURAN PAEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO RVL ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	DESCRIPCION:	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	Kg		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
ACERO DENTELLON MURO Z K5+860 - K5+870					
0.15 1.04 0.15	4,00	1,34	0,994	100,000	133,20
9.90	4,00	9,90	0,994	17,000	167,29
h b=0.15 h=0.68 g=0.10	4,00	1,88	0,994	50,000	93,44
0.20 0.70 0.20	4,00	1,10	0,994	50,000	54,67
ACERO DENTELLON MURO Z K5+850 - K5+860					
0.15 1.04 0.15	4,00	1,34	0,994	100,000	133,20
9.90	4,00	9,90	0,994	17,000	167,29
h b=0.15 h=0.68 g=0.10	4,00	1,88	0,994	50,000	93,44
0.20 0.70 0.20	4,00	1,10	0,994	50,000	54,67
ACERO ZARPA Y VASTAGO MURO Z K5+840 - K5+870					
0.15 1.04 0.15	4,00	1,34	0,994	50,00	66,60

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – BALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO
ITEM No.:	1.2.2.3	DESCRIPCION:	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	Kg		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
9.90	4,00	9,90	0,994	17,00	167,29
h, s=0.10, b=0.60, g=0.10	4,00	1,88	0,994	50,00	93,44
0.20 0.70 0.20	4,00	1,10	0,994	50,00	54,67
0.30 0.25 1.87	4,00	2,12	0,994	51,00	107,47
0.30 0.25 1.87	4,00	2,12	0,994	51,00	107,47
10.60	4,00	10,60	0,994	14,00	147,51
0.30 0.25 1.87	4,00	2,12	0,994	51,00	107,47
0.30 0.25 1.87	4,00	2,12	0,994	51,00	107,47
10.60	4,00	10,60	0,994	14,00	147,51
0.30 0.25 1.87	4,00	2,12	0,994	51,00	107,47
CUNETA RECTANGULAR K5+650-K5+662					
0.70 0.70 0.70	4,00	2,10	0,994	6,00	12,52

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2 0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023. CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO
ITEM No.:	1.2.2.3	DESCRIPCION	Acero de refuerzo 60 000 PSI (corte, figurado y colocación)
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	Kg		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
	12.70	3,00	12,70	0,560	5,00	35,56
					AJUSTE AL DECIMAL	0,36
					TOTAL	2.160,00

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABÓN
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO PEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+800	SUB-CAPITULO:	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO
ITEM No.:	1.2.2.6	DESCRIPCION:	Manto Geotextil no tejido 2600, 712lbs
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UNID:	M2		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTO M2	TOTAL M2
	MANTO GEOTEXTIL FILTROS	k05+840	k05+869,25	29,25	2,40				70,20
								AJUSTE AL DECIMAL	0,00
								TOTAL	70,20

OBSERVACIONES:

WILLIAM GUANTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JUREZ CARRILLO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-36-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO PARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+600	SUB-CAPITULO:	1.2.5 BOX CULVERT
ITEM No.:	1.2.2.8	DESCRIPCION:	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UNID:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTO M3	TOTAL M3
	EXCAVACION DE FILTROS	k05+840	k05+882	42,00	0,50	0,90			18,90
	EXCAVACION DE FILTROS	k05+390	k05+425	35,00	0,50	0,90			15,75
	EXCAVACION DE FILTROS	k05+055	k05+063	8,00	0,50	0,90			3,60
	EXCAVACION DE FILTROS	k05+445	k05+464	19,00	0,50	0,90			8,55
	EXCAVACION DE FILTROS	k05+020	k05+041	21,00	0,50	0,90			9,45
								AJUSTE AL DECIMAL	0,05
								TOTAL	56,30

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PADON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-PC-39-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – BALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTDI-SV-025S2-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO IN/L ING. MIGUEL DAM JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO IN/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ. ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.2.2 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO
ITEM No.:	1.2.2.10	DESCRIPCION:	Tuberia perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	ML		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD UND	TOTAL ML
	Tuberia para filtros	k05+840	k05+853	13,00				13,00
							AJUSTE AL DECIMAL	0.00
							TOTAL	13,00

OBSERVACIONES:

WILLIAN QUINTERO PABON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-GV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.2.3 CUNETA GEODREN Y BORDILLO

ITEM No.:	1.2.3.19	DESCRIPCION:	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) mat. selec de excavación	FECHA DE INICIO:			FECHA FINAL:		UND:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	KINICIAL	KFINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	TOTAL M3
	RELLENO CUNETA RECTANGULAR	k04+011	k04+090	79,00			0,17	13,40
							AJUSTE AL DECIMAL:	0,00
							TOTAL:	13,40

OBSERVACION:

WILLIAM QUINTERO PABON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

INFORME CANTIDAD DE RELLENO LATERAL DE LA CUNETA RECTANGULAR EN TRAMO 1.

OBJETO CONTRATO, "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S."

DICIEMBRE – ENERO

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9

RELLENO LATERAL CUNETA RECTANGULAR				
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	AREA PROMEDIO	VOLUMEN CORTE
4+011		0.66		
	4		0.65	2.6
4+015		0.64		
	5		0.92	4.575
4+020		1.19		
	5		0.99	4.95
4+025		0.79		
	5		0.99	4.95
4+030		1.19		
	5		1.49	7.43
4+035		1.78		
	5		1.99	9.93
4+040		2.19		
	5		1.96	9.78
4+045		1.72		
	5		2.14	10.68
4+050		2.55		
	5		2.35	11.75
4+055		2.51		
	5		2.31	11.55
4+060		2.11		
	5		2.02	10.10
4+065		1.93		
	5		1.66	8.28
4+070		1.38		
	5		1.16	5.80
4+075		0.94		
	5		0.78	3.88
4+080		0.61		
	5		0.59	2.93
4+085		0.56		
	5		0.46	2.28
4+090		0.35		
			TOTAL RELLENO	111.4

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

RELLENO LATERAL CUNETA RECTANGULAR				
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	AREA PROMEDIO	VOLUMEN CORTE
4+238		0.9		
	2		0.77	1.53
4+240		0.63		
	5		0.56	2.775
4+245		0.48		
	5		0.37	1.83
4+250		0.25		
	5		0.30	1.48
4+255		0.34		
	5		0.36	1.80
4+260		0.38		
	5		0.45	2.23
4+265		0.51		
	5		0.46	2.30
4+270		0.41		
	5		0.56	2.80
4+275		0.71		
	5		0.77	3.83
4+280		0.82		
	5		0.87	4.33
4+285		0.91		
	5		0.75	3.75
4+290		0.59		
	5		0.64	3.20
4+295		0.69		
	5		0.63	3.13
4+300		0.56		
	5		0.68	3.38
4+305		0.79		
	5		0.70	3.50
4+310		0.61		
	5		0.56	2.78
4+315		0.5		
	5		0.51	2.53
4+320		0.51		
	5		0.40	1.975
4+325		0.28		
	5		0.28	1.4
4+330		0.28		
	5		0.32	1.58
4+335		0.35		
	5		0.34	1.70
4+340		0.33		
	5		0.42	2.10
4+345		0.51		
	5		0.75	3.77
4+350		0.996		
	5		0.67	3.34
4+355		0.34		
	5		0.46	2.30
4+360		0.58		
	5		0.74	3.70
4+365		0.9		
	5		0.77	3.83
4+370		0.63		
	5		0.59	2.93
4+375		0.54		
	5		0.54	2.70
4+380		0.54		
	5		0.43	2.15
4+385		0.32		
	5		0.30	1.50
4+390		0.28		
			TOTAL RELLENO	82.1

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9

RELLENO LATERAL CUNETA RECTANGULAR				
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	AREA PROMEDIO	VOLUMEN CORTE
5+080		0.29		
	10		0.26	2.6
5+090		0.23		
	10		0.31	3.05
5+100		0.38		
	10		0.39	3.85
5+110		0.39		
	10		0.54	5.35
5+120		0.68		
	10		1.03	10.30
5+130		1.38		
	10		1.04	10.40
5+140		0.7		
	10		0.56	5.55
5+150		0.41		
	10		0.52	5.20
5+160		0.63		
	10		0.67	6.70
5+170		0.71		
	10		0.61	6.05
5+180		0.5		
	10		0.49	4.85
5+190		0.47		
	10		0.53	5.30
5+200		0.59		
	10		0.58	5.75
5+210		0.56		
	10		0.72	7.15
5+220		0.87		
	10		0.70	7.00
5+230		0.53		
	10		0.65	6.45
5+240		0.76		
	10		0.63	6.25
5+250		0.49		
	8		0.56	4.48
5+258		0.63		
			TOTAL RELLENO	106.3

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

RELLENO LATERAL CUNETA RECTANGULAR				
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	AREA PROMEDIO	VOLUMEN CORTE
5+760		0.49		
	10		0.48	4.75
5+770		0.46		
	10		0.55	5.5
5+780		0.64		
	10		0.85	8.50
5+790		1.06		
	10		0.76	7.55
5+800		0.45		
	10		0.50	4.95
5+810		0.54		
	10		0.55	5.50
5+820		0.56		
	10		0.55	5.50
5+830		0.54		
	10		0.74	7.35
5+840		0.93		
	10		0.86	8.55
5+850		0.78		
	10		0.72	7.15
5+860		0.65		
	10		0.66	6.60
5+870		0.67		
	10		0.94	9.40
5+880		1.21		
			TOTAL RELLENO	81.3

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9

RELLENO LATERAL CUNETA RECTANGULAR				
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	AREA PROMEDIO	VOLUMEN CORTE
5+560		1.48		
	10		0.97	9.7
5+570		0.46		
	10		0.33	3.3
5+580		0.2		
	10		0.32	3.20
5+590		0.44		
	10		0.42	4.20
5+600		0.4		
	10		0.36	3.60
5+610		0.32		
	10		0.42	4.20
5+620		0.52		
	10		0.46	4.55
5+630		0.39		
	10		0.46	4.55
5+640		0.52		
	10		0.49	4.85
5+650		0.45		
	15		0.38	5.70
5+665		0.31		
			TOTAL RELLENO	47.9

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

RELLENO LATERAL CUNETA RECTANGULAR				
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	AREA PROMEDIO	VOLUMEN CORTE
5+690		0.4		
	10		0.54	5.4
5+700		0.68		
	10		0.62	6.15
5+710		0.55		
	10		0.59	5.90
5+720		0.63		
	10		0.53	5.30
5+730		0.43		
	10		0.47	4.65
5+740		0.5		
	10		0.45	4.45
5+750		0.39		
	10		0.48	4.80
5+760		0.57		
			TOTAL RELLENO	36.7

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

RELLENO LATERAL CUNETA RECTANGULAR				
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	AREA PROMEDIO	VOLUMEN CORTE
5+882		1.33		
	10		0.95	9.45
5+890		0.56		
	10		0.48	4.75
5+900		0.39		
	10		0.41	4.05
5+910		0.42		
	10		0.41	4.10
5+920		0.4		
	10		0.42	4.15
5+924		0.43		
			TOTAL RELLENO	26.5

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.


CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9


RELLENO LATERAL CUNETA RECTANGULAR				
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	AREA PROMEDIO	VOLUMEN CORTE
5+485		0.99		
	10		0.87	8.65
5+490		0.74		
	10		0.80	8
5+500		0.86		
	10		0.84	8.35
5+510		0.81		
	10		0.84	8.40
5+520		0.87		
	10		0.67	6.70
5+530		0.47		
	10		0.56	5.60
5+540		0.65		
	10		0.64	6.40
5+550		0.63		
	10		1.04	10.40
5+560		1.45		
			TOTAL RELLENO	52.1

TOTAL RELLENO LATERAL	544.2


FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

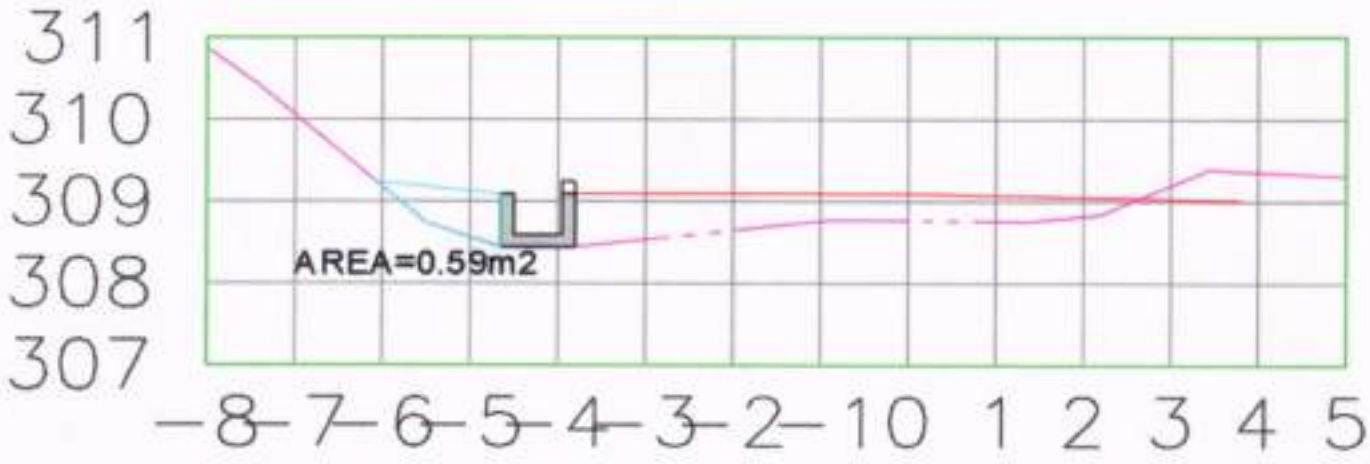


ESTACION 4+290.00

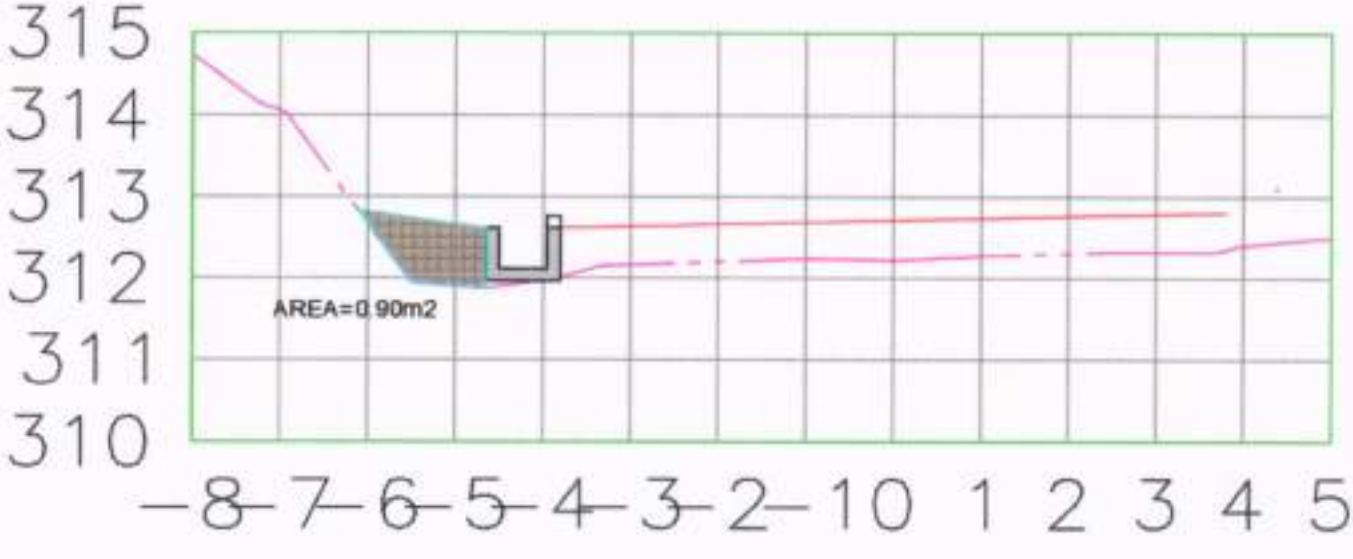


ESTACION 4+238.00

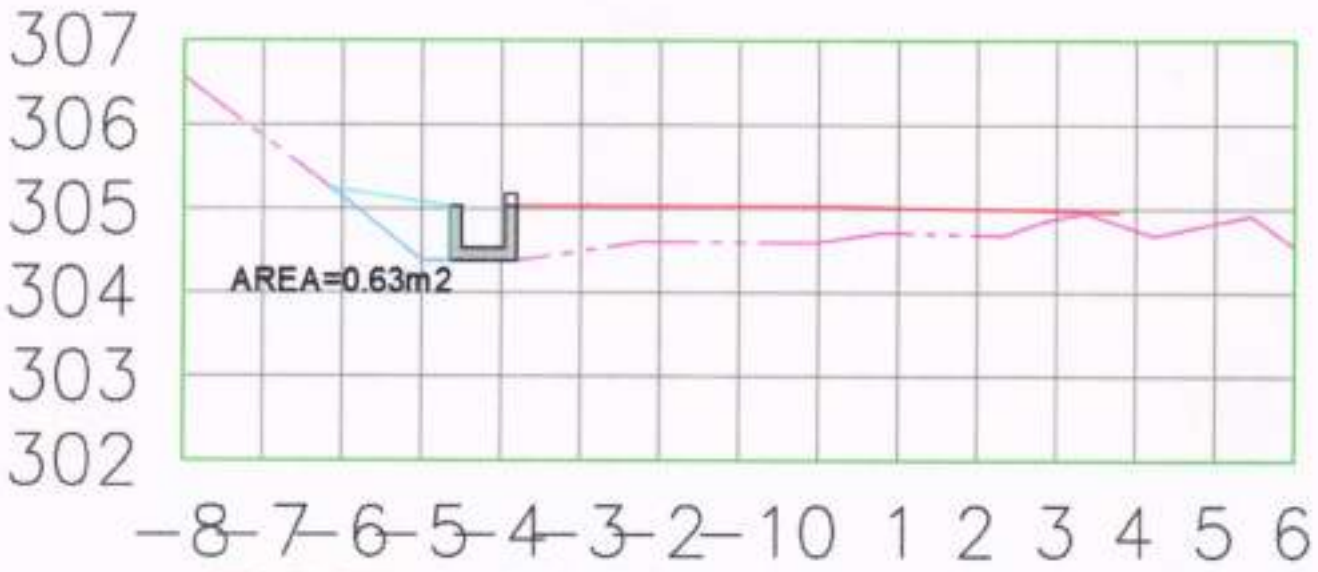


ESTACION 4+370.00

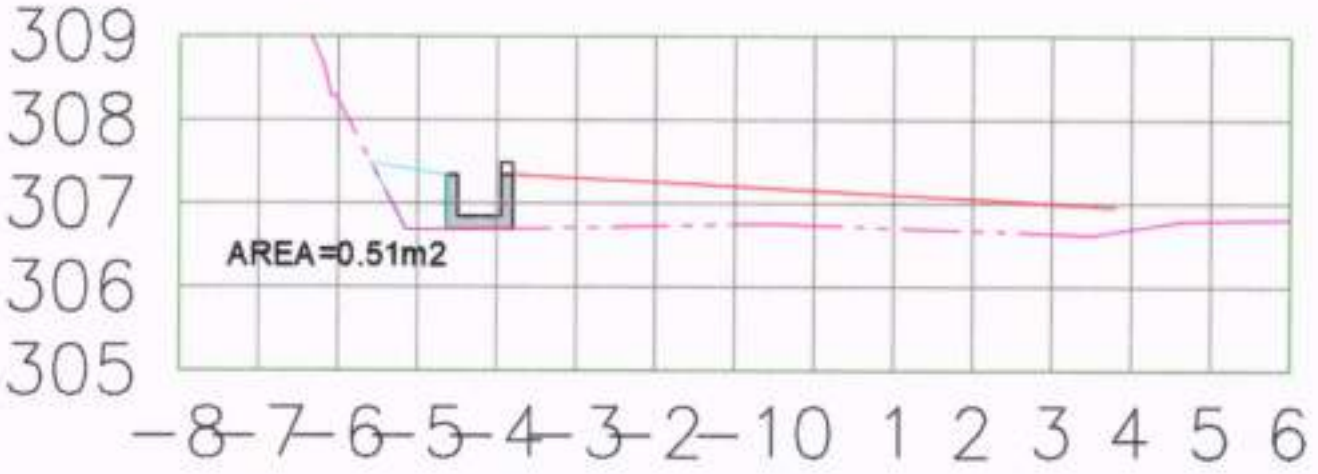

ESTACION 4+320.00

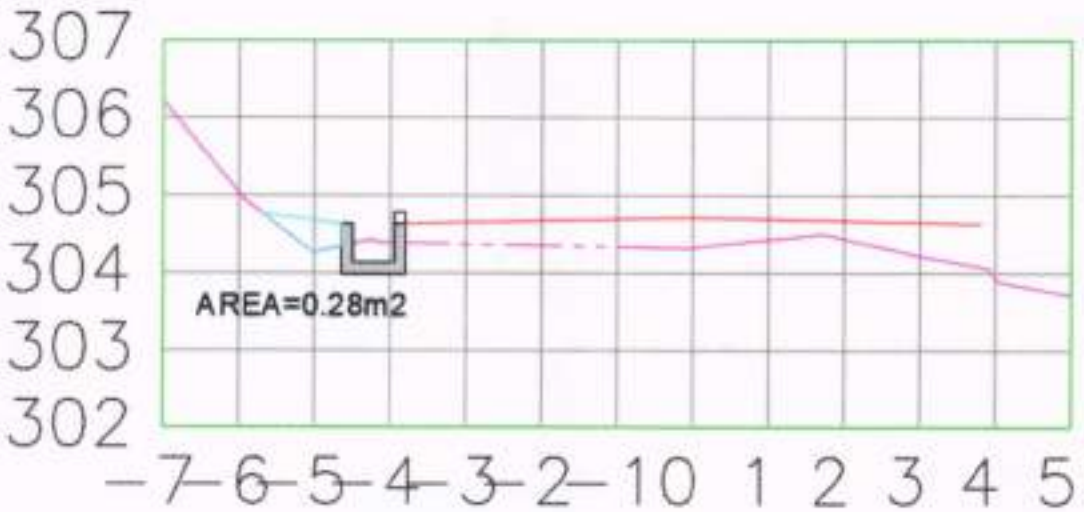


ESTACION 4+390.00

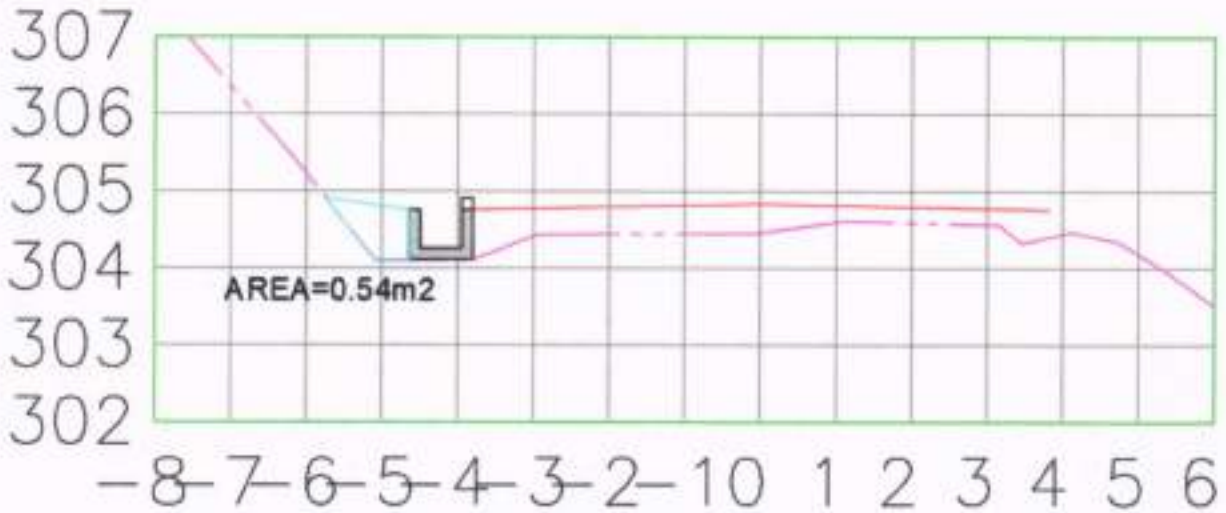


ESTACION 4+380.00


CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

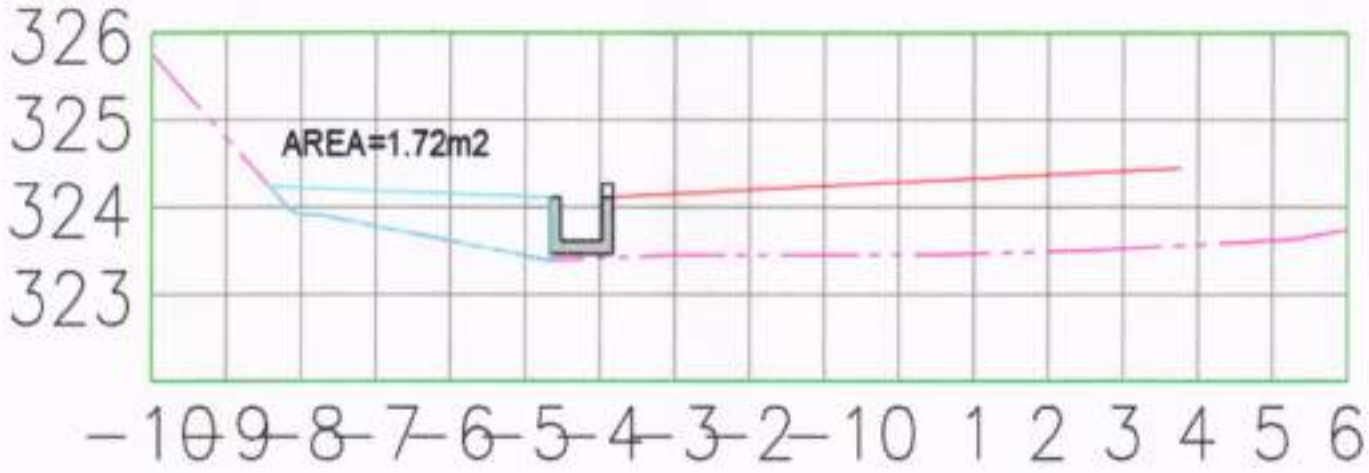


ESTACION 4+045.00

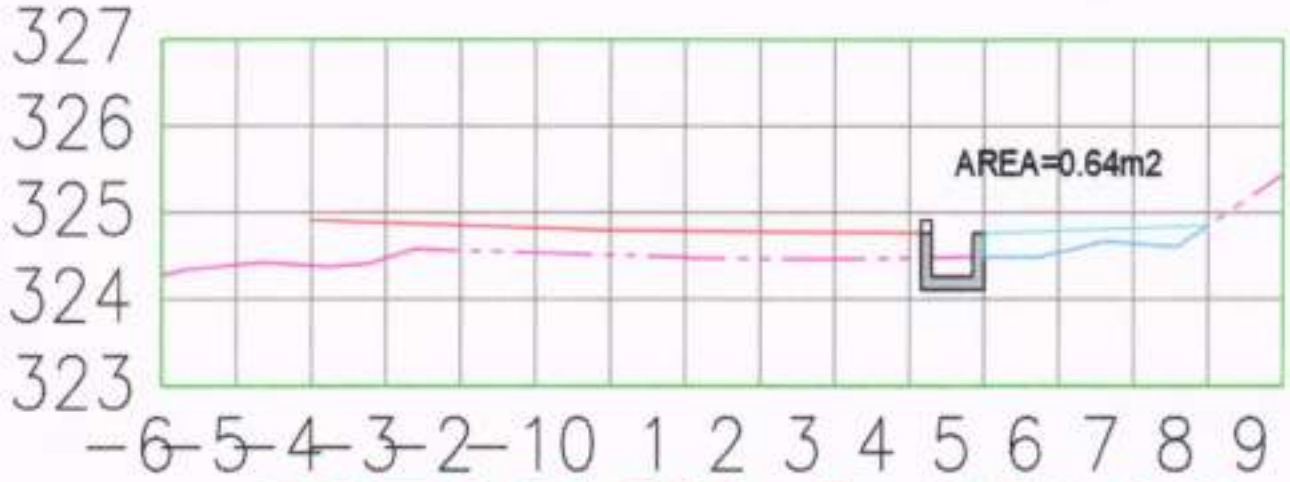

ESTACION 4+015.00

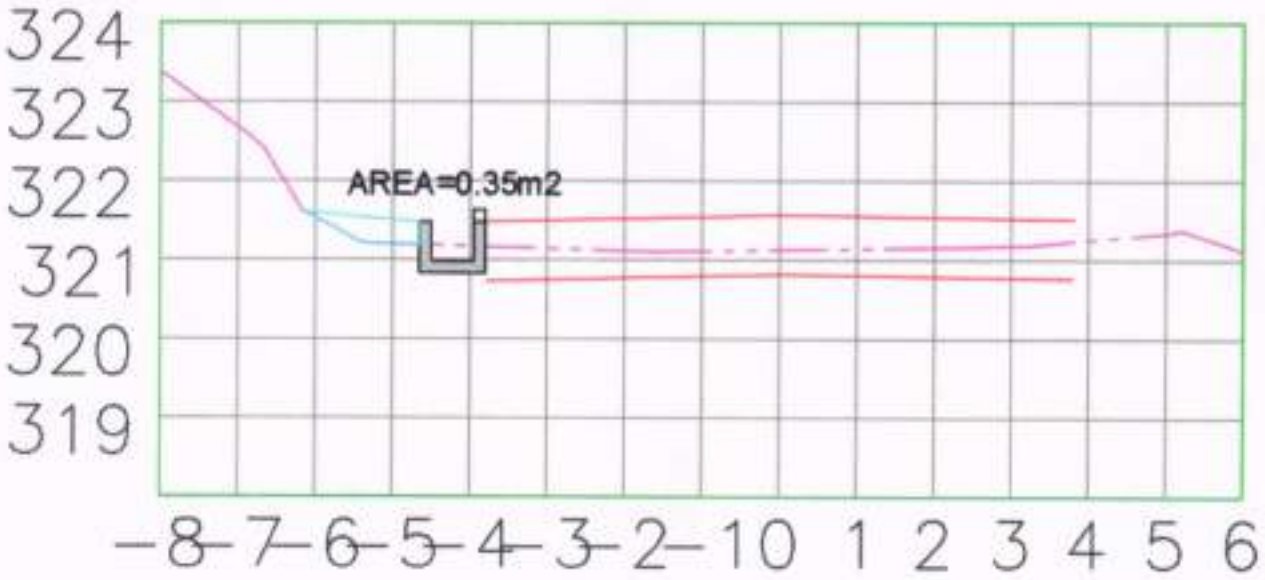

ESTACION 4+090.00

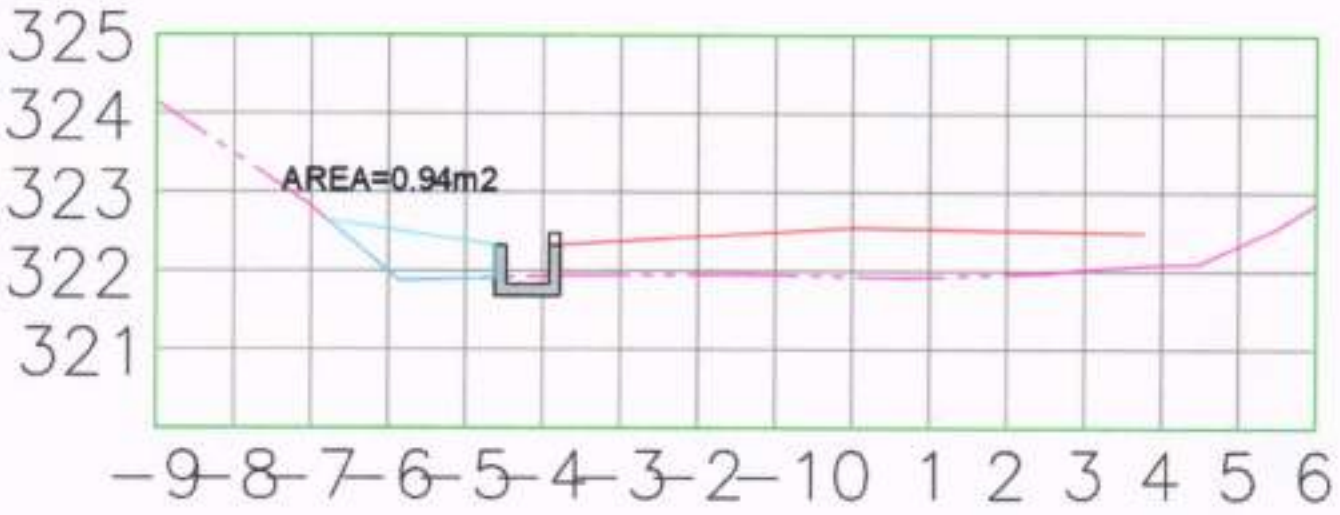


ESTACION 4+075.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9




ESTACION 5+110.00

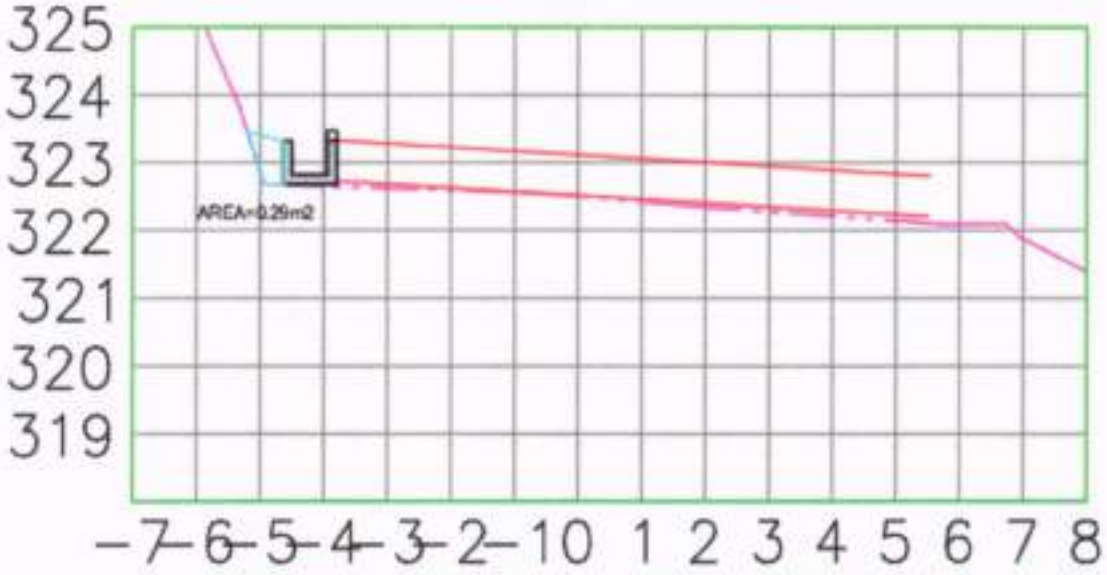


ESTACION 5+080.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

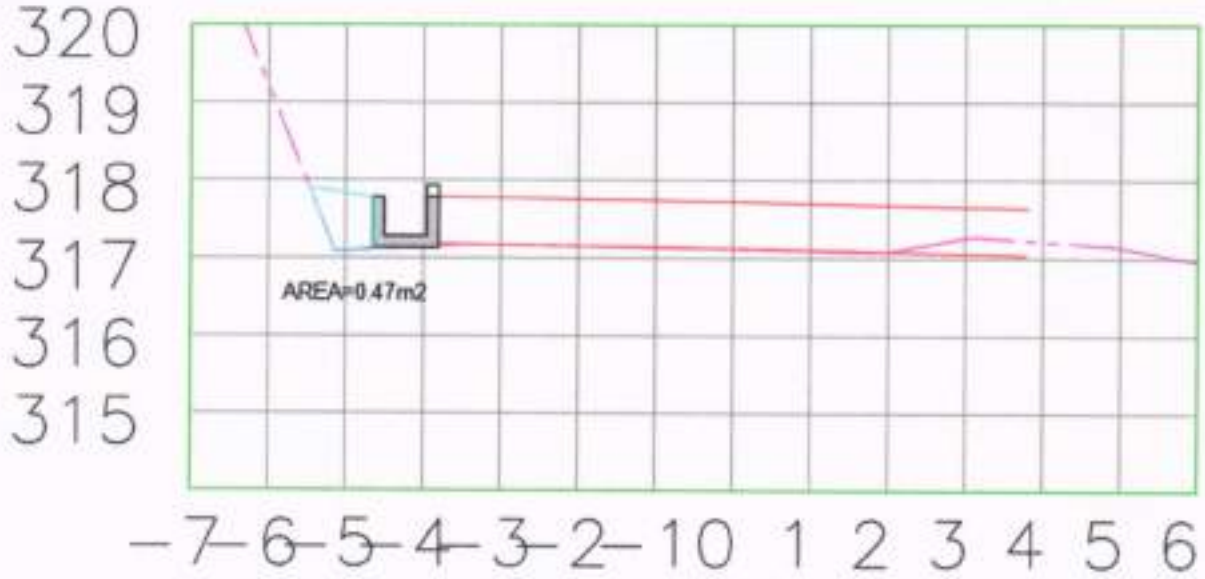


ESTACION 5+190.00

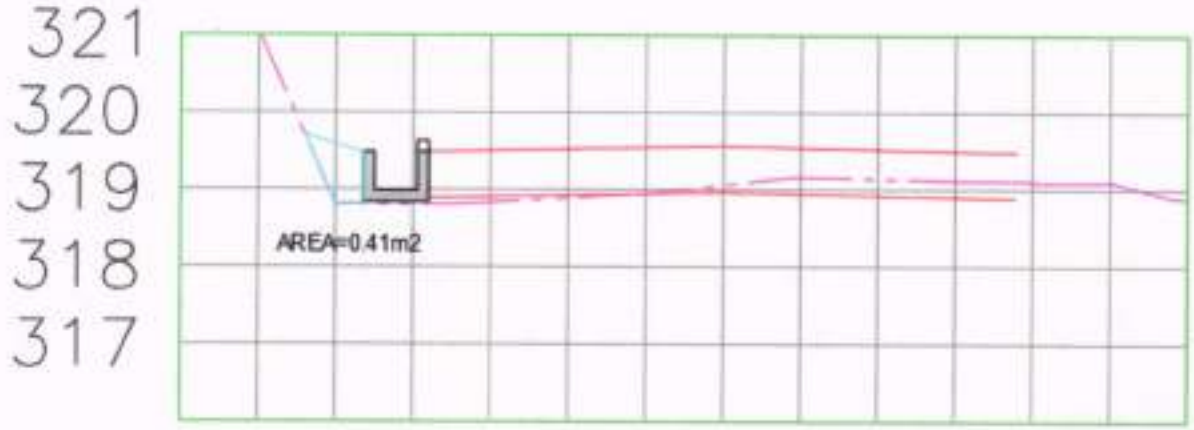

ESTACION 5+150.00




ESTACION 5+258.00

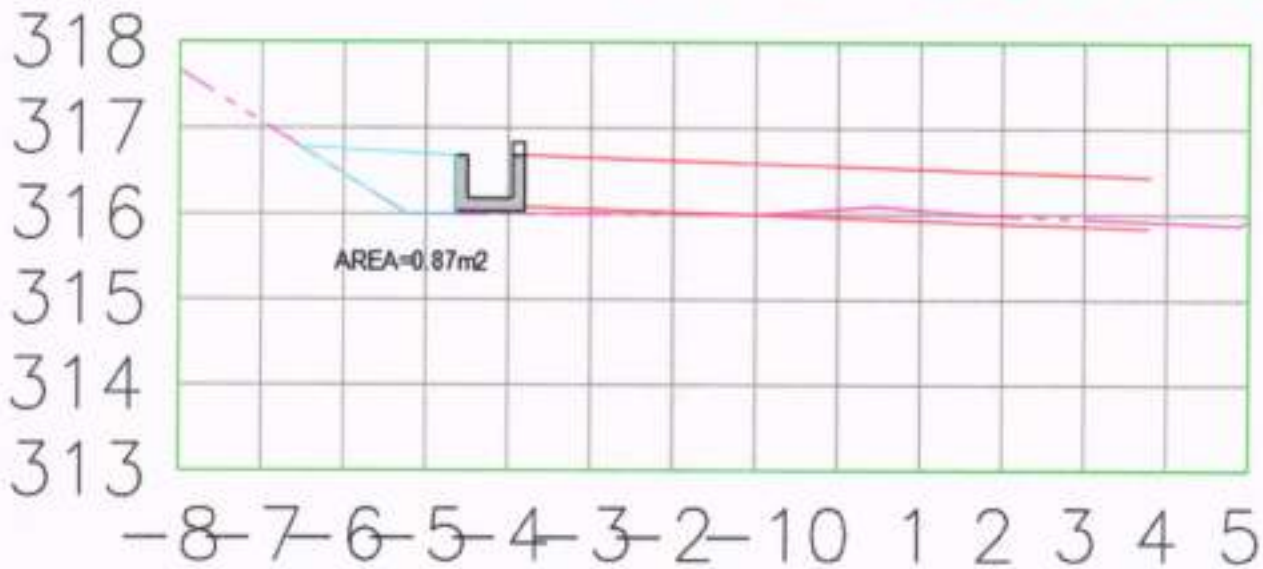

ESTACION 5+220.00




ESTACION 5+800.00

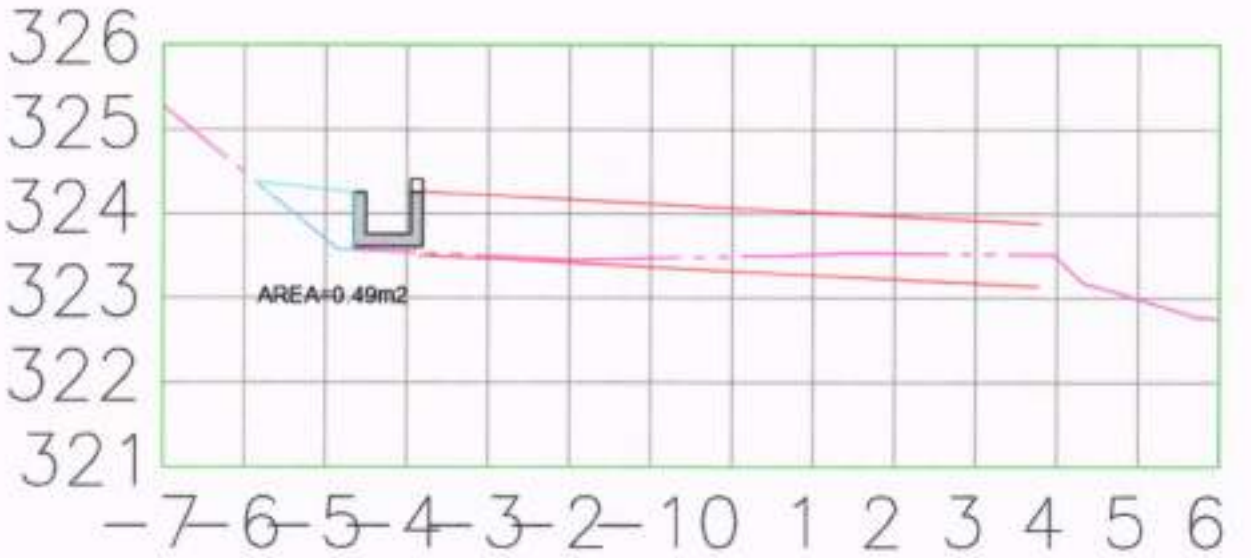


ESTACION 5+760.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

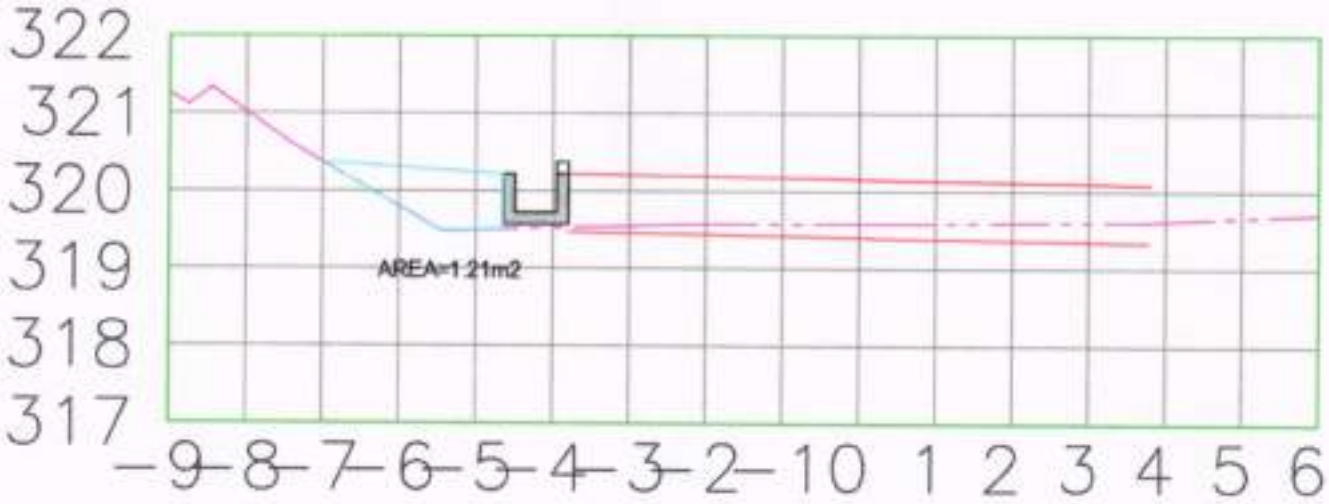


ESTACION 5+880.00

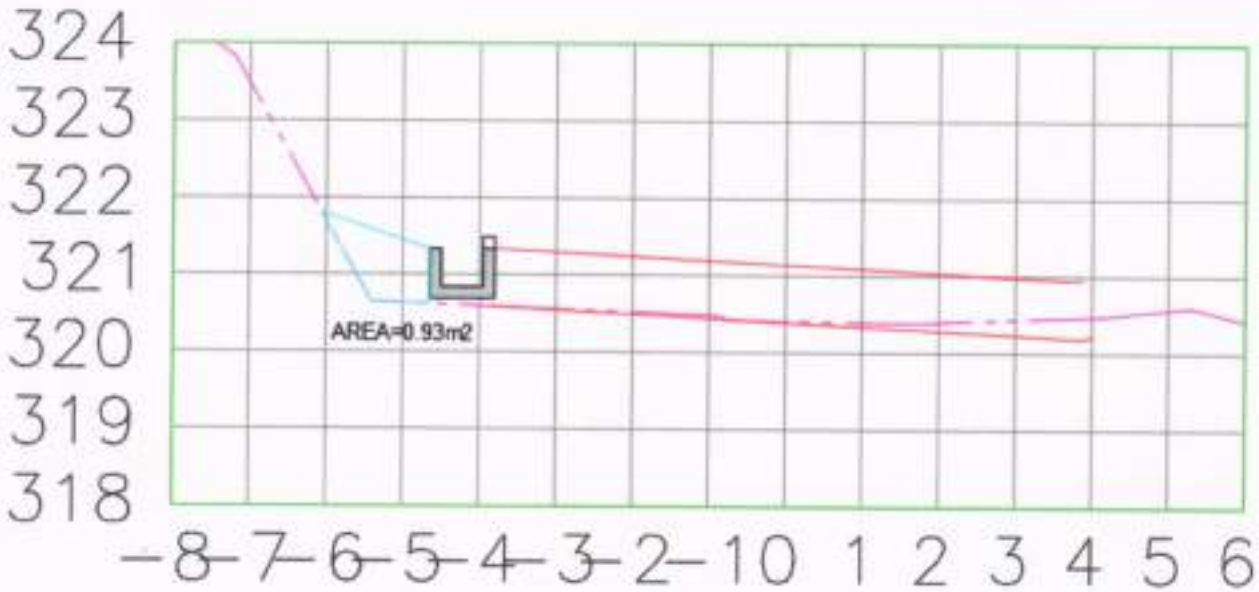


ESTACION 5+840.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

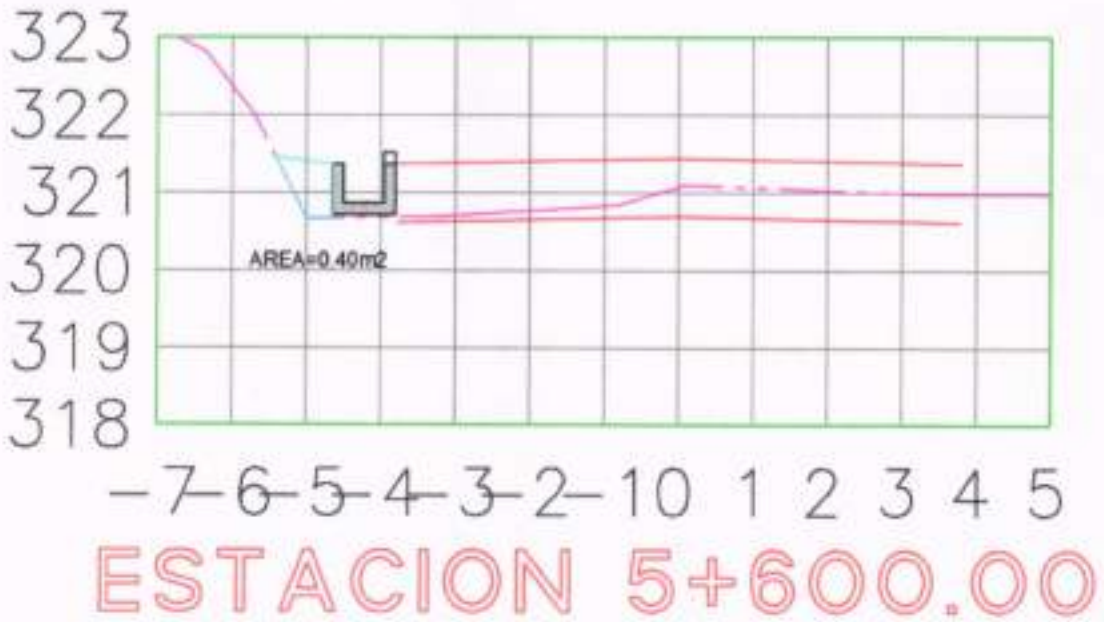


ESTACION 5+600.00

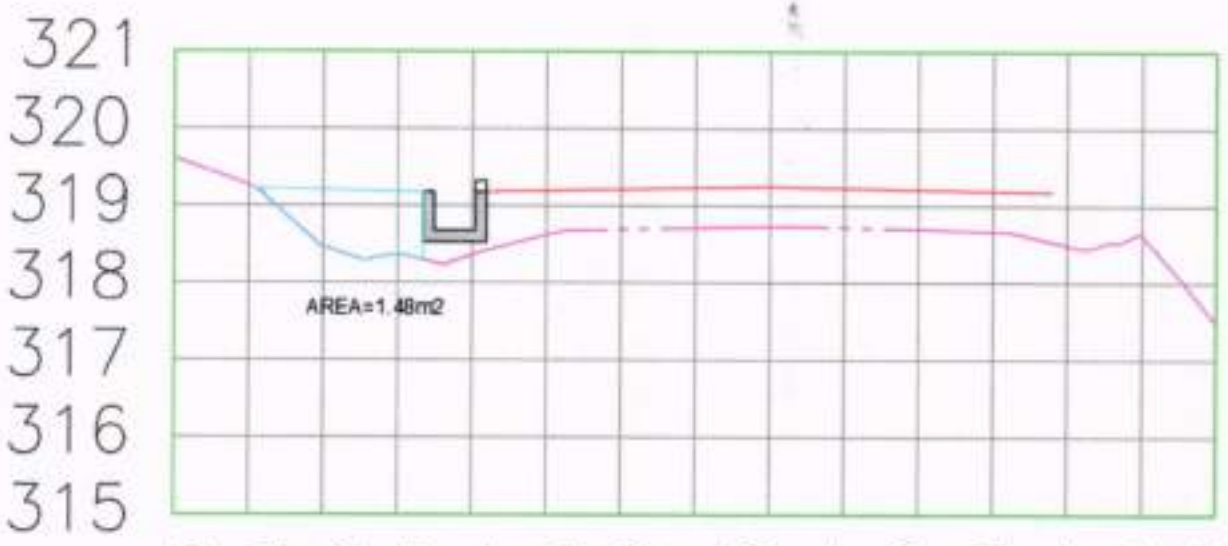


ESTACION 5+560.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

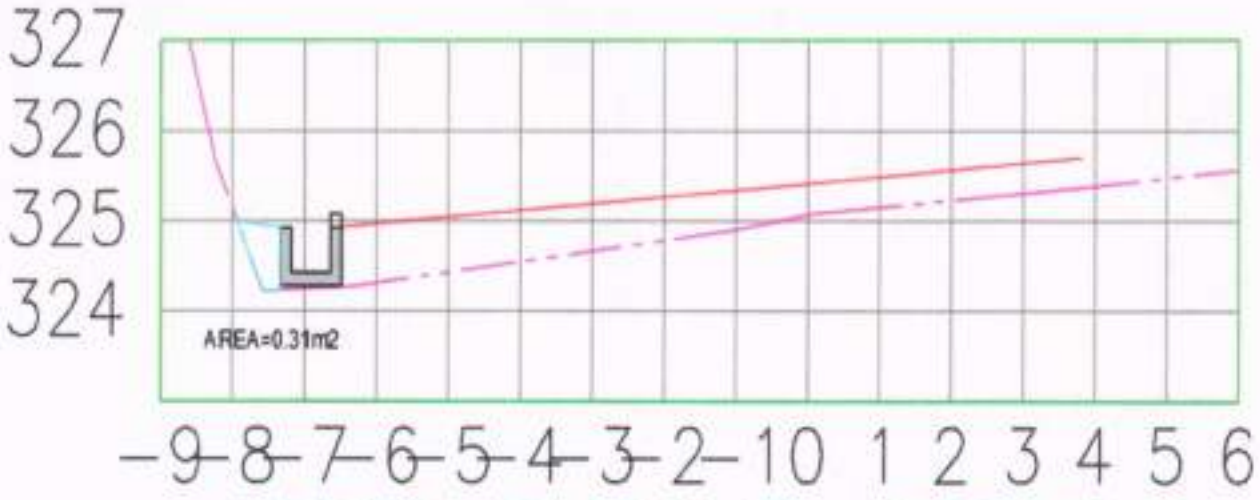


ESTACION 5+665.00

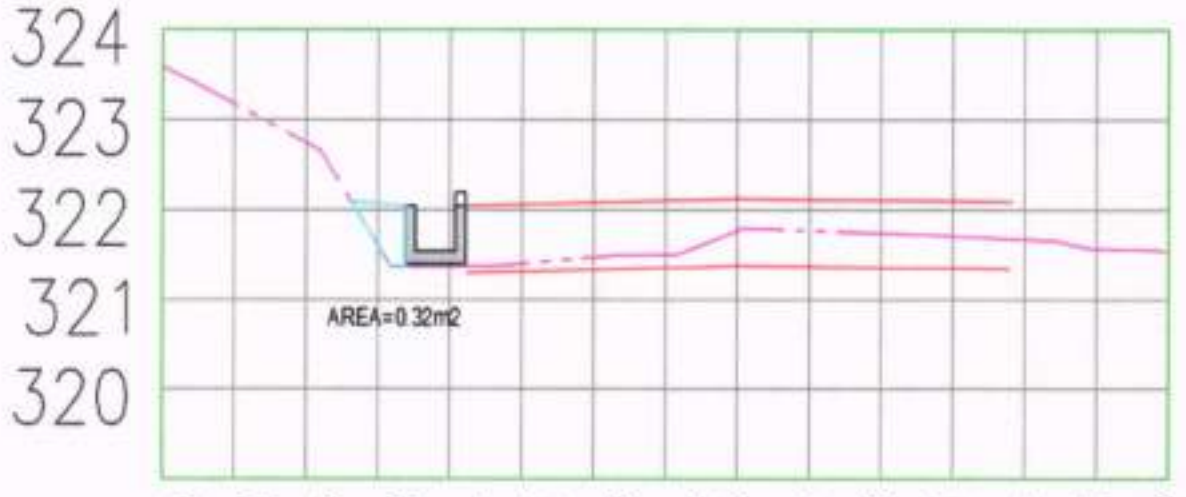


ESTACION 5+610.00


CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

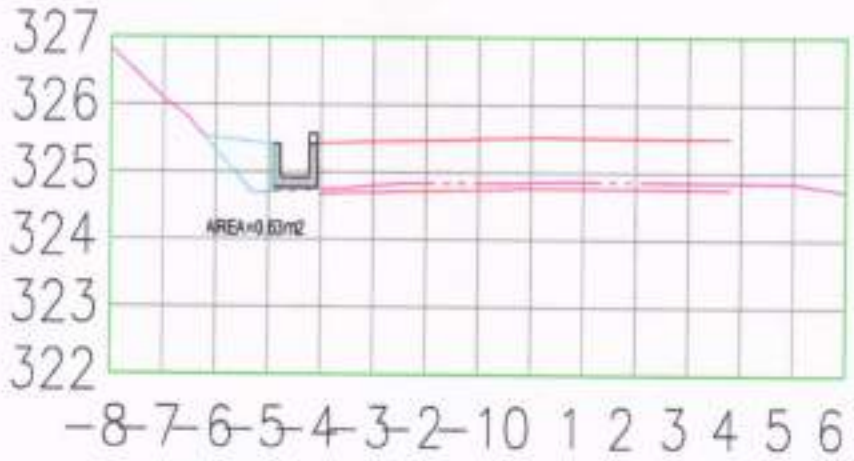


ESTACION 5+720.00

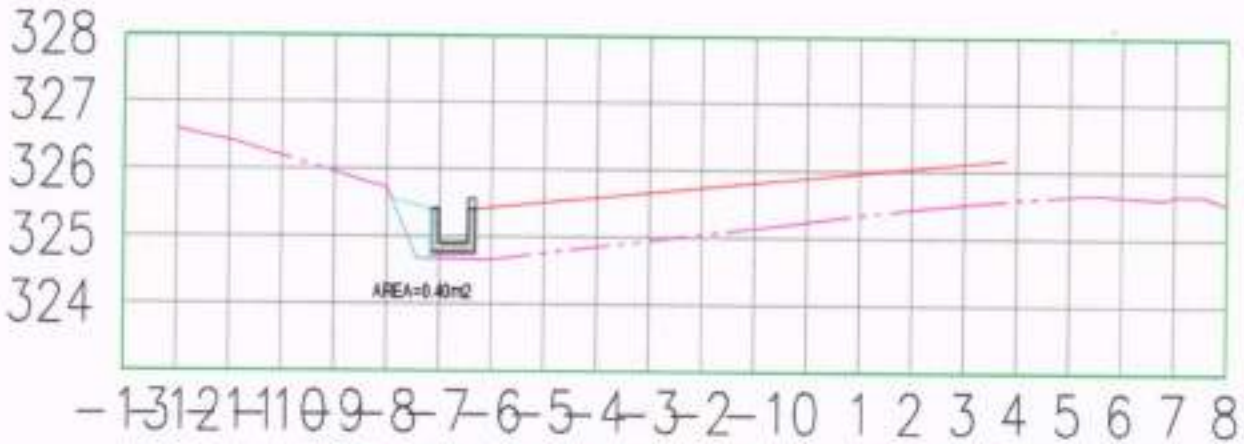

ESTACION 5+690.00

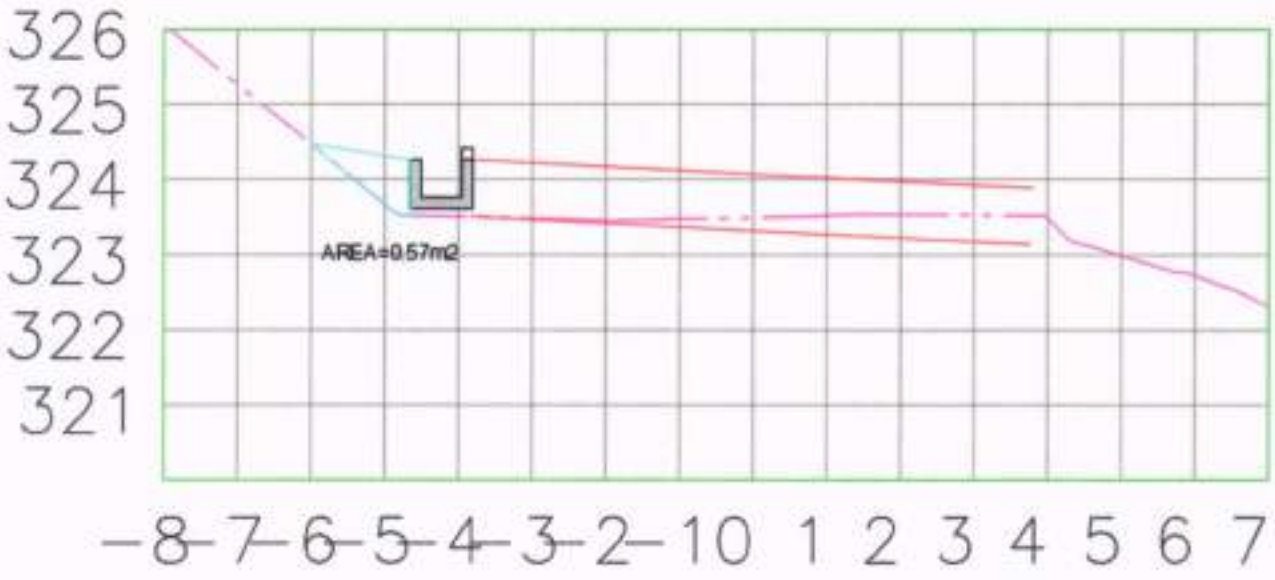


ESTACION 5+760.00

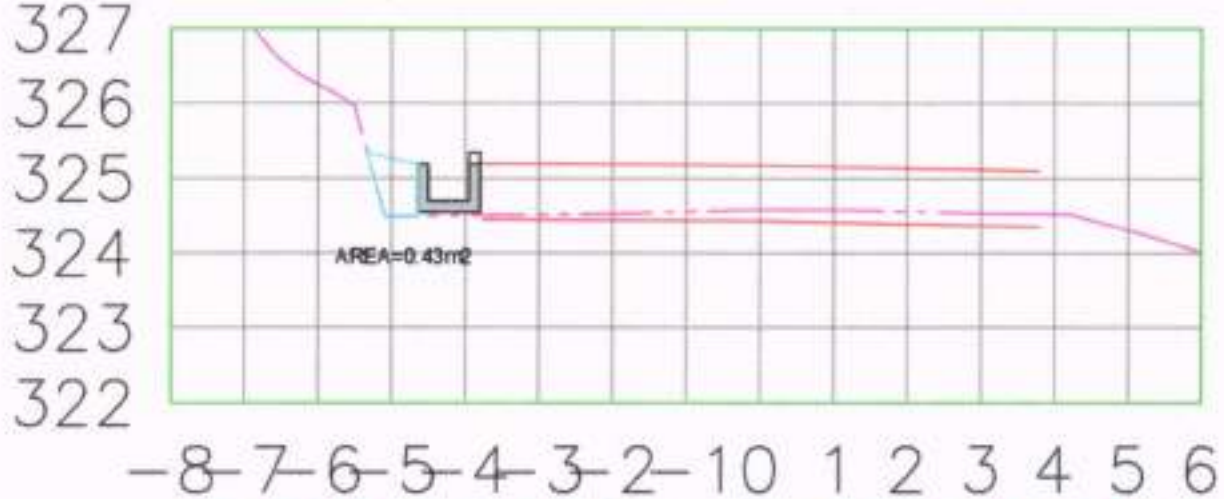


ESTACION 5+730.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

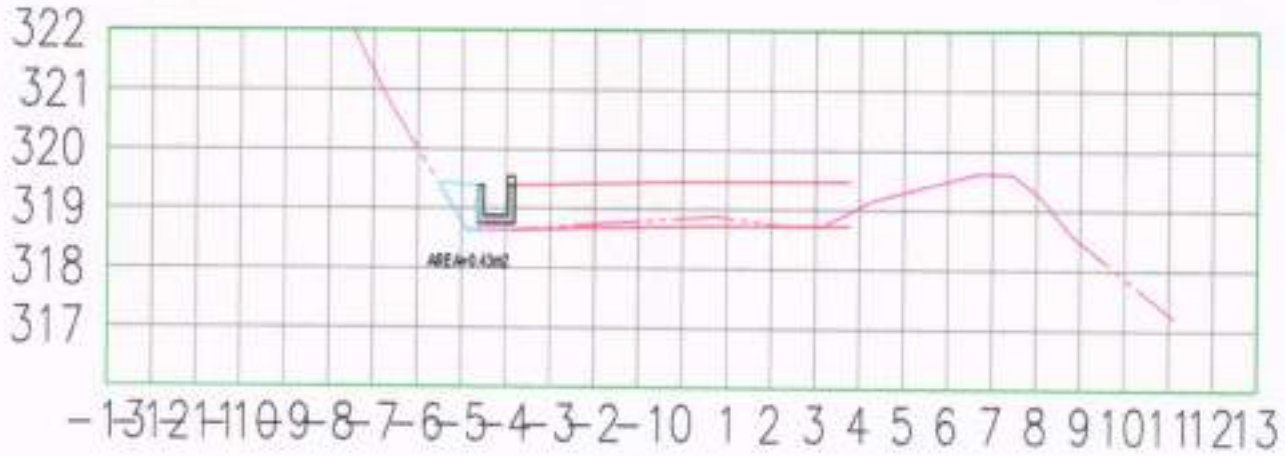


ESTACION 5+924.00

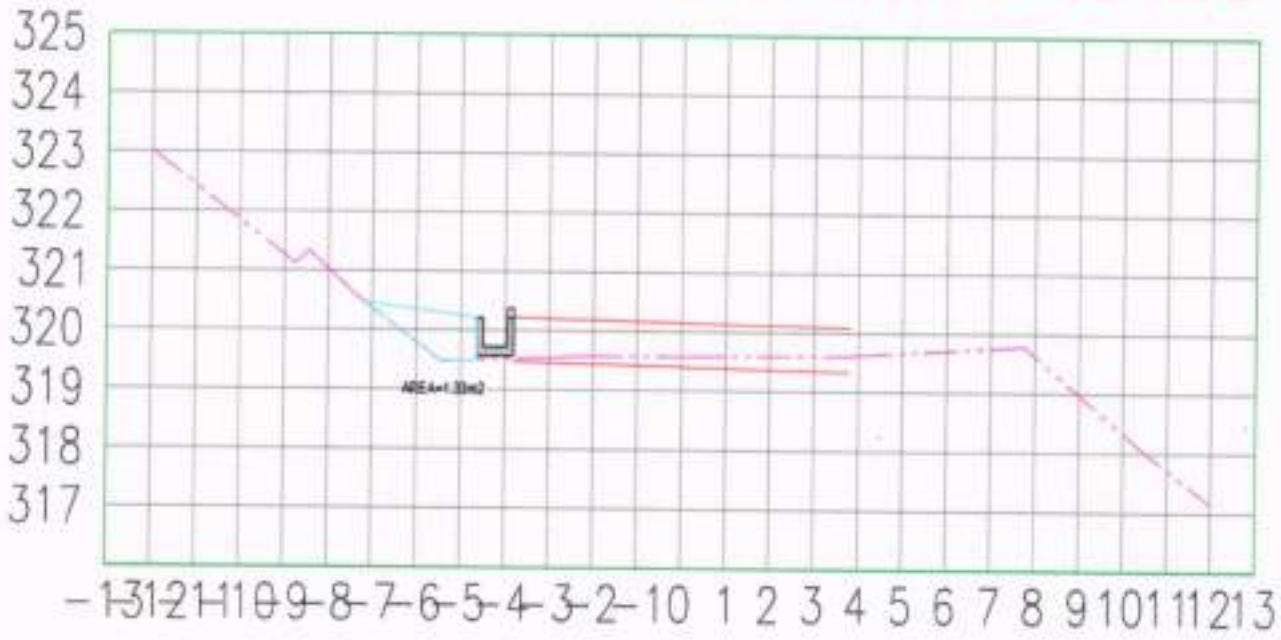


ESTACION 5+882.00


CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

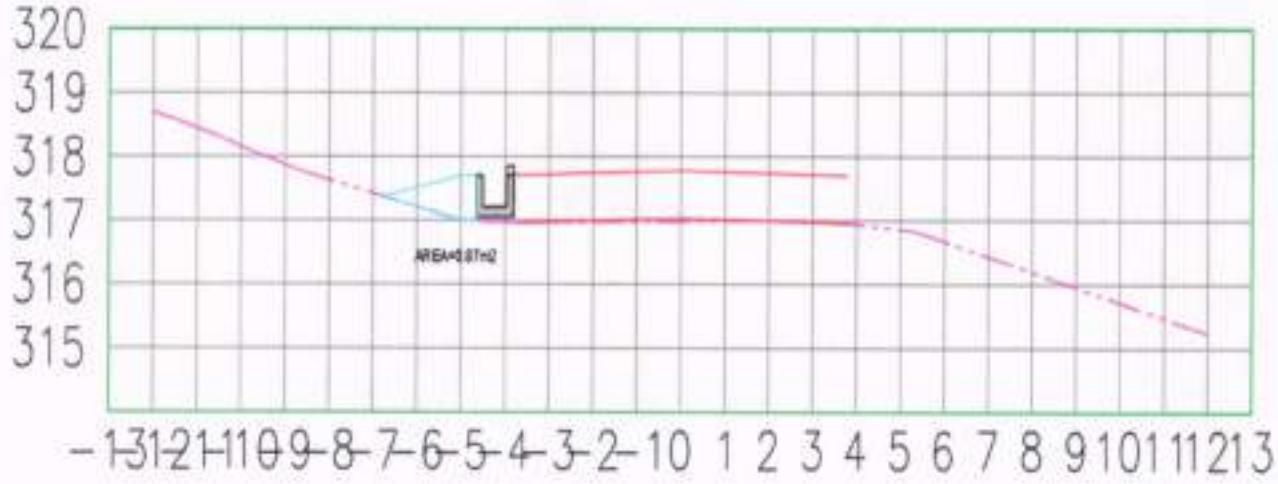


ESTACION 5+520.00

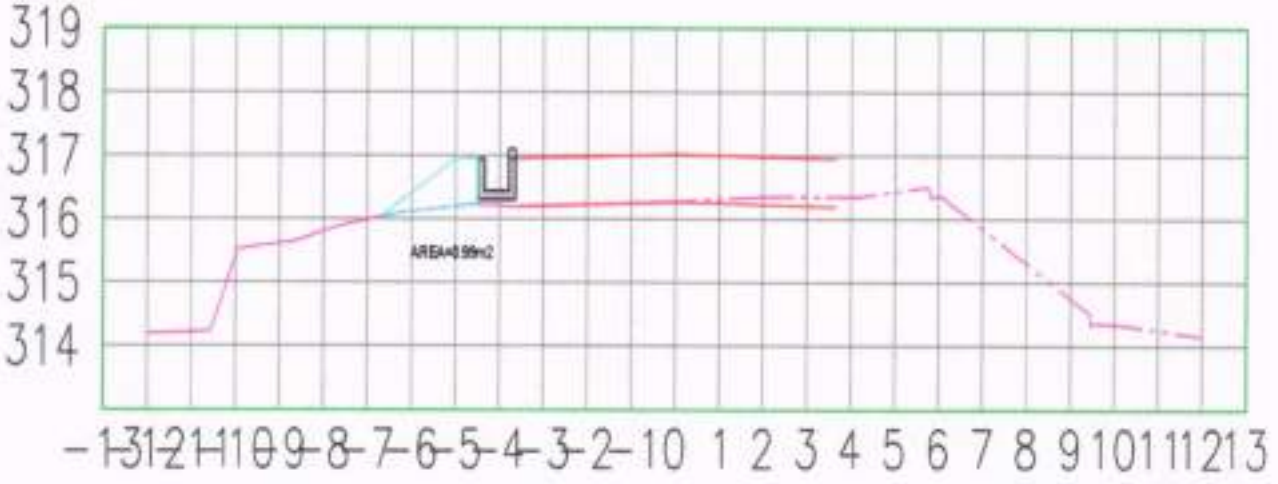

ESTACION 5+485.00

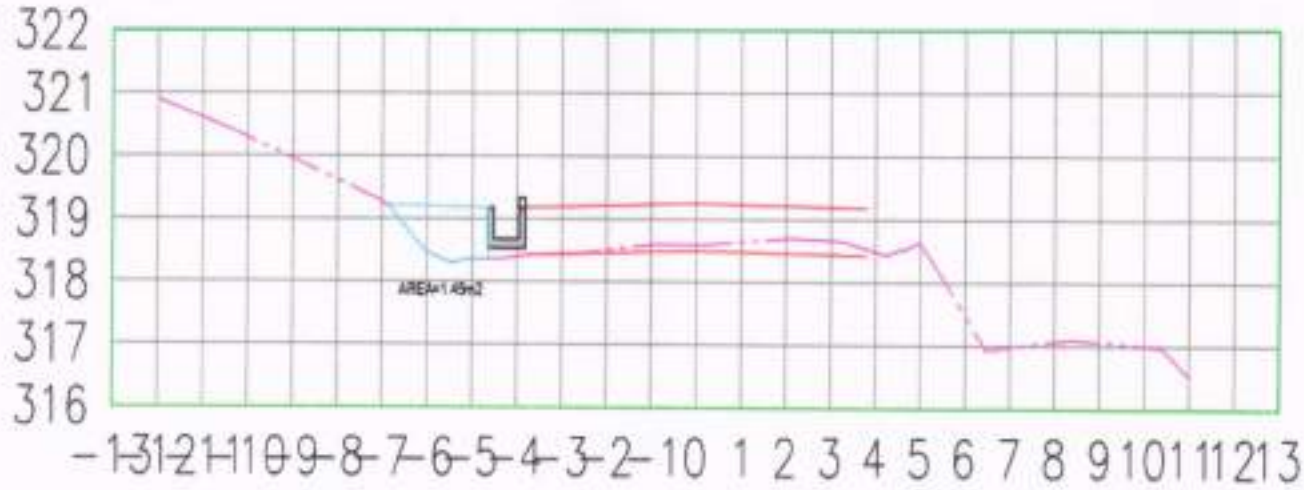

ESTACION 5+560.00

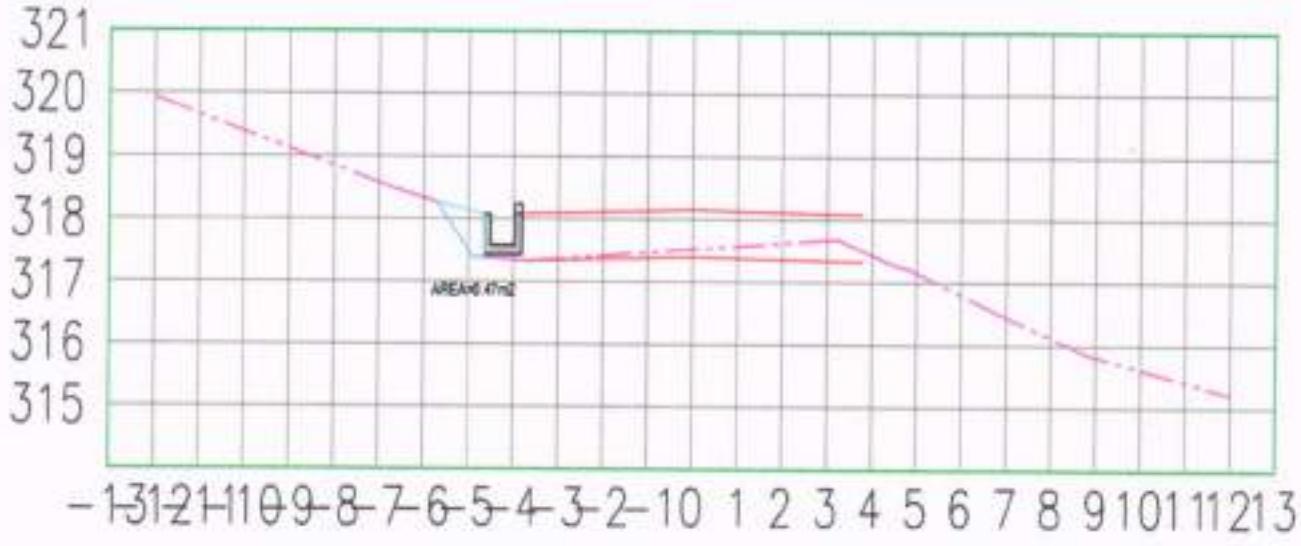

ESTACION 5+530.00

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-/C-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ. ABSCISAS K4+600 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.2.2 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO
ITEM No.:	1.2.2.18	DESCRIPCION:	Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	TOTAL M3
	Muro Izquierdo Cuneta Rectangular	k04+675	k05+745	9,00	0,85	0,15		1,15
	Muro Derecho Cuneta Rectangular	k04+686	k04+691	5,00	0,85	0,15		0,64
	Placa fondo Cuneta Rectangular	k04+251	k05+258			0,15	7,50	1,13
	Muro Izquierdo Cuneta Rectangular	k05+170	k05+258	3,50	0,15	0,45		0,24
						AJUSTE AL DECIMAL		-0,05
						TOTAL		3,10

OBSERVACIONES:

WILLIAN QUINTERO PARDO
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVERO JERRA CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-GV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO RIC ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q - JOYCO RIC ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ARBOLEDAS K4+000 - K5+800	SUB-CAPITULO:	1.2.5 BOXCULVERT
ITEM No.:	1.2.5.4	DESCRIPCION:	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:		UND:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	VOLUMEN M3	DESCUENTO M3	TOTAL M3
	total excavacion encole y descole box	k04+740	k04+740				190,60		190,60
	total excavacion encole y descole box	k04+950	k04+950				137,80		137,80
	total excavacion encole y descole box	k05+067	k05+067				165,10		165,10
								PAGADO EN EL ACTA N°10	-248,40
								TOTAL A PAGAR EN EL ACTA 11	244,90
								AJUSTE AL DECIMAL	0,00
								TOTAL	244,90

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PADRON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

69

INFORME CANTIDAD DE EXCAVACION BOX CULVERT K4+740 ENCOLE K5+950 ENCOLE, K5+063 ENCOLE Y DESCOLE EN TRAMO 1.

OBJETO CONTRATO, "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S."

DICIEMBRE – ENERO

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9

EXCAVACION BOX K5+067 ENCOLE Y DESCOLE BOX COULVERT				
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	AREA PROMEDIO	VOLUMEN CORTE
0+000		21.57		
	2		20.13	40.26
0+002		18.69		
	2		16.29	32.58
0+004		13.89		
	2		12.65	25.29
0+006		11.4		
	2		10.61	21.21
0+008		9.81		
	2		9.01	18.02
0+010		8.21		
	2		9.02	18.03
0+012		9.82		
	0.89		10.86	9.67
0+012.89		11.9		
			VOLUMEN TOTAL	165.1

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S


NIT. 900.794.329-9

EXCAVACION BOX K4+740 ENCOLE BOX COULVERT				
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	AREA PROMEDIO	VOLUMEN CORTE
0+000		19.07		
	2		26.90	53.8
0+002		34.73		
	2		30.52	61.04
0+004		26.31		
	2		23.90	47.80
0+006		21.49		
	1.3		21.55	28.01
0+007.30		21.6		
			VOLUMEN TOTAL	190.6


EXCAVACION BOX K4+950 ENCOLE				
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	AREA PROMEDIO	VOLUMEN CORTE
0+000		14.21		
	2		17.61	35.22
0+002		21.01		
	2		18.05	36.1
0+004		15.09		
	2		13.97	27.93
0+006		12.84		
	2		12.21	24.41
0+008		11.57		
	1.25		11.12	13.89
0+09.25		10.66		
			VOLUMEN TOTAL	137.6

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

BOX K5+063

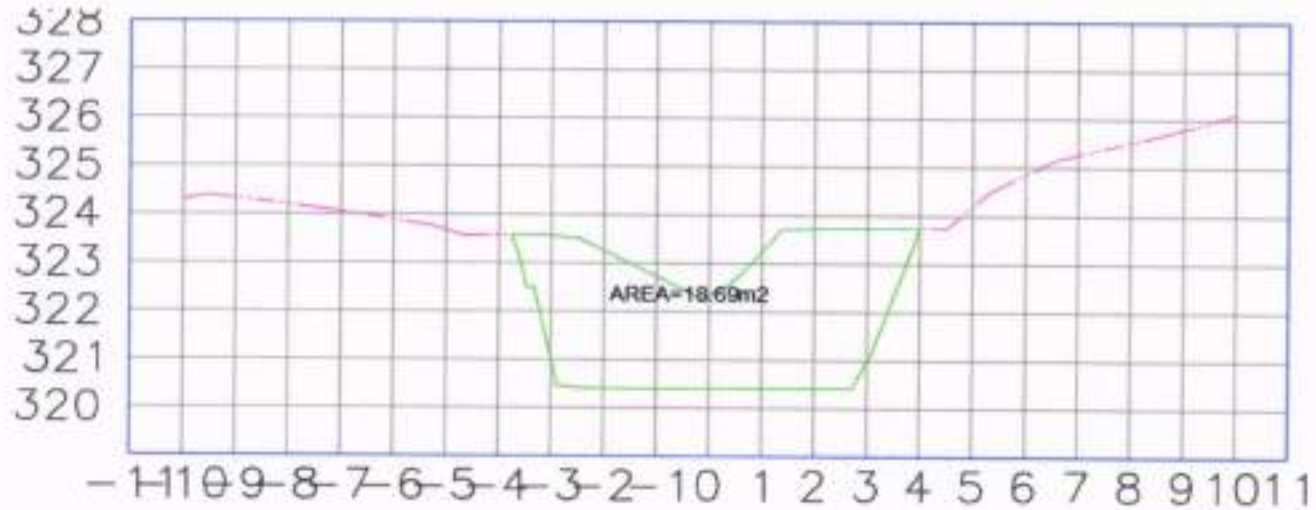


ESTACION 0+002.00

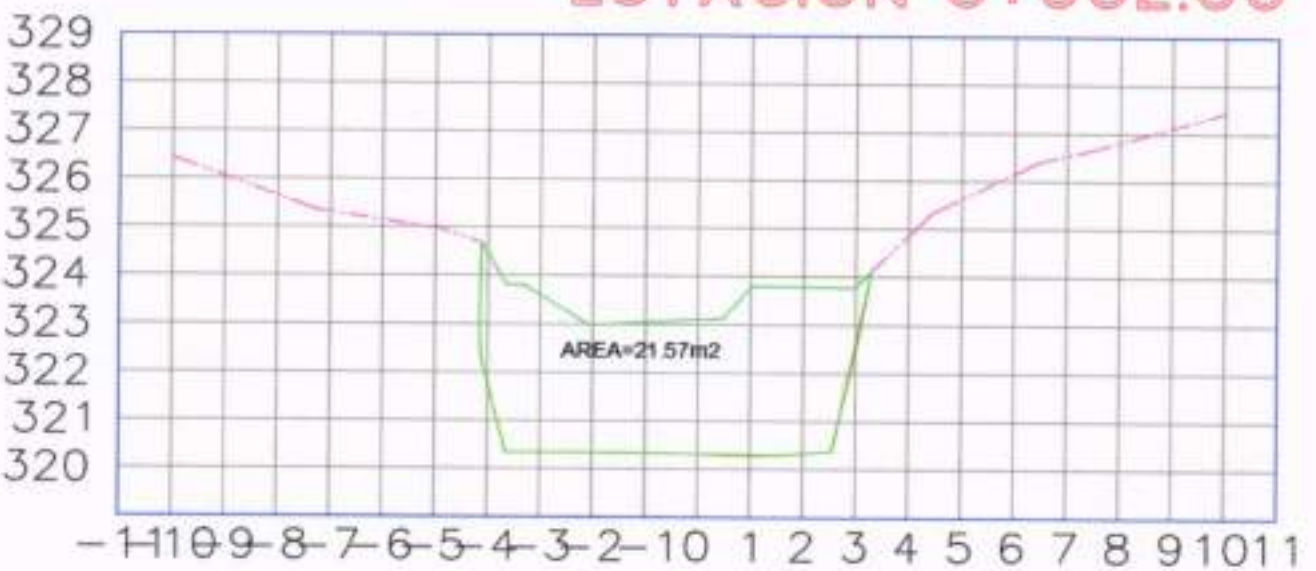


ESTACION 0+000.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

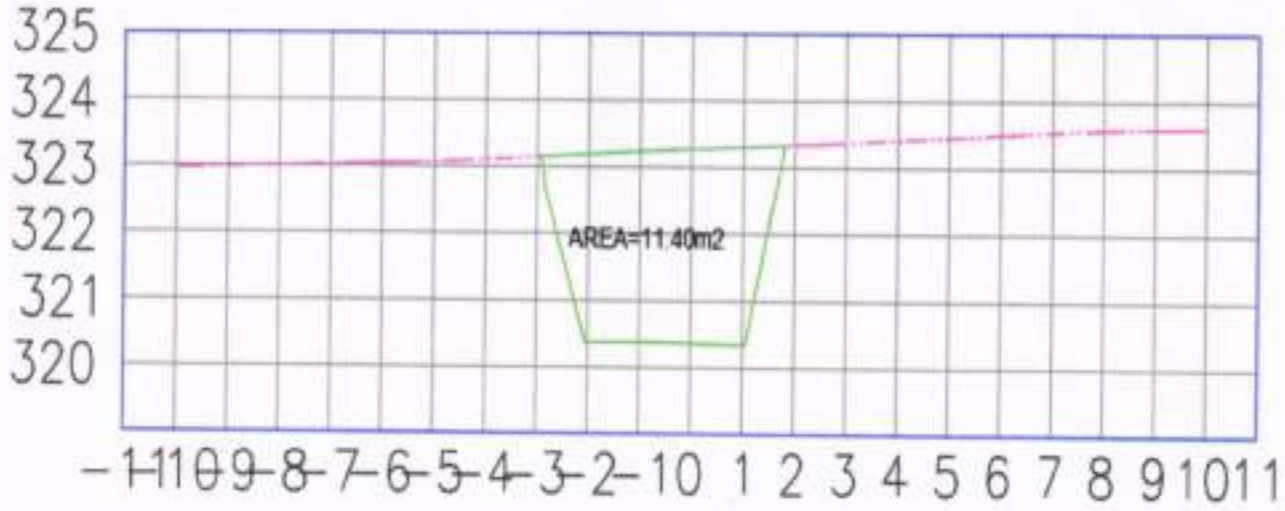


ESTACION 0+006.00

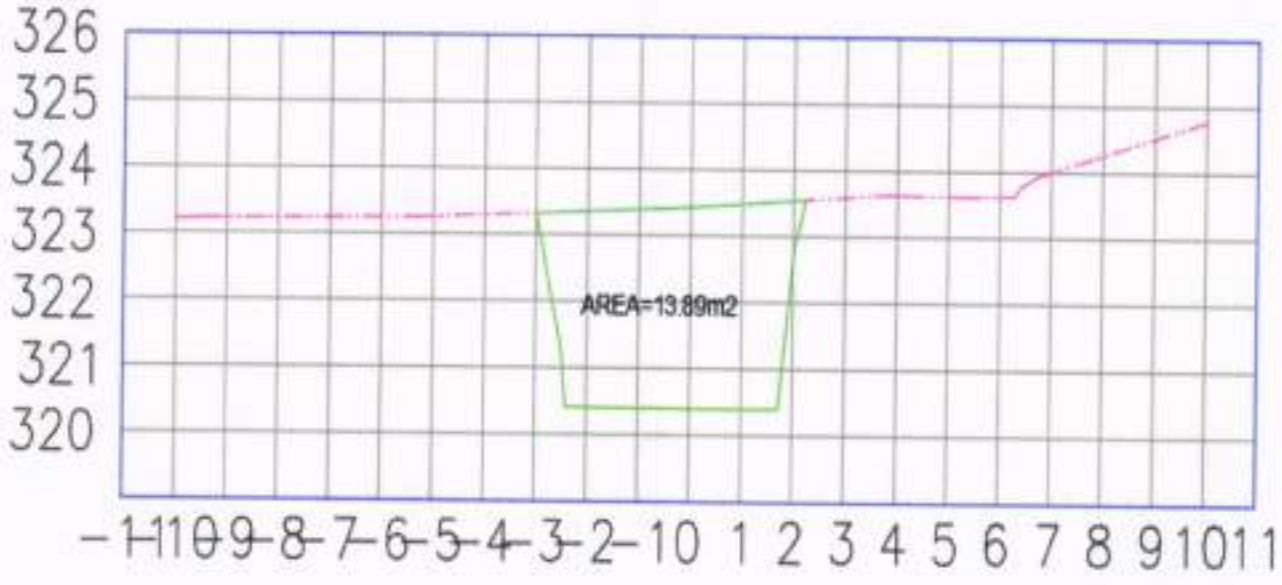


ESTACION 0+004.00




ESTACION 0+010.00

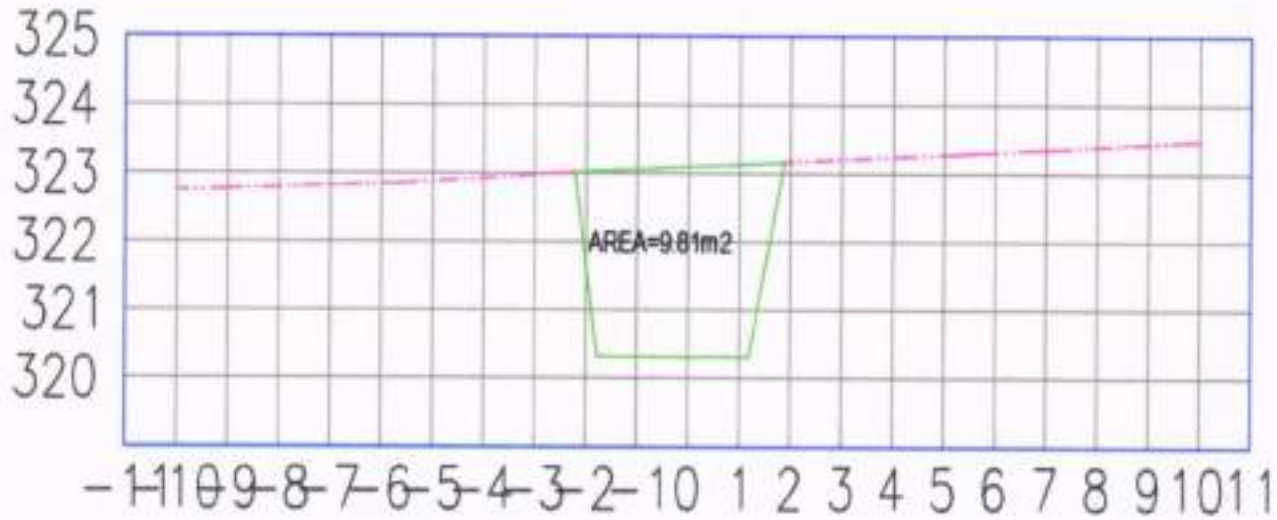

ESTACION 0+008.00

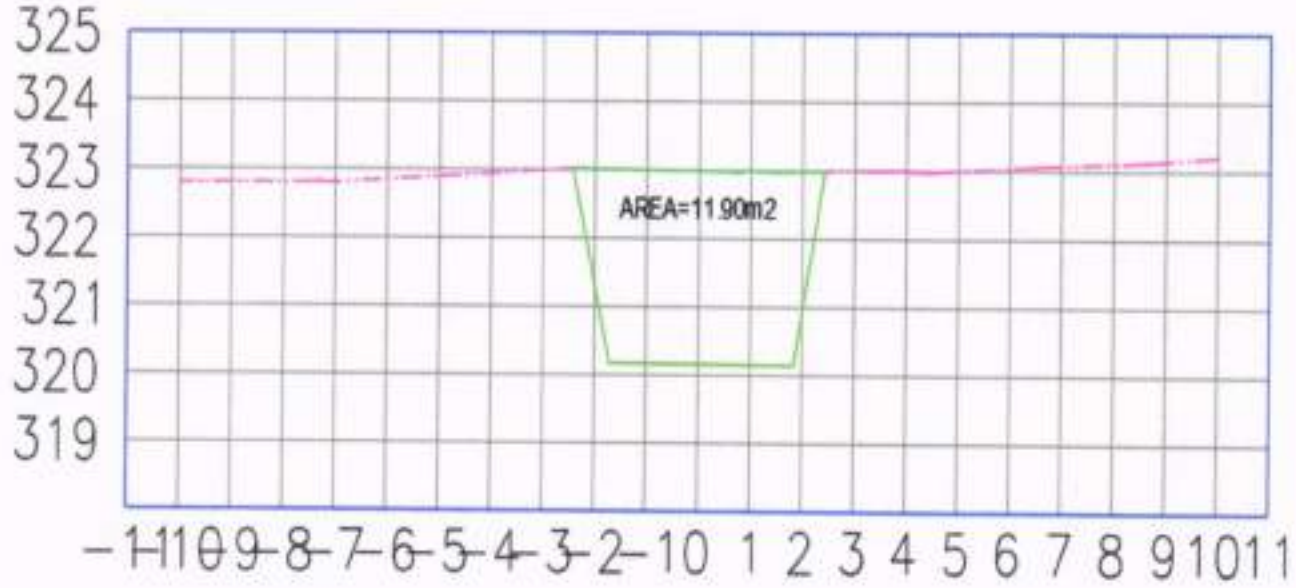


ESTACION 0+012.89

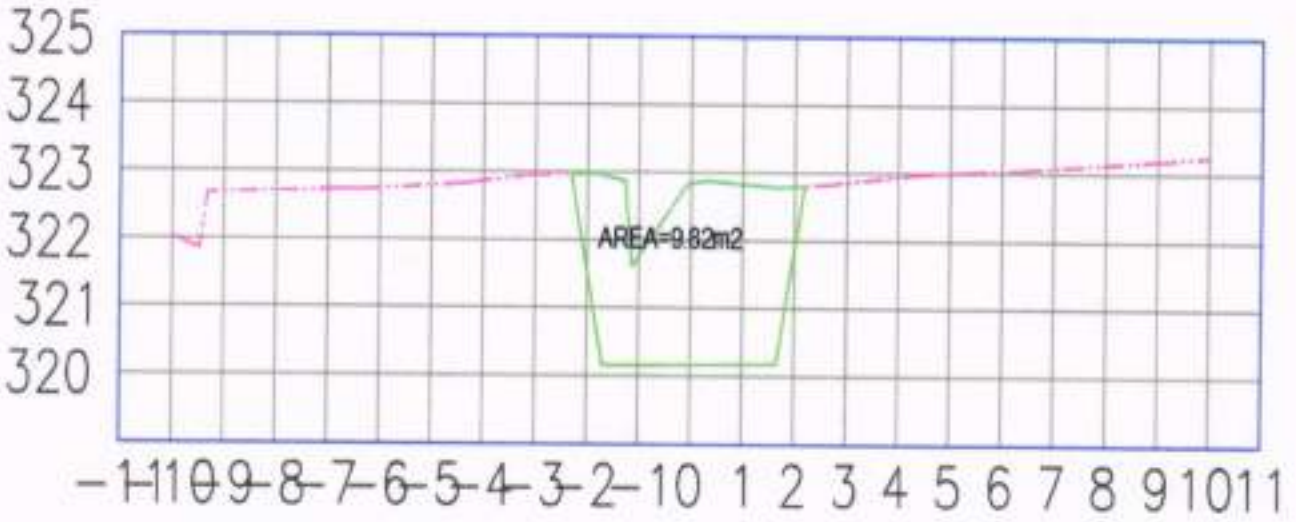


ESTACION 0+012.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9


BOX K4+740

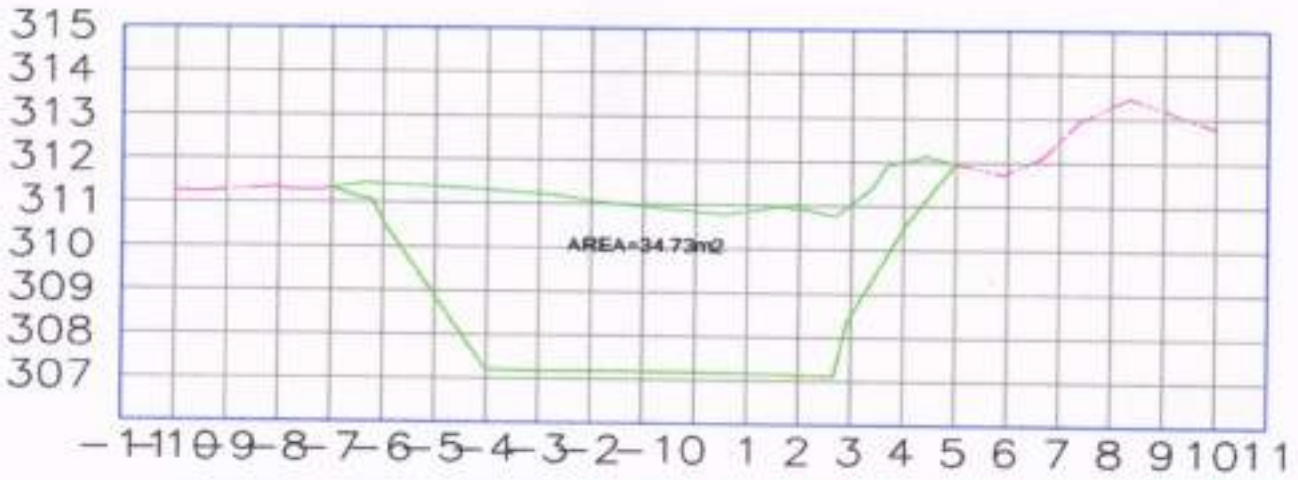


ESTACION 0+002.00

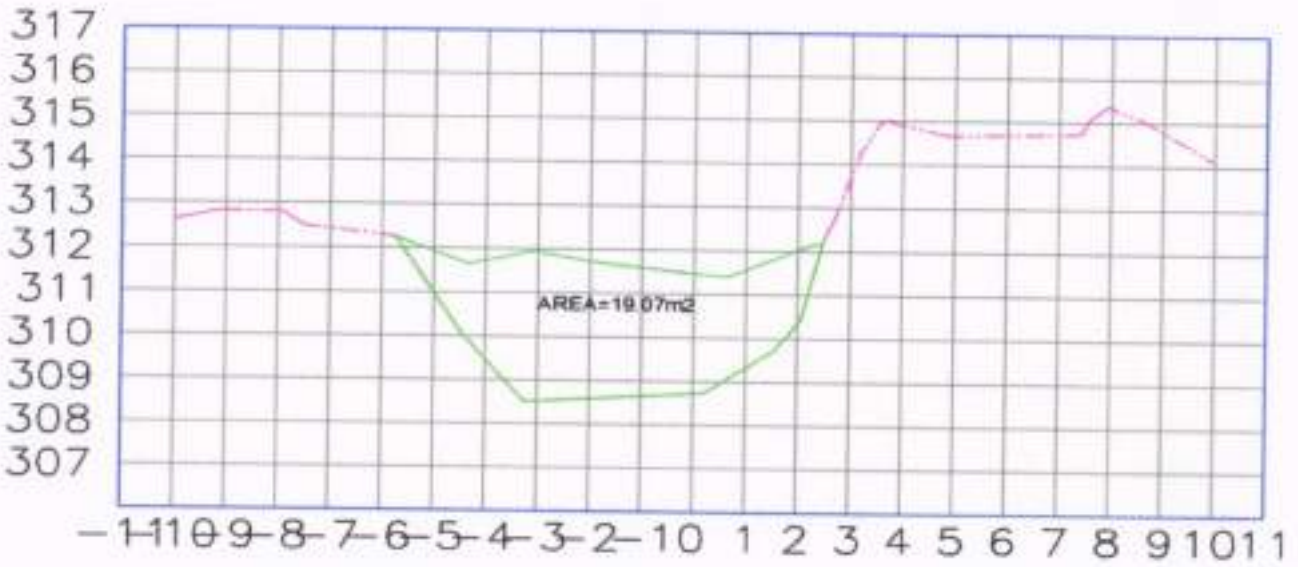


ESTACION 0+000.00

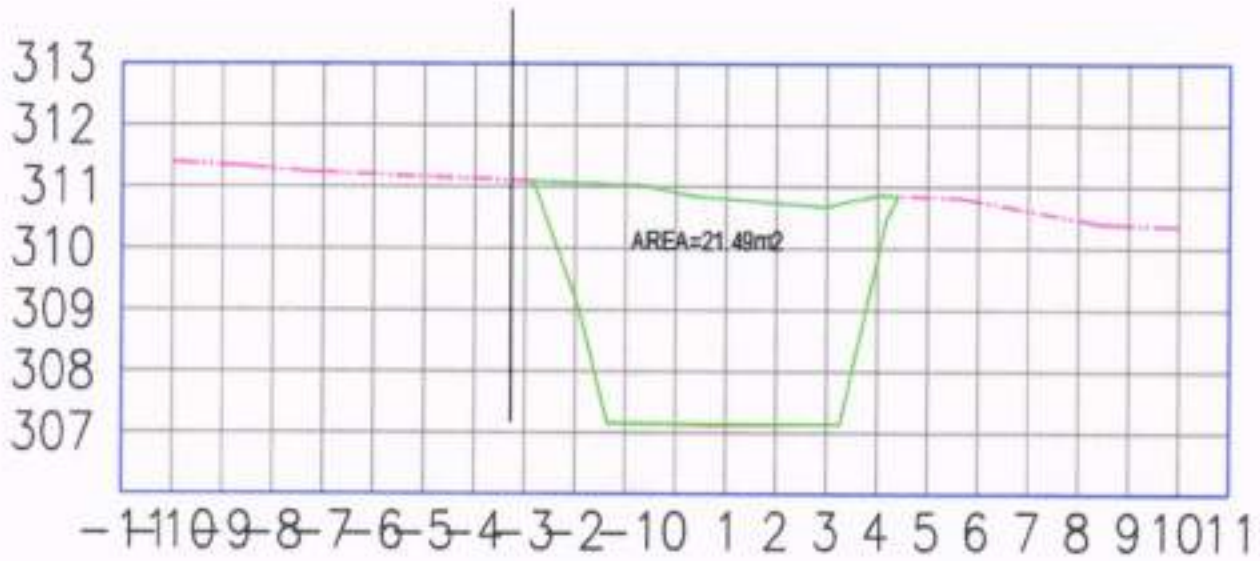

ESTACION 0+006.00

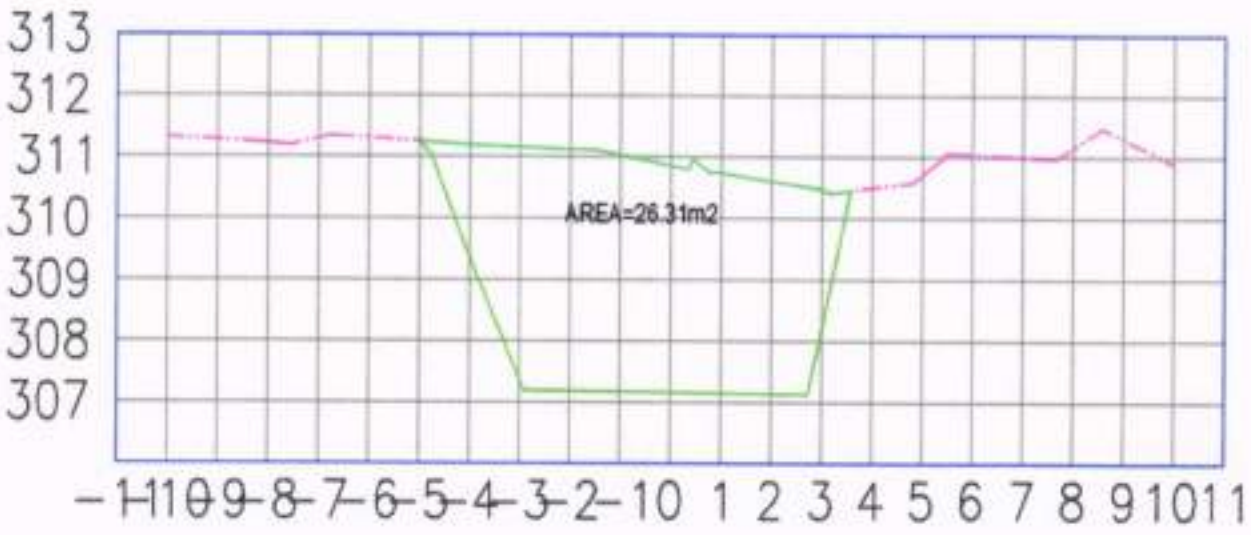


ESTACION 0+004.00

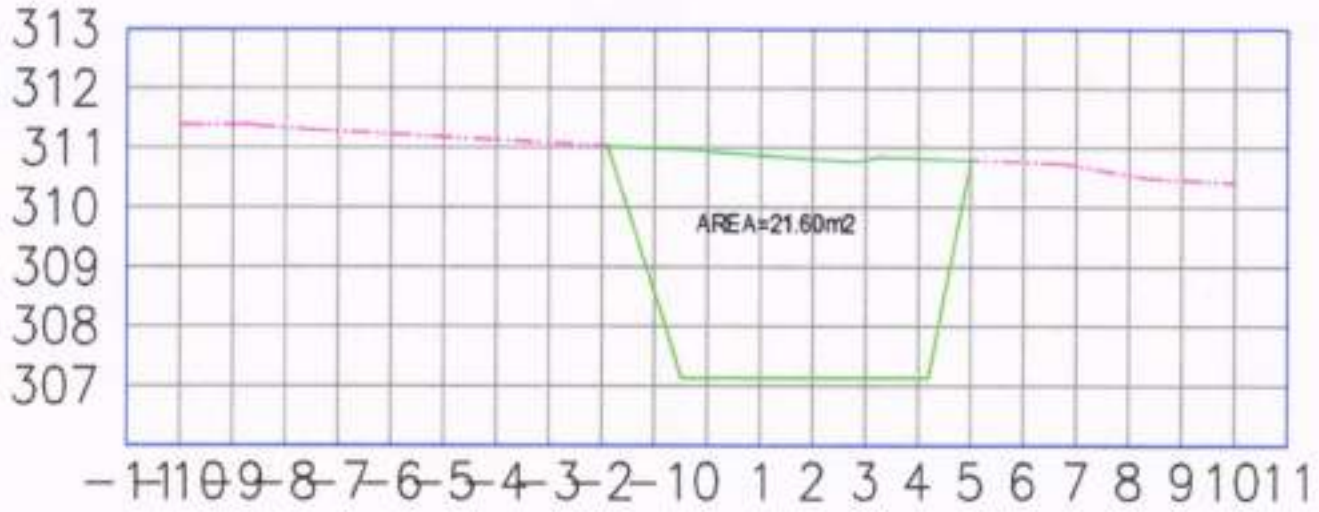


ESTACION 0+007.30

BOX K5+950

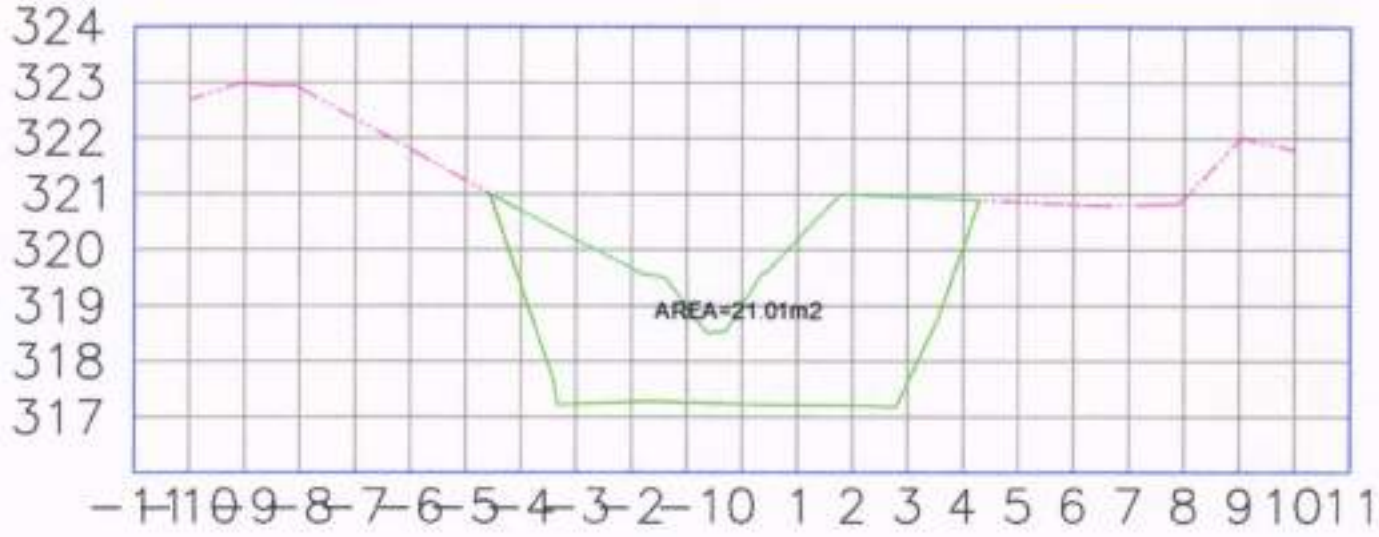


ESTACION 0+002.00

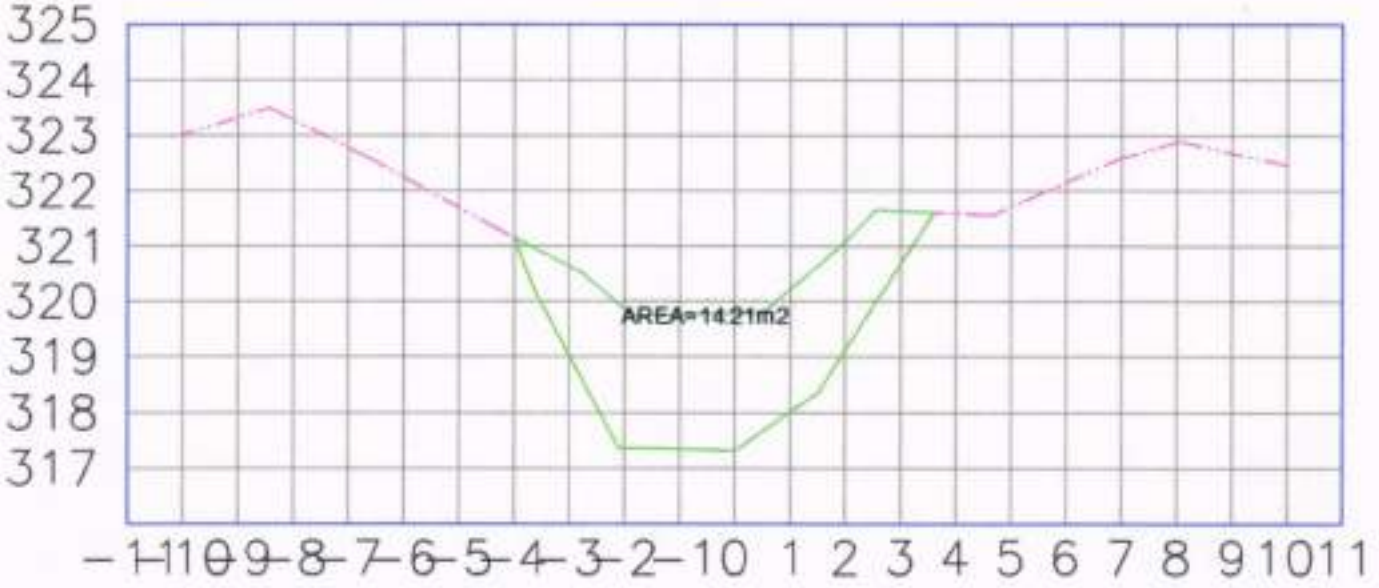


ESTACION 0+000.00


CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

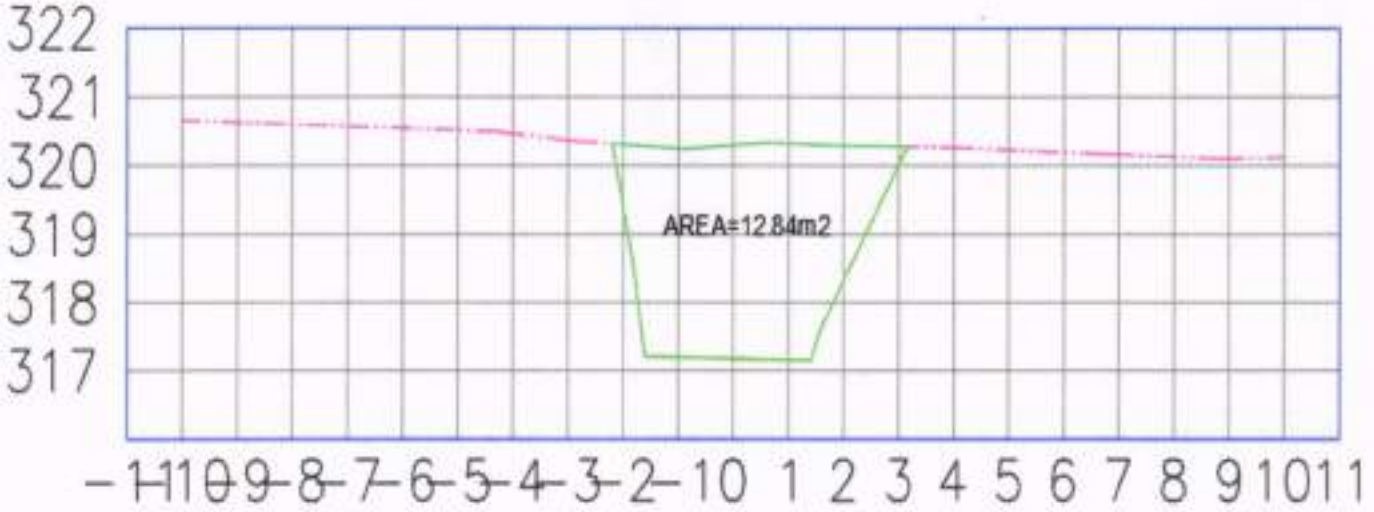


ESTACION 0+006.00

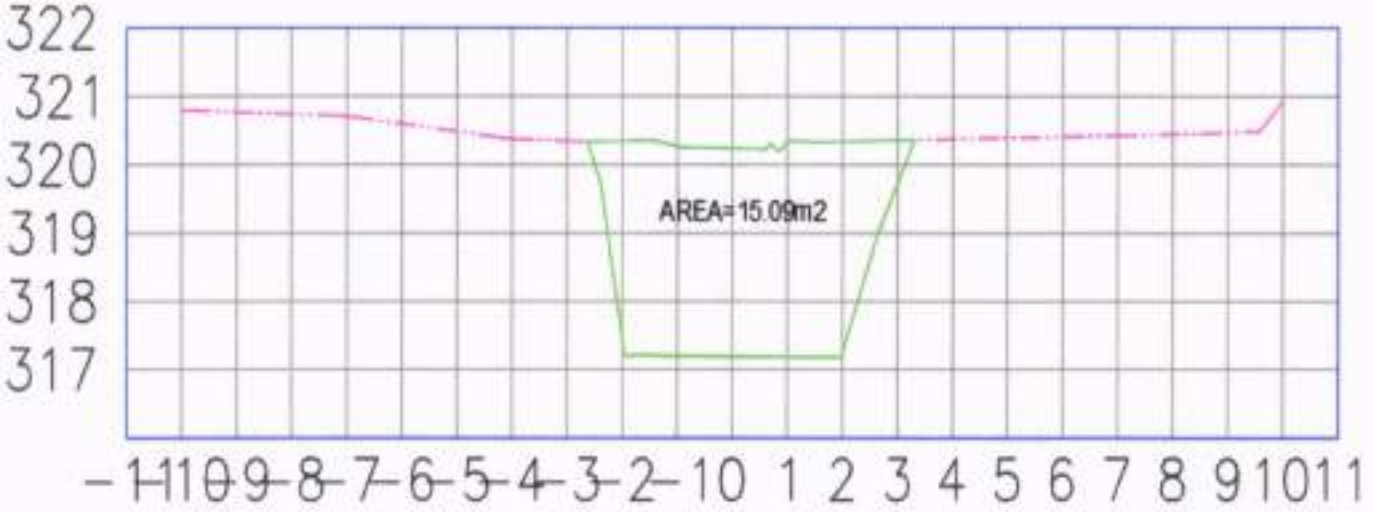

ESTACION 0+004.00

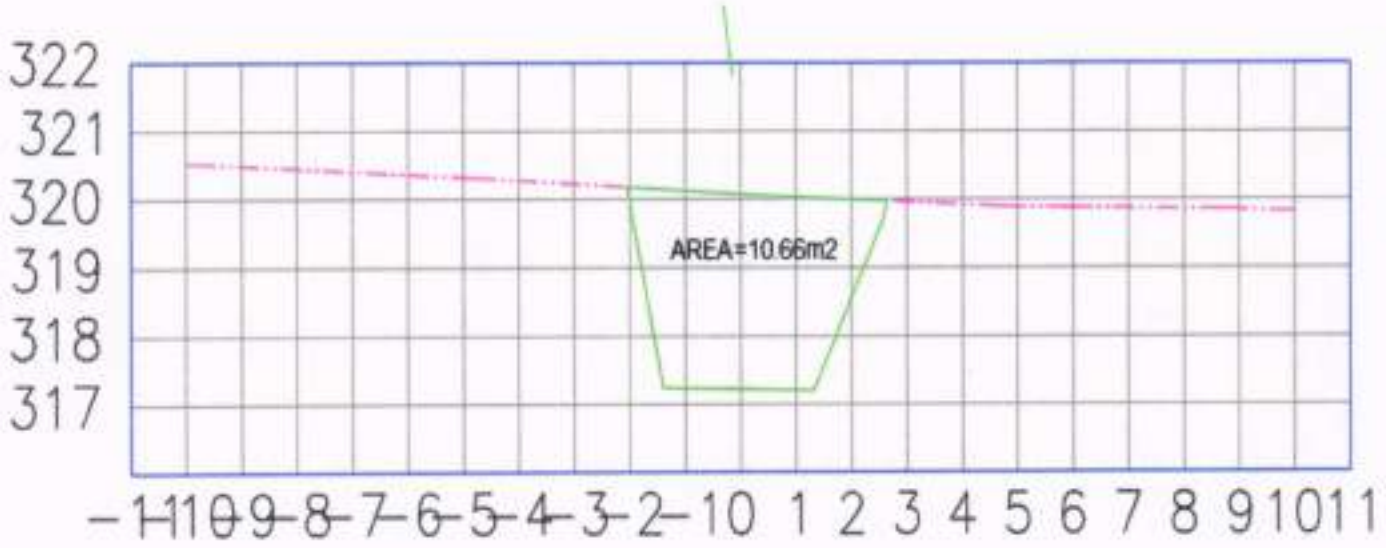

ESTACION 0+009.25

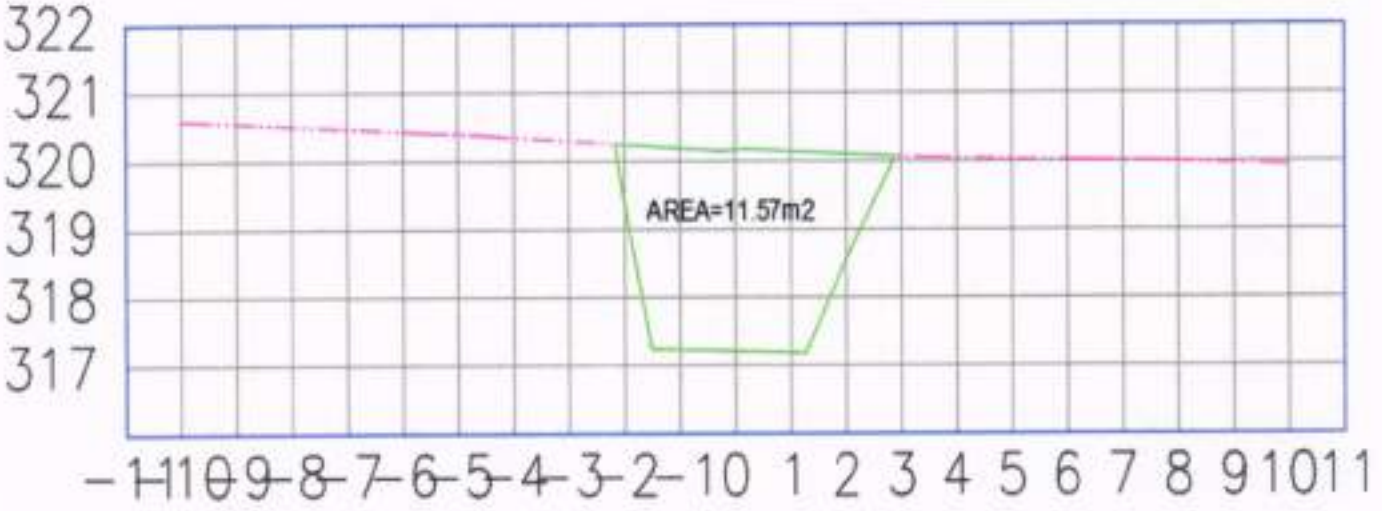

ESTACION 0+008.00

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – BALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.2.5 BOX CULVERT
ITEM No.:	1.2.5.5	DESCRIPCION:	Excavación manual en material sin clasificar
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UNID:	UD		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTO M3	TOTAL M3
	Box Coulvert Dentellon encole	k05+063	k05+063	5,70	0,30	0,70			1,20
	Box Coulvert Dentellon encole	k05+063	k05+063	3,75	0,30	0,30			0,34
								AJUSTE AL DECIMAL	-0,03
								TOTAL	1,50

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PARDO
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALFREDO PEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02533-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO		
	R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO		
	R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900		SUB-CAPITULO: 1.2.5 BOX/CULVERT
ITEM No.:	1.2.5.14	DESCRIPCION: Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	FECHA INICIAL DEL PERIODO: / FECHA FINAL DEL PERIODO: / UND: M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ALTO ML	ANCHO ML	AREA M2	TOTAL M3
Gaviones	k04+957	k04+957	4,00	2,00	1,00		8,00
Gaviones	k04+684	k04+684	3,00	2,00	1,00		6,00
Gaviones	k04+684	k04+684	3,00	2,00	1,00		6,00
Gaviones	k04+684	k04+684	3,00	2,00	1,00		6,00
Gaviones	k04+684	k04+684	3,00	2,00	1,00		6,00
Gaviones	k04+684	k04+684	6,00	1,00	1,00		6,00
Gaviones	k04+957	k04+957	4,00	2,00	1,00		8,00
Gaviones	k04+957	k04+957	1,00	2,00	1,00		2,00
						AJUSTE AL DECIMAL	0,00
						TOTAL	48,00

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVERO JEREZ CAMACHO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS KA+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.2.5 BOX CULVERT
ITEM No.:	1.2.5.15	DESCRIPCION:	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:			UND:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ALTO ML	ANCHO ML	AREA M2	TOTAL M3
Base de gaviones	k04+957	k04+957	8,000	2,00	0,20		3,20
Base de gaviones	k04+684	k04+684	3,000	2,00	0,20		1,20
Base de gaviones	k04+684	k04+684	3,000	2,00	0,20		1,20
Base de gaviones	k04+957	k04+957	6,00	2,00	0,20		2,40
					AJUSTE AL DECIMAL		0,00
					TOTAL		8,00

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-GV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO – SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.3.2 OBRA K5+255-K5+355: Muro en gaviones H=2.00m L=45.00m
ITEM No.:	1.3.2.9	DESCRIPCION:	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UNID:	M2		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LARGO ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	TOTAL M2
	MANTO GEOTEXTIL	k04+957	k04+957	6,00	3,00			18,00
	MANTO GEOTEXTIL	k04+957	k04+957	6,00	2,00			12,00
	MANTO GEOTEXTIL	k04+957	k04+957	6,00	3,00			18,00
						AJUSTE AL DECIMAL		0,00
						TOTAL		48,00

OBSERVACIONES:

WILLIAN QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ COMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-58-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTCI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO RE. ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO RE. ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABEDIDAS K4+600 - K5+660	SUB-CAPITULO:	1.3.5 MURO CAISSON
ITEM No.:	1.3.5.5	DESCRIPCION:	Excavación manual en roca o colovión para pilas, prof. 4 - 12mt, sin drenaje

FECHA DE INICIO:			FECHA FINAL:			UND:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	RINICIAL	RFINAL	PI	AREA PROMEDIO M2	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTO M3	TOTAL (AREAPROMEDIO*ALTO) M3
MURO CAISSON K4+140	k04+140	k04+140	3,1416	1,131	1,00			1,13
	k04+144	k04+144	3,1416	1,131	1,00			1,13
	k04+147	k04+147	3,1416	1,131	1,00			1,13
	k04+151	k04+151	3,1416	1,131	1,00			1,13
	k04+154	k04+154	3,1416	1,131	1,00			1,13
	k04+158	k04+158	3,1416	1,131	1,00			1,13
	k04+162	k04+162	3,1416	1,131	1,00			1,13
MURO CAISSON K4+830	k04+830	k04+830	3,1416	1,767	7,00			12,37
	k04+830	k04+830	3,1416	1,540	1,00			1,54
	k04+834	k04+834	3,1416	1,767	7,00			12,37
	k04+834	k04+834	3,1416	1,540	1,00			1,54
	k04+837	k04+837	3,1416	1,767	7,00			12,37
	k04+837	k04+837	3,1416	1,540	1,00			1,54
	k04+841	k04+841	3,1416	1,767	7,00			12,37
	k04+841	k04+841	3,1416	1,540	1,00			1,54
MURO CAISSON K4+860	k04+860	k04+860	3,1416	1,767	7,00			12,37
	k04+860	k04+860	3,1416	1,540	1,00			1,54
					PAGADO ACTAS ANTERIORES			-8,10
							AJUSTE AL DECIMAL:	0,03
							TOTAL:	69,40

OBSERVACION:

WILLIAN GARNERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO PEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA CENTRO		
	RL ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO		
	RL ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+800		SUB-CAPITULO: 1.3.5 MURO CAISSON K4+140
ITEM No.:	1.3.5.ii	DESCRIPCION: Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad máx de 4m	FECHA INICIAL DEL PERIODO: / FECHA FINAL DEL PERIODO:

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	Ø INTERMEDIO ML	ESPESOR ML	ALTO ML	TT Pi	UNDS:	M3 TOTAL M3
	MURO CAISSON K4+140	k04+140	k04+140	1,400	0,10	4,00	3,1416		1,76
		k04+144	k04+144	1,400	0,10	4,00	3,1416		1,76
		k04+147	k04+147	1,400	0,10	4,00	3,1416		1,76
		k04+151	k04+151	1,400	0,10	4,00	3,1416		1,76
		k04+154	k04+154	1,400	0,10	4,00	3,1416		1,76
		k04+158	k04+158	1,400	0,10	4,00	3,1416		1,76
		k04+162	k04+162	1,400	0,10	4,00	3,1416		1,76
	MURO CAISSON K4+830	k04+830	k04+830	1,400	0,10	4,00	3,1416		1,76
		k04+834	k04+834	1,400	0,10	4,00	3,1416		1,76
		k04+837	k04+837	1,400	0,10	4,00	3,1416		1,76
		k04+841	k04+841	1,400	0,10	4,00	3,1416		1,76
	MURO CAISSON K4+860	k04+860	k04+860	1,400	0,10	4,00	3,1416		1,76
		k04+864	k04+864	1,400	0,10	4,00	3,1416		1,76
		k04+867	k04+867	1,400	0,10	4,00	3,1416		1,76
		k04+871	k04+871	1,400	0,10	4,00	3,1416		1,76
							PAGADO ACTAS ANTERIORES		-19,80
								0,00	0,01
							TOTAL		6,60

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PARON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02032-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO V A CENTRO RL ING. MIGUEL DAN JENSEEN DURAN PAEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO RL ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.3.5 MURO CAISSON K4+140
ITEM No.:	1.3.5.7	DESCRIPCION:	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 - 12m
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	# INTERMEDIO ML	ESPESOR ML	ALTO ML	TT PI	TOTAL M3
	MURO CAISSON K4+830	k04+830	k04+830	1,587	0,10	7,00	3,1416	3,49
		k04+834	k04+834	1,587	0,10	7,00	3,1416	3,49
		k04+837	k04+837	1,587	0,10	7,00	3,1416	3,49
		k04+841	k04+841	1,587	0,10	7,00	3,1416	3,49
	MURO CAISSON K4+860	k04+860	k04+860	1,587	0,10	7,00	3,1416	3,49
		k04+864	k04+864	1,587	0,10	7,00	3,1416	3,49
		k04+867	k04+867	1,587	0,10	7,00	3,1416	3,49
		k04+871	k04+871	1,587	0,10	7,00	3,1416	3,49
						PAGADO ACTAS ANTERIORES		-8,80
							AJUSTE AL DECIMAL	-0,02
							TOTAL	19,10

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PARON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-PC-39-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ARBOLEDAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.3.5 MURO CAISSON K4+140
ITEM No.:	1.3.5.9	DESCRIPCION:	Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:			UND:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LARGO ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD	TOTAL M3
	modulo 1	k04+145	k04+170	7,25	0,25	0,85		1,54
	modulo 2	k04+145	k04+170	10,00	0,25	0,85		2,13
	modulo 3	k04+145	k04+170	7,25	0,25	0,85		1,54
							AJUSTE AL DECIMAL	-0,01
							TOTAL	5,20

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PARDO
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL, CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO		
	RL. ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO		
	RL. ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ARBOLEDAS K4+900 - K5+500		SUB-CAPITULO: 1.3.3 MURO CAISSON K4+140
ITEM No.:	1.3.5.12	DESCRIPCION:	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:			UND:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LARGO Mt.	ANCHO Mt.	ALTO Mt.	AREA M2	TOTAL M3
concreto lanzado	k04+830	k04+830			0,10	46,87	4,69
concreto lanzado	k04+830	k04+830			0,10	10,77	1,08
concreto lanzado	k04+850	k04+850			0,10	63,20	6,32
						AJUSTE AL DECIMAL	0,02
						TOTAL	**12,10**

OBSERVACIONES: LA PRESENTE MEMORIA VIENE SOPORTADA CON EL INFORME DE TOPOGRAFIA.

WILLIAM QUINTERO PARON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

INFORME CANTIDAD DE CONCRETO LANZADO PROTECCION TALUDES EN TRAMO 1.

OBJETO CONTRATO, "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S."

DICIEMBRE – ENERO

AREA CONCRETO LANZADO MURO CAISSON K4+830					
PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION	
1	1155473.387	1365959.536	314.570	CONCRETO	
2	1155473.368	1365958.885	314.558	CONCRETO	
3	1155471.168	1365956.628	314.712	CONCRETO	
4	1155467.206	1365952.749	314.786	CONCRETO	
5	1155466.038	1365953.379	313.875	CONCRETO	
6	1155465.394	1365954.501	313.354	CONCRETO	
7	1155464.470	1365955.853	313.203	CONCRETO	
8	1155464.190	1365957.856	312.491	CONCRETO	
9	1155464.115	1365959.193	312.210	CONCRETO	
10	1155465.148	1365959.823	311.682	CONCRETO	
11	1155465.261	1365960.777	311.153	CONCRETO	AREA 46.87
12	1155466.784	1365961.498	309.940	CONCRETO	
13	1155465.292	1365961.809	309.682	CONCRETO	
14	1155466.798	1365961.715	309.093	CONCRETO	
15	1155467.170	1365960.929	308.679	CONCRETO	
16	1155466.938	1365960.263	308.829	CONCRETO	
17	1155468.415	1365958.897	308.708	CONCRETO	
18	1155468.674	1365958.843	308.609	CONCRETO	
19	1155469.601	1365959.753	308.425	CONCRETO	
20	1155471.548	1365961.289	308.447	CONCRETO	
21	1155473.551	1365962.975	308.168	CONCRETO	
25	1155472.383	1365959.924	310.424	CONCRETO	
22	1155474.786	1365964.008	308.408	CONCRETO	
23	1155475.688	1365965.087	309.385	CONCRETO	
24	1155476.846	1365966.954	310.309	CONCRETO	
26	1155476.120	1365962.424	310.260	CONCRETO	
27	1155475.733	1365961.794	314.304	CONCRETO	
28	1155476.592	1365961.730	314.355	CONCRETO	AREA 10.77
29	1155477.126	1365962.186	314.264	CONCRETO	
30	1155477.983	1365964.108	314.200	CONCRETO	
31	1155478.180	1365965.337	314.126	CONCRETO	
32	1155477.891	1365966.335	314.185	CONCRETO	
33	1155477.245	1365966.436	313.807	CONCRETO	

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9

AREA CONCRETO LANZADO MURO CAISSON K4+850					
PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION	
34	1155455.521	1365949.013	315.772	CONCRETO	
35	1155456.634	1365947.793	315.826	CONCRETO	
36	1155457.251	1365946.705	315.543	CONCRETO	
37	1155457.546	1365945.244	315.454	CONCRETO	
38	1155456.659	1365943.425	315.507	CONCRETO	
39	1155456.060	1365942.226	315.557	CONCRETO	
40	1155455.120	1365941.083	315.595	CONCRETO	
41	1155453.292	1365939.410	315.671	CONCRETO	
42	1155451.743	1365937.748	315.774	CONCRETO	
43	1155450.112	1365935.845	315.949	CONCRETO	
44	1155448.504	1365934.082	316.033	CONCRETO	
45	1155447.150	1365932.416	316.156	CONCRETO	
46	1155446.413	1365933.036	315.976	CONCRETO	
47	1155445.710	1365932.611	315.769	CONCRETO	
48	1155445.360	1365932.888	315.094	CONCRETO	
49	1155444.739	1365933.601	314.415	CONCRETO	
50	1155443.755	1365934.916	314.064	CONCRETO	
51	1155443.331	1365935.988	313.635	CONCRETO	AREA 63.20
52	1155442.355	1365936.898	313.628	CONCRETO	
53	1155442.037	1365937.441	314.518	CONCRETO	
54	1155441.926	1365938.242	314.883	CONCRETO	
55	1155442.521	1365938.769	314.519	CONCRETO	
56	1155442.827	1365939.541	313.976	CONCRETO	
57	1155444.342	1365939.458	310.352	CONCRETO	
58	1155443.937	1365938.699	310.316	CONCRETO	
59	1155443.312	1365937.779	310.705	CONCRETO	
60	1155443.236	1365936.935	310.742	CONCRETO	
61	1155443.822	1365936.722	310.839	CONCRETO	
62	1155444.356	1365936.401	310.682	CONCRETO	
63	1155445.494	1365936.818	310.347	CONCRETO	
64	1155446.556	1365937.035	310.269	CONCRETO	
65	1155447.443	1365937.651	310.121	CONCRETO	
66	1155448.208	1365938.010	310.167	CONCRETO	
67	1155448.724	1365939.065	309.988	CONCRETO	
68	1155450.146	1365940.280	309.727	CONCRETO	

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S


NIT. 900.794.329-9


69	1155451.324	1365940.538	309.618	CONCRETO	
70	1155452.017	1365941.645	309.439	CONCRETO	
71	1155453.074	1365942.141	309.522	CONCRETO	
72	1155453.753	1365943.006	309.416	CONCRETO	
73	1155454.822	1365944.382	309.598	CONCRETO	
74	1155455.488	1365945.372	309.806	CONCRETO	
75	1155454.610	1365946.195	309.537	CONCRETO	
76	1155453.625	1365947.056	309.586	CONCRETO	
77	1155453.906	1365942.305	312.433	CONCRETO	
78	1155453.998	1365941.141	312.654	CONCRETO	
79	1155453.524	1365940.282	312.375	CONCRETO	
80	1155452.734	1365940.058	312.326	CONCRETO	
81	1155452.079	1365939.660	312.512	CONCRETO	

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9

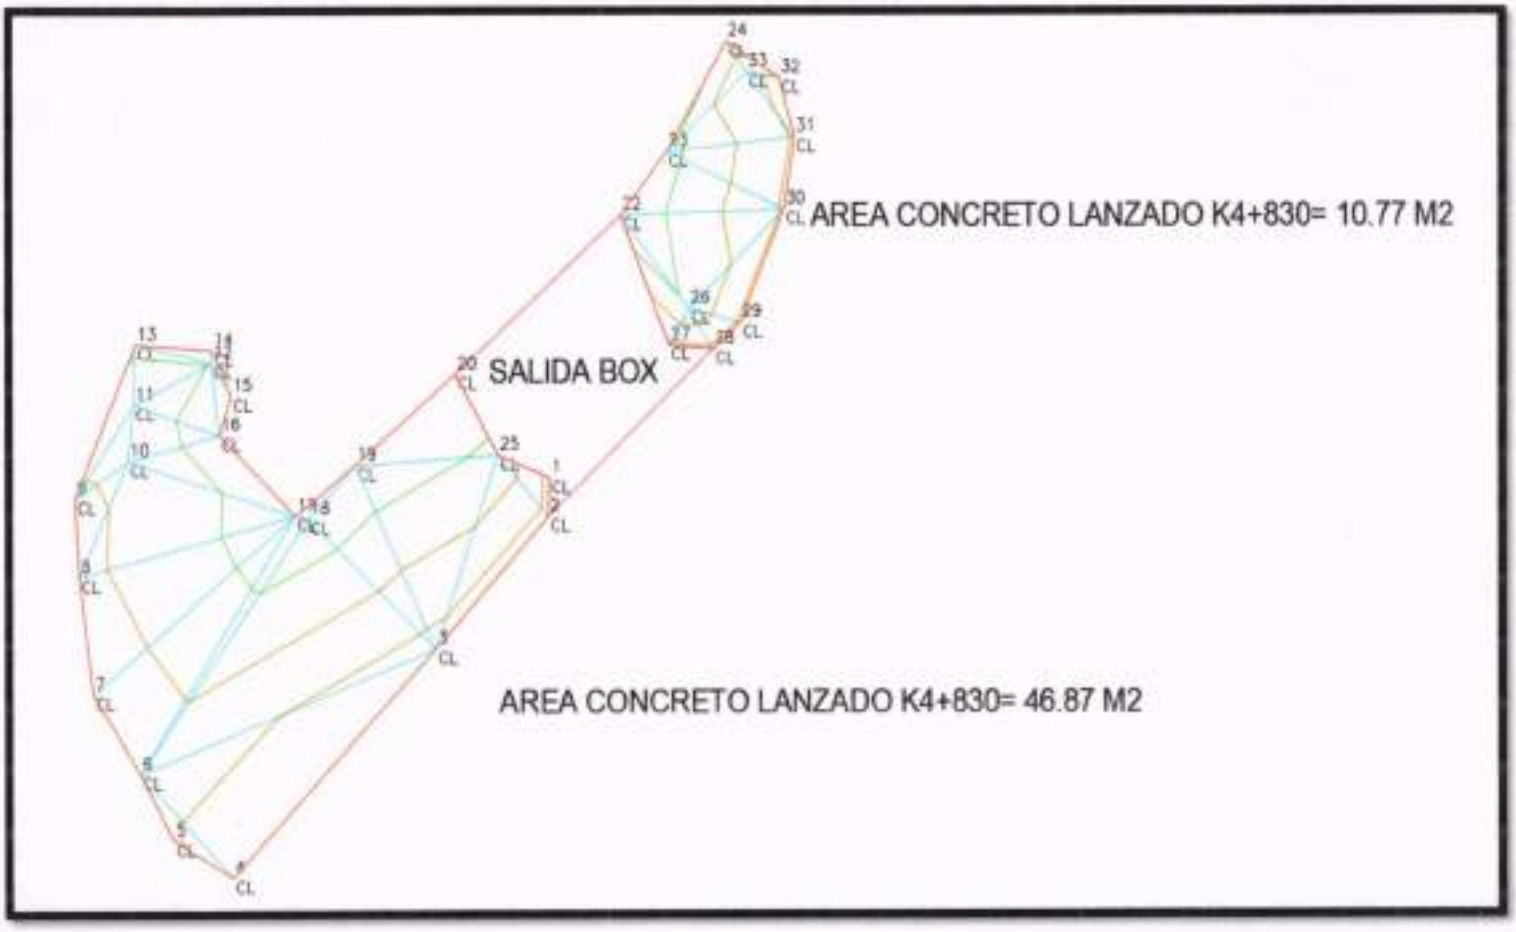

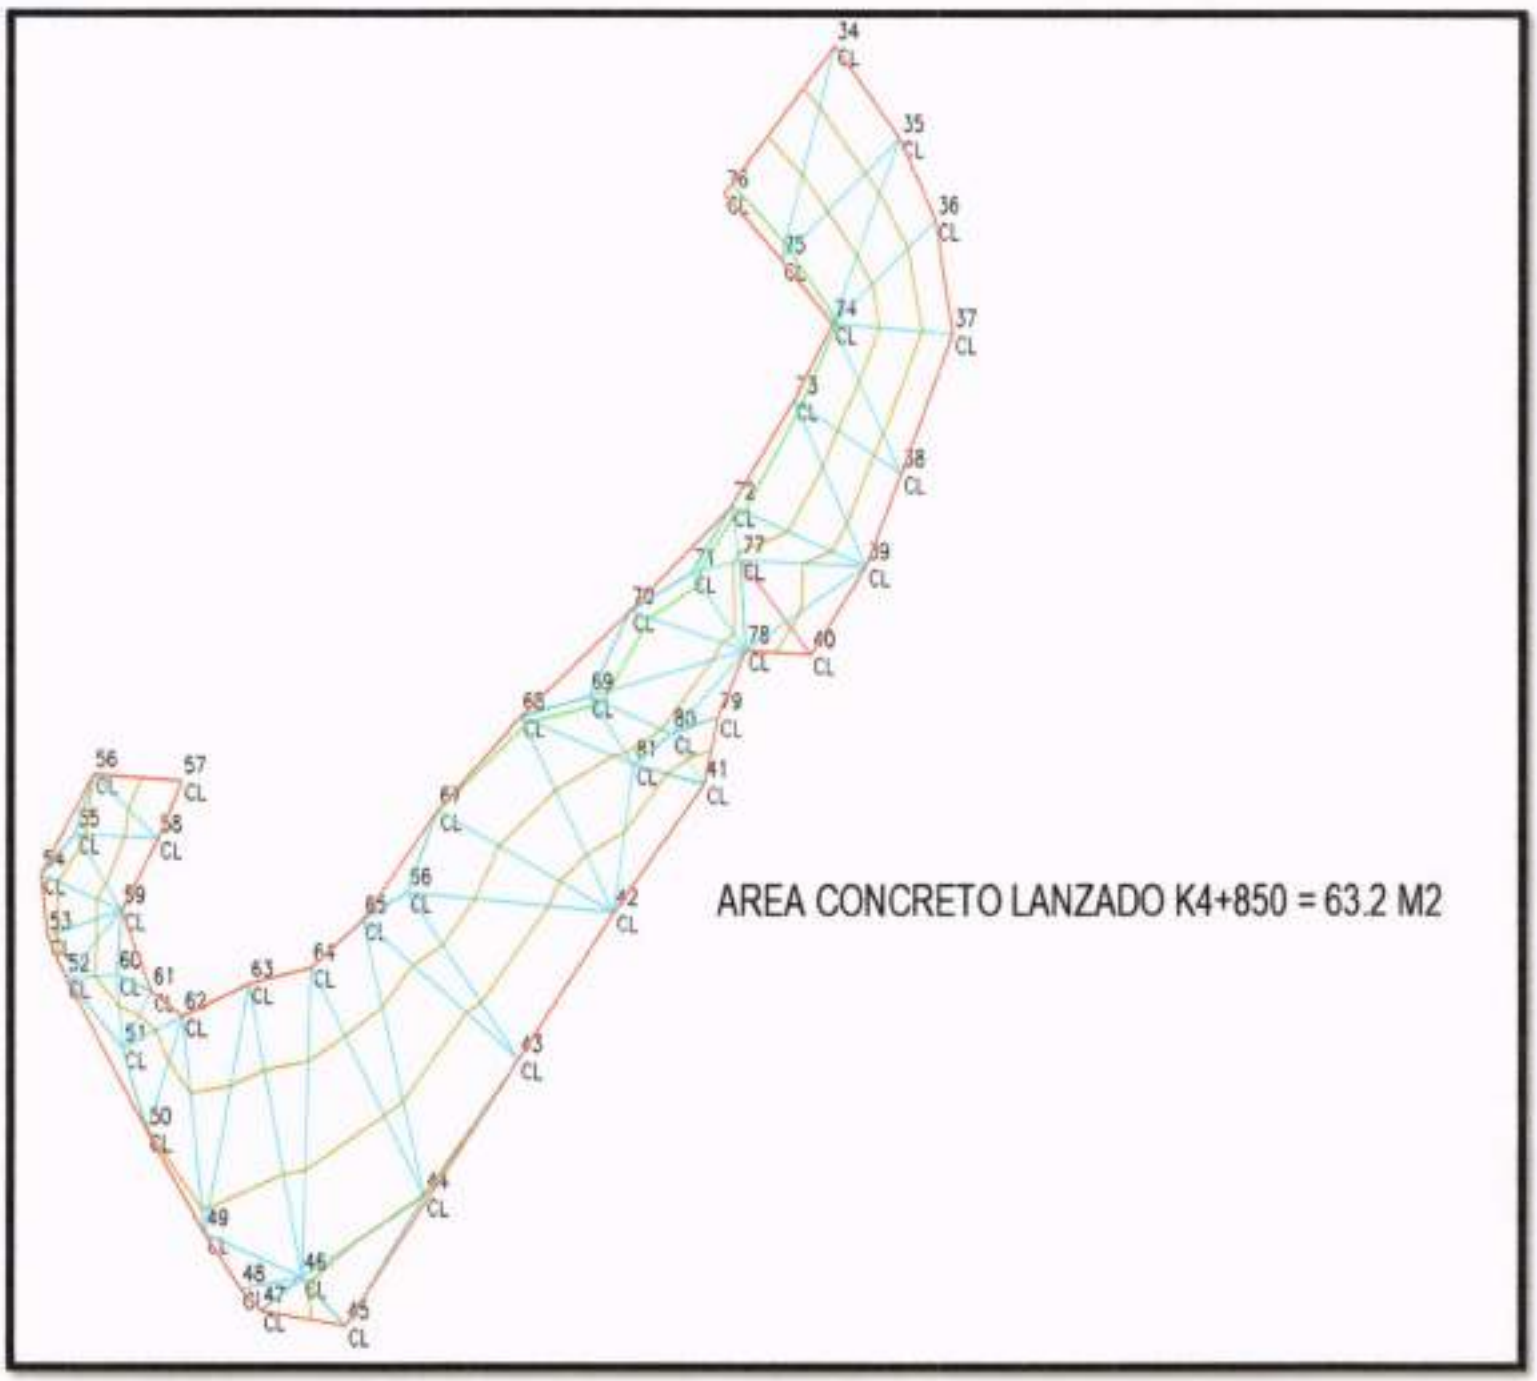
AREA CONCRETO LANZADO K4+850 = 63.2 M2

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-03532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.3.5 MURO CAISSON K4+140
ITEM No.:	NP-02 1.3	DESCRIPCION	Anclajes pasivos de 1" incluye suministro, perforación e inyección, tuerca y platina abovedada 15x15
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	ML		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	LONGITUD ML	CANTIDAD ML
MURO 4+860	1	1.155.454,65	1.365.946,64	310,57	6,00	6,00
MURO 4+860	2	1.155.455,51	1.365.945,20	310,66	6,00	6,00
MURO 4+860	3	1.155.454,08	1.365.947,40	311,80	6,00	6,00
MURO 4+860	4	1.155.455,36	1.365.945,99	311,80	6,00	6,00
					AJUSTE AL DECIMAL	0,00
					TOTAL	24,00

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PAGON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

99

INFORME CANTIDAD DE ANCLAJES PROTECCION TALUDES EN TRAMO 1.

OBJETO CONTRATO, "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S."

DICIEMBRE – ENERO

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9

ANCLAJES MURO CAISSON K4+860				
PUNTO	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCION
1	1155454,646	1365946,635	310,566	ANCLAJES 6 METRO
2	1155455,514	1365945,197	310,658	ANCLAJES 6 METRO
3	1155454,083	1365947,403	311,801	ANCLAJES 6 METRO
4	1155455,357	1365945,985	311,804	ANCLAJES 6 METRO
5	1155455,79	1365945,287	313,509	ANCLAJES 6 METRO
6	1155455,148	1365947,12	313,492	ANCLAJES 6 METRO
7	1155454,707	1365948,153	314,942	ANCLAJES 6 METRO
8	1155456,296	1365946,414	314,897	ANCLAJES 6 METRO
9	1155454,43	1365943,744	310,685	ANCLAJES 6 METRO
10	1155454,913	1365943,58	313,659	ANCLAJES 6 METRO
11	1155454,629	1365942,461	314,946	ANCLAJES 6 METRO
12	1155453,91	1365942,896	311,883	ANCLAJES 6 METRO
13	1155449,967	1365939,289	311,088	ANCLAJES 6 METRO
14	1155451,162	1365939,759	312,358	ANCLAJES 6 METRO
15	1155450,548	1365939,084	313,902	ANCLAJES 6 METRO
16	1155451,599	1365939,497	315,099	ANCLAJES 6 METRO
17	1155448,593	1365938,11	311,164	ANCLAJES 6 METRO
18	1155449,488	1365938,599	312,4	ANCLAJES 6 METRO
19	1155448,246	1365937,214	312,521	ANCLAJES 6 METRO
20	1155449,073	1365937,663	314,17	ANCLAJES 6 METRO
21	1155450,231	1365938,058	315,187	ANCLAJES 6 METRO
22	1155449,001	1365936,665	315,208	ANCLAJES 6 METRO
23	1155447,032	1365936,99	311,253	ANCLAJES 6 METRO
24	1155446,887	1365936,021	312,666	ANCLAJES 6 METRO
25	1155447,824	1365936,297	313,952	ANCLAJES 6 METRO
26	1155447,745	1365935,257	315,336	ANCLAJES 6 METRO
27	1155446,604	1365934,125	315,49	ANCLAJES 6 METRO
28	1155455,37	1365944,523	311,838	ANCLAJES 6 METRO
29	1155446,774	1365934,772	314,028	ANCLAJES 6 METRO
30	1155455,82	1365944,309	314,904	ANCLAJES 6 METRO
		LONGITUD TOTAL METROS		180

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.
