la Corporación para los proyectos de reforestación." *https://drive.google.com/file/d/1jCMKeddXzt5E4kszUnJKaQG6URLGnLVT/view?usp=drive_link*

ARTICULO SEPTIMO: La empresa CONSORCIO VIA CENTRO, Identificado con Nit. 901740307-9 representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ identificado con la cédula de ciudadanía No 1.090.473.156, expedida en Cúcuta, deberá allegar en un periodo de quince (15) días calendario, posteriores a la notificación del acto administrativo de otorgamiento, un informe de actividades indicando entre otras cosas: cronograma de obra con las talas a ejecutar con la debida georreferenciación y evidencia fotográfica del estado de los árboles antes de realizar las talas autorizadas.

Tabla. cronograma de obra del componente verde.

CONSORCIO VIA CENTRO - NIT 902.740.307-9 CRONOGRAMA DEL COMPONENTE VERDE Resolución 715 del 21/10/2024 'por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal para arboles aislados y se dictan otras disposiciones'																				
ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENOT FORESTAL	NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
ENTREGA DE REQUERIMIENTOS PREVIOS A CORPONOR																				
INSTALACIÓN DE VALLA ENUNCIATIVA																				
IDENTIFICACIÓN DE ARBOLES (el ingeniero forestal y ambiental realizan selecciones parciales de acuerdo a las obras de intervención.																				
PROGRAMACIÓN INICIAL: Tala en alcantarillas																				
PREPARACIÓN DE SITIO: (señalización, ahuyentamiento de fauna, inspección de nidos, suspensión de tráfico)																				
REPIQUE DEL MATERIAL VEGETAL Se procede a disminuir el tamaño del material vegetal																				
DONACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL: El material vegetal en donado a la comunidad del área de influencia.																				
DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL RESTANTE																				
RESTAURACIÓN AMBIENTAL Siembra de 27 árboles.																				

Tabla. Georreferenciación de las unidades de árboles presentados en el inventario forestal.

Name	X	y	Coordenada_X	Coordenada_Y
San 1	5031962	2427730	1362379	1150826
San 2	5031870	2427668	1362317	1150734
San 3	5031808	2427600	1362249	1150672

San 4	5031801	2427594	1362243	1150665
San 5	5031796	2427590	1362239	1150660
San 6	5031795	2427586	1362235	1150659
San 7	5031794	2427582	1362231	1150658
San 8	5031786	2427576	1362225	1150650
San 9	5031782	2427577	1362226	1150646
San 10	5031778	2427572	1362221	1150642
San 11	5031777	2427573	1362222	1150641
San 13	5031750	2427552	1362201	1150614
San 12	5031758	2427556	1362205	1150622
San 14	5031724	2427530	1362178	1150588
San 15	5031723	2427527	1362175	1150587
San 16	5031718	2427518	1362166	1150582
San 17	5031717	2427515	1362163	1150581
San 18	5031719	2427522	1362170	1150583
San 19	5031718	2427520	1362168	1150582
San 20	5031717	2427519	1362167	1150581
San 21	5031715	2427514	1362162	1150579
San 22	5031713	2427513	1362161	1150577
San 23	5031711	2427512	1362160	1150575
San 24	5031709	2427509	1362157	1150573
San 25	5031696	2427485	1362133	1150560
San 26	5031682	2427480	1362128	1150546
San 27	5031680	2427474	1362122	1150544


fotográfico del estado de los árboles antes de realizar las talas autorizadas.

Registro fotográfico del estado de los árboles antes de realizar las talas autorizadas.





CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. 901.740.307-9

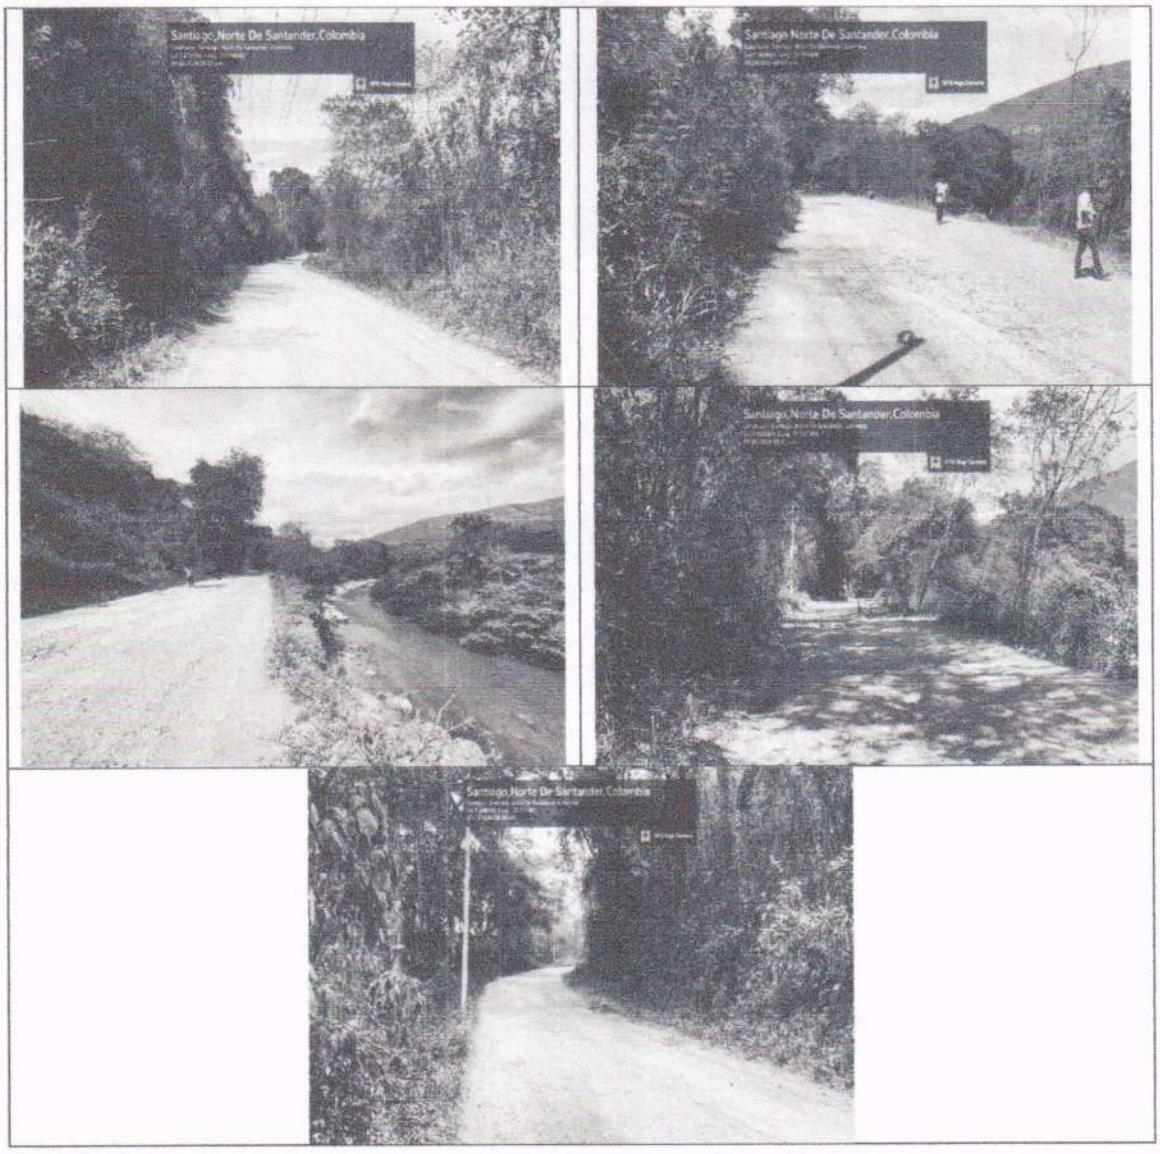

Sin otro particular, se despide.

Atentamente.

MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIA CENTRO

Dirección: Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
Correo: consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

258

FORESAECO SAS
NIT 900741376-8
Calle 0AN #2E-64 Barrio Quinta Bosch, Cúcuta, N. de Santander,
Tel: +57 3125865864
Facturacion@foresaeco.com ; www.foresaeco.co
Somos Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FAEL411
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO VIA CENTRO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CUCUTA, Colombia, Cúcuta, N. de Santander		08/11/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901740307-9	08/11/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PALMA BOTELLA	Unidad	$165,000	50		$8,250,000

Ocho millones doscientos cincuenta mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2024-11-08 10:35:09-05:00
Validación DIAN: 2024-11-08 10:36:09-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: f7ff382dd7340fa9256c1b0043c0610c53a83ddb7ed957ed4434bb8d0b8c37629174d75066a5ce48eb3058f751958ce7

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$8,250,000
Total	$8,250,000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764063417421 de 2024-01-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FAEL340 hasta FAEL500 con vigencia hasta 2025-01-07

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

259

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. 901.740.307-9
CE-AAM-CVC-20241105-01

San José de Cúcuta, 5 de noviembre 2024

Señores
CONSORCIO R&Q - JOYCO
Atn. Ingeniero Yoris Alexander Montaño Manjarrez
Director de Interventoría
E-Mail: cucutilla.cornejo@joyco.com.co
Cúcuta, Colombia

Referencia.
1. Contrato Nº LP-FC-038-2023, Adjudicado al CONSORCIO VIA CENTRO.
2. Cumplimiento a requerimiento del Artículo Quinto, Res 715 del 21/10/2024.
3. Entrega de cotizaciones para la compra de palmas botella.

Respetado ingeniero,
En el marco del cumplimiento de las funciones del contratista y los requisitos contractuales de lo mencionado en la referencia N°1, se le comunica a la interventoría sobre el cumplimiento de la medida de reposición estipulado mediante *Resolución 715 del 21 de octubre del 2024, "por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal y se dictan otras disposiciones".* Pag 11, Artículo Quinto, *como Medida de REPOSICIÓN AMBIENTAL por la naturaleza del permiso a otorgar, debido a la necesidad de hacer tala de veintisiete (27) arboles, el usuario deberá entregar a la subdirección de desarrollo sectorial sostenible de la Corporación, en un término de cinco (5) días hábiles (los cuales serán contemplados a partir de la notificación del presente acto administrativo) una factura de un vivero del área metropolitana por la compra de cincuenta (50) Palmas Botella (Roystonea regia), ejemplares con altura no inferior a tres (03) metros, en bolsa de dos (02) kilos de sustrato material vegetal, que será utilizado por la corporación para proyecto de reforestación.*

Teniendo en cuenta que, para el cumplimiento de dicha compensación, el consorcio debe realizar la respectiva cotización para la compra del material vegetal que debe ser entregado a la corporación, el consorcio hace entrega de 3 cotizaciones con los siguientes proveedores:

Proveedor	Descripción del producto	cantidad	valor
SETAGRO E.U.	PALMAS BOTELLA	50	$11'500.000
VIVERO EL MANÁ	PALMAS BOTELLA EN BOLSAS DE 3KG	50	$10'750.000
FORESAECO S.A.S.	PALMAS BOTELLA	50	$9'100.000

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. 901.740.307-9

Presentamos a la interventoría la empresa FORESAECO S.A.S. como el proveedor para la compra de las 50 palmas botella exigidas como medida de reposición en el Artículo quinto, de la Resolución 715 del 21/10/2024, quedamos a espera de la aprobación de su parte para continuar con el proceso de compra para posteriormente entregar la factura a la corporación.

Sin otro particular, se despide.
Atentamente.

MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIA CENTRO


Numero de folios 2

Dirección: Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
Correo: consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

VIVERO EL MANÁ	VIVERO EL MANÁ	COTIZACION: 37
	NIT. 1090397174 - 1	FORMATO V.01
	FORMATO DE COTIZACIÓN	AÑO 2023

Cliente	CONSORCIO VIA CENTRO		
Identificacion	NIT. 901740307		
Telefono		Creacion	5/11/2024
Correo		Vencimiento	13/11/2024

REFERENCIA	ITEM	PRECIO	CANTIDAD	DESCUENTO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
1	PALMA BOTELLA EN BOLSA DE 3 KG	$ 215.000	50	0	$ 10.750.000	0

VALOR TOTAL EN LETRAS: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS	SUBTOTAL:	$ 10.750.000
VIVERO UBICADO EN VILLA DEL ROSARIO CONTACTO: 3173852757	TOTAL:	$ 10.750.000
	ITEMS:	1
FIRMA: 	DIRECCION: **AUTOPISTA INTERNACIONAL VIA VILLA DEL ROSARIO, FINCA EL SAMAN**	

FORESAECO

FORESAECO SAS
NIT 900741376 -8

+57 3125865864
www.foresaeco.co
Facturacion@foresaeco.com
Calle 0AN #2E-64 Barrio Quinta Bosch - Cúcuta

Cotización

CONSORCIO VIA CENTRO
NIT 901740307
CUCUTA, Cúcuta
TEL

Cotización No. **482**

Fecha de expedición 05/11/2024

Fecha de vencimiento 05/11/2024

Referencia	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PALMA BOTELLA	$182,000	50	0.00%	$9,100,000

Nueve millones cien mil pesos

Observaciones

Subtotal $9,100,000

Total $9,100,000

Total de items: 50

JACK ORTEGA GARNICA

ELABORADO POR

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

261

Servicios Técnicos Agroecológicos, Profesionales y Otros Servicios

RSET201-04

REV FEB-2014

SETAGRO E.U

NIT.807.004.675-7 REGIMEN COMUN

ISO 9001 ICONTEC CERTIFICADO No. SC 1894-1 | ISO 14001 ICONTEC CERTIFICADO No. SA 194-1 | OHSAS 18001 ICONTEC CERTIFICADO No. OSH65-1

COTIZACION Nº 18/18

FECHA 5/11/2024

SEÑORES **CONSORCIO VIA CENTRO**
NIT. 901740307

OBJETO : **SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
50	Palma Botella	$ 230.000	$ 11.500.000
	SUBTOTAL		$ 11.500.000
	IVA	0%	$ 0
	TOTAL		$ 11.500.000

Nuestra empresa esta acreditada por ICONTEC en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, además tiene implementado el SGSST de acuerdo al decreto 1072.

FORMA DE PAGO: Se acuerda con el Cliente


ATENTAMENTE

LUIS HERNANDO MONTAÑEZ RODRIGUEZ
GERENTE

Avenida 7 No. 21N - 55 Estación Centro Empresarial CUCUTA –
Cel: 3213315788
Correo: gerencia_1@setagro.com ; subgerencia_2@setagro.com

Ecopodas y suministros SAS

Podas de árboles, Arreglos, Diseño de Jardines, Revegetalización,
Venta de plantas Ornamentales, Frutales y todo lo relacionado con Jardinería
NIT. 900470461-1 Reg. Común



San José de Cúcuta, 12 de noviembre 2024

SEÑORES:

CONSORCIO R&Q JOYCO

COTIZACION

CANTIDAD	ESPECIE Y ESPECIFICACIONES	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
50	PALMA BOTELLA EN BOLSA DE 3 KG	$ 195.000	$ 9.750.000
		Total	$ 9.750.000

FREDDY LANDINEZ MANRQUE
Representante legal

A &J FORESTAL MULTISERVICIOS S.A.S

Dejando Huella Ambiental

Nit: 901.127.403-1

San José de Cúcuta, 06 de noviembre de 2024

Señores:
CONSORCIO R&Q - JOYCO
NIT. 901577842 - 1
Cúcuta

1. COMPONENTE ECONÓMICO APROVECHAMIENTO FORESTAL

COSTOS					
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Palma botella en Bolsa de 3 kg	ÁRBOL	50	$165.000	$8.250.000
TOTAL					$8.250.000

Agradecemos la oportunidad a cotizar y deseamos hacer parte de este gran Proyecto.

JUAN RAMÓN MANJARREZ DURAN
Contacto: 3185529847
Representante legal

Consorcio
R&Q - Joyco

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190

VIVERO EL MANÁ descripción material vegetal (palma botella en bolsa de 3 kg	50	$215.000	$ 10.750.000
SETAGRO E.U. descripción del material vegetal (palma botella	50	$ 230.000	$ 11.500.000

COTIZACIONES GESTIONADA POR LA INTERVENTORIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A &J FORESTAL MULTISERVICIOS S.A.S Descripción del material vegetal ((palma botella en bolsa de 3 kg)	50	$165.000	$8.250.000

Del análisis anterior, se tiene que la cotización gestionada por la interventoría es más económica que la presentada por el CVC, sin embargo, el Contratista es autónomo de realizar la compra con el proveedor de su preferencia, siempre y cuando no se supere el menor valor registrado en el análisis realizado, cuyo valor para la compra de las 50 palmas es de $ 8.500.000.

Así mismo solicitamos que en la factura de compra el proveedor deberá especificar la obligación ambiental como aparece en el permiso "cincuenta (50) Palmas Botella (Roystonea regia), ejemplares con altura no inferior a tres (03) metros, en bolsa de dos (02) kilos de sustrato material vegetal", presentar registro fotográfico del material vegetal y radicado de la factura a CORPONOR, y respectivos soportes de pago al proveedor seleccionado. Lo anterior para anexar como soporte al plan de inversión ambiental y posterior reconocimiento en actas de pago ambiental.

Sin otro Particular. Cordialmente,

YORIS ALEXANDER MONTAÑO M.
Director Interventoría.
Consorcio R&Q - JOYCO

C.C. Archivo JOYCO S.A.S.
Ing. Leonel Valero Supervisor del Convenio -INVIAS lvalero@invias.gov.co
Arq. Víctor Peña Maldonado. Gerente EICE Faro del Catatumbo.eicefarodelcatatumbosas@nortedesantander.gov.co
Arq. Efraín Pacheco Sec. Infraestructura y vías – Gobernación secvias@nortedesantander.gov.co
Ing. Héctor Miguel Diaz. Gerente Consorcio R&Q- JOYCO hector.diaz@joyco.com.co

Elaboró:	CIAT	Revisó:	YAM	Aprobó:	YAM	Archivo:

Anexos: cotización del vivero A &J FORESTAL MULTISERVICIOS S.A.S

Seguimiento:

Consorcio
R&Q - Joyco

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190

Cúcuta, 07 de noviembre de 2024
19-11-2024/1032-2022
Cornejo - Cucutilla

CC-777

Señor(es)
MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante legal
CONSORCIO VIA CENTRO
Dirección consorcioviacentro@gmail.com
Cúcuta, Colombia

Referencia:

1. Contrato de interventoría No. 1032 de 2022 INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".
2. Proceso de LP-FC-038-2023 CONSORCIO VIA CENTRO. Respuesta comunicación CE-AAM-CVC-20241105-01 radicado de interventoría de 6 de noviembre, Entrega de cotizaciones para la compra de palmas botella.
3. Respuesta cumplimiento de medida de compensación ambiental permiso de tala y poda permiso ambiental del tramo 2.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con la información allegada respecto a cotizaciones para cumplimiento de la medida de compensación ambiental estipulada por CORPONOR en la resolución la Resolución 715 del 21 de octubre del 2024, "por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal y se dictan otras disposiciones". Pag 11, Artículo Quinto, como Medida de REPOSICIÓN AMBIENTAL por la naturaleza del permiso a otorgar, debido a la necesidad de hacer tala de veintisiete (27) arboles, el usuario deberá entregar a la subdirección de desarrollo sectorial sostenible de la Corporación, en un término de cinco (5) días hábiles (los cuales serán contemplados a partir de la notificación del presente acto administrativo) una factura de un vivero del área metropolitana por la compra de cincuenta (50) Palmas Botella (Roystonea regia), ejemplares con altura no inferior a tres (03) metros, en bolsa de dos (02) kilos de sustrato material vegetal, que será utilizado por la corporación para proyecto de reforestación, ***de la cual se resuelve recurso de reposición bajo la resolución N° 740 del 5 de noviembre del 2024 de CORPONOR.***

De acuerdo con lo antes mencionado, nos permitimos manifestar que se adelantó el análisis y evaluación de las cotizaciones presentadas por el Consorcio Vía Centro y además se gestionaron cotizaciones por parte de esta interventoría en viveros de la región (se anexa cotización) de las cuales se tiene:

COTIZACIONES GESTIONADAS POR EL CONTRATISTA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FORESAECO SAS descripción material vegetal (palma botella)	50	$182,000	$9,100,000

FORESAECO SAS
NIT 900741376 -8

+57 3125865864
www.foresaeco.co
Facturacion@foresaeco.com
Calle 0AN #2E-64 Barrio Quinta Bosch - Cúcuta

Cotización

CONSORCIO VIA CENTRO
NIT
901740307
CUCUTA, Cúcuta
TEL

Cotización No. **488**

Fecha de expedición 07/11/2024

Fecha de vencimiento 07/12/2024

Referencia	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PALMA BOTELLA	$165 ,000	50	0.00%	$8,250,000

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

Ocho millones doscientos cincuenta mil pesos

Observaciones

Subtotal $8,250,000

Total $8,250,000

Total de ítems: 50

ELABORADO POR

265

SIEP Corponor

Radicado 2024010150125252 ?

Entidad	Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental
Fecha Radicacion	10/11/2024
Tipo PQR	Otras Solicitudes
Tema	Otras Solicitudes
Remitente	CONSORCIO VIA CENTRO CONSORCIO VIA CENTRO MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Asunto	el CONSORCIO VIA CENTRO hace la primera entrega de cumplimientos a la resolución 715 del 21-oct-2024 'por medio de la cual se otorga un permiso de aprovechamiento para arboles aislados y se dictan otras disposiciones'.
Tipo Documento	Nit
Numero	9017403079
Envío de Correo	Correo de Confirmación Enviado Correctamente al Solicitante

A- A+

Imprimir Regre

Corporación autónoma regional de la Frontera

Corporonor

Corporonor
Dirección: Calle 13 Av. El Bosque #3E-278, Los Caobos, Cúcuta, Norte de Santander.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 7:15 A.M a 12:00 M y 2:15 P.M a 6:00 P.M.
Contáctenos:
Atención al ciudadano: (+57)(60)(7) 5828484
Notificaciones Judiciales: procesosjudicialescorponor@corponor.gov.co
(Correo Exclusivo para Juzgados y/o Despachos Judiciales)

A-

A+

@CORPONOR @corponor_ns @CorponorNortedeSantander

Política de Privacidad, Seguridad y Términos de uso

206

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. 901.740.307-9
CE-AAM-CVC-20241110-01

San José de Cúcuta, 10 de noviembre del 2024

Señores
CORPONOR
Corporación Autónoma Regional de la frontera Nororiental.
Dirección: Calle 13 Av. El Bosque #3E-278 San José de Cúcuta.

Referencia.

1. Proyecto de mejoramiento vial, contrato N°LP-FC-38-2023 adjudicado al CONSOCIO VIA CENTRO.
2. Resolución 715 del 21/10/2024, 'por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal para arboles aislados y se dictan otras disposiciones'
3. Entrega de cumplimientos N°1.

Cordial saludo, por medio de la presente el CONSORCIO VIA CENTRO con número de identificación tributario NIT. 901.740.307-9, representada legalmente por el abajo firmante, comunica a la corporación que hace la primera entrega de cumplimientos a la *Resolución 715 del 21/10/2024, 'por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal para arboles aislados y se dictan otras disposiciones',*

ARTICULO TERCERO. El beneficiario deberá cumplir con las siguientes consideraciones, obligaciones y prohibiciones:
*1*Las talas autorizadas, deben ser ejecutadas preferiblemente por personas que tengan la certificación de capacitación e idoneidad en la materia expedida por una entidad competente de técnicas silviculturales y utilizando tanto los equipos como los insumos necesarios para tal fin.*

En cumplimiento al artículo tercero, numeral 1* se relaciona el link de descarga de la hoja de vida del contratista encargado de la ejecución de las actividades de aprovechamiento forestal.
https://drive.google.com/drive/folders/1ziXgKRc9q7h8NvaocQ8QRNxhAHdLyJat?usp=drive_link

*6*Así mismo, para acceder a la ejecución de lo autorizado la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificado con Nit. 901740307-9 representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ identificado con la cédula de ciudadanía No 1.090.473.156, expedida en Cúcuta, deberá instalar una valla en el sector, en un lugar visible y de fácil localización donde se informe el objeto de las labores, número de la resolución del permiso de intervención del componente arbóreo, número de árboles autorizados para la poda, compensaciones etc., la valla debe ir acompañada de un mensaje ecológico y debe tener unas dimensiones de 3,00 x 2,50 m.*

en cumplimiento al artículo tercero numeral 6* se relaciona el registro fotográfico como evidencia del cumplimiento de la obligación.

Registro fotográfico de la instalación de la valla informativa.


Artículo quinto modificado mediante recurso de reposición otorgado con acto administrativo Resolución 740 del 05/11/2024, ARTICULO PRIMERO: Acceder de manera parcial, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, consistente en la, MODIFICACIÓN, del ARTICULO QUINTO de la resolución N°715 de 21 de octubre de 2024 "reposición ambiental", de conformidad con lo recurrido, el cual quedara asi:

> *"ARTICULO QUINTO: Por la naturaleza del permiso a otorgar debido a la necesidad de realizar la tala de veintisiete (27) arboles, se calcula la compensación en base a las necesidades de la corporación para el cumplimiento de los planes de reforestación plasmados en el plan de acción, por lo tanto, el usuario deberá entregar a la subdirección de desarrollo sectorial sostenible de la Corporación, en un término de cinco días hábiles (los cuales serán contados a partir de la notificación del presente acto administrativo) una factura de un vivero del área metropolitana por la compra de cincuenta (50) palmas Botella (Roystonea regia), ejemplares con altura no inferior a tres (3) metros, en bolsa de dos (2) kilos de sustrato material vegetal que sera utilizado por la Corporación para los proyectos de reforestación."*

En cumplimiento a la medida de reposición establecida en el artículo quinto de la resolución 715 del 21/10/2024, se hace entrega de la factura por concepto de compra de 50 palmas tipo botella, figurando como proveedor FORESAECO S.A.S. con NIT. 900.741.376-8, ver adjunto a esta comunicación la factura en cuestión. *"material vegetal que será utilizado por*

la Corporación para los proyectos de reforestación." *https://drive.google.com/file/d/1jCMKeddXzt5E4kszUnJKaQG6URLGnLVT/view?usp=drive_link*

ARTICULO SEPTIMO: La empresa CONSORCIO VIA CENTRO, Identificado con Nit. 901740307-9 representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ identificado con la cédula de ciudadanía No 1.090.473.156, expedida en Cúcuta, deberá allegar en un periodo de quince (15) días calendario, posteriores a la notificación del acto administrativo de otorgamiento, un informe de actividades indicando entre otras cosas: cronograma de obra con las talas a ejecutar con la debida georreferenciación y evidencia fotográfica del estado de los árboles antes de realizar las talas autorizadas.

Tabla. cronograma de obra del componente verde.

CONSORCIO VIA CENTRO - NIT 902.740.307-9
CRONOGRAMA DEL COMPONENTE VERDE
Resolución 715 del 21/10/2024
'por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal para arboles aislados y se dictan otras disposiciones'

ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENOT FORESTAL	NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
ENTREGA DE REQUERIMIENTOS PREVIOS A CORPONOR																				
INSTALACIÓN DE VALLA ENUNCIATIVA																				
IDENTIFICACIÓN DE ARBOLES (el ingeniero forestal y ambiental realizan selecciones parciales de acuerdo a las obras de intervención.																				
PROGRAMACIÓN INICIAL: Tala en alcantarillas																				
PREPARACIÓN DE SITIO: (señalización, ahuyentamiento de fauna, inspección de nidos, suspensión de tráfico)																				
REPIQUE DEL MATERIAL VEGETAL Se procede a disminuir el tamaño del material vegetal																				
DONACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL: El material vegetal en donado a la comunidad del área de influencia.																				
DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL RESTANTE																				
RESTAURACIÓN AMBIENTAL Siembra de 27 árboles.																				

Tabla. Georreferenciación de las unidades de árboles presentados en el inventario forestal.

Name	X	y	Coordenada_X	Coordenada_Y
San 1	5031962	2427730	1362379	1150826
San 2	5031870	2427668	1362317	1150734
San 3	5031808	2427600	1362249	1150672

San 4	5031801	2427594	1362243	1150665
San 5	5031796	2427590	1362239	1150660
San 6	5031795	2427586	1362235	1150659
San 7	5031794	2427582	1362231	1150658
San 8	5031786	2427576	1362225	1150650
San 9	5031782	2427577	1362226	1150646
San 10	5031778	2427572	1362221	1150642
San 11	5031777	2427573	1362222	1150641
San 13	5031750	2427552	1362201	1150614
San 12	5031758	2427556	1362205	1150622
San 14	5031724	2427530	1362178	1150588
San 15	5031723	2427527	1362175	1150587
San 16	5031718	2427518	1362166	1150582
San 17	5031717	2427515	1362163	1150581
San 18	5031719	2427522	1362170	1150583
San 19	5031718	2427520	1362168	1150582
San 20	5031717	2427519	1362167	1150581
San 21	5031715	2427514	1362162	1150579
San 22	5031713	2427513	1362161	1150577
San 23	5031711	2427512	1362160	1150575
San 24	5031709	2427509	1362157	1150573
San 25	5031696	2427485	1362133	1150560
San 26	5031682	2427480	1362128	1150546
San 27	5031680	2427474	1362122	1150544


fotográfico del estado de los árboles antes de realizar las talas autorizadas.

Registro fotográfico del estado de los árboles antes de realizar las talas autorizadas.





CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. 901.740.307-9

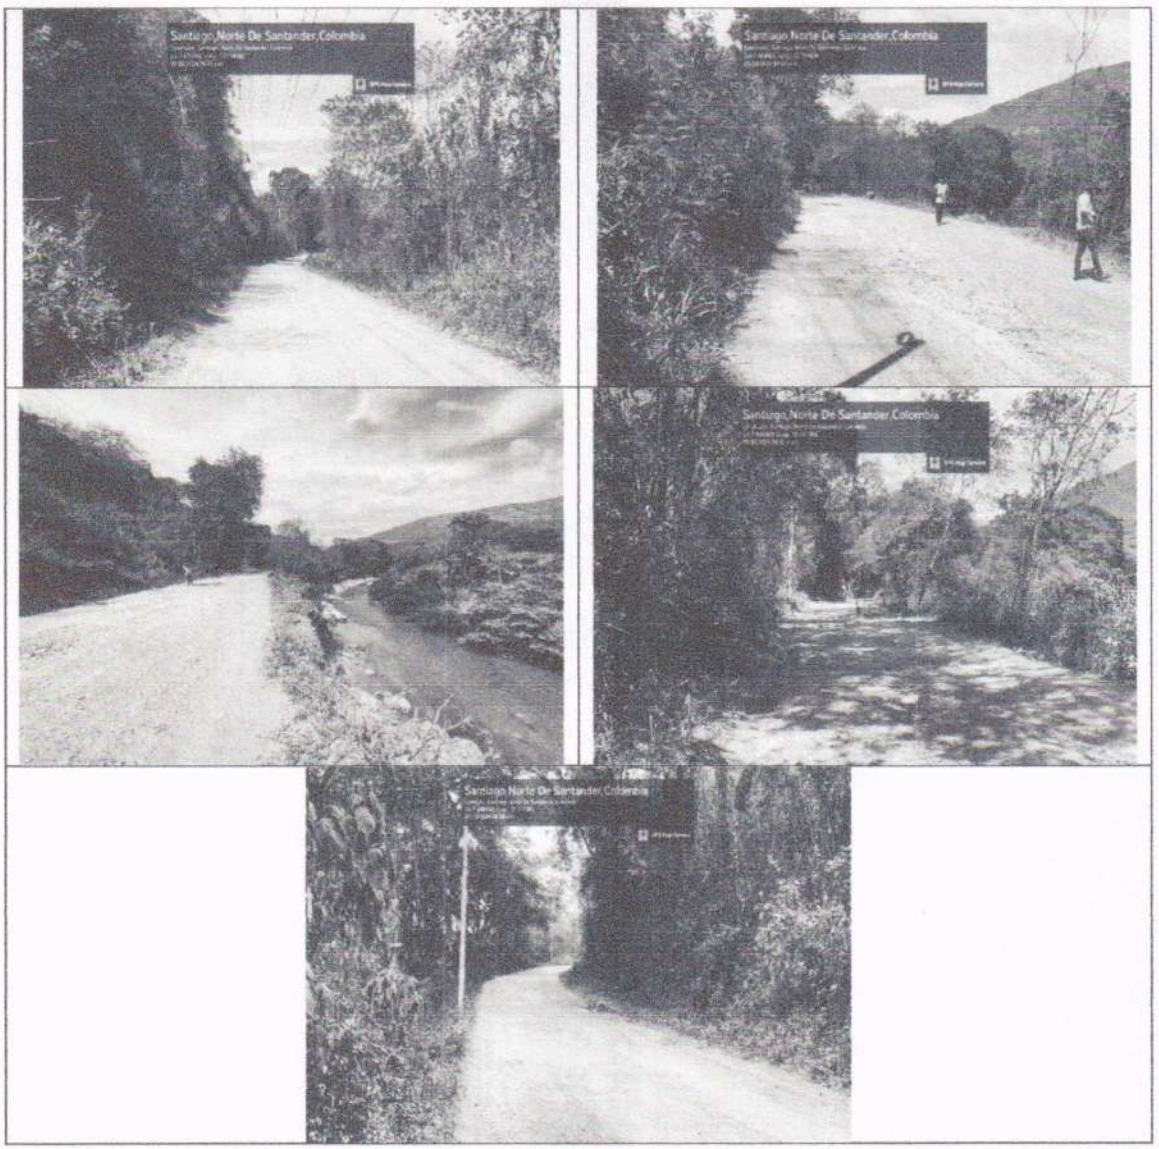


Sin otro particular, se despide.

Atentamente.

MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIA CENTRO

Dirección: Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
Correo: consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

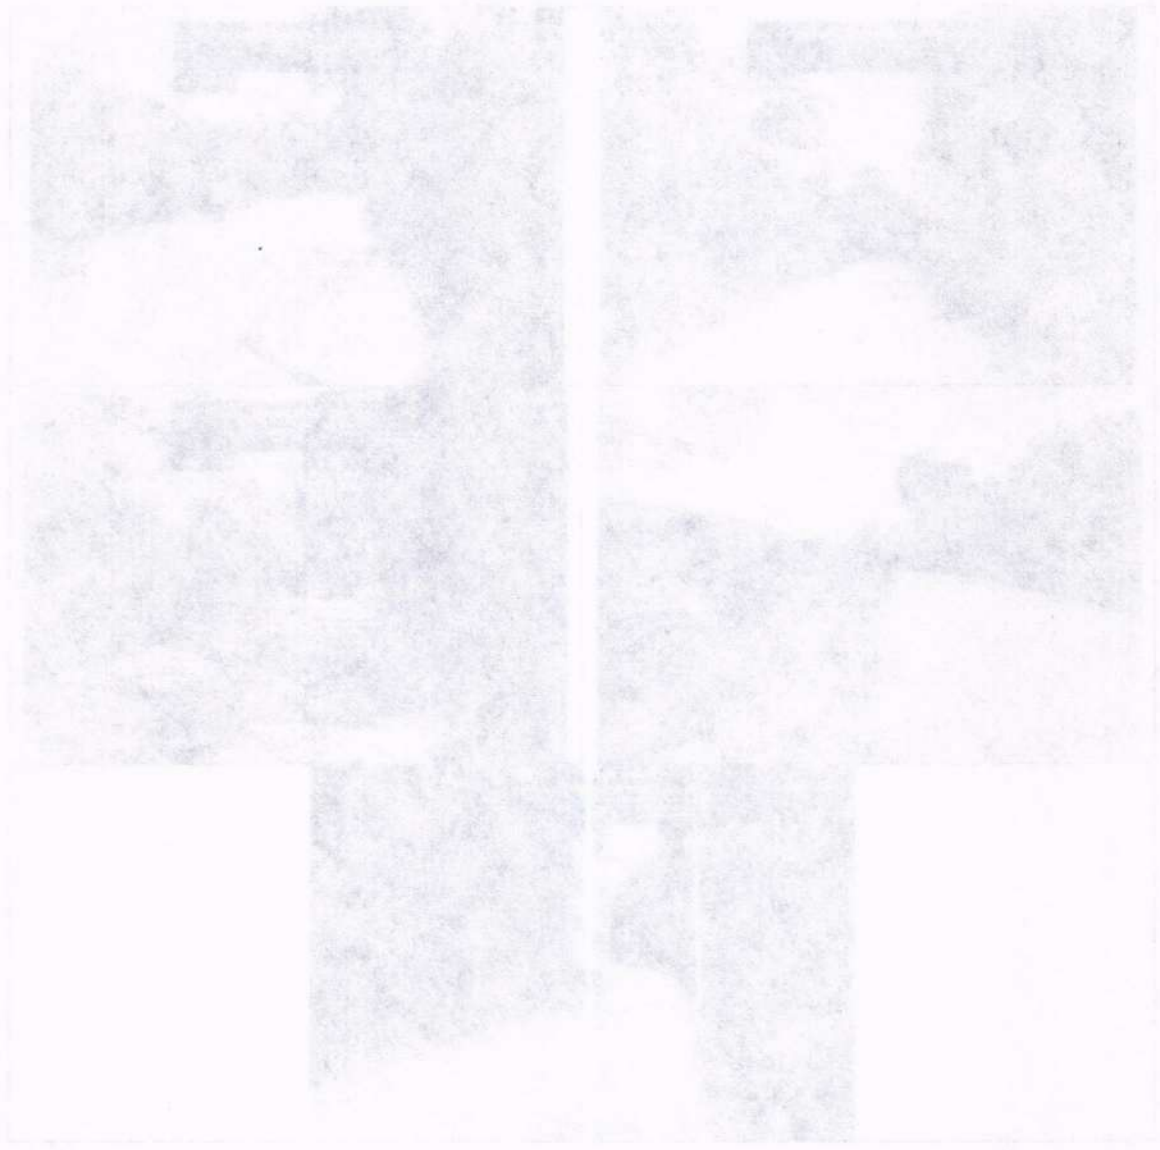

269

ADOLFO LEON BERRIO MURILLO
13.486.370-3
CALLE 16 No 5 - 73 BARRIO LA CABRERA
(undefined) 5713267 - Ext. undefined
Cúcuta - Colombia
publicidadbermur2012@hotmail.com

Bemur PUBLICIDAD

Factura electrónica de venta N°. B 1070

Cliente: CONSORCIO VIA CENTRO
Nit: 901.740.307-9
Teléfono: (607) 5729321 - Ext. 000
Dirección: CL 10 5 50 LC 27 ED CENTRO AGROBANCARIO
Ciudad: Cúcuta - Colombia
Correo: consorcioviacentro@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	12/11/2024, 13:48
Expedición	12/11/2024, 13:49
Vencimiento	12/11/2024
Vendedor	ADOLFO LEON BERRIO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE VALLA EN LONA BANNER 13 ONZAS DE 3,00 X 2,50 MTS PARA PERMISO CORPONOR, CON OJALES EN LOS 4 LADOS	1.00	410,000.00	77,900.00	487,900.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 487,900.00

Total Bruto	**410,000.00**
IVA 19%	**77,900.00**
Total a Pagar	**487,900.00**

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076874227 aprobado en 20240809 prefijo B desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa 6*1000
CUFE:
7dee6ccb4880709fcde8c1e153f227b1ea875249cdeabe6bd03799da74c7cf5c3816cb30f8f00942015c4c331b0a566b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. 901.740.307-9
CE-AAM-CVC-20241106-01

San José de Cúcuta, 6 de noviembre 2024

Señores
CONSORCIO R&Q - JOYCO
Atn. Ingeniero Yoris Alexander Montaño Manjarrez
Director de Interventoría
E-Mail: cucutilla.cornejo@joyco.com.co
Cúcuta, Colombia

Referencia.

1. Contrato Nº LP-FC-038-2023, Adjudicado al CONSORCIO VIA CENTRO.
2. Cumplimiento a de la instalación de dos (1) valla informativas permiso de aprovechamiento forestal de TRAMO 2.
3. Entrega de cotizaciones para la compra e instalación de una valla informativa.

Respetado ingeniero,

En el marco del cumplimiento de las funciones del contratista y los requisitos contractuales de lo mencionado en la referencia N°1, se le comunica a la interventoría sobre el cumplimiento de la instalación de una (1) valla informativa en el tramo de vía denominado TRAMO 2 estipuladas mediante *Resolución 715 del 21 de octubre del 2024, "por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal y se dictan otras disposiciones"*. Pag 10, Artículo Tercero, numeral 6. *Asi mismo para acceder a la ejecución de lo autorizado la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificada con Nit. 901.740.307-9 representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ identificado con la cedula de ciudadanía No 1'090.473.156, expedida en Cúcuta, deberá instalar una valla en el sector, en un lugar visible y de fácil localización donde se informe el objeto de las labores, numero de la resolución del permiso de intervención del componente arbóreo, numero de árboles autorizados para la poda, compensaciones, etc., la valla debe ir acompañada de un mensaje ecológico y debe tener unas dimensiones de 3,00 x 2,50mt.*

Imagen 2. Valla de información a ubicar por el usuario.



1. **Fuente: CORPONOR, 2024.**

Teniendo en cuenta que, para el cumplimiento de dicha compensación, el consorcio debe realizar la respectiva cotización para la compra e instalación de la valla, dicho esto el consorcio hace entrega de 3 cotizaciones con los siguientes proveedores:

Proveedor	Descripción del producto	cantidad	valor
BEMUR PUBLICIDAD	Suministro de valla en lona banner 13 onzas de 3,0x2,5m para permiso de Corponor, con ojales en los 4 lados.	1	$487.900
DP & PUBLICIDAD	1 valla en lona Banner de 3,0x2,5m, Impresión digital, ojales	1	$571.200
COLORPRINT PUBLICIDAD	Suministro 1 valla de 3,00 x 2,50 m, lona banner y ojaletes	1	$510.000

Presentamos a la interventoría la empresa BEMUR PUBLICIDAD como el proveedor para la compra e instalación de la valla exigida en el Articulo tercero, Numeral 6 de la Resolución 715 del 21/10/2024, quedamos a espera de la aprobación de su parte para continuar con el proceso de compra para la posterior aprobación.

Sin otro particular, se despide.
Atentamente.

MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIA CENTRO

Numero de folios 2

COLORPRINT
Publicidad

AVENIDA 6 # 15-97 CENTRO
Nit: 1092334934-3
No Responsable de I.V.A

Fecha Factura	31	10	2024
Fecha de Vencimiento			

COTIZACIÓN *No. 503*

SEÑOR(ES): **CONSORCIO VIA CENTRO** C.C. O NIT.: _____


DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
(1)	**Suministro 1 valla de 3,0 X 2.50 M .lona banner y ojaletes.**	**$ 510.000**
	TOTAL	**$ 510.000**

Impreso por Colorprintcucuta y / o Pablo Fabian Parra Nit: 1092334934-3

IMPRESION DIGITAL GRAN FORMATO
Fabian Parra
305 264 15 15
E-mail:Colorprintcucuta@hotmail.c
IDEAS • IMPRESION • IMAGEN CORPORATIVA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).



Bemur PUBLICIDAD

Regimen Comun
Nit . 13 486 370-3

BOTONES PUBLICITARIOS
TARJETAS DE PRESENTACION
DISEÑO GRAFICO
SEÑALIZACION VIAL
PASACALLES
PENDONES
CALCOMANIAS
ESTAMPADOS

San jose de cucuta, Octubre 31 de 2024

Señores: **CONSORCIO VIA CENTRO.**

Ciudad.

Cordial Saludo
La presente con el fin de cotizar el suministro e instalación de valla , asi:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
Suministro de valla en lona banner 13 onzas de 3,00 x 2,50 mts para permiso corponor, con ojales en los 4 lados	1	$ 410.000	$ 410.000
		IVA	$ 77.900
		TOTAL	$ 487.900

att.
ADOLFO BERRIO MURIILO

CALLE 16 No. 5 - 73 Barrio la Cabrera CEL. 315 565 26 87/3006098838 / Email. publicidadbemur2012@hotmail.com



BOTONES PUBLICITARIOS
TARJETAS DE PRESENTACION
DISEÑO GRAFICO
SEÑALIZACION VIAL
PASACALLES
PENDONES
CALCOMANIAS
ESTAMPADOS

San Jose de Cúcuta, 31 de Oct. / 2024

Señores

CONSORCIO VÍA AL CENTRO

Cordial Saludo

La presente para cotizar el suministro del siguiente trabajo:

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO
1 VALLA EN LONA BANNER DE 3,0 X 2.50 M . IMPRESIÓN DIGITAL „ HOJALES.	1	$ 480.000
	SUBTOTAL	$ 480.000
	IVAL	$ 91.200
	TOTAL	$ 571.200

Cll 12 # 10-28 El Contento local 02 / CEL. 301 4631343
Email. dyppublicidad2020@gmail.com

Signos PUBLICIDAD

Impresión Digital
Avisos Luminosos
Vallas Publicitarias
Letras en acero y acrílico
Señalización

COTIZACIÓN

SEÑORES : CONSORCIO R&Q JOYCO

CUCUTA, 13 DE NOV 2024

Suministro de valla en lona banner 13 onzas de 3,0x2,5m, con ojales en los 4 lados.

Valor Total.....$ 640.000 No Responsable de IVA

Diana Berrio Sarmiento

313 400 5297
318 509 5674
publicidadsignos1@gmail.com
Publicidadsignos
Av 6 # 15 - 81 El Paramo

San José de Cúcuta, 6 de noviembre 2024

CONSORCIO R&Q – JOYCO

Nos permitimos presentar la siguiente cotización solicitada para intalacion de vallas de acuerdo a las siguientes especificaciones de material y medidas.

Descripcion	cantidad	Valor unitario
Suministro de valla en lona banner 13 onzas de 3,0x2,5m, con ojales en los 4 lados.	1	$ 590.000
Valor total : $ 590.000 (sin IVA incluido)		

Nota: Los valores incluyen no IVA

Para efectos contables: ***SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, POR FAVOR NO APLICAR DESCUENTOS DE RETE FUENTE, NI RETE ICA***

Atentamente
Sandra Bautista
Gerente

Diagonal Santander N° 6 - 45 Cucuta
+57 301 421 86 44
097 571 67 36
trazospublicidad.com
trazos_publicidad@hotmail.com
Paul Hernández - Diseñador Gráfico Profesional

Consorcio
R&Q - Joyco

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190

Cotización del contratista	Valor total	Cotización gestionada por la interventoría	Valor total
Empresa BEMUR PUBLICIDAD	$ 487. 900	Empresa Trazos publicidad	$ 590 no incluye IVA
Empresa COLORPRINT	$ 510.000		

De acuerdo con lo anterior se aprueba la cotización de la empresa BEMUR PUBLICIDAD, que cumple con las especificaciones y medidas estipuladas por Corponor.

Sin otro Particular. Cordialmente,

YORIS ALEXANDER MONTAÑO M.
Director Interventoría.
Consorcio R&Q - JOYCO
C.C. Archivo JOYCO S.A.S.
Ing. Leonel Valero Supervisor del Convenio -INVIAS lvalero@invias.gov.co
Ing. Freddy Fontiveros. Gerente EICE Faro del Catatumbo.eicefarodelcatatumbosas@nortedesantander.gov.co
Arq. Efraín Pacheco Sec. Infraestructura y vías – Gobernación secvias@nortedesantander.gov.co
Ing. Héctor Miguel Diaz. Gerente Consorcio R&Q- JOYCO hector.diaz@joyco.com.co

Elaboró:	CIAT	Revisó:	YAM	Aprobó:	YAM	Archivo:

Anexos: se anexa cotización gestionada por la interventoría.

Seguimiento: no

Consorcio
R&Q - Joyco

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190

Cúcuta, 7 de noviembre de 2024
18-11-2024/1032-2022
Cornejo - Cucutilla

CC-775

Señor(es)
MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante legal
CONSORCIO VIA CENTRO
Dirección consorcioviacentro@gmail.com
Cúcuta, Colombia

Referencia:

1. Contrato de interventoría No. 1032 de 2022 INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".
2. Proceso de LP-FC-038-2023 CONSORCIO VIA CENTRO. Respuesta oficio CE-AAM-CVC-20241106-01 del 6 de noviembre de 2024, cotizaciones valla tramo 2, permiso de tala y poda.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con la información allegada respecto a las cotizaciones para la instalación de la valla en el tramo 2, en cumplimiento a lo estipulado en la resolución Resolución 715 del 21 de octubre del 2024, "por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal y se dictan otras disposiciones". Pag 10, Artículo Tercero, numeral 6. El cual reza:

" Asi mismo para acceder a la ejecución de lo autorizado la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificada con Nit. 901.740.307-9 representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ identificado con la cedula de ciudadanía No 1'090.473.156, expedida en Cúcuta, deberá instalar una valla en el sector, en un lugar visible y de fácil localización donde se informe el objeto de las labores, numero de la resolución del permiso de intervención del componente arbóreo, numero de árboles autorizados para la poda, compensaciones, etc., la valla debe ir acompañada de un mensaje ecológico y debe tener unas dimensiones de 3,00 x 2,50mt."

Nos permitimos revisar las cotizaciones presentadas por ustedes así mismo la interventoría realizo gestión de una cotización, reiterando que se deberá aprobar la cotización de menor valor.

275

FORESAECO SAS
NIT 900741376-8
Calle 0AN #2E-64 Barrio Quinta Bosch, Cúcuta, N. de Santander,
Tel: +57 3125865864
Facturacion@foresaeco.com ; www.foresaeco.co
Somos Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FAEL446
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO VIA CENTRO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CUCUTA, Colombia, Cúcuta, N. de Santander		27/01/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901740307-9	27/01/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SUMINISTRO TU Y YO(EN BOLSA DE 2 KG)	Unidad	$15,000	15		$225,000

Doscientos veinticinco mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-01-27 13:18:33-05:00
Validación DIAN: 2025-01-27 13:19:34-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: e2e3db86a9f32962432d1ff6f71dfb167219b53ca3fc872bd00c3d2de2f9eb1280de79ea6ae34e22c5265e8dcda01efb

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$225,000
Total	$225,000

Total de lineas: 1

JHON ORTEGA GARNICA

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764087547824 de 2025-01-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FAEL444 hasta FAEL500 con vigencia hasta 2026-01-22

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

SIEP Corponor

Radicado 2025010150008322

Entidad	Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental
Fecha Radicacion	27/01/2025
Tipo PQR	Otras Solicitudes
Tema	Otras Solicitudes
Remitente	CONSORCIO VIA CENTRO CONSORCIO VIA CENTRO MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Asunto	ENTREGA DE REQUERIMIENTOS N°1 DEL PERMISO FORESTAL RESOLUCIÓN 802 DEL 21-11-2024 OTORGADO POR LA CORPORACIÓN AL CONSORCIO VIA CENTRO
Tipo Documento	Nit
Numero	9017403079
Envío de Correo	Correo de Confirmación Enviado Correctamente al Solicitante

A- A+

Imprimir Regresar

Corporación autónoma regional de la Frontera

Corponor

Corponor
Dirección: Calle 13 Av. El Bosque #3E-278, Los Caobos, Cúcuta, Norte de Santander.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 7:15 A.M a 12:00 M y 2:15 P.M a 6:00 P.M.
Contáctenos:
Atención al ciudadano: (+57)(60)(7) 5828484
Notificaciones Judiciales: procesosjudicialescorponor@corponor.gov.co
(Correo Exclusivo para Juzgados y/o Despachos Judiciales)

A-

A+

@CORPONOR @corponor_ns @CorponorNortedeSantander

Política de Privacidad, Seguridad y Términos de uso

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. 901.740.307-9

CE-AAM-CVC-20250127-02

San José de Cúcuta, 27 de enero del 2025

Señores
CORPONOR
Corporación Autónoma Regional de la frontera Nororiental.
Dirección: Calle 13 Av. El Bosque #3E-278 San José de Cúcuta.

Referencia.

1. Resolución 802 del 21/11/2024, 'por la cual se otorga un permiso forestal para arboles aislados y se dictan otras disposiciones'.
2. Entrega del primer informe de cumplimientos.
3. Entrega de soportes por concepto de compensación y cronogramas de actividades.

Cordial saludo,
Por medio de la presente el CONSORCIO VÍA CENTRO identificado con NIT. 901.740.307-9, Representada por el suscrito, hace entrega de evidencia documental que respalda el cumplimiento de las disposiciones de la Resolución 802 del 21 de noviembre de 2024. "Por el cual se otorga un permiso forestal para arboles aislados y se dictan otras disposiciones" en cumplimiento a los artículos tercero, quinto y séptimo se tiene que:

ARTÍCULO TERGERO. El beneficiario deberá cumplir con las siguientes consideraciones, obligaciones y prohibiciones:
1. La tala autorizada, deben ser ejecutadas preferiblemente por personas que tengan la certificación de capacitación e idoneidad en la materia expedida por una entidad competente de técnicas silviculturales y utilizando tanto los equipos como los insumos necesarios para tal fin.

En cumplimiento al artículo tercero: La empresa **FORESAECO S.A.S. con NIT. 900.741.376-8 ubicada en la dirección Calle 0AN #2E-64 Barrio Quinta Bosch-Cúcuta.** Sera la encargada de los procedimientos de aprovechamiento forestal, la información sera encontrada mediante el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1ziXgKRc9q7h8NvaocQ8QRNxhAHdLyJat?usp=drive_link

ARTICULO QUINTO: Como medida de REPOSICIÓN AMBIENTAL Por la naturaleza del permiso a otorgar debido a la necesidad de realizar la tala de un (1) árbol, se calculará en relación

1:15, por lo cual, el usuario deberá entregar a la Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible de la Corporación, en un término de 5 días hábiles (los cuales serán contados a partir de la notificación del presente acto administrativo) una factura de un vivero del área metropolitana por la compra de quince (15) árboles de la especie Tú y yo (Euphorbia mili), en bolsa de dos (02) kilos de sustrato material vegetal que será utilizado por la Corporación para los proyectos de reforestación.

En cumplimiento al artículo quinto: se hace entrega de la factura N°FAEL446 proporcionada por el proveedor FORESAECO S.A.S. por la compra de (15) árboles de la especie Tú y yo (Euphorbia mili), en bolsa de dos (02) kilos de sustrato material vegetal que será utilizado por la Corporación para los proyectos de reforestación. Descargar soporte mediante el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/17Z6XmtlqTKM5rS1C6-3l8inJ7En73exB/view?usp=drive_link

ARTICULO SEPTIMO: La empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificado con Nit. 901740307-9 representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ identificado con la cédula de ciudadanía No 1.090.473.156, expedida en Cúcuta, deberá allegar en un periodo de quince (15) días calendario, posteriores a la notificación del acto administrativo de otorgamiento, un informe de actividades indicando entre otras cosas: cronograma de obra con la tala a ejecutar con la debida georreferenciación y evidencia fotográfica del estado del árbol antes de realizar la tala autorizada.

CONSORCIO VIA CENTRO NIT. 901.740.307-9
CRONOGRAMA DE OBRA PARA EL COMPONENTE VERDE

RESOLUCIÓN 802 DEL 21 DE NOV DE 2024, "Por e cual se otorga un permiso forestal para arboles aislados y se dictan otras disposiciones". Otorgado por CORPONOR
Vigencia del permiso por tres (3) meses.
Hasta 20 mayo de 2025

ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	ENERO				FEBRERO				MARZO			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
ENTRGA DE REQUERIMIENTOS PREVIOS A CORPONOR												
INTALACIÓN DE VALLAS (2)												
IDENTIFICACIÓN DEL ARBOL: El Ingeniero forestal y ambiental realizan identificación de acuerdo a las obras de intervención.												
PROGRAMACIÓN DE LA TALA: Por ejecución de obra												
PREPARACIÓN DEL SITIO (Señalización, Ahuyentamiento de fauna, Inspección de nidos, suspension del trafico)												
REPIQUE: se procede a disminuir el tamaño de material vegetal												
DONACIÓN: El material vegetal es donado a la comunidad												
ELIMINACIÓN DE DESECHOS												
RETAURACIÓN AMBIENTAL: plantación y manteniminetos												

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. 901.740.307-9

Adicionalmente se hace entrega del permiso de intervención otorgado por la propietaria del predio la señora RUMITH SILVA CARRILLO. Descargar el soporte mediante el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1yBKWsWr7wwG4vZxm0gvZftzure1ZPGUB/view?usp=drive_link

conforme se vallan implementando las demás medidas compensatorias se oficiará dando alcance a esta comunicación.

Quedamos atentos a cualquier observación o solicitud de información adicional que consideren pertinente.

Sin otro particular, se despide.

Atentamente.

MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIA CENTRO

Número de folio 3

279

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. 901.740.307-9
CE-AAM-CVC-20250111-01

San José de Cúcuta, 11 de enero 2025

Señores
CONSORCIO R&Q - JOYCO
Atn. Ingeniero Yoris Alexander Montaño Manjarrez
Director de Interventoría
E-Mail: cucutilla.cornejo@joyco.com.co
Cúcuta, Colombia

Referencia.
1. Contrato Nº LP-FC-038-2023, Adjudicado al CONSORCIO VIA CENTRO.
2. Entrega de la resolución 802 del 21/11/2024, permiso de aprovechamiento forestal por 1 árbol - TRAMO 2.
3. Entrega de cotizaciones para el cumplimento de la medida de reposición.

Respetado ingeniero,
En el marco del cumplimiento de las funciones del contratista y los requisitos contractuales de lo mencionado en la referencia N°1, se hace entrega de la Resolución 802 del 21/11/2024 'por la cual se otorga un permiso forestal para arboles aislados y se dictan otras disposiciones', notificado en el mes de diciembre al Consorcio Vía Centro; una vez finalizado el proceso de solicitud de las cotizaciones para la compra de las especies estipuladas por la resolución como medida de reposición, se allega a esta interventoría la resolución junto con las cotizaciones para proceder con la aprobación del proveedor y finalizar con el proceso de la compra y entrega de la factura a CORPONOR.

Resolución 802 del 21/11/2024 'por la cual se otorga un permiso forestal para arboles aislados y se dictan otras disposiciones'
ARTICULO QUINTO: Como medida de REPOSICIÓN AMBIENTAL Por la naturaleza del permiso a otorgar debido a la necesidad de realizar la tala de un (1) árbol, se calculará en relación 1:15, por lo cual, el usuario deberá entregar a la Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible de la Corporación, en un término de 5 días hábiles (los cuales serán contados a partir de la notificación del presente acto administrativo) una factura de un vivero del área metropolitana por la compra de quince (15) árboles de la especie Tú yyo (Euphorbia mili), en bolsa de dos (02) kilos de sustrato material vegetal que será utilizado por al Corporación para los proyectos de reforestación.

Teniendo en cuenta que, para el cumplimiento de dicha reposición, el consorcio debe realizar la respectiva cotización para la compra de las especies de árboles exigidas, el consorcio hace entrega de 3 cotizaciones con los siguientes proveedores:

Proveedor	Descripción del producto	cantidad	valor
FORESAECO S.A.S.	SUMINISTRO TU Y YO (EN BOLSA DE 2KG)	15	$225.000
A&J FORESTAL MULTISERVICIOS S.A.S.	SUMINISTRO DE ESPECIES ORNAMENTALES TU Y YO EN BOLSA DE 2KG.	15	$330.000

SETAGRO E.U.	ARBOLES ESPECIE TU Y YO EN BOLSA DE 2KG	15	$285.000

Presentamos a la interventoría la empresa FORESAECO S.A.S. como el proveedor para la compra de la medida de reposición exigida en el *Artículo quinto* de la *Resolución 802 del 21/11/2024*, quedamos a espera de la aprobación de su parte para continuar con el proceso de compra y posterior entrega de la factura a CORPONOR.

Sin otro particular, se despide.
Atentamente.

MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIA CENTRO

Numero de folios 2

280

FORESAECO SAS
NIT 900741376 -8

+57 3125865864
www.foresaeco.co
Facturacion@foresaeco.com
Calle 0AN #2E-64 Barrio Quinta Bosch - Cúcuta

Cotización

CONSORCIO VIA CENTRO
NIT 901740307
CUCUTA, Cúcuta
TEL

Cotización No. **520**

Fecha de expedición 09/01/2025

Fecha de vencimiento 09/01/2025

Referencia	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
	SUMINISTRO TU Y YO (EN BOLSA DE 2 KG)	$15,000	15	0.00%	$225,000

Doscientos veinticinco mil pesos

Observaciones
TEL 318878092

Subtotal $225,000

Total $225,000

Total de ítems: 15

ELABORADO POR

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

Servicios Técnicos Agroecológicos, Profesionales y Otros Servicios

SETAGRO E.U

NIT.807.004.675-7 REGIMEN COMUN

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 icontec

CERTIFICADO No. SC 1894-1 CERTIFICADO No. SA 194-1 CERTIFICADO No. OS065-1

COTIZACION Nº 18/18

FECHA 9/01/2025

SEÑORES **CONSORCIO VIA CENTRO**

OBJETO : **SUMINISTRO DE ARBOLES**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR MENSUAL	VALOR POR UNIDAD
15	ARBOLES ESPECIE TU Y YO EN BOLSA DE 2KG	$ 19.000	$ 285.000
	SUBTOTAL		$ 285.000
	IVA		$ 0
	TOTAL		$ 285.000

FORMA DE PAGO: Se acuerda con el Cliente

ATENTAMENTE

LUIS HERNANDO MONTAÑEZ RODRIGUEZ
GERENTE

A &J FORESTAL MULTISERVICIOS S.A.S
Dejando Huella Ambiental
Nit: 901.127.403-1

San José de Cúcuta, 09 de enero de 2025

Señores:
CONSORCIO VIA CENTRO
Cúcuta

1. COMPONENTE ECONÓMICO

COSTOS					
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE ESPECIES ORNAMENTALES TU Y YO EN BOLSA DE 2KG	ÁRBOL	15	$22.000	$330.000
TOTAL					$ 330.000

Agradecemos la oportunidad a cotizar y deseamos hacer parte de este gran Proyecto.

JUAN RAMÓN MANJARREZ DURAN
Contacto: 3118891706
Representante legal

A & J FORESTAL
MULTISERVICIOS S.A.S

782

Consorcio
R&Q - Joyco

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190

Cúcuta, 14 de enero de 2025
45-01-2025/1032-2022
Cornejo - Cucutilla

CC-952

Señor(es)
MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante legal
CONSORCIO VIA CENTRO
Dirección consorcioviacentro@gmail.com
Cúcuta, Colombia

Referencia:

1. Contrato de interventoría No. 1032 de 2022 INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".
2. Proceso de LP-FC-038-2023 CONSORCIO VIA CENTRO. Respuesta comunicación CE-AAM-CVC-20250111-01del 11 enero 2025 (R-CC-912)
3. Respuesta cumplimiento de medida de compensación ambiental permiso de tala y poda permiso ambiental del tramo 2. Resolución 802 del 21/11/2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con la información allegada respecto al permiso ambiental tramitado por el contratista atendiendo las recomendaciones de CORPONOR, en cuanto al aprovechamiento forestal de un (1) árbol que se verá afectado durante la ejecución de las obras, por la cuales se tramito el permiso de ocupación de cauce de tramo 2.

La interventoría reviso las cotizaciones para cumplimiento de la medida de compensación ambiental estipulada por CORPONOR en la resolución la Resolución 802 del 21/11/2024 'por la cual se otorga un permiso forestal para arboles aislados y se dictan otras disposiciones'

ARTICULO QUINTO: Como medida de REPOSICIÓN AMBIENTAL Por la naturaleza del permiso a otorgar debido a la necesidad de realizar la tala de un (1) árbol, se calculará en relación 1:15, por lo cual, el usuario deberá entregar a la Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible de la Corporación, en un término de 5 días hábiles (los cuales serán contados a partir de la notificación del presente acto administrativo) una factura de un vivero del área metropolitana por la compra de quince (15) árboles de la especie Tú y yo (Euphorbia mili), en bolsa de dos (02) kilos de sustrato material vegetal que será utilizado por la Corporación para los proyectos de reforestación.

así las cosas, la interventoría realizo el análisis y evaluación de las cotizaciones presentadas por el consorcio y se gestionaron cotizaciones por parte de la interventoría en viveros de la región:

Consorcio
R&Q - Joyco

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190

COTIZACIONES GESTIONADAS POR EL CONTRATISTA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FORESAECO SAS (SUMINISTRO TU Y YO (EN BOLSA DE 2 KG))	15	$15.000	$225.000
A &J FORESTAL MULTISERVICIOS S.A.S (SUMINISTRO TU Y YO (EN BOLSA DE 2 KG)	15	$22.000	$ 330.000
SETAGRO E.U. (ARBOLES ESPECIE TU Y YO EN BOLSA DE 2KG)	15	$ 19.000	$ 285.000

COTIZACIONES GESTIONADA POR LA INTERVENTORIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
VIVERO EL ENCANTO DE LAS FLORES (ARBOLES ESPECIE TU Y YO EN BOLSA DE 2KG)	15	$15.500	$232.500
VIVERO EL TU Y YO (ARBOLES ESPECIE TU Y YO EN BOLSA DE 2KG)	15	$15.800	$237.000

De acuerdo con lo anterior se aprueba la cotización presentada por el CONTRATISTA, de la empresa FORESAECO SAS por un valor total de $ 225.000.

Solicitamos presentar a la interventoría copia del radicado de la factura ante CORPONOR en cumplimiento de la obligación ambiental y copia de la factura de compra del material vegetal.

Para su información se anexa cotización gestionada por la interventoría.

Sin otro Particular, Cordialmente,

YORIS ALEXANDER MONTAÑO M.
Director Interventoría.
Consorcio R&Q - JOYCO

Ing. Leonel Valero Supervisor del Convenio -INVIAS
Ing. Freddy Fontiveros Gerente Faro del Catatumbo.eicefarodelcatatumbosas@nortedesantander.gov.co
Arq. Efraín Pacheco Sec. Infraestructura y vías – Gobernación secvias@nortedesantander.gov.co
Ing. Héctor Miguel Diaz. Gerente Consorcio R&Q- JOYCO hector.diaz@joyco.com.co

Elaboró: CIAT	Revisó: YAM	Aprobó: YAM	Archivo:YJLD

Anexos: cotización del vivero el encanto de las flores y vivero el tu y yo.

Seguimiento:

Consorcio
R&Q - Joyco

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190

Cotización 187



Facturar a

Fecha de la cotización 14/01/2025

CONSORCIO R&Q JOYCO.
NIT901577842-1 DIRECCION:
CALLE 22 AN # 18E-61 NIZA

Cant.	Descripción	Precio unitario	Valor total
15	SUMINISTRO DE ESPECIES ORNAM ENTALES TU Y YO EN BOLSA DE 2KG	$15.500	$232.500

Total, sin IVA COL$ 232.500

Vivero el encanto de las flores

Av libertadores calle 17 N finca 2 Frente al zulima barrio Niza

Nit 60366634-9

WhatsApp 3107116352

VIVERO EL PARAISO DEL TU Y YO
NIT 37.395.348-7

San José de Cúcuta, 14 de enero de 2025

Señores
CONSORCIO R&Q JOYCO
Ciudad

REF. COTIZACION MATERIAL VEGETAL

Teniendo en cuenta su requerimiento me permito enviar la siguiente cotización:

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	SUMINISTRO DE ESPECIES ORNAM ENTALES TU Y YO EN BOLSA DE 2KG	$15.800	$237.000
		TOTAL	**$237.000**

Observaciones

- Entrega inmediata
- Forma de pago: contado

Mindaly Montañez Perez

MINDALY MONTAÑEZ PEREZ
NIT: 37.395.348-7
Celular: 311 5471153
Correo: mindaly13@gmail.com

KDX8-1-5-C VEREDA LOS PERACOS, VIA PUERTO S/DER- FRENTE AL CRUCE DEL ANILLO VIAL OCCIDENTAL CÚCUTA COLOMBIA CEL. 311 5471153

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. 901.740.307-9
CE-AAM-CVC-20250322-01

San José de Cúcuta, 22 de marzo 2025

Señores
CONSORCIO R&Q - JOYCO
Atn. Ingeniero Yoris Alexander Montaño Manjarrez
Director de Interventoría
E-Mail: cucutilla.cornejo@joyco.com.co
Cúcuta, Colombia

Referencia.

1. Contrato N.º LP-FC-038-2023, Adjudicado al CONSORCIO VIA CENTRO.
2. Entrega de soporte de compra e instalación de valla Res 802 del 21-11-2024

Por medio de la presente el CONSORCIO VÍA CENTRO informa a la interventoría, que, en cumplimiento a la *Resolución 802 del 21-11-2024 'por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal para arboles aislados y se dictan otras disposiciones'* (permiso de aprovechamiento forestal de TRAMO 2 otorgado por CORPONOR).

A su vez informamos que se procedió a realizar la respectiva compra e instalación de la valla informativa teniendo en cuenta lo estipulado en la *Resolución 802 del 21-11-2024, artículo tercero, ARTÍCULO TERGERO. El beneficiario deberá cumplir con las siguientes consideraciones, obligaciones y prohibiciones: 6. Así mismo, para acceder a la ejecución de lo autorizado la empresa CONSORCIO VAI CENTRO, identificado con Nit. 901740307-9 representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ identificado con la cédula de ciudadanía No 1.090.473.156, expedida en Cúcuta, deberá instalar una valla en el sector, en un lugar visible y de fácil localización donde se informe el objeto de las labores, número de la resolución del permiso de intervención del componente arbóreo, número de árboles autorizados para la poda, compensaciones etc., al valla debe ir acompañada de un mensaje ecológico y debe tener unas dimensiones de 3,00 x 2,50 m. (ver imagen 2).*

Imagen 2. Valla de información a ubicar por el usuario.



1. **Fuente: CORPONOR, 2024.**

actividad que fue aprobada por la interventoría mediante comunicación CC-1085 de l11/11/2024, (adjunto a esta comunicación encontrara el soporte de compra de la valla informativa)

Registro fotográfico del cumplimiento:



Nota: Este cumplimiento será notificado a la Corporación en el informe de cierre del permiso.

anexo a esta comunicación encontrara la factura de compra N° B 1183 del 21-03-2025.

Sin otro particular, se despide.

Atentamente.

MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante legal
CONSORCIO VIA CENTRO

Número de folios 2

286

ADOLFO LEON BERRIO MURILLO
13.486.370-3
CALLE 16 No 5 - 73 BARRIO LA CABRERA
(undefined) 5713267 - Ext. undefined
Cúcuta - Colombia
publicidadbermur2012@hotmail.com

Bemur PUBLICIDAD

Factura electrónica de venta N°. B 1183

Cliente: CONSORCIO VIA CENTRO
Nit: 901.740.307-9
Teléfono: (607) 5729321 - Ext. 000
Dirección: CL 10 5 50 LC 27 ED CENTRO AGROBANCARIO
Ciudad: Cúcuta - Colombia
Correo: consorcioviacentro@gmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	21/03/2025, 15:26
Expedición	21/03/2025, 15:28
Vencimiento	21/03/2025
Vendedor	ADOLFO LEON BERRIO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE VALLA EN LONA BANNER EN IMPRESION DIGITAL CON OJALES ALREDEDOR PARA SU INSTALACION DE 3.00 * 2.50	1.00	250,000.00	47,500.00	297,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos noventa y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 297,500.00

Total Bruto	**250,000.00**
IVA 19%	**47,500.00**
Total a Pagar	**297,500.00**

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076874227 aprobado en 20240809 prefijo B desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 7310 Publicidad Tarifa 6*1000
CUFE: e3dfbc2d6098e7f5db4ca2a461841d2d49e6a9fec448c3bbe156134bae9bd165002f8afb2d3f838e746420d427d702c2

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.371-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica no es el XML

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. 901.740.307-9
CE-AAM-CVC-20250308-01

San José de Cúcuta, 08 de marzo 2025

Señores
CONSORCIO R&Q - JOYCO
Atn. Ingeniero Yoris Alexander Montaño Manjarrez
Director de Interventoría
E-Mail: cucutilla.cornejo@joyco.com.co
Cúcuta, Colombia

Referencia.

1. Contrato Nº LP-FC-038-2023, Adjudicado al CONSORCIO VIA CENTRO.
2. Resolución 802 del 21-11-2024, permiso de tala de TRAMO 2, por 1 árbol.
3. Entrega de cotizaciones para la propuesta de compra de valla informativa del permiso de tala Res 802, de tramo 2.

Respetado ingeniero,
En el marco del cumplimiento de las funciones del contratista y los requisitos contractuales de lo mencionado en la referencia N°1, se hace entrega de las cotizaciones para la medida de compensación del permiso de tala de tramo 2 estipuladas mediante:

Resolución 802 del 21 de noviembre del 2024, "por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal y se dictan otras disposiciones".
ARTÍCULO TERGERO. El beneficiario deberá cumplir con las siguientes consideraciones, obligaciones y prohibiciones:

6. Así mismo, para acceder a la ejecución de lo autorizado la empresa CONSORCIO VAI CENTRO, identificado con Nit. 901740307-9 representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ identificado con la cédula de ciudadanía No 1.090.473.156, expedida en Cúcuta, deberá instalar una valla en el sector, en un lugar visible y de fácil localización donde se informe el objeto de las labores, número de la resolución del permiso de intervención del componente arbóreo, número de árboles autorizados para la poda, compensaciones etc., al valla debe ir acompañada de un mensaje ecológico y debe tener unas dimensiones de 3,00 x 2,50 m.

Teniendo en cuenta que, para el cumplimiento de dicha compensación, el consorcio debe presentar las respectivas cotizaciones a la interventoría, se hace entrega de 3 cotizaciones con los siguientes proveedores:

Proveedor	Descripción del producto	cantidad	valor
BEMUR PUBLICIDAD	Suministro de 1 valla en lona banner en impresión digital con ojales alrededor para su instalación de 3.0 x 2.50	1	$297.500
COLORPRINT PUBLICIDAD	valla publicitaria de 3.0 x 2.0 en lona banner	1	$330.000
D&P PUBLICIDAD	Valla para Corponor de 3.0 x 250 impresión digital	1	$327.250

Dado que la empresa BEMUR PUBLICIDAD ofrece la cotización mas baja, se propone como proveedor para su aprobación por parte de la interventoría.

Sin otro particular, se despide.
Atentamente.

MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIA CENTRO

Numero de folios 2.

Dirección: Calle 10 No. 5 – 50 Local 27 Centro Agrobancario
Correo: consorcioviacentro@gmail.com **Teléfono:** 607-572-9321 – **Celular:** 300-323-7074
San José de Cúcuta – Norte de Santander

D&P PUBLICIDAD

San Jose de Cúcuta, 3 de marzo de 2025

Señores

CONSORCIO VÍA AL CENTRO

Cordial Saludo

La presente para cotizar el suministro del siguiente trabajo:

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO
Valla para Corponor de 3.0 x 250 impresion digital	1	**$ 275.000**

SUBTOTAL	**$ 275.000**
IVAL	**$ 52.250**
TOTAL	**$ 327.250**

Cll 12 # 10-28 El Contento local 02 / CEL. 301 4631343
Email. dyppublicidad2020@gmail.com

Bemur
PUBLICIDAD

Regimen Comun
Nit No. 13 486 379-3

BOTONES PUBLICITARIOS
TARJETAS DE PRESENTACION
DISEÑO GRAFICO
SEÑALIZACION VIAL
PASACALLES
PENDONES
CALCOMANIAS
ESTAMPADOS

San jose de cucuta, Febrero 28 de 2025

Señores:
CONSORCIO VIA CENTRO
Ciudad.

Cordial Saludo
La presente con el fin de cotizar el suministro de valla , asi:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
Suministro de 1 valla en lona banner en impresion digital con ojales alrededor para su instalacion de 3.0 x 2.50	1	$ 250.000	$ 250.000
		IVA	$ 47.500
		TOTAL	$ 297.500

att.
ADOLFO BERRIO MURIILO

CALLE 16 No. 5 - 73 Barrio la Cabrera CEL. 315 565 26 87/3006098838 / Email. publicidadbemur2012@hotmail.com

289

COLORPRINT Publicidad

AVENIDA 6 # 15-97 CENTRO
Nit: 1092334934-3
No Responsable de I.V.A

Fecha Factura	5	3	2025
Fecha de Vencimiento			

COTIZACIÓN No. 503

SEÑOR(ES): **CONSORCIO VIA CENTRO** C.C. O NIT.: _____

DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
(1)	**valla publicitaria de 3.0 x 2.0 en lona banner**	**$ 330.000**
	TOTAL	**$ 330.000**

Impreso por Colorprintcucuta y / o Pablo Fabian Parra Nit. 1092334934-3

IMPRESION DIGITAL GRAN FORMATO
Fabian Parra
305 264 15 15
E-mail:Colorprintcucuta@hotmail.c
IDEAS • IMPRESION • IMAGEN CORPORATIVA



CENTRO GRÁFICO Luz

Nit. 1090365834-0

AVISOS PUBLICITARIOS - AFICHES - VOLANTES - PENDONES - TARJETAS - IMAGEN CORPORATIVA - SELLOS - TODO LO RELACIONADO EN LAS ARTES GRÁFICAS

San José de Cúcuta, 10 de marzo de 2025

Cliente:

CONSORCIO R&Q - JOYCO
Cúcuta

Me permito presentar la siguiente cotización solicitada por ud(s).:

Cant.	Descripción	V/Unitario	V. Total
1	Valla con ojales, Tipo de material: lona en banner medidas: 3.0x 2.50	298.000	298.000

NOTA:
* Se trabaja con materiales de buena calidad.
* No se requiere abono.
* Los valores anteriores son NETOS, no son más IVA.

Atentamente,

Luz Yarime Martinez Rojas

LUZ YARIME MARTINEZ ROJAS
Propietaria

yarimar0329@hotmail.com
AV. 10 #12-27 BARRIO EL CONTENTO - CEL. 3115172533

Trazos Publicidad

San José de Cúcuta, 10 de marzo de 2025

CONSORCIO RCQ - JOYCO

Nos permitimos presentar la siguiente cotización solicitada para compra de una valla en lona.

Descripción	cantidad	Valor unitario
Valla tipo: lona banner con ojales laterales	1	$ 265.000
Valor total : $ 265.000 (sin IVA)		

NOTA: El valor cotizado no incluye IVA, este valor será incluido en la facturación de compra.

Para efectos contables: ***SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, POR FAVOR NO APLICAR DESCUENTOS DE RETE FUENTE, NI RETE ICA***

Atentamente

Sandra Bautista

Gerente

Diagonal Santander N° 6 - 45 Cucuta
+57 301 421 86 44
097 571 67 36
trazospublicidad.com
trazos_publicidad@hotmail.com
Paul Hernández - Diseñador Gráfico Profesional

Consorcio
R&Q - Joyco

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190

Cotización del contratista	Valor total	Cotización gestionada por la interventoría	Valor total
Empresa BEMUR PUBLICIDAD	$ 297.500 con IVA	Empresa TRAZOS PUBLICIDAD	$ 265.000 no incluye IVA
Empresa COLORPRINT	$ 330.000	CENTRO GRAFICO LUZ	$ 298.000 valor neto.
DYP PUBLICIDAD	$327.000 CON IVA		

De acuerdo con lo anterior la cotización aprobada es de la empresa BEMUR PUBLICIDAD.

Sin otro particular. Cordialmente,

YORIS ALEXANDER MONTAÑO MANJARREZ.
Director Interventoría.
Consorcio R&Q - JOYCO

C.C. Archivo JOYCO S.A.S.
Ing. Leonel Valero Supervisor del Convenio -INVIAS lvalero@invias.gov.co jfbernal@invias.gov.co
Ing. Freddy Fontiveros. Gerente EICE Faro del Catatumbo.eicefarodelcatatumbosas@nortedesantander.gov.co
Arq. Mary Fabiana Leal Sec. Infraestructura y vías – Gobernación secvias@nortedesantander.gov.co
Ing. Héctor Miguel Diaz. Gerente Consorcio R&Q- JOYCO hector.diaz@joyco.com.co

Elaboró: CIAT	Revisó: YAMM	Aprobó: YAMM	Archivo: YJLD

Anexos: 2 Cotizaciones interventoría

Seguimiento

Consorcio
R&Q - Joyco

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190

Cúcuta, 11 de marzo de 2025
24-03-2025/1032-2022
Cornejo - Cucutilla

CC-1085

Señor(es)
MIGUEL DAN JENSSEN DURAN
Representante legal
CONSORCIO VIA CENTRO
Dirección consorcioviacentro@gmail.com, ing.miguelduran@gmail.com
Cúcuta, Colombia

Referencia:

1. Contrato de interventoría No. 1032 de 2022 INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".
2. Proceso de LP-FC-038-2023 CONSORCIO VIA CENTRO.
3. Rta comunicado CE-AAM-CVC-20250308-01 con radicado interno R-CC-1094. (valla informativa del permiso de ambiental Resolución 802, de tramo 2).

Respetado Ingeniero

De acuerdo con la información allegada para el cumplimiento de la obligación ambiental Resolución 802 del 21 de noviembre del 2024, "por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal:

ARTÍCULO TERGERO. El beneficiario deberá cumplir con las siguientes consideraciones, obligaciones y prohibiciones:

6. Así mismo, para acceder a la ejecución de lo autorizado la empresa CONSORCIO VIA CENTRO, identificado con Nit. 901740307-9 representada legalmente por el señor MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ identificado con la cédula de ciudadanía No 1.090.473.156, expedida en Cúcuta, deberá instalar una valla en el sector, en un lugar visible y de fácil localización donde se informe el objeto de las labores, número de la resolución del permiso de intervención del componente arbóreo, número de árboles autorizados para la poda, compensaciones etc., al valla debe ir acompañada de un mensaje ecológico y debe tener unas dimensiones de 3,00 x 2,50 m.

La interventoría realizo la gestión de cotizaciones con otros proveedores locales, reiterando que el valor aprobado será el más bajo del mercado.

292

SIEP Corponor

Radicado 2025010150014912 ?

Entidad	Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental
Fecha Radicacion	10/02/2025
Tipo PQR	Otras Solicitudes
Tema	Otras Solicitudes
Remitente	CONSORCIOVIACENTRO CONSORCIO VIA CENTRO MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Asunto	ENTREGA DE CUMPLIMIENTOS N°1 - PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCES RES 802 DEL 21/11/2024 - EXPEDIENTE 34989, remite CONSORCIO VÍA CENTRO
Tipo Documento	Nit
Numero	9017403079
Envío de Correo	Correo de Confirmación Enviado Correctamente al Solicitante

A- A+

Imprimir Regresar

Corporación autónoma regional de la Frontera

Corponor

Corponor
Dirección: Calle 13 Av. El Bosque #3E-278, Los Caobos, Cúcuta, Norte de Santander.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 7:15 A.M a 12:00 M y 2:15 P.M a 6:00 P.M.
Contáctenos:
Atención al ciudadano: (+57)(60)(7) 5828484
Notificaciones Judiciales: procesosjudicialescorponor@corponor.gov.co
(Correo Exclusivo para Juzgados y/o Despachos Judiciales)

A-

A+

@CORPONOR @corponor_ns @CorponorNortedeSantander

Política de Privacidad, Seguridad y Términos de uso

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. 901.740.307-9

CE-AAM-CVC-20250210-01

San José de Cúcuta, 10 de febrero del 2025

Señores
CORPONOR
Corporación Autónoma Regional de la frontera Nororiental.
Dirección: Calle 13 Av. El Bosque #3E-278 San José de Cúcuta.

Referencia.

1. Resolución 744 del 06/11/2024, 'por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauces y se dictan otras disposiciones'
2. Socialización con la comunidad, permisos de intervención voluntario
3. Instalación de vallas informativas
4. Instalación de baños para trabajadores

Cordial saludo, por medio de la presente el CONSORCIO VIA CENTRO con número de identificación tributario NIT. 901.740.307-9, representado por el suscrito, hace la entrega N°1 En cumplimiento a los requerimientos estipulados mediante *Resolución 744 del 06/11/2024, 'por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauces y se dictan otras disposiciones'*

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario deberá cumplir con cada una de las recomendaciones u obligaciones consignadas en el informe técnico relacionado en el presente acto administrativo, so pena de las sanciones legales a las que hubiere lugar:

Inciso 5. No se autoriza labores de rocería, ni tala de árboles sobre márgenes del cauce del sitio señalado en la corriente hídrica, sin contar con los permisos ambientales correspondientes.

Cumplimiento: Para adecuar la entrada o acceso de la maquinaria al margen del rio, se presentó la necesidad de solicitar un permiso de aprovechamiento forestal para arboles aislados, otorgado por la corporación mediante acto administrativo RES N°802 del 21-11-2024 por medio de la cual se otorgo un permiso de tala para 1 árbol. Afectación que a la fecha no ha tenido lugar, debido a que se mantendrá el árbol hasta tanto no se vea la necesidad de intervenirlo. Ver anexo mediante el siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/1PACXa5CRsq5HEcUfAi-eWp04oOgZmUo4/view?usp=drive_link

Inciso 7. Para el seguimiento ambiental del sitio de las obras a realizar, deben presentar el Cronograma de actividades con fechas programadas reales indicando el responsable de cada una de ellas, cronograma a entregar dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del permiso de ocupación de cauce, junto con la socialización a los propietarios del área de influencia directa.

Inciso 8. El responsable de la ocupación de cauce debe informar a la Corporación sobre el inicio de actividades.

Cumplimiento:

En atención a los requerimientos relacionados con el cronograma de actividades para la ocupación de cauce, nos permitimos informar que, hasta la fecha, dicho cronograma aún no ha sido estipulado. Esto se debe a que nos encontramos en proceso de definición y coordinación de aspectos técnicos, administrativos y logísticos fundamentales para el correcto desarrollo de las actividades.

Dado lo anterior, una vez se resuelvan los aspectos pendientes y se establezca el cronograma definitivo, procederemos a dar el alcance correspondiente a esta comunicación y a remitir la información requerida.

Socialización a propietarios del área de influencia directa.

Predio	Propietario	Matricula Inmobiliaria
LA VEGUITA	RUMITH SILVA CARRILLO	260-144487
BARINAS	CRISILA BADILLO HERMES BADILLO	260-17090

Ver permisos de intervención voluntarios mediante el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/1g-krIljjY-w8UGFa9LGBuZBeS6k3iUnu/view?usp=drive_link

Inciso 14. Para conocimiento de la Comunidad, se deben instalar dos vallas informativas con dimensiones de 2,00 x 1,60 metros, a ubicar en lugares visibles de la vía., una valla en cada extremo de la via en el tramo a intervenir.

Cumplimiento:


Se realizo la instalación de 2 vallas una al inicio y la otra al final del tramo, con el animo de dar cumplimiento al requerimiento de la Corporación y a su vez de mantener informada a la comunidad sobre las actividades a ejecutar sobre el cauce.

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. 901.740.307-9

REGISTRO FOTOGRAFICO – INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS



INICIO DEL TRAMO

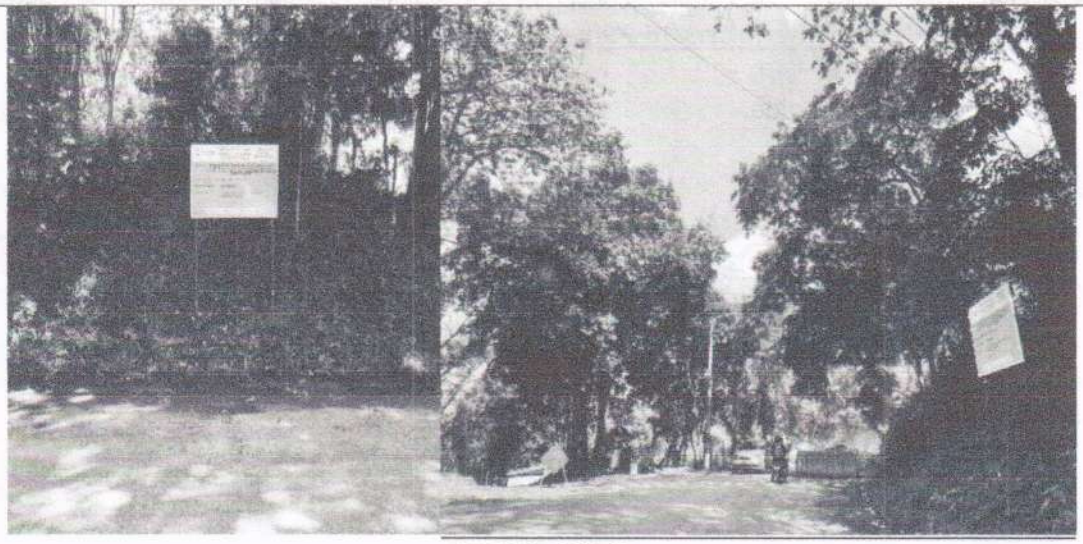

FIN DEL TRAMO

Para uso de los trabajadores se han instalado baños portátiles en el campamento del TRAMO 2, se deja constancia de que los baños se encuentran habilitados para los trabajadores desde el me de noviembre, ver el registro fotográfico a continuación:

REGISTRO FOTOGRAFICO – INSTALACIÓN DE BAÑOS PARA LOS TRABAJADORES

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. 901.740.307-9



Mediante el siguiente link encontrara los certificados de suministro del prestador del servicio BAÑOMOVIL DEL NORTE S.A.S., por concepto de alquiler y mantenimiento de baños. *https://drive.google.com/drive/folders/16_X9rpegurqhaBUJWnT1-vnxBJ1dxwI_?usp=drive_link*

Sin otro particular, se despide.

Atentamente.

MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIA CENTRO

Numero de folios 4

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. 901.740.307-9
CE-AAM-CVC-20241207-01


San José de Cúcuta, 7 de diciembre 2024

Señores
CONSORCIO R&Q - JOYCO
Atn. Ingeniero Yoris Alexander Montaño Manjarrez
Director de Interventoría
E-Mail: cucutilla.cornejo@joyco.com.co
Cúcuta, Colombia

Referencia.

1. Contrato Nº LP-FC-038-2023, Adjudicado al CONSORCIO VIA CENTRO.
2. Entrega de cotizaciones para la compra e instalación de dos (2) vallas informativas del permiso de Ocupación de Cauces de TRAMO 2.

Respetado ingeniero,
En el marco del cumplimiento de las funciones del contratista y los requisitos contractuales de lo mencionado en la referencia N°1, se hace entrega a la interventoría de las cotizaciones par el cumplimiento de la instalación de dos (2) vallas informativas en el tramo de vía denominado TRAMO 2 estipuladas mediante *Resolución 744 del 06 de noviembre del 2024, "por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauces y se dictan otras disposiciones".* Pag 15 y 16, Artículo Tercero, numeral 14. *Para conocimiento de la comunidad, se deben instalar dos vallas informativas con dimensiones de 2,00 x 1,60 metros, a ubicar en lugares visibles de la vía, una valla en cada extremo de la vía en el tramo a intervenir.*

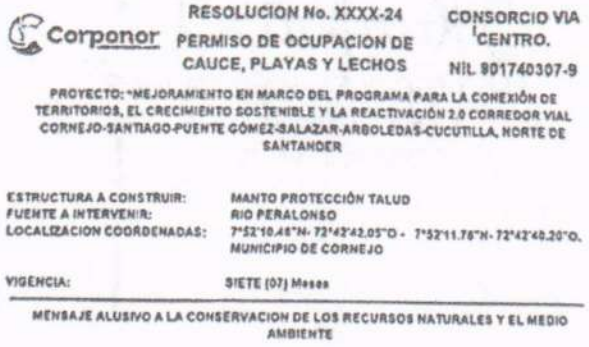

Teniendo en cuenta que, para el cumplimiento de dicha compensación, el consorcio debe realizar la respectiva cotización para la compra e instalación de la valla, el consorcio hace entrega de 3 cotizaciones con los siguientes proveedores:

Proveedor	Descripción del producto	cantidad	valor
BEMUR PUBLICIDAD	Suministro e instalación de 2 vallas metálica de 2.0x1.60 en lámina galvanizada cal.22, parales en tubo cuadrado 3x1y1/2 de 3m de	2	$3'236.800

	alto calibre 18, instaladas en Santiago en cada extremo del tamo.		
DP & PUBLICIDAD	Suministro e instalación de 2 vallas metálica de 2.0x1.60 en lámina galvanizada cal.22, parales en tubo cuadrado 3x1y1/2 de 3m de alto calibre 18, instaladas en Santiago en cada extremo del tamo.	2	$3'617.600
COLORPRINT PUBLICIDAD	Suministro 2 vallas de 2.0x1.60, lona banner, lámina galvanizada cal.22, parales en tubo cuadrado 3x1 1/2 cal 18, instaladas en Santiago en cada extremo de tamo.	2	$3'760.000

Presentamos a la interventoría la empresa BEMUR PUBLICIDAD como el proveedor para la compra e instalación de la valla exigida en el Articulo tercero, Numeral 14 de la Resolución 744 del 6/11/2024, quedamos a espera de la aprobación de su parte para continuar con el proceso de compra para la posterior instalación.

Sin otro particular, se despide.
Atentamente.

MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante Legal
CONSORCIO VIA CENTRO

Numero de folios 2

Bemur PUBLICIDAD
Regimen Comun
Nit No. 13 486 379-3

BOTONES PUBLICITARIOS
TARJETAS DE PRESENTACION
DISEÑO GRAFICO
SEÑALIZACION VIAL
PASACALLES
PENDONES
CALCOMANIAS
ESTAMPADOS

San jose de cucuta, Diciembre 04 de 2024

Señores:
CONSORCIO VIA CENTRO
Ciudad.

Cordial Saludo
La presente con el fin de cotizar el suministro e instalación de valla , asi:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
Suministro e instalación de 2 valla metálica de 2.0 x 1.60 en lamina galvanizada cal. 22, parales en tubo cuadrado 3 x 1 1/2 de 3.0 m de altocalibre 18. Instalada en Santiago en cada extremo de tramo	2	$ 1.360.000	$ 2.720.000
		IVA	$ 516.800
		TOTAL	$ 3.236.800

att.
ADOLFO BERRIO MURIILO

CALLE 16 No. 5 - 73 Barrio la Cabrera CEL. 315 565 26 87/3006098838 / Email. publicidadbemur2012@hotmail.com

COLORPRINT
Publicidad

AVENIDA 6 # 15-97 CENTRO
Nit: 1092334934-3
No Responsable de I.V.A

Fecha Factura	4	12	2024
Fecha de Vencimiento			

COTIZACIÓN *No. 503*


SEÑOR(ES): **CONSORCIO VIA CENTRO** C.C. O NIT.: _____

DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
(1)	**Suministro 2 vallas de 2,0 X 1.60 M . lona banner, lamina galvanizada cal 22, parales en tubo de hierro de 3 x 1 1/2 cal 18 instaladas en Samtiago a cada extremo de tramo.**	**$ 3.760.000**
	TOTAL	**$ 3.760.000**

Impreso por Colorprintcucuta y / o Pablo Fabian Parra Nit: 1092334934-3

IMPRESION DIGITAL GRAN FORMATO
Fabian Parra
305 264 15 15
E-mail:Colorprintcucuta@hotmail.c
IDEAS • IMPRESION • IMAGEN CORPORATIVA





BOTONES PUBLICITARIOS
TARJETAS DE PRESENTACION
DISEÑO GRAFICO
SEÑALIZACION VIAL
PASACALLES
PENDONES
CALCOMANIAS
ESTAMPADOS

San Jose de Cúcuta, 4 de Dic. / 2024

Señores

CONSORCIO VÍA AL CENTRO

Cordial Saludo

La presente para cotizar el suministro del siguiente trabajo:

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO
Suministro e instalación de 2 valla metálica de 2.0 x 1.60 en lamina galvanizada cal. 22, parales en tubo cuadrado 3 x 1 1/2 de 3.0 m de altocalibre 18. Instalada en Santiago en cada extremo de tramo	2	$ 1.520.000
		$ 3.040.000
	SUBTOTAL	$ 3.040.000
	IVAL	$ 577.600
	TOTAL	$ 3.617.600

Cll 12 # 10-28 El Contento local 02 / CEL. 301 4631343
Email. dyppublicidad2020@gmail.com

gamacolor
publicidad gráfica

- Papelería corporativa
- sublimación personalizada
- camisetas
- gorras
- manillas
- mugs
- lapiceros
- sellos
- cerámicas
- vallas publicitarias

CONSORCIO R&Q JOYCO **20 DE DICIEMBRE 2024**

Atendiendo su solicitud, tenemos el gusto de presentar la siguiente COTIZACIÓN:

2 Vallas metálicas de 2,0 x 1,60, en lámina galvanizada calibre

22, 2 parales en tubo de 3 x 1 1/2 pulgada, información en

adhesivo impresión digital laminado (Con instalación en Santiago N/S)

VALOR CADA UNA $ 1695.000

SUBTOTAL	**$ 3.390.000**
IVA	**$ 644.100**
TOTAL	**$ 4.034.100**

Atentamente,

DANILO GONZALEZ N.
Gerente

Calle 12 No. 5-83 Tel: 5 737157 Cel: 3116761886
Cúcuta - Colombia gamacolor411@gmail.com

CENTRO GRÁFICO Luz
Nit. 1090365834-0
AVISOS PUBLICITARIOS - AFICHES - VOLANTES - PENDONES - TARJETAS - IMAGEN CORPORATIVA - SELLOS - TODO LO RELACIONADO EN LAS ARTES GRÁFICAS

San José de Cúcuta, 16 de diciembre de 2024

Cliente:

CONSORCIO R&Q - JOYCO
Cúcuta

Asunto:
Cotización de Vallas

Me permito presentar la siguiente cotización solicitada por ud(s).:

Cant.	Descripción	V/Unitario	V. Total
2	Vallas metálicas de 2,0 x 1,60, en lámina galvanizada calibre 22, 2 parales en tubo de 3 x 1 1/2 pulgada, información en adhesivo impresión digital laminado. Instalada en Santiago	1.670.000	3.340.000

NOTA: * Se trabaja con materiales de buena calidad.
* No se requiere abono.
* Los valores anteriores son NETOS, no son mas IVA.

Atentamente,

Luz Yarime Martinez Rojas
LUZ YARIME MARTINEZ ROJAS
Propietaria

yarimar0329@hotmail.com
AV. 10 #12-27 BARRIO EL CONTENTO - CEL. 3115172533

Consorcio
R&Q - Joyco

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190

Así las cosas, realizando el comparativo con las cotizaciones presentadas por el CONSORCIO VIA CENTRO se aprueba la presentada por el valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 3.236.800) incluido IVA, correspondiente a BEMUR PUBLICIDAD.

Se solicita que las vallas se instalen en un lugar seguro, previo al inicio de las actividades objeto de la solicitud, ya que es obligación del contratista salvaguardar su permanencia y durabilidad en el sitio adecuado.

Sin otro Particular. Cordialmente,

YORIS ALEXANDER MONTAÑO M.
Director Interventoría.
Consorcio R&Q - JOYCO

C.C. Archivo JOYCO S.A.S.
Ing. Leonel Valero Supervisor del Convenio -INVIAS lvalero@invias.gov.co
Arq. Fredy Ontiveros. Gerente EICE Faro del Catatumbo.eicefarodelcatatumbosas@nortedesantander.gov.co
Arq. Efraín Pacheco Sec. Infraestructura y vías – Gobernación secvias@nortedesantander.gov.co
Ing. Héctor Miguel Diaz. Gerente Consorcio R&Q- JOYCO hector.diaz@joyco.com.co

Elaboró:	CIAT	Revisó:	YAM	Aprobó:	YAM	Archivo:

Anexos: se anexa cotización gestionada por la interventoría

Seguimiento:

Consorcio
R&Q - Joyco

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190

Cúcuta, 16 de diciembre de 2024
47-12-2024/1032-2022
Cornejo - Cucutilla

CC-886

Señor(es)
MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
Representante legal
CONSORCIO VIA CENTRO
Dirección consorcioviacentro@gmail.com
Cúcuta, Colombia

Referencia:

1. Contrato de interventoría No. 1032 de 2022 INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".
2. Proceso de LP-FC-038-2023 CONSORCIO VIA CENTRO.
3. Respuesta Comunicación CE-AAM-CVC-20241207-01 de 7 de diciembre 2024, R-CC- 841. Cotizaciones vallas del permiso de ocupación de cauce tramo 2 (dos)

Cordial saludo Ingeniero,

De acuerdo con la información allegada a esta interventoría mediante comunicado descrita en la referencia 2, correspondiente a las cotizaciones gestionadas por el CONSORCIO VIA CENTRO para el cumplimiento de la obligación ambiental de la Resolución 744 del 06 de noviembre del 2024, "por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauces y se dictan otras disposiciones". *"Artículo Tercero, numeral 14. Para conocimiento de la comunidad, se deben instalar dos vallas informativas con dimensiones de 2,00 x 1,60 metros, a ubicar en lugares visibles de la vía, una valla en cada extremo de la vía en el tramo a intervenir"*

Nos permitimos manifestar que la interventoría realizo varias solicitudes de cotizaciones en el mercado del cual nos allegan solo una del CENTRO GRAFICO LUZ por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($ 3.340.000) incluido IVA.

ACTA DE RECIBO PARCIAL CON ANEXO 1

Faro del Catatumbo EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11	Página 1 de 4

FECHA DEL ACTA	03 DE MARZO DE 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-FC-38-2023 – 8 DE AGOSTO 23
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO SAS
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍA CENTRO
C.C. o N.I.T.	901.740.307-92
REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN
C.C. o N.I.T.	1.090.473.156 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	LP-FC-038-2023 MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GÓMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS CON 00/100 ($69.756.000.000,00) M/CTE
ADICIONAL No.1	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($ 599.955.314.00) M/TE
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($ 70.355.955.314.00) M/TE
PLAZO O DURACIÓN	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026
PLAZO ADICIONAL	N.A
PLAZO TOTAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Las actividades previstas en el presente Contrato se ejecutarán en el CORREDOR VIAL CORNEJO – SANTIAGO – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, y el domicilio contractual es el Municipio de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander
RUBRO	2.3.2.02.02.009.81 mejoramiento en marco del programa para la conexión de territorios, en el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0 corredor vial cornejo – Santiago – Salazar – Arboledas – Cucutilla, Norte de Santander.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 000189 del 12 de julio 2023 No. 00 000231 del 08 de agosto 2024 No. 00 000070 del 17 de febrero 2025 No. 00 000053 del 10 de febrero 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 000163 del 09 agosto 2023 No. 00 000222 del 13 de agosto 2024 No. 00 000032 del 18 de febrero 2025 No. 00 000064 del 03 de marzo 2026
SUPERVISOR	LILIANA FUENTES MEDINA, Designada mediante memorando del 08 de agosto de 2023. ING LUIS ALFONSO RIVERA PABON, Designada mediante memorando del 16 de octubre del 2024.
INTERVENTOR (externo)	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. HECTOR MIGUEL DIAZ (APODERADO)
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN	NO APLICA.
ACTAS PREVIAS REINICIO	NO APLICA.
GARANTIAS	**ANEXO 0** No. 400049798 – 400049799 Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 11/08/2023 Fecha de Aprobación: 16/08/2023 **ANEXO 1** No. 400049798 Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 16/08/2023 Fecha de Aprobación: 16/08/2023 **ANEXO 2** No. 400049799 Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 11/08/2023 Fecha de Aprobación: 16/08/2023 **ANEXO 3** No. 400049799 Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 4/09/2024 Fecha de Aprobación: 6/09/2024 **ANEXO 4** No. 400049798 Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 4/09/2024 Fecha de Aprobación: 6/09/2024

ACTA DE APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	ACTA No. 1 DEL 03 JUNIO DEL 2025. ACTA No. 2 DEL 03 JULIO DEL 2025.
ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES	ACTA No. 1 DEL 13 AGOSTO DEL 2024. ACTA No. 2 DEL 15 ENERO DEL 2025. ACTA No. 3 DEL 24 FEBRERO DEL 2025. ACTA No. 4 DEL 06 DE MARZO DEL 2025. ACTA No. 5 DEL 03 DE JULIO DEL 2025. ACTA No. 6 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025. ACTA No. 7 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025.
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	ACTA PARCIAL N° 1 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 ACTA PARCIAL N° 2 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ACTA PARCIAL N° 3 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2025

	ACTA PARCIAL N° 4 DEL 04 DE MARZO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 5 DEL 05 DE MAYO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 6 DEL 01 DE JULIO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 7 DEL 04 DE AGOSTO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 8 DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 9 DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025 ACTA PARCIAL N°10 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	DOS MIL SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($2.070.850.890,00)
VALOR A CANCELAR EN PRESENTA ACTA	MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE. ($1.656.680.712,00)
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	2.94%
% EJECUTADO ACUMULADO	36.56%
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	72.80%
% A CANCELAR CON LA PRESENTE ACTA	2.35%
PERÍODO DEL ACTA	PRIMERO (1) DE DICIEMBRE DE 2025 AL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2026.

RESUMEN ACTAS DE PAGO		
RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 69.756.000.000,00	
VALOR ADICIONAL	$ 599.955.314.00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 70.355.955.314.00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 01		$ 471.026.144,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 02		$ 378.641.159,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 03		$ 1.344.468.123,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 04		$ 1.874.700.291,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 05		$ 2.187.803.958,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 06		$ 2.248.662.875,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 07		$ 2.414.655.762,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 08		$3.136.079.055,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 09		$2.496.597.312,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 10		$7.096.479.077,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 11 EN CURSO		$2.070.850.890,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 44.635.990.668,00
SUMAS IGUALES	$ 70.355.955.314.00	$ 70.355.955.314.00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL ANTICIPO (30%)	$ 13.951.200.000,00	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01		$ 94.205.229,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02		$ 75.728.232
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 03		$ 268.893.625
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 04		$ 374.940.058
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 05		$ 437.560.792

Faro del Catatumbo EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11	Página 4 de 4

AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 06		$ 449.732.575,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 07		$ 482.931.152,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 08		$ 627.215.811,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 09		$499.319.462,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 10		$1.419.295.815,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 11		$414.170.178,00
SALDO POR AMORTIZAR		$ 8.807.207.070,80
SUMAS IGUALES	$ 13.951.200.000,00	$ 13.951.200.000,00

En San José de Cúcuta, en las oficinas de **E.I.C.E. FARO CATATUMBO S.A.S.**, se reunieron los suscritos a saber: **ING. FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS**, Ordenador del Gasto, **ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN,** Representante Legal Consorcio Vía Centro, Contratista, **ING. LUIS ALFONSO RIVERA PABON**, Supervisor, e **ING. HÉCTOR MIGUEL DIAZ**, R/L (APODERADO) del Consorcio R&Q - JOYCO, Interventor Contratado por el Instituto Nacional de Vías, con el fin de dar recibo al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta.

Se deja constancia que el periodo de pago de la presente acta es del Primero (01) de diciembre del 2025 al Treinta y uno de (31) de enero de 2026.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN
R/L CONSORCIO VÍA CENTRO
Contratista

ING. LUIS ALFONSO RIVERA PABON
E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Supervisor

ING. HÉCTOR MIGUEL DIAZ
GERENTE CONSORCIO R&Q - JOYCO
Interventor Externo

Vb. Ing Yoris montaño
Director de la interventoria

Vo. Bo. ING. FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS
Ordenador del gasto

Proyectó: Ing. Rafael Ricardo Redondo – Apoyo a la Supervisión.
Revisó: Ing. Luis Alfonso Rivera Pabón – Supervisor

Nota 1: **Si el contrato contempla la interventoria externa, tanto el supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.**

Nota 2: Las cantidades y valores consignados en la presenta acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base del principio de la responsabilidad con la que la interventoría y/o supervisión y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría y/o supervisión.

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11 — 03-mar.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026.

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 08-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 11			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
1		CORREJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+000				8,242,686,955.00		7,674,126,793.00	46.14%		$ 16,631,739,630.00		916,956,376.00	5.51%		8,591,082,169.00	51.65%
1.1		PRELIMINARES				51,650,805.00		3,269,038.00	3.30%		$ 99,106,660.00		0.00	0.00%		3,269,038.00	3.30%
1.1.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	8,587.00	3,944.00	33,867,128.00	0.00	0.00	0.00%	20,140.00	$ 79,432,160.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.1.2	204	Roceria y Limpieza	m2	8,587.00	2,071.00	17,783,677.00	1,576.00	3,268,038.00	18.61%	9,500.00	$ 19,674,500.00		0.00	0.00%	1,576.00	3,268,038.00	16.61%
1.2		OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES				2,697,082,215.00		3,344,193,417.00	48.77%		$ 6,956,832,813.00		98,720,174.00	1.00%		3,412,913,591.00	49.77%
1.2.1		ALCANTARILLAS				1,304,236,891.00		1,058,524,076.00	46.98%		$ 2,304,587,903.00		10,868,808.00	0.47%	0.00	1,070,392,884.00	46.46%
1.2.1.1	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	147.00	238,519.00	35,062,293.00	15.80	3,768,600.00	10.75%	147.00	$ 35,062,293.00		0.00	0.00%	15.80	3,768,600.00	10.75%
1.2.1.2	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	58.00	101,591.00	5,892,278.00	80.00	8,127,280.00	68.03%	117.60	$ 11,947,102.00		0.00	0.00%	80.00	8,127,280.00	68.03%
1.2.1.3	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	1,918.00	3,944.00	7,564,592.00	0.00	0.00	0.00%	1,918.00	$ 7,564,592.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.1.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	4,296.00	19,220.00	82,569,120.00	688.70	13,236,814.00	16.03%	4,296.00	$ 82,569,120.00	13.50	259,470.00	0.31%	702.20	13,496,284.00	16.35%
1.2.1.5	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	24.00	865,080.00	20,761,440.00	11.50	9,946,190.00	38.33%	30.00	$ 25,951,800.00		0.00	0.00%	11.50	9,946,190.00	38.33%
1.2.1.6	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	19,295.00	11,042.00	213,055,390.00	25,403.60	280,506,551.00	61.99%	31,000.00	$ 342,302,000.00	13.00	143,546.00	0.04%	25,416.60	280,650,097.00	61.99%
1.2.1.7	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y ornas)	m3	299.00	1,212,774.00	362,619,426.00	158.90	192,709,789.00	45.40%	350.00	$ 424,470,900.00		0.00	0.00%	158.90	192,709,789.00	45.40%
1.2.1.8	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	108.00	2,216,826.00	239,417,208.00	118.10	261,807,151.00	98.42%	120.00	$ 266,019,120.00		0.00	0.00%	118.10	261,807,151.00	98.42%
1.2.1.9	835	Tubería de PVC Ø20" incluye colchón de arena.	m	14.00	392,958.00	5,501,412.00	0.00	0.00	0.00%	14.00	$ 5,501,412.00	12.00	4,715,496.00	85.71%	12.00	4,715,496.00	85.71%
1.2.1.10	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) mat. selec de excavación	m3	318.00	49,324.00	15,685,032.00	832.30	41,052,365.00	38.39%	2,168.00	$ 106,934,432.00		0.00	0.00%	832.30	41,052,365.00	38.39%
1.2.1.11	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	53.00	2,046,918.00	108,486,654.00	0.00	0.00	0.00%	53.00	$ 108,486,654.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.1.12	833	Canal sección 1,20x0,60 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	38.00	320,586.00	12,181,508.00	0.00	0.00	0.00%	38.00	$ 12,181,508.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.1.13	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	257.00	9,194.00	2,362,858.00	255.40	2,348,148.00	99.38%	257.00	$ 2,362,858.00		0.00	0.00%	255.40	2,348,148.00	99.38%
1.2.1.14	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	56,263.00	2,381.00	133,962,203.00	1,203.50	2,865,534.00	2.14%	56,263.00	$ 133,962,203.00		0.00	0.00%	1,203.50	2,865,534.00	2.14%
1.2.1.15	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	6,839.00	8,643.00	59,109,477.00	0.00	0.00	0.00%	6,839.00	$ 59,109,477.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA									$ -				0.00		
1.2.1.16		Demoliciones en concreto ciclópeo	m3		193,409.00		161.00	31,136,849.00	52.61%	306.00	$ 59,183,154.00		0.00	0.00%	161.00	31,136,849.00	52.61%
1.2.1.17	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3		180,292.33		6.70	1,207,959.00	16.75%	40.00	$ 7,211,693.00		0.00	0.00%	6.70	1,207,959.00	16.75%
1.2.1.18		Demolicion manual en roca	m3		326,510.00		236.90	77,023,709.00	94.36%	250.00	$ 81,627,500.00	14.00	4,571,140.00	0.04%	249.90	81,594,849.00	99.96%
1.2.1.19		Excavación manual en material sin clasificar	m3		71,464.00		122.10	8,725,754.00	87.21%	140.00	$ 10,004,960.00	16.50	1,179,156.00	85.71%	138.60	9,904,910.00	99.00%
1.2.1.20		Concreto ciclópeo para piso y solados	m3		787,275.00		48.00	37,789,200.00	64.00%	75.00	$ 59,045,625.00		0.00	0.00%	48.00	37,789,200.00	64.00%
1.2.1.21	1318	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada	m3	0.00	2,382,438.00		0.00	0.00	0.00%	150.00	$ 357,365,700.00			0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.1.22		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa	m3	0.00	1,055,238.00		82.70	87,268,183.00	82.70%	100.00	$ 105,523,800.00		0.00	0.00%	82.70	87,268,183.00	82.70%
1.2.2		CUNETA, GEODREN Y BORDILLO				884,392,398.00		1,719,380,400.00	61.23%		$ 2,908,107,626.00		29,513,304.00	1.05%	0.00	1,748,893,704.00	62.28%
1.2.2.1	815	Cunetas en concreto 21 Mpa e=0,10 m. Ancho 0,84mt, incluye excavación, replanteo y conformación	m3	126.00	1,055,238.00	132,959,988.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.2.2	809	Bordillo en concreto 21 MPa sección trapezoide 40x30x20, incluye refuerzo	m	1,500.00	182,918.00	274,377,000.00	0.00	0.00	0.00%	1,500.00	$ 274,377,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.2.3	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	9,000.00	11,042.00	99,378,000.00	39,408.00	435,143,136.00	62.55%	63,000.00	$ 695,646,000.00	2,160.00	23,850,720.00	3.43%	41,568.00	458,993,856.00	65.98%
1.2.2.4	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	126.00	173,982.00	21,919,212.00	283.50	49,318,227.00	94.50%	300.00	$ 52,188,600.00		0.00	0.00%	283.50	49,318,227.00	94.50%
1.2.2.5	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	750.00	161,765.00	121,323,750.00	636.50	102,963,423.00	34.18%	1,862.00	$ 301,206,430.00		0.00	0.00%	636.50	102,963,423.00	34.18%
1.2.2.6	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	4,133.00	9,165.00	37,878,945.00	4,543.80	41,643,927.00	65.14%	6,975.00	$ 63,925,875.00	70.20	643,383.00	1.01%	4,614.00	42,287,310.00	66.15%
1.2.2.7	901	Geodren con tubo 4" tipo ADS-PVC, H=1,50 mt	m	1,117.00	111,380.00	124,411,460.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.2.8	826	Sello elástico para juntas con poliuretano autonivelante	m2	887.00	47,513.00	42,144,031.00	0.00	0.00	0.00%	887.00	$ 42,144,031.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA													0.00	0.00	
1.2.2.9	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3		19,220.00		955.20	18,356,944.00	88.84%	1,100.00	$ 21,142,000.00	56.30	1,082,086.00	5.12%	1,011.50	19,441,030.00	91.95%
1.2.2.10		Tubo Ø 4" perforado para filtros	m		32,744.00		1,815.00	59,430,360.00	94.29%	1,925.00	$ 63,032,200.00	13.00	425,672.00	0.68%	1,828.00	59,856,032.00	94.96%
1.2.2.11	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3		865,080.00		35.40	30,623,124.00	29.50%	120.00	$ 103,807,200.00		0.00	0.00%	35.40	30,623,124.00	29.50%
1.2.2.12		Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y ornas)	m3		1,212,774.00		73.50	89,138,889.00	43.24%	170.00	$ 208,171,580.00		0.00	0.00%	73.50	89,138,889.00	43.24%
1.2.2.13	303	Demolicion manual en roca	m3		326,510.00		327.50	106,932,025.00	57.46%	570.00	$ 186,110,700.00		0.00	0.00%	327.50	106,932,025.00	57.46%
1.2.2.14	1020	Tubo PVC Ø2" sanitario, para paso de floradero	m	0.00	17,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.00	$ 102,864.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.2.15	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	0.00	17,925.75	0.00	526.60	9,439,700.00	97.52%	540.00	$ 9,679,905.00	13.40	240,205.00	2.48%	540.00	9,679,905.00	100.00%
1.2.2.16	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	0.00	2,381.00	0.00	730.80	1,740,035.00	19.45%	3,757.50	$ 8,946,608.00		0.00	0.00%	730.80	1,740,035.00	19.45%
1.2.2.17	505	Extendido Humedecimiento y compacto de relleno en botaderos	m3	0.00	8,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35.00	$ 302,505.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.2.18		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa	m3		1,055,238.00		733.10	773,594,978.00	99.57%	736.25	$ 776,918,978.00	3.10	3,271,238.00	0.42%	736.20	776,866,216.00	99.99%
1.2.2.19	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3		9,194.00		114.60	1,053,632.00	43.81%	261.60	$ 2,405,150.00		0.00	0.00%	114.60	1,053,632.00	43.81%
1.2.2.20	1230	Junta de dilatacion con cordon de espuma elastico Ø3/8" + sellador	m	2,000.00	110,030.20												
1.2.3		PUENTE QUEBRADA LA ESMERALDA				407,781,264.00		0.00	0.00%		$ 431,399,504.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.3.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	1,610.00	3,944.00	6,349,840.00	0.00	0.00	0.00%	1,610.00	$ 6,349,840.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.3.2	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	396.00	19,220.00	7,611,120.00	0.00	0.00	0.00%	396.00	$ 7,611,120.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.3.3	740	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=30cm	m3	162.00	590,592.80	95,676,034.00	0.00	0.00	0.00%	162.00	$ 95,676,034.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.3.4	1231	Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2	540.00	16,153.20	8,722,728.00	0.00	0.00	0.00%	540.00	$ 8,722,728.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.3.5	403	Excavación manual material sin clasificar para pilas pre-excavadas, prof. De 0 - 4mt	m3	49.26	91,858.84	4,524,982.00	0.00	0.00	0.00%	49.26	$ 4,524,982.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.3.6	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max da 4mt	m3	15.08	1,863,451.24	25,084,254.00	0.00	0.00	0.00%	15.08	$ 25,084,254.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.3.7	701	Concreto 21MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad	m3	36.19	1,087,569.09	39,360,373.00	0.00	0.00	0.00%	36.19	$ 39,360,373.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.3.8	729	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	37.48	1,276,742.57	47,847,204.00	0.00	0.00	0.00%	37.48	$ 47,847,204.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.3.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	8,874.66	11,042.00	97,994,208.00	0.00	0.00	0.00%	8,874.66	$ 97,994,208.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.3.10	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	Kg	90.00	787,275.00	70,854,750.00	0.00	0.00	0.00%	120.00	$ 94,473,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.3.11	1014	Conformación talud con material seleccionado del sitio compactado a rana-vibrocompactador	Kg	514.80	5,605.00	2,885,454.00	0.00	0.00	0.00%	514.80	$ 2,885,454.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11 — 03-feb.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE ENERO DE 2026.

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 11			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
1.2.3.12	635	Union de Anclaje en concreto con resina epoxica.	Kg	48.00	18,131.40	870,307.00	0.00	0.00	0.00%	48.00	$ 870,307.00			0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.4		PASOS PEATONALES				120,677,684.00		$ -	0.00%		$ 120,677,684.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.4.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	Kg	88.00	3,944.00	347,072.00	0.00	0.00	0.00%	88.00	$ 347,072.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.4.2	401	Excavación manual en material sin clasificar	Kg	21.20	71,484.01	1,515,037.00	0.00	0.00	0.00%	21.20	$ 1,515,037.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.4.3	742	Concreto ciclopeo para pleo y solados	Kg	16.00	787,275.00	12,596,400.00	0.00	0.00	0.00%	16.00	$ 12,596,400.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.4.4	729	Concreto 24.5 MPa para zapatas, vigas y dentellones	Kg	5.20	1,276,742.57	6,639,061.00	0.00	0.00	0.00%	5.20	$ 6,639,061.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.4.5	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	520.00	11,042.00	5,741,840.00	0.00	0.00	0.00%	520.00	$ 5,741,840.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.4.6	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	Kg	32.00	458,207.00	14,662,624.00	0.00	0.00	0.00%	32.00	$ 14,662,624.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.4.7	1637	Estructura peso peatonal Metalico, incluye transporte, suministros e instalacion.	Kg	44.00	1,799,446.60	79,175,650.00	0.00	0.00	0.00%	44.00	$ 79,175,650.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.5		BOXCULVERT				0.00		565,289,941.00	47.41%		$ 1,192,250,096.00		$ 28,338,062.00	0.00%	0.00	593,627,003.00	49.79%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA													0.00	0.00	
1.2.5.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	0.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	219.00	$ 419,385.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.5.2	204	Rocería y Limpieza	m2	0.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	219.00	$ 453,549.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.5.3	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	0.00	193,409.00	0.00	106.60	20,617,399.00	69.54%	153.30	$ 29,649,600.00		0.00	0.00%	106.60	20,617,399.00	69.54%
1.2.5.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	0.00	19,220.00	0.00	732.30	14,074,806.00	62.70%	1,168.00	$ 22,448,960.00	244.90	4,706,978.00	20.97%	977.20	18,781,784.00	83.66%
1.2.5.5	401	Excavación manual en material sin clasificar	m2	0.00	71,484.00	0.00	3.00	214,392.00	0.51%	584.00	$ 41,734,976.00	1.50	107,196.00	0.26%	4.50	321,588.00	0.77%
1.2.5.6	219	Solado en concreto 17.5 MPa	m3	0.00	865,080.00	0.00	10.70	9,256,142.00	7.33%	146.00	$ 126,296,760.00		0.00	0.00%	10.70	9,256,142.00	7.33%
1.2.5.7	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y otras)	m3	0.00	1,212,774.00	0.00	209.60	254,197,430.00	58.22%	360.00	$ 436,598,640.00		0.00	0.00%	209.60	254,197,430.00	58.22%
1.2.5.8	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	0.00	11,447.00	0.00	20,975.00	240,100,825.00	69.92%	30,000.00	$ 343,410,000.00		0.00	0.00%	20,975.00	240,100,825.00	69.92%
1.2.5.9	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	0.00	349,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	277.40	$ 96,852,288.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.5.10	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	0.00	9,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	146.00	$ 1,342,324.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.5.11	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	0.00	2,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	$ 23,810,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.5.12	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	0.00	8,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,314.00	$ 11,356,902.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.2.5.13	742	Concreto ciclopeo para pleo y solados	m3	0.00	787,275.00	0.00	10.60	8,345,115.00	90.75%	11.68	$ 9,195,372.00		0.00	0.00%	10.60	8,345,115.00	90.75%
1.2.5.14		Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3		458,207.00		38.00	17,411,866.00	38.00%	100.00	$ 45,820,700.00	48.00	21,993,936.00	0.00%	86.00	39,405,802.00	86.00%
1.2.5.15		Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3		191,244.00		5.60	1,070,966.00	37.33%	15.00	$ 2,868,660.00	8.00	1,529,952.00	0.00%	13.60	2,600,918.00	90.67%
1.3		OBRAS DE ESTABILIDAD, AMPLIACION Y CONFINAMIENTO.				649,057,172.00		854,478,652.60	45.58%		$ 1,675,692,095.00		378,144,672.00	20.18%		1,287,114,012.00	68.62%
1.3.1		OBRA K5+170-K5+215: Muro en gaviones H=2.00m L=45.00m				76,958,883.00		0.00	0.00%				0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.1.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	196.00	3,944.00	773,024.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	196.00	2,071.00	405,916.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.1.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	135.00	19,220.00	2,594,700.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.1.4	905	Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	167.00	10,016.00	1,672,672.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.1.5	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	135.00	458,207.00	61,857,945.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.1.6	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	9.00	191,244.00	1,721,196.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.1.7	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2,802.00	2,381.00	6,671,562.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.1.8	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	146.00	8,643.00	1,261,878.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.2		OBRA K5+255-K5+355: Muro en gaviones H=2.00m L=45.00m				61,646,559.00		192,973,002.00	77.62%		$ 248,610,015.00		$ 439,920.00	0.18%	0.00	193,412,922.00	77.80%
1.3.2.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	416.00	3,944.00	1,640,704.00	0.00	0.00	0.00%	416.00	$ 1,640,704.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.2.2	204	Rocería y Limpieza	m2	416.00	2,071.00	861,536.00	0.00	0.00	0.00%	416.00	$ 861,536.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.2.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	100.00	19,220.00	1,922,000.00	312.00	5,996,640.00	86.19%	362.00	$ 6,957,640.00		0.00	0.00%	312.00	5,996,640.00	86.19%
1.3.2.4	905	Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	170.00	10,016.00	1,702,720.00	0.00	0.00	0.00%	200.00	$ 2,003,200.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.2.5	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	100.00	458,207.00	45,820,700.00	368.50	168,849,280.00	79.59%	463.00	$ 212,149,841.00		0.00	0.00%	368.50	168,849,280.00	79.59%
1.3.2.6	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	20.00	191,244.00	3,824,880.00	33.40	6,387,550.00	100.00%	33.40	$ 6,387,550.00		0.00	0.00%	33.40	6,387,550.00	100.00%
1.3.2.7	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2,075.00	2,381.00	4,940,575.00	980.10	2,333,618.00	45.17%	2,170.00	$ 5,166,770.00		0.00	0.00%	980.10	2,333,618.00	45.17%
1.3.2.8	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	106.00	8,643.00	933,444.00	0.00	0.00	0.00%	108.00	$ 933,444.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.2.9	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9,165.00		402.00	3,684,330.00	89.33%	450.00	$ 4,124,250.00	48.00	439,920.00	10.67%	450.00	4,124,250.00	100.00%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA									$ -			0.00%	0.00	0.00	
1.3.2.10	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) mat. selec de excavación	m3	0.00	49,324.00		116.00	5,721,584.00	68.24%	170.00	$ 8,385,080.00		0.00	0.00%	116.00	5,721,584.00	68.24%
1.3.2.11	1404	Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2		90,372.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.3		OBRA K5+485-K5+625: Muro en gaviones H=3.00m L=140.00m				468,022,538.00		0.00	0.00%		$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.3.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	720.00	3,944.00	2,839,680.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.3.2	204	Rocería y Limpieza	m2	720.00	2,071.00	1,491,120.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.3.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	840.00	19,220.00	16,144,800.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.3.4	905	Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	796.00	10,016.00	7,992,768.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.3.5	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	840.00	458,207.00	384,893,880.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.3.6	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	28.00	191,244.00	5,354,832.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.3.7	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	17,430.00	2,381.00	41,500,830.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.3.8	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	903.00	8,643.00	7,804,629.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.4		OBRA K5+695-K5+720: Muro en gaviones H=2.00m L=25.00m				42,429,191.00		0.00	0.00%				0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.4.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	116.00	3,944.00	457,504.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

396

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11 — 03-feb.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE ENERO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION Nº07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 11			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
1.3.4.2	204	Roceria y Limpieza	m2	116.00	2,071.00	240,236.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.4.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	75.00	19,220.00	1,441,500.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.4.4	905	Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	56.00	10,016.00	560,896.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.4.5	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	75.00	458,207.00	34,365,525.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.4.6	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	5.00	191,244.00	956,220.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.4.7	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	1,557.00	2,381.00	3,707,217.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.4.8	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	81.00	8,643.00	700,083.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.5		**MURO CAISSON K4+140**						**715,996,338.00**	**44.00%**		**$ 1,627,082,880.00**		**377,704,752.00**	**23.21%**	0.00	**1,093,701,090.00**	**67.22%**
		ACTIVIDAD NO PREVISTA						0.00	0.00%					0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.5.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200.00	$ 788,800.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.5.2	204	Roceria y Limpieza	m2	0.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400.00	$ 828,400.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.5.3	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	0.00	238,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70.00	$ 16,696,330.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.5.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	0.00	19,220.00	0.00	114.50	2,200,690.00	21.60%	530.00	$ 10,186,600.00		0.00	0.00%	114.50	2,200,690.00	21.60%
1.3.5.5	405	Excavación manual en roca o colución para pilas, prof. 4 - 12mt, sin dinamita	m3	0.00	2,215,149.90	0.00	8.10	17,942,714.00	10.12%	80.00	$ 177,211,992.00	69.40	153,731,403.00	86.75%	77.50	171,674,117.00	96.87%
1.3.5.6	701	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	m3	0.00	1,663,451.00	0.00	19.80	32,936,330.00	70.71%	28.00	$ 46,576,628.00	6.60	10,978,777.00	23.57%	26.40	43,915,106.00	94.29%
1.3.5.7	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 12mt	m3	0.00	2,444,680.47	0.00	8.80	21,513,188.00	29.33%	30.00	$ 73,340,414.00	19.10	46,693,397.00	63.67%	27.90	68,206,585.00	93.00%
1.3.5.8	737	Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	0.00	1,664,832.00	0.00	18.00	29,786,976.00	45.00%	40.00	$ 66,193,280.00	0.00	0.00	0.00%	18.00	29,786,976.00	45.00%
1.3.5.9	767	Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas	m3	0.00	1,712,800.00	0.00	24.50	41,963,600.00	30.63%	80.00	$ 137,024,000.00	5.20	8,906,560.00	6.50%	29.70	50,870,160.00	37.13%
1.3.5.10	1012	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	0.00	11,042.00	0.00	23,406.90	258,458,990.00	68.84%	34,000.00	$ 375,428,000.00		0.00	0.00%	23,406.90	258,458,990.00	68.84%
1.3.5.11	401	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	0.00	2,381.00	0.00	1,030.80	2,454,335.00	49.09%	2,100.00	$ 5,000,100.00		0.00	0.00%	1,030.80	2,454,335.00	49.09%
1.3.5.12	1802	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada	m3	0.00	2,382,438.00	0.00	22.10	52,651,880.00	21.98%	100.64	$ 239,768,117.00	12.10	28,827,500.00	12.02%	34.20	81,479,380.00	33.98%
1.3.5.13	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	0.00	9,194.00		57.30	526,816.00	29.38%	195.00	$ 1,792,830.00		0.00	0.00%	57.30	526,816.00	29.38%
1.3.5.14	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3		865,060.00	0.00	1.50	1,297,590.00	6.25%	24.00	$ 20,761,440.00		0.00	0.00%	1.50	1,297,590.00	6.25%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)													0.00		
NP-02 1.3		Anclajes Pasivo DE 1" Incluye suministro, perforacion e inyeccion, tuerca y platina abovedada 15x15	m	0.00	262,118.38	0.00	174.00	45,608,598.00	87.00%	200.00	$ 52,423,676.00	24.00	6,290,841.00	12.00%	198.00	51,899,439.00	99.00%
NP-12 1.3		Concreto 28MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad	m3	0.00	1,175,345.00	0.00	84.80	99,669,256.00	75.04%	113.00	$ 132,813,985.00		0.00	0.00%	84.80	99,669,256.00	75.04%
NP-13 1.3		Excavación manual en roca o colución para pilas, prof. 0 - 4mt, sin dinamita	m3	0.00	2,215,149.90	0.00	49.20	108,985,375.00	40.33%	122.00	$ 270,248,288.00	55.20	122,276,274.00	45.25%	104.40	231,261,650.00	85.57%
1.4		**MOVIMIENTO DE TIERAS**				**695,097,174.00**		**194,922,020.00**	**35.39%**		**$ 549,788,796.00**		**39,621,991.00**	**7.21%**		**234,144,011.00**	**42.59%**
1.4.1	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	10,835.00	19,220.00	208,248,700.00	1,872.20	35,983,684.00	13.00%	14,400.00	$ 276,768,000.00	1,596.10	30,677,042.00	11.08%	3,468.30	66,660,726.00	24.09%
1.4.2	503	Relleno con material seleccionado de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	1,918.00	17,925.75	34,381,579.00	0.00	0.00	0.00%	500.00	$ 8,962,865.00	499.00	8,944,949.00	99.80%	499.00	8,944,949.00	99.80%
1.4.3	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3	500.00	180,292.33	90,146,165.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.4.4	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	76,506.00	2,381.00	182,165,546.00	5,856.00	13,943,136.00	35.47%	16,508.00	$ 39,305,548.00		0.00	0.00%	5,856.00	13,943,136.00	35.47%
1.4.5	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	9,274.00	8,643.00	80,155,182.00	0.00	0.00	0.00%	9,274.00	$ 80,155,182.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.4.6		Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2		90,372.00		1,600.00	144,595,200.00	100.00%	1,600.00	$ 144,595,200.00		0.00	0.00%	1,600.00	144,595,200.00	100.00%
1.4.7	1802	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada	m3		2,382,438.00		0.00	0.00	0.00%				0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
		ITEM NO PREVISTO - TALUD INFERIOR CURVA S PROYECTAR 30 ML											0.00	0.00%	0.00	0.00	
NP-02 2.10		Anclajes Pasivo DE 1" Incluye suministro, perforacion e inyeccion, tuerca y platina abovedada 15x15	m		262,118.38		0.00	0.00	0.00%				0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
NP-03 2.10		Suministro el Instalacion de Guaya 3/8" Perimetral y Diagonalmente Entre Anclajes para Refuerzo tipo STEEL GRID	m		57,178.11		0.00	0.00	0.00%				0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
NP-04 2.10		Suministro e instalacion malla Macmat R1 con Guaya Perimetral y Diagonales Tipo STEEL GRID.	m2		139,454.29		0.00	0.00	0.00%				0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.5		**PAVIMENTOS**				**3,180,371,908.00**		**2,609,853,254.00**	**44.94%**		**$ 5,807,294,393.00**		**429,308,043.00**	**7.39%**		**3,039,182,297.00**	**52.33%**
1.5.1	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3	2,100.00	180,292.33	378,613,893.00	400.00	72,116,932.00	10.00%	4,000.00	$ 721,169,320.00		0.00	0.00%	400.00	72,116,932.00	10.00%
1.5.2	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	3,375.00	173,982.00	587,121,750.00	2,404.20	418,239,440.00	62.04%	3,875.00	$ 674,102,750.00		0.00	0.00%	2,404.20	418,239,440.00	62.04%
1.5.3	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	2,100.00	191,244.00	401,612,400.00	3,009.50	575,548,818.00	86.00%	4,560.00	$ 872,072,640.00		0.00	0.00%	3,009.50	575,548,818.00	86.00%
1.5.4	1231	Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2	10,500.00	16,153.20	169,608,600.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.5.5	1205	Riego de Imprimacion	m2	10,500.00	8,985.00	94,342,500.00	11,404.00	102,464,940.00	75.03%	15,200.00	$ 136,572,000.00		0.00	0.00%	11,404.00	102,464,940.00	75.03%
1.5.6	1206	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	1,260.00	1,229,422.75	1,549,072,665.00	842.10	1,035,296,896.00	38.93%	2,280.00	$ 2,803,081,671.00	312.00	383,579,896.00	13.68%	1,154.10	1,418,876,796.00	50.62%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA												0.00%	0.00	0.00	
1.5.7		Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2		12,873.90		9,013.50	116,038,896.00	59.30%	15,200.00	$ 195,683,280.00	2,139.00	27,537,272.00	14.07%	11,152.50	143,576,170.00	73.37%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)													0.00	0.00	
NP-07 1.5		Demolicion de pavimento flexible	m2	0.00	44,147.00		6,572.30	290,147,328.00	61.02%	8,111.90	$ 358,115,932.00		0.00	0.00%	6,572.30	290,147,328.00	61.02%
NP-11 1.5		Riego de liga con emulsion asfaltica	m2	0.00	3,059.00		0.00	0.00	0.00%	15,200.00	$ 46,496,800.00	5,947.00	18,191,873.00	39.13%	5,947.00	18,191,873.00	39.13%
1.6		**SEÑALIZACION VIAL**				**76,363,534.00**		**650,508,658.00**	**48.99%**		**$ 1,301,165,886.00**		**658,566.00**	**0.08%**		**651,167,224.00**	**50.04%**
1.6.1	1101	Señal vial vertical, incluye: suministro e instalación	Un	23.00	525,144.60	12,078,326.00	0.00	0.00	0.00%	74.00	$ 38,860,700.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.6.2	1102	Demarcación horizontal	Km	2.00	3,089,213.75	6,178,428.00	0.00	0.00	0.00%	5.75	$ 17,808,518.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.6.3	1103	Tachas reflectivas bidireccionales, suministro e instalacion	Un	559.00	13,140.04	7,345,284.00	0.00	0.00	0.00%	662.00	$ 8,698,708.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.6.4	1104	Delineador de curva y corona horizontal 60x75cm	Un	115.00	389,230.40	44,761,496.00	0.00	0.00	0.00%	202.00	$ 78,624,541.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA											0.00		0.00	0.00	
1.6.5	1105	Defensa metalica acanalada a dos crestas en HG	m	0.00	806,613.00	0.00	1,072.00	650,289,136.00	56.42%	1,900.00	$ 1,152,564,700.00		0.00	0.00%	1,072.00	650,289,136.00	56.42%
1.6.6	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	0.00	71,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9.00	$ 643,176.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)													0.00		
NP-09 1.6		Delineador vial tipo corona	Un	0.00	109,781.00		2.00	219,522.00	7.69%	26.00	$ 2,853,786.00	6.00	658,566.00	23.08%	8.00	878,088.00	30.77%
NP-10 1.6		Marca vial con pintura en frio	m2	0.00	64,292.00		0.00	0.00	0.00%	20.40	$ 1,311,557.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11 — 03-feb.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE ENERO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 11			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
1.7		OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO				1,008,034,147.00		17,303,748.00	12.20%		$ 141,860,289.00		501,930.00	0.35%		17,805,678.00	12.56%
1.7.1		ZODME K8+580				352,184,391.00		0.00	0.00%		$ 38,006,293.00		501,930.00	1.29%	0.00	501,930.00	1.29%
1.7.1.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	2,793.00	3,944.00	11,015,592.00	0.00	0.00	0.00%	2,793.00	$ 11,015,592.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.7.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	2,793.00	1,287.00	3,594,591.00	0.00	0.00	0.00%	2,793.00	$ 3,594,591.00	390.00	501,930.00	13.96%	390.00	501,930.00	13.96%
1.7.1.3	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	252.00	458,207.00	115,468,164.00	0.00	0.00	0.00%	53.24	$ 24,396,110.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.7.1.4	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	96.00	173,962.00	16,700,352.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.7.1.5	906	Filtro en geotextil y tubería perforada pvc Ø4" sección 0,5x1,0 mas material filtrante	m	300.00	100,653.80	30,196,140.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.7.1.6	1404	Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2	1,829.00	90,372.00	165,290,388.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.7.1.7	837	Canal rampa en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,60 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	12.00	828,597.00	9,919,164.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.7.2		VIA				607,773,776.00		17,303,748.00	16.82%		$ 102,853,996.00		0.00	0.00%	0.00	17,303,748.00	16.82%
1.7.2.1	810	Trincho-cuneta en sacos rellenos de suelo/arena/cemento 3:1:1, mas geotextil, mas madera	m	40.00	248,785.10	9,950,804.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.7.2.2	811	Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"	m	60.00	77,939.00	4,676,340.00	0.00	0.00	0.00%	60.00	$ 4,676,340.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.7.2.3	836	Canal sección 2,40x0,60 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	181.00	415,333.00	75,175,273.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.7.2.4	902	Sub drenes horizontales en tubería pvc Ø2"	m	732.00	451,872.50	330,843,870.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.7.2.5	1401	Arborización con especies nativas	Un	2,500.00	50,192.30	125,480,750.00	0.00	0.00	0.00%	500.00	$ 25,096,150.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.7.2.6	829	Cunetas en sacos de 60x50 rellenos de suelo cemento 3:1:1	m	569.00	108,342.60	61,646,939.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA									$ -				0.00		
1.7.2.7	1411	Tala de arboles de entre 5 a 10m de altura con extraccion de tocon	Un	0.00	205,997.00	0.00	84.00	17,303,748.00	50.91%	165.00	$ 33,989,505.00		0.00	0.00%	84.00	17,303,748.00	50.91%
1.7.2.8	1410	Revegetalizacion con semillas agricolas	m2	0.00	39,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	$ 39,092,000.00			0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.7.3		BARRERA DE FLUJO				49,075,980.00		0.00	0.00%		$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.7.3.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	200.00	3,944.00	788,800.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.7.3.2	204	Rocería y Limpieza	m2	200.00	2,071.00	414,200.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.7.3.3	754	Micropilotes en concreto 28 Mpa Ø40cm + refuerzo + excavación + despuntar	m	40.00	459,555.00	18,382,200.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.7.3.4	702	Concreto 24,5 Mpa para viga cabezal	m3	12.00	1,208,185.00	14,498,220.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.7.3.5	1702	Acero de refuerzo 2,400kg/cm2 (37,000psi) corte, figurado y colocación	Kg	1,320.00	11,358.00	14,992,560.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2		CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K12+200 - K12+600, LONGITUD: 400 MTS				5,354,309,239.00		2,402,248,042.00	75.50%		$ 3,177,509,183.00		0.00	0.00%		2,402,248,042.00	75.50%
2.1		PRELIMINARES				175,459,285.00		13,371,560.00	43.23%		$ 30,934,321.00		0.00	0.00%		13,371,560.00	43.23%
2.1.1		Nivelación, replanteo y control topográfico	m2	7,519.58	3,944.00	29,657,224.00	0.00	0.00	0.00%	4,400.00	$ 17,353,600.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.1.2		Rocería y Limpieza	m2	3,135.79	2,071.00	6,494,221.00	995.00	2,060,645.00	90.78%	1,096.00	$ 2,269,816.00		0.00	0.00%	995.00	2,060,645.00	90.78%
2.1.3		Dique de desvio del rio, con material del sitio, adecuacion y conformacion	m3	960.00	56,786.00	54,514,560.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.1.4		Mantenimiento y conservación de dique de desvió del rio	Hora	320.00	264,979.00	84,793,280.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA												0.00%	0.00		
2.1.5		Retiro, traslado y reubicación de poste de paso y baja tensión	und	0.00	2,282,181.00		5.00	11,310,905.00	100.00%	5.00	$ 11,310,905.00		0.00	0.00%	5.00	11,310,905.00	100.00%
2.2		PROTECCIÓN DE TALUD CON COLCHONETA ENROCADA (Longitud 209,80m)				938,054,214.00		4,754,279.00	100.00%		$ 4,754,279.00		0.00	0.00%		4,754,279.00	100.00%
2.2.1		Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	1,536.74	24,823.00	38,146,497.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.2.2		Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	83.71	49,324.00	3,142,432.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.2.3		Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=30cm	m3	1,479.67	540,592.80	799,898,948.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.2.4		Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	2,899.74	10,016.00	29,043,798.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.2.5		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	6,392.84	2,381.00	15,221,352.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.2.6		Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	1,598.21	8,643.00	13,813,329.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.2.7		Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"	m	510.50	77,939.00	39,787,860.00	61.00	4,754,279.00	100.00%	61.00	$ 4,754,279.00		0.00	0.00%	61.00	4,754,279.00	100.00%
2.3		PROTECCIÓN DEL TALUD CON ESPIGONES (Son 6 Tramo K12+370 - K12+530)				1,729,188,996.00		0.00	0.00		$ -		0.00	0.00%		0.00	0.00%
2.3.1		Excavación a maquina bajo agua, profundidad hasta 4mt, Incluye estender el material	m3	927.00	38,107.00	35,325,189.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.3.2		Bolsacreto en sacos polipropileno de 1,2x2,4 concreto 21Mpa, transportado 1:3:3	m3	386.00	1,733,589.00	669,165,354.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.3.3		Concreto ciclópeo tremie 21MPa para pisos solados	m3	772.00	1,034,073.00	798,304,356.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.3.4		Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	5,237.00	11,442.00	59,921,754.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.3.5		Concreto 24,5 Mpa 3500psi Basico	m3	9.00	844,688.00	7,602,192.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.3.6		Concreto 28 Mpa para vigas y losa	m3	65.00	1,212,774.00	78,830,310.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.3.7		Micropilote Ø4" L=3mt con barra hueca R-32 Ø1 1/4" autoperforante	un	84.00	744,350.00	62,525,400.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.3.8		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	3,856.32	2,381.00	9,181,698.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.3.9		Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	964.08	8,643.00	8,332,543.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.4		PROTECCIÓN DE TALUD CON BOLSAS EN GAVIONES (Longitud : 40m)				241,806,096.00		0.00	0.00		$ -		0.00	0.00%		0.00	0.00%
2.4.1		Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	393.70	458,207.00	180,396,096.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.4.2		Protección del enrocado de gaviones sobre talud, con redmalla 8x10 MO, mas cables metálicos de 8mm en una dirección, para protección y soporte complementario de los sacos de gaviones colocados sobre el talud	m2	400.00	153,530.00	61,412,000.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.5		MURO EN GAVIONES PROYECTADO (Longitud 51.00m) (Prolongación de gaviones existentes)				520,144,729.00		0.00	0.00		$ -		0.00	0.00%		0.00	0.00%
2.5.1		Excavación para estructuras con maquina, incluye cargue	m3	495.00	19,220.00	9,513,900.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.5.2		Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	1,094.00	458,207.00	501,278,456.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11 — 03-feb.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE ENERO DE 2026.

				CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 11			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALE $	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
2.5.3		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2,059.20	2,381.00	4,902,955.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.5.5		Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	514.80	8,643.00	4,449,416.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.6		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**563,120,163.00**		**426,249,967.00**	**90.53%**		**$ 529,313,290.00**		**0.00**	**0.00%**		**426,249,967.00**	**90.53%**
2.6.1		**ALCANTARILLAS**				**563,120,163.00**		**426,249,967.00**	**90.53%**		**$ 529,313,290.00**		**0.00**	**0.00%**	0.00	**426,249,967.00**	**90.53%**
2.6.1.1	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	40.00	238,519.00	9,540,760.00	0.00	0.00	0.00%	3.30	$ 787,113.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.6.1.2	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	30.00	101,591.00	3,047,730.00	29.50	2,996,935.00	98.64%	33.28	$ 3,380,948.00		0.00	0.00%	29.50	2,996,935.00	98.64%
2.6.1.3	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	160.00	1,915.00	306,400.00	0.00	0.00	0.00%	160.00	$ 306,400.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.6.1.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	160.00	24,823.00	3,971,680.00	518.40	12,868,243.00	72.66%	713.48	$ 17,710,714.00		0.00	0.00%	518.40	12,868,243.00	72.66%
2.6.1.5	219	Solado en concreto 17.5 MPa	m3	8.00	1,265,396.00	10,123,168.00	9.70	12,274,341.00	99.94%	9.71	$ 12,281,427.00		0.00	0.00%	9.70	12,274,341.00	99.94%
2.6.1.6	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	7,200.00	11,442.00	82,362,400.00	9,802.30	112,157,942.00	97.81%	10,021.44	$ 114,665,298.00		0.00	0.00%	9,802.30	112,157,942.00	97.81%
2.6.1.7	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (para alcantarillas)	m3	120.00	1,657,370.00	198,884,400.00	86.90	144,025,453.00	85.96%	131.75	$ 218,358,498.00		0.00	0.00%	86.90	144,025,453.00	85.96%
2.6.1.8	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	40.00	2,216,826.00	88,673,040.00	42.00	93,106,692.00	99.88%	42.05	$ 93,217,533.00		0.00	0.00%	42.00	93,106,692.00	99.88%
2.6.1.9	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	53.00	3,032,345.00	160,714,285.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.6.1.10	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2,300.00	2,381.00	5,476,300.00	777.00	1,850,037.00	76.93%	1,010.00	$ 2,404,810.00		0.00	0.00%	777.00	1,850,037.00	76.93%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS															
2.6.1.11		Desmontar o desarmar gaviones	m3		43,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.00	$ 175,912.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.6.1.12		Concreto ciclópeo para piso y solados	m3		787,275.00	0.00	29.50	23,224,613.00	56.08%	52.60	$ 41,410,665.00		0.00	0.00%	29.50	23,224,613.00	56.08%
2.6.1.13		Excavación manual en material sin clasificar	m3		71,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.00	$ 428,784.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.6.1.14		Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3		49,324.00	0.00	353.20	17,421,237.00	97.54%	382.11	$ 17,860,714.00		0.00	0.00%	353.20	17,421,237.00	97.54%
2.6.1.15		Demoliciones en concreto ciclópeo	m3		193,409.00	0.00	32.70	6,324,474.00	100.00%	32.70	$ 6,324,474.00		0.00	0.00%	32.70	6,324,474.00	100.00%
2.7		**PAVIMENTOS**				**1,186,533,752.00**		**717,528,814.00**	**78.52%**		**$ 913,780,179.00**		**0.00**	**0.00%**		**717,528,814.00**	**78.52%**
2.7.1		Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3	1,200.00	180,292.00	216,350,400.00	377.00	67,970,084.00	95.06%	396.60	$ 71,503,807.00		0.00	0.00%	377.00	67,970,084.00	95.06%
2.7.2		Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	1,260.00	173,982.00	219,192,120.00	797.70	138,769,467.00	93.63%	852.00	$ 148,215,824.00		0.00	0.00%	797.70	138,769,467.00	93.63%
2.7.3		Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	960.00	193,405.00	185,668,800.00	760.20	147,026,481.00	94.91%	801.00	$ 154,917,405.00		0.00	0.00%	760.20	147,026,481.00	94.91%
2.7.4		Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2	3,200.00	16,153.00	51,689,600.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.7.5		Riego de Imprimacion	m2	3,200.00	12,667.00	40,534,400.00	2,480.00	31,414,160.00	100.00%	2,480.00	$ 31,414,160.00		0.00	0.00%	2,480.00	31,414,160.00	100.00%
2.7.6		Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	384.00	1,229,423.00	472,098,432.00	232.60	285,963,790.00	62.53%	372.00	$ 457,345,356.00		0.00	0.00%	232.60	285,963,790.00	62.53%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS															
2.7.7		Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m3		12,873.90	0.00	2,800.00	36,046,920.00	100.00%	2,800.00	$ 36,046,920.00		0.00	0.00%	2,800.00	36,046,920.00	100.00%
2.7.8		Excavación mejoramiento sub-rasante con maquina, incluye cargue	m3		19,220.00	0.00	287.00	5,516,140.00	96.93%	296.10	$ 5,691,042.00		0.00	0.00%	287.00	5,516,140.00	96.93%
2.7.9		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km		2,381.00	0.00	432.00	1,028,592.00	97.08%	445.00	$ 1,059,545.00		0.00	0.00%	432.00	1,028,592.00	97.08%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)													0.00	0.00	
NP-11 2.7		Riego de liga con emulsion asfaltica	m2	0.00	3,059.00		1,240.00	3,793,160.00	50.00%	2,480.00	$ 7,586,320.00		0.00	0.00%	1,240.00	3,793,160.00	50.00%
		CAPITULOS NO PREVISTOS															
2.8		**OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL**				**0.00**		**20,565,091.00**	**49.17%**		**$ 41,824,336.00**		**0.00**	**0.00%**		**20,565,091.00**	**49.17%**
2.8.1		Tala de arboles de entre 5 a 10m de altura con extraccion de tronco	und		205,997.00	0.00	22.00	4,531,934.00	78.57%	28.00	$ 5,767,916.00		0.00	0.00%	22.00	4,531,934.00	78.57%
2.8.2		Arborización con especies nativas	Un		50,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	28.00	$ 1,405,384.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.8.3		Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3		8,643.00	0.00	182.00	1,573,026.00	10.47%	1,738.00	$ 15,021,534.00		0.00	0.00%	182.00	1,573,026.00	10.47%
2.8.4		Revegetalizacion con semillas agricolas	m2		39,092.00	0.00	369.90	14,460,131.00	73.67%	502.14	$ 19,629,502.00		0.00	0.00%	369.90	14,460,131.00	73.67%
2.9		**CUNETA, GEODREN Y BORDILLO**				**0.00**		**423,485,909.00**	**59.07%**		**$ 716,599,360.00**		**0.00**	**0.00%**		**423,485,909.00**	**59.07%**
2.9.1		Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3		19,220.00	0.00	250.20	4,808,844.00	63.62%	393.28	$ 7,558,842.00		0.00	0.00%	250.20	4,808,844.00	63.62%
2.9.2		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km		2,381.00	0.00	375.00	892,875.00	89.78%	417.66	$ 994,486.00		0.00	0.00%	375.00	892,875.00	89.78%
2.9.3		Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9,165.00	0.00	1,243.10	11,393,012.00	99.93%	1,244.00	$ 11,401,260.00		0.00	0.00%	1,243.10	11,393,012.00	99.93%
2.9.4		Tubo Ø 4" perforado para filtros	m		32,744.00	0.00	392.60	12,855,294.00	93.65%	419.20	$ 13,726,285.00		0.00	0.00%	392.60	12,855,294.00	93.65%
2.9.5		Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3		161,765.00	0.00	215.10	34,795,652.00	40.09%	536.60	$ 86,803,099.00		0.00	0.00%	215.10	34,795,652.00	40.09%
2.9.6		Cunetas en concreto de 21 Mpa e=0,10 m, ancho 0.91mt, incluye excavación, replanteo y conformación	m3		1,055,238.00	0.00	34.10	35,983,616.00	100.00%	34.10	$ 35,983,616.00		0.00	0.00%	34.10	35,983,616.00	100.00%
2.9.7		Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg		11,042.00	0.00	11,255.00	124,277,710.00	94.81%	11,871.00	$ 131,079,582.00		0.00	0.00%	11,255.00	124,277,710.00	94.81%
2.9.8		Solado en concreto 17.5 MPa	m3		1,265,396.00	0.00	8.10	10,249,708.00	20.84%	38.87	$ 49,189,249.00		0.00	0.00%	8.10	10,249,708.00	20.84%
2.9.9		Concreto ciclopeo para piso y solados	m3		787,275.00	0.00	18.40	14,485,860.00	26.29%	70.00	$ 55,109,250.00		0.00	0.00%	18.40	14,485,860.00	26.29%
2.9.10		Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (para alcantarillas)	m3		1,657,370.00	0.00	35.30	58,505,161.00	34.47%	102.40	$ 169,714,688.00		0.00	0.00%	35.30	58,505,161.00	34.47%
2.9.11		Excavación manual en material sin clasificar	m3		71,464.00	0.00	7.10	507,394.00	88.75%	8.00	$ 571,712.00		0.00	0.00%	7.10	507,394.00	88.75%
2.9.12	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador), mat. selec de excavación	m3		49,234.00	0.00	107.70	5,302,502.00	87.81%	122.65	$ 6,038,753.00		0.00	0.00%	107.70	5,302,502.00	87.81%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA													0.00		
2.9.13		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa	m3		1,055,238.00		103.70	109,428,181.00	73.55%	141.00	$ 148,788,556.00		0.00	0.00%	103.70	109,428,181.00	73.55%
2.9.14	1230	Junta de dilatacion con cordon de espuma elastico Ø3/8" + sellador	m		110,030.20								0.00	0.00%	0.00	0.00	
2.10		**AMPLIACION DE BANCA Y ESTABILIDAD DE TALUDES**				**0.00**		**597,180,277.00**	**84.49%**		**$ 706,903,255.00**		**0.00**	**0.00%**		**597,180,277.00**	**84.49%**
2.10.1		Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3		19,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	246.00	$ 4,728,120.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.10.2		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km		2,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	369.00	$ 878,589.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11 — 03-feb.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE ENERO DE 2026.

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 11			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
2.10.3		Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2		90,372.00	0.00	602.30	54,431,056.00	55.26%	1,090.00	$ 98,505,480.00		0.00	0.00%	602.30	54,431,056.00	55.26%
2.10.4		Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg		11,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.10.5		Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (para alcantarillas)	m3		1,657,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	$ -		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.10.6		Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 6x12 C.12 suministro y construcción	m3		458,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.00	$ 2,749,242.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.10.7	902	Sub drenes horizontales en tuberia pvc Ø2"	m		451,972.50	0.00	45.00	20,338,763.00	100.00%	45.00	$ 20,338,763.00		0.00	0.00%	45.00	20,338,763.00	100.00%
		ITEM NO PREVISTO (03-JUNIO-2025 ACTA 01 APROBACION)													0.00		
NP-02 2.10		Anclajes Pasivo DE 1" Incluye suministro, perforacion e inyeccion, tuerca y platina abovedada 15x15	m		262,118.36	0.00	1,108.00	290,427,165.00	100.00%	1,108.00	$ 290,427,165.00		0.00	0.00%	1,108.00	290,427,165.00	100.00%
NP-03 2.10		Suministro el Instalacion de Guaya 3/8" Perimetral y Diagonalmente Entre Anclajes para Refuerzo tipo STEEL GRID	m		57,178.11	0.00	1,412.90	80,786,952.00	75.15%	1,880.00	$ 107,494,847.00		0.00	0.00%	1,412.90	80,786,952.00	75.15%
NP-04 2.10		Suministro e instalacion malla Macmat R1 con Guaya Perimetral y Diagonales Tipo STEEL GRID.	m2		139,454.29	0.00	1,084.20	151,196,341.00	83.22%	1,302.80	$ 181,681,049.00		0.00	0.00%	1,084.20	151,196,341.00	83.22%
2.11		SEÑALIZACION VIAL				0.00		199,129,555.00	85.41%		$ 233,139,153.00		0.00	0.00%		196,129,555.00	85.41%
2.11.1		Excavación manual en material sin clasificar	m3		71,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00	$ 357,320.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.11.2		Señal vial vertical, incluye: suministro e instalación	Un		525,144.80	0.00	2.00	1,050,289.00	6.90%	29.00	$ 15,229,193.00		0.00	0.00%	2.00	1,050,289.00	6.90%
2.11.3		Demarcación horizontal	km		3,089,213.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.20	$ 3,707,057.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.11.4		Taches reflectivas bidireccionales, suministro e instalacion	Un		13,140.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	200.00	$ 2,628,008.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.11.5		Delineador de curva y corona horizontal 60x75cm	Un		389,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.00	$ 5,838,456.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2.11.6		Defensa metalica acanalada a dos crestas en HG	m		606,613.00	0.00	324.00	196,542,612.00	100.00%	324.00	$ 196,542,612.00		0.00	0.00%	324.00	196,542,612.00	100.00%
		ITEM NO PREVISTO (03-JUNIO-2025 ACTA 01 APROBACION)				0.00									0.00	0.00	
NP-08 2.11		Suministro e instalacion de estoperol	Un		7,757.00		0.00	0.00	0.00%	720.00	$ 5,585,040.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
NP-09 2.11		Delineador vial tipo corona	und		109,781.00		14.00	1,536,654.00	58.33%	24.00	$ 2,634,264.00		0.00	0.00%	14.00	1,536,654.00	58.33%
NP-10 2.11		Marca vial con pinutra en frio	m2		64,292.00		0.00	0.00	0.00%	9.60	$ 617,203.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3		ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K31+900 - K32+900				11,825,784,216.00		7,909,349,785.00	63.96%		11,825,784,216.00		596,497,580.00	5.04%		8,105,837,345.00	68.54%
3.1		PRELIMINARES				70,947,069.00		41,290,924.00	46.37%		89,044,517.00		0.00	0.00%		41,290,924.00	46.37%
3.1.1	203	Nivelación, replanteo y control topográfico	m2	10,800.00	3,944.00	41,806,400.00	8,175.00	32,242,200.00	77.12%	10,600.00	41,806,400.00		0.00	0.00%	8,175.00	32,242,200.00	77.12%
3.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	4,240.00	2,071.00	8,781,040.00	0.00	0.00	0.00%	4,240.00	8,781,040.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.1.3	226	Retiro, traslado y reubicación de poste de paso y baja tensión	un	9.00	2,262,181.00	20,359,629.00	4.00	9,048,724.00	23.53%	17.00	38,457,077.00		0.00	0.00%	4.00	9,048,724.00	23.53%
3.2		OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES				1,307,398,972.00		734,567,315.00	54.53%		1,347,196,658.00		169,400,764.00	12.57%		903,968,079.00	67.10%
3.2.1		CUNETA, GEODREN Y BORDILLO				1,307,398,972.00		734,567,315.00	54.53%		1,347,196,658.00		169,400,764.00	12.57%	0.00	903,968,079.00	67.10%
3.2.1.1	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	62.08	193,409.00	12,006,753.00	0.00	0.00	0.00%	10.00	1,934,012.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.2.1.2	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	1,656.00	71,454.00	118,344,384.00	36.50	2,536,972.00	11.30%	314.10	22,446,842.00		0.00	0.00%	36.50	2,536,972.00	11.30%
3.2.1.3	1231	Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2	5,244.00	23,615.00	123,837,060.00	664.00	15,680,360.00	100.00%	664.00	15,680,360.00		0.00	0.00%	664.00	15,680,360.00	100.00%
3.2.1.4	901	Geodren con tubo 4" tipo ADS H=1.50 mt	m	1,000.00	111,380.00	111,380,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.2.1.5	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	960.00	393,912.00	378,155,520.00	694.30	273,493,102.00	86.79%	800.00	315,129,600.00		0.00	0.00%	694.30	273,493,102.00	86.79%
3.2.1.6	806	Cunetas en concreto de 21 Mpa e=0.10 m, ancho 0.91mt, incluye excavación, replanteo y conformación	m3	91.00	1,477,118.00	134,417,738.00	19.70	29,099,225.00	99.51%	19.80	29,243,982.00		0.00	0.00%	19.70	29,099,225.00	99.51%
3.2.1.7	826	Sello elastico para juntas con poliuretano autonivelante	m2	1,932.00	47,513.00	91,795,116.00	0.00	0.00	0.00%	132.00	6,271,716.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.2.1.8	809	Bordillo en concreto 21 Mpa, sección trapezoide 40x30x20, incluye refuerzo	m	1,000.00	233,544.00	233,544,000.00	0.00	0.00	0.00%	500.00	116,772,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.2.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	6,000.00	11,447.00	68,682,000.00	11,787.00	134,925,789.00	38.97%	30,247.26	346,240,381.00	4,583.00	52,461,601.00	15.15%	16,370.00	187,387,390.00	54.12%
3.2.1.10	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	1,656.00	9,194.00	15,225,264.00	0.00	0.00	0.00%	62.08	570,784.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.2.1.11	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2,152.80	2,381.00	5,125,817.00	2,195.80	5,227,724.00	37.99%	5,779.84	13,761,799.00		0.00	0.00%	2,195.80	5,227,724.00	37.99%
3.2.1.12	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	1,722.24	8,643.00	14,885,320.00	0.00	0.00	0.00%	800.00	6,914,400.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS													0.00	0.00	
3.2.1.13	908	Tuberia perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m		32,744.00	0.00	1,016.00	33,267,904.00	72.57%	1,400.00	45,841,600.00		0.00	0.00%	1,016.00	33,267,904.00	72.57%
3.2.1.14	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3		19,220.00	0.00	630.90	12,125,898.00	78.86%	800.00	15,376,000.00		0.00	0.00%	630.90	12,125,898.00	78.86%
3.2.1.15	635	Union de Anclaje en concreto con resina epoxica.	kg		16,131.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	173.30	3,140,358.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.2.1.16	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9,165.00	0.00	3,151.30	28,881,665.00	75.03%	4,200.00	38,493,000.00		0.00	0.00%	3,151.30	28,881,665.00	75.03%
3.2.1.17	219	Solado en concreto 17.5 MPa	m3		1,285,396.00	0.00	6.50	8,225,074.00	13.74%	47.32	59,878,539.00	2.60	3,290,030.00	0.00%	9.10	11,515,104.00	19.23%
3.2.1.18		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa			1,055,238.00		181.10	191,103,602.00	61.75%	293.30	309,501,305.00	107.70	113,649,133.00	0.00%	288.80	304,752,734.00	98.47%
3.3		OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES				1,938,882,726.00		2,095,958,176.00	80.71%		2,594,612,955.00		20,372,487.00	0.79%		2,106,330,671.00	81.50%
3.3.1		ALCANTARILLAS + MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO				1,056,008,192.00		1,137,695,625.00	57.57%		1,299,257,359.00		4,902,654.00	0.38%	0.00	1,142,598,279.00	57.94%
3.3.1.1	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación,	m	56.40	101,591.00	5,729,732.00	56.37	5,726,685.00	99.95%	56.40	5,729,732.00		0.00	0.00%	56.37	5,726,685.00	99.95%
3.3.1.2	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	19.81	238,519.00	4,677,358.00	17.21	4,104,912.00	87.76%	19.81	4,677,358.00		0.00	0.00%	17.21	4,104,912.00	87.76%
3.3.1.3	303	Demolicion manual en roca	m3	6.36	326,510.00	2,076,604.00	6.50	2,122,315.00	100.00%	6.50	2,122,315.00		0.00	0.00%	6.50	2,122,315.00	100.00%
3.3.1.4	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	907.00	1,915.00	1,162,405.00	136.96	262,278.00	15.14%	904.84	1,732,789.00		0.00	0.00%	136.96	262,278.00	15.14%
3.3.1.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	1,673.976	19,220.00	32,173,619.00	2,280.47	43,830,633.00	90.32%	2,524.67	48,526,001.00	14.40	276,768.00	0.57%	2,294.87	44,107,401.00	90.89%
3.3.1.6	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y otras)	m3	175.39	1,657,370.00	290,689,439.00	231.90	384,344,103.00	99.16%	233.87	387,610,365.00	1.00	1,657,370.00	0.43%	232.90	386,001,473.00	99.58%
3.3.1.7	219	Solado en concreto 17.5 MPa	m3	2.73	1,265,396.00	3,448,837.00	4.53	5,732,244.00	100.00%	4.53	5,732,244.00		0.00	0.00%	4.53	5,732,244.00	100.00%
3.3.1.8	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	50.00	2,216,826.00	110,841,300.00	135.50	300,379,923.00	77.99%	173.75	385,173,518.00		0.00	0.00%	135.50	300,379,923.00	77.99%
3.3.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11,196.48	11,447.00	128,051,682.00	23,771.13	272,108,125.00	97.11%	24,477.50	280,193,949.00	53.00	606,691.00	0.22%	23,824.13	272,714,816.00	97.33%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11 — 03-feb.-26

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE ENERO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 11			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALE $	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
3.3.1.10	832	Gradas disipadoras en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,60 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	22,31	2,369,134,00	52,854,195,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.1.11	833	Canal sección 1,20x0,60 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	100,30	328,443,00	32,942,833,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.1.12	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	53,00	3,032,345,00	160,714,285,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.1.13	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y conetrucción	m3	405,00	458,207,00	185,573,835,00	64,00	29,325,248,00	100,00%	64,00	29,325,248,00		0,00	0,00%	64,00	29,325,248,00	100,00%
3.3.1.14	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	355,48	49,324,00	17,533,853,00	716,70	35,350,511,00	84,35%	849,86	41,908,629,00		0,00	0,00%	716,70	35,350,511,00	84,35%
3.3.1.15	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	55,76	9,194,00	512,630,00	61,84	568,557,00	81,36%	76,01	698,808,00		0,00	0,00%	61,84	568,557,00	81,36%
3.3.1.16	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	4,463,85	2,381,00	10,628,431,00	2,064,87	4,916,455,00	25,03%	8,250,32	19,644,017,00		0,00	0,00%	2,064,87	4,916,455,00	25,03%
3.3.1.17	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	1,897,14	8,643,00	16,396,954,00	0,00	0,00	0,00%	2,172,00	18,772,569,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS														0,00	
3.3.1.18	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3		71,464,00	0,00	18,10	1,293,498,00	60,33%	30,00	2,143,920,00		0,00	0,00%	18,10	1,293,498,00	60,33%
3.3.1.19	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	m3		787,275,00	0,00	60,50	47,630,138,00	72,98%	82,90	65,263,917,00	3,00	2,361,825,00	0,00%	63,50	49,991,963,00	76,60%
3.3.2		**BOXCULVERT**				**582,874,534,00**	0,00	**948,262,561,00**	**73,77%**		**1,295,355,596,00**			**1,20%**	0,00	**963,732,392,00**	**74,98%**
3.3.2.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	430,54	1,915,00	824,492,00	0,00	0,00	0,00%	430,54	824,492,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.2	204	Rocería y Limpieza	m2	430,54	2,071,00	891,657,00	0,00	0,00	0,00%	430,54	891,657,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.3	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	7,73	238,519,00	1,843,521,00	7,73	1,843,752,00	42,64%	18,13	4,324,349,00		0,00	0,00%	7,73	1,843,752,00	42,64%
3.3.2.4	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	29,37	193,409,00	5,680,244,00	53,20	10,289,359,00	25,17%	211,37	40,880,682,00	5,30	1,025,068,00	2,51%	58,50	11,314,427,00	27,68%
3.3.2.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	279,44	19,220,00	5,370,801,00	885,64	17,022,001,00	71,02%	1,247,00	23,967,304,00		0,00	0,00%	885,64	17,022,001,00	71,02%
3.3.2.6	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	277,57	71,464,00	19,836,162,00	0,00	0,00	0,00%	18,74	1,339,235,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.7	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	47,32	1,265,396,00	59,881,164,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.8	1307	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo	m3	2,64	2,252,438,00	5,941,931,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.9	730	Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y estribos, bajo agua	m3	25,57	2,187,530,00	55,932,517,00	14,36	31,412,931,00	42,00%	34,19	74,785,417,00		0,00	0,00%	14,36	31,412,931,00	42,00%
3.3.2.10	1006	Muro pantalla en concreto 28 Mpa	m3	14,83	1,705,519,00	25,285,172,00	74,48	127,027,055,00	96,73%	77,00	131,319,846,00		0,00	0,00%	74,48	127,027,055,00	96,73%
3.3.2.11	1201	Concreto 28 Mpa para vigas y losa	m3	43,89	1,849,526,00	81,170,388,00	126,88	234,667,859,00	98,36%	129,00	238,583,546,00		0,00	0,00%	126,88	234,667,859,00	98,36%
3.3.2.12	1011	Concreto 24,5 MPa para muros, estribos, losetas y parapetos, Incluye bomba de concreto	m3	36,15	1,784,716,00	64,522,836,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.13	1239	Concreto 24,5MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	4,96	1,426,721,00	7,110,777,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.14	1701	Acero de refuerzo 60,000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	10,213,78	11,447,00	116,917,195,00	29,505,90	337,754,037,00	93,51%	31,553,00	361,187,191,00	416,00	4,784,846,00	1,32%	29,923,90	342,539,883,00	94,84%
3.3.2.15	828	Sello elástico para juntas con poliuretano autonivelante	m2	18,44	47,513,00	876,140,00	0,00	0,00	0,00%	18,44	876,140,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.16	741	Cinta flexible pvc e=15cm, para sello de juntas	m	39,80	36,592,00	1,456,362,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.17	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	11,30	405,590,00	4,581,899,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.18	905	Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	184,68	10,716,00	1,979,063,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.19	1020	Tubo PVC Ø2" sanitario, para paso de lloraderos	m	6,00	17,144,00	102,864,00	0,00	0,00	0,00%	6,00	102,864,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.20	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	12,14	393,912,00	4,783,667,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	1,969,560,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.21	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	68,28	349,143,00	23,838,402,00	17,10	5,970,345,00	6,98%	245,00	85,540,035,00		0,00	0,00%	17,10	5,970,345,00	6,98%
3.3.2.22	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y conetrucción	m3	111,00	458,207,00	50,860,977,00	3,50	1,603,725,00	14,00%	25,00	11,455,175,00	18,80	8,614,292,00	75,20%	22,30	10,218,018,00	89,20%
3.3.2.23	740	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=30cm	m3	54,60	590,592,80	32,246,367,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.24	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	409,07	9,194,00	3,760,959,00	7,73	71,070,00	3,37%	229,50	2,110,023,00		0,00	0,00%	7,73	71,070,00	3,37%
3.3.2.25	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	772,34	2,381,00	1,838,933,00	1,659,42	3,951,079,00	22,93%	7,236,80	17,230,809,00		0,00	0,00%	1,659,42	3,951,079,00	22,93%
3.3.2.26	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	617,87	8,643,00	5,340,242,00	0,00	0,00	0,00%	1,265,74	10,939,782,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS								0,00	0,00					0,00	
3.3.2.27	742	Concreto ciclopeo para piso y solados	m3		787,275,00	0,00	63,70	50,149,418,00	98,30%	64,80	51,015,420,00	1,10	866,003,00	0,00%	64,80	51,015,420,00	100,00%
3.3.2.28	303	Demolicion manual en roca	m3		326,510,00	0,00	9,00	2,938,590,00	55,01%	16,36	5,341,704,00		0,00	0,00%	9,00	2,938,590,00	55,01%
3.3.2.29	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3		180,292,33	0,00	5,20	937,520,00	3,64%	143,00	25,781,803,00		0,00	0,00%	5,20	937,520,00	3,64%
3.3.2.30		Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=50cm	m3		590,593,00	0,00	161,80	95,557,947,00	61,99%	261,00	154,144,773,00		0,00	0,00%	161,80	95,557,947,00	61,99%
3.3.2.31		Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	0,00	9,165,00	0,00	12,00	109,980,00	5,63%	213,00	1,952,145,00	19,60	179,634,00	0,00%	31,60	289,614,00	14,84%
3.3.2.32		Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m	0,00	32,744,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	36,00	1,178,784,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00	0,00	0,00%						0,00		0,00%
NP-06 3.3		Recubrimiento de colchogavión en concreto 3000psi	m3		1,253,752,00	0,00	21,50	26,955,883,00	71,67%	30,00	37,612,860,00		0,00	0,00%	21,50	26,955,883,00	71,67%
3.4		**OBRAS DE AMPLIACION DE BANCA**				**1,936,402,409,00**		**980,204,072,00**	**95,16%**		**1,150,995,432,00**		**0,00**	**0,00%**		**980,204,072,00**	**95,16%**
3.4.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	2.362,13	1,915,00	4,523,479,00	0,00	0,00	0,00%	219,38	420,113,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.2	204	Rocería y Limpieza	m2	2.362,13	2,071,00	4,891,971,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.3	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	28,66	238,519,00	6,839,866,00	16,40	3,911,712,00	57,22%	28,66	6,836,668,00		0,00	0,00%	16,40	3,911,712,00	57,22%
3.4.4	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	14,30	101,591,00	1,452,751,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	1.679,72	19,220,00	32,284,295,00	4,256,00	81,800,320,00	59,01%	7,212,53	138,624,815,00		0,00	0,00%	4,256,00	81,800,320,00	59,01%
3.4.6	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	773,40	71,464,00	55,270,150,00	0,00	0,00	0,00%	4,50	321,588,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.7	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	22,68	1,265,396,00	28,703,294,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.8	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	68,10	2,216,826,00	150,970,284,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4,434,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.9	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y ornas)	m3	84,49	1,657,370,00	140,029,895,00	217,80	360,975,186,00	100,00%	217,80	360,975,186,00		0,00	0,00%	217,80	360,975,186,00	100,00%
3.4.10	1004	Muro pantalla en concreto 24,5MPa	m3	105,21	1,657,645,00	174,400,830,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.11	1230	Junta de dilatacion con cordon de espuma elastico Ø3/8" + sellador	m	37,74	110,030,20	4,152,540,00	0,00	0,00	0,00%	60,00	6,601,812,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.12	1011	Concreto 24,5 MPa para muros, estribos, losetas y parapetos, Incluye bomba de concreto	m3	81,08	1,784,716,00	144,695,850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.13	729	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	36,38	1,596,819,00	58,096,267,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.14	1239	Concreto 24,5MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	16,83	1,426,721,00	24,011,714,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

341
