1369

FECHA DEL INFORME	03 DE MARZO DE 2026.

1.GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	LP-FC-38-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA	08 de agosto de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S".
CONTRATISTA	CONSORCIO VIA CENTRO
NIT DEL CONTRATISTA	901687177-1
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1.090.473.156
DIRECCIÓN CONTRATISTA / CONTACTOS	CENTRO DE NEGOCIO – VENTURA PLAZA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA	LILIANA FUENTES MEDINA designada mediante memorando del día 08 de agosto de 2023 LUIS ALFONSO RIVERA PABON designado mediante memorando del día 16 de octubre de 2024
INTERVENTOR EXTERNO	CONSORCIO R&Q – JOYCO R.L. DIANA LORENA CASTAÑO ACERO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00000189 del 12 de julio de 2023 No. 00000100 del 29 de enero de 2024 No. 00000231 del 8 de agosto de 2024 (ADICIONAL) No. 00000070 del 17 de febrero de 2025 No. 00 000053 del 10 de febrero 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00000163 del 09 de junio de 2023 No. 00000072 del 12 de febrero de 2024 No. 00000222 del 13 de agosto de 2024 (ADICIONAL) No. 00000032 del 18 de febrero de 2025 No. 00 000064 del 03 de marzo 2026
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($69.756.000.000.00) M/CTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($599.955.314,00)
VALOR FINAL CONTRATO	SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($70.355.955.314,00)
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	N/A
ACTA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
MODIFICATORIOS	No. 01 del 10 de agosto de 2023 No. 02 del 30 de octubre de 2023 No. 03 del 12 de febrero de 2024 No. 04 del 12 de marzo de 2024 No. 05 del 13 de agosto de 2024 No. 06 del 17 de febrero de 2025 No. 07 del 15 de septiembre de 2025
ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES	ACTA No. 1 DEL 13 AGOSTO DEL 2024. ACTA No. 2 DEL 15 ENERO DEL 2025. ACTA No. 3 DEL 24 FEBRERO DEL 2025. ACTA No. 4 DEL 06 DE MARZO DEL 2025. ACTA No. 5 DEL 03 DE JULIO DEL 2025. ACTA No. 6 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 ACTA No. 7 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025

1370

ACTAS DE RECIBO PREVIAS	ACTA PARCIAL N° 1 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 ACTA PARCIAL N° 2 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ACTA PARCIAL N° 3 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 4 DEL 04 DE MARZO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 5 DEL 05 DE MAYO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 6 DEL 01 DE JULIO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 7 DEL 04 DE AGOSTO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 8 DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 9 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 10 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025
ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS	ACTA No. 1 DEL 03 JUNIO DEL 2025. ACTA No. 2 DEL 03 JULIO DEL 2025.

2.GARANTIAS DEL CONTRATO

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN			
REQUISITO	**FECHA**		
Garantía Única. 400049799 Nacional de seguros Fecha de Expedición:11/08/2023 Fecha de aprobación: 16/08/2023	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento	$20.926.800.000,00	08/08/2023 a 30/04/2027
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$20.926.800.000,00	08/08/2023 a 31/12/2029
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$13.951.200.000,00	08/08/2023 a 30/04/2027
	Estabilidad y calidad de la obra.	$20.926.800.000,00	31/12/2026 a 31/12/2031
	Valor asegurado	Vigencia	

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 400049798 Nacional de seguros Anexo 0 Fecha de Expedición:11/08/2023 Fecha de aprobación: 16/08/2023 Anexo 1 Fecha de Expedición:16/08/2023 Fecha de aprobación: 16/08/2023	$3.487.800.000,00	08/08/2023 a 31/12/2026
Otros (según el contrato):		

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE ACTA DE INICIO

REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN			
REQUISITO	**FECHA**		
Garantía Única. 400049799 ANEXO 2 Nacional de seguros Fecha de Expedición:07/11/2023 Fecha de aprobación: 07/11/2023	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento	$20.926.800.000,00	01/09/2023 a 24/05/2027
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$20.926.800.000,00	01/09/2023 a 24/01/2030
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$13.951.200.000,00	01/09/2023 a 24/05/2027
	Estabilidad y calidad de la obra.	$20.926.800.000,00	24/01/2027 a 24/01/2032

1371

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 400049798 Nacional de seguros Anexo 3 Fecha de Expedición:07/11/2023 Fecha de aprobación: 07/11/2023	Valor asegurado	Vigencia
	$3.487.800.000,00	01/09/2023 a 24/01/2027
Otros (según el contrato):		

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE MODIFICATORIO

REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN			
REQUISITO	**FECHA**		
Garantía Única. 400049799 ANEXO 3 Nacional de seguros Fecha de Expedición:04/09/2024 Fecha de aprobación: 06/09/2024	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento	$21.106.786.594,20	13/08/2024 a 24/05/2027
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$21.106.786.594,20	13/08/2024 a 24/01/2030
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$13.951.200.000,00	13/08/2024 a 24/05/2027
	Estabilidad y calidad de la obra.	$21.106.786.594,20	24/01/2027 a 24/01/2032
	Calidad de los estudios.	$250.863.900,00	15/02/2025 a 15/02/2030

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	Valor asegurado	Vigencia
	$3.517.797.765,70	13/08/2024 a 24/01/2027

400049798 Nacional de seguros Anexo 4 Fecha de Expedición:04/09/2024 Fecha de aprobación: 06/09/2024		
Otros (según el contrato):		

3. ESTADO FINANCIERO				
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR ACTA**	**AMORTIZACION/ ANTICIPO**	**VALOR PAGADO**
ACTA PARCIAL 01	05/07/2024	$471.026.144,00	$94.205.229,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 02	19/09/2024	$378.641.159,00	$75.728.232,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 03	19/02/2025	$1.344.468.123,00	$268.893.625,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 04	04/03/2025	$1.874.700.291,00	$374.940.058,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 05	02/05/2025	$2.187.803.958,00	$437.560.792,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 06	01/07/2025	$2.248.662.875,00	$449.732.575,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 07	04/08/2025	$2.414.655.762,00	$ 482.931.152,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 08	01/10/2025	$ 3.136.079.055,00	$ 627.215.811,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 09	04/11/2025	$ 2.496.597.312,00	$ 499.319.462,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 10	16/12/2025	$ 7.096.479.077,00	$1.419.295.815,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 11	03/03/2026	$2.070.850.890,00	$414.170.178,00	EN TRAMITE
	TOTAL	$25.719.964.646,00	$5.143.992.929,00	

1372

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
TOTAL, VALOR INICIAL DEL CONTRATO	100,00%	$ 69.756.000.000.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO		$ 599.955.314,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	100%	$ 70.355.955.314,00
TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 01	% 0,67	$471.026.144,00
TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 02	% 0,54	$378.641.159,00
TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 03	%1,91	$1.344.468.123,00
TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 04	% 2,66	$1.874.700.291,00
TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 05	% 3,11	$2.187.803.958,00
TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 06	% 3.20	$2.248.662.875,00
TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 07	% 3.43	$ 2.414.655.762,00
TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 08	% 4.46	$ 3.136.079.055,00
TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 09	% 3.55	$ 2.496.597.312,00
TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 10	% 8.07	$ 7.096.479.077,00
TOTAL, EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 11	% 2,94	$ 2.070.850.890,00

4.DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONSORCIO R&Q - JOYCO interventoría, realiza seguimiento y control a las actividades contractuales ejecutadas por el contratista de obra, actividades realizadas en el periodo comprendido entre 01 de diciembre al 31 enero de 2026 por el contratista CONSORCIO VIA CENTRO al cumplimiento de su objeto contractual MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Durante el periodo del 01 de diciembre del 2025 al 31 de enero del 2026 se presentó el avance de las siguientes actividades

1		CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900
1.2		OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
1.2.1		ALCANTARILLAS
1.2.1.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
1.2.1.6	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)
1.2.1.9	835	Tubería de PVC Ø20" incluye colchón de arena.
1.2.1.18		Demolicion manual en roca
1.2.1.19		Excavación manual en material sin clasificar
1.2.2		CUNETA, GEODREN Y BORDILLO
1.2.2.3	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)
1.2.2.6	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn
1.2.2.9	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
1.2.2.10		Tubo Ø 4" perforado para filtros
1.2.2.15	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina
1.2.2.18		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa

1373

1.2.5 BOXCULVERT

1.2.5.4 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue

1.2.5.5 401 Excavación manual en material sin clasificar

1.2.5.14 Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción

1.2.5.15 Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte

1.3 OBRAS DE ESTABILIDAD, AMPLIACION Y CONFINAMIENTO.

1.3.2 OBRA K5+255-K5+355: Muro en gaviones H=2.00m L=45.00m

1.3.2.9 1226 Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn

1.3.5 MURO CAISSON K4+140

1.3.5.5 405 Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 4 - 12mt, sin dinamita

1.3.5.6 701 Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt

1.3.5.7 736 Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 - 12mt

1.3.5.9 767 Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas

1.3.5.12 1802 Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada

NP-02 1.3 Anclajes Pasivo DE 1" Incluye suministro, perforacion e inyeccion, tuerca y platina abovedada 15x15

NP-13 1.3 Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 0 - 4mt, sin dinamita

1.4 MOVIMIENTO DE TIERAS

1.4.1 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue

1.4.2 503 Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina

1.5 PAVIMENTOS

1.5.6 1206 Carpeta asfaltica en caliente MDC-19

1.5.7 Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares

NP-11 1.5 Riego de liga con emulsion asfaltica

1.6 SEÑALIZACION VIAL

NP-09 1.6 Delineador vial tipo corona

1.7 OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO

1.7.1 ZODME K6+580

1.7.1.2 204 Rocería y Limpieza

3 ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900

3.2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

3.2.1 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO

3.2.1.9 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)

3.2.1.17 219 Solado en concreto 17,5 MPa

3.2.1.18 Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa

3.3 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

3.3.1 ALCANTARILLAS + MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO

3.3.1.5 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue

3.3.1.6 1007 Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)

3.3.1.9 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)

3.3.1.19 742 Concreto ciclópeo para piso y solados

3.3.2 BOXCULVERT

3.3.2.4 302 Demoliciones en concreto ciclópeo

3.3.2.14 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)

3.3.2.22 1003 Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción

3.3.2.27 742 Concreto ciclopeo para piso y solados

1374

3.3.2.31		Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn
3.5		OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES
3.5.6	401	Excavación manual en material sin clasificar
3.5.18	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte
3.5.32	811	Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"
3.5.34	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción
3.5.40	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn
NP-05 3.5		Cuneta para zanja corona en geomembrana 30mils
3.6		PUNTOS CRITICOS
3.6.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
3.6.6	401	Excavación manual en material sin clasificar
3.6.14	219	Solado en concreto 17,5 MPa
3.6.16	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)
3.6.21	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)
3.6.53	742	Concreto ciclopeo para piso y solados
3.8		PAVIMENTOS
3.8.4	1205	Riego de Imprimacion
3.8.5	1206	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19
NP-11 3.8		Riego de liga con emulsion asfaltica
4		ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920
4.2		OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
4.2.4		BOXCULVERT
4.2.4.1	301	Demoliciones en concreto reforzado
4.2.4.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
4.2.4.4	219	Solado en concreto 17,5 MPa

4.2.4.5	767	Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones
4.2.4.6	1012	Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas
4.2.4.7	1201	Concreto 28 Mpa para vigas y losa
4.2.4.11	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)

1375

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

	
1.2.1.4 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	1.2.1.6 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)
	
1.2.1.9 835 Tubería de PVC Ø20" incluye colchón de arena.	11.2.1.18 Demolicion manual en roca
	
1.2.1.19 Excavación manual en material sin clasificar	1.2.2.3 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)

	
1.2.2.6 1226 Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	1.2.2.9 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
	
1.2.2.9 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	1.2.2.10 Tubo Ø 4" perforado para filtros
	
1.2.2.15 503 Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	1.2.2.18 Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa

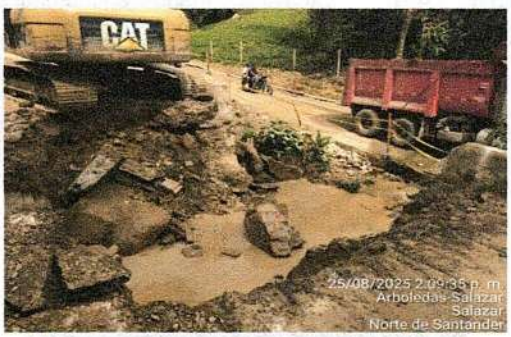
	
1.2.5.4 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	1.2.5.5 401 Excavación manual en material sin clasificar
	
1.2.5.14 Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	1.2.5.15 Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte
	
1.3.2.9 1226 Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	1.3.5.5 405 Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 4 - 12mt, sin dinamita

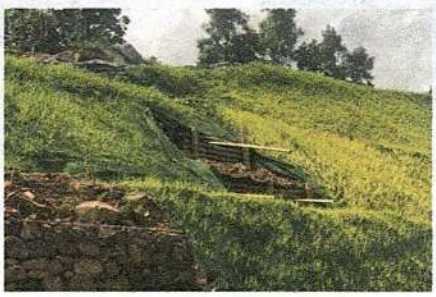
	
1.3.5.6 701 Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	1.3.5.7 736 Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 - 12mt
	
1.3.5.9 767 Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas	1.3.5.12 1802 Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada
	
NP-02 1.3 Anclajes Pasivo DE 1" Incluye suministro, perforacion e inyeccion, tuerca y platina abovedada 15x15	NP-13 1.3 Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 0 - 4mt, sin dinamita

1377

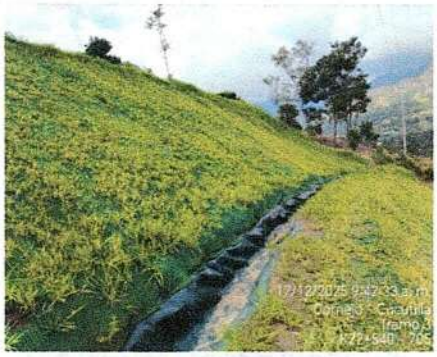
	
1.4.1 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	1.4.2 503 Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina
	
1.5.6 1206 Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	1.5.7 Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares
	
NP-11 1.5 Riego de liga con emulsion asfaltica	NP-09 1.6 Delineador vial tipo corona

	
1.7.1.2 204 Rocería y Limpieza	3.2.1.9 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)
	
3.2.1.17 219 Solado en concreto 17,5 MPa	3.2.1.18 Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa
	
3.3.1.5 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	3.3.1.6 1007 Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)

	
3.3.1.9 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	3.3.1.19 742 Concreto ciclópeo para piso y solados
	
3.3.2.4 302 Demoliciones en concreto ciclópeo	3.3.2.14 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)
	
3.3.2.22 1003 Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	3.3.2.27 742 Concreto ciclopeo para piso y solados

	
3.3.2.31 Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	3.5.6 401 Excavación manual en material sin clasificar
	
3.5.18 1204 Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	3.5.32 811 Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"
	
3.5.34 1003 Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	3.5.40 1226 Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn

1379

	
NP-05 3.5 Cuneta para zanja corona en geomembrana 30mils	3.6.5 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
	
3.6.6 401 Excavación manual en material sin clasificar	3.6.14 219 Solado en concreto 17,5 MPa
	
3.6.16 1007 Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	3.6.21 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)

	
3.6.53 742 Concreto ciclopeo para piso y solados	3.8.4 1205 Riego de Imprimacion
	
3.8.5 1206 Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	NP-11 3.8 Riego de liga con emulsion asfaltica
	
4.2.4.1 301 Demoliciones en concreto reforzado	4.2.4.3 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue

1380

	
4.2.4.4 219 Solado en concreto 17,5 MPa	4.2.4.5 767 Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones
	
4.2.4.6 1012 Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas	4.2.4.7 1201 Concreto 28 Mpa para vigas y losa
	
4.2.4.11 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	

6. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, ING. LUIS ALFONSO RIVERA PABON en mi condición de supervisor del contrato de obra LP-FC-38-2023 del 08 de agosto de 2023, CERTIFICO que:

CONSORCIO VIA CENTRO, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S"

durante el período comprendido del primero (1) de diciembre al treinta y uno (31) de enero de 2026, información verificada y aprobada por la interventoría. El valor a reconocer y pagar es la DOS MIL SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 2.070.850.890,00) M/CTE correspondiente al PAGO PARCIAL No 11 del 03 de marzo de 2026.

De igual forma, según revisión y aprobación de interventoría, el contratista acreditó los pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley, planillas que fueron presentadas por el contratista en el informe.

Observaciones (Si hay lugar a ello):

ING. LUIS ALFONSO RIVERA PABON

Supervisor

Proyectó: Ing. Rafael redondo – Apoyo supervisión

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

INFORME GENERAL No. 11

03 DE MARZO DE 2026

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023.

PROYECTO "CONTRATAR A LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS EN LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZARARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
CONTRATO No. – FECHA:	CTOI-SV-02532-2023 DEL 27 DE JUNIO DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	INTERADMINISTRATIVO
SUSCRITO:	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y E.I.C.E FARO DEL CATATUMBO S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR A LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS EN LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZARARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER.
SUPERVISOR DESIGNADO	ISABEL CRISTINA YAÑES MONTAÑO CON FECHA DE DESIGNACION DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($ 69.756.000.000
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO INICIAL:	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($599.955.314)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	SETENTA MIL TRESCIETNOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($70.355.955.314,00,00)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 003296 23 DE JUNIO DE 2023 00 002600 31 DE MAYO DE 2024

PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026
PLAZO ADICIONAL	N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 003975 DEL 28 DE JUNIO DE 2023 00 002853 DEL 10 DE JULIO DE 2024
ACTA DE INICIO:	07 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026

GENERALIDADES CONTRATO DERIVADO

CONTRATO DE OBRA No.	LP-FC-38-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA	08 de agosto de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S".
CONTRATISTA	CONSORCIO VIA CENTRO
NIT DEL CONTRATISTA	901687177-1
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1.090.473.156
DIRECCIÓN CONTRATISTA / CONTACTOS	CENTRO DE NEGOCIO – VENTURA PLAZA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA	LILIANA FUENTES MEDINA designada mediante memorando del día 08 de agosto de 2023

	LUIS ALFONSO RIVERA PABON designado mediante memorando del día 16 de octubre de 2024
INTERVENTOR EXTERNO	CONSORCIO R&Q – JOYCO R.L. DIANA LORENA CASTAÑO ACERO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00000189 del 12 de julio de 2023 No. 00000100 del 29 de enero de 2024 No. 00000231 del 8 de agosto de 2024 (ADICIONAL) No. 00000070 del 17 de febrero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00000163 del 09 de junio de 2023 No. 00000072 del 12 de febrero de 2024 No. 00000222 del 13 de agosto de 2024 (ADICIONAL) No. 00000032 del 18 de febrero de 2025
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($69.756.000.000.00) M/CTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($599.955.314,00)
VALOR FINAL CONTRATO	SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($70.355.955.314,00)
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	N/A
ACTA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
MODIFICATORIOS	No. 01 del 10 de agosto de 2023 No. 02 del 30 de octubre de 2023 No. 03 del 12 de febrero de 2024 No. 04 del 12 de marzo de 2024 No. 05 del 13 de agosto de 2024 No. 06 del 17 de febrero de 2025 No. 07 del 15 de septiembre de 2025

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES	ACTA No. 1 DEL 13 AGOSTO DEL 2024. ACTA No. 2 DEL 15 ENERO DEL 2025. ACTA No. 3 DEL 24 FEBRERO DEL 2025. ACTA No. 4 DEL 06 DE MARZO DEL 2025. ACTA No. 5 DEL 03 DE JULIO DEL 2025. ACTA No. 6 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 ACTA No. 7 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025.
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	ACTA PARCIAL N° 1 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 ACTA PARCIAL N° 2 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ACTA PARCIAL N° 3 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 4 DEL 04 DE MARZO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 5 DEL 05 DE MAYO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 6 DEL 01 DE JULIO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 7 DEL 04 DE AGOSTO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 8 DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 9 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 10 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025
ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS	ACTA No. 1 DEL 03 JUNIO DEL 2025. ACTA No. 2 DEL 03 JULIO DEL 2025.

POLIZAS DEL CONTRATO DERIVADO

REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN			
REQUISITO	**FECHA**		
Garantía Única. 400049799 Nacional de seguros Fecha de Expedición:11/08/2023 Fecha de aprobación: 16/08/2023	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento	$20.926.800.000,00	08/08/2023 a 30/04/2027
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$20.926.800.000,00	08/08/2023 a 31/12/2029
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$13.951.200.000,00	08/08/2023 a 30/04/2027

	Estabilidad y calidad de la obra.	$20.926.800.000,00	31/12/2026 a 31/12/2031

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	Valor asegurado	Vigencia
400049798 Nacional de seguros Anexo 0 Fecha de Expedición:11/08/2023 Fecha de aprobación: 16/08/2023 Anexo 1 Fecha de Expedición:16/08/2023 Fecha de aprobación: 16/08/2023	$3.487.800.000,00	08/08/2023 a 31/12/2026
Otros (según el contrato):		

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE ACTA DE INICIO

REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN			
REQUISITO	**FECHA**		
Garantía Única. 400049799 ANEXO 2 Nacional de seguros	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento	$20.926.800.000,00	01/09/2023 a 24/05/2027
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$20.926.800.000,00	01/09/2023 a 24/01/2030

Fecha de Expedición:07/11/2023 Fecha de aprobación: 07/11/2023	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$13.951.200.000,00	01/09/2023 a 24/05/2027
	Estabilidad y calidad de la obra.	$20.926.800.000,00	24/01/2027 a 24/01/2032

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 400049798 Nacional de seguros Anexo 3 Fecha de Expedición:07/11/2023 Fecha de aprobación: 07/11/2023	Valor asegurado	Vigencia
	$3.487.800.000,00	01/09/2023 a 24/01/2027
Otros (según el contrato):		

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE MODIFICATORIO

REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN			
REQUISITO	**FECHA**		
Garantía Única. 400049799 ANEXO 3 Nacional de seguros Fecha de Expedición:04/09/2024 Fecha de aprobación: 06/09/2024	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento	$21.106.786.594,20	13/08/2024 a 24/05/2027
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$21.106.786.594,20	13/08/2024 a 24/01/2030
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$13.951.200.000,00	13/08/2024 a 24/05/2027

	Estabilidad y calidad de la obra.	$21.106.786.594,20	24/01/2027 a 24/01/2032
	Calidad de los estudios.	$250.863.900,00	15/02/2025 a 15/02/2030

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 400049798 Nacional de seguros Anexo 4 Fecha de Expedición:04/09/2024 Fecha de aprobación: 06/09/2024	Valor asegurado	Vigencia
	$3.517.797.765,70	13/08/2024 a 24/01/2027

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DERIVADO

3. ESTADO FINANCIERO				
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR ACTA**	**AMORTIZACION/ ANTICIPO**	**VALOR PAGADO**
ACTA PARCIAL 01	05/07/2024	$471.026.144,00	$94.205.229,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 02	19/09/2024	$378.641.159,00	$75.728.232,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 03	19/02/2025	$1.344.468.123,00	$268.893.625,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 04	04/03/2025	$1.874.700.291,00	$374.940.058,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 05	02/05/2025	$2.187.803.958,00	$437.560.792,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 06	01/07/2025	$2.248.662.875,00	$449.732.575,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 07	04/08/2025	$2.414.655.762,00	$ 482.931.152,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 08	01/10/2025	$ 3.136.079.055,00	$ 627.215.811,00	PAGADA

ACTA PARCIAL 09	04/11/2025	$ 2.496.597.312,00	$ 499.319.462,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 10	16/12/2025	$ 7.096.479.077,00	$1.419.295.815,00	PAGADA
ACTA PARCIAL 11	03/03/2026	$2.070.850.890,00	$414.170.178,00	EN TRAMITE
	TOTAL	$25.719.964.646,00	$5.143.992.929,00	

VIGILANCIA TECNICA

1 CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900

1.2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

1.2.1 ALCANTARILLAS

1.2.1.4 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue

1.2.1.6 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)

1.2.1.9 835 Tubería de PVC Ø20" incluye colchón de arena.

1.2.1.18 Demolicion manual en roca

1.2.1.19 Excavación manual en material sin clasificar

1.2.2 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO

1.2.2.3 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)

1.2.2.6 1226 Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn

1.2.2.9 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue

1.2.2.10 Tubo Ø 4" perforado para filtros

1.2.2.15 503 Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina

1.2.2.18 Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa

1.2.5 BOXCULVERT

1.2.5.4 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue

1.2.5.5 401 Excavación manual en material sin clasificar

1.2.5.14 Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción

1.2.5.15 Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte

1.3 OBRAS DE ESTABILIDAD, AMPLIACION Y CONFINAMIENTO.

1.3.2 OBRA K5+255-K5+355: Muro en gaviones H=2.00m L=45.00m

1.3.2.9 1226 Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn

1.3.5 MURO CAISSON K4+140

1.3.5.5 405 Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 4 - 12mt, sin dinamita

1.3.5.6 701 Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt

1.3.5.7 736 Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 - 12mt

1.3.5.9 767 Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas

1.3.5.12 1802 Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada

NP-02 1.3 Anclajes Pasivo DE 1" Incluye suministro, perforacion e inyeccion, tuerca y platina abovedada 15x15

NP-13 1.3 Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 0 - 4mt, sin dinamita

1.4 MOVIMIENTO DE TIERAS

1.4.1 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue

1.4.2 503 Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina

1.5 PAVIMENTOS

1.5.6 1206 Carpeta asfaltica en caliente MDC-19

1.5.7 Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares

NP-11 1.5 Riego de liga con emulsion asfaltica

1.6 SEÑALIZACION VIAL

NP-09 1.6 Delineador vial tipo corona

1.7 OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO

1.7.1 ZODME K6+580

1.7.1.2 204 Rocería y Limpieza

3 ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900

3.2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

3.2.1 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO

3.2.1.9 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)

3.2.1.17 219 Solado en concreto 17,5 MPa

3.2.1.18 Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa

3.3 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

3.3.1 ALCANTARILLAS + MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO

3.3.1.5 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue

3.3.1.6 1007 Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)

3.3.1.9 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)

3.3.1.19 742 Concreto ciclópeo para piso y solados

3.3.2 BOXCULVERT

3.3.2.4 302 Demoliciones en concreto ciclópeo

3.3.2.14 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)

3.3.2.22 1003 Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción

3.3.2.27 742 Concreto ciclopeo para piso y solados

3.3.2.31		Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn
3.5		OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES
3.5.6	401	Excavación manual en material sin clasificar
3.5.18	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte
3.5.32	811	Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"
3.5.34	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción
3.5.40	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn
NP-05 3.5		Cuneta para zanja corona en geomembrana 30mils
3.6		PUNTOS CRITICOS
3.6.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
3.6.6	401	Excavación manual en material sin clasificar
3.6.14	219	Solado en concreto 17,5 MPa
3.6.16	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)
3.6.21	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)
3.6.53	742	Concreto ciclopeo para piso y solados
3.8		PAVIMENTOS
3.8.4	1205	Riego de Imprimacion
3.8.5	1206	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19
NP-11 3.8		Riego de liga con emulsion asfaltica
4		ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920
4.2		OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
4.2.4		BOXCULVERT
4.2.4.1	301	Demoliciones en concreto reforzado
4.2.4.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue

4.2.4.4	219	Solado en concreto 17,5 MPa
4.2.4.5	767	Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones
4.2.4.6	1012	Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas
4.2.4.7	1201	Concreto 28 Mpa para vigas y losa
4.2.4.11	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)

	
1.2.1.4 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	1.2.1.6 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)
	
1.2.1.9 835 Tubería de PVC Ø20" incluye colchón de arena.	11.2.1.18 Demolicion manual en roca
	
1.2.1.19 Excavación manual en material sin clasificar	1.2.2.3 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)

	
1.2.2.6 1226 Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	1.2.2.9 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
	
1.2.2.9 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	1.2.2.10 Tubo Ø 4" perforado para filtros
	
1.2.2.15 503 Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	1.2.2.18 Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa

	
1.2.5.4 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	1.2.5.5 401 Excavación manual en material sin clasificar
	
1.2.5.14 Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	1.2.5.15 Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte
	
1.3.2.9 1226 Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	1.3.5.5 405 Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 4 - 12mt, sin dinamita

	
1.3.5.6 701 Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	1.3.5.7 736 Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 - 12mt
	
1.3.5.9 767 Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas	1.3.5.12 1802 Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada
	
NP-02 1.3 Anclajes Pasivo DE 1" Incluye suministro, perforacion e inyeccion, tuerca y platina abovedada 15x15	NP-13 1.3 Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 0 - 4mt, sin dinamita

	
1.4.1 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	1.4.2 503 Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina
	
1.5.6 1206 Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	1.5.7 Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares
	

NP-11 1.5 Riego de liga con emulsion asfaltica	NP-09 1.6 Delineador vial tipo corona

	
1.7.1.2 204 Rocería y Limpieza	3.2.1.9 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)
	
3.2.1.17 219 Solado en concreto 17,5 MPa	3.2.1.18 Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa
	

3.3.1.5 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	3.3.1.6 1007 Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)
	
3.3.1.9 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	3.3.1.19 742 Concreto ciclópeo para piso y solados
	
3.3.2.4 302 Demoliciones en concreto ciclópeo	3.3.2.14 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)

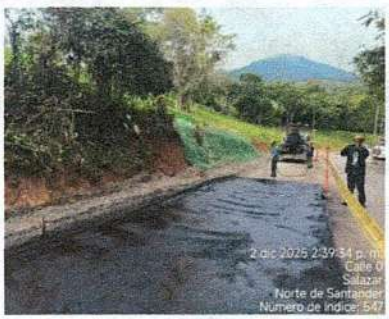
	
3.3.2.22 1003 Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	3.3.2.27 742 Concreto ciciopeo para piso y solados

	
3.3.2.31 Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	3.5.6 401 Excavación manual en material sin clasificar
	
3.5.18 1204 Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	3.5.32 811 Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"

	
3.5.34 1003 Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	3.5.40 1226 Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn

	
NP-05 3.5 Cuneta para zanja corona en geomembrana 30mils	3.6.5 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
	

3.6.6 401 Excavación manual en material sin clasificar	3.6.14 219 Solado en concreto 17,5 MPa
	
3.6.16 1007 Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	3.6.21 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)

	
3.6.53 742 Concreto ciclopeo para piso y solados	3.8.4 1205 Riego de Imprimacion

	
3.8.5 1206 Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	NP-11 3.8 Riego de liga con emulsion asfaltica
	
4.2.4.1 301 Demoliciones en concreto reforzado	4.2.4.3 402 Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue

	
4.2.4.4 219 Solado en concreto 17,5 MPa	4.2.4.5 767 Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones

	
4.2.4.6 1012 Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas	4.2.4.7 1201 Concreto 28 Mpa para vigas y losa
	
4.2.4.11 1701 Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	

VIGILANCIA AMBIENTAL

INFORME COMPONENTE AMBIENTAL				
MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER				
Elaborado: 03 de febrero del 2026				
Este informe comprende las actividades desarrolladas para la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía Cornejo – Cucutilla, específicamente de los tramo en ejecución denominados como TRAMO 1 y 2 con jurisdicción en el municipio de Santiago, en las abscisas K4+000 al K5+900 Y K12+200 al K12+600 y TRAMO 3 con jurisdicción en el municipio de Salazar de las Palmas, en las abscisas Arboledas – Salazar K21+900 al K22+900, los demás tramos por encontrarse en proceso de aprobación de diseños no poseen avances para el componente ambiental, ya que para la solicitud de trámites y demás actividades se requiere de la certeza de la información que brindan los mismos.				
PROGRAMA	**PRYECTO**	**¿IMPLEMENTADO EN EL PERIODO?**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
1.Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental	1 Conformación del grupo de gestión ambiental (CGA)	X		Para este periodo se contó con cinco (5) profesionales que conforman el grupo gestión ambiental del proyecto. El Consorcio Vía Centro cuenta con los siguientes profesionales: Director de obra Ing. Johana Ramírez, Residente de obra. Ing. Cesar Cárdenas Profesional ambiental Ing. Daren Ovallos, Profesional SISO Nelson Galvis, Profesional Social Yuri peña,
	2 Capacitación y concientización para el personal de obra.	X		Durante el periodo del mes de mayo se realizó inducción a trabajadores nuevos en cada tramo: TRAMO 1: 11 trabajadores nuevos TRAMO 2: 2 trabajadores nuevos TRAMO 3: 4 trabajadores nuevos (ver documento ANEXO 2. SOPORTES DE CAPACITACIÓN - SST - INDUCCIONES T1, T2, Y T3). En este periodo se realizó Charlas diarias Y capacitaciones brindadas a trabajadores por los componentes Ambienta, Sostenibilidad y SST. Total, en TRAMO 1: 26 charlas diarias y 3 capacitaciones

				Total, en TRAMO 2: 26 charlas diarias y 3 capacitaciones Total, en TRAMO 3: 26 charlas diarias y 3 capacitaciones (ver documento ANEXO 2. SOPORTES DE CAPACITACIÓN - CAP AMBIENTAL, SST, Sostenibilidad.)
	3 Cumplimiento requerimientos legales.	x		Durante este periodo no se han recibido las aprobaciones a los permisos ambientales solicitados ante CORPONOR, por tanto, nos encontramos a espera de la expedición de las Resoluciones que se encuentran en trámite, que para el caso serian: TRAMO 1. EXP N° 36099 Solicitud de permiso de aprovechamiento forestal para arboles aislados EXP N° 35561 Solicitud de permiso de Ocupación de Cauces. Las vallas requeridas para los permisos emitido por CORPONOR se relacionan a continuación: permiso de tala de TRAMO 3 mediante Resolución 107 del 11/03/2024, fueron instaladas y sustentadas en el informe del mes de abril/2024. permiso de ocupación de cauces de TRAMO 2 mediante Resolución 476 del 19/07/2024, fueron instaladas en el mes de agosto/2024, así mismo fue sustentado el cumplimiento de la actividad en el informe ambiental del mes de Agosto/2024 permiso de tala de TRAMO 2 mediante Resolución 715 del 21/10/2024, la valla fue instalada, ver los soportes del cumplimiento entregados en el informe del mes de Noviembre_2024. Permiso de Ocupación de cauces de TRAMO 2, mediante Resolución 744 del 06/11/2024, la corporación exigió la instalación de 2 vallas informativas, las cuales fueron instaladas el 18 de enero 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe del mes de enero 2025. permiso de tala por 1 árbol de TRAMO 2 mediante Resolución 802 del 21/11/2024, la corporación exigió la instalación de 1 valla informativa, la cual

				fue instaladas el 20 de marzo 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe del mes de marzo 2025. permiso de tala por 49 árboles de TRAMO 1A mediante Resolución 223 del 23/04/2025, la corporación exigió la instalación de 2 vallas informativa, las cuales fueron instaladas el 29 de abril 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe ambiental del mes de abril 2025. En el registro fotográfico se evidencia la permanencia de las vallas en los sitios donde se instalaron.
2.Manejo de las Actividades Constructivas	1 Manejo integral de materiales de construcción	x		Los soportes ambientales de los proveedores de materiales pétreos, concreto y asfalto, madera, agua, entre otros, fueron entregados y autorizados por la interventoría previo al inicio de la etapa constructiva del proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto requiere volúmenes significativamente altos de agregados pétreos para el desarrollo de sus actividades, los proveedores inicialmente vinculados no han logrado cubrir de manera suficiente y oportuna la demanda de material. Por tal motivo, y con el fin de evitar afectaciones en la continuidad del suministro y en el cumplimiento del cronograma de obra, nos vimos en la necesidad de gestionar la vinculación de nuevos proveedores que pudieran atender las necesidades del proyecto. En ese sentido, durante el mes de mayo de 2025 se presentaron ante la interventoría los proveedores Triturados La Roca y Construcciones S.A.S. y Edificaciones y Vías S.A., quienes fueron debidamente evaluados y aprobados por dicha instancia para su incorporación como fuentes adicionales de suministro de agregados. Ver documentos en el anexo - Anexo 3. Balance de Masas - proveedores nuevos Durante este periodo el proyecto cuento con 3 campamentos, dos en el municipio de Santiago para TRAMO 1 y 2 y el otro en el municipio de Salazar para TRAMO 3, todos implementados para el debido almacenamiento de las herramientas,

				materiales, maquinaria, vehículos y demás insumos necesarios para el funcionamiento de la etapa de construcción. En la medida que los demás tramos se vallan interviniendo, se irán acondicionando los campamentos para cada área de influencia. Durante el desarrollo de las actividades de obra se registró que, el material adquirido en marzo fue el siguiente: En su mayoría arena triturada lavada, piedra entre 10-30 pulgadas clasificada, triturado ¾, triturado 1 1/2, pedraplén, subbase, piedra filtro, concreto premezclado, cemento, tablas de madera, entre otros. El material fue adquiriendo de acuerdo a las necesidades de obra, y, por tanto, tan pronto llegaba se le iba dando el respectivo uso, minimizando perdidas del mismo. En los casos fortuitos donde el material llegase a sobrar, se dejaba acopiado en vía junto a la alcantarilla siguiente, para que en sus actividades hiciesen uso de él, así mismo el material quedo debidamente acordonado, señalizado y además se priorizaba cubrirlo y/o acordonarlo con cinta peligro finalizando jornadas, con el ánimo de minimizar riesgos por accidentes. El cemento recibido se acopia en los almacenes de los campamentos sobre estibas y debidamente cubierto con plástico, con el inicio de la fundición de los elementos se va proporcionando el material en la medida que se requiere en el frente de trabajo. También se recibió material vegetal como madera más específicamente tablas por el proveedor maderas pardillo. A continuación, la relación del suministro de materiales por proveedor: ARCOMEX = 0 M3 TRANSMATERIALIALES = 1867 M3 CEMEX - CEMENTO = 20,06 TON CEMEX - CONCRETO = 9,7 M3 TPU = 1348M3 COLPAO = 83,94 M3 MADERAS PARDILLO = 0 M3 (Ver documento ANEXO 3. BALANCE DE MASAS - MATERIAL SUMINISTRADO POR TERCEROS).

				REPORTE TRIMESTRAL N°7 POR PROVEEDOR: COLPAO Marzo = 251,3 m3 Abril = 0 mayo = 83,94 ARCOMEX Marzo = 1350 m3 Abril = 336 m3 mayo = 0m3 TRANSMATERIALES Marzo = 1584 m3 Abril = 1608 m3 mayo = 1867 m3 CEMEX - CEMENTO Marzo = 40,12 TON Abril = 40,12 TON mayo = 20,06 TON CEMEX - CONCRETO Marzo = 114,25 m3 Abril = 32,5 m3 mayo = 9,7m3 TPU Marzo = 880 m3 Abril = 488 m3 mayo = 1348 m3 PARDILLO Marzo = 17,4 m3 Abril = 0 m3 mayo = 0 m3
	2 Manejo integral de explotación de fuentes de materiales de construcción		X	NA
	3 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	x		Durante este periodo se contó con una serie de elementos de señalización de tipo fija y móvil, implementadas en los tramos 1, 2 y 3 con el ánimo de brindar las condiciones de seguridad para los

				trabajadores y vehículos que circulan por el tramo. cumplimiento reflejado en el informe. (ver ANEXO 9. CONTROL DE SEÑALIZACIÓN).
	4 Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	x		Los residuos RCD y de excavación generados por las actividades de obra durante el periodo fueron dispuestos en los predios receptores, como se indica para cada tramo a continuación: TRAMO 3 Receptor 1 - Rancho Pluma Receptor 2 - Villa José lote 4. Receptor 3 - Villa José Lote 5 TRAMO 2 Receptor 4 - Los Samanes Las cantidades de material dispuesto por predio en el periodo son: Receptor 1. Rancho Pluma = 0 Receptor 2. Villa José lote 4 = 0 Receptor 3. Villa José lote 5 = 816 M3 Receptor 4. Los Samanes = 670 M3 (El material reflejado para el informe no se encuentra compactado, por lo tanto, se proporcionará trazabilidad sobre el material suelto dispuesto en cada receptor, a su vez se deja constancia de que tan pronto se finalice con la actividad de disposición del material RCD, se levantará topografía nuevamente para determinar el volumen del material compactado dispuesto en cada receptor). ver ANEXO 6. CONTROL Y SEGUIMINTO RCD - INFORME RECEPTORES RCD - CVC-abr 2025). REPORTE TRIMESTRAL N°7 POR RECEPTOR RCD: RECEPTOR RCD #1 - RANCHO PLUMA Marzo, abril y maño = 0m3 RECEPTOR RCD #2 - VILLA JOSE LT 4 Marzo, abril y mayo = 0m3 RECEPTOR RCD #3 - VILLA JOSE LT 5 Marzo = 1042 m3 abril = 336 m3

				mayo = 816m3 RECEPTOR RCD #4 - LOS SAMANES LT2 Marzo = 326m3 Abril = 410m3 Mayo = 670m3
	5 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales.	x		TRAMO 1. La unidad de servicios públicos de Santiago, realiza la recolección de los residuos sólidos ordinarios el día sábado programados para la recolección en el municipio de Santiago. El punto de recolección es el campamento, con una frecuencia de 1 vez por semana según la necesidad del proyecto. Para el mes de mayo se programaron y ejecutaron 4 recolecciones para el tramo. (ver documento ANEXO 4. SEGUIMIENTO A RESIDUOS SOLIDOS - certif USP SANTIAGO RSO_T1-2) TRAMO 2. La unidad de servicios públicos de Santiago, realiza la recolección de los residuos sólidos ordinarios los días martes y sábado programados para la recolección en el municipio de Santiago. El punto de recolección es el campamento, con una frecuencia de 1 a 2 vez por semana según la necesidad del proyecto. Para el mes de mayo se programaron y ejecutaron 6 recolecciones para el tramo. (ver documento ANEXO 4. SEGUIMIENTO A RESIDUOS SOLIDOS - certif USP SANTIAGO RSO T_1-2) TRAMO 3. La unidad de servicios públicos de Salazar de las Palmas es el prestador del servicio autorizado, y realiza la recolección de los residuos sólidos ordinarios, con programación para los días martes y viernes en el municipio de Salazar de las Palmas, El punto de recolección es el campamento, con una frecuencia de 1 a 2 vez por semana según la necesidad del proyecto. Para el mes de mayo se programaron y ejecutaron 6 recolecciones para el tramo. (ver documento ANEXO 4. SEGUIMIENTO A RESIDUOS SOLIDOS - USP-SALAZAR_RSO T3_MAY_2025).

	6 Manejo preventivo de eventos de instabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales		x	Durante el periodo se continuo con la implementación de geotextil anclado a los taludes, asociado con una hidrosiembra de pasto. TRAMO 1 = 0 M2 TRAMO 2 = 507.75 M2 TRAMO 3 =469,4 M2. se realizaron las siguientes labores: adecuación del área de Revegetalizacion (remoción de material rocoso, perfilado), establecimiento del material vegetal gramíneo (Brachiaria Decumbens), instalación de capa de abono orgánico. El material de anclaje (grapas tipo "J"), y el material empleado para el corta flujo que se habían empleado en su anterior instalación y posterior desinstalación fueron reusadas, su estado aun lo permitían. Se hace entrega del informe/bitácora de avance proporcionado por el subcontratista FORESTALES Y ASESORIAS ECOLOGICAS NIT. 900741376-8 - FORESAECO S.A.S. REPORTE DEL TRIMESTRE N°7 Instalación de Geomanto = 3097,09m2
3.Gestión Hídrica y atmosférica	1 Manejo de aguas superficiales.		x	Durante el periodo comprendido entre el 1-31 del mes de mayo 2025, la unidad de servicios públicos de Santiago realizo el suministro de agua para actividades de obra por un total de 106m3. consumo por tramos: TRAMO1: 31M3 TRAMO 2: 33M3 TRAMO 3: 42M3 La certificación del suministro de suministro de agua: (ver documento ANEXO 5. CONTROL DE VOLUMENNES DE AGUA – CERTIFICACION USP_SANTIAGO_AGUA) El volumen de agua proyectado para el proyecto está contemplado solo para la actividad de mezcla del concreto, por tanto, este se ve afectado por el consumo de agua para humectación en la vía, lo cual mensualmente puede incrementar o disminuir. REPORTE TRIMESTRAL N°7 MARZO = 97m3 ABRIL = 122 m3

				MAYO = 106 m3
	2 Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	X		Para este periodo a Las Unidades Sanitarias Portátiles (USP) se les realizó mantenimientos según se programó para TRAMO 1, 2 y 3, en dichos mantenimientos se retiraron aguas residuales domésticas, proveniente de la limpieza de las USP con una cantidad aproximada de: TRAMO 1 = 0.200 Mts3. - 1 mantenimiento efectuado los días 7, 19 y 28 de mayo TRAMO 2 = 0.400 Mts3. - 3 mantenimientos efectuados los días 7, 19 y 28 de mayo TRAMO 3 = 0.500 Mts3 - 3 mantenimientos efectuados los días 7, 19 y 28 de mayo (ver documento ANEXO 7. SOPORTE DE RESIDUOS LIQUIDOS – Const. T1 - T2 - T3 - BAÑOMOVIL).
4.Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	1 Manejo del descapote y la cobertura vegetal	x		TRAMO 3 - PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL OTORGADO MEDIANTE RES 107 del 11-03-2024. Durante este periodo continúan suspendidas las actividades de tala para tramo 3 debido a que la propietaria del predio lo solicito hasta tanto no se concrete la negociación predial. TRAMO 2 - PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL OTORGADO MEDIANTE RES 802 del 21-11-2024. Aprovechamiento forestal finalizado en el mes de marzo del 2025. RES 715 del 21-10-2024. Aprovechamiento forestal finalizado en el mes de abril del 2025. Al contar con el permiso de aprovechamiento forestal de TRAMO 1, Res 223 del 23-04-2025, se programaron y ejecutaron actividades de aprovechamiento forestal a 15 unidades de árboles, identificadas en el inventario forestal con la numeración: 8, 11, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 176, con fecha del 2-05-2025 177, 1, 2, 3, 4, 179, con fecha del 5-05-2025 VER ANEXO: Anexo 1. Control de aprovechamiento forestal - RELACION TALA_RES 715_T2-may_2025

	2. Manejo de residuos vegetales	X		Durante el mes de mayo el contratista forestal realizo entrega de soportes de disposición final de material vegetal producto de las actividades de aprovechamiento forestal ejecutadas. Ver anexo, Anexo 1. Control de aprovechamiento forestal - 2.1 Certif _veolia_ 5 mayo 2025 acumulado: mayo/2024 = 6m3 sep/2024 = 5242kg dic/2024 = 4290 kg ene/2025 = 4790 kg may/2025 =6900 kg
	2. Recuperación de áreas afectadas		x	Durante este periodo se realizó seguimiento a la restauración en áreas degradadas con empradización. Nombre científico: Brachiaria Familia: Poaceae Área recuperada por tramos: TRAMO 1 = 0m2 TRAMO 2 = 0m2 TRAMO 3 = 270,1m2 zonas de intervención: TRAMO 3 se realizó seguimiento a la revegetalización en las áreas restauradas reflejadas en los periodos anteriores. REPORTE ACUMULADO Enero/2025 = 277,92m2 febrero/2025 = 142,8 m2 marzo/2025 = 0m2 abril/2025 = 0m2 mayo/2025 = 270,1 m2
	3. Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles	NA	NA	N/A
	4. Protocolo de fauna en obra		X	Durante este periodo no se realizaron actividades de recuperación de áreas afectadas.
	5. Protección de fauna en vías		X	Durante este periodo no se presentaron atropellamientos de fauna en la vía, por tanto, no se registra actividad para este subprograma.

	6.Compensación ambiental.	x		TRAMO 1 Durante este periodo se radico solicitud de cambio de medida a la Corporación, mediante Rad N° 2025010150058292 con fecha del 17/05/2025, expresando a CORPONOR nuestra preocupación frente a la medida de restauración ambiental establecida en el artículo 6º de la resolución 223 del 23-04-2025, mediante la cual se impone la obligación de siembra y mantenimiento por un año de especies nativas vegetales, como compensación por el aprovechamiento forestal otorgado. se expone que ya se realizó la restauración para 3 de los permisos otorgados anteriormente y durante el tiempo transcurrido desde la siembra hemos tenido que enfrentar diversos desafíos ambientales y logísticos. Estas circunstancias han generado un alto impacto económico, operativo y técnico, ya que el compromiso no se limita únicamente a la siembra, sino también al seguimiento y cuidado constante de las plantas durante todo el período. Esta solicitud no busca eximirnos del cumplimiento ambiental, sino por el contrario, encontrar caminos viables para continuar actuando conforme al principio de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. ver, ANEXO 01. MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz cumplimiento amb - 6. PERMISO TALAX49- T1A - 4. SOLICITUD DE CAMBIO DE MEDIDA. TRAMO 2 Durante este periodo se realizó seguimiento al primer mes de la siembra de los 28 árboles en el municipio de Santiago en el predio LA VEGA con el propósito de dar seguimiento a la medida de restauración ambiental implementada en cumplimiento a la Res 715 del 2025 y la Res 802 del 2024, permisos de tala de TRAMO 2. (ver documento - Anexo 1. Control de aprovechamiento forestal - 1. TRAZA SIEMBRA T2 - mes 1 - May 2025) TRAMO 3 Durante este periodo se realizó seguimiento al sexto mes de la siembra de los 146 árboles en el municipio de Salazar de las Palmas en los predios

				Agua Blanca y El Placer con el propósito de dar seguimiento a la medida de restauración ambiental implementada en cumplimiento a la Res 107 del 11-03-2024, permiso de tala de TRAMO 3. (ver documento - Anexo 1. Control de aprovechamiento forestal -6. TRAZA SIEMBRA T3 - mes 6 - mayo 2025)
5.Manejo de Instalaciones Temporales de Maquinaria y Equipos	1 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.	x		Durante el periodo sustentado se contó con las locaciones instaladas como campamentos (los cuales cuentan con almacén, acopio de combustibles, acopio de residuos especiales, punto ecológico). Receptores RCD en los predios receptor 1 - Rancho Pluma de T3. receptor 2 - villa José lote 4 de T3 receptor 3 - villa José lote 5 de T3 receptor 4 - Los Samanes de T2 El campamento de TRAMO 3 cuenta con: 3 USP, dos para hombres y una para mujeres, debidamente señalizadas y con los mantenimientos correspondientes. El campamento de TRAMO 2 cuenta con: 2 USP, uno para hombres y uno para mujeres, debidamente señalizadas y con los mantenimientos correspondientes. El campamento de TRAMO 1 cuenta con: 2 USP, uno para hombres y uno para mujeres, debidamente señalizadas y con los mantenimientos correspondientes. (ver documento ANEXO. SOPORTES DE RESIDUOS LIQUIDOS - CERTIFICACIÓN MANTENIMIENTO DE BAÑOS). (Ver documentos de la carpeta ANEXO. MANEJO DE CAMPAMENTO - formatos de inspección) (ver documento ANEXO. CONTROL Y SEGUIMIENTO RCD - Trazabilidad de receptores RCD).
	2 Instalación funcionamiento y desmantelamiento de la planta de triturado, asfalto y concreto.	NA	NA	NA
	3 Manejo de maquinaria,	x		En el ANEXO 8. SOPORTES DE CONTROL DE MAQUINARIA, se encontrará la relación del uso de

	equipos y vehículos			vehículos, maquinaria y equipos durante este periodo.

INFORME COMPONENTE AMBIENTAL				
MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER				
Elaborado: 03 de febrero del 2026				
Periodo comprendido				
Este informe comprende las actividades desarrolladas para la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía Cornejo – Cucutilla, específicamente de los tramo en ejecución denominados como TRAMO 1 y 2 con jurisdicción en el municipio de Santiago, en las abscisas K4+000 al K5+900 Y K12+200 al K12+600 y TRAMO 3 con jurisdicción en el municipio de Salazar de las Palmas, en las abscisas Arboledas – Salazar K21+900 al K22+900, los demás tramos por encontrarse en proceso de aprobación de diseños no poseen avances para el componente ambiental, ya que para la solicitud de trámites y demás actividades se requiere de la certeza de la información que brindan los mismos.				
PROGRAMA	**PRYECTO**	**¿IMPLEMENTADO EN EL PERIODO?**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
1.Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental	1 Conformación del grupo de gestión ambiental (CGA)	X		Para este periodo se contó con cinco (5) profesionales que conforman el grupo gestión ambiental del proyecto. El Consorcio Vía Centro cuenta con los siguientes profesionales: Director de obra Ing. Johana Ramírez, Residente de obra. Ing.Cesar Cardenas Profesional ambiental Ing. Daren Ovallos, Profesional SISO Nelson Galvis, Profesional Social Yuri peña,
	2 Capacitación y concientización para el personal de obra.	X		Durante el periodo del mes de mayo se realizó inducción a trabajadores nuevos en cada tramo: TRAMO 1: 9 trabajadores nuevos TRAMO 2: 0 trabajadores nuevos TRAMO 3: 4 trabajadores nuevos En este periodo se realizó Charlas diarias Y capacitaciones brindadas a trabajadores por los componentes Ambienta, Sostenibilidad y SST. Total, en TRAMO 1: 23 charlas diarias y 3 capacitaciones

				Total, en TRAMO 2: 22 charlas diarias y 3 capacitaciones Total, en TRAMO 3: 24 charlas diarias y 3 capacitaciones
	3 Cumplimiento requerimientos legales.	x		Durante este periodo no se han recibido las aprobaciones a los permisos ambientales solicitados ante CORPONOR, por tanto, nos encontramos a espera de la expedición de las Resoluciones que se encuentran en trámite, que para el caso serian: TRAMO 1. EXP N° 36099 Solicitud de permiso de aprovechamiento forestal para arboles aislados EXP N° 35561 Solicitud de permiso de Ocupación de Cauces Las vallas requeridas para los permisos emitido por CORPONOR se relacionan a continuación: permiso de tala de TRAMO 3 mediante Resolución 107 del 11/03/2024, fueron instaladas y sustentadas en el informe del mes de abril/2024. permiso de ocupación de cauces de TRAMO 2 mediante Resolución 476 del 19/07/2024, fueron instaladas en el mes de agosto/2024, así mismo fue sustentado el cumplimiento de la actividad en el informe ambiental del mes de Agosto/2024 permiso de tala de TRAMO 2 mediante Resolución 715 del 21/10/2024, la valla fue instalada, ver los soportes del cumplimiento entregados en el informe del mes de Noviembre_2024._VALLA RETIRADA EN EL MES DE JUNIO/2025. Permiso de Ocupación de cauces de TRAMO 2, mediante Resolución 744 del 06/11/2024, la corporación exigió la instalación de 2 vallas informativas, las cuales fueron instaladas el 18 de enero 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe del mes de enero 2025. permiso de tala por 1 árbol de TRAMO 2 mediante Resolución 802 del 21/11/2024, la corporación exigió la instalación de 1 valla informativa, la cual fue instaladas el 20 de marzo 2025. ver soportes de

				cumplimiento en el informe del mes de marzo 2025. VALLA RETIRADA EN EL MES DE JUNIO/2025 permiso de tala por 49 árboles de TRAMO 1A mediante Resolución 223 del 23/04/2025, la corporación exigió la instalación de 2 vallas informativa, las cuales fueron instaladas el 29 de abril 2025. ver soportes de cumplimiento en el informe ambiental del mes de abril 2025. En el registro fotográfico se evidencia la permanencia de las vallas en los sitios donde se instalaron.
2.Manejo de las Actividades Constructivas	1 Manejo integral de materiales de construcción	x		Los soportes ambientales de los proveedores de materiales pétreos, concreto y asfalto, madera, agua, entre otros, fueron entregados y autorizados por la interventoría previo al inicio de la etapa constructiva del proyecto. Durante este periodo el proyecto cuento con 3 campamentos, dos en el municipio de Santiago para TRAMO 1 y 2 y el otro en el municipio de Salazar para TRAMO 3, todos implementados para el debido almacenamiento de las herramientas, materiales, maquinaria, vehículos y demás insumos necesarios para el funcionamiento de la etapa de construcción. En la medida que los demás tramos se vallan interviniendo, se irán acondicionando los campamentos para cada área de influencia. Durante el desarrollo de las actividades de obra se registró que, el material adquirido en marzo fue el siguiente: En su mayoría arena triturada lavada, piedra entre 10-30 pulgadas clasificada, triturado ¾, triturado 1 1/2, pedraplén, subbase, piedra filtro, concreto premezclado, cemento, tablas de madera, entre otros. El material fue adquiriendo de acuerdo a las necesidades de obra, y, por tanto, tan pronto llegaba se le iba dando el respectivo uso, minimizando perdidas del mismo. En los casos fortuitos donde el material llegase a sobrar, se dejaba acopiado en vía junto a la alcantarilla siguiente, para que en sus actividades hiciesen uso de él, así mismo el material quedo debidamente acordonado, señalizado y además se

				priorizaba cubrirlo y/o acordonarlo con cinta peligro finalizando jornadas, con el ánimo de minimizar riesgos por accidentes. El cemento recibido se acopia en los almacenes de los campamentos sobre estibas y debidamente cubierto con plástico, con el inicio de la fundición de los elementos se va proporcionando el material en la medida que se requiere en el frente de trabajo. A continuación, la relación del suministro de materiales por proveedor: TRANSMATERIALIALES = 1717 M3 CEMEX - CEMENTO = 30,06 TON CEMEX - CONCRETO = 110 M3 TPU = 434M3 COLPAO = 243,55 M3 EDIVIAL S.A. = 466 M3 MADERAS PARDILLO = 0 M3 (Ver documento ANEXO 3. BALANCE DE MASAS - MATERIAL SUMINISTRADO POR TERCEROS).
	2 Manejo integral de explotación de fuentes de materiales de construcción		X	NA
	3 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	x		Durante este periodo se contó con una serie de elementos de señalización de tipo fija y móvil, implementadas en los tramos 1, 2 y 3 con el ánimo de brindar las condiciones de seguridad para los trabajadores y vehículos que circulan por el tramo. cumplimiento reflejado en el informe. (ver ANEXO 9. CONTROL DE SEÑALIZACIÓN).
	4 Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	x		Los residuos RCD y de excavación generados por las actividades de obra durante el periodo fueron dispuestos en los predios receptores, como se indica para cada tramo a continuación: TRAMO 3 Receptor 1 - Rancho Pluma Receptor 2 - Villa José lote 4. Receptor 3 - Villa José Lote 5 TRAMO 2 Receptor 4 - Los Samanes Las cantidades de material dispuesto por predio en el periodo son:

				Receptor 1. Rancho Pluma = 0 Receptor 2. Villa José lote 4 = 0 Receptor 3. Villa José lote 5 = 344 M3 Receptor 4. Los Samanes = 278M3 (El material reflejado para el informe no se encuentra compactado, por lo tanto, se proporcionará trazabilidad sobre el material suelto dispuesto en cada receptor, a su vez se deja constancia de que tan pronto se finalice con la actividad de disposición del material RCD, se levantará topografía nuevamente para determinar el volumen del material compactado dispuesto en cada receptor). ver ANEXO 6. CONTROL Y SEGUIMINTO RCD - INFORME RECEPTORES RCD - CVC-jun 2025).
	5 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales.	x		TRAMO 1. La unidad de servicios públicos de Santiago, realiza la recolección de los residuos sólidos ordinarios el día sábado programados para la recolección en el municipio de Santiago. El punto de recolección es el campamento, con una frecuencia de 1 vez por semana según la necesidad del proyecto. Para el mes de mayo se programaron y ejecutaron 4 recolecciones para el tramo. (ver documento ANEXO 4. SEGUIMIENTO A RESIDUOS SOLIDOS - certif USP SANTIAGO RSO_T1-2) TRAMO 2. La unidad de servicios públicos de Santiago, realiza la recolección de los residuos sólidos ordinarios los días martes y sábado programados para la recolección en el municipio de Santiago. El punto de recolección es el campamento, con una frecuencia de 1 a 2 vez por semana según la necesidad del proyecto. Para el mes de mayo se programaron y ejecutaron 6 recolecciones para el tramo. (ver documento ANEXO 4. SEGUIMIENTO A RESIDUOS SOLIDOS - certif USP SANTIAGO RSO T_1-2) TRAMO 3. La unidad de servicios públicos de Salazar de las Palmas es el prestador del servicio autorizado, y realiza la recolección de los residuos sólidos

				ordinarios, con programación para los días martes y viernes en el municipio de Salazar de las Palmas, El punto de recolección es el campamento, con una frecuencia de 1 a 2 vez por semana según la necesidad del proyecto. Para el mes de mayo se programaron y ejecutaron 6 recolecciones para el tramo. (ver documento ANEXO 4. SEGUIMIENTO A RESIDUOS SOLIDOS - USP-SALAZAR_RSO T3_JUN_2025).
	6 Manejo preventivo de eventos de instabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales		x	Durante el periodo se continuo con la implementación de geotextil anclado a los taludes, asociado con una hidrosiembra de pasto. TRAMO 1 = 0 M2 TRAMO 2 = 102,81 M2 TRAMO 3 =104 M2. se realizaron las siguientes labores: adecuación del área de Revegetalizacion (remoción de material rocoso, perfilado), establecimiento del material vegetal gramíneo (Brachiaria Decumbens), instalación de capa de abono orgánico. El material de anclaje (grapas tipo "J"), y el material empleado para el corta flujo que se habían empleado en su anterior instalación y posterior desinstalación fueron reusadas, su estado aun lo permitían. Se hace entrega del informe/bitácora de avance proporcionado por el subcontratista FORESTALES Y ASESORIAS ECOLOGICAS NIT.900741376-8 - FORESAECO S.A.S.
3.Gestión Hídrica y atmosférica	1 Manejo de aguas superficiales.		x	Durante el periodo comprendido entre el 1-30 del mes de junio 2025, la unidad de servicios públicos de Santiago realizo el suministro de agua para actividades de obra por un total de 99m3. consumo por tramos: TRAMO1: 31M3 TRAMO 2: 32M3 TRAMO 3: 36M3 La certificación del suministro de suministro de agua: (ver documento ANEXO 5. CONTROL DE VOLUMENNES DE AGUA – CERTIFICACION USP_SANTIAGO_AGUA) El volumen de agua proyectado para el proyecto está contemplado solo para la actividad de mezcla del concreto, por tanto, este se ve afectado por el

				consumo de agua para humectación en la vía, lo cual mensualmente puede incrementar o disminuir.
	2 Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	X		Para este periodo a Las Unidades Sanitarias Portátiles (USP) se les realizó mantenimientos según se programó para TRAMO 1, 2 y 3, en dichos mantenimientos se retiraron aguas residuales domésticas, proveniente de la limpieza de las USP con una cantidad aproximada de: TRAMO 1 = 0.200 Mts3. - 1 mantenimiento efectuado los días 7, 19 y 28 de mayo TRAMO 2 = 0.400 Mts3. - 3 mantenimientos efectuados los días 7, 19 y 28 de mayo TRAMO 3 = 0.300 Mts3 - 3 mantenimientos efectuados los días 9, 21 y 28 de junio. (ver documento ANEXO 7. SOPORTE DE RESIDUOS LIQUIDOS – Const. T1 - T2 - T3 - BAÑOMOVIL).
4.Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	1 Manejo del descapote y la cobertura vegetal	x		TRAMO 3 - PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL OTORGADO MEDIANTE RES 107 del 11-03-2024. Durante este periodo continúan suspendidas las actividades de tala para tramo 3 debido a que la propietaria del predio lo solicito hasta tanto no se concrete la negociación predial. TRAMO 2 - PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL OTORGADO MEDIANTE RES 802 del 21-11-2024. Aprovechamiento forestal finalizado en el mes de marzo del 2025. RES 715 del 21-10-2024. Aprovechamiento forestal finalizado en el mes de abril del 2025. TRAMO 1A - PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL OTORGADO MEDIANTE RES 223 DEL 23-04-2025 Aprovechamiento forestal finalizado en el mes de mayo del 2025. Quedan en pie dos unidades de Arboles correspondientes a los números 9 y 10 según inventario forestal. Esto se debe a que se están tratando de conservar, hasta no tener certeza de requerirse no serán aprovechados estos recursos
	2. Manejo de residuos vegetales	X		Durante el mes de mayo el contratista forestal realizo entrega de soportes de disposición final de material vegetal producto de las actividades de aprovechamiento forestal ejecutadas.

				acumulado: mayo/2024 = 6m3 sep/2024 = 5242kg dic/2024 = 4290 kg ene/2025 = 4790 kg may/2025 =6900 kg Ver soportes en el informe correspondiente a cada uno de los meses mencionados.
	2. Recuperación de áreas afectadas		x	Durante este periodo se realizó seguimiento a la restauración en áreas degradadas con empradización. Nombre científico: Brachiaria Familia: Poaceae Área recuperada por tramos durante este periodo: TRAMO 1 = 0m2 TRAMO 2 = 285,84m2 TRAMO 3 = 425,31m2 zonas de intervención: En los TRAMOS 2 y 3 se realizó seguimiento a la revegetalización en las áreas restauradas reflejadas en los periodos anteriores.
	3. Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles	NA	NA	N/A
	4. Protocolo de fauna en obra		X	Durante este periodo no se realizaron actividades de recuperación de áreas afectadas.
	5. Protección de fauna en vías		X	Durante este periodo no se presentaron atropellamientos de fauna en la vía, por tanto, no se registra actividad para este subprograma.
	6.Compensación ambiental.	x		TRAMO 1 a la fecha 30 de junio no se ha recibido respuesta al radicado de solicitud de cambio de medida a la Corporación, mediante Rad N° 2025010150058292 con fecha del 17/05/2025, expresando a CORPONOR nuestra preocupación frente a la medida de restauración ambiental establecida en el artículo 6º de la resolución 223 del 23-04-2025, mediante la cual se impone la obligación de siembra y mantenimiento por un año de especies nativas vegetales, como compensación por el aprovechamiento forestal otorgado. se expone que ya se realizó la restauración para 3 de los permisos

				otorgados anteriormente y durante el tiempo transcurrido desde la siembra hemos tenido que enfrentar diversos desafíos ambientales y logísticos. Estas circunstancias han generado un alto impacto económico, operativo y técnico, ya que el compromiso no se limita únicamente a la siembra, sino también al seguimiento y cuidado constante de las plantas durante todo el período. Esta solicitud no busca eximirnos del cumplimiento ambiental, sino por el contrario, encontrar caminos viables para continuar actuando conforme al principio de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. ver, soporte en el informe del mes de mayo 2025 TRAMO 2 Durante este periodo se realizó seguimiento al segundo mes de la siembra de los 28 árboles en el municipio de Santiago en el predio LA VEGA con el propósito de dar seguimiento a la medida de restauración ambiental implementada en cumplimiento a la Res 715 del 2025 y la Res 802 del 2024, permisos de tala de TRAMO 2. (ver documento - Anexo 1. Control de aprovechamiento forestal - 1. TRAZA SIEMBRA T2 - mes 2 - jun 2025) TRAMO 3 Durante este periodo se realizó seguimiento al séptimo mes de la siembra de los 146 árboles en el municipio de Salazar de las Palmas en los predios Agua Blanca y El Placer con el propósito de dar seguimiento a la medida de restauración ambiental implementada en cumplimiento a la Res 107 del 11-03-2024, permiso de tala de TRAMO 3. (ver documento - Anexo 1. Control de aprovechamiento forestal -7. TRAZA SIEMBRA T3 - mes 7 - jun 2025)
5.Manejo de Instalaciones Temporales de Maquinaria y Equipos	1 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.	x		Durante el periodo sustentado se contó con las locaciones instaladas como campamentos (los cuales cuentan con almacén, acopio de combustibles, acopio de residuos especiales, punto ecológico). Receptores RCD en los predios receptor 1 - Rancho Pluma de T3. receptor 2 - villa José lote 4 de T3

				receptor 3 - villa José lote 5 de T3 receptor 4 - Los Samanes de T2 El campamento de TRAMO 3 cuenta con: 3 USP, dos para hombres y una para mujeres, debidamente señalizadas y con los mantenimientos correspondientes. El campamento de TRAMO 2 cuenta con: 2 USP, uno para hombres y uno para mujeres, debidamente señalizadas y con los mantenimientos correspondientes. El campamento de TRAMO 1 cuenta con: 2 USP, uno para hombres y uno para mujeres, debidamente señalizadas y con los mantenimientos correspondientes. (ver documento ANEXO. SOPORTES DE RESIDUOS LIQUIDOS - CERTIFICACIÓN MANTENIMIENTO DE BAÑOS). (Ver documentos de la carpeta ANEXO. MANEJO DE CAMPAMENTO - formatos de inspección) (ver documento ANEXO. CONTROL Y SEGUIMIENTO RCD - Trazabilidad de receptores RCD).
	2 Instalación funcionamiento y desmantelamiento de la planta de triturado, asfalto y concreto.	NA	NA	NA
	3 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	x		En el ANEXO 8. SOPORTES DE CONTROL DE MAQUINARIA, se encontrará la relación del uso de vehículos, maquinaria y equipos durante este periodo.

COMPONENTE PREDIAL.

TRAMO	NÚM PREDIOS	FICHAS PREDIALES PRESENTADAS	FICHAS PREDIALES APROBADAS	Estudios de Títulos /Diagnósticos jurídicos Radicados	Avalúos Presentados	Avalúos Aprobados	Predios a favor de la Gobernación
Tramo 1	5	1	0	1	0	0	0
Tramo 2	2	2	2	2	1	0	0
Tramo 3	11	11	11	10	6	1	1
Tramo 4	18	0	0	0	0	0	0
Tramo 5	10	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**46**	**14**	**13**	**13**	**7**	**1**	**1**

Tramo No. 3:

	Número Predio	TRAMO	Propietario	OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL	OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS
1	001DT3MJAS	Tramo 3	Ana Francisca Pacheco de Ayala	CC-630 18/09/2024	CC-630 18/09/2024
2	002IT3MJAS	Tramo 3	Ana Francisca Pacheco	CC-630 18/09/2024	CC-630 18/09/2024
3	003IT3MJAS	Tramo 3	Elida Rosa Ortiz Manosalva	CC-630 18/09/2024	CC-630 18/09/2024
4	004DT3MJAS	Tramo 3	Municipio de Salazar de las Palmas	Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial	CC-704 15/10/2024
5	004DAT3MJAS	Tramo 3	María Belén Ortiz	Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial	CC-704 15/10/2024
6	005IT3MJAS	Tramo 3	Eloina Pabón de Arias y otra	Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial	CC-713 18/10/2024
7	006IAT3MJAS	Tramo 3	Luis Humberto Rozo	Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial	CC-704 15/10/2024

	Número Predio	TRAMO	Propietario	OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL	OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS
8	006IT3MJAS	Tramo 3	Gloria Stella Ortiz	Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial	CC-704 15/10/2024
9	007DT3MJAS	Tramo 3	Carmen Stella Duque Ramírez y otro (8)	Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial **Alcance Ficha Predial** CC-1014 12/02/2025	CC-704 15/10/2024 **Alcance al Estudio de Títulos** CC-1063 del 03/03/2025
10	008DT3MJAS	Tramo 3	Gloria Stella Ortiz	Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial	CC-704 15/10/2024
11	009IT3MJAS	Tramo 3	Centrales Eléctricas De Norte de Santander	Presentada sin aprobación, pendiente ajuste	Presentado sin aprobación, pendiente ajuste

TRAMO	NÚM PREDIOS	FICHAS PREDIALES PRESENTADAS	FICHAS PREDIALES APROBADAS	Estudios de Títulos /Diagnósticos jurídicos Radicados	Avalúos Presentados	Avalúos Aprobados	Predios a favor de la Gobernación
Tramo 1	5	1	0	1	0	0	0
Tramo 2	2	2	2	2	1	1	0
Tramo 3	11	11	11	10	6	5	1
Tramo 4	14	0	0	0	0	0	0
Tramo 5	13	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**45**	**14**	**13**	**13**	**7**	**6**	**1**

Tramo No. 2:

	Número Predio	TRAMO	Propietario	OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL	OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS
1	001DIT2MJCS	Tramo 2	Hermes Badillo y otro	CC-1011 12/02/2025	CC-1063 03/03/2025
2	002IT2MJCS	Tramo 2	Rumith Silva Carrillo	CC-1013 12/02/2025	CC-1063 03/03/2025

Tabla 1. Predios Radicados Tramo No.2.

Tramo No. 3:

	Número Predio	TRAMO	Propietario	OFICIO APROBACIÓN FICHA PREDIAL	OFICIO APROBACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS
1	001DT3MJAS	Tramo 3	Ana Francisca Pacheco de Ayala	CC-630 18/09/2024	CC-630 18/09/2024
2	002IT3MJAS	Tramo 3	Ana Francisca Pacheco	CC-630 18/09/2024	CC-630 18/09/2024
3	003IT3MJAS	Tramo 3	Elida Rosa Ortiz Manosalva	CC-630 18/09/2024	CC-630 18/09/2024
4	004DT3MJAS	Tramo 3	Municipio de Salazar de las Palmas	Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial	CC-704 15/10/2024
5	004DAT3MJAS	Tramo 3	María Belén Ortiz	Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial	CC-704 15/10/2024
6	005IT3MJAS	Tramo 3	Eloina Pabón de Arias y otra	Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial	CC-713 18/10/2024
7	006IAT3MJAS	Tramo 3	Luis Humberto Rozo	Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial	CC-704 15/10/2024
8	006IT3MJAS	Tramo 3	Gloria Stella Ortiz	Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial	CC-704 15/10/2024
9	007DT3MJAS	Tramo 3	Carmen Stella Duque Ramírez y otro (8)	Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial **Alcance Ficha Predial** CC-1014 12/02/2025	CC-704 15/10/2024 **Alcance al Estudio de Títulos** CC-1063 del 03/03/2025
10	008DT3MJAS	Tramo 3	Gloria Stella Ortiz	Acta de fecha 27/09/2024 Aprobación Ficha Predial	CC-704 15/10/2024
11	009IT3MJAS	Tramo 3	Centrales Eléctricas De Norte de Santander	Presentada sin aprobación, pendiente ajuste	Presentado sin aprobación, pendiente ajuste

Tabla 2. Predios Radicados Tramo No.3

AVALUOS APROBADOS

	Número Predio	TRAMO	Propietario	OFICIO APROBACIÓN Avalúos	OFERTA DE COMPRA	FECHA
1	001DIT2MJCS	Tramo 2	Hermes Badillo y otro	CC-1144 08/04/2025	Rad 2025-10000-09590-1	24/04/2025
2	001DT3MJAS	Tramo 3	Ana Francisca Pacheco de Ayala	CC-1144 08/04/2025	Rad 2025-10000-009588-1	24/04/2025
3	004DT3MJAS	Tramo 3	Municipio de Salazar de las Palmas	CC-1144 08/04/2025	Rad 2025-10000-009598-1	24/04/2025
4	004DAT3MJAS	Tramo 3	María Belén Ortiz	CC-1144 08/04/2025	N/A Mejora	
5	007DT3MJAS	Tramo 3	Carmen Stella Duque Ramírez y otros (8)	CC-1124 del 26/03/2025	Rad 2025-10000-009586-1	24/05/2025
6	008DT3MJAS	Tramo 3	Gloria Stella Ortiz	CC-1144 08/04/2025	Rad 2025-10000-096001-1	24/05/2025

COMPONENTE SOCIAL.

INFORME COMPONENTE SOCIAL				
Durante el periodo del presente informe, se llevaron a cabo diversas actividades con el fin de implementar los programas y subprogramas elaborados para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VIA CORNEJO A CUCUTILLA, INTERVENCIÓN EN LAS ABSCISAS CORNEJO-SANTIAGO K4+000-K5+900 CORNEJO-SANTIAGO K12+200-K12+600 ARBOLEDAS-SALAR, K21+900-K22+900, ARBOLEDAS-CUCUTILLA K0+000-K0+920, Y CUCUTILLA -ARBOLEDAS K2+000-K3+300, NORTE DE SANTANDER" de conformidad al cumplimiento del Plan de Adaptación de Guía Ambiental (PAGA), relacionados a continuación:				
PROGRAMA	**SUBPROGRAMA**	**¿IMPLEMENTADO EN EL PERIODO?**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL.	MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GENERO,	**X**		TRAMO # 1 Se llevó a cabo con los trabajadores de la obra un taller orientado al

	DE DERECHOS Y DIFERENCIAL.			fortalecimiento de la comunicación asertiva. Desde el enfoque de trabajo social, la actividad se diseñó como un espacio participativo en el que se promovió la reflexión sobre la importancia de expresar ideas, necesidades y emociones de manera clara y respetuosa, fomentando relaciones laborales más saludables. Durante la jornada se implementaron dinámicas grupales y ejercicios prácticos que facilitaron la interacción entre los participantes, propiciando el reconocimiento de la escucha activa como herramienta fundamental para prevenir conflictos y mejorar la convivencia en el entorno laboral. Como resultado, los trabajadores identificaron estrategias para fortalecer su comunicación cotidiana en obra, reconociendo la relevancia de mantener un trato respetuoso, empático y colaborativo que aporte al bienestar

				colectivo y al adecuado desarrollo del proyecto.
	OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	x		**TRAMO # 3** Se brindó información a las personas interesadas en las obras con participación comunitaria, con el propósito de socializar la importancia de entregar la documentación y datos completos requeridos en el proceso de postulación. Desde el enfoque de trabajo social, la actividad buscó generar conciencia en la comunidad acerca de que el suministro oportuno y veraz de la información es un paso esencial para garantizar la continuidad del trámite y, de esta manera, acceder a los beneficios colectivos que representan las obras con participación comunitaria. Durante el encuentro se resolvieron dudas, se ofreció acompañamiento para la correcta comprensión de los requisitos y se motivó a los asistentes a asumir

				un rol activo y corresponsable en el proceso. Esta orientación contribuye a fortalecer la organización comunitaria y a consolidar la confianza en los mecanismos de gestión social y participación ciudadana.
8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			**TRAMO # 3** Se realizó acompañamiento al Receptor N.° 2, en el marco de las acciones sociales y ambientales contempladas en el proyecto. Durante la visita se recibieron las sugerencias del señor Carlos Jaimes, propietario del predio receptor, relacionadas con aspectos de adecuación previa a la entrega. Desde el componente social, el acompañamiento permitió generar un espacio de diálogo directo con el propietario, garantizando su participación activa en el proceso, el reconocimiento de sus aportes y la

				incorporación de sus observaciones en aras de fortalecer la confianza y la transparencia en la gestión predial. Desde el componente ambiental, se resaltó la importancia de que las adecuaciones proyectadas en el predio se realicen de manera responsable y sostenible, teniendo en cuenta la conservación de las condiciones naturales, el manejo adecuado de los recursos y la prevención de posibles afectaciones al entorno inmediato. La actividad contribuyó a consolidar un proceso participativo e incluyente, en el que se integran las necesidades de los actores sociales con las consideraciones ambientales necesarias para garantizar la funcionalidad y sostenibilidad del predio receptor.
	APOYO Y ORIENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA.	x		NA

10 PARTICIPACIÓN GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL	INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPETCTIVA DE GÉNERO Y DE TRANSVERSALIZACIÓN	X		**TRAMO # 1** Se llevó a cabo una jornada de sensibilización y fortalecimiento comunitario dirigida a la población vinculada al proyecto, con el propósito de promover la inclusión social con perspectiva de género. Durante la actividad se socializaron conceptos clave relacionados con la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad y la prevención de prácticas discriminatorias, resaltando la importancia de reconocer y valorar el rol de mujeres y hombres en el ámbito comunitario y laboral. Asimismo, se desarrollaron dinámicas participativas que fomentaron la reflexión sobre estereotipos de género y la corresponsabilidad en la construcción de entornos más justos y equitativos. Desde el enfoque de transversalización, la

				jornada buscó integrar la perspectiva de género en todos los procesos del proyecto, asegurando que las acciones sociales contemplen las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, y contribuyan a fortalecer la cohesión comunitaria, la participación equitativa y el respeto por los derechos humanos. Como resultado, los participantes identificaron compromisos individuales y colectivos orientados a consolidar prácticas inclusivas y equitativas, con miras a garantizar el bienestar social de la comunidad en el marco de la ejecución del proyecto.

COMPONENTE SST

PERSONAL ACTIVO TRAMO 3

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO	INGRESOS MAYO	RETIROS MAYO	SEGURIDAD SOCIAL
1	Dennis Johanna Ramírez	30050210	Directora de Obra			Consorcio Vía Centro
2	Cesar Andrés Cárdenas Coll	1090393766	Ing. Residente Tramo -3			Consorcio Vía Centro
3	Yesica Estefanía García Ibarra	1005042765	Auxiliar SST			Consorcio Vía Centro
4	Adrián Reinaldo Castilla	1090445824	Auxiliar Ingeniería			Consorcio Vía Centro
5	Martha Cecilia Villamizar Urbina	1090395293	Controladora de Trafico			Consorcio Vía Centro
6	Edgar Claro Navarro	88263401	Oficios Varios			Consorcio Vía Centro
7	Carmen Yaneth Ibáñez	60446960	Controladora de Trafico			Consorcio Vía Centro
8	José Belén Uribe Laguado	88179493	Vigilante			Consorcio Vía Centro
9	Javier Alexander López	88239557	Conductor			Consorcio Vía Centro
10	Daren Ovallos Galvis	1094269900	Ing. Ambiental			Independiente
11	Yuri Marcela Peña	1096947236	Profesional Social			Independiente
12	Edgar Adrián Castillo	88253361	Almacenista			Constructora Cúcuta
13	Oscar Abel Peñaranda	13388186	Operador Retrocargador			Expo riente Representaciones
14	Eudes Bladimir Peñaranda	1094166681	Operador Retrocargador			Expo riente Representaciones
15	Yefferson Blaymer Sanjuan	1094369267	Operador Retro-Oruga			Expo riente Representaciones
16	Marlon Saul Reales Almendrales	1090472764	Operador Motoniveladora			Expo riente Representaciones
17	Luis Arturo Mendoza	1007197272	Operador Vibro			Expo riente Representaciones
18	Jhon Mendoza	1010122441	Conductor Volqueta			Expo riente Representaciones
19	Ángel Cenen García	88177643	Conductor Volqueta			Expo riente Representaciones
20	Nemesio David Galvis Álvarez	13487636	Conductor Volqueta			Expo riente Representaciones
21	Augusto Moreno Vera	13487533	Conductor Volqueta			Expo riente Representaciones
22	Deybis Giovanny Duarte Ragua	88257430	Conductor Volqueta			Expo riente Representaciones

23	Elkin Javier Salinas	1120564035	Oficial de Obra			Construcciones JARP
24	Alexander Rojas Fontalvo	88265303	Oficial de Obra			Construcciones JARP
25	Javier Cañizares López	88252039	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
26	Luis Antonio Ramírez Cárdenas	88179256	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
27	Juan Rojas Pérez	77142153	Maestro de Obra			Construcciones JARP
28	Emilio Hernando Laguado Gelvez	5497753	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
29	Álvaro José Ortiz Lindarte	88265667	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
30	Jhonatan Javier bautista	1005042843	Topografia			María Esperanza Monsalve
31	Jahir Ortiz	1094332836	Topografia			María Esperanza Monsalve
32	Alexander Galvis Flórez	88195263	Conductor Carrotanque			OUTSOURCING LOGISTICA
33	Juan Carlos Caamaño Rojas	1093750998	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
34	Víctor Manuel Contreras Arias	1094859085	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
35	Marlon Alexi Castrillón	1090175924	Auxiliar de Laboratorio			Consorcio Vía Centro
36	Leonardo Antonio Mora Aguilar	13390793	Vigilante-Turmero			Consorcio Vía Centro
37	John Jairo Salazar Galván	1093886068	Oficial de Obra		10/05/2025	Construcciones JARP
38	Juan Agustín Ortega Rodríguez	1093885733	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
39	José Alexander Galvis Pabón	1092646153	Oficial de Obra			Construcciones JARP
40	Luis Eduardo Valero Garcia	13487307	Auxiliar Laboratorio			Consorcio Vía Centro
41	Félix del Carmen Garcia Rojas	1063483429	Oficial de Obra			Construcciones JARP
42	Miller Osorio Valencia	1130674910	Operador Retro-Oruga			Expo riente Representaciones
43	Cristian Alejandro Tibaduisa	1093887157	Ayudante de Obra	21/05/2025		Construcciones JARP
44	Juan Carlos Ortiz	1007887610	Ayudante de Obra	21/05/2025		Construcciones JARP
45	Manuel Guillermo Molina	88179712	Ayudante de Obra	21/05/2025		Construcciones JARP
46	Eduardo Serrano Rodríguez	1091183109	Ayudante de Obra	21/05/2025		Construcciones JARP

PERSONAL ACTIVO TRAMO 2

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO	INGRESOS MAYO	RETIROS MAYO	SEGURIDAD SOCIAL
1	Renny Leonardo Briceño Marciales	1092359216	Ingeniero Residente Tramo 2			Consorcio Vía Centro
2	Nelson Enrique Galvis Flórez	1093785717	Profesional SST			Consorcio Vía Centro
3	José Antonio Ramírez	5497255	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
4	Ciro Antonio Pérez Ramírez	5497171	Vigilante Turnero			Consorcio Vía Centro
5	Julio Alberto Soto Hernández	12703347	Vigilante			Consorcio Vía Centro
6	Sergio Pérez Pérez	1090485739	Topógrafo			Sandra Katherine Barrera
7	Álvaro Javier Rodríguez Fuentes	1090176242	Operador Retro-Oruga			Expo riente Representaciones
8	Juan Carlos Rodríguez Torres	1090413797	Operador Retrocargador			Expo riente Representaciones
9	Karol Yuliana Ramírez Mantilla	1005085682	Controladora Trafico			Consorcio Vía Centro
10	María Belén Contreras Mayorga	1094859828	Controladora Trafico			Consorcio Vía Centro
11	Luis Francisco Martínez	13465276	Almacenista			Constructora Maticces
12	Juan David Hernández	1093590006	Cadenero			María Esperanza Monsalve
13	Eliber Quintero Pérez	1090427870	Oficial de Obra			Construcciones JARP
14	Yank Carlos Martínez Duarte	1094552023	Auxiliar Laboratorio			Consorcio Vía Centro
15	Luis Ramiro Pérez Parada	1094858770	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
16	Yilmer Alexander Acevedo Prieto	1094858928	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
17	Oscar Peñaranda Rodríguez	5398337	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
18	Cesar Adrián Peñaranda	5497850	Conductor Volqueta			Expo riente Representaciones
19	Edwar Leonardo Diaz Ibarra	1094859139	Ayudante de Obra	15/05/2025		Construcciones JARP
20	Víctor Eduardo Carrero Ávila	1094858122	Ayudante de Obra	15/05/2025		Construcciones JARP
21	Pedro Yesid Meaury	1092361134	Operador Vibro compactador	21/05/2025	28/05/2025	REMAQUINAS
22	Hernando Ramos Rojas	13385699	Operador Motoniveladora	21/05/2025	28/05/2025	MAOMAQ

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

PERSONAL ACTIVO TRAMO 1

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO	INGRESOS MAYO	RETIROS MAYO	SEGURIDAD SOCIAL
1	Yeferson Quintana Alvernia	5401800	Ingeniero Residente	03/05/2025		Consorcio Vía Centro
2	Leonel Alberto Ovalles Ortiz	1090376279	Cadenero			María Esperanza Monsalve
3	Jairo Montes	1093140436	Topógrafo			Sandra Katherine Barrera Monsalve
4	Carlos Antonio García Martínez	1094244145	Almacenista			Consorcio Vía Centro
5	Kely Zuleima Cáceres	1094858628	Controladora Trafico			Consorcio Vía Centro
6	Olga Viviana Cacua	10938833132	Controladora Trafico			Consorcio Vía Centro
7	Jhon Jairo Suescun	1094347234	Ayudante de Obra		17/05/2025	Geovanny Enrique Prieto Contreras
8	Jeferson Eduardo Pérez	1005085786	Ayudante de Obra		17/05/2025	Geovanny Enrique Prieto Contreras
9	Pedro Rodríguez Botia	1094859005	Operador Pajarita			MAOMAQ SAS
10	Kiener Rubio Reyes	1090486257	Operador Excavadora Oruga			Expo riente Representaciones
11	Luis Alfredo Reyes	1994002	Ayudante de Obra	21/05/2025		Construcciones JARP
12	Everth Alfonso Pérez	1094858016	Ayudante de Obra		17/05/2025	Geovanny Enrique Prieto Contreras
13	Oscar Gabriel Pérez Guerrero	1094858993	Ayudante de Obra	21/05/2025		Construcciones JARP
14	Luis Alfredo Herrera Ospina	88256554	Conductor Volqueta			Expo riente Representaciones
15	Cristian Fernando Celis Sandoval	1092156255	Operador Vibro			Expo riente Representaciones
16	Manuel Jesús Leal Blanco	5534965	Operador Moto-Niveladora			Expo riente Representaciones
17	German Rubio Ramírez	5497428	Ayudante de Obra	21/05/2025	17/05/2025	Geovanny Enrique Prieto Contreras
18	Anderson Eduardo Mojica	1094859295	Ayudante de Obra	10/05/2025	17/05/2025	Geovanny Enrique Prieto Contreras
19	Elisamir Niño Pabon	5497887	Oficial de Obra	12/05/2025	17/05/2025	Geovanny Enrique Prieto Contreras
20	Jhon Jairo Salazar Galván	1093886068	Oficial de Obra	13/05/2025	17/05/2025	Geovanny Enrique Prieto Contreras
21	Raúl Moncada Villamizar	88178989	Ayudante de Obra	13/05/2025		Construcciones JARP
22	Joel Alvear Jiménez	1090376540	Oficial de Obra	20/05/2025		Construcciones JARP
23	Gustavo Antonio Torres Mendoza	13506458	Oficial de Obra	20/05/2025		Construcciones JARP

24	Franklin Zúñiga Sánchez	1090375442	Oficial de Obra	20/05/2025		Construcciones JARP
25	Narien José Navarro Carrillo	1092357090	Oficial de Obra	22/05/2025		Construcciones JARP
26	Alexander Duran Navarro	71195072	Oficial de Obra	22/05/2025		Construcciones JARP
27	Luis Fernando Carvajal Villamizar	1092359201	Oficial de Obra	20/05/2025		Construcciones JARP
28	Onael García Rojas	7152840	Oficial de Obra	26/05/2025		Construcciones JARP
29	Diomedes Sánchez Ortega	1091593674	Oficial de Obra	20/05/2025		Construcciones JARP
30	Javier Sánchez Ortega	1004942189	Ayudante de Obra	20/05/2025		Construcciones JARP
31	Cesar Diaz	96168127	Ayudante de Obra	26/05/2025		Construcciones JARP
32	Manuel Gómez Acevedo	1090394886	Topografia	26/05/2025		María Esperanza Monsalve
33	Andrey Ovalles	1090490917	Topografia	26/05/2025		María Esperanza Monsalve

PERSONAL ACTIVO TRAMO 3

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO	INGRESOS JUNIO	RETIROS JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL
1	Dennis Johanna Ramírez	30050210	Directora de Obra			Consorcio Vía Centro
2	Cesar Andrés Cárdenas Coll	1090393766	Ing. Residente Tramo -3			Consorcio Vía Centro
3	Yesica Estefanía García Ibarra	1005042765	Auxiliar SST			Consorcio Vía Centro
4	Adrián Reinaldo Castilla	1090445824	Auxiliar Ingeniería			Consorcio Vía Centro
5	Martha Cecilia Villamizar Urbina	1090395293	Controladora de Trafico			Consorcio Vía Centro
6	Edgar Claro Navarro	88263401	Oficios Varios			Consorcio Vía Centro
7	Carmen Yaneth Ibáñez	60446960	Controladora de Trafico			Consorcio Vía Centro
8	José Belén Uribe Laguado	88179493	Vigilante			Consorcio Vía Centro
9	Javier Alexander López	88239557	Conductor			Consorcio Vía Centro
10	Daren Ovallos Galvis	1094269900	Ing. Ambiental			Independiente
11	Yuri Marcela Peña	1096947236	Profesional Social			Independiente
12	Edgar Adrián Castillo	88253361	Almacenista			Constructora Cúcuta
13	Oscar Abel Peñaranda	13388186	Operador Retrocargador			Expo riente Representaciones

14	Eudes Bladimir Peñaranda	1094166681	Operador Retrocargador			Expo riente Representaciones
15	Yefferson Blaymer Sanjuan	1094369267	Operador Retro-Oruga			Expo riente Representaciones
16	Marlon Saul Reales Almendrales	1090472764	Operador Motoniveladora			Expo riente Representaciones
17	Luis Arturo Mendoza	1007197272	Operador Vibro			Expo riente Representaciones
18	Jhon Mendoza	1010122441	Conductor Volqueta			Expo riente Representaciones
19	Ángel Cenen García	88177643	Conductor Volqueta			Expo riente Representaciones
20	Nemesio David Galvis Álvarez	13487636	Conductor Volqueta			Expo riente Representaciones
21	Augusto Moreno Vera	13487533	Conductor Volqueta			Expo riente Representaciones
22	Deybis Giovanny Duarte Ragua	88257430	Conductor Volqueta		07/06/2025	Expo riente Representaciones
23	Elkin Javier Salinas	1120564035	Oficial de Obra			Construcciones JARP
24	Alexander Rojas Fontalvo	88265303	Oficial de Obra			Construcciones JARP
25	Javier Cañizares López	88252039	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
26	Luis Antonio Ramírez Cárdenas	88179256	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
27	Juan Rojas Pérez	77142153	Maestro de Obra			Construcciones JARP
28	Emilio Hernando Laguado Gelvez	5497753	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
29	Álvaro José Ortiz Lindarte	88265667	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
30	Jhonatan Javier bautista	1005042843	Topografía			María Esperanza Monsalve
31	Jahir Ortiz	1094332836	Topografía			María Esperanza Monsalve
32	Alexander Galvis Flórez	88195263	Conductor Carrotanque			OUTSOURCING LOGISTICA
33	Juan Carlos Caamaño Rojas	1093750998	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
34	Víctor Manuel Contreras Arias	1094859085	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
35	Marlon Alexi Castrillón	1090175924	Auxiliar de Laboratorio			Consorcio Vía Centro
36	José Belén Becerra Ibarra	5483795	Vigilante-Turmero	25/06/2025		Consorcio Vía Centro
37	Juan Agustín Ortega Rodríguez	1093885733	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
38	José Alexander Galvis Pabón	1092646153	Oficial de Obra			Construcciones JARP
39	Luis Eduardo Valero García	13487307	Auxiliar Laboratorio			Consorcio Vía Centro
40	Félix del Carmen García Rojas	1063483429	Oficial de Obra			Construcciones JARP

41	Miller Osorio Valencia	1130674910	Operador Retro-Oruga			Expo riente Representaciones
42	Cristian Alejandro Tibaduisa	1093887157	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
43	Juan Carlos Ortiz	1007887610	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
44	Manuel Guillermo Molina	88179712	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
45	Eduardo Serrano Rodríguez	1091183109	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
46	Wilson Palacios Palacios	88179505	Ayudante de Obra	13/06/2025		Construcciones JARP
47	Wilson Javier Gómez Jiménez	1093886834	Ayudante de Obra	13/06/2025		Construcciones JARP
48	Jesús Antonio Palacios Palacios	88178746	Ayudante de Obra	13/06/2025		Construcciones JARP
49	Fabian Gustavo Ortiz Gómez	1005042672	Ayudante de Obra	13/06/2025		Construcciones JARP

PERSONAL ACTIVO TRAMO 2

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO	INGRESOS JUNIO	RETIROS JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL
1	Renny Leonardo Briceño Marciales	1092359216	Ingeniero Residente Tramo 2			Consorcio Vía Centro
2	Nelson Enrique Galvis Flórez	1093785717	Profesional SST			Consorcio Vía Centro
3	Ciro Antonio Pérez Ramírez	5497171	Vigilante Turnero			Consorcio Vía Centro
4	Julio Alberto Soto Hernández	12703347	Vigilante			Consorcio Vía Centro
5	Sergio Pérez Pérez	1090485739	Topógrafo			Sandra Katherine Barrera
6	Karol Yuliana Ramírez Mantilla	1005085682	Controladora Trafico			Consorcio Vía Centro
7	María Belén Contreras Mayorga	1094859828	Controladora Trafico			Consorcio Vía Centro
8	Luis Francisco Martínez	13465276	Almacenista			Constructora Maticces
9	Juan David Hernández	1093590006	Cadenero			María Esperanza Monsalve
10	Eliber Quintero Pérez	1090427870	Oficial de Obra			Construcciones JARP
11	Yank Carlos Martínez Duarte	1094552023	Auxiliar Laboratorio			Consorcio Vía Centro
12	Luis Ramiro Pérez Parada	1094858770	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
13	Yilmer Alexander Acevedo Prieto	1094858928	Ayudante de Obra		15/06/2025	Construcciones JARP

14	Cesar Adrián Peñaranda	5497850	Conductor Volqueta			Expo riente Representaciones
15	Edwar Leonardo Diaz Ibarra	1094859139	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
16	Diego Andrés Diaz Chacón	1090487941	Operador	11/06/2025		Constructora CCC

PERSONAL ACTIVO TRAMO 1

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO	INGRESOS JUNIO	RETIROS JUNIO	SEGURIDAD SOCIAL
1	Yeferson Quintana Alvernia	5401800	Ingeniero Residente			Consorcio Vía Centro
2	Richard Gutiérrez	88238984	Ingeniero Residente	16/06/2025		Consorcio Vía Centro
3	Leonel Alberto Ovalles Ortiz	1090376279	Cadenero			María Esperanza Monsalve
4	Jairo Montes	1093140436	Topógrafo			Sandra Katherine Barrera Monsalve
5	Carlos Antonio García Martínez	1094244145	Almacenista			Consorcio Vía Centro
6	Kely Zuleima Cáceres	1094858628	Controladora Trafico			Consorcio Vía Centro
7	Olga Viviana Cacua	10938833132	Controladora Trafico			Consorcio Vía Centro
8	Pedro Rodríguez Botia	1094859005	Operador Pajarita			MAOMAQ SAS
9	Kiener Rubio Reyes	1090486257	Operador Excavadora Oruga			Expo riente Representaciones
10	Luis Alfredo Reyes	1994002	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
11	Oscar Gabriel Pérez Guerrero	1094858993	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
12	Luis Alfredo Herrera Ospina	88256554	Conductor Volqueta			Expo riente Representaciones
13	Cristian Fernando Celis Sandoval	1092156255	Operador Vibro			Expo riente Representaciones
14	Manuel Jesús Leal Blanco	5534965	Operador Moto-Niveladora			Expo riente Representaciones
15	Raúl Moncada Villamizar	88178989	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
16	Joel Alvear Jiménez	1090376540	Oficial de Obra			Construcciones JARP
17	Gustavo Antonio Torres Mendoza	13506458	Oficial de Obra			Construcciones JARP
18	Franklin Zúñiga Sánchez	1090375442	Oficial de Obra			Construcciones JARP
19	Narien José Navarro Carrillo	1092357090	Oficial de Obra			Construcciones JARP

20	Alexander Duran Navarro	71195072	Oficial de Obra			Construcciones JARP
21	Luis Fernando Carvajal Villamizar	1092359201	Oficial de Obra			Construcciones JARP
22	Onael García Rojas	7152840	Oficial de Obra			Construcciones JARP
23	Diomedes Sánchez Ortega	1091593674	Oficial de Obra			Construcciones JARP
24	Javier Sánchez Ortega	1004942189	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
25	Cesar Diaz	96168127	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
26	Manuel Gómez Acevedo	1090394886	Topografía		18/06/2025	María Esperanza Monsalve
27	Andrey Ovalles	1090490917	Topografía			María Esperanza Monsalve
28	José Antonio Ramírez	5497255	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
29	Álvaro Javier Rodríguez Fuentes	1090176242	Operador Retro-Oruga			Expo riente Representaciones
30	Juan Carlos Rodríguez Torres	1090413797	Operador Retrocargador			Expo riente Representaciones
31	Oscar Peñaranda Rodríguez	5398337	Ayudante de Obra			Construcciones JARP
32	Miguel Antonio Medina	1094858448	Gavionero	06/06/2025		Construcciones JARP
33	Jhonier Arley Cacua	1094858093	Gavionero	06/06/2025		Construcciones JARP
34	Gilberto Ramírez	5497064	Gavionero	06/06/2025		Construcciones JARP
35	German Rubio Ramírez	5497428	Gavionero	06/06/2025		Construcciones JARP
36	José Eladio Peña	5489902	Gavionero	12/06/2025		Construcciones JARP
37	Brandon Geovanny Pérez	1094859349	Ayudante de Obra	12/06/2025		Construcciones JARP
38	Nahún Rivera Remolina	13197639	Oficial de Obra	19/06/2025		Construcciones JARP
39	Marlyn Jaime	1004996797	Topografía	19/06/2025		Sandra Katherine Barrera Monsalve
40	Elquin Yovany Mosquera	11707036	Pilero	25/06/2025		Independiente
41	Freddy Alexander González Ramírez	1006409300	Conductor Camión	26/06/2025		Consorcio Vía Centro

1414

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ESTADO DEL BUEN MANEJO DEL ANTICIPO.

VALOR DE FIDUCIA	$ 13.951.200.000,00
VALOR DE OPERACIONES AUTORIZADAS	$ 11.951.214.473,00
SALDO EN FIDUCIA	$ 1.999.985.527,00
NUMERO DE OPERACIONES	44

LUIS ALFONSO RIVERA PABON
SUPERVISOR
EICE FARO DEL CATATUMBO

Proyecto. Rafael redondo- profesional contratado

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 12	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

FECHA :	05 DE MARZO DEL 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

CONTRATO INTERADMINSITRATIVO No.	CTOI-SV-02532-2023
TIPO DE CONTRATO	INTERADMINISTRATIVO
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE VIAS
CONTRATISTA	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S - EICE FARO CATATUMBO
NIT	901.485.464-3
REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS
C.C. o N.I.T	
OBJETO DEL CONTRATO	GERENCIA INTEGRAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE PROYECTOS GISAP, MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 003296 del 23 de junio de 2023 Por valor de $69.756.000.000,00 No. 001001 del 21 de marzo del 2025 Por Valor de $ 55.125.066.158,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 003975 del 28 de junio de 2023 Por valor de $69.756.000.000,00 No. 002564 del 14 de junio de 2024 Por Valor de $ 55.125.066.158,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL No. 1	No. 002600 del 31 de mayo 2024 Por valor de $599.955.314,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No. 1	No. 002564 del 14 de junio 2024 Por valor de $599.955.314,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE CON 00/100 ($ 69.756.000.000,00)
FORMA DE PAGO	SEGÚN EL CONVENIO

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

	INTERADMINISTRATIVO No. 1914 DE 2021.
PLAZO O DURACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	07 DE JULIO DE 2023
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	**Modificatorio No. 01: 24-10-2023** MODIFICATORIO DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2023, EL CUAL SE REALIZA DE ACUERDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS. **Adicional 01: 14-06-2024** EN VALOR AL CTOI-SV-02532-2023, 14 DE JUNIO DE 2024 -POR QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($599.955.314,00). **Modificatorio No. 03: 19-06-2024** SE REALIZA MODIFICATORIO INCLUYENDO OBLIGACIONES A CARGO DE LA EICE FARO DEL CATATUMBO, RESPECTO DE LAS GARANTÍAS A EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA DERIVADO. **Modificatorio No. 04: 25-03-2025** SE PROCEDE A MODIFICAR LA SECCIÓN 6 DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL MODIFICATORIO ADJUNTO, ESTABLECIENDO EL NUEVO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR LA VIGENCIA EXPIRADA CONSTITUIDA PARA EL PRESENTE CONTRATO.
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE CON 50/100 ($599.955.314,00)
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	SETENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

	Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA CINCO MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE CON 00/100 ($70.355.955.314)
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2026
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Ing. JORGE ARIAS SANGUINO, Profesional Especializado. Ing. GLORIA RUTH BELTRAN, Profesional Especializado. Ing. ISABEL CRISTINA YAÑEZ MONTAÑO, Profesional Universitario. Asignada mediante memorando del 16 de septiembre de 2024. Ing. Manuel Alberto Flores, Profesional Universitario.
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	CONSORCIO R&Q – JOYCO R.L. DIANA LORENA CASTAÑO ACERO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DE OBRA CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATAMTUMBO S.A.S. Y CONSORCIO VIA CENTRO

CONTRATO DE OBRA No.	LP-FC-38-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA	08 de agosto de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S".
CONTRATISTA	CONSORCIO VIA CENTRO
NIT DEL CONTRATISTA	901687177-1
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1.090.473.156

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN CONTRATISTA / CONTACTOS	CENTRO DE NEGOCIO – VENTURA PLAZA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL FARO DEL CATATUMBO S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA	LILIANA FUENTES MEDINA designada mediante memorando del día 08 de agosto de 2023 LUIS ALFONSO RIVERA PABON designado mediante memorando del día 16 de octubre de 2024
INTERVENTOR EXTERNO	CONSORCIO R&Q – JOYCO R.L. DIANA LORENA CASTAÑO ACERO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00000189 del 12 de julio de 2023 No. 00000100 del 29 de enero de 2024 No. 00000231 del 8 de agosto de 2024 (ADICIONAL) No. 00000070 del 17 de febrero de 2025 No. 00 000053 del 10 de febrero 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00000163 del 09 de junio de 2023 No. 00000072 del 12 de febrero de 2024 No. 00000222 del 13 de agosto de 2024 (ADICIONAL) No. 00000032 del 18 de febrero de 2025 No. 00 000064 del 03 de marzo 2026
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($69.756.000.000.00) M/CTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($599.955.314,00)
VALOR FINAL CONTRATO	SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($70.355.955.314,00)
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	N/A
ACTA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

ACTA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
MODIFICATORIOS	No. 01 del 10 de agosto de 2023 No. 02 del 30 de octubre de 2023 No. 03 del 12 de febrero de 2024 No. 04 del 12 de marzo de 2024 No. 05 del 13 de agosto de 2024 No. 06 del 17 de febrero de 2025 No. 07 del 15 de septiembre del 2025
ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES	No. 01 del 13 de agosto de 2024 No. 02 del 15 de enero de 2025 No. 03 del 24 de febrero de 2025 No. 04 del 06 de marzo del 2025 No. 05 del 03 de julio del 2025 No. 6 del 03 de octubre del 2025 No. 7 del 05 de noviembre del 2025
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	Acta de Recibo Parcial No. 01 del 5 de julio de 2024 Acta de Recibo Parcial No. 02 del 19 de sept. De 2024 Acta de Recibo Parcial No. 03 del 19 de febrero de 2025 Acta de Recibo Parcial No. 04 del 04 de marzo de 2025 Acta de Recibo Parcial No. 05 del 02 de mayo 2025 Acta de Recibo Parcial No. 06 del 01 de junio del 2025 Acta de Recibo Parcial No. 07 del 04 de agosto del 2025 Acta de Recibo Parcial No. 08 del 04 de noviembre del 2025 Acta de Recibo Parcial No. 09 del 28 de noviembre del 2025 Acta de Recibo Parcial No. 10 del 16 de diciembre del 2025
ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS	Acta No. 01 del 03 de junio del 2025 Acta No. 02 del 03 de julio del 2025

2. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACION/ANTICIPO	VALOR PAGADO	% EJECUTADO
Acta No. 01	05 DE JULIO DEL 2024	$ 471.026.144,00	$ 94.205.228,80	$ 376.820.915,20	0,67%
Acta No. 02	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$378.641.159,00	$ 75.728.231,80	$ 302.912.927,20	0,54%
Acta No. 03	15 DE ENERO DEL 2025	$ 1.344.468.123,00	$ 268.893.624,20	$ 1.075.574.498,40	1,91%
Acta No. 04	04 DE MARZO DEL 2025	$ 1.874.700.291,00	$ 374.940.058,20	$ 1.499.760.232,80	2,66%
Acta No. 05	02 DE MAYO DEL 2025	$ 2.187.803.958,00	$ 437.560.791,60	$ 1.750.243.166,40	3,11%
Acta No. 06	10 DE JULIO	$ 2.248.662.875,00	$ 449.732.575,00	$1.798.930.300,00	3,20%

	DEL 2025				
Acta No. 07	04 DE AGOSTO DEL 2025	$ 2.414.655.762,00	$ 482.931.152,00	$ 1.931.724.610,00	3,43%
Acta No. 08	10 DE OCTUBRE DEL 2025	$ 3.136.079.055,00	$ 627.215.811,00	$ 2.508.863.244,00	4,46%
Acta No. 09	04 DE NOVIEMBRE DEL 2025	$ 2.496.597.312,00	$ 499.319.462,00	$ 1.997.277.850,00	3,55%
Acta No. 10	16 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 7.096.479.077,00	$ 1.419.295.815,00	$ 5.677.183.262,00	10,09%
Acta No. 11	03 DE MARZO DEL 2026	$ 2.070.850.890,00	$ 414.179.178,00	$ 1.656.680.712,00	2,94%
TOTAL		**$ 25.719.964.646,00**	**$ 5.143.992.929,00**	**$ 20.575.971.717,00**	

TOTAL CONTRATADO	**$ 70.355.955.314,00**
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS	**$ 23.649.113.756,00**

PAGOS REALIZADOS	C.E	VALOR
1. 6 de septiembre de 2024	C.E 009953	$ 471.026.144,00
2. 23 de octubre de 2024	C.E 012415	$ 378.641.159,00
3. 28 de marzo de 2025	C.E 000817	$ 1.344.468.123,00
4. 02 de mayo del 2025	CE 001549 CE001548	$ 2.187.803.958,00
5. 10 de julio de 2025	CE003955	$ 2.248.662.875,00
6. 15 de agosto del 2025	CE 008063	$ 1.360.440.536
7. 10 de octubre del 2025	CE 012357 CE 012356	$ 57.001.706,00 $ 1.874.722.904,00
8. 31 de octubre del 2025	CE 013844 CE 013849	$ 1.677.304.690,00 $ 208.779.589,00
9. 02 de diciembre del 2025	CE 016501	$ 1.485.474.965,00
10. 16 de diciembre del 2025	CE 018544 CE 018543	$ 185.697.124,00 $ 4.044.857.942,00

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

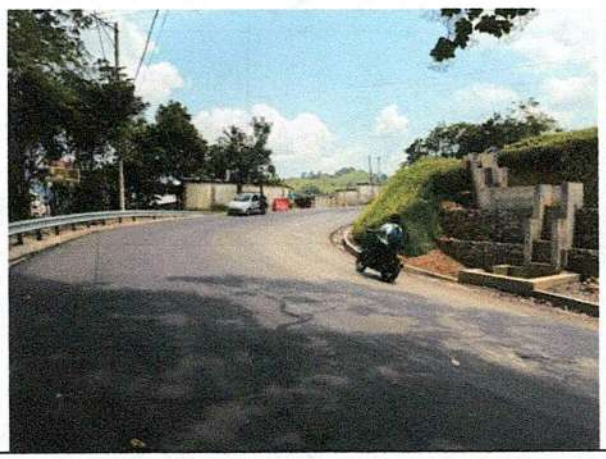
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1		**CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900**		
1.2		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**		
1.2.1		**ALCANTARILLAS**		
1.2.1.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	13,50
1.2.1.6	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	13,00
1.2.1.9	835	Tubería de PVC Ø20" incluye colchón de arena.	m	12,00

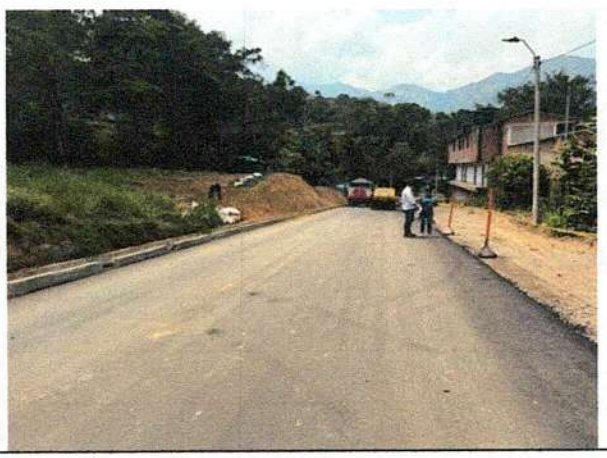
1.2.1.18		Demolicion manual en roca	m3	14,00
1.2.1.19		Excavación manual en material sin clasificar	m3	16,50
1.2.2		**CUNETA, GEODREN Y BORDILLO**		
1.2.2.3	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	2.160,00
1.2.2.6	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	70,20
1.2.2.9	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	56,30
1.2.2.10		Tubo Ø 4" perforado para filtros	m	13,00
1.2.2.15	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	13,40
1.2.2.18		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa	m3	3,10
1.2.5		**BOXCULVERT**		
1.2.5.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	244,90
1.2.5.5	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	1,50
1.2.5.14		Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	48,00
1.2.5.15		Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	8,00
1.3		**OBRAS DE ESTABILIDAD, AMPLIACION Y CONFINAMIENTO.**		
1.3.2		**OBRA K5+255-K5+355: Muro en gaviones H=2.00m L=45.00m**		
1.3.2.9	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	48,00
1.3.5		**MURO CAISSON K4+140**		
1.3.5.5	405	Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 4 - 12mt, sin dinamita	m3	69,40
1.3.5.6	701	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	m3	6,60
1.3.5.7	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 - 12mt	m3	19,10
1.3.5.9	767	Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas	m3	5,20
1.3.5.12	1802	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada	m3	12,10
NP-02 1.3		Anclajes Pasivo DE 1" Incluye suministro, perforacion e inyeccion, tuerca y platina abovedada 15x15	m	24,00
NP-13 1.3		Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 0 - 4mt, sin dinamita	m3	55,20
1.4		**MOVIMIENTO DE TIERAS**		
1.4.1	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	1.596,10
1.4.2	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	499,00
1.5		**PAVIMENTOS**		
1.5.6	1206	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	312,00

1.5.7		Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2	2.139,00
NP-11 1.5		Riego de liga con emulsion asfaltica	m2	5.947,00
1.6		**SEÑALIZACION VIAL**		
NP-09 1.6		Delineador vial tipo corona	Un	6,00
1.7		**OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO**		
1.7.1		**ZODME K6+580**		
1.7.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	390,00
3		**ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900**		
3.2		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**		
3.2.1		**CUNETA, GEODREN Y BORDILLO**		
3.2.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	4.583,00
3.2.1.17	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	2,60
3.2.1.18		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa		107,70
3.3		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**		
3.3.1		**ALCANTARILLAS + MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO**		
3.3.1.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	14,40
3.3.1.6	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3	1,00
3.3.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	53,00
3.3.1.19	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	m3	3,00
3.3.2		**BOXCULVERT**		
3.3.2.4	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	5,30
3.3.2.14	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	418,00
3.3.2.22	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	18,80
3.3.2.27	742	Concreto ciclopeo para piso y solados	m3	1,10
3.3.2.31		Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	19,60
3.5		**OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES**		
3.5.6	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	4,00
3.5.18	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	1,60
3.5.32	811	Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"	m	5,20
3.5.34	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	14,00
3.5.40	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	36,00

NP-05 3.5		Cuneta para zanja corona en geomembrana 30mils	m	118,80
3.6		**PUNTOS CRITICOS**		
3.6.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	70,80
3.6.6	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	1,90
3.6.14	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	0,20
3.6.16	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3	11,80
3.6.21	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	1.005,00
3.6.53	742	Concreto ciclopeo para piso y solados	m3	5,00
3.8		**PAVIMENTOS**		
3.8.4	1205	Riego de Imprimacion	m2	2.880,10
3.8.5	1206	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	227,20
NP-11 3.8		Riego de liga con emulsion asfaltica	m2	851,80
4		**ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920**		
4.2		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**		
4.2.4		**BOXCULVERT**		
4.2.4.1	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	17,90
4.2.4.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	127,00
4.2.4.4	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	1,70
4.2.4.5	767	Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	11,00
4.2.4.6	1012	Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas	m3	6,70
4.2.4.7	1201	Concreto 28 Mpa para vigas y losa	m3	3,80
4.2.4.11	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	2.126,00

2 INFORME FOTOGRÁFICO




















4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, ISABEL CRISTINA YAÑEZ MONTAÑO con cedula de ciudadanía 37.290.498 en mi condición de supervisor (a) del contrato interadministrativo Nº 02532 - 2023, **CERTIFICO** que:

EICE FARO CATATUMBO, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la de ejecución del objeto contractual: GERENCIA INTEGRAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE PROYECTOS GISAP, MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER. durante el período comprendido del 01 de diciembre del 2025 al 31 de enero del 2026.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

El valor a reconocer y pagar es la suma de **DOS MIL SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 2.070.850.890,00),** correspondiente al pago N.º 11.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley (se anexa planillas de pago) con (_____) folios

5. VIABILIDAD Y NO OPONIBILIDAD AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11

En mi calidad de supervisor del Contrato Interadministrativo No. 02532 de 2023, suscrito por la Gobernación del Departamento de Norte de Santander y la EICE FARO CATATUMBO, cuyo objeto es "GERENCIA INTEGRAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE PROYECTOS GISAP, MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER", me permito manifestar que revisada el Acta de Recibo Parcial N° 11, cumple a cabalidad con las cantidades ejecutadas y el valor presentado en la misma, cumpliendo con las especificaciones técnicas por lo cual me permito dar viabilidad y no oponibilidad al Acta de Recibo Parcial N° 11 entregada a la Secretaría en la fecha 03-MARZO-2026, por un valor de **DOS MIL SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 2.070.850.890,00),** correspondiente a un ejecutado del 2,94% en el periodo facturado del 01 de diciembre del 2025 al 31 de enero del 2026.

Observaciones (Si hay lugar a ello):

ISABEL CRISTINA YAÑEZ MONTAÑO
Supervisora

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	**Jonathan David Lizcano Garcia**	**Profesional Contratado**	
Revisión área técnica:	**Isabel Cristina Yáñez Montaño**	**Profesional Universitario**	3/1

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

Powered by CamScanner
