252

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 8
CONVENIO No. SI-036-2022

"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"

PERIODO: 01 de julio al 31 de julio del 2023.

Julio de 2023

Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 3
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO 4
3. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL CONVENIO 4
4. DESCRIPCIÓN DEL ALACANCE DE LAS OBRAS A EJECUTARSE DENTRO DEL CONVENIO 9
5. SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO 10
6. SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO 10
7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO O ESTADO TÉCNICO DEL CONVENIO 12
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 13

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto denominado **"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"** es concordante con el Plan de Desarrollo "Ahora le toca a Córdoba" 2020-2023 en el Eje Estratégico Estructural - 2: OPORTUNIDAD Y EMPRENDIMIENTO, en el cual se encuentra el Pilar estratégico transversal – 2.1: Desarrollo económico para el bienestar y la competitividad, Componente - 2.1.7: Infraestructura vial y segura para el desarrollo, Programa - 2.1.7.1: Infraestructura vial para el desarrollo y la competitividad, Subprograma- 2.1.7.1.1: Construcción, mantenimiento, rehabilitación, diseño de vías, cuya Meta de Producto es: Intervenir 10 km de vías urbanas.

Que el proyecto se encuentra inscrito en el Banco de proyectos del Municipio de planeta rica según consta en el certificado de inscripción en el Banco de proyectos, expedido por la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física del municipio y así mismo, se encuentran inscrito en el Banco de proyectos de la Gobernación de Córdoba con el número BPIN: 2022235550120, según consta en el certificado de inscripción en el Banco de proyectos del Departamento de Córdoba de fecha 28 de octubre de 2022 expedido por el Director del Departamento Administrativo del Planeación de Córdoba.

El proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA,** se ejecutará en la subregión Costanera, en el Municipio de PLANETA RICA.

Para la ejecución del proyecto y su alcance, se suscribió el convenio SI-036-2022 entre la gobernación de Córdoba y el municipio de Planeta Rica, siendo este último el encargado de contratar la obra e interventoría del proyecto en mención, así mismo el convenio será supervisado por la secretaria de Infraestructura del departamento de Córdoba.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO

CONVENIO	SI-036-2022
CONVENIANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONVENIANTE	MUNICIPIO DE PLANETA RICA
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CERTIFICADO PRESUPUESTAL:	2695 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 9 DE 2 DE ENERO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	6801 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 780 DE 23 DE FEBRERO DE 2023
VALOR INICIAL:	DOS MIL VENTITRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($2.023.241.407,00 M/CTE.)
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES
VENCIMIENTO:	31 DE JULIO DE 2023
FECHA PRORROGA 1	24 DE JULIO DE 2023 (3 MESES)
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCIÓN

Tabla 2-1. Información básica contractual – Convenio

3. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL CONVENIO

El valor del presente convenio es la suma de DOS MIL VENTITRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE $2.023.241.407,00 incluidos costos directos e indirectos, de los cuales $1.935.830.450,00 M/cte. corresponden a la obra, y $87.410.957 M/cte, corresponden a la interventoría.

Certificado Presupuestal No. 2695 de fecha 8 de noviembre del 2022, por valor de $ 303.486.211,00 y Registro Presupuestal No.6801 de 25 de noviembre de 2022, por valor de $ 303.486.211,00 y para la vigencia del año 2023 se expidió el Certificado Presupuestal No. 9 DE 2 DE ENERO DE 2023, por un valor de $ 1.719.755.196 y Registro Presupuestal No. 780 DE 23 DE FEBRERO DE 2023, por el valor de $ 303.486.211,00

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 2695
Fecha de Vencimiento 31/12/2022
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.022 **Fecha de Expedición:** 08 nov. 2022

Objeto: ;PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA. VIGENCIA 2022: $ 303.486.211,00 VIGENCIA 2023: $ 1.719.755.196,00 SEGUN LA ORDENANZA N° 011 DE 2022.

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.3.3.1.00
POLITICA PUBLICA:8121.0
DETALLE SECTORIAL: 0

Solicitante: 50882640-TOBIAS CARRASCAL CILIA JAQUELIN-SECRETARIA DE INFRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recursos de la Nación-Destinación Específica Sobretasa al ACPM	303.486.211,00
	TOTAL CERTIFICADO	303.486.211,00

DETALLE DE AUTORIZACION PARA LA VIGENCIA FUTURA

Autorización N° 011 del 31 de octubre de 2022
Vigencias Autorizadas 4
SEGUN ORDENANZA 011 DE 2022

		2.023	Total
03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles	1,719,755,196.00	1,719,755,196.00
Total		1,719,755,196.00	1,719,755,196.00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: ESMERALDAHERNANDEZ

Powered by CamScanner

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Registro No. 6801

Vigencia: 2022 **Fecha de Compromiso:** 25 de noviembre de 2022

Beneficiario MUNICIPIO DE_PLANETA RICA **Nit:** 800096765 - 1

No. C.D.P. : 2695 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 08 de noviembre de 2022 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Convenio: SI -036-2022 **Fecha:**24/11/2022 **Vence:** 31/12/2022

Objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE GOBERNACION DE CORDOBA Y EL MUNIICPIO DE PLANETA RICA PARA AUNAR ESFUERZO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA.
VIGENCIA 2022: $ 303.486.211,00
VIGENCIA 2023: $ 1.719.755.196,00 SEGUN LA ORDENANZA N° 011 DE 2022.
TIEMPO 8 MESES - APARADO VIGENCIA FUTURA SEGUN ORD 011 DEL 2022

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** MONTERIA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Sobretasa al ACPM **Clasificadores** 2402105-53211-1-1.2.3.2.11-8121.0-0 303.486.211,00	303.486.211,00
	Total Compromisos	$303.486.211,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Noviembre	$303.486.211,00
Valor Total Prog.	$303.486.211,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 9
Fecha de Vencimiento 31/12/2023
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.023 **Fecha de Expedición:** 02 ene. 2023

Objeto: PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.3.3.1.00
POLITICA PUBLICA: 8121.0
DETALLE SECTORIAL: 0
Solicitante: 50882640-TOBIAS CARRASCAL CILIA JAQUELIN-SECRETARIA DE INFRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Sobretasa al ACPM	1.719.755.196,00
	TOTAL CERTIFICADO	1.719.755.196,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 780

Vigencia: 2.023 **Fecha de Compromiso:** 23 de febrero de 2023

Beneficiario MUNICIPIO DE_PLANETA RICA **Nit:** 800096765 - 1

No. C.D.P. : 9 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 02 de enero de 2023 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Convenio: SI-036-2022 **Fecha:**23/02/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONTSRUCCION DE PAVIMIENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA CORDOBA - AUTORIZA VIGENCIA FUTURA - ORDENZNA 011-2022

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** MONTERIA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Sobretasa al ACPM **Clasificadores** 2402105-53211-1-1.2.3.2.11-8121.0-0 1.719.755.196,00	1.719.755.196,00
	Total Compromisos	$1.719.755.196,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Febrero	$1.719.755.196,00
Valor Total Prog.	$1.719.755.196,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

Gobernación de Córodoba NIT. 800103935-6
Palacio de Naín - Calle 27 No. 3 - 28 Montería - Córdoba PBX: + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

4. DESCRIPCIÓN DEL ALACANCE DE LAS OBRAS A EJECUTARSE DENTRO DEL CONVENIO

Las obras que se describen a continuación se registran en el presente convenio.

- construcción de 762,73 ml de pavimento Rígido.

I	OBRAS PROVISIONALES, DE EXPLANACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE		
1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS, PISOS, CUNETAS, Y BORDILLOS DE CONCRETO.	M2	402,60
2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (BOX COULVERT)	UND	52,00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES. NO INCLUYE RETIRO	M3	2.420,16
4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEBIDAMENTE COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	976,29
II	AFIRMADOS Y SUBBASES		
5	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	976,29
III	TRANSPORTE DE MATERIALES		
6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 m) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3-KM	3.759,92
IV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		
7	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - MR-40 INLCUYE TODO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M3	915,28
8	ACERO LISO PARA DOVELAS DE TRANSFERENCIA DE CARGAS. INCLUYE INSTALACIÓN.	KG	6.435,92
9	ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA IRREGULARES, ACERO DE TRANSFERENCIA, CANASTILLAS Y BOX COULVERT	KG	14.728,44
10	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 20X50X80CM	ML	1.189,46
11	SARDINEL ACHAFLANADO FUNDIDO IN SITU, ESPECIAL PARA ACCESO VEHICULAR. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE GRANULAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	ML	264,00
12	REALCE DE CAMARA DE INSPECCION - INCLUYE TAPA	UND	6,00
V	OBRAS DE DRENAJE		
13	CONCRETO DE 28MPA (4000 PSI) PARA BOX COULVERT 2.0 m X 2.0 m	M3	108,00
VI	OBRAS DE SEÑALIZACION		
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE SEÑAL SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-01 X 60 CM DE LADO A UNA CARA Y CON PEDESTAL, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL EN ÁNGULO CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	16,00
VII	AJUSTES		
15	AJUSTES Y DISEÑOS	UND	1,00

Todas estas actividades incluyen los elementos, maquinarias, materiales y mano de obra necesaria para su óptima ejecución. Estas actividades además se rigen por las especificaciones técnicas.

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISIÓN

La labor de la supervisión al convenio, desde el punto de vista administrativo, consistió en:

1. Mantener el expediente del convenio completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo.
2. Revisión de documentos de la etapa precontractual del convenio.
3. Coordinación de la suscripción de los contratos, revisión de garantías y proyección de documento de aprobación de las mismas.
4. Atención a correspondencia recibida.

5.1. GARANTÍAS DERIVADAS DEL CONVENIO

Para la ejecución del presente convenio no se exigirán garantías, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, que a la letra reza: "ARTÍCULO 7o. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. (...) **Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos**, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento".

5.2 ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO

El CONVENIO SI-036-2022, durante el periodo del presente informe, se encuentra como sigue:

1. El municipio suscribió el contrato de obra e interventoría para la ejecución del proyecto referenciado.
2. Se firmó acta de inicio del convenio con el municipio de planeta rica dándole inicio en la plataforma SECOP II.
3. El contratista actualizo póliza según el acta de inicio
4. La contratista suscribió acta de suspensión del contrato de obra e interventoría.

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO

6.1 FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:

- **UN PRIMER DESEMBOLSO** equivalente al **15%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de TRECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE **($ 303.486.211)**, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio, la suscripción del acta de inicio del convenio, y constancia de apertura de cuenta para el manejo de los recursos a financiar por parte del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Estos ingresarán en una cuenta de ahorros en una entidad financiera legalmente reconocida y será de titularidad del municipio suscribiente. Esta cuenta debe abrirse bajo la denominación del proyecto que se cofinancia. El municipio deberá utilizar los recursos cofinanciados por el Departamento exclusivamente en el objeto del convenio, de conformidad con los documentos previos que se consideran parte integral de esta relación jurídica obligacional. El municipio, deberá reintegrar al Departamento, los rendimientos financieros que los recursos depositados en la citada cuenta generen, lo que se efectuará una vez se proceda con la liquidación del convenio.
- **UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente al **25%** del valor del aporte de Departamento correspondiente a la suma de QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 505.810.351,75**), una vez el municipio haya celebrado los contratos de obra e interventoría derivados del presente convenio interadministrativo.
- **UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente al **50%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de MIL ONCE MILLONES SEICIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 1.011.620.703,5)**, por medio de acta parcial una vez superado el setenta por ciento (70%) de avance de obra.
- **UN DESEMBOLSO FINAL** equivalente al **10%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de DOCIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (**$ 202.324.140,7)**, sujeto al cumplimiento total y a cabalidad de las obligaciones pactadas en el convenio y una vez entregada y recibida la obra a satisfacción.

6.2 ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONVENIO

A la fecha del presente periodo la Gobernación de Córdoba ha realizado dos desembolsos discriminados de la siguiente manera un PRIMER desembolso equivalente al 15% por el valor de TRECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE **($ 303,486,211),** un SEGUNDO desembolso equivalente al 25% del valor del aporte de Departamento correspondiente a la suma de QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 505.810.351,75**), una vez

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

se cumplieron los requisitos de celebrar los contratos de obra e interventoría derivados del presente convenio interadministrativo.

Acta de ejecución No.	Fecha	Orden de pago No.	Comp. Egreso No.	Valor Bruto para pagar	Desc. Realizados	Valor Neto recibido
Desembolso No.1	22/02/2023	21061	2792	$ 303.486.211	$0	$ 303.486.211
Desembolso No. 2	28/02/2023	2792	3801	$505.810.351,75	$0	$505.810.351,75

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO O ESTADO TÉCNICO DEL CONVENIO

- Se realizó la fundición de losas de concreto.
- Relleno de material debidamente compactado
- Instalación de subbase granular clase c
- demolición de estructuras (box-coulvert)
- Construcción de acometidas domiciliarias
- Instalación de acero de refuerzo para losas irregulares.
- Instalación de bordillo prefabricado.
- Excavación sin calificar de la explanación y canales de la calle 12a entre 10 y 10ª y la calle 12 entre carrera 10 y 11

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones al final del periodo de ejecución del CONVENIO SI-036-2022 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA" son las siguientes:


1. Se realiza suspensión a los contratos de obra e interventoría en fecha 28 de julio de 2023
2. El municipio solicito adición para los contratos de obra e interventoría teniendo en cuenta nuevas cantidades encontradas en la ejecución de las obras.
3. A la fecha el municipio realizo solicitud de prórroga para el convenio SI-036-2022
4. Se realizo prorroga No.1 por el termino de tres meses al convenio SI-036-2022

Presentado por:


CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Supervisor


Elaboró: Sebastián Guerrero – Ing. Civil Externo – SID
Camilo Carmona – contratista SID

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

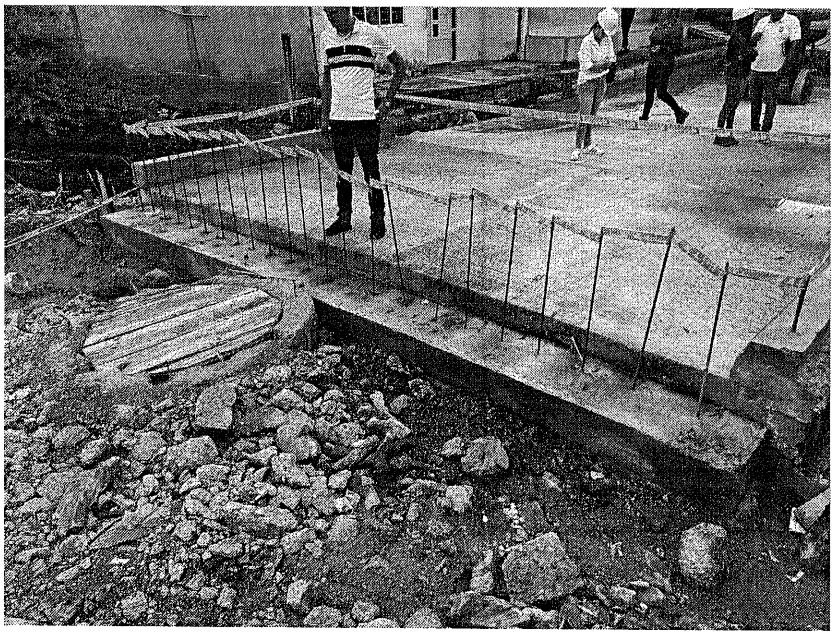




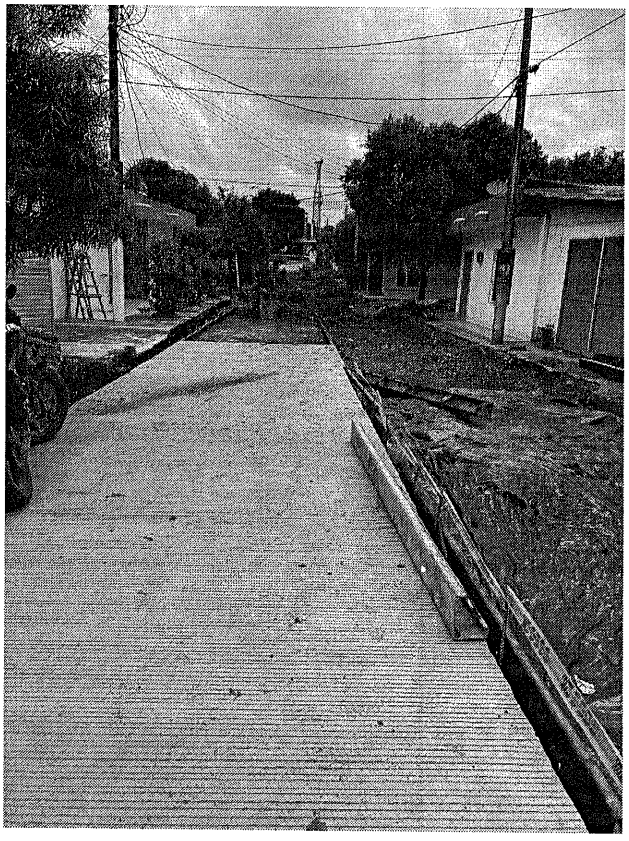


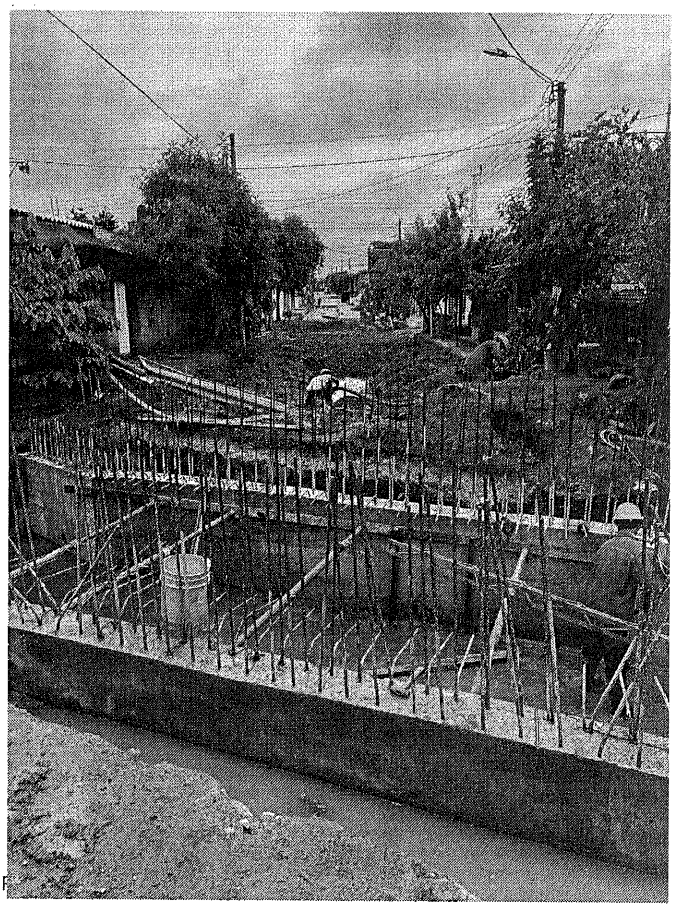


Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo




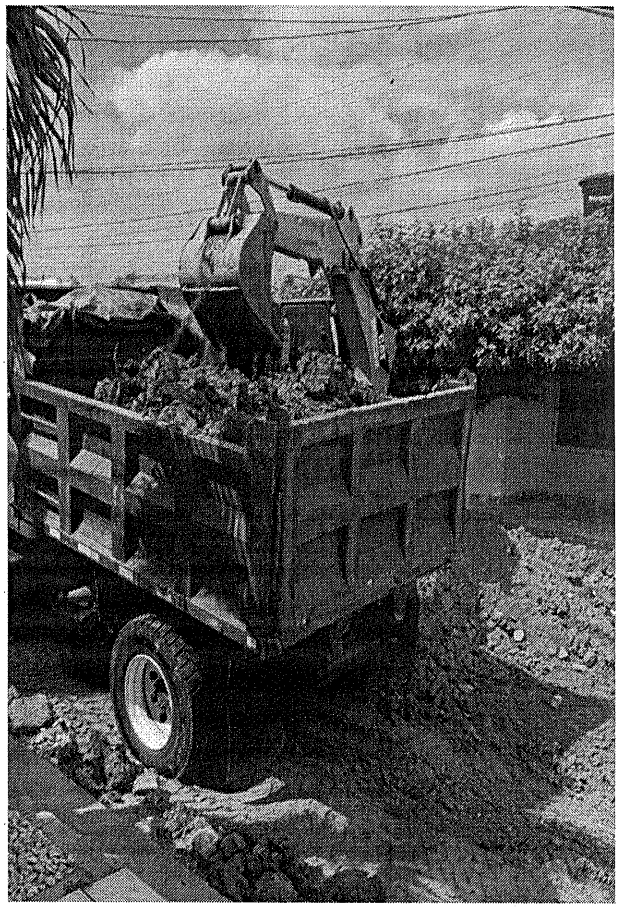


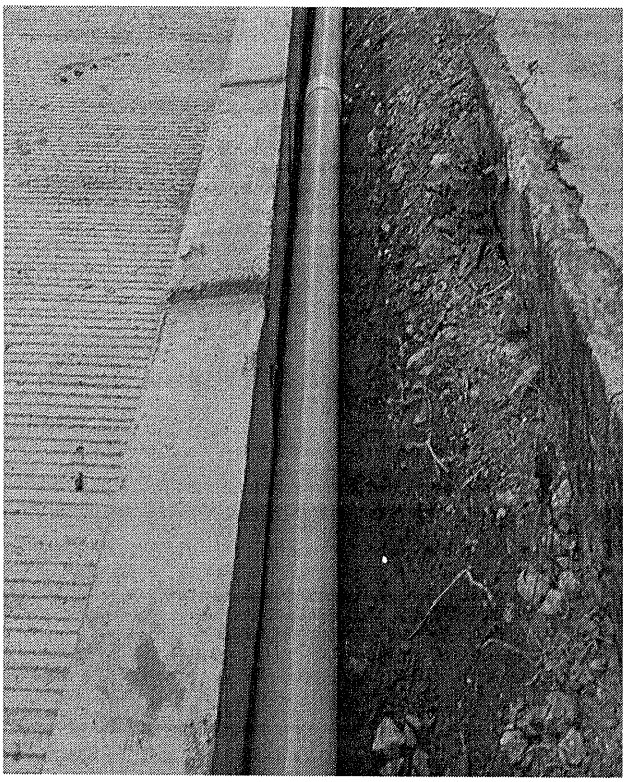


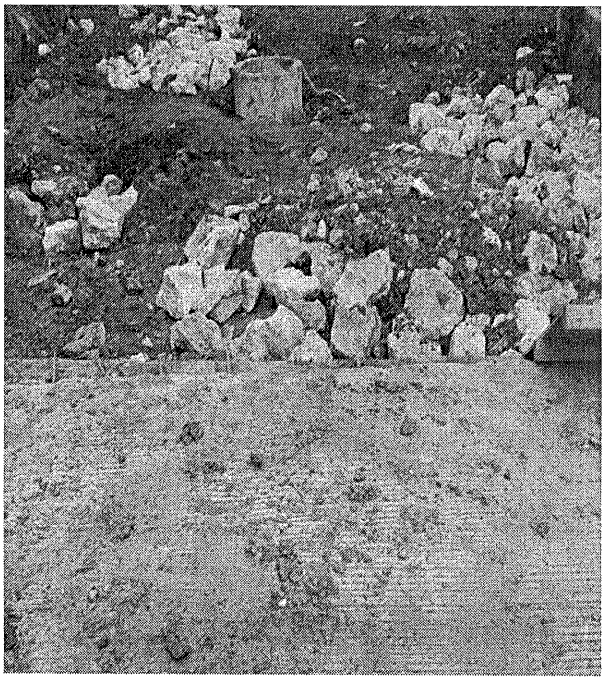


Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

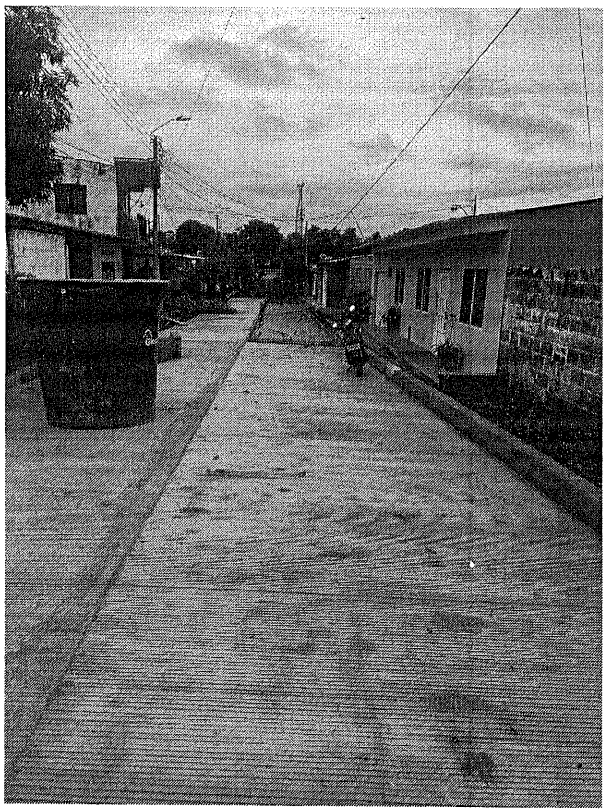

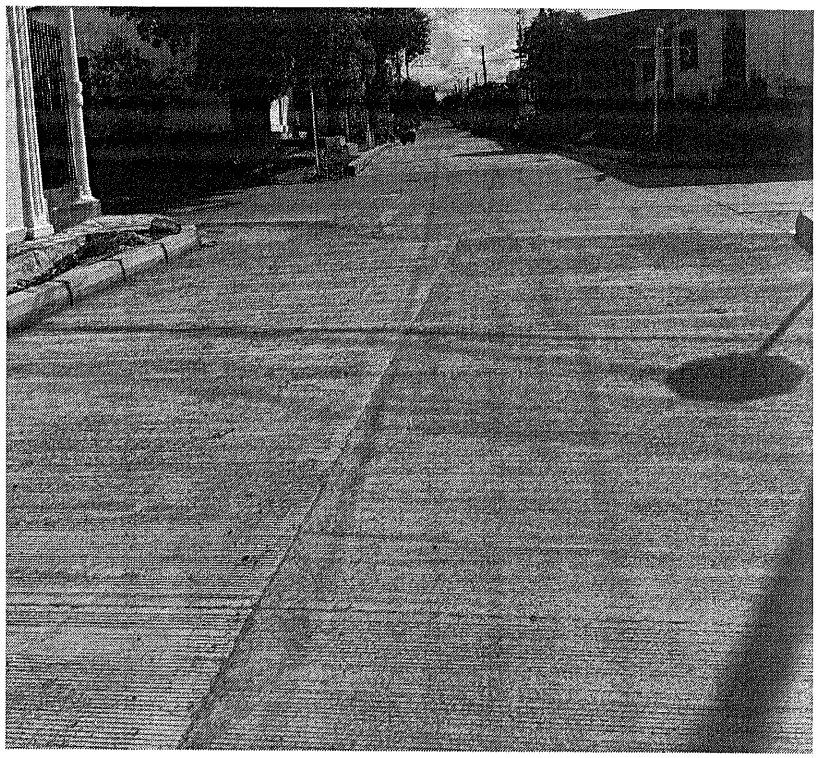

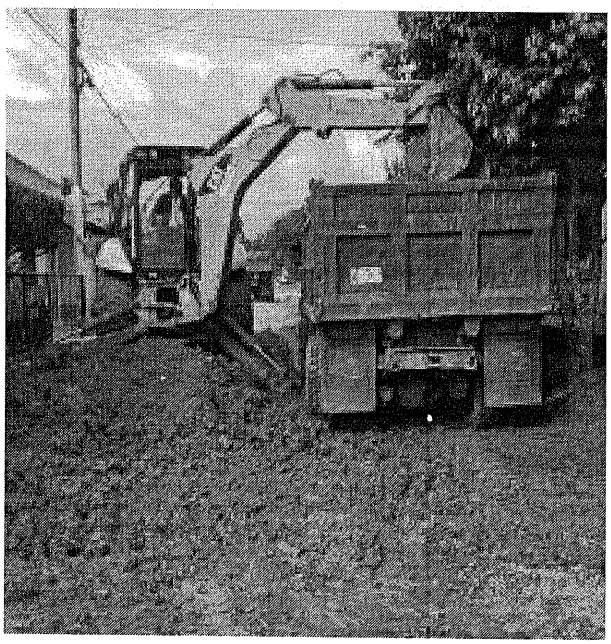

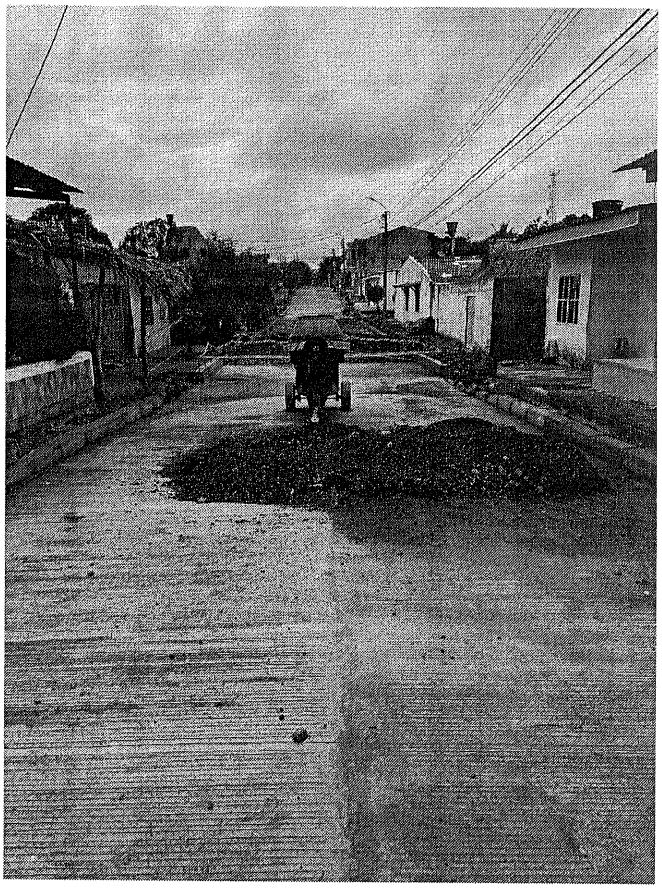

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

267

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 9
CONVENIO No. SI-036-2022

"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"

PERIODO: 01 de agosto al 31 de agosto del 2023.

Agosto de 2023

Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 3
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO 4
3. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL CONVENIO 4
4. DESCRIPCIÓN DEL ALACANCE DE LAS OBRAS A EJECUTARSE DENTRO DEL CONVENIO 9
5. SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO 10
6. SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO 11
7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO O ESTADO TÉCNICO DEL CONVENIO 12
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 12

269

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto denominado **"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"** es concordante con el Plan de Desarrollo "Ahora le toca a Córdoba" 2020-2023 en el Eje Estratégico Estructural - 2: OPORTUNIDAD Y EMPRENDIMIENTO, en el cual se encuentra el Pilar estratégico transversal – 2.1: Desarrollo económico para el bienestar y la competitividad, Componente - 2.1.7: Infraestructura vial y segura para el desarrollo, Programa - 2.1.7.1: Infraestructura vial para el desarrollo y la competitividad, Subprograma- 2.1.7.1.1: Construcción, mantenimiento, rehabilitación, diseño de vías, cuya Meta de Producto es: Intervenir 10 km de vías urbanas.

Que el proyecto se encuentra inscrito en el Banco de proyectos del Municipio de planeta rica según consta en el certificado de inscripción en el Banco de proyectos, expedido por la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física del municipio y así mismo, se encuentran inscrito en el Banco de proyectos de la Gobernación de Córdoba con el número BPIN: 2022235550120, según consta en el certificado de inscripción en el Banco de proyectos del Departamento de Córdoba de fecha 28 de octubre de 2022 expedido por el Director del Departamento Administrativo del Planeación de Córdoba.

El proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA,** se ejecutará en la subregión Costanera, en el Municipio de PLANETA RICA.

Para la ejecución del proyecto y su alcance, se suscribió el convenio SI-036-2022 entre la gobernación de Córdoba y el municipio de Planeta Rica, siendo este último el encargado de contratar la obra e interventoría del proyecto en mención, así mismo el convenio será supervisado por la secretaria de Infraestructura del departamento de Córdoba.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO

CONVENIO	SI-036-2022
CONVENIANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONVENIANTE	MUNICIPIO DE PLANETA RICA
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CERTIFICADO PRESUPUESTAL:	2695 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 9 DE 2 DE ENERO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	6801 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 780 DE 23 DE FEBRERO DE 2023
VALOR INICIAL:	DOS MIL VENTITRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($2.023.241.407,00 M/CTE.)
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES
VENCIMIENTO:	31 DE JULIO DE 2023
FECHA PRORROGA 1	24 DE JULIO DE 2023 (3 MESES)
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCIÓN

Tabla 2-1. Información básica contractual – Convenio

3. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL CONVENIO

El valor del presente convenio es la suma de DOS MIL VENTITRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE $2.023.241.407,00 incluidos costos directos e indirectos, de los cuales $1.935.830.450,00 M/cte. corresponden a la obra, y $87.410.957 M/cte, corresponden a la interventoría.

Certificado Presupuestal No. 2695 de fecha 8 de noviembre del 2022, por valor de $ 303.486.211,00 y Registro Presupuestal No.6801 de 25 de noviembre de 2022, por valor de $ 303.486.211,00 y para la vigencia del año 2023 se expidió el Certificado Presupuestal No. 9 DE 2 DE ENERO DE 2023, por un valor de $ 1.719.755.196 y Registro Presupuestal No. 780 DE 23 DE FEBRERO DE 2023, por el valor de $ 303.486.211,00

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 2695
Fecha de Vencimiento 31/12/2022
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.022 **Fecha de Expedición:** 08 nov. 2022

Objeto: ;PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA. VIGENCIA 2022: $ 303.486.211,00 VIGENCIA 2023: $ 1.719.755.196,00 SEGUN LA ORDENANZA N° 011 DE 2022.

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.3.3.1.00
POLITICA PUBLICA:8121.0
DETALLE SECTORIAL: 0

Solicitante: 50882640-TOBIAS CARRASCAL CILIA JAQUELIN-SECRETARIA DE INFRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recursos de la Nación-Destinación Específica Sobretasa al ACPM	303.486.211,00
	TOTAL CERTIFICADO	303.486.211,00

DETALLE DE AUTORIZACION PARA LA VIGENCIA FUTURA

Autorización N° 011 del 31 de octubre de 2022
Vigencias Autorizadas 4
SEGUN ORDENANZA 011 DE 2022

		2.023	Total
03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles	1,719,755,196.00	1,719,755,196.00
Total		1,719,755,196.00	1,719,755,196.00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: ESMERALDAHERNANDEZ

Powered by CamScanner

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Registro No. **6801**

Vigencia: 2022 **Fecha de Compromiso:** 25 de noviembre de 2022

Beneficiario MUNICIPIO DE_PLANETA RICA **Nit:** 800096765 - 1

No. C.D.P. : 2695 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 08 de noviembre de 2022 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Convenio: SI -036-2022 **Fecha:**24/11/2022 **Vence:** 31/12/2022

Objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE GOBERNACION DE CORDOBA Y EL MUNIICPIO DE PLANETA RICA PARA AUNAR ESFUERZO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA.
VIGENCIA 2022: $ 303.486.211,00
VIGENCIA 2023: $ 1.719.755.196,00 SEGUN LA ORDENANZA N° 011 DE 2022.
TIEMPO 8 MESES - APARADO VIGENCIA FUTURA SEGUN ORD 011 DEL 2022

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** MONTERIA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles **Recurso de la Nación-Destinación Especifica** Sobretasa al ACPM **Clasificadores** 2402105-53211-1-1.2.3.2.11-8121.0-0 303.486.211,00	303.486.211,00
	Total Compromisos	$303.486.211,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Noviembre	$303.486.211,00
Valor Total Prog.	$303.486.211,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 9
Fecha de Vencimiento 31/12/2023
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.023 **Fecha de Expedición:** 02 ene. 2023

Objeto: PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.3.3.1.00
POLITICA PUBLICA: 8121.0
DETALLE SECTORIAL: 0
Solicitante: 50882640-TOBIAS CARRASCAL CILIA JAQUELIN-SECRETARIA DE INFRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Sobretasa al ACPM	1.719.755.196,00
	TOTAL CERTIFICADO	1.719.755.196,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Registro No. 780

Vigencia: 2.023 **Fecha de Compromiso:** 23 de febrero de 2023

Beneficiario MUNICIPIO DE_PLANETA RICA **Nit:** 800096765 - 1

No. C.D.P. : 9 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 02 de enero de 2023 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Convenio: SI-036-2022 **Fecha:**23/02/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONTSRUCCION DE PAVIMIENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA CORDOBA - AUTORIZA VIGENCIA FUTURA - ORDENZNA 011-2022

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** MONTERIA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Sobretasa al ACPM **Clasificadores** 2402105-53211-1-1.2.3.2.11-8121.0-0 1.719.755.196,00	1.719.755.196,00
	Total Compromisos	$1.719.755.196,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Febrero	$1.719.755.196,00
Valor Total Prog.	$1.719.755.196,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

PCT Enterprise - Page 1 of 1 - RPC 780

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

4. DESCRIPCIÓN DEL ALACANCE DE LAS OBRAS A EJECUTARSE DENTRO DEL CONVENIO

Las obras que se describen a continuación se registran en el presente convenio.

- construcción de 762,73 ml de pavimento Rígido.

I	OBRAS PROVISIONALES, DE EXPLANACION Y CONFORMACION DE SUBRASANTE		
1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS, PISOS, CUNETAS, Y BORDILLOS DE CONCRETO.	M2	402,60
2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (BOX COULVERT)	UND	52,00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES. NO INCLUYE RETIRO	M3	2.420,16
4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEBIDAMENTE COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	976,29
II	AFIRMADOS Y SUBBASES		
5	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	976,29
III	TRANSPORTE DE MATERIALES		
6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 m) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3-KM	3.759,92
IV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		
7	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - MR-40 INLCUYE TODO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M3	915,28
8	ACERO LISO PARA DOVELAS DE TRANSFERENCIA DE CARGAS. INCLUYE INSTALACIÓN.	KG	6.435,92
9	ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA IRREGULARES, ACERO DE TRANSFERENCIA, CANASTILLAS Y BOX COULVERT	KG	14.728,44
10	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 20X50X80CM	ML	1.189,46
11	SARDINEL ACHAFLANADO FUNDIDO IN SITU, ESPECIAL PARA ACCESO VEHICULAR. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE GRANULAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	ML	264,00
12	REALCE DE CAMARA DE INSPECCION - INCLUYE TAPA	UND	6,00
V	OBRAS DE DRENAJE		
13	CONCRETO DE 28MPA (4000 PSI) PARA BOX COULVERT 2.0 m X 2.0 m	M3	108,00
VI	OBRAS DE SEÑALIZACION		
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE SEÑAL SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-01 X 60 CM DE LADO A UNA CARA Y CON PEDESTAL, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL EN ÁNGULO CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	16,00
VII	AJUSTES		
15	AJUSTES Y DISEÑOS	UND	1,00

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Todas estas actividades incluyen los elementos, maquinarias, materiales y mano de obra necesaria para su óptima ejecución. Estas actividades además se rigen por las especificaciones técnicas.

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISIÓN

La labor de la supervisión al convenio, desde el punto de vista administrativo, consistió en:

1. Mantener el expediente del convenio completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo.
2. Revisión de documentos de la etapa precontractual del convenio.
3. Coordinación de la suscripción de los contratos, revisión de garantías y proyección de documento de aprobación de las mismas.
4. Atención a correspondencia recibida.

5.1. GARANTÍAS DERIVADAS DEL CONVENIO

Para la ejecución del presente convenio no se exigirán garantías, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, que a la letra reza: "ARTÍCULO 7o. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. (...) **Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos**, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento".

5.2 ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO

El CONVENIO SI-036-2022, durante el periodo del presente informe, se encuentra como sigue:

1. El municipio suscribió el contrato de obra e interventoría para la ejecución del proyecto referenciado.
2. Se firmó acta de inicio del convenio con el municipio de planeta rica dándole inicio en la plataforma SECOP II.
3. El contratista actualizo póliza según el acta de inicio
4. La contratista suscribió acta de suspensión del contrato de obra e interventoría.

277

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO

6.1 FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:

- **UN PRIMER DESEMBOLSO** equivalente al **15%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de TRECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE **($ 303.486.211)**, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio, la suscripción del acta de inicio del convenio, y constancia de apertura de cuenta para el manejo de los recursos a financiar por parte del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Estos ingresarán en una cuenta de ahorros en una entidad financiera legalmente reconocida y será de titularidad del municipio suscribiente. Esta cuenta debe abrirse bajo la denominación del proyecto que se cofinancia. El municipio deberá utilizar los recursos cofinanciados por el Departamento exclusivamente en el objeto del convenio, de conformidad con los documentos previos que se consideran parte integral de esta relación jurídica obligacional. El municipio, deberá reintegrar al Departamento, los rendimientos financieros que los recursos depositados en la citada cuenta generen, lo que se efectuará una vez se proceda con la liquidación del convenio.
- **UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente al **25%** del valor del aporte de Departamento correspondiente a la suma de QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 505.810.351,75**), una vez el municipio haya celebrado los contratos de obra e interventoría derivados del presente convenio interadministrativo.
- **UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente al **50%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de MIL ONCE MILLONES SEICIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 1.011.620.703,5)**, por medio de acta parcial una vez superado el setenta por ciento (70%) de avance de obra.
- **UN DESEMBOLSO FINAL** equivalente al **10%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de DOCIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (**$ 202.324.140,7)**, sujeto al cumplimiento total y a cabalidad de las obligaciones pactadas en el convenio y una vez entregada y recibida la obra a satisfacción.

6.2 ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONVENIO

A la fecha del presente periodo la Gobernación de Córdoba ha realizado dos desembolsos discriminados de la siguiente manera un PRIMER desembolso equivalente al 15% por el valor de TRECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE **($ 303,486,211),** un SEGUNDO desembolso equivalente al 25% del valor del aporte de Departamento correspondiente a la suma de QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIES MIL TRECIENTOS CINCUENTA

Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 505.810.351,75**), una vez se cumplieron los requisitos de celebrar los contratos de obra e interventoría derivados del presente convenio interadministrativo.

Acta de ejecución No.	Fecha	Orden de pago No.	Comp. Egreso No.	Valor Bruto para pagar	Desc. Realizados	Valor Neto recibido
Desembolso No.1	22/02/2023	21061	2792	$ 303.486.211	$0	$ 303.486.211
Desembolso No. 2	28/02/2023	2792	3801	$505.810.351,75	$0	$505.810.351,75

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO O ESTADO TÉCNICO DEL CONVENIO

- Los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos razón por la cual no se ejecutaron actividades en el presente periodo.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones al final del periodo de ejecución del CONVENIO SI-036-2022 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA" son las siguientes:

1. Se continua a la espera de la aprobación de la solicitud de adición y prorroga al convenio.

Presentado por:

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Supervisor

Elaboró: Sebastián Guerrero – Ing. Civil Externo – SID
Camilo Carmona – contratista SID

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- Los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos razón por la cual no se ejecutaron actividades en el periodo.

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 10

CONVENIO No. SI-036-2022

"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"

PERIODO: 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2023.

octubre de 2023

260

Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 3
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO 4
3. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL CONVENIO 4
4. DESCRIPCIÓN DEL ALACANCE DE LAS OBRAS A EJECUTARSE DENTRO DEL CONVENIO 9
5. SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO 10
6. SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO 11
7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO O ESTADO TÉCNICO DEL CONVENIO 12
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 12

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto denominado **"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"** es concordante con el Plan de Desarrollo "Ahora le toca a Córdoba" 2020-2023 en el Eje Estratégico Estructural - 2: OPORTUNIDAD Y EMPRENDIMIENTO, en el cual se encuentra el Pilar estratégico transversal – 2.1: Desarrollo económico para el bienestar y la competitividad, Componente - 2.1.7: Infraestructura vial y segura para el desarrollo, Programa - 2.1.7.1: Infraestructura vial para el desarrollo y la competitividad, Subprograma- 2.1.7.1.1: Construcción, mantenimiento, rehabilitación, diseño de vías, cuya Meta de Producto es: Intervenir 10 km de vías urbanas.

Que el proyecto se encuentra inscrito en el Banco de proyectos del Municipio de planeta rica según consta en el certificado de inscripción en el Banco de proyectos, expedido por la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física del municipio y así mismo, se encuentran inscrito en el Banco de proyectos de la Gobernación de Córdoba con el número BPIN: 2022235550120, según consta en el certificado de inscripción en el Banco de proyectos del Departamento de Córdoba de fecha 28 de octubre de 2022 expedido por el Director del Departamento Administrativo del Planeación de Córdoba.

El proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA,** se ejecutará en la subregión Costanera, en el Municipio de PLANETA RICA.

Para la ejecución del proyecto y su alcance, se suscribió el convenio SI-036-2022 entre la gobernación de Córdoba y el municipio de Planeta Rica, siendo este último el encargado de contratar la obra e interventoría del proyecto en mención, así mismo el convenio será supervisado por la secretaria de Infraestructura del departamento de Córdoba.

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO

CONVENIO	SI-036-2022
CONVENIANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONVENIANTE	MUNICIPIO DE PLANETA RICA
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CERTIFICADO PRESUPUESTAL:	2695 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 9 DE 2 DE ENERO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	6801 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 780 DE 23 DE FEBRERO DE 2023
VALOR INICIAL:	DOS MIL VENTITRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($2.023.241.407,00 M/CTE.)
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES
VENCIMIENTO:	31 DE JULIO DE 2023
FECHA PRORROGA 1	24 DE JULIO DE 2023 (3 MESES)
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCIÓN

Tabla 2-1. Información básica contractual – Convenio.

3. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL CONVENIO

El valor del presente convenio es la suma de DOS MIL VENTITRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE $2.023.241.407,00 incluidos costos directos e indirectos, de los cuales $1.935.830.450,00 M/cte. corresponden a la obra, y $87.410.957 M/cte, corresponden a la interventoría.

Certificado Presupuestal No. 2695 de fecha 8 de noviembre del 2022, por valor de $ 303.486.211,00 y Registro Presupuestal No.6801 de 25 de noviembre de 2022, por valor de $ 303.486.211,00 y para la vigencia del año 2023 se expidió el Certificado Presupuestal No. 9 DE 2 DE ENERO DE 2023, por un valor de $ 1.719.755.196 y Registro Presupuestal No. 780 DE 23 DE FEBRERO DE 2023, por el valor de $ 303.486.211,00

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT. 800103935-6

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 2695
Fecha de Vencimiento 31/12/2022
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.022 **Fecha de Expedición:** 08 nov. 2022

Objeto: ;PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA. VIGENCIA 2022: $ 303.486.211,00 VIGENCIA 2023: $ 1.719.755.196,00 SEGUN LA ORDENANZA N° 011 DE 2022.

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.3.3.1.00
POLITICA PUBLICA:8121.0
DETALLE SECTORIAL: 0
Solicitante: 50882640-TOBIAS CARRASCAL CILIA JAQUELIN-SECRETARIA DE INFRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nación-Destinación Específica Sobretasa al ACPM	303.486.211,00
	TOTAL CERTIFICADO	303.486.211,00

DETALLE DE AUTORIZACION PARA LA VIGENCIA FUTURA

Autorización N° 011 del 31 de octubre de 2022
Vigencias Autorizadas 4
SEGUN ORDENANZA 011 DE 2022

		2.023	Total
03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles	1,719,755,196.00	1,719,755,196.00
Total		1,719,755,196.00	1,719,755,196.00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: ESMERALDAHERNANDEZ

Powered by CamScanner

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **6801**

Vigencia: 2022 **Fecha de Compromiso:** 25 de noviembre de 2022

Beneficiario MUNICIPIO DE_PLANETA RICA Nit: 800096765 - 1

No. C.D.P. : 2695 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 08 de noviembre de 2022 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Convenio: SI -036-2022 **Fecha:**24/11/2022 **Vence:** 31/12/2022

Objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE GOBERNACION DE CORDOBA Y EL MUNIICPIO DE PLANETA RICA PARA AUNAR ESFUERZO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA.
VIGENCIA 2022: $ 303.486.211,00
VIGENCIA 2023: $ 1.719.755.196,00 SEGUN LA ORDENANZA N° 011 DE 2022.
TIEMPO 8 MESES - APARADO VIGENCIA FUTURA SEGUN ORD 011 DEL 2022

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** MONTERIA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Sobretasa al ACPM **Clasificadores** 2402105-53211-1-1.2.3.2.11-8121.0-0 303.486.211,00	303.486.211,00
	Total Compromisos	$303.486.211,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Noviembre	$303.486.211,00
Valor Total Prog.	$303.486.211,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

285

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 9
Fecha de Vencimiento 31/12/2023
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.023 **Fecha de Expedición:** 02 ene. 2023

Objeto: PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.3.3.1.00.
POLITICA PUBLICA: 8121.0
DETALLE SECTORIAL: 0
Solicitante: 50882640-TOBIAS CARRASCAL CILIA JAQUELIN-SECRETARIA DE INFRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Sobretasa al ACPM	1.719.755.196,00
	TOTAL CERTIFICADO	1.719.755.196,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Registro No. 780

Vigencia: 2.023 **Fecha de Compromiso:** 23 de febrero de 2023

Beneficiario MUNICIPIO DE_PLANETA RICA **Nit:** 800096765 - 1

No. C.D.P. : 9 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 02 de enero de 2023 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Convenio: SI-036-2022 **Fecha:**23/02/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONTSRUCCION DE PAVIMIENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA CORDOBA - AUTORIZA VIGENCIA FUTURA - ORDENZNA 011-2022

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** MONTERIA

Identificación Presupuestal	Concepto		Valor
Gastos-Inversión			
03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nacion-Destinación Específica Sobretasa al ACPM **Clasificadores** 2402105-53211-1-1.2.3.2.11-8121.0-0	1.719.755.196,00	1.719.755.196,00
		Total Compromisos	$1.719.755.196,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Febrero	$1.719.755.196,00
Valor Total Prog.	$1.719.755.196,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

PCT Enterprise - Page 1 of 1 - RPC 780

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

4. DESCRIPCIÓN DEL ALACANCE DE LAS OBRAS A EJECUTARSE DENTRO DEL CONVENIO

Las obras que se describen a continuación se registran en el presente convenio.

- construcción de 762,73 ml de pavimento Rígido.

I	OBRAS PROVISIONALES, DE EXPLANACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE		
1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS, PISOS, CUNETAS, Y BORDILLOS DE CONCRETO.	M2	402,60
2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (BOX COULVERT)	UND	52,00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES. NO INCLUYE RETIRO	M3	2.420,16
4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEBIDAMENTE COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	976,29
II	AFIRMADOS Y SUBBASES		
5	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	976,29
III	TRANSPORTE DE MATERIALES		
6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 m) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3-KM	3.759,92
IV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		
7	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - MR-40 INLCUYE TODO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M3	915,28
8	ACERO LISO PARA DOVELAS DE TRANSFERENCIA DE CARGAS. INCLUYE INSTALACIÓN.	KG	6.435,92
9	ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA IRREGULARES, ACERO DE TRANSFERENCIA, CANASTILLAS Y BOX COULVERT	KG	14.728,44
10	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 20X50X80CM	ML	1.189,46
11	SARDINEL ACHAFLANADO FUNDIDO IN SITU, ESPECIAL PARA ACCESO VEHICULAR. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE GRANULAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	ML	264,00
12	REALCE DE CAMARA DE INSPECCION - INCLUYE TAPA	UND	6,00
V	OBRAS DE DRENAJE		
13	CONCRETO DE 28MPA (4000 PSI) PARA BOX COULVERT 2.0 m X 2.0 m	M3	108,00
VI	OBRAS DE SEÑALIZACION		
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE SEÑAL SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-01 X 60 CM DE LADO A UNA CARA Y CON PEDESTAL, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL EN ÁNGULO CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	16,00
VII	AJUSTES		
15	AJUSTES Y DISEÑOS	UND	1,00

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Todas estas actividades incluyen los elementos, maquinarias, materiales y mano de obra necesaria para su óptima ejecución. Estas actividades además se rigen por las especificaciones técnicas.

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISIÓN

La labor de la supervisión al convenio, desde el punto de vista administrativo, consistió en:

1. Mantener el expediente del convenio completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo.
2. Revisión de documentos de la etapa precontractual del convenio.
3. Coordinación de la suscripción de los contratos, revisión de garantías y proyección de documento de aprobación de las mismas.
4. Atención a correspondencia recibida.

5.1. GARANTÍAS DERIVADAS DEL CONVENIO

Para la ejecución del presente convenio no se exigirán garantías, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, que a la letra reza: "ARTÍCULO 7o. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. (...) **Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos**, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento".

5.2 ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO

El CONVENIO SI-036-2022, durante el periodo del presente informe, se encuentra como sigue:

1. El municipio suscribió el contrato de obra e interventoría para la ejecución del proyecto referenciado.
2. Se firmó acta de inicio del convenio con el municipio de planeta rica dándole inicio en la plataforma SECOP II.
3. El contratista actualizo póliza según el acta de inicio
4. La contratista suscribió acta de suspensión del contrato de obra e interventoría.

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO

6.1 FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:

- **UN PRIMER DESEMBOLSO** equivalente al **15%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de TRECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE **($ 303.486.211)**, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio, la suscripción del acta de inicio del convenio, y constancia de apertura de cuenta para el manejo de los recursos a financiar por parte del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Estos ingresarán en una cuenta de ahorros en una entidad financiera legalmente reconocida y será de titularidad del municipio suscribiente. Esta cuenta debe abrirse bajo la denominación del proyecto que se cofinancia. El municipio deberá utilizar los recursos cofinanciados por el Departamento exclusivamente en el objeto del convenio, de conformidad con los documentos previos que se consideran parte integral de esta relación jurídica obligacional. El municipio, deberá reintegrar al Departamento, los rendimientos financieros que los recursos depositados en la citada cuenta generen, lo que se efectuará una vez se proceda con la liquidación del convenio.
- **UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente al **25%** del valor del aporte de Departamento correspondiente a la suma de QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 505.810.351,75**), una vez el municipio haya celebrado los contratos de obra e interventoría derivados del presente convenio interadministrativo.
- **UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente al **50%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de MIL ONCE MILLONES SEICIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 1.011.620.703,5)**, por medio de acta parcial una vez superado el setenta por ciento (70%) de avance de obra.
- **UN DESEMBOLSO FINAL** equivalente al **10%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de DOCIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (**$ 202.324.140,7)**, sujeto al cumplimiento total y a cabalidad de las obligaciones pactadas en el convenio y una vez entregada y recibida la obra a satisfacción.

6.2 ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONVENIO

A la fecha del presente periodo la Gobernación de Córdoba ha realizado tres desembolsos discriminados de la siguiente un PRIMER desembolso equivalente al 15% por el valor de TRECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE **($ 303,486,211),** un SEGUNDO desembolso equivalente al 25% del valor del aporte de Departamento correspondiente a la suma de QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 505.810.351,75**), una vez se cumplieron los requisitos de celebrar los contratos de obra e interventoría derivados del presente convenio interadministrativo, **UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente al **50%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de MIL ONCE MILLONES SEICIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 1.011.620.703,5)**. Para un total del 90% de los recursos aportados por el departamento equivalente a $ 1.820.917.266,25

Acta de ejecución No.	Fecha	Orden de pago No.	Comp. Egreso No.	Valor Bruto para pagar	Desc. Realizados	Valor Neto recibido
Desembolso No.1	22/02/2023	21061	2792	$ 303.486.211	$0	$ 303.486.211
Desembolso No. 2	28/02/2023	2792	3801	$505.810.351,75	$0	$505.810.351,75
Desembolso No. 3	18/09/2023	11544	13003	$1.011.620.703,50	$0	$1.011.620.703,50

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO O ESTADO TÉCNICO DEL CONVENIO

- Los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos razón por la cual no se ejecutaron actividades en el presente periodo.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones al final del periodo de ejecución del CONVENIO SI-036-2022 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA" son las siguientes:

1. Se continua a la espera de la aprobación de la solicitud de adición y prorroga al convenio.

Presentado por:

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Supervisor

Elaboró: Sebastián Guerrero – Ing. Civil Externo – SID
Camilo Carmona – contratista SID

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- Los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos razón por la cual no se ejecutaron actividades en el periodo.

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 11

CONVENIO No. SI-036-2022

"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"

PERIODO: 01 de octubre al 31 de octubre del 2023.

Octubre de 2023

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 3
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO 4
3. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL CONVENIO 4
4. DESCRIPCIÓN DEL ALACANCE DE LAS OBRAS A EJECUTARSE DENTRO DEL CONVENIO 9
5. SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO 10
6. SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO 11
7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO O ESTADO TÉCNICO DEL CONVENIO 12
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 12

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto denominado **"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"** es concordante con el Plan de Desarrollo "Ahora le toca a Córdoba" 2020-2023 en el Eje Estratégico Estructural - 2: OPORTUNIDAD Y EMPRENDIMIENTO, en el cual se encuentra el Pilar estratégico transversal – 2.1: Desarrollo económico para el bienestar y la competitividad, Componente - 2.1.7: Infraestructura vial y segura para el desarrollo, Programa - 2.1.7.1: Infraestructura vial para el desarrollo y la competitividad, Subprograma- 2.1.7.1.1: Construcción, mantenimiento, rehabilitación, diseño de vías, cuya Meta de Producto es: Intervenir 10 km de vías urbanas.

Que el proyecto se encuentra inscrito en el Banco de proyectos del Municipio de planeta rica según consta en el certificado de inscripción en el Banco de proyectos, expedido por la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física del municipio y así mismo, se encuentran inscrito en el Banco de proyectos de la Gobernación de Córdoba con el número BPIN: 2022235550120, según consta en el certificado de inscripción en el Banco de proyectos del Departamento de Córdoba de fecha 28 de octubre de 2022 expedido por el Director del Departamento Administrativo del Planeación de Córdoba.

El proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA,** se ejecutará en la subregión Costanera, en el Municipio de PLANETA RICA.

Para la ejecución del proyecto y su alcance, se suscribió el convenio SI-036-2022 entre la gobernación de Córdoba y el municipio de Planeta Rica, siendo este último el encargado de contratar la obra e interventoría del proyecto en mención, así mismo el convenio será supervisado por la secretaria de Infraestructura del departamento de Córdoba.

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO

CONVENIO	SI-036-2022
CONVENIANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONVENIANTE	MUNICIPIO DE PLANETA RICA
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CERTIFICADO PRESUPUESTAL:	2695 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 9 DE 2 DE ENERO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	6801 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 780 DE 23 DE FEBRERO DE 2023
VALOR INICIAL:	DOS MIL VENTITRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($2.023.241.407,00 M/CTE.)
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES
VENCIMIENTO:	31 DE JULIO DE 2023
FECHA PRORROGA 1	24 DE JULIO DE 2023 (3 MESES)
FECHA PRORROGA 2	31 DE OCTUBRE DE 2023 (UN (01) MES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS)
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCIÓN

Tabla 2-1. Información básica contractual – Convenio.

3. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL CONVENIO

El valor del presente convenio es la suma de DOS MIL VENTITRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE $2.023.241.407,00 incluidos costos directos e indirectos, de los cuales $1.935.830.450,00 M/cte. corresponden a la obra, y $87.410.957 M/cte, corresponden a la interventoría.

Certificado Presupuestal No. 2695 de fecha 8 de noviembre del 2022, por valor de $ 303.486.211,00 y Registro Presupuestal No.6801 de 25 de noviembre de 2022, por valor de $ 303.486.211,00 y para la vigencia del año 2023 se expidió el Certificado Presupuestal No. 9 DE 2 DE ENERO DE 2023, por un valor de $ 1.719.755.196 y Registro Presupuestal No. 780 DE 23 DE FEBRERO DE 2023, por el valor de $ 303.486.211,00

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

GOBERNACION DE CORDOBA
NIT. 800103935-6

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 2695
Fecha de Vencimiento 31/12/2022
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.022 **Fecha de Expedición:** 08 nov. 2022

Objeto: ;PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA. VIGENCIA 2022: $ 303.486.211,00 VIGENCIA 2023: $ 1.719.755.196,00 SEGUN LA ORDENANZA N° 011 DE 2022.

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.3.3.1.00
POLITICA PUBLICA:8121.0
DETALLE SECTORIAL: 0
Solicitante: 50882640-TOBIAS CARRASCAL CILIA JAQUELIN-SECRETARIA DE INFRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recursos de la Nación-Destinación Específica Sobretasa al ACPM	303.486.211,00
	TOTAL CERTIFICADO	303.486.211,00

DETALLE DE AUTORIZACION PARA LA VIGENCIA FUTURA

Autorización N° 011 del 31 de octubre de 2022
Vigencias Autorizadas 4
SEGUN ORDENANZA 011 DE 2022

		2.023	Total
030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles	1,719,755,196.00	1,719,755,196.00
Total		1,719,755,196.00	1,719,755,196.00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: ESMERALDAHERNANDEZ

Powered by CamScanner

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 6801

Vigencia: 2022 **Fecha de Compromiso:** 25 de noviembre de 2022

Beneficiario MUNICIPIO DE_PLANETA RICA **Nit:** 800096765 - 1

No. C.D.P. : 2695 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 08 de noviembre de 2022 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Convenio: SI -036-2022 **Fecha:**24/11/2022 **Vence:** 31/12/2022

Objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE GOBERNACION DE CORDOBA Y EL MUNIICPIO DE PLANETA RICA PARA AUNAR ESFUERZO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA.
VIGENCIA 2022: $ 303.486.211,00
VIGENCIA 2023: $ 1.719.755.196,00 SEGUN LA ORDENANZA N° 011 DE 2022.
TIEMPO 8 MESES - APARADO VIGENCIA FUTURA SEGUN ORD 011 DEL 2022

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** MONTERIA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles **Recurso de la Nacion-Destinación Especifica** Sobretasa al ACPM **Clasificadores** 2402105-53211-1-1.2.3.2.11-8121.0-0 303.486.211,00	303.486.211,00
	Total Compromisos	$303.486.211,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Noviembre	$303.486.211,00
Valor Total Prog.	$303.486.211,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 9
Fecha de Vencimiento 31/12/2023
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.023 **Fecha de Expedición:** 02 ene. 2023

Objeto: PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.3.3.1.00
POLITICA PUBLICA: 8121.0
DETALLE SECTORIAL: 0
Solicitante: 50882640-TOBIAS CARRASCAL CILIA JAQUELIN-SECRETARIA DE INFRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Sobretasa al ACPM	1.719.755.196,00
	TOTAL CERTIFICADO	1.719.755.196,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 780

Vigencia: 2,023 **Fecha de Compromiso:**23 de febrero de 2023

Beneficiario MUNICIPIO DE_PLANETA RICA **Nit:** 800096765 - 1

No. C.D.P. : 9 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 02 de enero de 2023 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Convenio: SI-036-2022 **Fecha:**23/02/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONTSRUCCION DE PAVIMIENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA CORDOBA - AUTORIZA VIGENCIA FUTURA - ORDENZNA 011-2022

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** MONTERIA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Sobretasa al ACPM **Clasificadores** 2402105-53211-1-1.2.3.2.11-8121.0-0 1.719.755.196,00	1.719.755.196,00
	Total Compromisos	$1.719.755.196,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Febrero	$1.719.755.196,00
Valor Total Prog.	$1.719.755.196,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

PCT Enterprise - Page 1 of 1 - RPC 780

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

4. DESCRIPCIÓN DEL ALACANCE DE LAS OBRAS A EJECUTARSE DENTRO DEL CONVENIO

Las obras que se describen a continuación se registran en el presente convenio.

- construcción de 762,73 ml de pavimento Rígido.

I	OBRAS PROVISIONALES, DE EXPLANACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE		
1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS, PISOS, CUNETAS, Y BORDILLOS DE CONCRETO.	M2	402,60
2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (BOX COULVERT)	UND	52,00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES. NO INCLUYE RETIRO	M3	2.420,16
4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEBIDAMENTE COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	976,29
II	AFIRMADOS Y SUBBASES		
5	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	976,29
III	TRANSPORTE DE MATERIALES		
6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 m) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3-KM	3.759,92
IV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		
7	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - MR-40 INLCUYE TODO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M3	915,28
8	ACERO LISO PARA DOVELAS DE TRANSFERENCIA DE CARGAS. INCLUYE INSTALACIÓN.	KG	6.435,92
9	ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA IRREGULARES, ACERO DE TRANSFERENCIA, CANASTILLAS Y BOX COULVERT	KG	14.728,44
10	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 20X50X80CM	ML	1.189,46
11	SARDINEL ACHAFLANADO FUNDIDO IN SITU, ESPECIAL PARA ACCESO VEHICULAR. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE GRANULAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	ML	264,00
12	REALCE DE CAMARA DE INSPECCION - INCLUYE TAPA	UND	6,00
V	OBRAS DE DRENAJE		
13	CONCRETO DE 28MPA (4000 PSI) PARA BOX COULVERT 2.0 m X 2.0 m	M3	108,00
VI	OBRAS DE SEÑALIZACION		
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE SEÑAL SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-01 X 60 CM DE LADO A UNA CARA Y CON PEDESTAL, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL EN ÁNGULO CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	16,00
VII	AJUSTES		
15	AJUSTES Y DISEÑOS	UND	1,00

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Todas estas actividades incluyen los elementos, maquinarias, materiales y mano de obra necesaria para su óptima ejecución. Estas actividades además se rigen por las especificaciones técnicas.

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISIÓN

La labor de la supervisión al convenio, desde el punto de vista administrativo, consistió en:

1. Mantener el expediente del convenio completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo.
2. Revisión de documentos de la etapa precontractual del convenio.
3. Coordinación de la suscripción de los contratos, revisión de garantías y proyección de documento de aprobación de las mismas.
4. Atención a correspondencia recibida.

5.1. GARANTÍAS DERIVADAS DEL CONVENIO

Para la ejecución del presente convenio no se exigirán garantías, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, que a la letra reza: "ARTÍCULO 7o. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. (...) **Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos**, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento".

5.2 ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO

El CONVENIO SI-036-2022, durante el periodo del presente informe, se encuentra como sigue:

1. El municipio suscribió el contrato de obra e interventoría para la ejecución del proyecto referenciado.
2. Se firmó acta de inicio del convenio con el municipio de planeta rica dándole inicio en la plataforma SECOP II.
3. El contratista actualizo póliza según el acta de inicio
4. La contratista suscribió acta de suspensión del contrato de obra e interventoría.

301

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO

6.1 FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:

- **UN PRIMER DESEMBOLSO** equivalente al **15%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de TRECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE **($ 303.486.211)**, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio, la suscripción del acta de inicio del convenio, y constancia de apertura de cuenta para el manejo de los recursos a financiar por parte del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Estos ingresarán en una cuenta de ahorros en una entidad financiera legalmente reconocida y será de titularidad del municipio suscribiente. Esta cuenta debe abrirse bajo la denominación del proyecto que se cofinancia. El municipio deberá utilizar los recursos cofinanciados por el Departamento exclusivamente en el objeto del convenio, de conformidad con los documentos previos que se consideran parte integral de esta relación jurídica obligacional. El municipio, deberá reintegrar al Departamento, los rendimientos financieros que los recursos depositados en la citada cuenta generen, lo que se efectuará una vez se proceda con la liquidación del convenio.
- **UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente al **25%** del valor del aporte de Departamento correspondiente a la suma de QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 505.810.351,75**), una vez el municipio haya celebrado los contratos de obra e interventoría derivados del presente convenio interadministrativo.
- **UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente al **50%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de MIL ONCE MILLONES SEICIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 1.011.620.703,5)**, por medio de acta parcial una vez superado el setenta por ciento (70%) de avance de obra.
- **UN DESEMBOLSO FINAL** equivalente al **10%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de DOCIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (**$ 202.324.140,7)**, sujeto al cumplimiento total y a cabalidad de las obligaciones pactadas en el convenio y una vez entregada y recibida la obra a satisfacción.

6.2 ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONVENIO

A la fecha del presente periodo la Gobernación de Córdoba ha realizado tres desembolsos discriminados de la siguiente un PRIMER desembolso equivalente al 15% por el valor de TRECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE **($ 303,486,211),** un SEGUNDO desembolso equivalente al 25% del valor del aporte de Departamento correspondiente a la suma de QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 505.810.351,75**), una vez se cumplieron los requisitos de celebrar los contratos de obra e interventoría derivados del presente convenio interadministrativo, **UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente al **50%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de MIL ONCE MILLONES SEICIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 1.011.620.703,5)**. Para un total del 90% de los recursos aportados por el departamento equivalente a $ 1.820.917.266,25

Acta de ejecución No.	Fecha	Orden de pago No.	Comp. Egreso No.	Valor Bruto para pagar	Desc. Realizados	Valor Neto recibido
Desembolso No.1	22/02/2023	21061	2792	$ 303.486.211	$0	$ 303.486.211
Desembolso No. 2	28/02/2023	2792	3801	$505.810.351,75	$0	$505.810.351,75
Desembolso No. 3	18/09/2023	11544	13003	$1.011.620.703,50	$0	$1.011.620.703,50

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO O ESTADO TÉCNICO DEL CONVENIO

- Los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos razón por la cual no se ejecutaron actividades en el presente periodo.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones al final del periodo de ejecución del CONVENIO SI-036-2022 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA" son las siguientes:

- Se realizo prorroga No.2 por un tiempo de un mes y veintiséis días al tiempo de ejecución del convenio.

Presentado por:

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Supervisor

Elaboró: Sebastián Guerrero – Ing. Civil Externo – SID
Camilo Carmona – contratista SID

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- Los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos razón por la cual no se ejecutaron actividades en el periodo.

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 12

CONVENIO No. SI-036-2022

"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"

PERIODO: 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2023.

Noviembre de 2023

Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 3
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO 4
3. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL CONVENIO 5
4. DESCRIPCIÓN DEL ALACANCE DE LAS OBRAS A EJECUTARSE DENTRO DEL CONVENIO 12
5. SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO 13
6. SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO 14
7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO O ESTADO TÉCNICO DEL CONVENIO 15
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 17

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto denominado **"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"** es concordante con el Plan de Desarrollo "Ahora le toca a Córdoba" 2020-2023 en el Eje Estratégico Estructural - 2: OPORTUNIDAD Y EMPRENDIMIENTO, en el cual se encuentra el Pilar estratégico transversal – 2.1: Desarrollo económico para el bienestar y la competitividad, Componente - 2.1.7: Infraestructura vial y segura para el desarrollo, Programa - 2.1.7.1: Infraestructura vial para el desarrollo y la competitividad, Subprograma- 2.1.7.1.1: Construcción, mantenimiento, rehabilitación, diseño de vías, cuya Meta de Producto es: Intervenir 10 km de vías urbanas.

Que el proyecto se encuentra inscrito en el Banco de proyectos del Municipio de planeta rica según consta en el certificado de inscripción en el Banco de proyectos, expedido por la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física del municipio y así mismo, se encuentran inscrito en el Banco de proyectos de la Gobernación de Córdoba con el número BPIN: 2022235550120, según consta en el certificado de inscripción en el Banco de proyectos del Departamento de Córdoba de fecha 28 de octubre de 2022 expedido por el Director del Departamento Administrativo del Planeación de Córdoba.

El proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA,** se ejecutará en la subregión Costanera, en el Municipio de PLANETA RICA.

Para la ejecución del proyecto y su alcance, se suscribió el convenio SI-036-2022 entre la gobernación de Córdoba y el municipio de Planeta Rica, siendo este último el encargado de contratar la obra e interventoría del proyecto en mención, así mismo el convenio será supervisado por la secretaria de Infraestructura del departamento de Córdoba.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO

CONVENIO:	SI-036-2022
CONVENIANTE:	DEPARTAMENTO DE CORDOBA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
CONVENIANTE:	MUNICIPIO DE PLANETA RICA
OBJETO DEL CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	DOS MIL VENTITRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($2.023.241.407,00 M/CTE.)
ADICION No.1:	MIL NUEVE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($1.009.311.410) M/CTE CDP No.: 2488 de 14 de noviembre de 2023.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($3.263.948.312,00)
SUPERVISOR	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
PLAZO INCIAL DEL CONVENIO:	OCHO (08) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE FINALIZACION INICIAL DEL CONENIO *(según acta de inicio)*	31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA No.1:	TRES (03) MESES
PRORROGA No.2:	UN (01) MES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS
PRORROGA No.3:	UN (01) MES
FECHA DE FINALIZACION DEL CONVENIO: *(según acta final)*	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO FINAL DEL CONVENIO:*(según el acta final)*	DOCE (12) MESES Y VEINTISÉIS (29) DÍAS
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO	01 DE DICIEMBRE DE 2022 – 29 DE DICIEMBRE DE 2023
CEERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Departamento de Córdoba: CDP No. 2695 de fecha 8 de noviembre de 2022, CDP No.09 de fecha 02 de enero de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO	6801 del 25 de noviembre de 2022 – 780 de 23 de febrero de 2023 - 6264 de 20 de noviembre de 2023
AVANCE EJECUTADO	100%

Tabla 2-1. Información básica contractual – Convenio.

307

3. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL CONVENIO

El valor del presente convenio es la suma de DOS MIL VENTITRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE $2.023.241.407,00 incluidos costos directos e indirectos, de los cuales $1.935.830.450,00 M/cte. corresponden a la obra, y $87.410.957 M/cte, corresponden a la interventoría.

Certificado Presupuestal No. 2695 de fecha 8 de noviembre del 2022, por valor de $ 303.486.211,00 y Registro Presupuestal No.6801 de 25 de noviembre de 2022, por valor de $ 303.486.211,00 y para la vigencia del año 2023 se expidió el Certificado Presupuestal No. 9 DE 2 DE ENERO DE 2023, por un valor de $ 1.719.755.196 y Registro Presupuestal No. 780 DE 23 DE FEBRERO DE 2023, por el valor de $ 303.486.211,00

Adicción N°1:
Certificado Presupuestal No. 2488 de fecha 14 de noviembre del 2023, por valor de $ 1.009.311.410,00 Registro Presupuestal No.6264 de 20 de noviembre de 2023, por valor de $ 1.009.311.410,00

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 2695
Fecha de Vencimiento 31/12/2022
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.022 **Fecha de Expedición:** 08 nov. 2022

Objeto: ;PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA. VIGENCIA 2022: $ 303.486.211,00 VIGENCIA 2023: $ 1.719.755.196,00 SEGUN LA ORDENANZA N° 011 DE 2022.

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.3.3.1.00
POLITICA PUBLICA:8121.0
DETALLE SECTORIAL: 0
Solicitante: 50882640-TOBIAS CARRASCAL CILIA JAQUELIN-SECRETARIA DE INFRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nación-Destinación Específica Sobretasa al ACPM	303.486.211,00
	TOTAL CERTIFICADO	303.486.211,00

DETALLE DE AUTORIZACION PARA LA VIGENCIA FUTURA

Autorización N° 011 del 31 de octubre de 2022
Vigencias Autorizadas 4
SEGUN ORDENANZA 011 DE 2022

		2.023	Total
030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles	1,719,755,196.00	1,719,755,196.00
Total		1,719,755,196.00	1,719,755,196.00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: ESMERALDAHERNANDEZ

Powered by CamScanner

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Registro No. **6801**

Vigencia: 2022 **Fecha de Compromiso:** 25 de noviembre de 2022

Beneficiario MUNICIPIO DE_PLANETA RICA **Nit:** 800096765 - 1

No. C.D.P. : 2695 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 08 de noviembre de 2022 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Convenio: SI -036-2022 **Fecha:**24/11/2022 **Vence:** 31/12/2022

Objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE GOBERNACION DE CORDOBA Y EL MUNIICPIO DE PLANETA RICA PARA AUNAR ESFUERZO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA.
VIGENCIA 2022: $ 303.486.211,00
VIGENCIA 2023: $ 1.719.755.196,00 SEGUN LA ORDENANZA N° 011 DE 2022.
TIEMPO 8 MESES - APARADO VIGENCIA FUTURA SEGUN ORD 011 DEL 2022

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** MONTERIA

Identificación Presupuestal	Concepto		Valor
Gastos-Inversión			
03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nación-Destinación Específica Sobretasa al ACPM **Clasificadores** 2402105-53211-1-1.2.3.2.11-8121.0-0	303.486.211,00	303.486.211,00
		Total Compromisos	$303.486.211,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Noviembre	$303.486.211,00
Valor Total Prog.	$303.486.211,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 9
Fecha de Vencimiento 31/12/2023
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.023 **Fecha de Expedición:** 02 ene. 2023

Objeto: PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.3.3.1.00
POLITICA PUBLICA: 8121.0
DETALLE SECTORIAL: 0
Solicitante: 50882640-TOBIAS CARRASCAL CILIA JAQUELIN-SECRETARIA DE INFRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Sobretasa al ACPM	1.719.755.196,00
	TOTAL CERTIFICADO	1.719.755.196,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Registro No. 780

Vigencia: 2.023 **Fecha de Compromiso:** 23 de febrero de 2023

Beneficiario MUNICIPIO DE_PLANETA RICA **Nit:** 800096765 - 1

No. C.D.P. : 9 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 02 de enero de 2023 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Convenio: SI-036-2022 **Fecha:**23/02/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONTSRUCCION DE PAVIMIENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA CORDOBA - AUTORIZA VIGENCIA FUTURA - ORDENZNA 011-2022

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** MONTERIA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles **Recurso de la Nacion-Destinación Especifica** Sobretasa al ACPM **Clasificadores** 2402105-53211-1-1.2.3.2.11-8121.0-0 1.719.755.196,00	1.719.755.196,00
	Total Compromisos	$1.719.755.196,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Febrero	$1.719.755.196,00
Valor Total Prog.	$1.719.755.196,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

Gobernación de Córodoba NIT. 800103935-6
Palacio de Naín - Calle 27 No. 3 - 28 Montería - Córdoba PBX: + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 2488
Fecha de Vencimiento 31/12/2023
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.023 **Fecha de Expedición:** 14 nov. 2023

Objeto: PARA AMPARAR LA ADICION AL CONVENIO SI-036-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA.

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.2.3.2.11
POLITICA PUBLICA: 8121.0
DETALLE SECTORIAL: 0

Solicitante: 50882640-TOBIAS CARRASCAL CILIA JAQUELIN-SECRETARIA DE INFRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recursos de la Nación-Destinación Específica Sobretasa al ACPM	1.009.311.410,00
	TOTAL CERTIFICADO	1.009.311.410,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 6264

Vigencia: 2.023 **Fecha de Compromiso:** 20 de noviembre de 2023

Beneficiario MUNICIPIO DE_PLANETA RICA **Nit:** 800096765 - 1

No. C.D.P. : 2488 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 14 de noviembre de 2023 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Contrato de Obra

Adicion: SI-036-2022 **Fecha:** 31/10/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: ADICION AL CONVENIO SI-036-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA.

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.2.3.2.11
POLITICA PUBLICA: 8121.0
DETALLE SECTORIAL: 0

Cto.Utilidad : SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** MONTERIA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recursos de la Nación-Destinación Específica Sistema de ACPM **Clasificadores** 2402105-53211-215123585-1.2.3.2.11-8121.0.0 1.009.311.410,00	1.009.311.410,00
	Total Compromisos	$1.009.311.410,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Noviembre	$1.009.311.410,00
Valor Total Prog.	$1.009.311.410,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

4. DESCRIPCIÓN DEL ALACANCE DE LAS OBRAS A EJECUTARSE DENTRO DEL CONVENIO

Las obras que se describen a continuación se registran en el presente convenio.

- construcción de 762,73 ml de pavimento Rígido.

I	OBRAS PROVISIONALES, DE EXPLANACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE		
1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS, PISOS, CUNETAS, Y BORDILLOS DE CONCRETO.	M2	402,60
2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (BOX COULVERT)	UND	52,00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES. NO INCLUYE RETIRO	M3	2.420,16
4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEBIDAMENTE COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	976,29
II	AFIRMADOS Y SUBBASES		
5	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	976,29
III	TRANSPORTE DE MATERIALES		
6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 m) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3-KM	3.759,92
IV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		
7	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - MR-40 INLCUYE TODO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M3	915,28
8	ACERO LISO PARA DOVELAS DE TRANSFERENCIA DE CARGAS. INCLUYE INSTALACIÓN.	KG	6.435,92
9	ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA IRREGULARES, ACERO DE TRANSFERENCIA, CANASTILLAS Y BOX COULVERT	KG	14.728,44
10	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 20X50X80CM	ML	1.189,46
11	SARDINEL ACHAFLANADO FUNDIDO IN SITU, ESPECIAL PARA ACCESO VEHICULAR. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE GRANULAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	ML	264,00
12	REALCE DE CAMARA DE INSPECCION - INCLUYE TAPA	UND	6,00
V	OBRAS DE DRENAJE		
13	CONCRETO DE 28MPA (4000 PSI) PARA BOX COULVERT 2.0 m X 2.0 m	M3	108,00
VI	OBRAS DE SEÑALIZACION		
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE SEÑAL SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-01 X 60 CM DE LADO A UNA CARA Y CON PEDESTAL, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL EN ÁNGULO CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	16,00
VII	AJUSTES		
15	AJUSTES Y DISEÑOS	UND	1,00

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Todas estas actividades incluyen los elementos, maquinarias, materiales y mano de obra necesaria para su óptima ejecución. Estas actividades además se rigen por las especificaciones técnicas.

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISIÓN

La labor de la supervisión al convenio, desde el punto de vista administrativo, consistió en:

1. Mantener el expediente del convenio completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo.
2. Revisión de documentos de la etapa precontractual del convenio.
3. Coordinación de la suscripción de los contratos, revisión de garantías y proyección de documento de aprobación de las mismas.
4. Atención a correspondencia recibida.

5.1. GARANTÍAS DERIVADAS DEL CONVENIO

Para la ejecución del presente convenio no se exigirán garantías, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, que a la letra reza: "ARTÍCULO 7o. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. (...) **Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos**, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento".

5.2 ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO

El CONVENIO SI-036-2022, durante el periodo del presente informe, se encuentra como sigue:

1. El municipio suscribió el contrato de obra e interventoría para la ejecución del proyecto referenciado.
2. Se firmó acta de inicio del convenio con el municipio de planeta rica dándole inicio en la plataforma SECOP II.
3. El contratista actualizo póliza según el acta de inicio
4. La contratista suscribió acta de suspensión del contrato de obra e interventoría.
5. El contratista suscribió acta de reinicio del contrato de obra e interventoría.

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO

6.1 FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:

- **UN PRIMER DESEMBOLSO** equivalente al **15%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de TRECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE **($ 303.486.211)**, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio, la suscripción del acta de inicio del convenio, y constancia de apertura de cuenta para el manejo de los recursos a financiar por parte del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Estos ingresarán en una cuenta de ahorros en una entidad financiera legalmente reconocida y será de titularidad del municipio suscribiente. Esta cuenta debe abrirse bajo la denominación del proyecto que se cofinancia. El municipio deberá utilizar los recursos cofinanciados por el Departamento exclusivamente en el objeto del convenio, de conformidad con los documentos previos que se consideran parte integral de esta relación jurídica obligacional. El municipio, deberá reintegrar al Departamento, los rendimientos financieros que los recursos depositados en la citada cuenta generen, lo que se efectuará una vez se proceda con la liquidación del convenio.
- **UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente al **25%** del valor del aporte de Departamento correspondiente a la suma de QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 505.810.351,75**), una vez el municipio haya celebrado los contratos de obra e interventoría derivados del presente convenio interadministrativo.
- **UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente al **50%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de MIL ONCE MILLONES SEICIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 1.011.620.703,5)**, por medio de acta parcial una vez superado el setenta por ciento (70%) de avance de obra.
- **UN DESEMBOLSO FINAL** equivalente al **10%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de DOCIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (**$ 202.324.140,7)**, sujeto al cumplimiento total y a cabalidad de las obligaciones pactadas en el convenio y una vez entregada y recibida la obra a satisfacción.
- **UN DESEMBOLSO UNICO** Equivalente al 100% del valor de la adición por la suma de MIL NUEVE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($1.009.311.410), Los recursos equivalentes al 100% de la adición No.1, serán girados en un solo desembolso previa presentación de la cuenta de cobro por parte del municipio, una vez se suscriba y se perfeccione el ACTA DE ADICIÓN No.1.

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

6.2 ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONVENIO

A la fecha del presente periodo la Gobernación de Córdoba ha realizado tres desembolsos un PRIMER desembolso equivalente al 15% por el valor de TRECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE **($ 303,486,211),** un SEGUNDO desembolso equivalente al 25% del valor del aporte de Departamento correspondiente a la suma de QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 505.810.351,75**), una vez se cumplieron los requisitos de celebrar los contratos de obra e interventoría derivados del presente convenio interadministrativo, **UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente al **50%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de MIL ONCE MILLONES SEICIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 1.011.620.703,5)**. Para un total del 90% de los recursos aportados por el departamento equivalente a $ 1.820.917.266,25

Acta de ejecución No.	Fecha	Orden de pago No.	Comp. Egreso No.	Valor Bruto para pagar	Desc. Realizados	Valor Neto recibido
Desembolso No.1	22/02/2023	21061	2792	$ 303.486.211	$0	$ 303.486.211
Desembolso No. 2	28/02/2023	2792	3801	$505.810.351,75	$0	$505.810.351,75
Desembolso No. 3	18/09/2023	11544	13003	$1.011.620.703,50	$0	$1.011.620.703,50

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO O ESTADO TÉCNICO DEL CONVENIO

1. Se realizó la fundición de losas de concreto.
2. Relleno de material debidamente compactado
3. Instalación de subbase granular clase c
4. demolición de estructuras (box-coulvert)
5. Se realizó seguimiento a la programación de obra e implantación de señales frente de obras.
6. Instalación de acero de refuerzo para losas irregulares.
7. Instalación de bordillo prefabricado.
8. Excavación sin calificar de la explanación y canales de la calle 12a entre 10 y 10ª y la calle 12 entre carrera 10 y 11
9. Construcción de acometidas domiciliarias de acueducto y de todas las asesorías necesarias para su correcta instalación.

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones al final del periodo de ejecución del CONVENIO SI-036-2022 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA" son las siguientes:

- Se suscribió adicción No.1 y prorroga No.2 al convenio interadministrativo SI-036-2022.


Presentado por:


CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Supervisor


Elaboró: Sebastián Guerrero – Ing. Civil Externo – SID
Camilo Carmona – contratista SID


Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

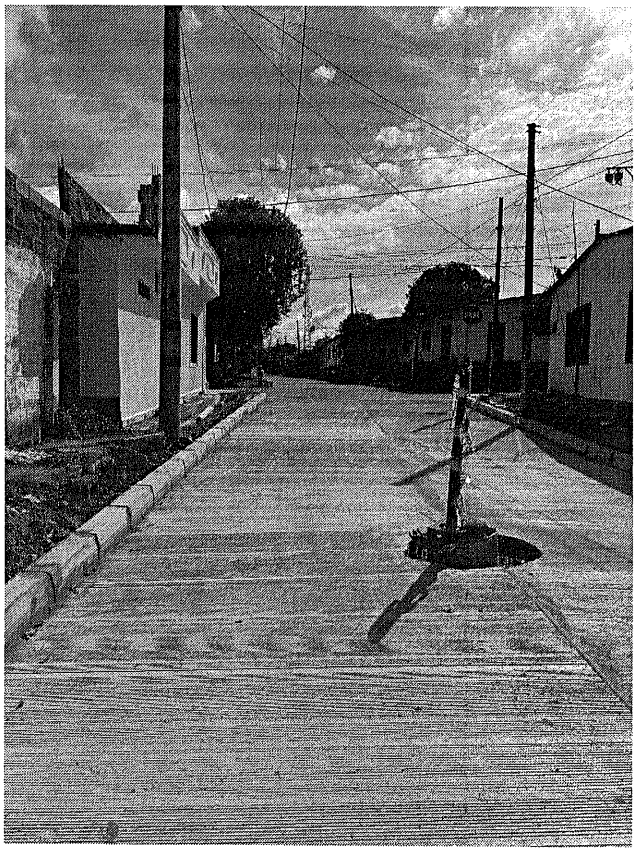


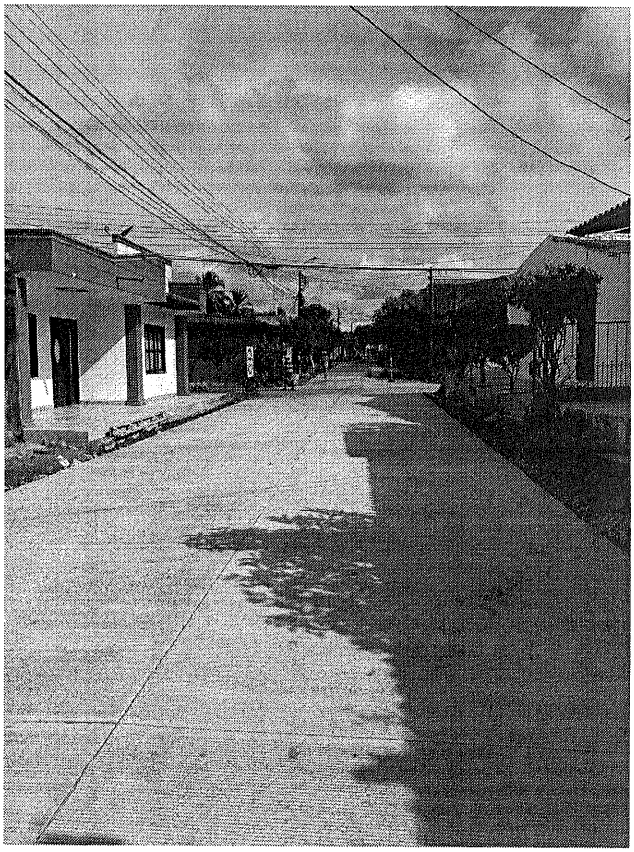


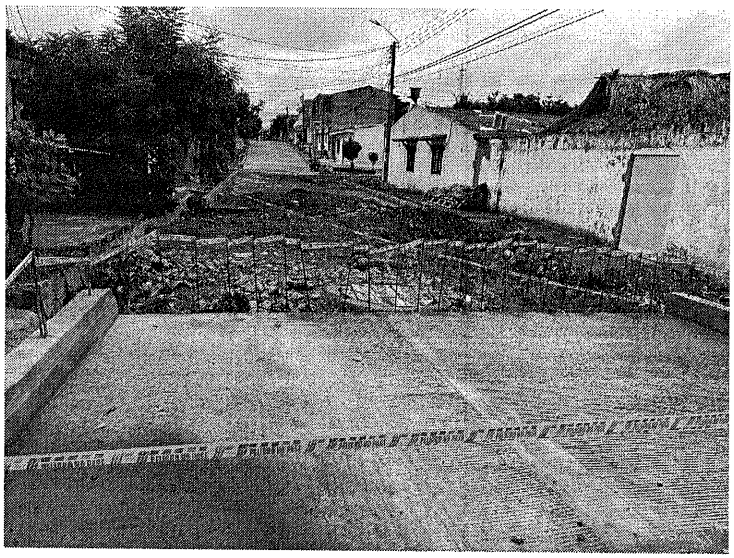


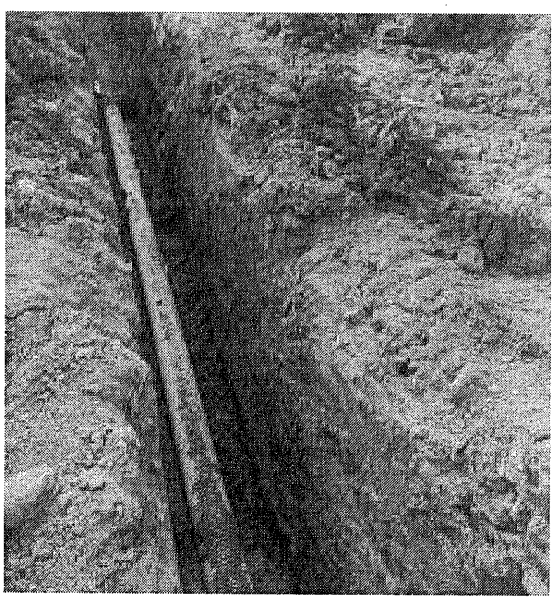


Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

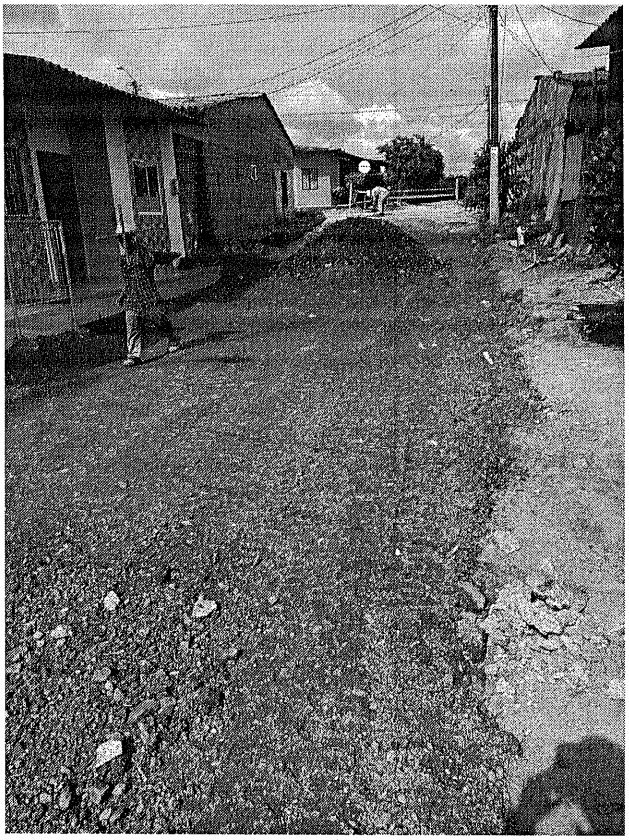

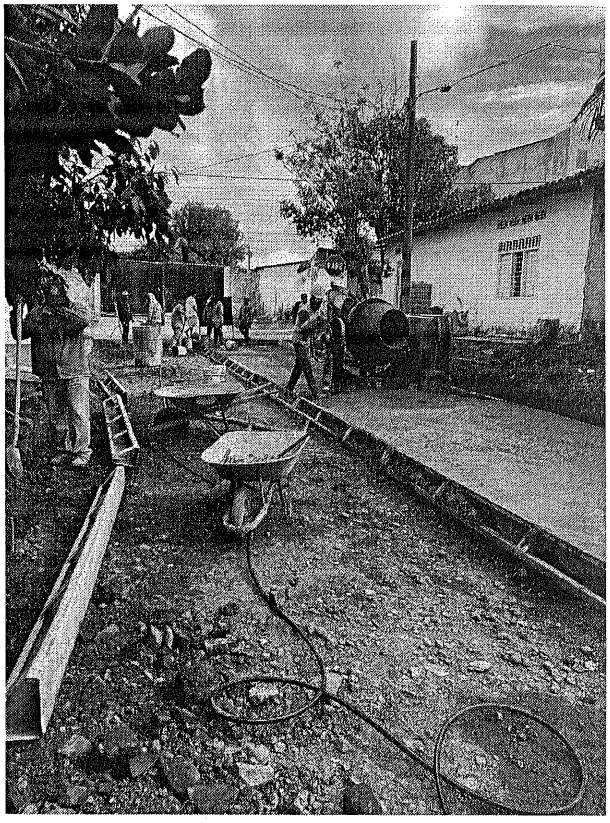

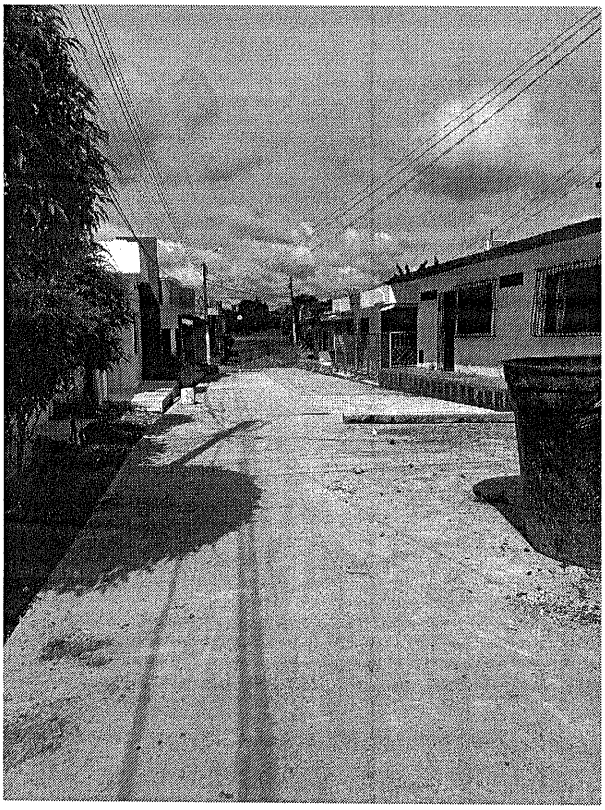

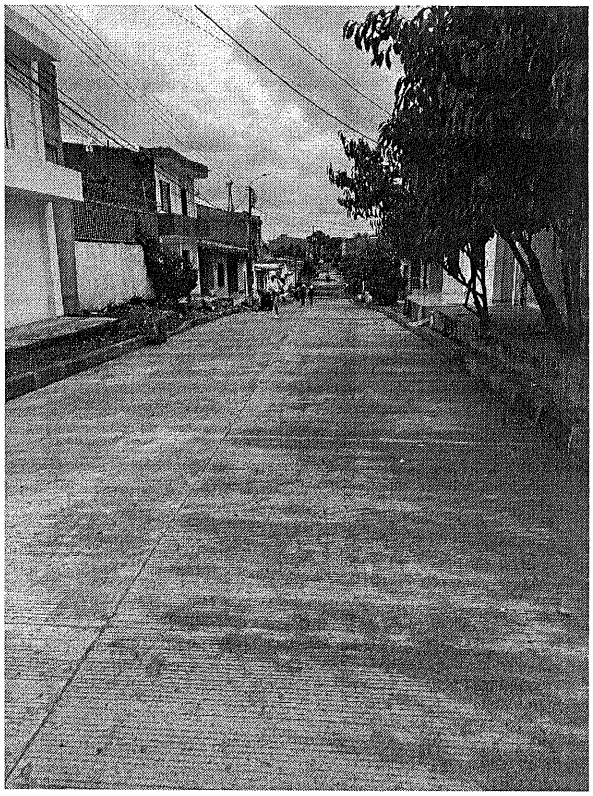


Gobernación de Córodoba NIT. 800103935-6
Palacio de Naín - Calle 27 No. 3 - 28 Montería - Córdoba PBX: + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

321

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 13

CONVENIO No. SI-036-2022

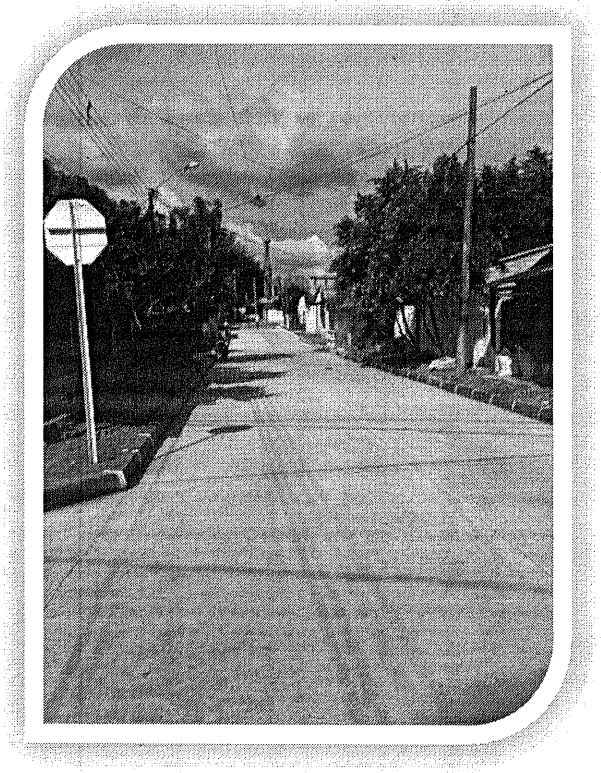

"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"

PERIODO: 01 de diciembre al 29 de diciembre del 2023.

Diciembre de 2023

Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 3
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO 4
3. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL CONVENIO 5
4. DESCRIPCIÓN DEL ALACANCE DE LAS OBRAS A EJECUTARSE DENTRO DEL CONVENIO 12
5. SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO 13
6. SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO 14
7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO O ESTADO TÉCNICO DEL CONVENIO 15
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 17

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto denominado **"AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA"** es concordante con el Plan de Desarrollo "Ahora le toca a Córdoba" 2020-2023 en el Eje Estratégico Estructural - 2: OPORTUNIDAD Y EMPRENDIMIENTO, en el cual se encuentra el Pilar estratégico transversal – 2.1: Desarrollo económico para el bienestar y la competitividad, Componente - 2.1.7: Infraestructura vial y segura para el desarrollo, Programa - 2.1.7.1: Infraestructura vial para el desarrollo y la competitividad, Subprograma- 2.1.7.1.1: Construcción, mantenimiento, rehabilitación, diseño de vías, cuya Meta de Producto es: Intervenir 10 km de vías urbanas.

Que el proyecto se encuentra inscrito en el Banco de proyectos del Municipio de planeta rica según consta en el certificado de inscripción en el Banco de proyectos, expedido por la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física del municipio y así mismo, se encuentran inscrito en el Banco de proyectos de la Gobernación de Córdoba con el número BPIN: 2022235550120, según consta en el certificado de inscripción en el Banco de proyectos del Departamento de Córdoba de fecha 28 de octubre de 2022 expedido por el Director del Departamento Administrativo del Planeación de Córdoba.

El proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA,** se ejecutará en la subregión Costanera, en el Municipio de PLANETA RICA.

Para la ejecución del proyecto y su alcance, se suscribió el convenio SI-036-2022 entre la gobernación de Córdoba y el municipio de Planeta Rica, siendo este último el encargado de contratar la obra e interventoría del proyecto en mención, así mismo el convenio será supervisado por la secretaria de Infraestructura del departamento de Córdoba.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO

CONVENIO:	SI-036-2022
CONVENIANTE:	DEPARTAMENTO DE CORDOBA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
CONVENIANTE:	MUNICIPIO DE PLANETA RICA
OBJETO DEL CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	DOS MIL VENTITRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($2.023.241.407,00 M/CTE.)
ADICION No.1:	MIL NUEVE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($1.009.311.410) M/CTE CDP No.: 2488 de 14 de noviembre de 2023.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($3.263.948.312,00)
SUPERVISOR	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
PLAZO INCIAL DEL CONVENIO:	OCHO (08) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE FINALIZACION INICIAL DEL CONENIO *(según acta de inicio)*	31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA No.1:	TRES (03) MESES
PRORROGA No.2:	UN (01) MES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS
PRORROGA No.3:	UN (01) MES
FECHA DE FINALIZACION DEL CONVENIO: *(según acta final)*	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO FINAL DEL CONVENIO:*(según el acta final)*	DOCE (12) MESES Y VEINTISÉIS (29) DÍAS
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO	01 DE DICIEMBRE DE 2022 – 29 DE DICIEMBRE DE 2023
CEERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Departamento de Córdoba: CDP No. 2695 de fecha 8 de noviembre de 2022, CDP No.09 de fecha 02 de enero de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO	6801 del 25 de noviembre de 2022 – 780 de 23 de febrero de 2023 - 6264 de 20 de noviembre de 2023
AVANCE EJECUTADO	100%

Tabla 2-1. Información básica contractual – Convenio.

3. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL CONVENIO

El valor del presente convenio es la suma de DOS MIL VENTITRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE $2.023.241.407,00 incluidos costos directos e indirectos, de los cuales $1.935.830.450,00 M/cte. corresponden a la obra, y $87.410.957 M/cte, corresponden a la interventoría.

Certificado Presupuestal No. 2695 de fecha 8 de noviembre del 2022, por valor de $ 303.486.211,00 y Registro Presupuestal No.6801 de 25 de noviembre de 2022, por valor de $ 303.486.211,00 y para la vigencia del año 2023 se expidió el Certificado Presupuestal No. 9 DE 2 DE ENERO DE 2023, por un valor de $ 1.719.755.196 y Registro Presupuestal No. 780 DE 23 DE FEBRERO DE 2023, por el valor de $ 303.486.211,00

Adicción No.1:
Certificado Presupuestal No. 2488 de fecha 14 de noviembre del 2023, por valor de $ 1.009.311.410,00 Registro Presupuestal No.6264 de 20 de noviembre de 2023, por valor de $ 1.009.311.410,00

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 2695
Fecha de Vencimiento 31/12/2022
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.022 **Fecha de Expedición:** 08 nov. 2022

Objeto: ;PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA. VIGENCIA 2022: $ 303.486.211,00 VIGENCIA 2023: $ 1.719.755.196,00 SEGUN LA ORDENANZA N° 011 DE 2022.

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.3.3.1.00
POLITICA PUBLICA:8121.0
DETALLE SECTORIAL: 0
Solicitante: 50882640-TOBIAS CARRASCAL CILIA JAQUELIN-SECRETARIA DE INFRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nación-Destinación Específica Sobretasa al ACPM	303.486.211,00
	TOTAL CERTIFICADO	303.486.211,00

DETALLE DE AUTORIZACION PARA LA VIGENCIA FUTURA

Autorización N° 011 del 31 de octubre de 2022
Vigencias Autorizadas 4
SEGUN ORDENANZA 011 DE 2022

		2.023	Total
03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles	1,719,755,196.00	1,719,755,196.00
Total		1,719,755,196.00	1,719,755,196.00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: ESMERALDAHERNANDEZ

Powered by CamScanner

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Registro No. **6801**

Vigencia: 2022 **Fecha de Compromiso:** 25 de noviembre de 2022

Beneficiario MUNICIPIO DE_PLANETA RICA **Nit:** 800096765 - 1

No. C.D.P. : 2695 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 08 de noviembre de 2022 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Convenio: SI -036-2022 **Fecha:**24/11/2022 **Vence:** 31/12/2022

Objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE GOBERNACION DE CORDOBA Y EL MUNIICPIO DE PLANETA RICA PARA AUNAR ESFUERZO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA.
VIGENCIA 2022: $ 303.486.211,00
VIGENCIA 2023: $ 1.719.755.196,00 SEGUN LA ORDENANZA N° 011 DE 2022.
TIEMPO 8 MESES - APARADO VIGENCIA FUTURA SEGUN ORD 011 DEL 2022

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** MONTERIA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
03030502 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Sobretasa al ACPM **Clasificadores** 2402105-53211-1-1.2.3.2.11-8121.0-0 303.486.211,00	303.486.211,00
	Total Compromisos	$303.486.211,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Noviembre	$303.486.211,00
Valor Total Prog.	$303.486.211,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 9
Fecha de Vencimiento 31/12/2023
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.023 **Fecha de Expedición:** 02 ene. 2023

Objeto: PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.3.3.1.00
POLITICA PUBLICA: 8121.0
DETALLE SECTORIAL: 0
Solicitante: 50882640-TOBIAS CARRASCAL CILIA JAQUELIN-SECRETARIA DE INFRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Sobretasa al ACPM	1.719.755.196,00
	TOTAL CERTIFICADO	1.719.755.196,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 780

Vigencia: 2.023 **Fecha de Compromiso:** 23 de febrero de 2023

Beneficiario MUNICIPIO DE_PLANETA RICA **Nit:** 800096765 - 1

No. C.D.P. : 9 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 02 de enero de 2023 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Convenio: SI-036-2022 **Fecha:**23/02/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: PARA AMPARAR EL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONTSRUCCION DE PAVIMIENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA CORDOBA - AUTORIZA VIGENCIA FUTURA - ORDENZNA 011-2022

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** MONTERIA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Sobretasa al ACPM Clasificadores 2402105-53211-1-1.2.3.2.11-8121.0-0 1.719.755.196,00	1.719.755.196,00
	Total Compromisos	$1.719.755.196,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Febrero	$1.719.755.196,00
Valor Total Prog.	$1.719.755.196,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

PCT Enterprise - Page 1 of 1 - RPC 780

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 2488
Fecha de Vencimiento 31/12/2023
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.023 **Fecha de Expedición:** 14 nov. 2023

Objeto: PARA AMPARAR LA ADICION AL CONVENIO SI-036-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA.

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.2.3.2.11
POLITICA PUBLICA: 8121.0
DETALLE SECTORIAL: 0

Solicitante: 50882640-TOBIAS CARRASCAL CILIA JAQUELIN-SECRETARIA DE INFRA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recursos de la Nación-Destinación Específica Sobretasa al ACPM	1.009.311.410,00
	TOTAL CERTIFICADO	1.009.311.410,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 6264

Vigencia: 2.023 **Fecha de Compromiso:** 20 de noviembre de 2023

Beneficiario MUNICIPIO DE_PLANETA RICA **Nit:** 800096765 - 1

No. C.D.P. : 2488 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 14 de noviembre de 2023 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Contrato de Obra

Adicion: SI-036-2022 **Fecha:**31/10/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: ADICION AL CONVENIO SI-036-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA.

UNIDAD: 03030502
CCPET: 2.3.2.01.01.001.03.02
FUENTE PCT: 23
CPC: 53211
PROGRAMATICO MGA: 2402105
CODIGO TERCERO: N/A
FUENTE DE FINANCIACION (CUIPO): 1.2.3.2.11
POLITICA PUBLICA: 81210
DETALLE SECTORIAL: 0

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** MONTERIA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02 - 23	Autopistas, carreteras, calles Recursos de la Nación-Destinación Específica Sobretasa al ACPM **Clasificadores** 2402105-53211-2155833556-1.2.3.2.11-81210-0 1.009.311.410,00	1.009.311.410,00
	Total Compromisos	$1.009.311.410,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Noviembre	$1.009.311.410,00
Valor Total Prog.	$1.009.311.410,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

4. DESCRIPCIÓN DEL ALACANCE DE LAS OBRAS A EJECUTARSE DENTRO DEL CONVENIO

Las obras que se describen a continuación se registran en el presente convenio.

- construcción de 762,73 ml de pavimento Rígido.

I	OBRAS PROVISIONALES, DE EXPLANACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE		
1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS, PISOS, CUNETAS, Y BORDILLOS DE CONCRETO.	M2	402,60
2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (BOX COULVERT)	UND	52,00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES. NO INCLUYE RETIRO	M3	2.420,16
4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEBIDAMENTE COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	976,29
II	AFIRMADOS Y SUBBASES		
5	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	976,29
III	TRANSPORTE DE MATERIALES		
6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 m) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3-KM	3.759,92
IV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		
7	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - MR-40 INLCUYE TODO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M3	915,28
8	ACERO LISO PARA DOVELAS DE TRANSFERENCIA DE CARGAS. INCLUYE INSTALACIÓN.	KG	6.435,92
9	ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA IRREGULARES, ACERO DE TRANSFERENCIA, CANASTILLAS Y BOX COULVERT	KG	14.728,44
10	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 20X50X80CM	ML	1.189,46
11	SARDINEL ACHAFLANADO FUNDIDO IN SITU, ESPECIAL PARA ACCESO VEHICULAR. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE GRANULAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	ML	264,00
12	REALCE DE CAMARA DE INSPECCION - INCLUYE TAPA	UND	6,00
V	OBRAS DE DRENAJE		
13	CONCRETO DE 28MPA (4000 PSI) PARA BOX COULVERT 2.0 m X 2.0 m	M3	108,00
VI	OBRAS DE SEÑALIZACION		
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE SEÑAL SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-01 X 60 CM DE LADO A UNA CARA Y CON PEDESTAL, MATERIAL REFLECTIVO TIPO XI, PELÍCULA ANTIGRAFFITI, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 E=1,5 MM, PEDESTAL EN ÁNGULO CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UN	16,00
VII	AJUSTES		
15	AJUSTES Y DISEÑOS	UND	1,00

Todas estas actividades incluyen los elementos, maquinarias, materiales y mano de obra necesaria para su óptima ejecución. Estas actividades además se rigen por las especificaciones técnicas.

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISIÓN

La labor de la supervisión al convenio, desde el punto de vista administrativo, consistió en:

1. Mantener el expediente del convenio completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo.
2. Revisión de documentos de la etapa precontractual del convenio.
3. Coordinación de la suscripción de los contratos, revisión de garantías y proyección de documento de aprobación de las mismas.
4. Atención a correspondencia recibida.

5.1. GARANTÍAS DERIVADAS DEL CONVENIO

Para la ejecución del presente convenio no se exigirán garantías, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, que a la letra reza: "ARTÍCULO 7o. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. (...) **Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos**, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento".

5.2 ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO

El CONVENIO SI-036-2022, durante el periodo del presente informe, se encuentra como sigue:

1. El municipio suscribió el contrato de obra e interventoría para la ejecución del proyecto referenciado.
2. Se firmó acta de inicio del convenio con el municipio de planeta rica dándole inicio en la plataforma SECOP II.
3. El contratista actualizo póliza según el acta de inicio
4. La contratista suscribió acta de suspensión del contrato de obra e interventoría.
5. El contratista suscribió acta de reinicio del contrato de obra e interventoría.
6. Se suscribe acta de recibo final de obra e interventoría con fecha de 26 de diciembre de 2023

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO

6.1 FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:

- **UN PRIMER DESEMBOLSO** equivalente al **15%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de TRECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE **($ 303.486.211)**, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio, la suscripción del acta de inicio del convenio, y constancia de apertura de cuenta para el manejo de los recursos a financiar por parte del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Estos ingresarán en una cuenta de ahorros en una entidad financiera legalmente reconocida y será de titularidad del municipio suscribiente. Esta cuenta debe abrirse bajo la denominación del proyecto que se cofinancia. El municipio deberá utilizar los recursos cofinanciados por el Departamento exclusivamente en el objeto del convenio, de conformidad con los documentos previos que se consideran parte integral de esta relación jurídica obligacional. El municipio, deberá reintegrar al Departamento, los rendimientos financieros que los recursos depositados en la citada cuenta generen, lo que se efectuará una vez se proceda con la liquidación del convenio.
- **UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente al **25%** del valor del aporte de Departamento correspondiente a la suma de QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 505.810.351,75**), una vez el municipio haya celebrado los contratos de obra e interventoría derivados del presente convenio interadministrativo.
- **UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente al **50%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de MIL ONCE MILLONES SEICIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 1.011.620.703,5)**, por medio de acta parcial una vez superado el setenta por ciento (70%) de avance de obra.
- **UN DESEMBOLSO FINAL** equivalente al **10%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de DOCIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (**$ 202.324.140,7)**, sujeto al cumplimiento total y a cabalidad de las obligaciones pactadas en el convenio y una vez entregada y recibida la obra a satisfacción.
- **UN DESEMBOLSO UNICO** Equivalente al 100% del valor de la adición por la suma de MIL NUEVE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($1.009.311.410), Los recursos equivalentes al 100% de la adición No.1, serán girados en un solo desembolso previa presentación de la cuenta de cobro por parte del municipio, una vez se suscriba y se perfeccione el ACTA DE ADICIÓN No.1.

6.2 ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONVENIO

A la fecha del presente periodo la Gobernación de Córdoba ha realizado tres desembolsos un PRIMER desembolso equivalente al 15% por el valor de TRECIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE **($ 303,486,211),** un SEGUNDO desembolso equivalente al 25% del valor del aporte de Departamento correspondiente a la suma de QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 505.810.351,75**), una vez se cumplieron los requisitos de celebrar los contratos de obra e interventoría derivados del presente convenio interadministrativo, **UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente al **50%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de MIL ONCE MILLONES SEICIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 1.011.620.703,5)**. Para un total del 90% de los recursos aportados por el departamento equivalente a $ 1.820.917.266,25 a su vez se realizó el **DESEMBOLSO DEL 100% DE LA ADICIÓN** por un valor de MIL NUEVE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($1.009.311.410)

Acta de ejecución No.	Fecha	Orden de pago No.	Comp. Egreso No.	Valor Bruto para pagar	Desc. Realizados	Valor Neto recibido
Desembolso No.1	22/02/2023	21061	2792	$ 303.486.211	$0	$ 303.486.211
Desembolso No. 2	28/02/2023	2792	3801	$505.810.351,75	$0	$505.810.351,75
Desembolso No. 3	18/09/2023	11544	13003	$1.011.620.703,50	$0	$1.011.620.703,50
Desembolso adicional	04/12/2023	16626	18106	$ 1.009.311.410	$0	$ 1.009.311.410

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO O ESTADO TÉCNICO DEL CONVENIO

1. suministro e instalación, de señal vertical reglamentaria sr-01 x 60 cm
2. Relleno de material debidamente compactado
3. instalación de baranda metálica para box coulvert
4. enrocados de protección para canales a entrada y salida de boxculverts
5. Se realizó fundición de losas de pavimento.
6. Instalación de acero de refuerzo para losas irregulares.
7. Instalación de bordillo prefabricado.
8. Excavación sin calificar de la explanación y canales de la calle 12a entre 10 y 10ª y la calle 12 entre carrera 10 y 11

9. Suministro e instalación de PVC UM PVC D=20 MM y tubería PVC UM PVC D=254 mm e instalación de tubería acueducto de 3" en OVC RDE 32.5.
10. Construcción de acometidas domiciliarias de acueducto y de todas las asesorías necesarias para su correcta instalación.
11. realce de cámara de inspección - incluye tapa

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones al final del periodo de ejecución del CONVENIO SI-036-2022 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA" son las siguientes:

- El municipio de Planeta Rica suscribió acta de recibo final de obra e interventoría.
- El municipio de Planeta Rica suscribió las respectivas actas de liquidación del contrato de obra e interventoría.
- Se realizo acta final del convenio SI-036-2022.
- El municipio se encuentra realizando los trámites para la liquidación del convenio y **DESEMBOLSO FINAL** equivalente al **10%** del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de DOCIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (**$ 202.324.140)**

Presentado por:

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Supervisor

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

