ENTREGA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OBTENIDOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8212249

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar adecuaciones integrales a todo costo para la infraestructura de la sede "Ciudad Verde" del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, incluyendo suministro de materiales, mano de obra y servicios técnicos especializados.
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGH–C&C–SEIPRODEG CIUDAD VERDE
INTERVENTOR	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
SUPERVISOR	EDWARD FABIAN MEDINA BARAJAS
LUGAR DE EJECUCION	SOACHA - CUNDINAMARCA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	03/09/2025
FECHA PRESENTE ACTA	25 NOV. 2025

El interventor JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ en desarrollo de sus actividades y en coordinación con el proveedor CONSORCIO AGH–C&C–SEIPRODEG CIUDAD VERDE, hace constar la entrega de los siguientes ítems y/o productos para el proyecto denominado ·Realizar adecuaciones integrales a todo costo para la infraestructura de la sede "Ciudad Verde" del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, incluyendo suministro de materiales, mano de obra y servicios técnicos especializados.

A continuación, se enuncian los ítems y/o materiales entregados:

ITEM No.	4.6
NOMBRE DEL ITEM:	DIVISIÓN METÁLICA TIPO TRIÁNGULO RECTÁNGULO PARA PATIO DE BIBLIOTECA

Pruebas y verificaciones:

Prueba requerida	Descripción / Criterio técnico	Cumple (Sí/No)	Observaciones
Verificación de dimensional y de acabados	Verificación mediante inspección visual de los acabados	Si	
Pruebas de líquidos penetrantes	Ensayo a las soldaduras de la estructura metálica	N/A.	Estructura arquitectónica y no estructural

Entregables:

Entregable	Requisito	Recibido (Sí/No)	Observaciones
Certificados de calidad de los materiales	Fichas técnicas y certificados de calidad	Si	
Registro fotográfico	Antes / durante / después	Si	
Informe de pruebas	Pruebas de calidad y verificación.	NA	

Concepto de Aceptación:

X	Se recibe a satisfacción.
	Se reciben con observaciones.
	No se recibe.

Observaciones Generales:

Para constancia se Soacha, a los 25 días del mes de NOV del año 2025

QUIEN ENTREGA:

FIRMA
Nombre: Andres felipe Peña
C.C.: 1032440701
Representa a: Consorcio
Cargo: Director Proyecto
Teléfono: 3192240608

QUIEN RECIBE:

FIRMA
Nombre: Jorge E. Monjè Mahecha
C.C.: 12.118.770
Representa a: Interventoría
Cargo: ingeniero Residente
Teléfono: 321 435 6528

CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE
NIT 901980651-7

INFORME DE VERIFICACIÓN FINAL POCETA CUARTO DE RESIDUOS SOLIDOS
CIDE - SENA CIUDAD VERDE

CONTRATO CO1.PCCNTR.8212249 – 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO AGH-C&C-SEIPRODEG CIUDAD VERDE
NIT: 901.980.651-7

14 DE NOVIEMBRE
2025

Dir: Calle 4 No. 20a-06 Valledupar – Cesar, Tel. 3158823687 - / email: alenrope@hotmail.com
Dir: cl 33 No 34-74 torre 1 apto 502 Soacha - email: consorcio.cide.2025@gmail.com

CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE
NIT 901980651-7

CONTENIDO

1. **OBJETIVO..... 3**
2. **ALCANCE..... 3**
3. **PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS..... 3**
4. **RESULTADOS..... 4**
5. **CONCLUSIONES..... 4**
6. **REGISTRO FOTOGRÁFICO.....5**

CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE

1. OBJETIVO

Comprobar que las especificaciones de calidad de la construcción del ítem “División Metálica Tipo Triángulo Rectángulo para Patio de Biblioteca” cumple con las especificaciones del anexo técnico del contrato, asegurando la calidad de la ejecución en cuanto a dimensiones, materiales, integridad estructural y terminados.

2. ALCANCE

Este informe establece los controles de dimensiones, materiales, integridad estructural y terminados junto con su medición y verificación para generar resultados que puedan ser evaluados y aprobados por la interventoría.

3. PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS

3.1. **Diseño y Fabricación**: Inspección de dimensiones de la división en conjunto, y del tubo metálico de con respecto a la especificación técnica.

3.2. **Instalación y Anclaje**: Verificación de la estabilidad y alineación de la estructura, integridad de los anclajes y seguridad de las soldaduras (según la norma técnica para este tipo espesores de tubo metálico no se realizan pruebas de líquidos penetrantes ya que la soldadura que se hace es puntual y no de cordón, por lo que una prueba de este tipo no aplica para esta estructura) adicionalmente este elemento es de tipo arquitectónico y no está diseñado para soportar carga..

4. RESULTADOS

Prueba	Descripción de la prueba	Resultado	Cumple / No Cumple
Diseño y Fabricación	Inspección de dimensiones de la división y del tubo metálico.	Se evidencia que cumple con las especificaciones técnicas	Cumple
Instalación y Anclaje	Se realiz inspección de los anclajes a la estructura existente y solides de los tubos.	Se evidencia anclajes fuertes que no presentan movimientos y estructura monolítica.	Cumple


5. CONCLUSIONES


- El ítem cumple rigurosamente con las Especificaciones Técnicas definidas. La verificación dimensional y geométrica confirma la forma de triángulo rectángulo según el diseño arquitectónico. El sistema de anclaje asegura la estabilidad estructural requerida.

- Los ensayos no destructivos no fueron realizados por la naturaleza del ítem de uso arquitectónico, adicionalmente el tubo del que está fabricado no puede ser soldado de manera apropiada para realizar una prueba de esta índole.


6. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Diseño y Fabricación

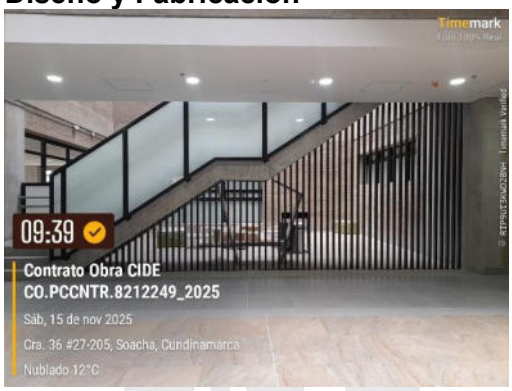

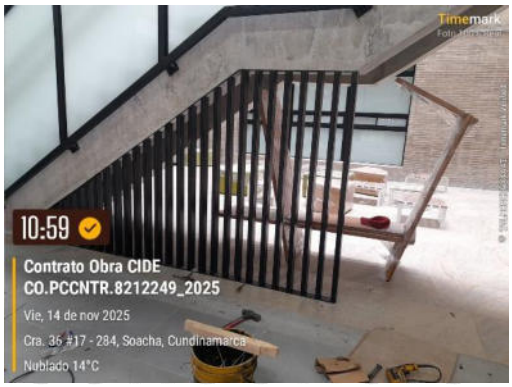

Instalación y Anclaje

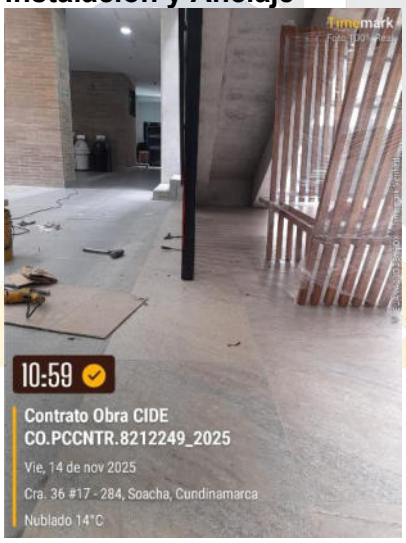

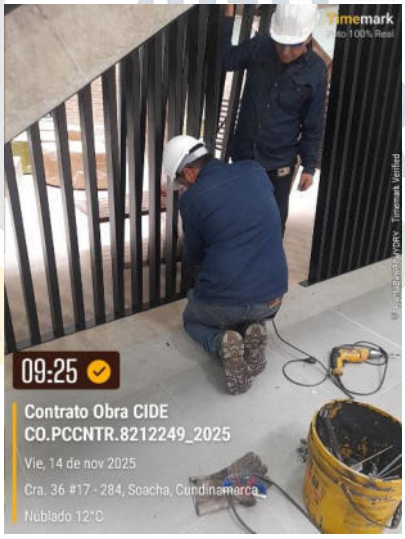

FICHAS TÉCNICAS MATERIALES USADOS

CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE
NIT 901980651-7

arme
NIT: 890.802.586-5

CERTIFICADO

N° REGISTRO
F-1313647

N.I.T.
830053137

Cliente
PERFIMETALES Y LAMINAS LTDA

ESPECIFICACIONES DE BOBINA MADRE

# Lote	% Cx100	% Mnx100	% Px1000	% Sx1000
KR-HTS0167501-03185	12.91	9.10	10.50	7.10

TIPO C (SS GR50) - TUB EST CUAD GR C - OTROS

UND TUBO EST CUAD 2,50 X 100 X 100 X 6000 MM NTC 4526 GR C

# Lote	Fecha Fabricación	Lado A (mm)	Lado B (mm)	Longitud (mm)	Elongación (%)
KR-B201461	28/8/2025	100.25	100.00	6010.00	25.58

Punto de fluencia (MPa)	Resistencia ultima (MPa)
420.22	511.52

# Lote	Fecha Fabricación	Lado A (mm)	Lado B (mm)	Longitud (mm)	Elongación (%)
KR-B201462	28/8/2025	100.25	100.00	6010.00	25.58

Punto de fluencia (MPa)	Resistencia ultima (MPa)
420.22	511.52

# Lote	Fecha Fabricación	Lado A (mm)	Lado B (mm)	Longitud (mm)	Elongación (%)
KR-B201463	28/8/2025	100.25	100.00	6010.00	25.58

Punto de fluencia (MPa)	Resistencia ultima (MPa)
420.22	511.52

OBSERVACIONES

*Los datos del presente certificado de calidad, han sido revisados por el área de calidad.
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
***No se debe reproducir información parcial del certificado de calidad, excepto, si se hace en su totalidad, con la aprobación escrita del laboratorio emisor.


AUTORIZA: Mariana López Rojas - Jefe de Calidad


Mariana López R.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE
NIT 901980651-7

4.6 DIVISIÓN METÁLICA TIPO TRIÁNGULO RECTANGULO PARA PATIO DE BIBLIOTECA (Registro Fotográfico)

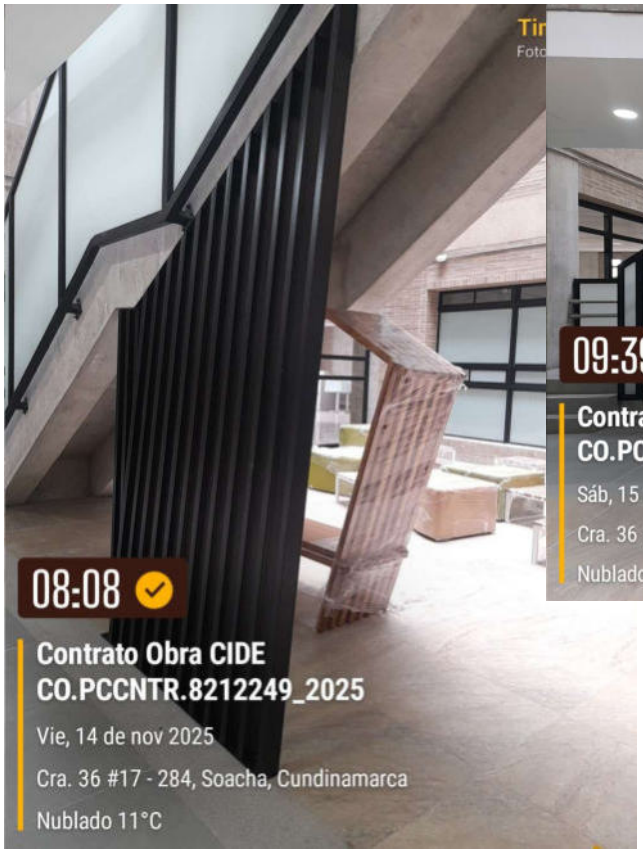

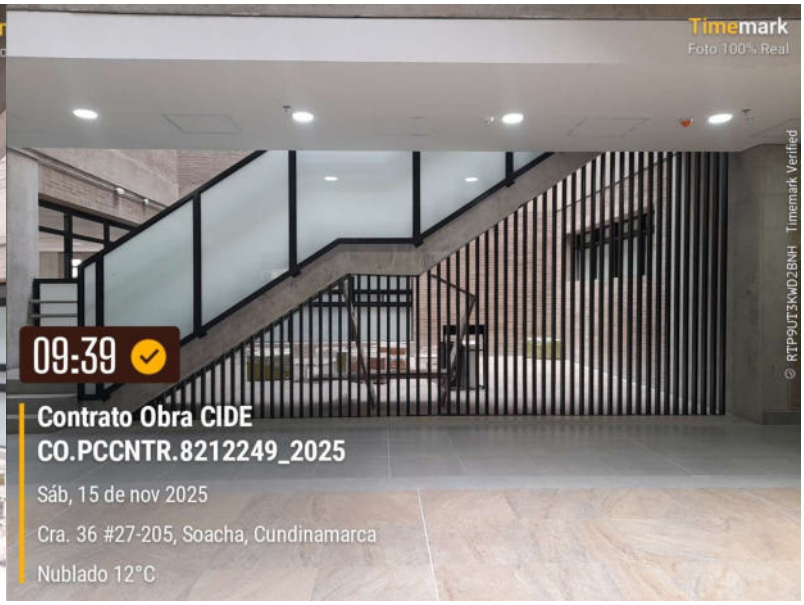

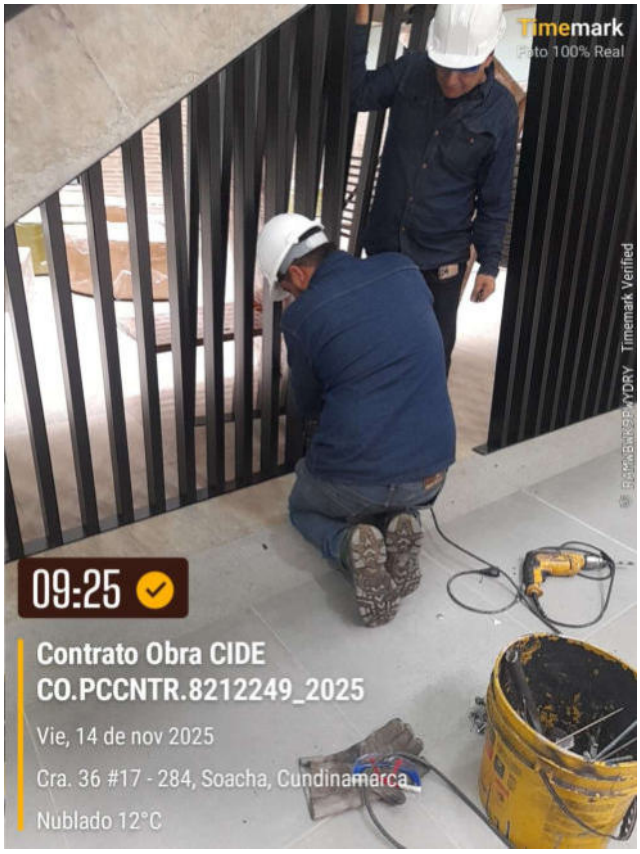

CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE
NIT 901980651-7
