INFORME DE OBRA No 11

CONTRATO DE OBRA No. 015 DE 2024:

OBJETO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

PERIODO DE SEGUIMIENTO: 1/12/2025 AL 10/12/2025

FECHA DEL INFORME: 10/12/2025

CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO VG

DICIEMBRE DE 2025

Dirección: CARRERA 7 No. 4-34
Correo Electrónico: claudiomejiag@gmail.com
Neiva – Huila

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 4
2. ASPECTO TÉCNICO. 6
2.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
2.2. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA 7
3. RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO 14
4. ASPECTO ADMINISTRATIVO 16
4.1. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. 16
5. SEGURIDAD SOCIAL 17
6. MEMORIA DIARIA O BITACORA 17
7. REGISTRO FOTOGRAFICO 17
8. ASPECTO JURÍDICO 18
8.1. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 18
8.2. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 19
9. ENSAYOS DE LABORATORIO 24
10. ESTUDIOS Y DISEÑOS 24
11. COMITES DE OBRA 26
12. CORRESPONDENCIA 26
13. CALIBRACION DE EQUIPOS 26
14. CARTERAS TOPOGRAFICAS 26
15. CONCLUSIONES 27

Dirección: CARRERA 7 No. 4-34
Correo Electrónico: claudiomejiag@gmail.com
Neiva – Huila

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Municipios a intervenir: 5
Tabla 2. Valor inicial del contrato de obra 5
Tabla 3 Control de programación y avance de obra. 8
Tabla 4. Control de inversión ejecutado 14
Tabla 5. Tabla pluviométrica 17
Tabla 6. Gráfica de precipitación 22
Tabla 7. Maquinaria mínima requerida 27
Tabla 8. Personal Técnico requerido 27
Tabla 9. Condiciones contrato de obra 29

ANEXOS

Anexo 1 Registro Fotográfico
Anexo 2 Programación
Anexo 3 Bitacora de Obra
Anexo 4 Comités de Obra
Anexo 5 Control Personal Obra
Anexo 6 Informe SST
Anexo 7 Correspondencia
Anexo 8 Calibración de equipos
Anexo 9 Laboratorios
Anexo 10 Cartera topográfica

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto a ejecutar se encuentra en el norte del Departamento del Huila partiendo de la ciudad de Neiva por la vía departamental cuyo código es 45 A01, en una longitud de 9.2km aproximadamente desde el inicio del primer tramo hasta el final del último tramo, el cual se encuentra el municipio de Tello, Departamento del Huila.

Esta vía actualmente cuenta con pavimento flexible, el cual presenta deterioro en su estructura, identificando veinticinco (25) tramos críticos para ser intervenidos y cuya rehabilitación es el objeto del presente contrato.



Via Fortalecillas - Tello

El proyecto a desarrollar corresponde a la vía Fortalecillas- Tello, según la resolución 4611 de 2019 expedida por el Ministerio de Transporte y comprende la construcción de 5,34 km de pavimento flexible distribuidos en 25 tramos, donde se incluye el fresado de pavimento asfáltico, conformación de calzada, construcción de estructura de pavimento en base y sub base granular, mezcla densa en caliente MDC-19, riego de imprimación, construcción de filtros, fundición cunetas, muros en gaviones y líneas de demarcación para la señalización horizontal.

De acuerdo al anexo técnico del contrato de obra 015 de 2024 los tramos están comprendidos en las siguientes coordenadas así:

TRAMO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	LONGITUD POR TRAMO (mts)	VIA	COORDENADA INICIO	COORDENADA FINAL
1	TELLO	VEREDA CUCHARITO	21,78	VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN COD 45A01 NEIVA SAN ANTONIO	E: 8708117.813 N: 829114.321	E: 870834.389 N: 829128.151
2		VEREDA CUCHARITO	193		E: 872465.259 N: 830243.272	E: 872626.413 N: 830349.328
3		VEREDA CUCHARITO	91,52		E: 872911.689 N: 830480.790	E: 872994.247 N: 830520.292
4		VEREDA CUCHARITO	74,7		E: 873014.910 N: 830529.547	E: 873080.364 N: 830565.457
5		VEREDA CUCHARITO	78		E: 873288.448 N: 830691.417	E: 873355.103 N: 830731.927
6		VEREDA CUCHARITO	66		E: 873549.081 N: 830870.461	E: 873600.478 N: 830911.783
7		VEREDA CUCHARITO	30		E: 873783.309 N: 830988.643	E: 873809.183 N: 831003.786
8		VEREDA CUCHARITO	130		E: 873874.551 N: 831045.673	E: 873983.477 N: 831116.631
9		VEREDA CUCHARITO	121,64		E: 873993.756 N: 831123.447	E: 874095.676 N: 831189.854
10		VEREDA CUCHARITO	24,98		E: 874104.910 N: 831195.799	E: 874125.811 N: 831209.475
11		VEREDA CUCHARITO	107,12		E: 874180.040 N: 831245.012	E: 874269.915 N: 831303.300
12		VEREDA CUCHARITO	56,02		E: 874374.500 N: 831370.522	E: 874421.628 N: 831400.812
13		VEREDA CUCHARITO	48,71		E: 874438.217 N: 831411.498	E: 874479.108 N: 831437.974
14		VEREDA CUCHARITO	103,65		E: 874486.186 N: 831442.528	E: 874572.812 N: 831499.437
15		VEREDA CUCHARITO	94,37		E: 874811.921 N: 831595.297	E: 874904.457 N: 831613.806
16		VEREDA CUCHARITO	88,32		E: 874964.772 N: 831626.175	E: 876488.492 N: 831727.129
17		VEREDA CUCHARITO	725,07		E: 875879.397 N: 831449.881	E: 876488.492 N: 831727.129
18		VEREDA CUCHARITO	200,04		E: 876532.198 N: 831728.958	E: 876731.150 N: 831745.452
19		MESA DEL TRAPICHE	1361,97		E: 876759.269 N: 831741.316	E: 878067.835 N: 831795.883
20		MESA DEL TRAPICHE	206,36		E: 878254.143 N: 831866.245	E: 878459.126 N: 831890.036
21		MESA DEL TRAPICHE	66,98		E: 878489.106 N: 831897.396	E: 878545.532 N: 831932.956
22		VEREDA CUCHARITO	52		E: 879068.291 N: 831700.165	E: 879120.280 N: 831701.231
23		VEREDA CUCHARITO	126		E: 879212.267 N: 831702.244	E: 879338.252 N: 831704.152
24		VEREDA CUCHARITO	826,99		E: 879437.818 N: 831710.540	E: 880235.376 N: 831827.137
25		VEREDA CUCHARITO	446,63		E: 880338.945 N: 831793.934	E: 880756.615 N: 831640.332
TOTAL			5341,85			

Tabla 1. Municipios a intervenir:

UBICACIÓN		
MUNICIPIO	**NOMBRE DE LA VIA**	**LONGITUD A INTERVENIR (KM)**
TELLO	Ruta Código 45 A01 NEIVA- SAN ANTONIO	5,34 km

Fuente: Autor

Valor Costo Inicial del Proyecto.

Tabla 2. Valor inicial del contrato de obra

MUNICIPIO	CATEGORIA	VALOR TOTAL
TELLO	Vía de primer Orden	$ 8.258.002.715,00
VALOR TOTAL		**$ 8.258.002.715,00**

Fuente: Autor

Valor adicional según ajuste No 1 del contrato de obra

TELLO	Vía de primer Orden
VALOR ADICIONAL	$3.370.776.617,36
VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 11.628.779.332,36

Plazo Inicial = Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Plazo adicional = Seis y medio (6.5) meses.
Plazo total contrato de obra = 10.5 meses.

2. ASPECTO TÉCNICO.

2.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

En anexo se adjunta las descripciones de las actividades que se realizaron hasta la fecha. (**Anexos 3** Copia Libro De Bitácora).

2.2. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA

Se presentan las actividades ejecutadas: Hasta la fecha ha transcurrido diez (10) meses y 10 días (17 de junio de 2024 fecha de inicio).

A continuación, se detalla la trazabilidad del proyecto, los inconvenientes y el estado de avance de estos:

El día 10/12/2025 se envió comunicado CO-15-24-46 a la Supervisora con respecto a la entrega del acta parcial de obra No 4 del contrato de obra No 015 de 2024.

Actividades de obra física.

Vía Fortalecillas- Tello.

Actividades ejecutadas durante el periodo. (**Anexo.1** Registro fotográfico)

- **Ítem 1,1.** Se ejecutó localización y replanteo en el tramo No 1 con una cantidad de 0,022 km para un total de 0,0218 km que suma un valor de $ 97.653,09 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 100,00%.
- **Ítem 1,2.** Se ejecutó fresado de pavimento asfáltico en el tramo No 1 con una cantidad de 143,75 m2 para un total de 143,75 m2 que suma un valor de $ 522.811,48 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 100,00%.
- **Ítem 2,1.** Se ejecutó corte en conglomerado para el cajeo en el tramo No 1 con una cantidad de 124,49 m3; excavación para cunetas sobre ambas márgenes con una cantidad de 523,83 m3; excavación para filtros tramo No 1 y 2 con una cantidad de 43,07 m3; excavación para gaviones tramo No 5,17 y 25 con una cantidad de 174 m3 para un total de 1026,54 m3 que suma un valor de $ 24.121.601,67 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 100,00%.
- **Ítem 3,1.** Se ejecutó conformación de calzada en los tramos No 1 con una cantidad de 152,46 m2 para un total de 152,46 m2 que suma un valor de $ 425.363,40 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 100,00%.

- **Ítem 3,2.** Se ejecutó instalación de base granular en el tramo No 1 con una cantidad de 30,49 m3; tramo No 2 una cantidad pendiente de 94,54 m3 para un total de 125,04 m3 que suman un valor de $ 18.130.220 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 100,00%.

- **Ítem 3,3.** Se ejecutó instalación de Mezcla asfáltica MDC-19 en el tramo No 1 una cantidad de 13,78 m3 para un total de 13,78 m3 que suma un valor de $ 20.936.053,20 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 100,00%.

- **Ítem 3,4.** Se ejecutó instalación de subbase granular en el tramo No 1 con una cantidad de 100,63 m3; tramo No 2 una cantidad de 891,66 m3; tramo No 3 una cantidad 422,83 m3; tramo No 4 una cantidad de 345,10 m3; tramo No 5 una cantidad de 360,36; tramo No 6 una cantidad de 304,92 m3 para un total de 4975,85 m3 que suman un valor de $ 547.343.236 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 100,00%.

- **Ítem 3,5.** Se ejecutó riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0 en el tramo No 1 una cantidad 143,75 m2; tramo 18 una cantidad pendiente de 0,26 m2; tramo No 19 una cantidad pendiente de 13,07 m2; tramo 20,21 y 24 una cantidad pendiente de 6,73 m2 para un total de 163,81 m2 que suma un valor de $ 559.581,79 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 100,00%.

- **Ítem 4,1.** Se ejecutó fundición de cuneta en concreto tramo No 1 una cantidad de 22,72 m3; tramo No 2 una cantidad de 74,10; tramo No 3 una cantidad de 34,25 m3; tramo No 4 una cantidad de 39,93 m3; tramo No 6 una cantidad de 19,80 m3; tramo No 7 una cantidad de 9 m3; tramo No 8 una cantidad de 62,29 m3; tramo No 9 una cantidad 40,19 m3; tramo No 10 una cantidad de 10,79 m3; tramo No 11 una cantidad de 51,59 m3; tramo No 12 una cantidad de 54,11 m3; tramo No 13 una cantidad de 20,53 m3; tramo No 17 una cantidad de 9 m3; tramo 19 una cantidad de 8,53 m3; tramo No 20 una cantidad de 4,63 m3; tramo No 22 una cantidad de 30,32 m3; tramo No 23 una cantidad de 29,94 m3 para un total de 521,70 m3 que suma un valor de $ 498.335.930,04 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 100,00%.

- **Ítem 4,2.** Se instaló material granular filtrante para los filtros de los tramos No 1,2 con una cantidad de 173,49 m3 para un total de 173,49 m3 que suma un valor de $ 30.699.252,93 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 100,00%.

- **Ítem 4,3.** Se instaló geotextil no tejido 2500 para los filtros de los tramos No 1 y 2; muros en gavión en el tramo No 17,24 y 25 para un total de 1758,77 m2 que suma un valor de $ 39.256.247,65 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 100,00%.

- **Ítem 4,4.** Se instaló tubería perforada de 4" para los filtros de los tramos No 1 y 2 para un total de 289,15 ml que suma un valor de $ 10.963.447,54 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 100,00%.

- **Ítem 4,5.** Construcción de gaviones en el tramo No 5,17,24 y 25 para un total de 612,60 m3 que suma un valor de $ 301.847.077,37 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 100,00%.

- **Ítem 4,6.** Concreto para revestimiento de gaviones en el tramo No 17,24 y 25 para un total de 603,20 m2 que suma un valor de $ 80.826.656,83 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 100,00%.

- **Ítem 4,7.** Base para piso de gaviones en el tramo No 17,24 y 25 para un total de 146,96 m3 que suma un valor de $ 150.292.855,43 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad de 100,00%.

- **Ítem 4,8.** Relleno para cunetas; para muro en gavión en el tramo No 5,17, 24 y 25 para un total de 1316,86 m3 que suma un valor de $ 161.454.441,98 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad de 100,00%.

- **Ítem 5,1.** Línea de demarcación con pintura en frío en los tramos 1 al 25 para un total de 16025,49 ml que suma un valor de $ 46.746.354,33 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad de 100,00%.

- **Ítem 6,1.** Se ejecutó el transporte de material proveniente del corte en conglomerado de las excavaciones de los tramos No 1; cunetas y gaviones para un total de 6547,23 m3-km que suma un valor de $ 9.820.842,57 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 100,00%.

Tabla 3 Control de programación y avance de obra de acuerdo a condiciones actualizadas dentro del contrato de obra.

ITEMS	FRENTE DE TRABAJO	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA EN EL CONTRATO	% PROGRAMADO PERIODO MES	% EJECUTADO PERIODO MES	% PROGAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO
1.1	Localización y replanteo	Km	5,34	0,00%	0,41%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2	Fresado de Pavimento asfáltco	M2	35.256,08	0,00%	0,41%	100,00%	100,00%	100,00%
2.1	Corte en Conglomerado	M3	13.265,95	0,00%	6,52%	100,00%	100,00%	100,00%
3.1	Conformación de calzada	M2	37.392,81	0,00%	0,41%	100,00%	100,00%	100,00%
3.2	base granular	M3	7.590,75	0,00%	0,40%	100,00%	100,00%	100,00%
3.3	Mezcla Densa en caliente MDC-19	M3	3.714,49	0,00%	0,37%	100,00%	100,00%	100,00%
3.4	Sub-base granular	M3	12.427,59	0,00%	0,81%	100,00%	100,00%	100,00%
3.5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M3	35.256,08	0,00%	0,41%	100,00%	100,00%	100,00%
4.1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	1.368,30	15,87%	38,13%	100,00%	100,00%	100,00%
N.P 4.2	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV.	M3	728,68	0,00%	5,91%	100,00%	100,00%	100,00%
N.P 4.3	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500. ESP. 673-13 INV.	M2	5.220,89	0,00%	11,55%	100,00%	100,00%	100,00%
N.P 4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA DE 4"	ML	1.214,47	0,00%	5,91%	100,00%	100,00%	100,00%
N.P 4.5	GAVION EN PIEDRA ZONGA Y MEDIA ZONGA, MALLA C-12, ESCUADRÌA 10CM X 8CM, VENA C-10. INCLUYE ATIRANTAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL. ESP. 681 INV.	M3	903,60	33,90%	30,54%	100,00%	100,00%	100,00%
N.P 4.6	CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DE GAVIONES	M3	828,20	36,42%	32,60%	100,00%	100,00%	100,00%
N.P 4.7	BASE PARA PISO DE GAVIONES EN CONCRETO DE 21Mpa ESPESOR 20CMS	M3	173,96	42,24%	40,47%	100,00%	100,00%	100,00%
N.P 4.8	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO . ESP. 610-13 P. INV	M3	1.444,86	22,79%	35,02%	100,00%	100,00%	100,00%
5.1	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	16.025,49	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	108.980,45	0,00%	4,76%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabla 4. Control de inversión ejecutado

OBRA		
DESCRIPCION	**PERIODO DEL MES 11**	**ACUMULADO**
obra programada (%)	4,76%	100,00%
valor de la obra programada	$ 553.718.575,25	$11.628.779.332,36
obra ejecutada (%)	17,39%	100,00%
valor de la obra ejecutada	$ 2.022.474.622,30	$11.628.779.332,36



De acuerdo a la ejecución en el periodo del presente informe No 11 se evidencia una ejecución del 100% de las actividades cumpliendo con la programación y las especificaciones técnicas del proyecto.

Plan de inversión del Anticipo

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
CONTRATO DE OBRA No.	15-2024
1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS	
REHABILITACIÓN VÍAS	
OBRA:	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATO	$8.258.002.715
% ANTICIPO	30%
VALOR ANTICIPO	$2.477.400.815,00
VALOR ANTICIPO AJUSTADO AL PESO	$2.477.400.815,00
DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS (5%).	$123.870.041,00
VALOR NETO GIRADO.	$2.353.530.774,00

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	% OBRA	VALOR	VALOR NETO
1	ALQUILER DE MAQUINARIA	HORA	25,000%	$588.382.693,50	$588.382.693,50
2	SUMINISTRO MATERIALES GRANULARES	M3	22,000%	$517.776.770,28	$517.776.770,28
3	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	M3	30,000%	$706.059.232,20	$706.059.232,20
4	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA	GLB	14,000%	$329.494.308,36	$329.494.308,36
5	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	GLB	9,000%	$211.817.769,66	$211.817.769,66
			100,000%		$2.353.530.774,00
				TOTAL ANTICIPO A DESEMBOLSAR	$2.353.530.774,00

SON	$2.353.530.774,00
VALOR EN LETRAS	DOS MIL TRECIENTOS CIENCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

CONTRATISTA:

CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
RL. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
Contratista

INTERVENTORIA:

ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
R.L. CONSORCIO VG
Interventoría

Este plan de inversión del anticipo del valor inicial del contrato de obra se aprobó por parte de la interventoría y el ente contratante, en el que se realizaron las siguientes ordenes de operaciones de pago:

ORDENES DE OPERACIONES CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT 901.785.282-7

No Fiducia 19100003460

No ORDEN	NIT	BENEFICIARIO	REPRESENTANTE LEGAL	VALOR	ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSION
6	12138187	INGENIERIA CIVIL CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 253.840.532,19	1
7	901046409	DISTRIBUCIONES MEJIA UNO SAS	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 329.494.308,36	4
8	901759608	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 517.776.770,28	2
9	901759608	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 56.059.232,00	3
10	813001515	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA	JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA	$ 650.000.000,00	3
12	813008120	PA COLOMBIA SAS	CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA	$ 293.996.604,00	1
13	900558342	CONCREMACK SAS	LUIS ENRIQUE JARAMILLO PEÑA	$ 211.817.769,66	5
14	901759608	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 40.000.000,00	1

Plan de inversión del Anticipo Otro si No 1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
CONTRATO DE OBRA No.	15-2024
1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS	
REHABILITACIÓN VÍAS	
OBRA:	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATO ADICIONAL 1	$ 3.370.776.617,36
% ANTICIPO	30%
VALOR ANTICIPO	$1.011.232.986,00
VALOR ANTICIPO AJUSTADO AL PESO	$1.011.232.986,00
DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS (5%).	$50.561.649,00
VALOR NETO GIRADO.	$960.671.337,00

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	% OBRA	VALOR	VALOR NETO
1	SUMINISTRO MATERIALES GRANULARES	M3	25,000%	$240.167.834,25	$240.167.834,25
2	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	M3	40,000%	$384.268.534,80	$384.268.534,80
3	MANO DE OBRA	GLB	20,000%	$192.134.267,40	$192.134.267,40
4	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	GLB	15,000%	$144.100.700,55	$144.100.700,55
			100,000%		$960.671.337,00
				TOTAL ANTICIPO A DESEMBOLSAR	$960.671.337,00

SON	$960.671.337,00
VALOR EN LETRAS	NOVECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.

CONTRATISTA:

CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
RL. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
Contratista

INTERVENTORIA:

ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
RCL CONSORCIO VG
Interventoría

Este plan de inversión del anticipo del valor adicional del contrato de obra se aprobó por parte de la interventoría y el ente contratante, y se encuentra en proceso de realizar las siguientes ordenes de operaciones de pago:

ORDENES DE OPERACIONES CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT 901.785.282-7
No Fiducia 19100003460

No ORDEN	NIT	BENEFICIARIO	REPRESENTANTE LEGAL	VALOR	ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSION
15	901759608	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 80.167.834,25	2
			CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 134.268.534,80	3
			CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 192.134.267,40	6
16	813001515	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA	JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA	$ 250.000.000,00	3
17	12138187	INGENIERIA CIVIL CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 144.100.700,55	5
18	900340491	MULTIMEZCLAS AGREGADOS SAS	DANIEL ALBERTO GONZALEZ ARCILA	$ 80.000.000,00	2
19	1075237530	DANIEL ALBERTO GONZALEZ ARCILA	DANIEL ALBERTO GONZALEZ ARCILA	$ 80.000.000,00	2

3. RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO

- Durante el periodo de este informe de obra No 11 se presentaron algunas precipitaciones pero que permitieron ejecutar las actividades al 100% del proyecto cumpliendo con el alcance estipulado. A continuación, en las siguientes tablas se grafica el comportamiento meteorológico en el área de influencia del proyecto:

Tabla 5. Tabla pluviométrica

Entidad	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES				
Codigo Estacion	**Nombre Estación**	**Latitud**	**Longitud**	**Altitud**	**categoría**
21110040	HATO MILAGRO [21110040]	30.748.888.890,00	-75,16841667	548	Pluviometria
Municipio	**Fecha Instalación**	**Id Parámetro**	**Etiqueta**		
Tello	15/09/1971	PRECIPITACIÓN	PTPM_CON		
Descripción Serie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Nivel Aprobación
Dia pluviometro	Diaria	1-dic-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	2-dic-25	2	50	900
Dia pluviometro	Diaria	3-dic-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	4-dic-25	2	50	900
Dia pluviometro	Diaria	5-dic-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	6-dic-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	7-dic-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	8-dic-25	10	50	900
Dia pluviometro	Diaria	9-dic-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	10-dic-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	11-dic-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	12-dic-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	13-dic-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	14-dic-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	15-dic-25	30	50	900

Información obtenida del banco de datos del Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Esttudios Ambientales (IDEAM) URL: http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/

Table 6. Grafica de precipitación

FRECUENCIA	DIARIA
MESES	JULIO
DIAS	mm/día
1-dic	0
2-dic	2
3-dic	0
4-dic	2
5-dic	0
6-dic	0
7-dic	0
8-dic	10
9-dic	0
10-dic	0
11-dic	0
12-dic	0
13-dic	0
14-dic	0
15-dic	30



Elaboró: Ingeniero residente de Obra. Consorcio Infraestructura JPN Tello
Información obtenida del banco de datos del Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM)
URL: http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/

De acuerdo a la estación meteorológica del IDEAM más cercana a la zona de influencia del proyecto, se puede observar algunas precipitaciones en algunos días del mes de diciembre de 2025, sin embargo se obtuvo un avance del 100% de todas las actividades del contrato.

4. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

4.1. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL.

Informe De Equipo Del Contratista

En la siguiente tabla se muestra la maquinaria mínima exigida pliegos de condiciones, a continuación, los relacionamos.

Tabla 7. Maquinaria mínima requerida

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	2
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	2
Mezcladora de concreto 9P3.	2
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	2
Carrotanque de agua (1000 galones)	2
Cortadora de pavimento	2
Formaleta metálica (Concreto hidráulico)	4
Vibrador de concreto	4
Camioneta D-300	1

Fuente. Anexo Técnico Cto No. 015-2024

Informe De Personal

En el presente periodo se presenta a la interventoría las planillas de seguridad social del personal de obra mínimo requerido. **Anexo 5.** Control Personal Obra.

Tabla 8. Personal Técnico requerido

CARGO	CANTIDAD	DEDICACION
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1	50%
INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA	2	100%
INSPECTOR DE OBRA	2	100%
PROFESIONAL SISO	2	80%
TOPOGRAFO	2	50%
AUX. TRANSITO	4	80%

Fuente. Anexo Técnico Cto No. 015-2024

5. SEGURIDAD SOCIAL

- De acuerdo a las obligaciones contractuales y según el pliego de condiciones se hacen las respectivas afiliaciones del personal que ejecuta el contrato, a un sistema de seguridad social (ARL, pensiones y salud).

- El Contratista de obra a la fecha del presente informe presentó el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral. **Anexo 5**. Control Personal Obra.

6. MEMORIA DIARIA O BITACORA

- La Interventoría indica en la bitácora los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en conjunto (Contratista e Interventoría) de la ejecución de los trabajos, registrando la visita de los funcionarios, permitiendo la compresión general de la obra y desarrollo de las actividades. **Anexo 3** Copia libro de bitácora.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

- En el registro fotográfico se anexan las actividades más relevantes desarrolladas en el presente informe de obra No 11. **Anexo 1**. Registro fotográfico.

8. ASPECTO JURÍDICO

La Gobernación del Huila realizó seguimiento a las pólizas correspondientes al contrato de obra No.015-2024.

8.1. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 9. Condiciones contrato de obra

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT:	901.785.282-7
CONTRATO No.:	015 DE 2024
OBJETO.:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA
VALOR INICIAL:	$ 8.258.002.715,00
VALOR ADICIONAL:	$ 3.370.776.617,36
VALOR ACTUALIZADO:	$ 11.628.779.332,36
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL:	SEIS Y MEDIO (6.5) MESES
PLAZO TOTAL	10.5 MESES
ACTA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1:	26 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE REINICIO No 1:	05 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	11 DE DICIEMBRE DE 2025

8.2. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta las pólizas del Contrato de Obra, con base en el Acta de Inicio.

Aseguradora: Seguros del Estado S.A, póliza responsabilidad civil extracontractual No. 61-40-101019508, póliza cumplimiento entidades estatales No. 61-44-101053603.

Según contrato:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101053603 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	23/02/2024	30/12/2024	$ 1,651,600,543.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	23/02/2024	30/12/2024	$ 2,477,400,814.50
PAGO DE SALARIO	23/02/2024	30/06/2027	$ 825,800,271.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 años, o meses y -0 dias		$ 1,651,600,543.00
TOTAL			**$ 6,606,402,172.00**

Fuente. Autor

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101019508 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23/02/2024	30/06/2024	$ 650,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23/02/2024	30/06/2024	$ 650,000,000.00
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	23/02/2024	30/06/2024	$ 650,000,000.00
TOTAL			**$ 650,000,000.00**

Fuente. Autor

Según acta de inicio:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101053603 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	17/06/2024	24/04/2025	$ 1,651,600,543.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	17/06/2024	24/04/2025	$ 2,477,400,814.50
PAGO DE SALARIO	17/06/2024	23/10/2027	$ 825,800,271.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	si ampara 5 años, o meses y -1 dias		$ 1,651,600,543.00
TOTAL			**$ 6,606,402,172.00**

Fuente. Autor

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101019508 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/06/2024	23/10/2024	$ 650,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/10/2023	24/06/2024	$ 650,000,000.00
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	24/10/2023	24/06/2024	$ 650,000,000.00
TOTAL			**$ 650,000,000.00**

Fuente. Autor

Según acta de Acta de reinicio No 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101053603 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	17/06/2024	04/12/2025	$ 1,651,600,543.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	17/06/2024	04/12/2025	$ 2,477,400,814.50
PAGO DE SALARIO	17/06/2024	04/06/2028	$ 825,800,271.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 años, o meses y -1 dias		$ 1,651,600,543.00
TOTAL			**$ 6,606,402,172.00**

Fuente. Autor

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101019508 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/06/2024	03/06/2025	$ 711,500,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17/06/2024	03/06/2025	$ 711,500,000.00
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	17/06/2024	03/06/2025	$ 711,500,000.00
TOTAL			**$ 711,500,000.00**

Fuente. Autor

Según OTRO SI No 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101053603 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	17/06/2024	19/03/2026	$ 2,325,755,866.47
BUEN MANEJO DELANTICIPO	17/06/2024	19/03/2026	$ 2,477,400,814.50
PAGO DE SALARIOS	17/06/2024	19/09/2028	$ 1,162,877,933.24
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 años, o meses y -1 dias		$ 2,325,755,866.47
TOTAL			**$ 8,291,790,480.68**

Fuente. Autor

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101019508 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/06/2024	19/09/2025	$ 711,750,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17/06/2024	19/09/2025	$ 711,750,000.00
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	17/06/2024	19/09/2025	$ 711,750,000.00
TOTAL			**$ 711,500,000.00**

Fuente. Autor

Según OTRO SI No 2:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101053603 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	17/06/2024	19/03/2026	$ 2,325,755,866.47
BUEN MANEJO DELANTICIPO	17/06/2024	19/03/2026	$ 2,477,400,814.50
PAGO DE SALARIOS	17/06/2024	19/12/2028	$ 1,162,877,933.24
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 años, o meses y -1 dias		$ 2,325,755,866.47
TOTAL			**$ 8,291,790,480.68**

Fuente. Autor

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101019508 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/06/2024	19/12/2025	$ 711,750,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17/06/2024	19/12/2025	$ 711,750,000.00
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	17/06/2024	19/12/2025	$ 711,750,000.00
TOTAL			**$ 711,500,000.00**

Fuente. Autor

9. ENSAYOS DE LABORATORIO

En este periodo del informe de obra No 11 se realizaron los siguientes ensayos (Ver anexo 9):

TIPO DE ENSAYO	FECHA
Resistencia a la compresión de concretos para cunetas Tramo No 24	1 de diciembre de 2025
Resistencia a la compresión de concretos para cunetas Tramo No 16	2 de diciembre de 2025
Resistencia a la compresión de concretos para cunetas Tramo No 7	3 de diciembre de 2025
Resistencia a la compresión de concretos para cunetas Tramo No 6	5 de diciembre de 2025

10. ESTUDIOS Y DISEÑOS

De acuerdo a lo considerado en el comité técnico el día 26 de junio de 2024, el contratista realizó la revisión y ajuste al diseño con los parámetros iniciales con la firma Especializada INGESUELOS DE COLOMBIA Ltda, cuyo representante legal es el Ingeniero Mario Trujillo Calderón Castro (Esp. En Ingeniería de Vías, T.P. 1920240632CAU) y se presentó a la interventoría el 10 de julio de 2024 a través del oficio CO-15-24-07 para la respectiva revisión. El ajuste del diseño por el método de la AASHTO y con revisión por el método racional se presentó una estructura homogénea para las secciones 1 y 2, teniendo en cuenta la poca diferencia en los CBR y una estructura para la sección 3.

Una vez presentada el ajuste de diseño a la interventoría. El Especialista de la interventoría realiza observaciones técnicas en cuanto a parámetros y factores utilizados para la utilización del método de la AASHTO y Método Racional. Dichas observaciones son contestadas y aclaradas por el Especialista del Contratista y aceptadas por la Interventoría.

Aclaradas las observaciones al ajuste del diseño se presenta el ajuste del diseño a la Secretaría de Vías e Infraestructura para la revisión y aprobación el día 23 de agosto de 2024 a través del oficio CO-15-24-11. Finalmente, la firma INGESUELOS DE COLOMBIA Ltda realiza el diseño completo con los parámetros iniciales reiterando la estructura de pavimento para las secciones 1, 2 y 3. Se unifica una estructura para las secciones 1 y 2 y otra estructura para la sección 3.

Sección 1.

ESPESORES PROPUESTOS PARA ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS EN SECCION 1				
ESTRUCTURA PROPUESTA	DETALLE DE CAPA	μ	Modulo E (Kg/cm2)	ESPESOR (mm)
DESCARGADERO				
	Rodadura en MDC-19	0.35	17569.78	100
	Base Granular (CBR>80%)	0.4	3167.68	200
	Subbase Granular (CBR>30%)	0.45	1417.13	200
	Subrasante	0.5	823.72	∞

Sección 2.

ESPESORES PROPUESTOS PARA ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS EN SECCION 2				
ESTRUCTURA PROPUESTA	DETALLE DE CAPA	μ	Modulo E (Kg/cm2)	ESPESOR (mm)
DESCARGADERO				
	Rodadura en MDC-19	0.35	17569.78	100
	Base Granular (CBR>80%)	0.4	3407.74	200
	Subbase Granular (CBR>30%)	0.45	1524.53	200
	Subrasante	0.5	923.86	∞

Sección 3.

ESPESORES PROPUESTOS PARA ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS EN SECCION 3				
ESTRUCTURA PROPUESTA	DETALLE DE CAPA	μ	Modulo E (Kg/cm2)	ESPESOR (mm)
DESCARGADERO				
	Rodadura en MDC-19	0.35	17569.78	120
	Base Granular (CBR>80%)	0.4	2777.83	200
	Subbase Granular (CBR>30%)	0.45	1242.73	200
	Subrasante	0.5	674.33	∞

Una vez presentada la solicitud del ajuste No 1 el día 21 de noviembre de 2024 a la Secretaría de Vías e Infraestructura y surtidos todos los procesos de revisión, finalmente mediante resolución No 283 de 2024 de fecha 30 de diciembre de 2024 y mediante decreto No 021 de 2025 de fecha 31 de enero de 2025, se aprueba la incorporación al presupuesto departamental del referido ajuste No 1.

11. COMITES DE OBRA

Durante el periodo del presente informe de obra No 11 se realizó comité de obra en el siguiente día: **Anexo 4** Comités de obra.

- Acta de comité el día 10 de diciembre de 2025 en donde se trataron temas como la revisión del estado actual de los tramos 17,18 y 19; cierre de inconformidades en la instalación de la mezcla asfáltica en los tramos 17 y 19.

12. CORRESPONDENCIA

Durante el periodo del presente informe se tiene la siguiente correspondencia: **Anexo 7** Correspondencia.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA INFORME DE OBRA No 11						
ITEM	PROCENDENCIA			DETALLE		
	ENTIDAD O PERSONA	LUGAR	N° DE CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	REFERENCIA
1	SUPERVISOR	NEIVA	CO-15-24-46	10/12/2025	Entrega acta parcial de obra No 4 contrato de referencia	Contrato de Obra No 0015 DE 2024

13. CALIBRACION DE EQUIPOS

Durante el periodo del presente informe para la localización y replanteo se utilizó el siguiente equipo: **Anexo 8** Calibración de equipos.

- Estación Total de marca HI TARGET modelo HTS 720 con serie No VAWN16431991.
- Sistema GNSS marca EFIX referencia eBase/F7 con No de serieF7-36311111.

14. CARTERAS TOPOGRAFICAS

Durante el periodo del presente informe se instaló subbase, Base granular, Mezcla asfáltica MDC-19 en el tramo No 1: **Anexo 10** Cartera Topográfica.

15. CONCLUSIONES

De acuerdo a la ejecución en el periodo del presente informe de obra No 11 se tiene una intervención de 5,34 km de rehabilitación con pavimento flexible que representa el 100,00 % del alcance total del contrato.

A la fecha de cierre del informe se radicó el acta parcial de obra No 4 al ente contratante el por un valor de $ 2.693.100.617,08 para una ejecución acumulada del 90%, porcentaje máximo a cobrar en actas parciales de acuerdo al contrato.

Se presentará a la interventoría el acta final de obra para revisión y aprobación con el fin de proceder con la liquidación del contrato.

ING. CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
Director de Obra CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

ANEXO 1.
REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA FORTALECILLAS- TELLO RUTA 45 A01


Localización y replanteo








Fresado de pavimento asfáltico

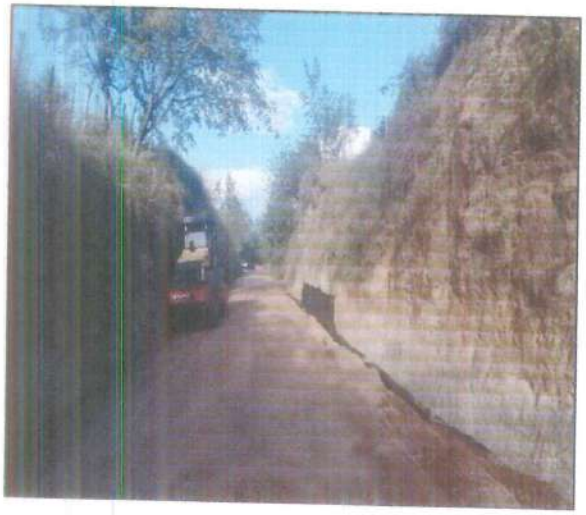



Excavación

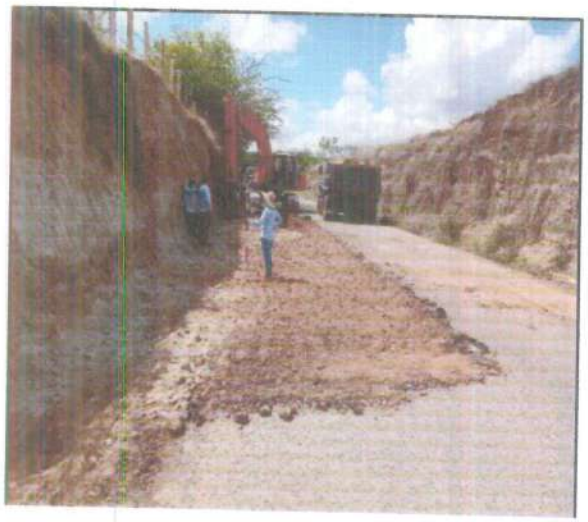







Conformación de calzada





Instalación de base granular











Instalación de Mezcla Densa en Caliente MDC-19

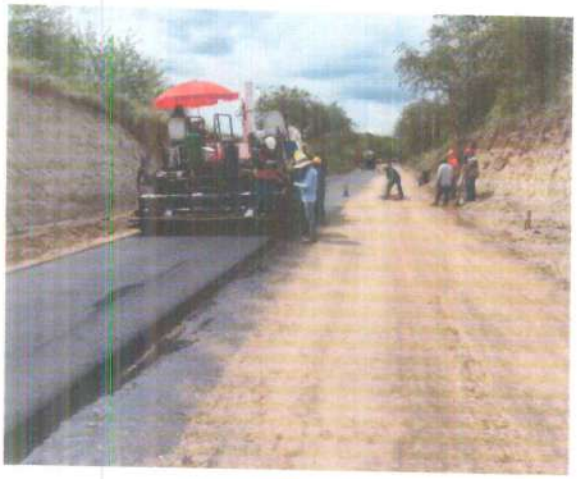





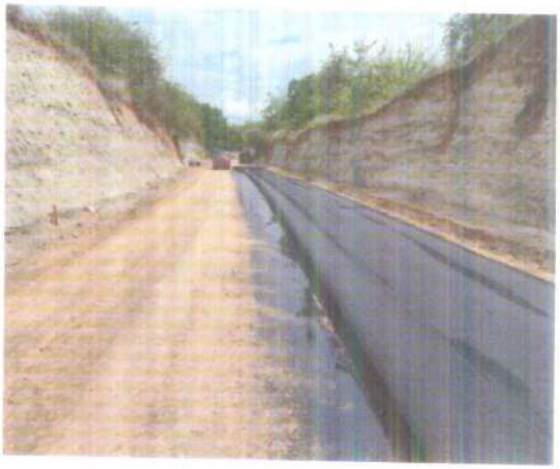





Dirección: CARRERA 7 No. 4-34
Correo Electrónico: claudiomejiag@gmail.com
Neiva – Huila

Instalación de sub-base granular









Riego de imprimación con emulsión asfáltica





Cuneta en concreto

















Construcción de filtros









Construcción de gaviones Tramo No 17,24 y 25













Instalación de señalización horizontal

















Anexo 2
Programación

Dirección: CARRERA 7 No. 4-34
Correo Electrónico: claudiomejiag@gmail.com
Neiva – Huila

VALOR TOTAL:	$ 11.638.779.333,38	PLAZO TOTAL	16.5 MESES


PRESUPUESTO FORTALECILLAS - TELLO
SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No 2

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
		PRELIMINARES					
1	1.1	Localización y replanteo	Km	5,34	$ 4.489.613,00	$ 23.950.899,42	0,21
2	1.2	Fresado de pavimento asfáltico	m2	39.259,66	$ 3.637,00	$ 136.236.309,68	1,19
SUBTOTAL PRELIMINARES						$ 152.177.654,10	1,31
		EXPLANACIONES					
3	2.1	Corte en Conglomerado	M3	11.287,85	$ 23.498,58	$ 311.733.382,86	2,68
SUBTOTAL EXPLANACIONES						$ 311.733.382,86	2,68
		SUBESTRUCTURA PAVIMENTO FLEXIBLE					
4	3.1	Conformación de la calzada	M2	37.382,61	$ 2.790,00	$ 104.328.606,90	0,90
5	3.2	base granular	M3	7.590,79	$ 140.606,00	$ 1.100.658.170,66	9,46
6	3.3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	M3	3.714,48	$ 1.518.199,00	$ 5.641.133.638,79	48,53
7	3.4	Sub-base granular	M3	12.407,59	$ 110.000,00	$ 1.367.834.372,00	11,79
8	3.5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	35.258,06	$ 3.416,00	$ 120.434.762,45	1,04
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE						$ 8.335.671.871,80	71,69
		CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS					
9	4.1	Cunet de Concreto Vaciado in Situ no Incluye la conformación de la superficie del terreno	M3	1.969,30	$ 688.221,00	$ 1.367.031.756,66	11,24
10		ITEMS NO PREVISTOS					0,00
11	N.P 4.2	ITEM : MATERIAL GRANULAR FILTRANTE ESP. 673-13 INV.	M3	738,68	$ 176.651,14	$ 128.041.109,14	1,11
12	N.P 4.3	ITEM : GEOTEXTIL NO TEJIDO 3300 ESP. 673-13 INV.	M2	5.220,89	$ 22.322,29	$ 116.531.683,47	1,00
13	N.P 4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA DE 6"	ML	1.214,47	$ 37.918,13	$ 46.047.666,33	
14	N.P 4.5	ITEM : GAVION EN PIEDRA ZONDA Y MALLA ZINCMA VALLA C-13, ESCALADERA 18CM X 50M, VENA C-16, INCLUYE ATRANTAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL ESP. 681 INV.	M3	959,60	$ 462.734,11	$ 445.231.830,09	3,83
15	N.P 4.6	ITEM CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DE GAVIONES	M3	836,28	$ 139.896,40	$ 119.675.657,41	0,95
16	N.P 4.7	ITEM BASE PARA PISO DE GAVIONES EN CONCRETO DE 21Mpa ESPESOR 20CMS	M3	173,84	$ 1.022.678,88	$ 177.805.176,17	1,53
17	N.P 4.8	ITEM RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO ESP. 610-13 P. INV	M3	1.444,60	$ 122.665,89	$ 177.147.388,73	1,52
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS						$ 2.599.813.284,91	21,56
		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD					
18	5.1	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	16.022,48	$ 2.917,00	$ 46.746.354,39	0,40
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						$ 46.746.354,39	0,40
		TRANSPORTES					
19	6.1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	108.997,45	$ 1.500,00	$ 163.479.674,85	1,41
SUBTOTAL TRANSPORTES						$ 163.479.674,85	1,41
		SUBTOTAL OBRAS				$ 11.810.699.645,30	

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)	$	11.810.699.645,30
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (VER INFORME PMT)	$	48.354.955,68
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL)	$	39.714.687,00
VALOR TOTAL	$	11.638.779.333,38

DEL 17 AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y DE 1 AL 30 DE FEBRERO DE 2025						1 AL 31 DE MARZO DE 2025				1 AL 30 DE ABRIL DE 2025				1 AL 31 DE MAYO DE 2025					1 AL 30 DE JUNIO DE 2025			
1 MES						2 MES				3 MES				4 MES					5 MES			
17 al 23 de Junio de 2024	24 al 28 de Junio de 2024	3 al 9 de Febrero	10 al 16 de Febrero	17 al 23 de Febrero	24 al 28 de Febrero	1 al 9 de Marzo	10 al 16 de Marzo	17 al 23 de Marzo	24 al 31 de Marzo	1 al 6 de Abril	7 al 13 de Abril	14 al 20 de Abril	21 al 30 de Abril	1 al 4 de Mayo	5 al 11 de Mayo	12 al 18 de Mayo	19 al 25 de Mayo	26 al 31 de Mayo	1 al 8 de Junio	9 al 15 de Junio	16 al 23 de Junio	23 al 30 de Junio
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
$ 2.022.899,25						$ 2.022.899,25				$ 2.022.899,25				$ 2.022.899,25					$ 2.022.899,25			
	$ 13.016.459,30					$ 13.016.459,30				$ 13.016.459,30				$ 13.016.459,30					$ 13.016.459,30			
						$ 17.431.712,88				$ 17.431.712,88				$ 17.431.712,88					$ 17.431.712,88			
						$ 12.103.187,40				$ 12.103.187,40				$ 12.103.187,40					$ 12.103.187,40			
							$ 104.110.909,00			$ 132.436.160,83				$ 132.436.160,83					$ 132.436.160,83			
										$ 341.016.001,23				$ 881.001.714,23					$ 881.001.714,23			
								$ 74.857.100,00		134.172.467,67				134.172.467,67					134.172.467,67			
										$ 16.323.239,86				$ 16.323.239,86					$ 16.323.239,86			
															$ 14.642.661,48				$ 14.642.661,48			
															$ 11.606.064,61				$ 11.606.064,61			
															$ 5.300.674,28				$ 5.300.674,28			
															$ 47.784.917,57				$ 47.784.917,57			
														$ 27.512.323,74								
						$ 13.839.700,50				$ 13.839.700,50				$ 13.839.700,50					$ 13.839.700,50			

						$ 1.882.400,00				$ 1.882.400,00				$ 1.882.400,00					$ 1.882.400,00			
						$ 1.954.811,45				$ 1.954.811,45				$ 1.954.811,45					$ 1.954.811,45			
VALOR PROGRAMADO MENSUAL						$ 19.196.370,00				$ 241.328.070,58				$ 677.108.820,17					$ 1.303.653.134,82			
% MENSUAL						0,16%				2,08%				5,82%					11,21%			
% ACUMULADO						0,16%				2,24%				8,06%					19,27%			
VALOR PROGRAMADO ACUMULADO						$ 19.196.370,00				$ 260.514.440,58				$ 937.623.260,75					$ 2.241.276.395,57			

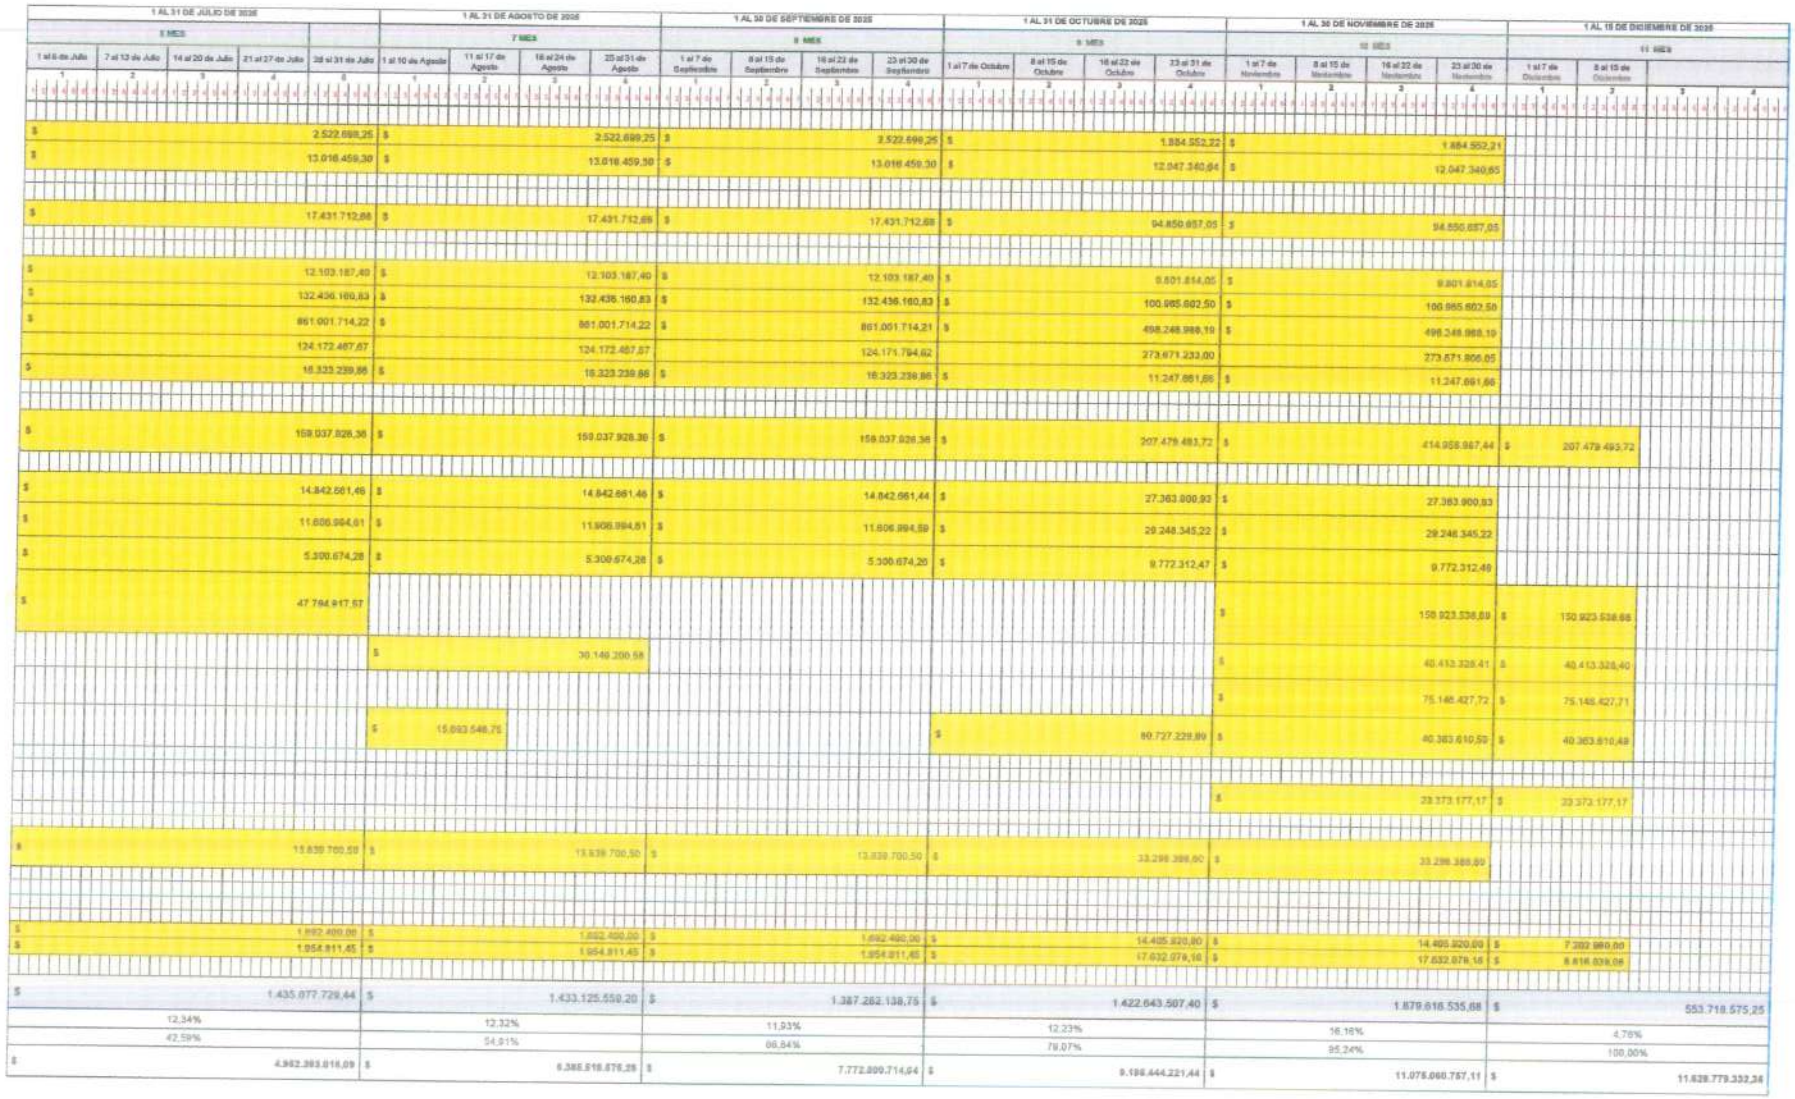

Anexo 3
Bitacora de Obra

DIC 2/25 charla a cargo de las Prof. SISO
Topografía en el sector 1
alistado para cunetas
construcción de cunetas
Rellenos para cunetas

DIC. 3/25 charla a cargo de las prof. SISO
alistado para cunetas
construcción de cunetas
Rellenos para cunetas
Topografía en el Sector 1

DIC 4/25 charla a cargo de las prof. SISO
bajo sector 1
construcción de cunetas
Rellenos para cunetas

DIC 5/25 charla a cargo de las prof. SISO
construcción de cunetas
instalación de Subbase Sector 1
Relleno para cunetas
Señalización Horizontal

Scanned with CamScanner

DIC. 6/25 bitacora a cargo de las prof. 9190
construcción de cunetas
instalación de base sector 1
Relleno para cunetas
Limpieza de la obra.
Señalización horizontal

DIC 9/25 bitacora a cargo de las prof. 9190
construcción de cunetas
imprimación sector 1
construcción de cunetas
Relleno de cunetas
Limpieza de la obra.
Señalización horizontal.

DIC 10/25 bitacora a cargo de las prof. 9190
Topografía sector 1
instalación mezcla asfaltica sector 1
construcción de cunetas
Relleno de cunetas
señalización Horizontal
Limpieza de la obra

Scanned with CamScanner

Anexo 4
Comités de Obra

ACTA No: 13

CONTRATO DE OBRA Nro:	15 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO		
CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro:	20 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VG		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SANANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
FECHA	**HORA INICIO**	**HORA FINALIZACION**	**DURACION**
10 DE DICIEMBRE DE 2025	10:00 AM	12:00 PM	2 HORAS

I. OBJETIVO DE LA REUNION:

Revisión y cierre de no conformidades generadas por defectos en tramos 17, 18 y 19.

II. PARTICIPANTES:

NOMBRES	CARGO
ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES	Supervisor
VÍCTOR GUILLERMO RODRÍGUEZ	Dir. Interventoría Consorcio VG
ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	Secretario de Vías
CLAUDIO CÉSAR MEJÍA GUTIÉRREZ	Dir. Obra Consorcio Inf. JPN
JESUS ANTONIO TRUJILLO TOVAR	Veedor
OSCAR IVAN BARRIOS	Veedor
AURELIO CUBIDES	Ingeniero Residente de Obra
EDGAR MAURICIO PERDOMO	Ingeniero Residente de Obra
NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	Profesional SST

Se anexan firmas de participantes a la reunión.

III. ORDEN DEL DÍA

1. Recuento de documentos relacionados con el objeto de la presente acta.
2. inspección de los tramos 17, 18 y 19

3. Cierre de inconformidades.

IV. TEMAS TRATADOS

1. Recuento de documentos relacionados con el objeto de la presente acta.
2. Revisión de estado actual de los tramos 17, 18 y 19.
3. Cierre de inconformidades evidenciadas tras el proceso de instalación de mezcla asfáltica en tramos 17 y 19 intervenidos en el Contrato de Obra No. 15 de 2024.

V. DESARROLLO DE LA REUNIÓN


1. Durante el desarrollo de la presente acta se realizó un recuento de todos los documentos generados que tienen relación con los defectos constructivos evidenciados en los tramos 17, 18 y 19 tras la instalación de mezcla asfáltica. Estos defectos tienen situaciones particulares que los generaron y que en su momento fueron manifestados por los contratistas de obra e interventoria, adicionalmente concluyeron en realizar un seguimiento y corrección de estos.


El día 4 de julio mediante el acta de comité técnico realizado el 4 de julio de 2025, se mencionaron puntos importantes en su momento como las intensas lluvias que en el caso particular del tramo 17 de instalo mezcla asfáltica, generando defectos funcionales (pieles de cocodrilo) ubicados en las abscisas 0+050 y 0+360 para estar bajo seguimiento y que al momento de que se estabilizara el desarrollo del fenómeno evidenciado se procedería a realizar la restitución de la estructura de pavimento en su totalidad en los puntos mencionados.

Luego se manifestó que en el tramo 19 entre las abscisas 0+350 y 0+550 se presentaron unas interrupciones en la instalación de mezcla asfáltica (ventanas) que el contratista debió dejar porque en el momento de llevar a cabo la actividad, en el predio ubicado entre las abscisas nombradas se iba a realizar una jornada de recolección de arroz y el tránsito de maquinaria para realizar la actividad afectaría seriamente la mezcla asfáltica. Posteriormente tras cerrar dichas ventanas se generaron unas pequeñas ondulaciones que al ser sometidas al tráfico irían desapareciendo.

Luego de una jornada de instalación de asfalto en el tramo 19 que se extendió a altas horas de la noche llevada a cabo el pasado 7 de julio de 2025 se generaron unos defectos por fallas en el proceso de compactación por la poca visibilidad del operador y que fueron manifestados por la interventoria mediante la comunicación INTERVG066, posteriormente en el acta de comité No.6 realizada el 21 de julio se fijaron compromisos por parte del contratista para corregir los defectos encontrados en los tramos.

El día 14 de agosto se entrega concepto técnico por parte de la interventoria en donde se concluye sobre los defectos en el tramo 17 lo siguiente: "Las FISURAS PIEL DE COCODRILO (PC) que se presentan en el TRAMO No.17 el cual está localizado entre la abscisa K 15+224.93 al K 15+950.00, con una longitud total de 725.074 metros, corresponden a DAÑOS FUNCIONALES alusivos a la variación del NIVELFREATICO en este tramo, por la presencia de los cultivos de arroz en las DOS (2) márgenes e incluso, en este mismo tramo existen CANALES EN TIERRA que conducen el agua de riego a dichos cultivos, afectando la resistencia del material de la subrasante y de las mismas capas granulares que conforman la estructura del pavimento de concreto asfáltico. Como solución se recomienda hacer las respectivas labores de PARCHEO estabilizando las capas granulares con cemento; con el propósito de garantizar su estabilidad y resistencia con la variación de su contenido de humedad."

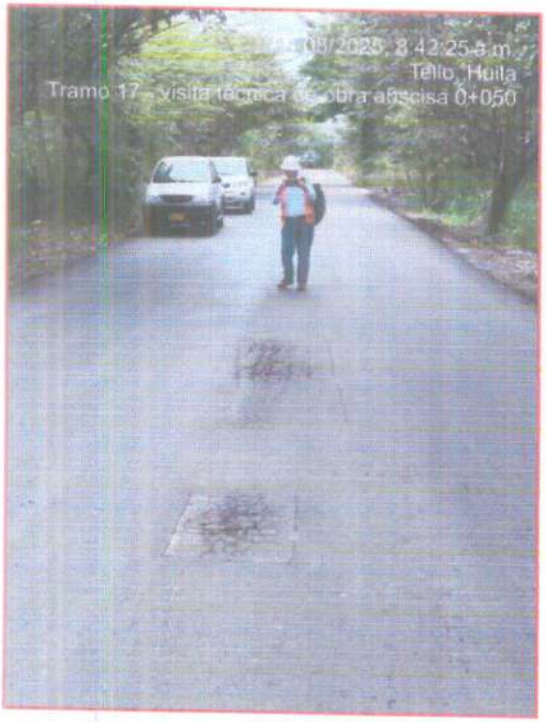

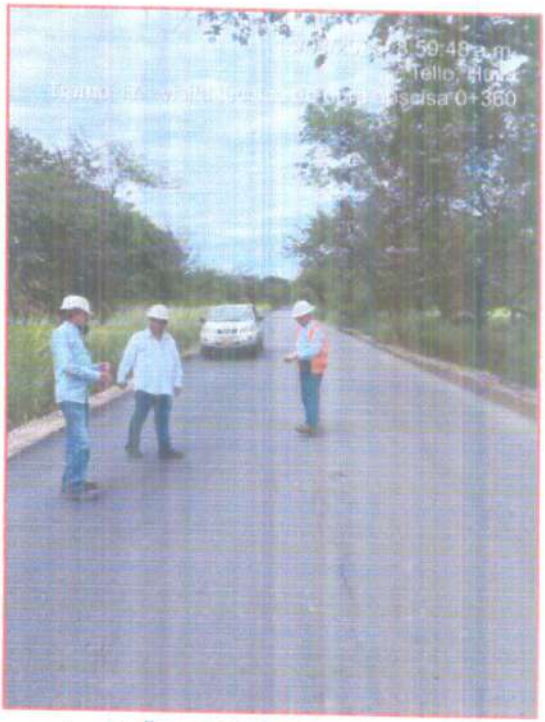

Soporte fotográfico No.1. **TRAMO No.17** donde se presentan **DAÑOS FUNCIONALES** consistentes en la presencia de **FISURAS PIEL DE COCODRILO (PC)** en la estructura del pavimento de concreto asfáltico recientemente construido, a causa de problemas de drenaje que afectan las capas granulares, teniendo en cuenta la presencia de cultivos de arroz en las **DOS (2)** márgenes de la calzada.
(Fuente / Archivo Personal / Soporte Fotográfico tomado en campo).





Soporte fotográfico No.1. **TRAMO No.17** donde se presentan **DAÑOS FUNCIONALES** consistentes en la presencia de **FISURAS PIEL DE COCODRILO (PC)** en la estructura del pavimento de concreto asfáltico recientemente construido, a causa de problemas de drenaje que afectan las capas granulares, teniendo en cuenta la presencia de cultivos de arroz en las **DOS (2)** márgenes de la calzada.
(Fuente / Archivo Personal / Soporte Fotográfico tomado en campo).

En el acta No.9 del 20 de agosto de 2025 La supervisión manifiesta a los asistentes, que ya se habían realizado observaciones a las falencias del tramo 17 y 19, en la visita de obra realizada el 21 de julio de 2025 según acta de comité #6, y que la interventoría solicitó formalmente al Consorcio Infraestructura JPN Tello con oficio INTER-VG071 de fecha 28 de julio de 2025 el procedimiento a realizar y la programación de las actividades, para la corrección de las falencias del acabado del pavimento asfaltico, por lo que se está a la espera de la propuesta con fundamento técnico para corregir las falencias encontradas en los tramos anteriormente descritos.

Mediante el acta de comité No.10 del 18 de septiembre y el acta de comité No.11 del 19 de septiembre de 2025, se manifiesta que una vez revisado el concepto técnico entregado por la interventoria el 14 de agosto, se concluyen causas y procedimientos a seguir para la solución de los fallos encontrados en tramo 17, mientras que para el tramo 19 se sugiere parcheo con material asfaltico de gradación fina si las ondulaciones no se reducen por acción de cargas vehiculares.

El día 24 de septiembre, el contratista de obra realiza la corrección de defectos en tramo 17 y 18 conforme a la normatividad vigente y en concordancia con el concepto técnico emitido por la interventoria, realizando el corte, demolición y restitución de la estructura afectada para finalizar con la instalación de mezcla asfáltica, para el tramo 18 se minimizo la ondulación presentada en el empalme con el puente, instalando una mezcla de gradación fina.

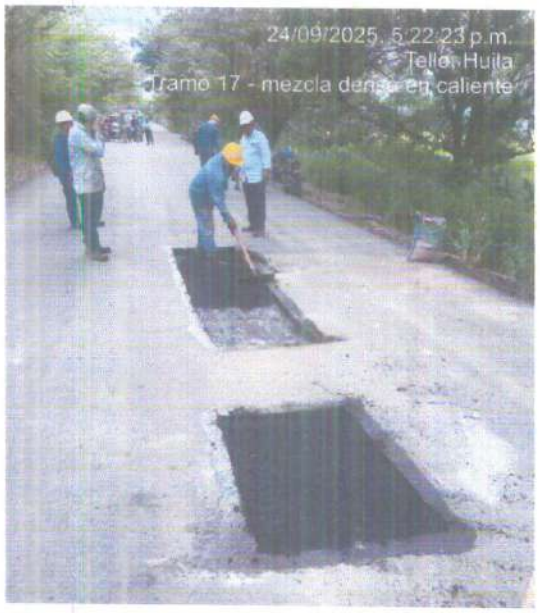

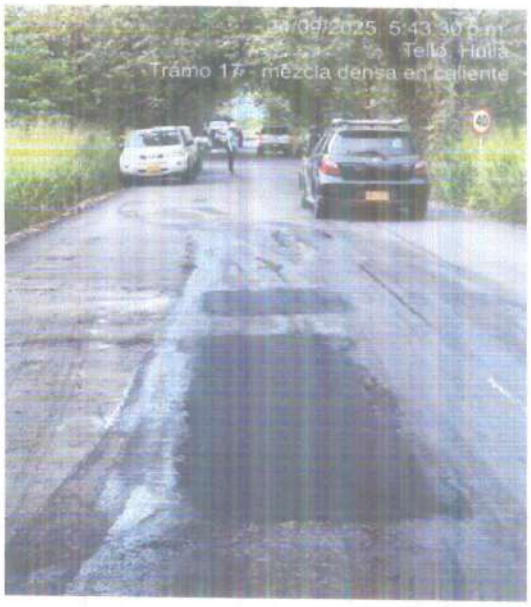

Registro fotográfico de Reparaciones en tramo 17 Realizadas el 24 de Septiembre de 2025

Mediante el acta de reunión No.10, el contratista de obra manifiesta haber reparado las fallas encontradas en los tramos 17 y 18 pero aun se estaba haciendo seguimiento al tramo 19, verificando el comportamiento de la mezcla asfáltica bajo la acción de cargas vehiculares.

2. Durante el recorrido realizado en los tramos 17 y 18 se pudo constatar por los asistentes y firmantes en la presente acta de comité, que dichas reparaciones permanecen en excelentes condiciones, esto fue producto de realizar un diagnostico y su posterior reparación efectiva, de esta manera se puede verificar que las condiciones de servicio y seguridad de estos tramos no se ven comprometidas y a su vez afectan la seguridad de los conductores, a continuación se deja registro fotográfico de los tramos mencionados y sus condiciones actuales.





Evidencia fotográfica del estado actual de reparaciones en tramo 17, abscisas 0+360 y 0+050 respectivamente.



Evidencia fotográfica del estado actual de reparación en tramo 18, abscisa 0+000 carril izquierdo

Posteriormente se realizó el recorrido en los puntos de interés en el tramo 19 entre las abscisas 0+350 y 0+550 y se verifico por parte de los firmantes de la presente acta que por la acción de cargas vehiculares, las ondulaciones habían reducido de tal manera que se volvieron imperceptibles al transitar por el sector, por lo anterior se concluye que las

condiciones de servicio y seguridad de este tramo no se ven comprometidas y que los conductores no correrán riesgo alguno.

3. Teniendo en cuenta que los tramos que presentaban afectaciones funcionales fueron corregidos por el contratista de obra, el contratista el pasado 5 de diciembre propuso mediante la comunicación CO-15-24-47 se hace necesario implementar otras medidas adicionales como el reforzamiento de la demarcación de la vía en estos puntos para alertar a los conductores de los cruces vehiculares de este tramo. Esta demarcación en los puntos de interés en el tramo 19 tendrá una fecha límite de realización el próximo 15 de febrero de 2026.

Por lo anterior expuesto, se concluye que los tramos 17, 18 y 19 fueron objeto de reparaciones conforme a las especificaciones de construcción de vías vigente y se constata por los presentes la aceptación de las reparaciones a satisfacción, se encuentra pendiente la demarcación en tramo 19 pero esto no afecta la funcionalidad y operatividad de la vía.

I. COMPROMISOS

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
1	*Demarcación de puntos de interés en tramo 19.*	*Consorcio Infraestructura JPN Tello*	*Plazo máximo hasta el 15 de Febrero de 2026*

Siendo las 12:00 PM, se dio por finalizada la sesión de esta reunión.

Firma,

CLAUDIO CÉSAR MEJÍA GUTIÉRREZ
Director de Obra
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director de Interventoría
CONSORCIO VG

ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES
Supervisor
Secretaria de Vías e Infraestructura – Gobernación del Huila

Anexo 5

Control Personal Obra

INGEMAQ SAS
DICIEMBRE 2025

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	105646585	95008044 43	Y	2026/01/06	2026/03/02	BANCO DE BOGOTA	55	$820,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	12232486	ALDANA JOSE		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA TELLO (7 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$9,964,500	$693,700		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS INDEPENDIENTES (7 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$9,964,500	$693,700		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (7 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$9,964,500	$693,700		$0	$0
2	CC	1083916902	ALDANA DYLAN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
3	CC	7684878	ALDANA FARYD		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
4	CC	7700880	BUSTOS WILSON		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
5	CC	1075220290	MANRIQUE JUAN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
6	CC	7707574	MOSQUERA JHON		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
7	CC	7714738	PERDOMO GUILLERMO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
8	CC	12137732	SOTO JOSE		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total Afiliados(8)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$11,388,000	$792,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$792,800	$27,300	$0	$820,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$792,800	$27,300	$0	$820,100
TOTAL				8	$792,800	$27,300	$0	$820,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143133943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	105558877	9500801546	E	2026/01/06	2026/03/02	BANCO DE BOGOTA	55	$11,989,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (15 Afiliados)						$15,943,200	$2,551,600			$17,366,700	$695,400			$17,366,700	$695,400			$17,366,700	$1,209,300		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (15 Afiliados)						**$15,943,200**	**$2,551,600**			**$17,366,700**	**$695,400**			**$17,366,700**	**$695,400**			**$17,366,700**	**$1,209,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (15 Afiliados)						**$15,943,200**	**$2,551,600**			**$17,366,700**	**$695,400**			**$17,366,700**	**$695,400**			**$17,366,700**	**$1,209,300**		**$0**	**$0**
1	CC	83247999	AYA OLIVER	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	7720952	BURGOS JOSE	230201	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF32	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
3	CC	1007778680	DIAZ RICARDO	231001	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF32	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
4	CC	1075246515	DUSSAN CARLOS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	1003809888	DUSSAN ESTEVAN	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF32	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
6	CC	1004035323	HERNANDEZ JAN	230201	10	$474,500	$76,000	EPS041	10	$474,500	$19,000	CCF32	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
7	CC	1077722003	JURADO JHOAN	230201	23	$1,091,350	$174,700	EPS041	23	$1,091,350	$43,700	CCF32	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
8	CC	12135091	MENDEZ OMAR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1073681021	MEZA NICOLAS	230301	19	$901,550	$144,300	EPS041	19	$901,550	$36,100	CCF32	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
10	CC	1004360617	MONTAÑO BAIRO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
11	CC	1094899055	MORALES ROOSELVET	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
12	CC	1117820219	RODRIGUEZ JERZON		0	$0	$0	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
13	CC	1075263571	RODRIGUEZ RONEI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS034	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
14	CC	1023907264	SOLER YEISON	230301	20	$949,000	$151,900	EPS034	20	$949,000	$38,000	CCF32	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
15	CC	1003893890	VARGAS JUAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA TELLO (16 Afiliados)						$20,266,050	$3,242,900			$23,689,550	$948,100			$23,689,550	$948,100			$23,689,550	$1,700,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS TELLO (3 Afiliados)						**$5,423,500**	**$867,800**			**$5,423,500**	**$217,000**			**$5,423,500**	**$217,000**			**$5,423,500**	**$28,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)						**$5,423,500**	**$867,800**			**$5,423,500**	**$217,000**			**$5,423,500**	**$217,000**			**$5,423,500**	**$28,400**		**$0**	**$0**
16	CC	1029880078	BUSTOS ANA	25-14	30	$1,623,500	$259,800	EPS005	30	$1,623,500	$65,000	CCF32	30	$1,623,500	$65,000	14-11	30	$1,623,500	$8,500	30	$0	$0
17	CC	1003819875	CHARRY KIMBERLY	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
18	CC	7729229	PEÑA MARIO	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS MAQUINARIA TELLO (5 Afiliados)						**$5,400,000**	**$864,000**			**$7,400,000**	**$296,000**			**$7,400,000**	**$296,000**			**$7,400,000**	**$515,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)						**$5,400,000**	**$864,000**			**$7,400,000**	**$296,000**			**$7,400,000**	**$296,000**			**$7,400,000**	**$515,200**		**$0**	**$0**
19	CC	1022359231	CORTES HUGO	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
20	CC	12121406	FERREIRA JOSE		0	$0	$0	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
21	CC	1082215917	ROJAS GUSTAVO	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
22	CC	1075289211	SANCHEZ HECTOR	230301	15	$800,000	$128,000	EPS005	15	$800,000	$32,000	CCF32	15	$800,000	$32,000	14-11	15	$800,000	$55,700	15	$0	$0
23	CC	1075253257	VIDALES CRISTHIAN	230201	15	$800,000	$128,000	EPS005	15	$800,000	$32,000	CCF32	15	$800,000	$32,000	14-11	15	$800,000	$55,700	15	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS TELLO (10 Afiliados)						**$9,442,550**	**$1,511,100**			**$10,866,050**	**$435,100**			**$10,866,050**	**$435,100**			**$10,866,050**	**$756,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (10 Afiliados)						**$9,442,550**	**$1,511,100**			**$10,866,050**	**$435,100**			**$10,866,050**	**$435,100**			**$10,866,050**	**$756,700**		**$0**	**$0**
24	CC	1075285580	ALVAREZ MILTON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
25	CC	83222367	CASTILLA MOISES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
26	CC	1003952896	DUSSAN ARMANDO	230201	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
27	CC	17667482	MEDINA ARCENIO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
28	CC	1082806583	MENDEZ EDINSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
29	CC	1004148007	SANCHEZ JAIME	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,376,050	$55,108	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
30	CC	83242768	SANCHEZ RICARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
31	CC	1003809603	SERRANO LUIS	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF32	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
32	CC	1003801176	VALDERRAMA DIEGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
33	CC	1080291570	ZAMBRANO WILLIAN	230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF32	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
Total	**Afiliados(33)**					**$36,209,250**	**$5,794,500**			**$41,056,250**	**$1,643,500**			**$41,056,250**	**$1,643,500**			**$41,056,250**	**$2,509,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$5,794,500	$199,100	$0	$5,993,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$980,100	$33,700	$0	$1,013,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$715,400	$24,600	$0	$740,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$2,952,800	$101,400	$0	$3,054,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,146,200	$39,400	$0	$1,185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$2,509,600	$86,200	$0	$2,595,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	33	$2,509,600	$86,200	$0	$2,595,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$1,643,500	$56,500	$0	$1,700,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	33	$1,643,500	$56,500	$0	$1,700,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				33	$1,643,500	$56,700	$0	$1,700,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$95,000	$3,300	$0	$98,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$2,000	$0	$59,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$751,800	$25,900	$0	$777,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$328,700	$11,300	$0	$340,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$411,000	$14,200	$0	$425,200
TOTAL				33	$11,591,100	$398,500	$0	$11,989,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS MBA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2026-01	88682469	95003497 33	E	2026/01/06	2026/02/25	BANCOLOMBIA	50	$1,875,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)					$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$297,300		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (3 Afiliados)					**$4,270,500**	**$683,400**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**	**$297,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)					$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$297,300		$0	$0
1	CC 1082805338	BERMEO DANIEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC 1007258395	BERMEO HERMES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC 83222237	CASILIMA GABRIEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA TELLO (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$111,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS MAQUINARIA TELLO (1 Afiliados)					**$1,600,000**	**$256,000**			**$1,600,000**	**$64,000**			**$1,600,000**	**$64,000**			**$1,600,000**	**$111,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$111,400		$0	$0
4	CC 4898798	OSPINA LUIS	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
Total Afiliados(4)					**$5,870,500**	**$939,400**			**$5,870,500**	**$235,000**			**$5,870,500**	**$235,000**			**$5,870,500**	**$408,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$939,400	$29,300	$0	$968,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$483,800	$15,100	$0	$498,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$14,200	$0	$469,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$408,700	$12,800	$0	$421,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$408,700	$12,800	$0	$421,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$235,000	$7,400	$0	$242,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	$235,000	$7,400	$0	$242,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$235,000	$7,400	$0	$242,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$1,800	$0	$58,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$178,000	$5,600	$0	$183,600
TOTAL				4	$1,818,100	$56,900	$0	$1,875,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	57035748	9499590742	E	2026/01/06	2026/02/12	BANCO DE BOGOTA	37	$1,382,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA TELLO (4 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$6,829,384	$273,300			$6,829,384	$218,200			$6,829,384	$379,700		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS MAQUINARIA TELLO (4 Afiliados)						**$3,000,000**	**$480,000**			**$6,829,384**	**$273,300**			**$6,829,384**	**$218,200**			**$6,829,384**	**$379,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)						**$3,000,000**	**$480,000**			**$6,829,384**	**$273,300**			**$6,829,384**	**$218,200**			**$6,829,384**	**$379,700**		**$0**	**$0**
1	CC	98654028	REGINO CARLOS	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
2	CC	4890672	SANCHEZ MILLER		0	$0	$0	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$0	14-11	3	$142,350	$0	3	$0	$0
3	CC	4890672	SANCHEZ MILLER		0	$0	$0	EPS037	1	$53,334	$2,200	CCF32	1	$53,334	$2,200	14-11	1	$53,334	$3,800	1	$0	$0
4	CC	4890672	SANCHEZ MILLER		0	$0	$0	EPS037	26	$1,233,700	$48,400	CCF32	26	$1,233,700	$0	14-11	26	$1,233,700	$0	26	$0	$0
5	CC	79253676	SIERRA PEDRO		0	$0	$0	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
6	CC	79234377	VARGAS LUIS		0	$0	$0	EPS037	15	$800,000	$32,000	CCF32	15	$800,000	$32,000	14-11	15	$800,000	$55,700	15	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$3,000,000	$480,000			$6,829,384	$273,300			$6,829,384	$218,200			$6,829,384	$379,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$11,000	$0	$491,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$11,000	$0	$491,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$379,700	$8,700	$0	$388,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$379,700	$8,700	$0	$388,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$218,200	$5,000	$0	$223,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	$218,200	$5,000	$0	$223,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$273,300	$6,300	$0	$279,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$209,300	$4,800	$0	$214,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$64,000	$1,500	$0	$65,500
TOTAL				4	$1,351,200	$31,000	$0	$1,382,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS MBA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143133943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	60044601	9499650629	E	2026/01/06	2026/02/13	BANCO DE BOGOTA	38	$451,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA TELLO (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS TELLO (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	4943631	REYES EVERLEDETH	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$5,400	$0	$233,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$5,400	$0	$233,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$2,400	$0	$101,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$2,400	$0	$101,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$1,400	$0	$58,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$57,000	$1,400	$0	$58,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$1,400	$0	$58,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$1,400	$0	$58,400
TOTAL				1	$440,900	$10,600	$0	$451,500

JPN TELLO DICIEMBRE 2025

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901785282	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	CALLE 104 No 14A 45 OF 401	TELLO-HUILA	2150482	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	57069876	9499591778	E	2026/01/22	2026/02/12	BANCO DE BOGOTA	21	$3,015,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO (5 Afiliados)						$9,194,000	$1,471,200			$9,194,000	$368,000			$12,409,865	$496,700			$9,194,000	$640,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (5 Afiliados)						**$9,194,000**	**$1,471,200**			**$9,194,000**	**$368,000**			**$12,409,865**	**$496,700**			**$9,194,000**	**$640,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: TELLO Depto: HUILA (5 Afiliados)						**$9,194,000**	**$1,471,200**			**$9,194,000**	**$368,000**			**$12,409,865**	**$496,700**			**$9,194,000**	**$640,000**		**$0**	**$0**
1	CC	1082804794	ALDANA MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$2,040,350	$81,700	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1075243622	GALLEGO HAMER	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF32	30	$4,375,000	$175,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
3	CC	1082804610	LOPEZ ANLLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$2,040,350	$81,700	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1082803924	MARTINEZ YASMIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,913,815	$76,608	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	26586026	OLIVEROS MAGALY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$2,040,350	$81,700	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			**$9,194,000**	**$1,471,200**			**$9,194,000**	**$368,000**			**$12,409,865**	**$496,700**			**$9,194,000**	**$640,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,471,200	$19,400	$0	$1,490,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,243,400	$16,400	$0	$1,259,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$3,000	$0	$230,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$640,000	$8,400	$0	$648,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	5	$640,000	$8,400	$0	$648,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$496,700	$6,600	$0	$503,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$496,700	$6,600	$0	$503,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$368,000	$5,000	$0	$373,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$140,000	$1,900	$0	$141,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$800	$0	$57,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$171,000	$2,300	$0	$173,300
TOTAL				5	$2,975,900	$39,400	$0	$3,015,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901785282	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	CALLE 104 No 14A 45 OF 401	TELLO-HUILA	2150482	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	105670684	9500805196	E	2026/01/22	2026/03/02	BANCO DE BOGOTA	39	$4,974,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO (6 Afiliados)					$12,900,000	$2,064,000			$16,900,000	$676,000			$23,466,942	$938,900			$16,900,000	$1,176,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (6 Afiliados)					**$12,900,000**	**$2,064,000**			**$16,900,000**	**$676,000**			**$23,466,942**	**$938,900**			**$16,900,000**	**$1,176,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: TELLO Depto: HUILA (6 Afiliados)					**$12,900,000**	**$2,064,000**			**$16,900,000**	**$676,000**			**$23,466,942**	**$938,900**			**$16,900,000**	**$1,176,300**		**$0**	**$0**
1	CC	1081154423	CHARRY CAMILO	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF32	30	$2,158,609	$86,400	14-7	30	$1,900,000	$133,300	30	$0	$0
2	CC	12101945	CUBIDES AURELIO		0	$0	$0	EPS065	30	$4,000,000	$160,000	CCF32	30	$5,733,333	$229,400	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
3	CC	12138187	MEJIA CLAUDIO	231001	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF32	30	$5,733,333	$229,400	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
4	CC	1078778338	PERDOMO DANIELA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,866,667	$114,700	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
5	CC	1075246303	PERDOMO EDGAR	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$4,300,000	$172,000	14-7	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
6	CC	1079184726	SALAS NASLY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,675,000	$107,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**				**$12,900,000**	**$2,064,000**			**$16,900,000**	**$676,000**			**$23,466,942**	**$938,900**			**$16,900,000**	**$1,176,300**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$2,064,000	$50,800	$0	$2,114,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$640,000	$15,800	$0	$655,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$11,800	$0	$491,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$944,000	$23,200	$0	$967,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,176,300	$28,900	$0	$1,205,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	6	$1,176,300	$28,900	$0	$1,205,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$938,900	$23,100	$0	$962,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	$938,900	$23,100	$0	$962,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$676,000	$16,700	$0	$692,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$516,000	$12,700	$0	$528,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,000	$4,000	$0	$164,000
TOTAL				6	$4,855,200	$119,500	$0	$4,974,700

Anexo 6
Informe SST

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA No. 015 DE 2024:

OBJETO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA:

10/12/2025

CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO

INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VG

DICIEMBRE
2025

CONTENIDO

1 INTRODUCCION 5
2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 6
3 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
4 INDUCCION 8
ANEXO 1. Registro de asistencia inducción 8
4.1 Registro fotográfico 8
5 EXAMENES MEDICO LABORALES 9
5.1 Exámenes de ingreso 9
ANEXO 2. Examenes de ingreso mes de Diciembre. 9
5.2 Exámenes de egreso 10
ANEXO 3. Examenes egresos 11
6 RECURSOS 11
7 AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL 11
Relación personal Diciembre 2025. 12
ANEXO 4. Afiliaciones mes de Diciembre 12
7.1 PLANILA SEGURIDAD SOCIAL 12
7.1.1 . RELACION DE PERSONAL 12
ANEXO 5. Planillas seguridad social. 13
8 CHARLAS DE SEGURIDAD 13
ANEXO 6. Registros de asistencia mes de diciembre. 14
8.1.1 Registro fotográfico 15
9 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO 16
ANEXO 7. Acta del cierre del COPASST. 16
10 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 16
ANEXO 8. Acta del cierre del Comite de Convivencia Laboral (CCL). 16
11 BRIGADAS DE EMERGENCIA 17
ANEXO 9. Acta del cierre brigadas de emergencia. 17
12 CONTROL DE VEHICULOS 17
13 INSPECCIONES 19
13.1 Inspección de vehículos y maquinaria 19
13.2 Registro de maquinaria. 19
ANEXO 10. Inspecciones Pre operacionales de maquinaria mes de diciembre 20

13.3 Registro fotografico. 20
13.4 INSPECCION EQUIPOS DE EMERGENCIA 20
14 DOTACION Y EPP 20
15 ACCIDENTES DE TRABAJO 21
16 MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS 21
17 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL 22
17.1 Conformación del grupo de gestión social y ambiental 22
ANEXO 11. Acta del cierre del grupo de Gestión Social y Ambiental. 22
17.2 Capacitación ambiental al personal en obra 22
17.3 Cumplimiento de los requisitos legales 23
17.3.1 Indicador 24
El soporte se encuentra en el informe N° 5 del mes de junio ANEXO 16. Titulo minero 24
18 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 24
18.1 Almacenamiento y manejo integral de los materiales deconstrucción. 24
18.1.1 Indicador 25
18.2 Señalización frentes de obra y sitios temporales 25
18.2.1 Indicador 26
18.2.2 Registro fotográfico 26
18.3 Presupuesto PMT 26
18.3.1 Registro fotográfico 27
18.4 PRESUPUESTO PMA 28
ANEXO 12. Facturas PMA y PMT 29
19 Manejo y disposicion final de escombros 29
19.1 Durante el periodo de diciembre se han gestionado diferentes Permisos para la Disposición Final del Material de excavación, el cual autoriza la disposición adecuada de los residuos y materiales sobrantes generados durante la ejecución de la obra. 29
ANEXO 13. Certificado paz y salvo "disposicion final de material". 29
19.1.1 Indicador 29
19.2 Especiales 30
19.3 Registro fotográfico 30
19.4 Orden y Aseo 31
19.4.1 Registro fotográfico 32
20 GESTION RECURSO HIDRICO 33

20.1 Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales 33
21 MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES 33
21.1 Indicador 33
21.2 Manejo de maquinaria equipos y vehículos 33
21.2.1 Indicador 34
22 GESTIÓN SOCIAL 34
22.1 Localización del proyecto 34
22.2 Proyecto de atención a la comunidad 35
22.2.1 Registro fotográfico 35
22.3 Información y divulgación 35
22.3.1 Indicador 35
22.3.2 Conformación de veedurias. 36
ANEXO 14. Acta del cierre de veedurias. 37
22.4 Directorio del municipio de Tello 37
22.5 Contratación mano de obra 38
22.5.1 Indicador 38
(11/11)*100 Número de trabajadores contratados del área de influencia/por Número de trabajadores en obra x100% donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento del indicador 38
23 Perfil Sociodemográfico. 39
ANEXO 15. Perfil sociodemográfico se encuentra "Actualizado" 39

1 INTRODUCCION

El presente documento relaciona las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo, realizadas en la ejecución del proyecto **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 15 DE 2024, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es un pilar fundamental de la empresa, ya que busca garantizar condiciones laborales seguras, prevenir accidentes y proteger el bienestar físico y mental de los trabajadores. A través de la identificación, evaluación y control de riesgos, se promueve un entorno de trabajo saludable y eficiente.

La ejecución de medidas de SST no solo cumple con normativas legales, sino que también mejora la productividad, reduce costos asociados a incidentes laborales y fortalece la cultura organizacional. Una adecuada gestión de la seguridad laboral es clave para fomentar el compromiso de los trabajadores y garantizar la sostenibilidad de la empresa

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la construcción de 5,33 km de pavimento flexible, donde se incluye el fresado de pavimento asfáltico, conformación de calzada, construcción de estructura de pavimento en base y sub base granular, mezcla densa en caliente MDC-19, riego de imprimación, construcción de filtros, fundición cunetas, muros en gaviones y líneas de demarcación para la señalización horizontal.

DESCRIPCION	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT:	901.785.282-7
CONTRATO No.:	015 DE 2024
OBJETO.:	REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA
VALOR INICIAL:	$ 8.258.002.715,00
VALOR ADICIONAL:	$ 3.370.776.617,36
VALOR ACTUALIZADO:	$ 11.628.779.332,36
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE SUSPENSION No 1:	26 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE REINICIO No 1:	05 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	10 DE DICIEMBRE DE 2025

3 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es un modelo estructurado que permite a las empresas identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales con el propósito de prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. Su ejecución es un requisito legal, el cual está diseñado para mejorar continuamente las condiciones de trabajo, promoviendo un ambiente seguro y saludable para los empleados.

Un SG-SST bien ejecutado no solo protege la vida y la salud de los trabajadores, sino que también beneficia a la empresa al reducir costos asociados a incidentes laborales, mejorar la moral del equipo y fortalecer la reputación de la organización. Su correcta gestión contribuye a crear un entorno laboral más seguro, cumpliendo con las normativas legales y promoviendo el bienestar de todos los colaboradores.

4 INDUCCION

La **inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)** es un proceso fundamental para garantizar que todos los trabajadores de la obra conozcan los riesgos laborales y las medidas preventivas que deben seguir para desarrollar sus actividades de manera segura.


En la inducción al personal se les dio a conocer la siguiente información:

- Explicar las Normas y procedimientos de seguridad que deben cumplir.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos asociados a la ejecución de sus actividades.
- Reglamento y horarios de trabajo.
- Capacitar sobre en el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal (EPP).
- Sensibilizar sobre la importancia de la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

NUMERO DE INDUCCIONES REALIZADAS EN EL MES DEL AÑ0 2025	
DICIEMBRE	1

ANEXO 1. Registro de asistencia inducción.

4.1 Registro fotográfico

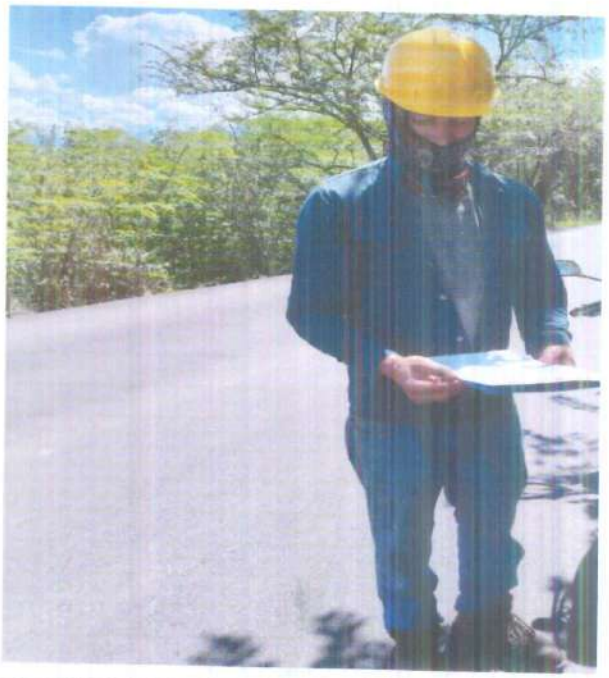

5 EXAMENES MEDICO LABORALES

En cumplimento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores, se han realizado los **exámenes médicos laborales** requeridos para la ejecución de las actividades en obra.

Estos exámenes permiten evaluar la condición física y aptitud médica del personal, asegurando que se encuentren en condiciones óptimas para desempeñar sus funciones sin riesgo para su bienestar.

- Todos los trabajadores han sido evaluados de acuerdo con el perfil ocupacional de su cargo.
- Se cuenta con los certificados médicos que respaldan la aptitud del personal.
- Se garantiza la confidencialidad de los resultados y el cumplimiento de la normatividad en salud ocupacional.

La realización de estos exámenes médicos contribuye a la prevención de enfermedades laborales y refuerza el compromiso de la empresa con la seguridad y el bienestar de su equipo de trabajo.

5.1 Exámenes de ingreso

- Verificar que el trabajador se encuentra **apto física y mentalmente** para desempeñar el cargo.
- Identificar condiciones de salud preexistentes.
- Garantizar que las tareas asignadas no representen un riesgo para su salud ni para la de terceros.

Personal que realizaron los exámenes de ingreso el mes de diciembre

NOMBRE	CEDULA	CARGO
JAIME ANDRES FERRO SANCHEZ	1.004.148..007	AYUDNATE DE OBRA

ANEXO 2. Examenes de ingreso mes de Diciembre.

5.2 *Exámenes de egreso*

- Evaluar el estado de salud Del trabajador al momento de su retiro.
- Identificar si se produjo algún deterioro relacionado con la exposición a factores de riesgo Durante su permanencia en la empresa.
- Dejar un registro clínico oficial que pueda usarse en caso de reclamaciones o procesos legales.

Nota: Del 1 al 10 de diciembre no se relacionan egresos porque no se presentaron, se reportaron con fecha del 13 al 31 de diciembre del 2025.

NOMBRE	CARGO	FECHA DE SALIDA
JAN CARLOS HERNANDEZ JIMENEZ	AYUDANTE CUENTAS	13/12/2025
RICARDO DIAZ WALTERO	AYUDANTE CUENTAS	19/12/2025
JOSE LUIS BURGOS	AYUDANTE GAVIONES	20/12/2025
NICOLAS ANDREY MESA	AYUDANTE GAVIONES	19/12/2025
YEISON SOLER MONTOLLA	AYUDANTE CUENTAS	20/12/2025
ESTEVAN DUSSAN	AYUDANTE CUENTAS	20 /12/2025
AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	ING. RESIDENTE	31/12/2025
HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	TOPOGRAFO	31/12/2025
CAMILO ANDRES CHARRY	CADENERO 1	31/12/2025
DANIELA PERDOMO HORTA	PROFESIONAL SST	31/12/2025
NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	PROFESIONAL SST	31/12/2025
AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	ING. RESIDENTE	31/12/2025
HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	TOPOGRAFO	31/12/2025
ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	CONTROLADORA VIAL	31/12/2025
MAGALY OLIVEROS SOTTO	CONTROLADORA VIAL	31/12/2025
MARIA EDITH ALDANA HOYOS	CONTROLADORA VIAL	31/12/2025
YASMIN ROCIO MARTINEZ	CONTROLADORA VIAL	31/12/2025

ANEXO 3. Examenes egresos

6 RECURSOS

6.1. Recursos humanos

Responsable del SG-SST: Profesional en seguridad y salud en el trabajo encargado de la gestión y supervisión del sistema.

Nombre Profesional	Cargo
Nasly Melisa Salas Sánchez	Profesional SST
Daniela Perdomo Horta	Profesional SST

6.2. Recursos técnicos

- Equipos de Protección Personal (EPP): Cascos, guantes, gafas de seguridad, botas punta de acero, chalecos reflectivos, entre otros.
- Señalización y demarcación: Avisos de prevención, zonas de riesgo y prohibiciones.
- Herramientas y equipos seguros: Equipos en buen estado, revisados periódicamente para evitar fallos o accidentes.

6.3. Recursos financieros

- Presupuesto para la seguridad y salud en el trabajo: Inversión en capacitación, compra de EPP, señalización y equipos de seguridad.

7 AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo con las obligaciones contractuales y en cumplimiento del pliego de condiciones, se han realizado las respectivas afiliaciones del personal que ejecuta el contrato a los sistemas de seguridad social obligatorios. Estas afiliaciones incluyen:

- Administradora de Riesgos Laborales (ARL): Garantiza la cobertura en caso de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Fondo de Pensiones: Asegura la cotización para la jubilación o protección en casos de invalidez o fallecimiento.
- Sistema de Salud: Proporciona acceso a servicios médicos y prestaciones asistenciales.

Se cuenta con los soportes correspondientes que evidencian la afiliación y pago de aportes Del personal vinculado. Además, se Han implementado medidas de control para garantizar el cumplimiento continuo de estas obligaciones durante la ejecución del contrato.

Relación personal Diciembre 2025.

NOMBRE	CEDULA	CARGO
JAIME ANDRES FERRO SANCHEZ	1.004.148..007	AYUDANTE DE OBRA

ANEXO 4. Afiliaciones mes de Diciembre.

7.1 PLANILA SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento de la normatividad legal vigente en Colombia y de las obligaciones contractuales establecidas, la empresa realizo el pago de la **Planilla Integrada de Liquidación de Aportes**, como evidencia del cumplimiento de las afiliaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral para el personal vinculado al proyecto.

7.1.1 . RELACION DE PERSONAL

Relación personal mes de Diciembre.

PERSONAL CONSORCIO JPN

NOMBRE	CEDULA	CARGO
CLAUDIO MEJIA GUTIERREZ	12.138.187	ING. DIRECTOR
EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE
AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE
HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO
CAMILO ANDRES CHARRY	1.081.154.423	CADENERO 1
ANLLY ASTRRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA
MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA
MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA
DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST
YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA
NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST

PERSONAL INGENIERIA Y EQUIPOS MA SAS

GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE. RETRO EXCAVADORA
LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR
RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE
MILLER SANCHEZ LEON	4.980.672	CONDUCTOR DE VOLQUETA
MILTON ANDRES ALVAREZ	1.075.285.580	OFICIAL
DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFICIAL
EVERLEDETH REYES DIAZ	83.242.741	AYUDANTE
EDINSON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE
OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR VOQLUETA
CASILIMA PERDOMO MOISES	83.222.367	AYUDANTE
GABRIEL CASILIMA	83.222.237	AYUDANTE
HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR VOLQUETA
PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR VOQUETA
LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR VOLQUETA
CARLOS ARTURO REGINO	98.654.023	OPE. MOTONIVELADORA
JOSE LUIS BURGOS	7.720.952	AYUDANTE
NICOLAS ANDREI MEZA MUÑOZ	1.073.681.021	AYUDANTE
OLIVER AYA GONZALES	83.247.999	AYUDANTE
OMAR MENDEZ ARMANZA	12.135.091	AYUDANTE
RICARDO DIAZ GUALTEROS	1.007.778.680	AYUDANTE
HERMES BERMEO CADENA	1.007.258395	AYUDANTE
DANIEL BERMEO	1.082.805.338	AYUDANTE
JAN CARLOS HERNANDEZ	1.004.035.323	AYUDANTE
YEISON SOLER MONTOYA	1.023.907.264	AYUDANTE

ANEXO 5. Planillas seguridad social.

8 CHARLAS DE SEGURIDAD

En cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, antes de iniciar la jornada laboral se realizan charlas de seguridad con el objetivo de informar y sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de la prevención de riesgos.

Estas charlas reflejan el compromiso de la empresa contratista con la seguridad y el bienestar del personal, permitiendo:

- Analizar situaciones que podrían derivar en accidentes.
- Evaluar los riesgos a los cuales están expuestos en la ejecución de las actividades.
- Identificar y aplicar medidas de control adecuadas.

El profesional SST es el encargado de dirigir estas charlas diarias, explicando las tareas programadas, los riesgos asociados y las acciones preventivas a implementar.
La capacitación o charla pre operacional es de carácter obligatorio y debe realizarse todos los días antes del inicio de las actividades con la participación de todo el personal de obra.
Se llevan registros de asistencia y temas tratados durante el mes de diciembre.

FECHA	TEMA
1/12/2025	Movimientos repetitivos
2/12/2025	Procedimientos seguros sst
3/12/2025	Seguridad vial
4/12/2025	Orden y aseo
5/12/2025	Actos y condiciones inseguras
6/12/2025	Trabajo en equipo
9/12/2025	Recoleccion de residuos
10/12/2025	Prevencion de accidentes de trabajo

ANEXO 6. Registros de asistencia mes de diciembre.

8.1.1 Registro fotográfico









9 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

En cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se encuentra conformado el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST, el cual tiene como función principal la promoción y vigilancia del cumplimiento de las normas y programas de prevención de riesgos laborales dentro de la obra.

NOTA: El acta de conformación reposa en el informe No. 2 del mes de marzo del 2025 , Actualización del copasst reposa en el informe N° 5 ANEXO 8.

Cabe resaltar que con la terminación contractual del Proyecto y finalización total de las actividades operativas en obra, cesan las Condiciones que dieron origen a la conformación del COPASST, para este contrato especifico.
Se deja constancia del cierre formal del COPASST.

ANEXO 7. Acta del cierre del COPASST.

10 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y bienestar organizacional, se encuentra conformado el **Comité de Convivencia Laboral (CCL)**, con el propósito de prevenir y atender situaciones de acoso laboral, promoviendo un ambiente de trabajo sano, respetuoso y armonioso.

NOTA: El acta de conformación reposa en el informe No. 2 del mes de marzo del 2025.
NOTA: Actualizacion del COCOLA reposa en el informe N° 5 ANEXO 9.

Cabe resaltar que con la terminación contractual del Proyecto y finalización total de las actividades operativas en obra, cesan las Condiciones que dieron origen a la conformación del Comite de Convivencia Laboral para este contrato especifico.
Se deja constancia del cierre formal del CCL.

ANEXO 8. Acta del cierre del Comite de Convivencia Laboral (CCL).

11 BRIGADAS DE EMERGENCIA

En cumplimiento del Plan de Emergencias y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se encuentran conformadas las Brigadas de Emergencia, con el propósito de garantizar:

- Actuar de manera organizada y eficiente ante situaciones de emergencia.
- Proteger la vida e integridad de los trabajadores y visitantes en la obra.
- Coordinar acciones de prevención, atención y recuperación en caso de incidentes.
- Reducir el impacto de emergencias mediante respuestas rápidas y efectivas.

NOTA: El acta de conformación reposa en el informe No. 2 del mes de marzo del 2025.

Cabe resaltar que con la terminación contractual del Proyecto y finalización total de las actividades operativas en obra, cesan las Condiciones que dieron origen a la conformación de las brigadas de emergencia para este contrato especifico. Se deja constancia del cierre formal de las brigadas de emergencia.

ANEXO 9. Acta del cierre brigadas de emergencia.

12 CONTROL DE VEHICULOS

El control adecuado de vehículos livianos, pesados y maquinaria amarilla es clave para la seguridad vial en la obra. Implementar protocolos de inspección, mantenimiento y capacitación ayuda a reducir riesgos, mejorar la eficiencia operativa y cumplir con la normativa vigentes.
Durante el mes de diciembre el consorcio conto con vehículos Livianos, pesados y maquina amarilla para la ejecución de actividades en obra, se relacionan a continuación.

Relación maquinaria mes de diciembre

LISTADO DE MAQUINARIA AMARILLA

No.	MAQUINARIA	MARCA	REFERENCIA	MODELO	TARJETA REGISTRO
1	Motoniveladora	Champión	710 a	1989	157-694-19629
2	Motoniveladora	Champión	715 a	2006	715ª-101-0705-2
3	Retroexcavadora	Caterpilar	320 D	2008	CPPAB06905
4	Retroexcavadora	Caterpilar	320 CL	2006	CAT0320CPPAB06905
5	Vibro compactador	Dynapac	CA125D	1998	64220324
6	Vibro compactador	Dynapac	CA 15	1989	MC107136
7	Finisher	Rodatec	207 with eagle	2006	RP-190

LISTADO DE VEHICULOS LIVIANOS

No.	VEHICULO	MARCA	REFERENCIA	MODELO	PLACA
1	Camioneta	CHEVROLET	LUV D MAX DSL	2006	CMQ 423
2	Camioneta	FORD	RANGER	2012	TDS 050

LISTADO DE VOLQUETAS

No.	VEHICULO	MARCA	REFERENCIA	MODELO	PLACA
1	VOLQUETA	CHEVROLET	C 70 149	1998	OWH 749
2	VOLQUETA	CHEVROLET	C 70 149	1983	OZD 276
3	VOLQUETA	CHEVROLET	C 79 189	1982	OWH 442

NOTA: La documentación de maquinaria reposa en el informe 1 del mes de febrero e informe 3 del mes de abril.

Cabe resaltar que para el mes de diciembre contamos con la misma documentación.

13 INSPECCIONES

13.1 Inspección de vehículos y maquinaria

Las inspecciones de seguridad y pre operacionales de maquinaria son estrategias preventivas implementadas por la empresa para ientificar peligros y controlar riesgos antes de que puedan ocasionar daños a los trabajadores o afectar el entorno donde se desarrollan las actividades.

A través de estas inspecciones se busca:

- Verificar el estado mecánico y operativo de la maquinaria.
- Detectar posibles fallas o condiciones inseguras que puedan generar accidentes.
- Asegurar que los equipos cumplan con las normas de seguridad y mantenimiento establecidas.
- Evaluar el correcto uso de los sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria.

Estas inspecciones son realizadas antes del inicio de cada jornada laboral o previo a la operación de cualquier equipo, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y minimizar riesgos.

Se lleva un registro detallado de cada inspección y documentando.

13.2 Registro de maquinaria.

Registro de maquinaria diciembre.

NOMBRE	CODIGO
Volqueta	OWH 749
Volqueta	OZD 276
Volqueta	OWH 442
Motoniveladora	710 A
Retro excavadora	CAT 320 CL
Vibrocompactador	CA 152
Finisher	Rodatec RP-190

ANEXO 10. Inspecciones Pre operacionales de maquinaria mes de diciembre

13.3 Registro fotografico.





13.4 INSPECCION EQUIPOS DE EMERGENCIA

Las inspecciones a los equipos de emergencia se realiza, con el objetivo de verificar su estado, funcionamiento y disponibilidad, garantizando una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad en la obra.

En la locación contamos con

- Camilla de emergencia con inmovilizador cervical
- Extintores
- Botiquines
- Kit antiderrame

Nota: Durante el mes de diciembre no se realizaron inspecciones a los equipos de emergencia.

14 DOTACION Y EPP

En cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, se ha realizado la entrega de dotación y elementos de protección personal (EPP) a los trabajadores vinculados a la obra, garantizando su seguridad y bienestar durante la ejecución de las actividades.

La dotación y los EPP suministrados cumplen con los estándares de calidad y normativas vigentes, asegurando su adecuada protección. Entre los elementos entregados se encuentran:

- Protección para la cabeza: Casco de seguridad con suspensión ajustable.
- Protección ocular y facial: Gafas de seguridad
- Protección auditiva: Tapones o protectores auditivos.
- Protección respiratoria: Tapabocas.
- Protección de manos: Guantes de seguridad
- Protección corporal: Pantalón, camisas y chaleco reflectivo para alta visibilidad.
- Protección de pies: Botas de seguridad con puntera de acero.

Se ha registrado la entrega de los elementos a cada trabajador mediante actas de recepción firmadas, Como también se capacita al personal en el uso correcto de los elementos entregados y su mantenimiento.
El suministro y control de la dotación y los EPP hacen parte del compromiso de la empresa con la seguridad y salud en el trabajo, minimizando riesgos y garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

Nota: Durante este periodo no se realizaron entrega de epp

15 ACCIDENTES DE TRABAJO

Un accidente de trabajo es todo suceso que cause daño o perjuicio a la salud del trabajador mientras desempeña sus actividades laborales, ya sea en el lugar de trabajo o durante el desempeño de las labores, siempre que exista una relación directa con la actividad laboral.

Nota: Durante este periodo no se evidenciaron accidentes de trabajo

16 MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS

La Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPER) es una herramienta fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), mediante la cual se identifican, analizan y valoran los riesgos a los que están expuestos los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades laborales.

Esta matriz permite determinar el nivel de riesgo de cada actividad, establecer controles existentes y proponer medidas de intervención para prevenir accidentes, enfermedades laborales y daños a la propiedad o al medio ambiente.

NOTA: La matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos reposa en el informe No.2 del mes de marzo del 2025.

17 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL

Es un instrumento de planificación y ejecución ambiental diseñado para garantizar la incorporación efectiva de criterios de sostenibilidad ambiental en el proyecto, desde la etapa de diseño hasta la construcción, operación, mantenimiento y cierre. Este programa busca prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos derivados de actividades humanas.

El DAGA no solo busca cumplir con las exigencias legales y normativas ambientales, sino también establecer una cultura organizacional orientada al respeto por el medio ambiente, al uso eficiente de los recursos y a la participación de todo el personal del proyecto.

17.1 Conformación del grupo de gestión social y ambiental

Durante el mes de mayo, se llevó a cabo la conformación del grupo de gestión ambiental, garantizando el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa de la GUIA Ambiental (PAGA).

Nota: El anexo correspondiente del Acta de Conformación del Grupo Ambiental reposa en el informe del mes de mayo.

Cabe resaltar que con la terminación contractual del Proyecto y finalización total de las actividades operativas en obra, cesan las Condiciones que dieron origen a la conformación del grupo de gestión social y ambiental para este contrato especifico.

Se deja constancia del cierre formal del grupo de gestión social y ambiental.

ANEXO 11. Acta del cierre del grupo de Gestión Social y Ambiental.

17.1.1. Indicador

(4/4) *100= 100% Siendo (Número de profesionales contratados/Número de profesionales Requeridos)

*100 donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

17.2 Capacitación ambiental al personal en obra

Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo charlas de sensibilización ambiental dirigidas al personal operativo y técnico de la obra, con enfoque en los siguientes temas clave:

- Orden y aseo en los puestos de trabajo en frentes de trabajo y zonas comunes.
- Clasificacion de residuos.

Estas actividades formaron parte de las acciones del Programa de Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental (DAGA), con el objetivo de reducir los impactos ambientales generados por las actividades constructivas, promover el cumplimiento de las medidas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y fomentar una cultura ambiental responsable dentro del equipo de trabajo.

(2/2) *100= 100% Siendo (Número de profesionales contratados/Número de profesionales Requeridos
*100 donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

17.3 Cumplimiento de los requisitos legales

En cumplimiento de la normativa ambiental vigente para el desarrollo del proyecto, se cuenta con el abastecimiento de materiales provenientes de la empresa **Construcciones Lagos Ltda.**, la cual posee un título minero vigente que la habilita legalmente para la explotación y comercialización de materiales de construcción.

Esta empresa cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental y minera, garantizando que los materiales suministrados al proyecto:

- Provienen de fuentes autorizadas y con licencia ambiental.
- Cuentan con los permisos y autorizaciones requeridos por la autoridad competente.
- Se extraen bajo criterios técnicos y ambientales que minimizan el impacto al entorno natural.

El abastecimiento responsable de materiales es una parte fundamental del Programa de Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental (DAGA), ya que contribuye al cumplimiento de los requisitos legales, al uso sostenible de los recursos naturales y a la trazabilidad de las materias primas utilizadas en obra.

Nota: Titulo minero y licencia ambiental reposa en el informe # 3 ANEXO 12.

17.3.1 Indicador

(2/2) *100= 100% Siendo (Número de Permisos otorgados /Número de Permisos requeridos
*100 donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

El soporte se encuentra en el informe N° 5 del mes de junio ANEXO 16. Titulo minero .

18 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

18.1 Almacenamiento y manejo integral de los materiales deconstrucción.

Durante el periodo correspondiente al mes de diciembre (1) acopio de material en obra. Todo el material requerido para las actividades constructivas fue transportado directamente desde la planta de producción (empresa Construcciones Lagos Ltda.) hasta los puntos específicos de utilización en el frente de trabajo.



Esta modalidad de operación responde a una estrategia de optimización logística y ambiental, con los siguientes beneficios:

- Reducción de riesgos ambientales asociados al almacenamiento prolongado de materiales (dispersión de partículas, escurrimientos, contaminación del suelo).
- Minimización del uso de áreas de acopio, evitando la afectación de zonas naturales o espacios improductivos.
- Mejor control del volumen de materiales ingresados y utilizados, lo que contribuye a una gestión más eficiente de los recursos.

18.1.1 Indicador

(2/2)*100 Número de acopios debidamente demarcados y señalizados / Número de acopios de material de obra

*100 donde los demuestran que no fueron establecidos para este periodo.

18.2 Señalización frentes de obra y sitios temporales

De acuerdo al plan de manejo de tránsito (PMT) La señalización de la obra es un elemento fundamental para garantizar la seguridad de los trabajadores, peatones y conductores que transitan por la zona de intervención. Su correcta implementación permite informar, advertir y regular la circulación, minimizando riesgos y evitando accidentes.

La señalización vial debe cumplir con las normativas vigentes y ser visible en todo momento, asegurando que los usuarios de la vía puedan identificar oportunamente las condiciones del tránsito y las restricciones generadas por la obra.

Diariamente se realiza una verificación de la señalización para garantizar su correcto estado y visibilidad, asegurando que:

- Las señales estén bien ubicadas y en condiciones óptimas.
- Los dispositivos de seguridad cumplan su función.
- Se implementen ajustes según el avance de la obra y las condiciones del tráfico.

La correcta aplicación de la señalización en obra vial contribuye a la prevención de accidentes y al ordenamiento del tránsito, garantizando un entorno seguro para todos los involucrados.

18.2.1 Indicador

(2/2*100 Número de acopios debidamente demarcados y señalizados / Número de acopios de material de obra
*100 donde los demuestran el cumplimiento de Este indicador para este periodo.

18.2.2 Registro fotográfico





18.3 Presupuesto PMT

Presupuesto correspondiente mes de diciembre

Descripción	*Unidad*	*Cantidad*
Barricada de listones, con tablero "SEÑAL VÍA CERRADA"	UND	12
Paleta de control PARE-SIGA	UND	8
Señal INICIO DE OBRA (Velocidad menor o igual de 50km/h)	UND	13
Señal FIN DE OBRA (Velocidad menor o igual de 50km/h)	UND	13
Señal SPO-1 TRABAJOS EN LA VÍA (Velocidad menor o igual de 50km/h) Vía rural	UND	16
Señal SPO-02 MAQUINARIA EN LA VÍA (Velocidad menor o igual de 50km/h) Vía rural	UND	15
Señal SPO-03 AUXILIAR DE TRÁNSITO (Velocidad menor o igual de 50km/h) Vía rural	UND	8
Delineador compuesto separado cada 11 metros	UND	33

Cinta de demarcación (500m)	UND	25,53
Radio teléfono Banda VHF (Frecuencia 151-161 MHZ) Banda	UND	8,27
Chalecos reflectivos	UND	8
Planos Plan de Manejo de Tráfico	UND	4

18.3.1 Registro fotográfico









18.4 PRESUPUESTO PMA

Presupuesto correspondiente mes de diciembre

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD:
I-GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL		
Descripción	Unidad	Cantidad
Reuniones informativas con la comunidad del Área de influencia directa e indirecta del proyecto - socialización de inicio, avance y fin de obra	Und	1
II-CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES		
Descripción	Unidad	Cantidad
Alquiler de sitios para servicio para uso de baño al personal de obra	mes	11
III-PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS		
Descripción	Unidad	Cantidad
Desmantelamiento obras provisionales	m2	300
Restauración de las áreas intervenidas (zonas de depósito, campamento y acopio de material sobrante)	m2	463,56
Riego de plantas tapizantes, de cobertura y de empradización durante cuatro meses desde el primer día, cada ocho días (10 lts)	m2	300
IV-MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DIFERENTES A ESCOMBROS Y LODOS		
Descripción	Unidad	Cantidad
Kit para desperdicios sólidos (Incluye kits antiderrames, cubrimientos y señalización de la obra, cinta de peligro, avisos proximidad)	Und	1
V-ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD		
Descripción	Unidad	Cantidad
Talleres ambientales dirigidos a los centros educativos ubicados en el área de influencia del Proyecto	Und	4
VI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Descripción	Unidad	Cantidad
Kit de primeros auxilios y extintores	Und	0

ANEXO 12. Facturas PMA y PMT

19 Manejo y disposicion final de escombros

19.1 Durante el periodo de diciembre se han gestionado diferentes Permisos para la Disposición Final del Material de excavación, el cual autoriza la disposición adecuada de los residuos y materiales sobrantes generados durante la ejecución de la obra.

NOMBRE	PERMISO Y /O AUTORIZACION	FECHA / ENTIDAD APROBATORIA
JUAN CARLOS MEDINA ROBLES	Autorización para el suministro de material de excavación para ser acopiado en predio del municipio	17 marzo del 2025 Sec. General y de gobierno Alcaldía de Tello- Huila

Nota: el permiso reposa en el informe No. 2 del mes de febrero del 2025.

Cabe resaltar que con la terminación contractual del Proyecto y finalización total de las actividades operativas en obra, cesan las Condiciones que dieron origen a la disposicon final de material de excavacion y fresado generados durante la ejecución de la obra.
Se deja constancia del cierre formal paz y salvo por este concepto.

ANEXO 13. Certificado paz y salvo "disposicion final de material".

19.1.1 Indicador

Indicador correspondiente Del mes de diciembre

(124,49 m3 /124,49 m3 *100= 100% Siendo (Volumen de materiales de escombro excavación de cajeo tramo 1 dispuestos /Volumen de material de escombro generado excavación de cuneta tramo 1)
*100 donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento Del indicador.

(1427 m3 /1427 m3 *100= 100% Siendo (Volumen de materiales de escombro excavación de cajeo tramo 2 dispuestos /Volumen de material de escombro generado excavación de cuneta tramo 2)
*100 donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento Del indicador.

(1011 m3 /1011 m3 *100= 100% Siendo (Volumen de materiales de escombro excavación de cajeo tramo 3 dispuestos /Volumen de material de escombro

generado excavación de cuneta tramo 3)
*100 donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento Del indicador.

(1374 m3 /1374 m3 *100= 100% Siendo (Volumen de materiales de escombro excavación de cajeo tramo 4 dispuestos /Volumen de material de escombro generado excavación de cuneta tramo 4)
*100 donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento Del indicador.

(552m3 /552 m3 *100= 100% Siendo (Volumen de materiales de escombro excavación de cajeo tramo 5 dispuestos /Volumen de material de escombro generado excavación de cuneta tramo 5)
*100 donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento Del indicador.

19.2 Especiales.

Como parte de las estrategias de gestión ambiental, se ha implementado un Punto Ecológico dentro de la obra, con el propósito de promover la separación adecuada de residuos y minimizar el impacto ambiental generado por las actividades laborales.

El punto ecológico se establece con el fin de:

- Facilitar la clasificación y disposición adecuada de los residuos generados en la obra.
- Fomentar la cultura de reciclaje y el manejo responsable de los desechos.
- Contribuir a la reducción de la contaminación ambiental.
- Cumplir con la normativa ambiental vigente en cuanto a gestión de residuos.

El adecuado funcionamiento Del **Puntos Ecológico** refleja el compromiso del consorcio con la **gestión ambiental sostenible**, promoviendo una cultura de responsabilidad ecológica dentro del entorno laboral.
La entidad encargada de realizar la recolección de residuos es **EMPRESAS PUBLICAS DE TELLO (EPT) .**

19.3 Registro fotográfico



19.4 Orden y Aseo

El mantenimiento del orden y aseo en el área de trabajo es fundamental para garantizar un ambiente seguro, eficiente y saludable dentro de la obra. Estas acciones permiten prevenir accidentes, mejorar la productividad y asegurar el cumplimiento de las Normas de **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y gestión ambiental.**

Las jornadas de orden y aseo tienen Como finalidad:

- Prevenir accidentes laborales causados por desorden o acumulación de materiales.
- Mantener los diferentes frentes de trabajo organizados, facilitando la movilidad del personal y el almacenamiento adecuado de implementos de obra.
- Cumplir con normativas ambientales, promoviendo una correcta separación y disposición de residuos.

La entidad encargada de realizar la recolección de residuos es **EMPRESAS PUBLICAS DE TELLO (EPT)**

El compromiso con el **orden y aseo** no solo mejora la seguridad y eficiencia operativa, sino que también refuerza una cultura de prevención de riesgos y responsabilidad ambiental dentro de la empresa.


NOTA: La solicitud de recolección de residuos reposa en el informe No. 1 y el acta de conformación de brigada de orden y aseo fue actualizada y su anexo correspondiente se encuesta reposado en el informe número 4, del mes de mayo

19.4.1 Registro fotográfico







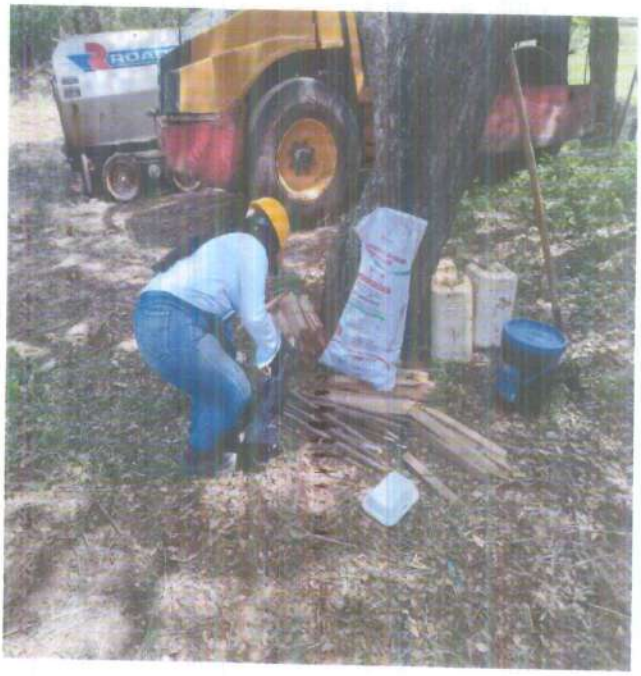

20 GESTION RECURSO HIDRICO

20.1 Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales

Para el periodo comprendido del mes de diciembre, no se contó con baterías sanitarias.

21 MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

Durante la ejecución del proyecto, se ha dispuesto la instalación de infraestructura temporal para el soporte de las actividades constructivas, en cumplimiento con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental y el Programa de Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental (DAGA).
El proyecto cuenta con un campamento de obra debidamente establecido en el Tramo 17, específicamente en el sector de Los Guásimos. Este campamento cumple la función de centro operativo para el personal técnico y operativo del proyecto, y se encuentra adecuadamente habilitado para apoyar las actividades constructivas en la zona.

21.1 Indicador

(2/2)*100 Número de acopios debidamente demarcados y señalizados / Número de acopios de material de obra *100 donde los demuestran que no fueron establecidos para Este periodo.

21.2 Manejo de maquinaria equipos y vehículos

El mantenimiento mensual de la maquinaria se basa en el **cambio de filtros y aceite cada 250 horas de operación**. Este procedimiento se realizará **en el sitio de trabajo**, con la excepción de las volquetas, cuyo mantenimiento se llevará a cabo en el taller correspondiente.
Para garantizar una adecuada gestión ambiental, los **aceites y filtros usados** serán recolectados en **recipientes específicos** y almacenados en **sitios adecuados** para su correcta disposición final, cumpliendo con las normativas ambientales vigentes y evitando la contaminación del entorno.

Registro de maquinaria del mes de diciembre.

NOMBRE	CODIGO
Volqueta	OWH 749
Volqueta	OZD 276
Volqueta	OWH 442
Motoniveladora	710 A
Retro excavadora	CAT 320 CL
Vibrocompactador	CA 152
Finisher	Rodatec

NOTA: El anexo de este numeral reposa en el informe No.1 del mes de febrero del 2025.

21.2.1 Indicador

(3/3)*100 Número de volquetas con revisión tecno mecánica vigente / Número total de volquetas utilizadas en el mes. X 100 donde los demuestran que no fueron establecidos para este periodo.

22 GESTIÓN SOCIAL

22.1 Localización del proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento del Huila entre el cruce de Villavieja (cucara) y la cabecera municipal de Tello, consiste en el mantenimiento del 5,33 kilómetro de vía en los sectores más deteriorados de la misma distribuidos en 25 tramos seleccionados previamente, de acuerdo a las necesidades.

El proyecto tiene como objetivo la construcción de 5,33 km de pavimento flexible, donde se incluye el fresado de pavimento asfáltico, conformación de calzada, construcción de estructura de pavimento en base y sub base granular, mezcla densa en caliente MDC-19, riego de imprimación, construcción de filtros, fundición cunetas, muros en gaviones y líneas de demarcación para la señalización horizontal.

22.2 *Proyecto de atención a la comunidad*

El punto de atención al ciudadano se encuentra ubicado en el tramo 17 ubicado en el sector los guásimos, donde se atiende a la comunidad y personal de obra y los PQRS. De igual manera se recibe y atiende via correo electrónico para mayor facilidad.
Durante el periodo del mes de diciembre no se evidenciaron PQRS
Cabe resaltar que para el mes de diciembre el (PAC) fue retirado del lugar por terminación contractual del Proyecto y finalización total de las actividades operativas en obra.

22.2.1 Registro fotográfico





22.3 Información y divulgación

Durante el mes de diciembre no se realizaron comites ni reuniones con la comunidad

22.3.1 Indicador

(0/0)*100 Número reuniones programadas/ Nº de reuniones realizadas X100 donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento del indicador

22.3.2 Conformación de veedurias.

Las veedurías ciudadanas son mecanismos de participación social que permiten a la comunidad hacer seguimiento, control y vigilancia a la gestión pública, especialmente en la ejecución de proyectos, obras y programas de interés colectivo. Su objetivo principal es garantizar la transparencia, eficiencia y cumplimiento de los recursos y acciones gubernamentales.

Las veedurías conformadas para el proyecto son

VEEDURIA TRANSPARENCIA		
NOMBRE	**C.C**	**CARGO**
DEICI ALEJANDRA GUTIÉRREZ TOBAR	26.585.822	PRESIDENTE
ADRIANA MARÍA DÍAZ	26.585.849	VEEDOR
JOSÉ VICENTE SOLANO VARGAS	12.126.709	VEEDOR

"VEEDURÍA CIUDADANA REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE FORTALECILLAS-TELLO		
NOMBRE	**C.C**	**CARGO**
JESÚS ANTONIO TRUJILLO TOVAR	12.109.567	PRESNIDENTE
JAMITH SEFAIR GARCÍA	83.242.512	VICEPRESIDENTE
ARMANDO SÁNCHEZ MOSQUERA	83.243.590	SECRETARIO

VEEDURÍA SOCIAL POR TELLO		
NOMBRE	**C.C**	**CARGO**
OSCAR IVÁN MARTÍNEZ	83.242.784	N/A
JOSÉ EDGAR TELLO BERRIO	12.225.095	N/A

NOTA: El anexo de la conformación de las veedurías reposa en el informe No. 1 del mes de febrero del 2025

Cabe resaltar que con la terminación contractual del Proyecto y finalización total de las actividades operativas en obra, cesan el porceso de seguimiento (cierre) de las veedurias del Proyecto.
Se deja constancia el acta cierre formal del veedurias.

ANEXO 14. Acta del cierre de veedurias.

22.4 Directorio del municipio de Tello

A continuación, se relaciona las entidades públicas para las atenciones a la comunidad

NOMBRE	CARGO	EMAIL	CONTACTO
Fernando Alipio Solano G	Alcalde Municipal	contactenos@tello-huila.gov.co	3209013619
Edna Lorena Diaz	Secretaria de planeación	contactenos@tello-huila.gov.co	3123668197
Juan Carlos Medina R	Secretario general y de	contactenos@tello-huila.gov.co	3228169110
Erit Francisco	Comisario de familia	contactenos@tello-huila.gov.co	3228169110
Ivon Duarte	Inspector de policía	contactenos@tello-huila.gov.co	3228169110
Maidy Cangrejo Quintero	Personería	Personeria@tello-huila.gov.co	3158232480
Yuli Paola González	Gerente Miguel Barreto López	contactenos@esemiguelbarretolopez.gov.co	3185672046
Bomberos	Cuerpo voluntario de Tello	bomberosvoluntariosdetello@gmail.com	3144835629

22.5 Contratación mano de obra

Listado del personal contratado de la región para la ejecución del proyecto

PERSONAL DE LA ZONA			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	MUNICIPIO
ANLLY ASTRRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Tello
MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Tello
MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Tello
DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Baraya
RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Tello
YASMIN ROCIO MARTINES MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Tello
NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Baraya
MILLER SANCHEZ	4.890.672	CONDUCTOR VOLQUETA	Fortalecillas
EDINSON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	Tello
EVERLEDETH REYES ROCHA	4.943.631	AYUDANTE	Tello
HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR VOLQUETA	Baraya

22.5.1 Indicador

(11/11)*100 Número de trabajadores contratados del área de influencia/por Número de trabajadores en obra x100% donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

23 Perfil Sociodemográfico.

La caracterización sociodemográfica del personal que participa en el desarrollo del proyecto tiene como propósito identificar y comprender las condiciones sociales, culturales, educativas y de salud que pueden incidir directa o indirectamente en la gestión de los riesgos laborales y en el Perfil desempeño de las actividades. Esta información permite establecer estrategias más eficaces de intervención, promoción y prevención desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

la población trabajadora vinculada al proyecto presenta una composición diversa en términos de edad, nivel educativo, procedencia y condiciones de salud. Esta diversidad implica una responsabilidad institucional en la adopción de medidas de gestión del riesgo que consideren las características individuales y colectivas del recurso humano, priorizando estrategias de intervención ajustadas al perfil real de los trabajadores.

ANEXO 15. Perfil sociodemográfico se encuentra "Actualizado"

ANEXO 1. INDUCCION

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA					
TEMA	Inducción SST				
HORA	8:00 - 8:20.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	x	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1.	JAIME ANDRES SANCHEZ FERRO	1.004.148.007	AYUDANTE	Jaime Andrés Sánchez

FIRMA PROFESIONAL SST:

NOMBRE: Daniela Perdomo Marta

Powered by CamScanner

ANEXO 2. EXAMENES DE INGRESO

ClipSalud
Nos movemos para que su empresa no se detenga

COMPAÑÍA LÍDER DE PROFESIONALES EN SALUD S.A.S
NIT. **900.304.743-4**
Dir: Cll 18 # 5a - 46 Barrio Quirinal
Cel: 318 291 7591
Neiva, Huila
E-mail: facturacionycartera@clipsalud.com



Nº 19.252

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
28 DÍA	11 MES	2025 AÑO	NEIVA (HUILA, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACION MEDICA DE PRE - INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS

CIIU (Actividad Económica) del empleador: SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
SANCHEZ FERRO JAIME ANDRES	MASCULINO	30 AÑOS 6 MESES 9 DÍAS	CC (Tipo)	1004148007 (Número)

Cargo: AYUDANTE DE OBRA

EPS	AFP	ARL
NUEVA EPS	NO REFIERE	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

CONDICIONES ADECUADAS PARA DESEMPEÑAR SU LABOR

Observaciones: *NO APLICA*

N/A | NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRÍA	✓	GLICEMIA-	✓
VISIOMETRÍA-	✓	PERFIL LIPIDICO-(Triglicéridos, Colesterol total, HDL, LDL)-	✓
ENFASIS OSTEOMUSCULAR	✓	EVALUACION MEDICA DE PRE INGRESO	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	CONTROL DE PESO
		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

MANTENER UN PESO SALUDABLE MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EQUILIBRADOS Y ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

DRA. CAROLINA LOSADA ARDILA
MEDICA OCUPACIONAL
U. IBEROAMERICANA
LIC: 6896

Firma:

Nombre: CC: 1127625985 - CAROLINA LOSADA

R. M.: 1127625985 L.S.O.: 6896 27/10/2022

Código de Seguridad
P865V1B19252

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: SANCHEZ FERRO JAIME ANDRES

CC: 1004148007

ANEXO 3. EXAMENES DE EGRESO

JPN TELLO

Neiva (Huila), 30 de diciembre de 2025

AUTORIZACION EXAMEN DE EGRESO

La señora **YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA;** identificada con Número de Cedula No. **1082803924** expedida en TELLO. Le notificamos, para que se presente a la IPS CLIP SALUD, ubicada en la Calle 18 Nª 5a - 48 Barrio Quirinal Neiva, con el fin de realizarse los exámenes correspondientes según protocolo de la empresa, esta evaluación médica tiene carácter obligatorio para usted, sea cual fuere la razón de su salida de nuestra empresa, por lo que la realización de este queda expresamente bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador. Por lo expuesto dejamos constancia que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO, cumple con su procedimiento interno de salud ocupacional y la normativa nacional vigente establecida en la ley.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa cabe señalar que estos exámenes no tienen ningún costo para el trabajador y que su vigencia es de 5 días calendario a partir de la fecha de retiro.

Si por algún motivo no puede hacerse el examen de egreso se dará por entendido que usted renuncia a este derecho.

Cordialmente,

DIANA C. BERMUDEZ GORDILLO
Directora de Talento Humano

Firma: Yasmin Rocio Martinez
C.C. 1082803924 Tello

116

Powered by CamScanner

JPN TELLO

Neiva (Huila), 30 de diciembre de 2025

AUTORIZACION EXAMEN DE EGRESO

La señora **NASLY MELISA SALAS SANCHEZ;** identificada con Número de Cedula No. **1079184726** expedida en CAMPOALEGRE. Le notificamos, para que se presente a la IPS CLIP SALUD, ubicada en la Calle 18 Nº 5a - 48 Barrio Quirinal Neiva, con el fin de realizarse los exámenes correspondientes según protocolo de la empresa, esta evaluación médica tiene carácter obligatorio para usted, sea cual fuere la razón de su salida de nuestra empresa, por lo que la realización de este queda expresamente bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador. Por lo expuesto dejamos constancia que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO, cumple con su procedimiento interno de salud ocupacional y la normativa nacional vigente establecida en la ley.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa cabe señalar que estos exámenes no tienen ningún costo para el trabajador y que su vigencia es de 5 días calendario a partir de la fecha de retiro.

Si por algún motivo no puede hacerse el examen de egreso se dará por entendido que usted renuncia a este derecho.

Cordialmente,

DIANA C. BERMUDEZ GORDILLO
Directora de Talento Humano

Firma: Nasly Melisa Salas Sanchez.
C.C. 1.079.184.726.

117

Powered by CamScanner

JPN TELLO

Neiva (Huila), 30 de diciembre de 2025

AUTORIZACION EXAMEN DE EGRESO

La señora **MARIA EDITH ALDANA HOYOS;** identificada con Número de Cedula No. **1082804794** expedida en TELLO. Le notificamos, para que se presente a la IPS CLIP SALUD, ubicada en la Calle 18 Nª 5a - 48 Barrio Quirinal Neiva, con el fin de realizarse los exámenes correspondientes según protocolo de la empresa, esta evaluación médica tiene carácter obligatorio para usted, sea cual fuere la razón de su salida de nuestra empresa, por lo que la realización de este queda expresamente bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador. Por lo expuesto dejamos constancia que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO, cumple con su procedimiento interno de salud ocupacional y la normativa nacional vigente establecida en la ley.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa cabe señalar que estos exámenes no tienen ningún costo para el trabajador y que su vigencia es de 5 días calendario a partir de la fecha de retiro.

Si por algún motivo no puede hacerse el examen de egreso se dará por entendido que usted renuncia a este derecho.

Cordialmente,

DIANA C. BERMUDEZ GORDILLO
Directora de Talento Humano

Firma: Maria Aldana
C.C. 1082804794

Powered by CamScanner

JPN TELLO

Neiva (Huila), 30 de diciembre de 2025

AUTORIZACION EXAMEN DE EGRESO

La señora **MAGALY OLIVEROS SOTTO;** identificada con Número de Cedula No. **26586026** expedida en TELLO. Le notificamos, para que se presente a la IPS CLIP SALUD, ubicada en la Calle 18 Nª 5a - 48 Barrio Quirinal Neiva, con el fin de realizarse los exámenes correspondientes según protocolo de la empresa, esta evaluación médica tiene carácter obligatorio para usted, sea cual fuere la razón de su salida de nuestra empresa, por lo que la realización de este queda expresamente bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador. Por lo expuesto dejamos constancia que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO, cumple con su procedimiento interno de salud ocupacional y la normativa nacional vigente establecida en la ley.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa cabe señalar que estos exámenes no tienen ningún costo para el trabajador y que su vigencia es de 5 días calendario a partir de la fecha de retiro.

Si por algún motivo no puede hacerse el examen de egreso se dará por entendido que usted renuncia a este derecho.

Cordialmente,

DIANA C. BERMUDEZ GORDILLO
Directora de Talento Humano

Firma: Magaly Oliveros Sotto
C.C. 26.586.026 Tello

119

Powered by CamScanner

JPN TELLO

Neiva (Huila), 30 de diciembre de 2025

AUTORIZACION EXAMEN DE EGRESO

El señor **HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA;** identificado con Número de Cedula No. **1075242622** expedida en NEIVA. Le notificamos, para que se presente a la IPS CLIP SALUD, ubicada en la Calle 18 Nª 5a - 48 Barrio Quirinal Neiva, con el fin de realizarse los exámenes correspondientes según protocolo de la empresa, esta evaluación médica tiene carácter obligatorio para usted, sea cual fuere la razón de su salida de nuestra empresa, por lo que la realización de este queda expresamente bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador. Por lo expuesto dejamos constancia que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO, cumple con su procedimiento interno de salud ocupacional y la normativa nacional vigente establecida en la ley.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa cabe señalar que estos exámenes no tienen ningún costo para el trabajador y que su vigencia es de 5 días calendario a partir de la fecha de retiro.

Si por algún motivo no puede hacerse el examen de egreso se dará por entendido que usted renuncia a este derecho.

Cordialmente,

DIANA C. BERMUDEZ GORDILLO
Directora de Talento Humano

Firma:
C.C. 1075-242622

Powered by CamScanner

JPN TELLO

Neiva (Huila), 30 de diciembre de 2025

AUTORIZACION EXAMEN DE EGRESO

La señora **DANIELA PERDOMO HORTA;** identificada con Número de Cedula No. **1078778338** expedida en BARAYA. Le notificamos, para que se presente a la IPS CLIP SALUD, ubicada en la Calle 18 Nª 5a - 48 Barrio Quirinal Neiva, con el fin de realizarse los exámenes correspondientes según protocolo de la empresa, esta evaluación médica tiene carácter obligatorio para usted, sea cual fuere la razón de su salida de nuestra empresa, por lo que la realización de este queda expresamente bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador. Por lo expuesto dejamos constancia que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO, cumple con su procedimiento interno de salud ocupacional y la normativa nacional vigente establecida en la ley.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa cabe señalar que estos exámenes no tienen ningún costo para el trabajador y que su vigencia es de 5 días calendario a partir de la fecha de retiro.

Si por algún motivo no puede hacerse el examen de egreso se dará por entendido que usted renuncia a este derecho.

Cordialmente,

DIANA C. BERMUDEZ GORDILLO
Directora de Talento Humano

Firma:
C.C. 1078778338

Powered by CamScanner

JPN TELLO

Neiva (Huila), 30 de diciembre de 2025

AUTORIZACION EXAMEN DE EGRESO

El señor **CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ;** identificado con Número de Cedula No. **1081154423** expedida en RIVERA. Le notificamos, para que se presente a la IPS CLIP SALUD, ubicada en la Calle 18 Nº 5a - 48 Barrio Quirinal Neiva, con el fin de realizarse los exámenes correspondientes según protocolo de la empresa, esta evaluación médica tiene carácter obligatorio para usted, sea cual fuere la razón de su salida de nuestra empresa, por lo que la realización de este queda expresamente bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador. Por lo expuesto dejamos constancia que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO, cumple con su procedimiento interno de salud ocupacional y la normativa nacional vigente establecida en la ley.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa cabe señalar que estos exámenes no tienen ningún costo para el trabajador y que su vigencia es de 5 días calendario a partir de la fecha de retiro.

Si por algún motivo no puede hacerse el examen de egreso se dará por entendido que usted renuncia a este derecho.

Cordialmente,

DIANA C. BERMUDEZ GORDILLO
Directora de Talento Humano

Firma: Camilo A Charry S
C.C. 1081154423

122

Powered by CamScanner

JPN TELLO

Neiva (Huila), 30 de diciembre de 2025

AUTORIZACION EXAMEN DE EGRESO

La señora **ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA;** identificada con Número de Cedula No. **1082804610** expedida en TELLO. Le notificamos, para que se presente a la IPS CLIP SALUD, ubicada en la Calle 18 Nª 5a - 48 Barrio Quirinal Neiva, con el fin de realizarse los exámenes correspondientes según protocolo de la empresa, esta evaluación médica tiene carácter obligatorio para usted, sea cual fuere la razón de su salida de nuestra empresa, por lo que la realización de este queda expresamente bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador. Por lo expuesto dejamos constancia que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO, cumple con su procedimiento interno de salud ocupacional y la normativa nacional vigente establecida en la ley.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa cabe señalar que estos exámenes no tienen ningún costo para el trabajador y que su vigencia es de 5 días calendario a partir de la fecha de retiro.

Si por algún motivo no puede hacerse el examen de egreso se dará por entendido que usted renuncia a este derecho.

Cordialmente,

DIANA C. BERMUDEZ GORDILLO
Directora de Talento Humano

Firma: Anlly Lopez
C.C. 1082804610

123

Powered by CamScanner

JPN TELLO

Neiva (Huila), 30 de diciembre de 2025

AUTORIZACION EXAMEN DE EGRESO

El señor **AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ;** identificado con Número de Cedula No. **12101945** expedida en NEIVA. Le notificamos, para que se presente a la IPS CLIP SALUD, ubicada en la Calle 18 Nª 5a - 48 Barrio Quirinal Neiva, con el fin de realizarse los exámenes correspondientes según protocolo de la empresa, esta evaluación médica tiene carácter obligatorio para usted, sea cual fuere la razón de su salida de nuestra empresa, por lo que la realización de este queda expresamente bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador. Por lo expuesto dejamos constancia que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO, cumple con su procedimiento interno de salud ocupacional y la normativa nacional vigente establecida en la ley.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa cabe señalar que estos exámenes no tienen ningún costo para el trabajador y que su vigencia es de 5 días calendario a partir de la fecha de retiro.

Si por algún motivo no puede hacerse el examen de egreso se dará por entendido que usted renuncia a este derecho.

Cordialmente,

DIANA C. BERMUDEZ GORDILLO
Directora de Talento Humano

Firma:
C.C. 12101945

Powered by CamScanner

DESISTIMIENTO DE LA PRACTICA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Neiva, 15 de diciembre 2025

Señores:
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS

Asunto: Examen médico ocupacional de Egreso

Por medio de la presente Yo, **JAN CARLOS HERNANDEZ JIMENEZ** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1.004.035.323** expedida en Neiva, quien desempeño funciones hasta la fecha 15 de diciembre del 2025, en el cargo de AYUDANTE manifiesto que por voluntad propia y por razones ajenas a la empresa desisto a realizarme el examen médico de egreso y eximo de toda responsabilidad a la empresa INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

Cordialmente

Jancarlos.
JAN CARLOS HERNANDEZ JIMENEZ
C.C No. 1.004.035.323

Powered by CamScanner

INGEMAQ M&A S.A.S
Ingenieria Civil y Maquinaria Pesada

DESISTIMIENTO DE LA PRACTICA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Neiva, 20 de diciembre 2025

Señores:
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS

Asunto: Examen médico ocupacional de Egreso

Por medio de la presente Yo, **RICARDO DIAZ WALTERO** identificado con Cedula de Ciudadanía No **1.007.778.680** expedida en Neiva, quien desempeño funciones hasta la fecha 19 de Diciembre del 2025, en el cargo de **AYUDANTE** manifiesto que por voluntad propia y por razones ajenas a la empresa desisto a realizarme el examen médico de egreso y eximo de toda responsabilidad a la empresa INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

Cordialmente

Ricardo Diaz.
RICARDO DIAZ WALTERO
C.C No. 1.007.778.680

126

Powered by CamScanner

INGEMAQ M&A S.A.S
Ingeniería Civil y Maquinaria Pesad

DESISTIMIENTO DE LA PRACTICA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Neiva, 22 de diciembre 2025

Señores:
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS

Asunto: Examen médico ocupacional de Egreso

Por medio de la presente Yo, **JOSE LUIS BURGOS** identificado con Cedula de Ciudadanía No **7.720.952** expedida en Neiva, quien desempeño funciones hasta la fecha 20 de Diciembre del 2025, en el cargo de **AYUDANTE** manifiesto que por voluntad propia y por razones ajenas a la empresa desisto a realizarme el examen médico de egreso y eximo de toda responsabilidad a la empresa INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

Cordialmente

Jose Luis J.
JOSE LUIS BURGOS
C.C No. 7.720.952

127

Powered by CamScanner

INGEMAQ M&A S.A.S
Ingenieria Civil y Maquinaria Pesada

DESISTIMIENTO DE LA PRACTICA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Neiva, 20 de diciembre 2025

Señores:
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS

Asunto: Examen médico ocupacional de Egreso

Por medio de la presente Yo, **NICOLAS ANDREY MESA** identificado con Cedula de Ciudadanía No **1.073.681.021** expedida en Neiva, quien desempeño funciones hasta la fecha 19 de Diciembre del 2025, en el cargo de **AYUDANTE** manifiesto que por voluntad propia y por razones ajenas a la empresa desisto a realizarme el examen médico de egreso y eximo de toda responsabilidad a la empresa INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

Cordialmente

Nicolas Andrey
NICOLAS ANDREY MESA
C.C No. 1.073.681.021

Powered by CamScanner

INGEMAQ M&A S.A.S
Ingeniería Civil y Maquinaria Pesada

DESISTIMIENTO DE LA PRACTICA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Neiva, 22 de diciembre 2025

Señores:
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS

Asunto: Examen médico ocupacional de Egreso

Por medio de la presente Yo, **YEISON SOLER MONTOLLA** identificado con Cedula de Ciudadanía No **1.023.907.264 ,** expedida en Neiva, quien desempeño funciones hasta la fecha 20 de Diciembre del 2025, en el cargo de **AYUDANTE** manifiesto que por voluntad propia y por razones ajenas a la empresa desisto a realizarme el examen médico de egreso y eximo de toda responsabilidad a la empresa INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

Cordialmente

YEISON SOLER.
YEISON SOLER MONTOLLA
C.C No. 1.023.907.264

129

Powered by CamScanner

INGEMAQ M&A S.A.S
Ingeniería Civil y Maquinaria Pesada

DESISTIMIENTO DE LA PRACTICA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Neiva, 22 de diciembre 2025

Señores:
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS

Asunto: Examen médico ocupacional de Egreso

Por medio de la presente Yo, **ESTEVAN DUSSAN** identificado con Cedula de Ciudadanía No **1.003.809.880** expedida en Neiva, quien desempeño funciones hasta la fecha 20 de Diciembre del 2025, en el cargo de **AYUDANTE** manifiesto que por voluntad propia y por razones ajenas a la empresa desisto a realizarme el examen médico de egreso y eximo de toda responsabilidad a la empresa INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

Cordialmente

Estevan Dussan.
ESTEVAN DUSSA
C.C No. 1.003.809.880

Powered by CamScanner

ANEXO 4.
AFILIACIONES

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 05/12/2025, el empleador INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS identificado con NIT número 901759608 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9637590	05/12/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1004148007	JAIMEANDRES SANCHEZ FERRO	1423500	AYUDANTE DE OBRA	2025-12-02

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 5 días del mes de Diciembre del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

ARL | sura

Medellín, 01 de December de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL HUILA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1004148007	SANCHEZ FERRO JAIME ANDRES	02/12/2025		219N2421	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/12/2025 19:00:19 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 177.74.205.83, 192.230.104.10, 172.16.42.57

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JAIME ANDRES SANCHEZ FERRO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.004.148.007**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 5 de Diciembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. - Nit. 800.144.331-3 Filial de Grupo AVAL

ANEXO 5. PLANILLAS

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	88682469	95003497 33	E	2026/01/06	2026/02/25	BANCOLOMBIA	50	$1,875,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)					$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$297,300		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (3 Afiliados)					$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$297,300		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)					$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$297,300		$0	$0
1	CC 1082805038	BERMEO DANIEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC 1007258395	BERMEO HERMES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC 83222337	CASILIMA GABRIEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA TELLO (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$111,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS MAQUINARIA TELLO (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$111,400		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$111,400		$0	$0
4	CC 4898798	OSPINA LUIS	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
Total Afiliados(4)					$5,870,500	$939,400			$5,870,500	$235,000			$5,870,500	$235,000			$5,870,500	$408,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$939,400	$29,300	$0	$968,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$483,800	$15,100	$0	$498,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$14,200	$0	$469,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$408,700	$12,800	$0	$421,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$408,700	$12,800	$0	$421,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$235,000	$7,400	$0	$242,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	$235,000	$7,400	$0	$242,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$235,000	$7,400	$0	$242,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$1,800	$0	$58,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$178,000	$5,600	$0	$183,600
TOTAL				4	$1,818,100	$56,900	$0	$1,875,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS MBA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	57035748	9499590742	E	2026/01/06	2026/02/12	BANCO DE BOGOTA	37	$1,382,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA TELLO (4 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$6,829,384	$273,300			$6,829,384	$218,200			$6,829,384	$379,700		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS MAQUINARIA TELLO (4 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$6,829,384	$273,300			$6,829,384	$218,200			$6,829,384	$379,700		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$6,829,384	$273,300			$6,829,384	$218,200			$6,829,384	$379,700		$0	$0
1	CC	98654028	REGINO CARLOS	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
2	CC	4890672	SANCHEZ MILLER		0	$0	$0	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$0	14-11	3	$142,350	$0	3	$0	$0
3	CC	4890672	SANCHEZ MILLER		0	$0	$0	EPS037	1	$53,334	$2,200	CCF32	1	$53,334	$2,200	14-11	1	$53,334	$3,800	1	$0	$0
4	CC	4890672	SANCHEZ MILLER		0	$0	$0	EPS037	26	$1,233,700	$49,400	CCF32	26	$1,233,700	$0	14-11	26	$1,233,700	$0	26	$0	$0
5	CC	79253676	SIERRA PEDRO		0	$0	$0	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
6	CC	79234377	VARGAS LUIS		0	$0	$0	EPS037	15	$800,000	$32,000	CCF32	15	$800,000	$32,000	14-11	15	$800,000	$55,700	15	$0	$0
Total	Afiliados(4)					$3,000,000	$480,000			$6,829,384	$273,300			$6,829,384	$218,200			$6,829,384	$379,700		$0	$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$11,000	$0	$491,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$11,000	$0	$491,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$379,700	$8,700	$0	$388,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$379,700	$8,700	$0	$388,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$218,200	$5,000	$0	$223,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	$218,200	$5,000	$0	$223,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$273,300	$6,300	$0	$279,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$209,300	$4,800	$0	$214,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$64,000	$1,500	$0	$65,500
TOTAL				4	$1,351,200	$31,000	$0	$1,382,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143133943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2026-01	60044601	9499650629	E	2026/01/06	2026/02/13	BANCO DE BOGOTA	38	$451,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA TELLO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS TELLO (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	4943631	REYES EVERLEDETH	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$5,400	$0	$233,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$5,400	$0	$233,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$2,400	$0	$101,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$2,400	$0	$101,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$1,400	$0	$58,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$57,000	$1,400	$0	$58,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$1,400	$0	$58,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$1,400	$0	$58,400
TOTAL				1	$440,900	$10,600	$0	$451,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901785282	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	CALLE 104 No 14A 45 OF 401	TELLO-HUILA	2150482	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	5706987e	9499591778	E	2026/01/22	2626/02/12	BANCO DE BOGOTA	21	$3,015,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO (5 Afiliados)					$9,194,000	$1,471,200			$9,194,000	$368,000			$12,409,865	$496,700			$9,194,000	$640,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (5 Afiliados)					**$9,194,000**	**$1,471,200**			**$9,194,000**	**$368,000**			**$12,409,865**	**$496,700**			**$9,194,000**	**$640,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: TELLO Depto: HUILA (5 Afiliados)					**$9,194,000**	**$1,471,200**			**$9,194,000**	**$368,000**			**$12,409,865**	**$496,700**			**$9,194,000**	**$640,000**		**$0**	**$0**
1	CC	1082804794	ALDANA MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$2,040,350	$81,700	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1075242622	GALLEGO MAYER	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF32	30	$4,375,000	$175,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
3	CC	1082804610	LOPEZ AMLLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$2,040,350	$81,700	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1082803924	MARTINEZ YASMIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,913,815	$76,600	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	26586026	OLIVEROS MAGALY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$2,040,350	$81,700	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(5)**				$9,194,000	$1,471,200			$9,194,000	$368,000			$12,409,865	$496,700			$9,194,000	$640,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,471,200	$19,400	$0	$1,490,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,243,400	$16,400	$0	$1,259,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$3,000	$0	$230,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$640,000	$8,400	$0	$648,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	5	$640,000	$8,400	$0	$648,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$496,700	$6,600	$0	$503,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$496,700	$6,600	$0	$503,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$368,000	$5,000	$0	$373,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$140,000	$1,900	$0	$141,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$800	$0	$57,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$171,000	$2,300	$0	$173,300
TOTAL				5	$2,975,900	$39,400	$0	$3,015,300

ANEXO 6. REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	1/12/2025.				
TEMA	Movimientos repetitivos				
HORA	8:00 - 8:15.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	x	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
4	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
5	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
6	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
7	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
8	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
9	CRISTAN VIDALES	1.075.253.251	CONDUCTOR	
10	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
11	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
12	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
13	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
14	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
15	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
16	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
	CARLOS REGINO	98.654.028	OPE. MOTONIVELADORA	
	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST:
NOMBRE: _____

Carlos Arturo Regino 98654028
Cristian adolfo Gil 1082 245 914.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	2/12/2025.				
TEMA	Procedimientos Seguros SST.				
HORA	8:00 - 8:15.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
4	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
5	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
6	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
7	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H
8	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
9	CRISTAN VIDALES	1.075.253.251	CONDUCTOR	
10	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
11	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
12	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
13	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
14	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
15	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
16	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
17	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
18	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
19	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
20	CARLOS REGINO	98.654.028	OPE. MOTONIVELADORA	
21	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST:
NOMBRE:

Costa adolfo Rgo V. 1082 215 9 12

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	3/12/2025			
TEMA	Seguridad vial			
HORA	8:00 - 8:15			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
	CRISTAN VIDALES	1.075.253.251	CONDUCTOR	
	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas
	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
	CARLOS REGINO	98.654.028	OPE. MOTONIVELADORA	
	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____
NOMBRE: _____

Haw adolfo PSS v. 1022 215 914

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 - 7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	4/12/2023				
TEMA	Orden y aseo.				
HORA	8:00 - 8:15				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
4	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	
5	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
6	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	
7	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	
8	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
9	CRISTAN VIDALES	1.075.253.251	CONDUCTOR	
10	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
11	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
12	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
13	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
14	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
15	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
16	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
17	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
18	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
19	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
20	CARLOS REGINO	98.654.028	OPE. MOTONIVELADORA	
21	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST:
NOMBRE:

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	5/12/2025.			
TEMA	Actos y condiciones inseguras			
HORA	8:00 - 8:15			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
4	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	
5	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
6	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	
7	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	
8	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
9	CRISTAN VIDALES	1.075.253.251	CONDUCTOR	
10	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
11	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
12	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
13	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
14	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
15	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
16	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
17	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
18	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
19	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
20	CARLOS REGINO	98.654.028	OPE. MOTONIVELADORA	
21	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.234	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST:
NOMBRE:

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 - 7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	6 / 12 / 2025			
TEMA	Trabajo en equipo.			
HORA	8:00 - 8:15.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
	CRISTAN VIDALES	1.075.253.251	CONDUCTOR	
	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo.
	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Ospina
	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Martinez
	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa.
	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
	CARLOS REGINO	98.654.028	OPE. MOTONIVELADORA	
	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____
NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	9/12/2025.				
TEMA	Recolección de Residuos				
HORA	8:00 - 8:15.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
4	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
5	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
6	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
7	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
8	LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
9	CRISTAN VIDALES	1.075.253.251	CONDUCTOR	
10	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
11	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Ospina
12	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
13	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Martinez
14	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa.
15	PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
16	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
17	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
18	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
19	HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
20	CARLOS REGINO	98.654.028	OPE. MOTONIVELADORA	
21	FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____
NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	10 /12/2025.				
TEMA	Prevención de accidentes de trabajo.				
HORA	8:00. - 8:15.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
CAMILO ANDRES CHARRY SANCHEZ	1.081.154.423	CADENERO 1	
ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	
DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	
LUIS EDUARDO VARGAS	79.234.377	CONDUCTOR	
CRISTAN VIDALES	1.075.253.251	CONDUCTOR	
RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Ospina
EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
PEDRO JERONIMO SIERRA	79.253.676	CONDUCTOR	
DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	
HUGO CORTES	1.022.359.231	CONDUCTOR	
CARLOS REGINO	98.654.028	OPE. MOTONIVELADORA	
FERMIN GUTIERREZ	1.022.359.231	OPE.RETRO	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____
NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

ANEXO 7. ACTA DE CIERRE COPASST

10 de diciembre del 2025

JPNTELLO

ACTA DE CIERRE

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST).

Hoy miércoles (10) de diciembre del 2025 siendo las 8: 00 am, nos reunimos en las instalaciones del campamento PAC, los integrantes del COPASST. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DEL PRIMER ORDEN, con el fin de dar cierre formal del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986 y al Decreto 1295 de 1994 en su artículo 63, Decreto 1072 de 2015 así como lo dispuesto en el SG-SST.

Durante la ejecución del contrato, el COPASST cumplió con las funciones establecidas en la normatividad vigente, participando en:

- La promoción y vigilancia del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- La inspección periódica de condiciones de trabajo.
- El seguimiento a la implementación de medidas preventivas y correctivas.
- La investigación y análisis de incidentes y accidentes de trabajo (cuando aplicó).
- La promoción de actividades de capacitación y prevención de riesgos laborales.

Con la terminación contractual formal del proyecto y la finalización total de las actividades operativas en obra, cesan las condiciones que dieron origen a la conformación del COPASST para este contrato específico. En consecuencia, se deja constancia del cierre formal del COPASST, sin que existan compromisos pendientes relacionados con la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo derivados del proyecto.

Leída la presente acta, se aprueba por unanimidad y se firma en señal de aceptación.

Firmas:

Presidente del COPASST
Aurelio Cubides
C.C. No12.101.945 de Neiva (Huila)

Secretario del COPASST
Haner Alberto Gallego
C.C. No1.075.242.622 de Neiva (Huila)

154

Powered by CamScanner

ANEXO 8. ACTA DE CIERRE DEL CCL

10 de diciembre del 2025

ACTA DE CIERRE

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL).

Hoy miércoles (10) de diciembre del 2025 siendo las 8: 00 am, nos reunimos en las instalaciones del campamento PAC, los integrantes del CCL. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DEL PRIMER ORDEN, con el fin de dar cierre formal del Comité de convivencia Laboral (CCL), dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 652 de 2012 y Ley 1010 de 2006 así como lo dispuesto en el SG-SST.

Durante la ejecución del contrato, el CCL cumplió con las funciones establecidas en la normatividad vigente, promoviendo un ambiente laboral respetuoso y gestionando de manera confidencial las situaciones relacionadas con la convivencia en el lugar de trabajo.

Con la terminación contractual formal del proyecto y la finalización total de las actividades operativas en obra, cesan las condiciones que dieron origen a la conformación del CCL para este contrato específico. En consecuencia, se deja constancia del cierre formal del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL), sin que existan compromisos pendientes relacionados con la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo derivados del proyecto.

Leída la presente acta, se aprueba por unanimidad y se firma en señal de aceptación.

Firmas:

Presidente del COPASST
Aurelio Cubides
C.C. No12.101.945 de Neiva (Huila)

Secretario del COPASST
Haner Alberto Gallego
C.C. No1.075.242.622 de Neiva (Huila)

Powered by CamScanner

ANEXO 9. ACTA DE CIERRE BRIGADAS DE EMERGENCIA

10 de diciembre del 2025

JPNTELLO

ACTA DE CIERRE

BRIGADAS DE EMERGENCIA

Hoy miércoles (10) de diciembre del 2025 siendo las 10: 00 am, nos reunimos en las instalaciones del campamento PAC, los integrantes de las brigadas de emergencia. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DEL PRIMER ORDEN, con el fin de dar cierre formal a las brigadas de emergencias contra incendio, evacuación, y primeros auxilios, dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 así como lo dispuesto en el SG-SST.

Con la terminación contractual formal del proyecto y la finalización total de las actividades operativas en obra, cesan las condiciones que dieron origen a la conformación de las brigadas de emergencia para este contrato específico. En consecuencia, se deja constancia del cierre formal a las brigadas de emergencias contra incendio, evacuación, y primeros auxilios, sin que existan compromisos pendientes relacionados con la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo derivados del proyecto.

Leída la presente acta, se aprueba por unanimidad y se firma en señal de aceptación.

Firmas:

Ingeniero Residente
Aurelio Cubides
C.C. No12.101.945 de Neiva (H)

Nasly Melissa Salas Sanchez

Profesional SST.
Nasly Melisa Salas
C.C. No1.079.184.726 Campoalegre (H)

153

Powered by CamScanner

ANEXO 10. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 4/12/2025

Código Equipo: Motoniveladora | Marca y Serie: 710 Champion 15 | Operador: Carlos

Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
EQUIPO SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
EQUIPO SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
EQUIPO SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de Inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga	X		
(zapatas, bujes y pasadores	X		
Carriles superiores e inferiores	X		
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor			X
Fuga Aceite Transmisiones			X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR | NOMBRE PROFESIONAL SST | FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 5/12/2025 | Operador: Carlos

Código Equipo: Motoniveladora | Marca y Serie: JIO champion | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos, Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
	X	X	
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga	X		
(zapatas, bujes y pasadores	X		
Carriles superiores e inferiores	X		
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor			X
Fuga Aceite Transmisiones			X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

1 / 1

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901788282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 9/12/2025		Operador: Carlos	
Código Equipo: Motoniveladora	Marca y Serie: 14G chuqing	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Silln del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
EQUIPO Extintor y botiquin	X		
EQUIPO Silla de la cabina	X		
EQUIPO Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X	X	
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga	X		
(zapatas, bujes y pasadores	X		
Carriles superiores e inferiores	X		
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor			X
Fuga Aceite Transmisiones			X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 10/12/2026.

Operador: Wuoseph Carlos.

Código Equipo: Retroexcavadora Marca y Serie: CA 210.

Horometro Inicial:

Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
Extintor y botiquin	X		
Silla de la cabina	X		
Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X	X	
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga	X		
(zapatas, bujes y pasadores	X		
Carriles superiores e inferiores	X		
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor			X
Fuga Aceite Transmisiones			X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

OTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 4/12/2025. | Operador: Fanyn.

Código Equipo: Retro. | Marca y Serie: JCB. Hidráchi | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas			X	Ventilador	X		
Vidrios, Espejos, Plumillas		X		Presiones de inflado			X	Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines			X	Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes			X	Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores			X	Ductos de admisión	X		
Indicador de presión aire	X			Amortiguadores			X	Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeción			X	SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico			X	Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo			X	Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo	X			Barra principal de dirección			X	Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal			X	Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa			X	Terminales			X	Aceite transmisiòn o caja	X		
Luces Direccionales			X	TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales	X		
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga	X			Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores	X			Refrigerante			X
Cableado			X	Carriles superiores e inferiores	X			Liquido de frenos			X
Conectores			X	Ruedas Tensoras	X			Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
EQUIPOS DE SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X			Sprocket	X			Fuga Aceite Hidraulicas	X		
EQUIPOS DE SEGURIDAD: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion	X			Fuga Aceite Motor	X		
EQUIPOS DE SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion	X			Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 5/12/2025.

Operador: Fermyn

Código Equipo: Retro

Marca y Serie: 200 - Hitachi

Horometro Inicial:

Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas		X	
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
SEGURIDAD Extintor y botiquin	X		
SEGURIDAD Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas			X
Presiones de inflado			X
Pernos de ruedas y rines			X
Eje muerto y bujes			X
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn			X
Barra transversal			X
Terminales			X
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga	X		
(zapatas, bujes y pasadores	X		
Carriles superiores e inferiores	X		
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket	X		
Motores de Traslacion	X		
Cadenas de las Traslacion	X		

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Exíjase amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 9/12/2025 | Operador: Fermyn

Código Equipo: Retro | Marca y Serie: 200 - Hitachy. | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas		X	
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
SEGURIDAD Extintor y botiquin	X		
SEGURIDAD Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas			X
Presiones de inflado			X
Pernos de ruedas y rines			X
Eje muerto y bujes			X
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn			X
Barra transversal			X
Terminales			X
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga	X		
(zapatas, bujes y pasadores	X		
Carriles superiores e inferiores	X		
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket	X		
Motores de Traslacion	X		
Cadenas de las Traslacion	X		

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Existen amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 10/12/2025		Operador: Fermin.	
Código Equipo: Eq10	Marca y Serie: 200 - Hitachi	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas			X	Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas		X		Presiones de inflado			X	Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines			X	Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes			X	Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores			X	Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores			X	Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn			X	SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico			X	Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo			X	Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn			X	Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal			X	Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa			X	Terminales			X	Aceite transmisiòn o caja	X		
Luces Direccionales			X	TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales	X		
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga	X			Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores	X			Refrigerante			X
Cableado			X	Carriles superiores e inferiores	X			Liquido de frenos			X
Conectores			X	Ruedas Tensoras	X			Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
EQUIPO SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X			Sprocket	X			Fuga Aceite Hidraulicas	X		
EQUIPO SEGURIDAD: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion	X			Fuga Aceite Motor	X		
EQUIPO SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion	X			Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 4/12/2025.

Código Equipo: Vibro. Dyn

Marca y Serie: CA 250

Operador: Luis Ortiz

Horometro Inicial:

Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servicio	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja			X
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Refrigerante	X		
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901786282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 5/12/2025 | Operador: Luis Diaz

Código Equipo: Vibro base | Marca y Serie: CA 250 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presión aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
Extintor y botiquin	X		
Silla de la cabina	X		
Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeción	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardán ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de dirección	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vástagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidráulico	X		
Aceite transmisión o caja			X
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Refrigerante	X		
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Existen amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901765282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 27/6/2025.

Operador: Luis Espinal

Código Equipo: Vibro Dyne | Marca y Serie: CA 25D | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
EQUIPO DE SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeción	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja			X
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Refrigerante	X		
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 10/12/2025 · Operador: Luis Oliveira

Código Equipo: VIBO. Marca y Serie: CA 250 · Horometro Inicial: Horometro Final:

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
SEGURIDAD Extintor y botiquin	X		
SEGURIDAD Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja			X
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Refrigerante	X		
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785382 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL TELLO

VIA Tello.

SEMANA DEL 1 AL 6 DE 12 2025.

QUH442. MODELO 7402. MARCA

LUIS WINNS. CEDULA 74.23.4377 KILOMETRAJE

DESCRIPCION	LUNES B	LUNES M	LUNES NA	MARTES B	MARTES M	MARTES NA	MIERCOLES B	MIERCOLES M	MIERCOLES NA	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES NA	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES NA	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO NA	OBSERVACIONES
A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO																			
Licencia de tránsito (Legible y disponible en el vehículo.)	X			X			X						X						
SOAT y Seguro Extracontractual (Legible y disponible en el vehículo.)	X			X			X						X						
Manifiesto de carga			X			X		X							X				
Revisión técnico mecánica y de gases. (Vigente y disponible en el vehículo)	X			X			X						X						
B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																			
Licencia de conducción (Vigente) Cat. 5 min.	X			X			X						X						
EPS- ARP-AFP	X			X			X						X						
Certificado de manejo defensivo (Vigente)	X			X			X						X						
C. ESTADO MECÁNICO																			
8 Niveles de fluido	X			X			X						X						
9 Estado y tensión de correas.	X			X			X						X						
10 Estado y sujeción de las mangueras.	X			X			X						X						
11 Sin fugas de fluidos		X			X			X						X					
12 Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	X			X			X						X						
D. PARTE EXTERNA																			
13 Estado general de la silbonería y pintura	X			X			X						X						
14 Estado de las puertas	X			X			X						X						
15 Espejo retrovisor	X			X			X						X						
16 Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	X			X			X						X						
E. CARROCERÍA VOLQUETA																			
17 Soportes y grapas	X			X			X						X						
18 Estado general del volquete	X			X			X						X						
19 Compuerta	X			X			X						X						
20 Sistema de levante de volqueta	X			X			X						X						
21 Bordeor	X			X			X						X						
22 Carpa de protección de la carga	X			X			X						X						
F. PARTES DE LA VOLQUETA																			
23 Cinturón de seguridad en todos los asientos	X			X			X						X						
24 Luz de cabina	X			X			X						X						
25 Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	X			X			X						X						
26 Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	X			X			X						X						
27 Pito y alarma de reversa	X			X			X						X						
G. EQUIPO DE PREVENCIÓN																			
28 Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo	X			X			X						X						
29 Botiquín	X			X			X						X						
30 Extintor	X			X			X						X						
31 LA VOLQUETA ES OPERATIVA	SI X		NO																

FIRMA CONDUCTOR

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA LA OPERACIÓN

REVISADO POR: PROFESIONAL SST

FIRMA

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785292 -7

INSPECCION PREOPERACIONAL TELLO

JPN TELLO

| | | |

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT 901178290-1

INSPECCION PREOPERACIONAL TELLO

JPN TELLO

VIA Tello.

PLACA: OWH 744 | MODELO: 1486. | MARCA: | KILOMETRAJE:

REF: 2 CIEN-7

SEMANA DEL 1 AL 6 DE 12 2023.

	DESCRIPCION	LUNES B	LUNES M	LUNES NA	MARTES B	MARTES M	MARTES NA	MIERCOLES B	MIERCOLES M	MIERCOLES NA	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES NA	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES NA	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO NA	OBSERVACIONES
	A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO																			
1	Licencia de tránsito (Legible y disponible en el vehículo)	X			X			X			X						X			
2	SOAT y Seguro Extracontractual (Legible y disponible en el vehículo)	X			X			X			X						X			
3	Manifiesto de carga		X			X			X			X						X		
4	Revisión técnico mecánica y de gases (Vigente y disponible en el vehículo)	X			X			X			X						X			
	B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																			
5	Licencia de conducción (Vigente) Cat. 5 min.	X			X			X			X						X			
6	EPS- ARP-AFP	X			X			X			X						X			
7	Certificado de manejo defensivo (Vigente)	X			X			X			X						X			
	C. ESTADO MECÁNICO																			
8	Niveles de fluido	X			X			X			X						X			
9	Estado y tensión de correas	X			X			X			X						X			
10	Estado y sujeción de las mangueras	X			X			X			X						X			
11	Sin fugas de fluidos	X			X			X			X						X			
12	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	X			X			X			X									
	D. PARTE EXTERNA																			
13	Estado general de la alboneria y pintura	X			X			X			X						X			
14	Estado de las puertas	X			X			X			X						X			
15	Espejo retrovisor	X			X			X			X						X			
16	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	X			X			X			X						X			
	E. CARROCERÍA VOLQUETA																			
17	Soportes y grapas	X			X			X			X						X			
18	Estado general del volquete	X			X			X			X						X			
19	Compuerta	X			X			X			X						X			
20	Sistema de levante de volqueta	X			X			X			X						X			
21	Vertedor	X			X			X			X						X			
22	Cargas de protección de la carga	X			X			X			X						X			
	F. PARTES DE LA VOLQUETA																			
23	Cinturón de seguridad en todos los asientos	X			X			X			X						X			
24	Luz de cabina	X			X			X			X						X			
25	Llantas (Sin cortaduras, sin abollamientos)	X			X			X			X						X			
27	Luces (Frontales- Exteriores- Traseras - Las parqueo - Las reversa)	X			X			X			X						X			
28	Pito y alarma de reversa	X			X			X			X						X			
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																			
29	Gato- Cruceta- dos señales de carretera en forma de triangulo- Dos tacos para bloqueo	X			X			X			X						X			
30	Botiquin	X			X			X			X						X			
31	Extintor	X			X			X			X						X			

LA VOLQUETA ES OPERATIVA	SI	NO	
NOMBRE CONDUCTOR			REVISADO POR: PROFESIONAL SST
NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA LA OPERACION			FIRMA

B. Bueno | M. Malo | NA: No aplica

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901795392 -7

INSPECCION PREOPERACIONAL TELLO

JPN TELLO

LUGAR: VIA Tello. | MODELO: 1988. | SEMANA DEL: 01 AL: 07 DE: 12 2025.

PLACA: OWH749 | MODELO: Ford | MARCA | KILOMETRAJE

CONDUCTOR: Pedro Cleroy | CEDULA

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES NA	MARTES B	MARTES M	MARTES NA	MIERCOLES B	MIERCOLES M	MIERCOLES NA	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES NA	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES NA	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO NA	OBSERVACIONES
	A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO																			
1	Licencia de tránsito (Legible y disponible en el vehículo.)				X			X			X			X						
2	SOAT y Seguro Extracontractual (Legible y disponible en el vehículo.)				X			X			X			X						
3	Manifiesto de carga						X			X			X			X				
4	Revisión técnico mecánica y de gases (Vigente y disponible en el vehículo)				X			X			X			X						
	B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																			
5	Licencia de conducción (Vigente) Cat. 5 min.				X			X			X			X						
6	EPS- ARP-AFP				X			X			X			X						
7	Certificado de manejo defensivo (Vigente)				X			X			X			X						
	C. ESTADO MECÁNICO																			
8	Niveles de fluido				X			X			X			X						
9	Estado y tensión de correas				X			X			X			X						
10	Estado y sujeción de las mangueras.				X			X			X			X						
11	Sin fugas de fluidos				X			X			X			X						
12	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)				X			X			X			X						
	D. PARTE EXTERNA																			
13	Estado general de la alfombra y pintura				X			X			X			X						
14	Estado de las puertas				X			X			X			X						
15	Espejo retrovisor				X			X			X			X						
16	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)				X			X			X			X						
	E. CARROCERÍA VOLQUETA																			
17	Soportes y grapas				X			X			X			X						
18	Estado general del volquete				X			X			X			X						
19	Compuerta				X			X			X			X						
20	Sistema de levante de volqueta				X			X			X			X						
21	Bastidor				X			X			X			X						
22	Carga de protección de la carga				X			X			X			X						
	F. PARTES DE LA VOLQUETA																			
23	Cinturón de seguridad en todos los asientos				X			X			X			X						
2	Luz de cabina				X			X			X			X						
28	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)				X			X			X			X						
27	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo) - De reversa)				X			X			X			X						
28	Pito y alarma de reversa				X			X			X			X						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																			
29	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo				X			X			X			X						
30	Botiquín				X			X			X			X						
31	Extintor				X			X			X			X						

LA VOLQUETA ES OPERATIVA: SI X | NO

FIRMA CONDUCTOR

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA LA OPERACION

REVISADO POR: PROFESIONAL SST

FIRMA

B: Bueno | M: Malo | NA: No aplica

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901195393-1

INSPECCION PREOPERACIONAL TELLO

JPN TELLO

LUGAR: Tello

PLACA: OLD 126. | MODELO: 1985.

SEMANA DEL: 1 AL: 6 DE: 12 2025.

MARCA: (Hyd. Cortes) | KILOMETRAJE:

CEDULA: 4'890.672.

	DESCRIPCION	LUNES B	M	NA	MARTES B	M	NA	MIERCOLES B	M	NA	JUEVES B	M	NA	VIERNES B	M	NA	SÁBADO B	M	NA	OBSERVACIONES
	A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO																			
1	Licencia de tránsito (Legible y disponible en el vehículo)	X			X			X						X			X			
2	SOAT y Tecnomecánica (Legible y disponible en el vehículo)	X			X			X						X			X			
3	Manifiesto de carga			X			X			X						X			X	
4	Revisión técnico mecánica y de gases (Vigente y disponible en el vehículo)	X			X			X						X			X			
	B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																			
5	Licencia de conducción (Vigente) Cat. B mín.	X			X			X						X			X			
6	EPS, ARP, AFP	X			X			X						X			X			
7	Certificado de manejo defensivo (Vigente)	X			X			X						X			X			
	C. ESTADO MECÁNICO																			
8	Niveles de fluidos	X			X			X						X			X			
9	Estado y tensión de correas	X			X			X						X			X			
10	Estado y sujeción de las mangueras	X			X			X						X			X			
11	Sin fugas de fluidos	X			X			X						X			X			
12	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	X			X			X						X			X			
	D. PARTE EXTERNA																			
13	Estado general de la silletería y pintura	X			X			X						X			X			
14	Estado de las puertas	X			X			X						X			X			
15	Espejos retrovisor	X			X			X						X			X			
16	Vidrios panorámicos / ventanas. (Sin roturas / manchas / deformaciones / No polarizados)	X			X			X						X			X			
	E. CARROCERÍA VOLQUETA																			
17	Soportes y grapas	X			X			X						X			X			
18	Estado general del volquete	X			X			X						X			X			
19	Compuerta	X			X			X						X			X			
20	Sistema de levante de volqueta	X			X			X						X			X			
21	Cuerdas	X			X			X						X			X			
22	Carga de distribución de la carga	X			X			X						X			X			
	F. PARTES DE LA VOLQUETA																			
23	Sistema de seguridad en todas las asientos	X			X			X						X			X			
24	Luz de cabina	X			X			X						X			X			
25	Luces (de carretera, de alumbramiento)	X			X			X						X			X			
26	Luces direccionales: Delanteras Traseras Un parqueo Un reversa	X			X			X						X			X			
27	Pito o alarma de reversa	X			X			X						X			X			
	G. EQUIPO DE PROTECCIÓN																			
28	Casco con barbuquejo, con sistema de carretilla en forma de trabajo. Con faja para trabajo	X			X			X						X			X			
29	Guantes	X			X			X						X			X			
30	Botines	X			X			X						X			X			
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA	SI			NO															

REVISADO POR: PROFESIONAL SST

FIRMA:

B: Bueno M: Malo NA: No aplica

176

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901765253 .7

INSPECCION PREOPERACIONAL TELLO

JPN TELLO

LUGAR: Vía Tello.

SEMANA DEL: 9 AL: 13 DE: 12/2025.

PLACA: OZD 276. MODELO: 1995. MARCA: KILOMETRAJE:

CONDUCTOR: Hugo Cortes CEDULA: 4'940 692.

ITEM	DESCRIPCION	LUNES B	LUNES M	LUNES NA	MARTES B	MARTES M	MARTES NA	MIERCOLES B	MIERCOLES M	MIERCOLES NA	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES NA	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES NA	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO NA	OBSERVACIONES
	A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO																			
1	Licencia de tránsito (Legible y disponible en el vehículo.)	X			X						X			X			X			
2	SOAT y Seguro Extracontractual (Legible y disponible en el vehículo.)	X			X						X			X			X			
3	Manifiesto de carga			X			X						X			X			X	
4	Revisión técnico mecánica y de gases (Vigente y disponible en el vehículo)	X			X						X			X			X			
	B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																			
5	Licencia de conducción (Vigente) Cat. 5 min.	X			X						X			X			X			
6	EPS- ARP-AFP	X			X						X			X			X			
7	Certificado de manejo defensivo (Vigente)	X			X						X			X			X			
	C. ESTADO MECÁNICO																			
8	Niveles de fluido	X			X						X			X			X			
9	Estado y tensión de correas	X			X						X			X			X			
10	Estado y sujeción de las mangueras.	X			X						X			X			X			
11	Sin fugas de fluidos	X			X						X			X			X			
12	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	X			X						X			X			X			
	D. PARTE EXTERNA																			
13	Estado general de la latonería y pintura	X			X						X			X			X			
14	Estado de las puertas	X			X						X			X			X			
15	Espejo retrovisor	X			X						X			X			X			
16	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	X			X						X			X			X			
	E. CARROCERÍA VOLQUETA																			
17	Soportes y grapas	X			X						X			X			X			
18	Estado general del volquete	X			X						X			X			X			
19	Compuerta	X			X						X			X			X			
20	Sistema de levante de volqueta	X			X						X			X			X			
21	Bastidor	X			X						X			X			X			
22	Garpa de protección de la carga	X			X						X			X			X			
	F. PARTES DE LA VOLQUETA																			
23	Cinturón de seguridad en todos los asientos.	X			X						X			X			X			
24	Luz de cabina	X			X						X			X			X			
25	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	X			X						X			X			X			
27	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	X			X						X			X			X			
26	Pito y alarma de reversa	X			X						X			X			X			
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																			
28	Gato, Cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo. Dos tacos para bloqueo	2			X						X			X			X			
30	Bolsiquin	2			X						X			X			X			
31	Extintor	2			X						X			X			X			
	LA VOLQUETA ES OPERATIVA	SI		NO																
	FIRMA CONDUCTOR																			
	NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA LA OPERACIÓN																			

REVISADO POR: PROFESIONAL SST

FIRMA:

CONVENCIONES

B: Bueno | M: Malo | NA: No aplica

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 6/12/2025.		Operador: John Myn.	
Código Equipo: Finisher	Marca y Serie:	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura			X
Elementos de desgaste			X
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire			X
Indicador Nivel Combustible			X
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
Extintor y botiquín			X
Silla de la cabina	X		
Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

John Myn	Mayly Melissa Solano S.	
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901765282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 6/12/2025. | Operador: Aldana

Código Equipo: Vibro pavimento | Marca y Serie: CA 152. | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado	X		
Conectores	X		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			X
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja			X
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor			X
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

ANEXO 11. ACTA DE CIERRE GRUPO AMBIENTAL

10 DE DICIEMBRE 2025

JPNTELLO

ACTA DE CIERRE GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Hoy miércoles 10 del mes de diciembre del año 2025 nos reunimos en las instalaciones del campamento PAC, con el fin de dar cierre el grupo administrativo de Gestión Ambiental (PAGA), se realiza para la ejecución de las obras constructivas del proyecto **REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DEL PRIMER ORDEN,** dando cumplimiento a los principales lineamientos de la constitución de 1991 y la ley 99 de 1993.

Las siguientes personas fueron elegidas para conformar el grupo de Gestión Ambiental "PAGA":

NOMBRE	CEDULA	CARGO
AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE
EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE
DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST
NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST

El Grupo administrativo de Gestión Ambiental del Consorcio Infraestructura JPNTELLO cumplió con las responsabilidades asignadas para el periodo evaluado, garantizando el desarrollo del proyecto bajo criterios de sostenibilidad, prevención de impactos ambientales y cumplimiento legal.

No siendo otro el objeto de la reunión, se da por terminada a las 2:00pm horas del mismo día, dejando constancia mediante la firma de los asistentes.

Nasly Melissa Salas Sanchez

FIRMA PROFESIONAL SST
NASLY MELISA SALAS

FIRMA ING.RESIDENTE
EDGAR MAURICIO PERDOMO

FIRMA PROFESIONAL SST
DANIELA PERDOMO HORTA


FIRMA ING.RESIDENTE
AURELIO CUBIDES

Powered by CamScanner

ANEXO 12. FACTURAS PMA Y PMT

DISTRIBUCIONES MEJIA UNO SAS

RESPONSABLE DE IVA 901.046.409-5
CARRERA 7 NO 4 - 34 CENTRO NEIVA - HUILA
CELL: 3143131943 - 31252339442
EMAIL: distribucionesmejia@gmail.com



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FED 5587 M

Fecha : 10/12/2025
Cliente : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
Dirección : CL 104 14A-45 OF 401
Forma de pago : CRÉDITO

Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
NIT ó C.C : 901785282
Tel:
Cel: 3182818164
Fecha de Vencimiento : 10/01/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND.MEDIDA	CANTIDAD	% IVA	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FER013	BARRICADA DE LISTONES, CON TABLER	UNIDAD	12,00	19		7.200.000,00
2	FER022	PALETA DE CONTROL PARE-SIGA	UNIDAD	8,00	19		248.000,00
3	FER014	SEÑAL INICIO DE OBRA (VELOCIDAD MEN	UNIDAD	13,00	19		4.485.000,00
4	FER015	SEÑAL FIN DE OBRA (VELOCIDAD MENOR	UNIDAD	13,00	19		4.485.000,00
5	FER016	SEÑAL SPO-1 TRABAJOS EN LA VIA (VEL	UNIDAD	16,00	19		5.520.000,00
6	FER017	SEÑAL SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA (V	UNIDAD	15,00	19		5.175.000,00
7	FER018	SEÑAL SPO-03 AUXILIAR DE TRANSITO (V	UNIDAD	8,00	19		2.760.000,00
8	FER019	DELINEADOR COMPUESTO SEPARADO C	UNIDAD	33,00	19		3.234.000,00
9	FER012	CINTA DE DEMARCACION (500M)	UNIDAD	25,53	19		919.000,00
10	FER020	RADIO TELEFONO BANDA VHF (FRECUEN	UNIDAD	8,27	19		1.488.800,00
11	FER023	CHALECOS REFLECTIVOS	UNIDAD	8,00	19		440.000,00
12	FER021	PLANOS PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	UNIDAD	4,00	19		60.000,00

Sub - total $ 30.264.537,00 **IVA 19%** $ 5.750.263,00 **Descuento** $ 0,00 $ 0,00

SON : TREINTA Y SEIS MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE **********

TOTAL $ 36.014.800,00

Para todos los efectos legales, esta factura se asimila a una letra de cambio según el Art. 774 del código de comercio.

Resolución No. 18764087116971, Del 14 de enero de 2025 Desde: 4001 Hasta 7000 VIGENCIA 12 MESES

PARRA VALENZUELA MARIA ELENA

Impreso por:
Original

CLIENTE FIRMA NIT ó C.C

193

FECHA ACEPTACION 21 de febrero de 2026 08:53 a. m.

21 de febrero de 2026 8:54 a. m.

a89e7149e739c17c51c0b2fe21fd55fc0ba56497df5b1c4991187c61005906070c454a3ea5a2ac3c091884dce6cb808f

DISTRIBUCIONES MEJIA UNO SAS

RESPONSABLE DE IVA 901.046.409-5
CARRERA 7 NO 4 - 34 CENTRO NEIVA - HUILA
CELL: 3143131943 - 31252339442
EMAIL: distribucionesmejia@gmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FED 5586 M

Fecha : 10/12/2025
Cliente : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
Dirección : CL 104 14A-45 OF 401
Forma de pago : CRÉDITO

Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
NIT ó C.C : 901785282
Tel:
Cel: 3182818164
Fecha de Vencimiento : 10/01/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND.MEDIDA	CANTIDAD	% IVA	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FER011	KIT PARA DESPERDICIOS SOLIDOS (INCL	UNIDAD	1,00	19		7.084.000,00

Sub - total $ 5.952.941,00 **IVA 19%** $ 1.131.059,00 **Descuento** $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00

SON : SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ********** $ 0,00 **TOTAL** **$ 7.084.000,00**

Para todos los efectos legales, esta factura se asimila a una letra de cambio según el Art. 774 del código de comercio.

Resolución No. 18764087116971, Del 14 de enero de 2025 Desde: 4001 Hasta 7000 VIGENCIA 12 MESES

PARRA VALENZUELA MARIA ELENA

Impreso por:
Original

CLIENTE FIRMA NIT ó C.C

184

FECHA ACEPTACION 21 de febrero de 2026 08:25 a. m.

21 de febrero de 2026 8:25 a. m.

ab588a0cd8264fd407b3c66d1b217b3f6f6333faecc181ca2be73742877d68a07c0d0b8cb7835a24cfd4cdd841307c89

www.seapyme.com.co
Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.457-4 Tel. 871 5007 - 314 3706642

Ingeniería Civil
Claudio César Mejía Gutiérrez

CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
12.138.187-6
CR 7 NO 4 - 34
claudiomejiag@gmail.com
038-8720825 312-523-39-42

Resolución DIAN Nro: 18764103848617, Fecha: 29/12/2025 12:00:00
Desde: 562 Hasta 1000

RESPONSABLE IVA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA CCMG - 567

Fecha: 10/12/2025
Cliente: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
Direccion: CL 104 14 A 45 OF 401
Forma Pago: CRÉDITO
Observaciones: Sitio para uso de baño, desmantelamiento obras provisionales, rest

Fecha Vence: 9/01/2026 9:39:45 a. m.
Nit ó C.C : 901785282 - 7
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Teléfono: 3182818164
Dias credito: 30

Código	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal	% IVA	Valor IVA	Total
SER030	CONTRATO DE OBRA - Sitio para uso de baño, desmantelamiento obras provisionales, restauracion de areas intervenidas y riego de plantas tapizantes	1,00	29.636.731,00	29.636.731,00	0,00	0,00	29.636.731,00
SER029	ADMINISTRACION E IMPREVISTOS -	1,00	2.074.571,00	2.074.571,00	0,00	0,00	2.074.571,00
SER014	UTILIDAD -	1,00	1.763.385,00	1.481.836,00	19,00	281.549,00	1.763.385,00

Base Gravada: $ 1.481.836,00 Base Exenta: $ 31.711.302,00 Base Excluida: $ 0,00 Subtotal : $ 33.193.138,00
GRAVADO 19% $ 281.549,00 $ 0,00 $ 0,00 Total IVA : $ 281.549,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

Son: TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE **********

Neto a Pagar: $ 33.474.687,00

PARRA VALENZUELA MARIA ELENA
ELABORO:

Saldo Cartera Cliente: 937.039.938,00

Original Página 1 de 1

RECIBÍ CONFORME:

CÓDIGO CUFE:

FECHA ACEPTACION: 5/03/2026 10:03:11 a. m.

53b7fed95c98cc9a41ff50c76eee39d51e7097c05c02394ee5a0246f84d5b3bfeccb08b43e34ffc6dcca0db7e3566ab0

Impreso por: VEND

Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 862 9090 - 311 5310210

5 de marzo de 2026 10:03 a. m.

www.seopyme.com.co

185

DST 4 DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Autorización DIAN 18764094868270 de 26/06/2025

Desde 1 Hasta 1000 Vigencia 26/06/2027

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

Fecha de expedición	Fecha de operación	Moneda	Tasa de cambio
05/03/2026	01/03/2026	COP	No aplica

Centro de costos
0102 - OBRAS TELLO

Concepto general
TALLERES AMBIENTALES DIRIGIDOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL AREA DE INLUENCIA PROYECTO TELLO HUILA (Documento del tercero No. CTACOBRO001-2026)

Adquiriente	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT	901785282 - 7
Ciudad	Bogotá, D.C.
Direccion	CRA 7 # 24 89 OF 3701
Telefono	7452219

Beneficiario	PEÑA MARTINEZ MARIO ALBERTO
CC	7729229 - 5
Ciudad	Neiva
Direccion	CL 22 A SUR 32 56 TO 9 AP 501
Telefono	314384331

Detalle	Total
TALLERES AMBIENTALES DIRIGIDOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL AREA DE INLUENCIA PROYECTO TELLO HUILA	$ 3.080.000,00
Total	**$ 3.080.000,00**

Código único de documento

e1d984d03e1e0501cf1ca53c2444aad0c9c87f62946fd7f7d9391783e5acd18fe63318648ff6186cdc248f3e3f7d7993

Valor firma digital

D/v4RGbQX1cPExR87zP3BzMtfgAEoR0kVCmhKiZ2YcEe3rfQqvM2VVUvL6ysecu/nSkXrvj+UzoWBe10LXFdHPxU+IcSaqI7j1z
M8tUsuxP49gNpLjY/aML/x63ScD8fG9D652LiZ71e2WXaCtlvo2nYtirVh2sUjFZHMa4Iq2GzigZjbjlmzvzEOCot18jtr39IpebpyJmIF
9v51SV4MsoGriBpqn4Dd6Y2md4u94bKqsBj6ZfN3ADr0PzmBz+u0/ZJhXpqmn1Ckm1BNKFP/A+DVNvWBbpjlZq16FHL6Fs93p
u4PP+l3E3HD/4ILWMlv5rn3iFfHvwN19Hh3OKtLg==

LA PRESENTE CUENTA DE COBRO SOLO ORIGINA LA OBLIGACION DE PAGO AQUÍ ESTIPULADO POR TRABAJO CONTRATADO Y DESCRITO EL CUAL FUE REALIZADO A DESTAJO, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD FORMULADA POR EL CONTRATANTE. IGUALMENTE HAGO CONSTAR QUE A LA FECHA LOS SEÑORES **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO** SE ENCUENTRAN A PAZ Y SALVO CON EL SUSCRITO SIN QUE EXISTAN OBLIGACIONES PENDIENTES DE NINGUN TIPO.

DST 3 DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Autorización DIAN 18764094868270 de 26/06/2025

Desde 1 Hasta 1000 Vigencia 26/06/2027

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

Fecha de expedición	Fecha de operación	Moneda	Tasa de cambio
05/03/2026	01/03/2026	COP	No aplica

Centro de costos
0102 - OBRAS TELLO

Concepto general
SUMIISTRO DE REFRIGERIOS PARA LA REUNION FINAL PROYECTO TELLO HUILA (Documento del tercero No. C.COBRO003-2026)

Adquiriente	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT	901785282 - 7
Ciudad	Bogotá, D.C.
Direccion	CRA 7 # 24 89 OF 3701
Telefono	7452219

Beneficiario	CHARRY TAVERA KIMBERLY
CC	1003819875 - 6
Ciudad	Neiva
Direccion	AV LA LOMA 9 66 AP 301
Telefono	3178714725

Detalle	Total
SUMIISTRO DE REFRIGERIOS PARA LA REUNION FINAL PROYECTO TELLO HUILA	$ 440.010,00
Total	**$ 440.010,00**

Código único de documento

06cd546cb949eef619c4dde6fd998c1905eef7fe1a5639185000b8bf04dacf104db007f559f35ee9cd2bc2a8c6f389a8

Valor firma digital

aMYl1SlYAZ8jBxy4w1LPrsCXJTi1zg0ga5w7Q5sGY8YfoM8QluHCWcJLyxurF6VCFZwnaU1nN4UbakVlSUf8HBCrPEqBoMPxjg
f3cbfaV4h7s/er+qFyi+aYG8jWBt+mQozhPbwueZTczOpPVWUAr/1atyd/NkZ+VewQ57YmiJPXo3V1lJpErnKBFHmLk1jLgRjH1w
eLM8xEr/gfwrCvpudZMFq9g3k6KSgoHul3ffZOJHYdgt5ipzz1A+40UqVlVV5dO8SMEKA3t6mpy5XZelfhk2kK9srGUvdDBt9ZdWL
2P6QiRuVq0l44lLPV0KougXGehkoWwx/r9YN2fFqWfA==

LA PRESENTE CUENTA DE COBRO SOLO ORIGINA LA OBLIGACION DE PAGO AQUÍ ESTIPULADO POR TRABAJO CONTRATADO Y DESCRITO EL CUAL FUE REALIZADO A DESTAJO. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD FORMULADA POR EL CONTRATANTE. IGUALMENTE HAGO CONSTAR QUE A LA FECHA LOS SEÑORES **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO** SE ENCUENTRAN A PAZ Y SALVO CON EL SUSCRITO SIN QUE EXISTAN OBLIGACIONES PENDIENTES DE NINGUN TIPO.

ANEXO 13. CERTIFICADO PAZ Y SALVO DISPOSICION FINAL

MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 17/01/2024
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 02
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO23-MA-B4
"CERTIFICACIÓN"	PÁGINA: 1 de 1

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

Radicado:
2026CS000296-1
Fecha: 2026-02-23
2026PQR00000314

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO DE INTRAESTRUCTURA JPN TELLO** y/o **CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ**, realizaron en esta localidad, la disposición final de materiales de excavación y fresado, del Contrato de Obra Nro. 015 de 2024, en coordinación con la Administración Municipal, quedando a paz y salvo por este concepto, a partir del 10/12/2025.

Se expide en Tello Huila, a los Veintitrés (23) días del mes de Febrero de Dos mil Veintiséis (2026).

Juan Carlos Medina Robles

JUAN CARLOS MEDINA ROBLES
Secretario General y de Gobierno

Proyectó: Juan Carlos Medina Robles	Revisó: JUAN CARLOS MEDINA ROBLES,	Aprobó: JUAN CARLOS MEDINA ROBLES
Cargo: Secretario General y de Gobierno	Cargo: Secretario General y de Gobierno.	Cargo: Secretario General y de Gobierno

ANEXO 14. ACTA DE CIERRE DE VEEDURIAS

JPNTELLO

ACTA DE CIERRE DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Municipio de Tello el día 18 del mes de marzo de 2025, se reunió la Asamblea compuesta por las personas que conforman Las veedurias para el proyecto, la Veeduria transparencia con resolución No 014 del 17 de febrero de 2025 , veeduría ciudadana con resolución No 016 del 19 de febrero de 2025 y veeduría social por Tello con resolución No 019 del 21 de febrero de 2025 del Municipio Tello Huila, para terminar el proceso de seguimiento (Cierre) de la Veeduría del proyecto: "Contrato de Obra **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 15 DE 2024, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.** " el objeto de dar por terminado la Veeduria Ciudadana según los lineamientos de la Ley 136 DE 1994 y la ley 850 de 2003.

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia le reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad compromiso con su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del Estado.

DECIDIMOS

PRIMERO: Dar por terminado el seguimiento de Veeduria transparencia, veeduría ciudadana y veeduria social por Tello, al Contrato de Obra pública N° No. 15 DE 2024, en el municipio de Tello Huila.

Powered by CamScanner

JPNTELLO

VEEDURIA TRANSPARENCIA

NOMBRE	C.C	CARGO
DEICI ALEJANDRA GUTIÉRREZ TOBAR	26.585.822	PRESIDENTE
ADRIANA MARÍA DÍAZ	26.585.849	VEEDOR
JOSÉ VICENTE SOLANO VARGAS	12.126.709	VEEDOR

"VEEDURÍA CIUDADANA REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE FORTALECILLAS-TELLO

NOMBRE	C.C	CARGO
JESÚS ANTONIO TRUJILLO TOVAR	12.109.567	PRESNIDENTE
JAMITH SEFAIR GARCÍA	83.242.512	VICEPRESIDENTE
ARMANDO SÁNCHEZ MOSQUERA	83.243.590	SECRETARIO

VEEDURÍA SOCIAL POR TELLO

NOMBRE	C.C	CARGO
OSCAR IVÁN MARTÍNEZ	83.242.784	N/A
JOSÉ EDGAR TELLO BERRIO	12.225.095	N/A
RAÚL CARDOZO RODRÍGUEZ	4.942.911	N/A

SEGUNDO: Los Veedores ratifican el compromiso que adquirieron ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 136 DE 1994 y la ley 850 de 2003 y las demás normas que rigen la participación ciudadana, mediante su firma.

TERCERO: Los Veedores afirman que a la fecha no se cuenta con peticiones, quejas, reclamos o solicitudes pendientes respecto a las obras realizadas por el Consorcio Infraestructura JPNTELLO.

Powered by CamScanner

CUARTO: Que los veedores realizan recorrido de campo y dejan constancia que la intervención de los 25 tramos con pavimento asfáltico en una longitud total de 5,34 km, se ejecutó de acuerdo a las especificaciones técnicas y las cantidades establecidas.

FIRMAS

VEEDURIA TRANSPARENCIA

NOMBRE	C.C	FIRMA
DEICI ALEJANDRA GUTIÉRREZ TOBAR	26.585.822	
ADRIANA MARÍA DÍAZ	26.585.849	
JOSÉ VICENTE SOLANO VARGAS	12.126.709	

"VEEDURÍA CIUDADANA REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE FORTALECILLAS-TELLO

NOMBRE	C.C	FIRMA
JESÚS ANTONIO TRUJILLO TOVAR	12.109.567	
JAMITH SEFAIR GARCÍA	83.242.512	
ARMANDO SÁNCHEZ MOSQUERA	83.243.590	

VEEDURÍA SOCIAL POR TELLO

NOMBRE	C.C	FIRMA
OSCAR IVÁN MARTÍNEZ	83.242.784	
JOSÉ EDGAR TELLO BERRIO	12.225.095	
RAÚL CARDOZO RODRÍGUEZ	4.942.911	

Dada en el Municipio de Tello a los 18 días del mes Marzo del año 2026.

Powered by CamScanner

ANEXO 15. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO PERSONAL JPNTELLO

JPNTELLO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	GÉNERO	EDAD	LUGAR DE RESIDENCIA	CARGO	ÁREA / SECCION / LUGAR DE TRABAJO	TURNO DE TRABAJO (Horas)	SALARIO	ESCOLARIDAD	ESTADO CIVIL	NÚMERO DE HIJOS	OTRAS PERSONAS A CARGO	ESTRATO SOCIAL
12.101.945	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	Masculino	73	NEIVA	ING. RESIDENTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Profesional	Soltero	3	Si	3
1.075.242.822	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	Masculino	35	NEIVA	TOPOGRAFO	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Profesional	Soltero	0	Si	3
19.105.846	HECTOR RUBIO DIAZ	Masculino	75	NEIVA	CADENERO 2	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Casado	3	Si	2
93.129.015	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	Masculino	52	NEIVA	CADENERO 1	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Técnico	Casado	1	Si	2
1.082.804.610	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	Femenino	32	TELLO	PALETERA	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Unión Libre	2	Si	2
26.586.026	MAGALY OLIVEROS SOTTO	Femenino	42	TELLO	PALETERA	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Casado	2	Si	1
1.082.804.794	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	Femenino	29	TELLO	PALETERA	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Soltero	2	Si	1
1.078.778.338	DANIELA PERDOMO HORTA	Femenino	28	BARAYA	PROFESIONAL SST	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Profesional	Casado	1	Si	1
83.233.181	LUNIO QUINTERO POLANIA	Masculino	60	NEIVA	CONDUCTOR VOLQ	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	Soltero	3	Si	2
4.897.316	DIOGENES YUCUMA	Masculino	58	NEIVA	CONDUCTOR VOLQ	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	Soltero	1	Si	1
83.242.768	RICARDO JAVIER SANCHES	Masculino	52	TELLO	AYUDANTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	Soltero	1	Si	1
4.898.799	LUIS CARLOS OSPINA	Masculino	64	NEIVA	OPE. VIBRO COMPACTADOR	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Primaria Completa	Soltero	0	No	1
1.075.246.303	EDGAR MAURICIO PERDOMO	Masculino	34	NEIVA	ING. RESIDENTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Profesional	Casado	1	Si	2
1.082.803.924	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	Femenino	35	TELLO	PALETERA	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Técnico	Soltero	2	Si	2
1.079.184.726	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	Femenino	28	BARAYA	PROFESIONAL SST	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Profesional	Unión Libre	1	Si	1
1.075.236.051	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	Masculino	36	NEIVA	CONDUCTOR VOLQ	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Unión Libre	2	Si	1
85.449.283	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	Masculino	58	NEIVA	OPE. MOTONIVELADORA	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	Unión Libre	4	Si	2
1.075.252.102	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	Masculino	34	NEIVA	OPE.RETRO EXCABADORA	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Unión Libre	2	Si	2
1.003.861.176	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	Masculino	29	NEIVA	OFCIAL	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	Soltero	3	Si	1
1.075.205.580	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	Masculino	30	NEIVA	OFCIAL	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Unión Libre	1	Si	2
1.006.528.347	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	Masculino	24	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Soltero	0	No	2
1.082.806.583	EDISON MENDEZ PERDOMO	Masculino	27	TELLO	AYUDANTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Soltero	0	Si	1
4'943.631	EVERLEDETH REYES ROCHA	Masculino	60	TELLO	AYUDANTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Primaria Completa	Casado	1	Si	1
1.075.225.724	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	Masculino	20	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Soltero	0	No	2
7.685.099	JAIRO PENAGOS	Masculino	59	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8Horas	SALARIO MINIMO	Primaria Completa	Unión Libre	5	Si	1
1.079.604.810	LORENZO MONTEALEGRE	Masculino	45	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Unión Libre	3	Si	1
17.627.931	OMAR QUINTERO VARGAS	Masculino	68	NEIVA	CONDUCTOR VOLQ	TELLO	8Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Divorciado	4	Si	2
79.234.377	LUIS EDUARDO VARGAS	Masculino	63	NEIVA	CONDUCTOR VOLQ	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Primaria Completa	Unión Libre	3	Si	1
7.722.955	JOSE HERNEY VALDERRAMA	Masculino	42	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Unión Libre	2	Si	1
83.222.367	MOISES CASILIMA PERDOMO	Masculino	43	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Primaria Completa	Unión Libre	2	Si	1
12.211.022	JOSE WILMAN HERNANDEZ	Masculino	45	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	Unión Libre	2	Si	1
79.253.679	PEDRO JERONIMO SIERRA	Masculino	64	RIVERITA	CONDUCTOR VOLQ	TELLO	8 Horas	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Divorciado	3	Si	1
1.022.398.291	HUGO CORTES	Masculino	38	BARAYA	CONDUCTOR VOLQ	TELLO	8HORAS	SALARIO MINIMO	Secuandario completa	union libre	3	Si	1
83.222.337	GABRIEL CASILIMA	Masculino	45	BARAYA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	union libre	3	Si	1
34.193.883	DANIRLEY DURAN NARVEZ	Masculino	44	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	union libre	2	Si	1
1.004.360.617	DARIO JOSE MONTAÑO	Masculino	23	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	union libre	0	Si	1
1.117.830.339	JERSON ENRRIQUE RODRIGZ	Masculino	33	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	union libre	2	Si	1
1.003.893.890	JUAN DAVID VARGAS	Masculino	33	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Soltero	1	Si	1
1.003.838.568	DIMAS OVIEDO	Masculino	23	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Secundaria Completa	Soltero	2	Si	1
1.077.722.003	JHOAN JURADO	Masculino	20	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	Soltero	0	Si	1
1.075.246.515	CARLOS PEREZ	Masculino	22	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	Soltero	0	Si	1
1.003.809.880	ESTEBAN DUSSAN	Masculino	22	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	Soltero	1	Si	1
1.075.263.371	AUNEY RODRIGEZ	Masculino	33	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	Soltero	1	Si	1
1.75.253.351	CRISTIAN VIDALES	Masculino	34	NEIVA	CONDUCTOR VOLQ	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	Soltero	1	Si	1
7.720.852	JOSE LUIS BURGOS	Masculino	45	NEIVA	AYUDANTE GAVIONES	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	union libre	1	Si	1
83.247.999	OLIVER AYA GONZALES	Masculino	51	NEIVA	AYUDANTE GAVIONES	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	union libre	2	Si	1
12.135.093	OMAR MENDEZ ARMANZA	Masculino	54	NEIVA	AYUDANTE GAVIONES	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	union libre	2	Si	1
1.075.794.759	JHOAN SEBASTIAN SOLANO	Masculino	18	FINCA GUASIMOS TELLO	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	union libre	0	Si	1
1.079.681.021	NICOLAS ANDREY MESA	Masculino	18	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	Soltero	0	Si	1
1.007.778.680	RICARDO DIAZ WALTERO	Masculino	24	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	union libre	0	Si	1
98.634.028	CARLOS ARTURO REGINO	Masculino	45	NEIVA	OPE. MOTONIVELADORA	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Primaria Incompleta	union libre	2	Si	1
1.082.805.338	DANIEL ANDRES BERMEO	Masculino	31	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	union libre	2	Si	1
1.007.258.395	NERME BERMEO CANENA	Masculino	58	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	union libre	1	Si	1
1.023.907.264	YEISON SOLER MONTOLLA	Masculino	34	NEIVA	AYUDANTE	TELLO	8 HORAS	SALARIO MINIMO	Secundaria Incompleta	union libre	1	Si	1

Anexo 7
Correspondencia

Neiva, 10 de diciembre de 2025

Ingeniera
ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES
Supervisor del Contrato
Gobernación del Huila
Carrera 4 callo 8 piso (Esquina)
Neiva – Huila

CO-15-24-46.

Ref.: Contrato de Obra No 0015 DE 2024 cuyo Objeto es: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Asunto: Entrega acta parcial de obra No 4 contrato de referencia

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito entregar acta parcial de obra No 4 correspondiente al periodo del 1 de octubre al 5 de diciembre de 2025 contrato de obra No 015 de 2024 cuyo objeto es: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Anexo carpeta No 1 acta parcial No 4 del folio 1 al folio 250.
Anexo carpeta No 2 acta parcial No 4 del folio 251 al folio 500.
Anexo carpeta No 3 acta parcial No 4 del folio 501 al folio 750.
Anexo carpeta No 4 acta parcial No 4 del folio 751 al folio 792.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,

CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO.

Anexo 8

Calibracion de equipos

CASA DEL
TOPÓGRAFO

Bogotá
21 de julio de 2023

No. 0289

CERTIFICADO DE ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO GNSS

Por medio de la presente, CASA DEL TOPOGRAFO COLOMBIA S.A.S., NIT. 900.681833-4, en calidad de distribuidor exclusivo para la República de Colombia de los equipos de la línea de productos GNSS de la marca EFIX, CERTIFICA que el sistema GNSS marca **EFIX** referencia **eBase/F7** cuyas antenas tienen números de serie F7-**3631111** y **eBase-3595736**, cumple con los parámetros del fabricante y se encuentra en el rango de precisión, referente a las características técnicas para este modelo de equipo y en óptimas condiciones de funcionamiento.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Constelaciones de rastreo simultáneo	GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
Precisión en medición estática	Hz: 2.5mm+0.5ppm Vt: 5mm+0.5ppm
Precisión en medición cinemática PPK	Hz: 30mm+1ppm Vt: 50mm+1ppm
Precisión en medición RTK	Hz: 8mm+1ppm Vt: 15mm+1ppm
Precisión GNSS de código diferencial	Hz: 40cm+1ppm Vt: 80cm+1ppm
Alcance de red RTK (vía CORS)	20 - 50Km
Frecuencia UHF radio interna	410 - 470MHz con 16 canales
Temperatura de trabajo	40°C - +65°C

Se realizan los procesos de pruebas y ajuste de acuerdo con los parámetros técnicos del fabricante en nuestros laboratorios por personal debidamente acreditado y autorizado, por lo cual se expide el presente certificado a solicitud del interesado, por una duración de un (1) años, tiempo normal óptimo, en donde al final del periodo se recomienda realizar un nuevo control de hardware y software del equipo.

Atentamente,

María Paula Pineda
Técnico Casa Del Topógrafo Colombia S.A.S.

(1) 4572128
contactenoscolombia@casadeltopografo.com
Carrera 29 No. 39B-52
Barrio La Soledad, Bogotá Colombia

Anexo 9
Laboratorios





SIEN LTDA.	REPORTE DE ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V. E-410	CÓDIGO	FOR-T-099
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	1/10/2019

OBRA: CONTRATO N°015-2024 VÍA FORTALECILLAS - TELLO


LOCALIZACIÓN: VÍA FORTALECILLAS-TELLO - DEPARTAMENTO DEL HUILA

PETICIONARIO: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

FECHA DEL INFORME: DICIEMBRE DE 2025

N° MUESTRA	N° CILINDRO	ELEMENTOS FUNDIDOS Y OBSERVACIONES	FECHA DE FUNDICIÓN	ASENT. (cm)	RESIST. ESPERADA σ(PSI)	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIÁM. (cm)	ALT. (cm)	ÁREA (cm²)	PESO (g)	DENSIDAD (g/cm³)	FUERZA DE ROTURA (kN)	TIPO DE ROTURA	RESIST. OBTENIDA σ(kg/cm²)	RESIST. OBTENIDA σ(MPa)	RESIST. OBTENIDA σ(PSI)	RESIST. PROMEDIO σ(PSI)	% RESIST. OBTENIDA	GRÁFICA RESISTENCIA vs. EDAD
9	9	CUNETAS TRAMO 24 CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO EN OBRA	01/12/25	10,16 cm 4,00 pulg	3.000	08/12/25	7	15,2	30,0	181,5	12.814	2,35	282,0	6	158,5	15,5	2.264	2.264	75,5%	
	9					15/12/25	14	15,2	30,0	181,5	13.263	2,44	335,5	6	188,5	18,5	2.693	2.693	89,8%	
	9					29/01/25	28	15,2	30,0	181,5	12.873	2,36	389,4	5	218,8	21,5	3.126	3.126	104,2%	
	9					TESTIGO														
10	10	CUNETAS TRAMO 16 CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO EN OBRA	02/12/25	10,16 cm 4,00 pulg	3.000	09/12/25	7	15,2	30,0	181,5	13.005	2,39	381,3	3	214,3	21,0	3.061	3.061	102,0%	
	10					16/12/25	14	15,2	30,0	181,5	12.972	2,38	435,6	4	244,8	24,0	3.497	3.497	116,6%	
	10					30/12/25	28	15,2	30,0	181,5	12.983	2,38	482,1	6	270,9	26,6	3.870	3.870	129,0%	
	10					TESTIGO														
11	11	CUNETAS TRAMO 7 CONCRETO CONVENCIONAL SUMINISTRADO POR POLANCOM S.A.S.	03/12/25	10,16 cm 4,00 pulg	3.000	10/12/25	7	15,2	30,0	181,5	13.032	2,39	284,3	5	159,8	15,7	2.282	2.282	76,1%	
	11					17/12/25	14	15,2	30,0	181,5	12.632	2,32	334,0	4	187,7	18,4	2.681	2.681	89,4%	
	11					31/12/25	28													
	11					TESTIGO														
12	12	CUNETAS TRAMO 6 CONCRETO CONVENCIONAL SUMINISTRADO POR POLANCOM S.A.S.	05/12/25	10,16 cm 4,00 pulg	3.000	12/12/25	7	15,2	30,0	181,5	12.936	2,38	285,6	4	160,5	15,7	2.293	2.293	76,4%	
	12					19/12/25	14	15,2	30,0	181,5	12.815	2,35	337,0	6	189,4	18,6	2.705	2.705	90,2%	
	12					02/01/26	28													
	12					TESTIGO														

TIPOS DE FALLA O ROTURA:



OBSERVACIONES GENERALES

Máquina de Ensayo a Compresión Marca Anditest, Modelo A4-CT-130-150, Serie 98002CT.

Muestras tomadas y referenciadas por el cliente.

Jaime Rivera — LABORATORISTA

SIEN LTDA.

Yolanda Rojas Gutiérrez R. — INGENIERO

Anexo 10
Cartera Topográfica

TRAMO No 1

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE SUB-BASE			ANCHOS		CORTE DE EXCAVACION		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,50		3,50					
K0+000,00	2,55	-2,00	-2,00	415,58	415,64	415,58	7,00	7,00	5,69		
K0+010,00	2,55	-2,00	-2,00	415,83	415,90	415,83	7,00	7,00	5,66	56,75	56,75
K0+020,00	2,55	-2,00	-2,00	416,09	416,15	416,09	7,00	7,00	5,81	57,35	114,10
K0+021,78	2,55	-2,00	-2,00	416,13	416,20	416,13	7,00	7,00	5,86	10,39	124,49
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		124,49

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE SUB-BASE			ANCHOS		LLENO SUB-BASE		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,50		3,50					
K0+000,00	2,55	-2,00	-2,00	416,17	416,24	416,17	7,00	7,00	4,62		
K0+010,00	2,55	-2,00	-2,00	416,43	416,50	416,43	7,00	7,00	4,62	46,21	46,21
K0+020,00	2,55	-2,00	-2,00	416,68	416,75	416,68	7,00	7,00	4,62	46,20	92,41
K0+021,78	2,55	-2,00	-2,00	416,73	416,80	416,73	7,00	7,00	4,62	8,22	100,63
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		100,63

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE BASE			ANCHOS		LLENO BASE		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,50		3,50					
K0+000,00	2,55	-2,00	-2,00	416,37	416,44	416,37	7,00	7,00	1,40		
K0+010,00	2,55	-2,00	-2,00	416,63	416,70	416,63	7,00	7,00	1,40	14,00	14,00
K0+020,00	2,55	-2,00	-2,00	416,88	416,95	416,88	7,00	7,00	1,40	14,00	28,00
K0+021,78	2,55	-2,00	-2,00	416,93	417,00	416,93	7,00	7,00	1,40	2,49	30,49
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		30,49

VOLUMENES DE CAPA DE SECCION											
OBRA: REHABILITACION VIA FORTALECILLAS - TELLO											
Abscisa	Pendiente %	PERALTE		RASANTE ASFALTO			ANCHOS		LLENO ASFALTO		
		Izq%	Der%	Izq	Eje	Der	BANCA	TOTAL	AREA	VOL	ACUM
				3,30		3,30					
K0+000,00	2,55	-2,00	-2,00	416,48	416,54	416,48	6,60	6,60	0,66		
K0+010,00	2,55	-2,00	-2,00	416,73	416,80	416,73	6,60	6,60	0,66	6,60	6,60
K0+020,00	2,55	-2,00	-2,00	416,99	417,05	416,99	6,60	6,60	0,66	6,60	13,20
K0+021,78	2,55	-2,00	-2,00	417,03	417,10	417,03	6,60	6,60	0,66	1,17	14,37
TOTAL DE MATERIAL COMPACTO									TOTAL M3		14,37
