INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

CÓDIGO:	F-PCT-008
VERSIÓN:	11
FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	18/03/2026				
INFORME No.	2	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	12/12/2025	Y EL	11/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACION, ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ				

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	7 meses
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 414.824.210,00
PROCESO No.:	CI-011-2025	FECHA DE INICIO:	12 de noviembre de 2025
CONTRATO No.:	01316 - 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11 de junio de 2026
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE GUAPOTÁ SANTANDER / EDISSON ARLEY CORTES VALLEGO	LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE GUAPOTÁ SANTANDER
NIT CONTRATISTA:	890.204.979-0 / 1.100.953.017 DE SAN GIL	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ Sudirectora de Planeacion y Ordenamiento Ambiental
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9088921&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupVi	APOYO SUPERVISIÓN	SAÚL ANTONIO CORTES DURÁN -Contratista, Subdirección de Planeación.

1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO/JURÍDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Inicio Contrato	12/11/2025	12/11/2025	11/06/2026	7 meses	0	11/06/2026	NO	Inicio del Convenio Interadministrativo No.01316 - 2025
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				7 meses	0			
% AVANCE FISICO				7%				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	840- 47- 994000005220	7/11/2025	1	CUMPLIMIENTO	7/11/2025	7/09/2026	$ 82.964.842,00
				PAGO DE SALARIOS	-	-	-
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS	-	-	-
				CALIDAD DEL SERVICIO	-	-	-
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS	-	-	-
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	-	-	-
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	-	-	-
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL	-	-	-	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	-	-	-

2. EJECUCION PRESUPUESTAL

ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 20.000.000,00
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 394.824.210,00
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 414.824.210,00
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 414.824.210,00
VALOR PAGADO:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR:	$ 414.824.210,00
% POR PAGAR	100,00%
% AVANCE FINANCIERO	0,00%

ADICIONES


CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL DE ADICIONES		$ -

2,1. SITUACION FINANCIERA

CONTRATO DE <Interventoria , Obra,Consultoría, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, otro>

CONCEPTO	FECHA	VALOR
	TOTAL	$ -

3. CURVA "S"

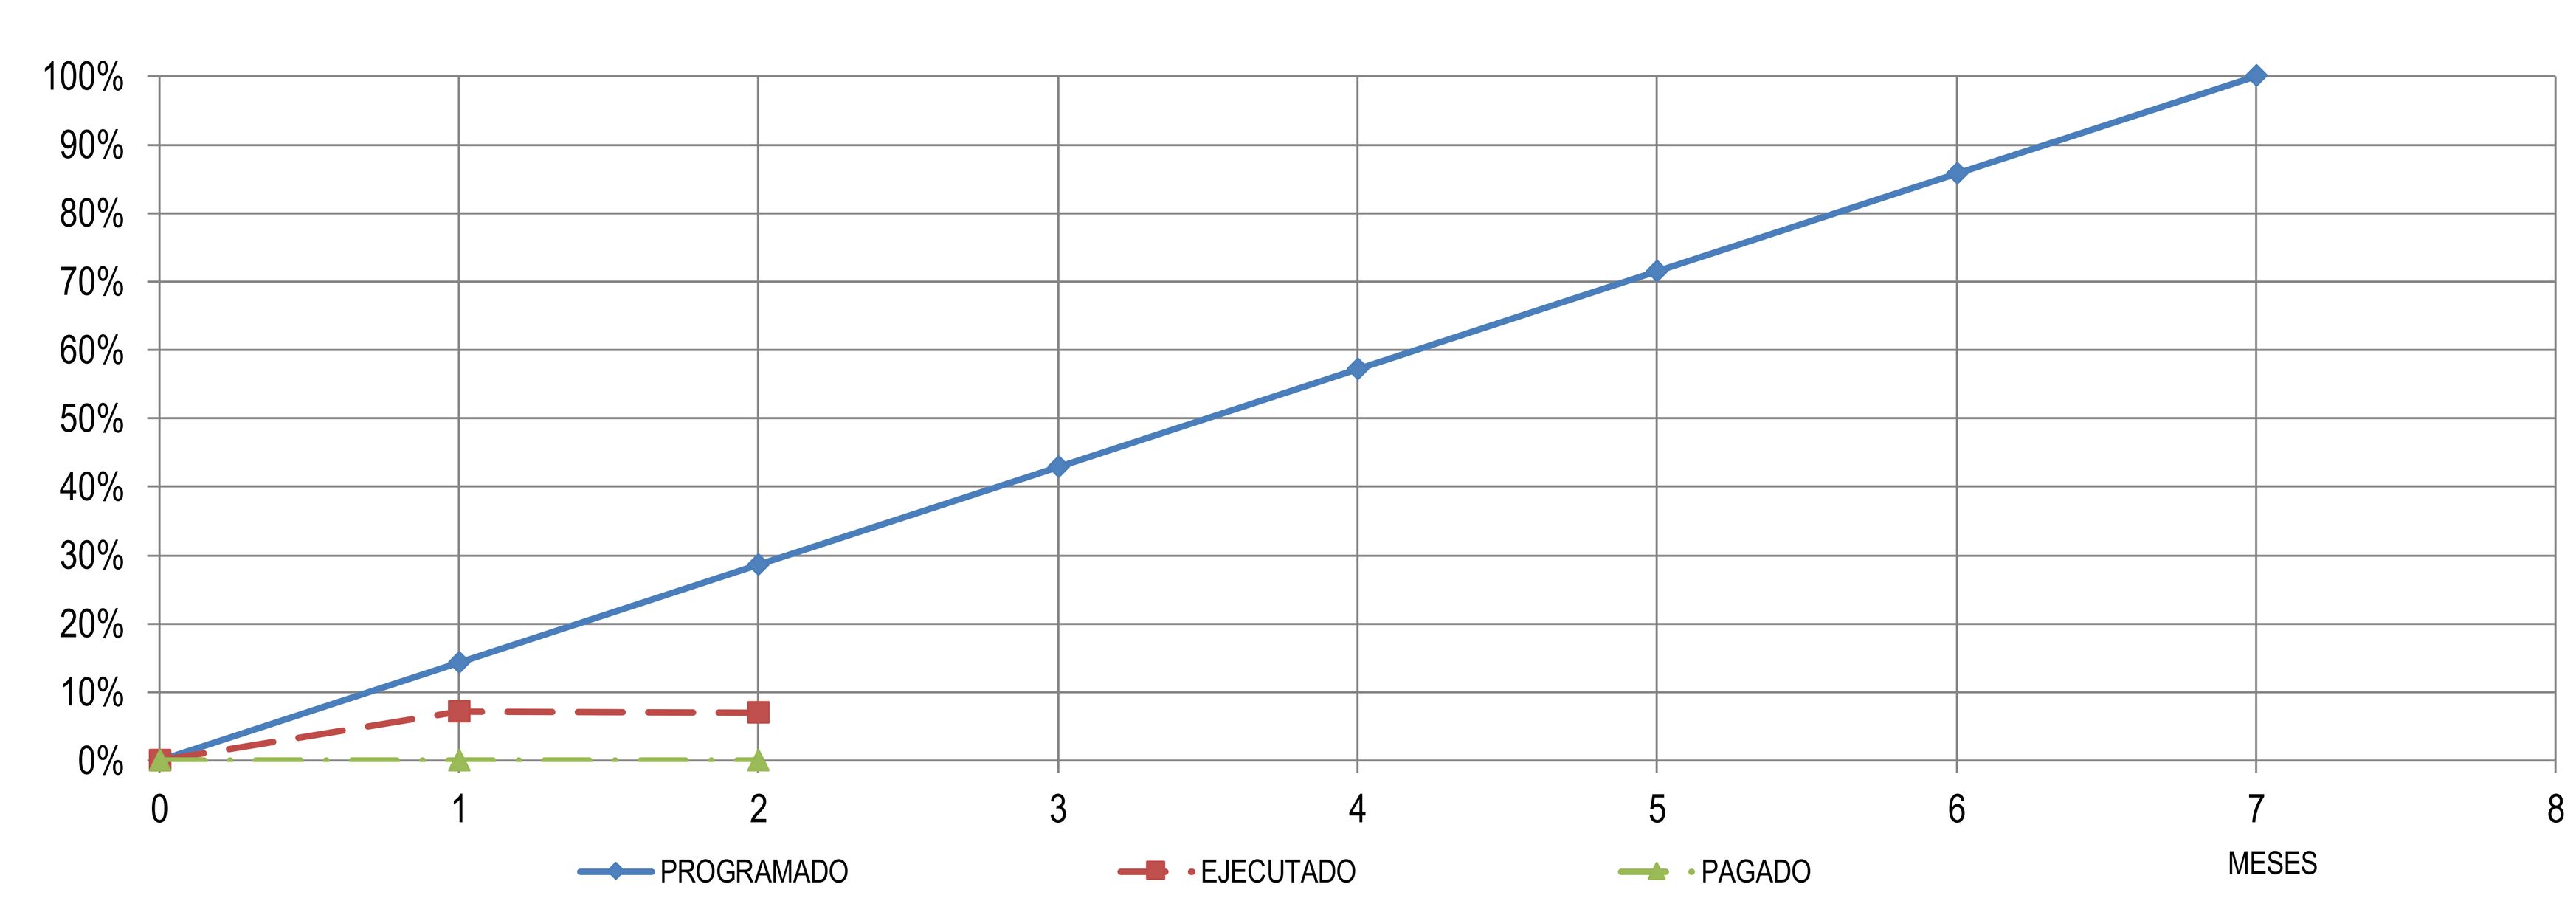

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	PAGADO
0	0%	0%	0%
1	14%	7%	0%
2	29%	7%	0%
3	43%		
4	57%		
5	71%		
6	86%		
7	100%		

PROGRAMADO	29%	
EJECUTADO	7%	
ATRASOS	-22%	
DESEMPEÑO	●	0,25
% PAGADO	0%	
Valor Pagado	$	0,00
Pendiente por cancelar	$	$ 414.824.210,00
Índice de avance financiero	●	0,00

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventorí

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

Dentro de este lapso de tiempo, el municipio no emitió ninguna respuesta frente al requerimiento de las condiciones iniciales del oficio SPL.1450.2025 y tampoco allegó información adicional, por lo tanto el seguimiento para este mes se hace sujeto al cronograma inicial del convenio.

Al desconocerse por parte del muicipio la ejeción a la fecha, se presenta un retrase como se indica en la curva S.

Al no contarse con una distribución porcentual con cada una de las actividades propias del cronograma, se hace una distribución del programado de la curva S conforme al tiempo total y el avance mensual esperado de cada actividad. El porcentaje de avance a la fecha corresponde al cumplimiento del perfeccionamiento e inicio del convenio

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Alexandra Niño	Contratista SPL	
REVISO:	Saúl Cortés	Contratista SPL	
V.B:	Rodolfo Sanchez Ruiz	Funcionario	
