Informe Mensual No. 11
CONTRATO 552-2024 COP (120683)
Periodo: del 12 al 19 de diciembre de 2025
y del 06 de enero al 6 de febrero de 2026



OBJETO DEL CONTRATO:

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA:
Consorcio Teusavial

Febrero de 2026

CONSORCIO TEUSAVIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA No. 552-2024 COP (120683)

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

Informe de Gestión Social No. 11

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Número de revisión: 1		**Versión No. 1**
Elaborado por: CONSORCIO TEUSAVIAL		
Responsable por elaboración Residente social	Nombre	T.S Ángela María Quiroga G.
	Firma	
Aprobado por: CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG		
Responsable por Aprobación Residente Social de Interventoría	Nombre	T.S. Luz Escobar Ospina
	Firma	
Febrero de 2026		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. JUSTIFICACIÓN 7
3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 8
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 10
5. ALCANCE DEL PROYECTO 11
6. RECURSOS HUMANOS Y SOPORTE LOGÍSTICO - ÁREA SOCIAL 12
7. GESTIÓN SOCIAL 12
7.1 Objetivo General. 12
7.2 Objetivos Específicos. 12
8. PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL 13
9. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD. 13
9.1 Afiches informativos 13
9.2 Reuniones de inicio 14
9.3. Reuniones de finalización 14
9.4. Reuniones Extraordinarias 14
9.5. Socializaciones 14
10. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO. 15
10.1. Objetivo General 15
10.2. Puntos satélites de información 15
10.3. Volante informativo de inicio de obra 17
10.4. Volante de convocatoria a reuniones de inicio de obra 17
10.5. Volante recomendaciones para adecuación de canales y bajantes de aguas lluvias . 17
10.6. Volante notificación inicio actas de vecindad 17
10.7. Volante Oferta laboral 17
10.8. Volante de información ciudadana 18
10.9. Piezas de Información del Plan de Manejo de Tráfico - PMT. 18
10.10. Volante otras informaciones 18
10.11. Volante notificación cierre actas de vecindad 19
10.12. Volante de convocatoria a reuniones de finalización de obra 21
11. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA – ACTAS DE VECINDAD 21
11.1. Levantamiento de Actas de Vecindad iniciales. 21
11.2. Actas de compromiso. 22
11.3. Levantamiento de actas para acceso a rampas 22

11.4. Registro fílmico y fotográfico de vías de desvió. 22
11.5. Actas de Vecindad de cierre 22
12. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 24
12.1. Punto PAC fijo 24
12.2. Punto PAC VIRTUAL 25
12.3. Punto PAC Móvil 25
12.5 PQRSD 26
12.6. Participación Ciudadana Reuniones Comité Ciudadano 34
13. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 34
13.1. Objetivo General 34
14. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO. 35
14.1 Objetivo General 35
14.2 Capacitación mensual 36
15. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO FORMADA 36
15.1 Objetivo General 36
15.2 Generación total de empleo 37
5.3. Vinculación de Mano de Obra No formada periodo No. 11. 39
16. PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A DOTACIONES 41
16.1 Objetivo General. 41
16.2 Seguimientos por periodo 41
17 PROGRAMA DE GESTION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 42
17.1 Informes Semanales 42
17.2 Informe Mensual 42
17.3 Informe Final 43
18 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COSTOS. 43
18.1 Comités de Gestión Social 43

Listado de Tablas

Tabla 1 Información del proyecto 8
Tabla 2 Información del Contratista 9
Tabla 3 Información de la Interventoría 9
Tabla 4 CIV´S del proyecto 11
Tabla 5 Personal mínimo requerido área social 12
Tabla 6 Consolidado actas de socializaciones realizadas en el periodo 15
Tabla 7 PSI vigentes en el periodo 16
Tabla 8 Indicador PSI actualizados 16

Tabla 9 Indicador PSI desinstalados 17
Tabla 10 Consolidado recomendaciones para la instalación de concreto en el periodo 18
Tabla 11 Indicador distribución de volantes recomendaciones para la instalación de concreto en el periodo 19
Tabla 12 Consolidado notificación cierre de actas de vecindad en el periodo 19
Tabla 13 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad primera visita en el periodo 20
Tabla 14 Consolidado de distribución de volante notificación segunda visita de cierre actas de vecindad 20
Tabla 15 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad segunda visita en el periodo 20
Tabla 16 Consolidado de distribución de volante notificación tercera visita de cierre de actas de vecindad 20
Tabla 17 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad tercera visita en el periodo 21
Tabla 18 Consolidado cierres de actas de vecindad 23
Tabla 19 Consolidado divulgación copias de actas de vecindad a la comunidad 23
Tabla 20 Indicador divulgación copias de actas de vecindad 24
Tabla 21 Tabla de atención PUNTO PAC 26
Tabla 22 Indicador Punto PAC Móvil 26
Tabla 23 Consolidado PQRSD 27
Tabla 24 Consolidado entrega de plegables de sostenibilidad de la vía en el periodo 35
Tabla 25 Indicador distribución de plegables de sostenibilidad de la vía en el periodo 35
Tabla 26 Realización de capacitación mensual 36
Tabla 27 Indicador realización de capacitación mensual 36
Tabla 28 Personal contratado en el periodo No. 11 37
Tabla 30 Personal MONF en el periodo 39
Tabla 31 Indicador vinculación MONC 40
Tabla 32 listado de las mujeres vinculadas en cumplimiento al decreto 332 de 2021. 40
Tabla 33 Indicador generación de empleo de mujeres en el periodo 41
Tabla 34 Indicador control y seguimiento de dotaciones 42

Lista de Anexos

Anexo 1. Acta de reunión extraordinaria barrio Pablo VI, anexos y registro fotográfico. 14
Anexo 2. Actas de socialización PMT barrio Chapinero Occidental tramo 1, registro fotográfico, Acta de socialización de inicio, tramo Campin, listado de firmas, esquema PMT y registro fotográfico. 15
Anexo 3. PSIS vigentes en el periodo 16
Anexo 4. Formato control entrega de piezas de divulgación, volante recomendaciones para la instalación de concreto y registro fotográfico barrio Campin. 18

Anexo 5. Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad primera visita y registro fotográfico barrio San Luis. 19
Anexo 6. Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad segunda visita y registro fotográfico barrio San Luis. 20
Anexo 7. Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad tercera visita y registro fotográfico San Luis. 21
Anexo 8. Formato de control entrega de copias de actas de vecindad y registro fotográfico Campin 23
Anexo 9. PQRSD No. 11. 26
Anexo 10. Formato control entrega de piezas de divulgación, plegable de sostenibilidad de la vía, registro fotográfico barrio San Luis. 35
Anexo 11. Listado de asistencia y registro fotográfico de capacitación No. 11 36

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados y avances de la Gestión Social del contrato No. 552-2024 COP (120683) el cual hace parte integral de los componentes requeridos en el marco de ejecución, cuyo objeto es **"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES",** celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y la firma Consorcio Teusavial.

Con base a lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, busca elevar las condiciones de bienestar de la ciudadanía, a través del cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas que deben desarrollar los contratistas en el marco del Plan de Desarrollo Local. Lo anterior con el fin de minimizar el impacto social generado por las obras de la construcción de vías en los diferentes barrios de la localidad de Teusaquillo, ejecutadas por la firma Consorcio Teusavial.

Dentro de los fines y objetivos del presente informe, se plantea describir las acciones realizadas desde la parte social del contratista en la etapa preliminar del contrato No. 552-2024 COP (120683), cabe señalar que el contrato fue suspendido por un término de dieciséis (16) días calendario, a partir del 20 de diciembre de 2025 hasta el 6 de febrero de 2026. En este informe se entregará un resumen de la gestión realizada en el **periodo No. 11, del 12 al 19 de diciembre de 2025 y del 06 de enero al 06 de febrero de 2026**, a partir de los siguientes programas:

- Programa de divulgación e información a la comunidad.
- Programa de atención al ciudadano
- Programa de sostenibilidad.
- Programa de capacitación empleados del proyecto
- Programa de control y seguimiento a dotaciones.
- Programa de contratación de mano de obra no calificada.
- Programa de gestión de aseguramiento de la calidad.

2. JUSTIFICACIÓN

Con ocasión de la ejecución del contrato No. 552-2024 COP (120683), cuyo objeto **"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"** y teniendo en cuenta que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, es una entidad de carácter público, la cual es responsable de la contratación de múltiples obras de infraestructura junto con el espacio público, es importante ejecutar obras que den alcance y respuesta a las necesidades de las comunidades.

Por lo anterior la ejecución de obras en los diferentes segmentos viales de la localidad de Teusaquillo, se convierte en acciones de carácter misional que cumple el FDLT, mediante la intervención de obras de infraestructura vial y del espacio público que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad.

Por lo tanto, se plantean estrategias y actividades que mitiguen los impactos generados debido a la ejecución de las obras a través de la implementación del Plan de Gestión Social y sus respectivos programas.

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO.

Tabla 1 Información del proyecto

Entidad contratante: Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo	
Contrato No.	552-2024 COP (120683)
Objeto del contrato	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
Localización del proyecto	Teusaquillo
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de inicio	22 de enero de 2025
Fecha de terminación	21 de septiembre de 2025
Valor Adición	$2.673.333.000
Valor Total	$8.130.760.612
Prórroga No.1	Cuatro (4) Meses a partir del 22 de septiembre de 2025 al 21 de enero de 2026.
Fecha de terminación incluida prórroga:	21 de enero de 2026
Plazo total	12 meses
Suspensión No. 1	Suspensión por un término de dieciséis (16) días calendario, a partir del 20 de diciembre de 2025.
Fecha de reinicio	6 de enero de 2026
Fecha prevista de terminación incluida suspensión	6 de febrero de 2026

Fuente: acta de inicio Contrato No. 552-2024 COP (120683)

Tabla 2 Información del Contratista

Contratista	
Contratista	Consorcio Teusavial
Director de obra	Ing. Juan Felipe Delgado.
Residente técnico	Ing. Andrés Echandía
Residente junior	Ing. Marcela Arévalo
Residente SST	Ing. Camilo Durán
Residente Ambiental	Ing. Camilo Durán
Residente Social	T.S Angela María Quiroga G.

Fuente: Archivos del contratista Contrato No. 552-2024 COP (120683)

Tabla 3 Información de la Interventoría


Interventoría	
Contratista	Consorcio Interteusaquillo JG
Director de obra	Ing. Jorge Gómez Falla
Residente técnico	Ing. Fredy Perdomo
Residente SST	Ing. Yesica Quíneme Fusca
Residente Ambiental	Ing. Yesica Quíneme Fusca
Residente Social	T.S. Luz Escobar Ospina

Fuente: residente social de interventoría

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

EL contrato se ejecuta en la localidad 13 de Teusaquillo, esta localidad está compuesta por seis UPL, las cuales son:

- ✓ UPL 100 Galerías
- ✓ UPL 101 Teusaquillo
- ✓ UPL 104 Parque Simón Bolívar – CAN
- ✓ UPL 106 La Esmeralda
- ✓ UPL 107 Quinta Paredes
- ✓ UPL 109 Ciudad Salitre Oriental

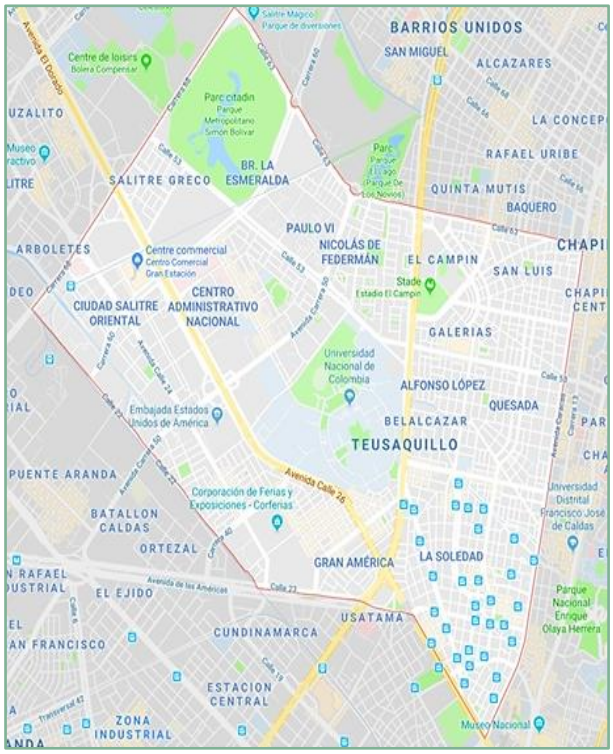

Fuente: Anexo técnico CCE-EICP-IDI-01
Imagen 1 Mapa de la localidad de Teusaquillo

El contrato No. 552-2024 COP (120683), realizará intervención vial en las UPL, Galerías, Teusaquillo, La Esmeralda y Quinta Paredes, de acuerdo con el listado de vías contempladas en el anexo técnico del contrato en referencia, lo cual representa un factor positivo para la ciudadanía puesto que habrá cobertura en un número significativo de UPL, de la localidad. A continuación, se relacionan los CIV´S a intervenir.

Tabla 4 CIV´S del proyecto

No	CIV o Código	No. UPL	Barrio	Eje Vial
1	13002387	101 Teusaquillo	Teusaquillo	Carrera 24 entre SE y Avenida Calle 34
2	13000593	100 Galerías	San Luis	Carrera 18 entre Calles 58B y 59
3	13000686	100 Galerías	San Luis	Carrera 18 entre Calles 58 y 58A
4	13000794	100 Galerías	San Luis	Carrera 16 entre Calles 57 y 58
5	13001165	100 Galerías	Alfonso López	Carrera 27 entre Calles 50 y 51
6	13002083	101 Teusaquillo	La Magdalena	Calle 38 entre Carreras 17A y 17
7	13000284	106 La Esmeralda	Nicolás de Federmán	Carrera 47 entre Calles 58A y 59
8	13000343	106 La Esmeralda	Nicolás de Federmán	Carrera 47 entre Calles 58 y 58A
9	13000476	106 La Esmeralda	Nicolás de Federmán	Carrera 36A entre Calles 57A y 57B
10	13000846	100 Galerías	Campin	Transversal 28 entre Carrera 28 y Diagonal 61B
11	13000875	100 Galerías	Galerías	Calle 53B entre Carrera 27 y Transversal 27A
12	13000864	106 La Esmeralda	Nicolás de Federmán	Calle 53A entre Carreras 35 y 36
13	13000336	100 Galerías	San Luis	Diagonal 61B entre Carreras 19A y 20
14	13000826	100 Galerías	Chapinero Occidental	Avenida Calle 57 entre Avenida Carrera 14 y Carrera 14A
15	13000814	100 Galerías	Chapinero Occidental	Carrera 14A entre Avenida Calle 57 y Calle 58

Fuente: Anexo técnico Contrato 552-2024 COP (120683)

5. ALCANCE DEL PROYECTO

En el presente documento se da respuesta al lineamiento técnico y social del contrato COP-552-2024 COP (120683), donde se garantiza por parte del contratista el cumplimiento del Plan de Gestión Social, a través del desarrollo de los programas aquí planteados.

Cabe resaltar que todos los procesos que surjan deben contar con la aprobación de la Interventoría y por su parte el contratista brindará una atención permanente y oportuna a los requerimientos realizados por la comunidad.

6. RECURSOS HUMANOS Y SOPORTE LOGÍSTICO - ÁREA SOCIAL

El equipo humano de la gestión social está integrado por profesionales idóneos los cuales trabajarán de manera interdisciplinaria con los profesionales del área técnica: director, residente, residente ambiental, residente de seguridad y salud en el trabajo en pro de favorecer la ejecución de las obras de manera eficaz y oportuna. El Consorcio Teusavial, cuenta con el siguiente personal a fin de cubrir todas las obligaciones contenidas en el Plan de Gestión Social del Contrato:

Tabla 5 Personal mínimo requerido área social

Cargo	Nombres y apellidos	Dedicación
Residente Social	T.S Ángela María Quiroga G	100 %

Fuente: elaboración propia

7. GESTIÓN SOCIAL

Para el **periodo once**, la firma contratista Consorcio Teusavial, por medio de la residente social, diseñó y realizó la distribución de diferentes piezas informativas.

7.1 Objetivo General.

Describir las acciones y actividades adelantas por el área de Gestión Social, de acuerdo a cada uno de los programas que hacen parte de este componente; garantizando a la comunidad del área de influencia directa del proyecto una información clara, veraz y oportuna que les permitan participar y apropiarse por las obras ejecutadas

7.2 Objetivos Específicos.

- Fomentar canales de comunicación que permitan al contratista brindar información clara, veraz y oportuna, a las comunidades del área de influencia del proyecto.
- Generar escenarios de participación comunitaria que faciliten la interacción entre la ciudadanía, el contratista y el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo.

- Brindar por medio de estrategias, una atención al ciudadano oportuna y eficaz, dando alcance a sus solicitudes, inquietudes, sugerencias quejas y/o reclamos que surjan con la ejecución de las obras.
- Mitigar los impactos sociales causados por la ejecución de las obras contempladas dentro del proyecto.

8. PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL

A continuación, se describe las actividades que adelantó el contratista desde el componente social en el **periodo once**, en pro de dar cumplimiento a las obligaciones de gestión social, las cuales están encaminadas a garantizar que los usuarios beneficiarios de los diferentes frentes de obra o CIV del proyecto y/u otros actores representantes organizaciones sociales, socioeconómicas y ambientales, se mantengan informados sobre las obras:

- Recorridos por los frentes de obra.
- Elaboración de metodología y cronograma de actividades del Plan de Gestión Social.
- Asistencia a los comités de seguimiento.
- Realización de trabajo interdisciplinario con los profesionales de las otras áreas que hacen parte del proyecto (Técnica, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo SST), para garantizar el cumplimiento de los criterios del proyecto de manera integral.
- Implementación de los formatos, informes semanales, mensual, entre otros.

9. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD.

El área social del contratista en el **periodo No. 11,** mantuvo el objetivo de fortalecer los procesos de comunicación con la comunidad y sus representantes, de manera que se genere una relación de confianza y participación constante, entre los diversos actores involucrados directa o indirectamente en la obra.

9.1 Afiches informativos

El contratista **en el periodo No. 11**, realizó la publicación de afiches informativos, los cuales tienen por objeto divulgar las actividades a realizar, dichos afiches fueron instalados en los PSI, y funcionan como estrategia informativa hacia la comunidad. Estos afiches se instalaron en los PSI vigentes en el periodo.

9.2 Reuniones de inicio

El área social del contratista, para el **periodo No. 11,** no realizó reuniones de inicio de obra.

9.3. Reuniones de finalización

El área social del contratista, para el **periodo No. 11,** no realizó reuniones de finalización de obra, pese a que ya se terminaron actividades técnicas; están pendientes de programar las fechas para las reuniones por parte de la Alcaldía Local en los tramos de Alfonso López CIV 13001165, Galerías CIV 13000875, Nicolás de Federmán CIV´S 13000343, 13002498, 13000284, Quinta Paredes CIV 13001365, San Luis CIV 13000744, Chapinero Occidental CIV´S 13000985 -13002468, por tanto, no aplica para este periodo.

9.4. Reuniones Extraordinarias

Para este periodo, el contratista con aprobación de la interventoría, realizó una reunión extraordinaria con el administrador del Conjunto Residencial Montana, ubicado en el barrio Pablo VI CIV 13000077; con el fin de informar que el Consorcio Teusavial realizó mantenimiento a los setos de cipreses, que consistió en una poda preventiva de baja densidad en unas ramas que habían sido dañadas con machete por un habitante de la comunidad, esta reunión se llevó a cabo el día 05 de diciembre de 2025.

Anexo 1. Acta de reunión extraordinaria barrio Pablo VI, anexos y registro fotográfico.

9.5. Socializaciones

El área de Gestión Social del Consorcio Teusavial, para el **periodo No. 11** por requerimiento de la Secretaría Distrital de Movilidad, realizó el levantamiento de actas de socialización de PMT, para el siguiente tramo de la siguiente manera:

<u>Para cierre total de calzada</u>

- Tramo 2 barrio Chapinero Occidental CIV´S 13000985 -13002468

Desde el área social del contratista se realizó visita predio a predio, se informó a la comunidad de zona de influencia directa las implicaciones del cierre total de calzada y espacio público, se recibió respuesta favorable de la comunidad, quienes firmaron las actas de socialización a conformidad. Se dio atención a la comunidad, se despejaron sus inquietudes y dudas frente a la intervención vial.

Igualmente, se realizó socialización puerta a puerta en el barrio Campin PK ID 66683 y 67967 del tramo ubicado en la carrera 26 con diagonal 61 D, informando sobre el inicio de actividades de mantenimiento del espacio público de emergencia, las cuales están contempladas dentro del Plan de Acción de Movilidad de la Alcaldía Local.
Se informó a la comunidad los aspectos técnicos, sociales, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y ambientales que contemplan las diferentes intervenciones; así como el tiempo de ejecución general del tramo, se realizaron recomendaciones que contribuyan a que las obras se ejecuten dentro de un ambiente de confianza y satisfacción para la comunidad.

Se dio atención a la comunidad, se despejaron sus inquietudes y dudas frente a la intervención vial. A continuación, se presenta tabla de consolidado de socializaciones realizadas en este periodo.

Anexo 2. Actas de socialización PMT barrio Chapinero Occidental tramo 1, registro fotográfico, Acta de socialización de inicio, tramo Campin, listado de firmas, esquema PMT y registro fotográfico.

Tabla 6 Consolidado actas de socializaciones realizadas en el periodo

Periodo No. 11			
Fecha	**PK ID**	**Barrio/tramo**	**Institución**
12/12/2025	66683 67967	Campin	Comunidad en general del área a intervenir
09/01/2026	13000985 13002468	Chapinero Occidental Tramo 2	Colegio Integral Ervid
			Kuana Café
			Edificio Portal de la 55
			Comunidad en general del área a intervenir

10. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.

10.1. Objetivo General

Mantener informada a la comunidad durante la ejecución del proyecto, por medio de piezas de divulgación, que contengan información de las diferentes actividades y acontecimientos específicos que se puedan presentar y que impacten a la comunidad.

10.2. Puntos satélites de información

Los puntos satélites de información son equipamientos urbanos o puntos de encuentro ciudadano, para este proyecto tendrán como función difundir por medio de piezas de divulgación la información de este contrato la comunidad de la localidad de Teusaquillo.

Para el **periodo No. 11,** se realizó la actualización de (5) PSI, ubicados en los barrios Alfonso López, San Luis tramos 2, Campin, Pablo VI y Chapinero Occidental, se publicaron piezas informativas de acuerdo a la dinámica de la obra.

Igualmente, se realizó la desinstalación de (6) PSI, barrios Quinta Paredes, Alfonso López, San Luis, Pablo VI, Chapinero Occidental y Campin por terminación de obra y solicitud de la comunidad.

Anexo 3. PSIS vigentes en el periodo

Tabla 7 PSI vigentes en el periodo

Periodo No. 11						
Fechas	**CIV**	**Barrio/tramo**	**Dirección**	**Instalación**	**Mantenimiento/ actualización**	**Desinstalación**
12/12/2025 29/01/2026	13001165	Alfonso López	Carrera 27 # 50-77	0	1	1
10/12/2025 15/01/2026 05/02/2026	13000744	San Luis	Carrera 20 No. 57-55	0	2	1
04/12/2025	13001365	Quinta Paredes	AC 26 No. 44 A-29	0	0	1
12/12/2025 15/01/2026 06/02/2026	66683 67967	Campin	Carrera 26 No. 61C-72	0	2	1
10/12/2025 14/01/2026 03/02/2026	13000077	Pablo VI	Calle 59 No. 58-17	0	2	1
10/12/2025 14/01/2026 03/02/2026	13000985 13002468	Chapinero Occidental	Carrera 15 No. 54A-29	0	2	1
Total				0	9	6

Tabla 8 Indicador PSI actualizados

Ítem	Formula	Meta	% de cumplimiento
PSI	9 PSI actualizados _____ 9 PSI con necesidad de actualización * 100	Actualizar los PSI	100%

Tabla 9 Indicador PSI desinstalados

Ítem	Formula	Meta	% de cumplimiento
PSI	6 PSI desinstalado _____ 6 PSI con terminación de obra * 100	Desinstalar los PSI abiertos	100%

10.3. Volante informativo de inicio de obra

Para el **periodo No. 11**, no se distribuyeron volantes de inicio de obra, ya que por la dinámica del contrato no se dio la necesidad de implementarlas. Estas se aplicarán en el momento que sea necesario en concordancia a la dinámica del proyecto.

10.4. Volante de convocatoria a reuniones de inicio de obra

Para el **periodo No. 11**, desde el área social del Consorcio Teusavial, no se realizó la distribución de volantes de invitación a reunión de inicio de obra.

10.5. Volante recomendaciones para adecuación de canales y bajantes de aguas lluvias

Durante la ejecución del proyecto, no se identificaron situaciones que dieran lugar a su implementación; por lo tanto, no aplica para este informe.

10.6. Volante notificación inicio actas de vecindad

Para el **periodo No. 11**, el área social no realizó distribución de volantes inicio actas de vecindad.

10.7. Volante Oferta laboral

Para el **periodo No. 11**, no se realizó publicación de volante de oferta laboral, sin embargo, en las reuniones de inicio de obra realizadas en los periodos anteriores se realizó la divulgación de oferta laboral para mano de obra no formada, se indicó a la comunidad el correo para el envío de las hojas de vida de las personas que estuvieran interesadas en las vacantes para cargos de BOAL y ayudantes de obra.

10.8. Volante de información ciudadana

Estas piezas se implementaron en caso de presentarse alguna contingencia, se adelantaron según la programación de actividades técnicas específicamente cuando hubo la necesidad de brindar:

- Información sobre corte se servicios públicos.
- Cuando se presente intervención de tráfico vehicular.
- Cuando se presenten circunstancias de intervención particular.

Para el **periodo No. 11,** no se implementó esta pieza ya que no se generaron situaciones que diera lugar a su utilización, no aplica para este informe.

10.9. Piezas de Información del Plan de Manejo de Tráfico - PMT.

Para el presente periodo no se generó la necesidad de implementar este tipo de piezas informativas, por lo cual este ítem no aplica para este periodo.

10.10. Volante otras informaciones

Para el **periodo No. 11**, el equipo social realizó el diseño del volante de recomendaciones para la instalación del concreto, el cual fue presentado a la interventoría y contó con su aprobación para impresión y distribución en el tramo del barrio Campin, se aplicó la metodología aprobada.

A continuación, se presenta la tabla de consolidado de distribución de volantes de recomendaciones para la instalación de concreto:

Tabla 10 Consolidado recomendaciones para la instalación de concreto en el periodo

Periodo No. 11					
Tipo de volante	**PK ID**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Recomendaciones para la instalación de concreto	66683 67967	Campin	1	06/02/2026	2
Total					2

Anexo 4. Formato control entrega de piezas de divulgación, volante recomendaciones para la instalación de concreto y registro fotográfico barrio Campin.

Tabla 11 Indicador distribución de volantes recomendaciones para la instalación de concreto en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	2 volantes de recomendaciones para la instalación de concreto distribuidos / 2 volantes de recomendaciones para la instalación de concreto requeridos * 100	Distribuir un volante por predio en zona de influencia directa de cada tramo intervenido requerido	100%

10.11. Volante notificación cierre actas de vecindad

Para el presente periodo, el área social del Consorcio Teusavial, continúo con el proceso de cierre de actas de vecindad, por lo tanto, se realizó la distribución de volantes cierre de actas de vecindad de primera, segunda y tercera visita; a los tramos que están en proceso de remates por el área técnica. La actividad se realizó en el barrio San Luis CIV 13000744.

Los volantes en su debido momento, fueron presentados a la interventoría, contaron con su aprobación para impresión y distribución, se aplicó la metodología aprobada.

Se informa que queda pendiente el diseño, aprobación y distribución del presente volante para el barrio Campin, debido a que este tramo se encuentra en proceso de terminación por parte del área técnica, esta actividad se reportará en el informe final. A continuación, se presentan tablas de consolidados de distribución de volantes de primera, segunda y tercera visita durante el periodo.

Tabla 12 Consolidado notificación cierre de actas de vecindad en el periodo

Periodo No. 11					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Notificación cierre de actas de vecindad primera visita	13000744	San Luis	2	13/01/2026	10
Total					10

Anexo 5. Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad primera visita y registro fotográfico barrio San Luis.

Tabla 13 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad primera visita en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	10 volantes de cierre de actas de vecindad primera visita distribuidos _____ 10 volantes de cierre de actas de vecindad de primera visita requeridos * 100	Distribuir un volante por predio en zona de influencia directa de cada tramo intervenido	100%

Tabla 14 Consolidado de distribución de volante notificación segunda visita de cierre actas de vecindad

Periodo No. 11					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Notificación cierre actas de vecindad segunda visita	13000744	San Luis	2	14/01/2026	2
Total					2

Anexo 6. Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad segunda visita y registro fotográfico barrio San Luis.

Tabla 15 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad segunda visita en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	2 volantes de segunda visita de cierre actas de vecindad distribuidos _____ 2 volantes de segunda visita de cierre actas de vecindad requeridos * 100	Distribuir un volante de segunda visita de cierre actas de vecindad, en predios donde no se reciba atención en primera visita	100%

Tabla 16 Consolidado de distribución de volante notificación tercera visita de cierre de actas de vecindad

Periodo No. 11					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Notificación cierre de actas de vecindad tercera vista	13000744	San Luis	2	15/01/2026	2
Total					2

Anexo 7. Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad tercera visita y registro fotográfico San Luis.

Tabla 17 Indicador distribución de volantes cierre de actas de vecindad tercera visita en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Divulgación	2 volantes de cierre de actas de vecindad tercera visita distribuidos _____ 2 volantes de cierre de actas de vecindad tercera visita requeridos * 100	Distribuir un volante de tercera visita de cierre de actas de vecindad, en predios donde no se reciba atención en segunda visita	100%

10.12. Volante de convocatoria a reuniones de finalización de obra

El área social del contratista, para el **periodo No. 11,** generó lo volantes de convocatoria a reuniones de finalización de obra de los tramos de Alfonso López CIV 13001165, Galerías CIV 13000875, Nicolás de Federmán CIV´S 13000343, 13002498, 13000284, Quinta Paredes CIV 13001365 y San Luis CIV 13000744, los cuales fueron remitidos y aprobados por la interventoría y por la Supervisión de la Alcaldía Local; se aclara, que están pendientes de programar las fechas para las reuniones de finalización en los segmentos viales mencionados, por tanto, no aplica para este periodo.

11. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA – ACTAS DE VECINDAD

11.1. Levantamiento de Actas de Vecindad iniciales.

Desde el componente social del contratista Consorcio Teusavial, para el periodo No. 11, no se realizó levantamiento actas de vecindad. Se informa que el día 9 de diciembre del 2025, la interventoría remitió la aprobación de las actas de vecindad realizadas en el periodo anterior, tramo del barrio Campin PK ID 66683 y 67967, en cumplimiento a la metodología aprobada para tal fin, por parte de la interventoría.

11.2. Actas de compromiso.

Para el presente periodo no surgieron situaciones que ameritaran el levantamiento de actas de compromiso, dado que el contrato se encuentra en etapa preliminar, por tal motivo no hay reporte referente a este tema, no aplica para este informe.

11.3. Levantamiento de actas para acceso a rampas

Para el **periodo No. 11,** desde el componente social del contratista Consorcio Teusavial, no se reporta levantamiento de actas para acceso a rampas

11.4. Registro fílmico y fotográfico de vías de desvió.

Para el **periodo No. 11**, desde el componente social del contratista Consorcio Teusavial, no se reporta la realización de registros fílmicos y fotográficos de vías aledañas y/o de posibles desvíos de PMT.

11.5. Actas de Vecindad de cierre

Para el presente periodo, el área social del Consorcio Teusavial, continúa con el proceso de cierre de actas de vecindad, procedimiento que consiste en la realización de una o tres visitas predio a predio en los tramos donde se concluyeron actividades técnicas, se valida con los encargados, responsables y/o propietarios de las viviendas, si a causa de la obra se generaron afectaciones en las mismas.

En caso de recibir manifestaciones de daños, se procede a verificar contra registro inicial de acta de vecindad y de evidenciar afectaciones nuevas, en caso de comprobar algún tipo de afectación se realiza respectivos acuerdos económicos y/o reparaciones para subsanar las afectaciones. Se levanta y se cierra PQR, y así mismo se da cierre correspondiente en paz y salvo, que estará anexo al formato de acta de vecindad.

Se informa que el día 9 de diciembre de 2025, la interventoría remitió la aprobación de las actas de cierre realizadas en periodos anteriores, tramos del barrio Alfonso López CIV 13001165, barrio Galerías CIV 13000875 y barrio Nicolás de Federmán tramo 1-5 CIV´S 13000343, 13002498 y 13000284; igualmente, el día 03 de febrero de 2026, la interventoría remitió la aprobación de las actas de cierre de los tramos de Quinta Paredes CIV 13001365 y San Luis CIV 13000744, en cumplimiento a la metodología aprobada para tal fin, por parte de la interventoría

Se aclara, que quedan pendientes las actas de vecindad de cierre del barrio Campin PK ID 66683 y 67967, las cuales se radicarán a la interventoría y reportarán en el informe final. A continuación, se presenta tabla de consolidado de cierre de actas de vecindad:

Tabla 18 Consolidado cierres de actas de vecindad

Periodo No. 11						
Barrio	**Tramo**	**CIV**	Total, actas de predios cerradas con firma del propietario y/o encargado	Total, cierre de actas con tres vistas verificadas con firma interventoría	Total, actas pendientes para cierre	Observaciones
San Luis	2	13000744	9	1	0	N/A

11.6. Divulgación actas de vecindad a la comunidad

Durante el presente periodo, se aprobaron las actas de vecindad de inicio del tramo 1 barrio Campin PK ID 66683 y 67967; por tal motivo, se realizó la entrega de copia de acta de vecindad a la comunidad en el tramo anteriormente mencionado.

Anexo 8. Formato de control entrega de copias de actas de vecindad y registro fotográfico Campin

Tabla 19 Consolidado divulgación copias de actas de vecindad a la comunidad

Periodo No. 11				
Barrio	**Tramo**	**Fecha**	**PK ID**	**Cantidad**
Campin	1	12/12/2025	66683 67967	3
TOTAL				3

Tabla 20 Indicador divulgación copias de actas de vecindad

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Acompañamiento social a actividades técnicas de obra	3 divulgación copias de actas de vecindad / 3 divulgación copias de actas de vecindad * 100	Divulgar el 100% de copias de actas de vecindad a la comunidad como soporte del estado inicial del predio	100%

12. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

El contratista en cumplimiento de sus obligaciones dará atención oportuna a la comunidad a través del trato digno y respetuoso que propenderá por la rápida solución de las diferentes consultas y requerimientos que se presenten; en virtud de ello contará con la instalación de un Punto PAC Fijo, virtual y móvil.

12.1. Punto PAC fijo

Desde el área social del contratista, se da cumplimiento a la metodología dispuesta para atención a la comunidad en caso de presentarse alguna petición, reclamo, queja, sugerencia, y/o denuncia, por tal motivo se instaló el Punto PAC fijo el cual cuenta con atención presencial, en la calle 39 A # 29 -21 piso 3.



Foto 1 Punto PAC

El equipamiento del Punto PAC, será dotado con los siguientes elementos y/o recursos:

- ✓ Espacio de recepción
- ✓ Escritorio y silla para la persona encargada de la atención del Punto PAC.
- ✓ Computador e impresora
- ✓ Sillas para la atención a la población.
- ✓ Material impreso: formato de sistema de atención PQRSD.
- ✓ Medios de comunicación: Línea telefónica para hacer la recepción de las llamadas realizadas por la población y cuenta de correo electrónico.
- ✓ Horario de atención al público.

12.2. Punto PAC VIRTUAL

La contratista continua con la disposición de la atención del Punto PAC Virtual, como mecanismo que no implique desplazamientos de la comunidad hasta el Punto físico, se realizó instalación de la línea de atención No. 3019072050, la cual está dispuesta para la atención a la comunidad y el correo electrónico: teusavialsocial@gmail.com.

Esta información ha sido plasmada en cada pieza informativa que se ha entregado a la comunidad y en el punto satélite de información. Para el presente informe por medio del correo electrónico no se recibieron PQRSD.

12.3. Punto PAC Móvil

Durante este periodo el contratista a través del área social realizó recorridos de reconocimiento de los tramos de obra, con el ánimo de tener un acercamiento directo con la comunidad, escuchar sus consultas y manifestaciones y así mismo tramitar su respuesta en lo posible de manera inmediata.

Para este periodo se presentó (1) PQRSD, la cual será referenciada y se dio la respectiva trazabilidad en el apartado PQRSD, al finalizar el programa atención al ciudadano. Se hace claridad que en la vigencia de este periodo el contratista Consorcio Teusavial continua con la disposición de canales de atención, los cuales se describen en la siguiente tabla.

Tabla 21 Tabla de atención PUNTO PAC

Horario de Atención Virtual		**Contacto**	**Responsable**
Días	**Horario**		
Lunes a viernes	8 am a 4:30 pm 	 Correo electrónico: teusavialsocial@gmail.com Teléfono Móvil: 3019072050	Profesional Social T.S Ángela María Quiroga G.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 22 Indicador Punto PAC Móvil

Ítems/programa	**Formula**	**Meta**	**% de cumplimiento**
Punto PAC Móvil	1 punto PAC móvil implementado _____ 1 punto PAC móvil programado * 100	Instalación de un Punto PAC móvil	100%

Fuente: elaboración propia.

12.5 PQRSD

Durante el **periodo No. 11,** se recibió una (1) PQRSD, correspondiente al consecutivo No. 11. Dicha PQRSD corresponde a particularidades surgidas por los procesos constructivos en los tramos de obra. A continuación, se muestra consolidado y trazabilidad de las PQRSD generadas hasta la fecha de este informe.

Anexo 9. PQRSD No. 11.

Para el presente informe por medio del correo electrónico no se recibieron PQRSD.

Tabla 23 Consolidado PQRSD

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/ informe #
1	25/03/2025	7/04/2025	Copia acta de reunión de inicio tramo 1 Nicolás de Federmán	Jesika Aullon Guerrero Edificio Monterosso P-H Administración	Carrera 47 # 58 - 40 Edificio Monterosso	7/04/2025 Se emite correo electrónico con acta de reunión solicitada. En esta misma fecha se recibe notificación de la peticionaria, sobre el recibido de la información solicitada. Teniendo en cuenta la respuesta dada se genera cierre de la PARSD No. 1, a satisfacción de las partes.	Cerrado en informe No. 3
2 2	29/04/2025	19/05/2025	Garantizar el paso para silla de ruedas costado occidental, tramo de la carrera 27 entre calles 50 y 51, Alfonso López	Yessica Olaya Sánchez Tel. 3178376564	Carreras 27 3 entre calles 50 y 51	29/04/2025 Por medio del correo electrónico de atención a la comunidad, se recibe petición de una residente del tramo Alfonso López, quien solicita que por el andén del costado occidental se garantice el paso de una silla de ruedas o persona con movilidad reducida. Se dará trámite en el periodo No. 4. 13/05/2025 Se realiza recorrido con el área técnica del contratista, donde se verifican los niveles del espacio público del costado occidental. Igualmente, se realiza adecuación de sobresalto en la junta de los andenes, quedando el andén en condiciones óptimas para la movilidad de silla de ruedas. 19/05/2025 Se envía respuesta formal a la señora Peticionaria, a través de correo electrónico. 23/05/2025 Se realiza visita al predio y se recibe firma física de la	Cerrado en informe No. 4

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/ informe #
						trazabilidad y cierre de la presente PQRSD.	
3	08/05/2025	08/05/2025	Inconformidad referente al poco personal trabajando en el tramo y la maquinaria quieta	Julia Moreno Tel. 6012219996	Calle 53A No. 35-10	Se informa a la Peticionaria que las actividades que se están adelantando son de tipo manual: excavación, adecuación de cárcamos y la instalación de tubería hacia los pozos. Igualmente, se le informa que las condiciones climáticas hacen que en ciertos lapsos de tiempo sea necesario suspender actividades, sin embargo, la ejecución se encuentra en los tiempos estipulados. La Peticionaria recibe la información suministrada y cierra el PQRSD a satisfacción.	Cerrado en informe No. 4
4	11/06/2025	11/06/2025	Información sobre la intervención que se está llevando a cabo en la carrera 47 entre calles 58A y 59, tiempo de duración, pago de parqueaderos	Blanca Mojica Álvaro Suarez Tel. 3142328909	Carrera 47 No. 58A-67	Se informa a los Peticionarios que la intervención del tramo carrera 47 entre calles 58A es de tres meses aproximadamente, tiempo en el cual no se permite el ingreso a los garajes y el costo de los mismos es asumido por el propietario, arrendatario y/o encargado del predio.	Cerrado en informe No. 5
5	02/07/2025	02/07/2025	Durante proceso de cierre de actas de vecindad, el propietario manifiesta fisura mínima en muro de alcoba del costado sur.	John Alexander Blandon Tel. 3107713366	Carrera 47 No. 58-40 Apartamento 208	En visita realizada al predio con el acompañamiento del área técnica del contratista, se evidencia que el daño mencionado por el propietario, muestra levantamiento de pintura generada por humedad, que no son ocasionadas por los equipos y maquinaría utilizada; sin embargo y ante la negativa de firma del paz y salvo, el Consorcio Teusavial, realiza la reparación de la fisura	Cerrado en informe No. 6

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/ informe #
						mínima, aclarando que la intervención realizada en la vía no sobrepasa los 65 cm, siendo poco viable la afectación de alguna propiedad vecina. El propietario firma a satisfacción el cierre del acta de vecindad.	
6	01/09/2025	03/09/2025	El día 01 de septiembre de 2025, la firma Contratista Consorcio Teusavial, recibe solicitud de PQRSD, a través de la firma Interventora Consorcio Interteusaquillo JG, la cual fue remitida por la supervisión en la fecha mencionada, donde el señor Benjamín Espitia Nieto, residente del predio ubicado en la Calle 55Bis No.15A-13, el día 28 de agosto manifiesta queja formal a la Alcaldía de Teusaquillo refiriendo inconformidad por obras de adecuación de la vía Carrera 15 entre calles 54A y 55Bis, barrio Chapinero Occidental.	Benjamín Espitia Nieto	Calle 55Bis No. 15A-13 3133069678	El día 03 septiembre de 2025, El Consorcio Teusavial envía respuesta al comunicado CIT_FDLT_577_2024_142, con consecutivo TEUSAVIAL-552-116, dando cumplimiento a la solicitud y cerrando de esta manera la presente PQRSD.	Cerrado en informe No. 8

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/ informe #
7	01/10/2025	01/10/2025	El día 01 de octubre de 2025, el FDLT, bajo radicado Bogotá Te Escucha No. 4935922025 con fecha de radicación 19/09/2025, donde el señor Fabián Tapia, manifiesta queja formal por discriminación, malas miradas, desconociendo que es una persona con autismo	Fabian Alexis Tapia Perdono	Calle 70Bis No. 7C-33 Sur 3122603929	El día 01 octubre de 2025, El Consorcio Teusavial envía respuesta con consecutivo TEUSAVIAL-552-126, dando cumplimiento a la solicitud y cerrando de esta manera la presente PQRSD.	Cerrado en informe No. 9
8	03/10/2025	03/10/2025	Durante proceso de cierre de actas de vecindad, la encargada del predio manifiesta afectación en la puerta de ingreso del local.	Angela María Escobar	Carrera 27 No. 50-43 3059251267	El día 03 de octubre, el Consorcio Teusavial realiza la reparación de la puerta, atendiendo de esta manera la solicitud y cerrando de esta manera la presente PQRSD	Cerrado en informe No. 9

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/ informe #
9	23/10/2025	6/11/2025	Durante proceso de cierre de actas de vecindad, el propietario del predio manifiesta afectación en la rampa vehicular durante el proceso constructivo del CIV 13000284	Celso Penagos	Carrera 47 No. 58-69 3123135113	El día 23 de octubre de 2025, notifica al propietario que la rampa fue reparada una vez finalizado el tramo con CIV 13000343, donde manifiesta que se deterioró por paso de vehículos que utilizaban la rampa para girar, reiterando la solicitud de arreglo. El día 29 de octubre de 2025, en comité técnico se aprueba la reparación, se visita al predio, no se encuentra a nadie. El día 30 de octubre de 2025, se realiza visita al predio y se notifica el arreglo. El área técnica notificará la fecha de reparación. El día 06 de noviembre de 2025, se realiza la reparación de la rampa de acceso vehicular, se firma paz y salvo y se cierra la presente PQRSD.	Cerrado en informe No. 10
10	12/11/2025	28/11/202511	Durante el proceso de adecuación de la vía Transversal 59A entre calles 57 y 59 CIV 13000077, se presentó la caída de una colombina golpeando el vehículo con placa KXO-230 que transitaba por el carril del costado izquierdo, generando afectación en la tapa del espejo izquierdo y levantamiento	José Bravo	Transversal 59A entre calles 57 y 59 / Carrera 104B No. 22J-16 Apto 401 3114424250	El día 12 de noviembre de 2025, el señor José Bravo, manifiesta que mientras transitaba por la vía Transversal 59A entre calles 57 y 59, fue golpeado con una colombina de madera y base en concreto, generando afectación en la tapa del espejo izquierdo y levantamiento de pintura en el paral del vidrio panorámico. Igualmente notifica, que llevará el vehículo al concesionario para evaluar el valor del daño generado y el día 13 de noviembre de 2025, remitirá al Consorcio la cotización del arreglo del mismo.	Cerrado en informe No. 10

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/ informe #
			de pintura en el paral del vidrio panorámico. CIV 13000077			El día 14 de noviembre de 2025 y una vez recibida la cotización de la afectación del vehículo (13 de noviembre 2025), se realiza contacto telefónico con el señor José Bravo, solicitando enviar cuenta de cobro, adjuntando la cotización, copia de cedula de ciudadanía, certificación bancaria. Dichos documentos fueron enviados al correo del área social del Consorcio Teusavial teusavialsocial@gmail.com; los cuales fueron remitidos al área de contabilidad para el proceso de desembolso. El día 20 de noviembre de 2025 se realiza el pago de la afectación. El día 28 de noviembre de 2025 se envía la PQRSD al correo y WhatsApp para firma virtual, la cual es devuelta al mismo, cerrando de esta manera la PQRSD a satisfacción.	
11	09/12/2025	14/01/2026	El día 27 de noviembre de 2025 durante el proceso de adecuación de la vía Carrera 15 entre Calles 54A y 55 Bis CIV´S 13000985 - 13002468, se presentó la caída de una colombina golpeando el vehículo con placa PDZ658 que transitaba por el carril del costado	Harbey Fabian Martínez	Carrera 15 entre calles 54A y 55 Bis 300 7831753	El día 27 de noviembre de 2025, durante el proceso de adecuación de la vía Carrera 15 entre Calles 54A y 55 Bis CIV´S 13000985 -13002468, se presentó la caída de una colombina golpeando el vehículo con placa PDZ658 que transitaba por el carril del costado oriental, generando abolladuras en la puerta del costado derecho. El Señor Harbey Marín, propietario del vehículo, se dirige a la Secretaría Distrital de Movilidad, donde se levantó una petición la cual remitida al	Cerrado en informe No. 11

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/ informe #
			oriental, generando abolladuras en la puerta del costado derecho.			Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, el día 05 de diciembre de 2025 Radicado 202531215947411, con copia al Consorcio Teusavial y Consorcio Interteusaquillo. El día 09 de diciembre de 2025, el Consorcio Teusavial recibió a través de correo electrónico, remitido por la firma Consorcio Interteusaquillo, la comunicación anteriormente descrita. El área social realiza contacto con el Señor Harbey Marín, donde se aclara lo sucedido y se le solicita cotización de reparación de las afectaciones del vehículo. El día 11 de diciembre de 2025, se recibe la cotización de la afectación del vehículo, se realiza contacto telefónico con el señor Harbey Marín para solicitarle enviar cuenta de cobro, adjuntando la cotización, copia de cedula de ciudadanía, certificación bancaria y Rut. Dichos documentos fueron enviados al correo del área social del Consorcio Teusavial teusavialsocial@gmail.com; los cuales fueron remitidos al área de contabilidad para el proceso de desembolso. El día 15 de diciembre de 2025 se realiza el pago de la afectación del vehículo. El día 14 de enero de 2026, se recibe comprobante de pago y se remite a la interventoría como soporte	

# de PQRSD	Fecha apertura	Fecha de cierre	Solicitud	Peticionario	Dirección /teléfono	Trazabilidad	Estado/ informe #
						del cierre de la presente PQRSD.	

12.6. Participación Ciudadana Reuniones Comité Ciudadano

La firma Contratista, a través de la residente social estableció en reuniones de inicio de los barrios Nicolás de Federmán y Quinta Paredes, un comité de participación ciudadana en cada uno de ellos, conformado por personas de la comunidad ubicada en el área de influencia directa del proyecto. Se aclara que el tramo de Nicolás de Federmán finalizó en el mes de octubre de 2025 y el de Quinta Paredes en el mes de noviembre de 2025, por lo cual se programará las reuniones de finalización.

El área social del Consorcio Teusavial durante el presente período, no llevó a cabo ninguna reunión de Comité de Participación Ciudadana en los tramos donde se conformó, por finalización de actividades técnicas.

13. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

13.1. Objetivo General

Brindará información por medio de plegables de sostenibilidad sobre la responsabilidad ciudadana en el buen uso y mantenimiento de las obras construidas, en pro de que las mismas se mantengan en el tiempo.

13.2. Plegables de Sostenibilidad

En el presente periodo se dio inicio a la socialización del plegable de sostenibilidad de la vía, en el barrio San Luis tramo 2 CIV 13000744, se realizó acercamiento predio a predio donde se contactaron a los propietarios y/o encargados de los mismos, indicando recomendaciones a tener en cuenta para que las obras ejecutadas se conserven en buen estado.

Se aclara, que el día 03 de febrero de 2026, se remitió a la Interventoría el plegable de sostenibilidad de la vía del barrio Chapinero Occidental, el cual fue aprobado por la Supervisión de la Alcaldía Local el día 06 de febrero de 2026, por lo tanto, dicha actividad se reportará en el informe final.

Los plegables en su debido momento, fueron presentados a la interventoría, contaron con su aprobación para impresión y distribución, se aplicó la metodología aprobada. A continuación, se presenta tabla de consolidado de distribución de plegables de sostenibilidad de la vía durante el periodo.

Tabla 24 Consolidado entrega de plegables de sostenibilidad de la vía en el periodo

Periodo No. 11					
Tipo de volante	**CIV**	**Barrio**	**Tramo**	**Fecha**	**# volantes distribuidos**
Plegable de sostenibilidad de la vía	13000744	San Luis	2	13/01/2026	10
Total					10

Anexo 10. Formato control entrega de piezas de divulgación, plegable de sostenibilidad de la vía, registro fotográfico barrio San Luis.

Tabla 25 Indicador distribución de plegables de sostenibilidad de la vía en el periodo

Programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Sostenibilidad	10 plegables de sostenibilidad de la vía y espacio público distribuidos _____ 10 plegables de sostenibilidad de la vía y espacio público requeridos * 100	Distribuir un plegable por predio en zona de influencia directa de cada tramo intervenido	100%

14. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO.

14.1 Objetivo General

Realizar acciones encaminadas a la formación del personal que hace parte del contrato, articuladas con las áreas SST y ambiental, a través de una capacitación mensual sobre temas que contribuyan al mejoramiento de la convivencia y desarrollo personal, laboral y social de los trabajadores adscritos al proyecto, además de enfatizar sobre el trato a la ciudadanía.

14.2 Capacitación mensual

Para el **periodo No. 11**, desde el área social y SST, se implementaron dos capacitaciones, las cuales se desarrollaron en los tramos, los temas abordados fueron compartir despedida de fin de año y hábito de vida saludable, se contó con la participación activa del personal vigente.

Anexo 11. Listado de asistencia y registro fotográfico de capacitación No. 11

Tabla 26 Realización de capacitación mensual

Periodo No. 11		
Fecha	**Tema**	**No. De asistentes**
20/12/2025	Compartir despedida de fin de año	14
27/01/2026	Hábitos de vida saludable	21

Tabla 27 Indicador realización de capacitación mensual

Ítems/programa	Formula	Meta	% de cumplimiento
Programa de capacitación a los empleados del proyecto.	35 trabajadores asistentes a la capacitación Mensual No. 10 y 11 / 35 trabajadores convocados a la capacitación * 100	Realización de una capacitación mensual.	100%

Fuente: elaboración propia.

15. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO FORMADA

15.1 Objetivo General

Vincular mínimo al 30% de personal MONF[1], de la localidad de Teusaquillo, en concordancia al anexo técnico del contrato.

[1] Mano de obra no formada

15.2 Generación total de empleo

Para el **periodo No. 11,** el Consorcio Teusavial continua con la plantilla de personal profesional requerida, se cumple con la vinculación de mano de obra femenina, también se continua con contratación de mano de obra no formada, de la localidad de Teusaquillo. A continuación, se presenta tabla.

Tabla 28 Personal contratado en el periodo No. 11

NÚMERO	EMPRESA (CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA)	DATOS DEL TRABAJADOR				
		TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	LOCALIDAD DE RESIDENCIA N°	CARGO
RETIROS						
1	CONSORCIO USAQUEN VIAL	LABORAL	LUIS SEBASTIAN MIRANDA BERNAL	1020803566	TEUSAQUILLO	OPERADOR
2	CONSORCIO USAQUEN VIAL	LABORAL	MARGOTH BRAVO SUAREZ	1000182756	TEUSAQUILLO	AUX TOPOGRAFIA
3	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA	OPS	JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA	79947081	USAQUÉN	DIRECTOR DE OBRA
4	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA	OPS	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA	80026555	PUENTE ARANDA	ESP. GEOTECNIA Y PAVIMENTOS
5	LISANDRO NUÑEZ GALEANO	OPS	LISANDRO NUÑEZ GALEANO	5471618	USAQUÉN	ESPECIALISTA HIDRAULICO
6	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	SANDRA ISABEL PERILLA FONSECA	52104995	BOSA	AUXILIAR SOCIAL
7	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	YOHANA MARCELA AREVALO MOLINA	1032380392	FONTIBÓN	INGENIERA CIVIL DE OBRAS Y TÉCNICA
8	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	HENRY CAMILO DURAN MARQUEZ	80903575	MARTIRES	RESIDENTE AMBIENTAL
9	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	ANDRES FELIPE ECHANDIA ROLDAN	79785617	USAQUÉN	RESIDENTE DE OBRA
10	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	ANGELA MARIA QUIROGA GALVIS	52753727	PUENTE ARANDA	RESIDENTE SOCIAL
11	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	TATIANA ANDREA VALDELEÓN MANRIQUE	1014240890	ENGATIVA	RESIDENTE SST
12	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	DANIEL FELIPE SANCHEZ MOLINA	1023928966	TUNJUELITO	TOPOGRÁFO
13	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	ISABEL CRISTINA AGUDELO	1193074894	ENGATIVA	INSPECTORA SST AMBIENTAL

15	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	DAVID SEBASTIAN MARTINEZ ARENAS	1022421350	KENNEDY	INSPECTOR DE OBRA
16	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	REINALDO SALAS GONZALEZ	1240640	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
17	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	ALEXIS FEREIRA SALAS	1775189	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
18	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	GLORIA ESPERANZA CAMPOS	52026157	CIUDAD BOLIVAR	AUXILIAR SOCIAL
19	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	RAFAEL GUTIERREZ	79122807	ENGATIVA	CONDUCTOR
20	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	SANDRA LILIANA VACA	52971427	CIUDAD BOLIVAR	AUXILIAR TOPOGRAFIA
21	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	JHON FREDY HERNANDEZ	74189712	CIUDAD BOLIVAR	AUXILIAR TOPOGRAFIA
22	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	JULIÁN FERNANDO TRUJILLO DURÁN	1010200330	CIUDAD BOLIVAR	INSPECTOR SST-AMB
23	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	JONATHAN CASTAÑO PIEDRAHITA	1012360118	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
24	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	LENIS CALDERON BOCANEGRA	79955833	BOSA	AYUDANTE DE OBRA
25	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	WILMER PEROZO	993685	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
26	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	EDGAR ALFONSO CASTRO BARRAGAN	79896322	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
27	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	OSCAR ENRIQUE DE LIMA	1118843305	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
28	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	KEVIN ANDRES ALZATE ROMERO	1105464056	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
29	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	HASSAY VANESA QUIROGA AGUILAR	1011080611	BOSA	INSPECTORA SSTAMB
30	CONSORCIO CAPITAL	LABORAL	LEIVER ESTIVEN RODRIGUEZ MORALES	1000000755	TEUSAQUILLO	CADENERO I
31	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	NIKOLAY CASTELLANOS CABALLERO	1001186516	TEUSAQUILLO	CADENERO I
32	PAVIOBRAS SAS	LABORAL	ALVARO RIOS BARRIOS	11433021	TEUSAQUILLO	OPERADOR
33	MAQUINARIA MEDINA R Y C SAS	LABORAL	JOSE ANDRES NIETO ROA	1031132699	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR
34	EP INGENIEROS CIVILES SAS	LABORAL	ANDRES FELIPE VILLEGAS MEDINA	1024592489	CIUDAD BOLIVAR	OPERADOR

5.3. Vinculación de Mano de Obra No formada periodo No. 11.

Para el presente periodo se mantienen vinculadas (8) personas, con perfil mano de obra no formada, de las cuales (3) pertenecen a la localidad de Teusaquillo, las demás pertenecen a la localidad Ciudad Bolívar y otras localidades, desde el área de gestión humana del Consorcio Teusavial, se generó la vinculación de perfiles para actividades de auxiliares de tráfico y brigadistas de orden, aseo y limpieza con asignación de cargos de ayudantes de obra, desde el subcontratista de obra se realizaron vinculaciones para ayudantes de obra, para actividades operativas en los diferentes frentes del proyecto.

A continuación, se presenta tabla que permite verificar cuantitativamente los porcentajes alcanzados del ítem para vinculación laboral MONF y mujeres.

Tabla 29

Periodo No. 11							
Total, MONF	**Total, MONF localidad Teusaquillo**	**Total, MONF otras localidades**	**Porcentaje cumplimiento MONF**	**Total, personal contratado (MONF, y Mujeres MOF)**	**Total, mujeres vinculadas al proyecto**	**Total, personal vinculado al proyecto**	**Porcentaje total vinculación (mujeres)**
8	3	5	37.5%	8	9	34	28%

Tabla 30 Personal MONF en el periodo

NÚMERO	EMPRESA (CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA)	DATOS DEL TRABAJADOR				
		TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	LOCALIDAD DE RESIDENCIA N°	CARGO
1	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	REINALDO SALAS GONZALEZ	1240640	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
2	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	ALEXIS FEREIRA SALAS	1775189	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA
3	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	JONATHAN CASTAÑO PIEDRAHITA	1012360118	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
4	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	LENIS CALDERON BOCANEGRA	79955833	BOSA	AYUDANTE DE OBRA
5	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	WILMER PEROZO	993685	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
6	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	EDGAR ALFONSO CASTRO BARRAGAN	79896322	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA

7	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	OSCAR ENRIQUE DE LIMA	1118843305	TEUSAQUILLO	AYUDANTE DE OBRA
8	CONSORCIO TEUSAVIAL	LABORAL	KEVIN ANDRES ALZATE ROMERO	1105464056	CIUDAD BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA

Tabla 31 Indicador vinculación MONC

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento
Contratación MONF	3 trabajadores MONF de localidad de Teusaquillo / 8 de trabajadores MONF * 100	30% mano de obra local y/o de localidades de estratos 1 y 2	37.5%

Es importante mencionar que, el contratista Consorcio Teusavial en el marco del contrato No. 552 – 2024 (120683), y en cumplimiento del acuerdo 332 de 2021 del Concejo de Bogotá, cuyo objetivo principal cerrar la brecha de pobreza y disminuir la informalidad económica e inclusión de mujeres en la contratación de obra pública, desde la etapa preliminar del contrato, realizó la vinculación de mano de obra femenina con un alcance del 28%, las cuales se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 32 listado de las mujeres vinculadas en cumplimiento al decreto 332 de 2021.

#	Contratista/ Subcontratista	Nombres Y Apellidos	Cédula	Localidad	Cargo
1	Consorcio Teusavial	Sandra Isabel Perilla Fonseca	52104995	Bosa	Auxiliar Social
2	Consorcio Teusavial	Yohana Marcela Arévalo Molina	1032380392	Fontibón	Ingeniera Civil De Obras Y Técnica
3	Consorcio Teusavial	Angela maría Quiroga Galvis	52753727	Puente Aranda	Residente Social
4	Consorcio Teusavial	Tatiana Valdeleón	1014240890	Engativá	Residente SST
5	Consorcio Teusavial	Isabel Cristina Agudelo	1193074894	Engativá	Inspectora SST-Ambiental
6	Consorcio Teusavial	Gloria Esperanza Campos	52026157	Bosa	Aux. Social

#	Contratista/ Subcontratista	Nombres Y Apellidos	Cédula	Localidad	Cargo
7	Consorcio Teusavial	Sandra Liliana Vaca	52971427	Ciudad Bolívar	Aux. Topografía
8	Consorcio Teusavial	Hassay Vanesa Quiroga Aguilar	1011080611	Bosa	Inspectora SSTAMB
9	Consorcio Usaquén Vial 2025	Margot Bravo Suarez	1000182756	Teusaquillo	Aux de Topografía

Tabla 33 Indicador generación de empleo de mujeres en el periodo

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento
Contratación mujeres	9 mujeres vinculadas al proyecto / 32 personas total vinculadas al proyecto * 100	Mantener mínimo el 13.4% mano de obra femenina en el desarrollo del contrato	28%

16. PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A DOTACIONES

16.1 Objetivo General.

Velar porque todos los empleados del proyecto utilicen adecuadamente los elementos de protección personal acorde a las actividades que cada uno realiza, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Identidad Visual del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo.

16.2 Seguimientos por periodo

Para el **periodo No. 11**, desde el área social del Consorcio Teusavial, se efectúo el seguimiento a dotaciones, para personal administrativo y operativo del contrato, quienes portan la dotación acorde a la imagen corporativa privada del contratista y en concordancia a criterios del área SST.



Foto 2 Uso dotación personal administrativo y operativo

Tabla 34 Indicador control y seguimiento de dotaciones

Programa	Formula	Meta	Cumplimiento
Control y seguimiento de dotaciones	32 trabajadores portando la dotación requerida _____ 33 trabajadores contratados en el periodo * 100	Que todo el personal administrativo y operativo contratado, porten la dotación requerida en cada periodo	100%

17 PROGRAMA DE GESTION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

17.1 Informes Semanales

Semanalmente la residente social del Consorcio Teusavial, ha remitido vía correo electrónico a la Interventoría, el informe semanal de actividades de gestión social, se han atendido las observaciones y sugerencias de la interventoría, de acuerdo a la etapa preliminar a la fecha.

17.2 Informe Mensual

Este es un mecanismo que permite verificar el cumplimiento de los programas del plan de gestión social planteados para el proyecto. En concordancia se presenta **el informe No. 11**, a corte 06 de febrero de 2026**,** en este informe se describen las actividades que se realizaron durante el periodo. Posteriormente la interventora social realizará revisión, verificación, concepto y aprobación, para remitir a la alcaldía Local de Teusaquillo (FDLT).

17.3 Informe Final

Al finalizar el contrato se presentará un informe final a la firma interventoría, donde se plasme el consolidado de la implementación del Plan de Gestión Social en obra, dicho informe recogerá información cuantitativa y cualitativa de cada una de las actividades realizadas por tramo o sector intervenido. Como se proyecta realizar consolidado por tramo se dejará organizado el historial de anexos que den soporte de las actividades ejecutadas; los cuales fueron mencionados en los informes mensuales, pero que en el final también se registraran.

Las actas de vecindad harán parte de los anexos por cada segmento vial, estás llevaran un consolidado donde se registre el nombre del propietario, dirección teléfono y numero de acta, así mismo contarán con su respectivo soporte de acta de cierre que verifique si se generó alguna afectación y firma a satisfacción según sea el caso. El informe se entregará según los criterios de radicación del FDLT. El informe final contendrá los siguientes requisitos:

- ✓ Identificación, información del proyecto.
- ✓ Introducción.
- ✓ Componentes del Plan de Gestión Social con los programas y actividades desarrolladas por el contratista, incluirá consolidados e indicadores de cumplimiento.
- ✓ Análisis del cumplimiento del programa.
- ✓ Conclusiones y recomendaciones y anexos.

18 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COSTOS.

18.1 Comités de Gestión Social

El seguimiento del desempeño social del contratista ha sido verificado semanalmente por la interventoría, de acuerdo a las actividades de gestión en campo, seguimiento telefónico y por vía correo electrónico. Adicionalmente se ha realizado seguimiento y verificación del trabajo por medio de comités sociales e integrales, validados y efectuados por la interventoría a través de la lista de chequeo. Esta información reposa en actas de seguimiento de la interventoría.

Anexos

Anexo 1
Acta de reunión extraordinaria barrio Pablo VI, anexos y registro fotográfico.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	

Contrato No.: 552-2024 COP (120683) **HORA INICIO:** 9:45 a.m. **Hoja** 1 ___ de 15

FECHA: DICIEMBRE 05 DE 2025 **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:45am **Acta N°** 1

PROYECTO:Descripción del proyecto
"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

ORDEN DEL DÍA

Reunión Extraordinaria aclaración no afectación de los setos de cipreses

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza contacto con el Señor Efrén Alexander Rojas, cedula de ciudadanía No. 7.165.619, Administrador del Conjunto Residencial Montana (Nit. 800.057.394-4), número de contacto 313 2107147, aledaño a la vía Transversal 59A entre Calles 57 y 59 CIV 13000077, la cual está siendo intervenida por el Consorcio Teusavial, Contratista de la Alcaldía Local de Teusaquillo; donde en visita realizada el día 28 de noviembre de 2025, se le comunicó al administrador que el Consorcio realizó un mantenimiento de los setos de cipreses, que consistió en una poda preventiva de baja intensidad en unas ramas que habían sido dañadas con machete por un habitante (jardinero) de la comunidad.

El señor Efrén nos comunica que cuenta con un permiso del IDRD para la administración del parque que rodea un costado de la copropiedad y que realizará las respectivas actividades y cotizaciones para el mantenimiento de los setos que pueden llegar a interferir con el desarrollo del proyecto y el tránsito de la comunidad.

Igualmente, se informa que el día 03 de diciembre de 2025, se instaló la primera capa de carpeta asfaltica del costado oriental de la via sin generar ningún daño a los setos del parque y una vez terminadas las actividades de rehabilitación del costado occidental se aplicará uniformemente el acabado de la via.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
NINGUNO		

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Efrein Alexander Rojas	C.R. Montura	Efrein Rojas

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Luz Escobar Ospina
CARGO	Residente Social	Residente Social	Residente Interventoría
FIRMA	Angela M. Quiroga	Angela M. Quiroga	Luz Escobar O.

ANEXOS:	SI	X	NO		TIPO DE ANEXO: Reg. Fotografico	CANTIDAD: 1

3 - 15

Outlook

Registro exitoso de petición

Desde avisoinformativo_sdqs@alcaldiabogota.gov.co <avisoinformativo_sdqs@alcaldiabogota.gov.co>
Fecha Lun 15/09/2025 12:51 PM
Para montanadmon@hotmail.com <montanadmon@hotmail.com>

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2025

Señor (a)
CONJUNTO RESIDENCIA MONTANA P.H NO REGISTRA
montanadmon@hotmail.com
CL 59 58-17

Asunto: Registro exitoso de petición
Petición No. 4830112025 Bogotá Te Escucha
Radicado No. 09/09/2025
Canal de presentación: E-MAIL .

Cordial saludo,

Desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., le informamos que su petición se ha registrado con éxito en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas – Bogotá Te Escucha con el No. 4830112025, del 15 de septiembre de 2025, siendo asignada a INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD.

Por lo tanto, si la petición es competencia legal de esta Entidad, el tiempo de respuesta empezará a contar al siguiente día hábil de asignada la solicitud. Esto según la normatividad vigente.

Si por lo contrario, la solicitud no es competencia de esta entidad, realizaremos el traslado a la(s) entidad(es) que consideremos pueden atenderla Esto se hará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la recepción; si obró por escrito, los términos para decidir se contarán a partir del día hábil siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente.

Para mayor información sobre sus consultas ingrese a Preguntas Frecuentes en el siguiente enlace: https://bogota.gov.co/sdqs/preguntas-frecuentes

Atentamente,

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas – Bogotá te escucha - https://bogota.gov.co/sdqs/

AVISO IMPORTANTE: Este correo es enviado desde Bogotá Te Escucha como respuesta automática en el registro, clasificación y/o atención de su petición. Por favor, no responder a esta dirección de correo, ya que no es revisada por ningún funcionario.

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra política de protección de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas

5- 15

BOGOTÁ | IDRD

Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20256000290371

Bogotá D.C. 17-09-2025


Efren Alexander Rojas
Calle 59 No. 58-43
montanadmon@hotmail.com
Bogotá.

Asunto: Respuesta Radicado IDRD 20252100386902 del 09 de septiembre de 2025.

Cordial saludo,

De manera atenta y respetuosa me permito informarle en referencia a su solicitud *"la poda de los pinos, eugenias que encierran el parque código IDRD13-147."*. informamos lo siguiente:

De acuerdo con la información allegada, una vez verificado en nuestro Sistema de Información Geográfica (SIG), nos permitimos referirnos sobre el parque: "Conjunto Residencial La Montana", de escala de proximidad (antes de escala vecinal o de bolsillo), con código 13-147, ubicado en la Localidad de Teusaquillo y que pertenece a la red de Parques Distritales, como se puede visualizar en las siguientes imágenes:

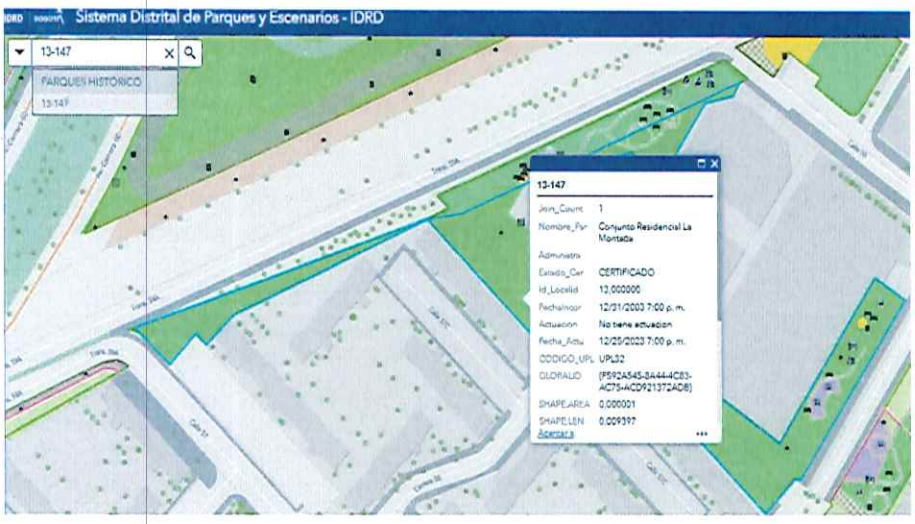

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59° -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Fecha de firmado:
2025.09.17 21:18:39 COT
Firmado digitalmente
desde SGD-Orfeo



Fuente: Sistema Distrital de Parques y Escenarios - IDRD

Ahora bien, es preciso indicar que por tratarse de un parque de proximidad (antes de escala vecinal o de bolsillo), la UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) es el ente en cargado de gestionar la poda en parques vecinales.

Frente a la intervención de poda me permito señalarle, que en el ¨ ***Artículo 116 del Acuerdo N.º 257 de 2006***, *que reza: "Artículo 116. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de servicios Públicos. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat" y que "tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público".*

Por lo anterior, encuentra entonces esta Subdirección que para su petición y con respecto a su solicitud del poda y horarios, teniendo en cuenta el aparte normativo precitado, es la UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos), la entidad competente para atender y dar respuesta a las solicitudes de ¨ *la poda de los pinos, eugenias que encierran el parque código IDRD13-147.* ¨


Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195

7-15

BOGOTÁ | IDRD

Finalmente, y acorde a lo expuesto, por medio de esta comunicación se da traslado del oficio en asunto, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, para que desde sus competencias la UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos), brinde respuesta directamente al peticionario de acuerdo con lo requerido y se informe a esta entidad mencionando en el asunto este número de radicado.

Cordialmente,



RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector Técnico de Parques
Subdirección Técnica de Parques

Anexos: 1 ARCHIVO PDF
Copia: UAEP Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -uaesp@uaesp.gov.co

Elaboró: Fabio Andres Bernal Gutierrez Contratista Subdirección Técnica de Parques
Proyectó: Fabio Andres Bernal Gutierrez Contratista Subdirección Técnica de Parques
Revisó: Liliana Bastidas- Abogada Contratista Subdirección Técnica de Parques
Aprobó: Rodrigo Alberto Manrique Forero – Subdirector Técnico de Parques

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Outlook

Solicitud poda pinos Código IDRS 13-147

Desde ADMINISTRACION MONTANA PH <montanadmon@hotmail.com>
Fecha Lun 08/09/2025 12:31
Para Glenda Rincon Fonseca <glenda.rincon@idrd.gov.co>
CC IDRD Correspondencia <idrdcorrespondencia@idrd.gov.co>

6 archivos adjuntos (1 MB)

WhatsApp Image 2025-09-06 at 11.00.12 AM.jpeg; WhatsApp Image 2025-09-06 at 10.59.45 AM.jpeg; WhatsApp Image 2025-09-06 at 10.58.45 AM.jpeg; WhatsApp Image 2025-09-08 at 10.59.02 AM.jpeg; WhatsApp Image 2025-09-08 at 10.58.50 AM.jpeg; WhatsApp Image 2025-09-08 at 10.58.41 AM.jpeg;

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
Atn. Sra. Glenda Rincón Fonseca
Equipo Gestión Social
Ciudad

Respetada señora:

La Administración del Conjunto Residencial Montana propiedad horizontal, solicita a esta entidad gestionar la poda de los pinos, eugenías y árboles que encierran el parque Código IDRD 13-147. calle 59 No. 58-43 de la ciudad e Bogotá. El cual por el transcurrir del tiempo esta vegetación a crecido de manera considerable afectando el transito peatonal por el anden, la visualización de las personas en la zona, creando focos de inseguridad, problemas de movilidad personal y desinterés en aprovechar este espacio que con tanto cariño a cuidado la comunidad de Montana.
Adjunto un registro fotográfico del estado de estos árboles.
Quedo atento a la pronta respuesta y solución a la petición.
cordial saludo
Efrén Alexánder Rojas
Administrador
Conjunto Residencial Montana

Aviso de confidencialidad: La información contenida en este correo electrónico y sus anexos contiene información del IDRD que se encuentra dirigida en forma exclusiva al destinatario del mismo para su uso, quien se encuentra obligado a mantener reserva sobre toda la información aquí contenida. Si usted es lector de este mensaje, pero no su destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la ley 1273 de 2009 y todas las que apliquen. Si ha recibido este correo por error, le agradecemos informar a soporte@idrd.gov.co y borrarlo de su sistema. Las opciones que contengan este mensaje son exclusivas de su autor, y no necesariamente representan la opinión oficial del IDRD. El remitente no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus que pueda contener este correo.




10- 15





11 - 15


12-15

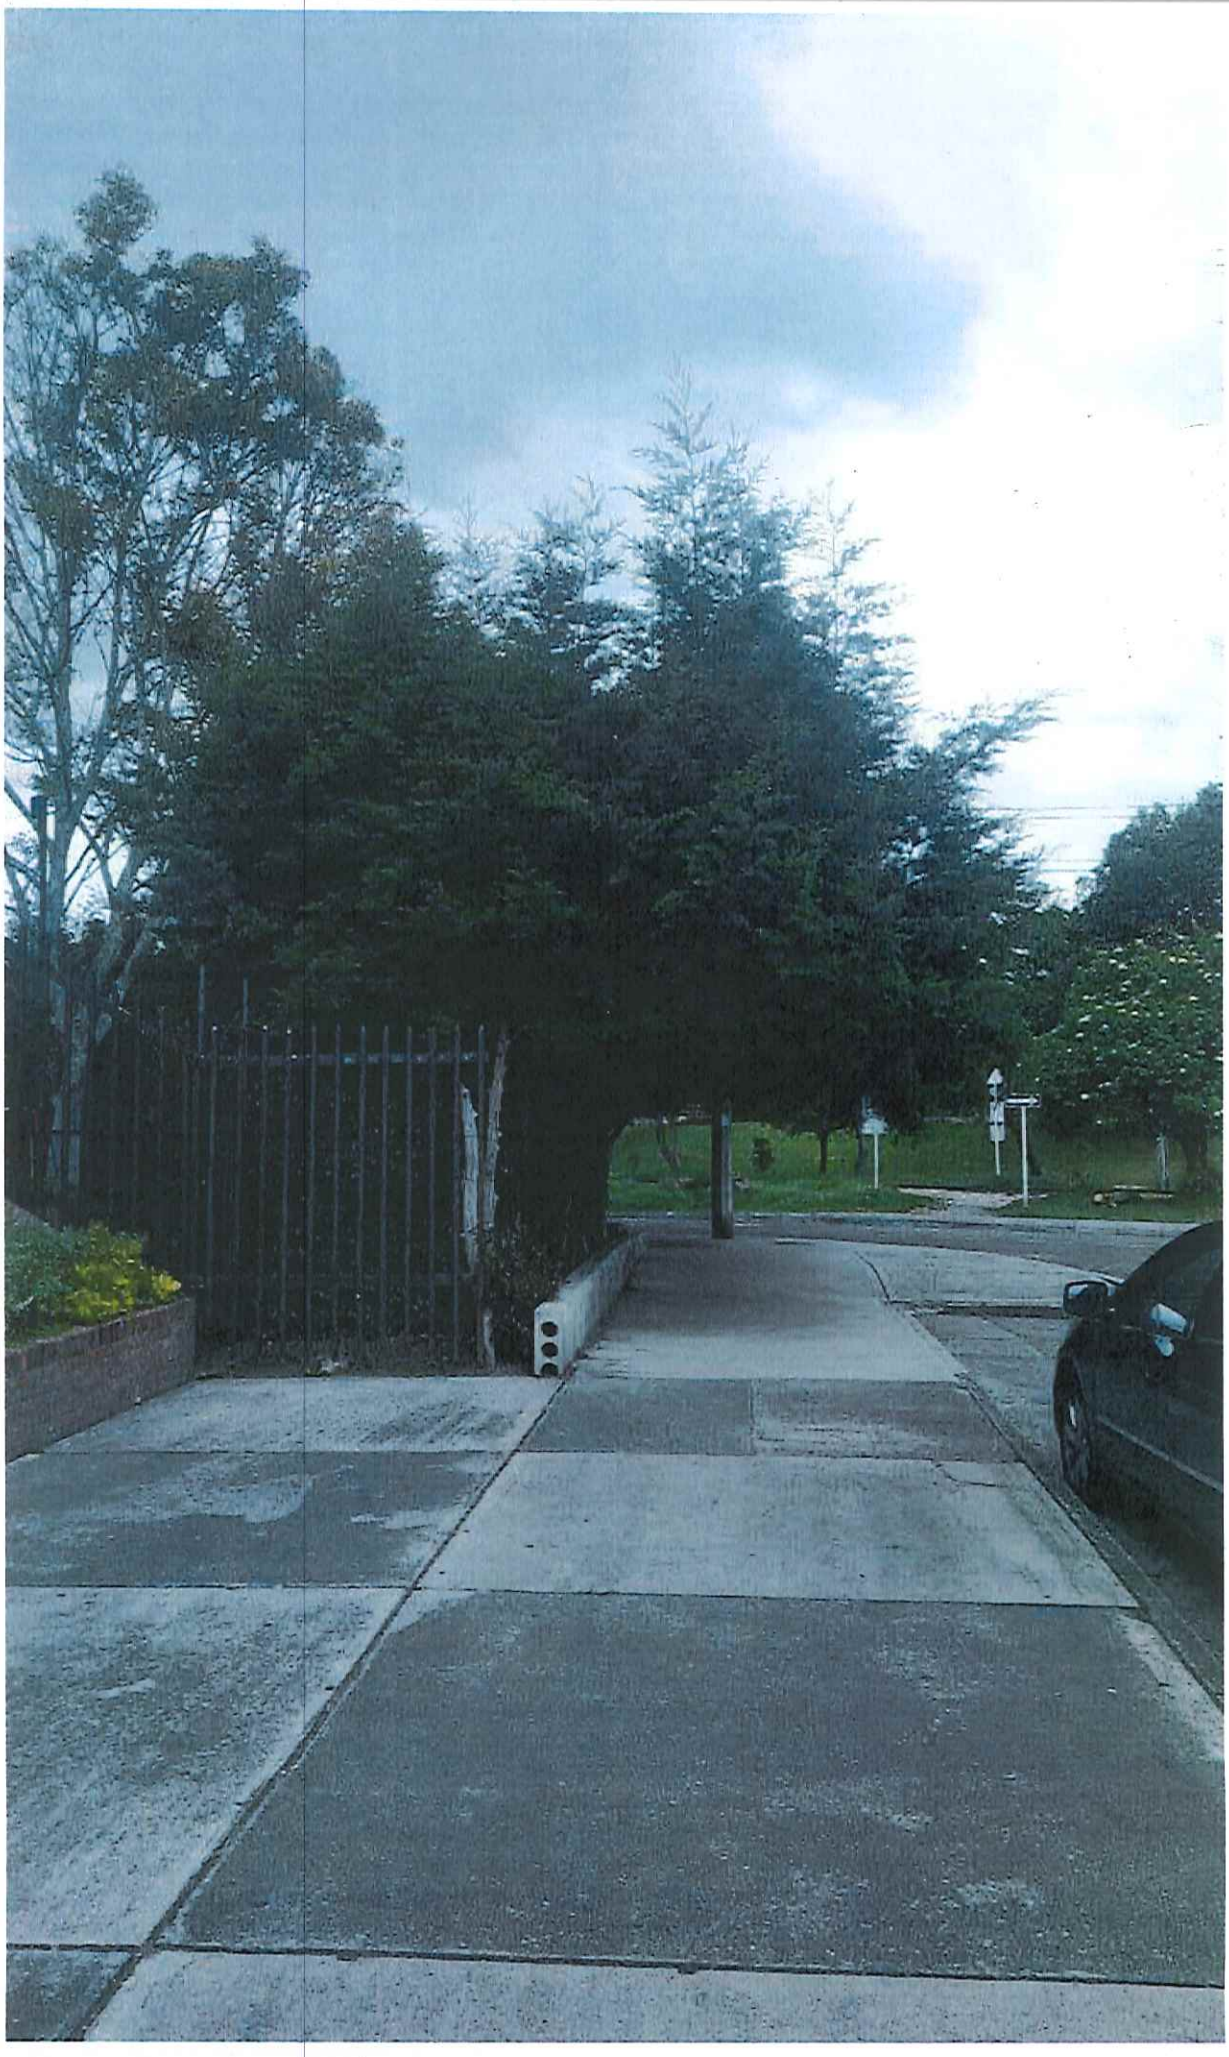

13-15



14 - 15

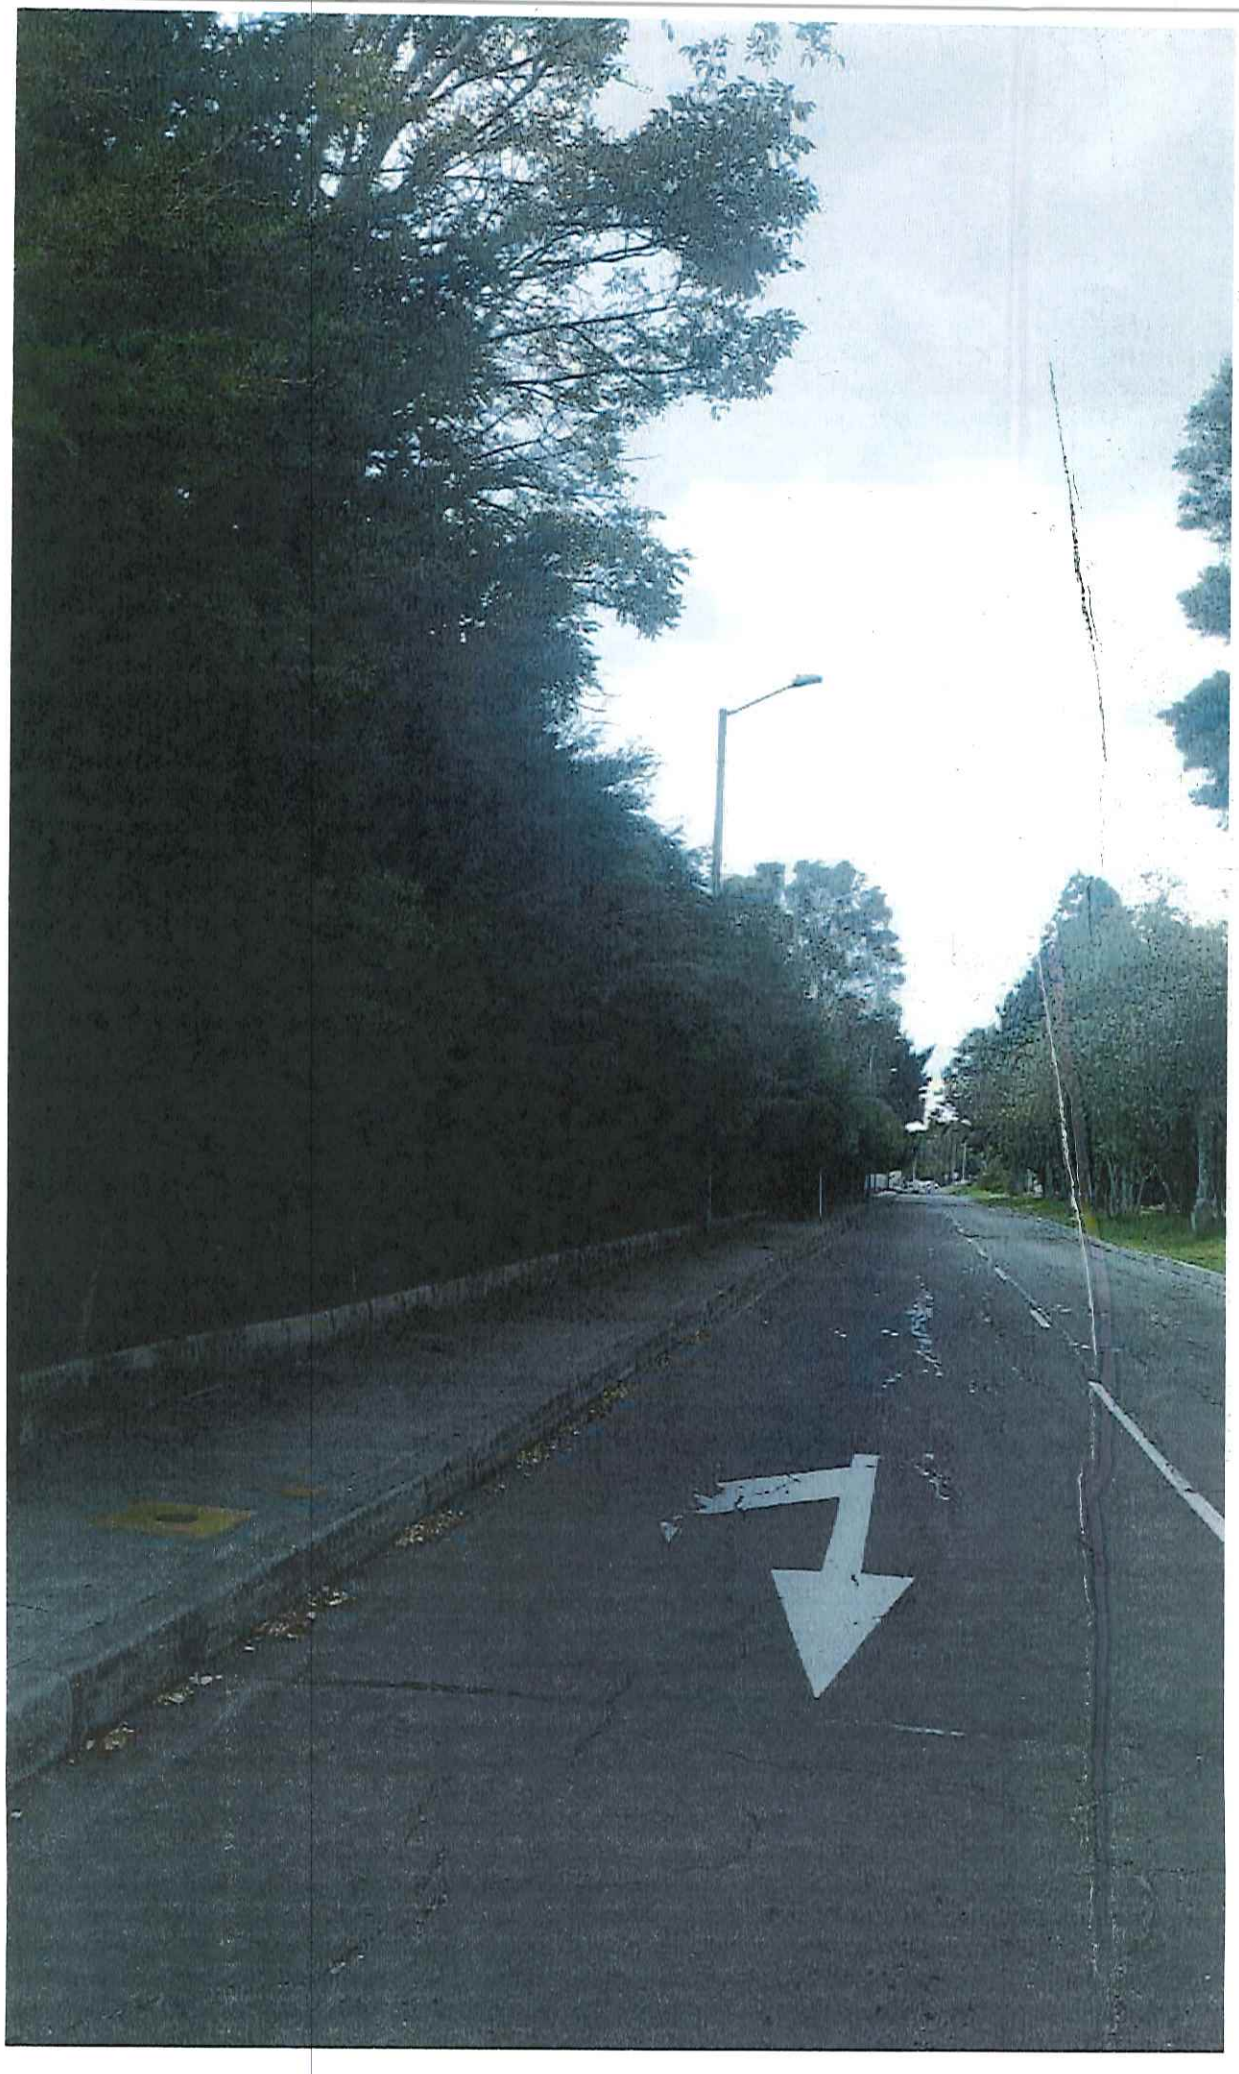

CONSORCIO TEUSAVIAL	Contrato No. 552-2024 COP (120683)	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	05 de Diciembre de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 AL 3









Observacion: Reunión extraordinaria barrio Pablo VI
No afectación de setosde cipreses
CIV 13000077

Anexo 2
Actas de socialización PMT barrio Chapinero Occidental tramo 1, registro fotográfico, Acta de socialización de inicio, tramo Campin, listado de firmas, esquema PMT y registro fotográfico.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	

Contrato No.: 552-2024 COP (120683)	HORA INICIO: 9:30 AM	Hoja 1 de 6
FECHA: DICIEMBRE 12 DE 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 AM	Acta N° 5

OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

ORDEN DEL DÍA

1.- Socialización del contrato y de las obras a ejecutar.

2.- Socialización de canales de atención del contrato.

3.- Recomendaciones a la comunidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- Socialización del contrato y de las obras a ejecutar:

PK ID 66683 y 67967 Tramo Diagonal 61D con Carrera 26 (Anden esquina de predio), Barrio Campin, UPL Galerías. Espacio público de emergencia por Plan de Acción de Movilidad de la Alcaldía Local.

El día 12 de diciembre de 2025, se inicia el proceso de socialización del contrato 552-2024, en el tramo ubicado en la Diagonal 61D con Carrera 26 (Anden), Barrio Campin, UPL Galerías. Durante este proceso se informó a los ciudadanos residentes el nombre del contratista, denominado Consorcio Teusavial y la interventoría Consorcio Interteusaquillo JG, se menciona que los trabajos a ejecutar se harán a partir del lunes 15 de diciembre de 2025, con CIERRE TOTAL DE ANDEN DEL COSTADO SUR DE LA DG 61D Y COSTADO ORIENTAL DE LA CR 26 PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO (DEMOLICION DE PLACA EXISTENTE, CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA DEL ANDÉN, INSTALACION DE PLACA DE CONCRETO).

Se socializa el esquema del PMT aprobado y se adjunta a la presente acta.

Se informa que el tiempo de ejecución del trabajo será de 1 (un) mes aproximadamente y con intervención diurna. Se notifica que una vez instalado el concreto de las rampas de acceso vehícular se requiere un tiempo de fraguado de 15 a 28 dias.

2.- Socialización de canales de atención del contrato

Se socializa los datos del punto PAC virtual: Celular: 301 907 2050 / Correo electrónico: teusavialsocial@gmail.com / Punto PAC presencial: Calle 39A No. 29-21 Barrio La Soledad

3.- Recomendaciones a la comunidad

Se realizan la siguientes recomendaciones a la comunidad:
1.- No ingresar a las zonas de trabajo las cuales se encontratrán aisladas durante la ejecución.
2.- Se recomienda atender la señalización informativa y reglamentaria dispuesta en el frente de obra.
3.-En caso de algún requerimiento de la comunidad por favor dirigirse al residente de obra, quien transmitira las inquietudes al área social,o a los canales de atención del contrato.
4.- Se recomienda el retiro de los vehículos de los garajes durante el tiempo de ejecución de la obra.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD
La comunidad no manifiesta ninguna inquietud, reciben la información a satisfacción y solicitan que la obra se ejecute en el menor tiempo posible.


COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
NINGUNO	N/A	N/A

FIRMAS		
NOMBRE	**ENTIDAD/CARGO**	**FIRMA**
Se adjunta listado de asistencia		

	ELABORÓ	**RESPONSABLE**	**APROBÓ**
NOMBRE	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Ángela M. Quiroga	T.S. Luz Escobar Ospina
CARGO	Residente Social	Residente Social	Residente Interventoría
FIRMA	Angela M. Quiroga	Angela M. Quiroga	Luz Escobar

ANEXOS:	**SI**	X	**NO**		**TIPO DE ANEXO:** Listados de firmas, esquema PMT y registro fotográfico	**CANTIDAD: 3**

3- 6

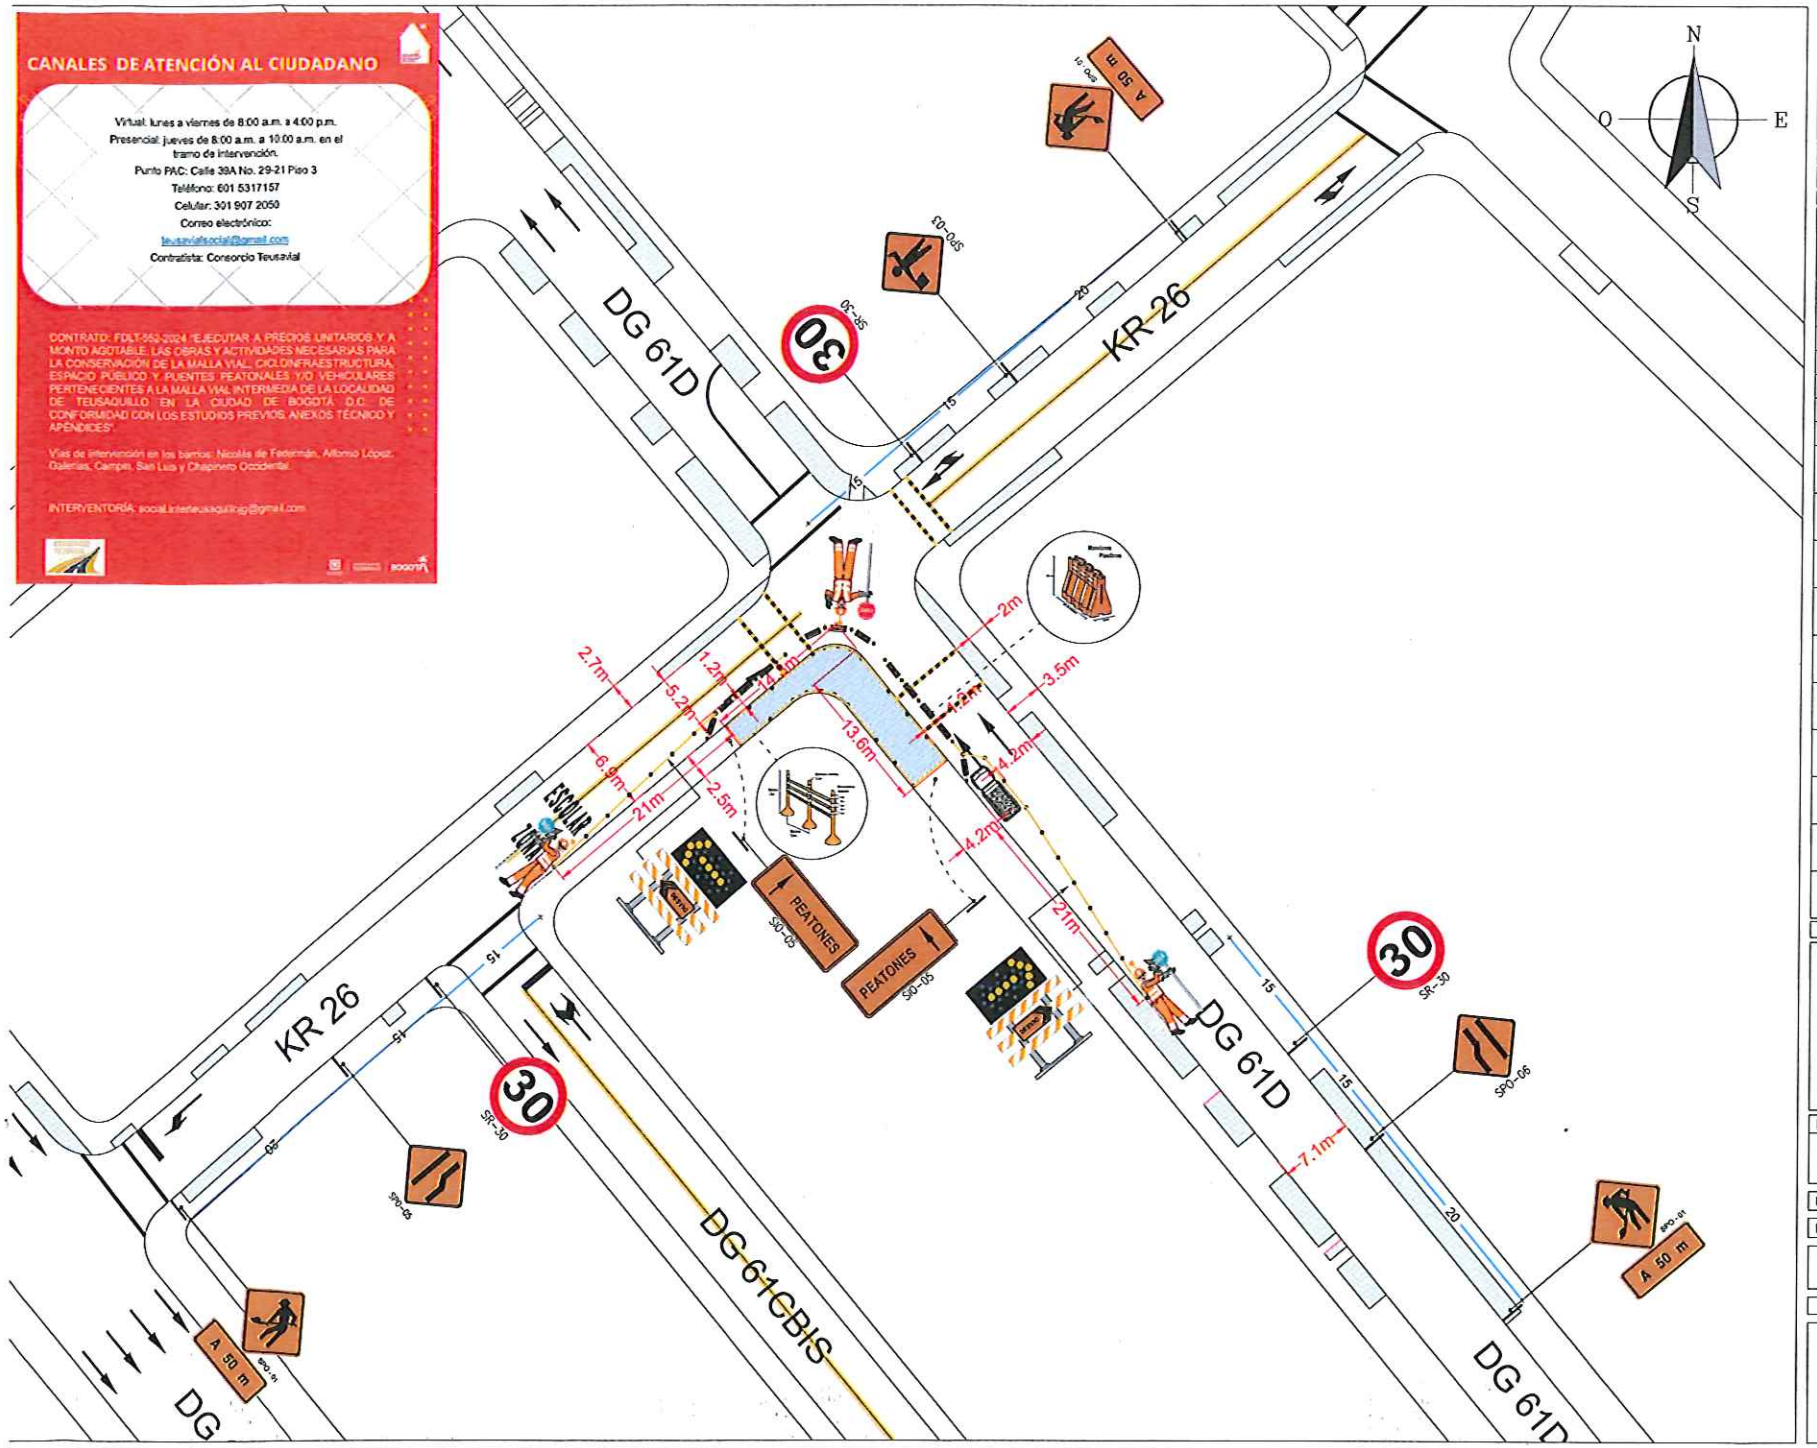
CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Virtual: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Presencial: jueves de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en el tramo de intervención.
Punto PAC: Calle 39A No. 29-21 Piso 3
Teléfono: 601 5317157
Celular: 301 907 2050
Correo electrónico:
teusavialsocial@gmail.com
Contratista: Consorcio Teusavial
CONTRATO: FDLT-052-2024 "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXOS TÉCNICO Y APÉNDICES".
Vías de intervención en los barrios: Nicolás de Federmán, Alfonso López, Galerías, Campin, San Luis y Chapinero Occidental.
INTERVENTORÍA: social.interteusaquillo@gmail.com
DG 61D
KR 26
KR 26
DG 61D
DG 61CBIS
DG 61D
DG
30
SR-30
SPO-05
SPO-06
SPO-01
A 50 m
SO-05
SO-06
PEATONES
ESCOLAR
2.7m
1.2m
5.2m
14.1m
13.6m
6.9m
21m
2.5m
2m
3.5m
4.2m
7.1m
20
15
N
O
E
S
CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN:
1. KR 26 ENTRE DG 61D Y 14.3m AL SUR
2. DG 61D ENTRE KR 26 Y 13.6m AL ORIENTE
CIV. 13000382 Y 13000447
COSTADO: ORIENTE / SUR
LOCALIDAD: TEUSAQUILLO
CONVENCIONES
UBICACIÓN
HORARIOS:
HORARIO: 07:00 - 17:00 HORAS
HORARIO CIERRE: 24 HORAS
ESCALA: N/A
REV: 0
FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2025
CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VÍA
PLANO 1 DE 1
CONSORCIO TEUSAVIAL

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Instituto Local de Tecnología

FECHA	DICIEMBRE 12 DE 2025	TEMA	SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA


LUGAR	DIAGONAL 61D CON CARRERA 26	BARRIO	CAMPIN	UPZ	GALERIAS	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	1032391814	Yessica Paola Díaz	38	COMUNIDAD					3006763361	Diag 61D # 24-65	CAMPIN	Jessipao2023@gmail.com	Información Bajo puerta
2	CC	— 11 —	— 11 —		COMUNIDAD					— 11 —	Dg 61D No. 24-57	CAMPIN	— 11 —	
3	CC	1019[illegible]345	Angie Linares	18	COMUNIDAD					3[illegible]	Cr 26 No. 61C.64	CAMPIN	— 11 —	Angie
4	CC	2335[illegible]802	Ana Bonilla		COMUNIDAD					No tiene	Cr 26 No. 61C.72	CAMPIN	— 11 —	Ana Bonilla
5	CC				COMUNIDAD							CAMPIN		
6	CC													
7	CC													
8	CC													
9	CC													
10	CC													
11	CC													
12	CC													
13	CC													
14	CC													
15	CC													

Sexo. M: Mujer / **H**: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht**: Heterosexual / **Bi**: Bisexual / **T**: Transexual/ **I**: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R**: Raizales / **A**: Afrodescendientes / **I**: Indígenas / **P**: Palenqueros(as)/**G**: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V**: Visual / **A**: Auditiva / **C**: Cognitiva / **MU**: Múltiple / **N**: Ninguna

Jud Escobar.
Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

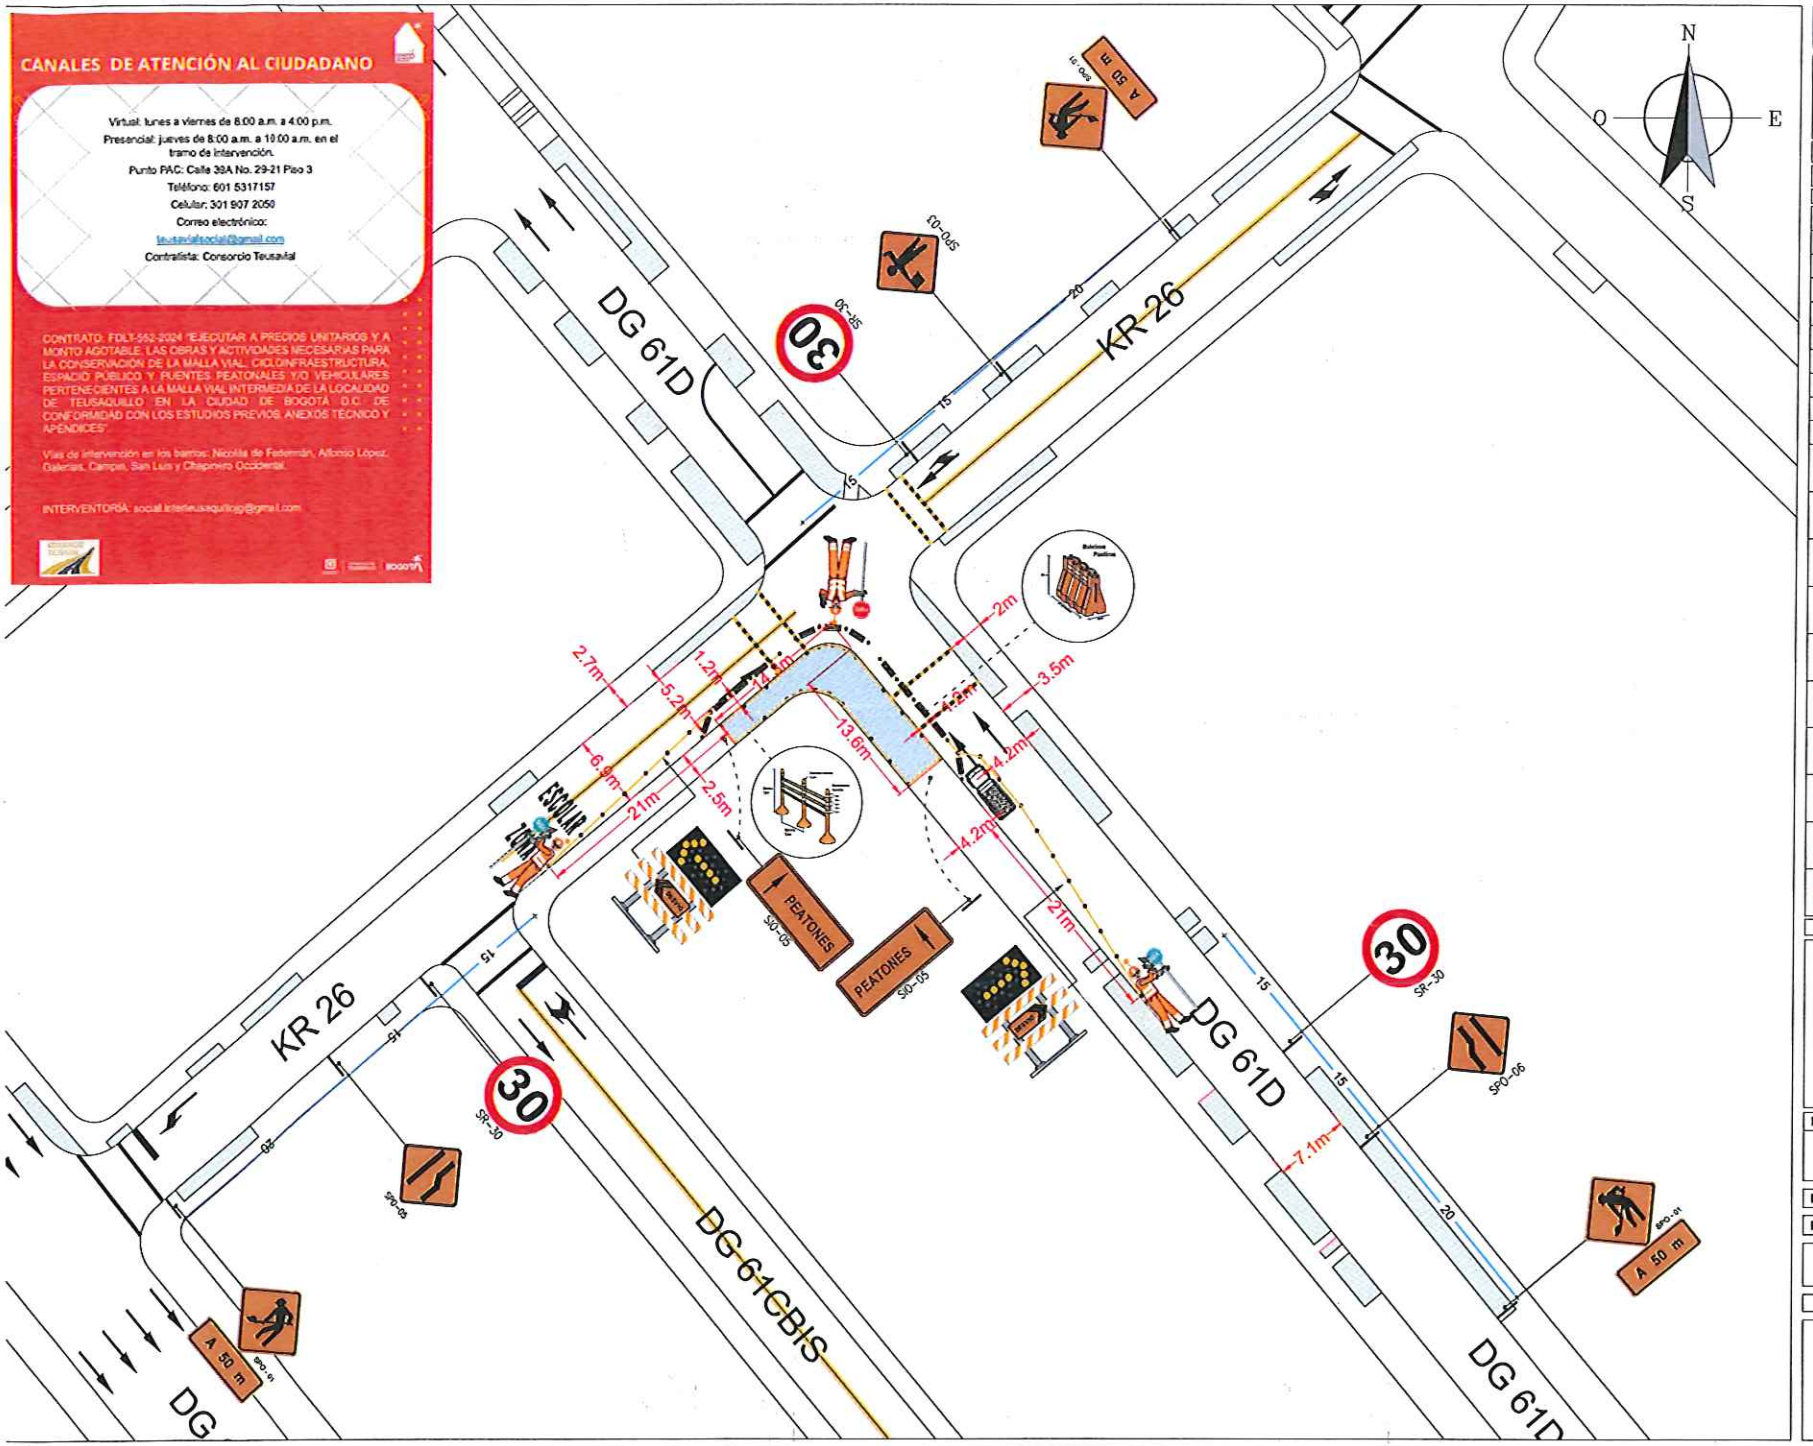

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
1. KR 26 ENTRE DG 61D Y 14.3m AL SUR
2. DG 61D ENTRE KR 26 Y 13.6m AL ORIENTE
CIV: 13000382 Y 13000447

COSTADO: ORIENTE / SUR

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO

CONVENCIONES

UBICACIÓN

HORARIOS:
HORARIO: 07:00 - 17:00 HORAS
HORARIO CIERRE: 24 HORAS

ESCALA: N/A | REV: 0

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2025

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VÍA

PLANO 1 DE 1

CONSORCIO TEUSAVIAL

CONSORCIO TEUSAVIAL	Contrato No. 552-2024 COP (120683)	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	12 de Diciembre de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 AL 4









Observacion: Socialización inicio de obra barrio Campin
PK ID 66683 y 67967

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Acta de Socialización del PMT	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F14	Versión 1.0

FECHA:	**2026/01/09 HORA: 10:00am**	**LUGAR:**	EDIFICIO PORTAL DE LA 55 KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS
CONTRATO No.	**FDLT - 552 - 2024**		
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES.		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**		
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**		
TEMA:	Socialización de PMT para cierre parcial de calzada en tramos no simultaneos para ejecutar las obras de ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial, ciclo infraestructura, espacio público, y puentes peatonales y/o vehiculares pertenecientes a la malla vial local e intermedia de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá D.C. de conformidad con los estudios previos, anexo técnico y apéndices.		
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**Auxiliar Social Sandra I. Perilla F.**		

Se realiza socialización del proyecto se realizará **Cierre total de calzada costado sur para realizar actividades de la conservación de la malla vial de la localidad de Teusaquillo y posicionamiento del vehículo de obra al interior del cerramiento.** contemplado en el Contrato No. **FDLT - 552 - 2024** el cual será ejecutado por el (la) contratista **CONSORCIO TEUSAVIAL** y supervisado por la interventoría **CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.** Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará afectación **cierre parcial** en **calzada**, para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación:

Manejo y desvíos de modos no motorizados (peatones y ciclistas)

I. **KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS**

ETAPA No. 1 Y 2_PLANO 1 Y 2 DE 2: Debido a que la intervención se realizara únicamente en la calzada, los andenes del entorno del proyecto no se verán afectados para el paso de peatones.

- **Accesos a predios:** No aplica, los andenes de la zona se dejarán habilitados para el ingreso de peatones a los predios existentes.

- **Paso en intersecciones:** Se garantizará el paso sobre intersecciones utilizado usualmente por los peatones de la zona con un ancho promedio de 1.2m.
- **Bici-carril, ciclorruta y/o ciclovía dominical:** No aplica.

Se implementará un cerramiento con delineadores tubulares y cintas, se ubicarán señales Informativas a 100m y 50m, Preventivas, Reglamentarias, para dar aviso oportuno a los conductores y peatones de la proximidad de la obra, además se contará con la ayuda de personal abanderado el cual coordinará la actividad descrita anteriormente. (Ver plano anexo).
Finalizado el horario de trabajo, se mantendrá el cerramiento las 24 horas, la señalización y cada uno de los manejos propuestos, hasta la culminación de las actividades. Posteriormente, la zona afectada se dejará en igual o mejores condiciones de lo encontrado.

Manejo y desvíos de transporte público

I. KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS

ETAPA No. 1 Y 2_PLANO 1 Y 2 DE 2: No aplica, teniendo en cuenta que sobre los corredores no circulan rutas de transporte público.

- **Paraderos SITP:** No aplica.
- **Desvíos:** No aplica.

Manejo y desvíos de tránsito particular

I. KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS

ETAPA No. 1_PLANO 1 DE 2: Los cierres propuestos se plantean realizar en el horario de 24 horas, donde se realizará el cierre parcial del costado occidental de la calzada garantizando en todo momento un carril de flujo sobre el corredor con un ancho mínimo de 3.4m.

- **Accesos a predios:** Se informará a los residentes de la zona que debido a las actividades a realizar al momento de requerir el acceso a los predios se realizará la implementación de plafones sobre los ingresos a los predios afectados incluyendo el acceso al Colegío Integral Ervid.
- **Desvíos:** No aplica.


ETAPA No. 2_PLANO 2 DE 2: Los cierres propuestos se plantean realizar en el horario de 24 horas, donde se realizará el cierre parcial del costado oriental de la calzada garantizando en todo momento un carril de flujo sobre el corredor con un ancho mínimo de 3.4m.


- **Accesos a predios:** Se informará a los residentes de la zona que debido a las actividades a realizar al momento de requerir el acceso a los predios se realizará la implementación de plafones sobre los ingresos a los predios afectados a los residentes del corredor de la CL 55 ENTRE AK 14 Y KR 15 se les indicará que se realizará el cierre de intersección, sin embargo, se realizará la implementación de plafones rígidos antideslizantes para el paso de vehículos por la zona.
- **Desvíos:** No aplica.

Se implementará un cerramiento con delineadores tubulares y cintas, se ubicarán señales Informativas a 100m y 50m, Preventivas, Reglamentarias, para dar aviso oportuno a los conductores y peatones de la proximidad de la obra, además se contará con la ayuda de personal abanderado el cual coordinará la actividad descrita anteriormente. (Ver plano anexo).

Finalizado el horario de trabajo, se mantendrá el cerramiento las 24 horas, la señalización y cada uno de los manejos propuestos, hasta la culminación de las actividades. Posteriormente, la zona afectada se dejará en igual o mejores condiciones de lo encontrado.

Esquema PMT

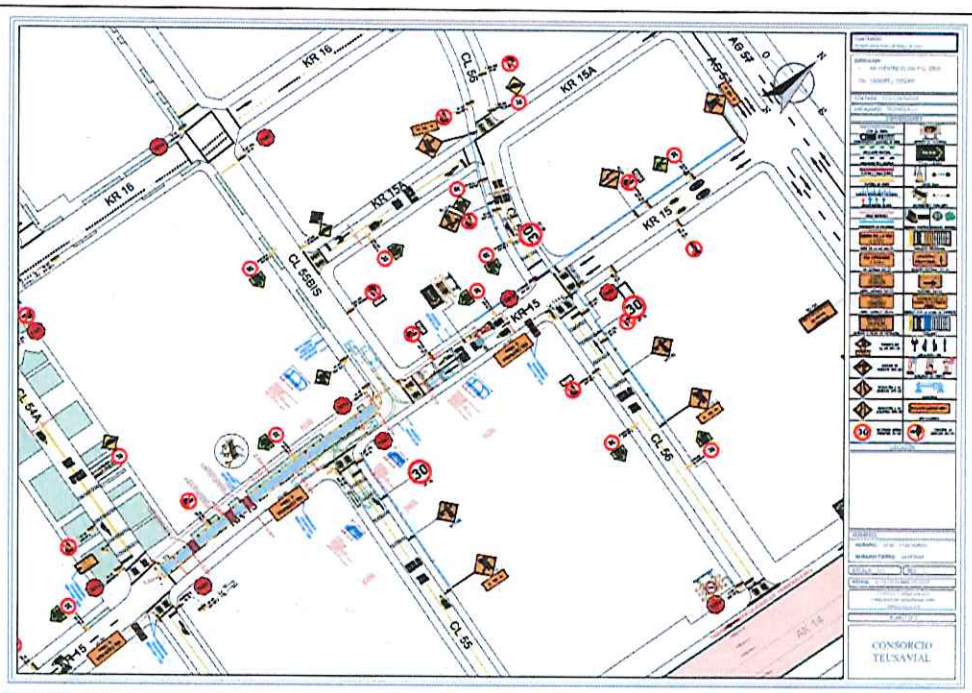
KR 16
CL 56
KR 15A
AC 57
KR 15
CL 56BIS
KR 15
CL 54A
CL 55
CONSORCIO TEUSAVIAL

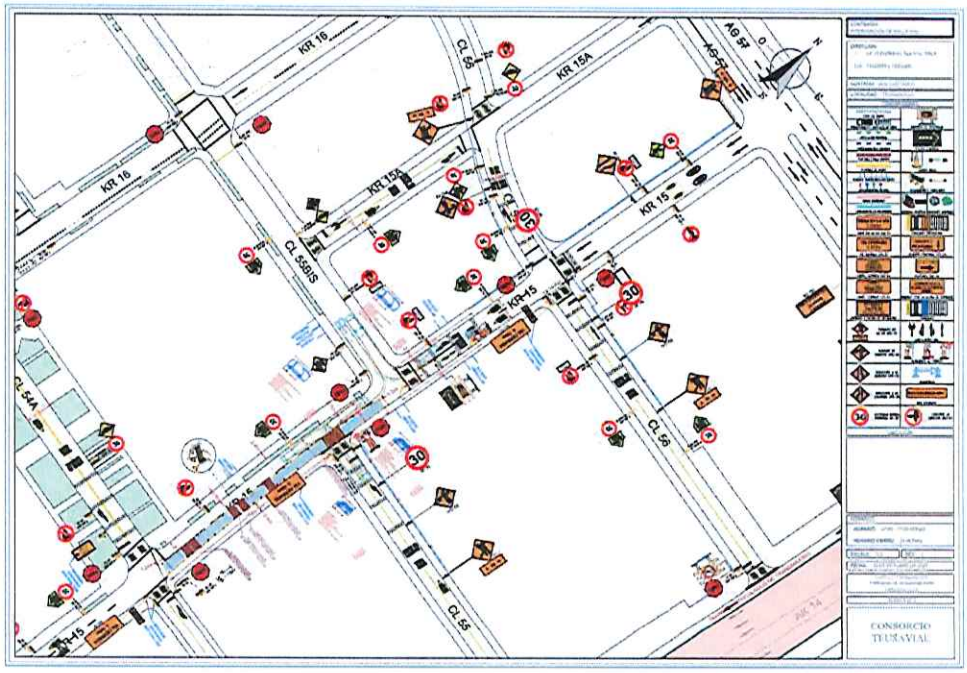
KR 16
CL 56
KR 15A
AC 57
KR 15
CL 56BIS
KR 15
CL 54A
CL 55
CONSORCIO TEUSAVIAL

Las actividades se realizarán de acuerdo con el avance de cada intervención en un tiempo máximo de veintiuno (21) días. La obra dará inicio el día 16 de enero de 2026 y se tiene previsto su finalización el día 06 de febrero de 2026.

I. **CL 55BIS ENTRE KR 15 Y KR 18**
II. **DG 54 ENTRE KR 16 Y KR 17**

Horario de trabajo: 22:00 – 05:00 HORAS y Horario de cierre: 22:00 – 05:00 HORAS.

III. **KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS**

Horario de trabajo: 07:00 – 17:00 HORAS y Horario de cierre: 24 HORAS.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Jorge Jaramillo	52328622	cll 55 #1447	3043616596	[illegible]	
2	Administradora					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FECHA:	**2026/01/09**	**HORA:**	**10:15am**	**LUGAR:**	Residentes y comerciantes KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS CL 55 ENTRE AK 14 Y KR 15
CONTRATO No.	**FDLT - 552 - 2024**				
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES.				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**				
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**				
TEMA:	Socialización de PMT para cierre parcial de calzada en tramos no simultaneos para ejecutar las obras de ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial, ciclo infraestructura, espacio público, y puentes peatonales y/o vehiculares pertenecientes a la malla vial local e intermedia de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá D.C. de conformidad con los estudios previos, anexo técnico y apéndices.				
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	Auxiliar Social Sandra I. Perilla F.				

Se realiza socialización del proyecto se realizará **Cierre total de calzada costado sur para realizar actividades de la conservación de la malla vial de la localidad de Teusaquillo y posicionamiento del vehículo de obra al interior del cerramiento.** contemplado en el Contrato No. **FDLT - 552 - 2024** el cual será ejecutado por el (la) contratista **CONSORCIO TEUSAVIAL** y supervisado por la interventoría **CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.** Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará afectación **cierre parcial** en **calzada**, para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación:

Manejo y desvíos de modos no motorizados (peatones y ciclistas)

I. KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS

ETAPA No. 1 Y 2_PLANO 1 Y 2 DE 2: Debido a que la intervención se realizara únicamente en la calzada, los andenes del entorno del proyecto no se verán afectados para el paso de peatones.

- **Accesos a predios:** No aplica, los andenes de la zona se dejarán habilitados para el ingreso de peatones a los predios existentes.

- **Paso en intersecciones:** Se garantizará el paso sobre intersecciones utilizado usualmente por los peatones de la zona con un ancho promedio de 1.2m.
- **Bici-carril, ciclorruta y/o ciclovía dominical:** No aplica.

Se implementará un cerramiento con delineadores tubulares y cintas, se ubicarán señales Informativas a 100m y 50m, Preventivas, Reglamentarias, para dar aviso oportuno a los conductores y peatones de la proximidad de la obra, además se contará con la ayuda de personal abanderado el cual coordinará la actividad descrita anteriormente. (Ver plano anexo).
Finalizado el horario de trabajo, se mantendrá el cerramiento las 24 horas, la señalización y cada uno de los manejos propuestos, hasta la culminación de las actividades. Posteriormente, la zona afectada se dejará en igual o mejores condiciones de lo encontrado.

Manejo y desvíos de transporte público

I. KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS

ETAPA No. 1 Y 2_PLANO 1 Y 2 DE 2: No aplica, teniendo en cuenta que sobre los corredores no circulan rutas de transporte público.

- **Paraderos SITP:** No aplica.
- **Desvíos:** No aplica.

Manejo y desvíos de tránsito particular

I. KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS

ETAPA No. 1_PLANO 1 DE 2: Los cierres propuestos se plantean realizar en el horario de 24 horas, donde se realizará el cierre parcial del costado occidental de la calzada garantizando en todo momento un carril de flujo sobre el corredor con un ancho mínimo de 3.4m.

- **Accesos a predios:** Se informará a los residentes de la zona que debido a las actividades a realizar al momento de requerir el acceso a los predios se realizará la implementación de plafones sobre los ingresos a los predios afectados incluyendo el acceso al Colegío Integral Ervid.
- **Desvíos:** No aplica.


ETAPA No. 2_PLANO 2 DE 2: Los cierres propuestos se plantean realizar en el horario de 24 horas, donde se realizará el cierre parcial del costado oriental de la calzada garantizando en todo momento un carril de flujo sobre el corredor con un ancho mínimo de 3.4m.


- **Accesos a predios:** Se informará a los residentes de la zona que debido a las actividades a realizar al momento de requerir el acceso a los predios se realizará la implementación de plafones sobre los ingresos a los predios afectados a los residentes del corredor de la CL 55 ENTRE AK 14 Y KR 15 se les indicará que se realizará el cierre de intersección, sin embargo, se realizará la implementación de plafones rígidos antideslizantes para el paso de vehículos por la zona.
- **Desvíos:** No aplica.

Se implementará un cerramiento con delineadores tubulares y cintas, se ubicarán señales Informativas a 100m y 50m, Preventivas, Reglamentarias, para dar aviso oportuno a los conductores y peatones de la proximidad de la obra, además se contará con la ayuda de personal abanderado el cual coordinará la actividad descrita anteriormente. (Ver plano anexo).

Finalizado el horario de trabajo, se mantendrá el cerramiento las 24 horas, la señalización y cada uno de los manejos propuestos, hasta la culminación de las actividades. Posteriormente, la zona afectada se dejará en igual o mejores condiciones de lo encontrado.

Esquema PMT

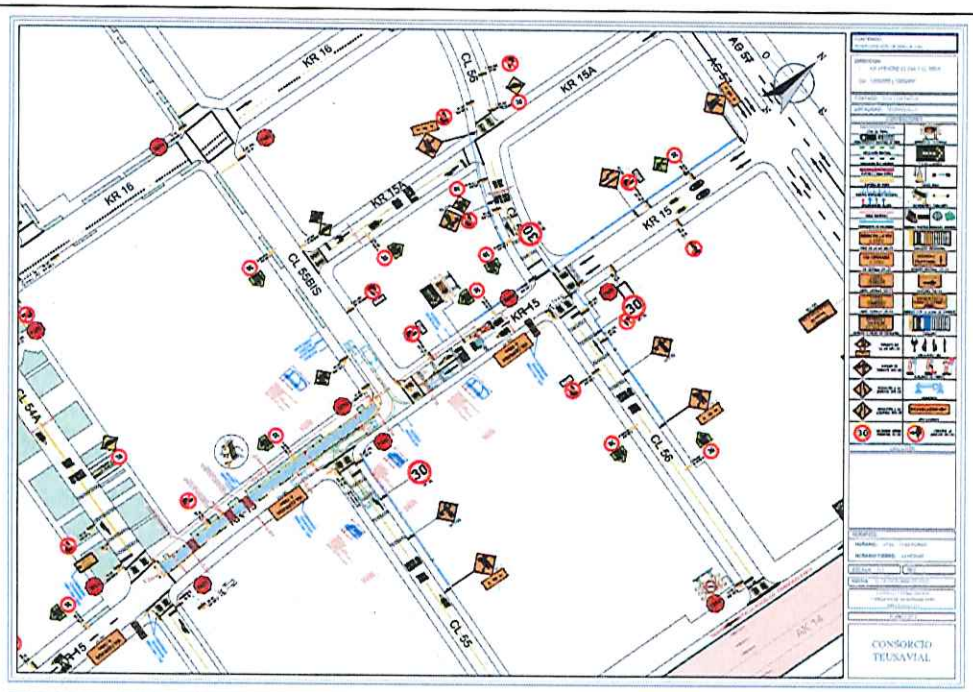
KR 16
CL 55
KR 15A
AK 57
KR 15
CL 55BIS
KR 15
CL 54A
CL 56
CL 55
CONSORCIO TEUSAVIAL

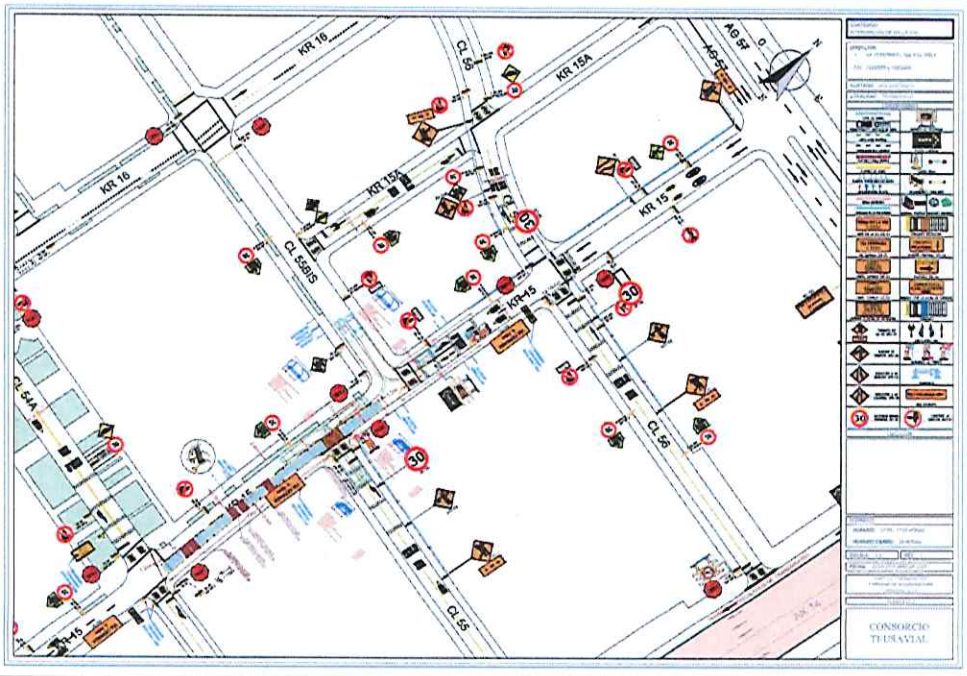
KR 16
CL 55
KR 15A
AK 57
KR 15
CL 55BIS
KR 15
CL 54A
CL 56
CL 55
CONSORCIO TEUSAVIAL

Las actividades se realizarán de acuerdo con el avance de cada intervención en un tiempo máximo de veintiuno (21) días. La obra dará inicio el día 16 de enero de 2026 y se tiene previsto su finalización el día 06 de febrero de 2026.

I. **CL 55BIS ENTRE KR 15 Y KR 18**
II. **DG 54 ENTRE KR 16 Y KR 17**

Horario de trabajo: 22:00 – 05:00 HORAS y Horario de cierre: 22:00 – 05:00 HORAS.

III. **KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS**

Horario de trabajo: 07:00 – 17:00 HORAS y Horario de cierre: 24 HORAS.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Jessica Gorunto Empleada	1033758256	Cll 55 No. 14-83	3005221016 3176386999	gerencia@humanossa.com	Jessica G.
2	Germán Muñoz propietario	91010386	Cll 55 No. 14-61	310263 5947	—11—	
3	Alberto Fajardo Residente	80'729.765	Cll 55 No. 14-12	305309 2277	—11—	
4	Pedro Melgarejo propietario	80363124	Cll 55 No 14-40	315834 7841	—11—	
5	Flor Avendaño Arrendataria	23560845	Cll 55 No 14-60	317342 6413	—11—	
6	Andreina Camargo Empleada	1090425201	Cll 55 No. 14-76	321985 4065	—11—	
7	Carlos Ramos Arrendatario	19'694046	Calle 55 No. 14-85	321972 5337	—11—	
8	Sandra Jimenez propietaria	1032 3822 14	Cll 55 No 14-14 Sb/ Sandix	321453 8755	dixsondra 92@gmail.com	
9	Hermes José Rodriguez Empleado	25726081	Cll 55 No. 14-66 Distribuidora Ligel	311493 3896	—11—	Hermes.
10	Jose Marquez Propietario	79'048917	Cr. 15 No 54A-04	316336 0920	—11—	
11	Julian Espejo Arrendatario	No Suministro	Cr 15 No. 54A-30	No Suministro	—11—	Julian Espejo
12	Gabriel Silva propietario	19'328731	Cr 15 No. 54A-42	320232 1974	—11—	
13	Mery Reyes propietaria	41'558.125	Cr 15 No 55-01	311873 1365	—11—	
14	Alexandra Giraldo Encargada	39'851584	Cr 15 No. 54A-29	301340 9361	—11—	A. G.
15	José Humberto Carmona (Caseta)	4'577.488	Caseta Cll 54A-Cr 15	313853 4271	—11—	Jose H C.

16	Juan Chaves propietario	7a1143448	cr 15 No. 54-50	No Suministrado	—11—	
17	Dany Rojas propietario	52370598	cr 15 No 55.12	316526 0000	—11—	
18	Nelson Londoño Dulce Romero (Adm)	1096034122	cr 15 No 54-55	313310 8049	—11—	
19						
20						
21						

FECHA:	**2026/01/09**	**HORA:**	**10:30am**	**LUGAR:**	KUANA CAFÉ KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS
CONTRATO No.	**FDLT - 552 - 2024**				
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES.				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**				
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**				
TEMA:	Socialización de PMT para cierre parcial de calzada en tramos no simultaneos para ejecutar las obras de ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial, ciclo infraestructura, espacio público, y puentes peatonales y/o vehiculares pertenecientes a la malla vial local e intermedia de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá D.C. de conformidad con los estudios previos, anexo técnico y apéndices.				
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**Auxiliar Social Sandra I. Perilla F.**				

Se realiza socialización del proyecto se realizará **Cierre total de calzada costado sur para realizar actividades de la conservación de la malla vial de la localidad de Teusaquillo y posicionamiento del vehículo de obra al interior del cerramiento.** contemplado en el Contrato No. **FDLT - 552 - 2024** el cual será ejecutado por el (la) contratista **CONSORCIO TEUSAVIAL** y supervisado por la interventoría **CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.** Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará afectación **cierre parcial** en **calzada**, para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación:

Manejo y desvíos de modos no motorizados (peatones y ciclistas)

I. KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS

ETAPA No. 1 Y 2_PLANO 1 Y 2 DE 2: Debido a que la intervención se realizara únicamente en la calzada, los andenes del entorno del proyecto no se verán afectados para el paso de peatones.

- **Accesos a predios:** No aplica, los andenes de la zona se dejarán habilitados para el ingreso de peatones a los predios existentes.

- **Paso en intersecciones:** Se garantizará el paso sobre intersecciones utilizado usualmente por los peatones de la zona con un ancho promedio de 1.2m.
- **Bici-carril, ciclorruta y/o ciclovía dominical:** No aplica.

Se implementará un cerramiento con delineadores tubulares y cintas, se ubicarán señales Informativas a 100m y 50m, Preventivas, Reglamentarias, para dar aviso oportuno a los conductores y peatones de la proximidad de la obra, además se contará con la ayuda de personal abanderado el cual coordinará la actividad descrita anteriormente. (Ver plano anexo).
Finalizado el horario de trabajo, se mantendrá el cerramiento las 24 horas, la señalización y cada uno de los manejos propuestos, hasta la culminación de las actividades. Posteriormente, la zona afectada se dejará en igual o mejores condiciones de lo encontrado.

Manejo y desvíos de transporte público

I. KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS

ETAPA No. 1 Y 2_PLANO 1 Y 2 DE 2: No aplica, teniendo en cuenta que sobre los corredores no circulan rutas de transporte público.

- **Paraderos SITP:** No aplica.
- **Desvíos:** No aplica.

Manejo y desvíos de tránsito particular

I. KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS

ETAPA No. 1_PLANO 1 DE 2: Los cierres propuestos se plantean realizar en el horario de 24 horas, donde se realizará el cierre parcial del costado occidental de la calzada garantizando en todo momento un carril de flujo sobre el corredor con un ancho mínimo de 3.4m.

- **Accesos a predios:** Se informará a los residentes de la zona que debido a las actividades a realizar al momento de requerir el acceso a los predios se realizará la implementación de plafones sobre los ingresos a los predios afectados incluyendo el acceso al Colegio Integral Ervid.
- **Desvíos:** No aplica.


ETAPA No. 2_PLANO 2 DE 2: Los cierres propuestos se plantean realizar en el horario de 24 horas, donde se realizará el cierre parcial del costado oriental de la calzada garantizando en todo momento un carril de flujo sobre el corredor con un ancho mínimo de 3.4m.


- **Accesos a predios:** Se informará a los residentes de la zona que debido a las actividades a realizar al momento de requerir el acceso a los predios se realizará la implementación de plafones sobre los ingresos a los predios afectados a los residentes del corredor de la CL 55 ENTRE AK 14 Y KR 15 se les indicará que se realizará el cierre de intersección, sin embargo, se realizará la implementación de plafones rígidos antideslizantes para el paso de vehículos por la zona.
- **Desvíos:** No aplica.

Se implementará un cerramiento con delineadores tubulares y cintas, se ubicarán señales Informativas a 100m y 50m, Preventivas, Reglamentarias, para dar aviso oportuno a los conductores y peatones de la proximidad de la obra, además se contará con la ayuda de personal abanderado el cual coordinará la actividad descrita anteriormente. (Ver plano anexo).

Finalizado el horario de trabajo, se mantendrá el cerramiento las 24 horas, la señalización y cada uno de los manejos propuestos, hasta la culminación de las actividades. Posteriormente, la zona afectada se dejará en igual o mejores condiciones de lo encontrado.

Esquema PMT

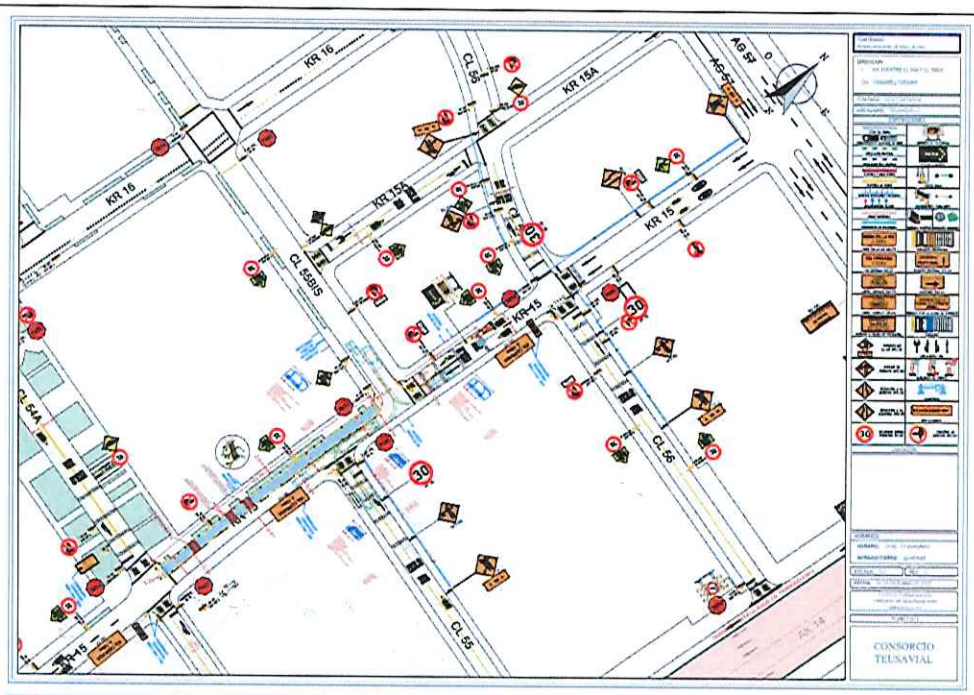
KR 16
CL 55
KR 15A
AC 57
KR 15
CL 55BIS
KR 15
CL 54A
CL 56
CL 55
CONSORCIO TEUSAVIAL

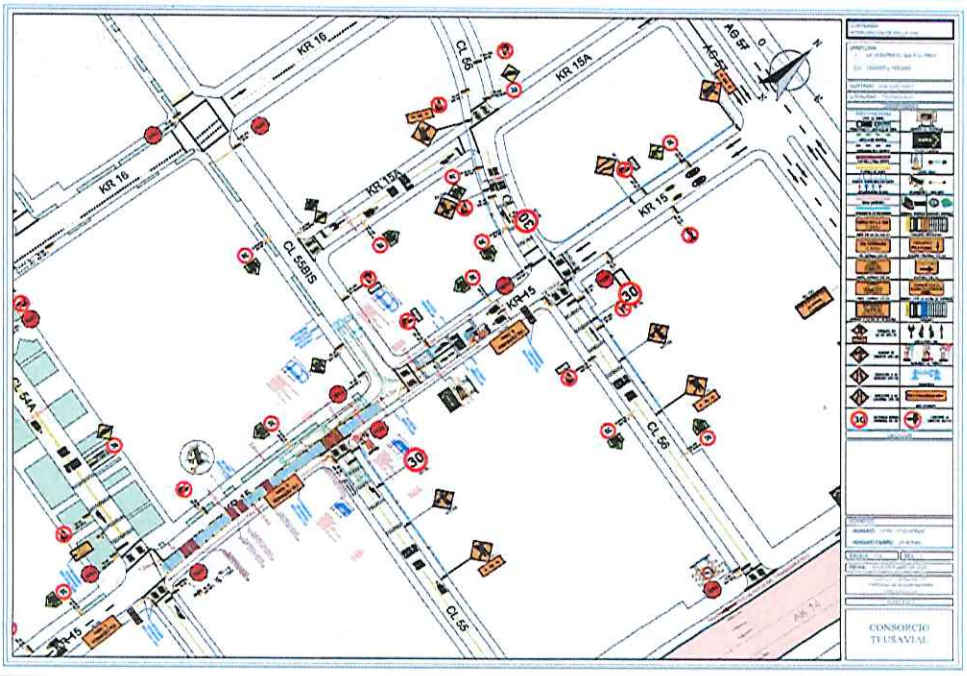
KR 16
CL 55
KR 15A
AC 57
KR 15
CL 55BIS
KR 15
CL 54A
CL 56
CL 55
CONSORCIO TEUSAVIAL

Las actividades se realizarán de acuerdo con el avance de cada intervención en un tiempo máximo de veintiuno (21) días. La obra dará inicio el día 16 de enero de 2026 y se tiene previsto su finalización el día 06 de febrero de 2026.

I. **CL 55BIS ENTRE KR 15 Y KR 18**
II. **DG 54 ENTRE KR 16 Y KR 17**

Horario de trabajo: 22:00 – 05:00 HORAS y Horario de cierre: 22:00 – 05:00 HORAS.

III. **KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS**

Horario de trabajo: 07:00 – 17:00 HORAS y Horario de cierre: 24 HORAS.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Andrés Rincón Baruta	1020835 263	Cr 15 No 54A-28	312349 2108	kuana Colombia @gmail. com	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FECHA:	**2026/01/09 HORA: 10:40am**	**LUGAR:**	COLEGIO INTEGRAL ERVID KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS
CONTRATO No.	**FDLT - 552 - 2024**		
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES.		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TEUSAVIAL**		
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**		
TEMA:	Socialización de PMT para cierre parcial de calzada en tramos no simultaneos para ejecutar las obras de ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial, ciclo infraestructura, espacio público, y puentes peatonales y/o vehiculares pertenecientes a la malla vial local e intermedia de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá D.C. de conformidad con los estudios previos, anexo técnico y apéndices.		
PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN:	**Auxiliar Social Sandra I. Perilla F.**		

Se realiza socialización del proyecto se realizará **Cierre total de calzada costado sur para realizar actividades de la conservación de la malla vial de la localidad de Teusaquillo y posicionamiento del vehículo de obra al interior del cerramiento.** contemplado en el Contrato No. **FDLT - 552 - 2024** el cual será ejecutado por el (la) contratista **CONSORCIO TEUSAVIAL** y supervisado por la interventoría **CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG.** Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará afectación **cierre parcial** en **calzada**, para lo cual se plantea como alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) descrito a continuación:

Manejo y desvíos de modos no motorizados (peatones y ciclistas)

I. KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS

ETAPA No. 1 Y 2_PLANO 1 Y 2 DE 2: Debido a que la intervención se realizara únicamente en la calzada, los andenes del entorno del proyecto no se verán afectados para el paso de peatones.

- **Accesos a predios:** No aplica, los andenes de la zona se dejarán habilitados para el ingreso de peatones a los predios existentes.

- **Paso en intersecciones:** Se garantizará el paso sobre intersecciones utilizado usualmente por los peatones de la zona con un ancho promedio de 1.2m.
- **Bici-carril, ciclorruta y/o ciclovía dominical:** No aplica.

Se implementará un cerramiento con delineadores tubulares y cintas, se ubicarán señales Informativas a 100m y 50m, Preventivas, Reglamentarias, para dar aviso oportuno a los conductores y peatones de la proximidad de la obra, además se contará con la ayuda de personal abanderado el cual coordinará la actividad descrita anteriormente. (Ver plano anexo).
Finalizado el horario de trabajo, se mantendrá el cerramiento las 24 horas, la señalización y cada uno de los manejos propuestos, hasta la culminación de las actividades. Posteriormente, la zona afectada se dejará en igual o mejores condiciones de lo encontrado.

Manejo y desvíos de transporte público

I. KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS

ETAPA No. 1 Y 2_PLANO 1 Y 2 DE 2: No aplica, teniendo en cuenta que sobre los corredores no circulan rutas de transporte público.

- **Paraderos SITP:** No aplica.
- **Desvíos:** No aplica.

Manejo y desvíos de tránsito particular

I. KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS

ETAPA No. 1_PLANO 1 DE 2: Los cierres propuestos se plantean realizar en el horario de 24 horas, donde se realizará el cierre parcial del costado occidental de la calzada garantizando en todo momento un carril de flujo sobre el corredor con un ancho mínimo de 3.4m.

- **Accesos a predios:** Se informará a los residentes de la zona que debido a las actividades a realizar al momento de requerir el acceso a los predios se realizará la implementación de plafones sobre los ingresos a los predios afectados incluyendo el acceso al Colegio Integral Ervid.
- **Desvíos:** No aplica.


ETAPA No. 2_PLANO 2 DE 2: Los cierres propuestos se plantean realizar en el horario de 24 horas, donde se realizará el cierre parcial del costado oriental de la calzada garantizando en todo momento un carril de flujo sobre el corredor con un ancho mínimo de 3.4m.


- **Accesos a predios:** Se informará a los residentes de la zona que debido a las actividades a realizar al momento de requerir el acceso a los predios se realizará la implementación de plafones sobre los ingresos a los predios afectados a los residentes del corredor de la CL 55 ENTRE AK 14 Y KR 15 se les indicará que se realizará el cierre de intersección, sin embargo, se realizará la implementación de plafones rígidos antideslizantes para el paso de vehículos por la zona.
- **Desvíos:** No aplica.

Se implementará un cerramiento con delineadores tubulares y cintas, se ubicarán señales Informativas a 100m y 50m, Preventivas, Reglamentarias, para dar aviso oportuno a los conductores y peatones de la proximidad de la obra, además se contará con la ayuda de personal abanderado el cual coordinará la actividad descrita anteriormente. (Ver plano anexo).

Finalizado el horario de trabajo, se mantendrá el cerramiento las 24 horas, la señalización y cada uno de los manejos propuestos, hasta la culminación de las actividades. Posteriormente, la zona afectada se dejará en igual o mejores condiciones de lo encontrado.

Esquema PMT

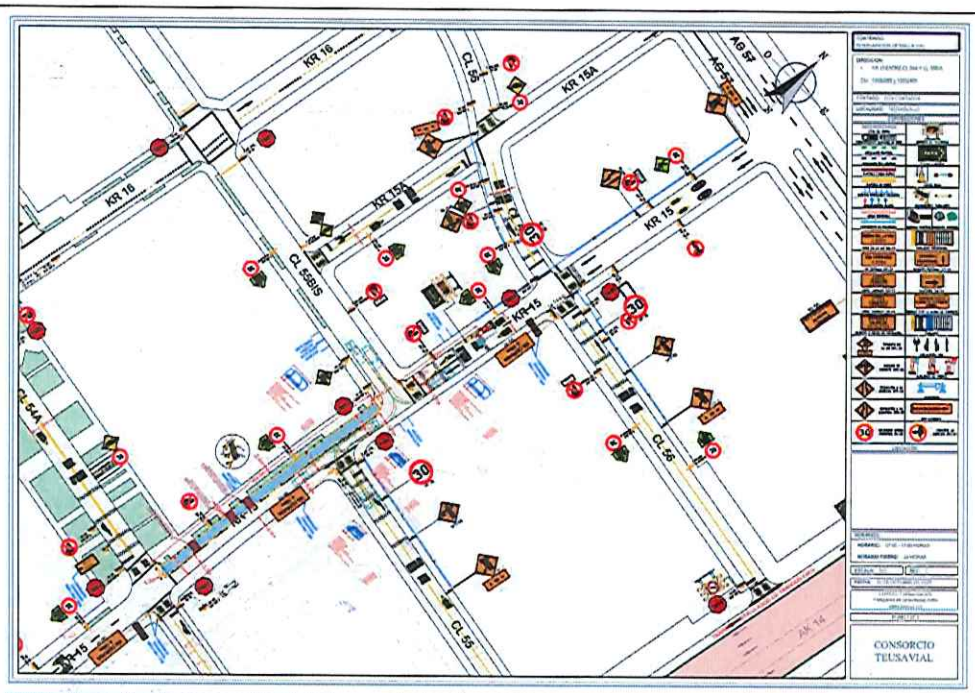
KR 16
CL 56
KR 15A
AG 5F
KR 15
CL 55BIS
KR 15
CL 54A
CL 55
CONSORCIO
TEUSAVIAL

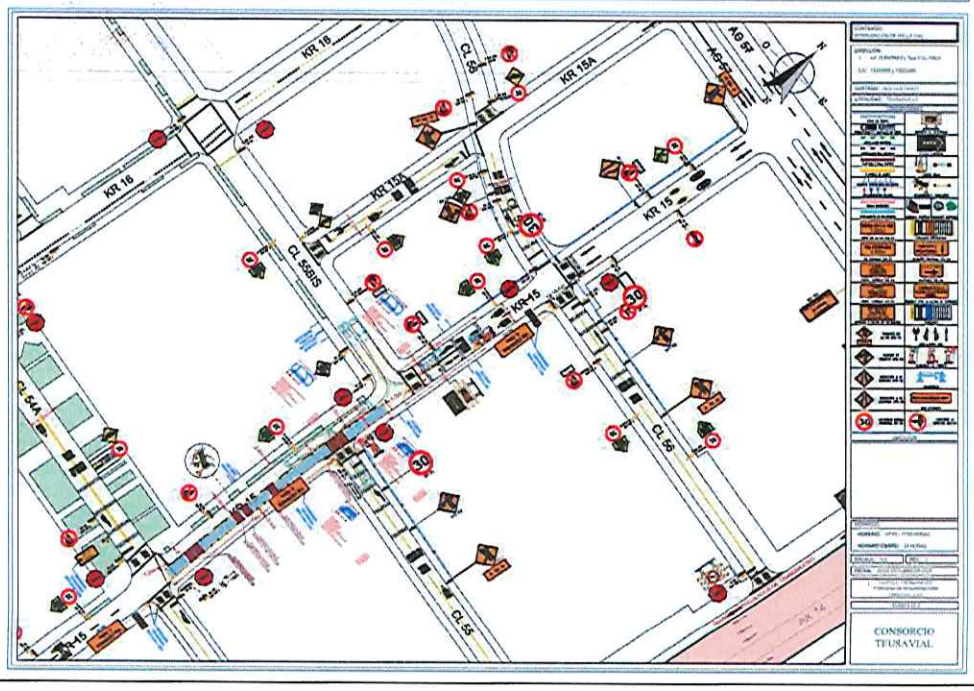
KR 16
CL 56
KR 15A
AG 5F
KR 15
CL 55BIS
KR 15
CL 54A
CL 55
CONSORCIO
TEUSAVIAL

Las actividades se realizarán de acuerdo con el avance de cada intervención en un tiempo máximo de veintiuno (21) días. La obra dará inicio el día 16 de enero de 2026 y se tiene previsto su finalización el día 06 de febrero de 2026.

I. **CL 55BIS ENTRE KR 15 Y KR 18**

II. **DG 54 ENTRE KR 16 Y KR 17**

Horario de trabajo: 22:00 – 05:00 HORAS y Horario de cierre: 22:00 – 05:00 HORAS.

III. **KR 15 ENTRE CL 54A Y CL 55BIS**

Horario de trabajo: 07:00 – 17:00 HORAS y Horario de cierre: 24 HORAS.

La presente socialización se realiza a los abajo firmantes:


No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Blanca Echeverría Rectora	41.494.632	Cr 15 No. 54A-29	301340 9361	cd. ernesto vidal@	
2					hotmail. com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	09 de enero de 2026

FOTOGRAFÍAS 1 AL 4

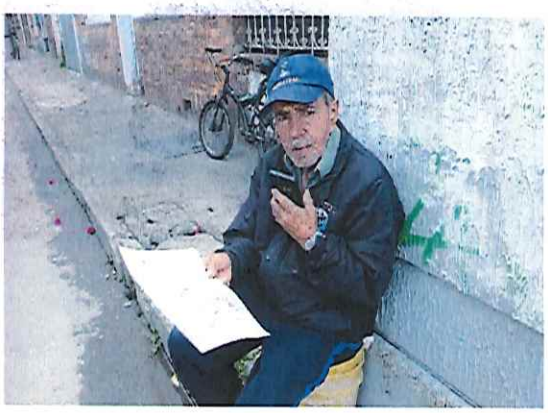







Observacion: Recorrido y actualización Plan de Manejo de Transito PMT
Barrio Chapinero Occidental CIV´S 13000985 -13002468

Anexo 3
PSIS vigentes en el periodo

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
12	12	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: NEGOCIO
DIRECCIÓN: CARRERA 27 No. 50-77
TELÉFONO: 3204956793
PERSONA CONTACTO: AMIR VERGEL
TRAMO: CIV 13001165 TRAMO 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☐	
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de Información con afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad, por pendiente de reunión de finalización.

CIV 13001165
Barrio: Alfonso López

6. FIRMAS

Amir Vergel
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela M. Quiroga
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

Luz Escobar
T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
29	01	2026

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: NEGOCIO
DIRECCIÓN: CARRERA 27 No. 50-77
TELÉFONO: 3204956793
PERSONA CONTACTO: AMIR VERGEL
TRAMO: CIV 13001165 TRAMO 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☒	
VOLANTE	☐	
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☒

5. OBSERVACIONES

Se desinstala punto satélite de información por terminación del tramo vial.

CIV 13001165
Barrio: Alfonso López

6. FIRMAS

Amir Vergel
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela M. Quiroga
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

Luz Escobar
T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
10	12	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: PARQUEADERO RB
DIRECCIÓN: CARRERA 20 No. 57-55
TELÉFONO: 3150599989
PERSONA CONTACTO: JOSE MANUEL BELTRAN
TRAMO: CIV 13000744 TRAMO 2

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	1
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de Información con volante de canales de atención y afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad de las actividades a realizar y de avance de la obra.

CIV 13000744
Barrio: San Luis Tramo 2

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela Maria Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
15	01	2026

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: PARQUEADERO RB
DIRECCIÓN: CARRERA 20 No. 57-55
TELÉFONO: 3150599989
PERSONA CONTACTO: JOSE MANJEL BELTRAN
TRAMO: CIV 13000744

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	3
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de Información con volante No. 47 cierre de actas de vecindad,plegable 28 de sostenibilidad de la vía, canales de atención y afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad de las actividades realizadas y de avance de la obra.

CIV 13000744
Barrio: San Luis tramo 2

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
05	02	2026

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: PARQUEADERO RB
DIRECCIÓN: CARRERA 20 No. 57-55
TELÉFONO: 3150599989
PERSONA CONTACTO: JOSE MANJEL BELTRAN
TRAMO: CIV 13000744

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☐	
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☒

5. OBSERVACIONES

Se desinstala punto satélite de información por terminación del tramo vial.

CIV 13000744
Barrio: San Luis tramo 2

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
04	19	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: EDIFICIO VILLA VENETTO PH
DIRECCIÓN: AC 26 No. 44A-29
TELÉFONO: 6014793351
PERSONA CONTACTO: ANA CECILIA AYALA
TRAMO: CIV 13001365 TRAMO 1

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☐	
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☒

5. OBSERVACIONES

Se desinstala punto satélite de información por parte de la comunidad por terminación del tramo vial.

CIV 13001365
Barrio: Quinta Paredes Tramo 1

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
12	12	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMUNIDAD
DIRECCIÓN: CARRERA 26 No. 61C-72
TELÉFONO: 3136341347
PERSONA CONTACTO: ALEJANDRO ALMENTERO
TRAMO: PK 66683 - 67967

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	3
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL? _____

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de información en predio para mantener informada a la comunidad sobre las generalidades del contrato, para la intervención del espacio público (andén)

PK 66683 - 67967
Barrio: Campin

6. FIRMAS

Alejandro Almentero	Angela M. Quiroga G	Luz Escobar
Nombres y apellidos	T.S. Angela María Quiroga G	T.S. Luz Escobar Ospina
Propietario /o quien autoriza el punto satélite	Residente Social del Contratista o Consultor	Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
15	01	2026

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMUNIDAD
DIRECCIÓN: CARRERA 26 No. 61C-72
TELÉFONO: 3136341347
PERSONA CONTACTO: ALEJANDRO ALMENTERO
TRAMO: PK 66683 - 67967

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	2
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☒
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de información en predio con afiche y canales de atención, para mantener informada a la comunidad sobre las generalidades del contrato, para la intervención del espacio público (andén)

PK 66683 - 67967
Barrio: Campin

6. FIRMAS

Alejandro Almentero	Angela Mª Quiroga	Luz Escobar
Nombres y apellidos	T.S. Angela María Quiroga G	T.S. Luz Escobar Ospina
Propietario /o quien autoriza el punto satélite	Residente Social del Contratista o Consultor	Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
06	02	2026

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMUNIDAD
DIRECCIÓN: CARRERA 26 No. 61C-72
TELÉFONO: 3136341347
PERSONA CONTACTO: ALEJANDRO ALMENTERO
TRAMO: PK 66683 - 67967

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☐	
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☒

5. OBSERVACIONES

Desinstalación PSI por terminación de intervención de espacio público

PK 66683 - 67967
Barrio: Campin

6. FIRMAS

Alejandro Almentero
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela María Quiroga
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

Luz Escobar
T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
10	12	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Montana Conjunto Residencial
DIRECCIÓN: CALLE 59 No.58-17
TELÉFONO: 3203301408
PERSONA CONTACTO: ANA ROMERO
TRAMO: CIV 13000077

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	1
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza punto satélite de información en predio con afiche, volante de canales de atención, plano de PMT, para mantener informada a la comunidad sobre las generalidades del contrato, durante la intervención de la vía.

CIV 13000077
Barrio: Pablo VI

6. FIRMAS

Ana Romero
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela M. Quiroga
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

Luz Escobar
T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
14	01	2026

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Montana Conjunto Residencial
DIRECCIÓN: CALLE 59 No.58-17
TELÉFONO: 3203301408
PERSONA CONTACTO: ANA ROMERO
TRAMO: CIV 13000077

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	1
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza punto satélite de información en predio con afiche, volante de canales de atención, plano de PMT, para mantener informada a la comunidad sobre las generalidades del contrato, durante la intervención de la vía.

CIV 13000077
Barrio: Pablo VI

6. FIRMAS

Ana Romero
Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Angela María Quiroga
T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

Luz Escobar
T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
03	02	2026

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Montana Conjunto Residencial
DIRECCIÓN: CALLE 59 No.58-17
TELÉFONO: 3203301408
PERSONA CONTACTO: ANA ROMERO
TRAMO: CIV 13000077

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☐	
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☒

5. OBSERVACIONES

Se desinstala punto satélite de información por terminación del tramo vial.

CIV 13000077
Barrio: Pablo VI

6. FIRMAS

Ana Romero	Angela Ma Quiroga	Luz Escobar
Nombres y apellidos	T.S. Angela María Quiroga G	T.S. Luz Escobar Ospina
Propietario /o quien autoriza el punto satélite	Residente Social del Contratista o Consultor	Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
10	12	2025

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Colegio Integral Ervid
DIRECCIÓN: CARRERA 15 No. 54A-29
TELÉFONO: 3013409301
PERSONA CONTACTO: ANA LUISA DELGADO
TRAMO: CIV´S 130000985 13002468 TRAMO 2

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	2
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de Información con volante convocatoria a reunión de inicio, volante de canales de atención y afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad de las actividades a realizar y de avance de la obra.

CIV´S 130000985 13002468
Barrio: Chapinero Occidental Tramo 2

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Fontibón

FECHA		
14	01	2026

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Colegio Integral Ervid
DIRECCIÓN: CARRERA 15 No. 54A-29
TELÉFONO: 3013409301
PERSONA CONTACTO: ANA LUISA DELGADO
TRAMO: CIV´S 130000985 13002468 TRAMO 2

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☑	1
VOLANTE	☑	2
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☑
CIERRE ☐

5. OBSERVACIONES

Se actualiza Punto Satélite de Información con volante convocatoria a reunión de inicio, volante de canales de atención y afiche, con el fin de mantener informada a la comunidad de las actividades a realizar y de avance de la obra.

CIV´S 130000985 13002468
Barrio: Chapinero Occidental Tramo 2

6. FIRMAS

Nombres y apellidos
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

T.S. Angela María Quiroga G
Residente Social del Contratista o Consultor

T.S. Luz Escobar Ospina
Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

FORMATO		
CONTROL DE PUNTOS SATELITES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-05	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

FECHA		
03	02	2026

CONTRATO N° 552-2024 COP (120683)

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Colegio Integral Ervid
DIRECCIÓN: CARRERA 15 No.54A-29
TELÉFONO: 3013409301
PERSONA CONTACTO: ANA LUISA DELGADO
TRAMO: CIV´S 13000985 -13002468 TRAMO 2

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☐	
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	

CUAL?

4. TIPO DE ACTIVIDAD

INSTALACION ☐ ACTUALIZACION ☐
CIERRE ☑

5. OBSERVACIONES

Se desinstala punto satélite de información por terminación del tramo vial.

CIV´S 13000985 -13002468
Barrio: Chapinero Occidental

6. FIRMAS

Nombres y apellidos	T.S. Angela María Quiroga G	T.S. Luz Escobar Ospina
Propietario /o quien autoriza el punto satélite	Residente Social del Contratista o Consultor	Residente Social Interventoría

Original: Interventoría
1ra Copia Propietario
2da Copia Contratista

Anexo 4
Formato control entrega de piezas de divulgación, volante recomendaciones para la instalación de concreto y registro fotográfico barrio Campin.

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: VOLANTE No. 51 RECOMENDACIONES INSTALACIÓN DE CONCRETO

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE:** T.S. Angela María Quiroga Galvis **FECHA** FEBRERO 6/2026

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO:** CAMPIN **CIV : PK ID** 66683 67967

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Ana González	Dg 61Db. 24-87	3118530111	CAMPIN		1	— 11 —
2	— 11 —	cl 26 Db. 61C-72	— 11 —	CAMPIN	— 11 —	1	Bajo Interés WhatsApp
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	2	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M. Quiroga	Luz Escobar

RECOMENDACIONES INSTALACION DE CONCRETO



CONTRATO DE OBRA Nº: FDLT-552-2024

El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, a través de la firma contratista Consorcio Teusavial y de la interventoría Consorcio Interteusaquillo, realizan las siguientes recomendaciones a la comunidad para garantizar la correcta durabilidad y calidad del concreto instalado en vías y andenes.

DURANTE LA INSTALACIÓN DEL CONCRETO:

- Valoremos el trabajo del personal de obra y construyamos juntos; con su ayuda podemos evitar que las mascotas o personas dejen huellas y marcas en el concreto, también evitar arrojar algún tipo de objeto.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DEL CONCRETO:

- Informamos que el concreto recién instalado necesita 28 días para alcanzar su resistencia y fraguado. Una vez cumplido este tiempo, la vía y las rampas vehiculares podrán usarse con normalidad.
- Para garantizar que la obra quede en buen estado, les solicitamos evitar el tránsito sobre estas zonas durante el proceso de secado, especialmente de:
- Motos
- Automóviles
- Camiones y/o vehículos de tracción manual (carretas, zorras, entre otros)
- ¡Apropiémonos de nuestras obras para que permanezcan en buen estado!

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

Lugar: Área intervenida, Carrera 26 con Diagonal 61D

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 301 907 2050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
BOGOTÁ


CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	06 febrero de 2026

FOTOGRAFÍAS 1 al 4



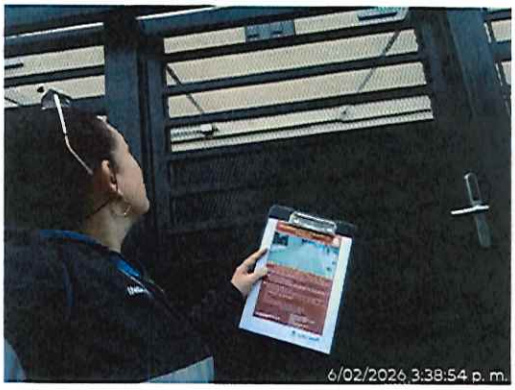





Observacion: Entrega de volante de recomendaciones para la instalación de concreto
PK ID 66683 Y 67967

Anexo 5
Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad primera visita y registro fotográfico barrio San Luis.

FORMATO			
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0	

TIPO DE PIEZA: Volante cierre actor de Vecindad 1RA VISITA

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis FECHA 13/01/2026

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO BARRIO: SAN LUIS CIV 13000744

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Manuel Beltrán	Cr 20 bis 57 - 55	3150599989	SAN LUIS		1	— " —
2	Harold Sanabria	Cr 20 bis 57 - 51	3214848556	SAN LUIS		1	— " —
3	Ruben Hernandez	Cr 20 bis 57 - 39	3012734305	SAN LUIS	- Ruben Hernandez	1	— " —
4	Juan Carlos Cardenas	Cr 20 bis 57 - 46	3057782920	SAN LUIS	- Juan C Cardenas R.	1	— " —
5	Carmen Quichiz	Cr 20 bis 57 - 31	— " —	SAN LUIS	Carmen Quichiz	1	— " —
6	— " —	Cll 57 bis. 20-12	— " —	SAN LUIS	— " —	1	En buzón
7	Karen Zerpa	Carrera 20 bis. 57-08	3226917683	SAN LUIS	5311090	1	— " —
8	Camilo Harny	Cr 20 bis. 57-24	3114610834	SAN LUIS	- Camilo Harny	1	— " —
9	Carmen Rsboya	Cr 20 bis 57 - 40	3153109738	SAN LUIS		1	— " —
10	Angel Horn Eslava	Cr 20 bis 57 - 58	3132039638	SAN LUIS		1	— " —
11				SAN LUIS		1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS 10

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela M Quiroga	L.E. Escobar



CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA Nº: FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad del Barrio San Luis que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo realizó la intervención del tramo vial identificado con el CIV 13000744 (carrera 20 entre calles 57 y 58), dentro del alcance del contrato de obra FDLT 552 2024 COP (120683) que tiene como objeto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES", Por tal motivo a partir del día 13 de enero de 2026, se realizará el cierre de actas de vecindad en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. Si desea coordinar el horario de la visita, por favor comunicarse con la profesional social de contratista

Fecha: 13-01-2026

Lugar: Área intervenida, Carrera 20 entre calles 57 y 58.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 301 907 2050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO


NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	13 de enero de 2026

FOTOGRAFÍAS 1 AL 4







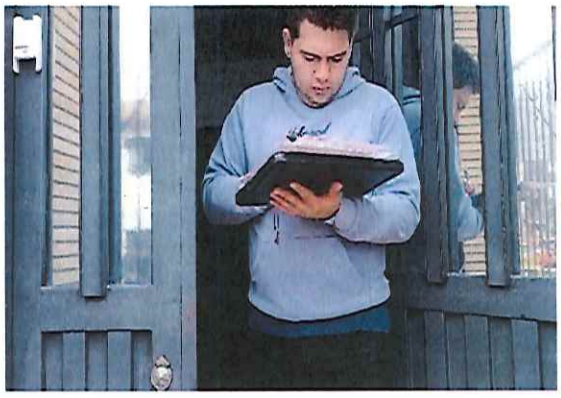

Observacion: Entrega de volante de cierre de actas de vecindad
Barrio San Luis CIV 13000744

Anexo 6
Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad segunda visita y registro fotográfico barrio San Luis.

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: VOLANTE DE CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD SEGUNDA VISITA

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis** **FECHA** 14-Ene-2026

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO: SAN LUIS** **CIV 13000744**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Angel Mario Estevez	Cr 20 No. 57-31	3132039638	SAN LUIS		1	— 11 —
2	— 11 —	Cll 57 No. 20-12	— 11 —	SAN LUIS		1	En buzón.
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	2	

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Ma Quiroga	LUZ ESCOBAR



CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA Nº: FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad del Barrio San Luis que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo realizó la intervención del tramo vial identificado con el CIV 13000744 (carrera 20 entre calles 57 y 58), dentro del alcance del contrato de obra FDLT 552 2024 COP (120683) que tiene como objeto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES", Por tal motivo a partir del día 13 de enero de 2026, se realizará el cierre de actas de vecindad en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. Si desea coordinar el horario de la visita, por favor comunicarse con la profesional social de contratista

Fecha: 13-01-2026

Lugar: Área intervenida, Carrera 20 entre calles 57 y 58.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 301 907 2050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial


Visita No. 2
Fecha: Enero 15 | 2026

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	14 de enero de 2026

FOTOGRAFÍAS 1 Y 2

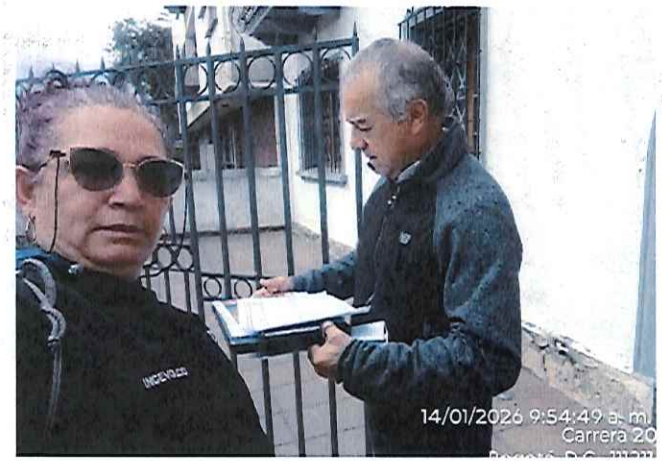



Observacion: Entrega de volante de cierre de acta de vecindad segunda visita
Barrio San Luis CIV 13000744

Anexo 7
Formato control entrega de piezas de divulgación, volante cierre de actas de vecindad tercera visita y registro fotográfico San Luis.

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: VOLANTE DE CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD TERCERA VISITA

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE:** T.S. Angela María Quiroga Galvis **FECHA** 15 Ene - 2026

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO:** SAN LUIS **CIV** 13000744

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Carolina Garzon	Cra 20 No. 57-31	No suministro	SAN LUIS	No firma	1	—11—
2	—11—	Cll 57 No. 20-12	—11—	SAN LUIS	—11—	1	Entregada
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	2	

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Ma Quiroga	Luz Escobar



CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA Nº: FDLT-552-2024

Se informa a la comunidad del Barrio San Luis que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo realizó la intervención del tramo vial identificado con el CIV 13000744 (carrera 20 entre calles 57 y 58), dentro del alcance del contrato de obra FDLT 552 2024 COP (120683) que tiene como objeto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES", Por tal motivo a partir del día 13 de enero de 2026, se realizará el cierre de actas de vecindad en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. Si desea coordinar el horario de la visita, por favor comunicarse con la profesional social de contratista

Fecha: 13-01-2026

Lugar: Área intervenida, Carrera 20 entre calles 57 y 58.

Información y Contacto:
ANGELA MARÍA QUIROGA GALVIS
Teléfono: 301 907 2050
Correo:
teusavialsocial@gmail.com
Profesional social
Consorcio Teusavial

Visita No. 3
Fecha: Enero 16 | 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15 de enero de 2026

FOTOGRAFÍAS 1 Y 2





Observacion: Entrega de volante de cierre de acta de vecindad tercera visita
Barrio San Luis CIV 13000744

Anexo 8
Formato de control entrega de copias de actas de vecindad y registro fotográfico Campin.

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

ENTREGA COPIAS DE ACTAS DE VECINDAD

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) **RESPONSABLE: T.S. Angela Maria Quiroga Galvis** **FECHA** 12-Dic-2025.

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO **BARRIO: CAMPIN** **PK ID 66683 Y 67967**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	— 11 —	Dg 61 D No. 24-87	— 11 —	Campin	— 11 —	1	Bajo puerta
2	Angie Linares	Cr 26 No 61 C-72	3133089614	Campin		1	— 11 —
3	Yesxo Paola Díaz A	Cr 26 No 61 C-64	3006733361	Campin		1	— 11 —
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS	3	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela Maria Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Mª Quiroga	Luz Escobar

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	12 de Diciembre de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 AL 4









Observacion: Entrega de copia de actas de vecindad barrio Campin
PK ID 66683 y 67967

Anexo 9
PQRSD No. 11

FORMATO ACTA DE COMPROMISO SOCIAL			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-22	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 2	

FECHA			SEGUIMIENTO No	CONTRATO CIN INTERVENTORÍA N°: 577 de 2024	CONTRATO 552-2024 COP (120683)	INICIO SEGUIMIENTO CIERRE
DD	MM	AA				
9	12	2025				

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

DESCRIPCIÓN:
El día 27 de noviembre de 2025 durante el proceso de adecuación de la vía Carrera 15 entre Calles 54A y 55 Bis CIV´S 13000985 -13002468 , se presentó la caída de una colombina golpeando el vehículo con placa PDZ658 que transitaba por el carril del costado oriental, generando abolladuras en la puerta del costado derecho.

PQRS No: 11	FECHA RADICACIÓN PQRS: 9 de diciembre de 2025 FECHA CIERRE PQRS: 14 de enero de 2026 FECHA CIERRE COMPROMISO: No aplica	SEGUIMIENTO A PQRS 11	SEGUMIENTO A ACTA 11

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
T.S. Ángela María Quiroga Galvis	52.753.727	C.C.	OTROS (ESPECIFIQUE)	
Sr. Harbey Fabian Marin Martínez	13.722.595	C.C.	OTROS (ESPECIFIQUE)	Virtual
			CIUDADANO	

OTRO:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPLEMENTO A LA ACTIVIDAD (En Caso de requerirse)



2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del propietario y/o Ciudadano: Sr. Harbey Fabian Marin Martínez
Dirección del inmueble y/o lugar de la PQRS: Carrera 15 entre calles 54A y 55 Bis
Correo electrónico: harbeymarin@gmal.com
Teléfono fijo/ movil: 300 7831753
Correo electrónico:
Nombre del propietario y/o Ciudadano :
Nombre del propietario y/o Ciudadano :
Nombre del propietario y/o Ciudadano :

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Seguimiento No. 1 El día 27 de noviembre de 2025, durante el proceso de adecuación de la vía Carrera 15 entre Calles 54A y 55 Bis CIV´S 13000985 -13002468 , se presentó la caída de una colombina golpeando el vehículo con placa PDZ658 que transitaba por el carril del costado oriental, generando abolladuras en la puerta del costado derecho.
El señor Harbey Marín, una vez presentado el acontecimiento reportó lo sucedido a los trabajadores de la obra, quienes le manifestaron que en el momento no se encontraba la persona encargada, le entregaron un número de teléfono, y la persona que contestó manifestó en que en el momento no se encontraba la persona que podía responder por los daños.
Le solicitaron correr el vehículo para no afectar el tráfico.
En vista de que la afectación no fue atendida en el momento, el Señor Harbey Marín, propietario del vehículo, se dirije a la Secretaría Distrital de Movilidad, donde se levantó un petición la cual remitida al Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, el día 05 de diciembre de 2025 Radicado 202531215947411, con copia al Consorcio Teusavial y Consorcio Interteusaquillo.

Seguimiento No. 2 El día 09 de diciembre de 2025, el Consorcio Teusavial recibio a traves de correo electrónico, remitido por la firma Consorcio Interteusaquillo, la comunicación anteriormente descrita. El área social realiza contacto con el Señor Harbey Marín, donde se aclara lo sucedido y se le solicita cotización de reparación de las afectaciones del vehículo.

Seguimiento No. 3 El día 11 de diciembre de 2025, se recibe la cotización de la afectación del vehículo, se realiza contacto telefónico con el señor Harbey Marín para solicitarle enviar cuenta de cobro, adjuntando la cotización, copia de cedula de ciudadanía, certificación bancaria y Rut. Dichos documentos fueron enviados al correo del área social del Consorcio Teusavial teusavialsocial@gmail.com; los cuales fueron remitidos al área de contabilidad para el proceso de desembolso.

Seguimiento No. 4 El día 15 de diciembre de 2025, el Consorcio Teusavial realiza el pago de la afectación del vehículo en la cuenta registrada por el por el peticionario.

Seguimiento No. 5 El día 14 de enero de 2026, el Consorcio Teusavial recibe el comprobante de pago por parte del área de contabilidad, la cual es remitida a la intervetoría como soporte del cierre de la presente PQRSD.

Jw Interventoría

FORMATO ACTA DE COMPROMISO SOCIAL			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-22	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 2	

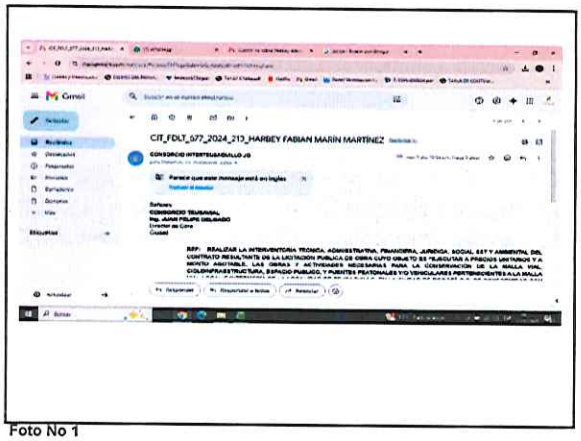


Foto No 1

Descripción: Apertura PQRSD, recepción de la petición por medio de correo electrónico - Diciembre 09 de 2025

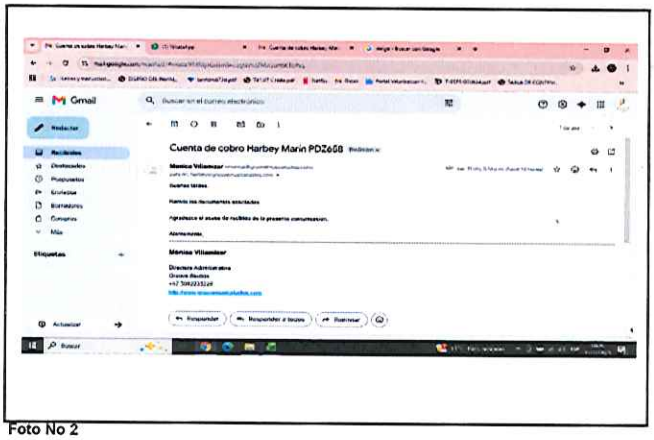


Foto No 2

Descripción: Recepción de la documentación por medio de correo electrónico, para trámite de desembolso (Se recibe cuenta de cobro y documentos anexos) Diciembre 11 de 2025




Foto No 3

Descripción: Soporte de consignación y cierre de la presente PQRSD

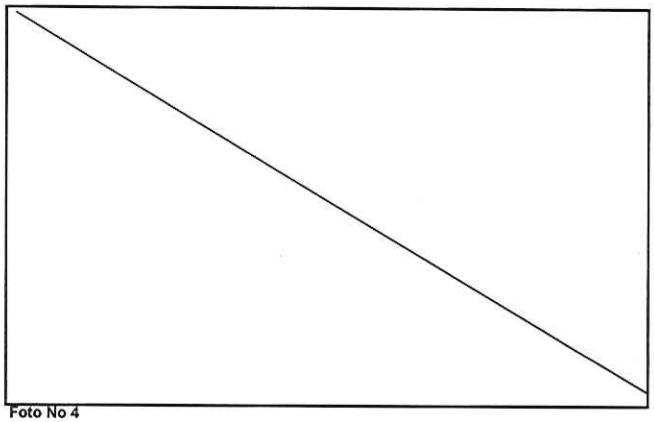


Foto No 4

Descripción:




Foto No 5

Descripción:




Foto No 6

Descripción:

Juz Escobar.
Interventoria

FORMATO ACTA DE COMPROMISO SOCIAL			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo
CÓDIGO FO-SC-22	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 2	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA PRÓXIMO SEGUIMIENTO AL COMPROMISO
Ninguno			

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de enero de 2026.

ELABORÓ:

Andres Echandia
Nombre Ing. Andrés Echandía

Andres Echandia
Firma

Residente Técnico – Contratista

Angela Quiroga
Nombre Angela María Quiroga G.

Angela y/o Quiroga G.
Firma

Residente Social – Contratista

REVISÓ:

Freddy Perdomo R
Nombre

Firma

Residente Técnico – Interventoría

VIRTUAL
Nombre

C.C.
Firma

Propietario y/o Ciudadano(a)


ACOMPAÑÓ:

Luz Escobar.
Nombre Luz Escobar Ospina

Luz Escobar
Firma

Residente Social – Interventoría

IMPORTANTE: SI LA PRESENTE ACTA SE GENERÓ COMO COMPROMISO PARA CIERRE DE UNA PQRS, ESTA SE DEBE ANEXAR A LA RESPUESTA QUE SE VA A DAR AL PETICIONARIO

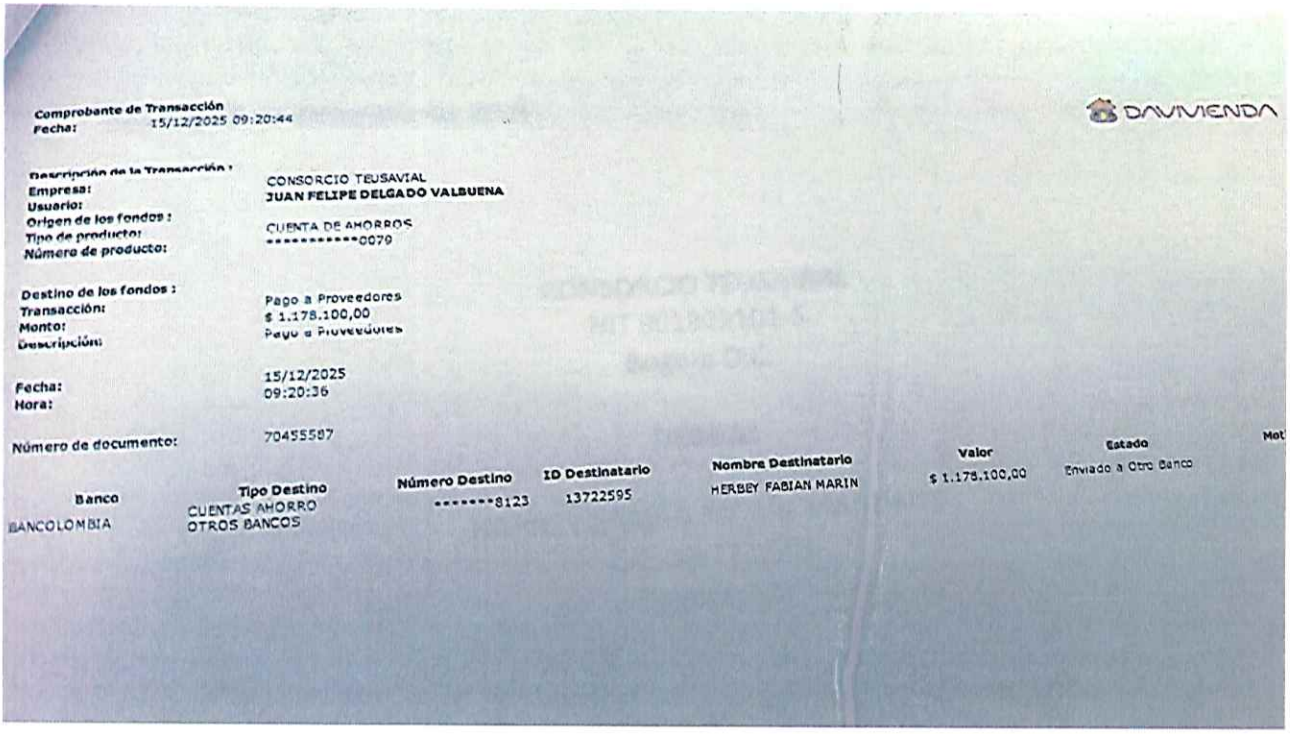

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/12/2025 09:20:44

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :

Empresa:	CONSORCIO TEUSAVIAL
Usuario:	**JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA**
Origen de los fondos :	
Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********0079
Destino de los fondos :	
Transacción:	Pago a Proveedores
Monto:	$ 1.178.100,00
Descripción:	Pago a Proveedores
Fecha:	15/12/2025
Hora:	09:20:36
Número de documento:	70455587

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Mot
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8123	13722595	HERBEY FABIAN MARIN	$ 1.178.100,00	Enviado a Otro Banco	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.722.595

MARIN MARTINEZ

APELLIDOS
HARBEY FABIAN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-OCT-1979

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

05-NOV-1997 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00191390-M-0013722595-20091028 0017542096A 1 1520515407

Válido solo para Tesseval

Bogotá, 11 de diciembre de 2025

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT 901902101-5
Bogotá D.C.

DEBE A:

HARBEY FABIÁN MARÍN MARTÍNEZ
C.C. 13.722.595
Bogotá D.C.


La Suma de: Un millón ciento setenta y ocho mil cien pesos ($1.178.100.00)

Por Concepto de: Reparación del vehículo con placas PDZ 658 Tramo chapinero occidental

FAVOR REALIZAR EL PAGO A LA CUENTA DE AHORROS BANCO BANCOLOMBIA No. 17742718123 A NOMBRE DE HARBEY FABIÁN MARÍN MARTÍNEZ.

Soy Declarante de renta. Certifico que no soy responsable del IVA.

Cordialmente,



Harbey Fabián Marín Martínez
C.C. 13722595 Bucaramanga

RENAULT
AutoGalias S.A.
Nit 8 3 0.0 1 1.6 1 6-5

Autopista Norte No 159A – 60
PBX: 676 72 00 FAX: 676 72 01 – 676 72 02
Bogotá, D. C. - Colombia

PEDIDO DE CLIENTES

Numero: 10,314

Fecha: 11/12/2025 00:00:00

SEÑORES:
BODEGA COLISION SEDE NORTE
11
AUTOP NORTE 159A 60
BOGOTA
Telefono: 6767200
Fax:

Vendedor:
BODEGA COLISION SEDE NORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	% DESC	VR. UND	VR. TOTAL
9999999910	MANO OBRA LATONERIA	7	19	0	$90,000.00	$630,000.00
9999999998	MANO DE OBRA PINTURA	4	19	0	$90,000.00	$360,000.00

Condicion de Pago:	Dias validez:	Subtotal	Descuento:	Iva	TOTAL
PAGO DE CONTADO	**158**	**990,000**	**0**	**188,100**	**1,178,100**

Notas: PLACA PDZ658

Autorizo a AUTOGALIAS. A. y/o la Red de Concesionarios y Talleres Autorizados Renault para:
- Contactarme con el fin de evaluar la calidad de los productos y servicios Renault y/o de aquellos comercializados en la Red de Concesionarios y Talleres Autorizados Renault. SI___NO___
- Informarme de manera oportuna sobre los productos Renault, los servicios ofrecidos a través de los Concesionarios y Talleres Autorizados Renault así como de los beneficios a los que pued promociones desplegadas por ellos. SI____NO____
- Acepto que mis datos personales sean empleados para que se efectúe mi inscripción en la comunidad My Renault y para que me envíen información relacionada con los beneficios y promoci NO____
Puede leer nuestras políticas de tratamiento de datos personales en www.renault.com.co".

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1859 y siguientes del Codigo Civil y el artículo 866 y siguientes del Codigo de Comercio, manifiesto que acepto establecer el dinero que entrego como repuesto, es consignado a título de arras confirmatorias en una suma que equivale al (50%) del valor total del precio del repuesto conforme a la presente orden de pedido, y estas quedarán de p en caso de retracto por el comprador, entendiéndose que si el comprador se retracta de la compra del repuesto solicitado, perderá el (50%) sobre el valor total del repuesto.

Elaboro

Autorizo

Firma del cliente

Bogotá D.C., diciembre 05 de 2025

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO
Atn. Doctora María Angélica González Russi
Transversal 18 Bis No. 38-41
(601) +2870094
mallavial.teusaquillo@gobiernobogota.gov.co
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato FDLT-552-2024 - CONSORCIO TEUSAVIAL**

Asunto: Traslado por competencia – SDQS-6577392025 – Solicitud reparación de daños de vehículo afectado.

Cordial saludo:

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en calidad de cabeza del sector movilidad y en cumplimiento de sus funciones como autoridad de tránsito y transporte de la ciudad, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 672 de 2018[1] en cuanto a la autorización de cierres, desvíos y medidas de mitigación por afectación del espacio público asociado a obras, eventos, aglomeraciones o emergencias, en el marco de los planes de manejo de tránsito (PMT); y el seguimiento al cumplimiento de los mismos, a través de la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT), comunica que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, da traslado por competencia de la petición realizada por el Señor **HARBEY FABIAN MARIN MARTINEZ**, en cuanto a:

> *"(…) El día 27 de noviembre de 2025 en una obra realizada por contratista (COP-759-2023) sobre la carrera 15 con calle 54a, por mala operación afectaron mi vehículo y no estuvo nadie para responder. Me dijeron que no sabían en que momento vendría el encargado de la obra y me pidieron que*

[1] *"Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Movilidad y se dictan otras disposiciones"*

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

me moviera porque estaba afectando el tráfico, en la obra no hubo nunca un responsable del asunto, la respuesta fue: "es que tenemos muchas obras al tiempo aquí no puede haber alguien que responda por los daños le toca que se espere". Solicite ayuda a la policía pero no hicieron presencia, solicito sean reparados los daños de mi vehículo el cual solo tiene un par de meses de comprado y como se puede observar en el video adjunto la misma situación se presentó mientras yo estaba tratando de buscar ayuda de alguna de las personas de la obra. Cabe anotar que uno de los trabajadores de la obra me dio el numero :3103395061 en donde me constesto una persona la cual me dijo que no sabía en qué momento harían presencia para responder por los daños y luego de esperar mas de 30 minutos volví a llamar y no me contesto mas. Me parece muy cruel que una obra en donde todo el personal tenia chaleco de la Alcaldía de Bogotá cometa este tipo de abusos con la comunidad y no exista una persona competente para responder, nuevamente, espero los daños a mi vehículo sean reparados en el menor tiempo posible. Gracias. (...)"

Lo anterior, con el fin de que, en el ámbito de sus competencias, se brinde respuesta directa al peticionario/a con copia a esta Entidad.

Cordialmente,

Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora de Planes de Manejo de Tránsito
Firma mecánica generada en 05-12-2025 09:19 AM

Anexo: Copia SDQS-6577392025

Cc Juan Felipe Delgado Valbuena-- Carrera 9 No.113-52 CP: Consorcioteusavial@gmail.com-110111(Bogota-D.C.)
cc Consorcio Interteusaquillo Jorge Gomez Falla– Carrera 9 No 126 30 Of 401 CP: Coordinacion.interteusaquillojg@gmail.com-111011(BOGOTA-D.C.)

Revisó: Diana Catalina Sandoval Avellaneda-Subdirección De Planes De Manejo De Tránsito
Elaboró: Yury Alejandra Garcia Rosas–Subdirección De Planes De Manejo De Tránsito

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

DETALLE DEL EVENTO 6577392025

DATOS BASICOS DE LA PETICION

Número de Petición	Tipo de Petición	Asunto
6577392025	DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR	EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN UNA OBRA REALIZADA POR CONTRATISTA (COP-759-2023) SOBRE LA CARRERA 15 CON CALLE 54A, POR MALA OPERACION AFECTARON MI VEHICULO Y NO ESTUVO NADIE PARA RESPONDER. ME DIJERON QUE NO SABIAN EN QUE MOMENTO VENDRIA EL ENCARGADO DE LA OBRA Y ME PIDIERON QUE ME MOVIERA PORQUE ESTABA AFECTANDO EL TRAFICO, EN LA OBRA NO HUBO NUNCA UN RESPONSABLE DEL ASUNTO, LA RESPUESTA FUE: "ES QUE TENEMOS MUCHAS OBRAS AL TIEMPO AQUI NO PUEDE HABER ALGUIEN QUE RESPONDA POR LOS DAÑOS LE TOCA QUE SE ESPERE". SOLICITE AYUDA A LA POLICIA PERO NO HICIERON PRESENCIA, SOLICITO SEAN REPARADOS LOS DAÑOS DE MI VEHICULO EL CUAL SOLO TIENE UN PAR DE MESES DE COMPRADO Y COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL VIDEO ADJUNTO LA MISMA SITUACION SE PRESENTO MIENTRAS YO ESTABA TRATANDO DE BUSCAR AYUDA DE ALGUNA DE LAS PERSONAS DE LA OBRA. CABE ANOTAR QUE UNO DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA ME DIO EL NUMERO :3103395061 EN DONDE ME CONSTESTO UNA PERSONA LA CUAL ME DIJO QUE NO SABIA EN QUE MOMENTO HARIAN PRESENCIA PARA RESPONDER POR LOS DAÑOS Y LUEGO DE ESPERAR MAS DE 30 MINUTOS VOLVI A LLAMAR Y NO ME CONTESTO MAS. ME PARECE MUY CRUEL QUE UNA OBRA EN DONDE TODO EL PERSONAL TENIA CHALECO DE LA ALCALDIA DE BOGOTA COMETA ESTE TIPO DE ABUSOS CON LA COMUNIDAD Y NO EXISTA UNA PERSONA COMPETENTE PARA RESPONDER, NUEVAMENTE, ESPERO LOS DAÑOS A MI VEHICULO SEAN REPARADOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. GRACIAS.

Tema	Subtema	Entidad que Atiende	Dependencia que Atiende
	ATENCION AL PERSONAL EN PUNTOS DE CONTACTO	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

DATOS BASICOS DEL PETICIONARIO

Tipo de Identificación	Número de Identificación	Correo Electronico	
Cédula de ciudadanía	13722595	harbeymarin@gmail.com	
Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido

Traslado [6577392025]	2025-11-28 10:49:32.885
Registro exitoso de petición	2025-11-27 21:02:55.0

SEGUIMIENTO

ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LA ENTIDAD

Fecha Actualización	Entidad	Dependencia	Funcionario	Tipo Evento/Petición Inicial	Fecha Inicio Términos De Ley	Cambia Términos Para Dar Respuesta	Tipo Evento/Petición Final	Fecha Para Dar Respuesta

No se encontraron registros.

Mostrando 0 a 0 de 0 registros

Atrás Siguiente

Cancelar

2024 ALCALDÍA DE BOGOTÁ D.C. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Versión: 2.1.1.4 - es

Anexo 10
Formato control entrega de piezas de divulgación, plegable de sostenibilidad de la vía, registro fotográfico barrio San Luis.

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Teusaquillo

TIPO DE PIEZA: Plegable de sostenibilidad de la vía

CONTRATO N°: 552-2024 COP (120683) RESPONSABLE: T.S. Angela María Quiroga Galvis FECHA 13/01/2026

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO BARRIO: SAN LUIS CIV 13000744

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Manuel Beltrán	Cr 20 bis 57-55	3150599989	SAN LUIS		1	-11-
2	Harold Santos	Cr 20 bis 57-51	3214848856	SAN LUIS		1	-11-
3	Ruben Hernandez	Cr 20 bis 57-39	3012734305	SAN LUIS	- Ruben Hernandez	1	-11-
4	Juan Carlos Cardenas	Cr 20 bis 57-46	3057782920	SAN LUIS	- Juan C Cardenas R.	1	-11-
5	Carmen Quichiz	Cr 20 bis 57-31	-11-	SAN LUIS	Carmen Quichiz	1	-11-
6	-11-	Cll 57 bis 20-12	-11-	SAN LUIS	-11-	1	En buzón
7	Karen Zerpa	Carrera 20 bis 57-08	3216917688	SAN LUIS	511090	1	-V-
8	Camilo Harny	Cr 20 bis 57-24	3119610834	SAN LUIS	- camilo Harny	1	-11-
9	Carmen Rubayo	Cr 20 bis 57-40	3153109738	SAN LUIS		1	-11-
10	Angelmiro Eslava	Cr 20 bis 57-58	3132039638	SAN LUIS		1	-11-
11				SAN LUIS		1	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS 10

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	T.S. Angela María Quiroga Galvis	T.S. Luz Escobar Ospina
FIRMA	Angela Ma Quiroga	Luz Escobar

Recomendaciones de sostenibilidad:



Evitar lavar, hacer mantenimiento o parquear vehículos en las vías.



Recoger y depositar la basura en las canecas dispuestas y horarios establecidos.



Evitar pintar, rayar o quemar materiales sobre las vías.



Utilizar adecuadamente los pasos peatonales. Evita alterar la estructura de la vía.



Evitar el derrame de combustible y agentes químicos.



Retirar o adecuar los desagües que puedan dañar la vía

Estado actual – Carrera 20 entre calles 57 y 58



Beneficios de la conservación vial:



Más seguridad vial



Menos tiempo de desplazamiento



Más conectividad



Más de 500 mil personas beneficiadas


Más información sobre el Contrato COP No. 552-2024 (120683)

Dirección: Calle 39A No. 29-21 Piso 3
Horario: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 pm.
Teléfono: 601 5317157
Línea celular: 3019072050
Correo: teusavialsocial@gmail.com
Contratista: Consorcio Teusavial
Interventoría: Consorcio Interteusaquillo JG

Finalizan las actividades de

Conservación Vial

En el tramo de la carrera 20 entre calles 57 y 58 CIV 13000744 barrio San Luis Localidad de Teusaquillo

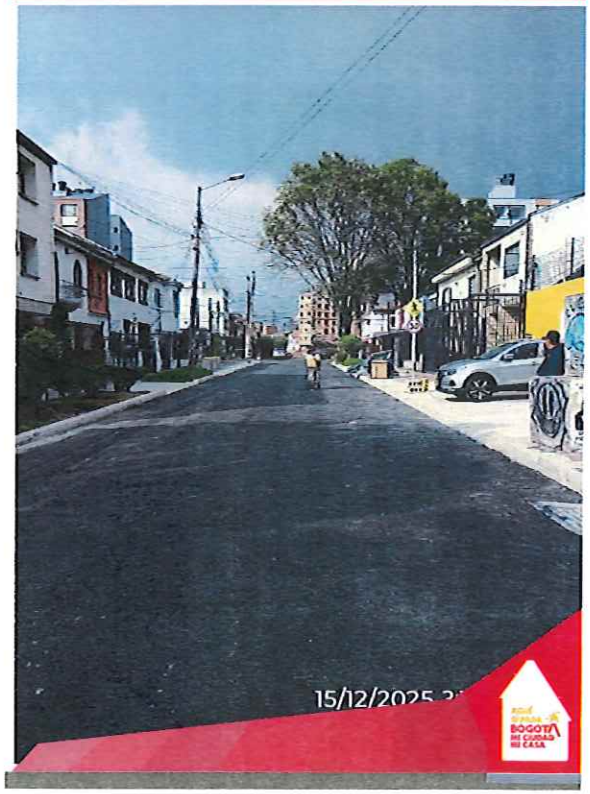

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Alcaldía Local de Teusaquillo

BOGOTÁ

Finalizan las actividades de conservación vial en la localidad Teusaquillo



Finalizan las obras de conservación de la malla vial

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- Se realizo excavación mecánica y manual
- Renovación de tubería residual
- Construcción de cárcamos
- Instalación de geotextil
- Instalación de geocelda
- Relleno SBG reciclada
- Instalación de sumideros
- Nivelación, instalación y compactación de material granular estabilizado con cemento y aditivo.
- Capa de asfalto MD-25 y MD-19

Las intervenciones en la malla vial, **mejoran la movilidad** vehicular, permitiendo la **conectividad y la accesibilidad**, así como **menores tiempos de desplazamiento** para los residentes de la zona.



Mejoramiento de la subrasante



Reparación de andenes en concreto

Estado inicial



Estado actual



NOTA: Se instalará señalización teniendo en cuenta los lineamientos del contrato.

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	13 de enero de 2026

FOTOGRAFÍAS 1 AL 4









Observacion: Entrega de Plegable de sostenibilidad de la via
Barrio San Luis CIV 13000744

Anexo 11
Capacitación No. 11, listado de asistencia y registro fotográfico

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	DICIEMBRE 20 DE 2025	TEMA	CAPACITACIÓN TRABAJADORES DE OBRA No. 11 COMPARTIR DESPEDIDA DE FIN DE AÑO

LUGAR		BARRIO		UPZ		LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	1023423191	Miguel Roa	32	TEUSAVIAL					3122748760		libertadores		
2	CC	1022473550	Sebastian Vanegas	29	Teusavial					3209748863				
3	CC	79878620	Jose miguel Vargas	47	Teusavial					3117783269				Jose Vargas
4	CC	1100007588	Leidy Rodriguez	24	Teusavial					3219146713				
5	CC	79936 85	Wilmer Perez	51	TEUSAVIAL					3102414525				W O P
6	CC	79816392	Edgar Castro	47	Teusavial					3208275042				Edgar Castro
7	CC	8265281	Humberto Vargas	62	teusavial					3118021467		Bosa		
8	CC	1007775347	Elender oliveira parra	23	TEUSAVIAL					3138203730		Perdomo		Elender OP
9	CC	52971424	Viviana vaca Cardenas	44	Teusavial					3216058630		Teusaquillo		
10	CC	74189712	FREDY HERNANDEZ	45	TEUSAVIAL					3125401631		CANDELARIA		
11	CC	79955853	Jenio Cabrera	42	Teusavial					3158895634		Bosa		
12	CC	3669936	JOSE A CARRILLO		TEUSAV					3212506893		TEUSO		JOSE A CARRILLO
13	CC	1010180611	Hassay Quiroga		Teusavial					3103398				Hassay Quiroga
14	CC	52104995	Sandra I. Perilla		Teusavial	Ht	H	N	V	3132258654	cll 39A bis 99-21	La Soledad	teusavialsocial@gmail.com	Sandra
15	CC													

Sexo. M: Mujer / **H**: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht**: Heterosexual / **Bi**: Bisexual / **T**: Transexual/ **I**: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R**: Raizales / **A**: Afrodescendientes / **I**: Indígenas / **P**: Palenqueros(as)/**G**: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V**: Visual / **A**: Auditiva / **C**: Cognitiva / **MU**: Múltiple / **N**: Ninguna

Jair Escobar
Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20 de Diciembre de 2025

FOTOGRAFÍAS 1 AL 4









Observacion: Capacitación trabajadores de obra

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	Enero 27/2026	TEMA	CAPACITACIÓN TRABAJADORES DE OBRA No. 12 Habitos de vida Saludable
LUGAR	FRENTES DE OBRA	BARRIO	CHAPINERO OCCIDENTAL, CAMPIN, PABLO VI
UPZ	GALERIAS, LA ESMERALDA	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC	1022421330	Sebastian Martinez	29	C. Teusaquillo	M						La Soledad		
2	CC	79122507	RAFAEL GOMEZ	62	TEUSAQUILLO							La Soledad.		
3	CC	1000000755	Liam Rodriguez	29	Teusaquillo							Nicolas Ferbacy		
4	CC	8736485	Wilmer Perez	51								SANTA BARBARA		W J P
5	CC	1028035666	Luis Sebastian Miranda	30	Teusavial.							Santa Catalina		
6	CC	79896322	Edgar Castro	47	Teusavial							Molinos.		Edgar Castro
7	CC	1023920626	Camilo Moreno	27	Teusavial							Sierra Morena		Camilo Moreno
8	CC	79878620	JOSE MISAEL VELASCO	47	TEUSAVIAL									JOSE MISAEL
9	CC	1023923[illegible]	Miguel Ro[illegible]	32	Teusavial									Miguel R
10	CC	9754168	GERMAN TORRES	68	TEUSA									G Torres
11	CC	P3445710	Jorge Polo Che		Teusavial									Polo Che
12	CC	79242[illegible]	Orlando Ruiz	58	Teusavial							Egipto		Orlando Ruiz
13	CC	1007340455	Jonatan Cardenas	22	C. Teusavial							Soacha		Jonatan
14	CC	Luis	Denis Calderon	42	Teusavial							Rosa		
15	CC		Jose A Castro		Teusavial							Nosa		Jose A Castro

Sexo. M: Mujer / **H:** Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht:** Heterosexual / **Bi:** Bisexual / **T:** Transexual/ **I:** Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R:** Raizales / **A:** Afrodescendientes / **I:** Indígenas / **P:** Palenqueros(as)/**G:** Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V:** Visual / **A:** Auditiva / **C:** Cognitiva / **MU:** Múltiple / **N:** Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA	Enero 27/2026	TEMA	CAPACITACIÓN TRABAJADORES DE OBRA No. 12 Hábitos de vida Saludable
LUGAR	FRENTES DE OBRA	BARRIO	CHAPINERO OCCIDENTAL, CAMPIN, PABLO VI
UPZ	GALERIAS, LA ESMERALDA	LOCALIDAD	TEUSAQUILLO

No.	DOCUMENTO C.C T.I C.E	DOCUMENTO NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CC		Freddy Hernandez	45	Teusaquillo	M				3125401636	Cra 22 - H 67-57 Sur	Chapinero		
2	CC		Liliana Vaca Cardenas	43	Teusaquillo	F				3226058836				
3	CC	1032383392	Marcela Arevalo		Teusaquillo	F				3208386944	Cra 29 No 34A-21			Marcela
4	CC	1010980611	Hassay Quiroga	21	Teusaquillo	F				3103798841				Hassay Quiroga
5	CC	2362211683	MARIA JULIANA VACA	41	TEUSAQUILLO	F				3209919587	Calle 39 A # 29-21			
6	CC	52104995	Sandra J. Perilla F	53	Teusaquillo	F				3132258659	cll 39A # 29-21	La Soledad	teusaquillosocial@gmail.com	
7	CC													
8	CC													
9	CC													
10	CC													
11	CC													
12	CC													
13	CC													
14	CC													
15	CC													

Sexo. M: Mujer / **H:** Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht:** Heterosexual / **Bi:** Bisexual / **T:** Transexual/ **I:** Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R:** Raizales / **A:** Afrodescendientes / **I:** Indígenas / **P:** Palenqueros(as)/**G:** Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V:** Visual / **A:** Auditiva / **C:** Cognitiva / **MU:** Múltiple / **N:** Ninguna

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CONSORCIO TEUSAVIAL	**Contrato No. 552-2024** **COP (120683)**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Localidad de Teusaquillo.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TEUSAVIAL
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 552-2024 (120683)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	27 de enero de 2026

FOTOGRAFÍAS 1 al 4









Observacion: Capacitación trabajadores de obra No. 11
Frentes de obra
