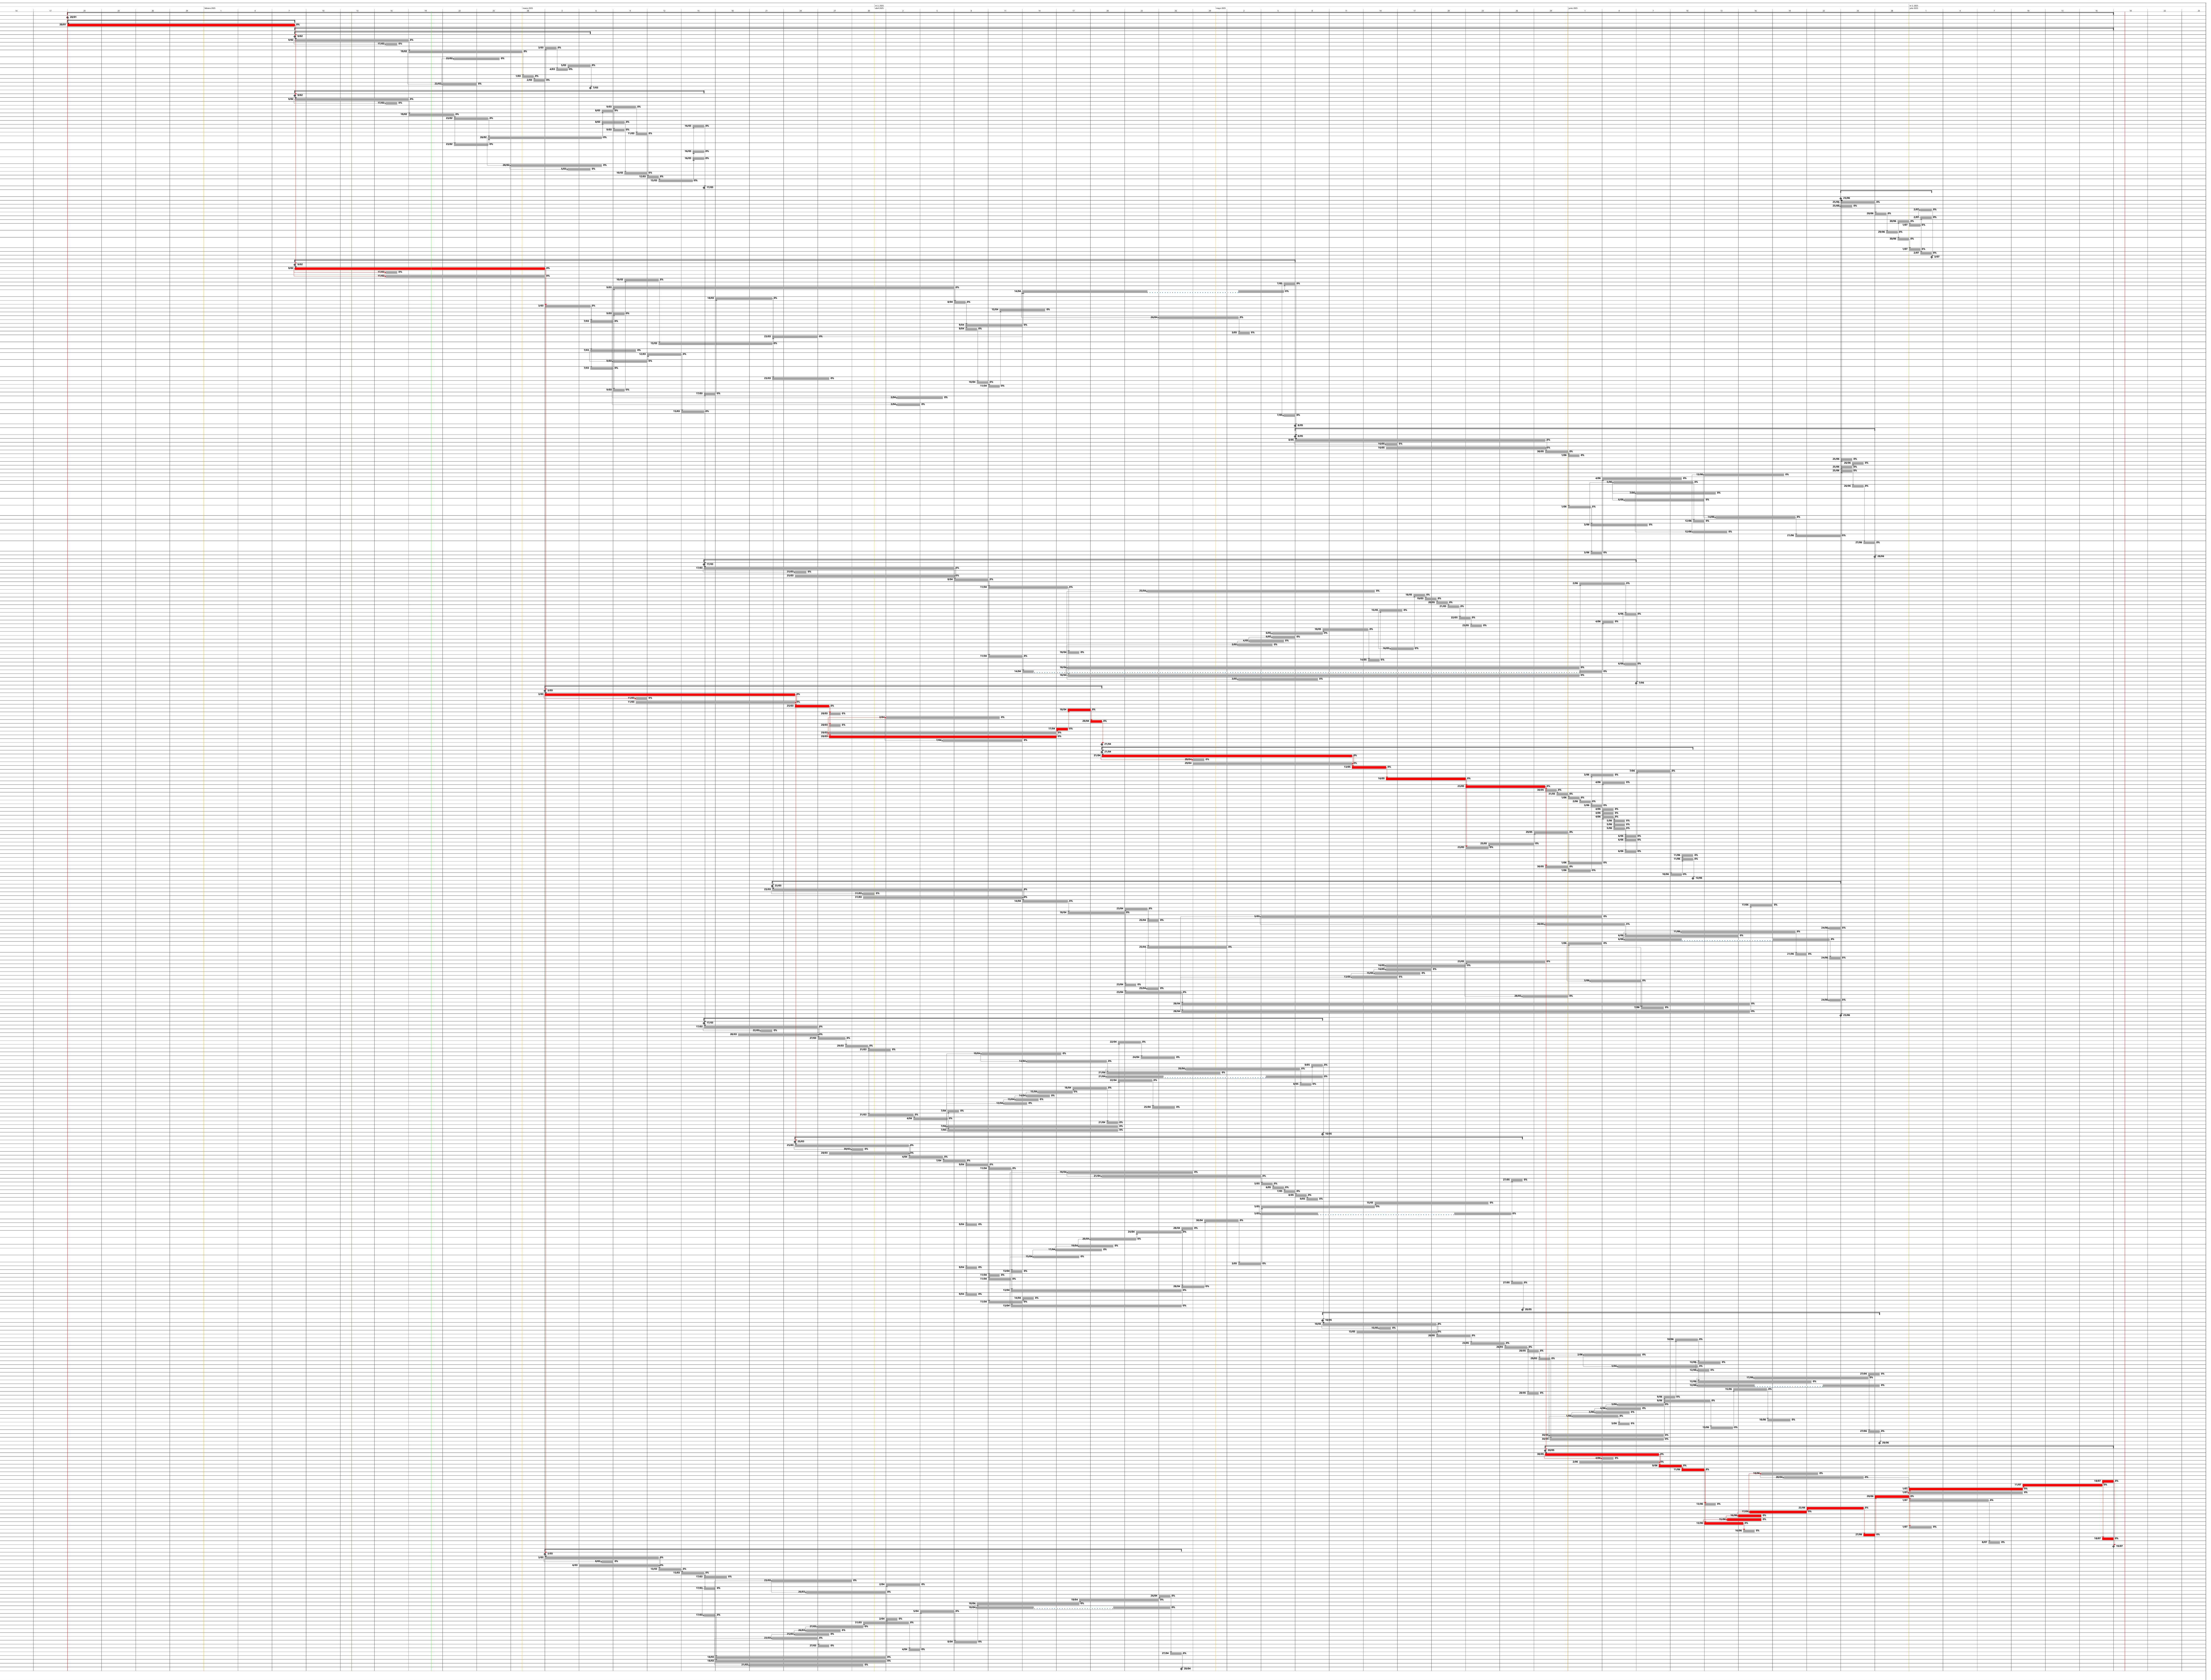Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
1	ITEM	1 COP FDLUSA-CTO-740-2024	180 días	lun 20/01/25	sáb 19/07/25			$ 3.300.227.740,14
2		1.1 INICIO	0 días	lun 20/01/25	lun 20/01/25		4	$ 0,00
3		1.2 ETAPA DIAGNOSTICO	20 días	lun 20/01/25	dom 9/02/25			$ 0,00
4		1.2.1 DIAGNÓSTICO	20 días	lun 20/01/25	dom 9/02/25	2	7;20;56	$ 0,00
5		1.3 OBRA	160 días	dom 9/02/25	sáb 19/07/25			$ 3.300.227.740,14
6		1.3.1 01-003 URBANIZACIÓN ALTABLANCA	26 días	dom 9/02/25	vie 7/03/25			$ 19.780.017,20
7		1.3.1.1 Inicio 01-003	0 días	dom 9/02/25	dom 9/02/25	4	8	$ 0,00
8		1.3.1.2 Preliminares	10 días	dom 9/02/25	mié 19/02/25	7	9CC+8 días;11	$ 0,00
9		1.3.1.3 Socialización	1 día	lun 17/02/25	mar 18/02/25	8CC+8 días		$ 0,00
10		1.3.1.4 Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	1 día	lun 3/03/25	mar 4/03/25	16	14	$ 7.673.092,58
11		1.3.1.5 PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	10 días	mié 19/02/25	sáb 1/03/25	8	17CC+3 días;15	$ 2.272.058,69
12		1.3.1.6 Modulo Complemento para Baranda M-80(0.80x0.85m)**	4 días	dom 23/02/25	jue 27/02/25	17CC+1 día		$ 421.278,14
13		1.3.1.7 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	2 días	mié 5/03/25	vie 7/03/25	14	18	$ 174.453,92
14		1.3.1.8 MODULO DORSAL PECTORAL (Suministr+Instal) Brazos al	1 día	mar 4/03/25	mié 5/03/25	10	13	$ 8.534.679,75
15		1.3.1.9 BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO(SUM+INST)	1 día	sáb 1/03/25	dom 2/03/25	11	16	$ 263.104,28
16		1.3.1.10 Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	1 día	dom 2/03/25	lun 3/03/25	15	10	$ 94.898,00
17		1.3.1.11 PUNTO DE SOLDADURA 6013	3 días	sáb 22/02/25	mar 25/02/25	11CC+3 días	12CC+1 día	$ 346.453,84
18		1.3.1.12 Fin 01-003	0 días	vie 7/03/25	vie 7/03/25	13		$ 0,00
19		1.3.2 01-395 URBANIZACIÓN BALMORAL	36 días	dom 9/02/25	lun 17/03/25			$ 37.850.230,17
20		1.3.2.1 Inicio 01-395	0 días	dom 9/02/25	dom 9/02/25	4	21	$ 0,00
21		1.3.2.2 Preliminares	10 días	dom 9/02/25	mié 19/02/25	20	22CC+8 días;25	$ 0,00
22		1.3.2.3 Socialización	1 día	lun 17/02/25	mar 18/02/25	21CC+8 días		$ 0,00
23		1.3.2.4 Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.	2 días	dom 9/03/25	mar 11/03/25	24	30	$ 1.608.496,53
24		1.3.2.5 Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)*	1 día	sáb 8/03/25	dom 9/03/25	31	23;39	$ 470.790,24
25		1.3.2.6 Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	4 días	mié 19/02/25	dom 23/02/25	21	26;32	$ 1.750.154,63
26		1.3.2.7 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	3 días	dom 23/02/25	mié 26/02/25	25	31	$ 949.822,02
27		1.3.2.8 LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)	2 días	sáb 8/03/25	lun 10/03/25	31	37	$ 620.965,33
28		1.3.2.9 LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST)	1 día	dom 16/03/25	lun 17/03/25	39	40	$ 472.503,01
29		1.3.2.10 Caneca M-120 (desmonte) STPM **	1 día	dom 9/03/25	lun 10/03/25	24		$ 227.195,45
30		1.3.2.11 Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta)	1 día	mar 11/03/25	mié 12/03/25	23	38	$ 3.688.727,12
31		1.3.2.12 PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	10 días	mié 26/02/25	sáb 8/03/25	26;32	35CC+2 días;24;27	$ 3.689.991,45
32		1.3.2.13 Modulo Complemento para Baranda M-80(0.80x0.85m)**	3 días	dom 23/02/25	mié 26/02/25	25	31	$ 842.554,90
33		1.3.2.14 LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL 18-HG+VinilioAdhesicobit	1 día	dom 16/03/25	lun 17/03/25	39	40	$ 1.562.378,55
34		1.3.2.15 LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL 18-HG+VinilioAdhesicobn	1 día	dom 16/03/25	lun 17/03/25	39	40	$ 2.290.941,44
35		1.3.2.16 PUNTO DE SOLDADURA 6013	8 días	vie 28/02/25	sáb 8/03/25	31CC+2 días	36CC+5 días	$ 1.385.805,97
36		1.3.2.17 Tubo acero negro Estruct. 3" e=4 mm **	2 días	mié 5/03/25	vie 7/03/25	35CC+5 días		$ 319.575,75
37		1.3.2.18 Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext).	2 días	lun 10/03/25	mié 12/03/25	27		$ 512.433,12
38		1.3.2.19 Desmonte Lamina Valla Instrucción (Carg+Re	1 día	mié 12/03/25	jue 13/03/25	30	39	$ 257.047,24
39		1.3.2.20 COLUMPIO CONVENCIONAL INCLUYE CADENA + ACOPLES	3 días	jue 13/03/25	dom 16/03/25	38	33;34;28	$ 15.200.849,42
40		1.3.2.21 Fin 01-395	0 días	lun 17/03/25	lun 17/03/25	28;33;34	236;117	$ 0,00
41		1.3.3 01-517 URBANIZACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL EL MORAL I	8 días	mié 25/06/25	jue 3/07/25			$ 4.890.912,03
42		1.3.3.1 Inicio 01-517	0 días	mié 25/06/25	mié 25/06/25	234	43	$ 0,00
43		1.3.3.2 Preliminares	3 días	mié 25/06/25	sáb 28/06/25	42	44CC;46	$ 0,00
44		1.3.3.3 Socialización	1 día	mié 25/06/25	jue 26/06/25	43CC		$ 0,00
45		1.3.3.4 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	47CC	54	$ 730.599,31
46		1.3.3.5 Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	1 día	sáb 28/06/25	dom 29/06/25	43	50	$ 318.305,92
47		1.3.3.6 Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	49	45CC	$ 922.182,12
48		1.3.3.7 Limpieza tubería existente**	1 día	lun 30/06/25	mar 1/07/25	50	49	$ 562.671,41
49		1.3.3.8 MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X80CM	1 día	mar 1/07/25	mié 2/07/25	48	53;47	$ 312.576,64
50		1.3.3.9 LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE	1 día	dom 29/06/25	lun 30/06/25	46	48;51	$ 141.544,11
51		1.3.3.10 LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y/O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL	1 día	lun 30/06/25	mar 1/07/25	50	52	$ 249.960,38
52		1.3.3.11 Desmonte Señal (IDG-S)	1 día	mar 1/07/25	mié 2/07/25	51		$ 84.236,15
53		1.3.3.12 Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris basal	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	49		$ 1.568.835,99
54		1.3.3.13 Fin 01-517	0 días	jue 3/07/25	jue 3/07/25	45		$ 0,00
55		1.3.4 01-546 URB LAS MERCEDES PARQUE	88 días	dom 9/02/25	jue 8/05/25			$ 255.603.628,52
56		1.3.4.1 Inicio 01-517	0 días	dom 9/02/25	dom 9/02/25	4	57	$ 0,00
57		1.3.4.2 Preliminares	22 días	dom 9/02/25	lun 3/03/25	56	58CC+8 días;59CC+8	$ 0,00
58		1.3.4.3 Socialización	1 día	lun 17/02/25	mar 18/02/25	57CC+8 días		$ 0,00
59		1.3.4.4 PMT	14 días	lun 17/02/25	lun 3/03/25	57CC+8 días		$ 0,00
60		1.3.4.5 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	3 días	lun 10/03/25	jue 13/03/25	83;68	75	$ 3.324.377,09
61		1.3.4.6 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	mié 7/05/25	jue 8/05/25	63	89;88CC	$ 730.599,31
62		1.3.4.7 Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	30 días	dom 9/03/25	mar 8/04/25	70	86CC+25 días;65;85C	$ 3.198.940,25
63		1.3.4.8 Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	15 días	lun 14/04/25	mié 7/05/25	74;73	69CC+12 días;61	$ 139.295.805,44
64		1.3.4.9 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	5 días	mar 18/03/25	dom 23/03/25	84	80;201	$ 18.114.345,55
65		1.3.4.10 RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+	1 día	mar 8/04/25	mié 9/04/25	62	71;72	$ 3.174.058,03
66		1.3.4.11 Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+reti	4 días	lun 3/03/25	vie 7/03/25	57	70;76;79	$ 2.677.347,48
67		1.3.4.12 Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena	4 días	sáb 12/04/25	mié 16/04/25	82		$ 852.207,48
68		1.3.4.13 Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro	1 día	dom 9/03/25	lun 10/03/25	79	60	$ 54.067,58
69		1.3.4.14 Columpio Combinado con cesta incluyente	7 días	sáb 26/04/25	sáb 3/05/25	63CC+12 días	73	$ 42.332.503,40
70		1.3.4.15 Juegos infantiles M-5 o M-5A Columpio (Desmor	2 días	vie 7/03/25	dom 9/03/25	66	62	$ 483.367,81
71		1.3.4.16 Pintura Modulo- M-3(retir pint+anticorrosivo+pint)	5 días	mié 9/04/25	lun 14/04/25	65	63	$ 1.759.140,75
72		1.3.4.17 Caneca M-120 (desmonte) STPM **	1 día	mié 9/04/25	jue 10/04/25	65	81	$ 170.396,24
73		1.3.4.18 Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta)	1 día	sáb 3/05/25	dom 4/05/25	69	63	$ 2.766.546,37
74		1.3.4.19 PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83	4 días	dom 23/03/25	jue 27/03/25	75	63	$ 1.712.458,99
75		1.3.4.20 Modulo Complemento para Baranda M-80(0.80x0.85m)**	10 días	jue 13/03/25	dom 23/03/25	60	74	$ 15.587.269,15
76		1.3.4.21 Excavacion manual con retiro en recebo **	4 días	vie 7/03/25	mar 11/03/25	66	78CC+2 días	$ 2.469.477,75
77		1.3.4.22 SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN IMPRIMACIÓN)	3 días	mié 12/03/25	sáb 15/03/25	78	87	$ 830.084,31
78		1.3.4.23 Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeC+Cilin	3 días	dom 9/03/25	mié 12/03/25	76CC+2 días	77	$ 370.638,81
79		1.3.4.24 LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y/O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL	2 días	vie 7/03/25	dom 9/03/25	66	83;68	$ 483.794,29
80		1.3.4.25 Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	5 días	dom 23/03/25	vie 28/03/25	64		$ 540.917,12
81		1.3.4.26 Desmonte Señal (IDG-S)	1 día	jue 10/04/25	vie 11/04/25	72	82	$ 84.236,15
82		1.3.4.27 Banca M-40 (desmonte)	1 día	vie 11/04/25	sáb 12/04/25	81	67	$ 135.521,37
83		1.3.4.28 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V).6M3)	1 día	dom 9/03/25	lun 10/03/25	79	60	$ 228.274,66
84		1.3.4.29 Cinta AjusteConc.3000psi(e=0.20;e=0.15m)sin r	1 día	lun 17/03/25	mar 18/03/25	87	64	$ 2.459.147,75
85		1.3.4.30 PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL(DESM+SUM+INST)	4 días	jue 3/04/25	lun 7/04/25	62CC+25 días		$ 3.082.267,71
86		1.3.4.31 PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFAN (DESM+SUM+INST)	2 días	jue 3/04/25	sáb 5/04/25	62CC+25 días		$ 2.773.374,06
87		1.3.4.32 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip de Bombe)*	2 días	sáb 15/03/25	lun 17/03/25	77	84	$ 2.890.256,73
88		1.3.4.33 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	1 día	mié 7/05/25	jue 8/05/25	61CC		$ 3.023.206,91
89		1.3.4.34 Fin 01-546	0 días	jue 8/05/25	jue 8/05/25	61	91	$ 0,00
90		1.3.5 01-016 EL CEDRO BOLÍVAR - UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS I SECTOR	51 días	jue 8/05/25	sáb 28/06/25			$ 113.415.041,86
91		1.3.5.1 Inicio 01-016	0 días	jue 8/05/25	jue 8/05/25	89	92	$ 0,00
92		1.3.5.2 Preliminares	22 días	jue 8/05/25	vie 30/05/25	91	94FF;93CC+8 días	$ 0,00
93		1.3.5.3 Socialización	1 día	vie 16/05/25	sáb 17/05/25	92CC+8 días		$ 0,00
94		1.3.5.4 PMT	14 días	vie 16/05/25	vie 30/05/25	92FF	95	$ 0,00
95		1.3.5.5 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	vie 30/05/25	dom 1/06/25	94	107;96	$ 3.468.574,66
96		1.3.5.6 Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)*	1 día	dom 1/06/25	lun 2/06/25	95		$ 313.860,17
97		1.3.5.7 Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)	1 día	mié 25/06/25	jue 26/06/25	112		$ 6.499.984,69
98		1.3.5.8 Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	1 día	jue 26/06/25	vie 27/06/25	100		$ 7.762.085,78
99		1.3.5.9 Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	1 día	mié 25/06/25	jue 26/06/25	112		$ 7.673.092,58
100		1.3.5.10 Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	1 día	mié 25/06/25	jue 26/06/25	112	104;98	$ 9.408.843,09
101		1.3.5.11 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	7 días	vie 13/06/25	vie 20/06/25	111CC+1 día	108CC+1 día	$ 28.594.769,68
102		1.3.5.12 Pintura Modulo- M-3(retir pint+anticorrosivo+pint)	7 días	mié 4/06/25	mié 11/06/25	114		$ 1.759.140,80
103		1.3.5.13 Excavacion manual con retiro en recebo **	7 días	jue 5/06/25	jue 12/06/25	110CC+2 días	105CC+2 días;106CC	$ 6.893.214,27
104		1.3.5.14 MODULO DORSAL PECTORAL (Suministr+Instal) Brazos al	1 día	jue 26/06/25	vie 27/06/25	100	113	$ 8.534.679,75
105		1.3.5.15 SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN IMPRIMACIÓN)	7 días	sáb 7/06/25	sáb 14/06/25	103CC+2 días	111CC+5 días	$ 7.968.979,14
106		1.3.5.16 Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeC+Cilin	7 días	vie 6/06/25	vie 13/06/25	103CC+1 día		$ 546.767,08
107		1.3.5.17 LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y/O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL	2 días	dom 1/06/25	mar 3/06/25	95	114;110	$ 427.351,62
108		1.3.5.18 Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	7 días	sáb 14/06/25	sáb 21/06/25	101CC+1 día	112	$ 227.754,94
109		1.3.5.19 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V).6M3)	1 día	jue 12/06/25	vie 13/06/25	103		$ 637.197,40
110		1.3.5.20 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasl+Retir	5 días	mar 3/06/25	dom 8/06/25	107	103CC+2 días	$ 12.295.655,12
111		1.3.5.21 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip de Bombe)*	3 días	jue 12/06/25	dom 15/06/25	105CC+5 días	101CC+1 día	$ 4.263.711,42
112		1.3.5.22 Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica+limpieza	4 días	sáb 21/06/25	mié 25/06/25	108	97;99;100	$ 1.434.060,61
113		1.3.5.23 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	104	115	$ 3.023.206,91
114		1.3.5.24 PASAMANOS ANGULADO(DESM+SUM+INST)	1 día	mar 3/06/25	mié 4/06/25	107	102	$ 1.682.112,15
115		1.3.5.25 Fin 01-016	0 días	sáb 28/06/25	sáb 28/06/25	113		$ 0,00
116		1.3.6 01-009 URBANIZACIÓN SAN PATRICIO - 2 SECTOR	82 días	lun 17/03/25	sáb 7/06/25			$ 329.392.177,80
117		1.3.6.1 Inicio 01-009	0 días	lun 17/03/25	lun 17/03/25	40	118	$ 0,00
118		1.3.6.2 Preliminares	22 días	lun 17/03/25	mar 8/04/25	117	121;120FF;119CC+8	$ 0,00
119		1.3.6.3 Socialización	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	118CC+8 días		$ 0,00
120		1.3.6.4 PMT	14 días	mar 25/03/25	mar 8/04/25	118FF		$ 0,00
121		1.3.6.5 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	3 días	mar 8/04/25	vie 11/04/25	118	123;141	$ 8.258.511,10
122		1.3.6.6 Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.	4 días	lun 2/06/25	vie 6/06/25	146	130	$ 7.216.993,05
123		1.3.6.7 Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	7 días	vie 11/04/25	vie 18/04/25	121	140;146	$ 9.753.715,19
124		1.3.6.8 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-con	20 días	vie 25/04/25	jue 15/05/25	146CC+7 días		$ 55.129.639,82
125		1.3.6.9 Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	1 día	dom 18/05/25	lun 19/05/25	139	126	$ 7.762.085,78
126		1.3.6.10 Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	1 día	lun 19/05/25	mar 20/05/25	125	127	$ 7.673.092,58
127		1.3.6.11 Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Mor	1 día	mar 20/05/25	mié 21/05/25	126	128	$ 13.666.864,99
128		1.3.6.12 Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviler	1 día	mié 21/05/25	jue 22/05/25	127	131	$ 14.621.309,66
129		1.3.6.13 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	2 días	jue 15/05/25	sáb 17/05/25	142	139CC+1 día	$ 8.243.712,04
130		1.3.6.14 LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST)	1 día	vie 6/06/25	sáb 7/06/25	122	143CC;148	$ 236.251,51
131		1.3.6.15 ModuloT/Pecho100 lbs Gimn aire libre(Incoldom	1 día	jue 22/05/25	vie 23/05/25	128	133	$ 14.488.293,66
132		1.3.6.16 Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta)	1 día	mié 4/06/25	jue 5/06/25	145		$ 3.688.727,12
133		1.3.6.17 ModuloT/Sentadilla100 lbsGimnaire libre(usadoer	1 día	vie 23/05/25	sáb 24/05/25	131		$ 20.204.524,74
134		1.3.6.18 BASE GRANULAR BG-1, Y BG-2(SIN IMPRIMA	4 días	sáb 10/05/25	mié 14/05/25	135	142	$ 4.471.258,89
135		1.3.6.19 SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN IN	4,13 días	mar 6/05/25	sáb 10/05/25	136CC	134	$ 4.666.482,50
136		1.3.6.20 Geotextil Tejido T-1700 CDRC	2 días	mar 6/05/25	jue 8/05/25	137CC+2 días	135CC	$ 1.051.239,18
137		1.3.6.21 Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeC	3 días	dom 4/05/25	mié 7/05/25	138CC+1 día	136CC+2 días	$ 157.629,45
138		1.3.6.22 EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Dis	3 días	sáb 3/05/25	mar 6/05/25	146CC+15 días	137CC+1 día	$ 6.654.423,12
139		1.3.6.23 Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	2 días	vie 16/05/25	dom 18/05/25	129CC+1 día	125	$ 438.902,07
140		1.3.6.24 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V).6M3)	1 día	vie 18/04/25	sáb 19/04/25	123		$ 581.284,05
141		1.3.6.25 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10	3 días	vie 11/04/25	lun 14/04/25	121	145	$ 528.349,16
142		1.3.6.26 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip de Bombe)*	1 día	mié 14/05/25	jue 15/05/25	134	129	$ 620.844,74
143		1.3.6.27 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS	1 día	vie 6/06/25	sáb 7/06/25	130CC	148	$ 3.023.207,04
144		1.3.6.28 Loseta IDUA50.5+p=10%4.2-(Medio geoPAVC	3 días	lun 18/04/25	lun 2/06/25	146CC		$ 7.947.548,16
145		1.3.6.29 Desmonte y reinstalacion banca existente**	3 días	lun 14/04/25	mié 4/06/25	141	132	$ 345.736,02
146		1.3.6.30 AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex.T-2	45 días	vie 18/04/25	lun 2/06/25	123	138CC+15 días;147Cl	$ 120.973.363,20
147		1.3.6.31 Contened Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57	7 días	sáb 3/05/25	sáb 10/05/25	146CC+15 días		$ 7.609.033,72
148		1.3.6.32 Fin 01-009	0 días	sáb 7/06/25	sáb 7/06/25	130;143		$ 0,00
149		1.3.7 01-117 URBANIZACIÓN LOS MOLINOS	49 días	lun 3/03/25	lun 21/04/25			$ 150.956.974,22
150		1.3.7.1 Inicio 01-117	0 días	lun 3/03/25	lun 3/03/25	57	151	$ 0,00
151		1.3.7.2 Preliminares	22 días	lun 3/03/25	mar 25/03/25	150	154;152CC+8 días;15	$ 0,00
152		1.3.7.3 Socialización	1 día	mar 11/03/25	mié 12/03/25	151CC+8 días		$ 0,00
153		1.3.7.4 PMT	14 días	mar 11/03/25	mar 25/03/25	151FF		$ 0,00
154		1.3.7.5 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	3 días	mar 25/03/25	vie 28/03/25	151	162;156;159	$ 9.290.824,98
155		1.3.7.6 Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.	2 días	vie 18/04/25	dom 20/04/25	160	158	$ 8.419.825,23
156		1.3.7.7 Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)*	1 día	vie 28/03/25	sáb 29/03/25	154		$ 313.860,17
157		1.3.7.8 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-con	10 días	mié 2/04/25	sáb 12/04/25	162CC+5 días	163CC+5 días	$ 28.570.132,92
158		1.3.7.9 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	dom 20/04/25	lun 21/04/25	155	164	$ 730.599,31
159		1.3.7.10 Caneca M-120 (desmonte) STPM **	1 día	vie 28/03/25	sáb 29/03/25	154		$ 113.598,41
160		1.3.7.11 Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta)	1 día	jue 17/04/25	vie 18/04/25	162	155	$ 1.844.364,24
161		1.3.7.12 Loseta IDUA50.5+p=10%4.2-(Medio geoPAVC.7	20 días	vie 28/03/25	jue 17/04/25	162CC		$ 23.162.803,20
162		1.3.7.13 AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex.T-2	20 días	vie 28/03/25	jue 17/04/25	154	161CC;157CC+5 días;	$ 75.279.728,64
163		1.3.7.14 Rampa en concreto e=0.10 Subb:20cm+Base:20	7 días	lun 7/04/25	lun 14/04/25	157CC+5 días		$ 3.231.237,12
164		1.3.7.15 Fin 01-117	0 días	lun 21/04/25	lun 21/04/25	158	166	$ 0,00
165		1.3.8 01-372 URBANIZACIÓN CODABAS	52 días	lun 21/04/25	jue 12/06/25			$ 192.230.568,33
166		1.3.8.1 Inicio 01-372	0 días	lun 21/04/25	lun 21/04/25	164	167	$ 0,00
167		1.3.8.2 Preliminares	22 días	lun 21/04/25	mar 13/05/25	166	170;169FF;168CC+8	$ 0,00
168		1.3.8.3 Socialización	1 día	mar 29/04/25	mié 30/04/25	167CC+8 días		$ 0,00
169		1.3.8.4 PMT	14 días	mar 29/04/25	mar 13/05/25	167FF		$ 0,00
170		1.3.8.5 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	3 días	mar 13/05/25	vie 16/05/25	167	173	$ 6.270.274,28
171		1.3.8.6 Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.	3 días	sáb 7/06/25	mar 10/06/25	192	198	$ 8.419.825,23
172		1.3.8.7 Desmonte juegos infantiles **	2 días	mar 3/06/25	jue 5/06/25	197		$ 786.231,54
173		1.3.8.8 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-con	7 días	vie 16/05/25	vie 23/05/25	170	175;191	$ 4.625.292,79
174		1.3.8.9 Empradizacion zonas verdesa recuperar (SumTier	2 días	mié 4/06/25	vie 6/06/25	180		$ 522.231,80
175		1.3.8.10 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	7 días	vie 23/05/25	vie 30/05/25	173	196;176;342	$ 36.211.965,37
176		1.3.8.11 SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO	1 día	vie 30/05/25	sáb 31/05/25	175	177	$ 3.282.415,34
177		1.3.8.12 ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SU	1 día	sáb 31/05/25	dom 1/06/25	176	178	$ 2.315.018,74
178		1.3.8.13 AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (S	1 día	dom 1/06/25	lun 2/06/25	177	179	$ 1.137.434,93
179		1.3.8.14 PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO C	1 día	lun 2/06/25	mar 3/06/25	178	180	$ 10.181.006,47
180		1.3.8.15 SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM	1 día	mar 3/06/25	mié 4/06/25	179	174	$ 3.708.225,62
181		1.3.8.16 Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Ins	1 día	mié 4/06/25	jue 5/06/25	195		$ 6.499.984,69
182		1.3.8.17 Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	1 día	mié 4/06/25	jue 5/06/25	195		$ 7.762.085,76
183		1.3.8.18 Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	1 día	mié 4/06/25	jue 5/06/25	195	184;185;186	$ 7.673.092,58
184		1.3.8.19 Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	1 día	jue 5/06/25	vie 6/06/25	183		$ 9.408.843,09
185		1.3.8.20 Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Mor	1 día	jue 5/06/25	vie 6/06/25	183		$ 13.666.864,99
186		1.3.8.21 Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviler	1 día	jue 5/06/25	vie 6/06/25	183	188;189;192	$ 14.621.309,66
187		1.3.8.22 Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena	3 días	jue 29/05/25	dom 1/06/25	190	195	$ 287.315,94
188		1.3.8.23 ModuloT/Pecho100 lbs Gimn aire libre(Incoldom	1 día	vie 6/06/25	sáb 7/06/25	186		$ 14.488.293,66
189		1.3.8.24 ModuloT/Sentadilla100 lbsGimnaire libre(usadoer	1 día	vie 6/06/25	sáb 7/06/25	186		$ 20.204.524,74
190		1.3.8.25 MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3	4 días	dom 25/05/25	jue 29/05/25	191	187	$ 1.362.881,81
191		1.3.8.26 LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE	2 días	vie 23/05/25	dom 25/05/25	173	190	$ 707.720,56
192		1.3.8.27 MODULO DORSAL PECTORAL (Suministr+Insta	1 día	vie 6/06/25	sáb 7/06/25	186	171	$ 8.534.679,68
193		1.3.8.28 LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL 18-HG+VinilioA	1 día	mié 11/06/25	jue 12/06/25	198		$ 1.562.378,55
194		1.3.8.29 LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL 18-HG+Vinilio	1 día	mié 11/06/25	jue 12/06/25	198	199	$ 2.290.941,48
195		1.3.8.30 Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	3 días	dom 1/06/25	mié 4/06/25	187	181;182;183	$ 227.754,94
196		1.3.8.31 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.1	2 días	vie 30/05/25	dom 1/06/25	175	197	$ 939.501,63
197		1.3.8.32 DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Desr	2 días	dom 1/06/25	mar 3/06/25	196	172	$ 1.309.265,55
198		1.3.8.33 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS	1 día	mar 10/06/25	mié 11/06/25	171	193;194	$ 3.023.206,91
199		1.3.8.34 Fin 01-372	0 días	jue 12/06/25	jue 12/06/25	194		$ 0,00
200		1.3.9 01-189 DESARROLLO ESTRELLA DEL NORTE	94 días	dom 23/03/25	mié 25/06/25			$ 533.301.484,70
201		1.3.9.1 Inicio 01-189	0 días	dom 23/03/25	dom 23/03/25	64	202	$ 0,00
202		1.3.9.2 Preliminares	22 días	dom 23/03/25	lun 14/04/25	201	203CC+8 días;204FF;	$ 0,00
203		1.3.9.3 Socialización	1 día	lun 31/03/25	mar 1/04/25	202CC+8 días		$ 0,00
204		1.3.9.4 PMT	14 días	lun 31/03/25	lun 14/04/25	202FF		$ 0,00
205		1.3.9.5 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	4 días	lun 14/04/25	vie 18/04/25	202	208	$ 5.293.705,07
206		1.3.9.6 Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.	2 días	mar 17/06/25	jue 19/06/25	233		$ 4.811.328,70
207		1.3.9.7 Desmonte juegos infantiles **	2 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	208	217;210	$ 262.077,18
208		1.3.9.8 Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	5 días	vie 18/04/25	mié 23/04/25	205	207;228;226	$ 2.470.806,54
209		1.3.9.9 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-con	30 días	lun 5/05/25	mié 4/06/25	233CC+7 días	211CC+25 días	$ 66.898.683,21
210		1.3.9.10 Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **	1 día	vie 25/04/25	sáb 26/04/25	207		$ 117.651,97
211		1.3.9.11 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	7 días	vie 30/05/25	vie 6/06/25	209CC+25 días	214	$ 18.758.984,98
212		1.3.9.12 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	mar 24/06/25	mié 25/06/25	230CC		$ 730.599,31
213		1.3.9.13 JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212aNoC	10 días	mié 11/06/25	sáb 21/06/25	215CC+5 días	218	$ 169.017.600,13
214		1.3.9.14 Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	10 días	vie 6/06/25	lun 16/06/25	211	215CC	$ 38.598.348,80
215		1.3.9.15 Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm	18 días	vie 6/06/25	mar 24/06/25	214CC	213CC+5 días;219	$ 21.441.596,88
216		1.3.9.16 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	3 días	dom 1/06/25	mié 4/06/25	229	225CC+2 días	$ 14.030.069,98
217		1.3.9.17 DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	7 días	vie 25/04/25	vie 2/05/25	207	227CC;232	$ 6.203.598,98
218		1.3.9.18 Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta)	1 día	sáb 21/06/25	dom 22/06/25	213		$ 1.844.364,24
219		1.3.9.19 LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL 18-HG+VinilioA	1 día	mar 24/06/25	mié 25/06/25	215	230CC	$ 1.562.378,55
220		1.3.9.20 BASE GRANULAR BG-1, Y BG-2(SIN IMPRIMA	7 días	vie 23/05/25	vie 30/05/25	221	229CC+5 días	$ 7.609.033,83
221		1.3.9.21 SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN IN	7 días	vie 16/05/25	vie 23/05/25	222CC	220	$ 7.941.941,24
222		1.3.9.22 Geotextil Tejido T-1700 CDRC	4 días	vie 16/05/25	mar 20/05/25	223CC+1 día	221CC	$ 1.789.117,28
223		1.3.9.23 Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeC	4 días	jue 15/05/25	lun 19/05/25	224CC+2 días	222CC+1 día	$ 268.271,34
224		1.3.9.24 EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Dis	4 días	mar 13/05/25	sáb 17/05/25	233CC+15 días	223CC+2 días	$ 11.740.935,88
225		1.3.9.25 Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	4,13 días	mar 3/06/25	sáb 7/06/25	216CC+2 días	232	$ 557.523,56
226		1.3.9.26 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V).6M3)	1 día	mié 23/04/25	jue 24/04/25	208		$ 1.025.606,86
227		1.3.9.27 Desmonte Lamina Valla Instrucción (Carg+Re	1 día	vie 25/04/25	sáb 26/04/25	217CC		$ 128.523,63
228		1.3.9.28 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.1	5 días	mié 23/04/25	lun 28/04/25	208	233;231	$ 6.425.210,24
229		1.3.9.29 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip de Bombe)*	4 días	mié 28/05/25	dom 1/06/25	220CC+5 días	216	$ 2.091.997,53
230		1.3.9.30 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS	1 día	mar 24/06/25	mié 25/06/25	219CC	234;212CC	$ 3.023.206,91
231		1.3.9.31 Loseta IDUA50.5+p=10%4.2-(Medio geoPAVC	50 días	lun 28/04/25	mar 17/06/25	228		$ 24.506.444,80
232		1.3.9.32 INSTALACION DOTACION	2 días	sáb 7/06/25	lun 9/06/25	217;225		$ 2.517.282,60
233		1.3.9.33 AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex.T-2	50 días	lun 28/04/25	mar 17/06/25	228	224CC+15 días;209Cl	$ 111.633.940,48
234		1.3.9.34 Fin 01-189	0 días	mié 25/06/25	mié 25/06/25	230	42	$ 0,00
235		1.3.10 01-483 Agrupacion De Vivienda Jardines De Oriente	54,13 días	lun 17/03/25	sáb 10/05/25			$ 321.857.113,81
236		1.3.10.1 Inicio 01-483	0 días	lun 17/03/25	lun 17/03/25	40	237	$ 0,00
237		1.3.10.2 Preliminares	10 días	lun 17/03/25	jue 27/03/25	236	240;238CC+5 días;23	$ 0,00
238		1.3.10.3 Socialización	1 día	sáb 22/03/25	dom 23/03/25	237CC+5 días		$ 0,00
239		1.3.10.4 PMT	7 días	jue 20/03/25	jue 27/03/25	237FF		$ 0,00
240		1.3.10.5 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	jue 27/03/25	sáb 29/03/25	237	242	$ 2.064.627,77
241		1.3.10.6 Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.	2 días	mar 22/04/25	jue 24/04/25	284	245	$ 2.405.664,35
242		1.3.10.7 Desmonte juegos infantiles **	2 días	sáb 29/03/25	lun 31/03/25	240	243;260	$ 393.115,77
243		1.3.10.8 Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	2 días	lun 31/03/25	mié 2/04/25	242		$ 627.720,35
244		1.3.10.9 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-co	7 días	jue 10/04/25	jue 17/04/25	264CC+3 días	246CC+4 días	$ 11.082.191,26
245		1.3.10.10 Empradizacion zonas verdesa recuperar (SumT	3 días	jue 24/04/25	dom 27/04/25	241		$ 1.332.223,83
246		1.3.10.11 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INS	7 días	lun 14/04/25	lun 21/04/25	244CC+4 días	249	$ 17.096.796,44
247		1.3.10.12 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	vie 9/05/25	sáb 10/05/25	252	265;308	$ 730.599,31
248		1.3.10.13 JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212aNo	10 días	lun 28/04/25	jue 8/05/25	249CC+7 días	252	$ 169.017.600,13
249		1.3.10.14 Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	10 días	lun 21/04/25	jue 1/05/25	246	250CC;248CC+7 días	$ 36.371.520,12
250		1.3.10.15 Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm	10 días	lun 21/04/25	sáb 10/05/25	249CC		$ 21.441.596,88
251		1.3.10.16 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	3 días	mar 22/04/25	vie 25/04/25	262	258	$ 8.728.636,28
252		1.3.10.17 Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta	1 día	jue 8/05/25	vie 9/05/25	248	247	$ 922.182,12
253		1.3.10.18 BASE GRANULAR BG-1, Y BG-2(SIN IMPRIM	3 días	vie 18/04/25	lun 21/04/25	254	262	$ 4.734.274,04
254		1.3.10.19 SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN	3 días	mar 15/04/25	vie 18/04/25	255CC+1 día	253	$ 4.940.980,91
255		1.3.10.20 Geotextil Tejido T-1700 CDRC	2 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25	256CC+1 día	254CC+1 día	$ 1.113.076,54
256		1.3.10.21 Nivelación y Compactación de Subrasante(Mde	2 días	dom 13/04/25	mar 15/04/25	257CC+1 día	255CC+1 día	$ 166.902,17
257		1.3.10.22 EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+D	2 días	sáb 12/04/25	lun 14/04/25	264CC+5 días	256CC+1 día	$ 7.304.479,19
258		1.3.10.23 Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm	2 días	vie 25/04/25	dom 27/04/25	251		$ 415.177,23
259		1.3.10.24 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V).6M3)	1 día	lun 7/04/25	mar 8/04/25	261		$ 638.068,17
260		1.3.10.25 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.	4 días	lun 31/03/25	vie 4/04/25	242	261	$ 2.966.441,99
261		1.3.10.26 Desmonte y retiro adoquin **	3 días	vie 4/04/25	lun 7/04/25	260	259;264	$ 1.340.598,36
262		1.3.10.27 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip de Bombe	1 día	lun 21/04/25	mar 22/04/25	253	251	$ 1.301.510,85
263		1.3.10.28 Loseta IDUA50.5+p=10%4.2-(Medio geoPAVC	15 días	lun 7/04/25	mar 22/04/25	264CC		$ 2.406.525,53
264		1.3.10.29 AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex.T-	15 días	lun 7/04/25	mar 22/04/25	261	263CC;257CC+5 días;	$ 22.314.604,27
265		1.3.10.30 Fin 01-483	0 días	sáb 10/05/25	sáb 10/05/25	247		$ 0,00
266		1.3.11 01-556 URBANIZACIÓN ALCAZAR DEL RIO	64 días	mar 25/03/25	mié 28/05/25			$ 358.356.964,24
267		1.3.11.1 Inicio 01-556	0 días	mar 25/03/25	mar 25/03/25	151	268	$ 0,00
268		1.3.11.2 Preliminares	10 días	mar 25/03/25	vie 4/04/25	267	271;269CC+5 días;27	$ 0,00
269		1.3.11.3 Socialización	1 día	dom 30/03/25	lun 31/03/25	268CC+5 días		$ 0,00
270		1.3.11.4 PMT	7 días	vie 28/03/25	vie 4/04/25	268FF		$ 0,00
271		1.3.11.5 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	3 días	vie 4/04/25	lun 7/04/25	268	272	$ 6.171.791,70
272		1.3.11.6 Desmonte juegos infantiles **	2 días	lun 7/04/25	mié 9/04/25	271	273;295;302;287	$ 262.077,18
273		1.3.11.7 Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	2 días	mié 9/04/25	vie 11/04/25	272	274;297;298;304	$ 627.720,35
274		1.3.11.8 Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	vie 11/04/25	dom 13/04/25	273	296;305;301	$ 2.120.775,61
275		1.3.11.9 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-cc	11 días	vie 18/04/25	mar 29/04/25	305CC+5 días	276CC+3 días	$ 11.082.191,26
276		1.3.11.10 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INS	14 días	lun 21/04/25	lun 5/05/25	275CC+3 días	278	$ 24.386.680,89
277		1.3.11.11 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	mar 27/05/25	mié 28/05/25	285		$ 730.599,31
278		1.3.11.12 SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANIN	1 día	lun 5/05/25	mar 6/05/25	276	279	$ 1.641.207,67
279		1.3.11.13 ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SI	1 día	mar 6/05/25	mié 7/05/25	278	280	$ 2.315.018,74
280		1.3.11.14 AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (	1 día	mié 7/05/25	jue 8/05/25	279	281	$ 1.137.434,93
281		1.3.11.15 PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO C	1 día	jue 8/05/25	vie 9/05/25	280	282	$ 5.090.503,24
282		1.3.11.16 SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUI	1 día	vie 9/05/25	sáb 10/05/25	281		$ 3.708.225,62
283		1.3.11.17 JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212aNo	10 días	jue 15/05/25	dom 25/05/25	284		$ 169.017.600,13
284		1.3.11.18 Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	10 días	lun 5/05/25	jue 15/05/25	294	285CC;283	$ 37.113.796,05
285		1.3.11.19 Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	10 días	lun 5/05/25	mar 27/05/25	284CC	277;299	$ 21.441.596,88
286		1.3.11.20 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	3 días	mié 30/04/25	sáb 3/05/25	300	294	$ 8.849.867,34
287		1.3.11.21 Caneca M-120 (desmonte) STPM **	1 día	mié 9/04/25	jue 10/04/25	272		$ 170.396,24
288		1.3.11.22 Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta	1 día	lun 28/04/25	mar 29/04/25	305		$ 1.844.364,24
289		1.3.11.23 BASE GRANULAR BG-1, Y BG-2(SIN IMPRIMACIÓN)	4 días	jue 24/04/25	lun 28/04/25	290	300	$ 4.800.027,83
290		1.3.11.24 SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN IMPRIMACIÓN)	4 días	dom 20/04/25	jue 24/04/25	291CC+1 día	289	$ 5.009.606,19
291		1.3.11.25 Geotextil Tejido T-1700 CDRC	3 días	sáb 19/04/25	mar 22/04/25	292CC+2 días	290CC+1 día	$ 1.128.536,57
292		1.3.11.26 Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeC+Cilin	4 días	jue 17/04/25	lun 21/04/25	293CC+2 días	291CC+2 días	$ 169.219,67
293		1.3.11.27 EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	4 días	mar 15/04/25	sáb 19/04/25	305CC+2 días	292CC+2 días	$ 7.405.930,63
294		1.3.11.28 Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	2 días	sáb 3/05/25	lun 5/05/25	286	284	$ 633.442,78
295		1.3.11.29 Desmonte Señal (IDG-S)	1 día	mié 9/04/25	jue 10/04/25	272		$ 168.472,31
296		1.3.11.30 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V).6M3)	1 día	dom 13/04/25	lun 14/04/25	274		$ 646.930,87
297		1.3.11.31 Desmonte Lamina Valla Instrucción (Carg+Re	1 día	vie 11/04/25	sáb 12/04/25	273		$ 128.523,63
298		1.3.11.32 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.	2 días	vie 11/04/25	dom 13/04/25	273		$ 1.037.486,43
299		1.3.11.33 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS	1 día	mar 27/05/25	mié 28/05/25	285	306	$ 3.023.206,91
300		1.3.11.34 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip de Bombe)	2 días	lun 28/04/25	mié 30/04/25	289	286	$ 1.319.587,31
301		1.3.11.35 Loseta IDUA50.5+p=10%4.2-(Medio geoPAVC	15 días	dom 13/04/25	lun 28/04/25	274		$ 2.268.550,91
302		1.3.11.36 Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPN	1 día	mié 9/04/25	jue 10/04/25	272		$ 202.808,27
303		1.3.11.37 Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris bas	1 día	lun 14/04/25	mar 15/04/25	304		$ 2.556.622,43
304		1.3.11.38 Desmonte y reinstalacion banca existente**	3 días	vie 11/04/25	lun 14/04/25	273	303	$ 2.765.888,14
305		1.3.11.39 AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex.T-	15 días	dom 13/04/25	lun 28/04/25	274	293CC+2 días;275CC	$ 27.380.275,98
306		1.3.11.40 Fin 01-556	0 días	mié 28/05/25	mié 28/05/25	299		$ 0,00
307		1.3.12 01-407 URBANIZACIÓN CONJUNTO MULTIFAMILIAR EL VERGEL	49 días	sáb 10/05/25	sáb 28/06/25			$ 320.332.506,34
308		1.3.12.1 Inicio 01-407	0 días	sáb 10/05/25	sáb 10/05/25	247	309	$ 0,00
309		1.3.12.2 Preliminares	10 días	sáb 10/05/25	mar 20/05/25	308	312;310CC+5 días;31	$ 0,00
310		1.3.12.3 Socialización	1 día	jue 15/05/25	vie 16/05/25	309CC+5 días		$ 0,00
311		1.3.12.4 PMT	7 días	mar 13/05/25	mar 20/05/25	309FF		$ 0,00
312		1.3.12.5 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	3 días	mar 20/05/25	vie 23/05/25	309	314	$ 3.548.470,63
313		1.3.12.6 Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.	2 días	mar 10/06/25	jue 12/06/25	328	319	$ 6.014.160,88
314		1.3.12.7 Caja de inspeccion .80x.60 h=1.0 **	3 días	vie 23/05/25	lun 26/05/25	312	315	$ 731.509,85
315		1.3.12.8 Desmonte juegos infantiles **	2 días	lun 26/05/25	mié 28/05/25	314	316;327	$ 262.077,18
316		1.3.12.9 Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	1 día	mié 28/05/25	jue 29/05/25	315	318	$ 627.720,35
317		1.3.12.10 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-c	5 días	lun 2/06/25	sáb 7/06/25	339CC+3 días	320CC+3 días	$ 8.890.109,48
318		1.3.12.11 Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **	1 día	jue 29/05/25	vie 30/05/25	316	339	$ 235.303,94
319		1.3.12.12 Banca en madera M-50 (instalacion) STPM **	2 días	jue 12/06/25	sáb 14/06/25	313	321CC	$ 646.490,69
320		1.3.12.13 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INS	7 días	jue 5/06/25	jue 12/06/25	317CC+3 días	324	$ 18.046.618,47
321		1.3.12.14 LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)	1 día	jue 12/06/25	vie 13/06/25	319CC		$ 620.965,33
322		1.3.12.15 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	323		$ 730.599,31
323		1.3.12.16 JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212aNo	10 días	mar 17/06/25	vie 27/06/25	325CC+5 días	322;337	$ 169.017.600,13
324		1.3.12.17 Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	10 días	jue 12/06/25	dom 22/06/25	320	325CC	$ 36.371.520,12
325		1.3.12.18 Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm	10 días	jue 12/06/25	sáb 28/06/25	324CC	323CC+5 días	$ 21.441.596,88
326		1.3.12.19 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	3 días	dom 15/06/25	mié 18/06/25	336	334	$ 9.092.329,45
327		1.3.12.20 Caneca M-120 (desmonte) STPM **	1 día	mié 28/05/25	jue 29/05/25	315		$ 227.195,45
328		1.3.12.21 Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta	1 día	lun 9/06/25	mar 10/06/25	339	313	$ 3.688.727,12
329		1.3.12.22 BASE GRANULAR BG-1, Y BG-2(SIN IMPRIMA	4,25 días	lun 9/06/25	vie 13/06/25	330	336	$ 4.931.535,40
330		1.3.12.23 SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN	4 días	jue 5/06/25	lun 9/06/25	331CC+1 día	329	$ 5.146.855,40
331		1.3.12.24 Geotextil Tejido T-1700 CDRC	3 días	mié 4/06/25	sáb 7/06/25	332CC+1 día	330CC+1 día	$ 1.159.455,25
332		1.3.12.25 Nivelación y Compactación de Subrasante(Mde	3 días	mar 3/06/25	vie 6/06/25	333CC+1 día	331CC+1 día	$ 173.856,03
333		1.3.12.26 EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Di	4 días	dom 1/06/25	jue 5/06/25	339CC+2 días	332CC+2 días;335	$ 7.608.832,14
334		1.3.12.27 Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm	2,05 días	mié 18/06/25	vie 20/06/25	326		$ 332.142,33
335		1.3.12.28 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V).6M3)	1 día	jue 5/06/25	vie 6/06/25	333		$ 664.654,91
336		1.3.12.29 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip de Bombe)	2 días	vie 13/06/25	dom 15/06/25	329	326	$ 1.355.740,24
337		1.3.12.30 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	323	340	$ 3.023.206,91
338		1.3.12.31 Loseta IDUA50.5+p=10%4.2-(Medio geoPAVC	10 días	vie 30/05/25	lun 9/06/25	339CC		$ 2.687.286,65
339		1.3.12.32 AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex.T-	10 días	vie 30/05/25	lun 9/06/25	318	338CC;333CC+2 días;	$ 15.055.845,62
340		1.3.12.33 Fin 01-407	0 días	sáb 28/06/25	sáb 28/06/25	337		$ 0,00
341		1.3.13 01-126 NUEVA URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA	50 días	vie 30/05/25	sáb 19/07/25			$ 301.794.543,20
342		1.3.13.1 Inicio 01-126	0 días	vie 30/05/25	vie 30/05/25	175	343	$ 0,00
343		1.3.13.2 Preliminares	10 días	vie 30/05/25	lun 9/06/25	342	344CC+5 días;345FF;	$ 0,00
344		1.3.13.3 Socialización	1 día	mié 4/06/25	jue 5/06/25	343CC+5 días		$ 0,00
345		1.3.13.4 PMT	7 días	lun 2/06/25	lun 9/06/25	343FF		$ 0,00
346		1.3.13.5 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	lun 9/06/25	mié 11/06/25	343	347	$ 2.580.744,72
347		1.3.13.6 Desmonte juegos infantiles **	2 días	mié 11/06/25	vie 13/06/25	346	356;361	$ 524.154,36
348		1.3.13.7 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-c	5 días	mié 18/06/25	lun 23/06/25	358CC+1 día	349CC+2 días	$ 4.993.075,19
349		1.3.13.8 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INS	7 días	vie 20/06/25	vie 27/06/25	348CC+2 días	352	$ 19.471.351,50
350		1.3.13.9 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	vie 18/07/25	sáb 19/07/25	351	367	$ 730.599,31
351		1.3.13.10 JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212aNo	17 días	vie 1/07/25	vie 18/07/25	352	350;365	$ 169.017.600,13
352		1.3.13.11 Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	10 días	mar 1/07/25	vie 11/07/25	349;354	353CC;351	$ 38.598.347,89
353		1.3.13.12 Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm	10 días	mar 1/07/25	vie 11/07/25	352CC		$ 21.441.596,88
354		1.3.13.13 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	3 días	sáb 28/06/25	mar 1/07/25	364	362;352;355	$ 9.092.329,45
355		1.3.13.14 DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGL	7 días	mar 1/07/25	mar 8/07/25	354	366	$ 7.444.318,77
356		1.3.13.15 Juegos infantiles M-5 o M-5A Columpio (Desmc	1 día	vie 13/06/25	sáb 14/06/25	347		$ 483.367,81
357		1.3.13.16 BASE GRANULAR BG-1, Y BG-2(SIN IMPRIM	5 días	dom 22/06/25	vie 27/06/25	358	364	$ 4.931.535,40
358		1.3.13.17 SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN	5 días	mar 17/06/25	dom 22/06/25	359CC+1 día	357;348CC+1 día	$ 5.146.855,40
359		1.3.13.18 Geotextil Tejido T-1700 CDRC	3 días	lun 16/06/25	mié 18/06/25	360CC+1 día	358CC+1 día	$ 1.159.455,25
360		1.3.13.19 Nivelación y Compactación de Subrasante(Mde	3 días	dom 15/06/25	mié 18/06/25	361CC+2 días	359CC+1 día	$ 173.856,03
361		1.3.13.20 EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+D	3,13 días	vie 13/06/25	lun 16/06/25	347	360CC+2 días;363	$ 7.608.832,14
362		1.3.13.21 Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm	2 días	mar 1/07/25	jue 3/07/25	354		$ 332.142,33
363		1.3.13.22 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V).6M3)	1 día	lun 16/06/25	mar 17/06/25	361		$ 664.654,91
364		1.3.13.23 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip de Bombe	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	357	354	$ 1.355.740,24
365		1.3.13.24 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS	1 día	vie 18/07/25	sáb 19/07/25	351		$ 3.023.206,91
366		1.3.13.25 INSTALACION DOTACION	2 días	mar 8/07/25	jue 10/07/25	355		$ 3.020.738,58
367		1.3.13.26 Fin 01-126	0 días	sáb 19/07/25	sáb 19/07/25	350		$ 0,00
368		1.3.14 01-059 urbanización capri	56 días	lun 3/03/25	lun 28/04/25			$ 365.465.580,74
369		1.3.14.1 Inicio 01-059	0 días	lun 3/03/25	lun 3/03/25	57	370	$ 0,00
370		1.3.14.2 Preliminares	10 días	lun 3/03/25	jue 13/03/25	369	371CC+5 días;372FF;	$ 0,00
371		1.3.14.3 Socialización	1 día	sáb 8/03/25	dom 9/03/25	370CC+5 días		$ 0,00
372		1.3.14.4 PMT	7 días	jue 6/03/25	jue 13/03/25	370FF		$ 0,00
373		1.3.14.5 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	jue 13/03/25	sáb 15/03/25	370	374	$ 4.645.412,49
374		1.3.14.6 Desmonte juegos infantiles **	2 días	sáb 15/03/25	lun 17/03/25	373	375;378	$ 524.154,36
375		1.3.14.7 Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	lun 17/03/25	mié 19/03/25	374		$ 411.801,09
376		1.3.14.8 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-c	7 días	dom 23/03/25	dom 30/03/25	397CC+5 días	379CC+3 días	$ 15.043.769,86
377		1.3.14.9 Empradizacion zonas verdesa recuperar (SumTi	3 días	mié 2/04/25	sáb 5/04/25	397		$ 592.099,48
378		1.3.14.10 Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **	1 día	lun 17/03/25	mar 18/03/25	374	385CC	$ 176.477,95
379		1.3.14.11 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INS	7 días	mié 26/03/25	mié 2/04/25	376CC+3 días		$ 15.059.428,72
380		1.3.14.12 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	sáb 26/04/25	dom 27/04/25	381	395	$ 730.599,31
381		1.3.14.13 JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero212aNo	7 días	sáb 19/04/25	sáb 26/04/25	382	380	$ 169.017.600,13
382		1.3.14.14 Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	9 días	jue 10/04/25	sáb 19/04/25	392	383CC;381	$ 40.825.175,65
383		1.3.14.15 Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm	10 días	jue 10/04/25	dom 27/04/25	382CC		$ 21.441.596,88
384		1.3.14.16 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	3 días	sáb 5/04/25	mar 8/04/25	394	392	$ 9.456.022,63
385		1.3.14.17 Caneca M-120 (desmonte) STPM **	1 día	lun 17/03/25	mar 18/03/25	378CC	397;396	$ 56.799,20
386		1.3.14.18 Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta	2 días	mié 2/04/25	jue 3/04/25	397		$ 1.844.364,24
387		1.3.14.19 BASE GRANULAR BG-1, Y BG-2(SIN IMPRIM	4 días	lun 31/03/25	vie 4/04/25	388	394	$ 5.128.796,76
388		1.3.14.20 SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN	4 días	jue 27/03/25	lun 31/03/25	389CC+1 día	387	$ 5.352.729,89
389		1.3.14.21 Geotextil Tejido T-1700 CDRC	3 días	mié 26/03/25	sáb 29/03/25	390CC+1 día	388CC+1 día	$ 1.205.833,95
390		1.3.14.22 Nivelación y Compactación de Subrasante(Mde	3 días	mar 25/03/25	vie 28/03/25	391CC+2 días	389CC+1 día	$ 180.811,26
391		1.3.14.23 EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+D	4 días	dom 23/03/25	jue 27/03/25	397CC+5 días	390CC+2 días;393	$ 7.913.185,10
392		1.3.14.24 Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm	2 días	mar 8/04/25	jue 10/04/25	384	382	$ 616.834,97
393		1.3.14.25 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(V).6M3)	1 día	jue 27/03/25	vie 28/03/25	391		$ 691.241,66
394		1.3.14.26 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip de Bombe	1 día	vie 4/04/25	sáb 5/04/25	387	384	$ 1.409.969,63
395		1.3.14.27 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS	1 día	dom 27/04/25	lun 28/04/25	380	399	$ 3.023.206,91
396		1.3.14.28 Loseta IDUA50.5+p=10%4.2-(Medio geoPAVC	15 días	mar 18/03/25	jue 3/04/25	385		$ 5.895.986,44
397		1.3.14.29 AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex.T-	15 días	mar 18/03/25	mié 2/04/25	385	391CC+5 días;376CC	$ 42.808.131,60
398		1.3.14.30 Contened Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57	10 días	vie 21/03/25	lun 31/03/25	397CC+3 días		$ 11.413.550,58
399		1.3.14.31 Fin 01-059	0 días	lun 28/04/25	lun 28/04/25	395		$ 0,00
