REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
ACTA DE AVANCE No. 1

Concocante: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Convocado: JAC OGOSCO

Secretaría de Infraestructura

Fecha presente Acta: 17/02/2026

Convenio solidario No. 002-2026
Fecha del convenio: 19/01/2026
Fecha de acta de inicio: 19/01/2026

OBJETO: "AUNAR ESFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VERDA OGOSCO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"

CONTRACTUAL							OBRA EJECUTADA							
							May. Y Men.		ACTA DE AVANCE # 1			Total obra acumulada		
Cap	Ítem	Descripción	Un	cant.	Vr. Unit.	Vr. Total	+,=,-	Cant.	Cant.	+	%	Cant.	Vr. Total	%
	1	Localización y replanteo	m2	72.0	$ 15.956.65	$ 1.148.878.80	(=)	0.00	72	$ 1.148.879	100%	72	$ 1.148.879	100%
	2	Rocería, h= 3 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.	km	1.5	$ 1.466.569.80	$ 2.199.854.70	(=)	0.00	1.5	$ 2.199.855	100%	1.5	$ 2.199.855	100%
	3	Excavación en conglomerado abierto manual	m3	22.0	$ 47.869.97	$ 1.053.139.34	(=)	0.00	22.00	$ 1.053.139	100%	22	$ 1.053.139	100%
	4	Corte en conglomerado con máquina	m3	300.0	$ 40.747.98	$ 12.224.394.00	(+)	91.34	391.34	$ 15.946.469	130%	391.3438	$ 15.946.469	130%
	5	Conformación y nivelación del terreno	m3	9.0	$ 47.869.97	$ 430.829.73	(=)	0.00	9.00	$ 430.830	100%	9	$ 430.830	100%
	6	Lleno compactado manual con material transportado	m3	26.0	$ 37.744.32	$ 981.352.32	(=)	0.00	26.00	$ 981.352	100%	26	$ 981.352	100%
	7	Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado, incluye todos los elementos para su correcta construcción	m3	30.0	$ 608.373.21	$ 18.251.196.30	(-)	2.98	27.02	$ 16.437.847	90%	27.01935	$ 16.437.847	90%
					COSTO DIRECTO	$ 36.289.645				$ 38.198.371			$ 38.198.371	
					ADMINISTRACIÓN	$ 4.380.160				$ 4.610.543			$ 4.610.543	
					VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 40.669.806				$ 42.808.915			$ 42.808.915	
					APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA	$ 40.000.000				$ 12.000.000			$ 12.000.000	
					APORTE EN ESPECIE JAC	$ 669.806.00				$ 30.808.915			$ 30.808.915	

COSTO DIRECTO	$ 36.289.645	AU INICIAL	AU SIN ESTAMPILLAS
ADMINISTRACIÓN	$ 4.380.160	12.07%	6.47%
VALOR TOTAL	$ 40.669.806		
APORTE EN ESPECIE JAC	$ 669.806		
APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA	$ 40.000.000		
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA	**$ 40.669.806**	% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1	100.00%
APORTE MUNICIPIO ACTA #1	**$ 40.000.000**		
APORTE OAC ACTA #1	**$ 669.806**		
VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA	$ 40.669.806	% TOTAL ACUMULADO	100.00%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO DE OBRA	$ 0		

Valor Total Acta de Avance # 1, a pagar aporte del Municipio: **$ 40.000.000**

En constancia se firma en el Municipio de Santa Fe de Antioquia, a los (17) días del mes de (Febrero) de 2026.

LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Supervisor
Secretario de infraestructura


Einer de Jesús Rivera Paniagua
Representante legal
Junta de Acción Comunal OGOSCO

Convocante

Convocado

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	17/02/2026
CONTRATISTA:	Einer de Jesús Rivera Paniagua						
CONTRATO No.	No. 002-2026	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VERDA OGOSCO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de Infraestructura						
ACTIVIDAD:	Localización y replanteo					UNIDAD	m2
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	1
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tramo 1 ogosco			24.00	3.00		72.00	0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	24	3.00	0	72.00	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

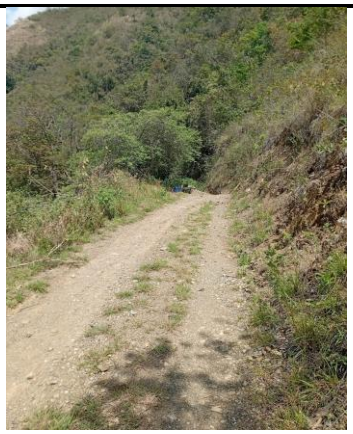




Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Einer de Jesus Rivera Paniagua		
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	17/02/2026
CONTRATISTA:	Einer de Jesús Rivera Paniagua						
CONTRATO No.	No. 002-2026	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VERDA OGOSCO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	0						
ACTIVIDAD:	Rocería, h= 3 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.						UNIDAD km
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	2
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. Km	Ancho	Alto	TOTAL km	Total Km
Tramo 1		1	1.5	1.00		1.5	1.5
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m^2	Peso
TOTAL ACTIVIDAD		1	1.5	1.00	0	1.5	1.5

REGISTRO FOTOGRÁFICO

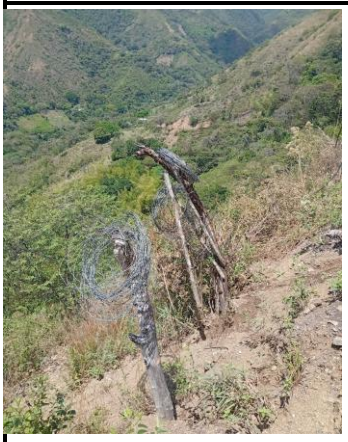



Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Einer de Jesus Rivera Paniagua		
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	17/02/2026
CONTRATISTA:	Einer de Jesús Rivera Paniagua						
CONTRATO No.	No. 002-2026		OBJETO:	OBJETO: “AUNAR ESFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VERDA OGOSCO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”			
SUPERVISOR:	Secretaría de Infraestructura						
ACTIVIDAD:	Excavación en conglomerado abierto manual						UNIDAD m3
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	3
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tramo 1 ogosco			11.00	2.00	0.30	22.00	6.6
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	11	2.00	0.3	22.00	6.6

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Einer de Jesus Rivera Paniagua		
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	17/02/2026
CONTRATISTA:	Einer de Jesús Rivera Paniagua						
CONTRATO No.	No. 002-2026	OBJETO:	OBJETO: “AUNAR ESFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VERDA OGOSCO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”				
SUPERVISOR:	Secretaría de Infraestructura						
ACTIVIDAD:	Corte en conglomerado con máquina						UNIDAD m3
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	4
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tramo 1 ogosco			65.22	3.00	2.00	391.34	391.3437919
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	65.22396532	3.00	2	391.34	391.3437919

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Einer de Jesus Rivera Paniagua		
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	17/02/2026
CONTRATISTA:	Einer de Jesús Rivera Paniagua						
CONTRATO No.	No. 002-2026	OBJETO:	OBJETO: “AUNAR ESFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VERDA OGOSCO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”				
SUPERVISOR:	Secretaría de Infraestructura						
ACTIVIDAD:	Conformación y nivelación del terreno						UNIDAD m3
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	5
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tramo 1 ogosco			3.00	3.00	1.00	9.00	9
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	3	3.00	1	9.00	9

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Einer de Jesus Rivera Paniagua		
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	17/02/2026
CONTRATISTA:	Einer de Jesús Rivera Paniagua						
CONTRATO No.	No. 002-2026		OBJETO:	OBJETO: “AUNAR ESFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VERDA OGOSCO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”			
SUPERVISOR:	Secretaría de Infraestructura						
ACTIVIDAD:	Lleno compactado manual con material transportado						UNIDAD m3
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	6
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tramo 1 ogosco			13.00	2.00	1.00	26.00	26
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	13	2.00	1	26.00	26

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Einer de Jesus Rivera Paniagua		
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	17/02/2026
CONTRATISTA:	Einer de Jesús Rivera Paniagua						
CONTRATO No.	No. 002-2026	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VERDA OGOSCO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de Infraestructura						
ACTIVIDAD:	Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado, incluye todos los elementos para su correcta construcción						UNIDAD m3
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	7
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tramo 1 ogosco			6.75	2.00	2.00	27.02	27.0193476
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	6.7548369	2.00	2	27.02	27.0193476

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Einer de Jesus Rivera Paniagua		
Firma	Firma	
