CONTRATO ■ CONVENIO ☐

Proyecto (S):

LOCALIZACIÓN: Municipio: Planeta Rica Vereda: N/A

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 01 de febrero al 28 de febrero de 2026.

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral, de acuerdo con la información suministrada por la interventoría CONINARQ (Contrato N°051-2025) en su informe ejecutivo correspondiente al periodo 01 de febrero al 03 de febrero de 2026.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO N°:	047 DE 2025
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO DE OBRA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	26 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO CAROLINA
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
OBJETO:	RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DE ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHO MIL CIENTO ONCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS MCTE ($8.111.095.014)
ANTICIPO (40%):	Si X No___ Valor: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCO PESOS MCTE ($3.244.438.005).
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	15 **DE SEPTIEMBRE** DE 2025
FECHA DE TERMINACION 1:	15 DE ENERO DE 2026
MODIFICACIÓN No. 1	REDUCCIÓN DE 0.5 MESES DE PLAZO
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	30 DE DICIEMBRE DE 2025

MODIFICACIÓN No. 2	PRORROGA 1 (20 DÍAS).
FECHA DE TERMINACIÓN 3:	21 DE MARZO 2026

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	22/12/2025	22/01/2026
	Reinicio No. 1	**23/01/2026**	
	Suspensión No.2	04/02/2026	04/03/2026
	Reinicio No. 2	**POR SUSCRIBIR**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**2 MESES**		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	*30/01/2026*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	Hasta la fecha, El plazo de ejecución del contrato será hasta el 20 de febrero de 2026, la cual será ajustada una vez se suscriba el acta de reinicio N°2.		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	contactenos@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**11-44-101263402**			**ANEXO No**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**SI**	26/08/2025	26/06/2026	$1.622.219.002,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**SI**	26/08/2025	26/06/2026	$3.244.438.005,6
Estabilidad / Calidad / correcto funcionamiento	**SI**	5 años, 4 meses y 1 día		$1.622.219.002,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**SI**	26/08/2025	26/12/2028	$811.109.501,40

POLIZA RCE No.	**11-40101082273**			
Responsabilidad civil extracontractual	**SI**	26/08/2025	26/12/2025	$711.750.000

Póliza actualizada según otrosí N°1

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	contactenos@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**11-44-101263402**			**ANEXO No**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**SI**	15/09/2025	16/08/2026	$1.622.219.002,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**SI**	15/09/2025	17/08/2026	$3.244.438.005,6
Estabilidad / Calidad / correcto funcionamiento	**SI**	5 años, 4 meses y 1 día		$1.622.219.002,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**SI**	15/09/2025	17/02/2029	$811.109.501,40
POLIZA RCE No.	**11-40101082273**			
Responsabilidad civil extracontractual	**SI**	15/09/2025	17/02/2026	$875.452.500,00

Póliza actualizada según reinicio N°1

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	contactenos@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**11-44-101263402**			**ANEXO No**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**SI**	15/09/2025	16/08/2026	$1.622.219.002,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**SI**	15/09/2025	17/08/2026	$3.244.438.005,6

Estabilidad / Calidad / correcto funcionamiento	**SI**	5 años, 4 meses y 1 día		$1.622.219.002,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**SI**	15/09/2025	17/02/2029	$811.109.501,40
POLIZA RCE No.	**11-40101082273**			
Responsabilidad civil extracontractual	**SI**	15/09/2025	17/02/2026	$875.452.500,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO:

MEDIO DE TRAMITE	RADICADO	ASUNTO	FECHA
SIDCAR	20252115404	Respuesta al radicado 20251111321: Solicitud de homologación de especialista en hidráulica - Contrato No. 047-2025.	1/10/2025
SIDCAR	20252115503	Citación a comité operativo conjunto Contratos N° 047-2025 y N° 051-2025 - Proyecto: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"	2/10/2025
SIDCAR	20252115728	Respuesta al radicado 20251111455: Remisión de diseños de valla informativa para aprobación – Contrato No. 047-2025	6/10/2025
SIDCAR	20252116591	Notificación de actos administrativos: Resolución 1246 - Permiso de Ocupación de Cauce	20/10/2025
SIDCAR	20252117533	Solicitud de cronograma de socialización y auditorías visibles del contrato 047-2025	4/11/2025
SIDCAR	20252117557	Solicitud de información relacionada con las auditorías	5/11/2025

		visibles.	
SIDCAR	20252118361	Notificación de fechas para el cierre presupuestal, contable y de tesorería en la CVS vigencia 2025	19/11/2025
SIDCAR	20262101387	Remisión mensual de certificado de avance del Contrato de Obra N°047-2025	2/02/2026
SIDCAR	20263100348	Remisión de documentación para expediente	2/02/2026
SIDCAR	20262101387	Remisión de documentación para expediente	2/02/2026
SIDCAR	20262102089	Solicitud de envío de pólizas actualizadas – Contratos N.° 047-2025 y 051-2025.	9/02/2026

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS


De acuerdo con la información suministrada por la interventoría externa CONINARQ (Contrato N°051-2025) en su informe No. 9 correspondiente al periodo 01 al 03 de febrero de 2026., las actividades ejecutadas hasta la fecha en el contrato N°047-2025 cuyo objeto es: “RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, son las siguientes:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT CONTRATADA	CANT EJECUTADA PERIODO	CANT EJECUTADA ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACTIVIDAD
1	**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
1.1	Localización, trazado y replanteo	m	8,220.00	0	8220.0	100%
2	**REALIZAR MOVIMIENTOS DE TIERRA**					
2.1	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra.	m3	146,804.43	0	135701.0	92.44%
2.2	Conformación de diques y dentellones a máquina con material de préstamo seleccionado de la excavación	m3	103,553.56	0	90609.0	84%

2.3	Retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral.	m3	56,226.13	0	52010.0	89%
3	**RECUPERACIÓN BOSQUE DE GALERÍA**					
3.1	Realizar establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería	Unid	12,544.00	0	12544	100%
3.2	Realizar Aislamiento del arreglo Forestal	km	15.8	0	15.8	100%
3.3	Realizar mantenimiento del arreglo forestal	Ha	15.8	0	0	0%
4	**REALIZAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION**					
4.1	Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos	Taller	10	6	6	60%
4.2	Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	Taller	2	0	0	0%

De acuerdo con lo anteriormente descrito, según el informe de la Interventoría externa, ejecutada mediante contrato de interventoría N°051-2025 por parte de la firma CONINARQ, el avance acumulado del contrato de obra N°047-2025 es del 89.67% de ejecución con corte al día 28 de febrero de 2026, es decir, debido a las intensas lluvias producto del evento hidro climático no previsto, denominado frente frio, se presentaron inundaciones en la zona, desbordamiento de los arroyos, afectaciones a las comunidades aledañas, etc.

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRAS Y/O ACTIVIDADES

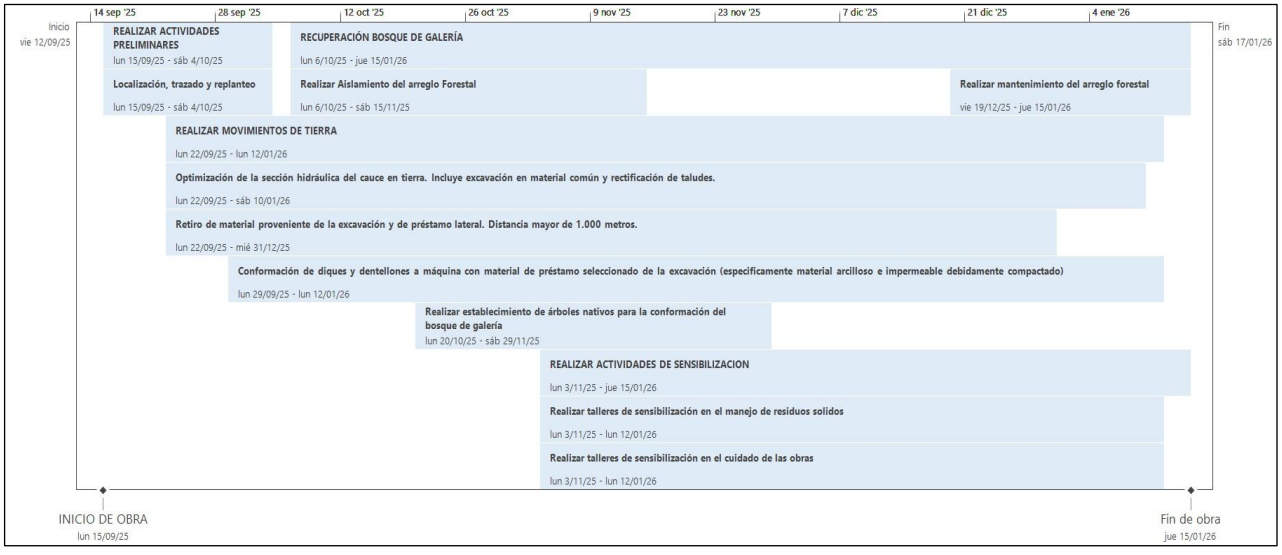

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO: $ 8.111.095.014

VALOR ANTICIPO: $ 3.244.438.005

% AVANCE FINANCIERO: 86,39%

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	29/10/2025	$3.244.438.005	$3.244.438.005	$0	$0	$3.244.438.005	$3.244.438.005	$3.244.438.005
ACTA 01	2/12/2025	$3.690.143.131	$3.690.143.131	1.476.057.252	$1.476.057.252	2.214.085.879		$5.458.523.884
ACTA 02	16/12/2025	$3.316.844.622	$3.316.844.622	$1.326.737.849	$2.802.795.101	-	1.326.737.849	$6.785.261.733

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO

Eje de calidad

REQUISITOS DE CALIDAD CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1) Asegurar que el personal tenga la educación, formación y experiencia necesarias. 2) Socializar la documentación del Sistema de Gestión Integral de la CVS con el equipo. 3) Realizar un ejercicio muestral para evaluar la satisfacción de los beneficiarios y entregar los resultados a la CVS. 4) Documentar y gestionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), informando a la CVS. 5) Asegurar que los equipos de medición tengan certificaciones de calibración iniciales y verificaciones intermedias, y entregar copias a la CVS.	No se evidencia informe anexo de PGIO al informe de interventoría ejecutivo del periodo 01 de febrero de 2026 al 03 de febrero de 2026	En los contratos N°047-2025 y No 051-2025 se suscribieron las siguientes actas: acta de suspensión de fecha 22 de diciembre de 2025 acta de reinicio de fecha 23 de enero de 2026 Acta de suspensión N°2 de fecha 04 de febrero de 2026

Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1) Designar un representante de seguridad y salud en el trabajo. 2) Entregar una autoevaluación anual aprobada por la ARL. 3) Presentar la matriz de riesgos y controles a la CVS. 4) Realizar inducción en seguridad y salud al equipo de trabajo. 5)Proveer y asegurar el uso correcto de elementos de protección personal. 6) Asegurar afiliación al Sistema de Seguridad Social y contar con concepto médico favorable. ') Tener un plan de prevención y respuesta ante emergencias. 8)Presentar certificados de revisión técnica y programa de seguridad vial para el uso de transporte.	No se evidencia informe anexo de PGIO al informe de interventoría ejecutivo del periodo 01 de febrero de 2026 al 03 de febrero de 2026	En los contratos N°047-2025 y No 051-2025 se suscribieron las siguientes actas: acta de suspensión de fecha 22 de diciembre de 2025 acta de reinicio de fecha 23 de enero de 2026 Acta de suspensión N°2 de fecha 04 de febrero de 2026

Eje ambiental

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1) Identificar y mitigar impactos ambientales de las actividades. 2) Ahorrar y usar eficientemente recursos (agua, energía, papel) y manejar adecuadamente los residuos. 3) Almacenar y manejar adecuadamente productos químicos según la normativa. 4)Implementar un plan de saneamiento que incluya limpieza, manejo de residuos, control de plagas y suministro de agua potable.	No se evidencia informe anexo de PGIO al informe de interventoría ejecutivo del periodo 01 de febrero de 2026 al 03 de febrero de 2026	En los contratos N°047-2025 y No 051-2025 se suscribieron las siguientes actas: acta de suspensión de fecha 22 de diciembre de 2025 acta de reinicio de fecha 23 de enero de 2026 Acta de suspensión N°2 de fecha 04 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO





Fotografía No.	01	**Fotografía No.**	02

Observaciones: No se pueden realizar actividades debido a las frecuentes y sostenidas precipitaciones.





Fotografía No.	03	**Fotografía No.**	04

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según el informe de la interventoría externa (Contrato N.º 051-2025), la firma CONINARQ certifica un avance físico del 89.67% en el contrato de obra N.º 047-2025, con corte al 28 de febrero de 2026. Cabe señalar que dicho contrato se encuentra en su segunda suspensión desde el 4 de febrero de 2026, por un término de un mes calendario.

Para constancia se firma el día 02 de marzo de 2026.



Supervisor CVS

Fecha corte informe: 28 de febrero de 2026
