CONTRATO ■ CONVENIO ☐

Proyecto (S):

LOCALIZACIÓN: Municipio: Municipio: Planeta Rica Vereda: N/A

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 16 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral, de acuerdo con la información suministrada por la interventoría CONINARQ (Contrato N°051-2025) en su informe ejecutivo N°7 correspondiente al periodo 16 de diciembre al 21 de diciembre de 2025.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO N°:	047 DE 2025
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO DE OBRA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	26 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO CAROLINA
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
OBJETO:	RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DE ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHO MIL CIENTO ONCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS MCTE ($8.111.095.014)
ANTICIPO (40%):	Si X No___ Valor: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCO PESOS MCTE ($3.244.438.005).
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION 1:	15 DE ENERO DE 2026
MODIFICACIÓN No. 1	REDUCCIÓN DE 0.5 MESES DE PLAZO
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	30 DE DICIEMBRE DE 2025

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	22/12/2025	22/01/2026
	Reinicio No. 1	**23/01/2026**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**30 DIAS**		
PRÓRROGAS:			
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:			

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	contactenos@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**11-44-101263402**			**ANEXO No**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**SI**	26/08/2025	26/06/2026	$1.622.219.002,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**SI**	26/08/2025	26/06/2026	$3.244.438.005,6
Estabilidad / Calidad / correcto funcionamiento	**SI**	5 años, 4 meses y 1 día		$1.622.219.002,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**SI**	26/08/2025	26/12/2028	$811.109.501,40
POLIZA RCE No.	**11-40101082273**			
Responsabilidad civil extracontractual	**SI**	26/08/2025	26/12/2025	$711.750.000

Póliza actualizada según otrosí N°1

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	contactenos@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**11-44-101263402**			**ANEXO No**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**SI**	15/09/2025	16/07/2026	$1.622.219.002,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**SI**	15/09/2025	16/07/2026	$3.244.438.005,6
Estabilidad / Calidad / correcto funcionamiento	**SI**	5 años, 4 meses y 1 día		$1.622.219.002,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**SI**	15/09/2025	15/01/2029	$811.109.501,40
POLIZA RCE No.	**11-40101082273**			
Responsabilidad civil extracontractual	**SI**	15/09/2025	15/01/2026	$711.750.000

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO:

MEDIO DE TRAMITE	RADICADO	ASUNTO	FECHA
SIDCAR	20252115404	Respuesta al radicado 20251111321: Solicitud de homologación de especialista en hidráulica - Contrato No. 047-2025.	1/10/2025
SIDCAR	20252115503	Citación a comité operativo conjunto Contratos No 047-2025 y N° 051-2025 - Proyecto: “RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”	2/10/2025
SIDCAR	20252115728	Respuesta al radicado	6/10/2025

		20251111455: Remisión de diseños de valla informativa para aprobación – Contrato No. 047-2025	
SIDCAR	20252116591	Notificación de actos administrativos: Resolución 1246 - Permiso de Ocupación de Cauce	20/10/2025
SIDCAR	20252117533	Solicitud de cronograma de socialización y auditorías visibles del contrato 047-2025	4/11/2025
SIDCAR	20252117557	Solicitud de información relacionada con las auditorías visibles.	5/11/2025
SIDCAR	20252118361	Notificación de fechas para el cierre presupuestal, contable y de tesorería en la CVS vigencia 2025	19/11/2025

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS


De acuerdo con la información suministrada por la interventoría externa CONINARQ (Contrato N°051-2025) en su informe ejecutivo correspondiente al periodo 16 de diciembre al 21 de diciembre de 2025, las actividades ejecutadas hasta la fecha en el contrato N°047-2025 cuyo objeto es: “RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, son las siguientes, teniendo en cuenta que en el periodo no se realizaron actividades y se suscribió el acta de suspensión con fecha 22 de diciembre de 2025:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT CONTRATADA	CANT EJECUTADA PERIODO	CANT EJECUTADA ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACTIVIDAD
1	**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
1.1	Localización, trazado y replanteo	m	8,220.00	0	8220.0	100%
2	**REALIZAR MOVIMIENTOS DE TIERRA**					
2.1	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra.	m3	146,804.43	0	130656.0	89.00%

2.2	Conformación de diques y dentellones a máquina con material de préstamo seleccionado de la excavación	m3	103,553.56	0	86985.0	84%
2.3	Retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral.	m3	56,226.13	0	50042.0	89%
3	**RECUPERACIÓN BOSQUE DE GALERÍA**					
3.1	Realizar establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería	Unid	12,544.00	0	12544	100%
3.2	Realizar Aislamiento del arreglo Forestal	km	15.8	0	15.8	100%
3.3	Realizar mantenimiento del arreglo forestal	Ha	15.8	0	0	0%
4	**REALIZAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION**					
4.1	Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos	Taller	10	0	6	60%
4.2	Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	Taller	2	0	0	0%

De acuerdo con lo anteriormente descrito, según el informe ejecutivo No 7 de la Interventoría externa, ejecutada mediante contrato de interventoría N°051-2025 por parte de la firma CONINARQ, el avance acumulado del contrato de obra N°047-2025 es del 86.39% de ejecución con corte al día 31 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta que el día 22 de diciembre de 2025 se suscribió acta de suspensión N°1 por un mes calendario.

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRAS Y/O ACTIVIDADES

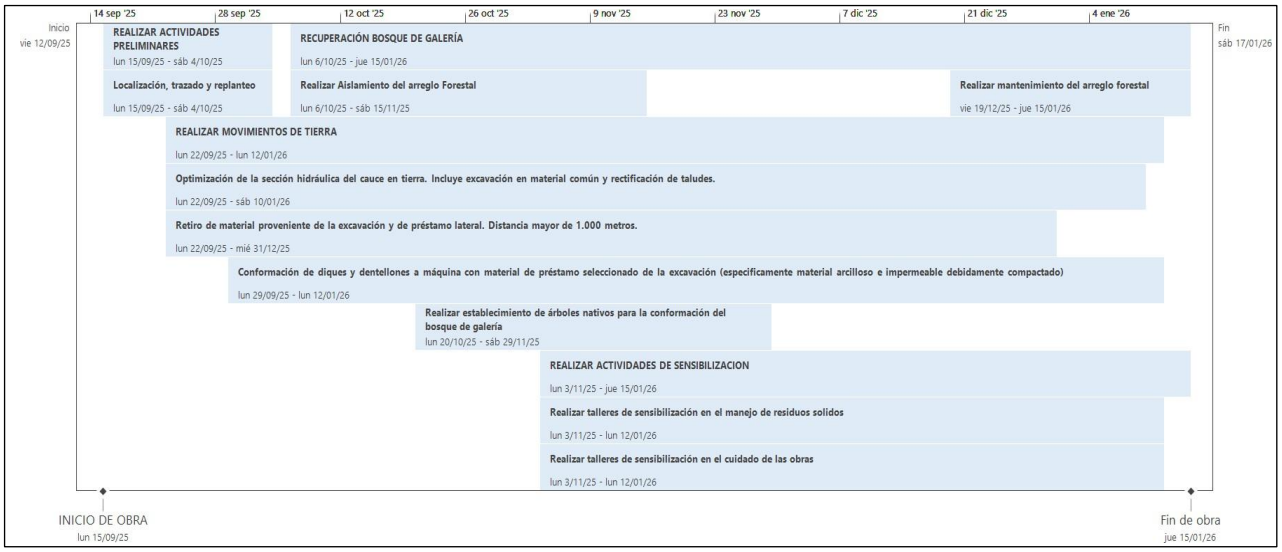

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO: $ 8.111.095.014
VALOR ANTICIPO: $ 3.244.438.005
% AVANCE FINANCIERO: 86,39%

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	29/10/2025	$3.244.438.005	$3.244.438.005	$0	$0	$3.244.438.005	$3.244.438.005	$3.244.438.005
ACTA 01	2/12/2025	$3.690.143.131	$3.690.143.131	1.476.057.252	$1.476.057.252	2.214.085.879		$5.458.523.884
ACTA 02	16/12/2025	$3.316.844.622	$3.316.844.622	$1.326.737.849	$2.802.795.101	-	1.326.737.849	$6.785.261.733

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO

Eje de calidad

REQUISITOS DE CALIDAD CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1) Asegurar que el personal tenga la educación, formación y experiencia necesarias. 2) Socializar la documentación del Sistema de Gestión Integral de la CVS con el equipo. 3) Realizar un ejercicio muestral para evaluar la satisfacción de los beneficiarios y entregar los resultados a la CVS. 4) Documentar y gestionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), informando a la CVS. 5) Asegurar que los equipos de medición tengan certificaciones de calibración iniciales y verificaciones intermedias, y entregar copias a la CVS.	No se evidencia informe anexo de PGIO al informe de interventoría ejecutivo del periodo 16 de diciembre al 21 de diciembre de 2025.	Los contratos N°047-2025 y No 051-2025 se suspendieron mediante acta de fecha 22 de diciembre de 2025

Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1) Designar un representante de seguridad y salud en el trabajo. 2) Entregar una autoevaluación anual aprobada por la ARL. 3) Presentar la matriz de riesgos y controles a la CVS. 4) Realizar inducción en seguridad y salud al equipo de trabajo. 5)Proveer y asegurar el uso correcto de elementos de protección personal. 6) Asegurar afiliación al Sistema de Seguridad Social y contar con concepto médico favorable. 7) Tener un plan de prevención y respuesta ante emergencias. 8)Presentar certificados de revisión técnica y programa de seguridad vial para el uso de transporte.	No se evidencia informe anexo de PGIO al informe de interventoría ejecutivo del periodo 16 de diciembre al 21 de diciembre de 2025.	Los contratos N°047-2025 y No 051-2025 se suspendieron mediante acta de fecha 22 de diciembre de 2025

Eje ambiental

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1) Identificar y mitigar impactos ambientales de las actividades. 2) Ahorrar y usar eficientemente recursos (agua, energía, papel) y manejar adecuadamente los residuos. 3) Almacenar y manejar adecuadamente productos químicos según la normativa. 4)Implementar un plan de saneamiento que incluya limpieza, manejo de residuos, control de plagas y suministro de agua potable.	No se evidencia informe anexo de PGIO al informe de interventoría ejecutivo del periodo 16 de diciembre al 21 de diciembre de 2025.	Los contratos N°047-2025 y No 051-2025 se suspendieron mediante acta de fecha 22 de diciembre de 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

			
Fotografía No.	01	**Fotografía No.**	02
Se evidencia la dificultad para realizar trabajos por las intensas lluvias, elevación de niveles del arroyo y saturación del terrero.			

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo manifestado en el informe ejecutivo No 7 de la Interventoría externa correspondiente al periodo 16 de diciembre al 21 de diciembre de 2025, ejecutada mediante contrato de interventoría N°051-2025 por parte de la firma CONINARQ, el avance acumulado del contrato de obra N°047-2025 es del 86.39% de ejecución con corte al día 31 de diciembre de 2025.

Así mismo se indica en el informe de interventoría relacionado, que durante este período no fue posible desarrollar actividades constructivas debido a la ocurrencia de lluvias constantes y persistentes, las cuales generaron saturación generalizada del terreno, inestabilidad en los frentes de obra y condiciones no aptas para la operación de maquinaria pesada, por lo cual el día 22 de diciembre de 2025 se suscribió acta de suspensión N°1 por un mes calendario. En ese sentido, se proyecta reiniciar las obras el día 23 de enero de 2026.

Para constancia se firma el día 03 de enero de 2026.

Supervisor CVS.

Fecha corte informe: 31 de diciembre de 2025
