FACTURA

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO SINU URBANO
NIT 901.911.834-3
TV 14C 44 12 ED VENECIA
Tel: (604) 3214459750
Montería - Colombia
pavimentocomuna7y8@gmail.com

No. FPSU 1

Señores	MUNICIPIO DE MONTERIA		
NIT	800.096.734-1	**Teléfono**	(604) 7924545 - Ext. 000
Dirección	CL 27 CR 3 ESQ	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-05-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALCALDIA DE MONTERIA DEBE A CONSORCIO SINU URBANO ACTA PARCIAL Nº 1 , CUYO OBJETO ES : PAVIMENTACION DE VIAS EN LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA .	1.00	1,658,408,478.00

Total items: 1

Total Bruto	1,658,408,478.00
Total a Pagar	1,658,408,478.00

Valor en Letras:
Mil seiscientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos ocho mil cuatrocientos setenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,658,408,478.00

Observaciones:
EL PERIODO DEL ACTA PARCIAL ES DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE ABRIL., DEL CONTRATO DE OBRA LP-SIM-035-2024.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO SINU URBANO
ASB ONASSIS CONSTRUCCIONES SAS 40%
KABOD EXECUTIVE GROUP SAS 60%

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901911834	3	CONSORCIO SINU URBANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	TV 14 C # 44 - 12 ED VENECIA	MONTERIA-CORDOBA	3214459750	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	20250314085525924021	9483099911	E	2025/03/10	2025/03/14	BANCO AV VILLAS	4	$688,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10771905	ALVAREZ BELTRAN LUIS CARLOS	231001	3	$142,350	$22,800	ESSC07	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
2	CC	11151559	BEDOYA VEGA HOLBIN GERMAN	230301	3	$146,250	$23,400	EPS037	3	$146,250	$5,900	CCF16	3	$146,250	$5,900	14-11	3	$146,250	$10,200	3	$0	$0
3	CC	78699137	BULA CASTILLO LUIS FRANCISCO	231001	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
4	CC	6881250	CASTILLO REYES RAFAEL DARIO		0	$0	$0	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
5	CC	77189860	CELEDON JARAMILLO ERWIN ANTONIO	230301	3	$146,250	$23,400	EPS005	3	$146,250	$5,900	CCF16	3	$146,250	$5,900	14-11	3	$146,250	$10,200	3	$0	$0
6	CC	1065378012	DONADO GARCIA MERLY DOMINGA	230301	3	$150,000	$24,000	ESSC07	3	$150,000	$6,000	CCF16	3	$150,000	$6,000	14-11	3	$150,000	$10,500	3	$0	$0
7	CC	15679759	DURAN ROMERO JESUS DAVID	25-14	3	$146,250	$23,400	EPS010	3	$146,250	$5,900	CCF16	3	$146,250	$5,900	14-11	3	$146,250	$10,200	3	$0	$0
8	CC	11304951	INFANTE ROA DANIEL RODRIGO		0	$0	$0	ESSC07	3	$144,560	$5,800	CCF16	3	$144,560	$5,800	14-11	3	$144,560	$10,100	3	$0	$0
9	CC	70529955	MEZA HOYOS JORGE IVAN	230201	3	$300,000	$48,000	EPS037	3	$300,000	$12,000	CCF16	3	$300,000	$12,000	14-11	3	$300,000	$20,900	3	$0	$0
10	CC	1067869373	MORALES PADILLA JORGE ELIECER	230201	3	$146,250	$23,400	EPS002	3	$146,250	$5,900	CCF16	3	$146,250	$5,900	14-11	3	$146,250	$10,200	3	$0	$0
11	CC	6874550	MUÑOZ VILLADIEGO BENETRIDE DE JESUS	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS041	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
12	CC	1073990211	NAVARRO MORELO SERGIO LUIS	230301	3	$250,000	$40,000	EPS002	3	$250,000	$10,000	CCF16	3	$250,000	$10,000	14-11	3	$250,000	$17,400	3	$0	$0
13	CC	71979619	PEREZ HOYOS IGNACIO ANTONIO		0	$0	$0	ESSC07	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
14	CC	54259957	RIVAS TAPIAS LUDDY ELENA	230301	3	$150,000	$24,000	EPS002	3	$150,000	$6,000	CCF16	3	$150,000	$6,000	14-11	3	$150,000	$10,500	3	$0	$0
15	CC	25776940	VERTEL BERROCAL ANA MARCELA	231001	3	$142,350	$22,800	EPS048	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
Total	**Afiliados(15)**					$2,004,400	$320,800			$2,433,660	$97,600			$2,433,660	$97,600			$2,433,660	$170,200		$0	$0

2025/05/09 04:56 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$320,800	$1,000	$0	$321,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$68,400	$200	$0	$68,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$46,200	$200	$0	$46,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$134,800	$400	$0	$135,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$71,400	$200	$0	$71,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$170,200	$500	$0	$170,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$170,200	$500	$0	$170,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$97,600	$300	$0	$97,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	15	$97,600	$300	$0	$97,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				15	$97,600	$700	$0	$98,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$5,700	$100	$0	$5,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$5,900	$100	$0	$6,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$23,200	$100	$0	$23,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$23,600	$100	$0	$23,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$5,700	$100	$0	$5,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$27,600	$100	$0	$27,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$5,900	$100	$0	$6,000
TOTAL				15	$686,200	$2,500	$0	$688,700

2025/05/09 04:56 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901911834	3	CONSORCIO SINU URBANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	TV 14 C # 44 - 12 ED VENECIA	MONTERIA-CORDOBA	3214459750	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1436132672	9485016270	E	2025/04/08	2025/04/28	BANCOLOMBIA	20	$7,401,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	78716183	ACOSTA REYES OVER JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
2	CC	10771905	ALVAREZ BELTRAN LUIS CARLOS	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	11151559	BEDOYA VEGA HOLBIN GERMAN	230301	30	$1,462,500	$234,000	EPS037	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
4	CC	1133601398	BOLAÑO PAEZ LUIS ALBERTO	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
5	CC	78699137	BULA CASTILLO LUIS FRANCISCO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	1068578218	CARMONA ALVAREZ LUIS EDUARDO	230301	12	$569,400	$91,200	EPS002	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
7	CC	6881250	CASTILLO REYES RAFAEL DARIO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	77189860	CELEDON JARAMILLO ERWIN ANTONIO	230301	30	$1,462,500	$234,000	EPS005	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
9	CC	1067953266	CORONADO JIMENEZ CARLOS ANDRES	230301	4	$189,800	$30,400	ESSC07	4	$189,800	$7,600	CCF16	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
10	CC	1065378012	DONADO GARCIA MERLY DOMINGA	230301	30	$1,500,000	$240,000	ESSC07	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
11	CC	15679759	DURAN ROMERO JESUS DAVID	25-14	30	$1,462,500	$234,000	EPS010	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
12	CC	78747590	FLOREZ ROSSI KERLY ROBERTO	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
13	CC	11304951	INFANTE ROA DANIEL RODRIGO		0	$0	$0	EPS048	30	$1,445,600	$57,900	CCF16	30	$1,445,600	$57,900	14-11	30	$1,445,600	$100,700	30	$0	$0
14	CC	11153972	LOPEZ ARROYO EDUARDO MANUEL	230201	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
15	CC	70529955	MEZA HOYOS JORGE IVAN	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF16	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
16	CC	1041257389	MOLINARES TORRES MAICOL ALFONSO	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
17	CC	1067869373	MORALES PADILLA JORGE ELIECER	230201	30	$1,462,500	$234,000	EPS002	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
18	CC	78744914	MORALES AVILA RICHARD ANTONIO	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS041	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
19	CC	6874550	MUÑOZ VILLADIEGO BENETRIDE DE JESUS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
20	CC	1065372758	NAVAJA MARTINEZ CRISTIAN	230201	3	$142,350	$22,800	EPS041	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
21	CC	1073990211	NAVARRO MORELO SERGIO LUIS	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
22	CC	10933564	PACHECO BORJA VICTOR MANUEL	230301	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
23	CC	71979619	PEREZ HOYOS IGNACIO ANTONIO		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
24	CC	54259957	RIVAS TAPIAS LUDDY ELENA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
25	CC	1062424815	TORRES BERNAL JUAN PABLO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
26	CC	25776940	VERTEL BERROCAL ANA MARCELA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(26)**					$21,514,950	$3,442,800			$25,807,550	$1,032,800			$25,807,550	$1,032,800			$25,807,550	$1,797,500		$0	$0

2025/05/09 04:57 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$3,442,800	$44,700	$0	$3,487,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$683,400	$8,900	$0	$692,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$492,200	$6,400	$0	$498,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$1,522,800	$19,700	$0	$1,542,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$744,400	$9,700	$0	$754,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,797,500	$23,300	$0	$1,820,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$1,797,500	$23,300	$0	$1,820,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,032,800	$13,400	$0	$1,046,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	26	$1,032,800	$13,400	$0	$1,046,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				26	$1,032,800	$13,700	$0	$1,046,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$1,900	$100	$0	$2,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$114,900	$1,500	$0	$116,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$58,500	$800	$0	$59,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$183,500	$2,400	$0	$185,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$237,400	$3,100	$0	$240,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$70,300	$1,000	$0	$71,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$305,900	$4,000	$0	$309,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$60,400	$800	$0	$61,200
TOTAL				**26**	**$7,305,900**	**$95,100**	**$0**	**$7,401,000**

2025/05/09 04:57 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901911834	3	CONSORCIO SINU URBANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	TV 14 C # 44 - 12 ED VENECIA	MONTERIA-CORDOBA	3214459750	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	9485916064	9485916064	E	2025/05/09	2025/05/12	BANCO DE BOGOTA	3	$12,688,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10771905	ALVAREZ BELTRAN LUIS CARLOS	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	10995744	ARROYO VERGARA FRANCISCO MIGUEL	Z5-14	5	$237,250	$38,000	ESSC07	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
3	CC	11151559	BEDOYA VEGA HOLBIN GERMAN	230301	30	$1,462,500	$234,000	EPS037	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
4	CC	1067905576	BERROCAL MARTINEZ CRISTIAN ENRIQUE	230201	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
5	CC	1003403234	BOHORQUEZ PEREZ ELI FABIO	Z5-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
6	CC	1003403234	BOHORQUEZ PEREZ ELI FABIO	Z5-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
7	CC	1133601398	BOLAÑO PAEZ LUIS ALBERTO	230301	23	$1,091,350	$174,700	ESSC07	23	$1,091,350	$43,700	CCF16	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
8	CC	78699137	BULA CASTILLO LUIS FRANCISCO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1068578218	CARMONA ALVAREZ LUIS EDUARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
10	CC	6881250	CASTILLO REYES RAFAEL DARIO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
11	CC	77189860	CELEDON JARAMILLO ERWIN ANTONIO	230301	30	$1,462,500	$234,000	EPS005	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
12	CC	78744930	COGOLLO EDUAR MIGUEL	231001	15	$711,750	$113,900	CCFC55	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
13	CC	1067953266	CORONADO JIMENEZ CARLOS ANDRES	230301	7	$332,150	$53,200	ESSC07	7	$332,150	$13,300	CCF16	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
14	CC	1065378012	DONADO GARCIA MERLY DOMINGA	230301	30	$1,500,000	$240,000	ESSC07	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
15	CC	15679759	DURAN ROMERO JESUS DAVID	Z5-14	30	$1,462,500	$234,000	EPS010	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
16	CC	78713391	FABRA VARGAS JORGE ELIECER	230301	9	$427,050	$68,400	EPS048	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
17	CC	73570664	GALINDO HERNANDEZ JOSE MIGUEL	230201	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
18	CC	1003099522	GARCIA SUAREZ PEDRO LUIS	230301	1	$47,450	$7,600	EPS040	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
19	CC	1003099522	GARCIA SUAREZ PEDRO LUIS	230301	3	$142,350	$22,800	EPS040	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
20	CC	1003452797	GUEVARA LADEUS JHON HECTOR	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
21	CC	1003452797	GUEVARA LADEUS JHON HECTOR	230301	8	$379,600	$60,800	ESSC24	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
22	CC	78701536	HERNANDEZ ESPITIA JOSE GREGORIO	231001	2	$94,900	$15,200	ESSC07	2	$94,900	$3,800	CCF16	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
23	CC	10772706	HOYOS MIRANDA HENRY MANUEL	230301	3	$142,350	$22,800	ESSC07	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
24	CC	11304951	INFANTE ROA DANIEL RODRIGO		0	$0	$0	EPS048	30	$1,445,600	$57,900	CCF16	30	$1,445,600	$57,900	14-11	30	$1,445,600	$100,700	30	$0	$0
25	CC	1072663878	JARAMILLO ESCOBAR DAYANA PATRICIA	231001	1	$47,450	$7,600	CCFC55	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
26	CC	1072663878	JARAMILLO ESCOBAR DAYANA PATRICIA	231001	1	$47,450	$7,600	CCFC55	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
27	CC	1124054415	LUGO AVILES JANER JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
28	CC	1124054415	LUGO AVILES JANER JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
29	CC	1124054415	LUGO AVILES JANER JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0

2025/05/12 02:23 PM

30	CC	1124054415	LUGO AVILES JANER JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
31	CC	15703840	MADERA NEGRETE RICHAR DEL CRISTO	231001	20	$949,000	$151,900	EPS041	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
32	CC	10779244	MEDINA MARTINEZ FRANCISCO MIGUEL	230201	22	$1,043,900	$167,100	EPS041	22	$1,043,900	$41,800	CCF16	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
33	CC	1067874343	MENDOZA RAMOS JOHN KENEDY	231001	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
34	CC	1067874343	MENDOZA RAMOS JOHN KENEDY	231001	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
35	CC	1133794217	MESTRA HERNANDEZ JUAN JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
36	CC	1133794217	MESTRA HERNANDEZ JUAN JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
37	CC	1137974269	MESTRA ACOSTA OVER DAVID	25-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
38	CC	70529955	MEZA HOYOS JORGE IVAN	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF16	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
39	CC	78295869	MIRANDA AYASO JAIME MANUEL	230301	9	$427,050	$68,400	ESSC07	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
40	CC	1068814577	MOGUEA ROSARIO GLEN DEIVIS	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC07	2	$94,900	$3,800	CCF16	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
41	CC	1067869373	MORALES PADILLA JORGE ELIECER	230201	30	$1,462,500	$234,000	EPS002	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
42	CC	78744914	MORALES AVILA RICHARD ANTONIO	25-14	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
43	CC	6874550	MUÑOZ VILLADIEGO BENETRIDE DE JESUS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
44	CC	1065372758	NAVAJA MARTINEZ CRISTIAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
45	CC	1073990211	NAVARRO MORELO SERGIO LUIS	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
46	CC	1064990576	NEGRETE BAENA CARLOS MARIO	230201	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
47	CC	1063649498	ORTEGA LUNA GERSON	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
48	CC	1063649498	ORTEGA LUNA GERSON	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
49	CC	10933564	PACHECO BORJA VICTOR MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
50	CC	1140884341	PADILLA SOLAR JOSE ANDRES	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF16	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
51	CC	1064307722	PALOMO BRAVO LUIS ANDRES	25-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
52	CC	1064307722	PALOMO BRAVO LUIS ANDRES	25-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
53	CC	1064307722	PALOMO BRAVO LUIS ANDRES	25-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
54	CC	1064307722	PALOMO BRAVO LUIS ANDRES	25-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
55	CC	6878868	PEÑA LALINDE PIO QUINTO	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF16	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
56	CC	1010117775	PERALTA ALVAREZ EDER LUIS	230301	23	$1,091,350	$174,700	ESSC07	23	$1,091,350	$43,700	CCF16	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
57	CC	11031303	PEREZ RAMOS ERMEN ENRIQUE	230201	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
58	CC	11031303	PEREZ RAMOS ERMEN ENRIQUE	230201	8	$379,600	$60,800	ESSC07	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
59	CC	71979619	PEREZ HOYOS IGNACIO ANTONIO		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
60	CC	1003002947	PEREZ YANEZ LUIS JAVIER	230201	9	$427,050	$68,400	EPS041	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
61	CC	54259957	RIVAS TAPIAS LUDDY ELENA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
62	CC	1066523879	RODRIGUEZ CONDE CRISTHIAN JOSE	230301	19	$901,550	$144,300	EPS010	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
63	CC	1067874360	RUIZ TORO ANGEL DE JESUS	230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
64	CC	1064986653	SANCHEZ MORALES JULIO CESAR	231001	3	$200,000	$32,000	ESSC07	3	$200,000	$8,000	CCF16	3	$200,000	$8,000	14-11	3	$200,000	$14,000	3	$0	$0
65	CC	1041256291	SANCHEZ SOTELO LUBIAN ALBERTO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
66	CC	1067883399	TERAN MESTRA ELIGIO MANUEL	230201	22	$1,043,900	$167,100	EPS005	22	$1,043,900	$41,800	CCF16	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
67	CC	10784903	VEGA OSORIO WILLIAM	Z5-14	21	$996,450	$159,500	ESSC07	21	$996,450	$39,900	CCF16	21	$996,450	$39,900	14-11	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago


68	CC	25776940	VERTEL BERROCAL ANA MARCELA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(54)**					$38,796,950	$6,209,300			$43,089,550	$1,724,800			$43,089,550	$1,724,800			$43,089,550	$3,003,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				51	$6,209,300	$12,400	$0	$6,221,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$1,026,800	$2,100	$0	$1,028,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$750,500	$1,500	$0	$752,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$2,821,700	$5,600	$0	$2,827,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,610,300	$3,200	$0	$1,613,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$3,003,600	$6,000	$0	$3,009,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	54	$3,003,600	$6,000	$0	$3,009,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$1,724,800	$3,400	$0	$1,728,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	54	$1,724,800	$3,400	$0	$1,728,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				54	$1,724,800	$3,900	$0	$1,728,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$32,300	$100	$0	$32,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$17,100	$100	$0	$17,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$132,000	$300	$0	$132,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$94,600	$200	$0	$94,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	19	$404,300	$800	$0	$405,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$275,400	$600	$0	$276,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$224,200	$500	$0	$224,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$433,200	$900	$0	$434,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$104,100	$300	$0	$104,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$7,600	$100	$0	$7,700
TOTAL				54	$12,662,500	$25,700	$0	$12,688,200

2025/05/12 02:23 PM

CONSORCIO SINU URBANO
Nit: 901911834-3



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA

Sres.
ALCALDIA DE MONTERIA
Secretaria de Infraestructura – Centro Verde
Montería - Córdoba

Yo, **ANA MARCELA VERTEL BERROCAL** identificado con la cedula de ciudadanía No. 25.776.940 de Montería, en mi condición de representante legal de CONSORCIO SINU URBANO identificada con NIT. 901.911.834-3, certifico que, durante los meses calendarios legalmente exigibles, trascurridos desde la firma del acta de inicio, febrero 28 de 2025, hasta la fecha de corte del periodo de la presente acta parcial N° 1, abril 28 de 2025, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Montería, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2025.

Agradeciendo su atención.

ANA MARCELA VERTEL BERROCAL.
C.C. 25.776.940 de Montería
REP LEG CONSORCIO SINU URBANO.
NIT: 900.371.384-9

HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO
C.C. 1.033.368.982 de Arboletes
Contadora Publica
T.P. 310289-T

Dirección: Transversal 14c # 44- 12 apto 402 torre 2- Montería Córdoba
Cel: 3214459750
Correo: pavimentocomuna7y8@gmail.com

PRE ACTA

ACTA DE PRE ENTREGA PARA PAGO PARCIAL

CONTRATO No.	LP-SIM 035-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO SINU URBANO
OBJETO	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
INTERVENTORIA No.	CMA-SIM-037-2024
APOYO A LA SUPERVISION	VICTOR MANUEL HERNANDEZ
FECHA FINAL	28 DE DICIEMBRE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	3 DE MAYO 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICION ORIGINAL	CONDICION ACTUALIZADA	CANTIDAD PROYECTADA PARA COBRO ACTA No.1	CANTIDAD VERIFICADA
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	467,280		0,00	
1,02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	56,000		0,00	
1,03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	M	1495,840		0,00	
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	571,390		0,00	
1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	11265,60		0,00	
1,07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	1800,25		0,00	
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	18257,01		0,00	
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	36,00		0,00	
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	103,00		0,00	
1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	8,00		0,00	
1,12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	1470,00		0,00	
2. SUBRASANTE Y SUBBASE						
2,01	TERRAPLENES	M3	2664,63		0,00	
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	1800,25		0,00	
2,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	10235,68		0,00	
2,04	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	5117,84		0,00	
2,05	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE YCAPAS GRANULARES	M2	27829,53		0,00	
3. PAVIMENTO Y BORDILLOS						
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	4800,66		336,57	
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	30,00		0,00	
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	2948,74		0,00	
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	23884,56		0,00	
4. SEÑALIZACION						
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	69,00		0,00	
4,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	6,00		0,00	

ACTA DE PRE ENTREGA PARA PAGO PARCIAL

CONTRATO No.	LP-SIM 035-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO SINU URBANO
OBJETO	PAVIMENTACIÓN DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
INTERVENTORIA No.	CMA-SIM-037-2024
APOYO A LA SUPERVISION	VICTOR MANUEL HERNANDEZ
FECHA FINAL	28 DE DICIEMBRE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	3 DE MAYO 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICION ORIGINAL	CONDICION ACTUALIZADA	CANTIDAD PROYECTADA PARA COBRO ACTA No.1	CANTIDAD VERIFICADA
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M2	662,45		0,00	
4,04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M	11478,71		0,00	
4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	224,50		0,00	
5. ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS						
5,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	5031,74		0,00	
5,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	5031,74		0,00	
5,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	4480,27		0,00	
5,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	95,00		0,00	
5,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	87,00		0,00	
5,06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	364,00		0,00	
6. OTRAS ACTIVIDADES						
6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	265,50		0,00	
6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	177,00		0,00	
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	177,00		0,00	
7. BOX CULVERT						
7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	467,23		0,00	
7,02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	29,64		0,00	
7,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	645,93		0,00	
7,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	186,63		0,00	
7,05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	633,23		0,00	

ACTA DE PRE ENTREGA PARA PAGO PARCIAL

CONTRATO No.	LP-SIM 035-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO SINU URBANO
OBJETO	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
INTERVENTORIA No.	CMA-SIM-037-2024
APOYO A LA SUPERVISION	VICTOR MANUEL HERNANDEZ
FECHA FINAL	28 DE DICIEMBRE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	3 DE MAYO 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICION ORIGINAL	CONDICION ACTUALIZADA	CANTIDAD PROYECTADA PARA COBRO ACTA No.1	CANTIDAD VERIFICADA
7,06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	29,64		0,00	
7,07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	5,93		0,00	
7,08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)	M3	76,14		0,00	
7,09	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	6209,52		0,00	
7,10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M	11,00		0,00	
8.REDES ELECTRICAS						
8,1	**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**				0,00	
8,1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M	2770,00		0,00	
8,1,02	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	3,00		0,00	
8,1,03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	3,00		0,00	
8,1,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	2,00		0,00	
8,1,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1,00		0,00	
8,1,06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	300,00		0,00	
8,1,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND	1,00		0,00	
8,1,08	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND	1,00		0,00	
8,1,09	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	1,00		0,00	
8,1,10	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	1,00		0,00	
8,2	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.					
8,2,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M	2770,00		0,00	
8,2,02	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	30,00		0,00	
8,2,03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	30,00		0,00	
8,2,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	20,00		0,00	
8,2,05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	500,00		0,00	
8,2,06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	1150,00		0,00	
8,2,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	4,00		0,00	

ACTA DE PRE ENTREGA PARA PAGO PARCIAL

CONTRATO No.	LP-SIM 035-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO SINU URBANO
OBJETO	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
INTERVENTORIA No.	CMA-SIM-037-2024
APOYO A LA SUPERVISION	VICTOR MANUEL HERNANDEZ
FECHA FINAL	28 DE DICIEMBRE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	3 DE MAYO 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICION ORIGINAL	CONDICION ACTUALIZADA	CANTIDAD PROYECTADA PARA COBRO ACTA No.1	CANTIDAD VERIFICADA
8,2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	3,00		0,00	
8,2,09	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	26,00		0,00	
8,2,10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	M	2260,00		0,00	
8,3	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.				0,00	
8,3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	1,00		0,00	
8,4	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.				0,00	
8,4,01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	800,00		0,00	
8,4,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	7,00		0,00	
8,4,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	15,00		0,00	

Nota 1: Las cantidades verificadas en campo y que se indican en la presente acta, corresponden única y exclusivamente a las que, por su misma naturaleza visiblemente son susceptibles de medición.

Nota 2: El porcentaje de ejecución del Contrato referenciado a fecha de la presente visita, corresponde al 10.82%.

CONSORCIO SINU URBANO
Rep. Legal:ANA MARCELA VERTEL BERROCAL
Contratista

CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
Rep. Legal: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Interventoria/Supervisor

VICTOR MANUEL HERNANDEZ
APOYO A LA SUPERVISION
SIM

ACTA PARCIAL DE CUMPLIMIENTO

ACTA PARCIAL DE OBRA No.1

CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO SINÚ URBANO
OBJETO DEL CONTRATO	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($15.436.620.455,00)
No. CDP	25000316 DEL 16 DE ENERO DE 2025 25000189 DEL 14 DE ENERO DE 2025
No. CRP	25000730 DEL 26 DE FEBRERO 2025 25000731 DEL 26 DE FEBRERO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	28 FEBRERO DE 2025
FECHA FINAL INICIAL	28 DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
PERIODO A COBRAR	DEL 28 DE FEBRERO HASTA 27 MARZO DE 2025 DEL 28 DE MARZO HASTA EL 27 DE ABRIL DE 2025

En la ciudad de Montería a los cinco (05) días del mes de mayo del año 2025 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO SINÚ URBANO,** Representado legalmente por **ANA MARCELA VERTEL BERROCAL** identificado con cédula de ciudadanía 25.776.940 expedida en Montería, el interventor **CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA**, representado legalmente por **MAURICIO FERNANDEZ PRIETO SANCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía 1.049.625.075 expedida en Tunja, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **VICTOR MANUEL HERNANDEZ**, con el propósito de dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

1. El avance de la obra es del 10.82% en el periodo a cobrar, lo cual equivale a un valor de MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.670.972.179,00), para un avance acumulado de 10.82%.

2. Teniendo en cuenta que, a la fecha de la presente acta, el contratista de obra no ha justificado los imprevistos en la presente acta cobrada, y que el valor de estos equivale a la suma total de DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE ($12.563.701,00), resulta pertinente indicar que los mismos solo serán pagados, al presentarse las justificaciones correspondientes, por tal motivo el valor a pagar en la presente acta N°1 descontando el valor del imprevisto es la suma de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.658.408.478,00).

3. El valor de la presente **ACTA PARCIAL No.1** es de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.658.408.478,00).

4. Los pagos parciales relacionados son los siguientes:

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	FECHA Y No. EGRESOS
Valor del contrato Inicial	$15.436.620.455,00		
Valor Adicional	$0		
Valor total del contrato	$15.436.620.455,00		
Acta parcial 1		$ 1.658.408.478,00	EN TRÁMITE
Saldo por ejecutar		**$ 13.778.211.977,00**	
BALANCE	**$15.436.620.455,00**	**$15.436.620.455,00**	

5. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

6. El contratista de obra declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

7. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista de obra para el personal relacionado en la propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de condiciones, como se relaciona a continuación:

MES DE FEBRERO DE 2025

ID	Nombre	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	JORGE IVAN MEZA HOYOS	70529955 de Arboletes	DIRECTOR DE OBRA	100%	$300,000	9483099911
2	SERGIO NAVARRO MORELO	1073990211 de Tierralta	RESIDENTE DE OBRA	100%	$250,000	9483099911
3	JESUS DURAN ROMERO	15679759 de planeta rica	ESTRUCTURAL	30%	$146,250	9483099911
4	HOLBIN BEDOYA VEGA	11151559 de San Carlos	ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE	30%	$146,250	9483099911
5	ERWIN CELEDON JARAMILLO	77189860 de Valledupar	HIDRAULICO	30%	$146,250	9483099911
6	JORGE MORALES PADILLA	1067869373 de Montería	GEOTECNISTA	30%	$146,250	9483099911
7	DANIEL INFANTE ROA	11304951 de Girardot Cundinamarca	FORESTAL	40%	$144,560	9483099911
8	LUDDY RIVAS TAPIAS	54259957 de Quibdó	TRABAJADORA SOCIAL	100%	$150,000	9483099911
9	MERLY DONADO GARCIA	1065378012 de Momil	SG-SST	100%	$150,000	9483099911
	PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
1	DARIO CASTILLO REYES	6881250 de Montería	MAESTRO GENERAL	100%	$142,350	9483099911
2	LUIS BULA CASTILLO	78699137 de Montería	CADENERO 1	100%	$142,350	9483099911
3	BENETRIDE MUÑOZ VILLADIEGO	6874550 de Montería	CADENERO 2	100%	$ 1.423.500	9483099911
4	LUIS ALVAREZ BELTRAN	10771905 de Montería	TOPOGRAFO	100%	$142,350	9483099911
5	IGNACIO PEREZ HOYOS	71979619 de Turbo	ALMACENISTA	100%	$142,350	9483099911
6	ANA MARCELA VERTEL B	25776940 de Montería	CONDUCTOR	100%	$142,350	9483099911

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	**03**	**13/01/2025**

MES DE MARZO DE 2025

ID	Nombre	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	JORGE IVAN MEZA HOYOS	70529955 de Arboletes	DIRECTOR DE OBRA	100%	$3,000,000	9485016270
2	SERGIO NAVARRO MORELO	1073990211 de Tierralta	RESIDENTE DE OBRA	100%	$2,500,000	9485016270
3	JESUS DURAN ROMERO	15679759 de planeta rica	ESTRUCTURAL	30%	$1,462,500	9485016270
4	HOLBIN BEDOYA VEGA	11151559 de San Carlos	ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE	30%	$1,462,500	9485016270
5	ERWIN CELEDON JARAMILLO	77189860 de Valledupar	HIDRAULICO	30%	$1,462,500	9485016270
6	JORGE MORALES PADILLA	1067869373 de Montería	GEOTECNISTA	30%	$1,462,500	9485016270
7	DANIEL INFANTE ROA	11304951 de Girardot Cundinamarca	FORESTAL	40%	$1,445,600	9485016270
8	LUDDY RIVAS TAPIAS	54259957 de Quibdó	TRABAJADORA SOCIAL	100%	$1,500,000	9485016270
9	MERLY DONADO GARCIA	1065378012 de Momil	SG-SST	100%	$1,500,000	9485016270
	PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
1	DARIO CASTILLO REYES	6881250 de Montería	MAESTRO GENERAL	100%	$1,423,500	9485016270
2	LUIS BULA CASTILLO	78699137 de Montería	CADENERO 1	100%	$1,423,500	9485016270
3	BENETRIDE MUÑOZ VILLADIEGO	6874550 de Montería	CADENERO 2	100%	$ 1.423.500	9485016270
4	LUIS ALVAREZ BELTRAN	10771905 de Montería	TOPOGRAFO	100%	$1,423,500	9485016270
5	IGNACIO PEREZ HOYOS	71979619 de Turbo	ALMACENISTA	100%	$1,423,500	9485016270
6	ANA MARCELA VERTEL B	25776940 de Montería	CONDUCTOR	100%	$1,423,500	9485016270

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

MES DE ABRIL DE 2025

ID	Nombre	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	JORGE IVAN MEZA HOYOS	70529955 de Arboletes	DIRECTOR DE OBRA	100%	$3,000,000	9485916064
2	SERGIO NAVARRO MORELO	1073990211 de Tierralta	RESIDENTE DE OBRA	100%	$2,500,000	9485916064
3	JESUS DURAN ROMERO	15679759 de planeta rica	ESTRUCTURAL	30%	$1,462,500	9485916064
4	HOLBIN BEDOYA VEGA	11151559 de San Carlos	ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE	30%	$1,462,500	9485916064
5	ERWIN CELEDON JARAMILLO	77189860 de Valledupar	HIDRAULICO	30%	$1,462,500	9485916064
6	JORGE MORALES PADILLA	1067869373 de Montería	GEOTECNISTA	30%	$1,462,500	9485916064
7	DANIEL INFANTE ROA	11304951 de Girardot Cundinamarca	FORESTAL	40%	$1,445,600	9485916064
8	LUDDY RIVAS TAPIAS	54259957 de Quibdó	TRABAJADORA SOCIAL	100%	$1,500,000	9485916064
9	MERLY DONADO GARCIA	1065378012 de Momil	SG-SST	100%	$1,500,000	9485916064
	PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
1	DARIO CASTILLO REYES	6881250 de Montería	MAESTRO GENERAL	100%	$1,423,500	9485916064
2	LUIS BULA CASTILLO	78699137 de Montería	CADENERO 1	100%	$1,423,500	9485916064
3	BENETRIDE MUÑOZ VILLADIEGO	6874550 de Montería	CADENERO 2	100%	$ 1.423.500	9485916064
4	LUIS ALVAREZ BELTRAN	10771905 de Montería	TOPOGRAFO	100%	$1,423,500	9485916064
5	IGNACIO PEREZ HOYOS	71979619 de Turbo	ALMACENISTA	100%	$1,423,500	9485916064
6	ANA MARCELA VERTEL B	25776940 de Montería	CONDUCTOR	100%	$1,423,500	9485916064

8. Que el interventor certifica que el contratista de obra aportó a la entidad municipal las garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad.

No. Póliza	Acto	Fecha del amparo inicial	No. Del anexo	Fecha del amparo final
25121 endoso 1	Contrato	06–02–2025	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO	31–12–2025
86361 endoso 3	Contrato	06–02–2025	CUMPLIMIENTO	07-12-2030
25121 endoso 2	Inicio	28–02–2025	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO	31–12–2025
86361 endoso 5	Inicio	28-02-2025	CUMPLIMIENTO	28-12-2030

9. Que en el periodo a cobrar el interventor certifica que el contratista de obra realizó y presentó los ensayos realizados en obra (si aplica), de acuerdo con los parámetros establecidos y normativa vigente y que a continuación se relacionan:

DESCRIPCIÓN ENSAYO	NORMA	CUMPLIMIENTO
ENSAYOS A MATERIAL SELECCIONADO – TERRAPLEN EL-F-SO10 LIMITE DE PLASTICIDAD	INV-125-13 & INV-126-13	SI
ENSAYOS A MATERIAL SELECCIONADO – TERRAPLEN GRANULOMETRIA DE SUELOS	INV-213-13 & INV-214-13	SI
ENSAYOS A MATERIAL SELECCIONADO – TERRAPLEN ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION PROCTOR	INV E-142-13	SI
SUBBASE EL-F-SO10 LIMITES DE PLASTICIDAD	INV-125-13 & INV-126-23	SI
SUBBASE GRANULOMETRIA DE SUELOS	INV-213-13 & INV-214-13	SI
SUBBASE – TERRAPLEN ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION PROCTOR	INV E-142-13	SI
SUBASE - RESISTENCIA A LA DEGRADACION (DESGASTE DE MAQUINA DE LOS ANGELES)	INV E-218-13	SI
SUBASE - RESISTENCIA AL AGREGADO GRUESO AL DESGASTE POR ABRASION	MICRO-DEVAL INV E – 238-13	SI
SUBASE - ENSAYO DE SOLIDEZ A LOS AGREGADOS	I.N.V.E-220	SI
SUBASE - EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELO Y AGREGADOS FINOS	INV-133-22	SI
SUBASE - ENSAYO DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS	INV E 211-13	SI
SUBASE - ENSAYO CBR MUESTRA ALTERADA SUB BABSE	INV-E-148-13	SI
SUBASE - ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION (PROCTOR)	INV E- 142-13	SI

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

TOMA DE DENSIDADES EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO Y ARENA MATERIAL SELECCIONADO, Barrio san José k0+015, y k0+030	I.N.V. E-161-13	SI
TOMA DE DENSIDADES EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO Y ARENA MATERIAL SELECCIONADO, Barrio Santa bárbara K0+005, k0+040, y k0+080	I.N.V. E-161-13	SI
TOMA DE DENSIDADES EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO Y ARENA SUBASE, Barrio Santa bárbara K0+020 CD, k0+040 EJE, y k0+090 CI	I.N.V. E-161-13	SI
TOMA DE DENSIDADES EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO Y ARENA MATERIAL SELECCIONADO, Barrio Santa bárbara K0+110 EJE, k0+040 CI, y k0+170 CD	I.N.V. E-161-13	SI
TOMA DE DENSIDADES EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO Y ARENA, SUBASE, Barrio Santa bárbara K0+120, k0+170	I.N.V. E-161-13	SI
TOMA DE DENSIDADES EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO Y ARENA, MATERIAL SELECCIONADO Y TERRAPLEN, Villa Fátima K0+020, k0+070, k0+120	I.N.V. E-161-13	SI
TOMA DE DENSIDADES EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO Y ARENA, MATERIAL SELECCIONADO Y TERRAPLEN, Villa Fátima K0+150 EJE, k0+195 CI, k0+014 EJE	I.N.V. E-161-13	SI
TOMA DE DENSIDADES EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO Y ARENA SUBASE, Villa Fátima K0+010 CI, k0+040 EJE, K0+070 CI	I.N.V. E-161-13	SI
TOMA DE DENSIDADES EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO Y ARENA SUBASE, Villa Fátima K0+015, K0+030	I.N.V. E-161-13	SI
TOMA DE DENSIDADES EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO Y ARENA MATERIAL SELECCIONADO, SUBASE K0+083, K0+117, K0+155	I.N.V. E-161-13	SI
RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO METODO DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ – CONCRETOS DEL SINU	I.N.V. E-414-13	SI
RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO METODO DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ, Barrio Santa Barbara – LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD CONTRATISTA	I.N.V. E-414-13, NTC-2871	SI

10. La Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato de interventoría manifiesta que, dado que los contratistas de obra e interventoría avalan los numerales relacionados anteriormente, y es procedente suscribir la presente acta parcial.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

CONSORCIO SINÚ URBANO
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL

CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA
MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	**03**	**13/01/2025**

VICTOR MANUEL HERNANDEZ
Apoyo a la Supervisión

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Revisó: Khalil Petro - Equipo de cuentas - Contratista SIM
Kelly Arteaga - Equipo de cuentas - Contratista SIM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

ACTA NUMERICA

		CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO LP-SIM-035-2024	FECHA DE INICIACION:	28 DE FEBRERO 2025		ACTA PARCIAL DE OBRA N°1
				PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES		
		OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE DICIEMBRE 2025		
				VALOR CONTRACTUAL	$ 15.436.620.455,00		PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N°1
		CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	VALOR PRESENTE	$ 1.670.972.179,00		DEL 26/Marzo/2025 HASTA 27/Abril/2025 DEL 26/Abril/2025 HASTA 27/Mayo/2025
		REPRESENTANTE LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1	$ 1.670.972.179,00		
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-037-2024	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 1.670.972.179,00		
VERSIÓN: 02	CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA	10,82%		FECHA DE LA PRESENTE ACTA
				% AVANCE ACUMULADO OBRA	10,82%		5/Mayo/2025
ACTA PARCIAL DE OBRA N°1		REPRESENTANTE LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ				

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA No.1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1,00	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	467,28	$ 13.856,00	$ 6.380.704,00					-	$ -
1,02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	56,00	$ 192.636,00	$ 10.786.816,00					0,00	$ -
1,03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	M	1.495,84	$ 35.387,00	$ 52.933.290,00					0,00	$ -
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	571,39	$ 30.783,00	$ 17.588.086,00					0,00	$ -
1,05	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M2	978,00	$ 33.411,00	$ 32.675.958,00					0,00	$ -
1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	11.265,60	$ 12.641,00	$ 142.406.450,00			4377,49	$ 55.336.851,00	4377,49	$ 55.336.851,00
1,07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE, PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	1.800,25	$ 25.281,00	$ 45.512.120,00			67,10	$ 1.696.355,00	67,10	$ 1.696.355,00
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	18.257,01	$ 29.316,00	$ 535.222.505,00			5471,86	$ 160.413.048,00	5471,86	$ 160.413.048,00
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	34,00	$ 430.318,00	$ 15.491.448,00					0,00	$ -
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	103,00	$ 600.152,00	$ 61.815.656,00					0,00	$ -
1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	8,00	$ 914.686,00	$ 7.317.488,00					0,00	$ -
1,12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	1.470,00	$ 122.036,00	$ 179.392.920,00					0,00	$ -
2,00	SUBRASANTE Y SUBBASE										
2,01	TERRAPLENES	M3	2.964,63	$ 91.980,00	$ 245.092.667,00			1373,10	$ 126.297.738,00	1373,10	$ 126.297.738,00
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	1.800,25	$ 220.741,00	$ 397.388.965,00			346,55	$ 76.497.794,00	346,55	$ 76.497.794,00
2,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	10.235,68	$ 107.167,00	$ 1.096.927.119,00			3986,90	$ 427.264.112,00	3986,90	$ 427.264.112,00
2,04	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	5.117,84	$ 316.542,00	$ 1.620.011.309,00			730,80	$ 231.328.894,00	730,80	$ 231.328.894,00
2,05	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE YCAPAS GRANULARES	M2	27.829,53	$ 14.150,00	$ 393.767.850,00			6376,00	$ 90.220.400,00	6376,00	$ 90.220.400,00
3,00	PAVIMENTO Y BORDILLOS										
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	4.800,66	$ 1.452.795,00	$ 6.974.374.845,00			336,57	$ 488.967.213,00	336,57	$ 488.967.213,00
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	30,00	$ 464.068,00	$ 13.922.640,00					0,00	$ -
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	2.948,74	$ 126.084,00	$ 371.768.934,00					0,00	$ -
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	23.884,56	$ 12.203,00	$ 291.483.246,00			883,40	$ 10.780.130,00	883,40	$ 10.780.130,00
4,00	SEÑALIZACION										
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	69,00	$ 576.313,00	$ 39.765.597,00					0,00	$ -
4,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	6,00	$ 840.283,00	$ 5.041.698,00					0,00	$ -
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2, (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M2	662,45	$ 93.128,00	$ 61.692.644,00					0,00	$ -
4,04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM), (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M	11.478,71	$ 8.531,00	$ 97.924.875,00					0,00	$ -
4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	224,50	$ 433.751,00	$ 97.377.100,00					0,00	$ -

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA No.1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
5,00	**ESPACIO PÚBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**										
5,01	SH TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0,20m X 0,20m X 0,06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4. INCLUYE ARENA H:+0,04 m., RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0,20m Y JUNTAS SELLADAS	M	5.031,74	$ 56.122,00	$ 282.391.312,00					0,00	$ -
5,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H:+4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	5.031,74	$ 49.726,00	$ 250.218.367,00					0,00	$ -
5,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M2	4.480,27	$ 139.718,00	$ 625.974.364,00					0,00	$ -
5,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	95,00	$ 1.130.234,00	$ 107.372.230,00					0,00	$ -
5,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	87,00	$ 1.563.444,00	$ 136.019.628,00					0,00	$ -
5,06	SH BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	364,00	$ 267.827,00	$ 97.489.028,00					0,00	$ -
6,00	**OTRAS ACTIVIDADES**										
6,01	SH TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	265,50	$ 79.718,00	$ 21.164.598,00					0,00	$ -
6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	177,00	$ 103.364,00	$ 18.295.428,00			21,00	$ 2.170.644,00	21,00	$ 2.170.644,00
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	177,00	$ 376.902,00	$ 66.711.654,00					0,00	$ -
7,00	**BOX CULVERT**										
7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	467,23	$ 26.978,00	$ 12.603.996,00					0,00	$ -
7,02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE: PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	29,64	$ 25.281,00	$ 749.329,00					0,00	$ -
7,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	645,93	$ 28.516,00	$ 18.936.084,00					0,00	$ -
7,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	186,63	$ 14.150,00	$ 2.640.815,00					0,00	$ -
7,05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	633,23	$ 107.167,00	$ 67.861.358,00					0,00	$ -
7,06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	29,64	$ 220.741,00	$ 6.542.763,00					0,00	$ -
7,07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	5,93	$ 756.380,00	$ 4.486.333,00					0,00	$ -
7,08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)	M3	76,14	$ 1.915.967,00	$ 145.881.727,00					0,00	$ -
7,09	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	8.209,52	$ 12.203,00	$ 75.774.773,00					0,00	$ -
7,10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M	11,00	$ 1.640.743,00	$ 18.048.173,00					0,00	$ -
8,00	**REDES ELECTRICAS**										
8,1	**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**										
8,1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M	2.770,00	$ 5.534,00	$ 15.329.180,00					0,00	$ -
8,1,02	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	3,00	$ 4.777.569,00	$ 14.332.707,00					0,00	$ -
8,1,03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	3,00	$ 942.963,00	$ 2.827.949,00					0,00	$ -
8,1,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13,2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	2,00	$ 3.292.966,00	$ 6.585.932,00					0,00	$ -
8,1,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13,2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1,00	$ 4.936.581,00	$ 4.936.581,00					0,00	$ -
8,1,06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	300,00	$ 88.177,00	$ 26.753.100,00					0,00	$ -
8,1,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND	1,00	$ 4.406.527,00	$ 4.406.527,00					0,00	$ -
8,1,08	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13,2 KV.	UND	1,00	$ 2.138.049,00	$ 2.138.049,00					0,00	$ -

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA No.1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANT	VR/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
8.1.09	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13,2 KV.	UND	1,00	$ 4,644,312.00	$ 4,644,312.00					0,00	$ -
8.1.10	INSTALACION CON TENSION A 13,2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	1,00	$ 8,230,927.00	$ 8,230,927.00					0,00	$ -
8.2	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.										
8.2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M	2,770,00	$ 2,942,00	$ 8,148,340.00					0,00	$ -
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	30,00	$ 1,005,678.00	$ 30,170,340.00					0,00	$ -
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	30,00	$ 541,191,00	$ 16,235,730.00					0,00	$ -
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	20,00	$ 753,465.00	$ 15,069,300.00					0,00	$ -
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	500,00	$ 80,556.00	$ 40,278,000.00					0,00	$ -
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	1.150,00	$ 86,754,00	$ 99.767,100.00					0,00	$ -
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	4,00	$ 1,614,099.00	$ 6,456,396.00					0,00	$ -
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	3,00	$ 2,218,106.00	$ 6,654,318.00					0,00	$ -
8.2.09	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	26,00	$ 1,071,335.00	$ 27,854,710.00					0,00	$ -
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	M	2,260,00	$ 20,322,00	$ 45,927,720.00					0,00	$ -
8.3	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13,200/240/120) VOL.										
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	1,00	$ 9.013.634,00	$ 9.013.634,00					0,00	$ -
8.4	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.				$ -					0,00	$ -
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	800,00	$ 62.932,00	$ 50.345.600,00					0,00	$ -
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	7,00	$ 975.338,00	$ 6.827.373,00					0,00	$ -
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	15,00	$ 768.436,00	$ 11.526.540,00					0,00	$ -
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 15,237,720,512,00				$ 1,670,972,179,00		$ 1,670,972,179,00
				PGIO	$ 147,341,366.00				$ -		$ -
				TRAMITE ANTE ENTIDAD AMBIENTAL	$ 45.056.578,00				$ -		
				TRAMITES Y LEGALIZACIONES (AFINA)	$ 8.500.000,00				$ -		
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 15,438,620,456,00				$ 1,670,972,179,00		$ 1,670,972,179,00
				VALOR TOTAL OBRA	$ 15,438,620,456,00				$ 1,670,972,179,00		$ 1,670,972,179,00
				ANTICIPO	0%						

BALANCE PRESUPUESTAL

VR INICIAL CONTRATO:	$	15,438,620,456,00
VR ADICIONES:	$	-
VR ACTUAL CONTRATO:	$	15,438,620,456,00

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR FACTURADO	%PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL INICIAL	%IMPREVISTO	COSTO IMPREVISTO POR ACTA	DESCUENTO IMPREVISTO	PAGO DE IMPREVISTO JUSTIFICADO	VALOR FACTURADO ACUMULADO	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	EN TRAMITE	$1,670,972,179,00	10,82%	1,00%	$12,563,701,00	$12,563,701,00		$ 1,658,408,478,00	$ 1,658,408,478,00	$ 1,658,408,478,00
2											
TOTAL			$1,670,972,179,00	10,82%		$12,563,701,00	$12,563,701,00		$1,658,408,478,00	$1,658,408,478,00	$ 1,658,408,478,00

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, el día 5 de mayo de 2025

TOTAL NETO A PAGAR: **$ 1,658,408,478,00**

SON: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

REVISADO: Ing. Hugo Martinez Rosales - Contratista SIM
REVISADO: Ing. Victor Manuel Hernandez - Contratista SIM

CONSORCIO SINÚ URBANO
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA
MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES

CARTERA TOPOGRAFICA

MORA

CAMINO:	
TRAMO:	**ESTACION:**
SUB-	**ORIG**

SIMBOLOGIA	
DC	DESPALME EN CORTE
DT	DESPALME EN TERRAPLEN
C	CORTE
T	TERRAPLEN

NOTA: Los conceptos que se incluirán en el cálculo de volúmenes aparecen subrayados. Se ha considerado el terreno ya despalmado al calcular áreas y volúmenes de corte y terraplén.

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA			10.000,00		AREAS						VOLUMENES					
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN	ELEVACIONES		ESPESORES		DESPALME		C	T	Factor de abundamiento en corte	SEMI-DISTANCIA	DESPALME		C	T	RESUMEN (ORDENADAS DE LA CURVA MASA)	
	TN	SUBRASANTE	C	T	DC	DT					DC	DT				
															0+000,000	10.000,00
0+000,000	12,676	12,350	0,33	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00								
0+010,000	12,732	12,392	0,34	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	20,09	0,00	0+010,000	10.020,09
0+020,000	12,713	12,435	0,28	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0+020,000	10.039,05
0+030,000	12,798	12,477	0,32	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	18,52	0,00	0+030,000	10.057,57
0+040,000	12,920	12,520	0,40	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	21,33	0,00	0+040,000	10.078,90
0+050,000	13,050	12,562	0,49	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	25,45	0,00	0+050,000	10.104,34
0+060,000	13,052	12,604	0,45	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	27,10	0,00	0+060,000	10.131,44
0+070,000	12,967	12,524	0,44	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	26,42	0,00	0+070,000	10.157,87
0+080,000	12,817	12,445	0,37	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	24,39	0,00	0+080,000	10.182,26
0+090,000	12,672	12,367	0,31	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0+090,000	10.202,85
0+100,000	12,650	12,337	0,31	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	19,54	0,00	0+100,000	10.222,39
0+110,000	12,633	12,307	0,33	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	19,69	0,00	0+110,000	10.242,09
0+120,000	12,663	12,278	0,39	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0+120,000	10.262,79
0+122,282	12,675	12,271	0,40	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	1,00	1,14	0,00	0,00	3,79	0,00	0+122,282	10.266,58

CAMINO:	
TRAMO:	ESTACION:
SUB-TRAMO:	ORIGE

SIMBOLOGIA	
DC	DESPALME EN CORTE
DT	DESPALME EN TERRAPLEN
C	CORTE
T	TERRAPLEN

NOTA: Los conceptos que se incluirán en el cálculo de volúmenes aparecen subrayados. Se ha considerado el terreno ya despalmado al calcular áreas y volúmenes de corte y terraplén.

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA			10.000,00		AREAS						VOLUMENES					
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES		ESPESORES		DESPALME		C	T	Factor de abundamiento en corte	SEMI-DISTANCIA	DESPALME		C	T	RESUMEN (ORDENADAS DE LA CURVA MASA)	
	TN	SUBRASANTE	C	T	DC	DT					DC	DT				
0+000,000	12,617	11,855	0,76	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00							0+000,000	10.000,00
0+010,000	12,829	11,882	0,95	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0+010,000	10.049,76
0+020,000	12,770	11,909	0,86	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0+020,000	10.102,58
0+030,000	12,717	11,936	0,78	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	47,85	0,00	0+030,000	10.150,43
0+040,000	12,677	11,963	0,71	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	43,40	0,00	0+040,000	10.193,80
0+050,000	12,648	11,939	0,71	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	41,30	0,00	0+050,000	10.235,06
0+060,000	12,660	11,915	0,74	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	41,50	0,00	0+060,000	10.276,52
0+070,000	12,585	11,891	0,69	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	41,15	0,00	0+070,000	10.317,63
0+080,000	12,553	11,867	0,69	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	40,35	0,00	0+080,000	10.357,95
0+090,000	12,567	11,843	0,72	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	40,75	0,00	0+090,000	10.398,71
0+100,000	12,528	11,819	0,71	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0+100,000	10.439,95
0+110,000	12,483	11,795	0,69	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	40,45	0,00	0+110,000	10.480,43
0+116,000	12,435	11,782	0,65	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	1,00	2,78	0,00	0,00	23,19	0,00	0+115,550	10.501,89

SAN JOSE

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\BARRIO SAN JOSE\VOLUMEN EXCAVACION SAN JOSE.txt

27/ABR/25 9:47pm Pagina 1
VIALIDAD 1

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) TERRAPLEN	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) TERRAPLEN	ORDENADA CURVA MASA
0+000.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+010.00	6.97	0.00	10.00	67.60	0.00	10,067.64
0+020.00	6.40	0.00	10.00	66.85	0.00	10,134.49
0+030.00	6.89	0.00	10.00	66.45	0.00	10,200.93
0+040.00	6.80	0.00	10.00	68.45	0.00	10,269.41
0+050.00	6.78	0.00	10.00	67.90	0.00	10,337.31
0+060.00	7.05	0.00	10.00	69.15	0.00	10,406.44
0+070.00	6.48	0.00	10.00	67.65	0.00	10,474.08
0+080.00	6.82	0.00	10.00	66.50	0.00	10,540.59
0+090.00	6.89	0.00	10.00	68.55	0.00	10,609.13
0+100.00	7.32	0.00	10.00	71.05	0.00	10,680.16
0+110.00	6.44	0.00	10.00	68.80	0.00	10,748.94
0+120.00	7.75	0.00	10.00	70.95	0.00	10,819.90
0+130.00	7.54	0.00	10.00	76.45	0.00	10,896.36
0+140.00	6.48	0.00	10.00	70.10	0.00	10,966.48
0+150.00	5.64	0.00	8.70	60.60	0.00	11,019.19

TOTAL VOLUMEN CORTE = 1,027.05m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = 0.00m3
COEF. ABUNDAMIENTO: 1.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\BARRIO SAN JOSE\VOLUMEN EXCAVACION SAN JOSE.txt

27/ABR/25 9:47pm Pagina 1
VIALIDAD 1

ESTACION	ELEVACIONES TERRENO	ELEVACIONES SUBRASANTE	ESPESORES CORTE	ESPESORES TERRAPLEN
0+000.00	12.91	11.86	1.04	----
0+010.00	12.93	11.85	1.08	----
0+020.00	12.82	11.83	0.99	----
0+030.00	12.92	11.81	1.11	----
0+040.00	12.88	11.79	1.09	----
0+050.00	12.86	11.77	1.09	----
0+060.00	12.92	11.75	1.17	----
0+070.00	12.76	11.73	1.02	----
0+080.00	12.80	11.71	1.09	----
0+090.00	12.79	11.69	1.09	----

0+100.00	12.83	11.68	1.15	----
0+110.00	12.73	11.70	1.03	----
0+120.00	13.04	11.79	1.24	----
0+130.00	13.09	11.91	1.17	----
0+140.00	13.08	12.03	1.04	----
0+148.70	13.12	12.21	0.91	----

SANTA BARBARA

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\TRAMO SANTA BARBARA\VOLUMEN REAL TRAMO 1.txt

16/MAY/25 9:02pm Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) TERRAPLEN	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) TERRAPLEN	ORDENADA CURVA MASA
0+000.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+010.00	4.36	0.00	10.00	43.50	0.00	10,043.49
0+020.00	5.58	0.00	10.00	49.70	0.00	10,093.17
0+030.00	6.19	0.00	10.00	58.85	0.00	10,152.01
0+040.00	6.25	0.00	10.00	62.20	0.00	10,214.23
0+050.00	6.31	0.00	10.00	62.80	0.00	10,277.03
0+060.00	6.10	0.00	10.00	62.05	0.00	10,339.08
0+070.00	5.94	0.00	10.00	60.20	0.00	10,399.28
0+080.00	5.88	0.00	10.00	59.10	0.00	10,458.37
0+090.00	5.59	0.00	10.00	57.35	0.00	10,515.72
0+100.00	6.41	0.00	10.00	60.00	0.00	10,575.73
0+110.00	6.09	0.00	10.00	62.50	0.00	10,638.26
0+120.00	6.14	0.00	10.00	61.15	0.00	10,699.44
0+130.00	6.01	0.00	10.00	60.75	0.00	10,760.20
0+140.00	6.04	0.00	10.00	60.25	0.00	10,820.43
0+150.00	5.71	0.00	10.00	58.75	0.00	10,879.16
0+160.00	5.56	0.00	10.00	56.35	0.00	10,935.53
0+170.00	5.40	0.00	10.00	54.80	0.00	10,990.37
0+180.00	5.54	0.00	10.00	54.70	0.00	11,045.09
0+190.00	5.16	0.00	10.00	53.50	0.00	11,098.59
0+200.00	5.72	0.00	10.00	54.40	0.00	11,153.00
0+210.00	5.17	0.00	10.00	54.45	0.00	11,207.45
0+220.00	5.58	0.00	10.00	53.75	0.00	11,261.20
0+230.00	5.58	0.00	10.00	55.80	0.00	11,317.00
0+240.00	5.58	0.00	10.00	55.80	0.00	11,372.80
0+250.00	5.58	0.00	10.00	55.80	0.00	11,428.60
0+260.00	5.58	0.00	10.00	55.80	0.00	11,484.40
0+274.00	5.58	0.00	14.00	78.12	0.00	11,562.52

TOTAL VOLUMEN CORTE = 1,562.42m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = 0.00m3
COEF. ABUNDAMIENTO: 1.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\TRAMO SANTA BARBARA\VOLUMEN REAL TRAMO 1.txt

16/MAY/25 9:02pm Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	ELEVACIONES	ESPESORES

	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	TERRAPLEN
0+000.00	12.71	12.02	0.70	----
0+010.00	12.73	12.05	0.69	----
0+020.00	12.97	12.09	0.88	----
0+030.00	13.10	12.14	0.97	----
0+040.00	13.11	12.16	0.96	----
0+050.00	13.15	12.18	0.97	----
0+060.00	13.13	12.20	0.93	----
0+070.00	13.14	12.22	0.92	----
0+080.00	13.15	12.24	0.91	----
0+090.00	13.12	12.26	0.86	----
0+100.00	13.29	12.28	1.01	----
0+110.00	13.26	12.30	0.96	----
0+120.00	13.32	12.32	1.00	----
0+130.00	13.33	12.34	0.99	----
0+140.00	13.37	12.37	1.01	----
0+150.00	13.33	12.39	0.95	----
0+160.00	13.30	12.41	0.89	----
0+170.00	13.30	12.43	0.88	----
0+180.00	13.32	12.45	0.88	----
0+190.00	13.29	12.47	0.82	----
0+200.00	13.43	12.49	0.95	----
0+210.00	13.31	12.51	0.80	----
0+220.00	13.37	12.47	0.90	----
0+230.00	13.37	12.47	0.90	----
0+240.00	13.37	12.47	0.90	----
0+250.00	13.42	12.52	0.90	----
0+260.00	13.46	12.56	0.90	----
0+274.00	13.82	12.92	0.90	----

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\TRAMO SANTA BARBARA\VOLUMEN SANTA BARBARA TRAMO 2.txt

26/ABR/25 08:46am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	AREAS(M2)		DISTANCIA	VOLUMENES(M3)		ORDENADA
	CORTE	TERRAPLEN		CORTE	TERRAPLEN	CURVA MASA
0+000.00	0.00	-5.96	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+010.00	0.00	-7.13	10.00	0.00	-65.45	9,934.55
0+020.00	0.00	-6.94	10.00	0.00	-70.35	9,864.18
0+030.00	0.00	-6.87	10.00	0.00	-69.05	9,795.14
0+040.00	0.00	-6.29	10.00	0.00	-65.80	9,729.37
0+050.00	0.00	-6.46	10.00	0.00	-63.75	9,665.64
0+060.00	0.00	-6.15	10.00	0.00	-63.05	9,602.61
0+070.00	0.00	-6.37	10.00	0.00	-62.60	9,540.03
0+080.00	0.00	-5.46	10.00	0.00	-59.15	9,480.89
0+090.00	0.00	-5.21	10.00	0.00	-53.35	9,427.53
0+100.00	0.00	-5.67	10.00	0.00	-54.40	9,373.11
0+110.00	0.00	-5.38	10.00	0.00	-55.25	9,317.86
0+120.00	0.00	-4.81	10.00	0.00	-50.95	9,266.94
0+130.00	0.00	-5.38	10.00	0.00	-50.95	9,215.99
0+140.00	0.00	-6.38	10.00	0.00	-58.80	9,157.16
0+150.00	0.00	-6.38	10.00	0.00	-63.80	9,093.35
0+155.00	0.00	-5.60	5.00	0.00	-29.95	9,063.41

TOTAL VOLUMEN CORTE = 0.00m3

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -936.65m3

COEF. ABUNDAMIENTO: 1.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\TRAMO SANTA BARBARA\VOLUMEN SANTA BARBARA TRAMO 2.txt

26/ABR/25 08:46am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	ELEVACIONES		ESPESORES	
	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	TERRAPLEN
0+000.00	12.12	13.09	----	0.96
0+010.00	12.27	13.41	----	1.13
0+020.00	12.42	13.53	----	1.11
0+030.00	12.50	13.57	----	1.07
0+040.00	12.52	13.51	----	0.98
0+050.00	12.48	13.48	----	0.99
0+060.00	12.44	13.42	----	0.98
0+070.00	12.39	13.43	----	1.04
0+080.00	12.39	13.27	----	0.88

0+090.00	12.44	13.28	----	0.84
0+100.00	12.48	13.37	----	0.89
0+110.00	12.53	13.33	----	0.80
0+120.00	12.55	13.26	----	0.72
0+130.00	12.51	13.34	----	0.83
0+140.00	12.45	13.45	----	1.00
0+150.00	12.39	13.40	----	1.02
0+155.00	12.36	13.26	----	0.90

VILLA FATIMA

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\VOLUMENES MATERIAL SELECCIONADO2.txt

14/MAY/25 05:38am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	AREAS(M2)		DISTANCIA	VOLUMENES(M3)		ORDENADA
	CORTE	TERRAPLEN		CORTE	TERRAPLEN	CURVA MASA
0+000.00	0.00	-8.58	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+010.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.50	9,914.51
0+020.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,829.35
0+030.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,744.18
0+040.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,659.01
0+050.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,573.84
0+060.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,488.66
0+070.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,403.50
0+080.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,318.33
0+090.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,233.16
0+100.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,147.99
0+110.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,062.81
0+120.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	8,977.64
0+130.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	8,892.48
0+140.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	8,807.31
0+150.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	8,722.14
0+160.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	8,636.97
0+170.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	8,551.79
0+180.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	8,466.63
0+190.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	8,381.46
0+200.00	0.00	-7.20	10.00	0.00	-78.60	8,302.87
0+210.00	0.00	-7.20	10.00	0.00	-72.00	8,230.87
0+220.00	0.00	-7.20	10.00	0.00	-72.00	8,158.87

TOTAL VOLUMEN CORTE = 0.00m3

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -1,841.70m3

COEF. ABUNDAMIENTO: 1.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\VOLUMENES MATERIAL SELECCIONADO2.txt

14/MAY/25 05:38am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	ELEVACIONES		ESPESORES	
	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	TERRAPLEN
0+000.00	15.58	16.18	----	0.60
0+010.00	15.63	16.23	----	0.60
0+020.00	15.68	16.28	----	0.60

0+030.00	15.73	16.33	----	0.60
0+040.00	15.78	16.38	----	0.60
0+050.00	15.83	16.43	----	0.60
0+060.00	15.88	16.48	----	0.60
0+070.00	15.93	16.53	----	0.60
0+080.00	15.98	16.58	----	0.60
0+090.00	16.03	16.63	----	0.60
0+100.00	16.08	16.68	----	0.60
0+110.00	16.13	16.73	----	0.60
0+120.00	16.18	16.78	----	0.60
0+130.00	16.20	16.80	----	0.60
0+140.00	16.18	16.78	----	0.60
0+150.00	16.13	16.73	----	0.60
0+160.00	16.08	16.68	----	0.60
0+170.00	16.03	16.63	----	0.60
0+180.00	15.98	16.58	----	0.60
0+190.00	15.93	16.53	----	0.60
0+200.00	15.88	16.48	----	0.60
0+210.00	15.83	16.43	----	0.60
0+220.00	15.78	16.38	----	0.60

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\VOLUMENES MATERIAL DE TERRAPLEN2.txt

14/MAY/25 05:39am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	AREAS(M2)		DISTANCIA	VOLUMENES(M3)		ORDENADA
	CORTE	TERRAPLEN		CORTE	TERRAPLEN	CURVA MASA
0+080.00	0.00	-1.02	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+090.00	0.00	-2.69	10.00	0.02	-18.55	9,981.46
0+100.00	0.00	-4.19	10.00	0.00	-34.40	9,947.06
0+110.00	0.00	-6.07	10.00	0.00	-51.30	9,895.76
0+120.00	0.00	-7.86	10.00	0.00	-69.65	9,826.13
0+130.00	0.00	-8.05	10.00	0.00	-79.55	9,746.58
0+140.00	0.00	-8.01	10.00	0.00	-80.30	9,666.28
0+150.00	0.00	-8.86	10.00	0.00	-84.35	9,581.97
0+160.00	0.00	-9.10	10.00	0.00	-89.80	9,492.17
0+170.00	0.00	-9.09	10.00	0.00	-90.95	9,401.20
0+180.00	0.00	-8.71	10.00	0.00	-89.00	9,312.22
0+190.00	0.00	-7.93	10.00	0.00	-83.20	9,229.05
0+200.00	0.00	-6.31	10.00	0.00	-71.20	9,157.88
0+210.00	0.00	-4.70	10.00	0.00	-55.05	9,102.83
0+220.00	0.00	-2.62	10.00	0.00	-36.60	9,066.21

TOTAL VOLUMEN CORTE = 0.02m3

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -933.90m3

COEF. ABUNDAMIENTO: 1.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\VOLUMENES MATERIAL DE TERRAPLEN2.txt

14/MAY/25 05:39am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	ELEVACIONES		ESPESORES	
	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	TERRAPLEN
0+080.00	15.85	15.98	----	0.13
0+090.00	15.77	16.03	----	0.25
0+100.00	15.77	16.08	----	0.30
0+110.00	15.72	16.13	----	0.41
0+120.00	15.66	16.18	----	0.51
0+130.00	15.60	16.20	----	0.60
0+140.00	15.64	16.18	----	0.54
0+150.00	15.53	16.13	----	0.60
0+160.00	15.46	16.08	----	0.62
0+170.00	15.42	16.03	----	0.61
0+180.00	15.37	15.98	----	0.61

0+190.00	15.36	15.93	----	0.57
0+200.00	15.41	15.88	----	0.47
0+210.00	15.52	15.83	----	0.31
0+220.00	15.56	15.78	----	0.22

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\tramo de entrada\volumen demejoramiento de la entrada.txt

14/MAY/25 05:26am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	AREAS(M2)		DISTANCIA	VOLUMENES(M3)		ORDENADA
	CORTE	TERRAPLEN		CORTE	TERRAPLEN	CURVA MASA
0+080.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+090.00	0.00	-6.00	10.00	0.00	-60.00	9,940.03
0+100.00	0.00	-6.00	10.00	0.00	-60.00	9,880.06
0+110.00	0.00	-6.00	10.00	0.00	-60.00	9,820.09
0+120.00	0.00	-6.00	10.00	0.00	-60.00	9,760.12
0+130.00	0.00	-2.28	10.00	0.00	-41.40	9,718.75

TOTAL VOLUMEN CORTE = 0.00m3

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -281.40m3

COEF. ABUNDAMIENTO: 1.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\tramo de entrada\volumen demejoramiento de la entrada.txt

14/MAY/25 05:26am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	ELEVACIONES		ESPESORES	
	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	TERRAPLEN
0+080.00	16.17	16.77	----	0.60
0+090.00	16.20	16.80	----	0.60
0+100.00	16.23	16.83	----	0.60
0+110.00	16.26	16.86	----	0.60
0+120.00	16.29	16.89	----	0.60
0+130.00	16.47	17.07	----	0.60

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\tramo de entrada\volumen de terraplen de la entrada.txt

14/MAY/25 05:25am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	AREAS(M2)		DISTANCIA	VOLUMENES(M3)		ORDENADA
	CORTE	TERRAPLEN		CORTE	TERRAPLEN	CURVA MASA
0+080.00	0.00	-6.91	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+090.00	0.00	-7.29	10.00	0.00	-71.00	9,929.01
0+100.00	0.00	-8.72	10.00	0.00	-80.05	9,848.96
0+110.00	0.00	-10.04	10.00	0.00	-93.80	9,755.16
0+120.00	0.00	-11.07	10.00	0.00	-105.55	9,649.59
0+130.00	0.00	-6.69	10.00	0.00	-88.80	9,560.77

TOTAL VOLUMEN CORTE = 0.00m3

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -439.20m3

COEF. ABUNDAMIENTO: 1.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\tramo de entrada\volumen de terraplen de la entrada.txt

14/MAY/25 05:25am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	ELEVACIONES		ESPESORES	
	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	TERRAPLEN
0+080.00	15.56	16.17	----	0.61
0+090.00	15.56	16.20	----	0.64
0+100.00	15.52	16.23	----	0.71
0+110.00	15.41	16.26	----	0.85
0+120.00	15.36	16.29	----	0.93
0+130.00	15.37	16.47	----	1.10

MEMORIAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.1

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	5/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	1.ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO			
ITEM	1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES		UNIDAD	M3

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.1




VILLA FATIMA SALIDA A LA 41

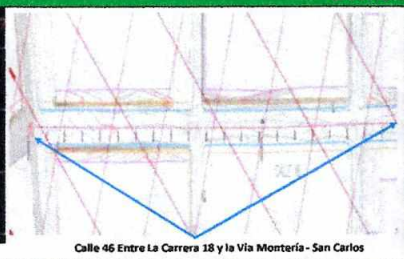

Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos



CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39



TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B


# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
	Villa Fatima Salida a la Calle 41 - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida									
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+000,00	3,12	0,00				0,00	0,00
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+005,00	3,39	5,00				16,28	16,28
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+010,00	0,88	5,00				10,66	26,95
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+015,00	0,00	5,00				2,20	29,15
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+220,00	0,00	0,00				0,00	29,15
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+225,00	1,61	5,00				4,03	33,18
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+230,00	1,90	5,00				8,78	41,95
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+235,00	1,97	5,00				9,68	51,63
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+240,00	1,84	5,00				9,53	61,15
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+245,00	1,82	5,00				9,15	70,30
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+250,00	1,75	5,00				8,98	79,23
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+255,00	1,69	5,00				8,60	87,83
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+260,00	1,52	5,00				8,03	95,85
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+265,00	1,26	5,00				6,95	102,80
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+270,00	0,97	5,00				5,58	108,38
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+275,00	0,64	5,00				4,03	112,40
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+280,00	0,42	5,00				2,65	115,05
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+285,00	0,26	5,00				1,70	116,75
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+290,00	0,00	5,00				0,65	117,40
									TOTAL	117,40
	Villa Fatima Salida a la Calle 41 - Carril de Desaceleración, Entrada									
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+000,00	0,17	0,00				0,00	0,00
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+005,00	0,19	5,00				0,90	0,90
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+010,00	0,30	5,00				1,23	2,13
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+015,00	0,47	5,00				1,93	4,05
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+020,00	0,72	5,00				2,98	7,03
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+025,00	1,01	5,00				4,33	11,35
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+030,00	1,31	5,00				5,80	17,15
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+035,00	1,69	5,00				7,50	24,65
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+040,00	2,02	5,00				9,28	33,93
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+045,00	2,16	5,00				10,45	44,38
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+050,00	2,18	5,00				10,85	55,23
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+055,00	2,20	5,00				10,95	66,18
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+060,00	2,11	5,00				10,78	76,95
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+065,00	2,10	5,00				10,53	87,48
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+070,00	1,99	5,00				10,23	97,70
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+075,00	2,38	5,00				10,93	108,63
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+080,00	0,92	5,00				8,25	116,88
									TOTAL	116,88
	Barrio Santa Barbara - Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos									
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+000,00	4,34	0				0,000	0,00
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+010,00	4,36	10,00				43,500	43,50
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+020,00	5,58	10,00				49,700	93,20
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+030,00	6,19	10,00				58,850	152,05
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+040,00	6,25	10,00				62,200	214,25
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+050,00	6,31	10,00				62,800	277,05
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+060,00	6,10	10,00				62,050	339,10
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+070,00	5,94	10,00				60,200	399,30
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+080,00	5,88	10,00				59,100	458,40
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+090,00	5,99	10,00				57,350	515,75
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+100,00	6,41	10,00				62,000	577,75
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+110,00	6,09	10,00				62,500	638,25
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+120,00	6,14	10,00				61,150	699,40
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+130,00	6,01	10,00				60,750	760,15
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+140,00	6,04	10,00				60,250	820,40
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+150,00	5,71	10,00				58,750	879,15
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+160,00	5,56	10,00				56,350	935,50
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+170,00	5,40	10,00				54,800	990,30
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+180,00	5,54	10,00				54,700	1045,00
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+190,00	5,16	10,00				53,500	1098,50
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+200,00	5,72	10,00				54,400	1152,90
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+210,00	5,17	10,00				54,450	1207,35
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+220,00	5,58	10,00				53,750	1261,10
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+230,00	5,58	10,00				55,800	1316,90
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+240,00	5,58	10,00				55,800	1372,70
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+250,00	5,58	10,00				55,800	1428,50
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+260,00	5,58	10,00				55,800	1484,30
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+274,00	5,58	14,00				78,120	1562,42
									TOTAL	1562,42

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.1


DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	5/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-030-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	1.ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO			
ITEM	1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.1

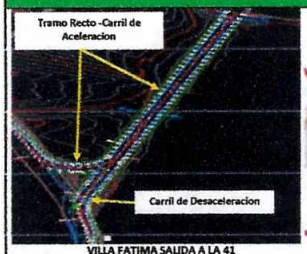

VILLA FATIMA SALIDA A LA 41

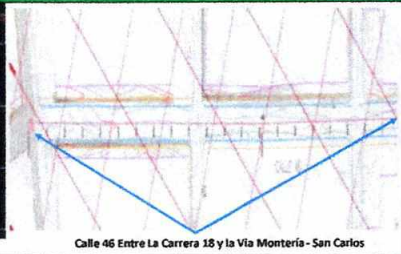
Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos


CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39


TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTURA	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
	Barrio Santa Barbara - Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48									
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+000,00	5,96	-				0,00	0,00
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+010,00	7,13	10,00				65,45	65,45
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+020,00	6,94	10,00				70,35	135,80
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+030,00	6,87	10,00				99,05	204,85
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+040,00	6,29	10,00				65,80	270,65
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+050,00	6,46	10,00				63,75	334,40
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+060,00	6,15	10,00				63,05	397,45
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+070,00	6,37	10,00				62,60	460,05
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+080,00	5,46	10,00				59,15	519,20
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+090,00	5,21	10,00				53,35	572,55
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+100,00	5,67	10,00				54,40	626,95
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+110,00	5,38	10,00				55,25	682,20
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+120,00	4,81	10,00				50,95	733,15
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+130,00	5,38	10,00				50,95	784,10
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+140,00	6,38	10,00				58,80	842,90
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+150,00	6,38	10,00				63,80	906,70
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+155,00	5,60	5,00				29,95	936,65
								TOTAL		936,65
	Barrio San José - Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39									
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+000,00	6,55	0,00				0,00	0,00
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+010,00	6,97	10,00				67,60	67,60
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+020,00	6,40	10,00				66,85	134,45
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+030,00	6,89	10,00				66,45	200,90
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+040,00	6,80	10,00				68,45	269,35
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+050,00	6,78	10,00				67,90	337,25
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+060,00	7,05	10,00				69,15	406,40
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+070,00	6,48	10,00				67,65	474,05
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+080,00	6,82	10,00				66,50	540,55
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+090,00	6,89	10,00				68,55	609,10
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+100,00	7,32	10,00				71,09	680,19
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+110,00	6,44	10,00				68,80	748,95
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+120,00	7,75	10,00				70,95	819,90
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+130,00	7,54	10,00				76,45	896,35
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+140,00	6,48	10,00				70,10	966,45
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+150,00	5,64	10,00				60,60	1027,05
								TOTAL		1027,05
	Barrio el Mora - Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B									
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+000,00	4,41	0,00				0,00	0,00
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+010,00	5,54	10,00				49,75	49,75
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+020,00	5,02	10,00				52,80	102,55
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+030,00	4,55	10,00				47,85	150,40
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+040,00	4,18	10,00				43,40	193,80
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+050,00	4,13	10,00				41,30	235,10
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+060,00	4,17	10,00				41,50	276,60
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+070,00	4,06	10,00				41,15	317,75
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+080,00	4,01	10,00				40,35	358,10
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+090,00	4,14	10,00				40,75	398,85
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+100,00	4,10	10,00				41,20	440,05
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+110,00	3,99	10,00				40,45	480,50
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+116,00	3,74	6,00				23,19	503,69
	BOCA CALLES									503,69
	Bocá calle - Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos				3,5	6,0	0,9		18,90	18,90
	Boca calle - Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos				3,5	6,0	0,9		18,90	37,80
	Boca calle - Tramo 11 - Carrera 18B Entre Calles 44A y 48				3,5	6,0	0,9		18,90	56,70
	Boca calle - Tramo 11 - Carrera 18B Entre Calles 44A y 48				3,5	6,0	0,9		18,90	75,60
	Boca calle - Tramo 11 - Carrera 18B Entre Calles 44A y 48				3,5	6,0	0,9		18,90	94,50
	Boca calle - Tramo 11 - Carrera 18B Entre Calles 44A y 48				3,5	6,0	0,9		18,90	113,40
								TOTAL		113,40
	TOTAL ÍTEM									4377,49

CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTA ACTA No.1	4.377,49


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.1


DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	5/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-032-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	1.ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO			
ITEM	1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.1



VILLA FATIMA SALIDA A LA 41

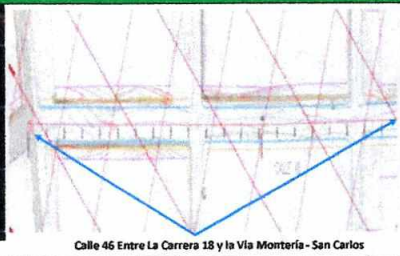
Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos

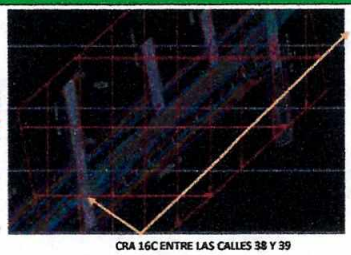
CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39


TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTU(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.1
	REGISTRO FOTOGRAFICO	









DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA PARCIAL No.1


DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	5/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				

CAPITULO	1.ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO			
ITEM	1,07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.1

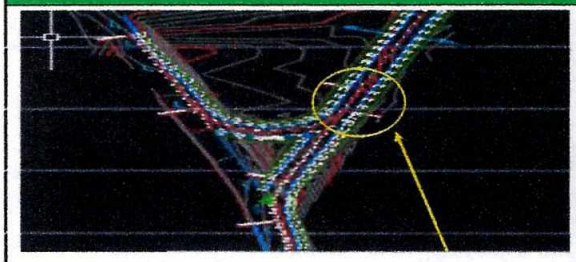

Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Abscisas K0+177 Hasta k0+183,8, Carril Izquierdo

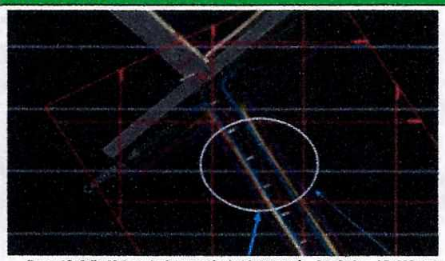

Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos - k0+030 Hasta K0+045 - Carril Izquierdo

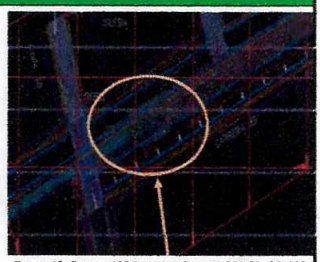

Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39 - k0+030 Hasta K0+045 - Carril Izquierdo

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+177 Hasta k0+183,8 - Carril Izquierdo		6,80	6,50	0,50		22,10	22,10
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		k0+030 Hasta K0+045 - Carril Izquierdo		15,00	3,00	0,5		22,50	44,60
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		k0+030 Hasta K0+045 - Carril Izquierdo		15,00	3,00	0,5		22,50	67,10
			TOTAL ÍTEM							67,10

CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTA ACTA No.1	67,10

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
		ACTA PARCIAL No.1
	REGISTRO FOTOGRAFICO	



Tramo: San José



Tramo: Villa Fátima



Tramo: Santa Barbara

DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.1

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	5/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	1.ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO			
ITEM	1,8	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1

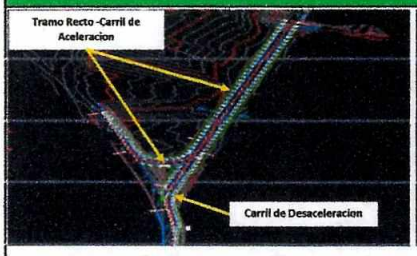


Villa Fatima Hacia La Calle 41

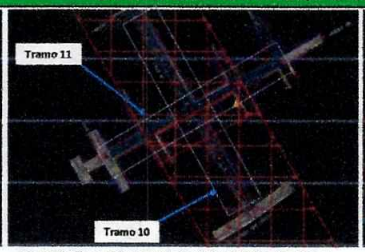

Tramo10: Calle 46 Entre LA Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos y Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48

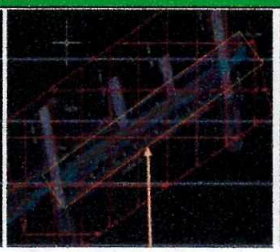

Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39



Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL. ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
	CONSOLIDADO DE TRAMOS									
	Villa Fatima Hacia La Calle 41			234,28				25,00%	292,84	292,84
	Tramo10: Calle 46 Entre LA Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos			1562,42				25,00%	1.953,03	2245,87
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48			936,65				25,00%	1.170,81	3416,68
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39			1027,05				25,00%	1.283,81	4700,49
	Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B			503,69				25,00%	629,61	5330,11
	Bocascalles Empalme Calle 46 Entre Carrera 18 y Via Montería - San Carlos y Boca calles - Tramo 11 - Carrera 18B Entre Calles 44A y 48			113,40				25,00%	141,75	5471,86
	TOTAL ÍTEM									5471,86

CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTA ACTA No.1	5.471,86


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.1

REGISTRO FOTOGRAFICO





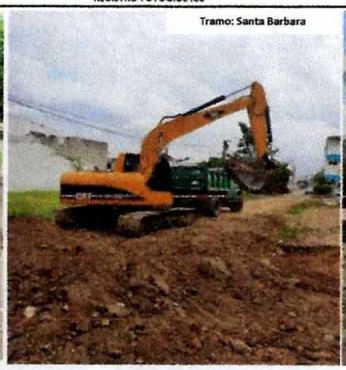

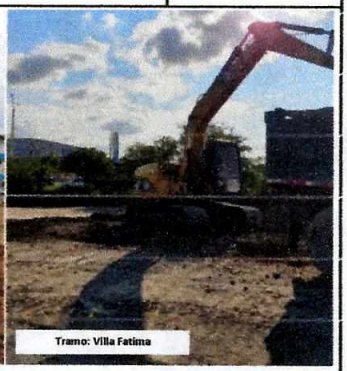

DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.1

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	5/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CIVIA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	2.SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO			
ITEM	2,01	TERRAPLENES		UNIDAD	M3

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.1

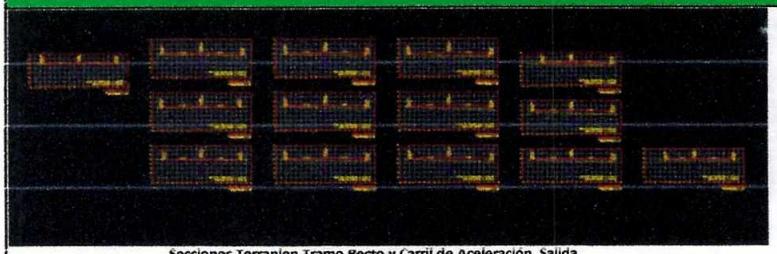

Secciones Terrapien Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida

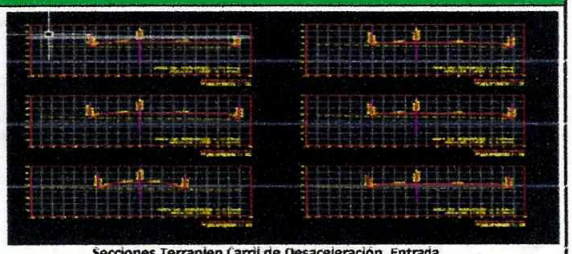

Secciones Terrapien Carril de Desaceleración, Entrada


# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
	Villa Fatima Hacia la Calle 41 - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida									
	Villa Fatima - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida		K0+080,00	1,02					0,00	0,00
	Villa Fatima - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida		K0+090,00	2,69					18,55	18,55
	Villa Fatima - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida		K0+100,00	4,19					34,40	52,95
	Villa Fatima - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida		K0+110,00	6,07					51,30	104,25
	Villa Fatima - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida		K0+120,00	7,86					69,65	173,90
	Villa Fatima - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida		K0+130,00	8,05					79,55	253,45
	Villa Fatima - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida		K0+140,00	8,01					80,30	333,75
	Villa Fatima - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida		K0+150,00	8,86					84,35	418,10
	Villa Fatima - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida		K0+160,00	9,10					89,80	507,90
	Villa Fatima - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida		K0+170,00	9,09					90,95	598,85
	Villa Fatima - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida		K0+180,00	8,71					89,00	687,85
	Villa Fatima - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida		K0+190,00	7,93					83,20	771,05
	Villa Fatima - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida		K0+200,00	6,31					71,20	842,25
	Villa Fatima - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida		K0+210,00	4,70					55,05	897,30
	Villa Fatima - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida		K0+220,00	2,62					36,60	933,90
								TOTAL	933,90	
	Villa Fatima Hacia la Calle 41 - Carril de Desaceleración, Entrada									
	Villa Fatima - Carril de Desaceleración, Entrada		K0+080,00	6,91					0,00	0,00
	Villa Fatima - Carril de Desaceleración, Entrada		K0+090,00	7,29					71,00	71,00
	Villa Fatima - Carril de Desaceleración, Entrada		K0+100,00	8,72					80,05	151,05
	Villa Fatima - Carril de Desaceleración, Entrada		K0+110,00	10,04					93,80	244,85
	Villa Fatima - Carril de Desaceleración, Entrada		K0+120,00	11,07					105,55	350,40
	Villa Fatima - Carril de Desaceleración, Entrada		K0+130,00	6,69					88,80	439,20
								TOTAL	439,20	
				TOTAL ÍTEM						1373,10

CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTA ACTA No.1	1.373,10


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.1

REGISTRO FOTOGRAFICO

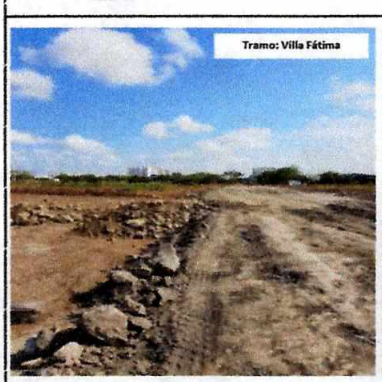



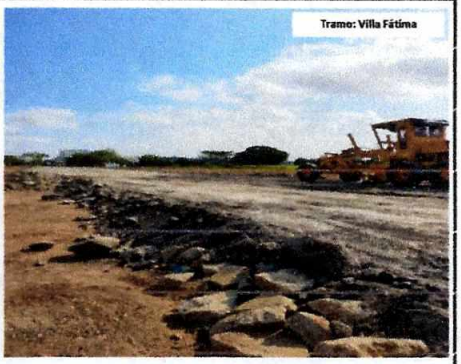

DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.1

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	5/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	2.SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO			
ITEM	2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.1

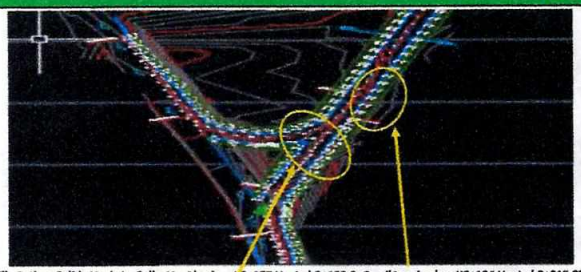

Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Abscisas K0+177 Hasta k0+183,8, Carril Izquierdo y K0+184 Hasta k0+215,05 - Ancho Calzada

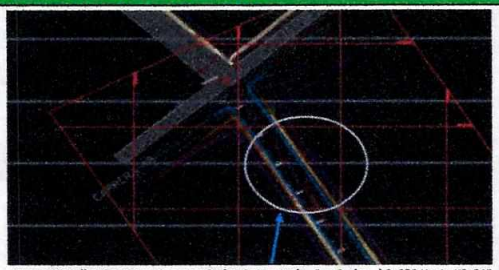

Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Vía Montería - San Carlos - k0+030 Hasta K0+045 - Carril Izquierdo



Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39 - k0+030 Hasta K0+045 - Carril Izquierdo

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+177 Hasta k0+183,8 - Carril Izquierdo		6,80	6,50	0,50		22,10	22,10
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+184 Hasta k0+215,05 - Ancho Calzada		31,05	18,00	0,5		279,45	301,55
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Vía Montería - San Carlos		k0+030 Hasta K0+045 - Carril Izquierdo		15,00	3,00	0,5		22,50	324,05
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		k0+030 Hasta K0+045 - Carril Izquierdo		15,00	3,00	0,5		22,50	346,55
			TOTAL ÍTEM							346,55

CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTA ACTA No.1	346,55

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.1

REGISTRO FOTOGRAFICO







DIRECTOR DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS	NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA		FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.1

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	5/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA SIM 037 2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAÚLICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACION MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPITULO	2 SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO			
ITEM	2,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.1




Secciones Material Seleccionado Villa Fatima, Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida + Carril de Entrada



Secciones Material Seleccionado Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Vía Montería - San Carlos + Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48



Secciones Material Seleccionado Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39



Secciones Material Seleccionado Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B

ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida									
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+000,00	8,58	0,00				0,00	0,00
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+010,00	8,52	10,00				85,50	85,50
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+020,00	8,52	10,00				85,20	170,70
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+030,00	8,52	10,00				85,20	255,90
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+040,00	8,52	10,00				85,20	341,10
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+050,00	8,52	10,00				85,20	426,30
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+060,00	8,52	10,00				85,20	511,50
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+070,00	8,52	10,00				85,20	596,70
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+080,00	8,52	10,00				85,20	681,90
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+090,00	8,52	10,00				85,20	767,10
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+100,00	8,52	10,00				85,20	852,30
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+110,00	8,52	10,00				85,20	937,50
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+120,00	8,52	10,00				85,20	1022,70
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+130,00	8,52	10,00				85,20	1107,90
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+140,00	8,52	10,00				85,20	1193,10
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+150,00	8,52	10,00				85,20	1278,30
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+160,00	8,52	10,00				85,20	1363,50
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+170,00	8,52	10,00				85,20	1448,70
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+180,00	8,52	10,00				85,20	1533,90
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+190,00	8,52	10,00				85,20	1619,10
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+200,00	7,20	10,00				78,60	1697,70
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+210,00	7,20	10,00				72,00	1769,70
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+220,00	7,20	10,00				72,00	1841,70
								Subtotal Villa Fatima - Tramo Recto y Carril de Salida		**1841,70**
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Carril de Desaceleración, Entrada									
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+080,00	6,00	0,00				0,00	0,00
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+090,00	6,00	10,00				60,00	60,00
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+100,00	6,00	10,00				60,00	120,00
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+110,00	6,00	10,00				60,00	180,00
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+120,00	6,00	10,00				60,00	240,00
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+130,00	2,28	10,00				41,40	281,40
								Subtotal Villa Fatima - Tramo Carril de Entrada		**281,40**
	CONSOLIDADO CANTIDADES									
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41, (Se anexa carteras)								2.123,10	2123,10
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Vía Montería - San Carlos		K0+000 Hasta K0+274		274,00	6,00	0,5		822,00	2945,10
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48		K0+000 Hasta K0+155		155,00	6,00	0,4		372,00	3317,10
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		K0+000 Hasta K0+150		150,00	6,00	0,4		360,00	3677,10
	Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B		K0+000 Hasta K0+116		116,00	5,50	0,4		255,20	3932,30
	Boca calle - Tramo N°10				3,50	6,00	0,5		10,50	3942,80
	Boca calle - Tramo N°10				3,50	6,00	0,5		10,50	3953,30
	Boca calle - Tramo N°11				3,50	6,00	0,4		8,40	3961,70
	Boca calle - Tramo N°11				3,50	6,00	0,4		8,40	3970,10
	Boca calle - Tramo N°11				3,50	6,00	0,4		8,40	3978,50
	Boca calle - Tramo N°11				3,50	6,00	0,4		8,40	3986,90
				TOTAL ITEM						3986,90


CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTA ACTA No.1	3.986,90

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.1

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tramo: Villa Fatima

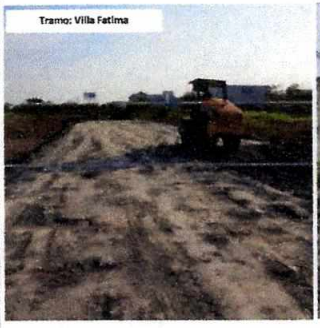


Tramo: Santa Barbara



Tramo: San Jose



Tramo: El Mora

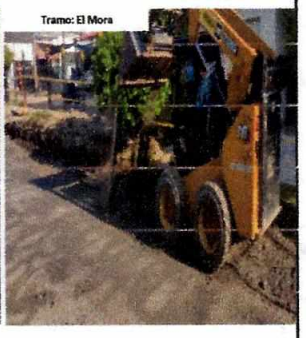

DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.1

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	5/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No:	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	2.SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO		UNIDAD	M3
ITEM	2,04	SUBBASE GRANULAR CLASE C			


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.1

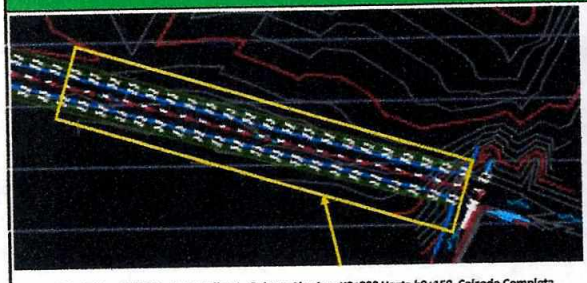

Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Subase Abscisas K0+000 Hasta k0+150, Calzada Completa



Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos - Subase Abscisas K0+000 Hasta k0+274

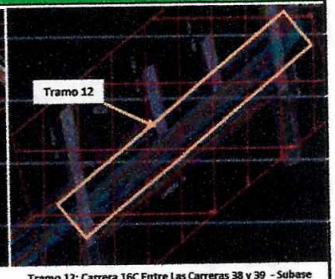

Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39 - Subase Abscisas K0+000 Hasta k0+150

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		k0+000 Hasta K0+150		150,00	7,40	0,20		222,00	222,00
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+000 Hasta K0+274		274,00	6,00	0,20		328,80	550,80
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		K0+000 Hasta K0+150		150,00	6,00	0,20		180,00	730,80
			TOTAL ÍTEM							730,80

CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTA ACTA No.1	730,80

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.1

REGISTRO FOTOGRAFICO


Tramo: Villa Fátima



Tramo: Santa Barbara



Tramo: San José

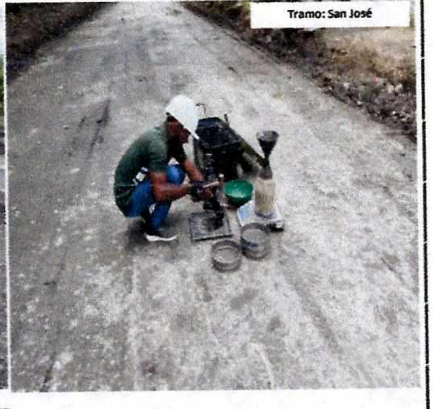

DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA PARCIAL No.1


DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	5/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				

CAPITULO	2.SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO			
ITEM	2,05	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE YCAPAS GRANULARES		UNIDAD	M2


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.1

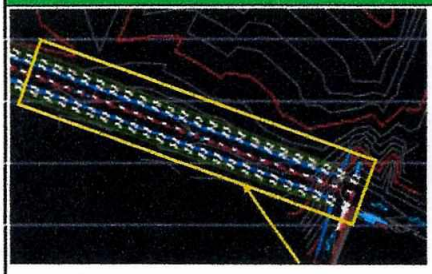

Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 Geotextil Abscisas K0+000 Hasta k0+180

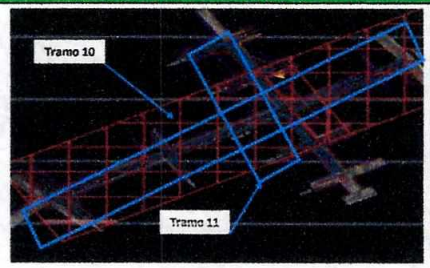

Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos, Geotextil Abscisas K0+000 Hasta k0+274 y Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48 - Geotextil Abscisas K0+000 Hasta k0+155

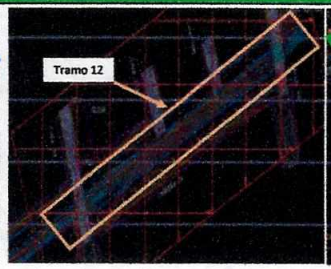

Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39 - Geotextil Abscisas K0+000 Hasta k0+150



Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B - Geotextil Abscisas K0+000 Hasta k0+116

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				AREA	AREA ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		k0+000 Hasta K0+180		180,00	7,40			1.332,00	1332,00
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+000 Hasta K0+274		274,00	7,20			1.972,80	3304,80
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48		K0+000 Hasta K0+155		155,00	7,20			1.116,00	4420,80
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		K0+000 Hasta K0+150		150,00	7,00			1.050,00	5470,80
	Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B		K0+000 Hasta K0+116		116,00	6,50			754,00	6224,80
	Boca Calle - Tramo 10				3,50	7,20			25,20	6250,00
	Boca Calle - Tramo 10				3,50	7,20			25,20	6275,20
	Boca Calle - Tramo 11				3,50	7,20			25,20	6300,40
	Boca Calle - Tramo 11				3,50	7,20			25,20	6325,60
	Boca Calle - Tramo 11				3,50	7,20			25,20	6350,80
	Boca Calle - Tramo 11				3,50	7,20			25,20	6376,00
			TOTAL ÍTEM							6376,00

CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTA ACTA No.1	6.376,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
		ACTA PARCIAL No.1

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tramo: Santa Barbara




Tramo: El Mora



Tramo: San José



Tramo: Santa Barbara

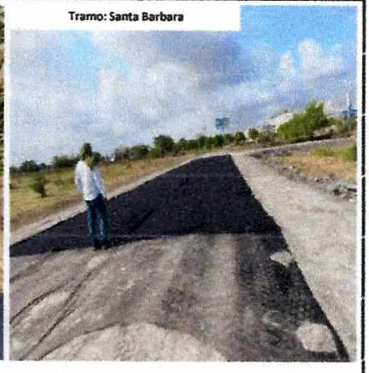

DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.1

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	5/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS	SUBCAPITULO			
ITEM	3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.1

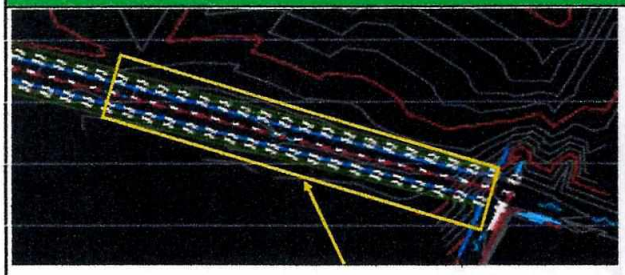

Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Concreto MR 40 kg/cm2, Abscisas K0+000 Hasta K0+152,20, Carril Derecho

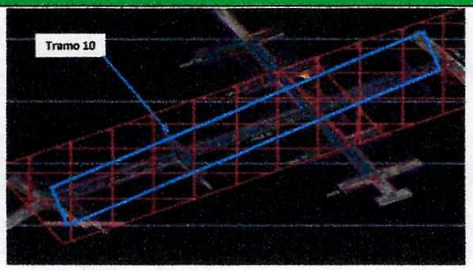

Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos - Concreto MR 40 kg/cm2 Absc K0+000 Hasta k0+182,02 Carril Izquierdo y Absc K0+000 Hasta k0+152 Carril Derecho

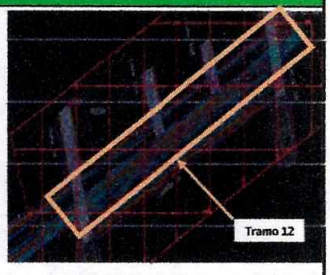

Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39 - Concreto MR 40 kg/cm2 Abscisas K0+150 Hasta k0+108, Carril Derecho

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	AREA ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)		
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+000 Hasta K0+152,20 - Carril Derecho		152,20	3,5	0,21		111,87	111,87
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+000 Hasta K0+182,02 Carril Izquierdo		182,02	3,00	0,2		109,21	221,08
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+000 Hasta K0+152 Carril Derecho		152,00	3,00	0,2		91,20	312,28
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		K0+152 Hasta K0+108 Carril Derecho		42,00	3,00	0,2		25,20	337,48
	Descuento Tapas de Pozos de Alcantarillado Tramo Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+019 - Eje de Via			1,70	0,2	- 2,27	- 0,45	337,03
	Descuento Tapas de Pozos de Alcantarillado Tramo Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+094 Eje de Via			1,70	0,2	2,27	0,45	336,57
			TOTAL ÍTEM							336,57

CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTA ACTA No.1	336,57

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.1

REGISTRO FOTOGRAFICO







DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.1

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	5/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS	SUBCAPITULO			
ITEM	3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa		UNIDAD	KG

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.1

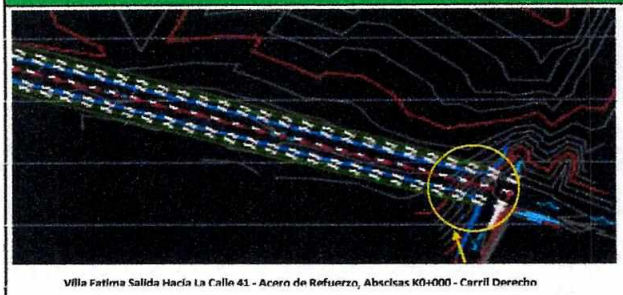

Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Acero de Refuerzo, Abscisas K0+000 - Carril Derecho

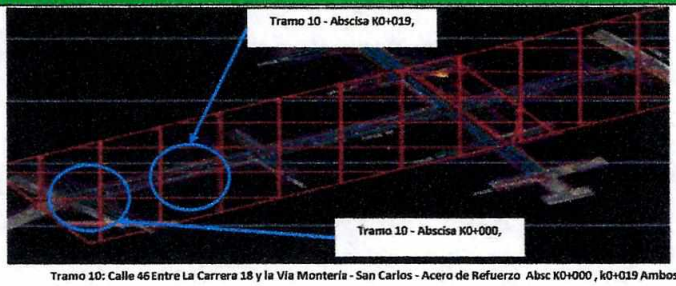

Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos - Acero de Refuerzo Absc K0+000 , k0+019 Ambos Carriles

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD DE MH	KG ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD DE LOSAS		
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+000 Hasta K0+003,7 - Carril Derecho		3,7	3,5	10,00	1,00	1,00	129,50
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+000 Hasta K0+002,9 - Carril Izquierdo		2,90	3,00	10,0	2,00	1,00	174,00
			K0+000 Hasta K0+003,2 - Carril Derecho		3,20	3,00	10,0	2,00	1,00	192,00
			K0+019 Hasta K0+025,54 - Carril Izquierdo		3,27	3,00	10,0	2,00	1,00	195,90
			K0+019 Hasta K0+025,40 - Carril Derecho		3,20	3,00	10,0	2,00	1,00	192,00
			TOTAL ÍTEM							883,40

CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTA ACTA No.1	883,40

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Tramo: Villa Fatima

ACTA PARCIAL No.1

REGISTRO FOTOGRAFICO







DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.1

DEPARTAMENTO	CORDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	5/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	**CONTRATO No.**	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	**CONTRATO No.**	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	6. OTRAS ACTIVIDADES	**SUBCAPITULO**			
ITEM	6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		**UNIDAD**	UND

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.1



Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos y Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48

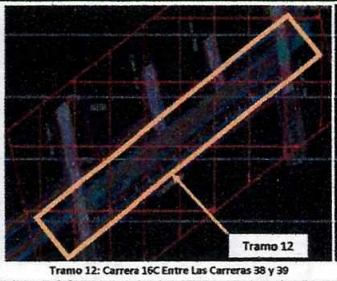

Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39



Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B


# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANT ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD DE LOSAS		
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+020						1,00	1,00
			K0+020						1,00	2,00
			K0+035						1,00	3,00
			K0+060						1,00	4,00
			K0+063						1,00	5,00
			K0+070						1,00	6,00
			K0+210						1,00	7,00
			K0+272						1,00	8,00
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48		K0+115						1,00	9,00
			K0+150						1,00	10,00
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		K0+090						1,00	11,00
			K0+115						1,00	12,00
	Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B		K0+103						2,00	14,00
			K0+085						1,00	15,00
			K0+062						1,00	16,00
			K0+038						1,00	17,00
			K0+030						1,00	18,00
			K0+023						2,00	20,00
			K0+020						1,00	21,00
			TOTAL ÍTEM							21,00

CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTA ACTA No.1	21,00


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.1

REGISTRO FOTOGRAFICO

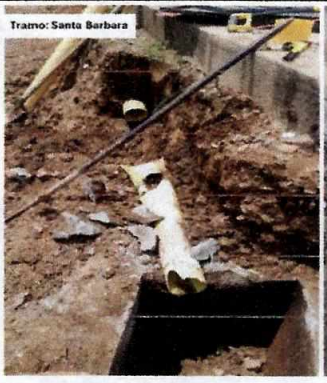



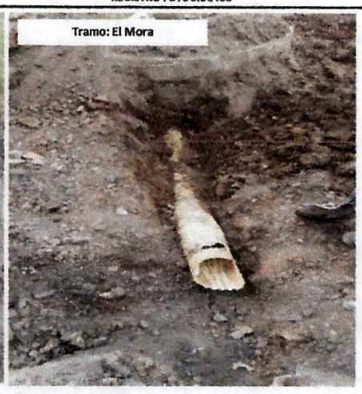



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO A COBRAR

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	10	3	2025	SEMANA No.:	1	DEL	28-feb-25	AL	8-mar-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA.	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA.	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15,436,620,455.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974,933,670.00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL:	$ 15,436,620,455.00	PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL:	$ 974,933,670.00
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA			SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA		
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	0.00% $ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$ -
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	0.00%
PARCIAL 2:	$ -		
PARCIAL 3:	$ -		
FINAL:	$ -		

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M		
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3		
1.03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M		
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2		
1.05	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2		
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	126.82	
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3		
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3		
1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND		
1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND		
1.11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND		
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND		
2.00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**			
2.01	TERRAPLENES.	M^3	793.80	
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR).	M^3	155.48	
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3		
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3		
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE YCAPAS GRANULARES.	M^2		
3.00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**			
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2).	M^3		
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND		
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M		
3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa.	KG		
4.00	**SEÑALIZACION**			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND		
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND		
4.03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2		
4.04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M		
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO.	M		
5.00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**			
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M		
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M		
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2		
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND		
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND		
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		
6.00	**OTRAS ACTIVIDADES**			
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M		
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND		
7.00	**BOX CULVERT**			
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA.	M^3		
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3		
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3		
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2		

1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3		
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3		
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3		
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3		
1.09	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa.	KG		
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M		
8.00	**REDES ELECTRICAS**			
8.1	**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**			
8.1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M		
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M		
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND		
8.1.08	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND		
8.1.09	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND		
8.1.10	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND		
8.2	**RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**			
8.2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M		
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND		
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M		
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M		
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND		
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND		
8.2.09	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND		
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M		
8.3	**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**			
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND		
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**			
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M		
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND		
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND		

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	**0.00%**	**0.00%**	
DURANTE EL PERIODO	0.05%	0.71%	**0.66%**
ACUMULADO ACTUAL	**0.05%**	**0.71%**	



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Control de precipitaciones.
Instalación de señalización PMT y socialización del tramo de vía de Villa Fátima.
Entrega de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Revisión caracterización de material de terraplén.
Revisión de documentación Inicial.

Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el transporte, extendido y compactación de material de terraplén en el sector de villa Fátima.
Levantamientos topográficos para apertura de otro frente de trabajo.
Realización de balance de obra por tramos de acuerdo a programación de obra.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.

VII.COMPONENTE SOCIAL

Atención solicitudes de la comunidad, recepción de hojas de vida, socialización con los propietarios de algunos predios que se requieren para intervención.
Socialización sector villa Fátima

VIII.COMPONENTE PMT

Se encuentra en obra la señalización requerida.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

Villa Fátima	TRAMO 2
Excavación y retiro de material común del K0+000 al K0+220 Transporte, extendido y compactación de material de terraplén del K0+000 al K0+220 en espesores variables. Comformación de la vía Se realizó socialización del tramo de vía de villa Fátima.	

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






VII. FIRMAS

CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VARTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	17	3	2025	SEMANA No.:	2	DEL	9-mar-25	AL	15-mar-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15,436,620,455.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974,933,670.00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15,436,620,455.00	PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 974,933,670.00
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA			SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA		
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0.00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	-
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	0.00%	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M		
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3		
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M		
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2		
1.05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2		
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	341.18	295.00
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3		
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3		
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND		
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND		
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND		
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND		
2.00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**			
2.01	TERRAPLENES.	M^3	1470.00	2377.00
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M^2	103.52	222.52
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3		
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3		
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YCAPAS GRANULARES.	M^2		
3.00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**			
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2).	M^3		
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND		
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M		
3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa.	KG		
4.00	**SEÑALIZACIÓN**			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND		
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND		
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2		
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M		
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO.	M		
5.00	**ESPACIO PÚBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**			
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M		
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M		
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2		
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND		
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND		
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		
6.00	**OTRAS ACTIVIDADES**			
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M		
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND		
7.00	**BOX CULVERT**			
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3		
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3		
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3		
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2		

1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3		
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3		
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3		
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3		
1.09	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa.	KG		
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M		
8.00	**REDES ELÉCTRICAS**			
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**			
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M		
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M		
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND		
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND		
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND		
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND		
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**			
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M		
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND		
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M		
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M		
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND		
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND		
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND		
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M		
8.3	**SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.**			
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND		
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**			
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M		
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND		
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND		

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	**0.05%**	**0.71%**	**1.66%**
DURANTE EL PERIODO	0.05%	1.05%	
ACUMULADO ACTUAL	**0.10%**	**1.76%**	



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Control de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Conformación de Vía.
Control de la calidad del material de terraplén recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de comité de seguimiento en las instalaciones de la alcaldía el día 11 de Marzo de 2025.

Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el transporte, extendido y compactación de material de terraplén en el sector de villa Fátima.
Levantamientos topográficos para apertura de otro frente de trabajo.
Realización de balance de obra por tramos de acuerdo a programación de obra.
Realización de densidades a tramo cereado de terraplén.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.

VII.COMPONENTE SOCIAL

Atención solicitudes de la comunidad

VIII.COMPONENTE PMT

Se encuentra en obra la señalización requerida.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

Villa Fátima	TRAMO 2
- Excavación y retiro de material común del K0+000 al K0+040 (retorno) - Transporte, extendido y compactación de material de terraplén del K0+000 al K0+220 en espesores variables y del K0+000 al K0+040 del retorno, igualmente en espesores variables. - Transporte e instalación de piedra rajón del K0+000 al K0+040 del retorno. NOTA: Las cantidades de movimientos de tierra (Terraplén y piedra rajón) fueron calculadas en base a los viajes recibidos en obra, estos serán reajustados a las medidas reales obtenidas por topografía.	

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






VII. FIRMAS

CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					**PÁGINA**	1	DE	2
						VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA					**CÓDIGO DEL PROCESO:**	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	24	3	2025	SEMANA No.:	3	DEL	16-mar-25	AL	22-mar-25

CONTRATO DE OBRA				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15,436,620,455.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974,933,670.00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA			PRORROGA 1:	NO APLICA		
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL:	$ 15,436,620,455.00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL:	$ 974,933,670.00
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	0.00% $ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$ -
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	**0.00%**
PARCIAL 2:	$ -		
PARCIAL 3:	$ -		
FINAL:	$ -		

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M		
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3		
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M		
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2		
1.05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2		
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	550.80	845.80
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	22.10	22.10
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	744.77	744.77
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND		
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND		
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND		
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND		
2.00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**			
2.01	TERRAPLENES.	M^3	401.80	2778.80
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M^3	20.48	243.00
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	137.20	137.20
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3		
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YCAPAS GRANULARES.	M^2		
3.00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**			
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2).	M^3		
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND		
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M		
3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa.	KG		
4.00	**SEÑALIZACIÓN**			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND		
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND		
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2		
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M		
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO.	M		
5.00	**ESPACIO PÚBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**			
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M		
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M		
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2		
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND		
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND		
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		
6.00	**OTRAS ACTIVIDADES**			
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M		
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	9.00	9.00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND		
7.00	**BOX CULVERT**			
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3		
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3		
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3		
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2		

1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3		
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^2		
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^2		
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3		
1.09	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa.	KG		
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M		
8.00	**REDES ELÉCTRICAS**			
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**			
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M		
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M		
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND		
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND		
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND		
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND		
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**			
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M		
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND		
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M		
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M		
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND		
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND		
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND		
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M		
8.3	**SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.**			
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND		
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**			
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M		
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND		
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND		

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	**0.10%**	**1.76%**	**2.18%**
DURANTE EL PERIODO	0.05%	0.57%	
ACUMULADO ACTUAL	**0.15%**	**2.33%**	



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Control de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de mejoramiento

Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Transporte, extendido y compactación de material de subbase granular en el sector de villa Fátima.
Levantamientos topográficos para apertura de otro frente de trabajo.
Realización de balance de obra por tramos de acuerdo a programación de obra.
Realización de densidades a tramo cereado de mejoramiento.
Transporte e instalación de material de mejoramiento en el sector de santa barbara.
Instalación de subbase granular en el tramo de vía de santa barbara.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.

VII.COMPONENTE SOCIAL

Atención solicitudes de la comunidad.
Socialización del proyecto en el sector de santa barbara

VIII.COMPONENTE PMT

Se encuentra en obra la señalización requerida.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

Villa Fátima	SANTA BARBARA
- Transporte, extendido y compactación de material de mejoramiento del K0+160 al K0+220 y del K0+00 al K0+050. - Realización de densidades al material de mejoramiento del K0+000 al K0+160. NOTA: Las cantidades de movimientos de tierra (Terraplén y piedra rajón) fueron calculadas en base a los viajes recibidos en obra, estos serán reajustados a las medidas reales obtenidas por topografía.	- Excavación del K0+000 al K0+090 en la calle 46. - Reparación de domiciliarias. - Transporte, extendido y compactación de material de mejoramiento del K0+000 al K0+090. - Socialización del proyecto el dia 17 de Marzo de 2025.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







VII. FIRMAS

CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA				PÁGINA	1	DE	2
					VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA				CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	31	3	2025	SEMANA No.:	4	DEL	23-mar-25	AL	29-mar-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA			
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ			
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15.436.620.455,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$	974.933.670,00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025			
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$	-
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025			
PRORROGA 1:	NO APLICA			PRORROGA 1:	NO APLICA			
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15.436.620.455,00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$	974.933.670,00
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0,00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	-
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	0,00%	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M		
1,02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3		
1,03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M		
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2		
1,05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2		
1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	594,88	1696,48
1,07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0,00	22,10
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	773,34	1518,11
1,09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND		
1,10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND		
1,11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND		
1,12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND		
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE			
2.01	TERRAPLENES.	M^2	0,00	2778,80
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0,00	280,00
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	345,28	482,48
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	103,60	103,60
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	1008,00	1008,00
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS			
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^2		
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND		
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M		
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mpa.	KG		
4.00	SEÑALIZACIÓN			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND		
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND		
4,03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2		
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M		
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADA.	M		
5.00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS			
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAL. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M		
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS CELLADAS CON ARENA.	M		
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2		
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL. SARDINEL. ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND		
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND		
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		
6.00	OTRAS ACTIVIDADES			
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M		
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	9,00	9,00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND		
7.00	BOX CULVERT			
7.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA.	M^3		
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3		
7.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3		
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2		

1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3		
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3		
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3		
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3		
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG		
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M		
8.00	**REDES ELECTRICAS**			
8.1	**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**			
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M		
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M		
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND		
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND		
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND		
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND		
8.2	**RED DE BAJA TENSION (240/128) VOL.**			
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M		
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND		
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M		
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M		
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND		
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND		
8.2.09	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND		
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M		
8.3	**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**			
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	-	
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**			
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M		
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND		
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	UND		

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	0,15%	2,32%	2,63%
DURANTE EL PERIODO	0,28%	0,74%	
ACUMULADO ACTUAL	0,43%	3,06%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Control de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de mejoramiento en el sector de Villa Fátima y Santa Barbara.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños.
Continuar con transporte, extendido y compactación de material de subbase granular en el sector de villa Fátima y Santa Barbara.
Levantamientos topográficos para apertura de otro frente de trabajo.
Realización de densidades a tramo cereado de mejoramiento.
Transporte e instalación de material de mejoramiento en el sector de santa bárbara.
Comité técnico en las instalaciones de la alcaldía.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.

VII.COMPONENTE SOCIAL

Atención solicitudes de la comunidad.

VIII.COMPONENTE PMT


Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Transito.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

Villa Fátima	SANTA BARBARA
- Visita por parte de los especialistas hidráulico, geotecnia y pavimento de la interventoría. - Realización de densidades al material de mejoramiento en el K0+150, K0+195 y carril de desaceleración K0+014. - Instalacion de geotextil NT-2000 de acuerdo a recomendaciones geotécnicas descritas en los diseños. - Transporte, extendido y compactación de material de subbase granular del K0+000 al K0+060. NOTA: Las cantidades de movimientos de tierra (Terraplén y piedra rajón) fueron calculadas en base a los viajes recibidos en obra, estos serán reajustados a las medidas reales obtenidas por topografía.	- Excavación del K0+000 al K0+090 en la calle 46. - Reparación de domiciliarias. - Transporte, extendido y compactacion de material de mejoramiento del K0+000 al K0+180. - Visita por parte de los especialistas hidráulico, geotecnia y pavimento de la interventoría. - Instalación de geotextil NT-2000 de acuerdo a recomendaciones geotécnicas descritas en los diseños.

VI. REGISTRO



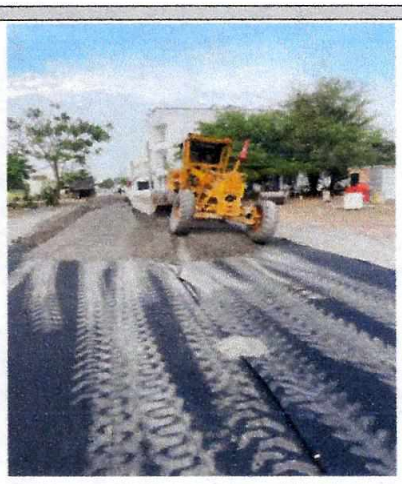



VII. FIRMAS

CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2
						VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA					CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	7	4	2025	SEMANA No.:	5	DEL	30-mar-25	AL	5-Abr-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15.436.620.455,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974.933.670,00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15.436.620.455,00	PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 974.933.670,00
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA			SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA		
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0,00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	-
PARCIAL 1:	$ -				
PARCIAL 2:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	0,00%	
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M		
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3		
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M		
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2		
1.05	REMOCIÓN MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2		
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	594,88	2664,90
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0,00	22,10
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	1946,23	3464,34
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND		
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND		
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND		
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND		
2.00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**			
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0,00	2665,60
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0,00	280,00
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	679,00	1161,48
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^2	140,40	244,00
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	1352,40	2380,40
3.00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**			
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3		
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND		
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M		
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG		
4.00	**SEÑALIZACIÓN**			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND		
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND		
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2		
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M		
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M		
5.00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**			
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAL. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M		
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS CELLADAS CON ARENA.	M		
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2		
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND		
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND		
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		
6.00	**OTRAS ACTIVIDADES**			
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M		
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	2,00	11,00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND		
7.00	**BOX CULVERT**			
7.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3		
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3		
7.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3		
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2		

7.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3		
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3		
7.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3		
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3		
7.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG		
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M		
8.00	**REDES ELÉCTRICAS**			
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**			
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M		
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M		
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND		
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND		
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND		
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND		
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**			
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M		
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND		
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M		
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M		
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND		
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND		
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND		
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M		
8.3	**SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.**			
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND		
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**			
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M		
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND		
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND		

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	0,79%	3,29%	3,26%
DURANTE EL PERIODO	0,39%	1,15%	
ACUMULADO ACTUAL	1,18%	4,44%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Control de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular en el sector de Villa Fátima y Santa Barbara.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños.
Continuar con transporte, extendido y compactación de material de subbase granular en el sector de villa Fátima y Santa Barbara.
Levantamientos topográficos para apertura de otro frente de trabajo.
Realización de densidades a tramo cereado de mejoramiento y subbase granular.
Transporte e instalación de material de mejoramiento en el sector de santa bárbara e inicio de vaciado de concreto hidráulico.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista

VII.COMPONENTE SOCIAL

Atención solicitudes de la comunidad.
Realización de socialización y primera piedra en el barrio san José.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Transito.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

VILLA FÁTIMA	SAN JOSÉ
- Visita por parte del consultor de la alcaldía, con el fin de evaluar y definir las sugerencias realizadas por el contratista respecto al componente geométrico e hidráulico del diseño inicial. - Realizacion de densidades al material de subbase granular en el K0+020, K0+040 y K0+090. - Instalación de geotextil NT-2000 de acuerdo a recomendaciones geotécnicas descritas en los diseños. - Transporte, extendido y compactación de material de subbase granular del K0+080 al K0+0120. - Transporte e instalación de material de mejoramiento en zona de andenes del K0+000 al K0+010. NOTA: Las cantidades de movimientos de tierra (Terraplén y piedra rajón) fueron calculadas en base a los viajes recibidos en obra, estos serán reajustados a las medidas reales obtenidas por topografía.	- Realización de socialización y primera piedra de los tramos de vías ubicados en este barrio y barrios aledaños.
SANTA BARBARA	
- Excavación del K0+195 al K0+264 de acuerdo al diseño geométrico y estructural de la vía. - Excavación del K0+080 al K0+156 de acuerdo al diseño geométrico y estructural de la vía Carrera 18b entre las calles 44a y 48. - Transporte, instalación y compactación de material de mejoramiento del K0+180 al K0+260. Transporte, instalación y compactación de material de mejoramiento del K0+080 al K0+156 en el tramo de vía de la carrera 18b entre las calles 44a y 48. - Instalación de geotextil NT-2000. - Realización de densidades al material de subbase granular en los puntos K0+010, K0+040 y K0+070. - Arreglo de cometidas de alcantarillado y acueducto.	

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VILLA FÁTIMA





SANTA BARBARA




SAN JOSÉ




NOTA: Se realiza ajuste al porcentaje programado deacuerdo a programación entregada por el contratista de acuerdo a la fecha de acta de inicio.

VII. FIRMAS

CONSORCIO SINÚ URBANO ANA MARCELA VERTEL BERROCAL R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	17	4	2025	SEMANA No.:	6	DEL	6-abr-25	AL	12-abr-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15,436,620,455.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974,933,670.00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA			PRORROGA 1:	NO APLICA		
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15,436,620,455.00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 974,933,670.00
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0.00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	-
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	0.00%	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FISICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES			0.00
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M		0.00
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3		0.00
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M		0.00
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2		0.00
1.05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2		0.00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	210.00	2874.88
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	22.10
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	262.50	3726.84
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND		0.00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND		0.00
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND		0.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND		0.00
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE			0.00
2.01	TERRAPLENES.	M^3		2865.60
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	279.48
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	210.00	1371.48
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	104.80	351.20
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	708.00	3258.00
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS			0.00
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	42.00	42.00
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND		0.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M		0.00
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	286.50	286.50
4.00	SEÑALIZACIÓN			0.00
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND		0.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND		0.00
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2		0.00
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M		0.00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M		0.00
5.00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS			0.00
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAL. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4. INCLUYE ARENA H.=0.04 m. RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M		0.00
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M		0.00
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2		0.00
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND		0.00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND		0.00
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		0.00
6.00	OTRAS ACTIVIDADES			0.00
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M		0.00
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	6.00	17.00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND		0.00
7.00	BOX CULVERT			0.00
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3		0.00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3		0.00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3		0.00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2		0.00

1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3		0.00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3		0.00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3		0.00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3		0.00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG		0.00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M		0.00
8.00	**REDES ELÉCTRICAS**			0.00
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**			0.00
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M		0.00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		0.00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		0.00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		0.00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		0.00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M		0.00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND		0.00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND		0.00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND		0.00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND		0.00
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**			0.00
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M		0.00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		0.00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		0.00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND		0.00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M		0.00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M		0.00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND		0.00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND		0.00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND		0.00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M		0.00
8.3	**SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.**			0.00
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND		0.00
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**			0.00
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M		0.00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND		0.00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	UND		0.00

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	1.18%	4.44%	3.79%
DURANTE EL PERIODO	0.39%	0.92%	
ACUMULADO ACTUAL	1.57%	5.36%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Control de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular en el sector de Villa Fátima y Santa Barbara.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión

Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños.
Continuar con transporte, extendido y compactación de material de subbase granular en el sector de villa Fátima y Santa Barbara.
Levantamientos topográficos para apertura de otro frente de trabajo.
Realización de densidades a tramo cereado de mejoramiento y subbase granular.
Transporte e instalación de material de mejoramiento en el sector de santa bárbara e inicio de vaciado de concreto hidráulico.
Inicio de Excavación en el Tramo de la CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 en el barrio San José
Continuar con el vaciado de concreto en los tramos de Santa bárbara

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Envio de informe mensual de interventoría

VII.COMPONENTE SOCIAL

Atención solicitudes de la comunidad.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Transito.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

VILLA FÁTIMA	SAN JOSÉ
- Nivelación de subbase del K0+100 al K0+160. - Esta semana no se avanzó mucho en este sector, por que se están realizando algunos ajustes menores al diseño geometrico de la via. NOTA: Las cantidades de movimientos de tierra (Terraplén y piedra rajón) fueron calculadas en base a los viajes recibidos en obra, estos serán reajustados a las medidas reales obtenidas por topografia.	**CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39** - Se realizó translado de equipos para iniciar con la excavación la proxima semana.B135.
SANTA BARBARA	
CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - Excavación desde la abscisa K0+000 a la Abscisa K0+070 - Transporte, Instalación y Compactación de Material Seleccionado del K0+000 al K0+070 - Instalación de Geotextil del K0+000 al K0+070 **CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VÍA MONTERÍA - SAN CARLOS** - Corte y figurado de acero para refuerzo de placas de sección irregular. - Vaciado de un carriel del K0+000 al K0+070.	

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VILLA FÁTIMA





SANTA BARBARA





SAN JOSÉ



NOTA: Se realiza ajuste al porcentaje programado de acuerdo a programación entregada por el contratista de acuerdo a la fecha de acta de inicio.

VII. FIRMAS

CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA				PÁGINA	1	DE	2
					VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA				CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	21	4	2025	SEMANA No.:	7	DEL	13-abr-25	AL	19-abr-25

CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO				CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA			
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL				REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ			
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$	15,436,620,455.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$	974,933,670.00
ACTA DE INICIO	28/02/2025				ACTA DE INICIO	28/02/2025			
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$	-	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$	-
TERMINACION:	28/12/2025				TERMINACION:	28/12/2025			
PRORROGA 1:	NO APLICA				PRORROGA 1:	NO APLICA			
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$	15,436,620,455.00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$	974,933,670.00
REINICIO 1:	NO APLICA				REINICIO 1:	NO APLICA			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%		0.00%	$	-
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:		$		-
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:		0.00%		
PARCIAL 2:	$ -						
PARCIAL 3:	$ -						
FINAL:	$ -						

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M		0.00
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3		0.00
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M		0.00
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2		0.00
1.05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2		0.00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	239.70	3114.58
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	22.10
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	299.63	4026.47
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND		0.00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND		0.00
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND		0.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND		0.00
2.00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**			0.00
2.01	TERRAPLENES.	M^3		2665.60
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	279.48
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^2	141.00	1512.48
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	56.00	407.20
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	329.00	3587.00
3.00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**			0.00
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	50.49	92.49
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND		0.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M		0.00
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM – 420 Mpa.	KG	324.00	610.50
4.00	**SEÑALIZACIÓN**			0.00
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND		0.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND		0.00
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2		0.00
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M		0.00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M		0.00
5.00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**			0.00
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAL. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M		0.00
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M		0.00
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2		0.00
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND		0.00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND		0.00
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		0.00
6.00	**OTRAS ACTIVIDADES**			0.00
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M		0.00
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	4.00	21.00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND		0.00
7.00	**BOX CULVERT**			0.00
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3		0.00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3		0.00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3		0.00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2		0.00

1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3		0.00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3		0.00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3		0.00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3		0.00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG		0.00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M		0.00
8.00	**REDES ELÉCTRICAS**			0.00
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**			0.00
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M		0.00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		0.00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		0.00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		0.00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		0.00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M		0.00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND		0.00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND		0.00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND		0.00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND		0.00
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**			0.00
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M		0.00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		0.00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		0.00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND		0.00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M		0.00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG	M		0.00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND		0.00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND		0.00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND		0.00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M		0.00
8.3	**SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.**			0.00
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND		0.00
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**			0.00
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M		0.00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND		0.00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	UND		0.00

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	**1.57%**	**5.36%**	**4.20%**
DURANTE EL PERIODO	0.41%	0.62%	
ACUMULADO ACTUAL	**1.98%**	**6.18%**	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Control de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular en el sector de Villa Fátima y Santa Barbara
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión

Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de San José
Continuar con transporte, extendido y compactación de material de subbase granular en el sector de Santa Barbara e iniciar la instalación en la vias del barrio san José.
Levantamientos topográficos para apertura de otro frente de trabajo.
Realización de densidades a tramo cereado de mejoramiento y subbase granular.
Transporte e instalación de material de mejoramiento en el sector de San José .
Excavación en el Tramo de la CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 en el barrio San José
Continuar con el vaciado de concreto en los tramos de Santa bárbara.
Aperturar un nuevo tramo de vía en el barrio el mora.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado.

VII.COMPONENTE SOCIAL

Atención solicitudes de la comunidad.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Transito

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

VILLA FÁTIMA	SAN JOSÉ
- Debido a que el contratista había realizado terraplenes y mejoramiento de subrasante de acuerdo a un trazado diferente al inicialmente entregado por la entidad contratante, la alcaldía de Montería definió que se debe ajustar dicho trazado a los diseños iniciales, ya que los predios por donde va dicho trazado están debidamente definidos ante notaria y no pueden ser cambiados. NOTA: Las cantidades de movimientos de tierra (Terraplén y piedra rajón) fueron calculadas en base a los viajes recibidos en obra, estos serán reajustados a las medidas reales obtenidas por topografía	**CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39** - Excavación en material común del K0+148 al K0+090. - Suministro e instalación de geotextil del K0+148 al K0+100 - Suministro, transporte e instalación de material de mejoramiento del K0+148 al K0+100.
SANTA BARBARA	
CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - Transporte e instalación de subbase granular del K0+000 al K0+190, en un espesor promedio de 12Cm. **CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VÍA MONTERÍA - SAN CARLOS** - Corte y figurado de acero para refuerzo de placas de sección irregular. - Vaciado de un carril derecho del K0+000 al K0+084.	

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


VILLA FÁTIMA

SANTA BARBARA





SAN JOSÉ

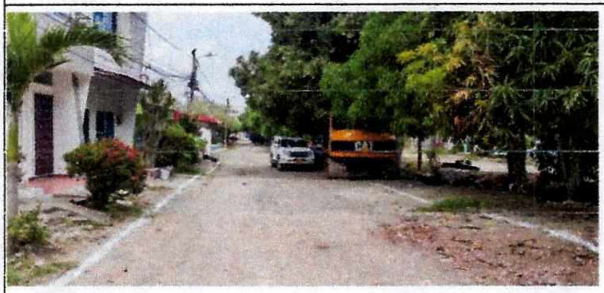


NOTA:

VII. FIRMAS

CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2
						VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA					CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	28	4	2025	SEMANA No.:	8	DEL	19-abr-25	AL	26-abr-25

CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO				CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA			
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL				REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ			
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$	15,436,620,455.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$	974,933,670.00
ACTA DE INICIO	28/02/2025				ACTA DE INICIO	28/02/2025			
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$	-	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$	-
TERMINACION:	28/12/2025				TERMINACION:	28/12/2025			
PRORROGA 1:	NO APLICA				PRORROGA 1:	NO APLICA			
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$	15,436,620,455.00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$	974,933,670.00
REINICIO 1:	NO APLICA				REINICIO 1:	NO APLICA			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%		0.00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:		$	-
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:		0.00%	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FISICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	0.00	0.00
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	0.00	0.00
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	0.00	0.00
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	0.00	0.00
1.05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0.00	0.00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	1084.41	4198.99
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	22.10
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	1166.02	5192.49
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	0.00	0.00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0.00	0.00
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0.00	0.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0.00	0.00
2.00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**		0.00	0.00
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0.00	2665.60
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	22.10	301.58
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^2	2339.42	3851.90
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	275.60	682.80
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	1882.00	5469.00
3.00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**		0.00	0.00
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	244.08	336.57
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	0.00	0.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	0.00	0.00
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mpa.	KG	272.90	683.40
4.00	**SEÑALIZACIÓN**		0.00	0.00
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	0.00	0.00
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M	0.00	0.00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M	0.00	0.00
5.00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**		0.00	0.00
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAL. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	0.00	0.00
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	0.00	0.00
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	0.00	0.00
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	0.00	0.00
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	0.00
6.00	**OTRAS ACTIVIDADES**		0.00	0.00
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	0.00	0.00
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	21.00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	UND	0.00	0.00
7.00	**BOX CULVERT**		0.00	0.00
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3	0.00	0.00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	0.00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	0.00	0.00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2	0.00	0.00

1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0.00	0.00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	0.00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3	0.00	0.00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3	0.00	0.00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0.00	0.00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M	0.00	0.00
8.00	**REDES ELÉCTRICAS**		0.00	0.00
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**		0.00	0.00
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.1.02	SUMINISTRO. INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND	0.00	0.00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0.00	0.00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0.00	0.00
8.3	**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0.00	0.00
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0.00	0.00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0.00	0.00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	**1.98%**	**6.18%**	**8.95%**
DURANTE EL PERIODO	0.37%	5.12%	
ACUMULADO ACTUAL	**2.35%**	**11.30%**	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Control de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular en el sector de Villa Fátima y Santa Barbara
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión

Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de San José y El mora
Continuar con transporte, extendido y compactación de material de subbase granular en el sector de Santa Barbara e iniciar la instalación en la vias del barrio san José.
Levantamientos topográficos para apertura de otro frente de trabajo.
Realización de densidades a tramo cereado de mejoramiento y subbase granular.
Transporte e instalación de material de mejoramiento en el sector de San José, santa bárbara y el mora.
Excavación en el Tramo de la CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 en el barrio San José, y tramo de El Mora
Continuar con el vaciado de concreto en los tramos de Santa bárbara y vaciado en el tramo de vía de villa Fátima.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado.
Participación en comités de obra

VII.COMPONENTE SOCIAL

Atención solicitudes de la comunidad.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Transito.
Se realizar algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejoral el control vehicular en los sectores intervenidos.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

VILLA FÁTIMA	SAN JOSÉ
- Reconformación de material de mejoramiento de subrasante, de acuerdo al diseño ajustado del K0+000 al K0+080. - Instalación de Subbase Granular del K0+00 al K0+080 - Visita de los especialista de la interventoría (Hidráulico, geotecnia y pavimento), los cuales sugirieron algunas acciones a tener en cuenta, como realizar el replanteo de todo el trazado de la vía, incluyendo carril de aceleración y desaceleración, continuar realizando la compactación en espesores máximos de 20 cm, teniendo especial cuidado en el empalme de la estructura construida y la ampliación. Recomiendan además al contratista evaluar con su especialista la utilización de una geomembrana que aísle la lamina de agua que se pueda general en la zona aledaña a la vía. NOTA: Las cantidades de movimientos de tierra (Terraplén y piedra rajón) fueron calculadas en base a los viajes recibidos en obra, estos serán reajustados a las medidas reales obtenidas por topografía.	**CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39** - Excavación en material común del K0+90 al K0+055. - Suministro e instalación de geotextil del K0+100 al K0+055 - Suministro, transporte e instalación de material de mejoramiento del K0+100 al K0+055. - Visita de los especialistas de la interventoría (Hidráulico, geotecnia y pavimento), los cuales sugirieron algunas acciones a tener en cuenta, como tomar las medidas necesarias que le garanticen un flujo constante de material y la presencia de maquinarias operativas en los frentes de trabajo.
SANTA BARBARA	
CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - Cereado de material de mejoramiento de subrasante. **CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VÍA MONTERÍA - SAN CARLOS** - Corte y figurado de acero para refuerzo de placas de sección irregular. - Transporte e instalación de subbase granular del K0+090 al K0+190, en un espesor promedio de 8Cm para completar el espesor de 20cm, según diseño. - Visita de los especialista de la interventoría (Hidráulico, geotecnia y pavimento), los cuales sugirieron algunas acciones a tener en cuenta, como extender los andenes hasta las terrazas de las viviendas, organizar y evaluar la construcción de unas placas de concreto adicionales en la boca calle del K0+000 con el fin de mejorar la circulación del agua de escorrentía.	

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VILLA FÁTIMA





SANTA BARBARA





SAN JOSÉ





NOTA:

VII. FIRMAS

CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
