FACTURA

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO SINU URBANO
NIT 901.911.834-3
TV 14C 44 12 ED VENECIA
Tel: (604) 3214459750
Montería - Colombia
pavimentocomuna7y8@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FPSU 2

Señores	MUNICIPIO DE MONTERIA		
NIT	800.096.734-1	**Teléfono**	(604) 7924545 - Ext. 000
Dirección	CL 27 CR 3 ESQ	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/08/2025, 14:19
Expedición	28/08/2025, 14:19
Vencimiento	28/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ALCALDIA DE MONTERIA DEBE A CONSORCIO SINU URBANO ACTA PARCIAL Nº2, CUYO OBJETO ES : PAVIMENTACION DE VIAS EN LOS BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA .	1.00	1,820,297,974.00	1,820,297,974.00

Total items: 1

Total Bruto	1,820,297,974.00
Total a Pagar	1,820,297,974.00

Valor en Letras:
Mil ochocientos veinte millones doscientos noventa y siete mil novecientos setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,820,297,974.00

Observaciones:
EL PERIODO DEL ACTA PARCIAL ES DEL 28 DE ABRIL HASTA EL 27 DE JUNIO DEL 2025, DEL CONTRATO DE OBRA LP-SIM- 035-2024.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO SINU URBANO
ASB ONASSIS CONSTRUCCIONES SAS 40%
KABOD EXECUTIVE GROUP SAS 60%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089336365 aprobado en 20250224 prefijo FPSU desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 518c43a0b800ed00eda5127156f00df97d182388d402e70568416b0f5cf9723d2a5e6eea69e7a2ea2f201fd6c16a2711

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901911834	3	CONSORCIO SINU URBANO	B -MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	TV 14 C # 44 - 12 ED VENECIA	MONTERIA-CORDOBA	3214459750	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	9485916064	9485916064	E	2025/05/09	2025/05/12	BANCO DE BOGOTA	3	$12,688,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10771905	ALVAREZ BELTRAN LUIS CARLOS	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	10995744	ARROYO VERGARA FRANCISCO MIGUEL	25-14	5	$237,250	$38,000	ESSC07	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
3	CC	11151559	BEDOYA VEGA HOLBIN GERMAN	230301	30	$1,462,500	$234,000	EPS037	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
4	CC	1067905576	BERROCAL MARTINEZ CRISTIAN ENRIQUE	230201	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
5	CC	1003403234	BOHORQUEZ PEREZ ELI FABIO	25-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
6	CC	1003403234	BOHORQUEZ PEREZ ELI FABIO	25-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
7	CC	1133601398	BOLAÑO PAEZ LUIS ALBERTO	230301	23	$1,091,350	$174,700	ESSC07	23	$1,091,350	$43,700	CCF16	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
8	CC	78699137	BULA CASTILLO LUIS FRANCISCO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1068578218	CARMONA ALVAREZ LUIS EDUARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
10	CC	6881250	CASTILLO REYES RAFAEL DARIO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
11	CC	77189860	CELEDON JARAMILLO ERWIN ANTONIO	230301	30	$1,462,500	$234,000	EPS005	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
12	CC	78744930	COGOLLO EDUAR MIGUEL	231001	15	$711,750	$113,900	CCFC55	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
13	CC	1067953266	CORONADO JIMENEZ CARLOS ANDRES	230301	7	$332,150	$53,200	ESSC07	7	$332,150	$13,300	CCF16	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
14	CC	1065378012	DONADO GARCIA MERLY DOMINGA	230301	30	$1,500,000	$240,000	ESSC07	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
15	CC	15679759	DURAN ROMERO JESUS DAVID	25-14	30	$1,462,500	$234,000	EPS010	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
16	CC	78713391	FABRA VARGAS JORGE ELIECER	230301	9	$427,050	$68,400	EPS048	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
17	CC	73570664	GALINDO HERNANDEZ JOSE MIGUEL	230201	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
18	CC	1003099522	GARCIA SUAREZ PEDRO LUIS	230301	1	$47,450	$7,600	EPS040	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
19	CC	1003099522	GARCIA SUAREZ PEDRO LUIS	230301	3	$142,350	$22,800	EPS040	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
20	CC	1003452797	GUEVARA LADEUS JHON HECTOR	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
21	CC	1003452797	GUEVARA LADEUS JHON HECTOR	230301	8	$379,600	$60,800	ESSC24	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
22	CC	78701536	HERNANDEZ ESPITIA JOSE GREGORIO	231001	2	$94,900	$15,200	ESSC07	2	$94,900	$3,800	CCF16	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
23	CC	10772706	HOYOS MIRANDA HENRY MANUEL	230301	3	$142,350	$22,800	ESSC07	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
24	CC	11304951	INFANTE ROA DANIEL RODRIGO		0	$0	$0	EPS048	30	$1,445,600	$57,900	CCF16	30	$1,445,600	$57,900	14-11	30	$1,445,600	$100,700	30	$0	$0
25	CC	1072663878	JARAMILLO ESCOBAR DAYANA PATRICIA	231001	1	$47,450	$7,600	CCFC55	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
26	CC	1072663878	JARAMILLO ESCOBAR DAYANA PATRICIA	231001	1	$47,450	$7,600	CCFC55	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
27	CC	1124054415	LUGO AVILES JANER JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
28	CC	1124054415	LUGO AVILES JANER JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
29	CC	1124054415	LUGO AVILES JANER JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0

30	CC	1124054415	LUGO AVILES JANER JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
31	CC	15703840	MADERA NEGRETE RICHAR DEL CRISTO	231001	20	$949,000	$151,900	EPS041	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
32	CC	10779244	MEDINA MARTINEZ FRANCISCO MIGUEL	230201	22	$1,043,900	$167,100	EPS041	22	$1,043,900	$41,800	CCF16	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
33	CC	1067874343	MENDOZA RAMOS JOHN KENEDY	231001	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
34	CC	1067874343	MENDOZA RAMOS JOHN KENEDY	231001	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
35	CC	1133794217	MESTRA HERNANDEZ JUAN JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
36	CC	1133794217	MESTRA HERNANDEZ JUAN JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
37	CC	1137974269	MESTRA ACOSTA OVER DAVID	25-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
38	CC	70529955	MEZA HOYOS JORGE IVAN	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF16	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
39	CC	78295869	MIRANDA AYASO JAIME MANUEL	230301	9	$427,050	$68,400	ESSC07	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
40	CC	1068814577	MOGUEA ROSARIO GLEN DEIVIS	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC07	2	$94,900	$3,800	CCF16	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
41	CC	1067869373	MORALES PADILLA JORGE ELIECER	230201	30	$1,462,500	$234,000	EPS002	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
42	CC	78744914	MORALES AVILA RICHARD ANTONIO	25-14	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
43	CC	6874550	MUÑOZ VILLADIEGO BENETRIDE DE JESUS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
44	CC	1065372758	NAVAJA MARTINEZ CRISTIAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
45	CC	1073990211	NAVARRO MORELO SERGIO LUIS	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
46	CC	1064990576	NEGRETE BAENA CARLOS MARIO	230201	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
47	CC	1063649498	ORTEGA LUNA GERSON	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
48	CC	1063649498	ORTEGA LUNA GERSON	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
49	CC	10933564	PACHECO BORJA VICTOR MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
50	CC	1140884341	PADILLA SOLAR JOSE ANDRES	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF16	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
51	CC	1064307722	PALOMO BRAVO LUIS ANDRES	25-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
52	CC	1064307722	PALOMO BRAVO LUIS ANDRES	25-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
53	CC	1064307722	PALOMO BRAVO LUIS ANDRES	25-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
54	CC	1064307722	PALOMO BRAVO LUIS ANDRES	25-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
55	CC	6878868	PEÑA LALINDE PIO QUINTO	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF16	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
56	CC	1010117775	PERALTA ALVAREZ EDER LUIS	230301	23	$1,091,350	$174,700	ESSC07	23	$1,091,350	$43,700	CCF16	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
57	CC	11031303	PEREZ RAMOS ERMEN ENRIQUE	230201	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
58	CC	11031303	PEREZ RAMOS ERMEN ENRIQUE	230201	8	$379,600	$60,800	ESSC07	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
59	CC	71979619	PEREZ HOYOS IGNACIO ANTONIO		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
60	CC	1003002947	PEREZ YANEZ LUIS JAVIER	230201	9	$427,050	$68,400	EPS041	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
61	CC	54259957	RIVAS TAPIAS LUDDY ELENA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
62	CC	1066523879	RODRIGUEZ CONDE CRISTHIAN JOSE	230301	19	$901,550	$144,300	EPS010	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
63	CC	1067874360	RUIZ TORO ANGEL DE JESUS	230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
64	CC	1064986653	SANCHEZ MORALES JULIO CESAR	231001	3	$200,000	$32,000	ESSC07	3	$200,000	$8,000	CCF16	3	$200,000	$8,000	14-11	3	$200,000	$14,000	3	$0	$0
65	CC	1041256291	SANCHEZ SOTELO LUBIAN ALBERTO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
66	CC	1067883399	TERAN MESTRA ELIGIO MANUEL	230201	22	$1,043,900	$167,100	EPS005	22	$1,043,900	$41,800	CCF16	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
67	CC	10784903	VEGA OSORIO WILLIAM	25-14	21	$996,450	$159,500	ESSC07	21	$996,450	$39,900	CCF16	21	$996,450	$39,900	14-11	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0

Resumen General de Pago

68	CC	25776940	VERTEL BERROCAL ANA MARCELA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0							
Total	**Afiliados(54)**					$38,796,950	$6,209,300			$43,089,550	$1,724,800			$43,089,550	$1,724,800			$43,089,550	$3,003,600		$0	$0							

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				51	$6,209,300	$12,400	$0	$6,221,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$1,026,800	$2,100	$0	$1,028,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$750,500	$1,500	$0	$752,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$2,821,700	$5,600	$0	$2,827,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,610,300	$3,200	$0	$1,613,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$3,003,600	$6,000	$0	$3,009,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	54	$3,003,600	$6,000	$0	$3,009,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$1,724,800	$3,400	$0	$1,728,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	54	$1,724,800	$3,400	$0	$1,728,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				54	$1,724,800	$3,900	$0	$1,728,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$32,300	$100	$0	$32,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$17,100	$100	$0	$17,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$132,000	$300	$0	$132,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$94,600	$200	$0	$94,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	19	$404,300	$800	$0	$405,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$275,400	$600	$0	$276,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$224,200	$500	$0	$224,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$433,200	$900	$0	$434,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$104,100	$300	$0	$104,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$7,600	$100	$0	$7,700
TOTAL				54	$12,662,500	$25,700	$0	$12,688,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901911834	3	CONSORCIO SINU URBANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	TV 14 C # 44 - 12 ED VENECIA	MONTERIA-CORDOBA	3214459750	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	88434306	9488434306	E	2025/06/10	2025/07/08	BANCO AV VILLAS	28	$19,540,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1067930684	ABAD PAEZ JEORGE ANTONIO	231001	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
2	CC	10771905	ALVAREZ BELTRAN LUIS CARLOS	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	10995744	ARROYO VERGARA FRANCISCO MIGUEL	25-14	6	$284,700	$45,600	ESSC07	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
4	CC	1067862983	BANQUE FABRA DAIRO DE JESUS	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
5	CC	11151559	BEDOYA VEGA HOLBIN GERMAN	230301	30	$1,462,500	$234,000	EPS037	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
6	CC	1067905576	BERROCAL MARTINEZ CRISTIAN ENRIQUE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	1133601398	BOLAÑO PAEZ LUIS ALBERTO	230301	6	$284,700	$45,600	ESSC07	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
8	CC	78699137	BULA CASTILLO LUIS FRANCISCO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1068578218	CARMONA ALVAREZ LUIS EDUARDO	230301	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
10	CC	1038100389	CASTILLO LOPEZ GUSTAVO ANTONIO	230201	8	$379,600	$60,800	EPS002	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
11	CC	6881250	CASTILLO REYES RAFAEL DARIO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
12	CC	77189860	CELEDON JARAMILLO ERWIN ANTONIO	230301	30	$1,462,500	$234,000	EPS005	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
13	CC	78744930	COGOLLO EDUAR MIGUEL	231001	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
14	CC	1067953266	CORONADO JIMENEZ CARLOS ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
15	CC	11033215	CORREA SEÑA JUAN CARLOS	230301	15	$711,750	$113,900	CCFC55	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
16	CC	15620684	DIAZ SANTOS FELIX SEGUNDO	230201	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
17	CC	1065378012	DONADO GARCIA MERLY DOMINGA	230301	30	$1,500,000	$240,000	ESSC07	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
18	CC	15679759	DURAN ROMERO JESUS DAVID	25-14	30	$1,462,500	$234,000	EPS010	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
19	CC	78713391	FABRA VARGAS JORGE ELIECER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
20	CC	1003099522	GARCIA SUAREZ PEDRO LUIS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
21	CC	1003043808	GOMEZ LOPEZ ANDRES FELIPE	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
22	CC	1067862243	GOMEZ CARDENAS DANILO ANTONIO	230301	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
23	CC	1003655061	GONZALEZ RIVERA ALAN DAVID	230301	15	$711,750	$113,900	EPS041	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
24	CC	1063135975	GONZALEZ RAMOS SEBASTIAN	230301	15	$711,750	$113,900	ESSC24	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
25	CC	1003452797	GUEVARA LADEUS JHON HECTOR	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
26	CC	78701536	HERNANDEZ ESPITIA JOSE GREGORIO	231001	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
27	CC	10934961	HERNANDEZ HERNANDEZ ROGER DE JESUS	230301	6	$284,700	$45,600	ESSC07	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
28	CC	1067874093	HOYOS GARCIA ADIELA TERESA	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS002	26	$1,233,700	$49,400	CCF16	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
29	CC	10772706	HOYOS MIRANDA HENRY MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

30	CC	11304951	INFANTE ROA DANIEL RODRIGO		0	$0	$0	EPS048	30	$1,445,600	$57,900	CCF16	30	$1,445,600	$57,900	14-11	30	$1,445,600	$100,700	30	$0	$0
31	CC	15703840	MADERA NEGRETE RICHAR DEL CRISTO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
32	CC	10779244	MEDINA MARTINEZ FRANCISCO MIGUEL	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
33	CC	1067874343	MENDOZA RAMOS JOHN KENEDY	231001	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
34	CC	1137974269	MESTRA ACOSTA OVER DAVID	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
35	CC	70529955	MEZA HOYOS JORGE IVAN	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF16	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
36	CC	78295869	MIRANDA AYASO JAIME MANUEL	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
37	CC	1068814577	MOGUEA ROSARIO GLEN DEIVIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
38	CC	1067869373	MORALES PADILLA JORGE ELIECER	230201	30	$1,462,500	$234,000	EPS002	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
39	CC	78744914	MORALES AVILA RICHARD ANTONIO	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
40	CC	1067843046	MULASCO ORTEGA EDUARDO ANTONIO	230201	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
41	CC	6874550	MUÑOZ VILLADIEGO BENETRIDE DE JESUS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
42	CC	1065372758	NAVAJA MARTINEZ CRISTIAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
43	CC	1073990211	NAVARRO MORELO SERGIO LUIS	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
44	CC	1063649498	ORTEGA LUNA GERSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
45	CC	10933564	PACHECO BORJA VICTOR MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
46	CC	1140884341	PADILLA SOLAR JOSE ANDRES	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
47	CC	1064307722	PALOMO BRAVO LUIS ANDRES	25-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
48	CC	6878868	PEÑA LALINDE PIO QUINTO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
49	CC	1010117775	PERALTA ALVAREZ EDER LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
50	CC	11031303	PEREZ RAMOS ERMEN ENRIQUE	230201	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
51	CC	71979619	PEREZ HOYOS IGNACIO ANTONIO		0	$0	$0	ESSC07	7	$332,150	$13,300	CCF16	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
52	CC	1003002947	PEREZ YANEZ LUIS JAVIER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
53	CC	10772477	POLO DE LA ROSA WILSON ENRIQUE	231001	17	$806,650	$129,100	EPS002	17	$806,650	$32,300	CCF16	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
54	CC	54259957	RIVAS TAPIAS LUDDY ELENA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
55	CC	1066523879	RODRIGUEZ CONDE CRISTHIAN JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
56	CC	1067874360	RUIZ TORO ANGEL DE JESUS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
57	CC	1064986653	SANCHEZ MORALES JULIO CESAR	231001	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
58	CC	1041256291	SANCHEZ SOTELO LUBIAN ALBERTO	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
59	CC	1067851094	SANCHEZ MORALES LUIS FERNANDO	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS002	26	$1,233,700	$49,400	CCF16	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
60	CC	1193459697	SANCHEZ MORALES PEDRO MANUEL	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF16	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
61	CC	1067883399	TERAN MESTRA ELIGIO MANUEL	230201	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
62	CC	78681510	TORDECILLA ROMERO CLICENIO ANTONIO	231001	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
63	CC	10784903	VEGA OSORIO WILLIAM	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
64	CC	1193154474	VELAIDES ROBLES ISAIAS	231001	2	$94,900	$15,200	CCFC55	2	$94,900	$3,800	CCF16	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
65	CC	25776940	VERTEL BERROCAL ANA MARCELA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(65)**			**$60,431,050**	**$9,670,700**			**$63,632,300**	**$2,547,300**			**$63,632,300**	**$2,547,300**			**$63,632,300**	**$4,432,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				62	$9,670,700	$172,800	$0	$9,843,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	$1,740,000	$31,100	$0	$1,771,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,206,000	$21,600	$0	$1,227,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$4,658,900	$83,200	$0	$4,742,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$2,065,800	$36,900	$0	$2,102,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$4,432,000	$79,200	$0	$4,511,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	65	$4,432,000	$79,200	$0	$4,511,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$2,547,300	$45,500	$0	$2,592,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	65	$2,547,300	$45,500	$0	$2,592,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				65	$2,547,300	$46,000	$0	$2,593,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$89,300	$1,600	$0	$90,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$30,400	$600	$0	$31,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$171,900	$3,100	$0	$175,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$115,500	$2,100	$0	$117,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	20	$599,800	$10,800	$0	$610,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$395,100	$7,100	$0	$402,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$315,400	$5,700	$0	$321,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$596,600	$10,700	$0	$607,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$176,300	$3,200	$0	$179,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$57,000	$1,100	$0	$58,100
TOTAL				**65**	**$19,197,300**	**$343,500**	**$0**	**$19,540,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901911834	3	CONSORCIO SINU URBANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	TV 14 C # 44 - 12 ED VENECIA	MONTERIA-CORDOBA	3214459750	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	88435756	9488435756	E	2025/07/08	2025/07/08	BANCO AV VILLAS	0	$21,485,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1067930684	ABAD PAEZ JEORGE ANTONIO	231001	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
2	CC	78716183	ACOSTA REYES OVER JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
3	CC	10771905	ALVAREZ BELTRAN LUIS CARLOS	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	11151559	BEDOYA VEGA HOLBIN GERMAN	230301	30	$1,462,500	$234,000	EPS037	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
5	CC	1067905576	BERROCAL MARTINEZ CRISTIAN ENRIQUE	230201	25	$1,186,250	$189,800	EPS002	25	$1,186,250	$47,500	CCF16	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
6	CC	78699137	BULA CASTILLO LUIS FRANCISCO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	1067898149	CABALLERO ALCIRIA LIZ CARLOS	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS002	27	$1,281,150	$51,300	CCF16	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0
8	CC	1038100389	CASTILLO LOPEZ GUSTAVO ANTONIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	6881250	CASTILLO REYES RAFAEL DARIO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
10	CC	1062960923	CAVADIA BALLESTERO LUIS ALBERTO	230301	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
11	CC	77189860	CELEDON JARAMILLO ERWIN ANTONIO	230301	30	$1,462,500	$234,000	EPS005	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
12	CC	78744930	COGOLLO EDUAR MIGUEL	231001	20	$949,000	$151,900	CCFC55	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
13	CC	1067899863	CONTRERAS FERIA LUIS EDUARDO	230301	6	$284,700	$45,600	EPS048	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
14	CC	1067953266	CORONADO JIMENEZ CARLOS ANDRES	230301	20	$949,000	$151,900	ESSC07	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
15	CC	11033215	CORREA SEÑA JUAN CARLOS	230301	20	$949,000	$151,900	CCFC55	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
16	CC	1065378012	DONADO GARCIA MERLY DOMINGA	230301	30	$1,500,000	$240,000	ESSC07	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
17	CC	1017253743	DUARTE ARGEL MIGUEL ANGEL	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
18	CC	15679759	DURAN ROMERO JESUS DAVID	25-14	30	$1,462,500	$234,000	EPS010	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
19	CC	1064976526	DURANGO ROMERO CRISPIN FELIPE	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS041	26	$1,233,700	$49,400	CCF16	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
20	CC	1064976526	DURANGO ROMERO CRISPIN FELIPE	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
21	CC	1065006880	ESPINOSA IZQUIERDO CRISTIAN DAVID	230301	25	$1,186,250	$189,800	ESSC07	25	$1,186,250	$47,500	CCF16	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
22	CC	78713391	FABRA VARGAS JORGE ELIECER	230301	20	$949,000	$151,900	EPS048	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
23	CC	1192713384	FLOREZ MARTINEZ ISAIAS	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
24	CC	1003099522	GARCIA SUAREZ PEDRO LUIS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
25	CC	1067862243	GOMEZ CARDENAS DANILO ANTONIO	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
26	CC	1003655061	GONZALEZ RIVERA ALAN DAVID	230301	20	$949,000	$151,900	EPS041	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
27	CC	11003231	GONZALEZ THIEL ARTURO	231001	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
28	CC	1067937340	GONZALEZ ARGEL HAMILTON ALBERTO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
29	CC	1063135975	GONZALEZ RAMOS SEBASTIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

30	CC	1067874093	HOYOS GARCIA ADIELA TERESA	230301	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
31	CC	10772706	HOYOS MIRANDA HENRY MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
32	CC	11304951	INFANTE ROA DANIEL RODRIGO		0	$0	$0	EPS048	30	$1,445,600	$57,900	CCF16	30	$1,445,600	$57,900	14-11	30	$1,445,600	$100,700	30	$0	$0
33	CC	1072663878	JARAMILLO ESCOBAR DAYANA PATRICIA	231001	1	$47,450	$7,600	CCFC55	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
34	CC	1072663878	JARAMILLO ESCOBAR DAYANA PATRICIA	231001	1	$47,450	$7,600	CCFC55	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
35	CC	1072663878	JARAMILLO ESCOBAR DAYANA PATRICIA	231001	1	$47,450	$7,600	CCFC55	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
36	CC	1071348519	JIMENEZ VASQUEZ ALDAIR	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
37	CC	1064188104	LORA APARICIO ALBEIRO JOSE	230301	25	$1,186,250	$189,800	ESSC24	25	$1,186,250	$47,500	CCF16	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
38	CC	1124054415	LUGO AVILES JANER JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
39	CC	1124054415	LUGO AVILES JANER JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
40	CC	1124054415	LUGO AVILES JANER JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
41	CC	15703840	MADERA NEGRETE RICHAR DEL CRISTO	231001	20	$949,000	$151,900	EPS041	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
42	CC	1067953116	MARTINEZ SALCEDO OSMAR DARIO	230301	12	$569,400	$91,200	ESSC07	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
43	CC	10779244	MEDINA MARTINEZ FRANCISCO MIGUEL	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
44	CC	1137974269	MESTRA ACOSTA OVER DAVID	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
45	CC	70529955	MEZA HOYOS JORGE IVAN	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF16	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
46	CC	1068814577	MOGUEA ROSARIO GLEN DEIVIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
47	CC	11000175	MONTIEL GONZALEZ JOSE NICANOR	231001	24	$1,138,800	$182,300	ESSC07	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
48	CC	1067869373	MORALES PADILLA JORGE ELIECER	230201	30	$1,462,500	$234,000	EPS002	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
49	CC	10777822	MORALES ESPITIA JOSE LUIS	230301	1	$47,450	$7,600	EPS042	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
50	CC	1067843046	MULASCO ORTEGA EDUARDO ANTONIO	230201	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
51	CC	6874550	MUÑOZ VILLADIEGO BENETRIDE DE JESUS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
52	CC	1065372758	NAVAJA MARTINEZ CRISTIAN	230201	20	$949,000	$151,900	EPS041	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
53	CC	1073990211	NAVARRO MORELO SERGIO LUIS	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
54	CC	1064990576	NEGRETE BAENA CARLOS MARIO	230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
55	CC	1064990576	NEGRETE BAENA CARLOS MARIO	230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
56	CC	1063649498	ORTEGA LUNA GERSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
57	CC	1073970854	PACHECO MARTINEZ DAIRO JOSE	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF16	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
58	CC	10933564	PACHECO BORJA VICTOR MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
59	CC	6878868	PEÑA LALINDE PIO QUINTO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
60	CC	1010117775	PERALTA ALVAREZ EDER LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
61	CC	1003002947	PEREZ YANEZ LUIS JAVIER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
62	CC	10772477	POLO DE LA ROSA WILSON ENRIQUE	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
63	CC	54259957	RIVAS TAPIAS LUDDY ELENA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
64	CC	1066523879	RODRIGUEZ CONDE CRISTHIAN JOSE	230301	20	$949,000	$151,900	EPS010	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
65	CC	1067874360	RUIZ TORO ANGEL DE JESUS	230301	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
66	CC	1064986653	SÁNCHEZ MORALES JULIO CESAR	231001	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
67	CC	1067851094	SANCHEZ MORALES LUIS FERNANDO	230301	12	$569,400	$91,200	EPS002	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0

68	CC	1193459697	SANCHEZ MORALES PEDRO MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
69	CC	78038367	SANCHEZ CORCHO PEDRO ANTONIO	230301	18	$854,100	$136,700	ESSC07	18	$854,100	$34,200	CCF16	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
70	CC	15670444	TORRES RIOS WILLIAM JAIRO	25-14	12	$569,400	$91,200	EPS002	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
71	CC	1071350393	TORRES HERRERA WILMER JOSE	231001	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF16	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0
72	CC	10784903	VEGA OSORIO WILLIAM	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
73	CC	25776940	VERTEL BERROCAL ANA MARCELA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(67)**					$67,975,600	$10,878,400			$70,844,700	$2,836,100			$70,844,700	$2,836,100			$70,844,700	$4,934,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				65	$10,878,400	$0	$0	$10,878,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	$2,173,000	$0	$0	$2,173,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,236,400	$0	$0	$1,236,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	37	$5,380,600	$0	$0	$5,380,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,088,400	$0	$0	$2,088,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				67	$4,934,400	$0	$0	$4,934,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	67	$4,934,400	$0	$0	$4,934,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				67	$2,836,100	$0	$0	$2,836,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	67	$2,836,100	$0	$0	$2,836,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				67	$2,836,100	$0	$0	$2,836,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$81,700	$0	$0	$81,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$1,900	$0	$0	$1,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,500	$0	$0	$104,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$164,300	$0	$0	$164,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$96,500	$0	$0	$96,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	15	$677,700	$0	$0	$677,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$410,300	$0	$0	$410,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	$340,100	$0	$0	$340,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$729,600	$0	$0	$729,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$172,500	$0	$0	$172,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				67	$21,485,000	$0	$0	$21,485,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901911834	3	CONSORCIO SINU URBANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	TV 14 C # 44 - 12 ED VENECIA	MONTERIA-CORDOBA	3214459750	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05		9490315950	N	2025/05/09			96	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10771905	ALVAREZ BELTRAN LUIS CARLOS	231001	30	($1,423,500)	($227,800)	ESSC07	30	($1,423,500)	($57,000)	CCF16	30	($1,423,500)	($57,000)	14-11	30	($1,423,500)	($99,100)	30	$0	$0
2	CC	10771905	ALVAREZ BELTRAN LUIS CARLOS	231001	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$576,500	$92,200			$576,500	$23,000			$576,500	$23,000			$576,500	$40,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,200	$5,700	$0	$97,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$92,200	$5,700	$0	$97,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,100	$2,500	$0	$42,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$40,100	$2,500	$0	$42,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,000	$1,500	$0	$24,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$23,000	$1,500	$0	$24,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,000	$1,500	$0	$24,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$23,000	$1,500	$0	$24,500
TOTAL				1	$178,300	$11,200	$0	$189,500

2025/08/19 12:33 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901911834	3	CONSORCIO SINU URBANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	TV 14 C # 44 - 12 ED VENECIA	MONTERIA-CORDOBA	3214459750	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1711788564	9490315860	N	2025/03/10	2025/08/19	BANCOLOMBIA	162	$19,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10771905	ALVAREZ BELTRAN LUIS CARLOS	231001	3	($142,350)	($22,800)	ESSC07	3	($142,350)	($5,700)	CCF16	3	($142,350)	($5,700)	14-11	3	($142,350)	($10,000)	3	$0	$0
2	CC	10771905	ALVAREZ BELTRAN LUIS CARLOS	231001	3	$200,000	$32,000	ESSC07	3	$200,000	$8,000	CCF16	3	$200,000	$8,000	14-11	3	$200,000	$14,000	3	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$57,650	$9,200			$57,650	$2,300			$57,650	$2,300			$57,650	$4,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$1,000	$0	$10,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$9,200	$1,000	$0	$10,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,000	$500	$0	$4,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,000	$500	$0	$4,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,300	$300	$0	$2,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$2,300	$300	$0	$2,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,300	$300	$0	$2,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$2,300	$300	$0	$2,600
TOTAL				1	$17,800	$2,100	$0	$19,900

2025/08/19 12:32 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901911834	3	CONSORCIO SINU URBANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	TV 14 C # 44 - 12 ED VENECIA	MONTERIA-CORDOBA	3214459750	SÍ

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1711815053	9490315905	N	2025/04/08	2025/08/19	BANCOLOMBIA	133	$193,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES


EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10771905	ALVAREZ BELTRAN LUIS CARLOS	231001	30	($1,423,500)	($227,800)	ESSC07	30	($1,423,500)	($57,000)	CCF16	30	($1,423,500)	($57,000)	14-11	30	($1,423,500)	($99,100)	30	$0	$0
2	CC	10771905	ALVAREZ BELTRAN LUIS CARLOS	231001	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$576,500	$92,200			$576,500	$23,000			$576,500	$23,000			$576,500	$40,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,200	$7,900	$0	$100,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$92,200	$7,900	$0	$100,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,100	$3,500	$0	$43,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$40,100	$3,500	$0	$43,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,000	$2,000	$0	$25,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$23,000	$2,000	$0	$25,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,000	$2,000	$0	$25,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$23,000	$2,000	$0	$25,000
TOTAL				1	$178,300	$15,400	$0	$193,700

2025/08/20 11:20 AM

CONSORCIO SINU URBANO
Nit: 901911834-3



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA

Sres.
ALCALDIA DE MONTERIA
Secretaria de Infraestructura – Centro Verde
Montería - Córdoba

Yo, **ANA MARCELA VERTEL BERROCAL** identificado con la cedula de ciudadanía No. 25.776.940 de Montería, en mi condición de representante legal de CONSORCIO SINU URBANO identificada con NIT. 901.911.834-3, certifico que, durante los meses calendarios legalmente exigibles, trascurridos desde la firma del acta de inicio, febrero 28 de 2025, hasta la fecha de corte del periodo de la presente acta parcial N° 2, junio 27 de 2025, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Montería, a los siete (7) días del mes de julio de 2025.

Agradeciendo su atención.

ANA MARCELA VERTEL BERROCAL.
C.C. 25.776.940 de Montería
REP LEG
CONSORCIO SINU URBANO.
NIT: 900.371.384-9

Dirección: Transversal 14c # 44- 12 apto 402 torre 2- Montería Córdoba
Cel: 3214459750
Correo: pavimentocomuna7y8@gmail.com

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	FORMATO CAMBIO DE PERSONAL -CON INTERVENTORÍA-		
CÓDIGO		VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-012		01	23/01/2024

ACTA CAMBIO DE PERSONAL No. 1

CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO SINÚ URBANO
OBJETO DEL CONTRATO	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($15.436.620.455,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	28 FEBRERO DE 2024
FECHA FINAL	28 DICIEMBRE DE 2024
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
INTERVENTORÍA No.	CMA-SIM-037-2024

En la ciudad de Montería a los treinta (30) días del mes abril del año 2025, se reunieron contratista **CONSORCIO SINÚ URBANO,** Representado legalmente por **ANA MARCELA VERTEL BERROCAL** identificado con cédula de ciudadanía 25.776.940 expedida en Montería, el interventor **CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA**, representado legalmente por **MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía 1.049.625.075 expedida en Tunja, con el fin de estudiar la solicitud de cambio de personal del contratista de la obra teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: Que el Municipio de Montería adelantó el proceso de selección de contratista, para desarrollar el objeto en mención.

Segundo: Que el contratista seleccionado para la ejecución del objeto contractual de la obra es: CONSORCIO SINÚ URBANO**,** representado legalmente por ANA MARCELA VERTEL BERROCAL.

Tercero: Que en fecha 27/01/2025, se firmó el Contrato N° LP-SIM-035-2024, de objeto; "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA ".

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

Cuarto: Que en fecha 24/03/2025, el contratista mediante Oficio N° CSU-010-2025, solicita el cambio del profesional: ALMACENISTA y TOPOGRAFO, por los motivos argumentados en su escrito, anexando Hoja de vida del topógrafo con soportes y cedula del almacenista, del personal a cambiar.

Quinto: Que el INTERVENTOR una vez analizado los requerimientos mínimos estipulados en la etapa precontractual y las hojas de vida de los profesionales, conceptúa que dichos profesionales CUMPLEN con los requisitos mínimos para remplazar a los profesionales propuesto inicialmente por el contratista, los cuales son:

PERFIL	REQUISITOS	DEDICACIÓN
ALMACENISTA	N/A	100%
TOPOGRAFO	N/A	100%

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye dar por aceptado el cambio de personal quedando así:

TRAZABILIDAD DE CAMBIO PERSONAL					
Nombre y Apellidos	N° Identificación	Profesión/ Cargo	Experiencia	Certificación experiencia especifica	REEMPLAZO/VIGENCIA/ ACTA DE CAMBIO
IGNACIO ANTONIO PÉREZ HOYOS	71.979.619	ALMACENISTA	N/A	N/A	**PROPUESTO INICIAL**
LUIS JAVIER PEREZ YANEZ	1003.002.947	ALMACENISTA	N/A	N/A	**REEMPLAZA A IGNACIO ANTONIO PÉREZ HOYOS desde 01/05/2025**

TRAZABILIDAD DE CAMBIO PERSONAL					
Nombre y Apellidos	N° Identificación	Profesión/ Cargo	Experiencia	Certificación experiencia especifica	REEMPLAZO/VIGENCIA/ ACTA DE CAMBIO
LUIS CARLOS ALVAREZ BELTRAN	10771905	TOPOGRAFO	N/A	N/A	**PROPUESTO INICIAL**
JULIO CESAR SANCHEZ MORALEZ	1067851094	TOPOGRAFO	N/A	N/A	**REEMPLAZA A LUIS CARLOS ALVAREZ BELTRAN desde 01/05/2025**

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO CAMBIO DE PERSONAL -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-012	**01**	**23/01/2024**

Se firma por los que en ella intervinieron,

ANA MARCELA VERTEL BERROCAL
CONTRATISTA

MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
INTERVENTOR

Proyectó: Víctor Hernández – Contratista SIM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

PREACTA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE PRE ENTREGA PARA PAGO PARCIAL		
CODIGO		VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-038		1	23/01/2024

ACTA DE PRE ENTREGA PARA PAGO PARCIAL

CONTRATO No.	LP-SIM 035-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO SINU URBANO
OBJETO	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
INTERVENTORIA No.	CMA-SIM-037-2024
APOYO A LA SUPERVISION	VICTOR MANUEL HERNANDEZ
FECHA FINAL	28 DE DICIEMBRE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	19 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PROYECTADA PARA COBRO ACTA No.2	CANTIDAD VERIFICADA
3. PAVIMENTO Y BORDILLOS				
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	825.05	825.05
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	515.71	515.71
5. ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS				
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	230.13	230.13
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	230.13	230.13
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	2.00	2.00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	2.00	2.00

Nota 1: Las cantidades verificadas en campo y que se indican en la presente acta, corresponden única y exclusivamente a las que, por su misma naturaleza visiblemente son susceptibles de medición.

Nota 2: El porcentaje de ejecución del Contrato referenciado a fecha de la presente visita, corresponde al 22,71%.

CONSORCIO SINU URBANO
Rep. Legal:ANA MARCELA VERTEL BERROCAL
Contratista

CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
Rep. Legal: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Interventoria/Supervisor

ACTA PARCIAL DE CUMPLIMIENTO

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-		
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	
SI-SUP-F-003	03	13/01/2025	

ACTA PARCIAL DE OBRA No.2

CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO SINÚ URBANO
OBJETO DEL CONTRATO	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($15.436.620.455,00)
No. CDP	25000316 DEL 16 DE ENERO DE 2025 25000189 DEL 14 DE ENERO DE 2025
No. CRP	25000730 DEL 26 DE FEBRERO 2025 25000731 DEL 26 DE FEBRERO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	28 FEBRERO DE 2025
FECHA FINAL INICIAL	28 DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
PERIODO A COBRAR	DEL 28 DE ABRIL HASTA 27 MAYO DE 2025 DEL 28 DE MAYO HASTA EL 27 DE JUNIO DE 2025

En la ciudad de Montería a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año 2025 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO SINÚ URBANO,** Representado legalmente por **ANA MARCELA VERTEL BERROCAL** identificado con cédula de ciudadanía 25.776.940 expedida en Montería, el interventor **CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA**, representado legalmente por **MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía 1.049.625.075 expedida en Tunja, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **VICTOR MANUEL HERNANDEZ**, con el propósito de dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

1. El avance de la obra es del 11.88% en el periodo a cobrar, lo cual equivale a un valor de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($1.834.088.110,00), para un avance acumulado de 22.71%.

2. Teniendo en cuenta que, a la fecha de la presente acta, el contratista de obra no ha justificado los imprevistos en la presente acta cobrada, y que el valor de estos equivale a la suma total de TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($13.790.136,00), resulta pertinente indicar que los mismos solo serán pagados, al presentarse las justificaciones correspondientes, por tal motivo el valor a pagar en la presente acta N°2 descontando el valor del imprevisto es la suma MIL OCHOCIENTOS VEITE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.820.297.974,00).

3. El valor de la presente **ACTA PARCIAL No.2** es MIL OCHOCIENTOS VEITE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.820.297.974,00).

   Los pagos parciales relacionados son los siguientes:

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	FECHA Y No. EGRESOS
Valor del contrato Inicial	$15.436.620.455,00		
Valor Adicional	$0		
Valor total del contrato	$15.436.620.455,00		
Acta parcial 1		$ 1.658.408.478,00	13/06/2025 – N° 25000722
Acta parcial 2		$1.820.297.974,00	EN TRÁMITE
Saldo por ejecutar		**$ 11.957.914.003,00**	
BALANCE	**$15.436.620.455,00**	**$15.436.620.455,00**	

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

5. El contratista de obra declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

6. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista de obra para el personal relacionado en la propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de condiciones, como se relaciona a continuación:

MES DE ABRIL DE 2025

ID	Nombre	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	JORGE IVAN MEZA HOYOS	70529955 de Arboletes	DIRECTOR DE OBRA	100%	$3,000,000	9485916064
2	SERGIO NAVARRO MORELO	1073990211 de Tierralta	RESIDENTE DE OBRA	100%	$2,500,000	9485916064
3	JESUS DURAN ROMERO	15679759 de planeta rica	ESTRUCTURAL	30%	$1,462,500	9485916064
4	HOLBIN BEDOYA VEGA	11151559 de San Carlos	ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE	30%	$1,462,500	9485916064
5	ERWIN CELEDON JARAMILLO	77189860 de Valledupar	HIDRAULICO	30%	$1,462,500	9485916064
6	JORGE MORALES PADILLA	1067869373 de Montería	GEOTECNISTA	30%	$1,462,500	9485916064
7	DANIEL INFANTE ROA	11304951 de Girardot Cundinamarca	FORESTAL	40%	$1,445,600	9485916064
8	LUDDY RIVAS TAPIAS	54259957 de Quibdó	TRABAJADORA SOCIAL	100%	$1,500,000	9485916064
9	MERLY DONADO GARCIA	1065378012 de Momil	SG-SST	100%	$1,500,000	9485916064
	PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
1	DARIO CASTILLO REYES	6881250 de Montería	MAESTRO GENERAL	100%	$1,423,500	9485916064
2	LUIS BULA CASTILLO	78699137 de Montería	CADENERO 1	100%	$1,423,500	9485916064
3	BENETRIDE MUÑOZ VILLADIEGO	6874550 de Montería	CADENERO 2	100%	$ 1.423.500	9485916064
4	LUIS ALVAREZ BELTRAN	10771905 de Montería	TOPOGRAFO	100%	$2.000.000	9485916064 9490315950
5	IGNACIO PEREZ HOYOS	71979619 de Turbo	ALMACENISTA	100%	$1,423,500	9485916064
6	ANA MARCELA VERTEL B	25776940 de Montería	CONDUCTOR	100%	$1,423,500	9485916064

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	**03**	**13/01/2025**

MES DE MAYO DE 2025

ID	Nombre	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	JORGE IVAN MEZA HOYOS	70529955 de Arboletes	DIRECTOR DE OBRA	100%	$3,000,000	9488434306
2	SERGIO NAVARRO MORELO	1073990211 de Tierralta	RESIDENTE DE OBRA	100%	$2,500,000	9488434306
3	JESUS DURAN ROMERO	15679759 de planeta rica	ESTRUCTURAL	30%	$1,462,500	9488434306
4	HOLBIN BEDOYA VEGA	11151559 de San Carlos	ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE	30%	$1,462,500	9488434306
5	ERWIN CELEDON JARAMILLO	77189860 de Valledupar	HIDRAULICO	30%	$1,462,500	9488434306
6	JORGE MORALES PADILLA	1067869373 de Montería	GEOTECNISTA	30%	$1,462,500	9488434306
7	DANIEL INFANTE ROA	11304951 de Girardot Cundinamarca	FORESTAL	40%	$1,445,600	9488434306
8	LUDDY RIVAS TAPIAS	54259957 de Quibdó	TRABAJADORA SOCIAL	100%	$1,500,000	9488434306
9	MERLY DONADO GARCIA	1065378012 de Momil	SG-SST	100%	$1,500,000	9488434306
	PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
1	DARIO CASTILLO REYES	6881250 de Montería	MAESTRO GENERAL	100%	$1,423,500	9488434306
2	LUIS BULA CASTILLO	78699137 de Montería	CADENERO 1	100%	$1,423,500	9488434306
3	BENETRIDE MUÑOZ VILLADIEGO	6874550 de Montería	CADENERO 2	100%	$ 1.423.500	9488434306
4	JULIO CESAR SANCHEZ	1067851094 de Montería	TOPOGRAFO	100%	$2.000.000	9488434306
5	LUIS PEREZ YANEZ	1003002947 de Montería	ALMACENISTA	100%	$1,423,500	9488434306
6	ANA MARCELA VERTEL B	25776940 de Montería	CONDUCTOR	100%	$1,423,500	9488434306

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	**03**	**13/01/2025**

MES DE JUNIO DE 2025

ID	Nombre	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	JORGE IVAN MEZA HOYOS	70529955 de Arboletes	DIRECTOR DE OBRA	100%	$3,000,000	9488435756
2	SERGIO NAVARRO MORELO	1073990211 de Tierralta	RESIDENTE DE OBRA	100%	$2,500,000	9488435756
3	JESUS DURAN ROMERO	15679759 de planeta rica	ESTRUCTURAL	30%	$1,462,500	9488435756
4	HOLBIN BEDOYA VEGA	11151559 de San Carlos	ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE	30%	$1,462,500	9488435756
5	ERWIN CELEDON JARAMILLO	77189860 de Valledupar	HIDRAULICO	30%	$1,462,500	9488435756
6	JORGE MORALES PADILLA	1067869373 de Montería	GEOTECNISTA	30%	$1,462,500	9488435756
7	DANIEL INFANTE ROA	11304951 de Girardot Cundinamarca	FORESTAL	40%	$1,445,600	9488435756
8	LUDDY RIVAS TAPIAS	54259957 de Quibdó	TRABAJADORA SOCIAL	100%	$1,500,000	9488435756
9	MERLY DONADO GARCIA	1065378012 de Momil	SG-SST	100%	$1,500,000	9488435756
	PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
1	DARIO CASTILLO REYES	6881250 de Montería	MAESTRO GENERAL	100%	$1,423,500	9488435756
2	LUIS BULA CASTILLO	78699137 de Montería	CADENERO 1	100%	$1,423,500	9488435756
3	BENETRIDE MUÑOZ VILLADIEGO	6874550 de Montería	CADENERO 2	100%	$ 1.423.500	9488435756
4	JULIO CESAR SANCHEZ	1067851094 de Montería	TOPOGRAFO	100%	$2.000.000	9488435756
5	LUIS PEREZ YANEZ	1003002947 de Montería	ALMACENISTA	100%	$1,423,500	9488435756
6	ANA MARCELA VERTEL B	25776940 de Montería	CONDUCTOR	100%	$1,423,500	9488435756

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

Para el periodo de cobro se realizaron los siguientes cambios de personal:

TRAZABILIDAD DE CAMBIO PERSONAL					
Nombre y Apellidos	N° Identificación	Profesión/ Cargo	Experiencia	Certificación experiencia especifica	REEMPLAZO/VIGENCIA/ ACTA DE CAMBIO
IGNACIO ANTONIO PÉREZ HOYOS	71.979.619	ALMACENISTA	N/A	N/A	**PROPUESTO INICIAL**
LUIS JAVIER PEREZ YANEZ	1003.002.947	ALMACENISTA	N/A	N/A	**REEMPLAZA A IGNACIO ANTONIO PÉREZ HOYOS desde 01/05/2025**

TRAZABILIDAD DE CAMBIO PERSONAL					
Nombre y Apellidos	N° Identificación	Profesión/ Cargo	Experiencia	Certificación experiencia especifica	REEMPLAZO/VIGENCIA/ ACTA DE CAMBIO
LUIS CARLOS ALVAREZ BELTRAN	10771905	TOPOGRAFO	N/A	N/A	**PROPUESTO INICIAL**
JULIO CESAR SANCHEZ MORALEZ	1067851094	TOPOGRAFO	N/A	N/A	**REEMPLAZA A IGNACIO ANTONIO PÉREZ HOYOS desde 01/05/2025**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

7. Que el interventor certifica que el contratista de obra aportó a la entidad municipal las garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad.

No. Póliza	Acto	Fecha del amparo inicial	No. Del anexo	Fecha del amparo final
25121 endoso 1	Contrato	06–02–2025	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO	31–12–2025
86361 endoso 3	Contrato	06–02–2025	CUMPLIMIENTO	07-12-2030
25121 endoso 2	Inicio	28–02–2025	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO	31–12–2025
86361 endoso 5	Inicio	28-02-2025	CUMPLIMIENTO	28-12-2030

8. Que en el periodo a cobrar el interventor certifica que el contratista de obra realizó y presentó los ensayos realizados en obra (si aplica), de acuerdo con los parámetros establecidos y normativa vigente y que a continuación se relacionan:

DESCRIPCIÓN ENSAYO	NORMA	CUMPLIMIENTO
TOMA DE DENSIDADES EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO Y ARENA, MATERIAL SELECCIONADO Y TERRAPLEN	I.N.V. E-161-13	SI
RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO METODO DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ	I.N.V. E-414-13, NTC-2871	SI

9. La Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato de interventoría manifiesta que, dado que los contratistas de obra e interventoría avalan los numerales relacionados anteriormente, y es procedente suscribir la presente acta parcial.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

CONSORCIO SINÚ URBANO
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL

CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA
MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Revisó: Khalil Petro - Equipo de cuentas - Contratista SIM
Kelly Arteaga - Equipo de cuentas - Contratista SIM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

ACTA NUMERICA

	CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO LP-SIM-035-2024	FECHA DE INICIACION:	VEINTIOCHO (28) DE FREBRERO 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
			PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES	$ 1.834.088.110,00
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE 2025	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
			VALOR CONTRACTUAL	$ 15.436.620.455,00	
			VALOR PRESENTE	$ 15.436.620.455,00	DEL 28/Mayo/2025 HASTA 27/Junio/2025 DEL 28/Abril/2025 HASTA 27/Mayo/2025
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1	$ 1.670.972.179,00	
	RePRESENTEnte:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	$ 1.834.088.110,00	
			VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 3.505.060.289,00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA	11,88%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
VERSIÓN: 02	CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA		
			% AVANCE FISICO ACUMULADO	22,71%	19/Agosto/2025
ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		RePRESENTEnte:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ		

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No.1		PRESENTE ACTA No.2		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1,00	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	467,28	$ 13.655,00	$ 6.380.708,00	-	$ -	0,00	$ -	467,28	$ 6.380.708,00	467,28	$ 6.380.708,00
1,02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	56,00	$ 192.836,00	$ 10.798.816,00	-	$ -	0,00	$ -	0,59	$ 113.388,00	0,59	$ 113.388,00
1,03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0,10MTS/0,15MTS CON CORTADORA	M	1.495,84	$ 35.387,00	$ 52.933.290,00	-	$ -	0,00	$ -	144,60	$ 5.116.960,00	144,60	$ 5.116.960,00
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	571,39	$ 30.783,00	$ 17.589.098,00	-	$ -	0,00	$ -	302,88	$ 9.323.555,00	302,88	$ 9.323.555,00
1,05	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M2	978,00	$ 33.411,00	$ 32.675.958,00	-	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	11.265,60	$ 12.641,00	$ 142.408.450,00	-	$ -	4377,49	$ 55.335.851,00	3204,35	$ 40.506.188,00	7581,84	$ 95.842.039,00
1,07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE, PROFUNDIDAD > 50 CM, NO INCLUYE RETIRO	M3	1.800,25	$ 25.281,00	$ 45.512.120,00	-	$ -	67,10	$ 1.696.355,00	52,28	$ 1.321.691,00	119,38	$ 3.018.046,00
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	18.257,01	$ 29.316,00	$ 535.222.505,00	-	$ -	5471,86	$ 160.413.048,00	4154,67	$ 121.798.306,00	9626,53	$ 282.211.353,00
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	36,00	$ 430.318,00	$ 15.491.448,00	-	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5,1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	103,00	$ 600.152,00	$ 61.815.656,00	-	$ -	0,00	$ -	32,00	$ 19.204.864,00	32,00	$ 19.204.864,00
1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10,1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	8,00	$ 914.686,00	$ 7.317.488,00	-	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 2.744.058,00	3,00	$ 2.744.058,00
1,12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1,5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	1.470,00	$ 122.036,00	$ 179.392.920,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
2,00	SUBRASANTE Y SUBBASE												
2,01	TERRAPLENES	M3	2.664,63	$ 91.980,00	$ 245.092.667,00	-	$ -	1373,10	$ 126.297.738,00			1373,10	$ 126.297.738,00
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	1.800,25	$ 220.741,00	$ 397.388.985,00	-	$ -	346,55	$ 76.497.794,00	52,28	$ 11.540.339,00	398,83	$ 88.038.133,00
2,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	10.235,68	$ 107.167,00	$ 1.096.927.119,00	-	$ -	3986,90	$ 427.264.112,00	856,22	$ 91.758.957,00	4843,12	$ 519.023.070,00
2,04	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	5.117,84	$ 316.542,00	$ 1.620.011.309,00	-	$ -	730,80	$ 231.328.894,00	304,90	$ 96.513.656,00	1035,70	$ 327.842.550,00
2,05	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE YCAPAS GRANULARES	M2	27.829,53	$ 14.150,00	$ 393.787.850,00	-	$ -	6376,00	$ 90.220.400,00	2934,32	$ 41.520.628,00	9310,32	$ 131.741.028,00
3,00	PAVIMENTO Y BORDILLOS												
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	4.800,66	$ 1.452.795,00	$ 6.974.374.845,00	-	$ -	336,57	$ 488.967.213,00	825,05	$ 1.198.628.515,00	1161,62	$ 1.687.595.728,00
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	30,00	$ 464.088,00	$ 13.922.640,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	2.948,74	$ 126.084,00	$ 371.788.934,00	-	$ -	0,00	$ -	515,71	$ 65.022.780,00	515,71	$ 65.022.780,00
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	23.884,56	$ 12.203,00	$ 291.463.286,00	-	$ -	883,40	$ 10.780.130,00	3501,30	$ 42.726.364,00	4384,70	$ 53.506.494,00
4,00	SEÑALIZACION												
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	69,00	$ 576.313,00	$ 39.765.597,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
4,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	6,00	$ 840.283,00	$ 5.041.698,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M2	662,45	$ 93.128,00	$ 61.692.644,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
4,04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M	11.478,71	$ 8.531,00	$ 97.924.875,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	224,50	$ 433.751,00	$ 97.377.100,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
5,00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS												
5,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0,20m X 0,20m X 0,06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	5.031,74	$ 56.122,00	$ 282.391.312,00	-	$ -	0,00	$ -	230,13	$ 12.915.356,00	230,13	$ 12.915.356,00

	CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO LP-SIM-035-2024	FECHA DE INICIACION:	VEINTIOCHO (28) DE FREBRERO 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
			PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES	$ 1.834.088.110,00
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE 2025	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
			VALOR CONTRACTUAL	$ 15.436.620.455,00	DEL 28/Mayo/2025 HASTA 27/Junio/2025
			VALOR PRESENTE	$ 15.436.620.455,00	DEL 28/Abril/2025 HASTA 27/Mayo/2025
			ACTA PARCIAL DE OBRA N°1	$ 1.670.972.179,00	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	$ 1.834.088.110,00	
	RePRESENTEnte:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 3.505.060.289,00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA	11,88%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
VERSIÓN: 02	CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA		
ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		RePRESENTEnte:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ	% AVANCE FISICO ACUMULADO	22,71% 19/Agosto/2025

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No.1		PRESENTE ACTA No.2		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
5,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	5.031,74	$ 49.728,00	$ 250.218.367,00	-	$ -	0,00	$ -	230,13	$ 11.443.905,00	230,13	$ 11.443.905,00
5,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	4.480,27	$ 139.718,00	$ 625.974.364,00	-	$ -	0,00	$ -	129,15	$ 18.044.580,00	129,15	$ 18.044.580,00
5,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	95,00	$ 1.130.234,00	$ 107.372.230,00	-	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.260.468,00	2,00	$ 2.260.468,00
5,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	87,00	$ 1.563.444,00	$ 136.019.628,00	-	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.126.888,00	2,00	$ 3.126.888,00
5,06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	364,00	$ 267.827,00	$ 97.489.028,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
6,00	OTRAS ACTIVIDADES												
6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	265,50	$ 79.716,00	$ 21.164.598,00	-	$ -			200,10	$ 15.951.172,00	200,10	$ 15.951.172,00
6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	177,00	$ 103.364,00	$ 18.295.428,00	-	$ -	21,00	$ 2.170.644,00	156,00	$ 16.124.784,00	177,00	$ 18.295.428,00
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	177,00	$ 376.902,00	$ 66.711.654,00	-	$ -					0,00	$ -
7,00	BOX CULVERT											0,00	$ -
7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	467,23	$ 26.976,00	$ 12.603.996,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
7,02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE, PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	29,64	$ 25.281,00	$ 749.329,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
7,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	645,93	$ 29.316,00	$ 18.936.084,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
7,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	186,63	$ 14.150,00	$ 2.640.815,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
7,05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	633,23	$ 107.167,00	$ 67.861.359,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
7,06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	29,64	$ 220.741,00	$ 6.542.763,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
7,07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	5,93	$ 756.380,00	$ 4.485.333,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
7,08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)	M3	76,14	$ 1.915.967,00	$ 145.881.727,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
7,09	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	6.209,52	$ 12.203,00	$ 75.774.773,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
7,10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M	11,00	$ 1.640.743,00	$ 18.048.173,00	-	$ -	0,00	$ -				
8,00	REDES ELECTRICAS												
8,1	RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.											0,00	$ -
8,1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M	2.770,00	$ 5.534,00	$ 15.329.180,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,1,02	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	3,00	$ 4.777.569,00	$ 14.332.707,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,1,03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	3,00	$ 942.663,00	$ 2.827.989,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,1,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	2,00	$ 3.292.966,00	$ 6.585.932,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,1,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1,00	$ 4.936.581,00	$ 4.936.581,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,1,06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	300,00	$ 89.177,00	$ 26.753.100,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -

	CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO LP-SIM-035-2024	FECHA DE INICIACION:	VEINTIOCHO (28) DE FREBRERO 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
			PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES	$ 1.834.088.110,00
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE 2025	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
			VALOR CONTRACTUAL	$ 15.436.620.455,00	DEL 28/Mayo/2025 HASTA 27/Junio/2025
			VALOR PRESENTE	$ 15.436.620.455,00	DEL 28/Abril/2025 HASTA 27/Mayo/2025
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1	$ 1.670.972.179,00	
	RePRESENTEnte:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	$ 1.834.088.110,00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 3.505.060.289,00	
			% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA	11,88%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
VERSIÓN: 02	CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA			
ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		RePRESENTEnte: MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ	% AVANCE FISICO ACUMULADO	22,71%	19/Agosto/2025

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No.1		PRESENTE ACTA No.2		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
8,1,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND	1,00	$ 4.406.527,00	$ 4.406.527,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,1,08	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND	1,00	$ 2.138.049,00	$ 2.138.049,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,1,09	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	1,00	$ 4.644.312,00	$ 4.644.312,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,1,10	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	1,00	$ 8.230.927,00	$ 8.230.927,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,2	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.					-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,2,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION,	M	2.770,00	$ 2.942,00	$ 8.149.340,00								
8,2,02	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	30,00	$ 1.005.676,00	$ 30.170.280,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,2,03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	30,00	$ 541.191,00	$ 16.235.730,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,2,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	20,00	$ 753.465,00	$ 15.069.300,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,2,05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	500,00	$ 80.556,00	$ 40.278.000,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,2,06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	1.150,00	$ 86.754,00	$ 99.767.100,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,2,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	4,00	$ 1.614.099,00	$ 6.456.396,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	3,00	$ 2.218.106,00	$ 6.654.318,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,2,09	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	26,00	$ 1.071.335,00	$ 27.854.710,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,2,10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	M	2.260,00	$ 20.322,00	$ 45.927.720,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,3	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.					-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	1,00	$ 9.013.834,00	$ 9.013.834,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,4	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.				$ -	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,4,01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	800,00	$ 62.932,00	$ 50.345.600,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,4,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	7,00	$ 975.339,00	$ 6.827.373,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
8,4,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	15,00	$ 768.436,00	$ 11.526.540,00	-	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -

	CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO LP-SIM-035-2024	FECHA DE INICIACION:	VEINTIOCHO (28) DE FREBRERO 2025	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
			PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES	$ 1.834.088.110,00
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE 2025	PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
			VALOR CONTRACTUAL	$ 15.436.620.455,00	DEL 26/Mayo/2025 HASTA 27/Junio/2025 DEL 26/Abril/2025 HASTA 27/Mayo/2025
			VALOR PRESENTE	$ 15.436.620.455,00	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1	$ 1.670.972.179,00	
	RePRESENTEnte:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	$ 1.834.088.110,00	
			VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 3.505.060.289,00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA	11,88%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
VERSIÓN: 02	CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA		
ACTA PARCIAL DE OBRA N°2		RePRESENTEnte:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ	% AVANCE FISICO ACUMULADO	22,71%
					19/Agosto/2025

CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No.1		PRESENTE ACTA No.2		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 15.237.720.512,00				$ 1.670.972.179,00		$ 1.834.088.110,00		$ 3.505.060.289,00
	PGIO				$ 147.341.365,00								
	TRAMITE ANTE ENTIDAD AMBIENTAL				$ 45.058.578,00				$ -		$ -		
	TRAMITES y LEGALIZACIONES (AFINIA)				$ 6.500.000,00				$ -		$ -		
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 15.436.620.455,00				$ 1.670.972.179,00		$ 1.834.088.110,00		$ 3.505.060.289,00
	VALOR TOTAL OBRA				$ 15.436.620.455,00				$ 1.670.972.179,00		$ 1.834.088.110,00		$ 3.505.060.289,00
	ANTICIPO				0%								

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: $	15.436.620.455,00
V/R ADICIONES: $	-
V/R ACTUAL CONTRATO: $	15.436.620.455,00

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR ACTA PARCIAL	% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL INICIAL	% IMPREVISTO	COSTO DE IMPREVISTO DEL CONTRATO	COSTO IMPREVISTO POR ACTA	DESCUENTO IMPREVISTO	PAGO DE IMPREVISTO JUSTIFICADO	VALOR FACTURADO	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		$1.670.972.179,00	10,82%	1,00%	$ 114.569.327,00	$12.563.701,00	$12.563.701,00	$ 0,00	$ 1.658.408.478,00		$ 1.658.408.478,00
2	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2	EN TRAMITE	$1.834.088.110,00	11,88%	1,00%		$13.790.136,00	$13.790.136,00	$ 0,00		$ 1.820.297.974,00	$ 3.478.706.452,00
TOTAL			$3.505.060.289,00	22,71%			$26.353.837,00	$26.353.837,00	$0,00	$1.658.408.478,00	$1.820.297.974,00	$ 3.478.706.452,00

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, el dia **19 de agosto de 2025**

TOTAL NETO A COBRARR: **$ 1.820.297.974,00**

SON: MIL OCHOCIENTOS VEITE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CONSORCIO SINÚ URBANO
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA
MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
INTERVENTOR:


MEMORIA DE CANTIDADES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	1.ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO		UNIDAD	M
ITEM	1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO			

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2



Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Abscisas K0+177 Hasta k0+183,8, Carril Izquierdo



Tramo 2: Carrera 16B Entre Las Carreras 29 y 39 - k0+030 Hasta K0+045 - Carril Izquierdo Y k0+126

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				LONGITUD [m]	LONG. ACUMULADA
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD		
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		Empalme Carril de Entrada y Salida con la Calle 41		150,00			3	450,00	450,00
	Tramo 2: Carrera 16B Entre Las Carreras 29 y 39				6,00			2	12,00	462,00
	Tramo 2: Carrera 16B Entre Las Carreras 29 y 40				5,28			1	5,28	467,28
										467,28
										467,28
										467,28

TOTAL ÍTEM

CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	467,28
SALDO POR COBRAR	-

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.2

REGISTRO FOTOGRAFICO


Tramo 5: Altos de la Floresta



Tramo: Villa Fátima

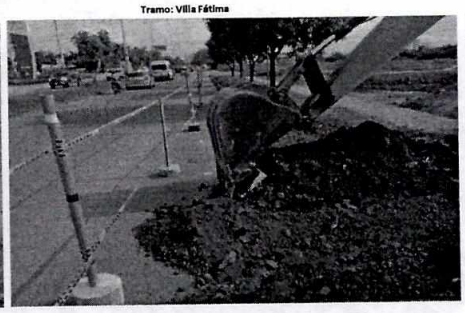

Tramo2 : San Jose

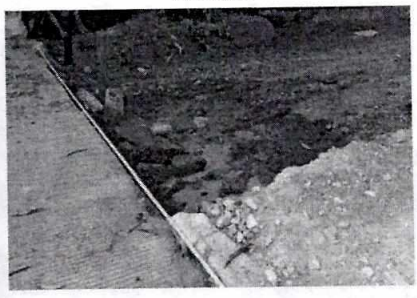


DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1 ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	1.ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO			
ITEM	1,02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS		UNIDAD	M3

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2

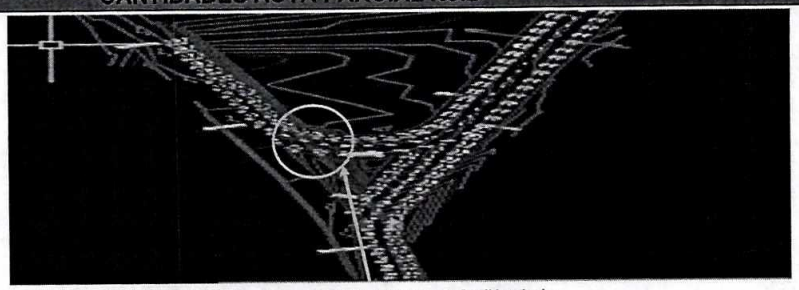


Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Abscisas K0+177 Hasta k0+183,8, Carril Izquierdo

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				LONGITUD	LONG. ACUMULADA
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD		
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		Empalme Carril de Salida con la Calle 41		2,10	1,40	0,20	1	0,59	0,59
	TOTAL ÍTEM									55,00

CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	0,59
SALDO POR COBRAR	55,41

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Tramo: Villa Fátima

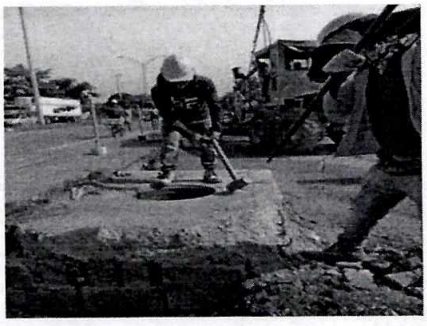


DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	AURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCH
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1 ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	1.ACTIVIDADES PRELIMNARES	SUBCAPITULO			
ITEM	1,03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA		UNIDAD	M

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2

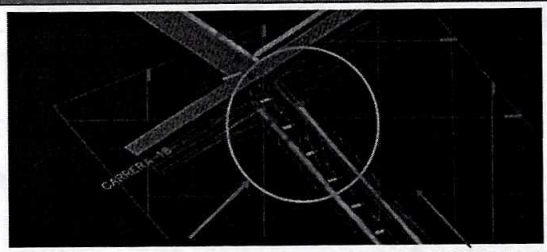

Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos - k0+030 Hasta K0+045 - Carril Izquierdo




Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				LONGITUD	LONG. ACUMULADO
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD		
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		Carril derecho k0+ 015 hasta k0+039		24,00			1	24,00	24,00
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		Carril derecho k0+ 050 hasta k0+058		8,00			1	8,00	32,00
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		Carril derecho k0+ 062 hasta k0+070		6,00			1	6,00	38,00
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		Carril izquierdo k0+ 243,9 hasta k0+260		12,60			1	12,60	50,60
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48		Carril derecho k0+ 065 hasta k0+040		67,90			1	67,90	118,50
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48		Carril derecho k0+ 115 hasta k0+98,9		16,10			1	16,10	134,60
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48				10,00			1	10,00	144,60
			TOTAL ÍTEM							1498,84

CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	144,60
SALDO POR COBRAR	1.361,24

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Tramo 10 y 11 : Santa Barbara

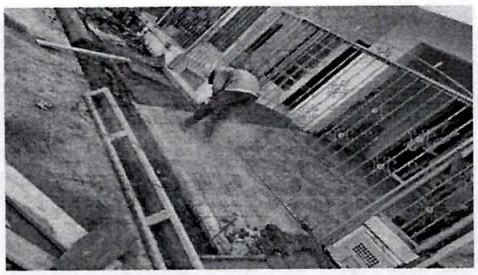




DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	AURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHI
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	1.ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO		UNIDAD	M2
ITEM	1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO			


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2

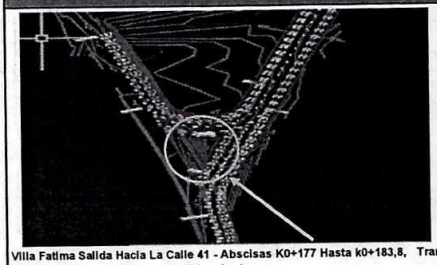

Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Abscisas K0+177 Hasta k0+183,8, Carril Izquierdo



Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos - k0+030 Hasta K0+045 - Carril Izquierdo




Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				LONGITUD (m)	LONG. ACUMULADO (m)
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD		
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		Carril Aceleracion k0+ 295 hasta k0+230 Carril entrada k0+000 hasta k0+080		150,00	1,10		1	165,00	165,00
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		Carril derecho k0+ 015 hasta k0+039		24,00	0,75		1	18,00	183,00
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		Carril derecho k0+ 050 hasta k0+058		8,00	0,60		1	4,80	187,80
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		Carril derecho k0+ 062 hasta k0+070		6,00	0,50		1	3,00	190,80
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		Carril izquierdo k0+ 243,9 hasta k0+260		12,60	0,30		1	3,78	194,58
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48		Carril derecho k0+ 115 hasta k0+98,9		16,10	1,00		1	16,10	210,68
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48		Carril derecho k0+ 065 hasta k0+031,05 Doble piso		67,90	0,92		1	62,20	272,88
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48				10,00	1,00		1	10,00	282,88
	Tramo 3: Carrera 15C Entre Calles 40A Y 41		k0+000 hasta k0+020		20,00	1,00		1	20,00	302,88
			TOTAL ÍTEM							671,39

CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	302,88
SALDO POR COBRAR	268,51

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	


Tramo 11: Santa Barbara

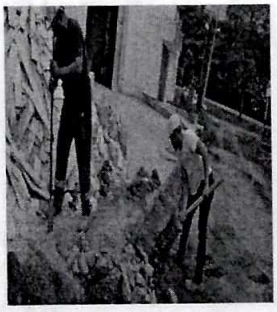

Tramo 11: Santa Barbara



Tramo 3: El Mora Carrera 15C

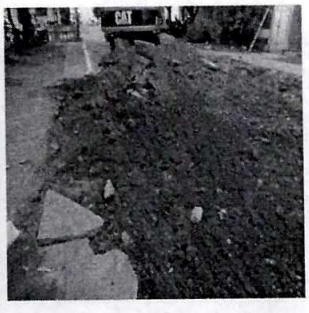

Tramo 3: El Mora Carrera 15C




DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPITULO	1.ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO			
ITEM	1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.1

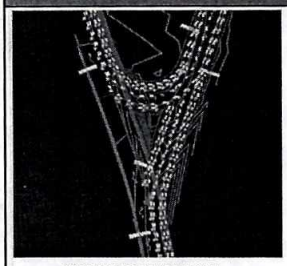


VILLA FATIMA SALIDA A LA 41

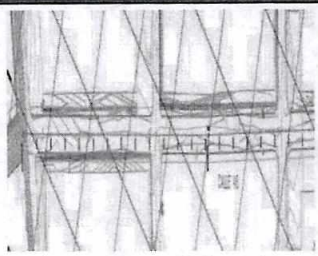

Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Vía Montería - San

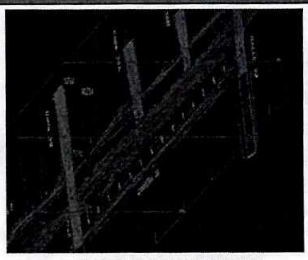

CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39

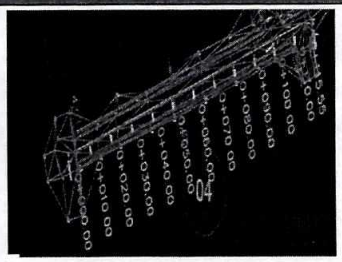

TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSIO		
CANTIDADES COBRARDAS ACTA No.1										
Villa Fatima Salida a la Calle 41 - Carril de Aceleración, Salida										
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+000,00	3,12	0,00				0,00	0,00
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+005,00	3,39	5,00				16,28	16,28
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+010,00	0,88	5,00				10,68	26,95
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+015,00	0,00	5,00				2,20	29,15
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida									29,15
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+220,00	0,00	0,00				0,00	29,15
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+225,00	1,61	5,00				4,03	33,18
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+230,00	1,90	5,00				8,78	41,95
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+235,00	1,97	5,00				9,68	51,63
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+240,00	1,84	5,00				9,53	61,15
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+245,00	1,82	5,00				9,15	70,30
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+250,00	1,75	5,00				8,93	79,23
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+255,00	1,69	5,00				8,60	87,83
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+260,00	1,52	5,00				8,03	95,85
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+265,00	1,26	5,00				6,95	102,80
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+270,00	0,97	5,00				5,58	108,38
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+275,00	0,64	5,00				4,03	112,40
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+280,00	0,42	5,00				2,65	115,05
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+285,00	0,26	5,00				1,70	116,75
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+290,00	0,00	5,00				0,65	117,40
									TOTAL	117,40
Villa Fatima Salida a la Calle 41 - Carril de Desaceleración, Entrada										
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+000,00	0,17	0,00				0,00	0,00
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+005,00	0,19	5,00				0,90	0,90
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+010,00	0,30	5,00				1,23	2,13
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+015,00	0,47	5,00				1,93	4,05
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+020,00	0,72	5,00				2,98	7,03
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+025,00	1,01	5,00				4,33	11,35
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+030,00	1,31	5,00				5,80	17,15
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+035,00	1,69	5,00				7,50	24,65
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+040,00	2,02	5,00				9,28	33,93
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+045,00	2,16	5,00				10,45	44,38
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+050,00	2,18	5,00				10,85	55,23
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+055,00	2,20	5,00				10,95	66,18
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+060,00	2,11	5,00				10,78	76,95
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+065,00	2,10	5,00				10,53	87,48
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+070,00	1,99	5,00				10,23	97,70
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+075,00	2,38	5,00				10,93	108,63
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+080,00	0,92	5,00				8,25	116,88
									TOTAL	116,88

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	1.ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO		UNIDAD	M3
ITEM	1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES			

Barrio Santa Barbara - Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos											
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+000,00	4,34	0				0,000	0,00
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+010,00	4,36	10,00				43,500	43,50
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+020,00	5,58	10,00				49,700	93,20
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+030,00	6,19	10,00				58,850	152,05
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+040,00	6,25	10,00				62,200	214,25
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+050,00	6,31	10,00				62,800	277,05
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+060,00	6,10	10,00				62,050	339,10
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+070,00	5,94	10,00				60,200	399,30
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+080,00	5,88	10,00				59,100	458,40
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+090,00	5,59	10,00				57,350	515,75
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+100,00	6,41	10,00				60,000	575,75
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+110,00	6,09	10,00				62,500	638,25
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+120,00	6,14	10,00				61,150	699,40
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+130,00	6,01	10,00				60,750	760,15
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+140,00	6,04	10,00				60,250	820,40
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+150,00	5,71	10,00				58,750	879,15
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+160,00	5,56	10,00				56,350	935,50
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+170,00	5,40	10,00				54,800	990,30
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+180,00	5,54	10,00				54,700	1045,00
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+190,00	5,16	10,00				53,500	1098,50
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+200,00	5,72	10,00				54,400	1152,90
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+210,00	5,17	10,00				54,450	1207,35
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+220,00	5,58	10,00				53,750	1261,10
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+230,00	5,58	10,00				55,800	1316,90
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+240,00	5,58	10,00				55,800	1372,70
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+250,00	5,58	10,00				55,800	1428,50
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+260,00	5,58	10,00				55,800	1484,30
	Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+274,00	5,58	14,00				78,120	1562,42
									TOTAL	1562,42
Barrio Santa Barbara - Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48											
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+000,00	5,96	-				0,00	0,00
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+010,00	7,13	10,00				65,45	65,45
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+020,00	6,94	10,00				70,35	135,80
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+030,00	6,87	10,00				69,05	204,85
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+040,00	6,29	10,00				65,80	270,65
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+050,00	6,46	10,00				63,75	334,40
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+060,00	6,15	10,00				63,05	397,45
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+070,00	6,37	10,00				62,60	460,05
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+080,00	5,46	10,00				59,15	519,20
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+090,00	5,21	10,00				53,35	572,55
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+100,00	5,67	10,00				54,40	626,95
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+110,00	5,38	10,00				55,25	682,20
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+120,00	4,81	10,00				50,95	733,15
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+130,00	5,38	10,00				50,95	784,10
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+140,00	6,38	10,00				58,80	842,90
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+150,00	6,38	10,00				63,80	906,70
	Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48		K0+155,00	5,60	5,00				29,95	936,65
									TOTAL	936,65
Barrio San José - Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39											
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+000,00	6,55	0,00				0,00	0,00
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+010,00	6,97	10,00				67,60	67,60
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+020,00	6,40	10,00				66,85	134,45
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+030,00	6,89	10,00				66,45	200,90
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+040,00	6,80	10,00				68,45	269,35
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+050,00	6,78	10,00				67,90	337,25
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+060,00	7,05	10,00				69,15	406,40
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+070,00	6,48	10,00				67,65	474,05
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+080,00	6,82	10,00				66,50	540,55
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+090,00	6,89	10,00				68,55	609,10
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+100,00	7,32	10,00				71,05	680,15
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+110,00	6,44	10,00				68,80	748,95
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+120,00	7,75	10,00				70,95	819,90
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+130,00	7,54	10,00				76,45	896,35
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+140,00	6,48	10,00				70,10	966,45
	TRAMO 12 - CRA 16C ENTRE LAS CALLES 38 Y 39		K0+150,00	5,64	10,00				60,60	1027,05
									TOTAL	1027,05

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	1.ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO		UNIDAD	M3
ITEM	1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES			

Barrio el Mora - Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B											
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+000,00	4,41	0,00				0,00	0,00
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+010,00	5,54	10,00				49,75	49,75
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+020,00	5,02	10,00				52,80	102,55
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+030,00	4,55	10,00				47,85	150,40
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+040,00	4,13	10,00				43,40	193,80
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+050,00	4,13	10,00				41,30	235,10
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+060,00	4,17	10,00				41,50	276,60
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+070,00	4,06	10,00				41,15	317,75
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+080,00	4,01	10,00				40,35	358,10
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+090,00	4,14	10,00				40,75	398,85
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+100,00	4,10	10,00				41,20	440,05
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+110,00	3,99	10,00				40,45	480,50
	TRAMO 4 - CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B		K0+116,00	3,74	6,00				23,19	503,69
									TOTAL	503,69
	Boca calle - Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos				3,5	6,0	0,9		18,90	18,90
	Boca calle - Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos				3,5	6,0	0,9		18,90	37,80
	Boca calle - Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48				3,5	6,0	0,9		18,90	56,70
	Boca calle - Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48				3,5	6,0	0,9		18,90	75,60
	Boca calle - Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48				3,5	6,0	0,9		18,90	94,50
	Boca calle - Tramo 11 - CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48				3,5	6,0	0,9		18,90	113,40
									TOTAL	113,40
CANTIDADES PRESENTE ACTA No.2										
Villa Fatima Salida a la Calle 41 - Carril de Desaceleración, Entrada										
	Villa fatima - Excavación para reubicación de tuberia de telecomunicaciones				61,00	0,6	0,80		29,28	29,28
	Villa fatima - Excavación para cuneta natural				210,00	0,6	0,80		100,80	130,08
									TOTAL	130,08
Barrio Santa Barbara - Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48										
	Descuento de volumen por intersección con la calle 46				6,00	6,10	0,96		-35,14	-35,14
									TOTAL	-35,14
Barrio El Mora y Altos de La Floresta - Tramo 5: Carrera 16A Entre Calles 40A Y 41										
	TRAMO 5 - CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41		K0+000,00	5,29	0,0				0,00	0,00
	TRAMO 5 - CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 42		K0+010,00	6,78	10,0				60,35	60,35
	TRAMO 5 - CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 43		K0+020,00	6,41	10,0				65,95	126,30
	TRAMO 5 - CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 44		K0+030,00	6,05	10,0				62,30	188,60
	TRAMO 5 - CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 45		K0+040,00	6,99	10,0				65,20	253,80
	TRAMO 5 - CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 46		0+049,88	5,51	10,0				62,50	316,30
	TRAMO 5 - CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 47		0+050,05	0,00	10,0				27,55	343,85
									TOTAL	343,85
Barrio El Mora - Tramo 3: Carrera 15C Entre Calles 40A Y 41										
	TRAMO 3 - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41		K0+000,00	2,24	0,00				0,00	**0,00**
	TRAMO 3 - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41		K0+010,00	2,46	10,00				23,50	**23,50**
	TRAMO 3 - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41		K0+020,00	1,84	10,00				21,50	**45,00**
	TRAMO 3 - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41		K0+030,00	2,01	10,00				19,26	**64,26**
	TRAMO 3 - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41		K0+040,00	2,30	10,00				21,55	**85,81**
	TRAMO 3 - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41		K0+050,00	2,79	10,00				25,45	**111,25**
	TRAMO 3 - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41		K0+060,00	2,63	10,00				27,10	**138,35**
	TRAMO 3 - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41		K0+070,00	2,66	10,00				26,42	**164,77**
	TRAMO 3 - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41		K0+080,00	2,22	10,00				24,39	**189,17**
	TRAMO 3 - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41		K0+090,00	2,03	10,00				21,26	**210,42**
	TRAMO 3 - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41		K0+100,00	2,01	10,00				20,21	**230,64**
	TRAMO 3 - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41		K0+110,00	2,02	10,00				20,16	**250,80**
									TOTAL	**250,80**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	1.ACTIVIDADES PRELIMNARES		SUBCAPITULO								
ITEM	1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES								UNIDAD	M3
	Barrio San Jose - Tramo 2: Carrera 16B Entre Calles 29 Y 39										
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+010.00	3,23	0					0	0,00
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+020.00	4,02	10					36,25	36,25
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+030.00	4,23	10					41,29	77,54
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+040.00	5,11	10					46,73	124,27
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+050.00	5,18	10					51,48	175,75
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+060.00	4,62	10					49,01	224,76
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+070.00	4,93	10					47,76	272,52
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+080.00	5,13	10					50,3	322,82
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+090.00	5,38	10					52,56	375,38
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+100.00	5,63	10					55,06	430,44
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+110.00	5,46	10					55,43	485,87
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+123.00	5,58	13					71,75	557,62
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+130.00	5,21	0					0	557,62
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+140.00	5,33	10					52,72	610,34
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+150.00	5,75	10					55,41	665,75
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+160.00	5,95	10					58,51	724,26
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+170.00	5,97	10					59,63	783,89
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+178.00	5,18	8					44,62	828,51
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+185.00	4,94	0					0	828,51
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+200.00	4,73	15					72,52	901,03
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+210.00	4,92	10					48,22	949,25
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+220.00	5,11	10					50,14	999,39
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+230.00	5,66	10					53,86	1053,25
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+246.60	5,48	16,6					92,47	1145,72
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+252.30	4,84	0					0	1145,72
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+260.00	5,37	7,7					39,3	1185,02
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+270.00	5,34	10					53,52	1238,54
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+280.00	4,9	10					51,17	1289,71
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+290.00	4,96	10					49,31	1339,02
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+300.00	4,86	10					49,1	1388,12
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+310.00	5,18	10					50,19	1438,31
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+320.00	5,34	10					52,59	1490,90
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+330.00	5,14	10					52,39	1543,29
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+339.20	4,8	9,2					45,73	1589,02
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+346.30	6,27	0					0	1589,02
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+360.00	7,27	13,7					92,72	1681,74
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+370.00	7,23	10					72,49	1754,23
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+380.00	7,37	10					73,02	1827,25
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+390.00	7,6	10					74,86	1902,11
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+403.00	6,9	13					94,26	1996,37
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+410.00	6,42	0					0	1996,37
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+420.00	6,6	10					65,1	2061,47
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+430.00	6,85	10					67,27	2128,74
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+440.00	7,33	10					70,94	2199,68
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+449.50	7,58	9,5					70,83	2270,51
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+456.00	6,3	0					0	2270,51
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+470.00	5,94	14					85,71	2356,22
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+480.00	6,09	10					60,19	2416,41
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+490.00	6,03	10					60,62	2477,03
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39		0+496.00	6,55	6					37,73	2514,76
										TOTAL	2514,76

TOTAL ÍTEM	11285,80


CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	4.377,49
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	3.204,35
SALDO POR COBRAR	3.683,76


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 5 de 5 ACTA PARCIAL No.2


DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPITULO	1.ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO			
ITEM	1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES		UNIDAD	M3

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 5 de 5 ACTA PARCIAL No.2

REGISTRO FOTOGRAFICO

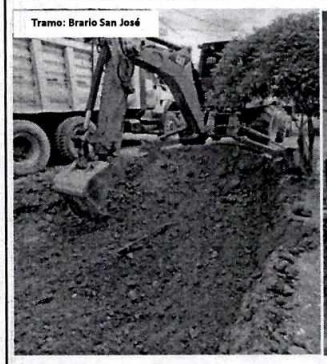

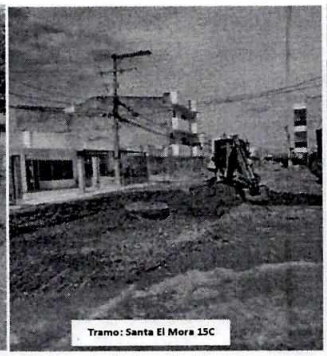

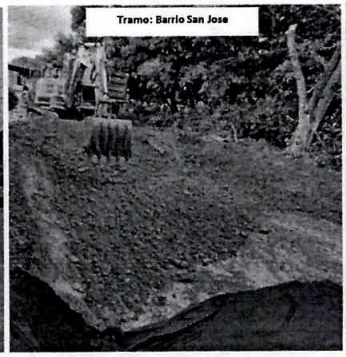



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	1.ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO			
ITEM	1,07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2



Tramo 3 El mora -Cra 15c entre las calles 40a y 41



Tramo 2: San José - Cra 16B entre las calles 29 y 39



Tramo 2: San José - Cra 16B entre las calles 29 y 39

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
	CANTIDADES ACTA No.1									
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+177 Hasta k0+183,8 - Carril Izquierdo		6,80	6,50	0,500		22,10	22,10
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		k0+030 Hasta K0+045 - Carril Izquierdo		15,00	3,00	0,500		22,50	44,60
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		k0+030 Hasta K0+045 - Carril Izquierdo		15,00	3,00	0,500		22,50	67,10
	CANTIDADES PRESENTE ACTA No.2									
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		K0+428 - K0+436 - Carril Derecho		8,00	3,00	0,40		9,60	76,70
	Tramo 2: San José - Cra 16B entre las calles 29 y 39		K0+140		8,00	3,70	0,65		19,24	95,94
	Tramo 2: San José - Cra 16B entre las calles 29 y 39		K0+445,00		6,50	3,20	0,35		7,28	103,22
	Tramo 2: San José - Cra 16B entre las calles 29 y 39		K0+445,00		2,00	3,20	0,60		3,84	107,06
	Tramo 3 El mora -Cra 15c entre las calles 40a y 41		K0+010		7,00	1,60	0,60		6,72	113,78
	Tramo 5: Carrera 16A Entre Calles 40A Y 41		K0+010		4,00	2,00	0,40		3,20	116,98
	Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B		K0+090,00		4,00	2,00	0,30		2,40	119,38
	TOTAL ÍTEM									1800,25

CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	67,10
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	52,28
SALDO POR COBRAR	1.680,87

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	


Tramo 2: San José



Tramo 2: San José



Tramo 3: El mora

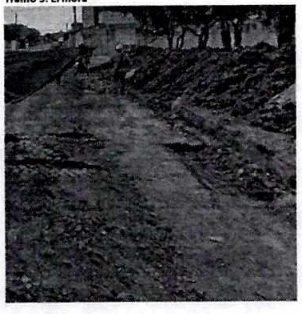


DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	1.ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO			
ITEM	1,8	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2




TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y39



TRAMO 5 - CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41



Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39



Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
	CANTIDAD ACTA No.1									
	Villa Fatima Hacia La Calle 41			234,28				25,00%	292,84	292,84
	Tramo10: Calle 46 Entre LA Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos			1562,42				25,00%	1.953,03	2245,87
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48			936,65				25,00%	1.170,81	3416,68
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39			1027,05				25,00%	1.283,81	4700,49
	Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B			503,69				25,00%	629,61	5330,11
	Bocacalles Empalme Calle 46 Entre Carrera 18 y Via Montería - San Carlos y Boca calles - Tramo 11 - Carrera 18B Entre Calles 44A y 48			113,40				25,00%	141,75	5471,86
	CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2									
	Villa Fatima Hacia La Calle 41			152,18				25,00%	190,23	5662,08
	Tramo10: Calle 46 Entre LA Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos			22,50				25,00%	28,13	5690,21
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39			32,10				25,00%	40,13	5730,33
	TRAMO 2 - Carrera 16B entre las calles 29 y 39			2545,12				25,00%	3.181,40	8911,73
	TRAMO 3 - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41			257,52				25,00%	321,90	9233,63
	TRAMO 5 - CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41			347,05				25,00%	433,81	9667,44
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48			-35,14				25,00%	- 43,92	9623,52
	Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B			2,40				25,00%	3,00	9626,52
	TOTAL ÍTEM									18257,01


CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	5.471,86
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	4.154,67
SALDO POR COBRAR	8.630,48

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
		ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	


Tramo: San José



Tramo: El mora

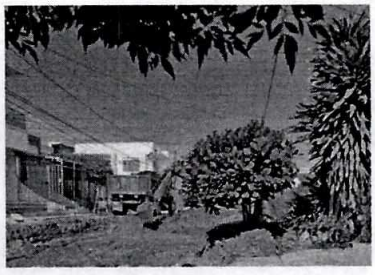

Tramo 5 CRA 16A

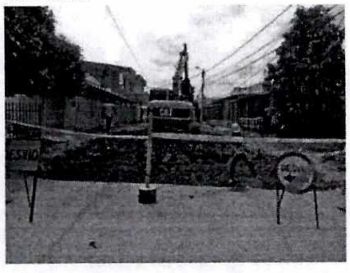

DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPITULO	6. OTRAS ACTIVIDADES	SUBCAPITULO			
ITEM	1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)		UNIDAD	UND

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2



Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41



Tramo 2: San José - Cra 16B entre las calles 29 y 39

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANT ACUMULADO
			ABSCISA	CARRIL	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD DE LOSAS		
	SAN JOSE									
	San Jose Tramo 2		K0+370	Carril Derecho					1,00	1,00
	San Jose Tramo 2		K0+388	Carril Derecho					1,00	2,00
	San Jose Tramo 2		K0+390	Carril izquierdo					1,00	3,00
	San Jose Tramo 2		K0+397	Carril izquierdo					1,00	4,00
	San Jose Tramo 2		k0+400	Carril Derecho					1,00	5,00
	San Jose Tramo 2		K0+402	Carril izquierdo					1,00	6,00
	San Jose Tramo 2		k0+406	Carril Derecho					1,00	7,00
	San josé Tramo 12		k0+035	Carril izquierdo					1,00	8,00
	San josé Tramo 12		k0+084	Carril izquierdo					1,00	9,00
	VILLA FATIMA									
	Villa Fatima		k0+000	Carril entrada					1,00	10,00
	Villa Fatima		k0+002	Carril entrada					1,00	11,00
	Villa Fatima		K0+014	Carril entrada					1,00	12,00
	Villa Fatima		K0+021	Carril entrada					1,00	13,00
	Villa Fatima		K0+028	Carril entrada					1,00	14,00
	Villa Fatima		K0+030	Carril entrada					1,00	15,00
	Villa Fatima		K0+035	Carril entrada					1,00	16,00
	Villa Fatima		K0+043	Carril entrada					1,00	17,00
	Villa Fatima		K0+056	Carril entrada					1,00	18,00
	Villa Fatima		K0+063	Carril entrada					1,00	19,00
	Villa Fatima		K0+070	Carril entrada					1,00	20,00
	Villa Fatima		K0+075	Carril entrada					1,00	21,00
	Villa Fatima		K0+080	Carril entrada					1,00	22,00
	Villa Fatima		K0+0237	Carril aceleracion					1,00	23,00
	Villa Fatima		K0+0240	Carril aceleracion					1,00	24,00
	Villa Fatima		K0+242	Carril aceleracion					1,00	25,00
	Villa Fatima		K0+270	Carril aceleracion					1,00	26,00
	Villa Fatima		K0+0280	Carril aceleracion					1,00	27,00
	Villa Fatima		K0+0284	Carril aceleracion					1,00	28,00
	Villa Fatima		K0+0287	Carril aceleracion					1,00	29,00
	Villa Fatima		K0+0290	Carril aceleracion					1,00	30,00
	Villa Fatima		K0+0292	Carril aceleracion					1,00	31,00
	EL MORA									
	El Mora		k0+018						1,00	32,00
	TOTAL ÍTEM									103,00

CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	32,00
SALDO POR COBRAR	71,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 2 de 2
		ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	


Tramo 2: San José



Villa Fatima Salida a la 41



Villa Fatima Salida a la 41

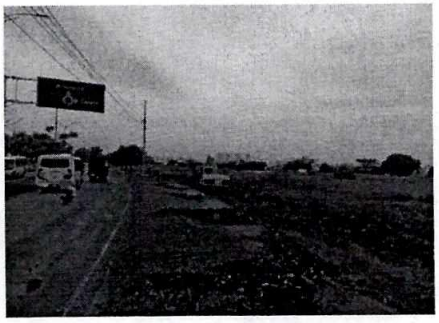

San Jose Tramo 1



Fatima Salida a la 41



Tramo 2: San José



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	AURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCH
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2


DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPITULO	6. OTRAS ACTIVIDADES	SUBCAPITULO			
ITEM	1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)		UNIDAD	UND

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2

Tramo: Villa Fátima

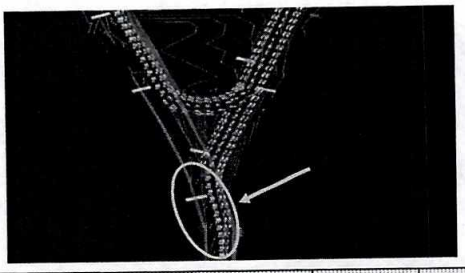

Tramo 2: San Jose

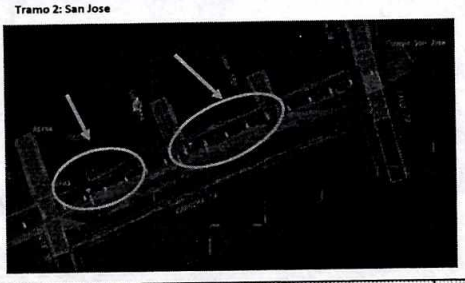

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANT ACUMULADA
			ABSCISA	CARRIL	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD DE LOSAS		
	Villa Fatima		K0+020						1,00	1,00
	Tramo N°2 - San José		k0+396	Carril Izquierdo					1,00	2,00
	Tramo N°2 - San José		k0+438	Carril Izquierdo					1,00	3,00
	TOTAL ÍTEM									8,00

CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	3,00
SALDO POR COBRAR	5,00


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Villa Fatima



Tramo 2: San Jose



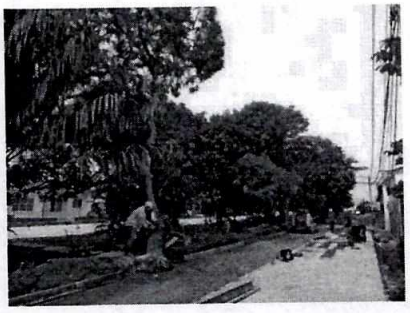

DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				

CAPITULO	2.SUBRASANTE Y SUBBASE		SUBCAPITULO		
ITEM	2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2

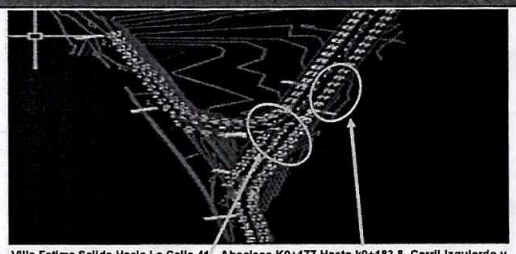

Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Abscisas K0+177 Hasta k0+183,8, Carril Izquierdo y K0+184 Hasta k0+215,05 - Ancho Calzada



Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos - k0+030 Hasta K0+045 - Carril Izquierdo



Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39 - k0+030 Hasta K0+045 - Carril Izquierdo

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL. ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
	CANTIDAD ACTA No.1									
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+177 Hasta k0+183,8 - Carril Izquierdo		6,80	6,50	0,50		22,10	22,10
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+184 Hasta k0+215,05 - Ancho Calzada		31,05	18,00	0,50		279,45	301,55
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		k0+030 Hasta K0+045 - Carril Izquierdo		15,00	3,00	0,50		22,50	324,05
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		k0+030 Hasta K0+045 - Carril Izquierdo		15,00	3,00	0,50		22,50	346,55
	CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2									
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		K0+428 - K0+436 - Carril Derecho		8,00	3,00	0,40		9,60	356,15
	Tramo 2: San José - Cra 16B entre las calles 29 y 39		K0+140		8,00	3,70	0,65		19,24	375,39
	Tramo 2: San José - Cra 16B entre las calles 29 y 39		K0+445,00		6,50	3,20	0,35		7,28	382,67
	Tramo 2: San José - Cra 16B entre las calles 29 y 39		K0+445,00		2,00	3,20	0,60		3,84	386,51
	Tramo 3 El mora -Cra 15c entre las calles 40a y 41		K0+010		7,00	1,60	0,6		6,72	393,23
	Tramo 5 -Altos de la Floresta		K0+010,00		4,00	2,00	0,4		3,20	396,43
	Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B		K0+090,00		4,00	2,00	0,3		2,40	398,83
	TOTAL ÍTEM									1800,25

CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	346,55
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	52,28
SALDO POR COBRAR	1.401,42

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
		ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Tramo 2: San José



Tramo 12: San José





DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAÚLICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACION MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPITULO	2.SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO			
ITEM	2,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2

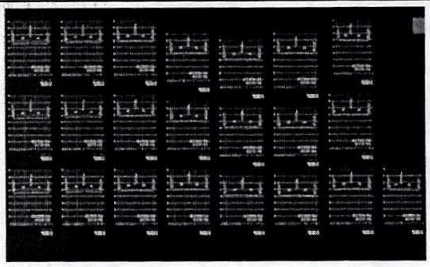


Secciones Material Seleccionado Villa Fatima, Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida + Carril de Entrada

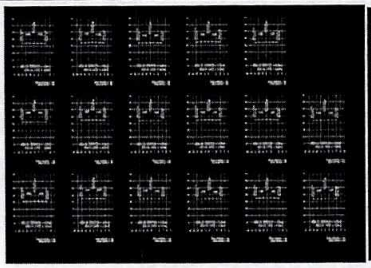

Secciones Material Seleccionado Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos + Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48

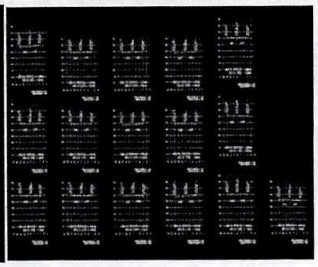

Secciones Material Seleccionado Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39




Secciones Material Seleccionado Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B

#ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	AREA EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
CANTIDADES ACTA No.1										
Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida										
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+000,00	8,58	0,00				0,00	0,00
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+010,00	8,52	10,00				85,50	85,50
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+020,00	8,52	10,00				85,20	170,70
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+030,00	8,52	10,00				85,20	255,90
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+040,00	8,52	10,00				85,20	341,10
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+050,00	8,52	10,00				85,20	426,30
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+060,00	8,52	10,00				85,20	511,50
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+070,00	8,52	10,00				85,20	596,70
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+080,00	8,52	10,00				85,20	681,90
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+090,00	8,52	10,00				85,20	767,10
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+100,00	8,52	10,00				85,20	852,30
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+110,00	8,52	10,00				85,20	937,50
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+120,00	8,52	10,00				85,20	1022,70
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+130,00	8,52	10,00				85,20	1107,90
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+140,00	8,52	10,00				85,20	1193,10
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+150,00	8,52	10,00				85,20	1278,30
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+160,00	8,52	10,00				85,20	1363,50
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+170,00	8,52	10,00				85,20	1448,70
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+180,00	8,52	10,00				85,20	1533,90
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+190,00	8,52	10,00				85,20	1619,10
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+200,00	7,20	10,00				78,60	1697,70
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+210,00	7,20	10,00				72,00	1769,70
	Villa Fatima - Tramo recto y carril de salida		K0+220,00	7,20	10,00				72,00	1841,70
								Subtotal Villa Fatima - Tramo Recto y Carril de Salida		**1841,70**
Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Carril de Desaceleración, Entrada										
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+080,00	6,00	0,00				0,00	0,00
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+090,00	6,00	10,00				60,00	60,00
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+100,00	6,00	10,00				60,00	120,00
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+110,00	6,00	10,00				60,00	180,00
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+120,00	6,00	10,00				60,00	240,00
	Villa Fatima - Carril de Entrada		K0+130,00	2,28	10,00				41,40	281,40
								Subtotal Villa Fatima - Tramo Carril de Entrada		**281,40**
CONSOLIDADO CANTIDADES										
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41, (Se anexa carteras)								2123,10	2123,10
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+000 Hasta K0+274		274,00	6,00	0,50		822,00	2945,10
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48		K0+000 Hasta K0+155		155,00	6,00	0,40		372,00	3317,10
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		K0+000 Hasta K0+150		150,00	6,00	0,40		360,00	3677,10
	Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B		K0+000 Hasta K0+116		116,00	5,50	0,40		255,20	3932,30
	Boca calle - Tramo N°10				3,50	6,00	0,50		10,50	3942,80
	Boca calle - Tramo N°10				3,50	6,00	0,50		10,50	3953,30
	Boca calle - Tramo N°11				3,50	6,00	0,40		8,40	3961,70


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAÚLICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACION MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPITULO	2.SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO			
ITEM	2,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2

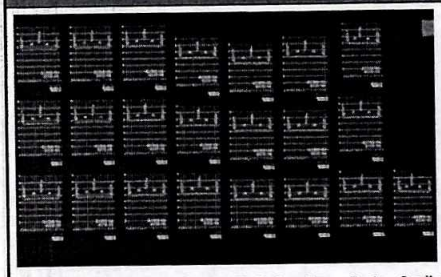


Secciones Material Seleccionado Villa Fatima, Tramo Recto y Carril de Aceleración, Salida + Carril de Entrada

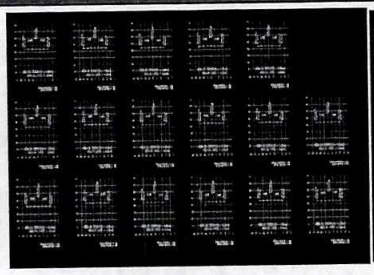

Secciones Material Seleccionado Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos + Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48

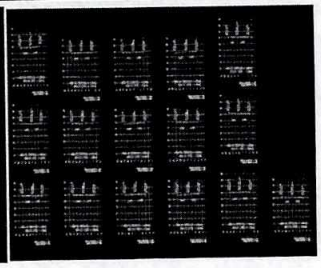

Secciones Material Seleccionado Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39



Secciones Material Seleccionado Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	AREA EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
	Boca calle - Tramo N°11				3,50	6,00	0,40		8,40	3970,10
	Boca calle - Tramo N°11				3,50	6,00	0,40		8,40	3978,50
	Boca calle - Tramo N°11				3,50	6,00	0,40		8,40	3986,90
	CANTIDADES PRESENTE ACTA No. 2									
	Tramo N°2 - Cra 16B entre las calles 29 y 39		K0+000 Hasta K0+248,76		248,76	6,00	0,40		597,02	4583,92
	TRAMO 3 - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41		K0+000 Hasta K0+080		80,00	5,50	0,40		176,00	4759,92
	TRAMO 5 - CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41		K0+000 Hasta K0+032		32,00	6,50	0,40		83,20	4843,12
	TOTAL ÍTEM									10235,68

CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	3.986,90
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	856,22
SALDO POR COBRAR	5.392,56

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Tramo 2: San Jose




Tramo 2: San Jose



Tramo 5: Altos de la floresta



Tramo 5: Altos de la floresta

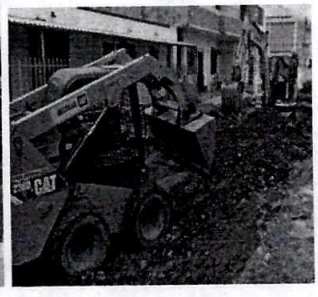


DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHE
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1 ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:	N/A		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	2.SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO			
ITEM	2,04	SUBBASE GRANULAR CLASE C		UNIDAD	M3

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2

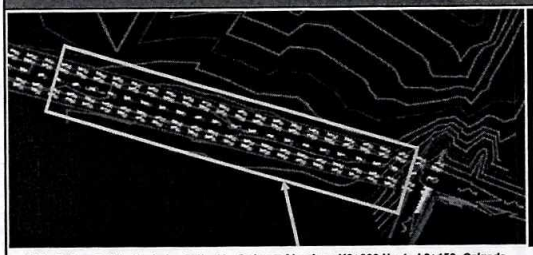

Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Subase Abscisas K0+000 Hasta k0+150, Calzada Completa

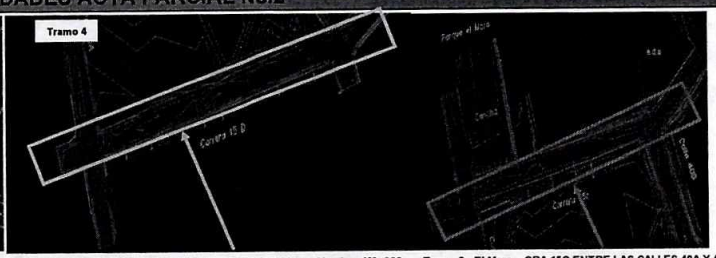

Tramo 4 - El Mora - Cra 15D entre calles 40B y 40A - Subase Abscisas K0+000 Hasta k0+103

Tramo 3 - El Mora - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - Subase Abscisas K0+000 Hasta k0+080

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
	CANTIDAD ACTA No.1									
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		k0+000 Hasta K0+150		150,00	7,40	0,20		222,00	222,00
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+000 Hasta K0+274		274,00	6,00	0,20		328,80	550,80
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		K0+000 Hasta K0+150		150,00	6,00	0,20		180,00	730,80
	CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2									
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		k0+000 Hasta K0+220		70,00	7,40	0,20		103,60	103,60
	Tramo 4 - El Mora - Cra 15D entre calles 40B y 40A.		K0+000 Hasta K0+103		103,00	5,50	0,20		113,30	216,90
	Tramo 3 - El Mora - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41		K0+000 Hasta K0+080		80,00	5,50	0,20		88,00	304,90
	TOTAL ÍTEM									5117,84

CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	730,80
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	304,90
SALDO POR COBRAR	4.082,14

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Tramo: Santa Barbara



Tramo 2: San José



Tramo: Villa Fatima




DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	2.SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO		UNIDAD	M2
ITEM	2,05	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE YCAPAS GRANULARES			


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2




Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Geotextil Abscisas K0+000 Hasta k0+220



Tramo 2 - Cra 16B entre las calles 29 y 39, Geotextil Abscisas K0+000 Hasta k0+248,76



TRAMO 5 - CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - Geotextil Abscisas K0+000 Hasta k0+032



Tramo 3: Carrera 15C Entre Las Calles 40A y 41 - Geotextil Abscisas K0+000 Hasta k0+080

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				AREA	AREA ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSIÓN		
	CANTIDAD ACTA No.1									
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		k0+000 Hasta K0+180		180,00	7,40			1.332,00	1332,00
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+000 Hasta K0+274		274,00	7,20			1.972,80	3304,80
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48		K0+000 Hasta K0+155		155,00	7,20			1.116,00	4420,80
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		K0+000 Hasta K0+150		150,00	7,00			1.050,00	5470,80
	Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B		K0+000 Hasta K0+116		116,00	6,50			754,00	6224,80
	Boca Calle - Tramo 10				3,50	7,20			25,20	6250,00
	Boca Calle - Tramo 10				3,50	7,20			25,20	6275,20
	Boca Calle - Tramo 11				3,50	7,20			25,20	6300,40
	Boca Calle - Tramo 11				3,50	7,20			25,20	6325,60
	Boca Calle - Tramo 11				3,50	7,20			25,20	6350,80
	Boca Calle - Tramo 11				3,50	7,20			25,20	6376,00
	CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2									
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		k0+000 Hasta K0+220		40,00	7,40			296,00	6672,00
	Villa Fatima Entrada desde La Calle 41		K0+080 Hasta K0+130		50,00	3,70			185,00	6857,00
	Tramo 2 - Cra 16B entre las calles 29 y 39		K0+000 Hasta K0+248,76		248,76	7,00			1741,32	8598,32
	TRAMO 3 - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41		K0+000 Hasta K0+080		80,00	5,90			472,00	9070,32
	TRAMO 5 - CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41		K0+000 Hasta K0+032		32,00	7,50			240,00	9310,32
	TOTAL ÍTEM									27829,53

CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	6.376,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	2.934,32
SALDO POR COBRAR	18.519,21

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Tramo 3: El Mora



Tramo 3: San José



Tramo 5: Altos de la Floresta



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.2


DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS	SUBCAPITULO			
ITEM	3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)		UNIDAD	M3

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2



Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Concreto MR 40 kg/cm2, Abscisas K0+000 Hasta k0+184,50, Carril Derecho, k0+184,5 hasta k0+248,5






Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Area Desde k248,5 Hasta k0+283



Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos - Concreto MR 40 kg/cm2 Absc K0+000 Hasta k0+182,02 Carril Izquierdo y Absc K0+000 Hasta k0+152 Carril Derecho




Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39 - Concreto MR 40 kg/cm2 Abscisas K0+150 Hasta k0+108, Carril Derecho

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
			ABSCISA	CANTIDAD	LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)		
			ACTA No.1							
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+000 Hasta K0+152,20 - Carril Derecho		152,20	3,5	0,21		111,87	111,87
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+000 Hasta K0+182,02 - Carril Izquierdo		182,02	3,00	0,2		109,21	221,08
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+000 Hasta K0+152 Carril Derecho		152,00	3,00	0,2		91,20	312,28
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		K0+152 Hasta K0+108 Carril Derecho		42,00	3,00	0,2		25,20	337,48
	Descuento Tapas de Pozos de Alcantarillado Tramo Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+019 - Eje de Via			1,70	0,2	- 2,27	- 0,45	337,03
	Descuento Tapas de Pozos de Alcantarillado Tramo Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+094 - Eje de Via			1,70	0,2	- 2,27	- 0,45	336,57
			CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2							
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+000 Hasta K0+152,20 - Carril Izquierdo		152,20	3,5	0,21		111,87	448,44
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+152.20 Hasta K0+184,20		32,00	7	0,21		47,04	495,48
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+184.5 Hasta K0+248.5		64,00	7	0,21		94,08	589,56
Carril Derecho - Curva de Salida	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+248,5 Hasta K0+283		161,84		0,21		33,99	623,54
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+152 Hasta K0+182.02 - Carril Derecho		30,02	3,00	0,2		18,01	641,56
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+182.02 Hasta K0+255.98 - Calzada Completa		73,96	6,00	0,2		88,75	730,31
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48		K0+000 Hasta K0+68.4 - Calzada Completa		68,40	6,00	0,2		82,08	812,39
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		K0+152 Hasta K0+108 Carril Izquierdo		42,00	3,00	0,2		25,20	837,59
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		K0+108 Hasta K0+008 Calzada Completa		102,00	6,00	0,2		122,40	959,99
	Tramo 4 - El Mora - Cra 15D entre calles 40B y 40A.		K0+000 Hasta K0+091,5 - Carril Derecho		91,50	2,75	0,2		50,33	1010,31
	Tramo 4 - El Mora - Cra 15D entre calles 40B y 40A.		K0+000 Hasta K0+060 - Carril Izquierdo		60,00	2,75	0,2		33,00	1043,31
	Tramo 2 - San José - CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39		K0+450 Hasta K0+410 - Calzada Completa		39,07	6,00	0,2		46,88	1090,20
	Tramo 2 - San José - CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39		K0+405 Hasta K0+373 - Carril Derecho		32,80	3,00	0,2		19,68	1109,88
	Tramo 3 - El Mora - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41		K0+000 Hasta K0+049 - Calzada Completa		49,00	5,50	0,2		53,90	1163,78
	Descuento Tapas de Pozos de Alcantarillado Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+019, K0+100, K0+185 y K0+275 - Eje de Via	2,00		1,40	0,2	- 1,54	- 0,62	1163,16
	Descuento Tapas de Pozos de Alcantarillado Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48		K0+010. K0+038, K0+115 - Eje de Via	2,00		1,40	0,2	- 1,54	- 0,62	1162,55

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2


DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS	SUBCAPITULO			
ITEM	3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)		UNIDAD	M3

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2



Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Concreto MR 40 kg/cm2, Abscisas K0+000 Hasta k0+184,50, Carril Derecho, k0+184,5 hasta k0+248,5






Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Area Desde k248,5 Hasta k0+283



Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos - Concreto MR 40 kg/cm2 Absc K0+000 Hasta k0+182,02 Carril Izquierdo y Absc K0+000 Hasta k0+182 Carril Derecho



Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39 - Concreto MR 40 kg/cm2 Abscisas K0+150 Hasta k0+108, Carril Derecho

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
			ABSCISA	CANTIDAD	LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)		
	Descuento Tapas de Pozos de Alcantarillado Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		K0+065 Eje de Via	1,00		1,40	0,2	- 1,54	- 0,31	1162,24
	Descuento Tapas de Pozos de Alcantarillado Tramo 4 - El Mora - Cra 15D entre calles 40B y 40A.		K0+060 Eje de Via	1,00		1,40	0,2	- 1,54	- 0,31	1161,93
	Descuento Tapas de Pozos de Alcantarillado Tramo 3 - El Mora - Cra 15C entre calles 40A y 41		K0+020 Eje de Via	1,00		1,40	0,2	- 1,54	- 0,31	1161,62
	TOTAL ÍTEM									4800,66


CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	336,57
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	825,06
SALDO POR COBRAR	3.639,04

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	


Tramo 3: El Mora



Tramo: Santa Barbara

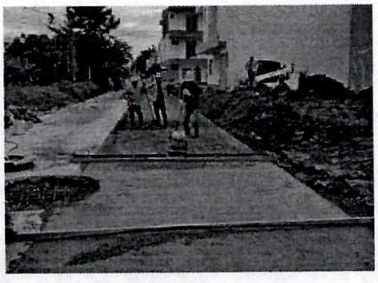

Tramo: Villa Fátima

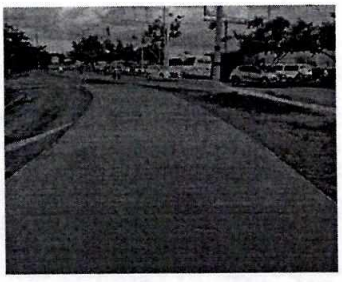

DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1 ACTA PARCIAL No.2


DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS	SUBCAPITULO			
ITEM	3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO		UNIDAD	M

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2

Villa Fatima



Tramo: Santa Barbara



# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				LADO	CANTIDAD ACUMULADA LONGITUD
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD DE LOSAS		
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+000 Hasta K0+171,8 - Carril Izquierdo		171,8				Izquierdo	171,80
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+000 Hasta K0+113 - Carril Izquierdo		113,00				Izquierdo	284,80
			K0+000 Hasta K0+230,91 - Carril Derecho		230,91				Derecho	515,71
TOTAL ÍTEM										2948,74

CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	515,71
SALDO POR COBRAR	2.433,03

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	


Tramo: Villa Fátima



Tramo: Villa Fátima



Tramo: Santa Barbara

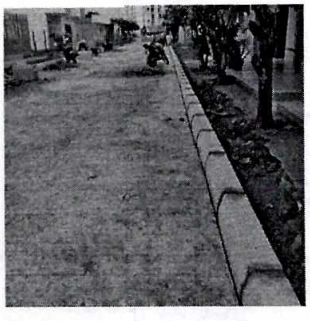

DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS	SUBCAPITULO		UNIDAD	KG
ITEM	3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa			

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2



Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 -



Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD DE LOSAS	KG ACUMULADO
			ABSCISA	AREA M2	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD DE LOSAS		
	CANTIDAD ACTA No.1									
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+000 Hasta K0+003,7 - Carril Derecho		3,7	3,5	10,00	1,00	1,00	129,50
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+000 Hasta K0+002,9 - Carril Izquierdo		2,90	3,00	10,0	2,00	1,00	174,00
			K0+000 Hasta K0+003,2 - Carril Derecho		3,20	3,00	10,0	2,00	1,00	192,00
			K0+019 Hasta K0+025,54 - Carril Izquierdo		3,27	3,00	10,0	2,00	1,00	195,90
			K0+019 Hasta K0+025,40 - Carril Derecho		3,20	3,00	10,0	2,00	1,00	192,00
	CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2									
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+000 Hasta K0+003,7 - Carril Derecho		3,7	3,5	10,00	1,00	1,00	129,50
Area Irregular N° 1 -Carril de Salida			K0+220 Hasta K0+240- Carril de Salida	42,10			10,00		1,00	421,00
Area Irregular N° 2 -Carril de Salida			K0+258 Hasta K0+0293- Carril de Salida	61,05			10,00		1,00	610,50
			VIGA							698,00
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39 - Carril derecho				4,10	3,00	10,0	2,00	1,00	246,00
					3,80	3,00	10,0	1,00	1,00	114,00
	Tramo 4 - El Mora - Cra 15D entre calles 40B y 40A				3,50	2,75	10,0	4,00	1,00	385,00
	Tramo 2 - San José - CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39				3,53	3,00	10,0	2,00	1,00	211,80
	Tramo 2 - San José - CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39				3,60	3,00	10,0	1,00	1,00	108,00
	Tramo 11 - Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48				3,00	3,00	10,0	2,00	1,00	180,00
	Tramo 11 - Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48				3,60	3,00	10,0	2,00	1,00	216,00
	Tramo 3 - El Mora - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41				3,30	2,75	10,0	2,00	1,00	181,50
	TOTAL ÍTEM									23884,56


CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	883,40
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	3.501,30
SALDO POR COBRAR	19.499,86

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.2

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tramo: Santa Barbara

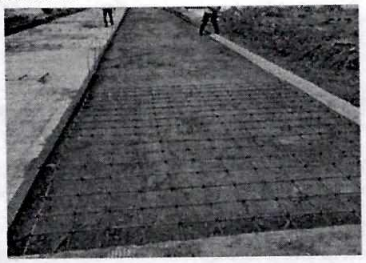

Tramo 3: El Mora



Tramo 12: San Jose



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPITULO	5. ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS	SUBCAPITULO			
ITEM	5,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS		UNIDAD	M

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2

Tramo: Villa Fátima



Tramo: Santa Barbara




# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				LADO	CANTIDAD ACUMULADA LONGITUD
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD DE LOSAS		
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+000 Hasta K0+080 - Carril Izquierdo		80,13					80,13
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+000 Hasta K0+150 - Carril Derecho		150,00					230,13
	TOTAL ÍTEM									5031,74


CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	230,13
SALDO POR COBRAR	4.801,61

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	


Tramo: Villa Fátima

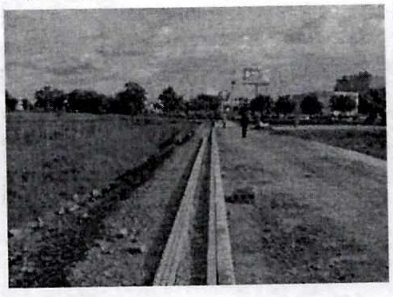

Tramo: Santa Barbara

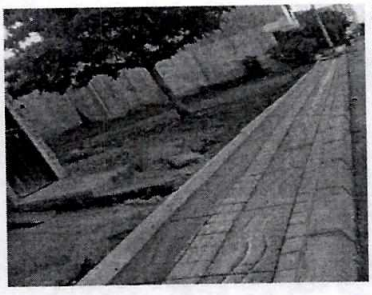

Tramo: Santa

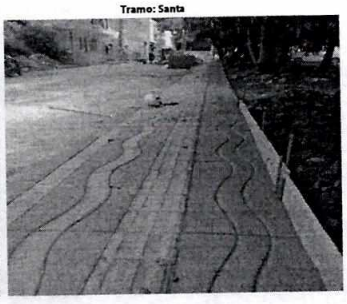

DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1 ACTA PARCIAL No.2


DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPITULO	5. ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS	SUBCAPITULO			
ITEM	5,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA		UNIDAD	M

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2

Tramo: Villa Fátima



Tramo: Santa Barbara




# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				LADO	CANTIDAD ACUMULADA LONGITUD
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD DE LOSAS		
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+000 Hasta K0+080 - Carril Izquierdo		80,13				izquierdo	80,13
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+000 Hasta K0+150 - Carril Derecho		150,00				izquierdo	230,13
	TOTAL ÍTEM									5031,74

CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	230,13
SALDO POR COBRAR	4.801,61

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Tramo: Villa Fátima

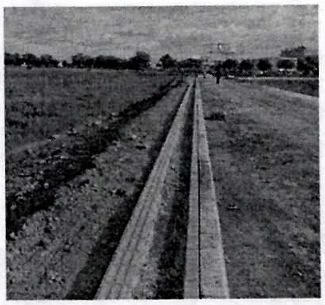

Tramo: Santa Barbara



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1 ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				


CAPITULO	5. ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS	SUBCAPITULO			
ITEM	5,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.		UNIDAD	M2

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2

Tramo: Villa Fátima



Tramo: Santa Barbara

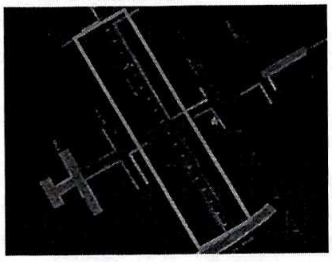

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				LADO	AREA ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD DE LOSAS		
	Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41		K0+000 Hasta K0+030 - Carril Derecho		25,4	0,35				8,89
			K0+000 Hasta K0+050 - Carril Izquierdo		43,6	0,35				15,26
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+000 Hasta K0+150 - Carril Derecho		150,00	0,70				105,00
TOTAL ÍTEM										4480,27


CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	129,15
SALDO POR COBRAR	4.351,12

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Tramo: Santa Barbara



Tramo: Villa Fátima

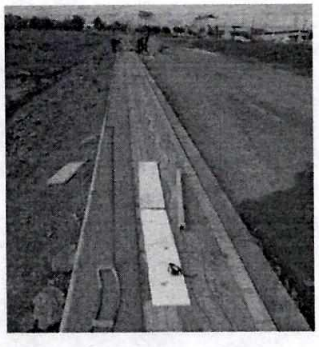

Tramo: Villa Fátima



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1
		ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	9/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	5. ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS	SUBCAPITULO			
ITEM	5,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO		UNIDAD	M2

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2

Tramo: Santa Barbara

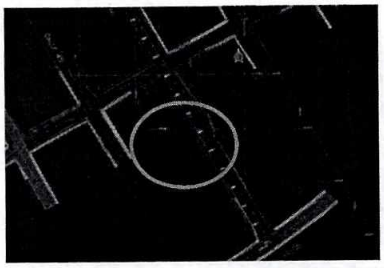

Tramo: Santa Barbara




# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				LADO	UND ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	CANTIDAD	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD DE LOSAS		
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+019 - Carril Izquierdo		1,00					1,00
			K0+110 - Carril Derecho		1,00					1,00
TOTAL ÍTEM										95,00


CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	2,00
SALDO POR COBRAR	93,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
		ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Tramo: Santa Barbara

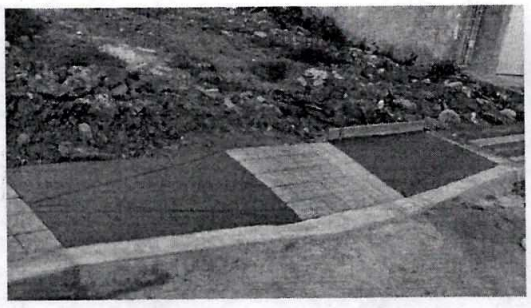

Tramo: Santa Barbara

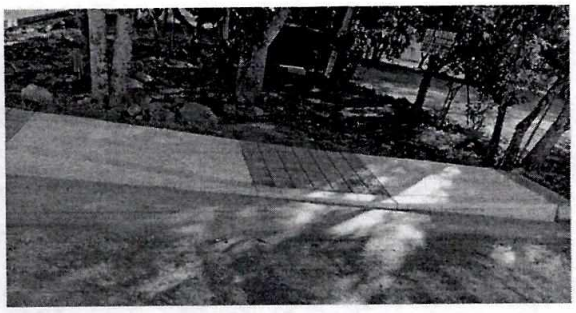

DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2


DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPITULO	5. ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS	SUBCAPITULO			
ITEM	5,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO		UNIDAD	UND

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2

Tramo: Santa Barbara

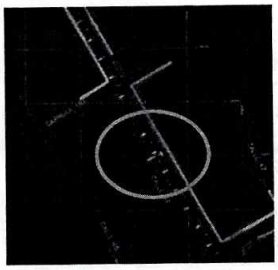

Tramo: Santa Barbara

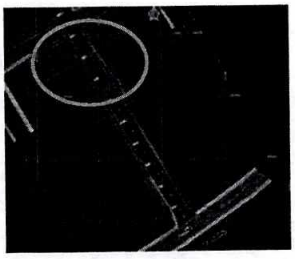

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				LADO	UND ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	CANTIDAD	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD DE LOSAS		
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos		K0+160 y K0+140 Carril Derecho		2,00					2,00
	TOTAL ÍTEM									87,00

CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	2,00
SALDO POR COBRAR	85,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2
REGISTRO FOTOGRAFICO	

Tramo: Santa Barbara



Tramo: Santa Barbara




DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHE
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	9/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	6. OTRAS ACTIVIDADES	SUBCAPITULO			
ITEM	6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO		UNIDAD	UND

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2




Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Vía Montería - San Carlos y Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48



Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39



Tramo 2: Carrera 16B Entre Las Calles 29 y 39



Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B


# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANT ACUMULADO Cl ML
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD		
	Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39		K0+103,00		9,00			1,00	9,00	9,00
			K0+097,00		9,00			1,00	9,00	18,00
			K0+088,00		9,00			1,00	9,00	27,00
			K0+074,00		9,00			1,00	9,00	36,00
			K0+058,00		9,00			1,00	9,00	45,00
			K0+057,00		9,00			1,00	9,00	54,00
			K0+044,00		9,00			1,00	9,00	63,00
			K0+030,00		9,00			1,00	9,00	72,00
			K0+019,00		9,00			1,00	9,00	81,00
	Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B		K0+030,00		2,00			1,00	2,00	83,00
	Tramo 2: Carrera 16B Entre Las Calles 29 y 39		K0+430,00		6,20			1,00	6,20	89,20
			K0+480,00		11,00			2,00	22,00	111,20
			K0+216,00		9,25			2,00	18,50	129,70
			K0+225,00		10,00			1,00	10,00	139,70
			K0+245,00		27,40			1,00	27,40	167,10
			K0+145,00		9,00			1,00	9,00	176,10
			K0+105,00		9,00			1,00	9,00	185,10
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48		K0+100,00		12,00			1,00	12,00	197,10
			K0+100,00		3,00			1,00	3,00	200,10
			TOTAL ÍTEM							265,50

CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	200,10
SALDO POR COBRAR	65,40


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA PARCIAL No.2

REGISTRO FOTOGRAFICO


Tramo 4: El Mora




Tramo 2: San José

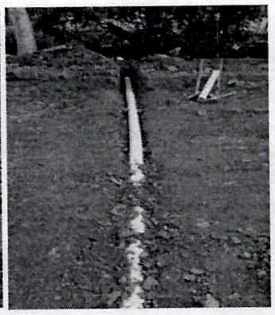

Tramo 12: San Jose

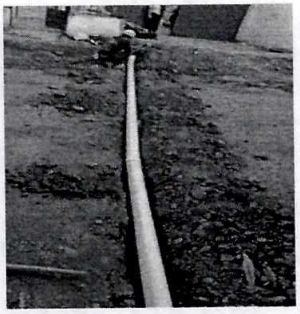

Tramo: Santa Barbara

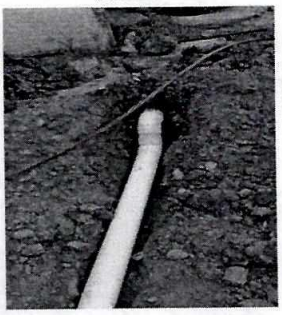

DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	6. OTRAS ACTIVIDADES	SUBCAPITULO			
ITEM	6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		UNIDAD	UND


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2



Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos y Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48



Tramo 2: Carrera 16B Entre Las Calles 29 y 39



Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANT ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD DE LOSAS		
	CANTIDAD ACTA NO.1									
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+020						1,00	1,00
			K0+020						1,00	2,00
			K0+035						1,00	3,00
			K0+060						1,00	4,00
			K0+063						1,00	5,00
			K0+070						1,00	6,00
			K0+210						1,00	7,00
			K0+272						1,00	8,00
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48		K0+115						1,00	9,00
			K0+150						1,00	10,00
	Tramo 12: Carrera 18C Entre Las Carreras 38 y 39		K0+090						1,00	11,00
			K0+115						1,00	12,00
	Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B		K0+103						2,00	14,00
			K0+085						1,00	15,00
			K0+062						1,00	16,00
			K0+038						1,00	17,00
			K0+030						1,00	18,00
			K0+023						2,00	20,00
			K0+020						1,00	21,00
	CANTIDAD PRESENTE ACTA NO.2									
	Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos		K0+272						2,00	23,00
	Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48		K0+050						1,00	24,00
	Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B		K0+070						1,00	25,00
			K0+067						1,00	26,00
	Tramo 2: Carrera 16B Entre Las Calles 29 y 39		K0+490						1,00	27,00
			K0+485						1,00	28,00
			K0+470						1,00	29,00
			K0+463						2,00	31,00
			K0+444						1,00	32,00
			K0+440						1,00	33,00
			K0+420						1,00	34,00
			K0+415						1,00	35,00
			K0+370						1,00	36,00
			K0+355						1,00	37,00
			K0+320						1,00	38,00
			K0+317						2,00	40,00
			K0+315						1,00	41,00
			K0+200						1,00	42,00
			K0+160						2,00	44,00
			K0+140						1,00	45,00
			K0+110						1,00	46,00
			K0+070						1,00	47,00
			K0+050						1,00	48,00
			K0+045						1,00	49,00
			K0+030						1,00	50,00
	Tramo 5: Carrera 16a Entre Las Calles 40 y 41		K0+007						1,00	51,00
			K0+010						1,00	52,00
			K0+015						1,00	53,00
			K0+020						1,00	54,00
			K0+023						1,00	55,00
			K0+030						2,00	57,00
			K0+035						1,00	58,00
			K0+040						1,00	59,00
			K0+043						1,00	60,00
	TOTAL ÍTEM									177,00

CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	21,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.2	156,00
SALDO POR COBRAR	-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 2 de 2
		ACTA PARCIAL No.2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	19/Agosto/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	6. OTRAS ACTIVIDADES	SUBCAPITULO			
ITEM	6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		UNIDAD	UND


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2



Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos y Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48



Tramo 2: Carrera 16B Entre Las Calles 29 y 39

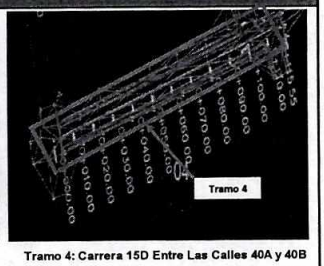


Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANT ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD DE LOSAS		

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 2 de 2
		ACTA PARCIAL No.2
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Tramo 2: San Jose

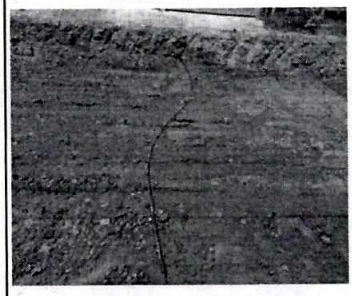

Tramo 5: Altos de la Floresta



Tramo 4 : El Mora



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

CARTERAS TOPOGRAFICAS

Altos de la Floresta y Mora

Alineación: Alineamiento T6 ADF

Grupo de líneas de muestreo: SECCIONES T6 ADF

P.K. inicial: 0+000.000

P.K. final: 0+050.051

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Volumen reutilizable (metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (metros cúbicos)
0+000.000	5,29	0	0	0
0+010.000	6,78	60,35	60,35	60,35
0+020.000	6,41	65,95	65,95	126,3
0+030.000	6,05	62,30	62,3	188,6
0+040.000	6,99	65,20	65,2	253,8
0+049.876	5,51	62,50	62,5	316,3
0+050.051	0	27,55	27,55	**343,85**

El Mora

CAMINO:	
TRAMO:	**ESTACION:**
SUB-	**ORIG**

SIMBOLOGIA	
DC	DESPALME EN CORTE
DT	DESPALME EN TERRAPLEN
C	CORTE
T	TERRAPLEN

NOTA: Los conceptos que se incluirán en el cálculo de volúmenes aparecen subrayados. Se ha considerado el terreno ya despalmado al calcular áreas y volúmenes de corte y terraplén.

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA			10.000,00		AREAS						VOLUMENES					
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN	ELEVACIONES		ESPESORES		DESPALME		C	T	Factor de abundamiento en corte	SEMI-DISTANCIA	DESPALME		C	T	RESUMEN (ORDENADAS DE LA CURVA MASA)	
	TN	SUBRASANTE	C	T	DC	DT					DC	DT				
															0+000,000	10.000,00
0+000,000	12,676	12,350	0,33	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00								
0+010,000	12,732	12,392	0,34	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	20,09	0,00	0+010,000	10.020,09
0+020,000	12,713	12,435	0,28	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0+020,000	10.039,05
0+030,000	12,798	12,477	0,32	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	18,52	0,00	0+030,000	10.057,57
0+040,000	12,920	12,520	0,40	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	21,33	0,00	0+040,000	10.078,90
0+050,000	13,050	12,562	0,49	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	25,45	0,00	0+050,000	10.104,34
0+060,000	13,052	12,604	0,45	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	27,10	0,00	0+060,000	10.131,44
0+070,000	12,967	12,524	0,44	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	26,42	0,00	0+070,000	10.157,87
0+080,000	12,817	12,445	0,37	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	24,39	0,00	0+080,000	10.182,26
0+090,000	12,672	12,367	0,31	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0+090,000	10.202,85
0+100,000	12,650	12,337	0,31	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	19,54	0,00	0+100,000	10.222,39
0+110,000	12,633	12,307	0,33	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	19,69	0,00	0+110,000	10.242,09
0+120,000	12,663	12,278	0,39	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0+120,000	10.262,79
0+122,282	12,675	12,271	0,40	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	1,00	1,14	0,00	0,00	3,79	0,00	0+122,282	10.266,58

CAMINO:	
TRAMO:	ESTACION:
SUB-TRAMO:	ORIGE

SIMBOLOGIA	
DC	DESPALME EN CORTE
DT	DESPALME EN TERRAPLEN
C	CORTE
T	TERRAPLEN

NOTA: Los conceptos que se incluirán en el cálculo de volúmenes aparecen subrayados. Se ha considerado el terreno ya despalmado al calcular áreas y volúmenes de corte y terraplén.

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA			10.000,00		AREAS						VOLUMENES					
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES		ESPESORES		DESPALME		C	T	Factor de abundamiento en corte	SEMI-DISTANCIA	DESPALME		C	T	RESUMEN (ORDENADAS DE LA CURVA MASA)	
	TN	SUBRASANTE	C	T	DC	DT					DC	DT				
															0+000,000	10.000,00
0+000,000	12,617	11,855	0,76	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00								
0+010,000	12,829	11,882	0,95	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0+010,000	10.049,76
0+020,000	12,770	11,909	0,86	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0+020,000	10.102,58
0+030,000	12,717	11,936	0,78	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	47,85	0,00	0+030,000	10.150,43
0+040,000	12,677	11,963	0,71	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	43,40	0,00	0+040,000	10.193,80
0+050,000	12,648	11,939	0,71	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	41,30	0,00	0+050,000	10.235,06
0+060,000	12,660	11,915	0,74	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	41,50	0,00	0+060,000	10.276,52
0+070,000	12,585	11,891	0,69	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	41,15	0,00	0+070,000	10.317,63
0+080,000	12,553	11,867	0,69	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	40,35	0,00	0+080,000	10.357,95
0+090,000	12,567	11,843	0,72	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	40,75	0,00	0+090,000	10.398,71
0+100,000	12,528	11,819	0,71	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0+100,000	10.439,95
0+110,000	12,483	11,795	0,69	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	40,45	0,00	0+110,000	10.480,43
0+116,000	12,435	11,782	0,65	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	1,00	2,78	0,00	0,00	23,19	0,00	0+115,550	10.501,89

San Jose Tramo 2 - (Carrera 15B Entre 29 y 39)

San Jose Tramo 12 - (Cra 16C Entre Las Calles 38 y 39)

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\BARRIO SAN JOSE\VOLUMEN EXCAVACION SAN JOSE.txt

27/ABR/25 9:47pm Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) TERRAPLEN	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) TERRAPLEN	ORDENADA CURVA MASA
0+000.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+010.00	6.97	0.00	10.00	67.60	0.00	10,067.64
0+020.00	6.40	0.00	10.00	66.85	0.00	10,134.49
0+030.00	6.89	0.00	10.00	66.45	0.00	10,200.93
0+040.00	6.80	0.00	10.00	68.45	0.00	10,269.41
0+050.00	6.78	0.00	10.00	67.90	0.00	10,337.31
0+060.00	7.05	0.00	10.00	69.15	0.00	10,406.44
0+070.00	6.48	0.00	10.00	67.65	0.00	10,474.08
0+080.00	6.82	0.00	10.00	66.50	0.00	10,540.59
0+090.00	6.89	0.00	10.00	68.55	0.00	10,609.13
0+100.00	7.32	0.00	10.00	71.05	0.00	10,680.16
0+110.00	6.44	0.00	10.00	68.80	0.00	10,748.94
0+120.00	7.75	0.00	10.00	70.95	0.00	10,819.90
0+130.00	7.54	0.00	10.00	76.45	0.00	10,896.36
0+140.00	6.48	0.00	10.00	70.10	0.00	10,966.48
0+150.00	5.64	0.00	8.70	60.60	0.00	11,019.19

TOTAL VOLUMEN CORTE = 1,027.05m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = 0.00m3
COEF. ABUNDAMIENTO: 1.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\BARRIO SAN JOSE\VOLUMEN EXCAVACION SAN JOSE.txt

27/ABR/25 9:47pm Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	ELEVACIONES TERRENO	ELEVACIONES SUBRASANTE	ESPESORES CORTE	ESPESORES TERRAPLEN
0+000.00	12.91	11.86	1.04	----
0+010.00	12.93	11.85	1.08	----
0+020.00	12.82	11.83	0.99	----
0+030.00	12.92	11.81	1.11	----
0+040.00	12.88	11.79	1.09	----
0+050.00	12.86	11.77	1.09	----
0+060.00	12.92	11.75	1.17	----
0+070.00	12.76	11.73	1.02	----
0+080.00	12.80	11.71	1.09	----
0+090.00	12.79	11.69	1.09	----

0+100.00	12.83	11.68	1.15	----
0+110.00	12.73	11.70	1.03	----
0+120.00	13.04	11.79	1.24	----
0+130.00	13.09	11.91	1.17	----
0+140.00	13.08	12.03	1.04	----
0+148.70	13.12	12.21	0.91	----

Santa Barbara

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\TRAMO SANTA BARBARA\VOLUMEN REAL TRAMO 1.txt

16/MAY/25 9:02pm Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) TERRAPLEN	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) TERRAPLEN	ORDENADA CURVA MASA
0+000.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+010.00	4.36	0.00	10.00	43.50	0.00	10,043.49
0+020.00	5.58	0.00	10.00	49.70	0.00	10,093.17
0+030.00	6.19	0.00	10.00	58.85	0.00	10,152.01
0+040.00	6.25	0.00	10.00	62.20	0.00	10,214.23
0+050.00	6.31	0.00	10.00	62.80	0.00	10,277.03
0+060.00	6.10	0.00	10.00	62.05	0.00	10,339.08
0+070.00	5.94	0.00	10.00	60.20	0.00	10,399.28
0+080.00	5.88	0.00	10.00	59.10	0.00	10,458.37
0+090.00	5.59	0.00	10.00	57.35	0.00	10,515.72
0+100.00	6.41	0.00	10.00	60.00	0.00	10,575.73
0+110.00	6.09	0.00	10.00	62.50	0.00	10,638.26
0+120.00	6.14	0.00	10.00	61.15	0.00	10,699.44
0+130.00	6.01	0.00	10.00	60.75	0.00	10,760.20
0+140.00	6.04	0.00	10.00	60.25	0.00	10,820.43
0+150.00	5.71	0.00	10.00	58.75	0.00	10,879.16
0+160.00	5.56	0.00	10.00	56.35	0.00	10,935.53
0+170.00	5.40	0.00	10.00	54.80	0.00	10,990.37
0+180.00	5.54	0.00	10.00	54.70	0.00	11,045.09
0+190.00	5.16	0.00	10.00	53.50	0.00	11,098.59
0+200.00	5.72	0.00	10.00	54.40	0.00	11,153.00
0+210.00	5.17	0.00	10.00	54.45	0.00	11,207.45
0+220.00	5.58	0.00	10.00	53.75	0.00	11,261.20
0+230.00	5.58	0.00	10.00	55.80	0.00	11,317.00
0+240.00	5.58	0.00	10.00	55.80	0.00	11,372.80
0+250.00	5.58	0.00	10.00	55.80	0.00	11,428.60
0+260.00	5.58	0.00	10.00	55.80	0.00	11,484.40
0+274.00	5.58	0.00	14.00	78.12	0.00	11,562.52

TOTAL VOLUMEN CORTE = 1,562.42m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = 0.00m3
COEF. ABUNDAMIENTO: 1.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\TRAMO SANTA BARBARA\VOLUMEN REAL TRAMO 1.txt

16/MAY/25 9:02pm Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	ELEVACIONES	ESPESORES

	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	TERRAPLEN
0+000.00	12.71	12.02	0.70	----
0+010.00	12.73	12.05	0.69	----
0+020.00	12.97	12.09	0.88	----
0+030.00	13.10	12.14	0.97	----
0+040.00	13.11	12.16	0.96	----
0+050.00	13.15	12.18	0.97	----
0+060.00	13.13	12.20	0.93	----
0+070.00	13.14	12.22	0.92	----
0+080.00	13.15	12.24	0.91	----
0+090.00	13.12	12.26	0.86	----
0+100.00	13.29	12.28	1.01	----
0+110.00	13.26	12.30	0.96	----
0+120.00	13.32	12.32	1.00	----
0+130.00	13.33	12.34	0.99	----
0+140.00	13.37	12.37	1.01	----
0+150.00	13.33	12.39	0.95	----
0+160.00	13.30	12.41	0.89	----
0+170.00	13.30	12.43	0.88	----
0+180.00	13.32	12.45	0.88	----
0+190.00	13.29	12.47	0.82	----
0+200.00	13.43	12.49	0.95	----
0+210.00	13.31	12.51	0.80	----
0+220.00	13.37	12.47	0.90	----
0+230.00	13.37	12.47	0.90	----
0+240.00	13.37	12.47	0.90	----
0+250.00	13.42	12.52	0.90	----
0+260.00	13.46	12.56	0.90	----
0+274.00	13.82	12.92	0.90	----

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\TRAMO SANTA BARBARA\VOLUMEN SANTA BARBARA TRAMO 2.txt

26/ABR/25 08:46am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) TERRAPLEN	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) TERRAPLEN	ORDENADA CURVA MASA
0+000.00	0.00	-5.96	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+010.00	0.00	-7.13	10.00	0.00	-65.45	9,934.55
0+020.00	0.00	-6.94	10.00	0.00	-70.35	9,864.18
0+030.00	0.00	-6.87	10.00	0.00	-69.05	9,795.14
0+040.00	0.00	-6.29	10.00	0.00	-65.80	9,729.37
0+050.00	0.00	-6.46	10.00	0.00	-63.75	9,665.64
0+060.00	0.00	-6.15	10.00	0.00	-63.05	9,602.61
0+070.00	0.00	-6.37	10.00	0.00	-62.60	9,540.03
0+080.00	0.00	-5.46	10.00	0.00	-59.15	9,480.89
0+090.00	0.00	-5.21	10.00	0.00	-53.35	9,427.53
0+100.00	0.00	-5.67	10.00	0.00	-54.40	9,373.11
0+110.00	0.00	-5.38	10.00	0.00	-55.25	9,317.86
0+120.00	0.00	-4.81	10.00	0.00	-50.95	9,266.94
0+130.00	0.00	-5.38	10.00	0.00	-50.95	9,215.99
0+140.00	0.00	-6.38	10.00	0.00	-58.80	9,157.16
0+150.00	0.00	-6.38	10.00	0.00	-63.80	9,093.35
0+155.00	0.00	-5.60	5.00	0.00	-29.95	9,063.41

TOTAL VOLUMEN CORTE = 0.00m3

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -936.65m3

COEF. ABUNDAMIENTO: 1.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\TRAMO SANTA BARBARA\VOLUMEN SANTA BARBARA TRAMO 2.txt

26/ABR/25 08:46am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	ELEVACIONES TERRENO	ELEVACIONES SUBRASANTE	ESPESORES CORTE	ESPESORES TERRAPLEN
0+000.00	12.12	13.09	----	0.96
0+010.00	12.27	13.41	----	1.13
0+020.00	12.42	13.53	----	1.11
0+030.00	12.50	13.57	----	1.07
0+040.00	12.52	13.51	----	0.98
0+050.00	12.48	13.48	----	0.99
0+060.00	12.44	13.42	----	0.98
0+070.00	12.39	13.43	----	1.04
0+080.00	12.39	13.27	----	0.88

0+090.00	12.44	13.28	----	0.84
0+100.00	12.48	13.37	----	0.89
0+110.00	12.53	13.33	----	0.80
0+120.00	12.55	13.26	----	0.72
0+130.00	12.51	13.34	----	0.83
0+140.00	12.45	13.45	----	1.00
0+150.00	12.39	13.40	----	1.02
0+155.00	12.36	13.26	----	0.90

Villa Fatima Completo

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\VOLUMENES MATERIAL SELECCIONADO2.txt

14/MAY/25 05:38am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) TERRAPLEN	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) TERRAPLEN	ORDENADA CURVA MASA
0+000.00	0.00	-8.58	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+010.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.50	9,914.51
0+020.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,829.35
0+030.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,744.18
0+040.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,659.01
0+050.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,573.84
0+060.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,488.66
0+070.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,403.50
0+080.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,318.33
0+090.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,233.16
0+100.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,147.99
0+110.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	9,062.81
0+120.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	8,977.64
0+130.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	8,892.48
0+140.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	8,807.31
0+150.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	8,722.14
0+160.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	8,636.97
0+170.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	8,551.79
0+180.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	8,466.63
0+190.00	0.00	-8.52	10.00	0.00	-85.20	8,381.46
0+200.00	0.00	-7.20	10.00	0.00	-78.60	8,302.87
0+210.00	0.00	-7.20	10.00	0.00	-72.00	8,230.87
0+220.00	0.00	-7.20	10.00	0.00	-72.00	8,158.87

TOTAL VOLUMEN CORTE = 0.00m3

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -1,841.70m3

COEF. ABUNDAMIENTO: 1.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\VOLUMENES MATERIAL SELECCIONADO2.txt

14/MAY/25 05:38am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	ELEVACIONES TERRENO	ELEVACIONES SUBRASANTE	ESPESORES CORTE	ESPESORES TERRAPLEN
0+000.00	15.58	16.18	----	0.60
0+010.00	15.63	16.23	----	0.60
0+020.00	15.68	16.28	----	0.60

0+030.00	15.73	16.33	----	0.60
0+040.00	15.78	16.38	----	0.60
0+050.00	15.83	16.43	----	0.60
0+060.00	15.88	16.48	----	0.60
0+070.00	15.93	16.53	----	0.60
0+080.00	15.98	16.58	----	0.60
0+090.00	16.03	16.63	----	0.60
0+100.00	16.08	16.68	----	0.60
0+110.00	16.13	16.73	----	0.60
0+120.00	16.18	16.78	----	0.60
0+130.00	16.20	16.80	----	0.60
0+140.00	16.18	16.78	----	0.60
0+150.00	16.13	16.73	----	0.60
0+160.00	16.08	16.68	----	0.60
0+170.00	16.03	16.63	----	0.60
0+180.00	15.98	16.58	----	0.60
0+190.00	15.93	16.53	----	0.60
0+200.00	15.88	16.48	----	0.60
0+210.00	15.83	16.43	----	0.60
0+220.00	15.78	16.38	----	0.60

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\VOLUMENES MATERIAL DE TERRAPLEN2.txt

14/MAY/25 05:39am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	AREAS(M2)		DISTANCIA	VOLUMENES(M3)		ORDENADA
	CORTE	TERRAPLEN		CORTE	TERRAPLEN	CURVA MASA
0+080.00	0.00	-1.02	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+090.00	0.00	-2.69	10.00	0.02	-18.55	9,981.46
0+100.00	0.00	-4.19	10.00	0.00	-34.40	9,947.06
0+110.00	0.00	-6.07	10.00	0.00	-51.30	9,895.76
0+120.00	0.00	-7.86	10.00	0.00	-69.65	9,826.13
0+130.00	0.00	-8.05	10.00	0.00	-79.55	9,746.58
0+140.00	0.00	-8.01	10.00	0.00	-80.30	9,666.28
0+150.00	0.00	-8.86	10.00	0.00	-84.35	9,581.97
0+160.00	0.00	-9.10	10.00	0.00	-89.80	9,492.17
0+170.00	0.00	-9.09	10.00	0.00	-90.95	9,401.20
0+180.00	0.00	-8.71	10.00	0.00	-89.00	9,312.22
0+190.00	0.00	-7.93	10.00	0.00	-83.20	9,229.05
0+200.00	0.00	-6.31	10.00	0.00	-71.20	9,157.88
0+210.00	0.00	-4.70	10.00	0.00	-55.05	9,102.83
0+220.00	0.00	-2.62	10.00	0.00	-36.60	9,066.21

TOTAL VOLUMEN CORTE = 0.02m3

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -933.90m3

COEF. ABUNDAMIENTO: 1.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\VOLUMENES MATERIAL DE TERRAPLEN2.txt

14/MAY/25 05:39am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	ELEVACIONES		ESPESORES	
	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	TERRAPLEN
0+080.00	15.85	15.98	----	0.13
0+090.00	15.77	16.03	----	0.25
0+100.00	15.77	16.08	----	0.30
0+110.00	15.72	16.13	----	0.41
0+120.00	15.66	16.18	----	0.51
0+130.00	15.60	16.20	----	0.60
0+140.00	15.64	16.18	----	0.54
0+150.00	15.53	16.13	----	0.60
0+160.00	15.46	16.08	----	0.62
0+170.00	15.42	16.03	----	0.61
0+180.00	15.37	15.98	----	0.61

0+190.00	15.36	15.93	----	0.57
0+200.00	15.41	15.88	----	0.47
0+210.00	15.52	15.83	----	0.31
0+220.00	15.56	15.78	----	0.22

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\tramo de entrada\volumen demejoramiento de la entrada.txt

14/MAY/25 05:26am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	AREAS(M2)		DISTANCIA	VOLUMENES(M3)		ORDENADA
	CORTE	TERRAPLEN		CORTE	TERRAPLEN	CURVA MASA
0+080.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+090.00	0.00	-6.00	10.00	0.00	-60.00	9,940.03
0+100.00	0.00	-6.00	10.00	0.00	-60.00	9,880.06
0+110.00	0.00	-6.00	10.00	0.00	-60.00	9,820.09
0+120.00	0.00	-6.00	10.00	0.00	-60.00	9,760.12
0+130.00	0.00	-2.28	10.00	0.00	-41.40	9,718.75

TOTAL VOLUMEN CORTE = 0.00m3

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -281.40m3

COEF. ABUNDAMIENTO: 1.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\tramo de entrada\volumen demejoramiento de la entrada.txt

14/MAY/25 05:26am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	ELEVACIONES		ESPESORES	
	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	TERRAPLEN
0+080.00	16.17	16.77	----	0.60
0+090.00	16.20	16.80	----	0.60
0+100.00	16.23	16.83	----	0.60
0+110.00	16.26	16.86	----	0.60
0+120.00	16.29	16.89	----	0.60
0+130.00	16.47	17.07	----	0.60

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\tramo de entrada\volumen de terraplen de la entrada.txt

14/MAY/25 05:25am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	AREAS(M2)		DISTANCIA	VOLUMENES(M3)		ORDENADA
	CORTE	TERRAPLEN		CORTE	TERRAPLEN	CURVA MASA
0+080.00	0.00	-6.91	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+090.00	0.00	-7.29	10.00	0.00	-71.00	9,929.01
0+100.00	0.00	-8.72	10.00	0.00	-80.05	9,848.96
0+110.00	0.00	-10.04	10.00	0.00	-93.80	9,755.16
0+120.00	0.00	-11.07	10.00	0.00	-105.55	9,649.59
0+130.00	0.00	-6.69	10.00	0.00	-88.80	9,560.77

TOTAL VOLUMEN CORTE = 0.00m3

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -439.20m3

COEF. ABUNDAMIENTO: 1.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jsanm\Desktop\levantamientos\TRAMO DE PAVIMENTO VILLA FATIMA\tramo de entrada\volumen de terraplen de la entrada.txt

14/MAY/25 05:25am Pagina 1

VIALIDAD 1

ESTACION	ELEVACIONES		ESPESORES	
	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	TERRAPLEN
0+080.00	15.56	16.17	----	0.61
0+090.00	15.56	16.20	----	0.64
0+100.00	15.52	16.23	----	0.71
0+110.00	15.41	16.26	----	0.85
0+120.00	15.36	16.29	----	0.93
0+130.00	15.37	16.47	----	1.10

Informes Semanales de Interventoria Correspondientes al Periodo a Cobrar

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	5	5	2025	SEMANA No.:	9	DEL	27-abr-25	AL	3-may-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15,436,620,455.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974,933,670.00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA			PRORROGA 1:	NO APLICA		
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15,436,620,455.00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 974,933,670.00
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	0.00% $ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$ -
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	0.00%
PARCIAL 2:	$ -		
PARCIAL 3:	$ -		
FINAL:	$ -		

III. AVANCE FÍSICO


ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	0.00	0.00
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	0.00	0.00
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	0.00	0.00
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	0.00	0.00
1.05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0.00	0.00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	151.00	4534.99
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	67.10
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	188.75	5858.23
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	0.00	0.00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0.00	0.00
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0.00	0.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0.00	0.00
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE		0.00	0.00
2.01	TERRAPLENES.	M^3	-1292.50	1373.10
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	346.58
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	90.00	4091.90
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	48.00	790.80
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	700.00	7079.00
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS		0.00	0.00
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	108.00	444.57
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	0.00	0.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	0.00	0.00
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0.00	883.40
4.00	SEÑALIZACIÓN		0.00	0.00
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	0.00	0.00
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0.00	0.00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M	0.00	0.00
5.00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS		0.00	0.00
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAL. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	0.00	0.00
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	0.00	0.00
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	0.00	0.00
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	0.00	0.00
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	0.00
6.00	OTRAS ACTIVIDADES		0.00	0.00
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	0.00	0.00
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	21.00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0.00	0.00
7.00	BOX CULVERT		0.00	0.00
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3	0.00	0.00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	0.00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	0.00	0.00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2	0.00	0.00

1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0.00	0.00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	0.00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3	0.00	0.00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3	0.00	0.00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0.00	0.00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M	0.00	0.00
8.00	**REDES ELÉCTRICAS**		0.00	0.00
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**		0.00	0.00
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND	0.00	0.00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0.00	0.00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0.00	0.00
8.3	**SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0.00	0.00
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0.00	0.00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0.00	0.00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	2.35%	11.78%	9.54%
DURANTE EL PERIODO	0.41%	0.52%	
ACUMULADO ACTUAL	2.76%	12.30%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Control de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular en el sector de Villa Fátima y Santa Barbara.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión

Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de San José y El mora
Continuar con transporte, extendido y compactación de material de subbase granular en el sector de Santa Barbara e iniciar la instalación en la vías del barrio san José.
Levantamientos topográficos para apertura de otro frente de trabajo.
Realización de densidades a tramo cereado de mejoramiento y subbase granular.
Transporte e instalación de material de mejoramiento en el sector de San José, santa bárbara y el mora.
Excavación en el Tramo de la CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 en el barrio San José, y tramo de El Mora
Continuar con el vaciado de concreto en los tramos de Santa bárbara y vaciado en el tramo de vía de villa Fátima.
Inicio de actividades en el tramo CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B en el barrio El Mora.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado.
Participación en comités de obra

VII.COMPONENTE SOCIAL

Atención solicitudes de la comunidad.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Transito.
Se realizar algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejoral el control vehicular en los sectores intervenidos.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

VILLA FÁTIMA	SAN JOSÉ
- Reconformación de material de mejoramiento de subrasante, de acuerdo al diseño ajustado del K0+000 al K0+080. - Instalación de Subbase Granular del K0+080 al K0+120 - Vaciado de concreto	**CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39** - Excavación en material común del K0+55 al K0+030. - Suministro e instalación de geotextil del K0+55 al K0+030 - Suministro, transporte e instalación de material de mejoramiento del K0+55 al K0+030. - Realización de densidades de campo al material seleccionado de mejoramiento.
SANTA BARBARA	
CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - Cereado de material de mejoramiento de subrasante. **CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VÍA MONTERÍA - SAN CARLOS** - Corte y figurado de acero para refuerzo de placas de sección irregular. - Transporte e instalación de subbase granular del K0+190 al K0+240.	

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


VILLA FÁTIMA






SANTA BARBARA



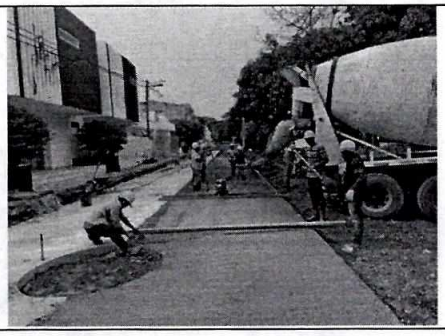

SAN JOSÉ

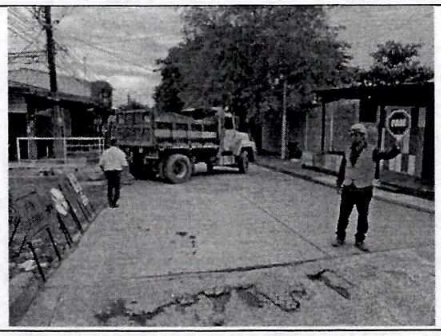



NOTA:

VII. FIRMAS

CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	12	5	2025	SEMANA No.:	10	DEL	4-may-25	AL	10-may-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15,436,620,455.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974,933,670.00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA			PRORROGA 1:	NO APLICA		
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15,436,620,455.00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 974,933,670.00
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0.00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	-
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	0.00%	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO


ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	0.00	0.00
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	0.00	0.00
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	0.00	0.00
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	0.00	0.00
1.05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0.00	0.00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	240.00	4774.99
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	67.10
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	300.00	6158.23
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	0.00	0.00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0.00	0.00
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0.00	0.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0.00	0.00
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE		0.00	0.00
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0.00	1373.10
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	346.58
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	72.00	4163.90
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	60.00	850.80
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	210.00	7289.00
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS		0.00	0.00
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	48.00	492.57
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	0.00	0.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	0.00	0.00
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0.00	883.40
4.00	SEÑALIZACIÓN		0.00	0.00
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	0.00	0.00
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0.00	0.00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M	0.00	0.00
5.00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS		0.00	0.00
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAL. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	0.00	0.00
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	0.00	0.00
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	0.00	0.00
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	0.00	0.00
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	0.00
6.00	OTRAS ACTIVIDADES		0.00	0.00
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	24.00	24.00
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	15.00	36.00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0.00	0.00
7.00	BOX CULVERT		0.00	0.00
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3	0.00	0.00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	0.00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	0.00	0.00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2	0.00	0.00

1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0.00	0.00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	0.00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3	0.00	0.00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3	0.00	0.00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0.00	0.00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M	0.00	0.00
8.00	**REDES ELÉCTRICAS**		0.00	0.00
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**	M	0.00	0.00
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	UND	0.00	0.00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND	0.00	0.00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0.00	0.00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0.00	0.00
8.3	**SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0.00	0.00
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0.00	0.00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0.00	0.00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	2.76%	12.30%	9.78%
DURANTE EL PERIODO	0.51%	0.75%	
ACUMULADO ACTUAL	3.27%	13.05%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Control de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular en el sector de Villa Fátima y Santa Barbara.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión

Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de San José y El mora
Continuar con transporte, extendido y compactación de material de subbase granular en el sector de Santa Barbara y continuar la instalación en la vía del barrio san José.
Realización de densidades a tramo cereado de mejoramiento y subbase granular.
Transporte e instalación de material de mejoramiento en el sector de San José.
Excavación en el Tramo de la CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 en el barrio San José.
Continuar con el vaciado de concreto en los tramos de Santa bárbara y vaciado en el tramo de vía de villa Fátima.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado.
Participación en comités de obra semanales.

VII.COMPONENTE SOCIAL

Atención solicitudes de la comunidad.

VIII.COMPONENTE PMT


Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Transito.
Se realizar algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejoral el control vehicular en los sectores intervenidos.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

VILLA FÁTIMA	SAN JOSÉ
- Reconformación de material de mejoramiento de subrasante, de acuerdo al diseño ajustado del K0+120 al K0+180. - Instalación de Subbase Granular del K0+120 al K0+180. - Vaciado de concreto.	**CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39** - Excavación en material común del K0+030 al K0+000. - Suministro e instalación de geotextil del K0+030 al K0+000 - Suministro, transporte e instalación de material de mejoramiento del K0+030 al K0+000. - Realización de densidades de campo al material seleccionado de mejoramiento. - Vaciado de concreto hidráulico, **CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39** - Excavación en material común. - Transporte de material producto de la excavación - Suministro e instalación de material de mejoramiento. - Suministro e instalación de geotextil.
SANTA BARBARA	**EL MORA**
CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - No se realizaron actividades. **CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VÍA MONTERÍA - SAN CARLOS** - Corte y figurado de acero para refuerzo de placas de sección irregular. - Transporte e instalación de subbase granular del K0+240 al K0+274. - Vaciado de concreto hidráulico.	**CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B** - Excavación en material común del K0+000 al K0+103. - Transporte de material producto de la excavación - Suministro e instalación de material de mejoramiento del K0+000 al K0+103. - Suministro e instalación de geotextil del K0+000 al K0+103


VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


VILLA FÁTIMA

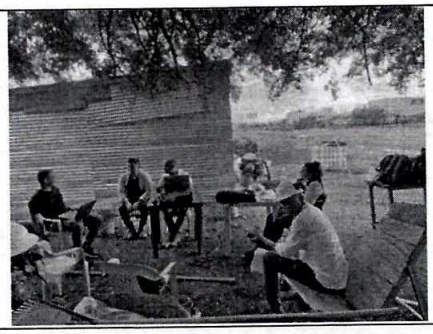





SANTA BARBARA


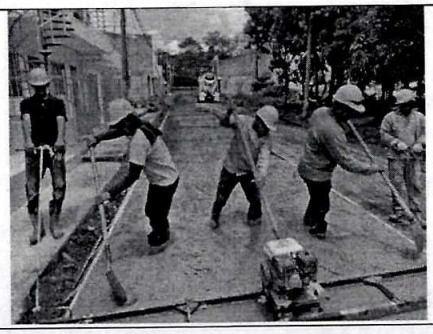


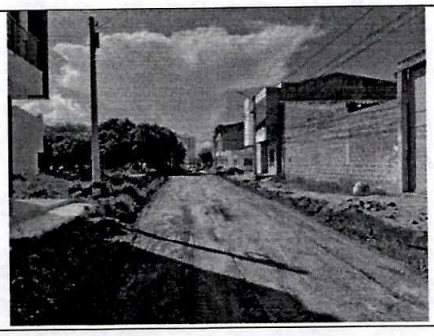

SAN JOSÉ

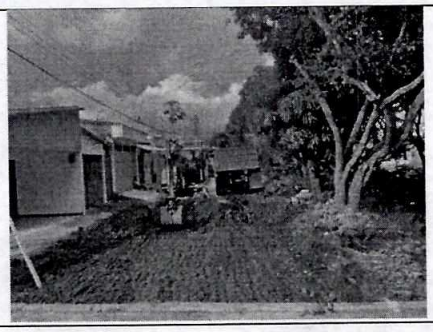

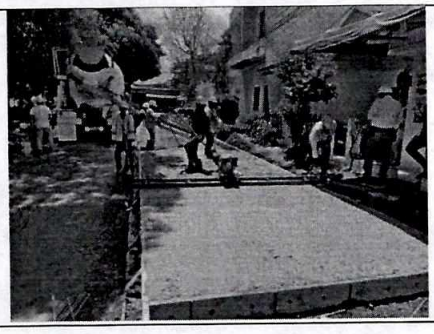

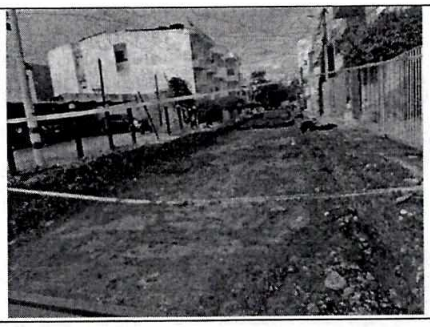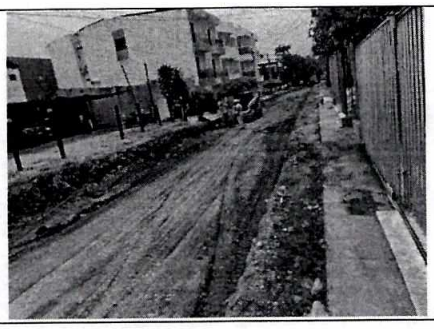EL MORA	
	

NOTA:

VII. FIRMAS	
CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	19	5	2025	SEMANA No.:	11	DEL	11-may-25	AL	17-may-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15,436,620,455.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974,933,670.00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA			PRORROGA 1:	NO APLICA		
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15,436,620,455.00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 974,933,670.00
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0.00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	-
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	0.00%	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO


ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	308.10	308.10
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	0.00	0.00
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	24.00	24.00
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	118.95	118.95
1.05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0.00	0.00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	96.00	4870.99
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	67.10
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	117.24	6275.47
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	0.00	0.00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	15.00	15.00
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0.00	0.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0.00	0.00
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE		0.00	0.00
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0.00	1373.10
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	346.58
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	103.52	4267.42
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	54.00	904.80
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	213.20	7502.20
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS		0.00	0.00
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	30.64	523.21
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	0.00	0.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	30.00	30.00
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0.00	883.40
4.00	SEÑALIZACIÓN		0.00	0.00
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	0.00	0.00
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0.00	0.00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M	0.00	0.00
5.00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS		0.00	0.00
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAL. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	0.00	0.00
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	0.00	0.00
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	0.00	0.00
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	0.00	0.00
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	0.00
6.00	OTRAS ACTIVIDADES		0.00	0.00
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	61.00	85.00
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	6.00	42.00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0.00	0.00
7.00	BOX CULVERT		0.00	0.00
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3	0.00	0.00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	0.00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	0.00	0.00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2	0.00	0.00

1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0.00	0.00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	0.00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3	0.00	0.00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3	0.00	0.00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0.00	0.00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M	0.00	0.00
8.00	**REDES ELÉCTRICAS**		0.00	0.00
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**		0.00	0.00
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND	0.00	0.00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0.00	0.00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0.00	0.00
8.3	**SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0.00	0.00
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0.00	0.00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0.00	0.00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	3.27%	13.05%	10.01%
DURANTE EL PERIODO	0.47%	0.70%	
ACUMULADO ACTUAL	3.74%	13.75%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Control de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular en el sector de Villa Fátima y Santa Barbara.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión

Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de San José.
Continuar con transporte, extendido y compactación de material de subbase granular en el sector de Santa Barbara.
Realización de densidades a tramo cereado de mejoramiento y subbase granular.
Transporte e instalación de material de mejoramiento en el sector de San José.
Vaciado de concreto de la CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 en el barrio San José.
Continuar con el vaciado de concreto en los tramos de Santa bárbara y vaciado en el tramo de vía de villa Fátima.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado.
Participación en comités de obra semanales.

VII.COMPONENTE SOCIAL

Atención solicitudes de la comunidad.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Transito.
Se realizar algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejoral el control vehicular en los sectores intervenidos.


IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

VILLA FÁTIMA	SAN JOSÉ
- Reconformación de material de mejoramiento de subrasante, de acuerdo al diseño ajustado del K0+180 al K0+220. - Instalación de Subbase Granular del K0+180 al K0+220. - Vaciado de concreto. - Tala de arboles de 15 arboles menores a 5 metros de altura, de acuerdo a resolución de la entidad ambiental. - Demolición de bordillos existentes. - Demolición de andenes existentes.	**CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39** - Vaciado de concreto hidráulico. **CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39** - Excavación en material común. - Transporte de material producto de la excavación - Suministro e instalación de material de mejoramiento. - Suministro e instalación de geotextil.
SANTA BARBARA	**EL MORA**
CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - No se realizaron actividades. **CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VÍA MONTERÍA - SAN CARLOS** - Corte y figurado de acero para refuerzo de placas de sección irregular. - Vaciado de concreto hidráulico.	**CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B** - Reemplazo de material de mejoramiento dañado por alta saturación. - Transporte e instalación de subbase granular. - reparación de acometidas de agua potable.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


VILLA FÁTIMA



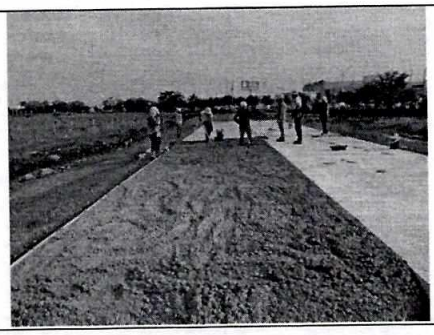


SANTA BARBARA



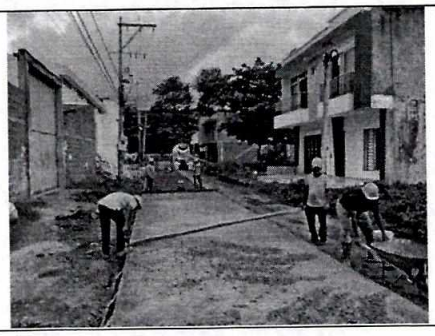

SAN JOSÉ



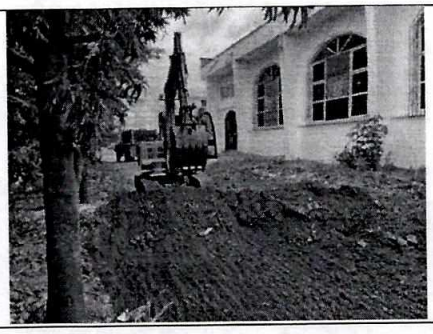

EL MORA





NOTA:

VII. FIRMAS

CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					**PÁGINA**	1	DE	2
						VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA					**CÓDIGO DEL PROCESO:**	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	26	5	2025	SEMANA No.:	11	DEL	18-may-25	AL	24-may-25

CONTRATO DE OBRA				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SINÚ URBANO**			CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA**		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15,436,620,455.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974,933,670.00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA			PRORROGA 1:	NO APLICA		
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15,436,620,455.00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 974,933,670.00
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	0.00% $ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$ -
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	0.00%
PARCIAL 2:	$ -		
PARCIAL 3:	$ -		
FINAL:	$ -		

III. AVANCE FÍSICO


ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	165.90	474.00
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	0.00	0.00
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	0.00	24.00
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	64.05	183.00
1.05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0.00	0.00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	141.46	5012.45
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	67.10
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	0.00	6275.47
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	0.00	0.00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	9.00	24.00
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	1.00	1.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0.00	0.00
2.00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**		0.00	0.00
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0.00	1373.10
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	346.58
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0.00	4267.42
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	42.90	947.70
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	0.00	7502.20
3.00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**		0.00	0.00
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	18.00	541.21
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	0.00	0.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	56.50	86.50
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0.00	883.40
4.00	**SEÑALIZACIÓN**		0.00	0.00
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	0.00	0.00
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0.00	0.00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M	0.00	0.00
5.00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**		0.00	0.00
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAL. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	0.00	0.00
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	0.00	0.00
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	0.00	0.00
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	0.00	0.00
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	0.00
6.00	**OTRAS ACTIVIDADES**		0.00	0.00
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	26.20	111.20
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	3.00	45.00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0.00	0.00
7.00	**BOX CULVERT**		0.00	0.00
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3	0.00	0.00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	0.00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	0.00	0.00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2	0.00	0.00

1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0.00	0.00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	0.00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3	0.00	0.00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3	0.00	0.00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0.00	0.00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M	0.00	0.00
8.00	**REDES ELÉCTRICAS**		0.00	0.00
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**		0.00	0.00
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND	0.00	0.00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0.00	0.00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0.00	0.00
8.3	**SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0.00	0.00
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0.00	0.00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0.00	0.00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	3.74%	13.75%	9.93%
DURANTE EL PERIODO	0.47%	0.39%	
ACUMULADO ACTUAL	4.21%	14.14%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Control de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular en el sector de Villa Fátima y Santa Barbara.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión

Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de San José.
Continuar con transporte, extendido y compactación de material de subbase granular en el sector de Santa Barbara.
Realización de densidades a tramo cereado de mejoramiento y subbase granular.
Transporte e instalación de material de mejoramiento en el sector de San José.
Vaciado de concreto de la CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 en el barrio San José.
Continuar con el vaciado de concreto en los tramos de Santa bárbara y vaciado en el tramo de vía de villa Fátima.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado.
Participación en comités de obra semanales.

VII.COMPONENTE SOCIAL

Atención solicitudes de la comunidad.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Transito.
Se realizar algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejoral el control vehicular en los sectores intervenidos.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

VILLA FÁTIMA

- Reconformación de material de mejoramiento de subrasante, de acuerdo al diseño ajustado del K0+180 al K0+220.
- Instalación de Subbase Granular del K0+180 al K0+220.
- Vaciado de concreto.
- Tala de arboles de 9 arboles menores a 5 metros de altura, de acuerdo a resolución de la entidad ambiental.
- Tala de arboles de 1 arbol entre 5 y 10 metros de altura, de acuerdo a resolución de la entidad ambiental.
- Demolición de bordillos existentes.
- Demolición de andenes existentes.
- Excavación manual para identificar redes de telecomunicaciones.
- Vista el día 22 de mayo de 2025 de los especialista de la Interventoria (Hidraulico, ambiental, pavimento)

SAN JOSÉ

CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39

- Vaciado de concreto hidráulico.
- Vista el día 22 de mayo de 2025 de los especialista de la Interventoria (Hidraulico, ambiental, pavimento)

CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39

- Excavación en material común.
- Transporte de material producto de la excavación
- Suministro e instalación de material de mejoramiento.
- Suministro e instalación de geotextil.
- Suministro e instalación de material de subbase granular del K0+460 al K0+414
- Vista el día 22 de mayo de 2025 de los especialista de la Interventoria (Hidraulico, ambiental, pavimento).

SANTA BARBARA

CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48

- No se realizaron actividades.
- Vista el día 22 de mayo de 2025 de los especialista de la Interventoria (Hidraulico, ambiental, pavimento)

CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VÍA MONTERÍA - SAN CARLOS

- Suministro e instalación de bordillos prefabricados.
- Vista el día 22 de mayo de 2025 de los especialista de la Interventoria (Hidraulico, ambiental, pavimento)

EL MORA

CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B

- Reemplazo de material de subbase granular dañado por alta saturación.
- Transporte e instalación de subbase granular.
- reparación de acometidas de agua potable.
- Realización de densidades a material de subbase granular
- Vista el día 22 de mayo de 2025 de los especialista de la Interventoria (Hidraulico, ambiental, pavimento)

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VILLA FÁTIMA





SANTA BARBARA






SAN JOSÉ





EL MORA

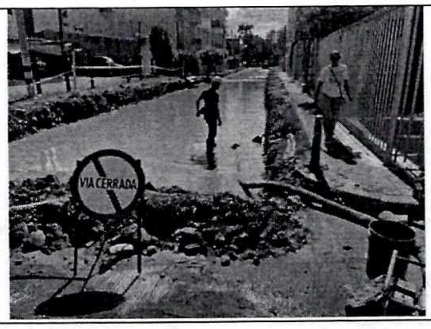



NOTA:

VII. FIRMAS

CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	3	6	2025	SEMANA No.:	13	DEL	25-may-25	AL 31-may-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15,436,620,455.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974,933,670.00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA			PRORROGA 1:	NO APLICA		
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15,436,620,455.00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 974,933,670.00
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	0.00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$	-
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	0.00%	
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

III. AVANCE FÍSICO


ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	0.00	474.00
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	0.00	0.00
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	0.00	24.00
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	0.00	183.00
1.05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0.00	0.00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	29.28	5041.73
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	67.10
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	36.60	6312.07
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	0.00	0.00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0.00	24.00
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0.00	1.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0.00	0.00
			0.00	0.00
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE			
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0.00	1373.10
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	346.58
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0.00	4267.42
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	0.00	947.70
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	0.00	7502.20
			0.00	0.00
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS			
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	101.28	642.49
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	0.00	0.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	0.00	86.50
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	360.00	1243.40
			0.00	0.00
4.00	SEÑALIZACIÓN			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	0.00	0.00
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0.00	0.00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M	0.00	0.00
			0.00	0.00
5.00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS			
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAL. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	0.00	0.00
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	0.00	0.00
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	0.00	0.00
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	0.00	0.00
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	0.00
			0.00	0.00
6.00	OTRAS ACTIVIDADES			
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	0.00	111.20
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	45.00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0.00	0.00
			0.00	0.00
7.00	BOX CULVERT			
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3	0.00	0.00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	0.00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	0.00	0.00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2	0.00	0.00

1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0.00	0.00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	0.00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3	0.00	0.00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3	0.00	0.00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0.00	0.00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M	0.00	0.00
8.00	REDES ELÉCTRICAS		0.00	0.00
8.1	RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.		0.00	0.00
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND	0.00	0.00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
8.2	RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.		0.00	0.00
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0.00	0.00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0.00	0.00
8.3	SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.		0.00	0.00
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0.00	0.00
8.4	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.		0.00	0.00
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0.00	0.00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0.00	0.00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	4.21%	14.14%	10.45%
DURANTE EL PERIODO	0.47%	0.99%	
ACUMULADO ACTUAL	4.68%	15.13%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Control de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular en el sector de Villa Fátima y Santa Barbara.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión

Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de San José Tramo 2
Continuar con transporte, extendido y compactación de material de subbase granular en el sector de Santa Barbara tramo 11.
Realización de densidades a tramo cereado de mejoramiento y subbase granular.
Transporte e instalación de material de mejoramiento en el sector de San José tramo 2.
Vaciado de concreto en tramo N°4 del barrio el mora.
Continuar con el vaciado de concreto en los tramos de Santa bárbara y vaciado en el tramo de vía de villa Fátima.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado.
Participación en comités de obra semanales.

VII.COMPONENTE SOCIAL

Atención solicitudes de la comunidad.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Transito.
Se realizar algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejoral el control vehicular en los sectores intervenidos.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

VILLA FÁTIMA	SAN JOSÉ
- Cereado de subbase granular del K0+220 al K0+292. - Instalación de Subbase Granular del K0+180 al K0+220. - vaciado de concreto hidráulico del K0+160 al K0+192 ambos carriles.	**CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39** - Vaciado de concreto hidráulico del K0+148 al K0+57.6 en el carril izquierdo. **CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39** - No se realizaron actividades
SANTA BARBARA	**EL MORA**
CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - No se realizaron actividades. **CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VÍA MONTERÍA - SAN CARLOS** - No se realizaron actividades	**CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B** - No se realizaron actividades


VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


VILLA FÁTIMA







SANTA BARBARA


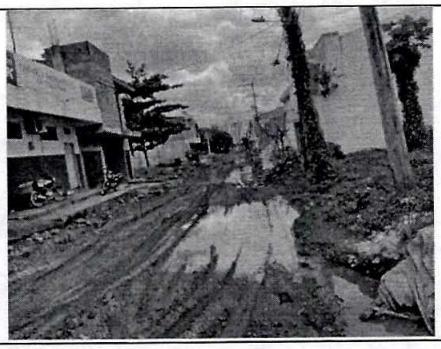


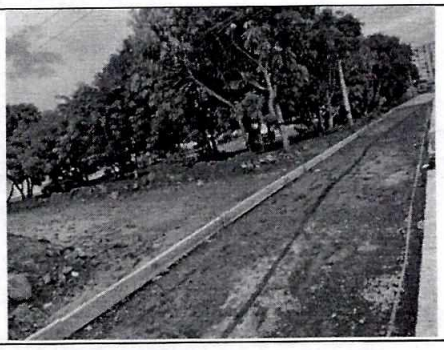

SAN JOSÉ

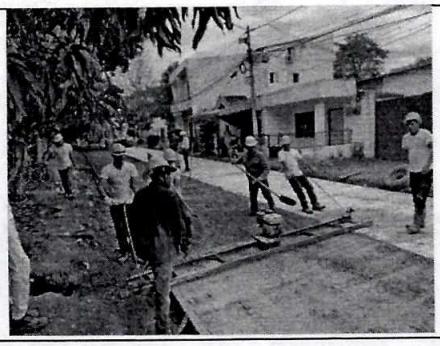

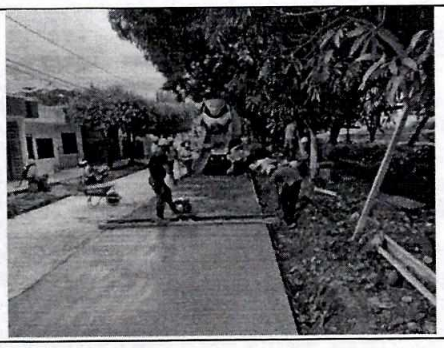

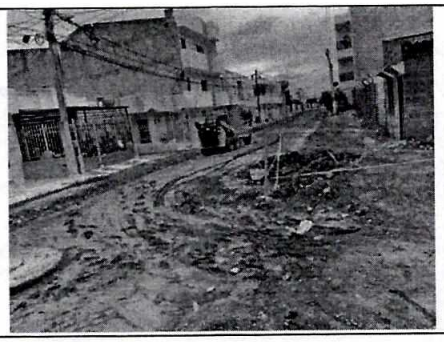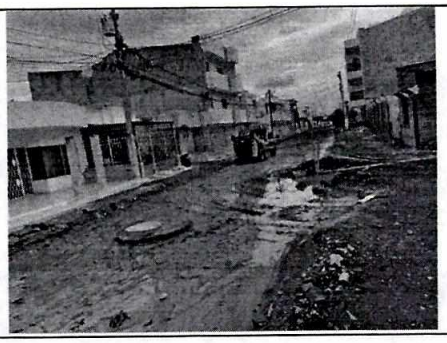EL MORA	
	

NOTA:

VII. FIRMAS	
CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	9	6	2025	SEMANA No.:	14	DEL	1-jun-25	AL	7-jun-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15,436,620,455.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974,933,670.00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15,436,620,455.00	PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 974,933,670.00
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA			SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA		
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	0.00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$ -	
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	0.00%	
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

III. AVANCE FÍSICO


ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	0.00	474.00
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	0.59	0.59
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	14.00	38.00
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	7.80	190.80
1.05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0.00	0.00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	287.68	5329.41
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	76.70
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	349.68	6661.76
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	0.00	0.00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	1.00	25.00
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0.00	1.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0.00	0.00
			0.00	0.00
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE	M^3	0.00	1373.10
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0.00	346.58
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	36.00	4303.42
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0.00	947.70
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^2	234.50	7736.70
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.		0.00	0.00
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS	M^3	174.26	816.75
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	UND	0.00	0.00
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	M	121.50	208.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	KG	385.00	1628.40
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.		0.00	0.00
4.00	SEÑALIZACIÓN	UND	0.00	0.00
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	M^2	0.00	0.00
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0.00	0.00
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0.00	0.00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.		0.00	0.00
5.00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS			
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAL. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	0.00	0.00
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	0.00	0.00
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	0.00	0.00
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	0.00	0.00
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	0.00
6.00	OTRAS ACTIVIDADES		0.00	0.00
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	0.00	111.20
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	2.00	47.00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0.00	0.00
7.00	BOX CULVERT		0.00	0.00
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3	0.00	0.00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	0.00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	0.00	0.00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2	0.00	0.00

1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0.00	0.00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	0.00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3	0.00	0.00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3	0.00	0.00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0.00	0.00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M	0.00	0.00
8.00	**REDES ELÉCTRICAS**		0.00	0.00
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**		0.00	0.00
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND	0.00	0.00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0.00	0.00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0.00	0.00
8.3	**SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0.00	0.00
8.4	**ALUMBRADO PÚBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0.00	0.00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0.00	0.00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	4.68%	15.13%	11.84%
DURANTE EL PERIODO	0.53%	1.92%	
ACUMULADO ACTUAL	5.21%	17.05%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Control de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular en el sector de Villa Fátima y Santa Barbara.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión

Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de San José Tramo 2
Continuar con transporte, extendido y compactación de material de subbase granular en el sector de Santa Barbara tramo 11.
Realización de densidades a tramo cereado de mejoramiento y subbase granular.
Transporte e instalación de material de mejoramiento en el sector de San José tramo 2.
Vaciado de concreto en tramo N°4 del barrio el mora.
Continuar con el vaciado de concreto en los tramos de Santa bárbara y vaciado en el tramo de vía de villa Fátima.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado.
Participación en comités de obra semanales.

VII.COMPONENTE SOCIAL

Atención solicitudes de la comunidad.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Transito.
Se realizar algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejoral el control vehicular en los sectores intervenidos.


IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

VILLA FÁTIMA	SAN JOSÉ
- Demolición de placa superior de caja de registro de telecomunicaciones. - Instalación de Subbase Granular del K0+180 al K0+220. - vaciado de concreto hidráulico del K0+160 al K0+192 ambos carriles.	**CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39** - Vaciado de concreto hidráulico del K0+57.6 al K0+003.40 en el carril izquierdo. **CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39** - Transporte, instalación y compactación de material de mejoramiento de subrasante del K0+200 al K0+215. - Instalación de geotextil. - Excavación en material común del K0+245 al K0+187.
SANTA BARBARA	**EL MORA**
CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - No se realizaron actividades. - Transporte, instalación y compactación de material de subbase granular del K0+020 al K0+060. **CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VÍA MONTERÍA - SAN CARLOS** - Corte de andenes existentes - Demolición de Andenes existentes. - Vaciado de concreto hidráulico del K0+154.03 al K0+259.30 Carril derecho. - Vaciado de concreto hidráulico del K0+238.09 al K0+259.63 Carril izquierdo. - Suministro e instalación de 121.5 metros de bordillos prefabricados	**CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B** - Tala de árbol de altura entre 5.1m a 10m. - Vaciado de concreto hidráulico del K0+000 al K0+060 Carril derecho. - Vaciado de concreto hidráulico del K0+000 al K0+060 Carril izquierdo.


VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


VILLA FÁTIMA



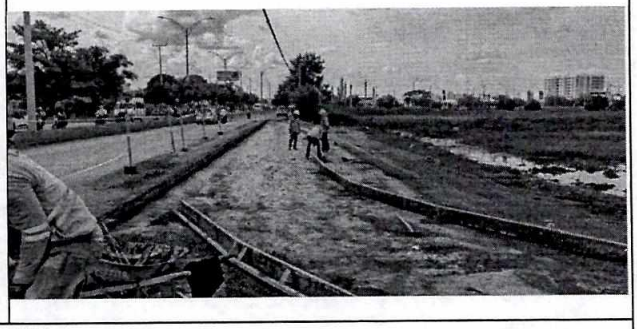


SANTA BARBARA

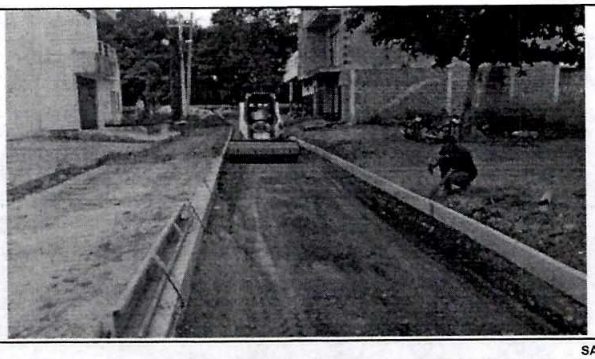

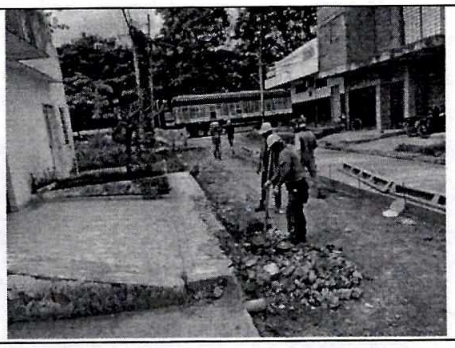

SAN JOSÉ



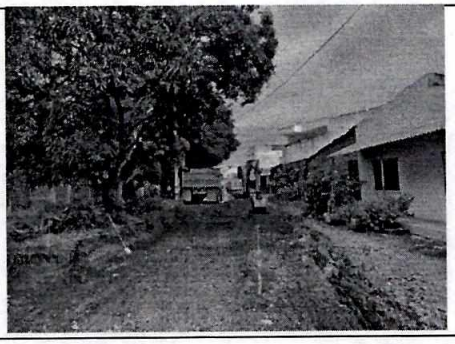

EL MORA





NOTA:

VII. FIRMAS

CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	16	6	2025	SEMANA No.:	15	DEL	8-jun-25	AL	14-jun-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15,436,620,455.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974,933,670.00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15,436,620,455.00	PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 974,933,670.00
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA			SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA		
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	0.00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$	-
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	0.00%	
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

III. AVANCE FÍSICO


ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	0.00	474.00
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	0.00	0.59
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	28.70	66.70
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	39.88	230.68
1.05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0.00	0.00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	559.27	5888.68
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	9.60	67.10
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	699.09	7360.85
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	0.00	0.00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0.00	25.00
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0.00	1.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0.00	0.00
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE		0.00	0.00
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0.00	1373.10
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	346.58
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	169.99	4473.41
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	55.00	1002.70
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	985.62	8722.32
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS		0.00	0.00
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	72.00	888.75
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	0.00	0.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	26.50	234.50
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	211.80	1840.20
4.00	SEÑALIZACIÓN		0.00	0.00
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	0.00	0.00
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0.00	0.00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M	0.00	0.00
5.00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS		0.00	0.00
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAL. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	0.00	0.00
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	0.00	0.00
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	0.00	0.00
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	0.00	0.00
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	0.00
6.00	OTRAS ACTIVIDADES		0.00	0.00
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	70.90	182.10
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	47.00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0.00	0.00
7.00	BOX CULVERT		0.00	0.00
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3	0.00	0.00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	0.00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	0.00	0.00

7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2	0.00	0.00
1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0.00	0.00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	0.00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3	0.00	0.00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	KG	0.00	0.00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	M	0.00	0.00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.		0.00	0.00
8.00	**REDES ELÉCTRICAS**		0.00	0.00
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**	M	0.00	0.00
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	UND	0.00	0.00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND	0.00	0.00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0.00	0.00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0.00	0.00
8.3	**SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0.00	0.00
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0.00	0.00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0.00	0.00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	5.21%	17.05%	12.53%
DURANTE EL PERIODO	0.58%	1.27%	
ACUMULADO ACTUAL	5.79%	18.32%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Control de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión.

Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de San José - Tramo 2
Inicio de actividades de excavación en tramo N°5 - El Mora y Altos de la Floresta - Cra 16A entre las calles 40 y 41.
Continuar con transporte, extendido y compactación de material de subbase granular en el sector de el Mora - Tramo 3 y San José - Tramo 2.
Transporte e instalación de material de mejoramiento en el sector de San José tramo 2 y El Mora y Altos de la Floresta - Tramo 5.
Vaciado de concreto en tramo N°4 del barrio el Mora, Santa Bárbara - tramo 10.
Continuar con el vaciado de concreto en el tramo de vía de Villa Fátima.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de tránsito Aprobado.
Participación en comités de obra semanales.
Seguimiento a compromisos del contratista de obra

VII.COMPONENTE SOCIAL

Atención solicitudes de la comunidad.

VIII.COMPONENTE PMT


Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Tránsito.
Se realizár algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejorar el control vehicular en los sectores intervenidos.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

VILLA FÁTIMA	SAN JOSÉ
- Demolición de placa superior de caja de registro de telecomunicaciones. - Instalación de Subbase Granular del K0+180 al K0+220. - vaciado de concreto hidráulico del K0+160 al K0+192 ambos carriles.	**CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - Tramo 12** - Vaciado de concreto hidráulico del K0+57.6 al K0+003.40 en el carril izquierdo. **CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - Tramo 2** - Transporte, instalación y compactación de material de mejoramiento de subrasante. - Instalación de geotextil. - Excavación en material común.
SANTA BARBARA	**EL MORA**
CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - Transporte, instalación y compactación de material de subbase granular del K0+020 al K0+060. **CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VÍA MONTERÍA - SAN CARLOS** - Corte de andenes existentes - Demolición de Andenes existentes. - Vaciado de concreto hidráulico del K0+154.03 al K0+259.30 Carril derecho. - Vaciado de concreto hidráulico del K0+238.09 al K0+259.63 Carril izquierdo. - Suministro e instalación de 121.5 metros de bordillos prefabricados	**CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B** - Tala de árbol de altura entre 5.1m a 10m. - Vaciado de concreto hidráulico del K0+000 al K0+060 Carril derecho. - Vaciado de concreto hidráulico del K0+000 al K0+060 Carril izquierdo.


VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VILLA FÁTIMA

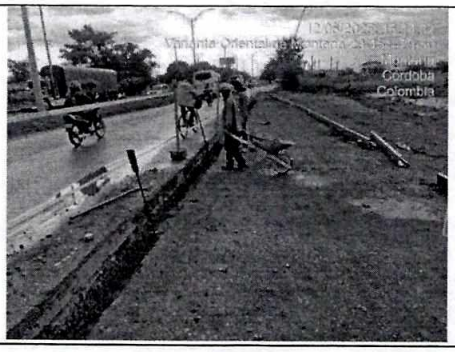





SANTA BARBARA

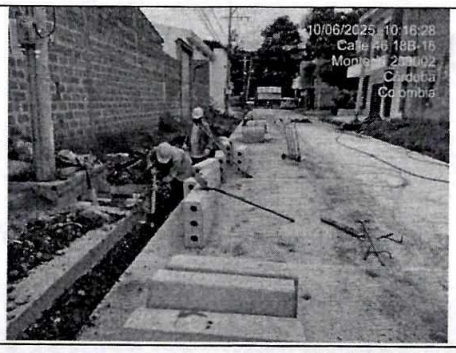




SAN JOSÉ

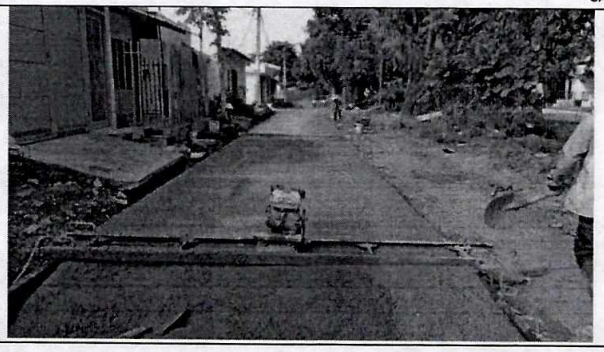

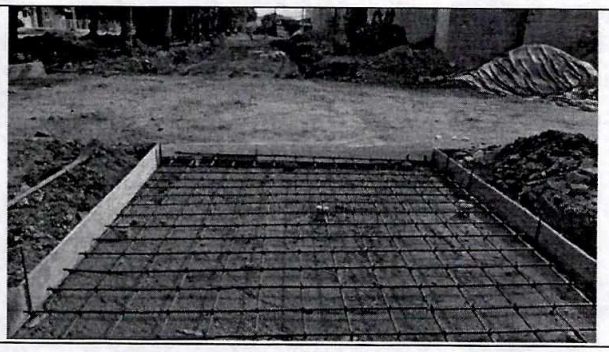

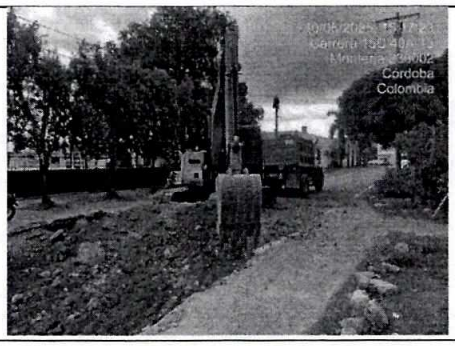EL MORA	
	

NOTA:

VII. FIRMAS	
CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	23	6	2025	SEMANA No.:	16	DEL	15-jun-25	AL	21-jun-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15,436,620,455.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974,933,670.00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15,436,620,455.00	PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 974,933,670.00
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA			SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA		
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	0.00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$	1,670,972,179.00
PARCIAL 1:	$ 1,670,972,179.00	% AVANCE FINANCIERO:	10.82%	
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

III. AVANCE FÍSICO


ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	6.40	480.40
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	0.00	0.59
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	0.00	66.70
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	0.00	230.68
1.05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0.00	0.00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	598.62	6487.30
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	19.24	95.94
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	868.21	8229.05
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	0.00	0.00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0.00	25.00
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	1.00	2.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0.00	0.00
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE		0.00	0.00
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0.00	1373.10
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	19.24	365.82
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	348.57	4821.98
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	33.00	1035.70
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	407.40	9129.72
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS		0.00	0.00
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	118.95	1007.70
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	0.00	0.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	43.16	277.66
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	1600.30	3440.50
4.00	SEÑALIZACIÓN		0.00	0.00
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	0.00	0.00
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0.00	0.00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M	0.00	0.00
5.00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS		0.00	0.00
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAL. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	0.00	0.00
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	0.00	0.00
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	0.00	0.00
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	0.00	0.00
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	0.00
6.00	OTRAS ACTIVIDADES		0.00	0.00
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	18.00	200.10
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	10.00	60.00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0.00	0.00
7.00	BOX CULVERT		0.00	0.00
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3	0.00	0.00

7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	0.00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	0.00	0.00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2	0.00	0.00
1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0.00	0.00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	0.00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3	0.00	0.00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3	0.00	0.00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0.00	0.00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M	0.00	0.00
8.00	REDES ELÉCTRICAS		0.00	0.00
8.1	RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.		0.00	0.00
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND	0.00	0.00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
8.2	RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.		0.00	0.00
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0.00	0.00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0.00	0.00
8.3	SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.		0.00	0.00
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0.00	0.00
8.4	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.		0.00	0.00
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0.00	0.00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0.00	0.00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	5.79%	18.32%	13.87%
DURANTE EL PERIODO	0.55%	1.89%	
ACUMULADO ACTUAL	6.34%	20.21%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Control de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión.

Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de San José - Tramo 2
Instalación de subbase granular en tramo N°5 - El mora y Altos de la Floresta - Cra 16A entre las calles 40 y 41.
Continuar con transporte, extendido y compactación de material de subbase granular en el sector de el Mora - Tramo 3 y San José - Tramo 2.
Transporte e instalación de material de mejoramiento en el sector de San José tramo 2 y El mora y Altos de la Floresta - Tramo 5.
Vaciado de concreto en tramo N°4 del barrio el Mora, Santa Bárbara - tramo 10, villa Fátima y San José tramo N°2.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de tránsito Aprobado.
Participación en comités de obra semanales.
Seguimiento a compromisos del contratista de obra

VII.COMPONENTE SOCIAL

Atención solicitudes de la comunidad.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Tránsito.
Se realizár algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejoral el control vehicular en los sectores intervenidos.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS

VILLA FÁTIMA

- Vaciado de 30.12 m3 en carril de aceleración (carril de salida)
- Armado e Instalación de acero para parrillas de refuerzo en placas de geometría irregular.
- Armado e Instalación de acero para viga de empalme con pavimento existente.
- Vaciado de vida de empalme con pavimento existente.
- Suministro e instalación de 43.16 metros de bordillo en el carril izquierdo.

SAN JOSÉ

CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - Tramo 12
- No se realizaron actividades.

CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - Tramo 2
- Excavación en material común de acuerdo a diseño geométrico y estructural en una longitud de 83.4m
- Transporte, instalación y compactación de material de mejoramiento de subrasante en una longitud de 140 m
- Instalación de geotextil en una longitud de 140 m.
- Vaciado de concreto hidráulico, un solo carril en una longitud de 39 m.
- Intervención de un fallo de 8m x 3.7m x 0.65m
- Extensión de dos tramos de tubería de alcantarillado de 9m cada una.
- Tala de un árbol con una altura mayor a 10 metros.

SANTA BARBARA

CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - Tramo 11
- Vaciado de 49.4 m de pavimento hidráulico en un carril del K0+080 al K0+129.4.
- Corte y armado de acero para placas de concreto con geometría irregular para dos placas de 3m x 3m

CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VÍA MONTERÍA - SAN CARLOS - Tramo 10
- Instalación de bordillos.

EL MORA

CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - Tramo 4
- Tala de árbol de altura entre 5.1m a 10m.
- Vaciado de concreto hidráulico del K0+000 al K0+060 Carril derecho.
- Vaciado de concreto hidráulico del K0+000 al K0+060 Carril izquierdo.




CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - Tramo 3
- Vaciado de concreto hidráulico en una longitud de 49m de un carril.
- Excavación en material común del K0+000 al K0+030.
- Instalación de material seleccionado, subbase y geotextil del K0+000 al K0+030

CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - ALTOS DE LA FLORESTA - Tramo 5
- Excavación en material común de acuerdo al diseño geométrico del K0+003 al K0+050.
- Mejoramiento de la subrasante con material seleccionado

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VILLA FÁTIMA

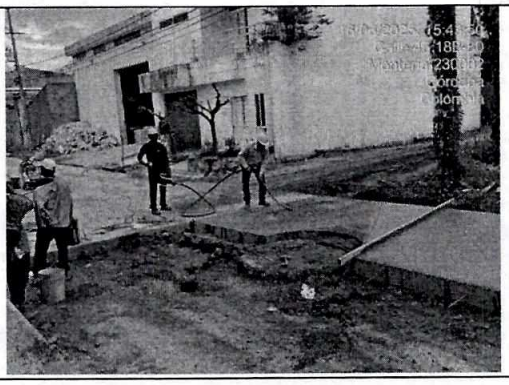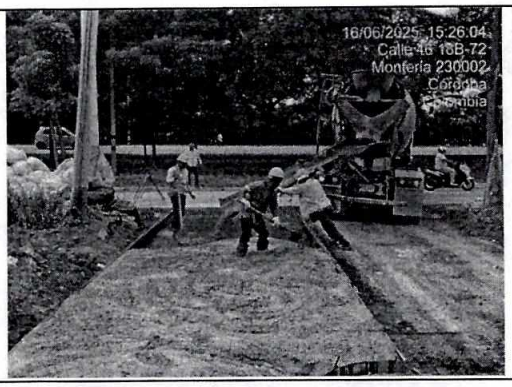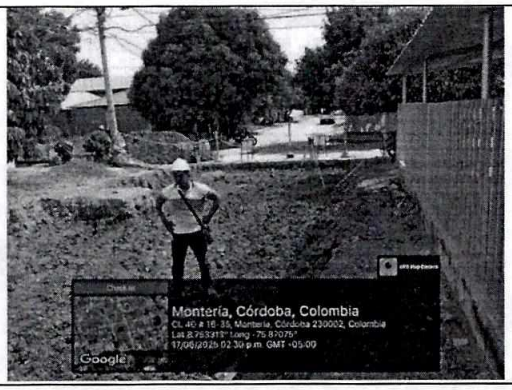

SANTA BÁRBARA	
	
SAN JOSÉ	
	
EL MORA	
	

NOTA:

VII. FIRMAS	
CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA		DE	
						VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA					CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	30	6	2025	SEMANA No.:	17	DEL	22-jun-25	AL	28-jun-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA			
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ			
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15,436,620,455.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$	974,933,670.00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025			
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$	-
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025			
PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15,436,620,455.00	PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$	974,933,670.00
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA			SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA			
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0.00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	1,670,972,179.00
PARCIAL 1:	$ 1,670,972,179.00	RADICADA SIM	% AVANCE FINANCIERO:	10.82%	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO


ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	7.40	487.80
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	0.00	0.59
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	77.90	144.60
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	72.20	302.88
1.05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0.00	0.00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	1094.54	7581.84
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	23.44	119.38
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	1441.39	9670.44
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	0.00	0.00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	7.00	32.00
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	1.00	3.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0.00	0.00
2.00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**		0.00	0.00
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0.00	1373.10
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	33.01	398.83
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0.00	4821.98
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	0.00	1035.70
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	180.60	9310.32
3.00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**		0.00	0.00
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	158.84	1166.54
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	0.00	0.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	238.05	515.71
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	635.00	4075.50
4.00	**SEÑALIZACIÓN**		0.00	0.00
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0.00	0.00
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	0.00	0.00
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0.00	0.00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M	0.00	0.00
5.00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**		0.00	0.00
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAL. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	230.13	230.13
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	230.13	230.13
5.03	CONSTRUCCION PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	129.15	129.15
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	2.00	2.00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	2.00	2.00

5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0.00	0.00
6.00	**OTRAS ACTIVIDADES**		0.00	0.00
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	0.00	200.10
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	UND	0.00	60.00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0.00	0.00
7.00	**BOX CULVERT**		0.00	0.00
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3	0.00	0.00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0.00	0.00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	0.00	0.00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2	0.00	0.00
1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0.00	0.00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0.00	0.00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3	0.00	0.00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3	0.00	0.00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0.00	0.00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M	0.00	0.00
8.00	**REDES ELÉCTRICAS**		0.00	0.00
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**		0.00	0.00
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0.00	0.00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE	UND	0.00	0.00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0.00	0.00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0.00	0.00
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0.00	0.00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0.00	0.00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0.00	0.00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0.00	0.00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0.00	0.00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0.00	0.00
8.3	**SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0.00	0.00
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0.00	0.00
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0.00	0.00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0.00	0.00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	**6.34%**	**20.21%**	**15.85%**
DURANTE EL PERIODO	0.57%	2.55%	
ACUMULADO ACTUAL	**6.91%**	**22.76%**	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Registro de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión.

Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de Sucre
Instalación de subbase granular en tramo N°5 - El Mora y Altos de la Floresta - Cra 16A entre las calles 40 y 41.
Continuar con transporte, extendido y compactación de material de subbase granular en el sector de el Mora - Tramo 3 y San José - Tramo 2.
Transporte e instalación de material de mejoramiento en el sector de San José tramo 2 y El mora y Altos de la Floresta - Tramo 5.
Vaciado de concreto en tramo N°4 del barrio el Mora, Santa Bárbara - tramo 10, Villa Fátima y San José tramo N°2
Vaciado de concreto en tramo de Villa Fátima.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito Aprobado.
Participación en comités de obra semanales.
Seguimiento a compromisos del contratista de obra.
Registro diario de actividades en la bitácora de obras

VII.COMPONENTE SOCIAL

Atención solicitudes de la comunidad.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Tránsito.
Se realizan algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejorar el control vehicular en los sectores intervenidos.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES

VILLA FÁTIMA

- Vaciado de 59.5m de pavimento con un ancho de 3.5m y 0.21m de espesor.
- Construcción de 128.64m de bordillo.
- Construcción de 68.98m de longitud por 0.35m de ancho.
- Construcción de 80.13m de tableta guía.
- Construcción de 80.13m tableta visual.

SAN JOSÉ

CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - Tramo 12
- No se realizaron actividades por parte del contratista, debido a fuertes y constantes lluvias

CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - Tramo 2
- Demolición de 7.4m de bordillo.
- Vaciado de 32.8m lineales de pavimento con un ancho de 3m y un espesor de 0.20m.
- Tala de 4 arboles con altura entre 5 y 10 metros.
- Tala de 1 árbol con una altura mayor a 10 metros.
- Corte, armado e instalación de 108 kg de acero.

SANTA BARBARA

CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - Tramo 11
- Vaciado de 55.84m metros lineales de pavimento con un acho de 3m y 0.20m de espesor.

CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VÍA MONTERÍA - SAN CARLOS - Tramo 10
- Instalación de 109.41m de bordillos.
- Construcción de 144.95m de tableta guía.
- Construcción de 144.95m tableta visual.
- Construcción de andén 144.95m x 0.70m.
- Construcción de 2 rampas peatonales.
- Construcción de 2 Rampas Vehiculares.
- Corte de 67.9m de andenes existentes.
- Demolición de 62.2 m2 de andenes existentes.

EL MORA

CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - Tramo 4
- Vaciado de concreto hidráulico en una longitud de 7.6m.
- Corte, figurado e instalación de 209 kg de acero.

CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - Tramo 3
- Vaciado de concreto hidráulico en una longitud de 49 con un ancho de 2.75m de un carril.
- Excavación en material común del K0+080 al K0+090.
- Instalación de material seleccionado, subbase y geotextil del K0+000 al K0+030
- Excavación y relleno en fallo encontrado.

CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - ALTOS DE LA FLORESTA - Tramo 5
- No se laboró por inconvenientes tenidos por el contratista en cuanto a lluvias.


VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VILLA FÁTIMA







SANTA BÁRBARA

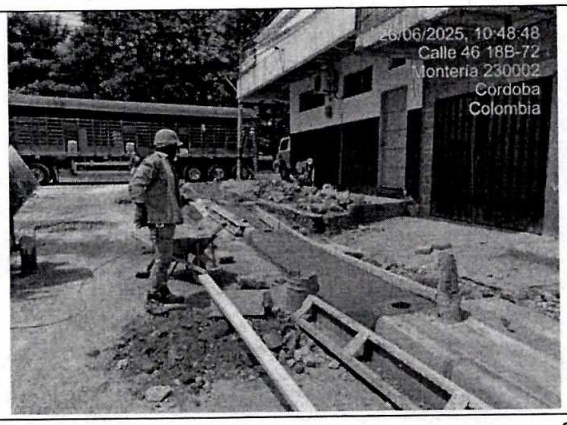




SAN JOSÉ

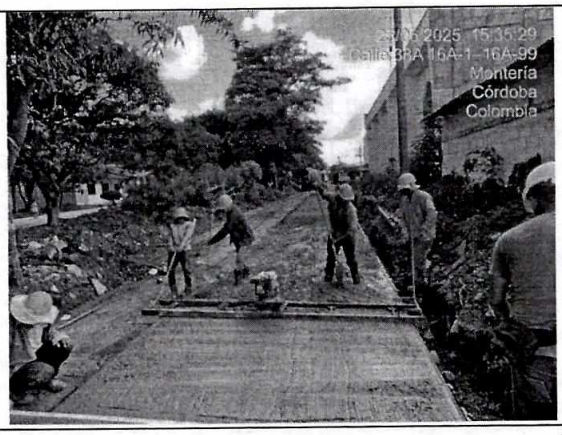

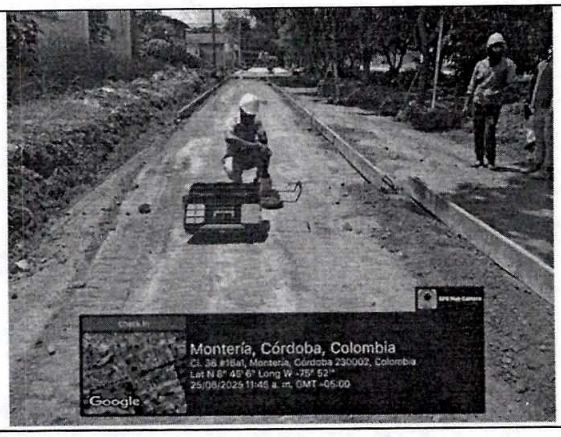

EL MORA

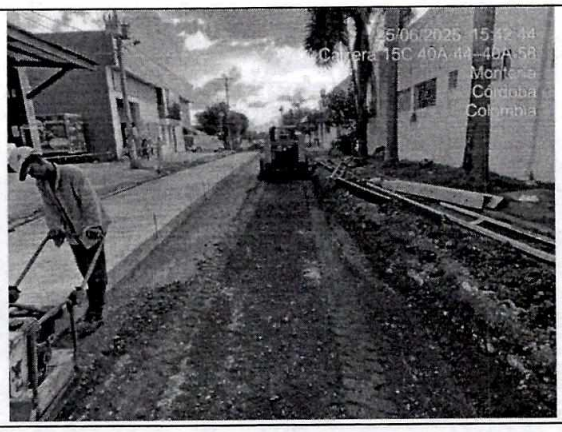



NOTA:

VII. FIRMAS

CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
