5. Factura

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO SINU URBANO
NIT 901.911.834-3
TV 14C 44 12 ED VENECIA
Tel: (604) 3214459750
Montería - Colombia
pavimentocomuna7y8@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FPSU 4

Señores	MUNICIPIO DE MONTERIA		
NIT	800.096.734-1	Teléfono	(604) 7924545
Dirección	CL 27 CR 3 ESQ	Ciudad	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 07:04
Expedición	12/12/2025, 07:04
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Municipio de Montería debe a consorcio Sinú Urbano, Acta parcial N° 4, cuyo objeto es Pavimento de vías en los barrios de la comuna 7 y 8 de montería cordobán.	1.00	3,208,548,327.00	3,208,548,327.00

Total items: 1

Total Bruto	3,208,548,327.00
Total a Pagar	3,208,548,327.00

Valor en Letras:
Tres mil doscientos ocho millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos veintisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 3,208,548,327.00

Observaciones:
EL PERIODO DEL ACTA PARCIAL DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE OCTUBRE, DEL CONTRATO DE OBRA LP- SIM -035-2024.

LOS INTEGRANTES DEL COSNSORCIO SON
ASB ONASSIS CONSTRUCCIONES SAS 50%
KABOD EXECUTIVE GROUP SAS 60%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089336365 aprobado en 20250224 prefijo FPSU desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 8a097746fcfdcc9ecc91c474f7623d263c5f129395dee665f74a00872a3df98eef700290abcb3a3463973e53eb0268d7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

1. Seguridad social

CONSORCIO SINU URBANO
Nit: 901911834-3



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA

Sres.
ALCALDIA DE MONTERIA
Secretaria de Infraestructura – Centro Verde
Montería - Córdoba

Yo, **ANA MARCELA VERTEL BERROCAL** identificado con la cedula de ciudadanía No. 25.776.940 de Montería, en mi condición de representante legal de CONSORCIO SINU URBANO identificada con NIT. 901.911.834-3, certifico que, durante los meses calendarios legalmente exigibles, trascurridos desde la firma del acta de inicio, febrero 28 de 2025, hasta la fecha de corte del periodo de la presente acta parcial N° 4, octubre 27 de 2025, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Montería, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2025.

Agradeciendo su atención.

ANA MARCELA VERTEL BERROCAL.
C.C. 25.776.940 de Montería
REP LEG
CONSORCIO SINU URBANO.
NIT: 900.371.384-9

Dirección: Transversal 14c # 44- 12 apto 402 torre 2- Montería Córdoba
Cel: 3214459750
Correo: pavimentocomuna7y8@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901911834	3	CONSORCIO SINU URBANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	TV 14 C # 44 - 12 ED VENECIA	MONTERIA-CORDOBA	3214459750	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1783908636	9491833151	E	2025/09/08	2025/09/17	BANCO DAVIVIENDA	9	$19,145,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1067930684	ABAD PAEZ JEORGE ANTONIO	231001	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
2	CC	78716183	ACOSTA REYES OVER JOSE	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF16	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
3	CC	10771905	ALVAREZ BELTRAN LUIS CARLOS	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1064311648	ALVAREZ CAMARGO RAFAEL ANTONIO	230301	10	$474,500	$76,000	ESSC07	10	$474,500	$19,000	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
5	CC	1067862777	ANAYA ATENCIO JOSE LUIS	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
6	CC	10778717	ARGUMEDO TORDECILLA LUIS EDUARDO	230201	5	$237,250	$38,000	ESSC07	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
7	CC	78706966	BANDA PEREZ SANTIAGO MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	1064979451	BARRAGAN MARTINEZ DAVID	230301	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF16	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
9	CC	1067915000	BARRERA RODRIGUEZ ARLEY DE JESUS	231001	9	$427,050	$68,400	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
10	CC	11151559	BEDOYA VEGA HOLBIN GERMAN	230301	30	$1,462,500	$234,000	EPS037	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
11	CC	1067905576	BERROCAL MARTINEZ CRISTIAN ENRIQUE	230201	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
12	CC	1002493590	BOLIVAR CORDERO JEAN CARLOS	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
13	CC	78699137	BULA CASTILLO LUIS FRANCISCO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
14	CC	1007174024	CACERES REYES JOSE ELIAS	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
15	CC	1067889044	CALDERIN LAGARES JAIRO MANUEL	231001	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
16	CC	1046396092	CARMONA CARDOZA FABIAN ANTONIO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
17	CC	1038100389	CASTILLO LOPEZ GUSTAVO ANTONIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
18	CC	6881250	CASTILLO REYES RAFAEL DARIO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
19	CC	77189860	CELEDON JARAMILLO ERWIN ANTONIO	230301	30	$1,462,500	$234,000	EPS005	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
20	CC	78744930	COGOLLO EDUAR MIGUEL	231001	1	$47,450	$7,600	CCFC55	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
21	CC	1067899863	CONTRERAS FERIA LUIS EDUARDO	230301	12	$569,400	$91,200	EPS048	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
22	CC	1067946344	CONTRERAS FERIA LUIS FERNANDO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
23	CC	10783937	CONTRERAS PADILLA LUIS MANUEL	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC07	2	$94,900	$3,800	CCF16	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
24	CC	1067953266	CORONADO JIMENEZ CARLOS ANDRES	230301	3	$142,350	$22,800	ESSC07	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
25	CC	11033215	CORREA SEÑA JUAN CARLOS	230301	1	$47,450	$7,600	CCFC55	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
26	CC	1065378012	DONADO GARCIA MERLY DOMINGA	230301	30	$1,500,000	$240,000	ESSC07	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
27	CC	10931649	DORIA JIMENEZ ANGEL FRANCISCO	231001	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
28	CC	15679759	DURAN ROMERO JESUS DAVID	25-14	30	$1,462,500	$234,000	EPS010	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
29	CC	1064976526	DURANGO ROMERO CRISPIN FELIPE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

2025/09/18 09:37 AM

30	CC	1003402589	ESPINOZA SOTELO LUIS FELIPE	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
31	CC	1067852046	ESTRADA PAEZ JORGE LUIS	230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
32	CC	78713391	FABRA VARGAS JORGE ELIECER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS048	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
33	CC	15671959	FLOREZ PEREZ JOAQUIN PABLO	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
34	CC	1003590016	GALLEGO PEREZ MARCO ANTONIO	230301	9	$427,050	$68,400	ESSC07	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
35	CC	1067926391	GALLO PORTACIO CARLOS ALBERTO	230301	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF16	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
36	CC	1003099522	GARCIA SUAREZ PEDRO LUIS	230201	12	$569,400	$91,200	EPS040	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
37	CC	1192764906	GOMEZ HERNANDEZ ARNALDO ANTONIO	230301	12	$569,400	$91,200	EPS048	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
38	CC	1003655061	GONZALEZ RIVERA ALAN DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
39	CC	10934499	GONZALEZ TORRES ARNULFO MANUEL	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF16	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
40	CC	11003231	GONZALEZ THIEL ARTURO	231001	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
41	CC	11003231	GONZALEZ THIEL ARTURO	231001	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
42	CC	1133797835	GONZALEZ RAMIREZ ROBERTO ANTONIO	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
43	CC	1063135975	GONZALEZ RAMOS SEBASTIAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
44	CC	78750757	GUERRA VELASQUEZ GERARDO GABRIEL	231001	13	$616,850	$98,700	EPS002	13	$616,850	$24,700	CCF16	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0
45	CC	1067850540	GUTIERREZ GALARCIO YAIR ENRIQUE	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
46	CC	10967565	GUZMAN AGAMEZ MARCO ANTONIO	230201	8	$379,600	$60,800	CCFC55	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
47	CC	78706199	HERNANDEZ MOLINA ALFREDO JOSE	230301	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF16	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
48	CC	1064982914	HERNANDEZ PETRO CESAR ANDRES	230301	18	$854,100	$136,700	EPS002	18	$854,100	$34,200	CCF16	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
49	CC	78701536	HERNANDEZ ESPITIA JOSE GREGORIO	231001	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
50	CC	1067874093	HOYOS GARCIA ADIELA TERESA	230201	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
51	CC	10772706	HOYOS MIRANDA HENRY MANUEL	230301	15	$711,750	$113,900	ESSC07	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
52	CC	11304951	INFANTE ROA DANIEL RODRIGO		0	$0	$0	EPS048	30	$1,445,600	$57,900	CCF16	30	$1,445,600	$57,900	14-11	30	$1,445,600	$100,700	30	$0	$0
53	CC	1072663878	JARAMILLO ESCOBAR DAYANA PATRICIA	231001	1	$47,450	$7,600	CCFC55	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
54	CC	1072663878	JARAMILLO ESCOBAR DAYANA PATRICIA	231001	1	$47,450	$7,600	CCFC55	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
55	CC	1007822312	LEGARDA MERCADO VICTOR MANUEL	230301	10	$474,500	$76,000	ESSC07	10	$474,500	$19,000	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
56	CC	1102122261	LOPEZ BARRERA VICTOR MANUEL	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
57	CC	1124054415	LUGO AYILES JANER JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
58	CC	1124054415	LUGO AYILES JANER JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
59	CC	15703840	MADERA NEGRETE RICHAR DEL CRISTO	231001	12	$569,400	$91,200	EPS041	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
60	CC	1065014568	MARTINEZ DORIA JORGE CARLOS	230201	17	$806,650	$129,100	ESSC07	17	$806,650	$32,300	CCF16	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
61	CC	1015397336	MARTINEZ AVILA JOSE CARLOS	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
62	CC	1015397336	MARTINEZ AVILA JOSE CARLOS	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
63	CC	1067953116	MARTINEZ SALCEDO OSMAR DARIO	230301	5	$237,250	$38,000	ESSC07	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
64	CC	10779244	MEDINA MARTINEZ FRANCISCO MIGUEL	230201	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
65	CC	1137974269	MESTRA ACOSTA OVER DAVID	25-14	12	$569,400	$91,200	ESSC07	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
66	CC	70529955	MEZA HOYOS JORGE IVAN	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF16	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
67	CC	1068814577	MOGUEA ROSARIO GLEN DEIVIS	230301	12	$569,400	$91,200	ESSC07	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0

68	CC	1002998914	MONTES PETRO MARIANO ANTONIO	230201	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
69	CC	11000175	MONTIEL GONZALEZ JOSE NICANOR	231001	12	$569,400	$91,200	ESSC07	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
70	CC	1067869373	MORALES PADILLA JORGE ELIECER	230201	30	$1,462,500	$234,000	EPS002	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
71	CC	1003406479	MORALES GONZALEZ OVER LUIS	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
72	CC	1003000998	MORELO VILORIA EBERTO CARLOS	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC07	2	$94,900	$3,800	CCF16	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
73	CC	1067843046	MULASCO ORTEGA EDUARDO ANTONIO	230201	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
74	CC	6874550	MUÑOZ VILLADIEGO BENETRIDE DE JESUS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
75	CC	1065372758	NAVAJA MARTINEZ CRISTIAN	230201	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF16	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
76	CC	1073990211	NAVARRO MORELO SERGIO LUIS	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
77	CC	1063649498	ORTEGA LUNA GERSON	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
78	CC	78033426	OSPINA MARTINEZ EINAR YESID	25-14	19	$901,550	$144,300	ESSC24	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
79	CC	1073970854	PACHECO MARTINEZ DAIRO JOSE	230301	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
80	CC	1126247040	PACHECO LICONA JOSE RAMON	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
81	CC	10933564	PACHECO BORJA VICTOR MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
82	CC	1068418072	PADILLA MARTINEZ DANIEL DAVID	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
83	CC	1003407285	PASTRANA ROJAS EVER LUIS	230201	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
84	CC	78695151	PASTRANA MARTINEZ HERNAN FRANCISCO	230301	10	$474,500	$76,000	EPS041	10	$474,500	$19,000	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
85	CC	6878868	PEÑA LALINDE PIO QUINTO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
86	CC	1010117775	PERALTA ALVAREZ EDER LUIS	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
87	CC	1003002947	PEREZ YANEZ LUIS JAVIER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
88	CC	1045423270	PULGARIN PETRO LEONARDO ANTONIO	230201	11	$521,950	$83,600	EPS048	11	$521,950	$20,900	CCF16	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
89	CC	78714855	RAMOS JIMENEZ JOSE RAMON	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF16	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
90	CC	54259957	RIVAS TAPIAS LUDDY ELENA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
91	CC	1066523879	RODRIGUEZ CONDE CRISTHIAN JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
92	CC	78749389	ROJAS GOMEZ CESAR AMAURY	25-14	12	$569,400	$91,200	ESSC07	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
93	CC	1062605333	ROSSO MARTINEZ ARIEL DAVID	230301	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
94	CC	1067874360	RUIZ TORO ANGEL DE JESUS	230301	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
95	CC	1067861883	RUIZ MORA SAMIR JOSE	230301	12	$569,400	$91,200	CCFC33	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
96	CC	1064986653	SANCHEZ MORALES JULIO CESAR	231001	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
97	CC	1041256291	SANCHEZ SOTELO LUBIAN ALBERTO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
98	CC	1041256291	SANCHEZ SOTELO LUBIAN ALBERTO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
99	CC	1067851094	SANCHEZ MORALES LUIS FERNANDO	230301	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
100	CC	1193459697	SANCHEZ MORALES PEDRO MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
101	CC	78038367	SANCHEZ CORCHO PEDRO ANTONIO	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
102	CC	1100551420	SANTIZ RIOS CARLOS ALBERTO	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
103	CC	78031036	SOLIPA MERCADO ERIOYTO JAVIER	231001	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
104	CC	1062431415	SOTO GAVIRIA OMAR YESID	230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS042	22	$1,043,900	$41,800	CCF16	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
105	CC	1065376198	SUAREZ CARRASCAL AYLIN KARINA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

Resumen General de Pago

106	CC	1067876086	TORRES MARTNEZ JHORDAN	230301	5	$237,250	$38,000	ESSC07	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
107	CC	15648006	TORRES GUERRA YORLIS MANUEL	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
108	CC	10766267	VARGAS SANDON JOSE DE LA OS	231001	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
109	CC	10784903	VEGA OSORIO WILLIAM	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
110	CC	1067928185	VERGARA HERNANDEZ CARLOS MARIO	230201	17	$806,650	$129,100	EPS037	17	$806,650	$32,300	CCF16	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
111	CC	25776940	VERTEL BERROCAL ANA MARCELA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
112	CC	1003591046	VERTEL GONZALEZ JAMER JOSE	231001	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
113	CC	78703922	VIDAL SOLANO EDUIN ENRIQUE	230301	22	$1,043,900	$167,100	ESSC07	22	$1,043,900	$41,800	CCF16	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
Total	**Afiliados(108)**					$60,051,450	$9,611,800			$62,920,550	$2,518,800			$62,920,550	$2,518,800			$62,920,550	$4,387,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				106	$9,611,800	$54,500	$0	$9,666,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	$1,687,100	$9,600	$0	$1,696,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,251,700	$7,100	$0	$1,258,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	60	$4,629,800	$26,200	$0	$4,656,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$2,043,200	$11,600	$0	$2,054,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				108	$4,387,300	$24,900	$0	$4,412,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	108	$4,387,300	$24,900	$0	$4,412,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				108	$2,518,800	$14,300	$0	$2,533,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	108	$2,518,800	$14,300	$0	$2,533,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				108	$2,518,800	$15,100	$0	$2,533,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	$22,800	$200	$0	$23,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$41,800	$300	$0	$42,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$96,900	$600	$0	$97,500
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$22,800	$200	$0	$23,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	$183,300	$1,100	$0	$184,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$60,400	$400	$0	$60,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	34	$630,200	$3,600	$0	$633,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$355,200	$2,100	$0	$357,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$283,100	$1,700	$0	$284,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	$566,200	$3,300	$0	$569,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$233,300	$1,400	$0	$234,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$22,800	$200	$0	$23,000
TOTAL				108	$19,036,700	$108,800	$0	$19,145,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901911834	3	CONSORCIO SINU URBANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	TV 14 C # 44 - 12 ED VENECIA	MONTERIA-CORDOBA	3214459750	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SEDE PRINCIPAL (92 Afiliados)						$84,630,550	$13,543,900			$88,069,050	$3,525,800			$88,069,050	$3,525,800			$88,069,050	$6,134,600		$0	$0
Centro de Trabajo: SEDE PRINCIPAL (92 Afiliados)						$84,630,550	$13,543,900			$88,069,050	$3,525,800			$88,069,050	$3,525,800			$88,069,050	$6,134,600		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (92 Afiliados)						$84,630,550	$13,543,900			$88,069,050	$3,525,800			$88,069,050	$3,525,800			$88,069,050	$6,134,600		$0	$0
1	CC	10771905	ALVAREZ BELTRAN LUIS CARLOS	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1064311648	ALVAREZ CAMARGO RAFAEL ANTONIO	230301	14	$664,300	$106,300	ESSC07	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
3	CC	10778717	ARGUMEDO TORDECILLA LUIS EDUARDO	230201	14	$664,300	$106,300	ESSC07	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
4	CC	78706966	BANDA PEREZ SANTIAGO MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	1064979451	BARRAGAN MARTINEZ DAVID	230301	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
6	CC	1067915000	BARRERA RODRIGUEZ ARLEY DE JESUS	231001	14	$664,300	$106,300	EPS002	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
7	CC	1067891377	BARRERA NISPERUZA LUIS FERNANDO	230301	26	$1,233,700	$197,400	ESSC07	26	$1,233,700	$49,400	CCF16	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
8	CC	11151559	BEDOYA VEGA HOLBIN GERMAN	230301	30	$1,462,500	$234,000	EPS037	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
9	CC	1067905576	BERROCAL MARTINEZ CRISTIAN ENRIQUE	230201	14	$664,300	$106,300	EPS002	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
10	CC	78699137	BULA CASTILLO LUIS FRANCISCO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
11	CC	1067837460	CASARRUBIA GARAVITO FRANKLIN FERNANDO	25-14	22	$1,043,900	$167,100	EPS002	22	$1,043,900	$41,800	CCF16	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
12	CC	1038100389	CASTILLO LOPEZ GUSTAVO ANTONIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
13	CC	6881250	CASTILLO REYES RAFAEL DARIO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
14	CC	77189860	CELEDON JARAMILLO ERWIN ANTONIO	230301	30	$1,462,500	$234,000	EPS005	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
15	CC	1067899863	CONTRERAS FERIA LUIS EDUARDO	230301	19	$901,550	$144,300	EPS048	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
16	CC	1071349787	CORDERO BLANQUICET FARID EDUARDO	230301	14	$664,300	$106,300	MIN002	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
17	CC	1067953266	CORONADO JIMENEZ CARLOS ANDRES	230301	11	$521,950	$83,600	ESSC07	11	$521,950	$20,900	CCF16	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
18	CC	8329553	DE LA ROSA FERNANDEZ HENRY MANUEL	230301	14	$664,300	$106,300	EPS041	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
19	CC	1067959809	DIAZ MENDOZA ALVARO RAFAEL	230301	12	$569,400	$91,200	EPS002	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
20	CC	1065378012	DONADO GARCIA MERLY DOMINGA	230301	30	$1,500,000	$240,000	ESSC07	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
21	CC	15679759	DURAN ROMERO JESUS DAVID	25-14	30	$1,462,500	$234,000	EPS010	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
22	CC	1064976526	DURANGO ROMERO CRISPIN FELIPE	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
23	CC	1067852046	ESTRADA PAEZ JORGE LUIS	230201	22	$1,043,900	$167,100	EPS002	22	$1,043,900	$41,800	CCF16	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
24	CC	1003590016	GALLEGO PEREZ MARCO ANTONIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
25	CC	1067926391	GALLO PORTACIO CARLOS ALBERTO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
26	CC	1067926391	GALLO PORTACIO CARLOS ALBERTO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
27	CC	1192764906	GOMEZ HERNANDEZ ARNALDO ANTONIO	230301	19	$901,550	$144,300	EPS048	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
28	CC	10934499	GONZALEZ TORRES ARNULFO MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
29	CC	11003231	GONZALEZ THIEL ARTURO	231001	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
30	CC	1063135975	GONZALEZ RAMOS SEBASTIAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
31	CC	78750757	GUERRA VELASQUEZ GERARDO GABRIEL	231001	19	$901,550	$144,300	EPS002	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
32	CC	10967565	GUZMAN AGAMEZ MARCO ANTONIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
33	CC	78706199	HERNANDEZ MOLINA ALFREDO JOSE	230301	8	$379,600	$60,800	EPS002	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
34	CC	1003006100	HERNANDEZ BARRERA CARLOS ALFREDO	230301	7	$332,150	$53,200	ESSC24	7	$332,150	$13,300	CCF16	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
35	CC	1064982914	HERNANDEZ PETRO CESAR ANDRES	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
36	CC	78701536	HERNANDEZ ESPITIA JOSE GREGORIO	231001	14	$664,300	$106,300	ESSC07	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
37	CC	1067961257	HERRERA YANEZ LUIS DANIEL	230301	19	$901,550	$144,300	ESSC07	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
38	CC	1067874093	HOYOS GARCIA ADIELA TERESA	230201	14	$664,300	$106,300	EPS002	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
39	CC	10771706	HOYOS MIRANDA HENRY MANUEL	230301	19	$901,550	$144,300	ESSC07	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
40	CC	10932064	HOYOS FERNANDEZ JOSE FRANCISCO	25-14	7	$332,150	$53,200	EPS041	7	$332,150	$13,300	CCF16	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
41	CC	11304951	INFANTE ROA DANIEL RODRIGO		0	$0	$0	EPS048	30	$1,445,600	$57,900	CCF16	30	$1,445,600	$57,900	14-11	30	$1,445,600	$100,700	30	$0	$0
42	CC	1072663878	JARAMILLO ESCOBAR DAYANA PATRICIA	231001	1	$47,450	$7,600	CCFC55	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
43	CC	1072663878	JARAMILLO ESCOBAR DAYANA PATRICIA	231001	1	$47,450	$7,600	CCFC55	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
44	CC	1007822312	LEGARDA MERCADO VICTOR MANUEL	230301	14	$664,300	$106,300	ESSC07	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
45	CC	1124054415	LUGO AVILES JANER JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
46	CC	1124054415	LUGO AVILES JANER JOSE	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
47	CC	15703840	MADERA NEGRETE RICHAR DEL CRISTO	231001	19	$901,550	$144,300	EPS041	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
48	CC	1073976765	MARTINEZ MENDOZA ALFONSO MIGUEL	230301	20	$949,000	$151,900	EPS041	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
49	CC	1065014568	MARTINEZ DORIA JORGE CARLOS	230201	14	$664,300	$106,300	ESSC07	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
50	CC	1015397336	MARTINEZ AVILA JOSE CARLOS	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
51	CC	1015397336	MARTINEZ AVILA JOSE CARLOS	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
52	CC	1067953116	MARTINEZ SALCEDO OSMAR DARIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
53	CC	10897640	MARTINEZ BRAVO UBALDO FRANCISCO		0	$0	$0	EPS005	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
54	CC	1137974269	MESTRA ACOSTA OVER DAVID	230301	19	$901,550	$144,300	ESSC07	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
55	CC	70529955	MEZA HOYOS JORGE IVAN	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF16	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
56	CC	1038821723	MINOTA CARO HUBER ANDRES	230301	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
57	CC	1068814577	MOGUEA ROSARIO GLEN DEIVIS	230301	19	$901,550	$144,300	ESSC07	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
58	CC	11000175	MONTIEL GONZALEZ JOSE NICANOR	231001	19	$901,550	$144,300	ESSC07	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
59	CC	1067869373	MORALES PADILLA JORGE ELIECER	230201	30	$1,462,500	$234,000	EPS002	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
60	CC	1003000998	MORELO VILORIA EBERTO CARLOS	230201	19	$901,550	$144,300	ESSC07	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
61	CC	6874550	MUÑOZ VILLADIEGO BENETRIDE DE JESUS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
62	CC	1065372758	NAVAJA MARTINEZ CRISTIAN	230201	19	$901,550	$144,300	EPS041	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
63	CC	1073990211	NAVARRO MORELO SERGIO LUIS	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
64	CC	1063649498	ORTEGA LUNA GERSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
65	CC	78033426	OSPINA MARTINEZ EINAR YESID	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
66	CC	10933564	PACHECO BORJA VICTOR MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
67	CC	78695151	PASTRANA MARTINEZ HERNAN FRANCISCO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
68	CC	6878868	PEÑA LALINDE PIO QUINTO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
69	CC	1003002947	PEREZ YANEZ LUIS JAVIER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
70	CC	1045423270	PULGARIN PETRO LEONARDO ANTONIO	230201	8	$379,600	$60,800	EPS048	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
71	CC	78714855	RAMOS JIMENEZ JOSE RAMON	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
72	CC	54259957	RIVAS TAPIAS LUDDY ELENA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
73	CC	78749389	ROJAS GOMEZ CESAR AMAURY	25-14	19	$901,550	$144,300	ESSC07	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
74	CC	1067874360	RUIZ TORO ANGEL DE JESUS	230301	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
75	CC	1067861883	RUIZ MORA SAMIR JOSE	230301	19	$901,550	$144,300	CCFC33	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
76	CC	1033369969	SALEME GUZMAN JENNITH JACIBE	230301	13	$616,850	$98,700	EPS037	13	$616,850	$24,700	CCF16	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0
77	CC	10934340	SANCHEZ BOHORQUEZ JOSE ALBERTO	230201	18	$854,100	$136,700	ESSC07	18	$854,100	$34,200	CCF16	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
78	CC	1064986653	SANCHEZ MORALES JULIO CESAR	231001	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
79	CC	1041256291	SANCHEZ SOTELO LUBIAN ALBERTO	230301	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
80	CC	1067851094	SANCHEZ MORALES LUIS FERNANDO	230301	14	$664,300	$106,300	EPS002	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
81	CC	78038367	SANCHEZ CORCHO PEDRO ANTONIO	230301	14	$664,300	$106,300	ESSC07	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
82	CC	1100551420	SANTIZ RIOS CARLOS ALBERTO	25-14	11	$521,950	$83,600	EPS041	11	$521,950	$20,900	CCF16	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
83	CC	1062431415	SOTO GAVIRIA OMAR YESID	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
84	CC	1065376198	SUAREZ CARRASCAL AYLIN KARINA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
85	CC	1064309119	SUAREZ SALGADO JUAN CAMILO	230301	14	$664,300	$106,300	ESSC07	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
86	CC	1064309132	SUAREZ ESPITIA RAFAEL AUGUSTO	230301	26	$1,233,700	$197,400	ESSC07	26	$1,233,700	$49,400	CCF16	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
87	CC	1067836203	TABORDA HOYOS ANDRES ALFONSO	230201	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
88	CC	10931044	TABORDA BALLESTA ROBER MANUEL	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
89	CC	1003430959	TAPIA COGOLLO CESAR SEGUNDO	230201	14	$664,300	$106,300	CCFC55	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
90	CC	1067876086	TORRES MARTINEZ JHORDAN	230301	8	$379,600	$60,800	ESSC07	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
91	CC	15670444	TORRES RIOS WILLIAM JAIRO	25-14	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF16	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
92	CC	1067941083	USTA JARAMILLO IVAN ANDRES	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
93	CC	10784903	VEGA OSORIO WILLIAM	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
94	CC	1067928185	VERGARA HERNANDEZ CARLOS MARIO	230201	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
95	CC	25776940	VERTEL BERROCAL ANA MARCELA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
96	CC	78703922	VIDAL SOLANO EDUIN ENRIQUE	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(92)**			$84,630,550	$13,543,900			$88,069,050	$3,525,800			$88,069,050	$3,525,800			$88,069,050	$6,134,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1912863088	9494535206	E	2025/10/08	2025/11/10	BANCO DAVIVIENDA	33	$27,274,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				89	$13,543,900	$275,500	$0	$13,819,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	$2,127,300	$43,300	$0	$2,170,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$1,677,000	$34,100	$0	$1,711,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	$6,914,500	$140,600	$0	$7,055,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$2,825,100	$57,500	$0	$2,882,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				92	$6,134,600	$124,800	$0	$6,259,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	92	$6,134,600	$124,800	$0	$6,259,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				92	$3,525,800	$71,700	$0	$3,597,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	92	$3,525,800	$71,700	$0	$3,597,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				92	$3,525,800	$72,300	$0	$3,598,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$87,400	$1,800	$0	$89,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$184,300	$3,800	$0	$188,100
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$36,100	$800	$0	$36,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	$202,300	$4,200	$0	$206,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$58,500	$1,200	$0	$59,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$26,600	$600	$0	$27,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	30	$1,099,500	$22,400	$0	$1,121,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$454,000	$9,300	$0	$463,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	$345,800	$7,100	$0	$352,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	$834,100	$17,000	$0	$851,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$197,200	$4,100	$0	$201,300
TOTAL				92	$26,730,100	$544,300	$0	$27,274,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901911834	3	CONSORCIO SINU URBANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	TV 14 C # 44 - 12 ED VENECIA	MONTERIA-CORDOBA	3214459750	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SEDE PRINCIPAL (90 Afiliados)					$88,806,150	$14,212,900			$92,339,550	$3,696,800			$92,339,550	$3,696,800			$92,339,550	$6,431,000		$0	$0
Centro de Trabajo: SEDE PRINCIPAL (90 Afiliados)					$88,806,150	$14,212,900			$92,339,550	$3,696,800			$92,339,550	$3,696,800			$92,339,550	$6,431,000		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (90 Afiliados)					$88,806,150	$14,212,900			$92,339,550	$3,696,800			$92,339,550	$3,696,800			$92,339,550	$6,431,000		$0	$0
1	CC	10771905	ALVAREZ BELTRAN LUIS CARLOS	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	10778717	ARGUMEDO TORDECILLA LUIS EDUARDO	230201	24	$1,138,800	$182,300	ESSC07	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
3	CC	78706966	BANDA PEREZ SANTIAGO MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1064979451	BARRAGAN MARTINEZ DAVID	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
5	CC	1062964899	BARRAGAN BORJA MOISES	230301	29	$1,376,050	$220,200	CCFC33	29	$1,376,050	$55,100	CCF16	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
6	CC	1067915000	BARRERA RODRIGUEZ ARLEY DE JESUS	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	1067891377	BARRERA NISPERUZA LUIS FERNANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	11151559	BEDOYA VEGA HOLBIN GERMAN	230301	30	$1,462,500	$234,000	EPS037	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
9	CC	1067905576	BERROCAL MARTINEZ CRISTIAN ENRIQUE	230201	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
10	CC	78699137	BULA CASTILLO LUIS FRANCISCO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
11	CC	1038100389	CASTILLO LOPEZ GUSTAVO ANTONIO	230201	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF16	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
12	CC	6881250	CASTILLO REYES RAFAEL DARIO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
13	CC	77189860	CELEDON JARAMILLO ERWIN ANTONIO	230301	30	$1,462,500	$234,000	EPS005	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
14	CC	78744930	COGOLLO EDUAR MIGUEL	231001	20	$949,000	$151,900	CCFC55	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
15	CC	1067899863	CONTRERAS FERIA LUIS EDUARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
16	CC	1071349787	CORDERO BLANQUICET FARID EDUARDO	230301	16	$759,200	$121,500	MIN002	16	$759,200	$30,400	CCF16	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
17	CC	1067953266	CORONADO JIMENEZ CARLOS ANDRES	230301	24	$1,138,800	$182,300	ESSC07	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
18	CC	8329553	DE LA ROSA FERNANDEZ HENRY MANUEL	230301	4	$189,800	$30,400	EPS041	4	$189,800	$7,600	CCF16	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
19	CC	1067959809	DIAZ MENDOZA ALVARO RAFAEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
20	CC	1065378012	DONADO GARCIA MERLY DOMINGA	230301	30	$1,500,000	$240,000	ESSC07	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
21	CC	15679759	DURAN ROMERO JESUS DAVID	25-14	30	$1,462,500	$234,000	EPS010	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
22	CC	1067852046	ESTRADA PAEZ JORGE LUIS	230201	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
23	CC	1067958570	FLOREZ PADILLA WILMER RAFAEL	230301	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
24	CC	73570664	GALINDO HERNANDEZ JOSE MIGUEL	230201	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF16	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
25	CC	1003590016	GALLEGO PEREZ MARCO ANTONIO	230301	12	$569,400	$91,200	ESSC07	12	$569,400	$22,800	CCF16	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
26	CC	1067926391	GALLO PORTACIO CARLOS ALBERTO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
27	CC	1192764906	GOMEZ HERNANDEZ ARNALDO ANTONIO	230301	7	$332,150	$53,200	EPS048	7	$332,150	$13,300	CCF16	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
28	CC	10934499	GONZALEZ TORRES ARNULFO MANUEL	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
29	CC	1062430111	GONZALEZ GUERRA JOSE DAVID	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS048	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
30	CC	1063135975	GONZALEZ RAMOS SEBASTIAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
31	CC	78750757	GUERRA VELASQUEZ GERARDO GABRIEL	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
32	CC	10967565	GUZMAN AGAMEZ MARCO ANTONIO	230201	24	$1,138,800	$182,300	CCFC55	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
33	CC	1003006100	HERNANDEZ BARRERA CARLOS ALFREDO	230301	15	$711,750	$113,900	ESSC24	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
34	CC	78701536	HERNANDEZ ESPITIA JOSE GREGORIO	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
35	CC	1067961257	HERRERA YANEZ LUIS DANIEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
36	CC	1067874093	HOYOS GARCIA ADIELA TERESA	230201	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF16	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
37	CC	10772706	HOYOS MIRANDA HENRY MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
38	CC	10932064	HOYOS FERNANDEZ JOSE FRANCISCO	25-14	14	$664,300	$106,300	EPS041	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
39	CC	11304951	INFANTE ROA DANIEL RODRIGO		0	$0	$0	EPS048	30	$1,445,600	$57,900	CCF16	30	$1,445,600	$57,900	14-11	30	$1,445,600	$100,700	30	$0	$0
40	CC	1007822312	LEGARDA MERCADO VICTOR MANUEL	230301	24	$1,138,800	$182,300	ESSC07	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
41	CC	2719709	LEON ARIZAL EVANGELISTA JOSE	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
42	CC	78078333	LOPEZ VARGAS LUIS ALBERTO	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
43	CC	15703840	MADERA NEGRETE RICHAR DEL CRISTO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
44	CC	1073976765	MARTINEZ MENDOZA ALFONSO MIGUEL	230301	17	$806,650	$129,100	EPS041	17	$806,650	$32,300	CCF16	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
45	CC	1065014568	MARTINEZ DORIA JORGE CARLOS	230201	7	$332,150	$53,200	ESSC07	7	$332,150	$13,300	CCF16	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
46	CC	1015397336	MARTINEZ AVILA JOSE CARLOS	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
47	CC	1067953116	MARTINEZ SALCEDO OSMAR DARIO	230301	15	$711,750	$113,900	ESSC07	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
48	CC	10897640	MARTINEZ BRAVO UBALDO FRANCISCO		0	$0	$0	EPS005	14	$664,300	$26,600	CCF16	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
49	CC	1007781081	MARTINEZ MORELO YISHAR ENRIQUE	230301	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
50	CC	1068420197	MENDEZ CORDERO DAIRO LUIS	230301	10	$474,500	$76,000	ESSC07	10	$474,500	$19,000	CCF16	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
51	CC	1137974269	MESTRA ACOSTA OVER DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
52	CC	70529955	MEZA HOYOS JORGE IVAN	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF16	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
53	CC	1068814577	MOGUEA ROSARIO GLEN DEIVIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
54	CC	11000175	MONTIEL GONZALEZ JOSE NICANOR	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
55	CC	1067869373	MORALES PADILLA JORGE ELIECER	230201	30	$1,462,500	$234,000	EPS002	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
56	CC	1003000998	MORELO VILORIA EBERTO CARLOS	230201	7	$332,150	$53,200	ESSC07	7	$332,150	$13,300	CCF16	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
57	CC	6874550	MUÑOZ VILLADIEGO BENETRIDE DE JESUS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
58	CC	1065372758	NAVAJA MARTINEZ CRISTIAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
59	CC	1073990211	NAVARRO MORELO SERGIO LUIS	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
60	CC	1063649498	ORTEGA LUNA GERSON	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
61	CC	78033426	OSPINA MARTINEZ EINAR YESID	25-14	15	$711,750	$113,900	ESSC24	15	$711,750	$28,500	CCF16	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
62	CC	10933564	PACHECO BORJA VICTOR MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
63	CC	78695151	PASTRANA MARTINEZ HERNAN FRANCISCO	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS041	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
64	CC	6878868	PEÑA LALINDE PIO QUINTO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
65	CC	1003002947	PEREZ YANEZ LUIS JAVIER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
66	CC	78714855	RAMOS JIMENEZ JOSE RAMON	231001	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
67	CC	6888449	RIOS BEGAMBRE ANTONIO DE JESUS	230301	3	$142,350	$22,800	ESSC07	3	$142,350	$5,700	CCF16	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
68	CC	54259957	RIVAS TAPIAS LUDOY ELENA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
69	CC	78749389	ROJAS GOMEZ CESAR AMAURY	25-14	11	$521,950	$83,600	ESSC07	11	$521,950	$20,900	CCF16	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
70	CC	1067872301	RUA ARRIETA JORGE ASIS	230301	21	$996,450	$159,500	EPS048	21	$996,450	$39,900	CCF16	21	$996,450	$39,900	14-11	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
71	CC	1067874360	RUIZ TORO ANGEL DE JESUS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
72	CC	1067861883	RUIZ MORA SAMIR JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC33	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
73	CC	1033369969	SALEME GUZMAN JENNITH JACIBE	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
74	CC	10934340	SANCHEZ BOHORQUEZ JOSE ALBERTO	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
75	CC	1064986653	SANCHEZ MORALES JULIO CESAR	231001	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
76	CC	1041256291	SANCHEZ SOTELO LUBIAN ALBERTO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
77	CC	1067851094	SANCHEZ MORALES LUIS FERNANDO	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
78	CC	1193459697	SANCHEZ MORALES PEDRO MANUEL	230301	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
79	CC	78038367	SANCHEZ CORCHO PEDRO ANTONIO	230301	24	$1,138,800	$182,300	ESSC07	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
80	CC	1100551420	SANTIZ RIOS CARLOS ALBERTO	25-14	9	$427,050	$68,400	EPS041	9	$427,050	$17,100	CCF16	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
81	CC	1062431415	SOTO GAVIRIA OMAR YESID	230301	24	$1,138,800	$182,300	ESSC24	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
82	CC	1065376198	SUAREZ CARRASCAL AYLIN KARINA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
83	CC	1064309119	SUAREZ SALGADO JUAN CAMILO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
84	CC	1064309132	SUAREZ ESPITIA RAFAEL AUGUSTO	230301	24	$1,138,800	$182,300	ESSC07	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
85	CC	1003430959	TAPIA COGOLLO CESAR SEGUNDO	230201	8	$379,600	$60,800	CCFC55	8	$379,600	$15,200	CCF16	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
86	CC	15670444	TORRES RIOS WILLIAM JAIRO	25-14	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
87	CC	1067941083	USTA JARAMILLO IVAN ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
88	CC	10784903	VEGA OSORIO WILLIAM	25-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
89	CC	25776940	VERTEL BERROCAL ANA MARCELA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
90	CC	78703922	VIDAL SOLANO EDUIN ENRIQUE	230301	5	$237,250	$38,000	ESSC07	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
Total			**Afiliados(90)**			$88,806,150	$14,212,900			$92,339,550	$3,696,800			$92,339,550	$3,696,800			$92,339,550	$6,431,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1920663036	9494613780	E	2025/11/11	2025/11/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$28,037,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				87	$14,212,900	$0	$0	$14,212,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	$2,704,400	$0	$0	$2,704,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$1,274,500	$0	$0	$1,274,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	$7,568,000	$0	$0	$7,568,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$2,666,000	$0	$0	$2,666,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				90	$6,431,000	$0	$0	$6,431,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	90	$6,431,000	$0	$0	$6,431,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				90	$3,696,800	$0	$0	$3,696,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	90	$3,696,800	$0	$0	$3,696,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				90	$3,696,800	$0	$0	$3,696,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$98,800	$0	$0	$98,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$159,600	$0	$0	$159,600
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	$112,100	$0	$0	$112,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	$227,000	$0	$0	$227,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$58,500	$0	$0	$58,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$30,400	$0	$0	$30,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	27	$1,074,800	$0	$0	$1,074,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$469,200	$0	$0	$469,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	$357,200	$0	$0	$357,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	$898,700	$0	$0	$898,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$210,500	$0	$0	$210,500
TOTAL				90	$28,037,500	$0	$0	$28,037,500

2. Pre acta

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE PRE ENTREGA PARA PAGO PARCIAL		
CODIGO	VERSIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-038	1		23/01/2024

ACTA DE PRE ENTREGA PARA PAGO PARCIAL

CONTRATO No.	LP-SIM 035-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO SINU URBANO
OBJETO	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
INTERVENTORIA No.	CMA-SIM-037-2024
APOYO A LA SUPERVISION	VICTOR MANUEL HERNANDEZ
FECHA FINAL	28 DE DICIEMBRE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	28 DE OCTUBRE DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICION ORIGINAL	CONDICION ACTUALIZADAS BALANCE No.1	CANTIDAD PROYECTADA PARA COBRO ACTA No.4	CANTIDAD VERIFICADA
3. PAVIMENTO Y BORDILLOS						
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	4800.66	3539.33	532.80	532.80
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	30.00	30.00	18.00	18.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	2948.74	2948.74	625.68	625.68
4. SEÑALIZACION						
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	69.00	69.00	14.00	14.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	6.00	6.00	4.00	4.00
4.03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M2	662.45	662.45	454.15	454.15
5. ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS						
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	5031.74	5031.74	749.00	749.00
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	5031.74	5031.74	746.11	746.11
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	95.00	95.00	19.00	19.00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	87.00	87.00	23.00	23.00
5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	364.00	364.00	168.00	168.00
NITEMS NO PREVISTOS						
NP1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (42 Kg/cm2)	M3		767.02	466.44	466.44
NP2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	M3		457.98	446.60	446.60

Nota 1: Las cantidades verificadas en campo y que se indican en la presente acta, corresponden única y exclusivamente a las que, por su misma naturaleza visiblemente son susceptibles de medición.
Nota 2: El porcentaje de ejecución del Contrato referenciado a fecha de la presente visita, corresponde al **62.09%.**

CONSORCIO SINU URBANO
Rep. Legal: ANA MARCELA VERTEL BERROCAL
Contratista

CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
Rep. Legal: MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Interventoria

VICTOR MANUEL HERNANDEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SIM

Revisó: MAURICIO FERNANDO PRIETO, DIRECTOR INTERVENTORÍA
Revisó: HUGO MARTINEZ - CONTRATISTA SIM

3. Acta parcial de cumplimiento

ACTA PARCIAL DE OBRA No.4

CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO SINÚ URBANO
OBJETO DEL CONTRATO	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($15.436.620.455,00)
No. CDP	25000316 DEL 16 DE ENERO DE 2025 25000189 DEL 14 DE ENERO DE 2025
No. CRP	25000730 DEL 26 DE FEBRERO 2025 25000731 DEL 26 DE FEBRERO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	28 FEBRERO DE 2025
FECHA FINAL INICIAL	28 DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
PERIODO A COBRAR	DEL 28 DE AGOSTO HASTA 27 SEPTIEMBRE DE 2025 DEL 28 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2025.

En la ciudad de Montería a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año 2025 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO SINÚ URBANO,** Representado legalmente por **ANA MARCELA VERTEL BERROCAL** identificado con cédula de ciudadanía 25.776.940 expedida en Montería, el interventor **CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA**, representado legalmente por **MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía 1.049.625.075 expedida en Tunja, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **VICTOR MANUEL HERNANDEZ**, con el propósito de dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

1. El avance de la obra es del **20.94%** en el periodo a cobrar, lo cual equivale a un valor de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($ 3.232.855.511,00), para un avance acumulado de **62.09%.**

2. Teniendo en cuenta que, a la fecha de la presente acta, el contratista de obra no ha justificado los imprevistos en la presente acta cobrada, y que el valor de estos equivale a la suma total de VEINTICUATRO MILLONES TRECIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 24.307.184,00), resulta pertinente indicar que los mismos solo serán pagados, al presentarse las justificaciones correspondientes, por tal motivo el valor a pagar en la presente acta N°4 descontando el valor del imprevisto es la suma TRES MIL DOCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($3.208.548.327,00).

Que de conformidad con los documentos precontractuales y contractuales la forma de pago del contrato de la referencia es:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. el 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Los pagos parciales relacionados son los siguientes:

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	FECHA Y No. EGRESOS
Valor del contrato Inicial	$15.436.620.455,00		
Valor Adicional	$0		
Valor total del contrato	$15.436.620.455,00		
Acta parcial 1		$ 1.658.408.478,00 (descontando 1% de imprevistos)	13/06/2025 – N° 25000722
Acta parcial 2		$ 1.820.297.974,00 (descontando 1% de imprevistos)	03/09/2025 – N° 25001269
Acta parcial 3		$ 2.825.725.974,00 (descontando 1% de imprevistos)	30/10/2025 – N° 25006650
Acta parcial 4		$ 3.208.548.327,00 (descontando 1% de imprevistos)	Trámite
Saldo por ejecutar		**$ 5.923.639.702,00**	
BALANCE	**$15.436.620.455,00**	**$15.436.620.455,00**	

3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

4. El contratista de obra declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

5. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista de obra para el personal relacionado en la propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de condiciones, como se relaciona a continuación:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-		
CÓDIGO		**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003		**03**	**13/01/2025**

MES DE AGOSTO DE 2025

ID	Nombre	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	JORGE IVAN MEZA HOYOS	70529955 de Arboletes	DIRECTOR DE OBRA	100%	$3,000,000	9491833151
2	SERGIO NAVARRO MORELO	1073990211 de Tierralta	RESIDENTE DE OBRA	100%	$2,500,000	9491833151
3	JESUS DURAN ROMERO	15679759 de planeta rica	ESTRUCTURAL	30%	$1,462,500	9491833151
4	HOLBIN BEDOYA VEGA	11151559 de San Carlos	ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE	30%	$1,462,500	9491833151
5	ERWIN CELEDON JARAMILLO	77189860 de Valledupar	HIDRAULICO	30%	$1,462,500	9491833151
6	JORGE MORALES PADILLA	1067869373 de Montería	GEOTECNISTA	30%	$1,462,500	9491833151
7	DANIEL INFANTE ROA	11304951 de Girardot Cundinamarca	FORESTAL	40%	$1,445,600	9491833151
8	LUDDY RIVAS TAPIAS	54259957 de Quibdó	TRABAJADORA SOCIAL	100%	$1,500,000	9491833151
9	MERLY DONADO GARCIA	1065378012 de Momil	SG-SST	100%	$1,500,000	9491833151
	PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
1	DARIO CASTILLO REYES	6881250 de Montería	MAESTRO GENERAL	100%	$1,423,500	9491833151
2	LUIS BULA CASTILLO	78699137 de Montería	CADENERO 1	100%	$1,423,500	9491833151
3	BENETRIDE MUÑOZ VILLADIEGO	6874550 de Montería	CADENERO 2	100%	$ 1.423.500	9491833151
4	JULIO CESAR SANCHEZ	1067851094 de Montería	TOPOGRAFO	100%	$2.000.000	9491833151
5	LUIS PEREZ YANEZ	1003002947 de Montería	ALMACENISTA	100%	$1,423,500	9491833151
6	ANA MARCELA VERTEL B	25776940 de Montería	CONDUCTOR	100%	$1,423,500	9491833151

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	03	13/01/2025

MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

ID	Nombre	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	JORGE IVAN MEZA HOYOS	70529955 de Arboletes	DIRECTOR DE OBRA	100%	$3,000,000	9494535206
2	SERGIO NAVARRO MORELO	1073990211 de Tierralta	RESIDENTE DE OBRA	100%	$2,500,000	9494535206
3	JESUS DURAN ROMERO	15679759 de planeta rica	ESTRUCTURAL	30%	$1,462,500	9494535206
4	HOLBIN BEDOYA VEGA	11151559 de San Carlos	ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE	30%	$1,462,500	9494535206
5	ERWIN CELEDON JARAMILLO	77189860 de Valledupar	HIDRAULICO	30%	$1,462,500	9494535206
6	JORGE MORALES PADILLA	1067869373 de Montería	GEOTECNISTA	30%	$1,462,500	9494535206
7	DANIEL INFANTE ROA	11304951 de Girardot Cundinamarca	FORESTAL	40%	$1,445,600	9494535206
8	LUDDY RIVAS TAPIAS	54259957 de Quibdó	TRABAJADORA SOCIAL	100%	$1,500,000	9494535206
9	MERLY DONADO GARCIA	1065378012 de Momil	SG-SST	100%	$1,500,000	9494535206
	PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
1	DARIO CASTILLO REYES	6881250 de Montería	MAESTRO GENERAL	100%	$1,423,500	9494535206
2	LUIS BULA CASTILLO	78699137 de Montería	CADENERO 1	100%	$1,423,500	9494535206
3	BENETRIDE MUÑOZ VILLADIEGO	6874550 de Montería	CADENERO 2	100%	$ 1.423.500	9494535206
4	JULIO CESAR SANCHEZ	1067851094 de Montería	TOPOGRAFO	100%	$2.000.000	9494535206
5	LUIS PEREZ YANEZ	1003002947 de Montería	ALMACENISTA	100%	$1,423,500	9494535206
6	ANA MARCELA VERTEL B	25776940 de Montería	CONDUCTOR	100%	$1,423,500	9494535206

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

MES DE OCTUBRE DE 2025

ID	Nombre	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	JORGE IVAN MEZA HOYOS	70529955 de Arboletes	DIRECTOR DE OBRA	100%	$3,000,000	9494613780
2	SERGIO NAVARRO MORELO	1073990211 de Tierralta	RESIDENTE DE OBRA	100%	$2,500,000	9494613780
3	JESUS DURAN ROMERO	15679759 de planeta rica	ESTRUCTURAL	30%	$1,462,500	9494613780
4	HOLBIN BEDOYA VEGA	11151559 de San Carlos	ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE	30%	$1,462,500	9494613780
5	ERWIN CELEDON JARAMILLO	77189860 de Valledupar	HIDRAULICO	30%	$1,462,500	9494613780
6	JORGE MORALES PADILLA	1067869373 de Montería	GEOTECNISTA	30%	$1,462,500	9494613780
7	DANIEL INFANTE ROA	11304951 de Girardot Cundinamarca	FORESTAL	40%	$1,445,600	9494613780
8	LUDDY RIVAS TAPIAS	54259957 de Quibdó	TRABAJADORA SOCIAL	100%	$1,500,000	9494613780
9	MERLY DONADO GARCIA	1065378012 de Momil	SG-SST	100%	$1,500,000	9494613780
	PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
1	DARIO CASTILLO REYES	6881250 de Montería	MAESTRO GENERAL	100%	$1,423,500	9494613780
2	LUIS BULA CASTILLO	78699137 de Montería	CADENERO 1	100%	$1,423,500	9494613780
3	BENETRIDE MUÑOZ VILLADIEGO	6874550 de Montería	CADENERO 2	100%	$ 1.423.500	9494613780
4	JULIO CESAR SANCHEZ	1067851094 de Montería	TOPOGRAFO	100%	$2.000.000	9494613780
5	LUIS PEREZ YANEZ	1003002947 de Montería	ALMACENISTA	100%	$1,423,500	9494613780
6	ANA MARCELA VERTEL B	25776940 de Montería	CONDUCTOR	100%	$1,423,500	9494613780

6. Que el interventor certifica que el contratista de obra aportó a la entidad municipal las garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

No. Póliza	Acto	Fecha del amparo inicial	No. Del anexo	Fecha del amparo final
25121 endoso 1	Contrato	06–02–2025	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO	31–12–2025
86361 endoso 3	Contrato	06–02–2025	CUMPLIMIENTO	07-12-2030
25121 endoso 2	Inicio	28–02–2025	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO	31–12–2025
86361 endoso 5	Inicio	28-02-2025	CUMPLIMIENTO	28-12-2030

7. Que en el periodo a cobrar el interventor certifica que el contratista de obra realizó y presentó los ensayos realizados en obra (si aplica), de acuerdo con los parámetros establecidos y normativa vigente y que a continuación se relacionan:

DESCRIPCIÓN ENSAYO	NORMA	CUMPLIMIENTO
TOMA DE DENSIDADES EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO Y ARENA, MATERIAL SELECCIONADO Y TERRAPLEN	I.N.V. E-161-13	SI
TOMA DE DENSIDADES EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO Y ARENA SUBBASE	I.N.V. E-161-13	SI
RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO METODO DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ	I.N.V. E-414-13, NTC-2871	SI

8. La Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato de interventoría manifiesta que, dado que los contratistas de obra e interventoría avalan los numerales relacionados anteriormente, y es procedente suscribir la presente acta parcial.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	**03**	**13/01/2025**

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

CONSORCIO SINÚ URBANO
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL

CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA
MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ

VICTOR MANUEL HERNANDEZ
Apoyo a la Supervisión

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Revisó: Khalil Petro - Equipo de cuentas - Contratista SIM
Kelly Arteaga - Equipo de cuentas - Contratista SIM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

4. Acta numérica

	CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO LP-SIM-035-2024	FECHA DE INICIACION:	VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO 2025	ACTA PARCIAL N°4
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES	$ 3,232,855,511.00
					PERIODO
			FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE 2025	DEL 28/Agosto/2025 HASTA 27/septiembre/2025
			VALOR CONTRACTUAL	$ 15,436,620,455.00	DEL 28/septiembre/2025 HASTA 27/octubre/2025
			VALOR PRESENTE	$ 15,436,620,455.00	
			ACTA PARCIAL DE OBRA N°1	$ 1,670,972,179.00	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	$ 1,834,088,110.00	
	REPRESENTANTE:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	ACTA PARCIAL DE OBRA N°3	$ 2,847,132,989.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			ACTA PARCIAL DE OBRA N°4	$ 3,232,855,511.00	28/10/2025
			VALOR ACUMULADO	$ 9,585,048,789.00	
VERSIÓN: 02	CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA	20.94%
ACTA PARCIAL DE OBRA N°4		REPRESENTANTE:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ	% AVANCE FISICO ACUMULADO	62.09%

CONDICIONES ORIGINALES					ACUMULADO ACTAS 1-2-3		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 1 (30/08/2024)		PRESENTE ACTA No.4		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VUNIT	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1,00	ACTIVIDADES PRELIMINARES											
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	467.28	$ 13,655.00	467.28	$ 6,380,708.00	467.28	$ 6,380,708.00		$ -	467.28	$ 6,380,708.00
1,02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	56.00	$ 192,636.00	18.30	$ 3,528,514.00	56.00	$ 10,798,816.00	34.97	$ 6,743,066.00	53.27	$ 10,271,600.00
1,03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	M	1,495.84	$ 35,387.00	556.80	$ 19,703,481.00	1495.84	$ 52,933,290.00	206.00	$ 7,289,722.00	762.80	$ 26,993,203.00
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	571.39	$ 30,783.00	507.56	$ 15,624,835.00	571.39	$ 17,589,098.00	62.75	$ 1,931,633.00	570.33	$ 17,556,468.00
1,05	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M2	978.00	$ 33,411.00	0.00	$ -	978.00	$ 32,675,958.00		$ -	0.00	$ -
1,06	EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	11,265.60	$ 12,641.00	11240.22	$ 142,087,599.00	11265.60	$ 142,408,450.00		$ -	11240.22	$ 142,087,599.00
1,07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	1,800.25	$ 25,281.00	177.27	$ 4,481,563.00	1800.25	$ 45,512,120.00		$ -	177.27	$ 4,481,563.00
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	18,257.01	$ 29,316.00	14271.87	$ 418,394,006.00	18257.01	$ 535,222,505.00		$ -	14271.87	$ 418,394,006.00
1,09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE	UND	36.00	$ 430,318.00	21.00	$ 9,036,678.00	36.00	$ 15,491,448.00	15.00	$ 6,454,770.00	36.00	$ 15,491,448.00
1,10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	103.00	$ 609,152.00	42.00	$ 25,206,384.00	103.00	$ 61,815,656.00	27.00	$ 16,204,104.00	69.00	$ 41,410,488.00
1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	8.00	$ 914,686.00	4.00	$ 3,658,744.00	8.00	$ 7,317,488.00	4.00	$ 3,658,744.00	8.00	$ 7,317,488.00
1,12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y	UND	1,470.00	$ 122,036.00	0.00	$ -	1470.00	$ 179,392,920.00		$ -	0.00	$ -
2,00	SUBRASANTE Y SUBBASE							$ -			-	
2,01	TERRAPLENES	M3	2,664.63	$ 91,980.00	1373.10	$ 126,297,738.00	2664.63	$ 245,092,667.00		$ -	1373.10	$ 126,297,738.00
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	1,800.25	$ 220,741.00	728.62	$ 160,836,307.00	1800.25	$ 397,388,985.00	15.94	$ 3,518,612.00	744.56	$ 164,354,919.00
2,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	10,235.68	$ 107,167.00	5846.38	$ 626,538,790.00	10235.68	$ 1,096,927,119.00	1628.73	$ 174,546,174.00	7475.11	$ 801,084,964.00
2,04	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	5,117.84	$ 316,542.00	2438.40	$ 771,855,000.00	5117.84	$ 1,620,011,309.00	942.04	$ 298,196,128.00	3380.44	$ 1,070,051,129.00
2,05	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE YCAPAS GRANULARES	M2	27,829.53	$ 14,150.00	14644.84	$ 207,224,472.00	27829.53	$ 393,787,859.00	3859.73	$ 54,615,238.00	18504.57	$ 261,839,710.00
3,00	PAVIMENTO Y BORDILLOS										-	
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	4,800.66	$ 1,452,795.00	1999.28	$ 2,904,537,072.00	3539.33	$ 5,141,921,135.00	532.80	$ 774,050,316.00	2532.08	$ 3,678,587,388.00
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	30.00	$ 464,088.00	0.00	$ -	30.00	$ 13,922,640.00	18.00	$ 8,353,584.00	18.00	$ 8,353,584.00
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	2,948.74	$ 126,084.00	2125.29	$ 267,965,191.00	2948.74	$ 371,788,934.00	625.68	$ 78,888,237.00	2750.97	$ 346,853,428.00
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	23,884.56	$ 12,203.00	15121.94	$ 184,533,009.00	23884.56	$ 291,463,286.00	8739.63	$ 106,649,656.00	23861.56	$ 291,182,656.00
4,00	SEÑALIZACION										-	
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	69.00	$ 579,313.00	13.00	$ 7,492,069.00	69.00	$ 39,765,597.00	14.00	$ 8,068,362.00	27.00	$ 15,560,431.00
4,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	6.00	$ 840,283.00	2.00	$ 1,680,566.00	6.00	$ 5,041,698.00	4.00	$ 3,361,132.00	6.00	$ 5,041,698.00

CONDICIONES ORIGINALES						ACUMULADO ACTAS 1-2-3		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 1 (30/08/2024)		PRESENTE ACTA No.4		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT		CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M2	662,45	$ 93,128,00		0.00	$ -	662,45	$ 61,692,644.00	454.15	$ 42,294,407.00	454.15	$ 42,294,407.00
4,04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS	M	11,478,71	$ 8,531.00		0.00	$ -	11478.71	$ 97,924,875.00	3292.93	$ 28,091,961.00	3292.93	$ 28,091,961.00
4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO	M	224,50	$ 433,751,00		0.00	$ -	224.50	$ 97,377,100.00		$ -	0.00	$ -
5,00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS												
5,01	S/I TABLETA GUIA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	5,031.74	$ 56,122.00		1407.39	$ 78,985,598.00	5031.74	$ 282,391,312.00	749.00	$ 42,035,378.00	2156.39	$ 121,020,976.00
5,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	5,031.74	$ 48,728.00		1410.28	$ 70,130,454.00	5031.74	$ 250,218,367.00	746.11	$ 37,102,558.00	2156.39	$ 107,233,012.00
5,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3,000 PSI), E=0.08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	4,480.27	$ 139,718.00		987.20	$ 137,929,051.00	4480.27	$ 625,974,364.00	521.98	$ 72,930,127.00	1509.18	$ 210,859,178.00
5,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	95.00	$ 1,130,234.00		36.00	$ 40,688,424.00	95.00	$ 107,372,230.00	19.00	$ 21,474,446.00	55.00	$ 62,162,870.00
5,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0,15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	87.00	$ 1,563,444.00		49.00	$ 76,608,756.00	87.00	$ 136,019,628.00	23.00	$ 35,959,212.00	72.00	$ 112,567,968.00
5,06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	364.00	$ 267,827.00		8.00	$ 2,142,616.00	364.00	$ 97,489,028.00	168.00	$ 44,994,936.00	176.00	$ 47,137,552.00
6,00	OTRAS ACTIVIDADES												
6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	265.50	$ 79,716.00		241.10	$ 19,219,528.00	265.50	$ 21,164,598.00	9.00	$ 717,444.00	250.10	$ 19,936,972.00
6,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	177.00	$ 103,364.00		177.00	$ 18,295,428.00	177.00	$ 18,295,428.00		$ -	177.00	$ 18,295,428.00
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	177.00	$ 376,902.00		3.00	$ 1,130,706.00	177.00	$ 66,711,654.00	1.00	$ 376,902.00	4.00	$ 1,507,608.00
7,00	BOX CULVERT												
7,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	467.23	$ 26,976.00		0.00	$ -	467.23	$ 12,603,996.00		$ -	0.00	$ -
7,02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	29.64	$ 25,281.00		0.00	$ -	29.64	$ 749,329.00		$ -	0.00	$ -
7,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	645.93	$ 29,316.00		0.00	$ -	645.93	$ 18,936,084.00		$ -	0.00	$ -
7,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	186.63	$ 14,150.00		0.00	$ -	186.63	$ 2,640,815.00		$ -	0.00	$ -
7,05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	633.23	$ 107,167.00		0.00	$ -	633.23	$ 67,861,358.00		$ -	0.00	$ -
7,06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	29.64	$ 220,741.00		0.00	$ -	29.64	$ 6,542,763.00		$ -	0.00	$ -
7,07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	5.93	$ 756,380.00		0.00	$ -	5.93	$ 4,485,333.00		$ -	0.00	$ -
7,08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA	M3	76.14	$ 1,915,967.00		0.00	$ -	76.14	$ 145,881,727.00		$ -	0.00	$ -
7,09	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	6,209.52	$ 12,203.00		0.00	$ -	6209.52	$ 75,774,773.00		$ -	0.00	$ -
7,10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M	11.00	$ 1,640,743.00		0.00	$ -	11.00	$ 18,048,173.00		$ -	0.00	$ -
8,00	REDES ELECTRICAS												
8,1	RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.					0.00	$ -		$ -		$ -	0.00	
8,1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA	M	2,770.00	$ 5,534.00		0.00	$ -	2770.00	$ 15,329,180.00		$ -	0.00	$ -
8,1,02	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	3.00	$ 4,777,569.00		0.00	$ -	3.00	$ 14,332,707.00		$ -	0.00	$ -
8,1,03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	3.00	$ 942,663.00		0.00	$ -	3.00	$ 2,827,989.00		$ -	0.00	$ -
8,1,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	2.00	$ 3,292,966.00		0.00	$ -	2.00	$ 6,585,932.00		$ -	0.00	$ -
8,1,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	1.00	$ 4,936,581.00		0.00	$ -	1.00	$ 4,936,581.00		$ -	0.00	$ -

CONDICIONES ORIGINALES					ACUMULADO ACTAS 1-2-3		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 1 (30/08/2024)		PRESENTE ACTA No.4		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
8,1,06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	300.00	$ 89,177.00	0.00	$ -	300.00	$ 26,753,100.00		$ -	0.00	$ -
8,1,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND	1.00	$ 4,406,527.00	0.00	$ -	1.00	$ 4,406,527.00		$ -	0.00	$ -
8,1,08	INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13,2 KV.	UND	1.00	$ 2,138,049.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,138,049.00		$ -	0.00	$ -
8,1,09	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13,2 KV.	UND	1.00	$ 4,644,312.00	0.00	$ -	1.00	$ 4,644,312.00		$ -	0.00	$ -
8,1,10	INSTALACION CON TENSION A 13,2 KV. DE POSTE EN	UND	1.00	$ 8,230,927.00	0.00	$ -	1.00	$ 8,230,927.00		$ -	0.00	$ -
8,2	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.									$ -	-	$ -
8,2,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M	2,770.00	$ 2,942.00	0.00	$ -	2770.00	$ 8,149,340.00		$ -	0.00	$ -
8,2,02	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	30.00	$ 1,005,676.00	0.00	$ -	30.00	$ 30,170,280.00		$ -	0.00	$ -
8,2,03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	30.00	$ 541,191.00	0.00	$ -	30.00	$ 16,235,730.00		$ -	0.00	$ -
8,2,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	20.00	$ 753,465.00	0.00	$ -	20.00	$ 15,069,300.00		$ -	0.00	$ -
8,2,05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2	M	500.00	$ 80,556.00	0.00	$ -	500.00	$ 40,278,000.00		$ -	0.00	$ -
8,2,06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No.	M	1,150.00	$ 86,754.00	0.00	$ -	1150.00	$ 99,767,100.00		$ -	0.00	$ -
8,2,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	4.00	$ 1,614,099.00	0.00	$ -	4.00	$ 6,456,396.00		$ -	0.00	$ -
8,2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	3.00	$ 2,218,106.00	0.00	$ -	3.00	$ 6,654,318.00		$ -	0.00	$ -
8,2,09	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	26.00	$ 1,071,335.00	0.00	$ -	26.00	$ 27,854,710.00		$ -	0.00	$ -
8,2,10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	M	2,260.00	$ 20,322.00	0.00	$ -	2260.00	$ 45,927,720.00		$ -	0.00	$ -
8,3	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13,200/240/120) VOL.									$ -	-	$ -
8,3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	1.00	$ 9,013,834.00	0.00	$ -	1.00	$ 9,013,834.00		$ -	0.00	$ -
8,4	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE							$ -		$ -	-	$ -
8,4,01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	800.00	$ 62,932.00	0.00	$ -	800.00	$ 50,345,600.00		$ -	0.00	$ -
8,4,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	7.00	$ 975,339.00	0.00	$ -	7.00	$ 6,827,373.00		$ -	0.00	$ -
8,4,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	15.00	$ 768,436.00	0.00	$ -	15.00	$ 11,526,540.00		$ -	0.00	$ -
NP	ITEMS NO PREVISTOS											
NP1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (42 Kg/cm2)	M3		$ 1,536,575.00	0.00	$ -	767.02	$ 1,178,583,757.00	466.44	$ 716,726,189.00	466.44	$ 716,726,189.00
NP2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	M3		$ 1,427,726.00	0.00	$ -	457.98	$ 653,869,953.00	446.60	$ 637,622,432.00	446.60	$ 637,622,432.00
					0.00	$ -						
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					$ 6,352,193,278.00		$ 15,237,720,512.00		$ 3,232,855,511.00		$ 9,585,048,789.00
	PGIO							$ 147,341,365.00				
	TRAMITE ANTE ENTIDAD AMBIENTAL					$ -		$ 45,058,578.00		$ -		
	TRAMITES y LEGALIZACIONES (AFINIA)					$ -		$ 6,500,000.00		$ -		
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					$ 6,352,193,278.00		$ 15,436,620,455.00		$ 3,232,855,511.00		$ 9,585,048,789.00
	VALOR TOTAL OBRA					$ 6,352,193,278.00		$ 15,436,620,455.00		$ 3,232,855,511.00		$ 9,585,048,789.00
	ANTICIPO											

CONDICIONES ORIGINALES					ACUMULADO ACTAS 1-2-3		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 1 (30/08/2024)		PRESENTE ACTA No.4		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
BALANCE PRESUPUESTAL												
	V/R INICIAL CONTRATO: $			15,436,620,455.00								
	V/R ADICIONES: $			-								
	V/R ACTUAL CONTRATO: $			15,436,620,455.00								

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR ACTA PARCIAL	% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL INICIAL	COSTO DE IMPREVISTO DEL CONTRATO	COSTO IMPREVISTO POR ACTA	DESCUENTO IMPREVISTO	PAGO DE IMPREVISTO JUSTIFICADO	VALOR FACTURADO	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	13/06/2025 – OP No.25000722	$1,670,972,179.00	10.82%	$ 114,569,327.00	$12,563,701.00	$12,563,701.00	$ 0.00	$ 1,658,408,478.00		$ 1,658,408,478.00
2	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2	03/09/2025 – OP No.25001269	$1,834,088,110.00	11.88%		$13,790,136.00	$13,790,136.00	$ 0.00	$ 1,820,297,974.00		$ 3,478,706,452.00
3	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3	30/10/2025 – N° 25006650	$2,847,132,989.00	18.44%		$21,407,015.00	$21,407,015.00	$ 0.00	$ 2,825,725,974.00		$ 6,304,432,426.00
4	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 4	EN TRAMITE	$3,232,855,511.00	20.94%		$24,307,184.00	$24,307,184.00	$ 0.00		$ 3,208,548,327.00	$ 9,512,980,753.00
TOTAL			**$9,585,048,789.00**	**62.09%**		**$72,068,036.00**	**$72,068,036.00**	**$0.00**	**$6,304,432,426.00**	**$3,208,548,327.00**	**$ 9,512,980,753.00**

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, el dia Veintiocho (28) de Octubre de 2025

TOTAL NETO A COBRARR: **$ 3,208,548,327.00**

SON: **TRES MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE**

REVISADO: Ing Hugo Martinez Rosales - Contratista SIM
REVISADO: Ing. Victor Hernández - Contratista SIM

CONSORCIO SINÚ URBANO
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA
MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
INTERVENTOR:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	KY6396049
FECHA FACTURA DD MM AAAA	10 02 2026 12:03:01
FECHA VENCIMIENTO	10 02 2026

MASSER SAS
NIT 900491889-0

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 000200 2024-12-27
EDS AVENIDA (MONTERIA)
RESPONSABLE DE IVA
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764083663723 DE 19 de noviembre de 2024 VIGENCIA HASTA 19 de noviembre de 2026
DESDE EL No. KY63-1 HASTA EL No. KY63-2000000

masser

CLL 41-No2-25 CENTRO
Tel: (57 5) 3669530
MONTERIA - COLOMBIA
Linea de Atención al Cliente:
01-8000-518-555

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
CONSORCIO SINU URBANO null - -	90446045 - -

No. IDENT. TRIBUTARIO	901911834	CODIGO CLIENTE		ORDEN DE COMPRA		FORMA DE PAGO	Contado
						MEDIO DE PAGO	Tarjeta Débito

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TARIFA IVA	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA	VALOR TOTAL
1	18096	GASOLINA CORRIENTE	GLL	1,912	15.680,0000	0,00		$ 0,00	30.000,00

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE MASSER S.A.S.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "MASSER S.A.S." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

Total Valor Bruto	**$ 30.000,00**
Total Base imponible	**$ 0,00**
Total Impuestos	**$ 0,00**
Total Descuentos	**$ 0,00**
Total Valor Bruto	**$ 30.000,00**

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA MIL PESOS CERO CENTAVOS

CUFE:
2484a6a78d381e7bab1aac08ef217190203a8fa141e7c1c7b1b4683082eeaeb6e6e163551908e57cb1a48032ef34be16

FECHA VALIDACION: 10 02 2026 12:03:16

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-

FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 03180867273 / DAVIVIENDA CTA AHORRO 5500156483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Referencia:	Valor Factura $	0	Efectivo $	Cheque $
No. KY6396049	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser

MASSER S.A.S

_ ORIGINAL - CLIENTE _

_ ORIGINAL - BANCO _

FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 03180867273 / DAVIVIENDA CTA AHORRO 5500156483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Referencia:	Valor Factura $	0	Efectivo $	Cheque $
No. KY6396049	Sin cargo hasta	Valor a pagar $	0	Codigo Banco	Cheque No.

masser

MASSER S.A.S

6. Memoria de cantidades


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4


DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINU URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-08-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA SIM-037 2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				

CAPITULO	1.ACTIVIDADES PRELIMINARES		SUBCAPITULO		
ITEM	1,02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS		UNIDAD	M3

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4



Tramo 4 - El Mora - Cra 15D entre calles 40B y 40A.



Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
			ABSCISA	LADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD		
		CANTIDADES								
	VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41.	K0+240,00	Izquierdo	2,10	1,40	0,20	1	0,59	0,59
	SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	K0+207,00	Derecho	10,55	1,20	0,2	1	1,90	1,90
	TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	K0+348,00	Izquierdo	18,00	1,20	0,2	1	3,24	3,24
	TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	K0+338,00	Transv	7,10	1,55	0,2	1	1,65	1,65
	TRAMO 3	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	K0+107,00	Izquierdo	18,00	2,77	0,2	1	9,97	9,97
	TRAMO 3	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	K0+100,00	Derecho	14,00	3,50	0,2	1	9,80	9,80
	TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".		Derecho	3,50	3,50	0,2	1	2,45	2,45
	TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".		MH	1,60		0,2	2	0,80	0,80
	TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA".	K0+101,00	Izquierdo	14,50	4,50	0,2	1	13,05	13,05
	TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA".	K0+110,00	Izquierdo	6,60	0,40	0,2	1	0,52	0,52
	TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA".	K0+060,00	MH	1,60		0,2	1	0,40	0,40
	TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA".	K0+100,00	MH	1,60		0,2	1	0,40	0,40
	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA".	K0+020,00	MH	1,60		0,2	1	0,40	0,40
	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA".	K0+090,00	MH	1,60		0,2	1	0,40	0,40
	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA".	K0+190,00	MH	1,60		0,2	1	0,40	0,40
	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA".	K0+240,00	MH	1,60		0,2	1	0,40	0,40
	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARRARA".	K0+050,00	Izquierdo	9,00	0,15	0,2	1	0,20	0,20
	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA".	K0+090,00	Izquierdo	9,00	0,20	0,2	1	0,27	0,27
	TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA".	K0+040,00	Derecho	15,00	0,20	0,2	1	0,60	0,60
	TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA".	K0+005,00	MH	1,60		0,2	1	0,40	0,40
	TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA".	K0+011,00	MH	1,60		0,2	1	0,40	0,40
	TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA".	K0+040,00	MH	1,60		0,2	1	0,40	0,40
	TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA".	K0+120,00	MH	1,60		0,2	1	0,40	0,40
	TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA".	K0+145,00	MH	1,60		0,2	1	0,40	0,40
	TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	K0+003,00	Transv	9,00	1,60	0,10	1	1,44	1,44
	TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	K0+003,00	Transv	3,00	2,60	0,25	1	1,95	1,95
	TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	K0+095,00	MH	1,60		0,2	1	0,40	0,40
		TOTAL ÍTEM								53,26

CANTIDAD CONTRACTUAL	56,00
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	18,29
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	34,97

SALDO POR COBRAR	2,74

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Tramo: Villa Fátima



Tramo 12: San jose



Tramo 4: El Mora



Tramo 3: El Mora



Tramo 2: San José



Tramo 10: Santa Barbara



Tramo 11: Santa Barbara



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.6

DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINO ORIENTE	CONTRATO No.	CONTRATO EP-SIH-035-2024	FECHA	27/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA	CONTRATO No.	CPM-049-027-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				

CAPITULO	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO	
ITEM	1,01	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS,JUNTA CON CORTADORA	UNIDAD: M


CANTIDADES DE OBRA PARCIAL No.6




Tramo 11 Carrera 16B Entre Las Calles 44A y 45



Tramo 5 - Cra 16a Entre Las Calles 40 Y 41 Altos de la floresta



TRAMO 9 - CRA 18 ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 San Jose



Barrio Sucre Calle 42 y 42A

TRAMO	DIRECCION	LADO	LOCALIZACION		DIMENSION				LONGITUD	LONG. ACUMULADO
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD		
			CANTIDADES							
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Derecho	K0+000,00		15,00			1	15,00	15,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Derecho	K0+015,00		5,00			1	5,00	5,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Derecho	K0+035,70		20,00			1	20,00	20,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Derecho	K0+057,70		21,70			1	21,70	21,70
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Carril Izq	K0+431,00		18,00			1	18,00	18,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Carril Izq	K0+360,00		10,00			1	10,00	10,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".		K0+390,00		45,00			1	45,00	45,00
TRAMO 3	CRA 16C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Derecho	K0+025,00		25,00			1	25,00	25,00
TRAMO 3	CRA 16C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Derecho	K0+050,00		25,00			1	25,00	25,00
TRAMO 3	CRA 16C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Izquierdo	K0+130,00		18,00			1	18,00	18,00
TRAMO 4	CRA 16D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Izquierdo	K0+051,00		19,00			1	19,00	19,00
TRAMO 4	CRA 16D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Derecho	K0+001,00		25,00			1	25,00	25,00
TRAMO 4	CRA 16D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Derecho	K0+026,00		20,00			1	20,00	20,00
TRAMO 4	CRA 16D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Derecho	K0+090,00		7,00			1	7,00	7,00
TRAMO 4	CRA 16D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Izquierdo	K0+026,00		6,00			1	6,00	6,00
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Izquierdo	K0+000,00		25,00			1	25,00	25,00
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Derecho	K0+031,50		31,50			1	31,50	31,50
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Izquierdo	K0+028,00		12,00			1	12,00	12,00
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Izquierdo	K0+130,00		8,40			1	8,40	8,40
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Izquierdo	K0+042,00		9,00			1	9,00	9,00
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Izquierdo	K0+059,00		9,00			1	9,00	9,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Carril Der	K0+000,00		10,10			1	10,10	10,10
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ"	Carril Izq	K0+004,00		4,00			1	4,00	4,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Carril Der	K0+094,00		19,70			1	19,70	19,70
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Carril Der	K0+118,00		9,70			1	9,70	9,70
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Carril Izq	K0+005,00		10,00			1	10,00	10,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Carril Der	K0+000,00		22,00			1	22,00	22,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Carril Der	K0+000,00		8,60			1	8,60	8,60
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+016,00		24,00			1	24,00	24,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+050,00		8,00			1	8,00	8,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+092,00		9,00			1	9,00	9,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+143,00		12,00			1	12,00	12,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+100,00		18,00			1	18,00	18,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+150,00		4,50			1	4,50	4,50
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+000,00		2,00			1	8,00	8,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+168,00		90,00			1	90,00	90,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+241,00		17,00			1	17,00	17,00
TRAMO 11	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 44A Y 45 - "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+060,00		39,00			1	39,00	39,00
TRAMO 11	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 44A Y 45 - "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+102,00		16,10			1	16,10	16,10
TRAMO 11	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 44A Y 45 - "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+140,00		12,00			1	12,00	12,00
TRAMO 11	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 44A Y 45 - "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+042,00		15,25			1	15,25	15,25
TRAMO 11	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 44A Y 45 - "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+020,00		11,60			1	11,60	11,60
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Derecho	K0+054,00		46,00			1	46,00	46,00
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ"	Derecho	K0+102,00		12,00			1	12,00	12,00
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ"	Derecho	K0+120,00		10,00			1	10,00	10,00
			TOTAL ITEM							760,30

CANTIDADES CONTRACTUALES	1.693,84
CANTIDAD COBRADAS ACTAS ANTERIORES	326,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	744,00
SALDO POR COBRAR	723,84

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

Página 1 de 2

ACTA PARCIAL No.4

Barrio Sucre



Tramo 2 - San José



Tramo 3: El Mora



Tramo 4 - El Mora



Tramo 5: Altos de la floresta



Tramo 6 - San José



Tramo 10: Santa Barbara



Tramo 11: Santa Barbara



Tramo 12 - San José



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN PIEDRAHITA OS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	FAUSTINO HERNANDO PRIETO SANCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO:	MONTERIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SIMO URBANO	CONTRATO No.	CUN INVIAS LP-SIM-036-2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:	
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	FECHA:	27/10/2025
CAPITULO	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES	SUBCAPITULO	
ITEM	1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	UNIDAD: M2


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4



Tramo 5 - Cra 18a Entre Las Calles 40 Y 41 Altos de la Floresta



Tramo10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Vía Montería - San Carlos - k0+030 Hasta K0+045 - Cantil Izquierdo



Barrio Sucre Calle 42 y 42A

TRAMO	DESCRIPCIÓN ITEM	LADO	LOCALIZACIÓN ABSCISA	LOCALIZACIÓN AREA	DIMENSIÓN LONGITUD / ALTO (m)	DIMENSIÓN ANCHO (m)	DIMENSIÓN ESPESOR (m)	DIMENSIÓN CANTIDAD	AREA (m2)	AREA ACUMULADA (m2)
			CANTIDADES							
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41.	Salida	K0+227,00		65,00	1,10			71,50	71,50
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41.	Entrada	K0+000,00		85,00	1,10			93,50	93,50
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Derecho	K0+000,00		15,00	0,20			3,00	3,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Derecho	K0+025,00		20,00	0,10			2,00	2,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Derecho	K0+015,00		0,05	5,00			0,25	0,25
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Derecho	K0+073,00		0,50	31,70			15,85	15,85
SAN FRANCISCO	CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)				6,50	1,50			9,75	9,75
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	K0+053,00			15,00	1,00			15,00	15,00
TRAMO 5	CRA 18A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Izquierdo	K0+038,00		12,00	1,00			12,00	12,00
TRAMO 5	CRA 18A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Derecho	K0+013,50		31,50	1,00			31,50	31,50
TRAMO 8	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Derecho	K0+000,00		10,10	1,00			10,10	10,10
TRAMO 8	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Izquierdo	K0+004,00		4,00	1,00			4,00	4,00
TRAMO 8	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Derecho	K0+004,30		15,70	1,00			15,70	15,70
TRAMO 8	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Derecho	K0+119,50		9,70	1,00			9,70	9,70
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+015,00		24,00	0,75			18,00	18,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+050,00		8,00	0,60			4,80	4,80
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+062,00		6,00	0,50			3,00	3,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+243,00		12,60	0,30			3,78	3,78
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+100,00		16,00	0,60			12,80	12,80
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+130,00		4,50	1,20			5,40	5,40
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+060,00		8,00	0,80			6,40	6,40
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+149,00		33,00	1,00			33,00	33,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+241,00		17,00	1,20			20,40	20,40
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+230,00		8,00	1,20			9,60	9,60
TRAMO 11	CRA 18D ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA".	Izquierdo	K0+080,00		88,00	0,02			35,28	35,28
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA".	Derecho	K0+102,80		16,10	1,00			16,10	16,10
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA".	Derecho	K0+140,00		12,00	1,00			12,00	12,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA".	Derecho	K0+042,00		15,25	1,00			15,25	15,25
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA".	Derecho	K0+020,35		11,85	0,78			9,07	9,07
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Derecho	K0+054,00		46,00	1,00			46,00	46,00
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Derecho	K0+032,00		12,00	1,00			12,00	12,00
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Derecho	K0+120,00		13,00	1,00			13,00	13,00
			TOTAL ITEM							570,33

CANTIDADES CONTRACTUALES	571,39
CANTIDAD COBRADAS ACTAS ANTERIORES	507,56
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	62,77
SALDO POR COBRAR	1,06

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

REGISTRO FOTOGRAFICO

VILLA FIRMA



SUCRE: PLaya Brigida Av 1ra entre calles 42 y 44



Tramo 4: Elmora



Tramo 5- Altos de la Floresta



Tramo 6 -CRA 16 Entre las Cra 38 Y 39 San Jose



Tramo 10: Santa Barbara



Tramo 11: Santa Barbara



Tramo 12 Cra 18C calle 38 - 39



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA MOYOR
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	6. OTRAS ACTIVIDADES		SUBCAPITULO		
ITEM	1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)		UNIDAD	UND


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4



Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41



PLAYA BRIGIDA - AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44

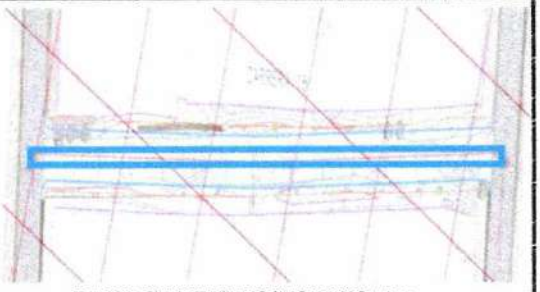

TRAMO 6 - CRA 18 ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 San Jose

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				LONGITUD (m)	LONG. TOTAL (m)
			ABSCISA	CARRIL	LONGITUD / DIAMETRO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD		
CANTIDADES										
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Lado Izq y Der	K0+003,00					2,00		2,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Derecho	K0+238,00					1,00		1,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Derecho	K0+240,00					1,00		1,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Derecho	K0+242,00					1,00		1,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Derecho	K0+245,00					1,00		1,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Derecho	K0+255,00					2,00		2,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Derecho	K0+345,00					1,00		1,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Izquierdo	K0+357,00					1,00		1,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Izquierdo	K0+359,00					1,00		1,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Izquierdo	K0+480,00					1,00		1,00
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Area Boca Calle	K0+028,00					1,00		1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo	K0+065,00					1,00		1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo	K0+038,00					1,00		1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo	K0+022,00					1,00		1,00
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Lado Izquierdo	K0+075,00					1,00		1,00
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Lado Izquierdo	K0+110,00					1,00		1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo	K0+011,00					1,00		1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo	K0+013,00					1,00		1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo	K0+015,00					1,00		1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo	K0+017,00					1,00		1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo	K0+030,00					1,00		1,00

TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+055,00					1,00		1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+057,00					1,00		1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+060,00					1,00		1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+130,00					1,00		1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+022,00					1,00		1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+012,00					1,00		1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+077,00					1,00		1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+005,00					1,00		1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+010,00					1,00		1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+030,00					1,00		1,00
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+112,00					1,00		1,00
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+115,00					1,00		1,00
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+028,00					1,00		1,00
TOTAL ÍTEM										36,00

CANTIDADES CONTRACTUALES	36,00
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	21,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	15,00
SALDO POR COBRAR	-

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tramo 12: San Jose



Villa Fatima Salida a la 41



Tramo 2: San José



Tramo 4: El Mora




Tramo 5:



Tramo 6:



Sucre - Playa Brigida

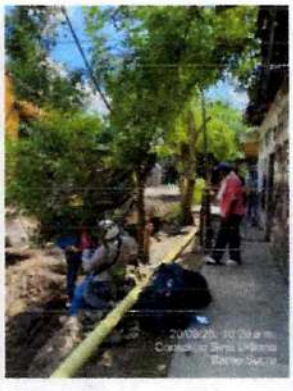

Villa Fatima Salida a la 41



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	6. OTRAS ACTIVIDADES	SUBCAPITULO			
ITEM	1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)		UNIDAD	UND


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

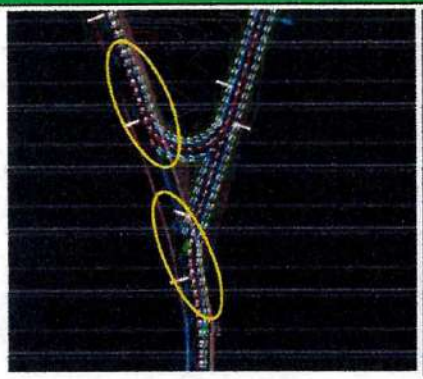

Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41



Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48

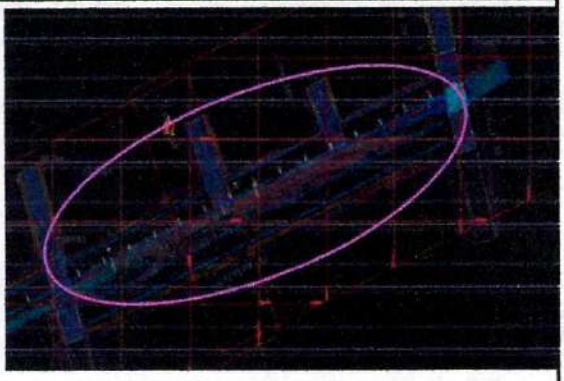

Tramo 2: San José - Cra 16B entre las calles 29 y 39

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				LONGITUD	CANT ACUMULADO
			ABSCISA	CARRIL	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD		
CANTIDADES										
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Entrada	K0+000,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Entrada	K0+002,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Entrada	K0+014,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Entrada	K0+021,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Entrada	K0+028,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Entrada	K0+030,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Entrada	K0+035,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Entrada	K0+043,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Entrada	K0+056,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Entrada	K0+063,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Entrada	K0+070,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Entrada	K0+075,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Entrada	K0+080,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Salida	K0+237,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Salida	K0+240,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Salida	K0+242,00					1,00		1,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	6. OTRAS ACTIVIDADES	SUBCAPITULO			
ITEM	1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)		UNIDAD	UND

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Salida	K0+270,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Salida	K0+280,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Salida	K0+284,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Salida	K0+287,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Salida	K0+290,00					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Izquierdo - Salida	K0+292,00					1,00		1,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Izquierdo	K0+345,00					1,00		1,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Derecho	K0+350,00					1,00		1,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Derecho	K0+357,00					1,00		1,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Derecho	K0+452,00					1,00		1,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Derecho	K0+450,00					1,00		1,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Izquierdo	K0+455,00					1,00		1,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Izquierdo	K0+456,00					1,00		1,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Izquierdo	K0+463,00					1,00		1,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Derecho	K0+472,00					1,00		1,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Derecho	K0+489,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+003,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+021,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+045,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+048,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+057,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+065,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+071,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+093,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+100,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+112,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+233,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+370,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+388,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo	K0+390,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo	K0+397,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+400,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo	K0+402,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+406,00					1,00		1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo	K0+430,00					1,00		1,00
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Lado Izquierdo	K0+021,00					1,00		1,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	6. OTRAS ACTIVIDADES	SUBCAPITULO			
ITEM	1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)		UNIDAD	UND

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Lado Izquierdo	K0+093,00					1,00		1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo	K0+045,00					1,00		1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo	K0+100,00					1,00		1,00
TRAMO 5	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo						1,00		1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo	K0+112,00					1,00		1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo	K0+108,00					1,00		1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+100,00					1,00		1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+068,00					1,00		1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+073,00					1,00		1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+115,00					1,00		1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+015,00					1,00		1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+018,00					1,00		1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+130,00					1,00		1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+173,00					1,00		1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+030,00					1,00		1,00
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo	K0+035,00					1,00		1,00
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo	K0+084,00					1,00		1,00
TOTAL ÍTEM										69,00

CANTIDADES CONTRACTUALES	103,00
CANTIDAD COBRARDA ACTAS ANTERIORES	42,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	27,00
SALDO POR COBRAR	34,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tramo 6: San José



Villa Fatima Salida a la



Villa Fatima Salida a la 41



MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	**CONTRATO No.**	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	**CONTRATO No.**	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				


CAPITULO	6. OTRAS ACTIVIDADES		**SUBCAPITULO**		
ITEM	1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)		**UNIDAD**	**UND**

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4







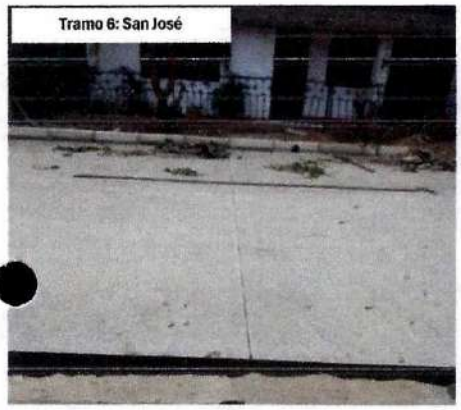



SUCRE



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO:	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA SIM 037 2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				


CAPITULO	6. OTRAS ACTIVIDADES		SUBCAPITULO		
ITEM	1,11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)		UNIDAD	UND

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

Tramo: Villa Fátima

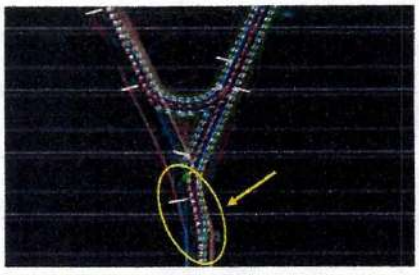

Tramo 2: San Jose

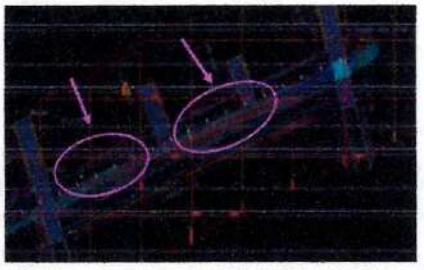

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANT ACUMULADA
			ABSCISA	CARRIL	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD		
CANTIDADES										
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Lado Izquierdo	K0+020					1,00		1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Lado Derecho	K0+005,00					1,00		1,00
TRAMO 2	TRAMO 2	Lado Derecho	K0+438,00					1,00		1,00
TRAMO 2	TRAMO 2	Lado Derecho	K0+396,00					1,00		1,00
TRAMO 2	TRAMO 2	Lado Izquierdo	K0+070,00					1,00		1,00
TRAMO 2	TRAMO 2	Lado Izquierdo	K0+085,00					1,00		1,00
TRAMO 2	TRAMO 2	Lado Izquierdo	K0+120,00					1,00		1,00
TRAMO 2	TRAMO 2	Lado Izquierdo	K0+246,00					1,00		1,00
TOTAL ÍTEM										8,00


CANTIDADES CONTRACTUALES	8,00
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	4,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	4,00
SALDO POR COBRAR	-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Villa Fatima



Villa Fatima

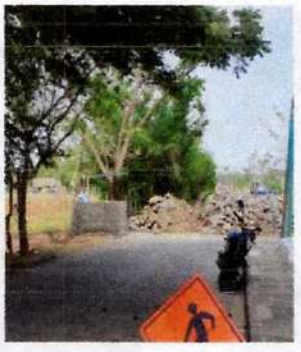

Tramo 2: San Jose



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4


DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				

CAPITULO	2.SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO			
ITEM	2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

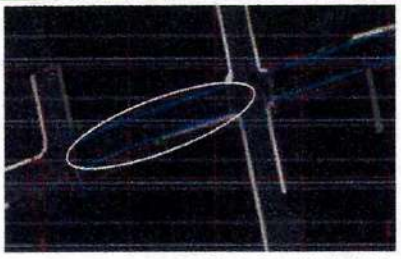

Tramo 5 - Cra 16a Entre Las Calles 40 Y 41 Altos de la floresta

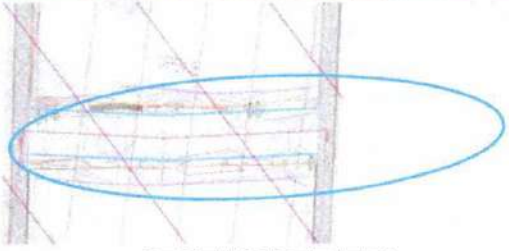

Tramo 2: San José - Cra 168 entre las calles 29 y 39

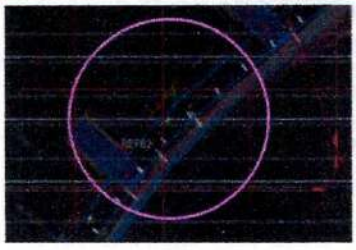

Tramo 2: San José - Cra 168 entre las calles 29 y 39

TRAMO	DESCRIPCIÓN ITEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSION				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO promedio (m)	PROFUNDIDAD promedio (m)	CANTIDAD		
			CANTIDAD							
SAN FRANCISCO	CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)		K0+326 - K0+195		319,00	7,00	0,30		669,90	669,90
SAN FRANCISCO	CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)		K0+100,00		10,00	7,20	0,80		57,60	57,60
SAN FRANCISCO	CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)	Boca Calles		20,30			0,30	3,00	18,27	18,27
SAN FRANCISCO	CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)	Descuento MH			1,60		0,30	2,00	- 1,21	-1,21
			TOTAL ÍTEM							744,56

CANTIDAD CONTRACTUAL	1.800,25
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	728,62
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	15,94
SALDO POR COBRAR	1.055,69

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

REGISTRO FOTOGRAFICO

Villa fatima



Sucre



San Francisco



Tramo 12: Santa barbara



Tramo 6



Tramo 2: San José



io 5: Altos de la Floresta



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAÚLICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACION MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPITULO	2.SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO			
ITEM	2,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

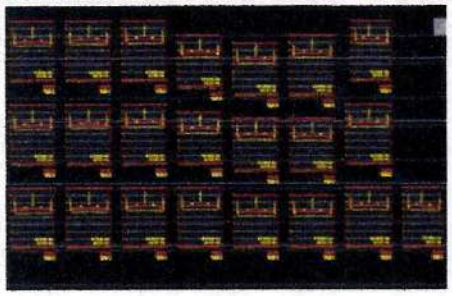


Secciones Material Seleccionado Villa Fatima, Tramo 2: Cra 16B entre las calles 29 y 39

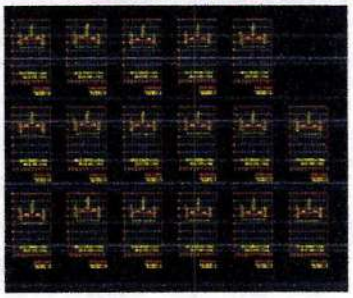

Secciones Material Seleccionado PLAYA BRIGIDA - AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44

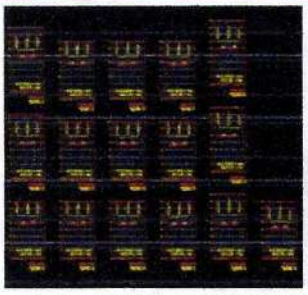

Secciones Material Seleccionado CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41

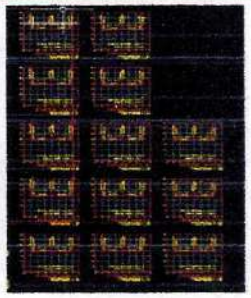

Secciones Material Seleccionado Carrera 18 entre Calles 39 y 39


TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	AREA (m^2)	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
			CANTIDADES							
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+005,04	0,83	0,00				-	0,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+010,00	10,09	4,96				27,09	27,09
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+020,00	10,51	10,00				103,02	103,02
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+030,00	10,41	10,00				104,61	104,61
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+040,00	10,35	10,00				103,80	103,80
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+050,00	10,40	10,00				103,77	103,77
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+060,00	10,45	10,00				104,26	104,26
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+070,00	10,47	10,00				104,59	104,59
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+080,00	10,60	10,00				105,30	105,30
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+090,00	11,17	10,00				108,81	108,81
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+100,00	11,23	10,00				111,99	111,99
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+110,00	11,39	10,00				113,10	113,10
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+120,00	11,15	10,00				112,69	112,69
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+130,00	11,14	10,00				111,45	111,45
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+140,00	11,01	10,00				110,78	110,78
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+150,00	11,18	10,00				110,96	110,96
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+160,00	11,44	10,00				113,07	113,07
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+170,00	12,09	10,00				117,65	117,65
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+180,00	12,44	10,00				122,09	122,09
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+190,00	12,47	10,00				124,57	124,57
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+200,00	15,14	10,00				138,04	138,04
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+210,00	9,53	10,00				123,36	123,36
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+220,00	7,04	10,00				82,87	82,87
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+230,00	1,80	10,00				44,20	44,20
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+240,00	1,51	10,00				16,53	16,53
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+250,00	1,42	10,00				14,62	14,62
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+260,00	1,44	10,00				14,29	14,29
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+270,00	1,36	10,00				14,00	14,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+280,00	1,65	10,00				15,04	15,04
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 1	K0+292,00	1,22	12,00				17,17	17,17
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 2	K0+003,02	0,82	0,00				-	0,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 2	K0+010,00	2,49	6,98				11,55	11,55

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAÚLICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACION MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPITULO	2.SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO			
ITEM	2,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

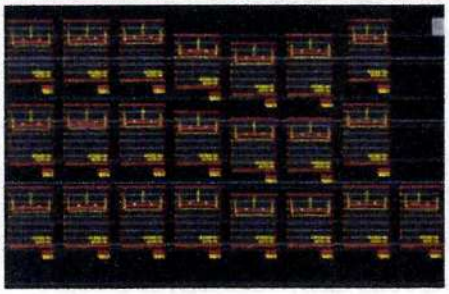


Secciones Material Seleccionado Villa Fatima, Tramo 2: Cra 16B entre las calles 29 y 39

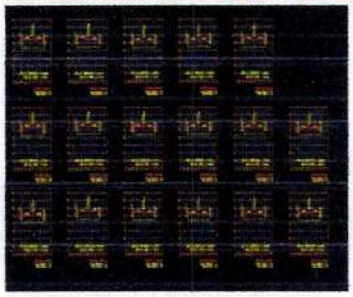

Secciones Material Seleccionado PLAYA BRIGIDA - AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44

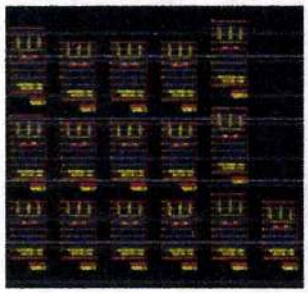

Secciones Material Seleccionado CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41



Secciones Material Seleccionado Carrera 18 entre Calles 38 y 39


TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	AREA (m^2)	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 2	K0+020,00	2,60	10,00				25,47	25,47
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 2	K0+030,00	2,96	10,00				27,81	27,81
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 2	K0+040,00	3,09	10,00				30,24	30,24
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 2	K0+050,00	3,21	10,00				31,50	31,50
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 2	K0+060,00	3,85	10,00				35,30	35,30
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 2	K0+070,00	3,93	10,00				38,89	38,89
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 2	K0+080,00	5,81	10,00				48,72	48,72
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 2	K0+090,00	6,51	10,00				61,63	61,63
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 2	K0+100,00	7,49	10,00				70,03	70,03
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 2	K0+110,00	7,59	10,00				75,41	75,41
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Alineamiento 2	K0+120,00	7,65	10,00				76,17	76,17
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44		k000 al k0+020		20,00	6,50	0,20		26,00	26,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44		k0+020 al k0+110		90,00	6,00	0,20		108,00	108,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44		k0+ 210 a la k0+330		120,00	6,00	0,20		144,00	144,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44		k0+450 a la k0+500		50,00	6,00	0,20		60,00	60,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44		k0+330 a la k0+410		80,00	6,00	0,20		96,00	96,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44			21,5000			0,20	1,00	4,30	4,30
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Descuento MH			1,00		0,20	1,00	-0,40	-0,40
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".				429,50	6,00	0,40		1030,80	1030,80
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Descuento MH			1,60		0,40	2,00	-1,61	-1,61
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Esapldar de bordillos			200,00	1,00	0,20		40,00	40,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Calzada	K0+000,00		112,90	5,50	0,4		248,38	248,38
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Cuñas Boca Calle	K0+003,00	0,7100			0,4		0,28	0,28
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Derecho - Boca Calle	K0+108,70	23,0000			0,4		9,20	9,20
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	ado Izquierdo - Sobre ancl	K0+108,70		7,56	0,73	0,4		2,21	2,21
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	ado Izquierdo - Sobre ancl	K0+108,70	13,5860			0,4		5,43	5,43
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Tramo sobre la calle 40B	K0+108,70		23,2160	3,50	0,4		32,50	32,50
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Descuento MH			1,60		0,2	2,00	-0,80	-0,80
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"				230,22	6,50	0,4		598,57	598,57
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Descuento MH			1,60		0,4	3,00	-2,41	-2,41
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Calzada			141,60	7,00	0,4		396,48	396,48
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Giros Boca Calle		1,6500			0,4	4,00	2,64	2,64

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO:	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAÚLICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACION MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPITULO	2.SUBRASANTE Y SUBBASE		SUBCAPITULO		
ITEM	2,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

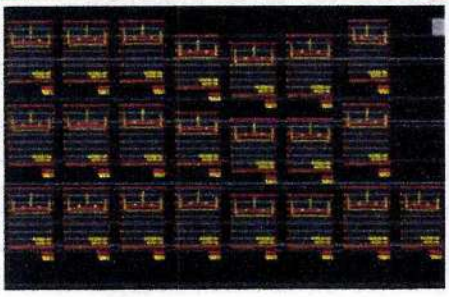


Secciones Material Seleccionado Villa Fatima, Tramo 2: Cra 16B entre las calles 29 y 39

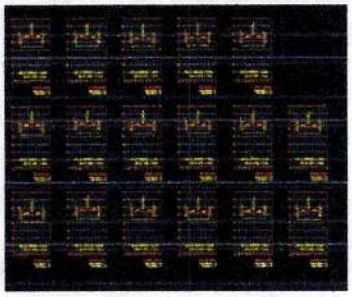

Secciones Material Seleccionado PLAYA BRIGIDA - AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44

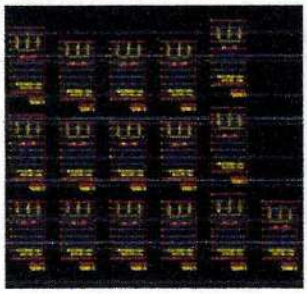

Secciones Material Seleccionado CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41



Secciones Material Seleccionado Carrera 18 entre Calles 39 y 39

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	AREA (m^2)	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Descuento MH			1,60		0,4	1,00	-0,80	-0,80
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Calzada	K0+000,00		274,70	6,00	0,5		824,10	824,10
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	ado Derecho - Boca Calle	K0+000,00	16,3860			0,5		8,19	8,19
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	ado Izquierdo - Boca Call	K0+000,00	20,3060			0,5		10,15	10,15
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	ado Izquierdo - Boca Call	K0+095,00	20,5430			0,5		10,27	10,27
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho - Boca Calle	K0+095,00	20,2650			0,5		10,13	10,13
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Giros - Boca Calle	K0+185,00	2,6020			0,5		1,30	1,30
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	s - Boca Calle - Empalme	K0+274,50	4,0180			0,5		2,01	2,01
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Descuento MH			1,60		0,5	4,00	- 4,02	-4,02
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Calzada	K0+000,00		150,00	6,00	0,4		360,00	360,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	- Boca Calle - Empalme	K0+003,00	1,7370			0,4		0,69	0,69
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho - Boca Calle	K0+039,00	20,6490			0,4		8,26	8,26
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	ado Izquierdo - Boca Call	K0+039,00	21,5040			0,4		8,60	8,60
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho - Boca Calle	K0+116,00	20,2790			0,4		8,11	8,11
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo - Boca Call	K0+116,00	20,1850			0,4		8,07	8,07
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho - Boca Calle	K0+155,50	19,6880			0,4		7,88	7,88
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo - Boca Call	K0+155,50	18,5330			0,4		7,41	7,41
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Descuento MH			1,60		0,4	4,50	- 3,62	-3,62
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".		K0+000,00		148,70	6,00	0,4		356,88	356,88
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	do Derecho - Cuña bocac	K0+003,00	1,6480			0,4		0,66	0,66
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	lo Izquierdo - Cuña bocac	K0+003,00	1,4370			0,4		0,57	0,57
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	do Derecho - Cuña bocac	K0+151,70	0,7140			0,4		0,29	0,29
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	lo Izquierdo - Cuña bocac	K0+151,70	0,9930			0,4		0,40	0,40
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Descuento MH			1,60		0,4	1,00	- 0,80	-0,80
					144,60	1,10	0,2		23,86	23,86
TOTAL ÍTEM										7475,11


CANTIDADES CONTRACTUALES	10.235,68
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	5.246,32
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	1.628,73
SALDO POR COBRAR	2.760,57

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAÚLICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACION MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPITULO	2.SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO			
ITEM	2,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

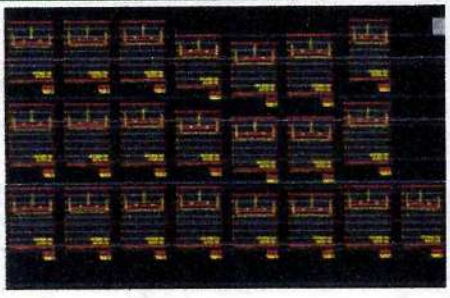


Secciones Material Seleccionado Villa Fatima, Tramo 2: Cra 16B entre las calles 29 y 39

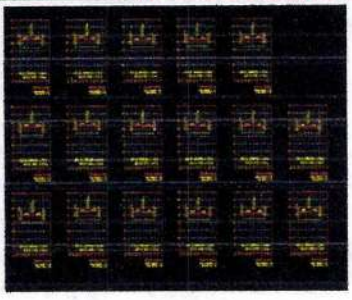

Secciones Material Seleccionado PLAYA BRIGIDA - AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44

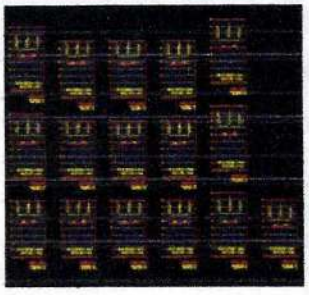

Secciones Material Seleccionado CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41



Secciones Material Seleccionado Carrera 16 entre Calles 39 y 39

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACION		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL.ACUMULADO
			ABSCISA	AREA (m^2)	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		

Villa fatima




Tramo: Sucre - Playa Brigida



Tramo 2: San Jose



Tramo: El Mora

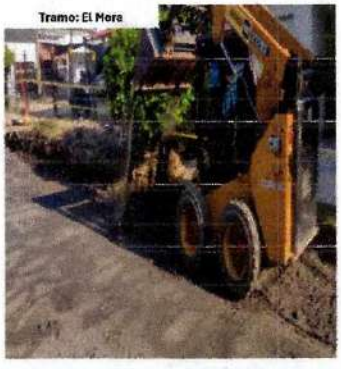

Tramo 5: Altos de la Floresta



Tramo 6: San Jose



Tramo 10



Tramo 11



Tramo 12



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1 ACTA PARCIAL No.4


DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP- SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:	N/A		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				

CAPITULO	2.SUBRASANTE Y SUBBASE		SUBCAPITULO		
ITEM	2,04	SUBBASE GRANULAR CLASE C		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4




BARRIO SUCRE - CLLE 42 Y 42 A

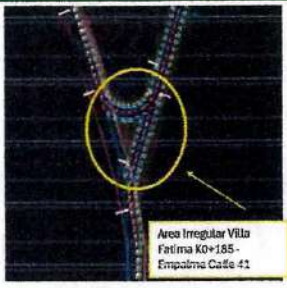

Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41

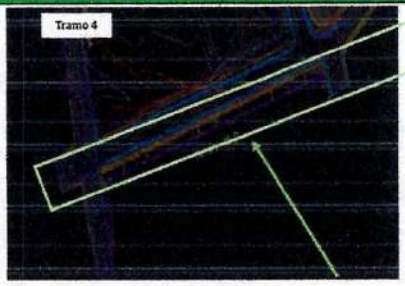

Tramo 4 - El Mora - Cra 15D entre calles 40B y 40A - Subase Abscisas K0+000 Hasta k0+103

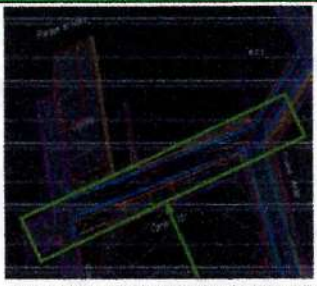

Tramo 3 - El Mora - CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - Subase Abscisas K0+000 Hasta k0+086

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN	VOL ACUMULADO
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
			CANTIDADES							
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41								466,50	466,50
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44		k0+000 al k0+020		20,00	8,50	0,20		26,00	26,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44		k0+020 al k0+107		87,00	6,00	0,20		104,40	104,40
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44				120,00	6,00	0,20		144,00	144,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44				50,00	6,00	0,20		60,00	60,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44		k0+330 a la k0+410		80,00	6,00	0,20		96,00	96,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44			21,50			0,20	1,00	4,30	4,30
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Descuento MH			1,60		0,20	1,00	- 0,40	-0,40
SAN FRANCISCO	CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)				319,00	7,00	0,20		446,60	446,60
SAN FRANCISCO	CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)	Descuento MH			1,60		0,20	2,00	- 0,80	-0,80
TRAMO 2	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".				429,50	6,00	0,2		515,40	515,40
TRAMO 2	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 "SAN JOSÉ".	Descuento MH			1,60		0,20	2,00	- 0,80	-0,80
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Calzada	K0+003,00		84,39	5,50	0,2		92,83	92,83
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Giros - Inicio	K0+003,00	3,2840			0,2		0,65	0,65
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Losas Irregulares Boca Calle	K0+003,00	106,6850			0,2		21,34	21,34
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Medio Carril	K0+099,49		24,37	3,50	0,2		17,06	17,06
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Empalme Estación de Servicio	K0+106,50		27,18	2,23	0,2		12,12	12,12
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Descuento MH			1,60		0,2	2,00	- 0,80	-0,80
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Boca Calle Parque.		20,30			0,2		4,06	4,06
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"				112,90	5,50	0,2		124,19	124,19
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Cuñas Boca Calle	K0+003,00	0,7100			0,2		0,14	0,14
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Derecho - Boca Calle	K0+108,70	23,0000			0,2		4,60	4,60
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo - Sobre ancho	K0+108,70		7,56	0,73	0,2		1,10	1,10
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo - Sobre ancho	K0+108,70	13,5860			0,2		2,72	2,72
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Tramo sobre la calle 40B	K0+108,70		23,2160	3,50	0,2		16,25	16,25

TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Descuento MH			1,60		0,2	2,00	- 0,80	-0,80
TRAMO 5	CRA 19A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"				230,22	6,50	0,2		299,29	299,29
TRAMO 5	CRA 19A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Descuento MH			1,60		0,2	3,00	-1,21	-1,21
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".				141,60	7,00	0,2		198,24	198,24
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Giros Boca Calle		1,6500			0,2	4,00	1,32	1,32
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Descuento MH			1,60		0,2	1,00	-0,40	-0,40
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Calzada	K0+000,00		274,70	6,00	0,2		329,64	329,64
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho - Boca Calle	K0+000,00	16,3850			0,2		3,28	3,28
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo - Boca Calle	K0+000,00	20,3060			0,2		4,06	4,06
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo - Boca Calle	K0+095,00	20,5430			0,2		4,11	4,11
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho - Boca Calle	K0+095,00	20,2650			0,2		4,05	4,05
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Giros - Boca Calle	K0+185,00	2,6020			0,2		0,52	0,52
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Giros - Boca Calle - Empalme Final	K0+274,50	4,0180			0,2		0,80	0,80
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Descuento MH			1,60		0,2	4,00	- 1,61	-1,61
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Calzada	K0+000,00		150,00	6,00	0,2		180,00	180,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Giros - Boca Calle - Empalme Inicial	K0+003,00	1,7370			0,2		0,35	0,35
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho - Boca Calle	K0+039,00	20,6490			0,2		4,13	4,13
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo - Boca Calle	K0+039,00	21,5040			0,2		4,30	4,30
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho - Boca Calle	K0+116,00	20,2790			0,2		4,06	4,06
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo - Boca Calle	K0+116,00	20,1850			0,2		4,04	4,04
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho - Boca Calle	K0+155,50	19,6880			0,2		3,94	3,94
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo - Boca Calle	K0+155,50	18,5330			0,2		3,71	3,71
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Descuento MH			1,60		0,2	4,50	- 1,61	-1,61
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".				148,70	6,00	0,2		178,44	178,44
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho - Cuña bocacalle	K0+003,00	1,65			0,2		0,33	0,33
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo - Cuña bocacalle	K0+003,00	1,44			0,2		0,29	0,29
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho - Cuña bocacalle	K0+151,70	0,71			0,2		0,14	0,14
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo - Cuña bocacalle	K0+151,70	0,99			0,2		0,20	0,20
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Descuento MH			1,60		0,2	1,00	- 0,40	-0,40
			TOTAL ITEM							3380,44

CANTIDAD CONTRACTUAL	5.117,84
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	2.438,40
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	942,04
SALDO POR COBRAR	1.737,40

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tramo: Villa Fatima



Tramo: San Francisco



BARRIO SUCRE - CLLE 42 Y 42 A



BARRIO SUCRE - CLLE 42 Y 42 A



TRAMO 2: SAN JOSE



TRAMO 3



TRAMO 4



TRAMO 5



TRAMO 10: SANTA BARBARA



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4


DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				

CAPITULO	2.SUBRASANTE Y SUBBASE	SUBCAPITULO			
ITEM	2,09	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES		UNIDAD	M2


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

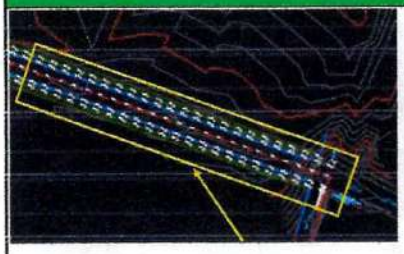


Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Geotextil Abscisas K0+000 Hasta k0+220



Tramo 2 - Cra 16B entre las calles 29 y 39, Geotextil Abscisas K0+000 Hasta k0+248,76

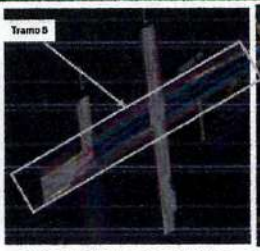

TRAMO 5 - CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - Geotextil Abscisas K0+000 Hasta k0+032



Tramo 3: Carrera 15C Entre Las Calles 40A y 41 - Geotextil Abscisas K0+000 Hasta k0+080

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				AREA	AREA ACUMULADO
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE EXPANSION		
			CANTIDADES							
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41								2.328,08	2328,08
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44		K0+000,00		20,00	7,10			142,00	142,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44		K0+020 al K0+107		87,00	6,60			574,20	574,20
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44				120,00	6,60			792,00	792,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44				50,00	6,60			330,00	330,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44			21,50				1,00	21,50	21,50
SAN FRANCISCO	CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)				319,00	7,80			2.488,20	2488,20
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSE".				429,50	7,00			3.006,50	3006,50
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Calzada	K0+003,00		84,39	5,90			497,90	497,90
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Giros - Inicio	K0+003,00	3,2640					3,26	3,26
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Losas Irregulares Boca Calle	K0+003,00	106,6850					106,69	106,68
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Medio Carril	K0+099,49		24,37	3,90			95,04	95,04
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Empalme Estación de Servicio	K0+106,50		27,18	2,63			71,48	71,48
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Boca Calle Parque.		20,30				1,00	20,30	20,30
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"				112,90	6,50			733,85	733,85
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Cuñas Boca Calle	K0+003,00	0,7100				1,00	0,71	0,71
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	ado Derecho - Boca Cal	K0+108,70	23,0000				1,00	23,00	23,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	do Izquierdo - Sobre ma	K0+108,70		7,86	0,73		1,00	5,82	5,82
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	do Izquierdo - Sobre ma	K0+108,70	13,5860				1,00	13,59	13,59
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Tramo sobre la calle 40	K0+108,70		23,2100	4,50		1,00	104,47	104,47
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"				230,2200	7,50			1.726,65	1726,65
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".				141,60	8,00			1.132,80	1132,80
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Giros Bocacalle		1,6500				4,00	6,60	6,60
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Calzada	K0+000,00		274,70	7,20			1.977,84	1977,84
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	ado Derecho - Boca Cal	K0+000,00	16,3850					16,39	16,39
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	do Izquierdo - Boca Ca	K0+000,00	20,3080					20,31	20,31
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	do Izquierdo - Boca Ca	K0+095,00	20,5400					20,54	20,54
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	ado Derecho - Boca Cal	K0+095,00	20,2650					20,27	20,27
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Giros - Boca Calle	K0+180,00	2,6020					2,60	2,60
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	- Boca Calle - Empalm	K0+274,50	4,0160					4,02	4,02

TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	Calzada	K0+000,00		150,00	7,00			1.050,00	1050,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	- Boca Calle - Empalme	K0+003,00	1,7370					1,74	1,74
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	ado Derecho - Boca Cal	K0+039,00	20,5490					20,55	20,55
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	ado Izquierdo - Boca Ca	K0+039,00	21,5040					21,50	21,50
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	ado Derecho - Boca Cal	K0+116,00	20,2790					20,28	20,28
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	ado Izquierdo - Boca Ca	K0+116,00	20,1850					20,19	20,19
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	ado Derecho - Boca Cal	K0+155,50	19,8880					19,89	19,89
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	ado Izquierdo - Boca Ca	K0+155,50	18,5330					18,53	18,53
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".				148,70	7,00			1.040,90	1040,90
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	o Derecho - Cuña boca	K0+003,00	1,65				1,00	1,65	1,65
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	o Izquierdo - Cuña boca	K0+003,00	1,44				1,00	1,44	1,44
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	o Derecho - Cuña boca	K0+151,70	0,71				1,00	0,71	0,71
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	o Izquierdo - Cuña boca	K0+151,70	0,99				1,00	0,99	0,99
			TOTAL ITEM							18504,57

CANTIDAD CONTRACTUAL	27.829,53
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	14.644,84
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	3.859,73
SALDO POR COBRAR	9.324,96

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

REGISTRO FOTOGRAFICO

Villa fatima



SAN FRANCISCO



Tramo 3: El Mora



Tramo 4: El Mora



Tramo 5



Tramo 6: San José



Tramo 2



Tramo 10



Tramo 11



Tramo 12




DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	[illegible]		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS	SUBCAPITULO			
ITEM	3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4




Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Concreto MR 40 kg/cm2, Abscisas K0+000 Hasta k0+182 Carril Derecho, k0+184,5 hasta k0+248,5



Tramo 3: Carrera 15C Entre Las Calles 40A y 41



Tramo 10: Calle 40 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos - Concrete MR 40 kg/cm2



Tramo 12: Carrera 19C Entre Las Carreras 38 y 39 - Concrete MR 40 kg/cm2


TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN (m³)	CANT TOTAL (m³)
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)		

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINDI URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-032-2024
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:	
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	FECHA	27/10/2025
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS	SUBCAPITULO	
ITEM	3,01 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4




Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Concreto MR 40 kg/cm2, Abscisas K0+000 Hasta k0+182 Carril Derecho, k0+184,5 hasta k0+248,5



Tramo 3: Carrera 15C Entre Las Calles 40A y 41



Tramo 10: Calle 48 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos - Concreto MR 40 kg/cm2



Tramo 12: Carrera 18C Entre Las Carreras 38 y 39 - Concreto MR 40 kg/cm2

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN (m³)	CANT TOTAL (m³)
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)		
	CANTIDADES									
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41			21168,00			0,21		455,55	455,55
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".				435,50	6,00	0,20		522,60	522,60
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Boca Calle	K0+075,00	20,3500			0,2		4,06	4,06
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Boca Calle	K0+098,70	20,3600			0,2		4,06	4,06
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Giros Empalmes		1,6500			0,20	18	5,94	5,94
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Descuento MH			1,60		0,20	2,80	- 0,89	-0,89
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Calzada	K0+003,00		34,39	5,59	0,2		92,83	92,83
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Giros - Inicio	K0+003,00	3,2640			0,2		0,65	0,65
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Losas Irregulares Boca Calle	K0+003,00	108,8800			0,2		21,34	21,34
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Medio Carril	K0+099,49		24,37	3,50	0,2		17,06	17,06
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Empalme Estación de Servicio	K0+108,59		27,18	2,23	0,2		12,12	12,12
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Descuento MH			1,60		0,2	2,80	- 0,89	-0,89
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Boca Calle Parque		20,30			0,2		4,06	4,06
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA".				112,98	5,59	0,2		124,19	124,19
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA".	Cuñas Boca Calle	K0+003,00	0,7100			0,2		0,14	0,14
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA".	Lado Derecho - Boca Calle	K0+108,70	23,0900			0,2		4,60	4,60
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA".	Lado Izquierdo - Sobre ancho	K0+108,70		7,58	0,73	0,2		1,10	1,10
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA".	Lado Izquierdo - Sobre ancho	K0+108,70	13,5980			0,2		2,72	2,72
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA".	Tramo sobre la calle 40B	K0+108,70		23,2180	3,59	0,2		16,25	16,25
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA".	Descuento MH			1,50		0,2	3,00	- 0,90	-0,90
TRAMO 5	CRA 18A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"		K0+000,00		230,22	6,59	0,20		299,29	299,29
TRAMO 5	CRA 18A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Boca Calles		20,30			0,20	5,00	20,30	20,30
TRAMO 5	CRA 18A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Giros Empalmes		1,6500			0,2	4,00	1,32	1,32
TRAMO 5	CRA 18A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Descuento MH			1,90		0,2	3,00	-1,21	-1,21
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".				141,60	7,00	0,2		198,24	198,24
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ"	Giros Boca Calle		1,6500			0,2	4,00	1,32	1,32
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Descuento MH			1,50		0,2	1,00	-0,40	-0,40
TRAMO 10	CALLE 48 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Calzada	K0+000,00		274,70	6,00	0,2		329,64	329,64
TRAMO 10	CALLE 48 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho - Boca Calle	K0+000,00	16,3860			0,2		3,28	3,28
TRAMO 10	CALLE 48 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo - Boca Calle	K0+000,00	20,3060			0,2		4,06	4,06
TRAMO 10	CALLE 48 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo - Boca Calle	K0+065,00	20,5430			0,2		4,11	4,11
TRAMO 10	CALLE 48 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho - Boca Calle	K0+065,00	20,2050			0,2		4,05	4,05
TRAMO 10	CALLE 48 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Giros - Boca Calle	K0+185,00	2,6020			0,2		0,52	0,52
TRAMO 10	CALLE 48 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Giros - Boca Calle - Empalme Final	K0+274,50	4,6180			0,2		0,92	0,92
TRAMO 10	CALLE 48 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Descuento MH			1,60		0,2	4,00	-1,61	-1,61
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Calzada	K0+000,00		150,00	6,00	0,2		180,00	180,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Giros - Boca Calle - Empalme Inicial	K0+003,00	1,7370			0,2		0,35	0,35
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho - Boca Calle	K0+030,00	20,5430			0,2		4,11	4,11
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo - Boca Calle	K0+030,00	21,5040			0,2		4,30	4,30
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho - Boca Calle	K0+116,00	20,2790			0,2		4,06	4,06
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo - Boca Calle	K0+116,00	20,1850			0,2		4,04	4,04
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho - Boca Calle	K0+155,50	19,6660			0,2		3,94	3,94
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo - Boca Calle	K0+155,50	18,5330			0,2		3,71	3,71
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Descuento MH			1,80		0,2	4,50	- 1,81	-1,81
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ"	Calzada			148,70	6,00	0,20		178,44	178,44
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ"	Lado Derecho - Calle bocacalle	K0+000,00	1,05			0,20		0,22	0,22
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo - Calle bocacalle	K0+000,00	1,44			0,20		0,29	0,29
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ"	Lado Derecho - Calle bocacalle	K0+151,70	0,71			0,20		0,14	0,14
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo - Calle bocacalle	K0+151,70	0,99			0,20		0,20	0,20
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Descuento MH			1,20		0,2	1,60	- 0,48	-0,48
	SAN FRANCISCO									
		TOTAL ITEM								2523,08


CANTIDAD CONTRACTUAL	4.800,08
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	1.990,28
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	532,80
SALDO POR COBRAR	2.268,58

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	[illegible]		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS		SUBCAPITULO		
ITEM	3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 kg/cm2)		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4




Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Concreto MR 40 kg/cm2, Abscisas K0+000 Hasta k0+182 Carril Derecho, k0+184,5 hasta k0+248,5



Tramo 3: Carrera 15C Entre Las Calles 40A y 41



Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos - Concreto MR 40 kg/cm2



Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39 - Concreto MR 40 kg/cm2

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN (m³)	CANT TOTAL (m³)
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)		

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tramo: Villa Fátima




Tramo: Tramo 2



Tramo: Tramo 3



Tramo: Tramo 4



Tramo: Tramo 5



Tramo: Tramo 6



Tramo: Tramo 10



Tramo: Tramo 11



Tramo: Tramo 12




DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA MOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No. 4

DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-007-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y SORDILLOS	SUBCAPITULO			
ITEM	3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI		UNIDAD	UND


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4




Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Concreto MR 40 kg/cm2, Abscisas K0+000 Hasta k0+182 Carril Derecho, k0+124,5 hasta k0+248,5

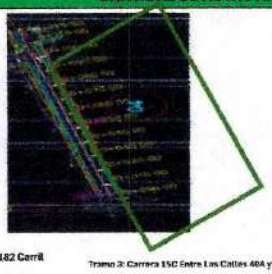

Tramo 3: Carrera 15C Entre Las Calles 40A y 41



Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 15 y La Via Montería - San Carlos - Concreto MR 40 kg/cm2



Tramo 12: Carrera 19C Entre Las Carreras 38 y 39 - Concreto MR 40 kg/cm2


TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
			ABSCISA	CANTIDAD	LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)		
	CANTIDADES									
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44								1,00	1,00
SAN FRANCISCO	CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)								2,00	2,00
TRAMO 2	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 29 Y 30 - "SAN JOSÉ".								2,00	
TRAMO 2	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".		K0+098,70						1,00	1,00
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".		K0+098,70						1,00	1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"		K0+059,00						1,00	1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"		K0+100,00						1,00	1,00
TRAMO 5	CRA 19A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORIDA"								2,00	
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".								1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"		K0+020,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"		K0+093,70						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"		K0+185,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"		K0+295,00						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"		K0+000,00						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"		K0+005,14						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"		K0+039,00						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"		K0+118,00						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"		K0+156,50						1,00	1,00
TRAMO 12	CRA 19C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".		K0+075,00						1,00	1,00
		TOTAL ÍTEM								18,00

CANTIDAD CONTRACTUAL	30,00
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	18,00
SALDO POR COBRAR	12,00


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-036-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA	CONTRATO No.	CMA SIM-027-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS	SUBCAPITULO			
ITEM	3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI		UNIDAD	UND


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4




Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Concreto MR 40 kg/cm2, Abscisas K0+000 Hasta k0+182 Carril Derecho, k0+184,5 hasta k0+246,5

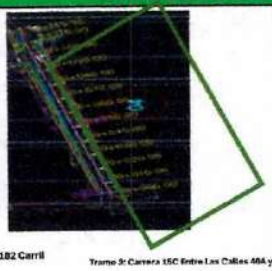

Tramo 3: Carrera 15C Entre Las Calles 40A y 41



Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos - Concreto MR 40 kg/cm2



Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39 - Concreto MR 40 kg/cm2

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
			ABSCISA	CANTIDAD	LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)		

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Tramo: San Francisco



Tramo: Tramo2



Tramo: Tramo 3



Tramo: Tramo 4



Tramo: Tramo 6



Tramo: Tramo 10



Tramo: Tramo 11



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No. 4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO IUNU URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO CP-SIM-025-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-027-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS	SUBCAPITULO			
ITEM	3.03 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO			UNIDAD	M

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4


BARRIO SUCRE



Tramo 10 y 11: Santa Barbara



Tramo 2: San Jose



TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		LADO	DIMENSIÓN				LONGITUD / ALTO(m)	CANTIDAD ACUMULADA LONGITUD
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO		LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD DE BORDILLOS		
			CANTIDADES								
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Lado Derecho y Alineamiento de Aceleración	K0+095,00			266,0660				266,07	266,07
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Lado Izquierdo y Alineamiento de Desaceleración	K0+095,00			303,06				303,06	303,06
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Borde Externo - Alineamiento de Salida y Entrada				83,4700				83,47	83,47
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Lado Izquierdo - Alineamiento de Salida y Entrada								21,00	21,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Izquierdo				560,00				560,00	560,00
SAN FRANCISCO	CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)	Lado Izquierdo				253,25				253,25	253,25
TRAMO 3	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA"	Lado Derecho	K0+155,00			18,55				18,55	18,55
TRAMO 3	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA"	Lado Izquierdo	K0+155,00			39,10				39,10	39,10
TRAMO 3	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA"	Lado Izquierdo				12,00				12,00	12,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Derecho				48,35				48,35	48,35
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo				77,81				77,81	77,81
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Sobre la Calle 40B				20,00				20,00	20,00
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Lado Izquierdo	K0+037,00			50,00				50,00	50,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo				103,90				103,90	103,90
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho				114,00				114,00	114,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo				168,76				168,76	168,76
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho				206,563				206,56	206,56
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+000,00			81,00				81,00	81,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+000,00			75,48				75,48	75,48
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Borde Izq				147,01				147,01	147,01
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Borde Der	K0+112,00			100,91				100,91	100,91
			TOTAL ÍTEM								2750,97

CANTIDAD CONTRACTUAL	3.948,74
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	2.125,29
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	625,68
SALDO POR COBRAR	197,77

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINU URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA 029-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA	CONTRATO No.	CMA-SIH-027-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS	SUBCAPITULO		UNIDAD	M
ITEM	3,03 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO				

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

REGISTRO FOTOGRAFICO

Villa Fátima



TRAMO 2



TRAMO 3



TRAMO 4



TRAMO 5



TRAMO 6



TRAMO 10



Tramo 11: Santa Bárbara



Tramo 12: Santa Bárbara




DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEJIA MONTES
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-031-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPÍTULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS	SUBCAPÍTULO			
ITEM	3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa		UNIDAD	KG


CANTIDADES ACTA PARCIAL No 4

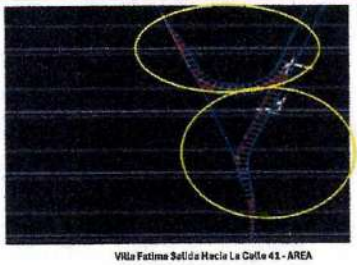

Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - AREA

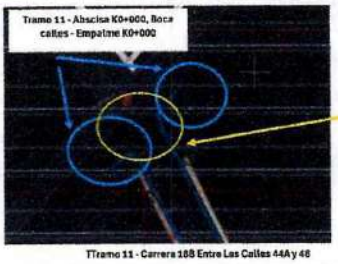

TTramo 11 - Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 46

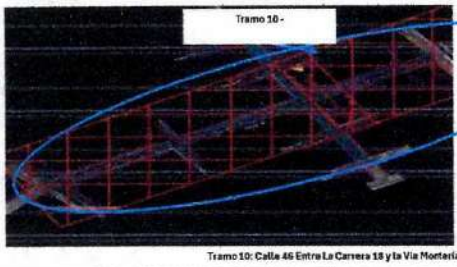

Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos


TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACION		AREA	DIMENSION				CANTIDAD DE LOSAS	CANTIDAD TOTAL (Kg)
			ABSCISA INICIAL	ABSCISA INICIAL		LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	KG/M2	CANTIDAD DE KG X m2		
	CANTIDAD										
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41		K0+000,00	K0+003,70	12,9500				10,00	2,00	258,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41		K0+000,00	K0+130,00	250,6900				10,00	1,00	2506,90
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41		K0+224,00	K0+230,00	23,9610				10,00	2,00	479,22
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41		K0+230,00	K0+235,00	6,8790				10,00	1,00	68,79
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41		K0+235,00	K0+237,00	11,1790				10,00	1,00	111,79
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41		K0+160,00	K0+292,00	61,0500				10,00	1,00	610,50
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41		K0+225,00	K0+292,00		67,50			9,5970 Kg/m	1,00	648,66
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41		K0+000,00	K0+067,00		67			9,5970 Kg/m	1,00	643,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Inicio	K0+000,00				3,50	3,70	10,0	2,00	259,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	MH	K0+068,00				3,70	3,00	10,0	10,00	1110,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Boca Calle	K0+282,00			21,50			10,0	3,00	645,00
SAN FRANCISCO							3,70	3,50	10,0	2,00	259,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Empalme pavimento viejo	K0+000,00			27,0400			10,00	1,00	270,40
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Boca Calle	K0+075,00			20,30			10,00	1,00	203,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	MH	K0+076,00				3,70	3,00	10,0	4,00	444,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Boca Calle	K0+096,70			20,30			10,00	1,00	203,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	MH	K0+100,00				3,47	3,00	10,0	2,00	208,20
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	MH					3,70	3,00	10,0	4,00	444,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Empalme pavimento viejo	K0+125,00				3,56	3,00	10,0	2,00	214,80
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Empalme pavimento viejo	K0+131,00				3,45	3,00	10,0	2,00	207,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Empalme pavimento viejo	K0+176,00				4,00	3,00	10,0	2,00	240,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Empalme pavimento viejo	K0+184,00				4,13	3,00	10,0	2,00	247,80
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Empalme pavimento viejo	K0+244,00				3,20	3,00	10,0	2,00	192,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Empalme pavimento viejo	K0+252,30				3,93	6,00	10,0	2,00	471,60
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Empalme pavimento viejo	K0+403,00				3,60	3,00	10,0	2,00	216,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Empalme pavimento viejo	K0+410,00				3,60	3,00	10,0	2,00	216,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Empalme pavimento viejo	K0+450,00				3,53	3,00	10,0	2,00	211,80
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Empalme de Inicio	K0+003,00			21,3140			10,0	1,00	213,14
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	MH	K0+024,76			17,4630			10,0	1,00	174,63
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	MH - Boca Calle	K0+090,70			66,8440			10,0	1,00	668,44
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Lado Izq EDS	K0+108,00			63,9120			10,0	1,00	639,12

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-039-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS	SUBCAPITULO			
ITEM	3.64	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa		UNIDAD	KG


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

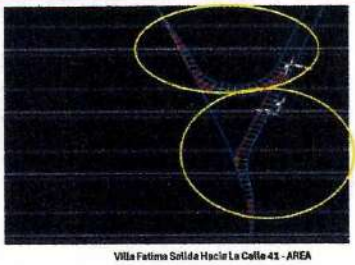

Villa Fatima Solida Hacia La Calle 41 - AREA

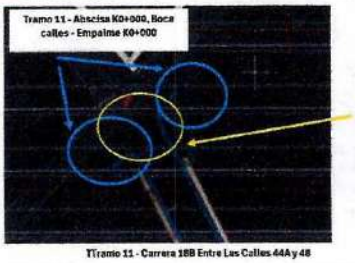

TTramo 11 - Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 48

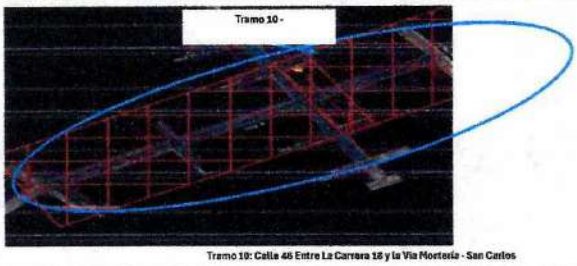


Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		ÁREA	DIMENSIÓN				CANTIDAD DE LOSAS	CANTIDAD TOTAL (Kg)
			ABSCISA INICIAL	ABSCISA INICIAL		LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	KG/M2	CANTIDAD DE KG X m2		
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Boca Calle Parque				20,3000			10,0	1,00	203,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Inicio	K0+003,00			20,0180			10,0	1,00	200,18
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	MH	K0+060,00				3,50	2,75	10,0	2,00	192,50
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	MH	K0+100,00				3,63	2,75	10,0	2,00	199,65
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Boca Calle Lado Derecho	K0+101,00			29,00			10,0		290,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Placas Empalme con calle (triangulo)	K0+101,00			13,5880			10,0		135,88
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Placas sobre la calle 40B	K0+101,00			18,6110			10,0		186,11
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Giro Bocacalle	K0+096,60			0,52			10,0	1,00	5,16
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Empalme Final				20,5060			10,0		205,06
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Sobre ancho lado Izquierdo					7,56	0,73	10,0		55,19
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Placas Empalme con calle 40B				13,30			10,0	1,00	132,96
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Inicio	K0+003,00				3,85	3,25	10,0	2,00	250,25
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Valvulas - Carril Derecho	K0+006,85				3,85	3,25	10,0	1,00	125,13
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	empalme Inicial	K0+000,00				3,61	7,00	10,0	2,00	504,70
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	MH	K0+071,00				3,55	3,50	10,0	4,00	497,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Empalme Final	K0+142,00				3,50	3,50	10,0	2,00	245,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Giros Empalmes				1,65			10,0	2,00	33,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Boca Calle Lado Derecho	K0+000,00			16,3950			10,0	1,00	163,95
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Boca Calle Lado Izquierdo	K0+000,00			20,3060			10,0	1,00	203,06
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Emplame Inicio	K0+000,00			39,8760			10,0	1,00	398,76
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	MH - 4 placas	K0+022,00			38,9250			10,0	1,00	389,25
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	MH - 4 placas	K0+093,70			33,6610			10,0	1,00	336,61
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Boca Calle - Derecho	K0+093,70			20,2650			10,0	1,00	202,65
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Boca Calle - Izquierdo	K0+093,70			20,5430			10,0	1,00	205,43
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	MH - 4 placas	K0+165,00			34,0270			10,0	1,00	340,27
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Giros Boca Calle - 4 und	K0+165,00			2,8020			10,0	1,00	28,02
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	MH - 4 placas	K0+295,00			34,0830			10,0	1,00	340,83
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Empalme Final	K0+274,50			22,9670			10,0	1,00	229,67
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Giros - Boca Calle - Empalme Inicial	K0+003,00			1,7370			10,0	1,00	17,37
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	MH 4 placas y empalme	K0+005,14			40,9790			10,0	1,00	409,79
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	MH - 4 placas	K0+039,00			32,3090			10,0	1,00	323,09
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Boca Calle - Derecho	K0+038,00			20,6480			10,0	1,00	206,48


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINU URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-039-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-031-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y SORDILLOS	SUBCAPITULO			
ITEM	3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa		UNIDAD	KG


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

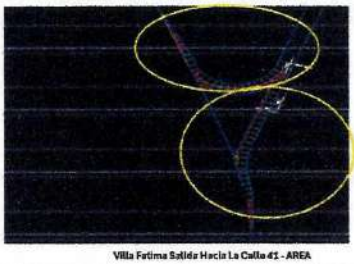

Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - AREA

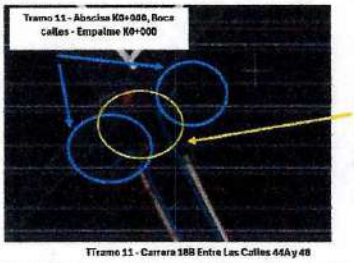

TTramo 11 - Carrera 18B Entre Las Calles 44Ay 48

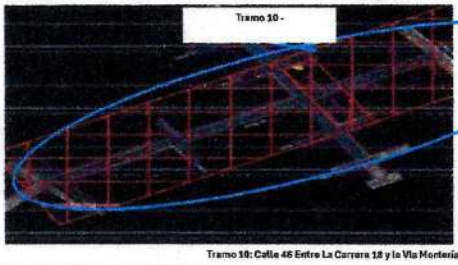

Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		AREA	DIMENSIÓN				CANTIDAD DE LOSAS	CANTIDAD TOTAL (Kg)
			ABSCISA INICIAL	ABSCISA INICIAL		LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	KG/M2	CANTIDAD DE KG/ m2		
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Boca Calle - Izquierdo	K0+039,00			21,5040			10,0	1,00	215,04
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Empalme con calle 46 - Antes	K0+070,90			21,8500			10,0	1,00	218,50
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Empalme con calle 46 - Despues	K0+092,60			21,6110			10,0	1,00	216,11
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	MH - 4 placas	K0+116,00			34,2360			10,0	1,00	342,36
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Boca Calle - Derecho	K0+116,00			28,2790			10,0	1,00	282,79
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Boca Calle - Izquierdo	K0+116,00			20,1850			10,0	1,00	201,85
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	MH - 2 placas	K0+156,50			15,8090			10,0	1,00	158,09
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Boca Calle - Derecho	K0+156,50			19,6880			10,0	1,00	196,88
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Boca Calle - Izquierdo	K0+156,50			18,5330			10,0	1,00	185,33
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Empalme Inicio	K0+009,00			26,71			20,0	1,00	534,28
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	MH	K0+075,00			44,62			10,0	1,00	446,21
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Empalme Final	K0+151,70			24,45			10,0	1,00	244,54
										TOTAL ÍTEM	23881,56

CANTIDAD CONTRACTUAL	23.884,56
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	15.121,94
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	8.739,63
SALDO POR COBRAR	23,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

Villa Fatima



Tramo: Sucre



Tramo San



Tramo 2 San José



Tramo 3 El Mora



Tramo 4 El Mora



Tramo 5 Altos de la Floresta



Tramo 6 San Jose



Tramo 10 Sant



Tramo 11: Santa Barbara




Tramo 12: Santa Barbara




	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINU URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-030-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA	CONTRATO No.	CMA-SIM-031-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS	SUBCAPITULO			
ITEM	3.04	ACERO DE REFUERZO Fy= 420 Mpa		UNIDAD	KG


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

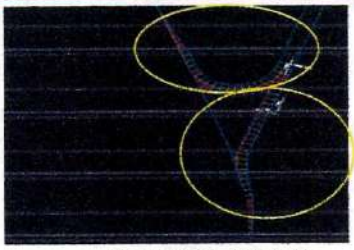

Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - AREA

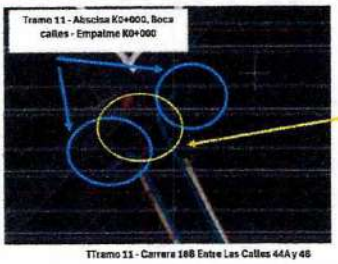

TTramo 11 - Carrera 16B Entre Las Calles 44A y 46

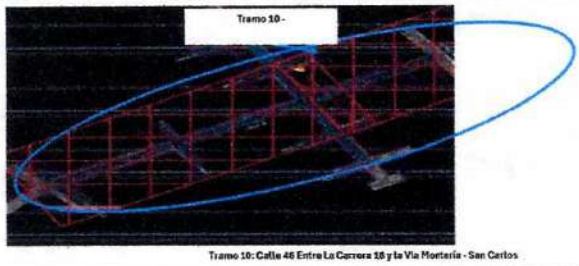

Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		AREA	DIMENSIÓN				CANTIDAD DE LOSAS	CANTIDAD TOTAL (Kg)
			ABSCISA INICIAL	ABSCISA INICIAL		LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	KG/M2	CANTIDAD DE ACE X m2		




DIRECTOR DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS	NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1 ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO:	MONTERIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SIM URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-039-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA	CONTRATO No.	CMA SIM 037 2024	FECHA:	27/11/2025
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
CAPÍTULO	4. SEÑALIZACION	SUBCAPITULO			
ITEM	4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.30m Y JUNTAS SELLADAS		UNIDAD	UND

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

Tramo: Villa Fátima



TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD DE SEÑALES	CANTIDAD ACUMULADA LONGITUD
			ABSCISA	CODIGO						
			CANTIDAD							
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41								11,00	11,00
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Lado Izquierdo	K0+013,18	SR-01					1,00	1,00
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Lado Izquierdo	K0+025,30	SR-01					1,00	1,00
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Lado Derecho	K0+033,55	SR-01					1,00	1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA".	Lado Izquierdo	K0+019,64	SR-01					1,00	1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA".	Lado Izquierdo	K0+097,40	SR-01					1,00	1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA".	Lado Derecho	K0+115,80	SR-01					1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+017,00	SR-01					1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+059,70	SR-01					1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+098,70	SR-01					1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+267,90	SR-01					1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+014,43	SR-01					1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+042,71	SR 01					1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+065,71	SR-01					1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+089,05	SR-01					1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+113,00	SR-01					1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+129,00	SR-01					1,00	1,00
			TOTAL ÍTEM							27,00

CANTIDAD CONTRACTUAL	69,00
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	13,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	14,00
SALDO POR COBRAR	42,00

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Tramo: Villa Fátima



Tramo 3



Tramo 4



Tramo 10



Tramo 11



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Pagina 1 de 1 ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	4. SEÑALIZACION		SUBCAPITULO		
ITEM	4,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM		UNIDAD	UNO

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

Tramo: Villa Fátima

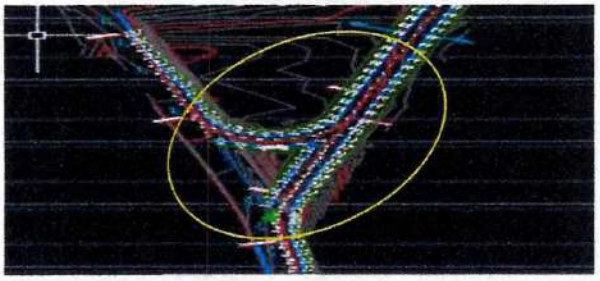

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD DE SEÑALES	CANTIDAD ACUMULADA LONGITUD
			ABSCISA	CODIGO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD DE LOSAS		
				CANTIDAD						
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41		K0+180,00						1,00	1,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41		K0+175,00						1,00	1,00
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 "EL MORA".	Lado Derecho	K0+023,20	SP-48 SR-30					1,00	1,00
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 "EL MORA".	Lado Izquierdo	K0+034,80	SP-48 SR-30					1,00	1,00
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".								2,00	2,00
								TOTAL ÍTEM		6,00

CANTIDAD CONTRACTUAL	6,00
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	2,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	4,00
SALDO POR COBRAR	-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO	ACTA PARCIAL No.4

Tramo: Villa Fátima



Tramo 3



Tramo 12



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-036-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO			SUBCAPITULO		
11bM	4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS		UNIDAD	M2

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

Tramo: Villa Fátima

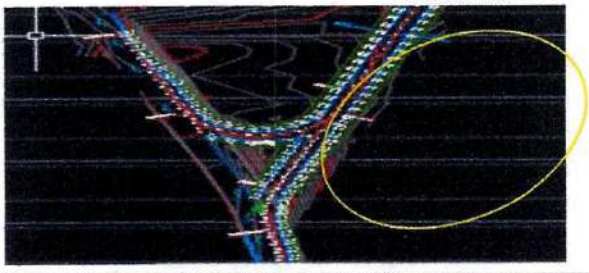

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				AREA (M2)	CANT TOTAL (M2)
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD		
			CANTIDAD							
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Cebra Peatonal	K0+010,00		4,00	0,40		8,00	12,80	12,80
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Linea Antes de Cebra	K0+010,00		3,35	0,40		2,00	2,68	2,68
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Cebra Peatonal	K0+165,00		4,00	0,40		9,00	14,40	14,40
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Linea Antes de Cebra	K0+165,00		3,35	0,40		2,00	2,68	2,68
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Flecha Simple	K0+014,60	1,2000				3,00	3,60	3,60
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Flecha un giro	K0+014,60	1,5338				1,00	1,53	1,53
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Flecha dos giros		2,21				1,00	2,21	2,21
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Pictograma carril de Aceleración		77,77				1,00	77,77	77,77
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Flechas delineadoras carril de aceleración		1,97				3,00	5,91	5,91
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Pictograma carril de Desaceleración		28,31				1,00	28,31	28,31
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Cebra Peatonal			4,00	0,40		14,00	22,40	22,40
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Linea Antes de Cebra			2,43	0,40		2,00	1,94	1,94
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Flecha Simple		1,2000				4,00	4,80	4,80
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Flecha un giro		1,5338				1,00	1,53	1,53
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Flecha de Frente y Giro		2,2100				2,00	4,42	4,42
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Flecha de frente y dos giros		3,2100				1,00	3,21	3,21
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Cebra Peatonal	K0+005,00		4,00	0,40		7,00	11,20	11,20
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Franja antes de cebra	K0+010,00		2,61	0,40		1,00	1,04	1,04
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Flecha Simple - Lado Izquierdo	K0+011,70	1,2220				1,00	1,22	1,22
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Flecha Simple - Lado Derecho	K0+011,70	1,2220				1,00	1,22	1,22
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Flecha Triple - Lado Derecho	K0+009,00	3,2100				1,00	3,21	3,21

TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Flecha Simple - Lado Izquierdo	K0+089,00	1,2220				1,00	1,22	1,22
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Franja antes de cebra	K0+096,70		2,61	0,40		1,00	1,04	1,04
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Cebra Peatonal	K0+097,70	9,75				1,00	9,75	9,75
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Cebra Peatonal	K0+011,60		4,00	0,40		7,00	11,20	11,20
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Franja antes de cebra	K0+016,50		2,71	0,40		1,00	1,08	1,08
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Flecha Triple - Lado Izquierdo	K0+018,00	3,2100				1,00	3,21	3,21
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Flecha Simple - Lado Derecho	K0+019,00	1,2220				1,00	1,22	1,22
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Cebra Peatonal	K0+062,40		4,00	0,40		7,00	11,20	11,20
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Cebra Peatonal	K0+100,20		4,00	0,40		7,00	11,20	11,20
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Flecha Triple - Lado Izquierdo	K0+166,20	3,2100				1,00	3,21	3,21
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Flecha Simple - Lado Derecho	K0+166,20	1,2220				1,00	1,22	1,22
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Franja antes de cebra	K0+173,40		2,71	0,40		1,00	1,08	1,08
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Cebra Peatonal	K0+175,20		4,00	0,40		7,00	11,20	11,20
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Cebra Peatonal	K0+190,40		4,00	0,40		7,00	11,20	11,20
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Franja antes de cebra	K0+195,00		2,71	0,40		1,00	1,08	1,08
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Flecha Triple - Lado Izquierdo	K0+197,00	3,2100				1,00	3,21	3,21
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Flecha Simple - Lado Derecho	K0+197,00	1,2220				1,00	1,22	1,22
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Flecha Triple - Lado Derecho	K0+262,00	3,2100				1,00	3,21	3,21
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Flecha Simple - Lado Izquierdo	K0+262,00	1,2220				1,00	1,22	1,22
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Franja antes de cebra	K0+268,00		2,71	0,40		1,00	1,08	1,08
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Cebra Peatonal	K0+269,30		4,00	0,40		7,00	11,20	11,20
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Cebra Peatonal	K0+006,50		4,00	0,40		7,00	11,20	11,20
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Franja antes de cebra	K0+011,40		2,61	0,40		1,00	1,04	1,04
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Flecha Triple - Lado Derecho	K0+012,80	3,2100				1,00	3,21	3,21
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Flecha Simple - Lado Izquierdo	K0+012,80	1,2220				1,00	1,22	1,22
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Cebra Peatonal	K0+026,50		4,00	0,40		7,00	11,20	11,20
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Cebra Peatonal	K0+045,20		4,00	0,40		7,00	11,20	11,20
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Flecha Triple - Lado Derecho	K0+058,50	3,2100				1,00	3,21	3,21
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Flecha Simple - Lado Izquierdo	K0+058,50	1,2220				1,00	1,22	1,22
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Franja antes de cebra	K0+065,70		2,61	0,40		1,00	1,04	1,04
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Cebra Peatonal	K0+067,00		4,00	0,40		7,00	11,20	11,20
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Cebra Peatonal	K0+083,50		4,00	0,40		7,00	11,20	11,20
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Franja antes de cebra	K0+089,20		2,61	0,40		1,00	1,04	1,04
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Flecha Triple - Lado Izquierdo	K0+090,20	3,2100				1,00	3,21	3,21
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Flecha Simple - Lado Derecho	K0+090,20	1,2220				1,00	1,22	1,22
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Cebra Peatonal	K0+105,80		4,00	0,40		7,00	11,20	11,20
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Cebra Peatonal	K0+122,00		4,00	0,40		7,00	11,20	11,20
TRAMO 11	CRA 18D ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Flecha Triple - Lado Derecho	K0+137,70	3,2100				1,00	3,21	3,21

TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Flecha Simple - Lado Izquierdo	K0+137,70	1,2220				1,00	1,22	1,22
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Franja antes de cebra	K0+144,40		2,61	0,40		1,00	1,04	1,04
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Cebra Peatonal	K0+145,50		4,00	0,40		7,00	11,20	11,20
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Cebra Peatonal	K0+005,20		4,00	0,40		8,00	12,80	12,80
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Franja antes de cebra	K0+011,20		2,75	0,40		1,00	1,10	1,10
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Flecha Simple - Lado Derecho	K0+014,60	1,2000				1,00	1,20	1,20
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Flecha un giro - Lado Izquierdo	K0+014,60	1,5338				1,00	1,53	1,53
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Flecha Simple - Lado Izquierdo	K0+136,50	1,2000				1,00	1,20	1,20
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Flecha un giro - Lado Derecho	K0+136,50	1,5338				1,00	1,53	1,53
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Franja antes de cebra	K0+143,40		2,75	0,40		1,00	1,10	1,10
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Cebra Peatonal	K0+145,00		4,00	0,40		8,00	12,80	12,80
									TOTAL ÍTEM	454,15

CANTIDAD CONTRACTUAL	662,45
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	454,15
SALDO POR COBRAR	208,30

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tramo: Villa Fátima



Tramo: 10



Tramo: 11



Tramo: 12



Tramo: 3



Tramo: 4



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-031-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	4. SEÑALIZACION		SUBCAPITULO		
ITEM	4,04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS		UNIDAD	M

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

Tramo: Villa Fátima

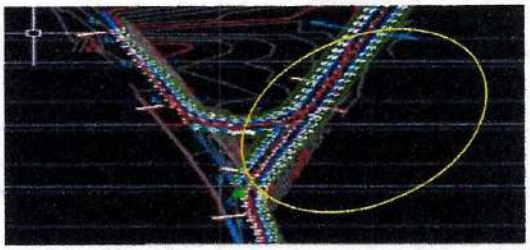

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				LONGITUD	CANT TOTAL (M)
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	K/G	CANTIDAD		
			CANTIDAD							
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Eje Tramo Recto			175,2000			1,00	175,20	175,20
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Eje Carril de Aceleración			56,6341			1,00	56,63	56,63
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Borde Derecho (tramo recto y carril de aceleración)			275,5683			1,00	275,57	275,57
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Borde Derecho (tramo recta y carril de aceleración)			46,8241			1,00	46,82	46,82
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Borde Izquierdo (tramo recto y carril de desaceleración)			311,6106			1,00	311,61	311,61
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Borde exterieo carril de aceleración y desaceleración			124,1245			1,00	124,12	124,12
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Borde pavimento existente			56,5259			1,00	56,53	56,53
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Borde pavimento existente			11,2400			1,00	11,24	11,24
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Borde pavimento existente			28,3433			1,00	28,34	28,34
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Borde pavimento existente			48,1661			1,00	48,17	48,17
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	EJE			105,0000			1,00	105,00	105,00
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Borde Izquierdo			106,0000			1,00	106,00	106,00
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Borde Derecho			117,8000			1,00	117,80	117,80
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Eje			101,9920			1,00	101,99	101,99
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Borde Derecho			105,5500			1,00	105,55	105,55
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Borde Izquierdo			106,1500			1,00	106,15	106,15
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Eje	K0+009,00		226,68			1,00	226,68	226,68
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Borde Derecho	K0+009,00		256,64			1,00	256,64	256,64
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Borde Izquierdo	K0+009,00		257,95			1,00	257,95	257,95
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 45 - "SANTA BARBARA"	Eje			98,39			1,00	98,39	98,39
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 45 - "SANTA BARBARA"	Borde Izquierdo y Derecho	K0+009,00		139,27			2,00	278,53	278,53
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Eje y Bordes	K0+010,40		133,43			3,00	400,29	400,29
									TOTAL ÍTEM	3292,93

CANTIDAD CONTRACTUAL	11.478,71
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	3.292,93
SALDO POR COBRAR	8.185,78

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No. 4
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Tramo: Villa Fátima



Tramo: 10

Tramo: 11



Tramo: 12



Tramo: 3



Tramo: 4



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1 ACTA PARCIAL No.4


DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO:	MONTERIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINU URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-020-2023		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CPM-SIM-027-2024	FECHA	27/10/2025
PROPIETARIO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	1. ESPACIO PUBLICO ANDENES Y HOBILIARIO		SUBCAPITULO		
ITEM	5.05	SOLADO EN CONCRETO 3000 PSI, ESPESOR PROMEDIO DE 0.20m, INCLUYE: SUMINISTRO, FORMALETA, VIBRADO, CURADO, ACABADO ESCOBEADO, ACABADO FINAL CON MAQUINA ALISADORA, CORTES DE DILATACION, CONFORMACION DE SUBRASANTE, RETIRO DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO POR LA INTERVENTORIA, EXCEPTO EL SUMINISTRO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA.	UNIDAD	M


CANTIDADES ACTA PARCIAL No. 4




Tramo 10 y 11: Santa Barbara



Tramo 4: El Mora



Tramo 5: Altos de la Floresta



TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN ABSCISA	LOCALIZACIÓN VOLUMEN EXCAVADO	DIMENSIÓN LONGITUD / ALTO(m)	DIMENSIÓN ANCHO (m)	DIMENSIÓN EJE	DIMENSIÓN CANTIDAD	LONGITUD (m)	CANTIDAD (m)
CANTERO										
VILLA FATIMA	SALIDA DE LOSBARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FATIMA Y VILLA SORAYATO HACIA LA CALLE 41	Lado Izquierdo y Alrededores de Desarticulación	K0+000,00		569,1649				569,55	569,55
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Izquierdo			215,00				215,00	215,00
[illegible]	CRAS PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44 (SENTIDO SUR - NORTE)	Lado Izquierdo			170,00				170,00	170,00
TRAMO 2	CRA 10E ENTRE LAS CALLES 39 Y 39 - "SAN JOSE"	Lado Izquierdo	K0+115,00		114,00				114,00	114,00
TRAMO 3	CRA 10C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA"	Lado Derecho	K0+155,00		24,59				24,59	24,59
TRAMO 3	CRA 10C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA"	Lado Izquierdo	K0+155,00		25,00				25,00	25,00
TRAMO 4	CRA 9SD ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Derecho			48,50				48,50	48,50
TRAMO 4	CRA 9SD ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo			77,61				77,61	77,61
TRAMO 5	CRA 10A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "SECTOR DE LA FLORESTA"	Lado D	K0+000,00		22,00				22,00	22,00
TRAMO 5	CRA 10A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "SECTOR DE LA FLORESTA"	Lado Izquierdo			12,24				12,24	12,24
TRAMO 6	CRA 10A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "SECTOR DE LA FLORESTA"	Lado Izquierdo			38,40				38,40	38,40
TRAMO 8	CRA 2E ENTRE LAS CALLES 39 Y 39 - "SAN JOSE"	Lado Izquierdo	K0+000 - K0+150		102,30			1,00	102,30	102,30
TRAMO 8	CRA 2E ENTRE LAS CALLES 39 Y 39 - "SAN JOSE"	Lado Derecho	K0+000 - K0+150		105,85			1,00	105,85	105,85
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 1B Y LA VIA MONTERIA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+000 - K0+274		163,59			1,00	163,59	163,59
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 1B Y LA VIA MONTERIA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+000 - K0+274		200,83			1,00	200,83	200,83
TRAMO 11	CRA 1BB ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+000,00		76,33				76,33	76,33
TRAMO 11	CRA 1BB ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+000,00		70,72				70,72	70,72
TRAMO 12	CRA 1BC ENTRE LAS CRAS 39 Y 39 - "SAN JOSE"	Entre Ejes	K0+112,00		99,34				99,34	99,34
									TOTAL ÍTEM	2354,39

CANTIDAD CONTRACTUAL	5.821,74
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	1.407,30
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	748,08
SALDO POR COBRAR	3.670,35

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Tramo: Villa Fátima



Tramo 3 El Mora



Tramo 4 El Mora



Tramo 5 Altos de la floresta



Tramo 6 San Jose



Tramo 10 Santa Barbara



Tramo 11 Santa Barbara



Tramo 12 San Jose



Tramo 2



Tramo 3



DIRECTOR DE OBRA	
DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO FREITO SANCHEZ
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				


CAPITULO	5. ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS	SUBCAPITULO			
ITEM	5,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.4 CH, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA		UNIDAD	M

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4


Tramo: Villa Fátima




Tramo 10 y 11: Santa Barbara

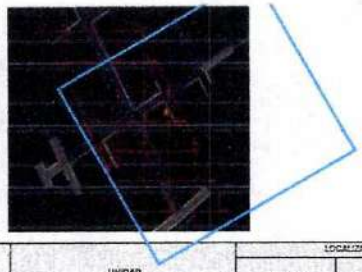

Tramo 12: San Jose



Tramo 4: El Mora



TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				LONGITUD (M)	CANT TOTAL (m)
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD		
		CANTIDAD								
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Lado Izquierdo y Alineamiento de Desaceleración	K0+095,00		569,5500				569,55	569,55
SUROF	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Izquierdo			215,00				215,00	215,00
SAN FRANCISCO	CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)	Lado Izquierdo			150,00				150,00	150,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo	K0+115,00		114,00				114,00	114,00
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Lado Derecho	K0+155,90		24,59				24,59	24,59
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Lado Izquierdo	K0+150,00		60,39				60,39	60,39
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Derecho			48,30				48,30	48,30
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo			77,61				77,61	77,61
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Lado D	K0+055,00		22,40				22,40	22,40
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Lado Izquierdo			12,24				12,24	12,24
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Lado Izquierdo			38,40				38,40	38,40
TRAMO 6	CRA 16 ENTRE LAS CALLES 39 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo	K0+050 - K0+150		102,30			1,00	102,30	102,30
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+060 - K0+150		105,85			1,00	105,85	105,85
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+000 - K0+274		163,59			1,00	163,59	163,59
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+000 - K0+274		200,83			1,00	200,83	200,83
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+000,00		76,33				76,33	76,33
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+000,00		70,72				70,72	70,72
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Borde Der	K0+112,00		99,34				99,34	99,34
		TOTAL ÍTEM								2156,39

CANTIDAD CONTRACTUAL	5.631,74
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	1.410,28
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	746,11
SALDO POR COBRAR	3.475,35

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

REGISTRO FOTOGRAFICO

Villa Fatima



SAN FRANCISCO



Tramo 3



Tramo 4



Tramo 5



Tramo 6



Tramo 10



Tramo 11: Santa Barbara



Tramo 12



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				


CAPITULO	5. ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS	SUBCAPITULO			
ITEM	5,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.		UNIDAD	M2

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4


Tramo: Villa Fátima

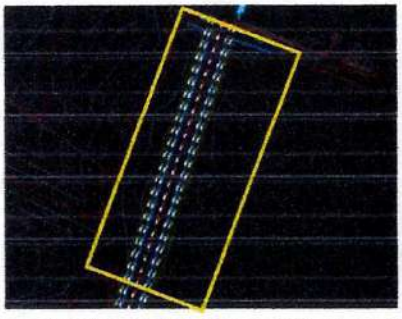


Tramo 10 y 11: Santa Barbara

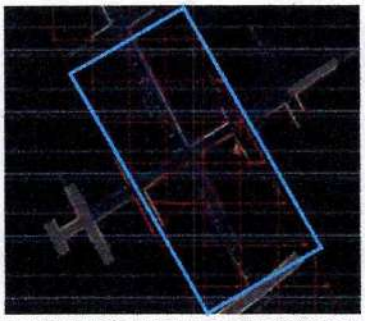

Tramo 12: San Jose

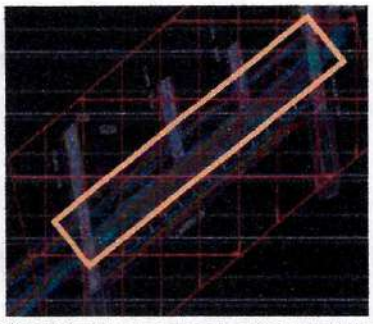

Tramo 4: El Mora

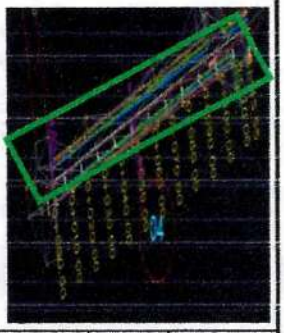

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				AREA	AREA ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	ESPESOR (M)	CANTIDAD DE LOSAS		
			CANTIDAD							
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Lado Derecho y Alineamiento de Aceleración	K0+095,00		266,0660	0,70			186,25	186,25
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	Lado Izquierdo y Alineamiento de Desaceleración	K0+095,00		303,0600	0,70			212,14	212,14
SAN FRANCISCO	CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)	Lado Izquierdo			150,00	0,70			105,00	105,00
SUCRE	AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44	Lado Izquierdo			215,00	0,70			150,50	150,50
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo	K0+115,00		114,00	0,70			79,80	79,80
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Lado Derecho	K0+155,00		24,59	0,70			17,21	17,21
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Lado Izquierdo	K0+155,00		65,35	0,70			45,75	45,75
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Derecho			48,30	0,70			33,81	33,81
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo			77,61	0,70			54,33	54,33
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Lado D	K0+055,00		22,40	0,70			15,68	15,68
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Lado Izquierdo			12,24	0,70			8,57	8,57
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"	Lado Izquierdo			38,40	0,70			26,88	26,88
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Izquierdo	K0+090 - K0+150		102,30	0,70			71,61	71,61
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+080 - K0+150		105,85	0,70			74,10	74,10

TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+000 - K0+274		163,59	0,70			114,51	114,51
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+000 - K0+274		200,83	0,70			140,58	140,58
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+000,00		76,33	0,70			53,43	53,43
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+000,00		70,72	0,70			49,50	49,50
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Borde Der	K0+112,00		99,34	0,70			69,54	69,54
TOTAL ÍTEM										1509,18

CANTIDAD CONTRACTUAL	4.480,27
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	987,20
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	521,98
SALDO POR COBRAR	2.971,09

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tramo: Villa Fátima



Tramo 3



Tramo 4



Tramo 5



Tramo 6



Tramo 10



Tramo 11: Santa Barbara



Tramo 12



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				


CAPITULO	5. ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS	SUBCAPITULO			
ITEM	5,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO		UNIDAD	M2

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

Tramo: Santa Barbara

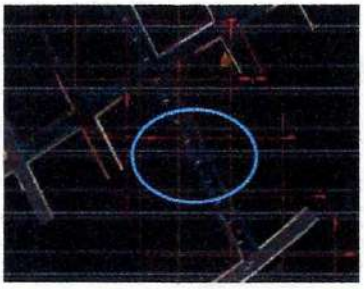

Tramo: Santa Barbara

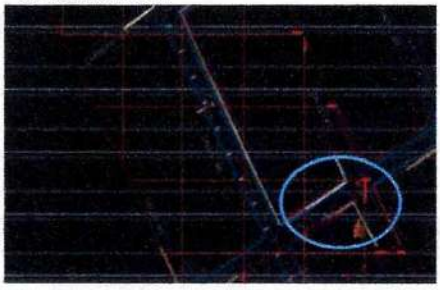

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANT	UND ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	CANTIDAD	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD DE LOSAS		
			CÁNTIDAD							
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41		K0+005,00						2,00	2,00
VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FÁTIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41		K0+175,00						2,00	2,00
SUCRE		Lado Izquierdo	K0+000,00						1,00	1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".								4,00	4,00
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Lado Derecho	K0+005,30						1,00	1,00
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Lado Izquierdo	K0+005,30						1,00	1,00
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Lado Izquierdo	K0+017,60						1,00	1,00
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Lado Izquierdo	K0+037,40						1,00	1,00
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".	Lado Izquierdo	K0+090,00						1,00	1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Derecho	K0+003,30						1,00	1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo	K0+004,27						1,00	1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Derecho	K0+100,00						1,00	1,00
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"		K0+004,00						2,00	2,00
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"		K0+038,00						2,00	2,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".		K0+005,00						2,00	2,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".		K0+142,00						2,00	2,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+010,50						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+010,50						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+081,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+081,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+099,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+099,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+173,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+175,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+189,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+189,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+268,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+268,00						1,00	1,00

TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+005,36						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+005,36						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+025,31						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+025,31						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+044,00						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+044,00						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+066,00						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+066,00						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+082,27						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+082,27						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+104,50						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+104,50						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+121,50						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+121,50						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Derecho	K0+144,70						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - "SANTA BARBARA"	Lado Izquierdo	K0+144,70						1,00	1,00
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".		K0+005,00						1,00	1,00
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".		K0+138,00						1,00	1,00
			TOTAL ÍTEM							55,00

CANTIDAD CONTRACTUAL	95,00
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	36,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	19,00
SALDO POR COBRAR	40,00

Villa Fatima



Tramo 3



Tramo 4



Tramo 5



Tramo 6



Tramo 10



Tramo 11



Tramo 12



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	5. ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS	SUBCAPITULO			
ITEM	5,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UNIDAD	UND	

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

Tramo 11: Santa Barbara

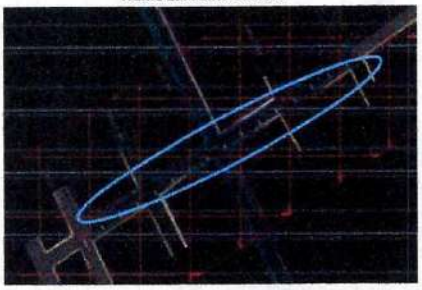

Tramo 10: Santa Barbara



TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANT ACUMULADO
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	CANTIDAD	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD DE LOSAS		
CANTIDAD										
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".		K0+252,00						2,00	2,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".		K0+339,00						1,00	1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".		K0+417,00						1,00	1,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".		K0+427,00						1,00	1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo	K0+009,40						1,00	1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Derecho	K0+024,70						1,00	1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo	K0+029,14						2,00	2,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Derecho	K0+033,00						1,00	1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo	K0+044,13						1,00	1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Derecho	K0+046,20						2,00	2,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo	K0+048,15						1,00	1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo	K0+057,50						1,00	1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Derecho	K0+059,60						1,00	1,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo	K0+064,20						2,00	2,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo	K0+083,20						2,00	2,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"	Lado Izquierdo	K0+095,00						1,00	1,00
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"		K0+015,00						1,00	1,00
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"		K0+025,00						1,00	1,00
TRAMO 5	CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - "ALTOS DE LA FLORESTA"		K0+040,00						1,00	1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Derecho	K0+002,00						1,00	1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Derecho	K0+013,00						1,00	1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Derecho	K0+017,00						1,00	1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Izquierdo	K0+047,00						1,00	1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Izquierdo	K0+058,00						1,00	1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Derecho	K0+060,00						1,00	1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Derecho	K0+070,00						1,00	1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Izquierdo	K0+090,00						1,00	1,00

TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Derecho	K0+092,00						1,00	1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Derecho	K0+110,00						1,00	1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Izquierdo	K0+110,00						1,00	1,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Izquierdo	K0+110,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+028,60						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+036,50						2,00	2,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+037,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+049,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+059,75						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+070,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+107,30						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+120,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+128,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+144,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+158,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+171,00						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+199,30						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+221,50						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+226,50						1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+232,50						5,00	5,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+258,60						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+015,00						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+018,70						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	Izquierdo	K0+020,70						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+054,40						1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	Derecho	K0+096,80						1,00	1,00
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+031,30						1,00	1,00
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+046,19						1,00	1,00
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+068,84						1,00	1,00
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+089,40						1,00	1,00
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+096,65						2,00	2,00
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+124,80						1,00	1,00
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+133,00						1,00	1,00
TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - "SAN JOSÉ".	Lado Derecho	K0+145,00						1,00	1,00
									TOTAL ÍTEM	72,00

CANTIDAD CONTRACTUAL	87,00
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	49,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	23,00
SALDO POR COBRAR	15,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

REGISTRO FOTOGRAFICO

Tramo 4 El mora



Tramo 5



Tramo 6 San Jose



Tramo 10 San Barbara



Tramo 11 Santa Barbara



Tramo 12 Santa Barbara



DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
FIRMA	


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINU URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIN-035-2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA	CONTRATO No.	CMA-SIN-037-2024
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:	
OBJETO:	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA		
CAPITULO	5. ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS	SUBCAPITULO	
ITEM	5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO H63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UNIDAD: UND

FECHA:

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

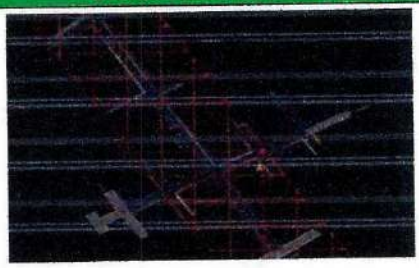

LADO	TRAMO	DIRECCIÓN	LOCALIZACIÓN ABSCISA						CANTIDAD	CANT TOTAL
	VILLA FÁTIMA	SALIDA DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO, VILLA FATIMA Y VILLA SORRENTO HACIA LA CALLE 41	K0+020,00						8,00	8,00
	TRAMO 2	CRA 15B ENTRE LAS CALLES 39 Y 39 - "SAN JOSE".							4,00	4,00
	TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - "EL MORA".							12,00	12,00
	TRAMO 4	CRA 18D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA"							32,00	32,00
	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+010,00	Rampa Peatonal					4,00	4,00
Izquierdo	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+020,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
Izquierdo	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+025,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
Derecho	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+034,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
Derecho	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+050,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
Derecho	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+055,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
Derecho	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+065,00	Rampa Vehicular					1,00	1,00
	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+090,00	Rampa Peatonal					4,00	4,00
	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+100,00	Rampa Peatonal					4,00	4,00
Izquierdo	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+110,00	Rampa Vehicular					1,00	1,00
Izquierdo	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+124,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
Izquierdo	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+130,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
Izquierdo	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+140,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
Izquierdo	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+150,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
Izquierdo	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+175,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+180,00	Rampa Peatonal					4,00	4,00
	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+195,00	Rampa Peatonal					4,00	4,00
Izquierdo	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+200,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
Izquierdo	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+210,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
Derecho	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+214,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
Izquierdo	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+230,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
Izquierdo	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+258,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
Derecho	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+265,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
	TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"	K0+270,00	Rampa Peatonal					4,00	4,00
	TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	K0+000,00	Rampa Peatonal					4,00	4,00
Izquierdo	TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	K0+020,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
Derecho	TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	K0+020,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
Izquierdo	TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	K0+030,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
	TRAMO 11	CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"	K0+030,00	Rampa Peatonal					4,00	4,00

	TRAMO 11	CRA 15B ENTRE LAS CALLES 44A Y 45 - "SANTA BARBARA"	K0+045,00	Rampa Peatonal					4,00	4,00
Derecho	TRAMO 11	CRA 15B ENTRE LAS CALLES 44A Y 45 - "SANTA BARBARA"	K0+057,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
	TRAMO 11	CRA 15B ENTRE LAS CALLES 44A Y 45 - "SANTA BARBARA"	K0+070,00	Rampa Peatonal					4,00	4,00
	TRAMO 11	CRA 15B ENTRE LAS CALLES 44A Y 45 - "SANTA BARBARA"	K0+082,00	Rampa Peatonal					4,00	4,00
Derecho	TRAMO 11	CRA 15B ENTRE LAS CALLES 44A Y 45 - "SANTA BARBARA"	K0+100,00	Rampa Vehicular					2,00	2,00
	TRAMO 11	CRA 15B ENTRE LAS CALLES 44A Y 45 - "SANTA BARBARA"	K0+110,00	Rampa Peatonal					4,00	4,00
	TRAMO 11	CRA 15B ENTRE LAS CALLES 44A Y 45 - "SANTA BARBARA"	K0+120,00	Rampa Peatonal					4,00	4,00
	TRAMO 11	CRA 15B ENTRE LAS CALLES 44A Y 45 - "SANTA BARBARA"	K0+150,00	Rampa Peatonal					4,00	4,00
	TRAMO 12	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 35 Y 35 - "SAN JOSÉ".	K0+032,20	Rampa Vehicular					20,00	20,00
TOTAL ÍTEM										176,00

CANTIDAD CONTRACTUAL	364,00
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	8,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	168,00
SALDO POR COBRAR	188,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

REGISTRO FOTOGRAFICO

VILLA FATIMA



Tramo 9



Tramo 4



Tramo 6 San Jose




Tramo 10



Tramo 12



Tramo 11

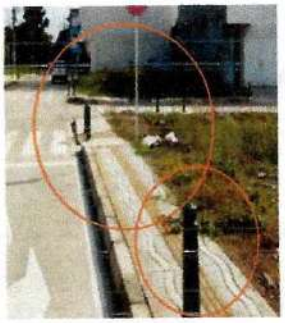


DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/08/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINU URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-002-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA MONTERIA	CONTRATO No.	CMA-SIM-017-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	6. OTRAS ACTIVIDADES	SUBCAPITULO			
ITEM	6.01	SUMINISTRO PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4", INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO		UNIDAD	UND


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4



Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Monteria - San Carlos y Tramo 11: Carrera 16B Entre Las Calles 44A y 46



Tramo 12: Carreras 18C Entre Las Carreras 36 y 38



Tramo 2: Carrera 16B Entre Las Calles 29 y 39

Tramo 4: Carrera 15D Entre Las Calles 40A y 40B

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				LONGITUD	LONGITUD ACUMULADO POR
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KD	CANTIDAD		
	CANTIDAD									
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".		KD+105,00		9,00			1,00	9,00	9,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".		KD+145,00		9,00			1,00	9,00	9,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".		KD+216,00		9,25			2,00	18,50	18,50
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".		KD+225,00		10,00			1,00	10,00	10,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".		KD+245,00		27,40			1,00	27,40	27,40
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".		KD+320,00		9,20			1,00	9,20	9,20
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".		KD+460,00		11,00			2,00	22,00	22,00
TRAMO 2	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - "SAN JOSÉ".		KD+480,00		9,00			1,00	9,00	9,00
TRAMO 4	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - "EL MORA".		KD+030,00		2,00			1,00	2,00	2,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"		KD+020		1,00			1,00	1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"		KD+025		1,00			1,00	1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"		KD+030		1,00			1,00	1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"		KD+035		1,00			1,00	1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"		KD+040		6,00			1,00	6,00	6,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"		KD+045		1,00			1,00	1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"		KD+050		1,00			1,00	1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"		KD+070		1,00			1,00	1,00	1,00
TRAMO 10	CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VIA MONTERÍA - SAN CARLOS "SANTA BARBARA"		KD+075		1,00			1,00	1,00	1,00
TRAMO 11	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"		KD+100,00		12,00			1,00	12,00	12,00
TRAMO 11	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"		KD+100,00		3,00			1,00	3,00	3,00
TRAMO 11	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 44A Y 46 - "SANTA BARBARA"		KD+060 a KD+040		27,00			1,00	27,00	27,00
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 36 Y 38 - "SAN JOSÉ".		KD+103,00		9,00			1,00	9,00	9,00
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 36 Y 38 - "SAN JOSÉ".		KD+097,00		9,00			1,00	9,00	9,00
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 36 Y 38 - "SAN JOSÉ".		KD+086,00		9,00			1,00	9,00	9,00
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 36 Y 38 - "SAN JOSÉ".		KD+074,00		9,00			1,00	9,00	9,00
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 36 Y 38 - "SAN JOSÉ".		KD+058,00		9,00			1,00	9,00	9,00
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 36 Y 38 - "SAN JOSÉ".		KD+047,00		9,00			1,00	9,00	9,00
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 36 Y 38 - "SAN JOSÉ".		KD+044,00		9,00			1,00	9,00	9,00
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 36 Y 38 - "SAN JOSÉ".		KD+030,00		9,00			1,00	9,00	9,00
TRAMO 12	CRA 18C ENTRE LAS CRAS 36 Y 38 - "SAN JOSÉ".		KD+029,00		9,00			1,00	9,00	9,00
	TOTAL ITEM									[illegible]

CANTIDAD CONTRACTUAL	365,50
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	341,10
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	9,00
SALDO POR COBRAR	15,40

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No.4
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

Tramo 4: El Mora



Tramo 2: San José



Tramo 10: Santa Barbara



Tramo 11: Santa Barbara



RESPONSABLE DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-005-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	[illegible]	FECHA	[illegible]
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS		SUBCAPITULO		
ITEM	NP1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (43 Kg/cm2)		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4




Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Concreto MR 40 kg/cm2, Abscisas K0+000 Hasta k0+182 Carril Derecho, k0+124,5 hasta k0+248,5



Tramo 3: Carrera 15C Entre Las Calles 46A y 41



Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y La Via Montería - San Carlos - Concreto MR 40 kg/cm2



Tramo 12: Carrera 16C Entre Las Carreras 38 y 39 - Concreto MR 40 kg/cm2

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN (m³)	CANT TOTAL (m³)
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)		
CANTIDADES										
	BUCRE		K0+000 AL K0+020		20,00	6,50	0,22		28,60	28,60
			K0+020 AL K0+107		87,00	6,00	0,22		114,84	143,44
			K0+207 AL K0+330		123,00	6,00	0,22		162,36	305,80
			K0+330 AL K0+410		71,70	6,00	0,22		94,64	400,44
			K0+450 AL K0+500		50,00	6,00	0,22		66,00	466,44
	SAN FRANCISCO									
			TOTAL ITEM							466,44


CANTIDAD CONTRACTUAL	767,02
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	466,44
SALDO POR COBRAR	300,58

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No. 4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	PERIODO	FECHAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINU URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-005-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CTMA-SIM-057-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y SOBRILLOS	SUBCAPITULO			
ITEM	KP1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR(43 kg/cm2)		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4




Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Concreto MR 40 kg/cm2, Abscisas K0+000 Hasta k0+182 Carril Derecho, k0+194,5 hasta k0+248,5



Tramo 3: Carrera 15C Entre Las Calles 40A y 41



Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos - Concreto MR 40 kg/cm2



Tramo 12: Carrera 18C Entre Las Carreras 38 y 38 - Concreto MR 40 kg/cm2

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN (m³)	CANT TOTAL (m³)
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)		

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 4

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUCRE









DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	


DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINJ URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO P-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	6. OTRAS ACTIVIDADES	SUBCAPITULO			
ITEM	6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.		UNIDAD	UND

CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4

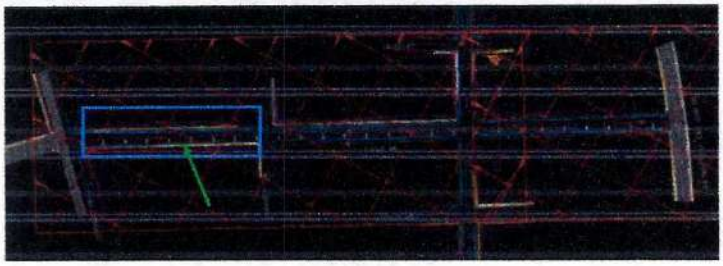

Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Vía Montería - San Carlos y Tramo 11: Carrera 18B Entre Las Calles 44A y 46

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANT ACUMULADO ML
			ABSCISA	VOLUMEN EXCAVADO	LONGITUD / ALTO(m)	ANCHO (m)	KG	CANTIDAD		
CANTIDAD										
TRAMO 3	CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 -								3,00	3,00
TRAMO 6	CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 -		K0+080,00						1,00	1,00
TOTAL ÍTEM										4,00

CANTIDAD CONTRACTUAL	177,00
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	3,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	1,00
SALDO POR COBRAR	173,00

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.4

REGISTRO FOTOGRAFICO




DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	ACTA PARCIAL No. 4

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	27/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO ENFUERSANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-035-2024		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.	CTIA-SIM-057-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS CONURAS T Y 6 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS	SUBCAPITULO			
ITEM	NP2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)		UNIDAD	M3


CANTIDADES ACTA PARCIAL No.4




Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Concreto MR 40 kg/cm2, Abscisas K0+000 Hasta k0+182 Carril Derecho, k0+184,5 hasta k0+248,5



Tramo 3: Carrera 15C Entre Las Calles 40A y 41



Tramo 10: Calle 46 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos- Concreto MR 40 kg/cm2



Tramo 12: Carrera 15C Entre Las Carreras 38 y 39 - Concreto MR 40 kg/cm2

TRAMO	DESCRIPCIÓN ITEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN (m³)	CANT TOTAL (m³)
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)		
	CANTIDADES									
	CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)		K0+325 - K0+305		319,00	7,09	0,2		445,60	445,60
	CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)									
	CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)									
	SAN FRANCISCO									
	TOTAL ITEM									445,60


CANTIDAD CONTRACTUAL	457,96
CANTIDAD COBRADA ACTAS ANTERIORES	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA No.4	445,60
SALDO POR COBRAR	11,36

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No. 4

DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO:	MONTERIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINU URBANO	CONTRATO No.	CONTRATO LP-SIM-935-2024	FECHA	29/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA	CONTRATO No.:	IDMA-SIM-057-2024		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No:			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN 8 BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.				
CAPITULO	3. PAVIMENTO Y BORDILLOS		SUBCAPITULO		
ITEM	MP2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)		UNIDAD	M2


CANTIDADES ACTA PARCIAL No. 4




Villa Fatima Salida Hacia La Calle 41 - Concreto MR 40 kg/cm2, Abscisas K0+000 Hasta k0+182 Carril Derecho, k0+184,5 hasta k2+248,5



Tramo 3: Carrera 15C Entre Las Calles 40A y 41



Tramo 10: Calle 48 Entre La Carrera 18 y la Via Montería - San Carlos - Concreto MR 40 kg/cm2



Tramo 12: Carrera 18C Entre Las Carreras 38 y 39 - Concreto MR 40 kg/cm2

TRAMO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	LADO	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				VOLUMEN (m³)	CANT TOTAL (m²)
			ABSCISA	AREA	LONGITUD / ALTO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)		

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 4

REGISTRO FOTOGRAFICO

VILLA FÁTIMA









DIRECTOR DE OBRA	
NOMBRE	JORGE IVAN MEZA HOYOS
FIRMA	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
FIRMA	

7. Informes Semanales de Interventoría Correspondientes al Periodo a Cobrar

26. Informe Semanal N°26 ok

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA		DE	
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	1	9	2025	SEMANA No.:	26	DEL	24-ago-25	AL	30-ago-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15.436.620.455,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974.933.670,00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15.436.620.455,00	PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 974.933.670,00
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA			SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA		
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0,00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	1.670.972.179,00
PARCIAL 1:	$ 1.670.972.179,00	PAGADA 13/6/2025	% AVANCE FINANCIERO:	22,65%	
PARCIAL 2:	$ 1.825.389.063,00	En tramite			
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	15,00	578,10
1,02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	15,00	35,57
1,03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	115,00	561,30
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	62,00	661,30
1,05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0,00	0,00
1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	2050,00	11315,28
1,07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	35,00	183,78
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	2606,25	14352,22
1,09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	12,00	21,00
1,10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	5,00	48,00
1,11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	1,00	4,00
1,12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0,00	0,00
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE		0,00	0,00
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0,00	1373,10
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	320,00	748,23
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	520,00	5202,27
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	720,00	2591,90
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	2500,00	15436,24
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS		0,00	0,00
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	460,00	2416,58
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	5,00	5,00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	460,00	2132,93
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mpa.	KG	2500,00	15447,49
4.00	SEÑALIZACIÓN		0,00	0,00
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	8,00	13,00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	2,00	2,00
4.03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	0,00	0,00
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0,00	0,00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADA.	M	0,00	0,00
5.00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS		0,00	0,00
5.01	SM TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCA. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	350,00	1407,41
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	353,00	1410,41
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0.08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	250,00	990,19
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	18,00	36,00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	28,00	49,00

5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0,00	8,00
6.00	**OTRAS ACTIVIDADES**		0,00	0,00
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4" INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	15,00	243,10
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0,00	111,00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0,00	3,00
7.00	**BOX CULVERT**		0,00	0,00
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA.	M^3	0,00	0,00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0,00	0,00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	0,00	0,00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2	0,00	0,00
1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0,00	0,00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0,00	0,00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3	0,00	0,00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3	0,00	0,00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mpa.	KG	0,00	0,00
7.10	BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR.	M	0,00	0,00
8.00	**REDES ELECTRICAS**		0,00	0,00
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**		0,00	0,00
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M	0,00	0,00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF)	UND	0,00	0,00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0,00	0,00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0,00	0,00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0,00	0,00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND	0,00	0,00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0,00	0,00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0,00	0,00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0,00	0,00
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0,00	0,00
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0,00	0,00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0,00	0,00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0,00	0,00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0,00	0,00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0,00	0,00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0,00	0,00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0,00	0,00
8.3	**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**		0,00	0,00
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0,00	0,00
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**		0,00	0,00
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0,00	0,00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0,00	0,00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	0,00	0,00

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	17,54%	36,85%	24,24%
DURANTE EL PERIODO	4,23%	9,16%	
ACUMULADO ACTUAL	21,77%	46,01%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Registro de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión y a la compresión.
Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de Sucre
Excavación en material común e instalación de material de mejoramiento en el tramo de N°5 - Altos de la Floresta
Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo N°5 - Altos de la floresta.
Vaciado de concreto en tramo N°4 del barrio el mora, San José tramo N°2.
Excavación en material común de préstamo en tramo San Francisco e instalación de material de mejoramiento de subbase granular.
Vaciado de concreto en tramo de vía N°6 - San José, sucre.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado.
Participación en comités de obra semanales.
Seguimiento a compromisos del contratista de obra
Registro diario actividades en la bitácora de obra

VII.COMPONENTE SOCIAL

Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del contratista de obra en las actas de PQRS.

VIII.COMPONENTE PM I

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Tránsito.
Se realizan algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejorar el control vehicular en los sectores intervenidos.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES

VILLA FÁTIMA

- Ya fue inaugurado este tramo vial y esta pendiente el relleno del espacio comprendido entre los carriles de entrada y salida (jardinera triangular). La interventoria solicitó el reforzamiento de la pintura de piso en los accesos de entrada y salida (por garantía de calidad)

SAN JOSÉ

CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - Tramo 12
- Suministro el instalación de bordillos prefabricados.

CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - Tramo 2
- Vaciado de placas de pavimento en concreto hidráulico del K0+273 al k0+333.

CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 TRAMO 6
- Corte de piso, para la construcción de andenes.
- Demolición de andenes existentes, para la construcción de andenes nuevos, según diseño.
- Tala de árboles con altura entre 5.1 metros y 10 metros en el K0+112 y K0+108, lado izquierdo.
- Vaciado de placas de pavimento en concreto hidráulico del K0+085 al k0+050.
- Suministro, e instalación de bordillos prefabricados.
- Corte, armado y figurado de acero de refuerzo para placas de pavimento de geometría irregular.

SANTA BARBARA

CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - Tramo 11
- Vaciado de placas de pavimento en concreto hidráulico del K0+156 al K0+145.
- Corte, armado y figurado de acero de refuerzo para placas de pavimento de geometria irregular.

CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VÍA MONTERÍA - SAN CARLOS - Tramo 10
- Construcción de bocacalles, andenes y rampas.

EL MORA

CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - Tramo 4
- Construcción de rampas vehiculares.

CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - Tramo 3
- Construcción de andenes, rampas vehiculares y peatonales.

CRA 15A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - ALTOS DE LA FLORESTA - Tramo 5.
- Construcción de andenes y replanteo de tramo faltante.

SUCRE - PLAYA BRÍGIDA

AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44
- Demolición de estructura de concreto.
- Excavación en material común para reparación de fallo en el K0+300, y para mejoramiento de subrasante.
- Tala de árboles con altura menores a 5 metros.
- Transporte, instalación y compactación de material de piedra rajón, para reparación de fallo en el K0+300.
- Transporte, instalación y compactación de material de piedra rajón para el mejoramiento de la subrasante existente del K0+310 al K0+330
- Transporte, instalación y compactación de material de subbase granular del K0+220 al K0+330.
- Suministro e instalación de tabletas guía para la construcción de andenes, del K0+060 al K0+095, lado izquierdo.
- Suministro e instalación de tabletas visuales para la construcción de andenes, del K0+060 al K0+095, lado izquierdo.
- Construcción de placas de concreto para andenes del K0+060 al K0+095.
- Reparación de acometidas de acueducto.

SAN FRANCISCO

CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)
- Excavación en material común para mejoramiento de subrasante del K0+328 al K0+250.
- Transporte, instalación y compactación de material de piedra rajón para el mejoramiento de la subrasante existente del K0+326 al K0+280.
- Instalación de geotextil del K0+326 al K0+280.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SANTA BÁRBARA





SAN JOSÉ






EL MORA





SUCRE



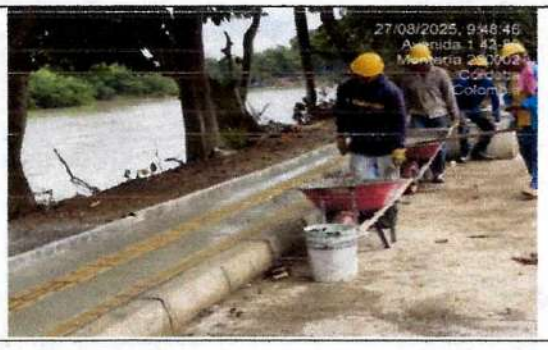

SAN FRANCISCO	
	

OBSERVACIONES:

En el periodo de este informe semanal, se presentaron 4 días de altas precipitaciones, lo cual dificultó el avance normal de las obras, debido a que en varios de los puntos intervenidos siempre que llueve hay la necesidad de evacuar el agua represada y esperar a que el terreno seque para poder realizar actividades sin afectar la calidad de del mejoramiento y/o subbase granular.

El contratista radicó a interventoria varios APU NP para evaluación y posterior radicación en la SIM, lo cual debe ir acompañado del Balance de obra, actas literales de pactación de precios, acta literal de mayores y menores cantidades, estudio de mercado, cotizaciones y, demás documentos de soporte que sean aplicables

VII. FIRMAS

CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

27. Informe Semanal N°27 - 7-Sep-2025

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA		DE	
						VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA					CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	7	9	2025	SEMANA No.:	27	DEL	31-ago-25	AL	6-sep-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15.436.620.455,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974.933.670,00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA			PRORROGA 1:	NO APLICA		
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL:	$ 15.436.620.455,00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL:	$ 974.933.670,00
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0,00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	1.670.972.179,00
PARCIAL 1:	$ 1.670.972.179,00	PAGADA 13/6/2025	% AVANCE FINANCIERO:	41,10%	
PARCIAL 2:	$ 1.625.369.663,00	PAGADA 03/9/2025			
PARCIAL 3:	$ 2.851.991.097,00				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	0,00	0,00
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	0,00	0,00
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	20,00	20,00
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	25,00	25,00
1.05	REMOCIÓN MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0,00	0,00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	850,00	850,00
1.07	EXCAVACIONES MECANICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	24,00	24,00
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^2	1092,50	1092,50
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	0,00	0,00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0,00	0,00
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0,00	0,00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0,00	0,00
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE		0,00	0,00
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0,00	0,00
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	52,00	52,00
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0,00	0,00
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	0,00	0,00
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	850,00	850,00
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS		0,00	0,00
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	86,00	86,00
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	0,00	0,00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	50,00	50,00
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mpa.	KG	2100,00	2100,00
4.00	SEÑALIZACIÓN		0,00	0,00
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	5,00	5,00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0,00	0,00
4.03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	0,00	0,00
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0,00	0,00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M	0,00	0,00
5.00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS		0,00	0,00
5.01	S/ TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCA. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4. INCLUYE ARENA H.=0.04 m. RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	0,00	0,00
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO. APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	0,00	0,00
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0.08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	50,00	50,00
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	0,00	0,00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 8CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	0,00	0,00

5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	20,00	20,00
6.00	**OTRAS ACTIVIDADES**		0,00	0,00
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	5,00	5,00
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	2,00	2,00
6.03	REUBICACIÓN TIPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0,00	0,00
7.00	**BOX CULVERT**		0,00	0,00
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA.	M^3	0,00	0,00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0,00	0,00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	0,00	0,00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2	0,00	0,00
1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0,00	0,00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0,00	0,00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3	0,00	0,00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3	0,00	0,00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mpa.	KG	0,00	0,00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M	0,00	0,00
8.00	**REDES ELÉCTRICAS**		0,00	0,00
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**		0,00	0,00
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M	0,00	0,00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0,00	0,00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0,00	0,00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0,00	0,00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND	0,00	0,00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND	0,00	0,00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	0,00	0,00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0,00	0,00
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0,00	0,00
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0,00	0,00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0,00	0,00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0,00	0,00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0,00	0,00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0,00	0,00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0,00	0,00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0,00	0,00
8.3	**SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.**		0,00	0,00
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0,00	0,00
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**		0,00	0,00
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0,00	0,00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0,00	0,00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	0,00	0,00

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	21,77%	46,01%	19,55%
DURANTE EL PERIODO	6,25%	1,56%	
ACUMULADO ACTUAL	28,02%	47,57%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Registro de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión y a la compresión.
Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de Sucre
Excavación en material común e instalación de material de mejoramiento en el tramo de N°5 - Altos de la Floresta
Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo N°5 - Altos de la floresta.
Vaciado de concreto en tramo N°4 del barrio el mora, San José tramo N°2, .
Excavación en material común de préstamo en tramo San Francisco e instalación de material de mejoramiento de subbase granular.
Vaciado de concreto en tramo de vía N°6 - San José, sucre.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado.
Participación en comités de obra semanales.
Seguimiento a compromisos del contratista de obra
Registro diario actividades en la bitácora de obra

VII.COMPONENTE SOCIAL

Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del contratista de obra en las actas de PQRS.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Tránsito.
Se realizan algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejorar el control vehicular en los sectores intervenidos.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES

VILLA FÁTIMA

- Ya fue inaugurado este tramo vial y esta pendiente el relleno del espacio comprendido entre los carriles de entrada y salida (jardinera triangular). La interventoría solicitó el reforzamiento de la pintura de piso en los accesos de entrada y salida (por garantía de calidad)

SAN JOSÉ

CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - Tramo 12
- Suministro el instalación de bordillos prefabricados.
- Sello de juntas longitudinales y transversales
- Construcción de descoles.

CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - Tramo 2
- Vaciado de placas de pavimento en concreto hidráulico del K0+273 al k0+333
- Construcción de andenes.

CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 TRAMO 6
- Corte de piso, para la construcción de andenes.
- Demolición de andenes existentes, para la construcción de andenes nuevos, según diseño.
- Tala de árboles con altura entre 5.1 metros y 10 metros
- Vaciado de placas de pavimento en concreto hidráulico

SANTA BARBARA

CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - Tramo 11
- Vaciado de placas de pavimento en concreto hidráulico para bocacalle
- Corte, armado y figurado de acero de refuerzo para placas de pavimento de geometría irregular.

CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VÍA MONTERÍA - SAN CARLOS - Tramo 10
- Construcción de bocacalles, andenes y rampas.
- Vaciado de placas de concreto para boca-calles.

EL MORA

CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - Tramo 4
- Construcción de rampas vehiculares.
- Construcción de rampas peatonales.

CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - Tramo 3
- Construcción de andenes, rampas vehiculares y peatonales.
- Retiro de material de excavación por alta saturación.

CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - ALTOS DE LA FLORESTA - Tramo 5.
- Construcción de andenes y replanteo de tramo faltante.

SUCRE - PLAYA BRÍGIDA

AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44
- Demolición de estructura de concreto.
- Excavación en material común para reparación de fallo, y para mejoramiento de subrasante.
- Tala de árboles con altura menores a 5 metros.
- Transporte, instalación y compactación de material de subbase granular.
- Construcción de placas de concreto para andenes del K0+060 al K0+095.
- Reparación de acometidas de acueducto.

SAN FRANCISCO

CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)
- Excavación en material común para mejoramiento de subrasante.
- Transporte, instalación y compactación de material de piedra rajón para el mejoramiento de la subrasante existente
- Instalación de geotextil

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SANTA BÁRBARA





SAN JOSÉ





EL MORA





SUCRE





SAN FRANCISCO	
	

OBSERVACIONES:

VII. FIRMAS	
CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

28. Informe Semanal N°28 - 14-Sep-2025

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA		DE	
						VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA					CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	14	9	2025	SEMANA No.:	28	DEL	7-sep-25	AL	13-sep-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15.436.620.455,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974.933.670,00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA			PRORROGA 1:	NO APLICA		
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL:	$ 15.436.620.455,00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL:	$ 974.933.670,00
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0,00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	1.670.972.179,00
PARCIAL 1:	$ 1.670.972.179,00	PAGADA 13/6/2025	% AVANCE FINANCIERO:	41,10%	
PARCIAL 2:	$ 1.825.369.993,00	PAGADA 03/9/2025			
PARCIAL 3:	$ 2.851.991.097,00				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	0,00	578,10
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	8,00	43,57
1.03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	22,50	803,80
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	25,00	711,30
1.05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0,00	0,00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	320,00	12485,28
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	68,50	276,28
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	465,63	15930,35
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	0,00	21,00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0,00	48,00
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0,00	4,00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA. INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0,00	0,00
2.00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**		0,00	0,00
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0,00	1373,10
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0,00	800,23
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	120,00	6382,47
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	110,00	2701,90
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	715,00	17001,24
3.00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**		0,00	0,00
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	120,00	2622,58
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	5,00	10,00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	0,00	2182,93
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mpa.	KG	1200,00	18747,49
4.00	**SEÑALIZACIÓN**		0,00	0,00
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	3,00	21,00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0,00	2,00
4.03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	30,26	30,26
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0,00	0,00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADA.	M	0,00	0,00
5.00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**		0,00	0,00
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCA. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	50,00	1457,41
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	65,00	1475,41
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0.08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	42,00	1082,19
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	0,00	36,00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	2,00	51,00

5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	10,00	38,00
6.00	OTRAS ACTIVIDADES		0,00	0,00
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	5,00	253,10
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	2,00	115,00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0,00	3,00
7.00	BOX CULVERT		0,00	0,00
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3	0,00	0,00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0,00	0,00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	0,00	0,00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2	0,00	0,00
1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0,00	0,00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0,00	0,00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3	0,00	0,00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3	0,00	0,00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0,00	0,00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M	0,00	0,00
8.00	REDES ELECTRICAS		0,00	0,00
8.1	RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.		0,00	0,00
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M	0,00	0,00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0,00	0,00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ÁNGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV , E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	0,00	0,00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0,00	0,00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND	0,00	0,00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0,00	0,00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0,00	0,00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV, DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0,00	0,00
8.2	RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.		0,00	0,00
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0,00	0,00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ÁNGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0,00	0,00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0,00	0,00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0,00	0,00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0,00	0,00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0,00	0,00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0,00	0,00
8.3	SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.		0,00	0,00
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0,00	0,00
8.4	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.		0,00	0,00
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0,00	0,00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0,00	0,00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	UND	0,00	0,00

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	28,02%	47,57%	15,22%
DURANTE EL PERIODO	6,25%	1,91%	
ACUMULADO ACTUAL	34,27%	49,49%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Registro de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión y a la compresión.
Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de Sucre
Excavación en material común e instalación de material de mejoramiento en el tramo de N°5 - Altos de la Floresta
Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo N°5 - Altos de la floresta.
Vaciado de concreto en tramo N°4 del barrio el mora, San José tramo N°2, tramo 5, san josé, .
Excavación en material común de préstamo en tramo San Francisco e instalación de material de mejoramiento de subbase granular.
Vaciado de concreto en tramo de vía N°6 - San José, sucre.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado.
Participación en comités de obra semanales.
Seguimiento a compromisos del contratista de obra
Registro diario actividades en la bitácora de obra

VII.COMPONENTE SOCIAL

Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del contratista de obra en las actas de PQRS.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Tránsito.
Se realizan algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejorar el control vehicular en los sectores intervenidos.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES

	SAN JOSÉ
	CRA 16C ENTRE LAS CRAS 38 Y 39 - Tramo 12 - Suministro el instalación de bordillos prefabricados. - Sello de juntas longitudinales y transversales - Demarcación de señales horizontales. - Suministro e instalación de señales verticales. - Aseo general. - El día 13 de septiembre se llevó a cabo la inauguración de este tramo vial por parte del señor alcalde de la ciudad de Montería. **CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - Tramo 2** - Vaciado de placas de pavimento en concreto hidráulico del K0+273 al k0+333 - Construcción de andenes. **CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 TRAMO 6** - Corte de piso, para la construcción de andenes. - Demolición de andenes existentes, para la construcción de andenes nuevos, según diseño. - Tala de árboles con altura entre 5.1 metros y 10 metros - Vaciado de placas de pavimento en concreto hidráulico
SANTA BARBARA	**EL MORA**
CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - Tramo 11 - Vaciado de placas de pavimento en concreto hidráulico para bocacalle - Corte, armado y figurado de acero de refuerzo para placas de pavimento de geometría irregular. - Construcción de andenes. - Realce de pozos de inspección. - Instalación de bolardos. **CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VÍA MONTERÍA - SAN CARLOS - Tramo 10** - Construcción de bocacalles, andenes y rampas. - Vaciado de placas de concreto para boca-calles. - Realce de pozos de inspección. - Instalación de Bolardos.	**CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - Tramo 4** - Construcción de rampas vehiculares. - Construcción de rampas peatonales. - Vaciado de placas de pavimento. **CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - Tramo 3** - Construcción de andenes, rampas vehiculares y peatonales. - Retiro de material de excavación por alta saturación. - Vaciado de placas de pavimento. **CRA 18A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - ALTOS DE LA FLORESTA - Tramo 5.** - Se trabajó en excavación en material común, de acuerdo a los planos de diseño. - Se realizó actividad de instalación de geotextil. - Se trabajó en transporte, extendido y compactación de material seleccionado para mejoramiento de subrasante. - Mientras se reparaba una acometida de agua potable la retroexcavadora le ocasionó una fisura a tubería de impulsión de aguas residuales de 24 pulg, siendo las 12:30pm aproximadamente, situación que fue informada inmediatamente a la empresa prestadora de servicio, la cual activo los protocolos pertinentes para solucionar el impase lo más pronto posible. Luego de varias horas de trabajo por parte de veolia, pasadas las 10 de la noche, se pudo reparar la tubería averiada, iniciando protocolo de puesta en funcionamiento de las estaciones de bombeo que usan la tubería afectada.
SUCRE - PLAYA BRÍGIDA	**SAN FRANCISCO**
AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44 - Demolición de estructura de concreto. - Excavación en material común para reparación de fallo, y para mejoramiento de subrasante. - Tala de árboles con altura menores a 5 metros. - Transporte, instalación y compactación de material de subbase granular. - Construcción de placas de concreto para andenes. - vaciado de placas de pavimento - Reparación de acometidas de acueducto.	**CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)** - Excavación en material común para mejoramiento de subrasante. - Transporte, instalación y compactación de material de piedra rajón para el mejoramiento de la subrasante existente - Instalación de geotextil

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SANTA BÁRBARA





SAN JOSÉ





EL MORA





SUCRE





SAN FRANCISCO	
	
ALTOS DE LA FLORESTA	
	

OBSERVACIONES:

El día 13 de septiembre se llevó a cabo la inauguración de este tramo vial por parte del señor alcalde de la ciudad de Montería.

VII. FIRMAS

CONSORCIO SINU URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINU URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

29. Informe Semanal N°29 - 21-Sep-2025

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA		DE	
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	21	9	2025	SEMANA No.:	29	DEL	14-sep-25	AL	20-sep-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15.436.620.455,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974.933.670,00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA			PRORROGA 1:	NO APLICA		
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15.436.620.455,00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 974.933.670,00
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0,00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	1.670.972.179,00
PARCIAL 1:	$ 1.670.972.179,00	PAGADA 13/6/2025	% AVANCE FINANCIERO:	41,10%	
PARCIAL 2:	$ 1.825.369.063,00	PAGADA 03/9/2025			
PARCIAL 3:	$ 2.851.991.097,00				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	0,00	578,10
1,02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^2	0,00	43,57
1,03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	22,00	625,80
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	0,00	711,30
1,05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0,00	0,00
1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	0,00	12485,28
1,07	EXCAVACIONES MECANICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	21,60	297,88
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	27,00	15957,35
1,09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	0,00	21,00
1,10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	1,00	49,00
1,11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0,00	4,00
1,12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0,00	0,00
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE		0,00	0,00
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0,00	1373,10
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	35,00	835,23
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0,00	6382,27
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	0,00	2701,90
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	0,00	17001,24
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS		0,00	0,00
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	130,00	2752,58
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	0,00	10,00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	0,00	2182,93
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	600,00	19347,49
4.00	SEÑALIZACIÓN		0,00	0,00
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0,00	21,00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	2,00	4,00
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	0,00	30,26
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0,00	0,00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M	0,00	0,00
5.00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS		0,00	0,00
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCA. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	43,40	1500,81
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	70,00	1545,41
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	0,00	1082,19
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	2,00	38,00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	2,00	53,00

	CORRECTA INSTALACION.	UND	10,00	40,00
5.00	OTRAS ACTIVIDADES		0,00	0,00
5.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	5,00	258,10
5.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	3,00	118,00
5.03	REUBICACIÓN TIPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	1,00	4,00
7.00	BOX CULVERT		0,00	0,00
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3	0,00	0,00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0,00	0,00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	0,00	0,00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2	0,00	0,00
1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0,00	0,00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0,00	0,00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3	0,00	0,00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3	0,00	0,00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mpa.	KG	0,00	0,00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M	0,00	0,00
8.00	REDES ELECTRICAS		0,00	0,00
8.1	RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.		0,00	0,00
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M	0,00	0,00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0,00	0,00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0,00	0,00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0,00	0,00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND	0,00	0,00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND	0,00	0,00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0,00	0,00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0,00	0,00
8.2	RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.		0,00	0,00
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0,00	0,00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0,00	0,00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0,00	0,00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0,00	0,00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0,00	0,00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0,00	0,00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0,00	0,00
8.3	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.		0,00	0,00
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0,00	0,00
8.4	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.		0,00	0,00
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0,00	0,00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0,00	0,00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	0,00	0,00

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	34,27%	49,49%	11,56%
DURANTE EL PERIODO	5,10%	1,45%	
ACUMULADO ACTUAL	39,37%	50,93%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Registro de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión y a la compresión.
Control topográfico

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de Sucre, altos de la floresta, san francisco.
Excavación en material común e instalación de material de mejoramiento en el tramo de N°5 - Altos de la Floresta, tramo de sucre.
Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo N°5 - Altos de la floresta.
Vaciado de concreto en tramo N°4 del barrio el mora, San José tramo N°2, tramo 5 altos de la floresta, san José tramo 6, .
Excavación en material común de préstamo en tramo San Francisco e instalación de material de mejoramiento de subbase granular.
Vaciado de concreto en tramo de vía N°6 - San José, sucre, tramo N°2 san José.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado.
Participación en comités de obra semanales.
Seguimiento a compromisos del contratista de obra
Registro diario actividades en la bitácora de obra

VII.COMPONENTE SOCIAL

Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del contratista de obra en las actas de PQRS.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implamantación del Plan de Manejo de Tránsito.
Se realizan algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejorar el control vehicular en los sectores intervenidos.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES

SAN JOSÉ

CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - Tramo 2
- Construcción de andenes.

CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 TRAMO 6
- Vaciado de placas de pavimento en concreto hidráulico.
- Extensión de tubería de aguas lluvias.
- Suministro e instalación de bordillos.

SANTA BARBARA

CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - Tramo 11
- Vaciado de placas de pavimento en concreto hidráulico para bocacalle y curva de giro
- Corte, armado y figurado de acero de refuerzo para placas de pavimento de boca-calles.
- Construcción de andenes.
- Realce de pozos de inspección y limpieza de los mismos.
- Instalación de bolardos.
- Manejo de agua por lluvias presentadas en la semana.

CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VÍA MONTERÍA - SAN CARLOS - Tramo 10
- Vaciado de placas de concreto para boca-calles.
- Realce de pozos de inspección y limpieza de los mismos.
- Instalación de Bolardos.
- Reubicación de caja de alcantarillado.
- Reparación de placas de andenes que se encontraban fisuradas.

EL MORA

CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - Tramo 4
- Aseo general
- Manejo de agua por lluvias presentadas en la semana.

CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - Tramo 3
- Aseo general
- Manejo de agua por lluvias presentadas en la semana.

CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - ALTOS DE LA FLORESTA - Tramo 5.
- Se trabajó en excavación en material común, de acuerdo a los planos de diseño.
- Se realizó actividad de instalación de geotextil.
- Se trabajó en transporte, extendido y compactación de material seleccionado para mejoramiento de subrasante.
- Mientras se reparaba una acometida de agua potable la retroexcavadora le ocasionó una fisura a tubería de impulsión de aguas residuales de 24 pulg, siendo las 12:30pm aproximadamente, situación que fue informada inmediatamente a la empresa prestadora de servicio, la cual activo los protocolos pertinentes para solucionar el impase lo más pronto posible. Luego de varias horas de trabajo por parte de veolia, pasadas las 10 de la noche, se pudo reparar la tubería averiada, iniciando protocolo de puesta en funcionamiento de las estaciones de bombeo que usan la tubería afectada.
- Manejo de agua por lluvias presentadas en la semana.

SUCRE - PLAYA BRÍGIDA

AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44
- Tala de árboles con altura variable.
- Suministro e instalación de bordillos.
- Vaciado de placas de pavimento del K0+270 al K0+290 em el carril derecho.
- El pasado domingo se presentaron luvias con fuertes vientos en la ciudad, evento que produjo la caida de varios arboles en este sector, afectando algunas viviendas. Se realizó visita del contratista de obra con el acompañamiento de la interventoria para evaluar las afectaciones de las viviendas y las necesidades en reparación.
- Manejo de agua por lluvias presentadas en la semana.

SAN FRANCISCO

CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)
- Suministro, extendido y compactación de material de subbase granular, y cereo del mismo en el tramo del K0+250 al K0+320.
- Manejo de agua por lluvias presentadas en la semana.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





SAN JOSÉ





EL MORA





SUCRE





	
ALTOS DE LA FLORESTA	
	

OBSERVACIONES:

VII. FIRMAS	
CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

30. Informe Semanal N°30 - 28-Sep-2025

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA		DE	
		VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA	CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	28	9	2025	SEMANA No.:	30	DEL	21-sep-25	AL	27-sep-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15.436.620.455,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974.933.670,00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA			PRORROGA 1:	NO APLICA		
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15.436.620.455,00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 974.933.670,00
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0,00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	1.670.972.179,00
PARCIAL 1:	$ 1.670.972.179,00	PAGADA 13/6/2025	% AVANCE FINANCIERO:	41,10%	
PARCIAL 2:	$ 1.825.369.063,00	PAGADA 03/9/2025			
PARCIAL 3:	$ 2.851.991.097,00				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	13,30	591,40
1,02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	6,44	50,01
1,03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	0,00	625,80
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	25,48	736,78
1,05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0,00	0,00
1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	451,10	12936,38
1,07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	40,89	338,77
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	636,59	16593,94
1,09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	2,00	23,00
1,10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	1,00	50,00
1,11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0,00	4,00
1,12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0,00	0,00
2.00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**		0,00	
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0,00	1373,10
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	45,49	880,72
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	59,51	6440,81
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	64,98	2766,88
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	113,65	17114,89
3.00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**		0,00	
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^2	132,72	2885,30
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	2,00	12,00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	14,00	2196,93
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	639,15	19986,63
4.00	**SEÑALIZACIÓN**		0,00	
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	2,00	23,00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0,00	4,00
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	0,00	30,26
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0,00	0,00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADA.	M	0,00	0,00
5.00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**		0,00	
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCA. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	0,00	1500,91
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	85,00	1630,41
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	27,51	1109,70
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	2,00	40,00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	0,00	55,00

	CORRECTA INSTALACION.			
6.00	OTRAS ACTIVIDADES		0,00	
6.01	S/I TUBERIA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	5,00	263.10
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1,00	119.00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0,00	4,00
7.00	BOX CULVERT		0,00	
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3	0,00	0,00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0,00	0,00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	0,00	0,00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2	0,00	0,00
1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0,00	0,00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0,00	0,00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3	0,00	0,00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3	0,00	0,00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0,00	0,00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M	0,00	0,00
8.00	REDES ELÉCTRICAS		0,00	
8.1	RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.		0,00	
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M	0,00	0,00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0,00	0,00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0,00	0,00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0,00	0,00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND	0,00	0,00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND	0,00	0,00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0,00	0,00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0,00	0,00
8.2	RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.		0,00	
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0,00	0,00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0,00	0,00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0,00	0,00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0,00	0,00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0,00	0,00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0,00	0,00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0,00	0,00
8.3	SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.		0,00	
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0,00	0,00
8.4	ALUMBRADO PÚBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.		0,00	
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0,00	0,00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0,00	0,00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	UND	0,00	0,00

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	39,37%	50,93%	8,62%
DURANTE EL PERIODO	4,81%	1,87%	
ACUMULADO ACTUAL	44,18%	52,80%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Registro de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión y a la compresión.
Control topográfico

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de Sucre, altos de la floresta, san francisco.
Excavación en material común e instalación de material de mejoramiento en el tramo de N°5 - Altos de la Floresta, tramo de sucre.
Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo N°5 - Altos de la floresta.
Vaciado de concreto en tramo N°4 del barrio el mora, San José tramo N°2, tramo 5 altos de la floresta, san José tramo 6, .
Excavación en material común de préstamo en tramo San Francisco e instalación de material de mejoramiento de subbase granular.
Vaciado de concreto en tramo de vía N°6 - San José, sucre, tramo N°2 san José.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado.
Participación en comités de obra semanales.
Seguimiento a compromisos del contratista de obra
Registro diario actividades en la bitácora de obra

VII.COMPONENTE SOCIAL

Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del contratista de obra en las actas de PQRS.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Tránsito.
Se realizan algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejorar el control vehicular en los sectores intervenidos.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES

	SAN JOSÉ
	CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - Tramo 2 - Construcción de andenes. - Construcción de rampas vehiculares. - Suministro e instalación de bordillos prefabricados. **CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 TRAMO 6** - Suministro e instalación de bordillos. - Construcción de andenes.
SANTA BARBARA	**EL MORA**
CRA 18B ENTRE LAS CALLES 44A Y 48 - Tramo 11 - Construcción de andenes. - Instalación de bolardos. - Suministro e instalación de Señales verticales. - Limpieza general - Construcción de andenes. - Sello de juntas transversales y longitudinales. - Corrección de detalles observados por la interventoría. **CALLE 46 ENTRE LA CRA 18 Y LA VÍA MONTERÍA - SAN CARLOS - Tramo 10** - Suministro e instalación de Señales verticales. - Limpieza general. - Sello de juntas transversales y longitudinales. - Corrección de detalles observados por la interventoría.	**CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - Tramo 4** - Aseo general - Adecuación de pozo de inspección. - Vaciado de boca - calles - Construcción de rampas vehiculares. - Suministro e instalación de bolardos. **CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - Tramo 3** - Aseo general - Demolición de pavimento existente. **CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - ALTOS DE LA FLORESTA - Tramo 5.** - Suministro, extendido y compactación de material de subbase granular del K0+060 al K0+170
SUCRE - PLAYA BRÍGIDA	**SAN FRANCISCO**
AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44 - Excavación en material común de acuerdo al diseño geométrico. - Suministro e instalación de geotextil. - Suministro, transporte y extendido de material seleccionado para mejoramiento de subrasante. - Figurado de acero pata la construcción de boca - calles.	**CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)** - Suministro, extendido y compactación de material de subbase granular, y cereo del mismo.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





SAN JOSÉ





EL MORA





SUCRE









ALTOS DE LA FLORESTA





OBSERVACIONES:

VII. FIRMAS

CONSORCIO SINÚ URBANO	**CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA**
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	**MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ**
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	**R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA**

31. Informe Semanal N°31 - 6-Oct-2025

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA		DE	
						VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA					CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	6	10	2025	SEMANA No.:	30	DEL	28-sep-25	AL	4-oct-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15.436.620.455,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974.933.670,00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA			PRORROGA 1:	NO APLICA		
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL:	$ 15.436.620.455,00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL:	$ 974.933.670,00
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0,00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	1.670.972.179,00
PARCIAL 1:	$ 1.670.972.179,00	PAGADA 13/6/2025	% AVANCE FINANCIERO:	22,65%	
PARCIAL 2:	$ 1.825.369.063,00	PAGADA 03/9/2025			
PARCIAL 3:	$ 2.851.991.097,00	EN TRAMITE			
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	0,00	591,40
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	0,00	50,01
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	26,00	645,80
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	40,60	777,38
1.05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO	M^2	0,00	0,00
1.06	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES.	M^3	187,83	13124,21
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	3,60	342,37
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	235,89	16829,63
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	3,00	26,00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	4,00	54,00
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0,00	4,00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0,00	0,00
2.00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**			
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0,00	1373,10
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	108,00	988,72
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	311,69	6752,70
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	0,00	2766,88
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	564,94	17679,83
3.00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**			
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	62,40	2947,70
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	0,00	12,00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	81,52	2278,45
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	1530,00	21516,63
4.00	**SEÑALIZACIÓN**			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0,00	23,00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0,00	4,00
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	0,00	30,26
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0,00	0,00
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M	0,00	0,00
5.00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**			
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCA. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	81,78	1582,59
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	74,75	1705,16
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	25,06	1134,76
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	4,00	44,00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 8CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	5,00	60,00

5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	35,00	103,00
6.00	**OTRAS ACTIVIDADES**			
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	20,00	283,10
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0,00	119,00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0,00	4,00
7.00	**BOX CULVERT**			
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA.	M^3	0,00	0,00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0,00	0,00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. CON ACARREO LIBRE.	M^3	0,00	0,00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2	0,00	0,00
1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0,00	0,00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0,00	0,00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^2	0,00	0,00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3	0,00	0,00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0,00	0,00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M	0,00	0,00
8.00	**REDES ELÉCTRICAS**			
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**			
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M	0,00	0,00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA, BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0,00	0,00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0,00	0,00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0,00	0,00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND	0,00	0,00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0,00	0,00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0,00	0,00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0,00	0,00
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**			
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0,00	0,00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0,00	0,00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0,00	0,00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0,00	0,00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0,00	0,00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0,00	0,00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0,00	0,00
8.3	**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**			
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0,00	0,00
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**			
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0,00	0,00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0,00	0,00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	0,00	0,00

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	44,18%	52,80%	
DURANTE EL PERIODO	4,87%	1,52%	5,27%
ACUMULADO ACTUAL	49,05%	54,32%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Registro de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión y a la compresión.
Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de Sucre, altos de la floresta, san francisco.
Excavación en material común e instalación de material de mejoramiento en el tramo San Francisco, tramo de sucre.
Suministro e instalación del material de mejoramiento de acuerdo a los diseños en el tramo N°5 - Altos de la floresta.
Vaciado de concreto en tramo N°5 del barrio altos de la Floresta, San José tramo N°2,.
Excavación en material común de préstamo en tramo San Francisco e instalación de material de mejoramiento de subbase granular.
Vaciado de concreto en tramo de vía N°5 - Altos De La Floresta, sucre.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado.
Participación en comités de obra semanales.
Seguimiento a compromisos del contratista de obra
Registro diario actividades en la bitácora de obra

VII.COMPONENTE SOCIAL

Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del contratista de obra en las actas de PQRS.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Tránsito.
Se realizan algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejorar el control vehicular en los sectores intervenidos.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES

ALTOS DE LA FLORESTA	SAN JOSÉ
- Veceado de concreto -Construccion de rampas vehiculares y de andenes	**CRA 16B ENTRE LAS CALLES 29 Y 39 - Tramo 2** - Construcción de andenes. - Construcción de rampas vehiculares. - Suministro e instalación de bordillos prefabricados. **CRA 18 ENTRE LAS CALLES 38 Y 39 TRAMO 6** Suministro e instalación de bordillos. - Construcción de rampas vehiculares
SANTA BARBARA	**EL MORA**
	CRA 15D ENTRE LAS CALLES 40A Y 40B - Tramo 4 - Aseo general - Adecuación de pozo de inspección. - Vaciado de boca - calles - Construcción de rampas vehiculares. - Suministro e instalación de bolardos. **CRA 15C ENTRE LAS CALLES 40A Y 41 - Tramo 3** - Aseo general - Arreglo de detalle y instalacion de tubena de 4pig **CRA 16A ENTRE LAS CALLES 40 Y 41 - ALTOS DE LA FLORESTA - Tramo 5.** - Suministro, extendido y compactación de material de subbase granular del K0+060 al K0+170
SUCRE - PLAYA BRÍGIDA	**SAN FRANCISCO**
AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44 - Excavación en material común de acuerdo al diseño geométrico. - Suministro e instalación de bordillo - Suministro, transporte y extendido de material seleccionado para mejoramiento de subrasante.	**CRA 4 ENTRE LAS CALLES 73 Y 77 (SENTIDO S-N)** - Suministro, extendido y compactación de material de subbase granular, y cereo del mismo. -Excavación para fallo -Figurado de acero para losas irregulares -Instalacion de piedra rajón para fallo

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SANTA BÁRBARA	
SAN JOSÉ	
	
EL MORA	
	
SUCRE	
	

SAN FRANCISCO	
	
ALTOS DE LA FLORESTA	
	
OBSERVACIONES:	
VII. FIRMAS	
CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

32. Informe Semanal N°32 - 13-Oct-2025

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA		DE	
						VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA					CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	13	10	2025	SEMANA No.:	32	DEL	5-oct-25	AL	11-oct-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15.436.620.455,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974.933.670,00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA			PRORROGA 1:	NO APLICA		
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL:	$ 15.436.620.455,00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL:	$ 974.933.670,00
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0,00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	1.670.972.179,00
PARCIAL 1:	$ 1.670.972.179,00	PAGADA 13/6/2025	% AVANCE FINANCIERO:	22,65%	
PARCIAL 2:	$ 1.825.369.083,00	PAGADA 03/9/2025			
PARCIAL 3:	$ 2.851.991.097,00	EN TRAMITE			
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	0	591,40
1,02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	0	50,01
1,03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	29	874,80
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	0	777,38
1,05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0	0,00
1,06	EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	187,83	13312,04
1,07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0,00	342,37
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	235,69	17065,32
1,09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	3	29,00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	2	56,00
1,11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	1	5,00
1,12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA. INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0	0,00
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE			
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0	1373,10
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0	988,72
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	311,88	7064,58
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	38,77	2805,65
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	564,94	18244,77
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS			
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (40 Kg/cm2).	M^3	44,80	2992,50
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	2,00	14,00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	81,52	2359,97
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	1536,00	23054,63
4.00	SENALIZACIÓN			
4.01	SENAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0,00	23,00
4.02	SENAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0,00	4,00
4,03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	174,82	204,88
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	1317,40	1317,40
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADA.	M	0,00	0,00
5.00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS			
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCA. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	0	1582,59
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO. APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	0	1705,16
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	0	1134,76
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	0	44,00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	0	60,00

5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0	103,00
6.00	OTRAS ACTIVIDADES			
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	26,80	309,90
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0,00	119,00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0,00	4,00
7.00	BOX CULVERT			
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA.	M^3	0,00	0,00
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0,00	0,00
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	0,00	0,00
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2	0,00	0,00
1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	0,00	0,00
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0,00	0,00
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3	0,00	0,00
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3	0,00	0,00
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0,00	0,00
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M	0,00	0,00
8.00	REDES ELÉCTRICAS			
8.1	RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.			
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M	0,00	0,00
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF)	UND	0,00	0,00
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	0,00	0,00
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	0,00	0,00
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0,00	0,00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND	0,00	0,00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0,00	0,00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0,00	0,00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0,00	0,00
8.2	RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.			
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0,00	0,00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0,00	0,00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0,00	0,00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0,00	0,00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0,00	0,00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0,00	0,00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0,00	0,00
8.3	SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.			
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DFS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0,00	0,00
8.4	ALUMBRADO PÚBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.			
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0,00	0,00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0,00	0,00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	UND	0,00	0,00

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	49,05%	54,32%	1,68%
DURANTE EL PERIODO	4,91%	1,32%	
ACUMULADO ACTUAL	53,96%	55,64%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Registro de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión y a la compresión.
Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños en el tramo de Sucre, altos de la floresta, san francisco.
Excavación en material común e instalación de material de mejoramiento en el tramo San Francisco, tramo de sucre.
Suministro e instalación del material de mejoramiento de acuerdo a los diseños en el tramo N°5 - Altos de la floresta.
Vaciado de concreto en tramo N°5 del barrio altos de la Floresta, San José tramo N°2,.
Excavación en material común de préstamo en tramo San Francisco e instalación de material de mejoramiento de subbase granular.
Vaciado de concreto en tramo de vía N°5 - Altos De La Floresta, sucre.

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado.
Participación en comités de obra semanales.
Seguimiento a compromisos del contratista de obra
Registro diario actividades en la bitácora de obra

VII.COMPONENTE SOCIAL

Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del contratista de obra en las actas de PQRS.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Tránsito.
Se realizan algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejorar el control vehicular en los sectores intervenidos.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES

ALTOS DE LA FLORESTA	SAN JOSÉ
	T2 Instalacion de bordillo
SANTA BARBARA	**EL MORA**
	T3 Se realizó vaciado de concreto Se realizo figurado de acero para losas irregulares
SUCRE - PLAYA BRIGIDA	**SAN FRANCISCO**
AV. PRIMERA ENTRE LAS CALLES 42 Y 44 Se realizó fundida de concreto Se realizó instalación de material de mejoramiento Se realizó extensión de geotextil -Se realizó instalación de subbase y nivelación de esta misma	Se realizó Vaciado de concreto Se realizo instalación de sub base Se realizó figurado de acero Se continuo con trabajos de excavación

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SANTA BÁRBARA	
SAN JOSÉ	
	
EL MORA	
	
SUCRE	
	

SAN FRANCISCO	
	
ALTOS DE LA FLORESTA	
OBSERVACIONES:	
VII. FIRMAS	
CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

33. Informe Semanal N°33 - 20-Oct-2025

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA		DE	
						VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA					CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	20	10	2025	SEMANA No.:	33	DEL	12-oct-25	AL	18-oct-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15.436.620.455,00	CONTRATO No	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974.933.670,00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA			PRORROGA 1:	NO APLICA		
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15.436.620.455,00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 974.933.670,00
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0,00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	1.670.972.179,00
PARCIAL 1:	$ 1.670.972.179,00	PAGADA 13/6/2025	% AVANCE FINANCIERO:	22,65%	
PARCIAL 2:	$ 1.825.369.063,00	PAGADA 03/9/2025			
PARCIAL 3:	$ 2.851.991.097,00	EN TRAMITE			
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	0	591,40
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	0	50,01
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	0	674,80
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	0	777,38
1.05	REMOCIÓN MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0	0,00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	187,83	13499,87
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0,00	342,37
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	235,69	17301,01
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND		29,00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	2	58,00
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0	5,00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0	0,00
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE			
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0	1373,10
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0	988,72
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	311,69	7379,45
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	38,77	2844,42
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	282,47	18527,24
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS			
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	60,13	3052,63
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	0,00	14,00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	91,52	2441,49
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	1843,25	24897,88
4.00	SEÑALIZACIÓN			
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0,00	23,00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	0,00	4,00
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	261,93	466,81
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	1976,10	3293,50
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M	0,00	0,00
5.00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS			
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCA. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	81,5	1664,09
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	74,75	1779,91
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	25,06	1159,82
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	0	44,00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	4	60,00

5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M83 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	32	135,00
6.00	**OTRAS ACTIVIDADES**			
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	0,00	309,90
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0,00	119,00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0,00	4,00
7.00	**BOX CULVERT**			
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA.	M^3		
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3		
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3		
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2		
1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3		
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3		
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3		
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3		
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mpa.	KG		
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRAFICO VEHICULAR.	M		
8.00	**REDES ELÉCTRICAS**			
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**			
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M		
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA, BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	0,00	0,00
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND	0,00	0,00
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	UND	0,00	0,00
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND	0,00	0,00
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND	0,00	0,00
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**			
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M	0,00	0,00
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	0,00	0,00
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	0,00	0,00
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	0,00	0,00
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	0,00	0,00
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	0,00	0,00
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	0,00	0,00
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M	0,00	0,00
8.3	**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**			
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL..INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	0,00	0,00
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**			
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	0,00	0,00
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	0,00	0,00
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	0,00	0,00

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	53,95%	55,64%	-1,60%
DURANTE EL PERIODO	4,91%	1,61%	
ACUMULADO ACTUAL	58,86%	57,27%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Registro de precipiteciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión y a la compresión.
Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños san francisco.
Excavación en material común e instalación de material de mejoramiento en el tramo San Francisco, tramo de sucre.
Vaciado de concreto en tramo N°5 del barrio altos de la Floresta, San José tramo N°2,.
Excavación en material común de préstamo en tramo San Francisco e instalación de material de mejoramiento de subbase granular.
Vaciado de concreto en tramo de vía N°5 - Altos De La Floresta, sucre, San francisco
Demacarcion horizontal de T3

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado.
Participación en comités de obra semanales.
Seguimiento a compromisos del contratista de obra
Registro diario actividades en la bitácora de obra

VII.COMPONENTE SOCIAL

Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del contratista de obra en las actas de PQRS.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Tránsito.
Se realizan algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejorar el control vehicular en los sectores intervenidos.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES

ALTOS DE LA FLORESTA	SAN JOSÉ
Se realizó fundida de losas de concreto Se realizó figurado de acero de losas irregulares Se realizó instalación de subbase	Tramo 6 Se realizo construcción de rampas vehiculares. Se realizo fundida de concreto estampado para anden. Se realizó instalación de adoquines tanto como visual y guía.
SANTA BARBARA	**EL MORA**
	Se realizó fundida de losas de concreto Se realizó fundida de boca calle Se realizó figurado de acero de boca calle
SUCRE - PLAYA BRÍGIDA	**SAN FRANCISCO**
Instalación de adoquín Vaciado de concreto estampado para anden Vaciado de losas de pavimento	Se realizó excavación Se realizó instalación de geotextil Se realizó instalación de material de mejoramiento Se realizó instalación de subbase Se realizó vaciado de concreto

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SAN JOSÉ	
	
EL MORA	
	
SUCRE	
	

SAN FRANCISCO	
	
ALTOS DE LA FLORESTA	
	
OBSERVACIONES:	
VII. FIRMAS	
CONSORCIO SINÚ URBANO	**CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA**
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	**MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ**
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	**R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA**

34. Informe Semanal N°34 - 20-Oct-2025

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA		DE	
						VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA					CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	27	10	2025	SEMANA No.:	33	DEL	19-oct-25	AL	25-oct-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15.436.620.455,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974.933.670,00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL:	$ 15.436.620.455,00	PRORROGA 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL:	$ 974.933.670,00
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA			SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA		
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0,00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	1.670.972.179,00
PARCIAL 1:	$ 1.670.972.179,00	PAGADA 13/6/2025	% AVANCE FINANCIERO.	22,65%	
PARCIAL 2:	$ 1.625.369.063,00	PAGADA 03/9/2025			
PARCIAL 3:	$ 2.851.991.097,00	EN TRAMITE			
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1,01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	0	591,40
1,02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	3,26	53,27
1,03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	88	762,80
1,04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	0	777,38
1,05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0	0,00
1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	0	13439,87
1,07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3	0,00	342,37
1,08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3		17301,01
1,09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	7	36,00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	11	69,00
1,11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	3	8,00
1,12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	0	0,00
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE			0,00
2.01	TERRAPLENES.	M^3	0	1373,10
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	0	988,72
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	98,63	7475,11
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	536,02	3380,44
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	0	18527,24
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS			0,00
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	520,55	3573,18
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	4,00	18,00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	0,00	2441,49
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0,00	24897,88
4.00	SEÑALIZACIÓN			0,00
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	4,00	27,00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	2,00	6,00
4,03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	0,00	466,81
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0,57	3294,07
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M	0,00	0,00
5.00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS			0,00
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCA. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	386,3	2030,39
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	218,5	1998,41
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	247,01	1406,83
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	11	55,00

5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	49	184,00
6.00	**OTRAS ACTIVIDADES**			0,00
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	0,00	309,90
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	58,00	177,00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0,00	4,00
7.00	**BOX CULVERT**			
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA.	M^3		
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3		
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3		
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2		
1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3		
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3		
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3		
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3		
1.09	ACERO DE REFUERZO Fym = 420 Mapa.	KG		
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRAFICO VEHICULAR.	M		
8.00	**REDES ELECTRICAS**			
8.1	**RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.**			
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M		
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG	M		
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND		
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND		
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND		
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND		
8.2	**RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**			
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M		
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND		
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M		
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M		
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND		
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND		
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND		
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M		
8.3	**SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.**			
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL..INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND		
8.4	**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.**			
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M		
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND		
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND		

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	58,86%	57,27%	1,26%
DURANTE EL PERIODO	4,11%	6,96%	
ACUMULADO ACTUAL	62,97%	64,23%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Registro de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión y a la compresión.
Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños san francisco, Sucre.
Excavación en material común e instalación de material de mejoramiento en el tramo San Francisco, tramo de sucre.
Vaciado de concreto en tramo N°5 del barrio altos de la Floresta, San José tramo N°2,.
Excavación en material común de préstamo en tramo San Francisco e instalación de material de mejoramiento de subbase granular.
Vaciado de concreto en tramo de vía N°5 - Altos De La Floresta, sucre, San francisco
Demacarcion horizontal de T3

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas.
Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista.
Revisión y respuesta de oficios recibidos.
Realización de informes diarios y semanales.
Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista
Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado.
Participación en comités de obra semanales.
Seguimiento a compromisos del contratista de obra
Registro diario actividades en la bitácora de obra

VII.COMPONENTE SOCIAL

Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del contratista de obra en las actas de PQRS.

VIII.COMPONENTE PMT

Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Tránsito.
Se realizan algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejorar el control vehicular en los sectores intervenidos.

IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES

ALTOS DE LA FLORESTA	SAN JOSÉ
Se realizo vaciado de losas de concreto Se realizó figurado de acero de losas irregulares Se realizó instalación de bordillo	T6 Se realizó instalación de adoquín tipo guía y visual Vaciado de concreto para construcción de andenes Se realizó construcción de rampa Vehiculares
SANTA BARBARA	**EL MORA**
	T3 Instalación de adoquín guía y visual Vaciado de concreto para construcción de andenes Se realizó sello de losas Se realizó limpieza del tramo Instalacion de bolardos
SUCRE - PLAYA BRÍGIDA	**SAN FRANCISCO**
Se realizó instalación de adoquín guía y visual.	Se realizo vaciado de losas de concreto Se realizó figurado de acero de losas irregulares. Se realizó instalación de material de mejoramiento y subbase posteriormente luego de toma de densidades de estos mismos

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SAN JOSÉ	
	
EL MORA	
	
SUCRE	
	

SAN FRANCISCO	
	
ALTOS DE LA FLORESTA	
	
OBSERVACIONES:	
VII. FIRMAS	
CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA

35. Informe Semanal N°35 - 02-Nov-2025

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA		DE	
						VERSIÓN	1		
	INFORME SEMANAL DE OBRA					CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	2-nov	10	2025	SEMANA No.:	35	DEL	26-oct-25	AL	1-nov-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SINÚ URBANO			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA		
REP. LEGAL:	ANA MARCELA VERTEL BERROCAL			REP. LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ		
CONTRATO No.	LP-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 15,436,620,455.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024	VALOR INICIAL:	$ 974,933,670.00
ACTA DE INICIO	28/02/2025			ACTA DE INICIO	28/02/2025		
PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONES:	$ -
TERMINACIÓN:	28/12/2025			TERMINACIÓN:	28/12/2025		
PRORROGA 1:	NO APLICA			PRORROGA 1:	NO APLICA		
SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 15,436,620,455.00	SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA	VALOR TOTAL	$ 974,933,670.00
REINICIO 1:	NO APLICA			REINICIO 1:	NO APLICA		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	0.00%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	1,670,972,179.00
PARCIAL 1:	$ 1,670,972,179.00	PAGADA 13/6/2025	% AVANCE FINANCIERO:	22.65%	
PARCIAL 2:	$ 1,825,369,063.00	En tramite			
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO


ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.01	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO.	M	5	596.40
1.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS.	M^3	0	53.27
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	7	769.80
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO.	M^2	32	809.38
1.05	REMOCIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO.	M^2	0	0.00
1.06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.	M^3	363.42	13863.29
1.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3		342.37
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3	460.75	17781.76
1.09	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS).	UND	0	36.00
1.10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	0	69.00
1.11	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ).	UND	2	10.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	0	0.00
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE			0.00
2.01	TERRAPLENES.	M^3		1373.10
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3	127.39	1116.11
2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3	18.056	7493.17
2.04	SUBBASE GRANULAR CLASE C.	M^3	25.7	3406.14
2.05	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE YAPAS GRANULARES.	M^2	234.587	18761.83
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS			0.00
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. (40 Kg/cm2).	M^3	0.00	3573.18
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANJOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	0.00	18.00
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	0.00	2441.49
3.04	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG	0.00	24897.88
4.00	SEÑALIZACIÓN			0.00
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	3.00	30.00
4.02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRO REFLECTIVA DE 60CM X 60CM.	UND	2.00	8.00
4.03	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M^2	0.00	466.81
4.04	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS.	M	0.00	3294.07
4.05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADA.	M	0.00	0.00
5.00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS			0.00
5.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCA. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS.	M	0	2030.39
5.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	0	1998.41
5.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO. JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M^2	0	1406.83
5.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO.	UND	0	55.00
5.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.	UND	0	72.00

5.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	0	184.00
6.00	OTRAS ACTIVIDADES			0.00
6.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	0.00	309.90
6.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	UND	0.00	177.00
6.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	0.00	4.00
7.00	BOX CULVERT			
1.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M^3		
7.02	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M^3		
1.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE.	M^3		
7.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.	M2		
1.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M^3		
7.06	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR).	M^3		
1.07	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO).	M^3		
7.08	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS).	M^3		
1.09	ACERO DE REFUERZO FyM = 420 Mapa.	KG		
7.10	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR.	M		
8.00	REDES ELÉCTRICAS			
8.1	RED DE MEDIA TENSIÓN (13.200) VOL.			
8.1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN.	M		
8.1.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.1.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFÁSICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		
8.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND		
8.1.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M		
8.1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m.	UND		
8.1.08	INSTALACIÓN EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SECCIONADOR BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND		
8.1.09	INSTALACIÓN CON TENSIÓN DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFÁSICO A 13.2 KV.	UND		
8.1.10	INSTALACIÓN CON TENSIÓN A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO.	UND		
8.2	RED DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.			
8.2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSIÓN.	M		
8.2.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.2.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND		
8.2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACIÓN - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND		
8.2.05	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M		
8.2.06	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFÁSICA AÉREA EN CABLE TRÍPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M		
8.2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND		
8.2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND		
8.2.09	DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND		
8.2.10	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES.	M		
8.3	SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (13.200/240/120) VOL.			
8.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE SUBESTACIÓN BIFÁSICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND		
8.4	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSIÓN (240/120) VOL.			
8.4.01	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M		
8.4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND		
8.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REINSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND		

AVANCE FÍSICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	62.02%	64.21%	-1.53%
DURANTE EL PERIODO	4.15%	0.43%	
ACUMULADO ACTUAL	66.17%	64.64%	



IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD


Registro de precipitaciones.
Verificación de funcionamiento de señalización PMT.
Verificación de uso de dotación (Implementos EPP) a personal de obra.
Control de la calidad del material de terraplén y seleccionado recibido en obra.
Control de la calidad del material de subbase granular recibido en obra.
Control del adecuado funcionamiento de los equipos del contratista de obra.
Realización de ensayos de densidad a material de subbase granular.
Revisión de ensayos de caracterización del material de subbase granular.
Toma de muestra de concreto para evaluación de resistencia a la flexión y a la compresión.

Control topográfico

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA
Suministro e instalación de geotextil NT 2000 de acuerdo a los diseños san francisco, Sucre. Excavación en material común e instalación de material de mejoramiento en el tramo San Francisco, tramo de sucre. Vaciado de concreto en tramo N°5 del barrio altos de la Floresta, San José tramo N°2.. Excavación en material común de préstamo en tramo San Francisco e instalación de material de mejoramiento de subbase granular. Demacarcion horizontal de T3
VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Se realiza reporte diario de las actividades ejecutadas. Revisión del estado de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores del contratista. Revisión y respuesta de oficios recibidos. Realización de informes diarios y semanales. Revisión y seguimiento de programación de obra del contratista Seguimiento al Plan de Manejo de transito Aprobado. Participación en comités de obra semanales. Seguimiento a compromisos del contratista de obra Registro diario actividades en la bitácora de obra
VII.COMPONENTE SOCIAL
Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del contratista de obra en las actas de PQRS.
VIII.COMPONENTE PMT
Se revisa la implementación del Plan de Manejo de Tránsito. Se realizan algunas observaciones al contratista de obra con el fin de mejorar el control vehicular en los sectores intervenidos.
IX. RELACIÓN DE ACTIVIDADES

ALTOS DE LA FLORESTA	SAN JOSÉ
Se realizó figurado de acero de losas irregulares Se realizó instalación de bordillo	T6. Se realizo remocion de especies vegetales
SANTA BARBARA	**EL MORA**
	T3 Se realizó sello de losas Se realizó limpieza del tramo Instalacion de bolardos
SUCRE - PLAYA BRÍGIDA	**SAN FRANCISCO**
Se realizó trabajos con excavacion y se realizo relleno con material selecionado	Se realizo instalacion de subbase Se realizó figurado de acero de losas irregulares. Se realizó instalación de material de mejoramiento y subbase posteriormente luego de toma de densidades de estos mismos

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

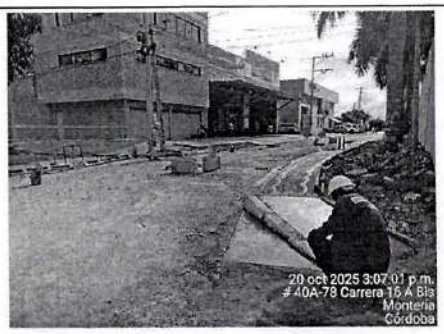SAN JOSÉ	
EL MORA	
	
SUCRE	
	

SAN FRANCISCO	
	
ALTOS DE LA FLORESTA	
	
OBSERVACIONES:	
VII. FIRMAS	
CONSORCIO SINÚ URBANO	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
ANA MARCELA VERTEL BERROCAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/L CONSORCIO SINÚ URBANO	R/L CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA
