INFORMES CORRECTIVOS 2025

DICIEMBRE 2025

INFORME DE GESTIÓN – MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DICIEMBRE.

1. Introducción

El presente informe detalla las actividades de mantenimiento correctivo realizadas sobre el sistema de videovigilancia, luego de evidenciar múltiples cámaras fuera de servicio debido a vandalismo, daños en la infraestructura de fibra óptica y robo de las acometidas eléctricas. Las labores realizadas tienen como objetivo restablecer la operatividad del sistema y garantizar la continuidad del monitoreo.

2. Hallazgos Iniciales

Durante la inspección preliminar se detectaron las siguientes afectaciones:

1. Cortes y robo de fibra óptica en el anillo troncal de comunicaciones.
2. Robo de acometidas eléctricas, dejando inoperativos varios puntos de red.
3. Destrucción y hurto de cámaras y equipos activos.
4. Daños en recámaras y cajas de paso por vandalismo.
5. UPS fuera de servicio, afectando el funcionamiento de nodos críticos.

3. Actividades de Mantenimiento Correctivo Realizadas

3.1 Reparación de la Red de Fibra Óptica

- Reposición de los tramos de fibra cortados o robados.
- Empalmes y reconfiguración del anillo troncal para restablecer la comunicación entre nodos.


3.2 Recuperación del Sistema Eléctrico


- Instalación de nuevas acometidas eléctricas.
- Pruebas de carga y estabilización del suministro eléctrico.

3.3 Sustitución y Reparación de Equipos


- Cambio de UPS fuera de servicio.
- Reemplazo de cámaras vandalizadas y equipos de red destruidos.
- Reparación de recámaras, cajas de paso y protecciones físicas.


- Intervenciones en recámaras, cajas de paso y nodos de comunicación.

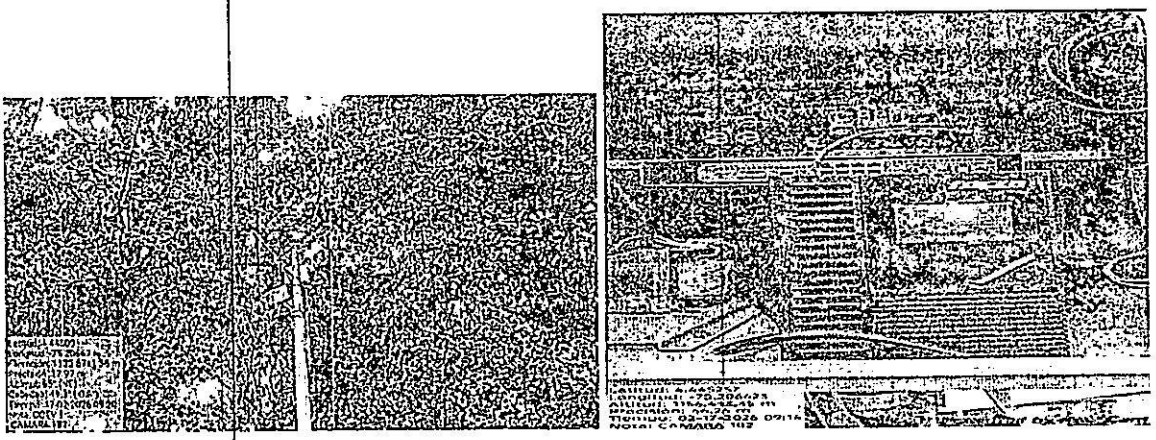







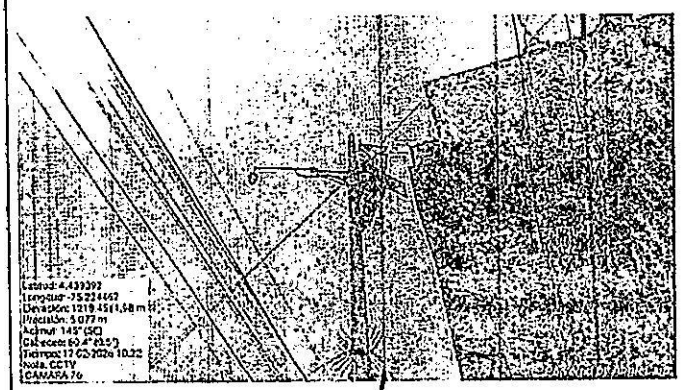

REDCO	ACTA CANTIDADES CORRECTIVOS	ACTA # 1 NOVIEMBRE CLIENTE: ALCALDIA DE IBAGUE	REDCO

EMPRESA:	INGENIERIA REDCO	DIRECCIÓN (LINEA NEGOCIOS):	INFRAESTRUCTURA
NIT:	900303669-2	COORDINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN:	Carrera 46 Sur 116-24 San Fco Aparco, Ibagué – Tolima	COD CENTRO DE COSTOS:	
TELEFONO:	3148943894	NOMBRE CENTRO DE COSTOS:	ALCALDIA DE IBAGUE
RESPONSABLE:	MILTON GOMEZ	CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS

PROVEEDOR:	MUNICIPIO DE IBAGUE	CONTRATO No:	2608	VALOR	1,100,000,000
NIT:	800113389-7	ANEXO No:		VALOR ANEXO:	
DIRECCIÓN:	Cl. 9 #2-1	OTROSI No:		VALOR OTROSI:	
CIUDAD:	IBAGUE			FECHA	DICIEMBRE
TELEFONO:	(608) 2611182			VALOR:	
CONTACTO:	SERGIO ARMANDO SAAVEDRA MOJICA				

CONCEPTO:	CONSOLIDADO CORRECTIVOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VLR. UNIT	VLR.TOTAL
1,00	Mantenimiento correctivo de sistemas de CCTV Este servicio comprende la diagnosis, reparación y corrección de fallas en el sistema completo de Seguridad Ciudadana, incluyendo cámaras tipo LPR, cámaras tipo domo PTZ, cámaras tipo fijas, y la infraestructura tecnológica utilizada para su operación. Se aplican acciones de reemplazo de componentes, ajustes de configuración y pruebas funcionales para restablecer la operatividad del sistema	UND	1	$ 12.757.885	$ 12.757.885
2,00	Mantenimiento correctivo de centros de contro y monitoreo Este servicio comprende la diagnosis, corrección de fallas y reparación de los sistemas encargados de la supervisión y gestión de las cámaras de seguridad ciudadana, asegurando la restitución de su operatividad y evitando interrupciones en la vigilancia. Se intervienen todos los elementos criticos, incluyendo equipos eléctricos, sistemas de aire acondicionado, estaciones de monitoreo y demás Insumos tecnológicos afectados por fallas	UND	1	$ 14.844.663	$ 14.844.663
3,00	Mantenimiento correctivo de redes de fibra óptica Este servicio comprende el diagnostico, reparación y corrección de fallas en la infraestructura de transmisión de fibra óptica, 2.2 abarcando ductos, cables, canaletas, cajas de inspección y demás elementos esenciales del sistema. Se realizan intervenciones técnicas para restablecer la conectividad, corrigiendo averías que afectan el desempeño y estabilidad de la red	UND	1	$ 12.047 842	$ 12.047.842
4,00	Fibra Óptica por metro 24 hilos, ADSS Span 200 Incluye Empalmes. Monomodo.	ML	105	$ 6.234	$ 654.570
5,00	Caja de Empalme (exteriores) - Mufla. 24 hilos. derivaciones.	UND	3	$ 960.612	$ 2.881.836
6,00	UPS 1,5 KVA. Nueva.	UND	1	$ 3.683.226	$ 3.683.226
7,00	Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 6 AWG M	ML	102	$ 65 538	$ 6.684.876
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -

TOTAL CORTE		53.554.697
COSTO DIRECTO		53.554.697
IVA	19,00%	10.175.430
TOTAL A PAGAR		63.730.327

FIRMA GERENTE / DIRECTOR / SUBDIRECTOR

FIRMA PROFESIONAL


REDCO	MANTENIMIENTO DE CCTV Y CORRECTIVOS	
Versión: 1	INGENIERIA REDCO S.A.S	


Fecha: DICIEMBRE 2025	**Ciudad:** IBAGUE
Cliente(s): ALCALDIA DE IBAGUE	**Lugar: CAMARA 115**
DIRECTOR PROYECTO: MILTON A GOMEZ H	**TIPO ACTIVIDAD:** CORRECTIVO


NOVEDAD.
Se realizó la revisión de los equipos, encontrándose la tapa de la cámara en mal estado. Asimismo, se efectuó la instalación de la acometida eléctrica correspondiente.


Actividades realizadas:







- Registro fotográfico
- Toma de potencias
- Instalación de acometida eléctrica

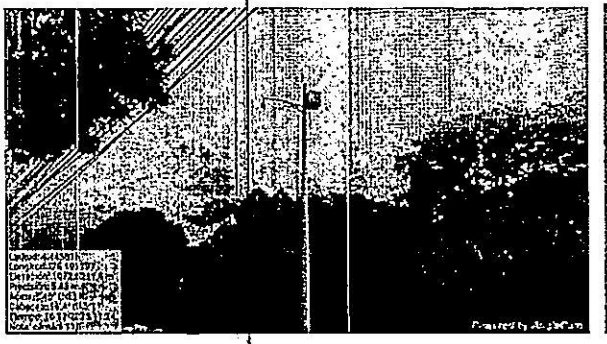

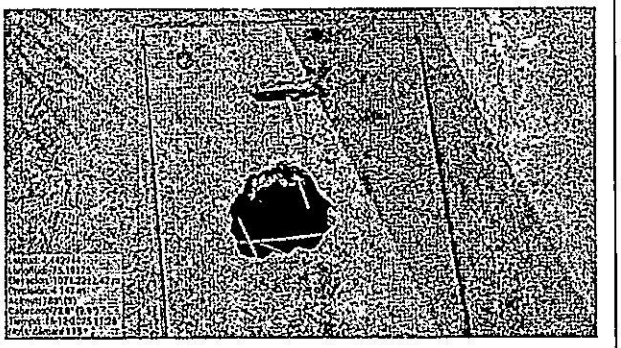

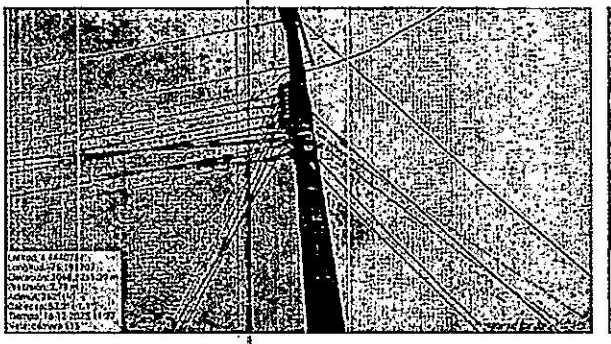

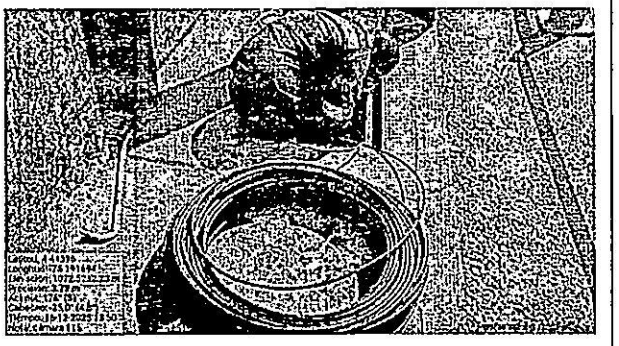

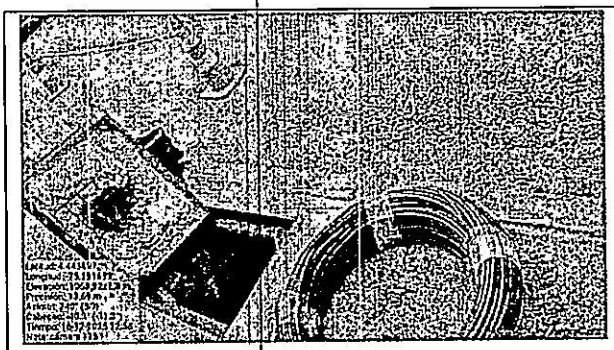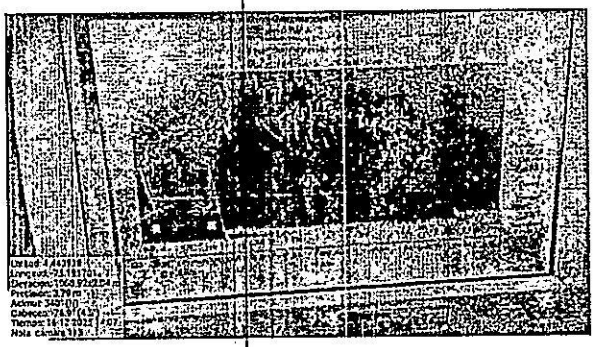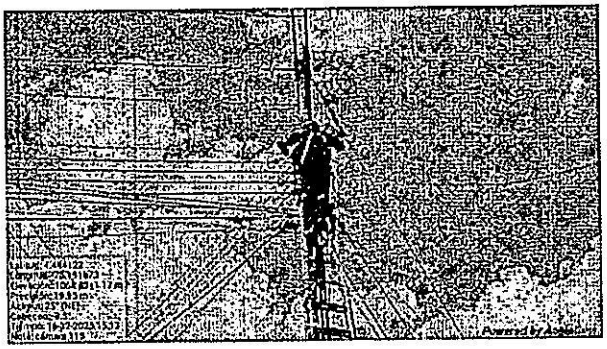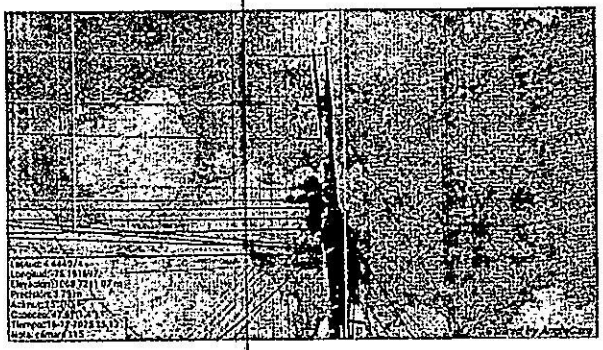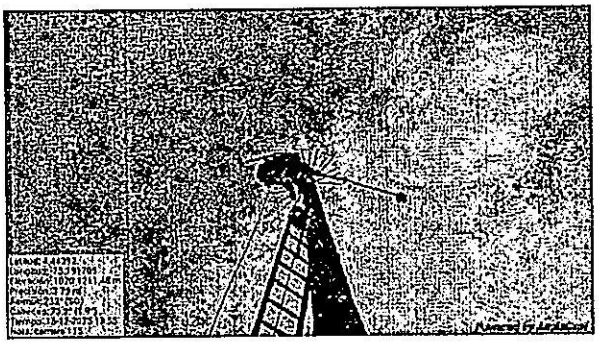MATERIALES

- 45 mts de cable eléctrico
- 2 conectores de perforación
- 7 amarres de 35 cm

REDCO

ACTA DE CANTIDADES EJECUTADAS

N°	39
CLIENTE:	ALCALDIA DE IBAGUE

REDCO

EMPRESA:	INGENIERIA REDCO	DIRECCIÓN (UNEA NEGOCIOS):	INFRAESTRUCTURA
NIT:	900303669-2	COORDINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN:	Carrera 46 Sur 116-24 San Fco Aparco, Ibagué – Tolima	COD CENTRO DE COSTOS:	
TELEFONO:	3148943894	NOMBRE CENTRO DE COSTOS:	ALCALDIA DE IBAGUE
RESPONSABLE:	MILTON GOMEZ	CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS

PROVEEDOR:	MUNICIPIO DE IBAGUE	CONTRATO No:	2608	VALOR	1,100,000,000
NIT:	800113389-7	ANEXO No:		VALOR ANEXO:	
DIRECCIÓN:	Cl. 9 #2-1	OTROSI No:		VALOR OTROSI:	
CIUDAD:	IBAGUE			FECHA	DICIEMBRE
TELEFONO:	(608) 2611182			VALOR:	
CONTACTO:	SERGIO ARMANDO SAAVEDRA MOJICA				

CONCEPTO:	VERIFICACION INFRAESTRUCTURA EN PUNTO SIN POTENCIA, PUNTO DE DAÑO CAMARA 115

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VLR. UNIT	VLR.TOTAL
1,00	Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 6 AWG	ML	45	$ 65.538	$ 2.949.210
2,00				$ -	$ -
3,00				$ -	$ -
4,00				$ -	$ -
5,00				$ -	$ -
6,00				$ -	$ -

TOTAL CORTE		$ 2.949.210
COSTO DIRECTO		$ 2.949.210
IVA	19,00%	$ 560.350
TOTAL A PAGAR		$ 3.509.560

FIRMA GERENTE / DIRECTOR / SUBDIRECTOR

FIRMA PROFESIONAL





REDCO	MANTENIMIENTO DE CCTV Y CORRECTIVOS	
	Versión: 1	INGENIERIA REDCO S.A.S


Fecha: DICIEMBRE 2025	**Ciudad:** IBAGUE
Cliente(s): ALCALDIA DE IBAGUE	**Lugar: CAMARA 173**
DIRECTOR PROYECTO: MILTON A GOMEZ H	**TIPO ACTIVIDAD:** CORRECTIVO


NOVEDAD.
Se realizó la revisión de los equipos, se efectuó la instalación de la acometida eléctrica correspondiente.


Actividades realizadas:


- Registro fotográfico
- Toma de potencias
- Instalación de acometida eléctrica

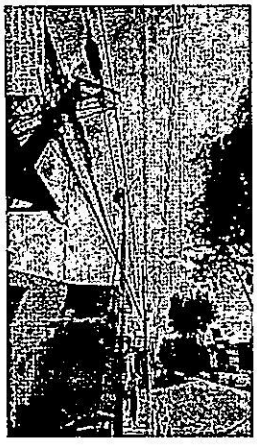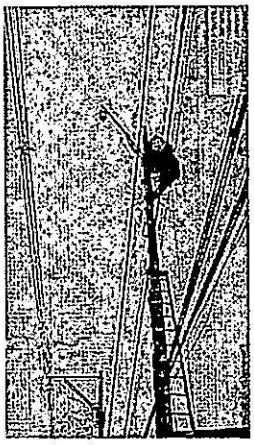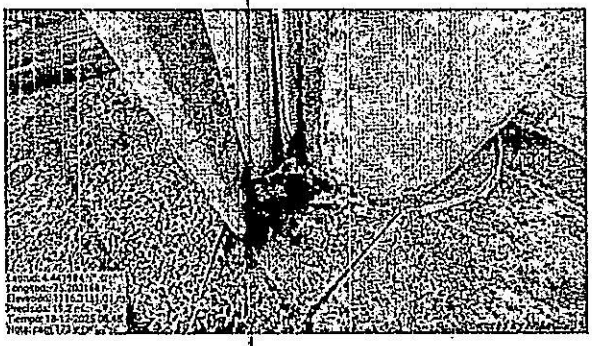


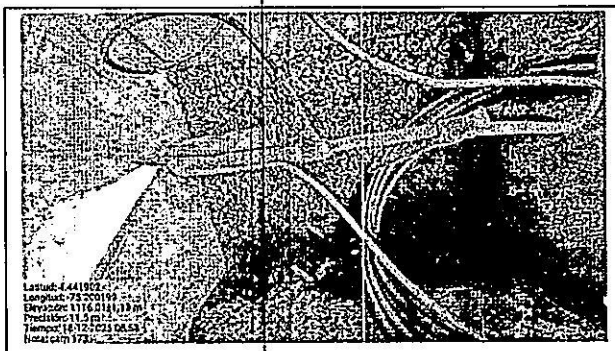

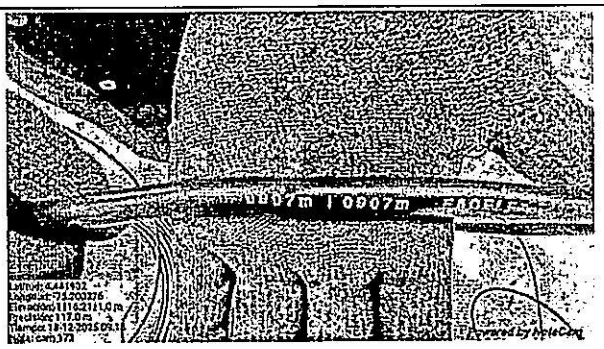

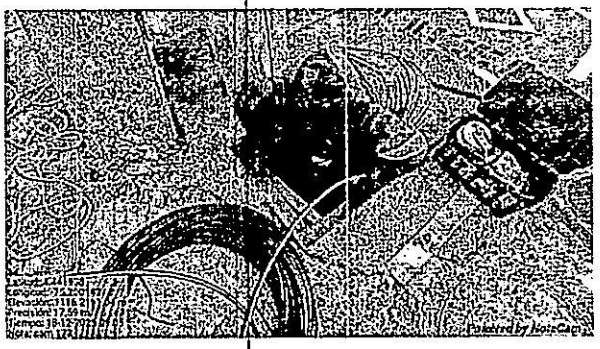


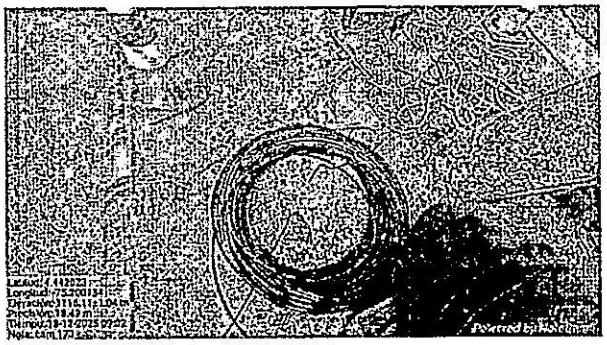


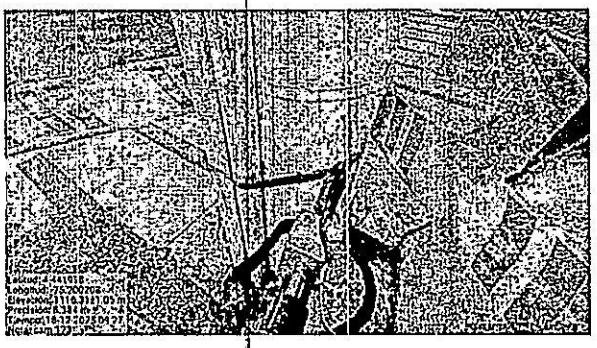





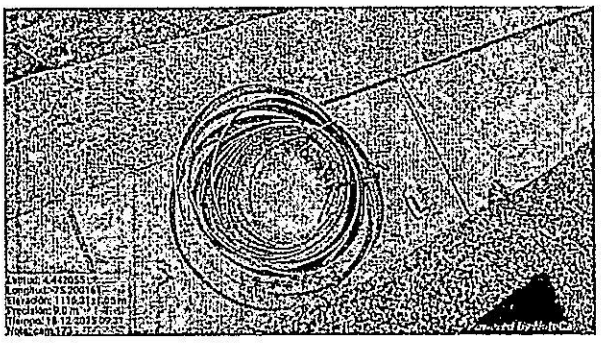

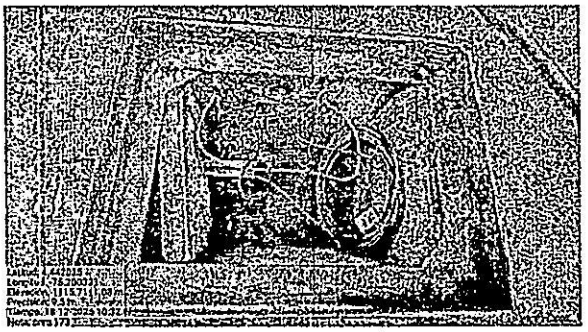

MATERIALES

- 32 mts de cable eléctrico
- 1 metro de cinta bandy
- 1 hebilla

REDCO

ACTA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Nº 40	
CLIENTE:	
ALCALDIA DE IBAGUE	

REDCO

EMPRESA:	INGENIERIA REDCO	DIRECCIÓN (UNEA NEGOCIOS):	INFRAESTRUCTURA
NIT:	900303669-2	COORDINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN:	Carrera 46 Sur 116-24 San Fco Aparco, Ibagué – Tolima	COD CENTRO DE COSTOS:	
TELEFONO:	3148943894	NOMBRE CENTRO DE COSTOS:	ALCALDIA DE IBAGUE
RESPONSABLE:	MILTON GOMEZ	CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS

PROVEEDOR:	MUNICIPIO DE IBAGUE	CONTRATO No:	2608	VALOR	1,100,000,000
NIT:	800113389-7	ANEXO No:		VALOR ANEXO:	
DIRECCIÓN:	Cl. 9 #2-1	OTROSI No:		VALOR OTROSI:	
CIUDAD:	IBAGUE			FECHA	DICIEMBRE
TELEFONO:	(608) 2611182			VALOR:	
CONTACTO:	SERGIO ARMANDO SAAVEDRA MOJICA				

CONCEPTO:	VERIFICACION INFRAESTRUCTURA EN PUNTO SIN POTENCIA, PUNTO DE DAÑO CAMARA 173

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VLR. UNIT	VLR.TOTAL
1,00	Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 6 AWG	ML	32	$ 65.538	$ 2.097.216
2,00				$ -	$ -
3,00				$ -	$ -
4,00				$ -	$ -
5,00				$ -	$ -
6,00				$ -	$ -

TOTAL CORTE		$ 2.097.216
COSTO DIRECTO		$ 2.097.216
IVA	19,00%	$ 398.471
TOTAL A PAGAR		$ 2.495.687

FIRMA GERENTE / DIRECTOR / SUBDIRECTOR

FIRMA PROFESIONAL


REDCO	MANTENIMIENTO DE CCTV Y CORRECTIVOS	
	Versión: 1	INGENIERIA REDCO S.A.S


Fecha: DICIEMBRE 2025	**Ciudad:** IBAGUE
Cliente(s): ALCALDIA DE IBAGUE	**Lugar: CAMARA 110**
DIRECTOR PROYECTO: MILTON A GOMEZ H	**TIPO ACTIVIDAD:** CORRECTIVO


NOVEDAD.
Se realizó la revisión de los equipos, se efectuó la instalación de la acometida eléctrica correspondiente. UPS en mal estado


Actividades realizadas:


- Registro fotográfico
- Toma de potencias
- Instalación de acometida eléctrica

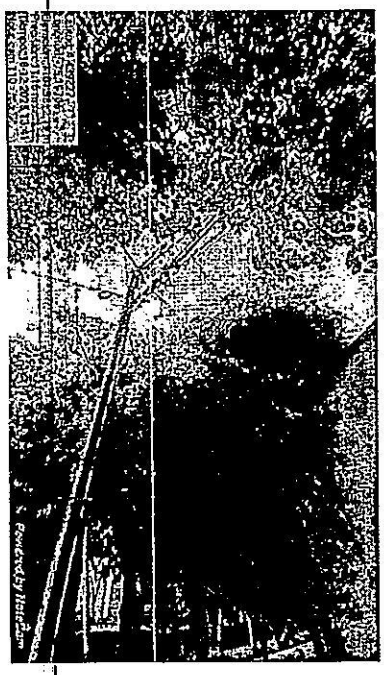


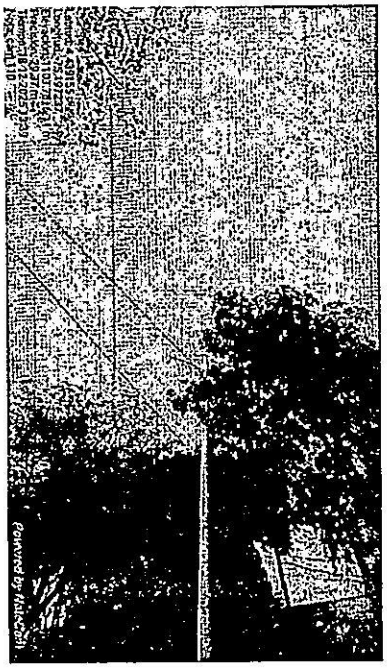


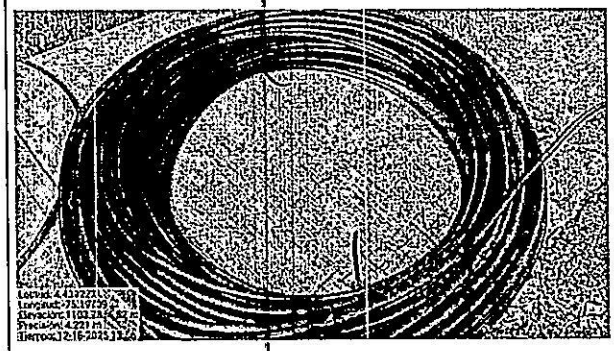






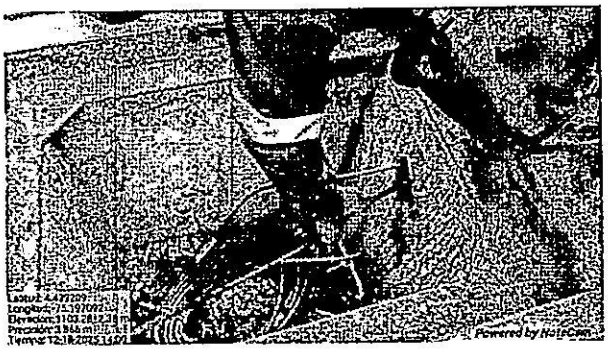

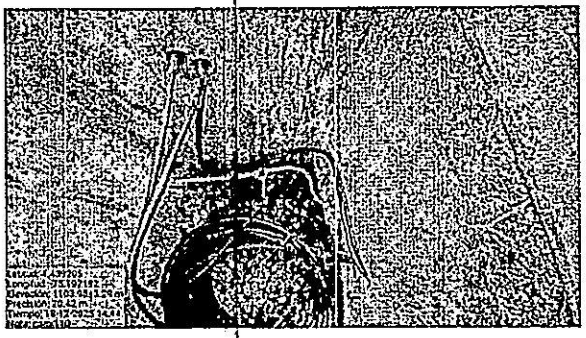


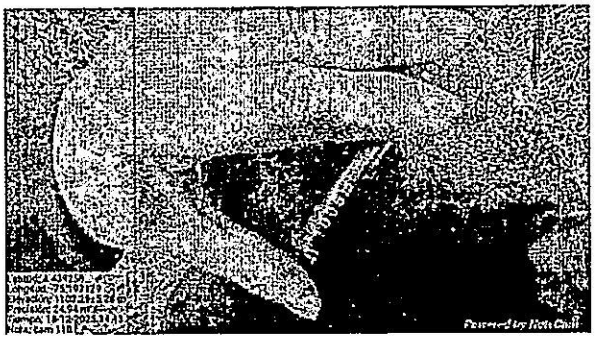












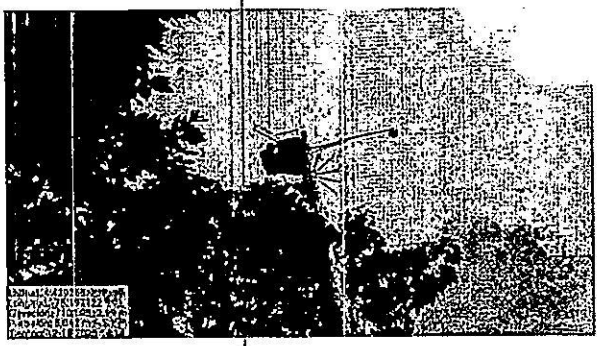

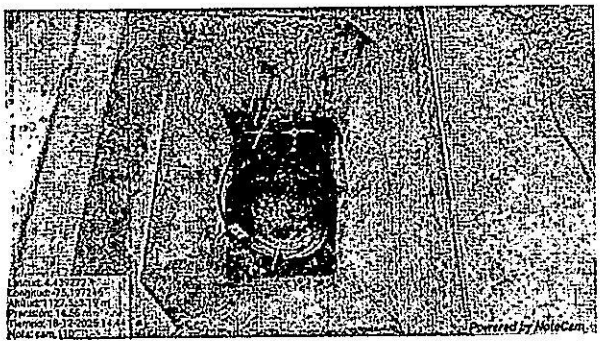

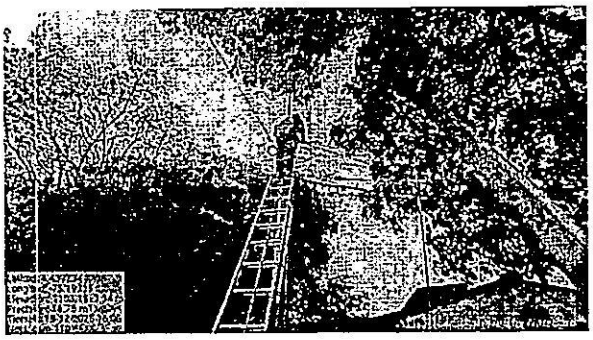

MATERIALES

- 25 mts de cable eléctrico
- 3 metros de cinta bandy
- 3 hebillas
- 1 Tubo EMT de 1/2"
- 1 unión emt de 1/2"

REDCO

ACTA DE CANTIDADES EJECUTADAS

N° 42

CLIENTE: ALCALDIA DE IBAGUE

Redco

EMPRESA:	INGENIERIA REDCO	DIRECCIÓN (LINEA NEGOCIOS):	INFRAESTRUCTURA
NIT:	900303669-2	COORDINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN:	Carrera 46 Sur 116-24 San Fco Aparico, Ibagué – Tolima	COD CENTRO DE COSTOS:	
TELEFONO:	3148943894	NOMBRE CENTRO DE COSTOS:	ALCALDIA DE IBAGUE
RESPONSABLE:	MILTON GOMEZ	CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS

PROVEEDOR:	MUNICIPIO DE IBAGUE	CONTRATO No:	2608	VALOR	1,100,000,000
NIT:	800113389-7	ANEXO No:		VALOR ANEXO:	
DIRECCIÓN:	Cl. 9 #2-1	OTROSI No:		VALOR OTROSI:	
CIUDAD:	IBAGUE			FECHA	DICIEMBRE
TELEFONO:	(608) 2611182			VALOR:	
CONTACTO:	SERGIO ARMANDO SAAVEDRA MOJICA				

CONCEPTO:	VERIFICACION INFRAESTRUCTURA EN PUNTO SIN POTENCIA, PUNTO DE DAÑO CAMARA 110

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VLR. UNIT	VLR.TOTAL
1,00	Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 6 AWG	ML	25	$ 65.538	$ 1.638.450
2,00				$ -	$ -
3,00				$ -	$ -
4,00				$ -	$ -
5,00				$ -	$ -
6,00				$ -	$ -

TOTAL CORTE		1.638.450
COSTO DIRECTO		1.638.450
IVA	19,00%	311.306
TOTAL A PAGAR		1.949.756

FIRMA GERENTE / DIRECTOR / SUBDIRECTOR

FIRMA PROFESIONAL







REDCO	MANTENIMIENTO DE CCTV Y CORRECTIVOS	
	Versión: 1	INGENIERIA REDCO S.A.S


Fecha: DICIEMBRE 2025	**Ciudad:** IBAGUE
Cliente(s): ALCALDIA DE IBAGUE	**Lugar: CAMARA 87**
DIRECTOR PROYECTO: MILTON A GOMEZ H	**TIPO ACTIVIDAD:** CORRECTIVO


NOVEDAD.
Se realizó la revisión de los equipos, se efectuó la instalación de la acometida eléctrica correspondiente.


Actividades realizadas:


- Registro fotográfico
- Toma de potencias

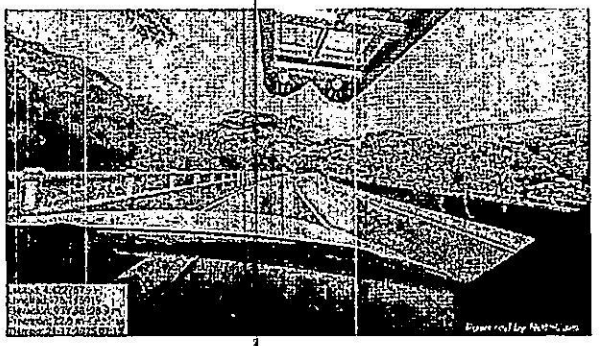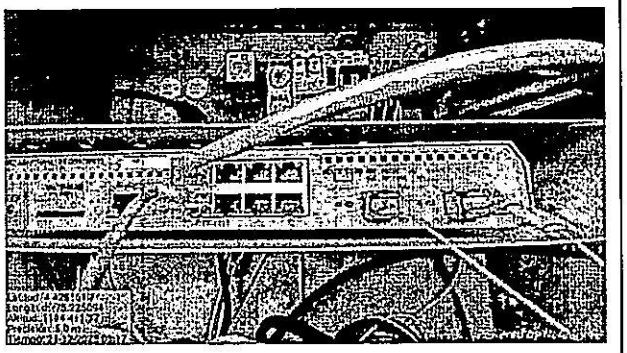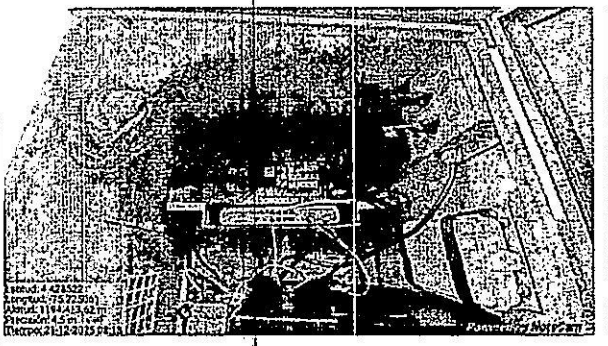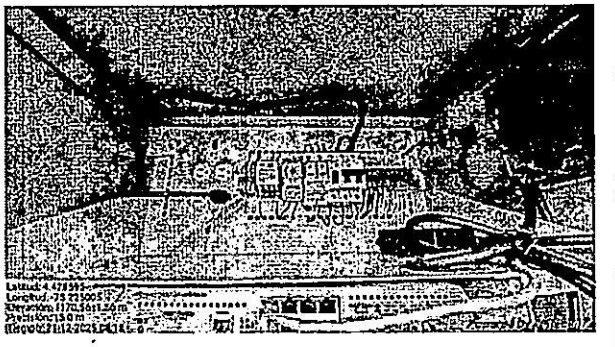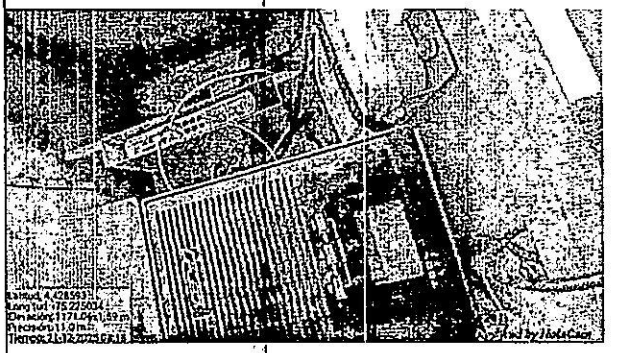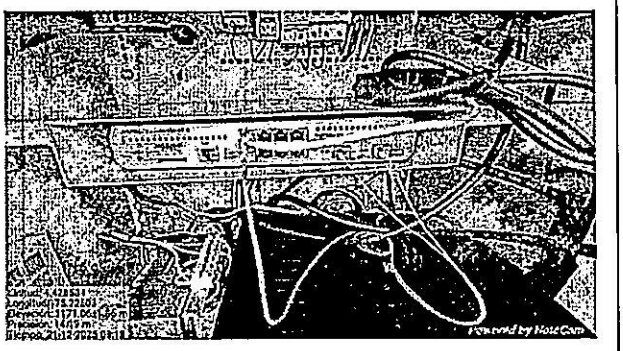


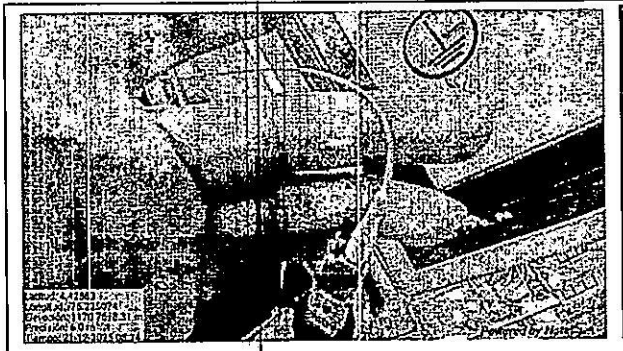

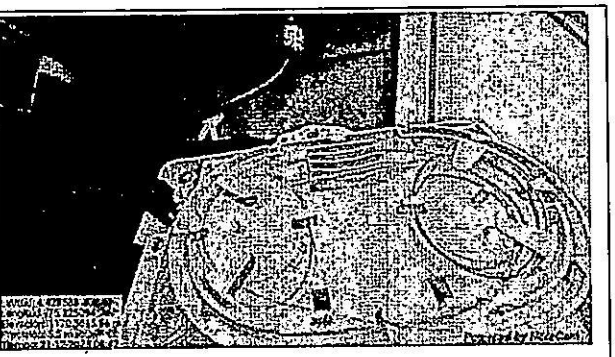

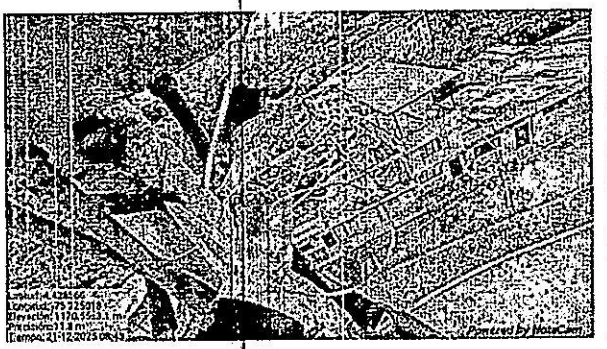
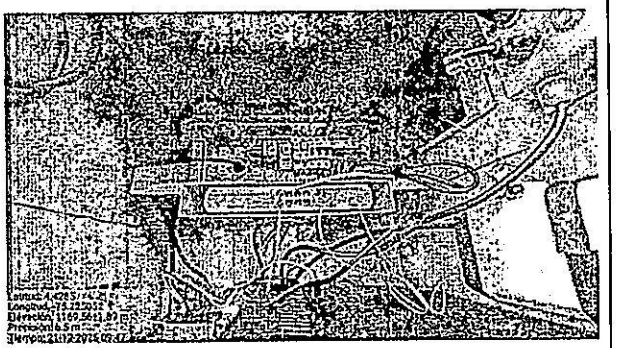


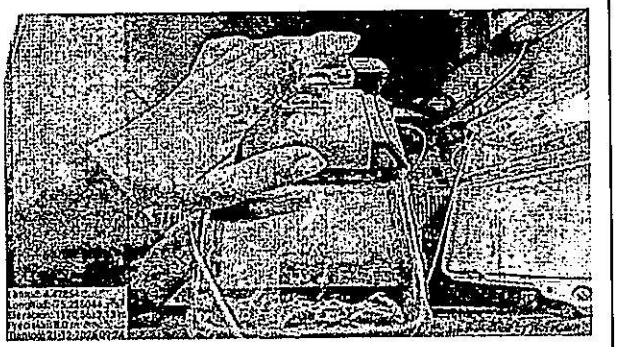


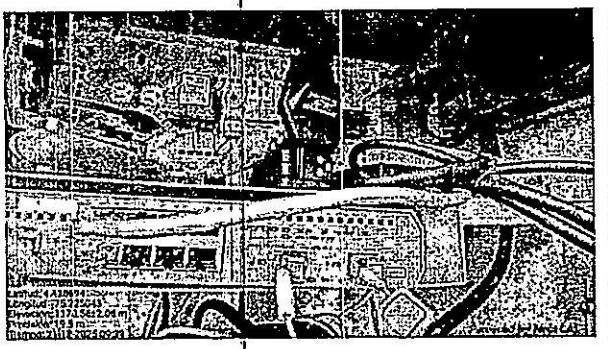








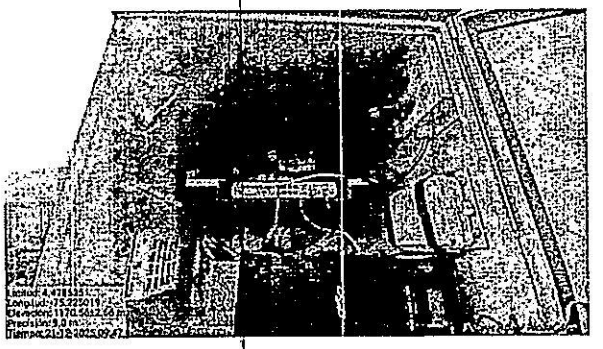

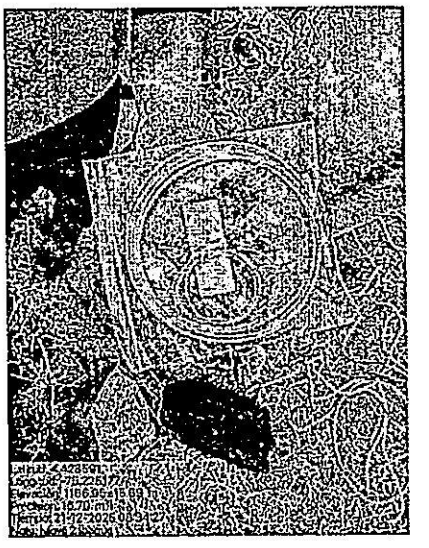

MATERIALES

- 1 cable pigtail

REDCO

ACTA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Nº 42	
CLIENTE:	REDCO
ALCALDIA DE IBAGUE	

EMPRESA:	INGENIERIA REDCO	DIRECCIÓN (UNEA NEGOCIOS):	INFRAESTRUCTURA
NIT:	900303669-2	COORDINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN:	Carrera 46 Sur 116-24 San Fco Aparto, Ibagué – Tolima	COD CENTRO DE COSTOS:	
TELEFONO:	3148943894	NOMBRE CENTRO DE COSTOS:	ALCALDIA DE IBAGUE
RESPONSABLE:	MILTON GOMEZ	CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS

PROVEEDOR:	MUNICIPIO DE IBAGUE	CONTRATO No:	2608	VALOR	1,100,000,000
NIT:	800113389-7	ANEXO No:		VALOR ANEXO:	
DIRECCIÓN:	Cl. 9 #Z-1	OTROSI No:		VALOR OTROSI:	
CIUDAD:	IBAGUE			FECHA	DICIEMBRE
TELEFONO:	(608) 2611182			VALOR:	
CONTACTO:	SERGIO ARMANDO SAAVEDRA MOJICA				

CONCEPTO:	VERIFICACION INFRAESTRUCTURA EN PUNTO SIN POTENCIA, PUNTO DE DAÑO CAMARA 87

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VLR. UNIT	VLR.TOTAL
1,00	Fibra Óptica por metro 12 hilos, ADSS Span 200' Incluye Empalmes. Multimodo.	ML	1	4.438	$ 4.438
2,00				$ -	$ -
3,00				$ -	$ -
4,00				$ -	$ -
5,00				$ -	$ -
6,00				$ -	$ -

TOTAL CORTE		4.438
COSTO DIRECTO		4.438
IVA	19,00%	843
TOTAL A PAGAR		5.281

FIRMA GERENTE / DIRECTOR / SUBDIRECTOR

FIRMA PROFESIONAL


REDCO	MANTENIMIENTO DE CCTV Y CORRECTIVOS	
Versión: 1	INGENIERIA REDCO S.A.S	


Fecha: DICIEMBRE 2025	**Ciudad:** IBAGUE
Cliente(s): ALCALDIA DE IBAGUE	**Lugar: CAMARA 105**
DIRECTOR PROYECTO: MILTON A GOMEZ H	**TIPO ACTIVIDAD:** CORRECTIVO


NOVEDAD.
Se realiza revisión de equipos, se encuentra fibra en mal estado, y se realiza instalación de empalmes. Las actividades debieron suspenderse temporalmente debido a las fuertes lluvias y fueron retomadas una vez mejoraron las condiciones climáticas.

Actividades realizadas:


- Registro fotográfico
- Toma de potencias
- Cambio de fibra
- Fusiones de empalmaría
- Instalación de empalmes

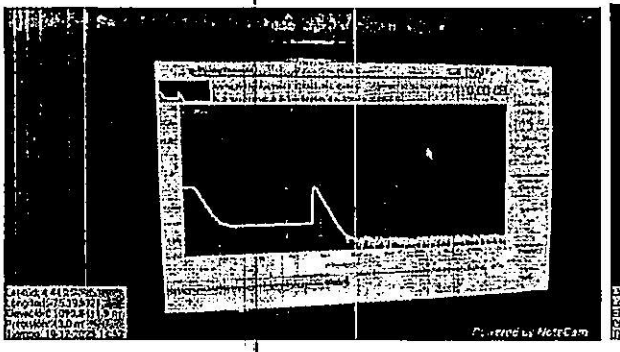


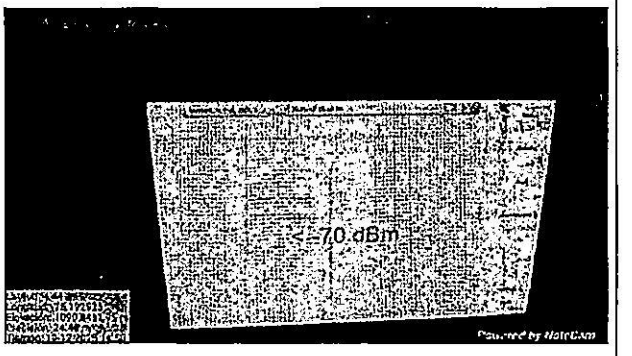

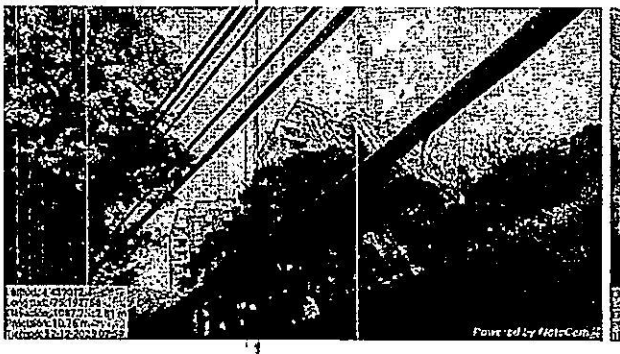





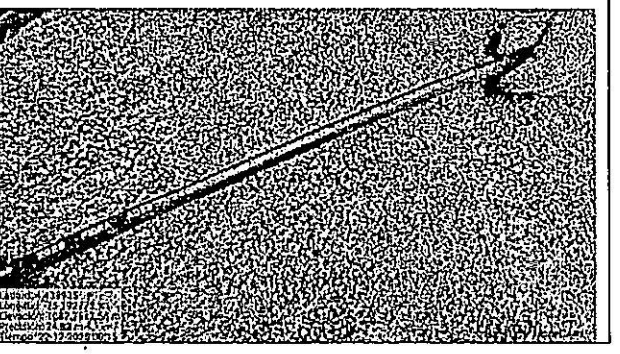

MATERIALES

- 2 Empalmes
- 50 mts de fibra óptica
- 20 amarres de 35 cm

REDCO	ACTA DE CANTIDADES EJECUTADAS	Nº 43 CLIENTE: ALCALDIA DE IBAGUE	REDCO

EMPRESA:	INGENIERIA REDCO	DIRECCIÓN (LINEA NEGOCIOS):	INFRAESTRUCTURA		
NIT:	900303669-2	COORDINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA		
DIRECCIÓN:	Carrera 46 Sur 116-24 San Fco Aparco, Ibagué – Tolima	COD CENTRO DE COSTOS:			
TELEFONO:	3148943894	NOMBRE CENTRO DE COSTOS:	ALCALDIA DE IBAGUE		
RESPONSABLE:	MILTON GOMEZ	CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS		
PROVEEDOR:	MUNICIPIO DE IBAGUE	CONTRATO No:	2608	VALOR	1,100,000,000
NIT:	800113389-7	ANEXO No:		VALOR ANEXO:	
DIRECCIÓN:	Cl. 9 #2-1	OTROSI No:		VALOR OTROSI:	
CIUDAD:	IBAGUE			FECHA	DICIEMBRE
TELEFONO:	(608) 2611182			VALOR:	
CONTACTO:	SERGIO ARMANDO SAAVEDRA MOJICA				

CONCEPTO:	VERIFICACION INFRAESTRUCTURA EN PUNTO SIN POTENCIA, PUNTO DE DAÑO CAMARA 105

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VLR. UNIT	VLR.TOTAL
1,00	Caja de Empalme (exteriores) - Mufla. 24 hilos, derivaciones.	UND	2	$ 960.812	$ 1.921.224
2,00	Fibra Óptica por metro 24 hilos, ADSS Span 200 Incluye Empalmes. Monomodo.	MTR	50	$ 6.234	$ 311.700
3,00				$ -	$ -
4,00				$ -	$ -
5,00				$ -	$ -
6,00				$ -	$ -

TOTAL CORTE		$ 2.232.924
COSTO DIRECTO		$ 2.232.924
IVA	19,00%	$ 424.256
TOTAL A PAGAR		$ 2.657.180

FIRMA GERENTE / DIRECTOR / SUBDIRECTOR

FIRMA PROFESIONAL

REDCO	MANTENIMIENTO DE CCTV Y CORRECTIVOS	
	Versión: 1	INGENIERIA REDCO S.A.S


Fecha: DICIEMBRE 2025	**Ciudad:** IBAGUE
Cliente(s): ALCALDIA DE IBAGUE	**Lugar: CAMARA 156**
DIRECTOR PROYECTO: MILTON A GOMEZ H	**TIPO ACTIVIDAD:** CORRECTIVO


NOVEDAD.
DAÑO DE FIBRA
Se realiza revisión de equipos, y se realiza cambio de UPS


Actividades realizadas:

- Registro fotográfico
- Cambio UPS



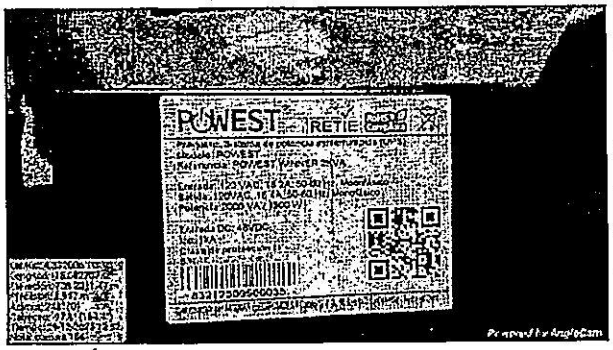

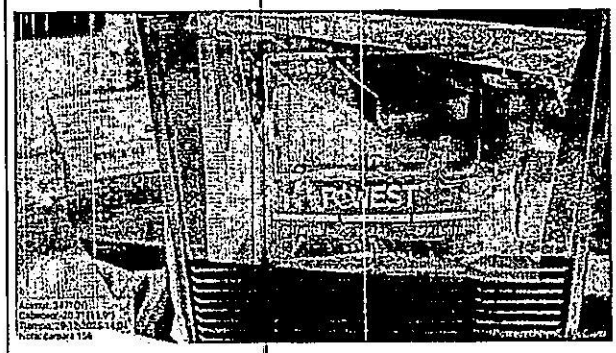

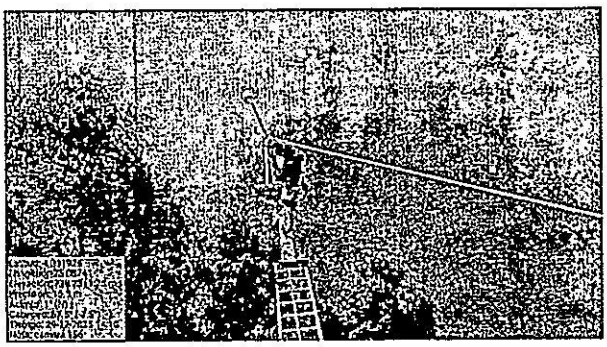

MATERIALES

- 1 UPS

REDCO

ACTA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Nº 45	
CLIENTE:	REDCO
ALCALDIA DE IBAGUE	

EMPRESA:	INGENIERIA REDCO	DIRECCIÓN (UNEA NEGOCIOS):	INFRAESTRUCTURA
NIT:	900303669-2	COORDINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN:	Carrera 46 Sur 116-24 San Fco Aparco, Ibagué – Tolima	COD CENTRO DE COSTOS:	
TELEFONO:	3148943894	NOMBRE CENTRO DE COSTOS:	ALCALDIA DE IBAGUE
RESPONSABLE:	MILTON GOMEZ	CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS

PROVEEDOR:	MUNICIPIO DE IBAGUE	CONTRATO No:	2608	VALOR	1,100,000,000
NIT:	800113389-7	ANEXO No:		VALOR ANEXO:	
DIRECCIÓN:	Cl. 9 #2-1	OTROSI No:		VALOR OTROSI:	
CIUDAD:	IBAGUE			FECHA	DICIEMBRE
TELEFONO:	(608) 2611182			VALOR:	
CONTACTO:	SERGIO ARMANDO SAAVEDRA MOJICA				

CONCEPTO:	VERIFICACION INFRAESTRUCTURA EN PUNTO SIN POTENCIA, PUNTO DE DAÑO CAMARA 156

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VLR. UNIT	VLR.TOTAL
1,00	UPS 1 KVA. Nueva.	UND	1	$ 2.533.717	$ 2.533.717
2,00				$ -	$ -
3,00				$ -	$ -
4,00				$ -	$ -
5,00				$ -	$ -
6,00				$ -	$ -

TOTAL CORTE		2.533.717
COSTO DIRECTO		2.533.717
IVA	19,00%	481.406
TOTAL A PAGAR		3.015.123

FIRMA GERENTE / DIRECTOR / SUBDIRECTOR

FIRMA PROFESIONAL



REDCO	MANTENIMIENTO DE CCTV Y CORRECTIVOS	
	Versión: 1	INGENIERIA REDCO S.A.S



Fecha: DICIEMBRE 2025	**Ciudad:** IBAGUE
Cliente(s): ALCALDIA DE IBAGUE	**Lugar: CAMARA 136**
DIRECTOR PROYECTO: MILTON A GOMEZ H	**TIPO ACTIVIDAD:** CORRECTIVO



NOVEDAD.
DAÑO DE FIBRA
Se realiza revisión de equipos, se encuentra fibra en mal estado, y se realiza instalación de empalme






Actividades realizadas:

- Registro fotográfico
- Toma de potencias
- Cambio de fibra
- Fusiones de empalmaría
- Instalación de empalmes

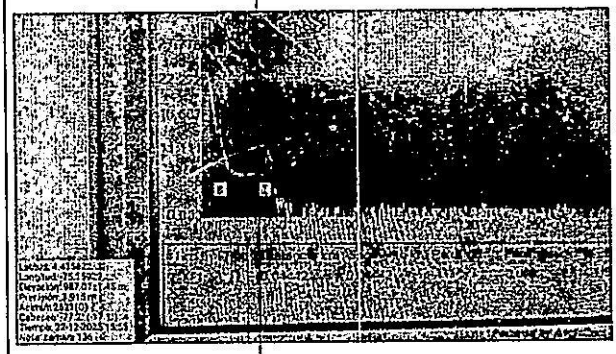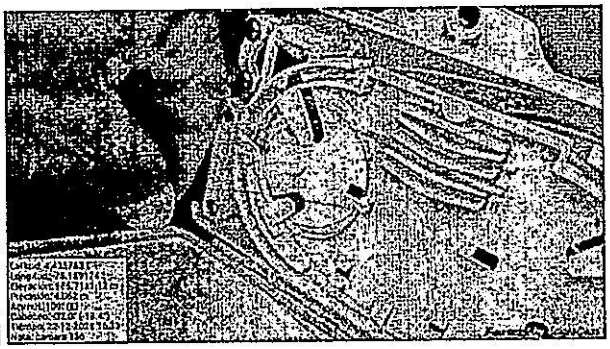MATERIALES

- 1 empalme
- 54 mts de fibra óptica
- 2 herrajes de retención
- 2 trompoplatinas
- 2 mts de cinta bandy
- 2 hebillas
- 15 amarres de 35 cm

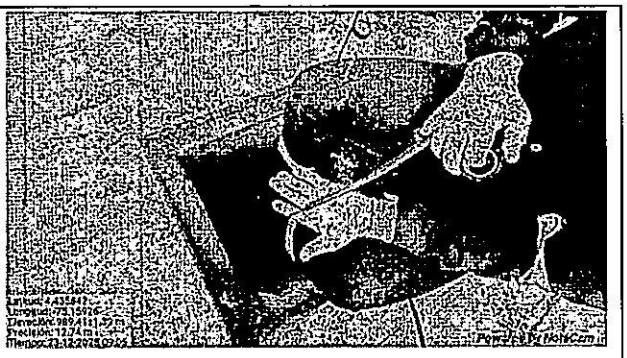REDCO	ACTA DE CANTIDADES EJECUTADAS	N° 44	REDCO
		CLIENTE:	
		ALCALDIA DE IBAGUE	

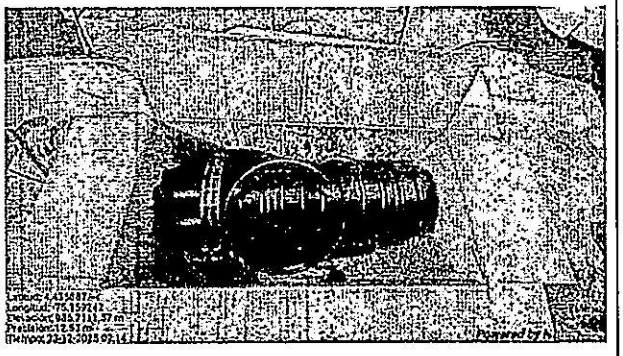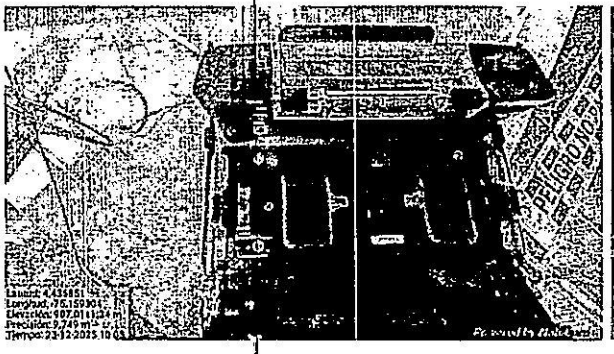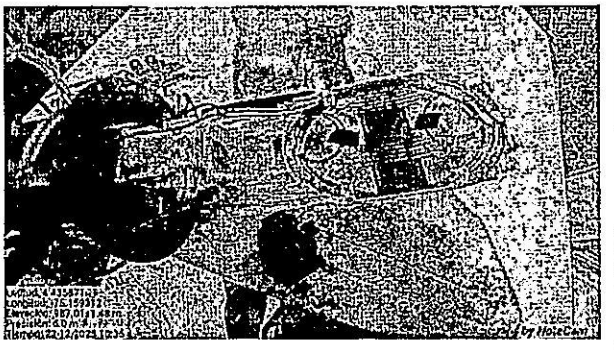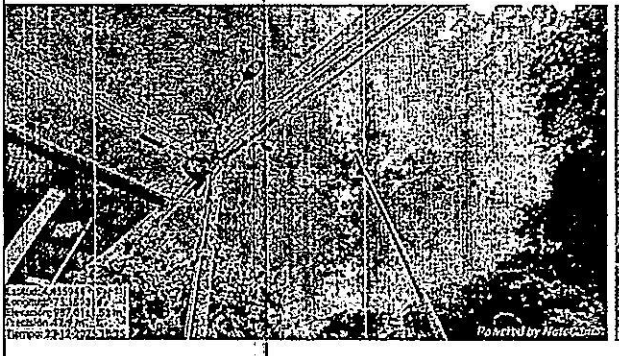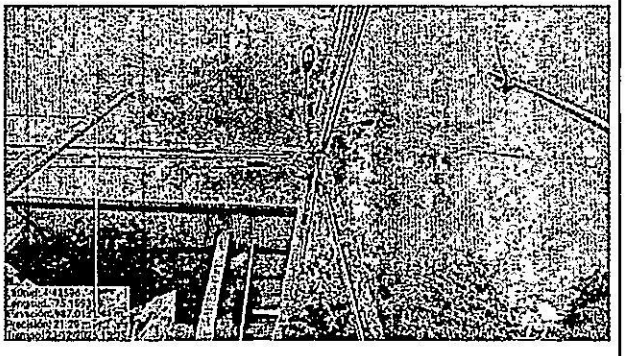EMPRESA:	INGENIERIA REDCO	DIRECCIÓN (LINEA NEGOCIOS):	INFRAESTRUCTURA		
NIT:	900303669-2	COORDINACIÓN:	INFRAESTRUCTURA		
DIRECCIÓN:	Carrera 46 Sur 116-24 San Fco Aparco, Ibagué – Tolima	COD CENTRO DE COSTOS:			
TELEFONO:	3148943894	NOMBRE CENTRO DE COSTOS:	ALCALDIA DE IBAGUE		
RESPONSABLE:	MILTON GOMEZ	CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS		
PROVEEDOR:	MUNICIPIO DE IBAGUE	CONTRATO No:	2608	VALOR	1,100,000,000
NIT:	800113389-7	ANEXO No:		VALOR ANEXO:	
DIRECCIÓN:	Cl. 9 #2-1	OTROSI No:		VALOR OTROSI:	
CIUDAD:	IBAGUE			FECHA	DICIEMBRE
TELEFONO:	(608) 2611182			VALOR:	
CONTACTO:	SERGIO ARMANDO SAAVEDRA MOJICA				

CONCEPTO:	VERIFICACION INFRAESTRUCTURA EN PUNTO SIN POTENCIA, PUNTO DE DAÑO CAMARA 136

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VLR. UNIT	VLR.TOTAL
1,00	Caja de Empalme (exteriores) - Mufla, 24 hilos, derivaciones.	UND	1	$ 960.612	$ 960.612
2,00	Fibra Optica por metro 24 hilos, ADSS Span 200 Incluye Empalmes. Monomodo.	MTR	54	$ 6.234	$ 336.636
3,00				$ -	$ -
4,00				$ -	$ -
5,00				$ -	$ -
6,00				$ -	$ -

TOTAL CORTE		$ 1.297.248
COSTO DIRECTO		$ 1.297.248
IVA	19,00%	$ 246.477
TOTAL A PAGAR		$ 1.543.725

FIRMA GERENTE / DIRECTOR / SUBDIRECTOR

FIRMA PROFESIONAL
