Acta No:	10	Tema:	Comité Obra Contrato 2025-2780
Fecha:	30/01/2026	Ubicación:	Consorcio Movilidad Capital, Calle 74 No. 20C-04
Hora Inicio:	8:00 A.M.	Hora Fin:	11:00 AM

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo	Seguimiento técnico, administrativo y operativo al contrato No. 2025-2780.
Agenda	1. Presentación y registro de asistencia. 2. Seguimiento a compromisos. 3. Seguimiento al desarrollo y avance de ejecución del contrato. 4. Compromisos

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación y registro de asistencia

Se registró la asistencia a la reunión en el listado de asistencia (se adjunta listado de asistencia).

2. Seguimiento compromisos anteriores

Tabla 1. Compromisos del Comité Mensual No.9

No	Descripción	Responsable	Fecha Limite
1	Respuesta a requerimento SEM-CMC-CBM-142-25 (AK 19 X CL 45).	Contratista	Cumplido
2	Completar base de datos que se creó por parte de la SDM con el seguimiento de cantidades de obra.	Interventoría	Cumplido
3	Presentación a la SDM y a la interventoría del plan de acción y plan de choque para los PMT's, articulando cronograma con IDPC.	Contratista	Cumplido
4	Subsanación en las reiteraciones interpuestas a los contratistas por parte de la interventoría en el área ambiental.	Contratista	Cumplido Parcialmente
5	Subsanación de los hallazgos evidenciados en bodega el día 12 de diciembre.	Contratista	Cumplido

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

3. Seguimiento al desarrollo y avance de ejecución del contrato

Tabla 2. Ficha Técnica Contrato Lote 1 – Obras Civiles (Norte) No. 2025-2780

Número de contrato	2025-2780
Clase de contrato	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Objeto	"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"
Contratista	CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD
Identificación	901.933.921-0
Interventor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL.
Plazo de ejecución	Diez (10) meses o hasta agotar los recursos, lo que primero suceda, contados a partir de contados de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
Fecha de inicio del contrato	29 de abril de 2025
Fecha de terminación	28 de febrero de 2026
Valor del Contrato	CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 5.141.951.324)
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 106 del 02 de enero del 2025. POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($38.800.000.000) M/CTE.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2448 del 21 de abril de 2025. Por valor de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 5.141.951.324).		
RUBRO:	O232020200888759		
No. Pólizas	Número de póliza de cumplimiento: 400063638 Número de póliza RCE: 400063639		
Fecha de aprobación pólizas iniciales	Suscripción del contrato	RCE	28/04/2025
		Cumplimiento	28/04/2025
	Actualización según acta de inicio	RCE	18/09/2025
		Cumplimiento	18/09/2025
Compañía Aseguradora	Nacional de Seguros		
Proceso de selección No.	SDM-LP-001-2025		

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

a. Área Jurídica

Póliza Las pólizas del contrato se encuentran debidamente aprobadas y vigentes. No obstante, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en trámite una prórroga contractual, la Interventoría recomienda que, una vez esta sea formalmente aprobada, el contratista proceda a realizar la correspondiente actualización de las pólizas, a fin de garantizar la cobertura durante el nuevo plazo contractual.
Cumplimiento Contractual: La Interventoría aprobó el Plan de Acción definitivo presentado por el contratista, el cual actualmente se encuentra en estado de cumplimiento frente a los compromisos establecidos. Así mismo, la Interventoría viene analizando la viabilidad de la prórroga del contrato, la cual se encuentra en etapa de análisis y evaluación técnica, jurídica y financiera, con el propósito de determinar su procedencia conforme a las disposiciones contractuales y normativas aplicables. Una vez concluida dicha verificación y de considerarse viable, la Interventoría emitirá el respectivo concepto para su eventual remisión y trámite ante la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM.

De manera paralela, la Interventoría adelanta la revisión de los avances del Plan de Acción presentado mediante el oficio BEL-SDM-ADM-305-25 y BEL-SDM-ADM-306-25, aprobado a través del comunicado SEM-CMC-CBM-160-25, dejando expresamente claro que dicha aprobación no exonera al contratista de la responsabilidad por los atrasos generados, ni implica modificación alguna de los plazos contractuales, distintos a los expresamente previstos en el cronograma aprobado.

b. Área financiera

Tabla **3.** Balance financiero contrato 2025-2780

Período	Valor total del corte	Valor Rete garantía	Valor por pagar	Valor ejecutado acumulado	Valor pagado acumulado	CRP´S	Saldo CRP´S	Saldo por ejecutar	Fecha de radicación CMC	n.° de Documento contable	Fecha de estado de pago	Fecha de acta de recibo parcial
1/05/2025 al 31/05/202	$14.145.460	$707.273	$13.438.187	$14.145.460	$13.438.187	2448	$5.128.513.137	$5.127.805.864	8/07/2025	3000700776	24/07/2025	4/07/2025
1/06/2025 al 30/06/2025	$62.236.162	$3.111.808	$ 59.124.354	$76.381.622	$72.562.541	2448	$5.069.388.783	$5.065.569.702	6/08/2025	3000822223	22/08/2025	5/08/2025
1/07/2025 al 31/07/2025	$303.006.734	$15.150.336	$287.856.398	$379.388.356	$360.418.939	2448	$4.781.532.385	$4.762.562.968	8/09/2025	3000983868	23/09/2025	5/09/2025
1/08/2025 al 31/08/2025	$302.871.640	$15.143.583	$287.728.057	$682.259.996	$648.146.996	2448	$4.493.804.328	$4.459.691.328	7/10/2025	3001112798	23/10/2025	6/10/2025
1/09/2025 al 30/09/2025	$359.891.182	$17.994.559	$341.896.623	$1.042.151.178	$990.043.619	2448	$4.451.907.705	$4.099.800.146	11/11/2025	3001222336	21/11/2025	6/11/2025
1/10/2025 al 31/10/2025	$425.622.715	$21.281.136	$404.341.579	$1.467.773.893	$1.394.385.198	2448	$3.747.566.126	$3.674.178.157	10/12/2025	3001354717	17/12/2025	3/12/2025
1/11/2025 al 30/11/2025	$444.597.298	$22.229.865	$422.367.433	$1.912.371.191	$1.816.752.631	2448	$3.325.198.693	$3.229.580.133	10/12/2025	3001393311	23/12/2025	9/12/2025
1/12/2025 al 31/12/2025	$411.172.547	$20.558.627	$390.613.920	$2.323.543.738		2448	$2.934.584.773	$2.818.407.586	11/02/2026	3000122864		6/02/2026
TOTALES	$2.323.543.738	$116.177.187	$2.207.366.551									

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

La Interventoría, verificó los soportes reglamentarios de la factura la completitud de la información y remitió la documentación del pago correspondiente al período de diciembre de 2025, para trámite ante la Entidad el 11 de febrero de 2026, mediante comunicado n° SEM-CMC-SDM-162-26 en referencia.

Seguimiento programación PAC

Tabla 4. Seguimiento Programación PAC

Programación PAC	Cuentas de	Valor programado (a)	Valor por pagar (b)	Diferencia (a-b)	% ejecución PAC
Octubre 2025	Agosto 2025	$311.178.769	$287.728.057	$23.450.712	92,46%
Noviembre 2025	Septiembre 2025	$417.110.275	$341.896.623	$75.213.652	81,97%
Diciembre 2025	Octubre 2025	$400.000.000	$404.341.579	-$4.341.579	101,09%
	Noviembre 2025	$428.132.319	$422.367.433	$5.764.886	98,65%
Febrero 2026	Diciembre 2025	$361.000.000	$390.613.920	-$29.613.920	108,20%
TOTALES		$1.917.421.363	$1.846.947.612	$70.473.751	96,32%


Fuente: Consorcio Movilidad Capital

c. Área de calidad

Durante el periodo se realizó la verificación de los factores de calidad correspondientes: a) objetivos de calidad e indicadores, b) control de la información documentada, c) producción, provisión y conformidad de los productos y servicios, d) seguimiento y medición y d) mejora continua. A continuación, se presenta el avance de cada de los factores de calidad evaluados para el periodo.

En la siguiente ilustración se presentan los porcentajes de cumplimiento para cada uno de los factores de calidad indicados.

Ilustración 1. Nivel de cumplimiento factores de calidad _Contrato n° 2025-2780

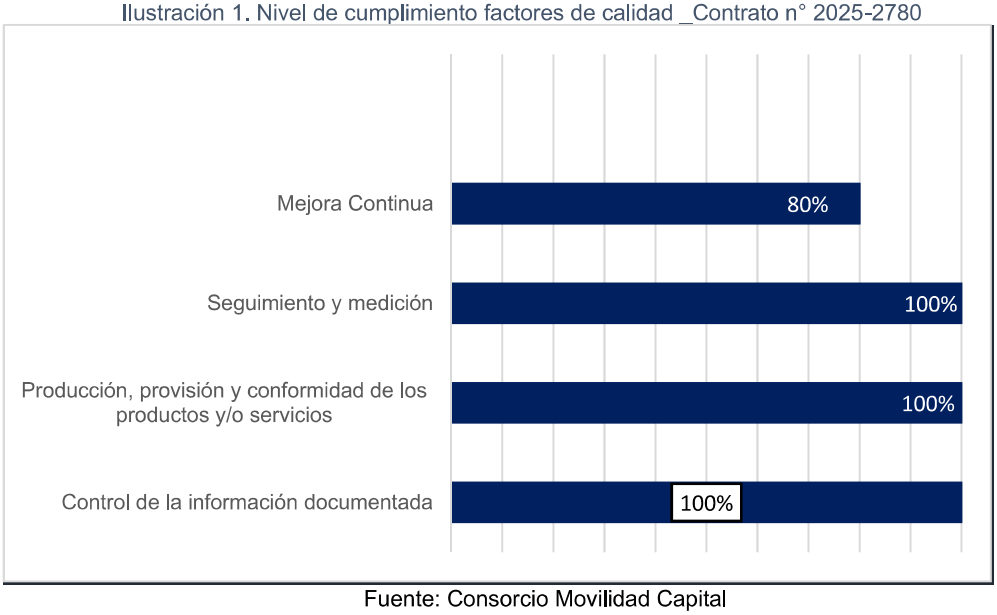

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

El nivel de cumplimiento del plan de calidad del contratista Consorcio Belzcon Movilidad es del 96%. Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

- Factores de calidad “Objetivos de Calidad e Indicadores”: Respecto a este factor durante el periodo se verificó el reporte del cumplimiento de los objetivos de calidad y del proyecto (Formato SEM-CAL-M01- F03), así como los resultados de los indicadores, los cuales están dentro de los rangos de las metas establecidas.

- Factor de Calidad “Control de la Informacicón Documentada”: Respecto en el periodo se llevaron a cabo las actividades correspondientes

  - Revisión periódica del listado maestro de documentos y sus actualizaciones de acuerdo con las disposiciones y controles establecidos en el plan de calidad. Se confirma que para el periodo no se presentan novedades respecto a la incorporación, actualización o derogación de documentos (procedimientos, instructivos y/o formatos)

  - Verificación por muestreo de la aplicación y uso de los formatos vigentes para el desarrollo del proyecto, correspondientes a “Reporte Semanal de Obra”, “Control de lluvias”, “Seguimiento de PMT” y “Entrada a Almacen”. Se confirma que si aplican se aplican los controles correspondientes respecto al uso de la documentación vigente para el periodo.

- Factor de Calidad “Producción, provisión y conformidad de los productos”: Respecto a este factor se llevó a cabo sseguimiento se resultados de la métrica correspondiente Garantizar que el 100% de las obras civiles se ejecuten de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato”, la cual genero resultados de conformidad. Los resultados se soportan en el registro (Reporte del cumplimiento de los objetivos de calidad y del proyecto (Formato SEM-CAL-M01- F03))

- Factor de Calidad “Seguimiento y Medición”: Respecto a este factor de calidad durante el periodo se realizó seguimiento a la aplicación efectiva por parte del equipo en terreno del reporte “Control de inspección y ensayos – Toma de muestras en campo (Formato SEM-TEC-M06- F07)”, el cual permite a la interventoría un control más efectivo en el seguimiento en la toma de muestras para ensayos de laboratorio que reporta el contratista.

- Factor de calidad “Mejora Continua”: Respecto a este factor durante el periodo se adelantaron mesas de trabajo con los componentes se SST y Ambiental y análisis de hallazgos reiterativos correspondientes a: RCD, Cerramientos y Señalización, Dotación y EPP. Resultado de este abordaje multidisciplinario se definieron las acciones de mejora (acciones correctivas) focalizadas en la eliminación de la causa raíz, a fin de que los hallazgos presenten una disminución significativa en sus eventos reiterativos. Los resultados de estas mejoras se soportan en el reporte consolidado de acciones correctivas y preventivas (Formato SEM-CAL-M01- F07)

d. Área ambiental

- El día 22 de enero de 2026, se realizó reunión de seguimiento con el contratista en donde se mencionó y subsano las observaciones del informe correspondiente al mes de enero.
- Mediante el comunicado SEM-CMC-CBM-165-26 del día 7 de enero de 2026 y radicado ORFEO 202661200060752 la Interventoría requiere al Contratista Consorcio Belzcon Movilidad, remitir las certificaciones correspondientes al manejo de los RCD del personal operativo, a más tardar el 02 de febrero de 2026.

Condiciones Ambientales Intersecciones:

Durante el mes se realizaron verificaciones en campo a las intersecciones en las cuales el contratista se encuentra realizando actividades de complementos e intersecciones nuevas semafóricas:

- Localidad de Puente Aranda: TV 42 X CL 4A EXT_2185 ID_1942 y AK 50 X CL 5A EXT_2911 ID_736
- Localidad de Engativá: KR 101 X AC 72 EXT_1564 ID_760 y KR 70G X CL 72 EXT_1176 ID_1930
- Localidad de Chapinero: AK 11 X CLL 67 EXT_1002 ID_213, AK 13 X CLL 46 EXT_2057 ID_291 y AK 13 X CLL 47 EXT_ 2057 ID_286

Como resultado de dichas verificaciones se presentan los siguientes hallazgos:

- No retiro de los RCD en el tiempo estipulado ni cubiertos.
- Recuperación de zonas verdes
- Uso inadecuado del punto ecológico
- Sumideros sin protección
- Individuos arbóreos sin protección

Dichos hallazgos son enviados semanalmente los viernes al contratista mediante comunicados, los cuales el contratista debe subsanar a más tardar los martes de la semana siguiente.

Cargue Reporte de RCD

El día 27 de enero del año en curso, en conjunto con la supervisión, el contratista, el profesional del área ambiental de la secretaria distrital de movilidad y la interventoría. Se realizo el cargue del reporte de los RCD´S correspondiente al mes de diciembre del año 2025.

e. Componente SST

- Se realizo la verificación de 31 inducciones, entrega de EPP y dotación, afiliaciones de seguridad social, Exámenes medico ocupacionales del personal que han ingresado al contrato en el mes de enero.
- De acuerdo con los hallazgos reiterativos en cuanto a la gestión SST. observados en los frentes de trabajo del contrato interventoría realizo una mesa de trabajo el día 15 de enero, se contó con la participación del área de calidad de interventoría y los profesionales de calidad y SST del contratista. Donde se revisaron los hallazgos reiterativos que permanecen sin subsanar a la fecha. Durante esta reunión se establecieron compromisos de acciones de mejora con el contratista, incluyendo fechas límite específicas para su cumplimiento el 21 de enero de 2025 para la entrega parcial de las subsanaciones, y el 30 de enero de 2026 para la subsanación completa de todos los hallazgos reportados.
- Interventoría realizó la verificación a la bodega asignada al contrato el día 19 de enero donde se evidenciaron 4 hallazgos los cuales fueron subsanados por el contratista en los tiempos solicitados.
- Se realizo mesa de trabajo el día 22 de enero con la profesional SST del contratista donde se revisó la gestión SSTA del mes y se solicitó la evaluación de los estándares mínimos del SG-SST, plan de trabajo, cronograma de capacitaciones del 2026.
- Para el mes de enero no se han presentado accidentes o incidentes de trabajo en el contrato
- El 02 de enero el contratista presento mediante comunicado BEL-SDM-ADM-307-26-Alcance oficio BEL-SDM-ADM-298 –25 con radicado de ORFEO: 202661200008042, el reporte semestral del Decreto 332 de 2020 modificado por decreto 634 del 2023 dando así su porcentaje de cumplimiento del 14,29%.

f. Área Tránsito

PMT General

- A la fecha del 30 de enero de 2026, se autorizaron por la SDM las siguientes intersecciones con PMT general:

Tabla **5**. PMT general vigentes Zona Norte – enero de 2026

ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	ESTADO PMT	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
203	1002	KR 11 X CL 69	Chapinero	Aprobado por SDM	4	22/01/2026	23-ene-26	13-feb-26
-	-	AK 50 X AC 63	Teusaquillo	Aprobado por SDM	4	22/01/2026	23-ene-26	6-feb-26
770	3659	AK 50 X CL 16 Sur	Puente Aranda	Aprobado por SDM	4	22/01/2026	23-ene-26	6-feb-26
736	2911	AK 50 X CL 5A	Puente Aranda	Aprobado por SDM	4	22/01/2026	23-ene-26	6-feb-26
258	1488	KR 55 x CL 127	Suba	Aprobado por SDM	4	22/01/2026	23-ene-26	6-feb-26
17	1169	AK 9 X AC 134	USAQUEN	Aprobado por SDM	4	22/01/2026	23-ene-26	6-feb-26

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

PMT Específicos:

- A la fecha 30 de enero de 2026, el estado de los PMT específicos de nuevas intersecciones y complementos es el siguiente:

Tabla **6**. Estado PMT específicos nuevas y complementos mes de enero de 2026

TIPO DE PMT	CANTIDAD	ID	EXT	INTERSECCIÓN	N° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO DEL PMT	COI -APROBADO	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN	COI 01	COI 02	COI 03	COI 04	COI 05	COI 06	COI 07	COI 08	COI 09
												ene-26					feb-26			
												2/01/2026	9/01/2026	16/01/2026	23/01/2026	30/01/2026	6/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	28/02/2026
5 - NUEVAS	1	759	1176	KR 70G X CL 72	202661200096562	9/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 21-ene-2026													
	2	1927	2184	KR 100 X CL 18	202561204576872	15/12/2025	Aprobado por SDM	52	26/12/2025	27-dic-25	26-feb-26									
		1943	2185	TV 42 X CL 4 A	202561204424172	4/12/2025	Aprobado por SDM	50	11/12/2025	12-dic-25	29-ene-26									
	2	1929	1175	AK 104(AV. CALI) X CL 135A	202561203463992	19/09/2025	Plazo Finalizado	40	2/10/2025	10-oct-25	13-nov-25									
		736	1162	AV. BOYACÁ (AK 72) X CL 152	202561203195542	1/09/2025	Plazo Finalizado	37	11/09/2025	12-sep-25	6-nov-25									
40 - COMPLEMETOS	12	1133	1877	KR 58 X AC 170	202661200248352	21/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 29-ene-2026													
		183	1877	KR 62 X CL 169 B	202661200248352	21/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 29-ene-2026													
		167	1877	KR 58 X CL 169 B	202661200248352	21/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 29-ene-2026													
		1167	2961	KR 121 X CL 64	202661200247762	21/01/2026	En revisión por SDM													
		404	2762	KR 17 X AC 32	202661200247352	21/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al													

							CBM el 27-ene-2026														
		432	2762	KR 16 X AC 32	202661200247352	21/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 27-ene-2026														
		177	1194	KR 15 X CL 77	202661200136682	14/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 21-ene-2026														
		274	2056	KR 13 X CL 50	202661200189852	17/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 27-ene-2026														
		279	2056	KR 13 X CL 49	202661200189852	17/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 27-ene-2026														
		424	2152	KR 24 X AC 63	202661200099822	9/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 21-ene-2026														
		1172	1001	KR 11 X CL 66	202561204772612	29/12/2025	En revisión por SDM														
		407	2137	KR 19 X AC 45	202561204756932	29/12/2025	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 06-ene-2026														
40 - COMPLEMETOS	16	670	1372	KR 77 A x AC 72	202561204133832 202561204583982	12/11/2025	Aprobado por SDM	4	22/01/2026	23-ene-26	26-feb-26										
		203	1002	KR 11 X CL 69	202661200096972	9/01/2026	Aprobado por SDM	4	22/01/2026	23-ene-26	26-feb-26										
		213	1002	KR 11 X CL 67	202661200096972	9/01/2026	Aprobado por SDM	4	22/01/2026	23-ene-26	26-feb-26										
		354	1151	AK 24 X CL 66	202661200061772	7/01/2026	Aprobado por SDM	4	22/01/2026	23-ene-26	26-feb-26										
		770	3659	AK 50 X CL 16 Sur	202561201666352	10/10/2025	Aprobado por SDM	4	22/01/2026	23-ene-26	6-feb-26										
		354	2749	KR 19A X CL 63	202561204786382	31/12/2025	Aprobado por SDM	3	15/01/2026	16-ene-26	26-feb-26										
		318	2132	KR 17 X AC 63	202561204787202	31/12/2025	Aprobado por SDM	3	15/01/2026	16-ene-26	26-feb-26										
		298	2132	KR 16 X AC 63	202561204787202	31/12/2025	Aprobado por SDM	3	15/01/2026	16-ene-26	26-feb-26										
		282	1029	KR 19 X CL 69	202561204031512 202561204499502	5/11/2025	Aprobado por SDM	3	15/01/2026	16-ene-26	26-feb-26										
		297	1029	KR 20 X CL 69	202561204031512 202561204499502	5/11/2025	Aprobado por SDM	3	15/01/2026	16-ene-26	26-feb-26										
		607	2813	KR 37 x AC 24	202561204031962 202561204424522	5/11/2025	Aprobado por SDM	2	8/01/2026	9-ene-26	26-feb-26										
		1467	1557	KR 106 x AC 132	202561204050182 202561204499152	6/11/2025	Aprobado por SDM	2	8/01/2026	9-ene-26	26-feb-26										
		267	2055	KR 13 X CL 53	202561204132712 202561204584482	12/11/2025	Aprobado por SDM	2	8/01/2026	9-ene-26	26-feb-26										
		857	2918	KR 103 A X CL 17	202561204787412	31/12/2025	Aprobado por SDM	2	8/01/2026	16-ene-26	26-feb-26										
		589	1359	KR 68 H X AC 72	202561204133472 202561204583622	12/11/2025	Aprobado por SDM	1	2/01/2026	3-ene-26	28-feb-26										
		742	1564	KR 101 X AC 72	202561204424302	4/12/2025	Aprobado por SDM	50	11/12/2025	19-dic-25	12-feb-26										
40 - COMPLEMETOS	11	291	2057	KR 13 X CL 46	202561204132912	12/11/2025	Plazo Finalizado	52	26/12/2025	27-dic-25	29-ene-26										
		286	2057	KR 13 X CL 47	202561204132912	12/11/2025	Plazo Finalizado	52	26/12/2025	27-dic-25	29-ene-26										
		770	3660	AK 50 X CL 1G	202561204424372	4/12/2025	Plazo Finalizado	50	11/12/2025	12-dic-25	29-ene-26										
		79	1302	AK 19 X AC 134	202561204424452	4/12/2025	Plazo Finalizado	50	11/12/2025	12-dic-25	29-ene-26										

		708	2912	TV 42 X AC 6	202561203968442	30/10/2025	Plazo Finalizado	45	6/11/2025	13-nov-25	29-ene-26	
		759	3664	AK 50 X AC 8 Sur	202561203821322	17/10/2025	Plazo Finalizado	44	30/10/2025	31-oct-25	30-nov-25	
		1316	2911	AK 50 X CL 5A	202561203821132	17/10/2025	Plazo Finalizado	44	30/10/2025	31-oct-25	30-nov-25	
		772	3410	KR 56 X AC 3	202561203751602	14/10/2025	Plazo Finalizado	43	23/10/2025	24-oct-25	27-nov-25	
		742	2950	AK 50 X CL 4F	202561203742822	10/10/2025	Plazo Finalizado	43	23/10/2025	24-oct-25	17-nov-25	
		770	2843	AK 86 (AV. Cali) x CL 23	202561203351612	11/09/2025	Plazo Finalizado	41	9/10/2025	10-oct-25	11-dic-25	
		1924	3658	AK 50 X CL 2C	202561202505792	17/07/2025	Plazo Finalizado	30	24/07/2025	25-jul-25	15-ago-25	
	1	1692	1078	AV 9 X CL 127	N.A.	N.A.	No se puede ejecutar por permisos de ocupación de Cause y temas IDU	-	N.A.	N.A.	N.A.	

	PMT radicado en la SDM en revisión y/o con OBS
	PMT Aprobado por SDM
	PMT Finalizado
	No se puede ejecutar

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

Seguimientos a PMT en obras:

- Al 30 de enero de 2026, se han evaluado un total de nueve (9) intersecciones con PMT y se han realizado un total de treinta y tres (33) seguimientos encontrando que los PMT se implementan de acuerdo con lo aprobado, sin embargo, durante este periodo se ha identificado algunos frentes de obra sin cerramientos y la protección adecuada según el PMT aprobado en los siguientes sitios:
- EXT_2185 ID_1943 – TV 42 X CL 4A
- EXT 1002 ID 213 – KR 11 x CL 67
- EXT 1564 ID 742 – KR 101 x CL 72
- Lo anterior se solicitó al CMB incluir los ajustes respectivos en cada uno de los sitios quedando subsanado al finalizar el mes.

g. Mántum

- En el periodo comprendido del 1 al 26 de enero de 2026 se realizaron las siguientes actividades en relación con el componente Mántum:

  - Actualización de perfiles de usuario para permitir el acceso a Informes Mántum incluyendo Informe de Bitácora.
  - Sesión de retroalimentación con contratista el 21 de enero de 2026 donde se revisaron los ajustes en perfiles de usuario y se socializó el procedimiento para generar y descargar el Informe de Bitácora e Informes personalizados desde la plataforma Mántum. Acta No 30 componente Mántum.

- Con corte al 26 de enero de 2026, se encuentran nueve (9) registros de actividades en la plataforma Mántum para el contratista CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD. [SE-301], resaltando el hecho de que en el informe de bitácora no se reflejan las SS 2026-00906 y 2026-01520:

SS No	OT No	NEI	ID_SIG	Dirección	LOCALIDAD	Diagnóstico	Solución	ACTIVIDAD
2026-00690	2026-000685	213	1002	AV GERMAN ARCINIEGAS (AK 11) X CL 67	CHAPINERO	Intersección en servicio. Actividades de obras civiles.	Actividades en el NEI-1002 / ID-213, inicio de actividades de complemento a intersección existente.	COMPLEMENTO
2026-00820	2026-000814	342	2041	KR 16 X CL 49	TEUSAQUILLO	Intersección en servicio. Actividades de obras civiles.	Actividades en el NEI 2041 / ID 342. Inicio de actividades de mantenimiento correctivo de obras civiles.	CORRECTIVO
2026-00863	2026-000857	322	2041	KR 15 X CL 49	TEUSAQUILLO	Intersección en servicio. Servicio cancelado.	Servicio cancelado.	CANCELADO
2026-00865	2026-000859	342	2041	KR 16 X CL 49	TEUSAQUILLO	Intersección en servicio. Actividades de obras civiles.	Actividades en el NEI-2041 / ID-342. Se finalizan actividades de mantenimiento correctivo de obras civiles.	CORRECTIVO
2026-00906	2026-000900	1939	2150	TV 112B BIS A X AC 63	ENGATIVA	Intersección en servicio. Servicio cancelado.	Servicio cancelado	CANCELADO
2026-01520	2026-001500	1923	3124	AK 50 X TV 42 W	PUENTE ARANDA	Intersección en servicio. Actividades de obras civiles.	Actividades en el NEI-3124 / ID-1923. Fin de actividades de construcción de nueva intersección, fecha efectiva de finalización (13-sep-2025).	NUEVA INTERSECCION
2026-01534	2026-001513	286	2057	KR 13 X CL 47	CHAPINERO	Intersección en servicio. Actividades de obras civiles.	Actividades en el NEI 2057 / ID 286. Inicio de actividades de complemento a intersección existente.	COMPLEMENTO
2026-01883	2026-001857	203	1002	AV GERMAN ARCINIEGAS (AK 11) X CL 69	CHAPINERO	Intersección en servicio. Actividades de obras civiles.	Actividades en el NEI 1002 / ID 203. Inicio de actividades de complemento a intersección existente.	COMPLEMENTO
2026-01888	2026-001862	291	2057	KR 13 X CL 46	CHAPINERO	Intersección en servicio. Actividades de obras civiles.	Actividades en el NEI-2057 / ID-291: Inicio de actividades de complemento a intersección existente.	COMPLEMENTO

- La Interventoría presenta el resumen de los 77 registros generados por el contratista desde el inicio del contrato 29 de abril de 2025 hasta el 26 de enero de 2026:

ACTIVIDAD	Conteo SS
CORRECTIVO	45
COMPLEMENTO	18
NUEVA INTERSECCION	8
CANCELADO	6
Suma total	**77**

- Con corte al 26 de enero de 2026, se encuentran actividades en curso para las siguientes intersecciones, de acuerdo con los registros generados en Mántum:

ACTIVIDAD	NEI	ID	DIRECCION	Conteo SS
COMPLEMENTO	1002	203	AV GERMAN ARCINIEGAS (AK 11) X CL 69	1
	1002	213	AV GERMAN ARCINIEGAS (AK 11) X CL 67	1
	1564	760	KR 101 X AV CHILE (AC 72)	1
	2057	286	KR 13 X CL 47	1
	2057	291	KR 13 X CL 46	1

	2911	736	AV BATALLON CALDAS (AK 50) X CL 5A	1
	2950	742	AV BATALLON CALDAS (AK 50) X CL 4F	1
	3660	759	AV BATALLON CALDAS (AK 50) X CL 1G	2
	3664	767	AV BATALLON CALDAS (AK 50) X AV FUCHA (AC 8 S)	1
			Total COMPLEMENTO	10
NUEVA INTERSECCION	1176	1930	KR 70G Y 70F X CL 72	1
	2185	1942	TV 42 X CL 4A	1
			Total NUEVA INTERSECCION	2
			Suma total	**12**

h. Ejecución del contrato

- **Ordenes de trabajo**

La Interventoría Consorcio Movilidad Capital informa que, con corte al 29 de enero de 2026, se registran treinta y uno (31) órdenes de trabajo en el proyecto. A continuación, se presenta una tabla con las ordenes de trabajo que se presentaron en el mes y las que están a la fecha sin ejecutar

Tabla 7. Relación ordenes de trabajo

Orden de trabajo No.	OBJETO	FECHA	FECHA ENVIO AL CONTRATISTA	ESTADO
1	Fabricación de 50 tapas normales y 50 antivandálicas	21-may-25	21-may-25	Ejecutado
2	Suministro 4 AUCES	21-may-25	21-may-25	Ejecutado
2A	Construcción de intersecciones (5) nuevas y (33) complementos*	08-jun-25	08-junio-	Pendientes por ejecutar 36 de 38
3	Mantenimiento entrega de (5) intersecciones	16-jun-25	18-jun-25	Pendiente por ejecutar 1 de 5
3A	Construcción de (15) Complementos	01-jul-25	01-jul-25	Pendientes por ejecutar 15 de 15
4	Mantenimiento entrega de (4) intersecciones	05-jul-25	10-jul-25	Ejecutado
5	Atención Mto Emergencia intersección AK 40 X AC 20	12-jul-25	12-jul-25	Ejecutado
6	Mantenimiento entrega de (3) intersecciones	15-jul-25	17-jul-25	Pendientes por ejecutar 1 de 3
7	Atención Mto Emergencia intersección KR 60 CL 2C AC3	15-jul-25	18-jul-25	Ejecutado
8	Atención Mto Emergencia de (2) intersecciones	08-jul-25	18-jul-25	Ejecutado
9	Fabricación de 50 tapas normales y 50 antivandálicas	17-jul-25	18-jul-25	Ejecutado
10	Mantenimiento entrega de (3) intersecciones	24-jul-25	25-jul-25	Ejecutado
11	Atención Mto Emergencia intersección AK 86 X CL 66A - KR 83 X CL 66A	28-jul-25	30-jul-25	Ejecutado
12	Fabricación de 5 AUCES intersecciones nuevas	30-jul-25	30-jul-25	En ejecución
13	Atención Mto Emergencia intersección AK 9 X AC 134	30-jul-25	08-ago-25	Ejecutado
14	Atención Mto Emergencia intersección KR 16 X AC 57 - KR 17 X AC 57	08-ago-25	08-ago-25	Ejecutado
15	Fabricación de 100 tapas antivandálicas	15-ago-25	15-ago-25	En ejecución
16	Mantenimiento entrega de (3) intersecciones**	15-ago-25	15-ago-25	Pendientes por ejecutar 2 de 3
17	Construcción de intersección nueva TV 42 X CL 4A	22-ago-25	25-ago-25	En ejecución
18	Mantenimiento entrega de (2) intersecciones	26-ago-25	26-ago-25	Sin ejecutar

20	Fabricación de 75 tapas normales y 25 antivandálicas	22-sep-25	23-sep-25	Sin ejecutar
21	Retiro base semafórica portátil intersección Av. Américas KR 60	10-oct-25	10-oct-25	Sin ejecutar
22	Mantenimiento de intersección TV 3 X CL 53	13-oct-25	16-oct-25	Sin ejecutar
23	Fabricación de 75 tapas normales y 25 antivandálicas	18-nov-25	18-nov-25	Sin ejecutar
24	Atención Mto Emergencia intersección KR 32 X AC 6	05-dic-25	05-dic-25	Ejecutado
25***	Atención Mto Emergencia intersección KR 24 X AC 44 S	10-dic-25		N/A (OT ANULADA)
26	Revisión y mantenimiento intersección AK 7 X CL 81	26-dic-25	26-dic-25	Sin ejecutar
27	Atención Mto instalación ducto intersección AK 86 X CL 23	2-ene-26	4-ene-26	Sin ejecutar
28	Atención Mto intersección AK 7 X CL 70	7-ene-26	23-ene-26	Sin ejecutar
29	Atención Mto Emergencia intersección KR 16 X CL 49	6-ene-26	7-ene-26	Ejecutado
30	Atención Mto Emergencia intersección AK 7 X CL 112	6 -ene-26	7-ene-26	Sin ejecutar

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

*Se emitió orden de trabajo 2A con (33) complementos de los cuales se realizó la verificación y (8) no se encuentran relacionados en el consolidado final. Se aclara que mediante el comunicado emitido por la SDM n.° radicado 202532208108141 del 06 de julio de 2025 se realizaron modificaciones al listado inicialmente establecido debido a factores externos no atribuibles a la subdirección de semaforización.

**Intersección KR 55 X CL 170 EXT 1492, esta solicitud se ha realizado mediante la OT No. 6, No se tiene en cuenta en la orden 16.

*** Orden de trabajo 25 anulada ya que la emergencia no correspondía al Lote 1.

- **Intersecciones Nuevas**

El análisis de programación y avance se realiza teniendo en cuenta la programación presentada por el contratista de fecha 16 de octubre de 2025.

A continuación, se presenta el avance de obras de las intersecciones nuevas:

Tabla 8. Avance de obras de las intersecciones nuevas

EXTERNO	ID	DIRECCIÓN	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FINAL CRONOGRAMA	FECHA FINAL PLAN DE MEJORAMIENTO	% PROGRAMADO 29/01/2026	% EJECUTADO 29/01/2026	AVANCE
		INTERSECCIONES NUEVAS						
1162	1928	AV BOYACÁ X CL 152	5/05/2025	03/09/2025		100%	100%	0%
1175	1929	AV CALI X CL 135	5/05/25	06/10/2025		100%	100%	0%
1176	1930	KR 70G X CL 72	5/05/2025	12/12/2025	24/01/2026	100%	36%	-64%
2184	1327	KR 100 X CL 18	5/05/2025	15/01/2026	31/01/2026	100%	5%	-95%
2185	1942	TV 42 X CL 4A	2/10/2025	10/12/2025	12/01/2026	100%	89%	-11%

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

- **Complementos**

La Interventoría Consorcio Movilidad Capital informa que, con corte al 29 de enero de 2026, se presenta el balance general de complementos, el cual se detalla a continuación:


Tabla 9. Balance general complementos

DETALLE	CANTIDAD
Total	40*
Ejecutados	5
Pendientes por ejecutar al 29/01/2026	32

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

*De estos 40 complementos se retiraron 3, KR 9 X CL 127 por medio del comunicado SEM-CMC-SDM-118-25 con radicado Orfeo No 202561204579052 del 16 de diciembre 2025. KR 13 X CL 67 está la va a realizar el metro, y la TV 42 X AC 6 ya que en esta intersección fue intervenida por el IDU.

Ilustración 2. Avance Complementos CTO 2025-2780

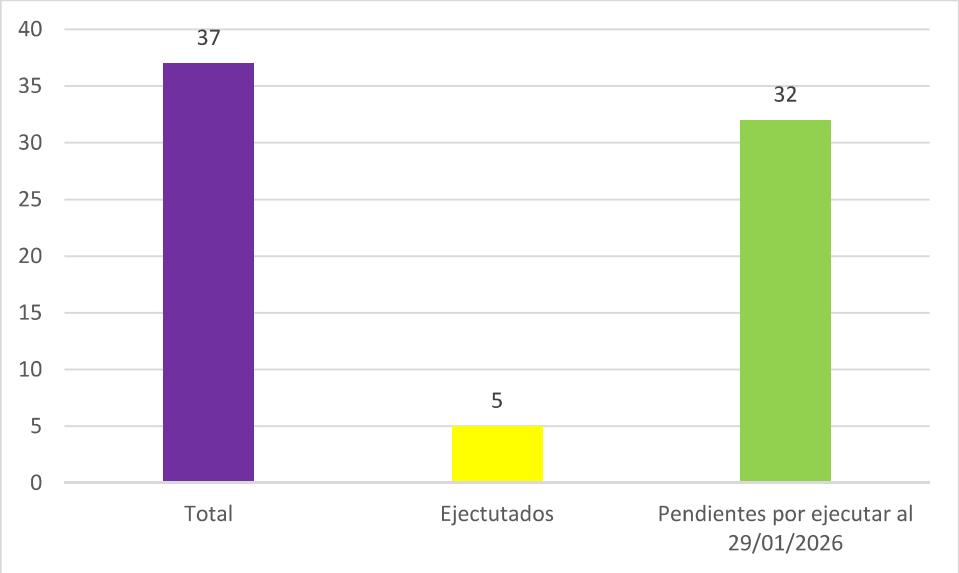

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

Se presenta a continuación un cuadro resumen donde se muestran todos los complementos con sus respectivas fechas de inicio del cronograma y su fecha final, así mismo el porcentaje programado a la fecha y el ejecutado:

Tabla 10. Avance Complementos

Dirección	EXTERNO	ID	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FINAL CRONOGRAMA	FECHA FINAL PLAN DE MEJORAMIENTO	Programado 29/01/2026	Ejecutado 29/01/2026
AK 50 x DG 16 S	3659	770	28/07/25	16/09/25	19/01/26	100%	95%
AK 50 x AC 8 S	3664	767	07/07/25	13/08/25	05/01/26	100%	100%
AK 50 x CL 1G	3660	759	14/07/25	01/09/25	19/01/26	100%	94%
AK 50 x CL 2C	3658	1316	07/07/25	20/08/25	05/01/26	100%	100%
AK 50 x CL 4F	2950	742	04/08/25	14/09/25	05/01/26	100%	100%
AK 50 x CL 5A	2911	736	04/08/25	13/09/25	19/01/26	100%	95%
TV 42 X AC6	2912	708	Complemento retirado por intervención del IDU				
KR 9 X CL 127	1078	1692	Realizado el análisis, el complemento no es viable en el marco del contrato vigente, ya que requiere trámites administrativos y/o técnicos que superan el plazo contractual.				
TV 21 X DG 45 D X CL 45C BIS	2735	447	13/01/26	28/02/26	Pendiente	0%	0%
KR 37 x AC 24	2813	607	31/10/25	18/12/25	24/02/26	100%	5%
KR 13 x CL 50	2056	274	04/10/25	30/11/25	N/A	100%	2%
KR 101 x AC 72	1564	760	01/09/25	29/10/25	17/01/26	100%	95%
AK 11 x CL 69	1002	203	06/10/25	07/11/25	24/01/26	100%	25%
AK 11 x CL 67	1002	213	06/10/25	07/11/25	24/01/26	100%	51%
KR 13 x CL 67*	1160	235	Retirada. No se ejecutará debido a que se encuentra en proyecto Metro				
AK 11 x CL 66	1001	1172	22/09/25	11/11/25	N/A	100%	7%
KR 56 x AC 3	3410	772	01/09/25	15/10/25	N/A	100%	100%
KR 19 x AC 45 (KR 20 X CL 45)	2137	407	22/09/25	28/11/25	28/02/26	100%	0%
AK 24 x CL 66	1151	384	22/09/25	06/11/25	31/01/26	100%	28%
AV CALI x CL 23	2843	384	01/09/25	18/10/25	29/12/25	100%	100%
KR 106 X CL 132	1557	1467	22/11/25	05/12/25	24/01/26	100%	0%

KR 13 X AC 53	2055	267	28/11/25	12/12/25	24/01/26	100%	0%
KR 13 X CL 47	2057	286	26/11/25	10/12/25	24/01/26	100%	80%
KR 13 X CL 48	2057	291	06/12/25	20/12/25	24/01/26	100%	80%
KR 121 X CL 64	2961	1167	13/12/25	27/12/25	Pendiente	100%	0%
KR 103A X CL 17	2918	857	11/12/25	23/12/25	Pendiente	100%	0%
AK 24 X CL 63	2152	424	22/12/25	07/01/26	Pendiente	100%	0%
KR 19A X CL 63	2749	354	29/12/25	10/01/26	Pendiente	100%	0%
KR 17 X AC 63	2132	318	24/12/25	08/01/26	Pendiente	100%	0%
KR 16 X CL 63	2132	298	08/01/26	21/01/26	Pendiente	100%	0%
KR 16 X AC 32	2762	404	13/01/26	24/01/26	N/A	100%	0%
KR 17 X AC 32	2762	432	09/01/26	23/01/26	Pendiente	100%	0%
KR 68H X AC 72	1359	589	22/01/26	04/02/26	N/A	60%	0%
KR 77A X AC 72	1372	670	26/01/26	10/02/26	N/A	30%	0%
KR 19 X CL 69	1029	282	24/01/26	06/02/26	N/A	400%	0%
KR 20 X CL 69	1029	297	05/02/26	18/02/26	N/A	0%	0%
KR 15 X CL 77	1194	177	11/02/26	24/02/26	N/A	0%	0%
AK 58 X CL 170	1877	1133	07/02/26	20/02/26	N/A	0%	0%
KR 62 X CL 169B	1877	183	19/02/26	28/02/26	N/A	0%	0%
KR 158 X CL 169B	1877	167	19/02/26	28/02/26	N/A	0%	0%

Fuente: Consorcio Movilidad Capital


* Intersección de la KR 13 X CL 67 se retiró debido a que la realizara el metro como se informó en el oficio 202532213400651 del 14 de octubre de 2025.

La Interventoría informa que, de acuerdo con la tabla presentada, se evidencia un atraso significativo en la ejecución de las actividades programadas en todos los frentes de obra, a la fecha se han recibido por parte de la interventoría 5 complementos, sin embargo, como se muestra en la tabla, 10 complementos cuentan con retraso en las fechas establecidas en el plan de mejora.

- **Mantenimientos**

La Interventoría Consorcio Movilidad Capital informa que, con corte al 29 de enero de 2026, se presenta el balance general de mantenimientos, el cual se detalla a continuación:

Ilustración 3. Avance ejecución de mantenimientos contrato 2025-2780

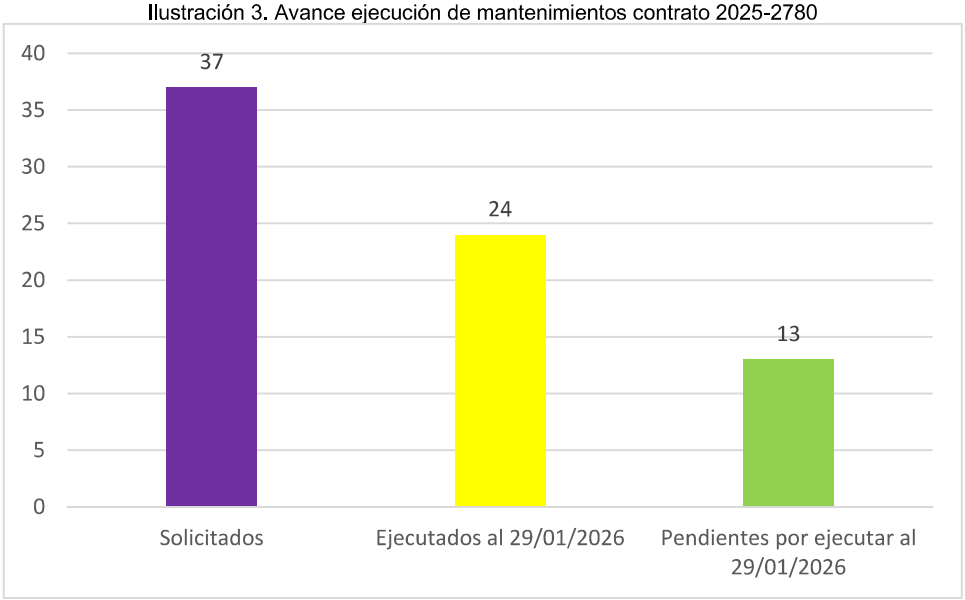

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

Tabla 11. Balance general mantenimientos

DETALLE	CANTIDAD
Solicitados	37
Ejecutados al 29/01/26	24
Pendientes por ejecutar al 29/01/26	13

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

- **Requerimientos previos**

La Interventoría presenta el consolidado de las comunicaciones emitidas y recibidas en el marco de los requerimientos previos en los diferentes frentes de obra.

Tabla 12. Comunicaciones requerimientos previos

Consecutivo	Asunto	OBSERVACION
SEM-CMC-CBM-182-26	REQUERIMIENTO PREVIO PROGRAMACIÓN DE OBRAS SEGÚN CRONOGRAMA – 9 INTERSECCIONES	A la fecha no se recibe respuesta por parte del contratista.

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

Varios

- Si bien se debe hacer entrega oficial de cada intersección con plano récord, ensayos, cuadro valorizado y formato recibo de satisfacción por parte de la interventoría en el informe correspondiente, se solicita vía correo remitir dicha información, para poder adelantar los tramites de planeamiento y señalización.
- El contratista indica que la intersección de la KR 13 X CL 47 finaliza el sábado 31 de enero de 2026 y se entrega a la interventoría el lunes 2 de febrero de 2026.
- Se debe informar previamente a la interventoría todos los frentes de trabajo en los que se vayan a iniciar actividades.
- La supervisión pide a la interventoría tener más presencia en los frentes de trabajo en terreno por parte del residente, para así tener más seguimiento y control, así mismo se pide hacer más seguimiento a la parte financiera.
- Se hace llamado de atención por parte de la SDM al contratista por la reiteración de incumplimientos en materia ambiental, evidenciados en los comités de seguimiento y reportados por la Interventoría.
- Por parte de la SDM se solicita revisar el decreto 643 de 2025 de diciembre para la parte SST.

3. COMPROMISOS

No.	Descripción	Responsable	Fecha Limite
1	Ejecución y entrega de planos récord de la intersección TV 42 X CL 4A	Contratista	04/02/2026
2	Entrega de planos récord a la SDM por parte de la Interventoría de las intersecciones (AK 50 X CL 2C, AK 50 X CL 4F, AK 50 X AC 8 S, Av Cali X CL 23, AV Boyacá X CL 152, AV Cali X CL 135)	Interventoría	04/02/2026
3	Entrega de los planos récord por parte del contratista a la interventoría de las siguientes intersecciones (AK 50 X CL 1G, KR 56 X AC 3, AK 50 X DG 16 S, AK 50 X CL 5 A)	Contratista	31/01/2026

No.	Descripción	Responsable	Fecha Limite
4	Solicitar mesa de trabajo a la gerencia única de PMT para verificar los PMT que están pendientes	Contratista / Interventoría	06/02/2026
5	Entregar de manera detallada las acciones que el Consorcio Belzcon – Movilidad plantea para nivelar los tiempos de desfase y recuperar los tiempos aprobados en el plan de acción de cada una de las intersecciones.	Contratista	03/02/2026

4. FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adriana Lucía Rodríguez Fonseca	Profesional Especializada - Secretaría Distrital de Movilidad	
Nancy Mateus Ráquira	Contratista - Secretaría Distrital de Movilidad	
Néstor Bautista	Gerente Técnico - Consorcio Belzcon - Movilidad	
Andrés Valderrama Padilla	Director de Obra - Consorcio Belzcon - Movilidad	
Javier Andrés Meza Gil	Especialista de Tránsito - Consorcio Belzcon - Movilidad	
Sergio Andrés Torres Toloza	Residente de Obra Lote 1 – Consorcio Belzcon - Movilidad	
María Camila Pérez Roa	Profesional SST - Consorcio Belzcon Movilidad	
Valentín Eduardo Barajas	Director de Interventoría – Consorcio Movilidad Capital	
Andrés García Avendaño	Coordinador Técnico de Interventoría – Consorcio Movilidad Capital	
Wilson Pineda	Residente de Obras Civiles Lote 1 – Consorcio Movilidad Capital	
Luis Carlos Daza	Especialista de Tránsito – Consorcio Movilidad Capital	
Ibeth Palacios	Profesional Jurídico – Consorcio Movilidad Capital	
Gloria Claudia Martin Melo	Profesional de Calidad – Consorcio Movilidad Capital	GLORIA CLAUDIA MARTIN MELO
Andrea Lizeth Vargas Soler	Profesional Ambiental - Consorcio Movilidad Capital	
Deisy Katalina Moya Jiménez	Profesional SST - Consorcio Movilidad Capital	
Laura Castellanos	Profesional Financiero y Contable - Consorcio Movilidad Capital	
Fernando Estuíñan	Profesional Mántum - Consorcio Movilidad Capital	

MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	**LISTADO DE ASISTENCIA – REUNIONES** **Contrato 2025-2769 Contrato de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte**	**VERSIÓN:** 1 **FECHA DE VIGENCIA:** 23/04/2025

N.° de Acta:	10				
Tema de la reunión:	Comité de Seguimiento n.° 10 CBM - CMC - SDM - Contrato Lote 1 n.° 2025-2780				
Fecha:	30/01/2026	**Hora:**	8:00 AM	**Lugar:**	Calle 74 No. 20c-04, Barrio San Felipe

No	Nombres y Apellidos	Empresa/ Entidad	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	NESTOR BAUTISTA	BELZCON	GERENTE TECNICO	NBAUTISTA.BZC@GMAIL.COM	
2	Luiton Camilo Maldonado	Belzcon	Residente	cmaldonado.bzc@gmail.com	
3	Sergio Andrés Torres	CBM	Residente obra	storres.bzc@gmail.com	
4	María Camila Pinzón	C.Belzcon movilidad	Residente SST - Ambiental	c.pinzt.bzc@gmail.com	
5	Valentín Eduardo Barajas	CMC	Director de Interventoría	sem-directbog@redtic.com.co	
6	Javier Andres Meza	CBM	Esp. en Tránsito	jmeza.bzc@gmail.com	
7	Esteban Barbosa Cortés	Belzcon	Aux. ingeniería	sdm2780.bzc@gmail.com	Esteban Bzc.
8	Andrés Valderrama P	Belzcon	Director de Obra	avalderrama.bzc@gmail.com	
9	Luis Carlos Daza V.	Interventoría CMC.	Esp. en Tránsito	sem-esp-transitoytransporte@redtic.com	
10	Wilson Pineda Martínez	Interventoría CMC	Residente Obra	sem-ing-res-obras[illegible]@redtic.com	
11	Nancy Mateus Raguso	SDM/SEMA	Contratista	nmateus@movilidadbogota.gov.co	Nancy M R
12	Adriana Rodríguez Forero	SDM/SEMA	prof Esp.	adrodriguez@movilidadbogota	
13	Katalina Mora Jiménez	Interventoría CMC	Profesional SST	sem-sst1@redtic.com	Katalina Mora
14	Andrea Vargas Soler	Interventoría CMC	Prof. Ambiental	sem-p-ambiental@redtic.com	
15	Fernando Estupiñán	CMC/Interventoría	Ing. Residente Mantenim	secring.res-mantto@redtic.com.	
16	Laura Castellanos	CMC/Interventoría	Prof. financiero	sem-p-financiero@redtic.com	
17	Gloria D Martin	CMC	Prof Calidad	sem-c-calidad@redtic.com	

MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	**LISTADO DE ASISTENCIA – REUNIONES** **Contrato 2025-2769 Contrato de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte**	**VERSIÓN:** 1 **FECHA DE VIGENCIA:** 23/04/2025

N.° de Acta:	10				
Tema de la reunión:	Comité de Seguimiento n.° 10 CBM - CMC - SDM - Contrato Lote 1 n.° 2025-2780				
Fecha:	30/01/2026	**Hora:**	8:00 AM	**Lugar:**	Calle 74 No. 20c-04, Barrio San Felipe

No.	Nombres y Apellidos	Empresa/ Entidad	Cargo	Correo electrónico	Firma
18	Andres García Avendaño	CMC	Coordinador Técnico	Sdm-coordinador-Tecnico@redtic.com.co	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
