Acta No:	08	**Tema:**	Comité Obra Contrato 2025-2781
Fecha:	26/11/2025	**Ubicación:**	Secretaría Distrital de Movilidad Sede Calle 13
Hora Inicio:	8:00 A.M.	**Hora Fin:**	12:00 PM

I. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo	Seguimiento técnico, administrativo y operativo al contrato N ° 2025-2781.
Agenda	1. Presentación y registro de asistencia. 2. Temas por desarrollar en el comité. 3. Conclusiones.

Participantes

Nombre	Área/proyecto	Nombre	Área/proyecto
Valentín E. Barajas Andrés García Avendaño Mayte Gutiérrez Barbosa Luis Carlos Daza Tania Lombana Otalora Katalina Moya Andrea Vargas Ibeth del Carmen Palacios Claudia Melo Laura Castellanos	Interventoría	Diego Suarez Yeison Ibáñez	SDM
		William Acosta López María Paz Rosario Christian Roqueme Diana Ramos Christian Felipe Gutierrez	Consorcio Movilidad 2025

1. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ANTERIORES

n.°	Descripción	Responsable	Estado
1	Subsanación de observaciones para recibo final KR 79 x 40C Sur EXT 3795 – 4ta reiteración	Contratista	No cumplido
2	Respuesta del Contratista a la SDM del comunicado SPMT_202531213388651 del 14/10/2025, con “posibles incumplimientos” al PMT AK 80 con CL 38C Sur – 2da reiteración	Contratista	Cumplido
3	Documentos para el recibo a satisfacción - Entrega de plano récord de la intersección KR 79 X CL 40C SUR EXT 3795 – 2da reiteración	Contratista	Cumplido
4	Implementación de PMT en la intersección de Isla del sol	Contratista	Cumplido
5	Inicio de trámite de disposición final de bolsas de cemento –2da reiteración	Contratista	Cumplido
6	Inicio de la entrega de dotación EPP a los trabajadores del CM25 (se continua de acuerdo con la fecha de contratación/ingreso al proyecto)	Contratista	Parcialmente cumplido
7	Proteger el adoquín que se encuentra en la intersección KR 14I X CALLE 84 SUR, dicha protección incluye el cubrimiento con plástico y soporte de un estibo de madera	Contratista	No cumplido*
8	Remitir copia de la solicitud realizada por el Contratista en la cual solicita el certificado correspondiente a las actividades de fundición de tapas realizadas en el mes de junio y en el mes de octubre– 2da reiteración	Contratista	Cumplido
9	Entrega del certificado emitido por el gestor ambiental.	Contratista	15/12/2025

n.°	Descripción	Responsable	Estado
10	Entrega de valorizaciones de los mantenimientos que se han realizado a la fecha (5)	Contratista	Cumplido
11	Mejorar el cerramiento de la intersección de la Avenida Boyacá – 2da reiteración	Contratista	Cumplido
12	Certificación firmada por revisor fiscal o contador público, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 15 de la Cláusula 9 de la Minuta del Contrato, la cual señala la obligación del Contratista de responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias, conforme a lo dispuesto en la Ley.	Contratista	Cumplido
13	Revisión para recibo final KR 80 x 38C Sur	Interventoría/Contratista	No cumplido

- Se corrige el compromiso n.° 13: la revisión se realiza para la intersección KR 79 X 38C SUR.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- **Presentación y registro de asistencia**

Se registró la asistencia en el anexo de *listado de asistencia*.

- El Director de Obra del Contratista informa que el Residente de Obras civiles del Contratista de Consorcio Movilidad 2025 no se presentó al comité quincenal debido a su renuncia el día 13 de noviembre de 2025. Por lo tanto, la Interventoría de acuerdo con lo establecido en el ***Anexo Técnico N° 1A LOTE O GRUPO No. 1 ZONA NORTE y LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR Componente Obras Civiles del Sistema de Semaforización de Bogotá D.C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES,*** la cual cita en su numeral 3 ***ASPECTOS GENERALES DEL PERSONAL QUE LABORARÁ EN EL CONTRATO*** *que establece*:

  "(…)

  Es obligación del Contratista disponer y mantener durante la ejecución del contrato y hasta su finalización y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría, el personal idóneo y calificado de profesionales, técnicos y auxiliares que se requieran. Por lo anterior, el Contratista deberá prever situaciones fortuitas y disponer a su costo de personal para realizar reemplazos, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos al personal básico requerido. ***En caso de necesitar realizar un reemplazo en el desarrollo del contrato, se deberá entregar hoja de vida del personal propuesto con tres (3) días calendario*** *de antelación al inicio de labores de la persona propuesta, para revisión y aprobación de la Interventoría.*

  Negrilla y Subrayado fuera de texto

  (…)"

  Solicita al Consorcio Movilidad 2025 presentar el reemplazo del Ingeniero Andrés Barriga, con todas sus subsanaciones antes del 05 de diciembre de 2025.

- **Tiempo transcurrido:** 70.59% equivalente a 216 días.
- **Días faltantes:** 90 para finalizar periodo contractual.

COMPONENTE FINANCIERO

Tabla 1. Balance financiero contrato 2025-2781

Período	Valor total del corte	Valor Rete garantía	Valor por pagar	Valor ejecutado acumulado	Valor pagado acumulado	Saldo CRP´S	Saldo por ejecutar	Fecha de radicación CMC	n.° de Documento contable	Fecha de estado	Fecha de acta de recibo parcial
1/05/2025 al 31/05/2025	$35.153.420	$1.757.671	$33.395.749	$35.153.420	$33.395.749	$5.108.555.575	$5.106.797.904	8/08/2025	3000792965	22/08/2025	6/08/2025
1/06/2025 al 30/06/2025	$47.999.156	$2.399.958	$45.599.198	$83.152.576	$78.994.947	$5.062.956.377	$5.058.798.748	8/08/2025	3000822224	14/08/2025	6/08/2025
1/07/2025 al 31/07/2025	$488.821.931	$24.441.097	$464.380.834	$571.974.507	$543.375.781	$4.598.575.543	$4.569.976.817	6/09/2025	3000973224	22/09/2025	4/09/2025
1/08/2025 al 31/08/2025	$521.542.988	$26.077.150	$495.465.838	$1.093.517.495	$1.038.841.619	$4.103.109.705	$4.048.433.829	7/10/2025	3001100296	22/10/2025	6/10/2025
1/09/2025 al 30/09/2025	$454.179.498	$22.708.975	$431.470.523	$1.543.696.993	$1.470.312.142	$3.671.639.182	$3.594.254.331	11/11/2025	3001230826	24/11/2025	6/11/2025
1/10/2025 al 31/10/2025	$566.692.824	$28.334.641	$538.358.183			$3.133.280.999	$3.027.561.507				
TOTALES	$2.114.389.817	$105.719.492	$2.008.670.325								

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

La Interventoría, verificó los soportes reglamentarios de la factura, la completitud de la información y a través del comunicado n.° SEM-CMC-SDM-104-25 el 13 de noviembre de 2025, tramitó el pago ante la Secretaría de Movilidad SDM, correspondiente al período del 1 al 30 de septiembre de 2025. Así mismo se informa que la SDM realizó el pago en referencia el 24 de noviembre de 2025.

Tabla 2. Programación PAC Contrato n.° 2025-2781

Período programación PAC	Cuentas de	Valor Programado (a)	Valor por pagar (b)	Diferencia (a-b)	% ejecución PAC
octubre 2025	agosto 2025	$600.000.000	$495.465.838	$104.534.162	82,58%
noviembre 2025	septiembre 2025	$835.892.343	$431.470.523	$404.421.820	51,62%
diciembre 2025	octubre 2025 (*)	$888.021.363	$538.358.183	$349.663.180	60,62%
	noviembre 2025 (*)	$600.000.000			
TOTALES		$2.923.913.706			

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

Impuesto de timbre – Decreto n.° 0175 del 14/02/2025: A la fecha de corte, el Contratista Consorcio Movilidad 2025 no ha realizado el pago del Impuesto de Timbre Nacional, tras la respuesta desfavorable de la SDM a su solicitud de descontar dicho impuesto de manera mensual.

En consecuencia, el 12 de noviembre de 2025 se llevó a cabo una reunión entre el Contratista, la Interventoría y la Entidad, con el fin de revisar la situación y definir las acciones a seguir. Por lo anterior, la Interventoría proyectó el comunicado n° SEM-CM25-135-25 con Radicado Orfeo n°. 202561204039802 del 6 de noviembre del 2025, donde conmino al Consorcio Movilidad 2025, acatar lo solicitado por la Entidad.

Adicionalmente, en el comité mensual del contratista realizado el 26 de noviembre de 2025, el Contratista informó que intentó efectuar el pago; sin embargo, el recibo remitido por la SDM ya se encontraba vencido, dado que tenía fecha límite hasta el 21 de noviembre de 2025.
En consecuencia, el Consorcio Movilidad 2025, el mismo día del comité, remitió un correo electrónico a esta Interventoría.

Asimismo, en esta misma fecha, el Consorcio Interventor trasladó la solicitud a la Entidad para la generación de un nuevo recibo de pago, con el fin de que el contratista pueda dar cumplimiento a la obligación tributaria correspondiente. En consecuencia, el 27 de noviembre de 2025 la SDM remitió un nuevo recibo de pago relacionado con la referencia mencionada. Por lo anterior, esta Interventoría tiene en proceso de radicación el comunicado dirigido al contratista, con el fin de notificarle formalmente dicha información.

Pago en diciembre de 2025 – facturas octubre y noviembre 2025: El mes pasado, la Interventoría remitió un correo electrónico al contratista informando las fechas establecidas para la entrega de las facturas correspondientes. Es de vital importancia el cumplimiento de dichas fechas con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del cronograma de facturación definido por la Entidad, así:

Octubre de 2025: 1 al 3 de diciembre de 2025
Noviembre de 2025: 3 al 7 de diciembre de 2025

COMPONENTE JURÍDICO

Pólizas: Teniendo en cuenta que las pólizas fueron rechazadas por la SDM.

La supervisión informó las causales de rechazo, la Interventoría mediante comunicación SEM-CMC-CM25-144-25, puso en conocimiento del contratista dichas observaciones:

- La póliza de cumplimiento debe anexar la constancia de no revocatoria de la póliza por falta de pago de la prima correspondiente al último anexo.
- La póliza de RCE deben anexar el comprobante de pago de esta.

Requerimientos Previos: Se efectuó una mesa de trabajo orientada a verificar las respuestas presentadas por el Contratista frente a los presuntos incumplimientos previamente identificados. En dicho espacio se requirió al contratista dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales y presentar los debidos soportes que lo acrediten, se establecieron compromisos específicos para cada uno de los frentes de obra.

El 18 de noviembre de 2025, el Contratista radicó el comunicado WEXT-2025-2781-159, mediante el cual presentó la propuesta de avances del Plan de Choque. Esta información se encuentra en proceso de revisión por parte de la Interventoría y, una vez culminado dicho análisis, será remitida a la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para lo de su competencia.

Desde el componente de gestión jurídica, se acompañó de manera transversal las gestiones desarrolladas en el marco de los demás componentes del contrato de Interventoría, con el propósito de asegurar un análisis integral y coordinado de los distintos aspectos contractuales durante la ejecución del contrato.

COMPONENTE SST

Para el mes de noviembre de 2025, la Interventoría registró la aprobación de 9 hojas de vida del personal sub-Contratista JVM donde se presentó afiliaciones de seguridad social, entrega de EPP, inducciones y EMO. A su vez se menciona que se evidencia para el mes de noviembre un total de 90 personas para el contrato, de acuerdo con los documentos suministrados por el contratista.

De acuerdo con lo anterior la operación en campo desarrolla una distribución de trabajadores por cada frente de trabajo. Evidenciado así por Interventoría en las últimas semanas:

Tabla 3. Personal en campo Contrato n.° 2025-2781

Intersecciones	Cantidad personal	Total
Kr 79 x Cl 38 c sur	0	0
Kr 78k x Cl 38 c sur	0	0
Kr 80 x Cl 38 c sur	4 ayudantes, 2 oficiales	6
Kr 46a x AC 68 sur:	0	0
Tv 60 x DG 70 sur:	6 ayudantes 1 maestro	14
	7 oficiales	
AK 14i x CL 84 sur:	5 oficiales 6 ayudantes	12
	1 maestro	
AK 72 x Cl 9	0	0

Kr 61g x Cl 67b sur:	2 ayudantes 2 inspectores	4

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

Durante las verificaciones realizadas por la Interventoría en campo, se evidenciaron los siguientes hallazgos reiterativos en cuanto a:

- Se siguen evidenciando cerramientos en todos los frentes de trabajo en malas condiciones con bordillos, el día 24 de noviembre se observó una vendedora dentro de un cerramiento, donde se evidencia una excavación profunda, por lo cual se requirió al contratista realizar el retiro inmediato de la vendedora, dicho hallazgo continúa en proceso, puesto que aún no se han mejorado los cerramientos y no se ha instalado la señalización de las condiciones inseguras, se solicitó al contratista subsanar.
- Se evidencia a la fecha personal sin reposición de dotación y carnés.
- Se continúa observando personal en los frentes de trabajo sin el debido uso de EPP acorde a las actividades que deben realizar.
- No se evidencia la señalización alusiva SST como tampoco de las condiciones inseguras y del material.

Estos hallazgos fueron enviados por la Interventoría mediante comunicados los viernes de cada semana para atención del contratista. El Consorcio Movilidad 2025 no se encuentra subsanando oportunamente los hallazgos en los tiempos establecidos, por lo tanto, la Interventoría insta nuevamente al contratista a dar cumplimiento a los plazos otorgados por la Interventoría.

El día 21 de noviembre en mesa de trabajo con la profesional SSTA del contratista se realizó una revisión de los hallazgos pendientes a la fecha, los cuales se trasladarán al área de calidad de Interventoría, con el fin que desde esta área se haga seguimiento, con el objetivo que el contratista de cierre a estos hallazgos. Se informa que de los 50 hallazgos identificados en el periodo, 43 continúan abiertos.

En cuanto a la bodega el día 19 de noviembre de 2025, se realizó la verificación de esta por parte de Interventoría y se observaron 7 hallazgos de la parte SST y ambiental, dichos hallazgos fueron reportados el día de 20 de noviembre y deben ser subsanados al 26 de noviembre, el contratista menciona que la fecha de subsanación será para el 15 de diciembre.

El contratista reportó un accidente de trabajo ocurrido el 13 de noviembre, en el cual se vio involucrado el inspector Cristian Gutiérrez. El evento se presentó durante su desplazamiento entre la KR 46A con AC 68 Sur y la TV 60 con DG 70 Sur, cuando un motociclista de avanzada edad se atravesó en la vía, lo que obligó al inspector a frenar repentinamente; en esa maniobra, la motocicleta perdió adherencia y el trabajador cayó al suelo.

Como resultado del accidente, el inspector presentó esguinces y torceduras que comprometen los ligamentos cruzado anterior y posterior de la rodilla, requiriendo una incapacidad inicial de diez (10) días. Se encuentra pendiente la investigación del accidente y la definición de las acciones correctivas y preventivas correspondientes.

COMPONENTE AMBIENTAL

RCD – Residuos de Construcción y Demolición:

Durante el mes se llevaron a cabo verificaciones en campo a cada una de las intersecciones, en donde por parte de Interventoría se continúa evidenciando una inadecuada gestión por parte del Contratista con el manejo de los RCD (Residuos de Construcción y Demolición).

Con respecto a lo anterior, el Decreto 507 del 2023 establece en su artículo 27.1.7 que el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de RCD y materiales de construcción en el espacio público es de veinticuatro (24) horas; sin embargo, el Contratista no está realizando el retiro de estos en el tiempo exigido como tampoco realiza el cubrimiento de estos.

Así mismo se recuerda al contratista que debe dar alcance al comunicado WEXT-2025-2781-161 del día 19 de noviembre de 2025, con radicado Orfeo 202500001330502 y cuyo asunto es “Respuesta al Oficio No. SEM-CMCCM25-131-25 – Plan de Manejo de RCD. Puesto que, una vez revisado por el componente ambiental, esta interventoría manifiesta que lo plasmado en dicho comunicado no representa un plan de mejora por el cual el contratista garantice el retiro de los RCD´S en el tiempo estipulado tal como lo establece el Decreto 507 de 2023 en su artículo 27.1.7. Es importante mencionar que el plan de mejora debe especificar las acciones, responsables, frecuencia y demás actividades que llevaran a cabo para cumplir con la normatividad ambiental. Adicionalmente, el registro fotográfico relacionado para la intersección KR 79 X CL 38C SUR, corresponde es a la intersección KR 80 X CL 38C SUR

A lo que el contratista Consorcio Movilidad 2025 manifiesta que hará la respectiva gestión para dar alcance al comunicado tomando en cuenta las observaciones dadas por la interventoría,

Por otro lado, se recuerda al Contratista Consorcio Movilidad 2025 que el personal operativo debe contar con la certificación de competencia laboral en “Separar escombros según procedimiento técnico y normativa ambiental”, expedida por el SENA o cualquier otro establecimiento acreditado o certificado. Como alternativa el contratista puede contratar personal operativo que tenga ya el certificado anteriormente mencionado.

El Consorcio Movilidad 2025, manifiesta que se encuentra en la gestión de buscar personal operativo que ya cuente con la certificación de competencia laboral en “Separar escombros según procedimiento técnico y normativa ambiental”.

Condiciones Ambientales Intersecciones:

Durante las verificaciones realizadas en mes de noviembre de 2025 a las intersecciones de la localidad de Kennedy Avenida Boyacá (AK 72) x Calle 9, Kr 79 x Calle 38c Sur, AK 80 x Calle 38c Sur, AK 78k x 38c sur, así como a la intersección de la localidad de Usme Kr 14 I x Calle 84 sur, y la intersección de la localidad de Ciudad Bolívar kr 46ª x calle 68 sur y por ultimo para la localidad de Sierra Morena TV 60 x DG 70 sur; en las cuales el Contratista está realizando actividades de intersecciones nuevas y complementos; se evidenció como recurrente el hallazgo del no retiro de los RCD en el tiempo estipulado ni cubiertos tal como lo establece el Decreto 507 de 2023 en su artículo 27.1.7. Además, se evidenció que en los puntos de trabajo los individuos arbóreos y sumideros no cuentan con su debida protección, o en su defecto, se encuentran en malas condiciones. Dichos hallazgos son enviados semanalmente los viernes al Contratista mediante comunicados, los cuales el Contratista debe subsanar a más tardar los martes de la semana siguiente. Sin embargo, el Contratista no realiza la entrega en los tiempos estipulados.

Para las intersecciones de la AK 78k x 38c sur y Kr 14 I x Calle 84 sur se debe realizar recuperación de zonas verdes, las cuales fueron afectadas por la ejecución de actividades.

Para lo cual el Consorcio Movilidad 2025 manifiesta que el 05 de diciembre de 2025, se llevará a cabo la respectiva visita para realizar la medición del metraje a recuperar de las zonas verdes afectadas en compañía de la interventoría.

Cargue Reporte de RCD


El 25 de noviembre del año en curso el contratista Consorcio Movilidad 2025 radicó un derecho de petición a la Secretaría Distrital de Ambiente cuyo radicado es 2025ER278832, lo anterior se debe a las fallas presentadas en el aplicativo WEB de la SDA para realizar el cargue de los reportes de los RCD´S.

COMPONENTE CALIDAD

Durante el periodo se realizó la verificación de los factores de calidad correspondientes: a) control de la información documentada, b) procesos, productos y servicios proporcionados externamente, c) producción, provisión y

conformidad de los productos y servicios, d) seguimiento y medición y e) mejora continua. A continuación, se presenta el avance de cada de los factores de calidad evaluados para el periodo

Gráfica 1. Nivel de cumplimiento factores de calidad factores plan de calidad evaluados para contrato n.° 2025- 2781 durante el periodo de noviembre

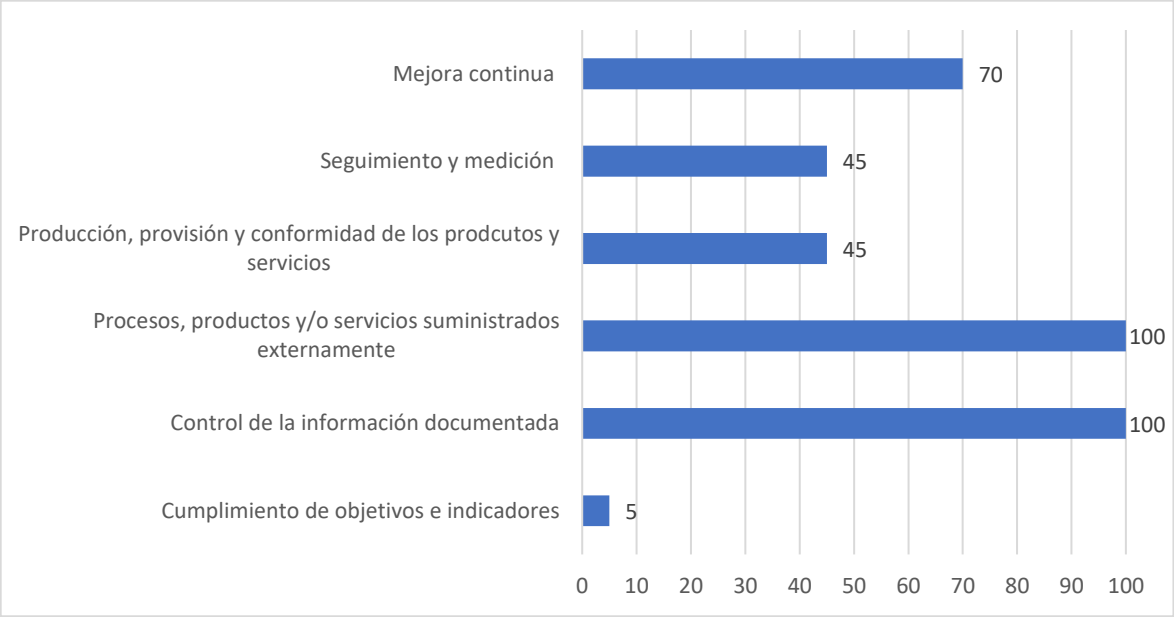

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

El nivel de cumplimiento del plan de calidad del contratista Consorcio Movilidad 2025 es del 78%, categorizándose como aceptable. Los aspectos para resaltar como mejoraras en el periodo son los siguientes:

- Se presentan avances significativos en el plan de mejora acciones correctivas y preventivas
- Se inicio la reorientación de la reunión agiles de programación semanal
- Evaluación de proveedores

Aspectos con desviaciones y potencial materialización de riesgos con impacto en los productos y/o servicios

- Reporte de los resultados de inspección y ensayos de laboratorio
- Control de la información documentada

COMPONENTE TRÁNSITO

PMT General:

Durante el mes de noviembre de 2025, en cuanto al PMT general finalizó la autorización en las siguientes intersecciones:

ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	ESTADO PMT general	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
881	3795	KR 79 X CL 40 C Sur	KENNEDY	Plazo finalizado	42	16/10/2025	17-oct-25	15-nov-25

PMT Específicos:

Durante el mes de noviembre de 2025, en cuanto a PMT específicos de intersecciones Nuevas y Complementos, se tienen los siguientes estados de PMT por intersecciones:

- **PMT específicos radicados en la SDM para solicitud de aprobación de la entidad:**

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	N° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO PMT específico
Complemento	1082	3429	KR 19C X CL 48C Sur Y DG 48 Sur	TUNJUELITO	10/11/2025	202561204142852	13/11/2025	En revisión de SDM sin observaciones
Complemento	879	3477	AK 80 G X DG 3	KENNEDY	6/11/2025	202561204142742	13/11/2025	Pendiente atender observaciones de SDM del 19/11/2025
Complemento	1168	3873	AK 80 X CL 38 C sur	KENNEDY	29/10/2025	202561203967532	30/10/2025	Pendiente atender observaciones de SDM del 5/11/2025
Complemento	887	3454	KR 79 X CL 38 C Sur	KENNEDY	29/10/2025	202561203967552	30/10/2025	Pendiente subsanar observaciones de SDM del 5/11/2025
Complemento	882	3814	KR 63 X CL 57 B Sur	BOSA	29/10/2025	202561203967592	30/10/2025	Pendiente subsanar observaciones de SDM del 5/11/2025
Complemento	930	3273	KR 79 C X CL 63 S	BOSA	29/10/2025	202561203967742	30/10/2025	Pendiente subsanar observaciones de SDM del 5/11/2025
Complemento	969	3690	KR 14 X CL 2 SUR	ANTONIO NARIÑO	29/10/2025	202561203967802	30/10/2025	Observaciones de SDM subsanadas el 20/11/2025
Complemento	937	3916	TV 78 L X CL 68 A Sur	BOSA	23/10/2025	202561203892102	23/10/2025	Pendiente subsanar observaciones de SDM del 13/11/2025
Complemento	936	3916	TV 78 L X CL 68 Sur	BOSA	23/10/2025	202561203892102	23/10/2025	Pendiente subsanar observaciones de SDM del 13/11/2025

- **PMT específicos con plazos vigentes y/o prorrogados y/o aprobados por SDM:**

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	N° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO PMT específico	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
Complemento	867	3816	KR 72 J X CL 45 Sur	KENNEDY	202561204142802	13/11/2025	Aprobado por SDM	47	20/11/2025	21-nov-25	5-feb-26
Nueva	1919	3119	KR 61G X CL 67B Sur	TUNJUELITO	202561203673912	7/10/2025	Aprobado por SDM	45	6/11/2025	7-nov-25	29-ene-26
Complemento	896	3796	AK 80 X CL 40 C Sur	KENNEDY	202561203726932	9/10/2025	Aprobado por SDM PRORROGA N° 1	45	6/11/2025	7-nov-25	15-ene-26
Complemento	819	2393	AK 72 X CL 9	KENNEDY	202561203967642	30/10/2025	Aprobado por SDM	45	6/11/2025	7-nov-25	11-dic-25
Nueva	1922	3122	TV 60 X DG 70 Sur	CIUDAD BOLÍVAR	202561203889882	23/10/2025	Aprobado por SDM PRORROGA N° 1	44	30/10/2025	31-oct-25	22-ene-26
Complemento	881	3795	KR 79 X CL 40 C Sur	KENNEDY	202561203728532	9/10/2025	Aprobado por SDM PRORROGA N° 1	44	30/10/2025	31-oct-25	15-ene-26
Nueva	1900	3928	KR 46A X CL 68 Sur	CIUDAD BOLÍVAR	202561203830162	20/10/2025	Aprobado por SDM PRORROGA N° 1	44	30/10/2025	31-oct-25	1-ene-26
Complemento	1754	3049	KR 78K X CL 38 C Sur	KENNEDY	202561203727142	9/10/2025	Aprobado por SDM PRORROGA N° 1	43	23/10/2025	1-nov-25	15-ene-26
Nueva	1921	3121	KR 14 I X CL 84 Sur	USME	202561203673972	6/10/2025	Aprobado por SDM PRORROGA N° 1	42	16/10/2025	17-oct-25	4-dic-25

- **PMT específicos finalizados en el periodo:** Durante este mes de noviembre de 2025, no ha finalizado ningún PMT hasta el momento.

- **PMT específicos devueltos al Contratista con observaciones de Interventoría, pendientes por subsanar:**

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	ESTADO PMT específico
Complemento	1202	2301	KR 16 X CL 22	LOS MÁRTIRES	Devuelto con observaciones el 24/11/2025	Devuelto con observaciones el 24/11/2025
Complemento	519	2301	KR 17 X CL 22	LOS MÁRTIRES	Devuelto con observaciones el 24/11/2025	Devuelto con observaciones el 24/11/2025
Complemento	325	2061	KR 13 X CL 34	SANTA FE	Devuelto con observaciones el 13/11/25	Devuelto con observaciones el 13/11/25
Complemento	332	2061	KR 13 X CL 33	SANTA FE	Devuelto con observaciones el 13/11/25	Devuelto con observaciones el 13/11/25

- **Sin elaborar PMT específico, con expedición de Orden de Trabajo por la Interventoría:**

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	ESTADO PMT específico
Complemento	1177	3013	KR 18B X CL 53 Sur Y DG 54 Sur	TUNJUELITO	Sin recibir Aún	Con OT Sin entregar PMT específico

Se solicita por parte de la Interventoría al Consorcio Movilidad 2025 gestionar 5 PMT (Plan de Manejo de Tránsito) adicionales, en razón de prever obras faltantes con relación a los diseños remitidos inicialmente por la Secretaría Distrital de Movilidad y la Interventoría Consorcio Movilidad Capital. El Consorcio Movilidad 2025 informa que se entregarán el 05 de diciembre de 2025,

COMPONENTE MÁNTUM

- En el periodo comprendido del 1 al 24 de noviembre no se registran actividades en la plataforma Mántum para el contratista CONSORCIO MOVILIDAD 2025. [SE-302]

- El 6 de noviembre de 2025 se realizó sesión de retroalimentación con el contratista para atender dudas e inquietudes sobre el registro de actividades en la plataforma Mántum, documentado en Acta No 26 componente Mántum. El documento fue enviado para revisión al correo williams.areaoperativa@gmail.com el 18 de noviembre y remitido para firmas el día 20 de noviembre. A la fecha se encuentra pendiente la firma del residente de obra del contratista.

- El 25 de noviembre se realizó sesión de trabajo con el profesional de calidad del contratista revisando el procedimiento de generación de OT. Se presenta el documento "PLANTILLAS PARA DILIGENCIAMIENTO EN PLATAFORMA MÁNTUM 24112025"

La Interventoría presenta el resumen y estado de los registros generados por el contratista desde el inicio del contrato hasta el 25 de noviembre:

ACTIVIDAD	Conteo SS
Complemento	**7**
AV AGOBERTO MEJÍA CIFUENTES (AK 80) X CL 38C S	1
AV AGOBERTO MEJÍA CIFUENTES (AK 80) X CL 40C S	1
AV BOYACÁ (AK 72) X CL 9	1

KR 12D X CL 28C SUR	1
KR 78K X CL 38C S	1
KR 79 X CL 38C S	1
KR 79 X CL 40C S	1
Mto Correctivo	**4**
AUTOPISTA AL LLANO (KR 1) X CL 90 S	1
AV CIUDAD DE CALI (AK 86) X DG 49 S	1
AV PRIMERO DE MAYO (TV 78N) X CL 53 S	1
TV 85 X CL 57B S	1
Nueva Intersección	**4**
KR 14F X AUTOPISTA AL LLANO (CL 84 Sur)	2 *
KR 47A X AC 68 S	1
TV 60 X DG 70 SUR	1
Total general	**15**

* Doble registro de INICIO de actividad

Se reiteran las recomendaciones generales para el registro de actividades en Mántum contenidas en el documento "PLANTILLAS PARA DILIGENCIAMIENTO EN PLATAFORMA MÁNTUM 24112025"

- En todas las actividades se debe generar una OT indicando el inicio de las actividades y otra OT indicando la finalización de las actividades. Es decir, por cada actividad de nueva intersección, complemento, o mantenimiento correctivo se generan 2 Ordenes de Trabajo OT.
- En los casos de mantenimiento correctivo relacionados con siniestralidad, indicar en el campo solución que la atención está relacionada con un siniestro. Es decir, usar SIEMPRE la plantilla y los textos que eventualmente se agreguen, van luego de la plantilla.
- En los informes de actividades vincular el número de OT generado en Mántum y suministrado por el operador al inicio de actividades. El número de OT sirve como “llave” para cruzar información de Mántum con otras fuentes como los formatos e informes propios de cada contratista.
- Al solicitar OT verificar que el EXT/ID correspondan al punto donde se ejecutara la actividad.
- Si la actividad es cancelada SCN el tipo de reporte de la OT debe quedar como SCN

SEGUIMIENTO TÉCNICO

- **Relación de vehículos.** Pendiente cumplimiento requisitos técnicos de la Grúa. El contratista informa que continúa en proceso de traslado de la matrícula, se aprobó grúa de emergencia por un mes. El contratista radicará la respuesta de los pendiente antes del próximo comité y/o cierre de informes.

  Porcentajes de avance semanal, en estado pendiente. El contratista a la fecha de la presente acta no ha emitido estos datos. El Contratista revisará la información faltante para lo cual se programará una reunión con el componente de calidad del Consorcio Movilidad 2025

- **Fichas técnicas:** Las siguientes se encuentran pendientes: KR 46ª X CL 68 SUR, AK 72 X CL 9 y KR 14I X CL 84 SUR enviado por correo el día 21 de noviembre de 2025. Comunicado SEM-CMC-CM25-117-25 del 15 de octubre de 2025.

  Hallazgos de inspección en obra. Durante las verificaciones realizadas por el personal en campo de la Interventoría del contrato 2025-2781 (técnico), se han identificado puntos de mejora, lo cual se ha anexado en cada informe mensual el formato correspondiente a los hallazgos identificados. El Contratista revisará la información pendiente y, para tal fin, se programará una reunión con el componente de Calidad del Consorcio Movilidad 2025

REQUERIMIENTOS

- **Ausencia de bitácora en los frentes de obra.** La Interventoría comunicó lo anterior mediante el oficio SEM-CMC-CM25-090-25 del 24 de septiembre de 2025 y reiterado mediante SEM-CMC-CM25-103-25 del 01 de octubre de 2025. Al no obtener respuesta, la Interventoría remitió el requerimiento previo SEM-CMC-CM25-133-25 del 24 de octubre de 2025, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del contratista. El contratista debe emitir respuesta el día **01 de diciembre de 2025.**

- **Informes diarios y semanales:** Incompletos. SEM-CMC-CM25-102 del 01 de octubre de 2025. Se respondió por correo y en anteriores comités que hacen falta. Proyección de incumplimiento**.** El contratista debe emitir respuesta el día **01 de diciembre de 2025.**

- **SEM-CMC-CM25-094-25** del 27 de septiembre: Requerimiento previo programación de obra EXT 3873 AK 80 X CL 38C SUR**.** El contratista manifestó que revisará el requerimiento a detalle para dar respuesta antes del próximo comité.

- **SEM-CMC-CM25-128-25** del 23 de octubre de 2025: Requerimiento Previo Inactividad en el frente de obra identificado con EXT 3121 - AK 14I X CL 84 SUR.

- **SEM-CMC-CM25-137-25:** Requerimiento previo - programación de obra EXT 2393 AK 72 X CL 9**.**


- **Tapas:** No se ha recibido programación de avance de tapas y/o su respectiva entrega de las solicitadas mediante orden de fabricación N° 04 N° 05 y N°6. El Contratista explica que hará la actividad de fundición de tapas en dos días diferentes desde las 9:00 am para una entrega a la Interventoría el día 10 de diciembre de 2025.

- **Subcontratistas:** Pendiente radicación de la comunicación del contratista con las observaciones de MYV.

- **Personal:** Pendiente subsanación personal presentado en el oficio WEXT-2025-2781-156 del 13 de noviembre de 2025. Para lo anterior se revisará la documentación remitida el día 25 de noviembre de 2025 por parte del componente SST de la Interventoría.

Avance contractual

% AVANCE	
EJECUTADO	**41,12%**
PROGRAMADO	**65,11%**

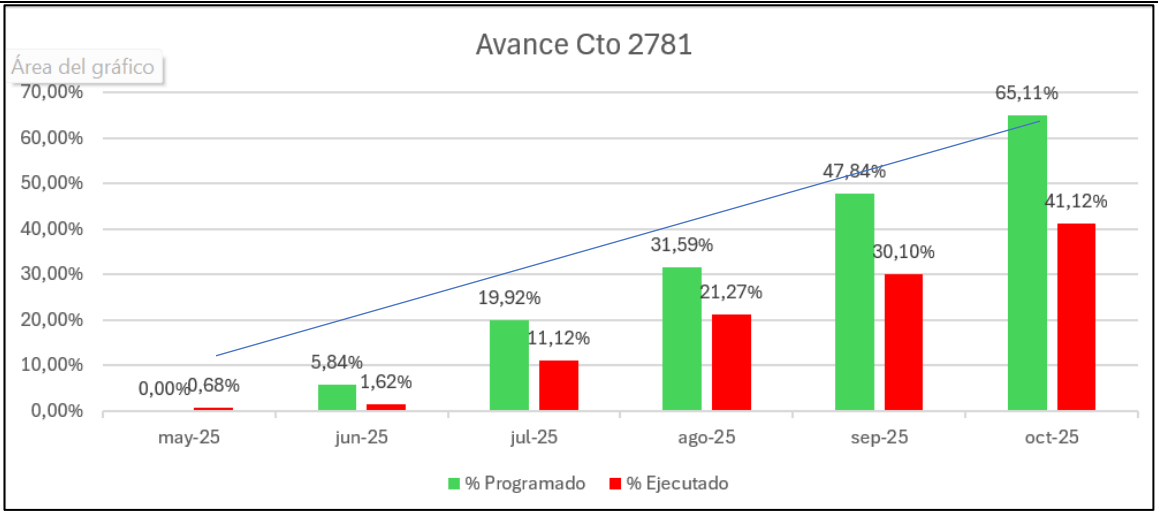

Ordenes de Trabajo Noviembre

Orden de trabajo	Fecha de solicitud	Localidad	Externo	Dirección	Inicio	Tipo
12	18/11/2025	ANTONIO NARIÑO	3422	KR 19 X CL 10B SUR	NO	MANTENIMIENTO
13	20/11/2025	BOSA	3909	KR 81B X CK 63 SUR	NO	COMPLEMENTO
13	20/11/2025	ANTONIO NARIÑO	3388	KR 18 X CL 22 SUR	NO	COMPLEMENTO
13	20/11/2025	BOSA	3485	AK 80 X CL 65 SUR	NO	COMPLEMENTO
13	20/11/2025	KENNEDY	3485	AK 80 X CL 57ª SUR	NO	COMPLEMENTO
13	20/11/2025	KENNEDY	3785	AK 80 X AC 55 SUR	NO	COMPLEMENTO
13	20/11/2025	KENNEDY	3459	KR 78B X CL 37 SUR	NO	COMPLEMENTO
13	20/11/2025	SANTA FE	2044	KR 12 X AC 19	NO	COMPLEMENTO
13	20/11/2025	SAN CRISTÓBAL	3826	KR 6 X CL 22 SUR	NO	COMPLEMENTO
13	20/11/2025	ANTONIO NARIÑO	3380	KR 18 X CL 17 SUR	NO	COMPLEMENTO
13	20/11/2025	ANTONIO NARIÑO	3278	TV 21ª X CL 22 SUR	NO	COMPLEMENTO
13	20/11/2025	ANTONIO NARIÑO	3278	TV 21ª X DG 21ª SUR	NO	COMPLEMENTO
13	20/11/2025	BOSA	3437	TV 78L X DG 69B SUR	NO	COMPLEMENTO
13	20/11/2025	LOS MÁRTIRES	2761	KR 19B XDG 23 BIS	NO	COMPLEMENTO

13	20/11/2025	LOS MÁRTIRES	2761	KR 19B X CL 24	NO	COMPLEMENTO
13	20/11/2025	TUNJUELITO	3053	KR 24 X CL 46 SUR	NO	COMPLEMENTO
13	20/11/2025	TUNJUELITO	3430	KR 24 X AC 44 SUR	NO	COMPLEMENTO
13	20/11/2025	BOSA	3912	KR 87C X CL 62 SUR	NO	COMPLEMENTO
13	20/11/2025	KENNEDY	3507	TV 87J X CL 42 SUR	NO	COMPLEMENTO
13	20/11/2025	KENNEDY	3481	DG 2 X JR 79C IDD	NO	COMPLEMENTO

Complementos

Se informa que las fechas del cronograma de la actividades pendientes se modificaron respecto a los planes de mejora y choque remitidos por el Contratista Consorcio Movilidad 2025

- **Externo 3795**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL KR 79 X CL 40C S				
ACTIVIDAD	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	14/07/2025	14/07/2025	100%	100%
Perforación dirigida	15/07/2025	30/07/2025	100%	100%
Demoliciones y Excavaciones	15/07/2025	14/08/2025	100%	100%
Canalizaciones	29/07/2025	4/08/2025	100%	100%
Cajas marcos y tapas	12/08/2025	18/08/2025	100%	98%
Bases para poste	12/08/2025	5/09/2025	100%	98%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	28/08/2025	17/09/2025	100%	98%
Plano récord	18/09/2025	22/09/2025	100%	90%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	23/09/2025	25/09/2025	100%	80%
Entrega laboratorios	18/09/2025	27/10/2025	100%	90%
TOTAL			**100%**	**97%**

Durante la tercera visita realizada junto con la Interventoría, se identificó la atención parcial de las observaciones relacionadas con los acabados, las cuales llevan más de un mes en proceso de corrección. Si bien algunos acabados fueron ejecutados, la Interventoría emitió no conformidad respecto a las bases, por lo que se programó nuevamente la ejecución de los ajustes solicitados. Los trabajos en ladrillo se llevarán a cabo el día de hoy 26 de noviembre de 2025. Se indica además que la fecha estimada de terminación de los acabados será el 27 de noviembre de 2025. Es necesario responder el oficio correspondiente, dado que constituye un llamado de atención (SEM-CMC-CM25-153-25 con n.° de radicado ORFEO 202500001340832)

- **Externo 3796**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL KR 80 X CL 40C S				
ACTIVIDAD	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	25/06/2025	25/06/2025	100%	100%
Perforación dirigida	26/06/2025	4/08/2025	100%	100%
Canalizaciones	30/06/2025	29/07/2025	100%	100%
cajas marcos y tapas	26/06/2025	29/07/2025	100%	98%
bases para poste	10/11/2025	14/11/2025	100%	98%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	10/11/2025	14/11/2025	100%	98%
Plano récord	19/11/2025	19/11/2025	100%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	19/11/2025	19/11/2025	100%	0%
Entrega laboratorios	19/11/2025	19/11/2025	100%	80%
TOTAL			**100%**	**95%**

En cuanto a los acabados pendientes, específicamente los adoquines, el contratista informó que estos fueron instalados completamente nuevos. Por tal motivo, remitirán el registro fotográfico correspondiente e identificarán la causa de la afectación para presentarla nuevamente a la Interventoría. Se indicó que la corrección se realizará el sábado 29 de noviembre de 2025 y que la entrega final se efectuará el lunes 01 de diciembre de 2025, dado que el adoquín afectado debe ser reemplazado. En la bitácora se encuentran registradas todas las observaciones que deben ser atendidas.

- **Externo 3873**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL AK 80 X CL 38C S				
ACTIVIDADES	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	16/07/2025	18/07/2025	100%	100%
perforación dirigida N1	16/07/2025	23/07/2025	100%	100%
demoliciones y Excavaciones	25/07/2025	21/08/2025	100%	100%
Canalizaciones	25/07/2025	21/08/2025	100%	95%
cajas marcos y tapas	30/07/2025	26/08/2025	100%	95%
bases para poste	18/08/2025	10/09/2025	100%	60%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	3/09/2025	29/09/2025	100%	40%
Plano récord	30/09/2025	6/10/2025	100%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	30/09/2025	6/10/2025	100%	0%
Entrega laboratorios	22/09/2025	21/10/2025	100%	0%
TOTAL			**100%**	**74%**

- **Externo 3454**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL KR 79 X CL 38C S				
ACTIVIDADES	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	16/07/2025	18/07/2025	100%	100%
perforación dirigida N1	16/07/2025	7/09/2025	100%	100%
demoliciones y Excavaciones	18/07/2025	15/10/2025	100%	100%
Canalizaciones	18/07/2025	15/10/2025	100%	100%
cajas marcos y tapas	23/07/2025	15/10/2025	100%	100%
bases para poste	16/07/2025	21/10/2025	100%	100%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	29/08/2025	21/10/2025	100%	95%
Plano récord	30/09/2025	2/11/2025	100%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	30/09/2025	2/11/2025	100%	0%
Entrega laboratorios	22/09/2025	17/11/2025	100%	0%
TOTAL			**100%**	**90%**

- **Externo 3457**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL KR 78K X CL 38C S				
ACTIVIDADES	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	29/07/2025	31/07/2025	100%	100%
perforación dirigida N1	29/07/2025	12/08/2025	100%	100%
demoliciones y Excavaciones	29/07/2025	4/09/2025	100%	100%
Canalizaciones	29/07/2025	4/09/2025	100%	100%
cajas marcos y tapas	30/07/2025	9/09/2025	100%	100%
bases para poste	18/08/2025	24/09/2025	100%	100%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	3/09/2025	14/11/2025	100%	95%
Plano récord	30/09/2025	19/11/2025	100%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	22/09/2025	14/11/2025	100%	0%
Entrega laboratorios	22/09/2025	29/11/2025	96%	0%
TOTAL			**100%**	**89%**

- **Externo 2393**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL KR 72 X CL9			
ACTIVIDADES	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMAD**
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	17/07/2025	23/07/2025	100%
perforación dirigida N1	24/07/2025	14/08/2025	100%
demoliciones y Excavaciones	5/08/2025	21/08/2025	100%
Canalizaciones	12/08/2025	21/08/2025	100%
cajas marcos y tapas	15/08/2025	26/08/2025	100%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	3/09/2025	29/09/2025	100%
Plano récord	30/09/2025	6/10/2025	100%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	7/10/2025	13/10/2025	100%
Entrega laboratorios	14/10/2025	12/11/2025	100%
TOTAL			**100%**

Para la intersección KR 72 X CL9 el Contratista informa que retomarán la ejecución de obra el día 27 de noviembre de 2025.

- Todas las intersecciones tipo complemento ejecutadas en la localidad de Kennedy deben terminarse y entregarse a la Interventoría la **primera semana de diciembre de 2025**. Deben remitir el cronograma actualizado con las modificaciones aprobadas.

- Intersecciones tipo complemento no iniciadas

EXT	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
2182	KR 16 X CL 22	MÁRTIRES
2301	KR 17 X CL22	MÁRTIRES
3492	KR19C X CL48C S Y DG 48S	TUNJUELITO
3013	KR 18B X CL53 S Y DG 54 S	TUNJUELITO
3273	KR 79C X CL 63 S	BOSA
3814	KR 63X CL 57B S	BOSA
3916	TV 78L X CL 68A S	BOSA
3477	AK 80G X DG 3	KENNEDY
3690	AK 14 X CL 2 S	ANTONIO NARIÑO
3816	KR 72J X CL 45 Sur	KENNEDY
2061/332	KR 13 X CL 34	SANTA FE
2061/1104	KR 13 X CL 34	SANTA FE

3679	KR 19C X ENTRADA PORTAL TUNAL	TUNJUELITO
3703	AK 14 X DG 48 S	RAFAEL URIBE
3909	KR 81B X CL 63 S	BOSA
3388	KR 18 X CL 22 S	ANTONIO NARIÑO
3910	KR 80C X CL 65 S	BOSA
3485	AK 80 X CL 57A S	KENNEDY
3785	AK 80 X AC 55 S	KENNEDY
3459	KR 78B X CL 37 S	KENNEDY
2044	KR 12 X AC 19	SANTA FE
3826	KR 6 X CL 22 S	SAN CRISTÓBAL
3380	KR 18 X CL 15 S	ANTONIO NARIÑO
3421	KR 18 X CL 17 S	ANTONIO NARIÑO
3278	TV 21A X CL 22 S	ANTONIO NARIÑO
3437	TV 21A X DG 21A S	ANTONIO NARIÑO
2761	TV 78L X DG 69B S	BOSA
3253	KR 19B X DG 23BIS	LOS MÁRTIRES
3430	KR 19B X CL 24	LOS MÁRTIRES
3912	KR 24 X CL 46 S	TUNJUELITO
3507	KR 24 X AC 44 S	TUNJUELITO
3481	KR 87C X CL 62 S	BOSA

Intersecciones nuevas

Se informa que las fechas del cronograma de la actividades pendientes se modificaron respecto a los planes de mejora y choque remitidos por el Contratista Consorcio Movilidad 2025

- **Externo 3121**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL USME				
ACTIVIDAD	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Aprobación PMT N1	11/07/2025	11/07/2025	100%	100%
revisión de redes y solicitud de planos de servicios	14/07/2025	4/08/2025	100%	100%
perforación dirigida INT NUEVA N1	5/08/2025	8/09/2025	100%	100%
demoliciones y Excavaciones	30/11/2025	3/12/2025	0%	65%
Canalizaciones	30/11/2025	3/12/2025	0%	60%
cajas marcos y tapas	30/11/2025	3/12/2025	0%	60%
bases para poste	30/11/2025	3/12/2025	0%	0%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	10/11/2025	3/12/2025	67%	43%
Instalación AUCE	2/12/2025	2/12/2025	0%	0%
Plano récord	3/11/2025	9/12/2025	62%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	3/11/2025	9/12/2025	62%	0%
Entrega laboratorios	24/10/2025	24/11/2025	100%	0%
TOTAL			**49%**	**54%**

- **Externo 3122**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL SIERRA MORENA			
ACTIVIDAD	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMAD**
Aprobación PMT N1	25/07/2025	25/07/2025	100%
revisión de redes y solicitud de planos de servicios	28/07/2025	18/08/2025	100%
perforación dirigida INT NUEVA N1	19/08/2025	22/09/2025	100%
demoliciones y Excavaciones	4/08/2025	22/11/2025	100%
Canalizaciones	4/08/2025	22/11/2025	100%
cajas marcos y tapas	7/08/2025	22/11/2025	100%
bases para poste	2/10/2025	22/11/2025	100%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	7/10/2025	22/11/2025	100%
Instalación AUCE	3/11/2025	4/11/2025	100%
Plano récord	26/11/2025	26/11/2025	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	26/11/2025	26/11/2025	0%
Entrega laboratorios	22/12/2025	22/12/2025	0%
TOTAL			**75%**

- **Externo 3928**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL KR 46A X CL 68 SUR				
ACTIVIDAD	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Aprobación	8/09/2025	8/09/2025	100%	100%
revisión de redes y solicitud de planos de servicios	9/09/2025	19/09/2025	100%	100%
perforación dirigida	22/09/2025	14/10/2025	100%	100%
demoliciones y Excavaciones	15/10/2025	25/11/2025	100%	30%
Canalizaciones	15/10/2025	25/11/2025	100%	30%
cajas marcos y tapas	27/10/2025	21/11/2025	100%	30%
bases para poste	24/11/2025	17/12/2025	8%	0%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	27/11/2025	23/12/2025	0%	0%
Instalación AUCE	24/12/2025	25/12/2025	0%	0%
Plano récord	24/12/2025	30/12/2025	0%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	24/12/2025	30/12/2025	0%	0%
Entrega laboratorios	24/12/2025	22/01/2026	0%	0%
TOTAL			**51%**	**29%**

- **EXT 3119**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL KR 46A X CL 68 SUR				
ACTIVIDAD	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
Aprobación	18/09/2025	18/09/2025	100%	0%
revisión de redes y solicitud de planos de servicios	19/09/2025	26/09/2025	100%	0%
perforación dirigida	29/09/2025	20/10/2025	100%	0%
demoliciones y Excavaciones	21/10/2025	13/11/2025	100%	0%
Canalizaciones	21/10/2025	13/11/2025	100%	0%
cajas marcos y tapas	24/10/2025	18/11/2025	100%	0%
Base para postes	19/11/2025	12/12/2025	29%	0%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	24/11/2025	18/12/2025	8%	0%
Instalación AUCE	19/12/2025	22/12/2025	0%	0%
Plano récord	19/12/2025	25/12/2025	0%	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	19/12/2025	22/12/2025	0%	0%
Entrega laboratorios	19/12/2025	19/01/2026	0%	0%
TOTAL			**53%**	**0%**

- **EXT 3120**

RESUMEN DE AVANCE PORCENTUAL KR 25 X CL 18 SUR			
ACTIVIDAD	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FIN**	**% PROGRAMADO**
Aprobación	29/09/2025	29/09/2025	100%
revisión de redes y solicitud de planos de servicios	30/09/2025	13/10/2025	100%
perforación dirigida	14/10/2025	6/11/2025	100%
demoliciones y Excavaciones	7/11/2025	2/12/2025	73%
Canalizaciones	7/11/2025	2/12/2025	73%
cajas marcos y tapas	12/11/2025	5/12/2025	58%
bases para poste	8/12/2025	5/12/2025	0%
Recuperación Andenes, rampas y acabados	11/12/2025	31/12/2025	0%
Instalación AUCE	7/01/2026	6/01/2026	0%
Plano récord	7/01/2026	8/01/2026	0%
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	7/01/2026	13/01/2026	0%
Entrega laboratorios	7/01/2026	5/02/2026	0%
TOTAL			**42%**

- Para todas las intersecciones nuevas deben remitir el **cronograma actualizado** con las modificaciones aprobadas.

- El contratista debe comunicar a la Interventoría si de acuerdo con el cronograma ase presenta algún atraso de obra con su respectiva justificación.

- Se debe priorizar la intersecciones de Usme, Sierra Morena y Candelaria debido a que sus órdenes de trabajo están remitidas desde el 17 de julio de 2025, 27 de julio de 2025 y 10 de septiembre respectivamente.

Mantenimientos

Orden de trabajo	Fecha de solicitud	Localidad	Externo	Dirección	Inicio	Actividad	Atención de actividad (INICIO)	Actividad finalizada
4	30/07/2025	USME	3007	KR 1 X CL 87C S	NO	Realizar sondeo y de encontrarse taponamiento en ductería y cámara de paso realizar la respectiva limpieza	NO	NO
4	30/07/2025	USME	3008	KR 1 X CL 90 S	SI	Instalar 3 tapas antivandálicas y 1 marco	30/09/2025	SI
4	30/07/2025	KENNEDY	3783	TV 78N X CL 53 S	SI	Instalación de 1 tapa y 1 marco	20/09/2025	SI
4	30/07/2025	KENNEDY	3276	TV 85 X CL 57B S	SI	Instalación de 6 tapas y 4 marcos	06/08/2025	SI
9	10/09/2025	BOSA	3489	AK 86 X DG 49 S	SI	Se requiere construcción de caja de paso para GICE	26/09/2025	NO

11	17/10/2025	RAFAEL URIBE	3082	KR 12B X CL 28C SUR	SI	Suministro e instalación de GICE	23/10/2025 06/11/2025	SI
12	18/11/2025	ANTONIO NARIÑO	3422	KR 19 X CL10B SUR	NO	Mantenimiento	NO	NO

- Para la actividad de la KR 12B X CL 28C SUR EXT 3489 se debe coordinar con la componente de Postes de Interventoría una vez el Contratista Consorcio Movilidad 2025 termine la actividad, la cual se indicó su gestión el día 19 de noviembre de 2025.

- Para la actividad de la KR 1 X CL 87C S EXT 3007 el Contratista manifiesta que no se realizó debido a que el ítem de sondeo no se encuentra dentro de las actividades conciliadas en los APU.

VARIOS INTERVENTORÍA – SDM

- Se solicita que para el próximo comité todas las actividades y observaciones se encuentren normalizadas y subsanadas. En caso de dudas, el contratista deberá solicitar las reuniones necesarias para abordar los temas de trabajo pendientes.
- En cuanto al IDPC, se encuentran pendientes los certificados de libertad y tradición con una antigüedad no mayor a 30 días. Por lo anterior, se solicita al contratista su actualización, con fecha de compromiso para el 27 de noviembre de 2025.
- Respecto a la supervisión, se reitera la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos en los comités técnicos.

3. COMPROMISOS

n.°	Descripción	Responsable	Fecha Limite
1	Subsanación de observaciones para recibo final KR 79 x 40C Sur EXT 3795 – 5ta reiteración.	Contratista	01/12/2025
2	Atención de observaciones - Plano récord de la intersección KR 79 X CL 40C SUR EXT 3795	Contratista	03/12/2025
3	Entrega del certificado emitido por el gestor ambiental	Contratista	15/12/2025
4	Entrega de valorizaciones de los mantenimientos que se han realizado a la fecha (5)	Contratista	01/12/2025
5	Certificación firmada por revisor fiscal o contador público, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 15 de la Cláusula 9 de la Minuta del Contrato, la cual señala la obligación del Contratista de responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias, conforme a lo dispuesto en la Ley.	Contratista	27/11/2025
6	Revisión para recibo final KR 80 x 38C Sur	Contratista	05/12/2025
7	Entrega de respuesta al comunicado SEM-CMC-CM25-089-25 y SEM-CMC-CM25-102-25: Informes diarios y semanales.	Contratista	01/12/2025
8	Entrega de subsanaciones de las fichas técnicas faltantes	Contratista	28/11/2025

n.°	Descripción	Responsable	Fecha Limite
9	Entrega de tapas normales y antivandálicas según orden de fabricación enviadas por la Interventoría	Contratista	10/12/2025
10	Subsanación de hallazgos de bodega	Contratista	05/12/2025
11	Entrega de los PMT faltantes de las intersecciones tipo complemento	Contratista	05/12/2025
12	volver a cargar las pólizas con las observaciones de la SDM y enviadas por el consorcio CMC mediante comunicado SEM-CMC-CM25-144-25	Contratista	29/11/2025

4. FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Andrés Suarez	Subdirector de semaforización	DIEGO ANDRES SUAREZ GOMEZ Firmado digitalmente por DIEGO ANDRES SUAREZ GOMEZ Fecha: 2026.01.06 16:02:45 -05'00'
Valentín E. Barajas Santos	Director de Interventoría	
Andrés García Avendaño	Coordinador de Interventoría	
Mayte Gutiérrez Barbosa	Residente de Obras Civiles - Interventoría	
William Acosta	Director de Obra - Contratista	

MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	**LISTADO DE ASISTENCIA – REUNIONES** **Contrato 2025-2769 Contrato de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte**	**VERSIÓN: 1** **FECHA DE VIGENCIA:** 23/04/2025

N.° de Acta:	08				
Tema de la reunión:	Comité de Seguimiento No. 8 CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 No. 2025-2781				
Fecha:	26/11/2025	**Hora:**	8:30 AM	**Lugar:**	Cra. 28 A # 17 A 20 - SDM Paloquemao

No	Nombres y Apellidos	Empresa/ Entidad	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Mayte Gutierrez B.	CMC	Residente Obras	sem-ing-res-obrasciviles-2@redtic.com.co	MAYTE G.
2	Tania Lombana	CMC	Auxiliar Obras	———	Tania.
3	Gloria Colorado	CMC	P Calidad	sem-p-calidad@redtic.com.co	
4	Laura M. Castellanos Guerrero	CMC	Prof. financiero	sem-p-financiero@redtic.com.co	
5	Isabella Pabuena Agudelo	CMC	Prof Jurídico	sem-p-juridico@redtic.com	
6	Andrea Vargas Soler	CMC	Prof. Ambiental	sem-p-ambiental@redtic.com.co	
7	Katalina Moya Jiménez	CMC	Profesional SST	sem-SST-1@redtic.com.co	Katalina Moya
8	Fernando Estupiñán	CMC/Interventoría	Ing. Residente	sem-ing-mantun@redtic.com.co	
9	Luis Carlos Daza V.	CMC	Esp. en Transito	sem-esp-transitoytransporte@redtic.com.co	
10	Jhon Robb Rozo	CM 2025	Profesional Calidad	williams.lidercalidad@gmail.com	
11	Diana M. Ramos C.	CM. 2025	Profesional SSTA	williams.arealiderssta@gmail.com	
12	Mauricio Aco M.	CM. 2025	Arquv.	mauricio@arquvialya.com	
13	Christian Alejo Gutierrez Garcia.	Cm. 2025	Res. obra.	ingguti erez garcia2020@gmail.com	
14	William A. Acosta L	Consorcio Mov 2025	Dirección	consorciomovilidad2025@gmail.com	
15	María Paz Rosario Oyuela	CM 2025	Aux. Ingeniería	consorciomovilidad2025@gmail.com	María Paz
16	YEISON IBAÑEZ GUERRERO	SEMA / SDM	Contratista	yibanez@movilidadbogota.gov.co	YEISON IBAÑEZ G.
17	Diego Andrés Suarez Gomez	SEMA/SDM	Subdirector / Supervisor encargado	dsuarezg@movilidadbogota.gov.co	

MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	**LISTADO DE ASISTENCIA – REUNIONES** **Contrato 2025-2769 Contrato de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte**	**VERSIÓN:** 1 **FECHA DE VIGENCIA:** 23/04/2025

N.° de Acta:	08				
Tema de la reunión:	Comité de Seguimiento No. 8 CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 No. 2025-2781				
Fecha:	26/11/2025	**Hora:**	8:30 AM	**Lugar:**	Cra. 28 A # 17 A 20 - SDM Paloquemao

No.	Nombres y Apellidos	Empresa/ Entidad	Cargo	Correo electrónico	Firma
18	Valentín Eduardo Barajas Santos	CMC	Director de Interventoría	sem-director@redtic.com.co	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
