INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.° 10

Componente Obras Civiles - Lote 2

Contrato n.° 2025-2769

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

Periodo del 01 al 31 de enero de 2026

Bogotá D.C. – febrero de 2026

ELABORACIÓN Y REVISIÓN:

Elaboró:	**Mayte Dayana Gutiérrez Barbosa**	**Revisó:**	**Andrés García Avendaño**	**Aprobó:**	**Valentín Barajas Santos**
Fecha:	15/02/2026	Fecha:	15/02/2026	Fecha:	15/02/2026
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Residente Obras Civiles	Cargo:	Coordinador Técnico de Interventoría	Cargo:	Director de Interventoría

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN	**FECHA**	**CAMBIOS REALIZADOS**	**OBSERVACIONES**
0.0	15/02/2026	Versión Inicial	Versión Inicial
1.0	10/03/2026	Versión 1.0	Versión 1.0

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	INFORME BÁSICO DE INTERVENTORÍA n.° 10 - Componente Obras Civiles - Lote 2 presentado por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL correspondiente a las actividades adelantadas del 01 al 31 de enero de 2026.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	15/02/2026		
Resumen	Se presentan las actividades realizadas por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL en el marco del Contrato de Interventoría n.° 2025-2769, respecto al seguimiento mensual de la verificación tanto integral como por aspecto, efectuada a contratistas cuyo objeto sea la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C. De igual forma, se relaciona el estado técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental del contrato, durante el período del presente informe.		
Formato	DOCX.	**Lenguaje**	Español
Versión	Versión 1.0		
Autor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL		
Revisó	Andrés García Avendaño		

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 7
2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO 8
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 9
3.1. Seguimiento técnico del contrato 9
3.1.1. Componente de obra 9
3.1.2. Estadísticas del avance físico de los trabajos 12
3.1.3. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la Interventoría 25
3.1.4. Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito 32
3.1.5. Registro fotográfico georreferenciado 32
3.1.6. Controles de calidad 34
3.1.7. Planes de contingencia elaborados por el Contratista 34
3.1.8. Medidas correctivas exigidas por la Interventoría Calidad 34
3.1.9. Relación de los resultados y análisis de laboratorio y de campo 34
3.1.10. Seguimiento del plan de calidad del Contratista 34
3.1.11. Relación de productos no conformes 36
3.1.12. Recomendaciones, observaciones y conclusiones 36
3.2. Seguimiento administrativo 37
3.2.1. Verificación de requisitos mínimos 37
3.2.2. Informes presentados por el Contratista 37
3.2.3. Recursos utilizados por el Contratista 38
3.2.4. Verificación de cumplimiento de Condiciones que generaron puntaje adicional- Puntaje por: i) vinculación de personas en condición de discapacidad, ii) Puntaje de industria nacional y iii) factor de calidad. 40
3.3 Seguimiento financiero 42
3.4 Seguimiento jurídico 44
3.4.1 Resumen de garantías del contrato 44
3.4.2 Verificación de pagos y aportes a seguridad social y parafiscal 45
3.5 Relación de actas suscritas durante el periodo objeto de Interventoría 45
3.6 Relación de correspondencia enviada y recibida relacionadas con el Contratista 46
4 ANEXOS 52
4.1. Anexo n.° 1. Directorio del personal profesional del Contratista 52
4.2. Anexo n.° 2. Directorio del personal profesional de Interventoría 53
4.3. Anexo n.° 3 Directorio del personal profesional de la Entidad 53
4.4. Anexo n.° 4 evaluación del cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del contrato. 53

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ficha Técnica CTO 2025-2781 7
Tabla 2. Relación de fabricación de elementos 9
Tabla 3.Órdenes de Trabajo 11
Tabla 4. Total Órdenes de Trabajo 11
Tabla 5. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva AK 14I X CL 84 Sur - Usme 12
Tabla 6. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva TV 60 X DG 70 SUR - Sierra Morena 13
Tabla 7. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 46A X CL 68 SUR 14
Tabla 8. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 61G X CL 67B SUR 15
Tabla 9. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 24 X CL 18 SUR 15
Tabla 10. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 40 C Sur 16
Tabla 11. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 38C Sur 17
Tabla 12. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 40C Sur 18
Tabla 13. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 38C Sur 18
Tabla 14. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 78 K X CL 38C Sur 19
Tabla 15. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 72 K X CL 9 20
Tabla 16. Avance físico de los trabajos – Complemento KR 72J X CL 45 SUR 21
Tabla 17. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80G X DG 3 21
Tabla 18. Requerimientos Planes de Mejora Contratista 23
Tabla 19. Mantenimientos 23
Tabla 20. Relación cantidades de obra 25
Tabla 21. Seguimiento PMT Generales enero 2026 32
Tabla 22. Seguimiento PMT específicos vigentes enero 2026 32
Tabla 23. Registro fotográfico 33
Tabla 24. Hoja de vida presentadas por el Contratista durante el periodo de enero de 2026 37
Tabla 25. Informes básicos Contratista 37
Tabla 26. Obra de mano no calificada 38
Tabla 27. Personal administrativo y de apoyo 38
Tabla 28. Transporte 39
Tabla 29. Puntaje de Industria Nacional 40
Tabla 30. Vinculación de personas con discapacidad 41
Tabla 31. Disponibilidad y reserva presupuestal del contrato (2025-2781) 42
Tabla 32. Presupuesto del Contrato 2025-2781 42
Tabla 33. Balance Financiero 2025-2781 43
Tabla 34. Programación PAC CTO n.° 2025-2781 43
Tabla 35. Relación de actas suscritas durante el periodo 46
Tabla 36. Correspondencia Recibida 46
Tabla 37. Correspondencia Enviada 46
Tabla 38. Correspondencia enviada al Contratista mediante correo electrónico 47
Tabla 39. Correspondencia recibida del Contratista mediante correo electrónico 51

Tabla 40. Relación de personal profesional del Contratista 52
Tabla 41. Relación de personal profesional de la Interventoría 53
Tabla 42. Relación de personal profesional de la Entidad 53
Tabla 43. Obligaciones generales del Contratista 53

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Avance de Trabajos con Relación al Avance Presupuestal 24
Ilustración 2. Nivel de cumplimiento factores de calidad factores plan de calidad evaluados para contrato n.° 2025- 2781 durante el periodo de enero del 2025 35
Ilustración 3. Ejecución presupuestal vs PAC programado Cto. 2025-2781 43

LISTADO DE ANEXOS

Anexo n.° 1. Directorio telefónico relación del personal profesional del Contratista.
Anexo n.° 2. Directorio telefónico relación del personal profesional de Interventoría.
Anexo n.° 3. Directorio telefónico del personal profesional de la Entidad.
Anexo n.° 4. Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del contrato.
Anexo n.° 5. Formatos de seguimiento de la Interventoría.
Anexo n.° 8. Copia de la bitácora del periodo.
Anexo n.° 9. Copia de actas desarrolladas en el periodo.
Anexo n.° 10. Registro fotográfico.
Anexo n.° 14. Cuadro sobre el estado del tiempo. Registro de condiciones climáticas de lluvia o meteorológicas que impidan la ejecución de los trabajos.
Anexo n.° 15. Documento que soporta como se llegó a determinar las cantidades por cada ítem, acorde a lo indicado en el numeral 3.1.2 del anexo técnico 1A.
Anexo n.° 17. Certificado de materiales y ensayos de laboratorio.
Anexo n.° 18. Relación personal aprobado al Contratista.
Anexo n.° 19. Aspectos que otorgan puntaje.
Anexo n.° 20. Reporte de Hallazgos.
Anexo n.° 21. Maquinaria, herramientas y equipos.

INTRODUCCIÓN

La SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (en adelante "SDM") mediante concurso de méritos abierto n.° SDM-CMA-3-2025, adjudicó el Contrato de Interventoría n.° 2025-2769 al CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL (en adelante la "Interventoría") con el objeto de "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.", durante el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2025 y el 15 de febrero de 2026.

Así, este informe se desarrolla en cumplimiento del numeral *4.1. INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA* del *Anexo Técnico 1A* del contrato 2025-2769, celebrado entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL, el cual establece:

"Mensualmente la Interventoría entregará un informe por cada contrato objeto de Interventoría a la Entidad, donde se indicará: descripción y localización de las actividades desarrolladas del contrato, una completa lista de las actividades desarrolladas por el interventor, enmarcando las actividades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas, una ficha técnica del contrato, relación de todos y cada uno de los indicadores establecidos para el contrato, un balance financiero y el estado de avance y cumplimiento de cada uno de los contratos; igualmente, se deben incluir los anexos que soporten la información relacionada."

De esta manera, se incluye el resumen de las labores y actividades desarrolladas por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL durante el período del presente informe, relacionado con la Interventoría integral de la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C.

La Entidad mediante Resolución n.° 357297 del 26 de marzo de 2025, adjudicó el proceso de selección SDM-LP-001-2025, en el lote 2, al proponente CONSORCIO MOVILIDAD 2025. Resultado de esta adjudicación, se celebró el contrato 2025-2781 cuyo objeto es: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.", en el Lote n.° 2 Componente Obras Civiles del Sistema de Semaforización de Bogotá D.C. Zona Sur.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Tabla 1. Ficha Técnica CTO 2025-2781

Número de contrato	**2025-2781**
Clase de contrato	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Objeto	"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 2"
Contratista	CONSORCIO MOVILIDAD 2025
Identificación	NIT n.° 901.932.603-9
Interventor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL.
Plazo de ejecución	Diez (10) meses o hasta agotar los recursos, lo que primero suceda, contados a partir de contados de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
Fecha de suscripción del contrato	14 de abril de 2025
Fecha de inicio del contrato	29 de abril de 2025
Fecha de terminación	28 de febrero de 2026
Valor del Contrato	CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 5.141.951.324)
Certificados de Disponibilidad Presupuestal	n.° 106 del 02 de enero del 2025. POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($38.800.000.000) M/CTE.
Certificado de Registro Presupuestal	n.° 2417 del 15 de abril del 2025. Por valor de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 5.141.951.324).
Rubro:	O2301172409202401270805 9
n.° Pólizas	Póliza de Cumplimiento: n.° 21-44-101467820 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE): n.° 21-40-101253037
Fecha de aprobación Pólizas:	28 de abril de 2025
Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Proceso de selección N.º	SDM-LP-001-2025

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Se anexan al informe los directorios telefónicos correspondientes al personal profesional del Contratista, la Interventoría y de la Secretaría Distrital de Movilidad SDM así:

Anexo n.° 1. Directorio telefónico relación del personal profesional del Contratista.
Anexo n.° 2. Directorio telefónico relación del personal profesional de Interventoría.
Anexo n.° 3. Directorio telefónico del personal profesional de la Entidad.

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO

En el presente documento se detallan las actividades desarrolladas por la Interventoría del Contrato de Obra 2025-2781, correspondiente al Contratista Consorcio Movilidad 2025 responsable de las obras civiles del Lote n.° 2 – Zona Sur.

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación n.° **SDM-LP-001-2025**, los cuales hacen parte integral del contrato.

El Contratista de obra se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta económica y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

Dentro del alcance determinado en los documentos contractuales de obra para el contrato 2025-2781 el Contratista contempla realizar actividades para la construcción e implementación nuevas intersecciones, complementar las existentes y mantener elementos del sistema de semaforización de Bogotá D.C., contribuyendo a su expansión. Dentro de las cuales se encuentran:

- Gestionar la licencia de excavación.
- Gestionar Plan de Manejo de Tránsito de obra.
- Realizar localización, verificación y materialización del proyecto, verificar diseños, ejecutar la construcción según especificaciones y cantidades, realizar replanteo con el interventor.
- Verificar redes y servicios, elaborar planos As-Built y tramitar paz y salvos ante el IDU, empresas de servicios y demás entidades.

Dentro de las actividades de construcción se incluyen: demolición, excavación para ductos, construcción de cajas de paso y bases para postes, instalación de ductos PVC, compactación de materiales, perforación neumática, construcción de placas, muros, pañetes, filos, dilataciones, andenes, calzadas, sardineles, bases y pedestales, instalación de bajantes, sardineles prefabricados, marcos, tapas, conexiones, rotura y reconstrucción de andenes, así como la limpieza de residuos generados.

Para el caso de la reconstrucción y mantenimiento del sistema, se contemplan canalizaciones, bases, cajas de paso e infraestructura para acometidas, entre otras labores de obras civiles. El Contratista debe contar con el personal, vehículos y herramientas necesarios según las especificaciones técnicas.

En cumplimiento del Contrato de Interventoría n.° 2025-2769, el Consorcio Movilidad Capital realiza seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental a

los contratos, según las especificaciones impartidas por la SDM y las condiciones contractuales para la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

3.1. Seguimiento técnico del contrato

3.1.1. Componente de obra

En el presente periodo, no se remitieron nuevas órdenes de fabricación al Contratista.

La siguiente tabla muestra el resumen de elementos fabricados por el Contratista, relacionándolos con los comprobantes de ingreso, cortes, órdenes de trabajo y facturación, a la fecha los elementos de la OT 4, 5 y 7 se encuentra en fabricación, la cual se emitió el 19 de agosto, 24 de septiembre de 2025 y 31 de octubre:

Tabla 2. Relación de fabricación de elementos

Comprobante de ingreso n.°	Elementos	Tramitado en corte	Orden de trabajo n.°	Factura n.°	Fecha de factura	Ubicación
1955	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso (50)	25-jul	1	1	25-jul-25	Almacén SDM
1955	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (50)	25-jul	1	1	25-jul-25	Almacén SDM
2013	Suministro e instalación de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE) o gabinete integrado de comunicaciones y energía (GICE) con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA), para equipo de control y losa de concreto – prefabricada. (3)	31-oct	2	9	23-oct-25	Bodega Contratista CM25
2020	Suministro de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE) o gabinete integrado de comunicaciones y energía	13-nov	2	8	21-oct-25	Almacén SDM

Comprobante de ingreso n.°	Elementos	Tramitado en corte	Orden de trabajo n.°	Factura n.°	Fecha de factura	Ubicación
	(GICE) con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA), para equipo de control y losa de concreto – prefabricada. (2)					
1976	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso (50)	27-ago	3	4	27-ago	Almacén SDM
1976	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (50)	27-ago	3	4	27-ago	Almacén SDM
Pendiente de ingreso	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (50)	Pendiente de ingreso	4	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso
Pendiente de ingreso	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (25)	Pendiente de ingreso	5	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso
Pendiente de ingreso	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular para caja de paso (75)	Pendiente de ingreso	5	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso
Pendiente de ingreso	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso (25)	Pendiente de ingreso	7	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso
Pendiente de ingreso	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular para caja de paso (75)	Pendiente de ingreso	7	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso	Pendiente de ingreso
2020	Suministro de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE) o gabinete integrado de comunicaciones y energía (GICE) con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA), para equipo de control y losa de concreto – prefabricada. (4)	13-nov	6	8	21-oct-25	Almacén SDM

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

A continuación, se relacionan las órdenes de trabajo realizadas en el periodo con corte al 31 de enero de 2026:

Tabla 3.Órdenes de Trabajo

Orden de Trabajo n.°	Fecha	Solicitudes de construcción de nuevas intersecciones	Solicitudes de construcción de complementos	Solicitudes de trabajos de mantenimiento
17	28/01/2026			2
TOTAL		0	0	2

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

A la fecha, se relaciona la totalidad de las órdenes de trabajo y ordenes de fabricación del contrato:

Tabla 4. Total Órdenes de Trabajo

Orden de Trabajo n.°	Fecha	Solicitudes de construcción de nuevas intersecciones	Solicitudes de construcción de complementos	Solicitudes de trabajos de mantenimiento	Solicitud de fabricación de elementos
Órdenes de fabricación					
1	21/05/2025				100
2	22/05/2025				5
3	19/06/2025				100
4	19/08/2025				50
5	24/09/2025				100
6	07/10/2025				4
7	31/10/2025				100
Ordenes de Trabajo					
1	7/07/2025		5		
2	15/07/2025		5		
3	15/07/2025	1			
4	30/07/2025			4	
5	27/07/2025	1			
6	10/09/2025		5		
7	10/09/2025	1			
8	10/09/2025	2			
9	10/09/2025			1	
10	10/10/2025		5		
11	17/10/2025			1	
12	18/11/2025			1	1

Orden de Trabajo n.°	Fecha	Solicitudes de construcción de nuevas intersecciones	Solicitudes de construcción de complementos	Solicitudes de trabajos de mantenimiento	Solicitud de fabricación de elementos
Órdenes de fabricación					
13	20/11/2025		20		
14	01/12/2025			1	
15	26/12/2025			1	
16	26/12/2025			1	
17	28/01/2026			2	
TOTAL		5	40	12	460

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

En el *Anexo 20* se muestran los hallazgos realizados hacia el Contratista en el periodo del presente informe.

3.1.2. Estadísticas del avance físico de los trabajos

En los siguientes numerales, se muestra el avance físico de los trabajos de obra realizados con corte al último día del periodo objeto del presente informe.

3.1.2.1. Intersecciones nuevas

Tabla 5. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva AK 14I X CL 84 Sur - Usme

Actividad	% Programado al 31/01/2026	% Ejecución al 31/01/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Aprobación COI PMT ESPECIFICO	100%	100%	11/07/2025	11/07/2025	0
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	14/07/2025	4/08/2025	0
Perforación dirigida	100%	100%	5/08/2025	8/09/2025	0
Demoliciones y excavaciones	100%	93%	30/11/2025	3/12/2025	59
Canalizaciones	100%	95%	30/11/2025	3/12/2025	59
Cajas, marcos y tapas	100%	85%	30/11/2025	3/12/2025	59
Bases para postes	100%	71%	30/11/2025	3/12/2025	59
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	90%	10/11/2025	3/12/2025	59
Instalación AUCE	100%	0%	2/12/2025	2/12/2025	60
Planos récord	100%	0%	3/11/2025	9/12/2025	53

Actividad	% Programado al 31/01/2026	% Ejecución al 31/01/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Acta de entrega a satisfacción	100%	0%	3/11/2025	9/12/2025	53
Entrega de laboratorios	100%	50%	24/10/2025	24/11/2025	68
Promedio ejecución	**100%**	83%	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		11/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		09/12/2025
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		204

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 6. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva TV 60 X DG 70 SUR - Sierra Morena

Actividad	% Programado al 31/01/2026	% Ejecución al 31/01/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Aprobación PMT 1	100%	100%	25/07/2025	25/07/2025	0
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	28/07/2025	18/08/2025	0
Perforación dirigida	100%	100%	19/08/2025	22/09/2025	0
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	4/08/2025	22/11/2025	0
Canalizaciones	100%	100%	4/08/2025	22/11/2025	0
Cajas, marcos y tapas	100%	100%	7/08/2025	22/11/2025	70
Bases para postes	100%	100%	2/10/2025	22/11/2025	0
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	7/10/2025	22/11/2025	70
Instalación AUCE	100%	100%	3/11/2025	4/11/2025	0
Planos récord	100%	0%	26/11/2025	26/11/2025	66
Acta de entrega a satisfacción	100%	50%	26/11/2025	26/11/2025	66
Entrega de laboratorios	100%	100%	22/12/2025	22/12/2025	0
Promedio ejecución	**100%**	**97%**	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		25/07/2025

Actividad	% Programado al 31/01/2026	% Ejecución al 31/01/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Fecha entrega pactada según cronograma		22/12/2025			
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		190			

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 7. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 46A X CL 68 SUR

Actividad	% Programado al 31/12/2025	% Ejecución al 31/12/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
INICIO PROYECTADO	100%	100%	8/09/2025	8/09/2025	0
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	9/09/2025	19/09/2025	0
Perforación dirigida INT NUEVA 1	100%	100%	22/09/2025	14/10/2025	0
Demoliciones y excavaciones	100%	50%	15/10/2025	25/11/2025	67
Canalizaciones	100%	45%	15/10/2025	25/11/2025	67
Cajas, marcos y tapas	100%	35%	27/10/2025	21/11/2025	71
Bases para postes	100%	0%	24/11/2025	17/12/2025	45
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	5%	27/11/2025	23/12/2025	39
Instalación AUCE	100%	0%	24/12/2025	25/12/2025	37
Planos récord	100%	0%	24/12/2025	30/12/2025	32
Acta de entrega a satisfacción	100%	0%	24/12/2025	30/12/2025	32
Entrega de laboratorios	27%	0%	24/12/2025	22/01/2026	38
Promedio ejecución	**94%**	**36%**	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		08/09/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		22/01/2026
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		145

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 8. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 61G X CL 67B SUR

Actividad	% Programado al 31/12/2025	% Ejecución al 31/12/2025	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Aprobación	100%	100%	18/09/2025	18/09/2025	0
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	19/09/2025	26/09/2025	0
Perforación dirigida	100%	100%	29/09/2025	20/10/2025	0
Demoliciones y excavaciones	100%	40%	21/10/2025	13/11/2025	79
Canalizaciones	100%	0%	21/10/2025	13/11/2025	79
Cajas, marcos y tapas	100%	0%	24/10/2025	18/11/2025	74
Bases para postes	100%	0%	19/11/2025	12/12/2025	50
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	0%	24/11/2025	18/12/2025	44
Instalación AUCE	100%	0%	19/12/2025	22/12/2025	40
Planos récord	100%	0%	19/12/2025	25/12/2025	37
Acta de entrega a satisfacción	100%	0%	19/12/2025	22/12/2025	40
Entrega de laboratorios	100%	0%	19/12/2025	19/01/2026	43
Promedio ejecución	**100%**	20%	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		18/09/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		19/01/2026
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		135

Tabla 9. Avance físico de los trabajos – Intersecciones nueva KR 24 X CL 18 SUR

Actividad	% Programado al 31/01/2026	% Ejecución al 31/01/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Aprobación	100%	100%	29/09/2025	29/09/2025	0
Revisión de redes y solicitud de planos de servicios	100%	100%	30/09/2025	13/10/2025	0
Perforación dirigida	100%	0%	14/10/2025	6/11/2025	86
Demoliciones y excavaciones	100%	0%	7/11/2025	2/12/2025	60

Actividad	% Programado al 31/01/2026	% Ejecución al 31/01/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Canalizaciones	100%	0%	7/11/2025	2/12/2025	60
Cajas, marcos y tapas	100%	0%	12/11/2025	5/12/2025	57
Bases para postes	100%	0%	8/12/2025	5/12/2025	57
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	0%	11/12/2025	31/12/2025	31
Instalación AUCE	100%	0%	7/01/2026	6/01/2026	25
Planos récord	100%	0%	7/01/2026	8/01/2026	23
Acta de entrega a satisfacción	100%	0%	7/01/2026	13/01/2026	18
Entrega de laboratorios	83%	0%	7/01/2026	5/02/2026	0
Promedio ejecución	**99%**	5%	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		29/09/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		05/02/2026
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		124

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

3.1.2.2. Complementos

Tabla 10. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 40 C Sur

Actividad	% Programado al 31/01/2026	% Ejecución al 31/01/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	25/06/2025	25/06/2025	0
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	26/06/2025	4/08/2025	0
Canalizaciones	100%	100%	30/06/2025	29/07/2025	0
Cajas, marcos y tapas	100%	100%	26/06/2025	29/07/2025	0
Bases para postes	100%	98%	10/11/2025	14/11/2025	0
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	98%	10/11/2025	14/11/2025	0
Planos récord	100%	0%	19/11/2025	19/11/2025	73
Acta de entrega a satisfacción	100%	0%	19/11/2025	19/11/2025	73

Actividad	% Programado al 31/01/2026	% Ejecución al 31/01/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Entrega de laboratorios	100%	95%	19/11/2025	19/11/2025	73
Promedio ejecución	**100%**	**95%**	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		25/06/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		19/11/2025
Retraso parcial acumulado obra al 19/11/2025		73
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		221

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 11. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80 X CL 38C Sur

Actividad	% Programado al 31/01/2026	% Ejecución al 31/01/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	16/07/2025	18/07/2025	0
Perforación dirigida	100%	100%	16/07/2025	23/07/2025	0
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	25/07/2025	21/08/2025	0
Canalizaciones	100%	95%	25/07/2025	21/08/2025	163
Cajas, marcos y postes	100%	95%	30/07/2025	26/08/2025	158
Base para postes	100%	60%	18/08/2025	10/09/2025	143
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	60%	3/09/2025	29/09/2025	124
Planos récord	100%	0%	30/09/2025	6/10/2025	117
Acta de entrega a satisfacción	100%	0%	30/09/2025	6/10/2025	117
Entrega de laboratorios	100%	90%	22/09/2025	21/10/2025	102
Promedio ejecución	**100%**	**86%**	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		16/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		21/10/2025
Retraso parcial acumulado obra al 21/10/2025		102
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		221

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 12. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 40C Sur

Actividad	**% Programado al 31/01/2026**	**% Ejecución al 31/01/2026**	**Inicio pactado según cronograma**	**Terminación pactada según cronograma**	**Retraso (días)**
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	14/07/2025	14/07/2025	0
Perforación dirigida	100%	100%	15/07/2025	30/07/2025	0
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	15/07/2025	14/08/2025	0
Canalizaciones	100%	100%	29/07/2025	4/08/2025	0
Cajas, marcos y tapas	100%	100%	12/08/2025	18/08/2025	0
Base para postes	100%	100%	12/08/2025	5/09/2025	0
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	28/08/2025	17/09/2025	0
Planos récord	100%	95%	18/09/2025	22/09/2025	131
Acta de entrega a satisfacción	100%	100%	23/09/2025	25/09/2025	128
Entrega de laboratorios	100%	100%	18/09/2025	27/10/2025	96
Promedio ejecución	**100%**	**99%**	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		14/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		27/10/2025
Retraso parcial acumulado obra al 27/10/2025		96
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		204

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 79 X CL 38C Sur

Actividad	% Programado al 31/01/2026	% Ejecución al 31/01/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	16/07/2025	18/07/2025	0
Perforación dirigida	100%	100%	16/07/2025	7/09/2025	0

Actividad	% Programado al 31/01/2026	% Ejecución al 31/01/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	18/07/2025	15/10/2025	0
Canalizaciones	100%	100%	18/07/2025	15/10/2025	0
Cajas, marcos y postes	100%	100%	23/07/2025	15/10/2025	0
Base para postes	100%	100%	16/07/2025	21/10/2025	0
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	29/08/2025	21/10/2025	0
Planos récord	100%	0%	30/09/2025	2/11/2025	90
Acta de entrega a satisfacción	100%	80%	30/09/2025	2/11/2025	90
Entrega de laboratorios	100%	100%	22/09/2025	17/11/2025	0
Promedio ejecución	**100%**	**98%**	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		16/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		17/11/2025
Retraso parcial acumulado obra al 17/11/2025		75
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		221

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 14. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 78 K X CL 38C Sur

Actividad	**% Programado al 31/01/2026**	**% Ejecución al 31/01/2026**	**Inicio pactado según cronograma**	**Terminación pactada según cronograma**	**Retraso (días)**
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	29/07/2025	31/07/2025	0
Perforación dirigida	100%	100%	29/07/2025	12/08/2025	0
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	29/07/2025	4/09/2025	0
Canalizaciones	100%	100%	29/07/2025	4/09/2025	0
Cajas, marcos y postes	100%	100%	30/07/2025	9/09/2025	0
Base para postes	100%	100%	18/08/2025	24/09/2025	0

Actividad	% Programado al 31/01/2026	% Ejecución al 31/01/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	95%	3/09/2025	14/11/2025	78
Planos récord	100%	0%	30/09/2025	19/11/2025	73
Acta de entrega a satisfacción	100%	80%	22/09/2025	14/11/2025	78
Entrega de laboratorios	100%	100%	22/09/2025	29/11/2025	0
Promedio ejecución	**100%**	**98%**	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		29/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		29/11/2025
Retraso parcial acumulado obra al 29/11/2025		63
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		122

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 15. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 72 K X CL 9

Actividad	% Programado al 31/01/2026	% Ejecución al 31/01/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	17/07/2025	23/07/2025	0
Perforación dirigida	100%	100%	24/07/2025	14/08/2025	0
Demoliciones y excavaciones	100%	100%	5/08/2025	21/08/2025	0
Canalizaciones	100%	100%	12/08/2025	21/08/2025	0
Cajas, marcos y postes	100%	100%	15/08/2025	26/08/2025	0
Recuperación de andenes, rampas y acabados	100%	100%	3/09/2025	29/09/2025	0
Planos récord	100%	0%	30/09/2025	6/10/2025	117
Acta de entrega a satisfacción	100%	90%	7/10/2025	13/10/2025	110
Entrega de laboratorios	100%	0%	14/10/2025	12/11/2025	80
Promedio ejecución	**100%**	**93%**	-	-	-

Actividad	% Programado al 31/01/2026	% Ejecución al 31/01/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)

Fecha inicio pactada según cronograma		17/07/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		12/11/2025
Retraso parcial acumulado obra al 12/11/2025		80
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		199

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 16. Avance físico de los trabajos – Complemento KR 72J X CL 45 SUR

Actividad	% Programado al 31/01/2026	% Ejecución al 31/01/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	31/12/2025	31/12/2025	
Demoliciones y excavaciones	100%	50%	31/12/2025	26/01/2026	
Canalizaciones	100%	50%	7/01/2026	29/01/2026	
Cajas, marcos y tapas	100%	0%	31/12/2025	20/01/2026	
Base para poste	99%	0%	14/01/2026	2/02/2026	
Recuperación de andenes, rampas y acabados	95%	50%	6/01/2026	29/01/2026	
Planos récord	0%	0%	12/02/2026	28/02/2026	
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	0%	0%	12/02/2026	28/02/2026	
Entrega laboratorios	28%	0%	21/01/2026	28/02/2026	
Promedio ejecución	**80%**	**37%**	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		31/12/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		28/02/2026
Retraso parcial acumulado obra al 28/02/2026		0
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		31

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 17. Avance físico de los trabajos – Complemento AK 80G X DG 3

Actividad	% Programado al 31/01/2026	% Ejecución al 31/01/2026	Inicio pactado según cronograma	Terminación pactada según cronograma	Retraso (días)
Estudio de redes, cerramientos y preliminares	100%	100%	31/12/2025	1/01/2026	
Demoliciones y excavaciones	84%	60%	31/12/2025	3/02/2026	
Canalizaciones	91%	45%	5/01/2026	3/02/2016	
Cajas, marcos y tapas	100%	0%	31/12/2025	27/01/2026	
Recuperación de andenes, rampas y acabados	0%	0%	11/02/2026	26/02/2026	
Plano récord	0%	0%	12/02/2026	28/02/2026	
Acta de entrega a satisfacción con pendiente laboratorios finales	0%	0%	12/02/2026	28/02/2026	
Entrega de laboratorios	28%	0%	21/01/2026	28/02/2026	
Promedio ejecución	**54%**	**30%**	-	-	-

Fecha inicio pactada según cronograma		31/12/2025
Fecha entrega pactada según cronograma		28/02/2026
Retraso parcial acumulado obra al 28/02/2026		0
Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra (días)		31

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a los atrasos presentados en la ejecución del cronograma de obra aprobado, la Interventoría mediante comunicado SEM-CMC-CM25-176-25 con radicado ORFEO n.° 202500001394762 del 27 de diciembre de 2025 remitió requerimiento previo para once (11) intersecciones que a dicha fecha incumplieron actividades de entrega o de avances establecidas en el cronograma aprobado. Sobre el particular, la Interventoría solicitó al contratista cumplir con las obligaciones que se encontraban en mora, y explicar por escrito a la Interventoría , las razones y motivos fácticos y jurídicos por los cuales se presentaron los posibles incumplimientos.

Al respecto, el Consorcio Movilidad 2025, mediante carta WEXT-2025-2781-190 con n.° de radicado ORFEO 202500001394762 del 31 de diciembre de, entregó respuesta al requerimiento realizado por la Interventoría presentando un plan de mejora con el fin de cumplir con las obligaciones que se encontraban en mora.

Finalmente, la Interventoría, mediante comunicado SEM-CMC-CBM-179-25 con n.° de radicado ORFEO 202561204788762 del 31 de diciembre de 2025, remitió aprobación del plan de mejora presentado por el contratista, al cual se le realizó seguimiento durante el periodo.

Ahora bien, durante el mes de enero de 2026, la Interventoría evidenció retrasos en la ejecución del Plan de Mejora aprobado al Contratista. En consecuencia, se remitió un (1) requerimiento formal con el fin de que el Contratista expusiera las circunstancias que, a su juicio, soportan dichos retrasos y precisara su eventual responsabilidad.

Tabla 18. Requerimientos Planes de Mejora Contratista

n.°	Comunicado	Radicado ORFEO	Fecha	Referencia
1	SEM-CMC-CM25-188-26	202661200343622	28/01/2026	Presunto Incumplimiento Plan de Mejora – KR 61G X CL 67B SUR – CTO 2025-2781

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

A la fecha de corte del presente informe, la Interventoría se encuentra en espera de las respuestas por parte del contratista, con el propósito de determinar la atribución de los retrasos, ya sea al Consorcio Movilidad 2025 o a terceros.

De igual forma y con respecto a los atrasos presentados en la ejecución del cronograma de obra aprobado, la Interventoría mediante comunicado SEM-CMC-CM25-183-26 con n.° de radicado ORFEO 202600000018652 del 14 de enero de 2026, remitió requerimiento previo para veinte (20) intersecciones que a dicha fecha incumplieron actividades de entrega o de avances establecidas en el cronograma aprobado. Sobre el particular, la Interventoría solicitó al contratista cumplir con las obligaciones que se encontraban en mora, y explicar por escrito a la Interventoría y a la Secretaría Distrital de Movilidad, las razones y motivos fácticos y jurídicos por los cuales se presentaron los posibles incumplimientos. Al corte del presente informe, la Interventoría se encuentra a espera de la respuesta del contratista.

3.1.2.3. Mantenimientos

Tabla 19. Mantenimientos

n.°	EXT	Dirección	Actividad	Fecha de atención
1	3007	KR 1 X CL 87 C Sur	Se requiere realizar sondeo y de encontrarse taponamiento en ductería y cámara de paso realizar la respectiva limpieza	No atendido
2	3008	KR 1 X CL 90 Sur	Instalar tres (3) tapas antivandálicas y un (1) marco	29/09/2025
3	3783	TV 78N X CL 53 Sur	Instalación de una (1) tapa y un (1) marco	20/09/2025
4	3276	TV 85 X CL 57B Sur	Instalación de seis (6) tapas antivandálicas y cuatro (4) marcos	6/08/2025
5	3489	AK 86 X DG 49 S	Construcción de caja de paso GICE	19/11/2025


n.°	EXT	Dirección	Actividad	Fecha de atención
6	3082	KR 12B X CL 28C SUR	Suministro e instalación de GICE en la intersección	23/10/2025
7	3422	KR 19 X CL 10B Sur	Suministro de una (1) caja de paso de semaforización.	12/12/2025
8	3274	AK 10 X CL 4 S	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	23/12/2025
9	3051	KR 87 X DG 49 SUR	Suministro e instalación marco y tapa para Caja de paso del GICE	17/01/2026
10	3408	AK 86 X DG 49 SUR	Suministro e instalación de dos (2) marcos y cuatro (4) tapas para Caja de paso doble	No atendido
11	2027	KR 7 #14-78	Suministro e instalación de un (1) marco y una (1) tapa para caja de paso sencilla	No atendido
12	2031	KR 5 X CL 27	Suministro e instalación de un (1) marco y (1) tapa caja de paso sencilla	No atendido

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Los listados de formatos de seguimiento del contrato realizados por la Interventoría para el mes de enero de 2026 se adjuntan en el Anexo n.° 5 formatos de seguimiento.

Han transcurrido 278 días desde la fecha de suscripción del acta de inicio hasta el 31 enero de 2026 lo que equivale al 90.85% del plazo contractual. La siguiente gráfica muestra el avance de los trabajos con relación al avance presupuestal y el plazo de ejecución:

Ilustración 1. Avance de Trabajos con Relación al Avance Presupuestal

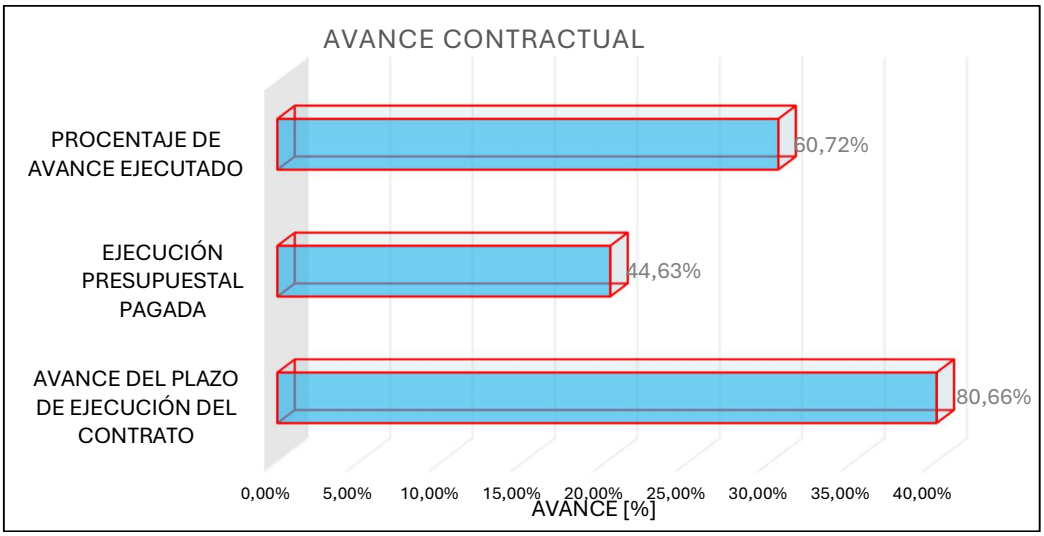

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

3.1.2.4. Cronograma

La Interventoría al 31 de enero de 2026 ha aprobado tres (3) cronogramas de contrato.

3.1.3. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la Interventoría

Las siguientes son las cantidades de obra ejecutadas por el Contratista durante el mes de enero del 2026.

Tabla 20. Relación cantidades de obra

Nº	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
I. ÍTEMS por disponibilidad mensual									
1	Implementación del plan de manejo de tráfico	12 ML	$16.513	$17.355	1,00	0,00	$ 16.513,00	$ 0,00	$ 16.513,00
2	Localización, verificación y replanteo	UN	$18.435	$19.375	16,00	11,00	$ 294.960,00	$ 213.125,00	$ 508.085,00
3	Limpieza de Caja de Paso	UN	$122.406	$128.649	-5,00	0,00	-$ 612.030,00	$ 0,00	-$ 612.030,00
4	Limpieza de Caja de Paso con riesgo biológico	UN	$165.068	$173.486	1,00	0,00	$ 165.068,00	$ 0,00	$ 165.068,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**-$ 135.489,00**	**$ 213.125,00**	**$ 77.636,00**
II. Demoliciones									
5	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3	$325.536	$342.138	2,78	7,42	$ 904.990,00	$ 2.538.664,00	$ 3.443.654,00
6	Demolición y construcción de losas de Concreto Hidráulico en calzada (MR-43KG/CM2 y espesor variable)	M3	$1.531.602	$1.609.714	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
7	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3	$297.609	$312.787	22,88	0,59	$ 6.809.294,00	$ 184.544,00	$ 6.993.838,00
8	Demolición de Sardinel Existente	ML	$38.765	$40.742	25,85	3,00	$ 1.002.075,00	$ 122.226,00	$ 1.124.301,00
9	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	M2	$44.829	$47.115	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
10	Demolición Placa Base de Caja de Paso	M3	$135.017	$141.903	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**$ 8.716.359,00**	**$ 2.845.434,00**	**$ 11.561.793,00**
III. Excavaciones									

Nº	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
11	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	M3	$241.421	$253.733	104,74	657,37	$ 25.286.436,00	$ 166.796.462,00	$ 192.082.898,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**$ 25.286.436,00**	**$ 166.796.462,00**	**$ 192.082.898,00**
IV. Transporte de escombros									
12	Transporte y Disposición final en el botadero autorizado por autoridad ambiental	M3	$103.301	$108.569	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
V. Suministro para redes									
13	Suministro e Instalación de dos (2) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3”) de diámetro	ML	$81.517	$85.674	23,98	0,00	$ 1.954.778,00	$ 0,00	$ 1.954.778,00
14	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3”) de diámetro	ML	$104.671	$110.009	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
15	Suministro e Instalación de cuatro (4) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3”) de diámetro	ML	$147.938	$155.483	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
16	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo DB de dos (2”) pulgadas de diámetro	ML	$32.249	$33.894	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
17	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3”) de diámetro	ML	$46.632	$49.010	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
18	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de cuatro pulgadas (4”) de diámetro	ML	$51.332	$53.950	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2”) Pulgadas de Diámetro	UN	$15.586	$16.381	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
20	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3”) Pulgadas de Diámetro	UN	$17.666	$18.567	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
21	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Cuatro (4”) Pulgadas de Diámetro	UN	$31.239	$32.832	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Nº	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**$ 1.954.778,00**	**$ 0,00**	**$ 1.954.778,00**
VI. Rellenos									
22	Suministro, Extendida y Compactación de Arena para base y Recubrimiento de Ductos	M3	$246.896	$259.488	1,87	0,00	$ 461.696,00	$ 0,00	$ 461.696,00
23	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3	$282.185	$296.576	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
24	Relleno Tipo Base Granular BG-1 INVIAS	M3	$329.308	$346.103	38,57	0,00	$ 12.701.410,00	$ 0,00	$ 12.701.410,00
25	Base Asfáltica Tipo MDC-1	M3	$1.562.616	$1.642.309	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
26	Rodadura Asfáltica Tipo MDC-3	M3	$1.595.313	$1.676.674	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
27	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	M3	$104.062	$109.369	2,43	0,00	$ 252.871,00	$ 0,00	$ 252.871,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**$ 13.415.977,00**	**$ 0,00**	**$ 13.415.977,00**
VII. Construcciones									
28	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)	M2	$145.648	$153.076	103,60	0,00	$ 15.089.133,00	$ 0,00	$ 15.089.133,00
29	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2)	M3	$1.147.361	$1.205.876	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
30	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico Pesado	M2	$228.584	$240.242	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
31	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico liviano	M2	$206.357	$216.881	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
32	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico Pesado	M2	$262.765	$276.166	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
33	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico liviano	M2	$268.080	$281.752	0,00	31,82	$ 0,00	$ 8.965.349,00	$ 8.965.349,00
34	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Tableta o Tablón de Gres o Similares	M2	$270.428	$284.220	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Nº	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
35	Construcción de Andén en Concreto y acabado en gravilla No, 2 (Piedra Mona)	M2	$378.174	$397.461	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
36	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Granito Pulido	M2	$383.055	$402.591	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
37	Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)	M2	$205.481	$215.961	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
38	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UN	$1.106.899	$1.163.351	0,00	1,00	$ 0,00	$ 1.163.351,00	$ 1.163.351,00
39	Construcción de Caja de Paso Doble , incluye marco y tapa	UN	$2.288.856	$2.405.588	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
40	Construcción de Caja de Paso para AUCE o GIC, incluye marco y tapa	UN	$1.730.407	$1.818.658	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
41	Construcción de Placa Base para Caja de Paso, en Concreto de Resistencia a la compresión (175 Kg/cm2),	M2	$246.948	$259.542	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
42	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2	$225.704	$237.215	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
43	Construcción de Pañetes	M2	$176.564	$185.569	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
44	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UN	$406.909	$427.661	1,00	0,00	$ 406.909,00	$ 0,00	$ 406.909,00
45	Suministro e instalación de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	$504.366	$530.089	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UN	$332.952	$349.933	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
47	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UN	$199.463	$209.636	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Nº	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
48	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador. con riesgo biológico	UN	$246.880	$259.471	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
49	Perforación dirigida	ML	$722.565	$759.416	41,18	0,00	$ 29.755.227,00	$ 0,00	$ 29.755.227,00
50	Perforación neumática	ML	$566.183	$595.058	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
51	Construcción Sardinel Monolítico	ML	$291.174	$306.024	10,04	0,00	$ 2.923.387,00	$ 0,00	$ 2.923.387,00
52	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	ML	$126.485	$132.936	118,78	67,28	$ 15.023.888,00	$ 8.943.934,00	$ 23.967.822,00
53	Empradización	M2	$53.888	$56.636	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
54	Construcción de Base para Poste Semafórico T1, T1X, T2 (L=2,50 metros A 6,50 metros)	UN	$1.090.309	$1.145.915	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
55	Construcción de Base para Poste Semafórico T2 (L=8,50 metros)	UN	$2.390.493	$2.512.408	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
56	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T1, T2 y T6	UN	$1.106.004	$1.162.410	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
57	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T3	UN	$1.224.631	$1.287.087	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
58	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T4 y T5	UN	$1.270.178	$1.334.957	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
59	Suministro e Instalación de Tubo Galvanizado de 2" x 6 m para la Bajante de la Acometida Eléctrica	UN	$498.254	$523.665	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
60	Suministro e Instalación de Bolardo en concreto tipo M60	UN	$281.207	$295.549	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
61	Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63	UN	$318.005	$334.223	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Nº	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
62	Concreto Armado para muro de contención de resistencia a la compresión de doscientos diez kilogramos por centimetro cuadrado (210Kg/cm2 - Veintiocho (28) días de freguado)	M3	$1.325.730	$1.393.342	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
63	Rehabilitación de andén en adoquín de arcilla tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	$133.310	$140.109	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
64	Rehabilitación de andén en adoquín de concreto tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	$162.452	$170.737	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
65	Rehabilitación piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06), con materiales del sitio	M2	$123.211	$129.495	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
66	Suministro e instación de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	$38.551.049	$40.517.152	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
67	Suministro de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	$37.614.323	$39.532.653	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
68	Suministro e instalación de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE.	UN	$565.871	$594.730	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
69	Suministro (Entrega en sitio) de losa de concreto pefabricada para base de AUCE o GICE	UN	$524.307	$551.047	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Nº	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
70	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	UN	$498.556	$523.982	-5,00	0,00	-$ 2.492.780,00	$ 0,00	-$ 2.492.780,00
71	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso doble	UN	$648.920	$682.015	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UN	$470.979	$494.999	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
73	Suministro (Entrega en sitio) de marco rectangular para caja de paso sencilla	UN	$352.607	$370.590	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
74	Suministro (Entrega en sitio) de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	$410.633	$431.575	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
75	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso de 10 cm de espesor	UN	$406.530	$427.263	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**$ $ 60.705.764,00**	**$ 19.072.634,00**	**$ 79.778.398,00**
VIII. Ensayos de Laboratorio									
76	Ensayo de compactación	UN	$213.276	$224.153	1,00	0,00	$ 213.276,00	$ 0,00	$ 213.276,00
77	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN	$48.830	$51.320	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
78	Ensayo Granulometría de agregados	UN	$142.744	$150.024	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**$ 213.276,00**	**$ 0,00**	**$ 213.276,00**
IX. Transportes									
79	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES	$14.472.684	$15.210.791	0,00	2,00	$ 0,00	$ 30.421.582,00	$ 30.421.582,00
80	Camion tipo grúa cabina sencilla para el traslado y movimiento de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	HR	$420.776	$442.236	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			**$ 0,00**	**$ 30.421.582,00**	**$ 30.421.582,00**
X. Personal									
81	Personal Profesional Técnico y Administrativo	MES	$36.666.871	$38.536.881	0,00	1,00	$ 0,00	$ 38.536.881,00	$ 38.536.881,00
82	Personal Técnico de Obra	MES	$11.623.094	$12.215.872	0,00	1,00	$ 0,00	$ 12.215.872,00	$ 12.215.872,00
			Subtotal 2025	Subtotal 2026			$ 0,00	**$ 50.752.753,00**	**$ 50.752.753,00**
			TOTAL 2025	TOTAL 2026					

Nº	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO 2025	VALOR UNITARIO 2026	CANTIDAD 2025	CANTIDAD 2026	VALOR TOTAL 2025	VALOR TOTAL 2026	VALOR TOTAL
SUBTOTAL OBRAS CIVILES							**$ 110.157.101,00**	**$ 270.101.990,00**	**$ 380.259.091,00**

Fuente: Informe mes de enero del Contratista

3.1.4. Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito

Tabla 21. Seguimiento PMT Generales enero 2026

ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	ESTADO PMT general	COI - APROBADO	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
1168	3873	AK 80 X CL 40 C SUR	KENNEDY	Aprobado por SDM	5	29/01/2026	30-ene-26	28-feb-26

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22. Seguimiento PMT específicos vigentes enero 2026

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	n.° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO PMT específico	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
Nueva	1919	3119	KR 61G X CL 67B Sur	TUNJUELITO	2/01/2026	2026612000008552	2/01/2026	Aprobado por SDM - PRORROGA N° 1	5	29/01/2026	30-ene-26	26-feb-26
Complemento	867	3816	KR 72 J X CL 45 Sur	KENNEDY	20/01/2026	2026612002051132	21/01/2026	Aprobado por SDM PRORROGA N° 1	5	29/01/2026	6-feb-26	26-feb-26
Complemento	969	3690	KR 14 X CL 2 SUR	ANTONIO NARIÑO	18/12/2025	2025612046049772	19/12/2025	Aprobado por SDM	4	22/01/2026	23-ene-26	26-feb-26
Nueva	1900	3928	KR 46A X CL 68 Sur	CIUDAD BOLIVAR	2/01/2026	2025612044080872 2026612000008612	2/01/2026	Aprobado por SDM PRORROGA N° 2	3	15/01/2026	16-ene-26	26-feb-26
Nueva	1920	3120	KR 24 X CL 18 Sur	ANTONIO NARIÑO	20/11/2025	2025612042035742	20/11/2025	Aprobado por SDM	52	26/12/2025	27-dic-25	26-feb-26
Complemento	879	3477	AK 80 G X DG 3	KENNEDY	6/11/2025	2025612041042742	13/11/2025	Aprobado por SDM	51	18/12/2025	19-dic-25	26-feb-26

Fuente: Elaboración propia

La relación completa y trazabilidad de los PMT se encuentra en el informe de Tránsito del presente mes.

3.1.5. Registro fotográfico georreferenciado

Durante el mes de enero de 2026, se realizaron actividades tales como construcción de cajas de paso sencilla y doble, demoliciones, excavaciones, rellenos, bases para poste, las cuales se presentan en el siguiente registro fotográfico:

Tabla 23. Registro fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL 2025-2781	
 Visita a intersección nueva EXT 3119	 Visita a complementos EXT 3477
 Visita a intersección nueva EXT 3928	 Visita a complementos EXT 3816
 Visita a intersección nueva EXT 3121	 Visita a complementos EXT 3873

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

La relación completa de las fotografías se encuentra en el Anexo n.° 10 Registro fotográfico.

3.1.6. Controles de calidad

Durante el mes correspondiente al presente informe, se realizaron ensayos de laboratorio (concreto) y materiales granulares; el análisis de cumplimiento de estos se encuentra descrito en el numeral.

3.1.7. Planes de contingencia elaborados por el Contratista

A la fecha, el contrato se desarrolló con normalidad, por tanto, no se ha requerido el diseño e implementación de planes de contingencia. No obstante~~,~~ lo anterior, y dados los compromisos adquiridos por la Secretaría Distrital de Movilidad a nivel de Distrito, se recomendó al Contratista establecer una ruta crítica para cumplir con las metas establecidas mediante Acta Comité de Seguimiento n.° 9 al Contrato 2025-2781 CM25.

3.1.8. Medidas correctivas exigidas por la Interventoría Calidad

A partir de los hallazgos declarados por la Interventoría para el periodo, la Interventoría exigió las medidas correctivas para la eliminación de la causa raíz de estas no conformidades inherentes a los componentes de seguridad y salud en el trabajo, así como componente ambiental. El detalle de esta información podrá ser consultado en el informe transversal de interventoría n.° 10.
Como información complementaria se listan las fuentes donde se pueden consultar los hallazgos por componente:

- SST y Ambiental: Fuente reporte SST Interventoría (Anexo Informe SST del Contratista)

3.1.9. Relación de los resultados y análisis de laboratorio y de campo

La Interventoría realizó la verificación de los ensayos de laboratorio utilizados en la obra, conforme a la documentación soporte anexa presentada por el Contratista. Dicha revisión incluyó el análisis de los resultados de resistencia a la compresión, así como la validación de los certificados y registros correspondientes, con el fin de constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la normatividad aplicable.

3.1.10. Seguimiento del plan de calidad del Contratista


Durante el periodo se realizó la verificación de los factores de calidad correspondientes:

- Cumplimiento de objetivos e indicadores de calidad
- Control de la información documentada,
- Procesos, productos y servicios proporcionados externamente,

- Producción, provisión y conformidad de los productos y servicios,
- Seguimiento y medición y e) mejora continua.

A continuación, se presenta el avance de cada de los factores de calidad evaluados para el periodo.

Ilustración 2. Nivel de cumplimiento factores de calidad factores plan de calidad evaluados para contrato n.° 2025-2781 durante el periodo de enero del 2025

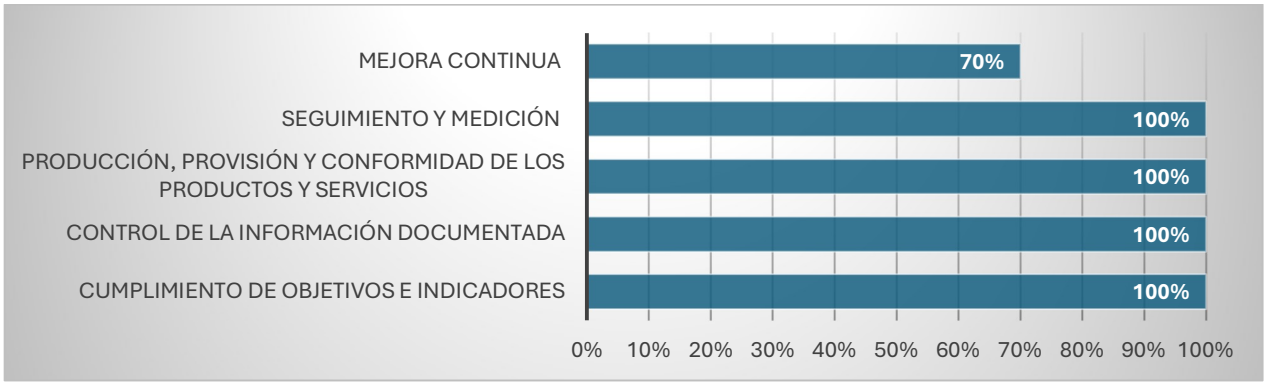

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Dado lo anterior se emiten las siguientes conclusiones:

- El nivel de cumplimiento del plan de calidad del contratista Consorcio Movilidad 2025 es del noventa y cuatro por ciento (94%), presentando una mejora respecto al periodo anterior en la cual reportó un nivel del cumplimiento del noventa por ciento (90%).

- Respecto la medición del nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad a través de indicadores se concluye que el contratista Consorcio Movilidad 2025 cumple con las disposiciones establecidas en el plan de calidad. A partir del análisis de los resultados de indicadores se confirma el cumplimiento y mejora del contratista respecto al objetivo de calidad correspondientes al cumplimiento de especificaciones técnicas.

- El contratista Consorcio Movilidad 2025 cumple con los requisitos y controles establecidos en el plan de calidad, respecto a la información documentada (formatos).

- Respecto al factor de producción, provisión y conformidad de los productos y servicios, se continúa con el desarrollo de las medidas exigidas por la interventoría respecto a la programación y socialización semanal de actividades, acción que contribuye a la articulación entre las partes, mayor efectividad de los controles operacionales, mejoras en la coordinación y disponibilidad de recursos y mayor aseguramiento para el cumplimiento de especificaciones de los productos y/o servicios.

- Durante el periodo de enero el contratista Consorcio Movilidad 2025 logro un avance del 70% en desarrollo de los planes de acción trazados para tratamiento de hallazgos con acciones correctivas que presentaron reincidencias nuevamente. La cuantificación de este porcentaje se realizó mediante el seguimiento por parte de la interventoría en los frentes de SST, Ambiental y Calidad de la ejecución de las actividades establecidas para la eliminación de la causa raíz y reformulación de los planes de acción. Igualmente, mediante mesas de trabajo se realizó el seguimiento de los avances del contratista y la efectividad de las acciones.

3.1.11. Relación de productos no conformes

Durante el mes no se presentaron productos no conformes.

3.1.12. Recomendaciones, observaciones y conclusiones

3.1.12.1. Recomendaciones y observaciones

- La interventoría hace revisión permanente de las Obras civiles, e identifica la necesidad de ajustes respecto a los planos de semaforización en las intersecciones en ejecución durante el mes enero de 2026, como lo fue en la KR 61G X CL 67B SUR, KR 72J X CL 45 SUR. En consecuencia, se realizó acompañamiento durante las inspecciones en campo y se dejó constancia en la bitácora de obra de lo identificado en tiempo real con el Contratista, todos los cambios requeridos en terreno antes de su implementación deben remitirse mediante justificaciones técnicas.

- La Interventoría radicó Requerimiento Previo de Cronograma al contrato 2025-2781 con el oficio SEM-CMC-CM25-183-25 con n.° de radicado ORFEO 202661200149772 del 14 de enero de 2026; al cual el Contratista da respuesta con oficio WEXT-2025-2781-204 con n.° de radicado ORFEO 202600000042622 del 29 de enero de 2026, el cual está en revisión de la Interventoría.

- La Interventoría radicó Presunto Incumplimiento Plan de Mejora – KR 61G X CL 67B SUR con el oficio WEXT-2025-2781-188 con n.° de radicado ORFEO 202661200343622 del 28 de enero de 2026, donde se solicita al Contratista las razones y motivos fácticos y jurídicos por los cuales se está presentando el posible incumplimiento. Al corte del presente informe la Interventoría está a la espera de la respuesta del contratista.

3.1.12.2. Acciones y/o Conclusiones

- Mediante oficio SEM-CMC-CM25-184-25 con n.° de radicado ORFEO 202661200179482 del 16 de enero de 2026, la Interventoría da visto bueno a la respuesta frente al

requerimiento previo realizado por no cumplimiento de fechas de actividades en el cronograma en el frente de Obra identificado con EXT 2393 – KR 72 X CL 9.

- De acuerdo con las verificaciones realizadas en terreno (Ver *Anexo n.° 5. Formatos de seguimiento de la Interventoría*) se identificaron cinco (05) hallazgos en el periodo, registrado en el Anexo n.° 20. Al corte del presente informe se encuentra cerrado un (1) hallazgo.

3.2. Seguimiento administrativo

3.2.1. Verificación de requisitos mínimos

Se realiza revisión de las obligaciones generales y específicas según la cláusula 9 y 10 del anexo 5 de la minuta del contrato. A la fecha de la elaboración del presente informe se verifica el cumplimiento de cada una de estas obligaciones, aclarando que no hay atrasos en la ejecución.

La siguiente es la relación de hojas de vida presentadas por el Contratista durante el mes de enero del 2026.

Tabla 24. Hoja de vida presentadas por el Contratista durante el periodo de enero de 2026

n.°	Cargo	Cantidad	Concepto Aprobadas	Concepto No Aprobadas	Comunicado Interventoría	Radicado SDM
1	Ayudante de obra	12	11	01	---	---
2	Oficial de obra	01	01	00	---	---
Totales		13	12	01		

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

En el *Anexo n.° 18. Relación de personal aprobado al Contratista*, se encuentra la relación del personal aprobado desde el mes de mayo de 2025 al mes de enero de 2026.

3.2.2. Informes presentados por el Contratista

Se relacionan los informes presentados por el Contratista hasta el presente mes de enero.

Tabla 25. Informes básicos Contratista

Informe n.°	Periodo	Fecha a entrega a Interventoría	Estado	COMUNICADO INTERVENTORIA	Radicado SDM	Observaciones
1	29 al 30 de abril (v2)	05/06/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-018-25	202561201988022	No Aplica
2	01 al 31 de mayo (v4)	14/07/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-039-25	202561202444742	No Aplica
3	01 al 30 de junio (v3)	01/08/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-054-25	202561202783672	No aplica

Informe n.°	Periodo	Fecha a entrega a Interventoría	Estado	COMUNICADO INTERVENTORIA	Radicado SDM	Observaciones
4	01 al 31 de julio	08/08/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-074-25	202561203288482	No aplica
5	01 al 31 de agosto	05/09/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-109-25	202561203710682	No Aplica
6	01 al 30 de septiembre	07/10/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-139-25	202561204168442	No Aplica
7	01 al 31 de octubre	07/11/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-156-25	202561204365562	No Aplica
8	01 al 30 de noviembre	01/12/2025	Aprobado	SEM-CMC-CM25-163-25	202561204507402	No Aplica
9	1 al 31 de diciembre	07/01/2026	En revisión	---	---	---

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

3.2.3. Recursos utilizados por el Contratista

3.2.3.1. Verificación del cumplimiento de la obligación de destinar mano de obra no calificada

A la fecha de elaboración de este informe, se tienen 76 personas en total del contrato las cuales 31 cuentan como mano de obra no calificada contratada.

Tabla 26. Obra de mano no calificada

PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA	Cantidad	%
Total	76	100
Activos	39	51.32
Mujeres	01	2.56

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

3.2.3.2. Personal

La siguiente es la relación del personal administrativo y de apoyo aprobado al Contratista al corte del presente informe.

Tabla 27. Personal administrativo y de apoyo

n.°	Cargo	Nombre
1	Ayudante de obra	Humberto Rojas
2	Ayudante de obra	Alexander Galvis
3	Ayudante de obra	Juan Stiven González
4	Ayudante de obra	Fredy Otavo
5	Ayudante de obra	Jairo Peña
6	Ayudante de obra	Edimer Rodríguez
7	Ayudante de obra	Alberto Rudas

n.°	Cargo	Nombre
8	Ayudante de obra	José de Jesús Medina
9	Ayudante de obra	Isrrael Viasus
10	Ayudante de obra	José Arenas
11	Oficial de obra	Roberth Ariza
12	Ayudante de obra	Jesús Pérez

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

3.2.3.3 Maquinaria, herramientas y equipos

En el anexo 21 se relaciona la maquinaria, herramientas y equipos presentados a la fecha y su estado, para el periodo de enero no se evaluó maquinaria.

3.2.3.4 Transporte

A corte del 31 de enero de 2026, en Contratista ha presentado los siguientes medios de transporte, de los cuales no se cuenta con ingresos de vehículos, y sigue pendiente el de Traslado e izaje de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles:

Tabla 28. Transporte

Uso	Placa	Carrocería	Cilindraje	Modelo	Organismos de tránsito	Aprobación	Radicado SDM
Traslado personal administrativo	JKZ914	Doble cabina	1997 CC	2020	Bogotá D.C.	Aprobado SEM-CMC-CM25-026-25	202561202097632
Traslado materiales y equipos.	KYP683	Furgón	2746 CC	2022	Bogotá D.C.	Aprobado SEM-CMC-CM25-026-25	202561202097632
Traslado materiales y equipos.	JKU690	Furgón	2746 CC	2021	Bogotá D.C.	Aprobado SEM-CMC-CM25-026-25	202561202097632
Traslado e izaje de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	JKU049	Plataforma	7790	2020	Cota Cundinamarca	No Aprobada	-

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

3.2.4. Verificación de cumplimiento de Condiciones que generaron puntaje adicional- Puntaje por: i) vinculación de personas en condición de discapacidad, ii) Puntaje de industria nacional y iii) factor de calidad.

Dando cumplimiento al CAPITULO IV de los pliegos tipos se verifica que se mantenga la condiciones que otorgaron puntaje durante el proceso de selección al Contratista adjudicatario que ejecuta el contrato 2025-2781.

Para el presente periodo del contrato 2025-2781, la Interventoría verificó los aspectos que otorgaron puntaje adicional al Contratista Consorcio Movilidad 2025.

3.2.4.1. Factor de calidad

Según la información publicada en la oferta del Contratista en el marco del Proceso de Contratación SDM-LP-001-2025, se identifica la presentación del formato 7C – Plan de Calidad, mediante el cual el Contratista se compromete a elaborar y presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto.

En cumplimiento de dicho compromiso, el Contratista radicó el Plan de Calidad en el mes de Septiembre, al cual se le realiza seguimiento constante por parte de Interventoría.

3.2.4.2. Puntaje de industria nacional

El Contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de servicios nacionales o con trato nacional. Indicando en el formato 9 de la oferta:

> "*Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%) del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato."*

Se ha verificado que se ha destinado un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%), del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato. De esta manera, el personal vinculado cumple de acuerdo con la siguiente manera:

Tabla 29. Puntaje de Industria Nacional

CANTIDAD TOTAL DE EMPLEADOS	CANTIDAD DE COLOMBIANOS	CANTIDAD DE EXTRANJEROS	% CUMPLIMIENTO
76	70	06	92.11

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

El Contratista para el periodo de enero de 2025 presentó la relación del personal contratado, mediante declaración y la certificación de cada empleado.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.2.4.3. Vinculación de personas en condición de discapacidad

El Contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por el puntaje por vinculación de personas con discapacidad, contando con un número de trabajadores con discapacidad con por lo menos un año de vinculación o desde el momento de la Constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un año acreditados con certificación de aportes a seguridad social, destinando un porcentaje del (2,44%) del total del personal para el cumplimiento del contrato. De esta manera, el personal vinculado cumple de acuerdo con la siguiente información:

Tabla 30. Vinculación de personas con discapacidad

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	% CUMPLIMIENTO
76	1	1.32

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

De conformidad con la vigencia del certificado expedido por el Ministerio de trabajo, de seis (6) meses a partir de la fecha de expedición 04 de septiembre 2025.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.2.4.5. Emprendimientos y empresas de mujeres

El Contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por emprendimientos y empresas de mujeres, acreditando la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, acogiendo a "***Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año.***" Por tanto, para el presente periodo, el Contratista cuenta con por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Certificando que son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.2.4.6. MIPYME

El Contratista Consorcio Movilidad 2025 presentó ofrecimiento optando por el puntaje por MIPYME domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya, para ello, el Contratista, tratándose de contratistas plurales, el puntaje fue otorgado si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio Movilidad 2025.

La Interventoría verificó el documento RUP con fecha de expedición del 08 de enero de 2026.

La certificación del cumplimiento de este puntaje se puede verificar en el **Anexo 19. Aspectos que otorgan puntaje.**

3.3 Seguimiento financiero

Los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y de registro presupuestal (CRP), del contrato n.° 2025-2781, se muestran a continuación:

Tabla 31. Disponibilidad y reserva presupuestal del contrato (2025-2781)

ÍTEM	n.°	FECHA	VALOR
CDP	106	01/2025	$38.800.000.000
CRP	2417	21/04/2025	$ 5.141.951.324
VALOR DEL CONTRATO			$5.141.951.324
RUBRO CDP	O2301172409202412708059		
RUBRO CRP	O230117240920240127		

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

Tabla 32. Presupuesto del Contrato 2025-2781

Periodo	Valor Del Corte	Valor Rete garantía	Valor Por Pagar	Valor Ejecutado Acumulado	Valor Pagado Acumulado	Crp´S	Saldo Crp´S	Saldo Por Ejecutar	Fecha De Radicación CMC	n.° De Documento Contable	Fecha De Estado De Pago	Fecha Del Acta De Recibo Parcial
1/05/2025 al 31/05/2025	$35.153.420	$1.757.671	$33.395.749	$35.153.420	$ 33.395.749	2417	$5.108.555.575	$5.106.797.904	11/08/2025	3000792965	22/08/2025	6/08/2025
1/06/2025 al 30/06/2025	$47.999.156	$2.399.958	$45.599.198	$83.152.576	$ 78.994.947	2417	$5.062.956.377	$5.058.798.748	11/08/2025	3000822224	14/08/2025	6/08/2025
1/07/2025 al 31/07/2025	$488.821.931	$24.441.097	$464.380.834	$571.974.507	$ 543.375.781	2417	$4.598.575.543	$4.569.976.817	10/09/2025	3000973224	22/09/2025	4/09/2025
1/08/2025 al 31/08/2025	$521.542.988	$26.077.150	$495.465.838	$1.093.517.495	$1.038.841.619	2417	$4.103.109.705	$4.048.433.829	8/10/2025	3001100296	22/10/2025	6/10/2025
1/09/2025 al 30/09/2025	$454.179.498	$22.708.975	$431.470.523	$1.547.696.993	$1.470.312.142	2417	$3.671.939.182	$3.594.254.331	11/11/2025	3001230826	24/11/2025	6/11/2025
1/10/2025 al 31/10/2025	$566.692.824	$28.334.641	$538.358.183	$2.114.389.817	$2.008.670.325	2417	$3.133.280.999	$3.027.561.507	9/12/2025	3001354718	17/12/2025	2/12/2025
1/11/2025 al 30/11/2025	$301.453.692	$15.072.685	$286.381.007	$2.415.843.509	$2.295.051.332	2417	$2.846.899.992	$2.726.107.815	11/12/2025	3001369607	19/12/2025	10/12/2025

1/12/2025 al 31/12/2025	$706.533.679	$35.326.684	$671.206.995	$3.122.377.188		2417	$2.175.692.997	$2.019.574.136				
TOTALES	**$3.122.377.188**	**$156.118.861**	**$2.966.258.327**									

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

Tabla 33. Balance Financiero 2025-2781

Ítem	Descripción	Valor
A	Valor inicial del contrato	$ 5.141.951.324
B	Total, adiciones al contrato	$ 0
C	Valor total del contrato	$ 5.141.951.324
D	Valor pagado al Contratista	$ 2.295.051.332
E	Retención en garantía acumulada, de pagos realizados	$ 120.792.177
F	Valor total ejecutado	$ 3.122.377.188
G	**Valor por ejecutar del contrato (A- F)**	**$ 2.175.692.997**

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

- Seguimiento del PAC: El comportamiento del PAC en los períodos analizados evidencia una tendencia fluctuante. En particular, para las cuentas correspondiente a septiembre, octubre y noviembre de 2025, el nivel de cumplimiento es inferior al 61,00%, lo cual refleja una disminución en la ejecución de pagos frente al valor programado en el PAC, para las cuentas de agosto y diciembre de 2025, obtuvo un cumplimiento del 82,58% y 73,57%.


Tabla 34. Programación PAC CTO n.° 2025-2781

Período programación PAC	Cuentas de	Valor Programado	Valor por pagar	Diferencia	% de ejecución PAC
octubre 2025	agosto 2025	$600.000.000	$495.465.838	$104.534.162	82,58%
noviembre 2025	septiembre 2025	$835.892.343	$431.470.523	$404.421.820	51,62%
diciembre 2025	octubre 2025	$888.021.363	$538.358.183	$349.663.180	60,62%
	noviembre 2025	$600.000.000	$286.381.007	$313.618.993	47,73%
febrero 2026	diciembre 2025	$912.289.000	$671.206.995	$241.082.005	73,57%
marzo 2026	enero 2026	$799.500.000			
Total		$4.635.702.706	$3.222.382.546	$1.413.320.160	

Fuente: Documentos y Anexos del Contrato

Así mismo se relaciona el seguimiento de la ejecución presupuestal respecto a la proyección del PAC, así:

Ilustración 3. Ejecución presupuestal vs PAC programado Cto. 2025-2781

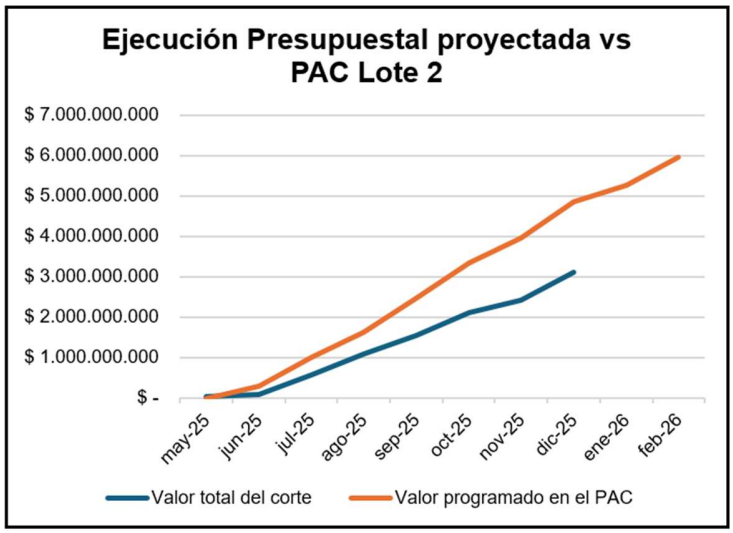

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

- Certificación de Revisor Fiscal o Contador Público: Se evidenció que el contratista remitió la certificación en referencia, en la cuenta del período de diciembre 2025.

3.4 Seguimiento jurídico

3.4.1 Resumen de garantías del contrato

- **Pólizas:** La Interventoría procedió a verificar el estado de las garantías contractuales constituidas, constatando que las pólizas se encuentran debidamente aprobadas y vigentes conforme a lo dispuesto en el contrato. No obstante, en el evento en que se apruebe la prórroga del plazo contractual, dichas garantías deberán ser ajustadas en su vigencia para amparar de manera continua el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el nuevo término de ejecución, así como los periodos adicionales que resulten exigibles según la naturaleza de cada amparo.

- Prórroga~~Prorroga~~ El Contratista presentó solicitud de prórroga del plazo contractual mediante el comunicado n.° WEXT-2025-2781-203.1, radicado en el sistema ORFEO bajo el n.° 202600000044132 del 29 de enero de 2026, mediante el cual solicitó la ampliación del término de ejecución por dos (2) meses, con el fin de culminar en su integridad las obras correspondientes a diez (10) intersecciones objeto del contrato.

Al corte del presente informe, la Interventoría se encuentra realizando análisis de las razones entregadas por el Contratista, con el fin de determinar que se cumpla con lo definido tanto

en el manual de contratación de la SDM vigente, así como en lo establecido en la Ley 80 de 1993, es decir:

> *"… La prórroga del plazo de un contrato, no puede fundamentarse en la mora de las partes por motivos de su propia culpa o negligencia; deberá obedecer a razones ajenas a la voluntad de las mismas o producto de la actividad de un tercero. De igual manera, al prorrogarse el contrato deberá examinarse si el mayor plazo de ejecución prevé un mayor valor del mismo, caso en el cual, la o el Ordenador del Gasto deberá acompañar la solicitud de prórroga con la de adición del contrato junto con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP, así como la solicitud a la Dirección de Contratación de su viabilidad jurídica, previa justificación remitida por la o el supervisor o la o el interventor y aceptación de la persona contratista. La solicitud deberá remitirse a la Dirección de Contratación, con diez (10) días hábiles de antelación al plazo o término previsto para aplicar la correspondiente modificación."*

- Desde el componente de gestión jurídica, se acompañó de manera transversal las gestiones desarrolladas en el marco de los demás componentes del contrato de Interventoría, con el propósito de asegurar un análisis integral y coordinado de los distintos aspectos contractuales durante la ejecución del contrato.

3.4.2 Verificación de pagos y aportes a seguridad social y parafiscal

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Interventoría en el marco del seguimiento y control al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, y conforme a lo establecido en el Contrato de Obra n.° 2025-2781, así como en la normativa vigente en materia de riesgos laborales, se informa que durante el periodo reportado se realizaron las verificaciones documentales correspondientes al informe de gestión presentado por el Contratista.

La verificación incluyó los soportes las personas vinculadas al proyecto, evidenciándose el cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos en materia de vinculación laboral, pagos salariales, afiliaciones al sistema de seguridad social integral, certificados de aptitud médica y demás documentos exigidos.

El detalle de la revisión de seguridad social se encuentra en el informe de gestión de septiembre de SST (Transversales).

3.5 Relación de actas suscritas durante el periodo objeto de Interventoría

A continuación, se presenta el detalle de las sesiones realizadas durante el periodo con su respectivo registro documental. En el *Anexo n.° 9 Copia de actas desarrolladas en el periodo. (Comité y reuniones)*, se relacionan las suscritas por esta Interventoría en el presente periodo.

Tabla 35. Relación de actas suscritas durante el periodo

n.° Acta	Tipo	Fecha	Tema Principal
8	Acta Comité de Obra	15/01/2026	Acta Comité de Obra n.° 8 al Contrato 2025-2781 (Quincenal)
10	Acta Comité de Seguimiento	28/01/2026	Acta Comité de Seguimiento n.° 10 al Contrato 2025-2781 (Mensual)
-	Acta de Replanteo	19/01/2026	Carrera 80G x dg 3 sur
26	Visita a Campo	06/01/2026	Revisión recibo final de obra – TV 60 X DG 70 Sur
27	Visita a Campo	07/01/2026	Seguimiento avance contrato 2781
28	Visita a Campo	09/01/2026	Entrega de llaves GICE

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

3.6 Relación de correspondencia enviada y recibida relacionadas con el Contratista

Durante el periodo se tiene registro de la siguiente correspondencia:

Tabla 36. Correspondencia Recibida

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado Contratista	Radicado Movilidad
1	07 de Enero de 2026	Informe Mensual n.° 9 V1 del Mes de Diciembre de 2025.	CM25	WEXT-2025-2781-192	20266120006646 2
2	07 de Enero de 2026	Informe Mensual n.° 8 V1 del Mes de Diciembre de 2025 - SSTMA	CM25	WEXT-2025-2781-193	20266120006659 2
3	09 de Enero de 2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-087-25	CM25	WEXT-2025-2781-194	20266120009003 2
4	09 de Enero de 2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-175-25	CM25	WEXT-2025-2781-195	20266120009039 2
5	09 de Enero de 2026	Respuesta comunicado SEM-CMC-CM25-180-25	CM25	WEXT-2025-2781-196	20266120009053 2
6	09 de Enero de 2026	Presentación del Subcontratista GYG INGENIEROS ASOCIADOS	CM25	WEXT-2025-2781-197	20266120009773 2
7	9 de Enero de 2026	Plan de choque complemento del contrato	CM25	WEXT-2025-2781-198	Pendiente
8	14 de Enero de 2026	NO PREVISTO NP 1 Tubo galvanizado de 3 pulgadas	CM25	WEXT-2025-2781-199	20260000001914 2
9	18 de Enero de 2026	Respuesta comunicada SEM-CMC-CM25-182-25	CM25	WEXT-2025-2781-200	20260000002571 2
10	18 de Enero de 2026	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles – CDJ GROUP SAS.	CM25	WEXT-2025-2781-201	20260000002602 2
11	24 de Enero de 2026	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles – JVM GROUP SAS.	CM25	WEXT-2025-2781-202	20260000003446 2
12	28 de Enero de 2026	Solicitud de extensión del plazo de ejecución	CM25	WEXT-2025-2781-203	20266120036277 2

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 37. Correspondencia Enviada

Ítem	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Radicado Interventoría	Radicado movilidad
1	02 de Enero de 2026	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 29 diciembre 2025 al 02 de enero de 2026	CMC	SEM-CMC-CM25-180-25	202661200008562
2	07 de Enero de 2026	Certificado de manejo de RCD.	CMC	SEM-CMC-CM25-181-26	202661200060402
3	13 de Enero de 2026	Reporte hallazgos SST y Ambientales semana del 05 de enero al 09 de enero de 2026	CMC	SEM-CMC-CM25-182-26	202661200123662
4	14 de Enero de 2026	Requerimiento Previo 20 Intersecciones –Cronograma CTO 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-183-26	202661200149772
5	16 de Enero de 2026	Respuesta a WEXT-2025-2781-182 asociado a Requerimiento Previo Programación de obra EXT 2393 KR 72 X CL 9 – Contrato 2025-2781.	CMC	SEM-CMC-CM25-184-26	202661200179482
6	16 de Enero de 2026	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 13 de enero al 16 de enero de 2026	CMC	SEM-CMC-CM25-185-26	202600000024642
7	23 de Enero de 2026	Respuesta al comunicado WEXT-2025-2781-201. Presentación de personal operativo para actividades de obras civiles - CDJ GROUP SAS	CMC	SEM-CMC-CM25-186-26	202661200290352
8	23 de Enero de 2026	Reporte hallazgos SST Y Ambientales semana del 19 de enero al 23 de enero de 2026	CMC	SEM-CMC-CM25-187-26	202600000033602
9	28 de Enero de 2026	Presunto Incumplimiento Plan de Mejora – KR 61G X CL 67B SUR – CTO 2025-2781	CMC	SEM-CMC-CM25-188-26	202661200343622

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

NOTA: Para el presente periodo las comunicaciones enviadas y recibidas fueron notificadas mediante comunicación oficial.

Tabla 38. Correspondencia enviada al Contratista mediante correo electrónico

n.°	Fecha enviada	Asunto
1	02/01/2026	Acta n.° 19 - GICE
2	02/01/2026	Visita KR 80 X CL 38C Sur- Observaciones en campo
3	02/01/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web
4	02/01/2026	Recibo final obras - Cto 2781
5	02/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-186 - 2025-12-27 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-160-25.
6	02/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-187 - 2025-12-27 Hallazgos comunicado SEM-CMC-CM25-164-25
7	02/01/2026	RESPUESTA OFICIO SEM-CMC-CM25-176-25, PLAN DE CHOQUE
8	02/01/2026	REPORTE DECRETO 332
9	02/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-165 - Presentación Hoja de vida Nuevo Residente de Obra
10	02/01/2026	SEM-CMC-SDM-137-25 Radicación de Correspondencia

n.°	Fecha enviada	Asunto
11	05/01/2026	3ra Revisión laboratorios
12	05/01/2026	Entrega de recibo de pago de la retención del impuesto de timbre del contrato 2025-2781 Plazo máximo jueves 01 de diciembre de 2025
13	06/01/2026	Reunión Presencial CM25
14	06/01/2026	RE: Acta no. 26 - Recibo Sierra Morena
15	06/01/2026	RE: REMISIÓN OBSERVACIONES DE SDM AL PMT - RAD. SDM- 202561204746112 - 202561204767122 – CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO. 2025-2781
16	06/01/2026	RE: REMISIÓN OBSERVACIONES DE SDM V1 (COI) AL PMT - RAD - 202561204746002 - KR 13 CON CL 33 - CTO. 2025-2781
17	07/01/2026	RV: Atención de OBSERVACIONES a SDM Radicado - 202561203967742– CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO. 2025-2781 - PMT-EXT_3273 ID_930 KR 79C X CL 63 Sur
18	07/01/2026	RE: Observaciones de Interventoría - PMT EMERGENCIA KENNEDY - EXT_3489 ID_1339 AK 86 x Dg 49 Sur - CTO. 2025-2781
19	07/01/2026	RV: Atención prioritaria Estado de avance intersección Isla del Sol
20	07/01/2026	Tema IDPC / PMT complemento intersecciones KR 16 y KR 17 X CL 22
21	07/01/2026	SEM-CMC-CM25-181-26 Radicación de Correspondencia
22	07/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT - EXT_2301 ID 1202 - KR 16 X CL 22 - CTO.2025-2781
23	07/01/2026	VALORIZACIONES CONTRATO 2025-2781
24	07/01/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web
25	07/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT - EXT_3916 ID_936 y 937 - TV 78L X CL 68A Sur Y CL 68 Sur - CTO.2025-2781
26	08/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT - EXT_3679 ID_1104 - KR 19C X ENTRADA PORTAL TUNAL - CTO. 2025-2781
27	08/01/2026	Acta 07 de enero
28	08/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT de Complemento - EXT_3388 ID_1017 - KR 19 x CL 22 sur - CTO.2025-2781
29	08/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT de Complemento EXT_2044 ID_475 - KR 12 X AC 19
30	08/01/2026	RE: Solicitud PMT por EMERGENCIA en KENNEDY - EXT_3489 ID_1339 AK 86 x Dg 49 Sur - CTO. 2025-2781
31	08/01/2026	Comité de Seguimiento n.º 9 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 n.° 2025-2781[En persona]
32	08/01/2026	Comité de Seguimiento n.º 10 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 n.° 2025-2781[En persona]
33	09/01/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web
34	08/01/2026	Solicitud de protocolos siniestros 1RA quincena de DICIEMBRE 2025
35	13/01/2026	COI_02 del 8-ene-2026 / CTO. 2025-2781
36	13/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT de complemento # 27. EXT_3826 ID_972 - KR 6 X CL 22 Sur. CTO. 2025-2781
37	13/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-192 - Informe Mensual n.° 9 V1 del Mes de Diciembre de 2025.
38	13/01/2026	RESPUESTA OFICIO n.° SEM-CMC-CM25-094-25 Intersección KR 80 X AC38c sur
39	13/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-193 - Informe Mensual n.° 8 V1 del Mes de Diciembre de 2025 - SSTMA
40	13/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-195 - 2026-01-06 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-175-25
41	13/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-194 - 2026-01-06 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-087-25
42	13/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-196 - 2026-01-06 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-180-25

n.°	Fecha enviada	Asunto
43	13/01/2026	Enlace sesión JAL – 14 de enero de 2026
44	13/01/2026	Informes semanales faltantes
45	13/01/2026	Comité de Seguimiento n.º 10 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 n.° 2025-2781[En persona]
46	13/01/2026	CONDICIONES INICIO ACTIVIDADES
47	13/01/2026	Consecutivo WEXT-2025-2781-185
48	16/01/2026	SEM-CMC-CM25-167-25 Radicación de Correspondencia
49	13/01/2026	RE: Implementaciones semafóricas – Externos 3082 y 2087
50	13/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-173 - Informe Mensual n.° 7 V1 del Mes de Noviembre de 2025 - SSTMA
51	13/01/2026	SOLICITUD DE PRORROGA RESPUESTA REQUERIMIENTO INTERVENTORIA
52	14/01/2026	RE: Orden de trabajo n.° 15 -OT
53	14/01/2026	RE: Orden de Trabajo n.° 16 - OT 16
54	14/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-197 - Presentación del Subcontratista GYG INGENIEROS ASOCIADOS
55	14/01/2026	SEM-CMC-CM25-183-26 Radicación de Correspondencia
56	14/01/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web
57	15/01/2026	RE: Remisión Observaciones de la SDM a los radicados 202661200081462,202661200081272,202661200081152 - CTO. 2025-2781
58	15/01/2026	RV: Remisión COMUNICADO de SDM_ SPMT_ 202631200061681 del 06-enen-2026 sobre posible Incumplimiento a PMT Lote 2 Obras civiles zona sur - CTO. 2025-2781
59	15/01/2026	RV: SDM 202531215451241 - Incumplimiento PMT CTO 2781
60	15/01/2026	RV: RADICADO SDM No- 202531216473481
61	15/01/2026	COMPROMISOS COMITÉ 15/01/2026
62	15/01/2026	Acta n.° 24
63	15/01/2026	RE: Reubicación de semáforos portátil - Sendero en espacio del reductor de velocidad
64	15/01/2026	RE: Solicitud de información sobre actividades relacionadas con siniestros - OBRAS CIVILES.
65	16/01/2026	COI_03 del 15-ene-2026 / CTO 2025-2781
66	16/01/2026	SEM-CMC-CM25-184-26 Radicación de Correspondencia
67	16/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT de Complemento. - EXT_3013 ID_1177 - KR 18 B X CL 53 Sur Y DG 54 Sur - CTO. 2025-2781
68	16/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT de Complemento. EXT_3703 ID_1071 - PMT AK 14 X DG 48 Sur - CTO.2025-2781
69	16/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT de Complemento - EXT_3485 - ID_923 - KR 80 X CL 57A SUR - CTO.2025-2781
70	16/01/2026	SOLICITUD REPLANTEO AK 80G X DG 3
71	16/01/2026	Revisión cantidades diciembre
72	14/01/2026	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACCIÓN CORRECTIVA EPP Y DOTACIÓN
73	18/01/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web
74	19/01/2026	SOLICITUD TRAMITE NO PREVISTO
75	19/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-200 - 2026-01-18 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-182-25

n.°	Fecha enviada	Asunto
76	19/01/2026	Revisión cantidades diciembre
77	19/01/2026	RV: Remisión OBS DE MOVILIDAD - PMT por EMERGENCIA en KENNEDY - EXT_3489 ID_1339 AK 86 x Dg 49 Sur - CTO. 2025-2781
78	19/01/2026	RV: VISITA VERIFICACIÓN POR INTERFERENCIA DE REDES KR 72J X CL 45 SUR
79	19/01/2026	Implementación TV 60 X DG 70 Sur - Sierra morena
80	20/01/2026	RV: Remisión Observaciones de la SDM al PMT - Radicado No 202661200150642 - EXT 3826 - ID 972 KR 6 X CL 22 S - CTO. 2025 -2781
81	20/01/2026	RE: Observaciones de Interventoría al PMT de complemento EXT_3909 ID_1311 KR 81 B X CL 63 Sur - CTO. 2025-2781
82	20/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT Esp. de complemento - EXT_3785 ID_921 - Carrera 80 por Calle 55 SUR - CTO-2025-2781
83	20/01/2026	RE: Solicitud de prorroga 2 - ampliación PMT Carrera 14I x Calle 84 Sur
84	20/01/2026	RE: Solicitud de prorroga o ampliación PMT Carrera 72 J x Calle 45 Sur
85	20/01/2026	Implementación TV 60 X DG 70 Sur - Sierra morena
86	20/01/2026	Accidente 2026-01-20
87	20/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-201 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles - CDJ GROUP SAS
88	21/01/2026	PLANILLAS PENDIENTES
89	21/01/2026	Fwd: Capacitación Mántum - Obras Civiles
90	21/01/2026	Memorias de cálculo para PAGOS de PMT - Mes de diciembre y meses siguientes
91	21/01/2026	RE: Devolución atención OBSERVACIONES V1 (COI) de la SDM al PMT - RAD - 202561204746002 - CTO. 2025-2780
92	22/01/2026	RE: Atención OBSERVACIONES V1 (COI) de la SDM al PMT - RAD - 202561204746002 - CTO. 2025-2780
93	22/01/2026	Comité de Seguimiento n.º 10 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 n.° 2025-2781 [En persona]
94	22/01/2026	Documentos maquinaria y volquetas
95	23/01/2026	Respuestas PENDIENTES CM25
96	23/01/2026	COI_04 del 22-ene-2026 / CTO 2025-2781
97	23/01/2026	RE: Remisión OBSERVACIONES de la SDM al PMT RAD. SDM- 202661200081032- CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO. 2025-2781
98	23/01/2026	PROGRAMACIÓN semanas siguientes PMT General típicos 22/01/2026 - Contrato SDM-2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur - comunicado SPMT_202531207916131
99	23/01/2026	RE: Aprobación de Interventoría al PMT complemento - EXT_3814 ID_882 - KR 63 X CL 57 B Sur - CTO.2025-2781
100	23/01/2026	SEM-CMC-CM25-186-26 Radicación de Correspondencia
101	24/01/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web
102	24/01/2026	RE: Devolución Atención de Observaciones al PMT Radicado SDM-202561204746082 - EXT_3429 - ID_1082 - KR 19C X CL 48 C Sur
103	25/01/2026	Reunión CM25 - Interventoría
104	25/01/2026	Revisión programación - plan de calidad
105	26/01/2026	Reunión CM25 - Interventoría
106	26/01/2026	RE: REMISIÓN OBSERVACIONES DE LA SDM AL PMT - RAD. SDM- 202661200250722– EXT 3273 ID 930 - KR 79C X CL 63 S CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO. 2025-2781

n.°	Fecha enviada	Asunto
107	26/01/2026	RE: Remisión OBSERVACIONES de la SDM al PMT RAD. SDM- 202661200250722– CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO. 2025-2781
108	27/01/2026	PROGRAMACIÓN AGENDA DE MEDICIONES CORTE ENERO
109	27/01/2026	revisión cantidades Cto mes diciembre
110	27/01/2026	Acta primera quincena enero 2026
111	27/01/2026	RE: Remisión Observaciones de la SDM al PMT radicado 202661200195122– EXT_3485 - ID_923 - KR 80 X CL 57A SUR, CTO. SDM 2025 - 2781
112	27/01/2026	RE: Remisión de Observaciones de la SDM al PMT - radicado 202661200243602 202661200272942– EXT_3785 ID_921 - Carrera 80 por Calle 55 SUR, SDM 2025 - 2781
113	28/01/2026	SEM-CMC-CM25-188-26 Radicación de Correspondencia
114	29/01/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web
115	29/01/2026	RV: Orden Trabajo_n.° 17 - Mantenimientos
116	29/01/2026	RE: Radicación de cuentas terceros en febrero
117	29/01/2026	Informes Técnicos - Hallazgos (Fecha límite 03/02/2026)
118	29/01/2026	Visita técnica EXT 3120 - KR 24 X CL 18 SUR
119	29/01/2026	Visita técnica EXT 3454 - KR 79 X CL 38C
120	29/01/2026	SEM-CMC-CM25-188-26 Radicación de Correspondencia
121	29/01/2026	Re: Reporte hallazgos bodega- enero
122	29/01/2026	RE: REMISIÓN OBSERVACIONES DE LA SDM AL PMT RAD. SDM- 202661200250722 - EXT_3273 ID_930 - kr 79C x Cl 63 Sur - CTO. 2025-2781
123	29/01/2026	Presentación 29/02/2026
124	29/01/2026	Visita técnica EXT 3454 - KR 78k X CL 38C
125	29/01/2026	ACTA 29/01/2026 (FIRMA)
126	29/01/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Registro de radicación vía formulario web
127	30/01/2026	RE: REMISIÓN OBSERVACIONES DE LA SDM AL PMT - RAD. SDM- 202661200297252– EXT_3814 - ID_882 - KR 63 X CL 57 B Sur -CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - CTO 2025-2781
128	31/01/2026	Respuesta al Oficio n.° SEM-CMC-CM25-183-26 Intersección proyectadas

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

Tabla 39. Correspondencia recibida del Contratista mediante correo electrónico

n.°	Fecha envió	Asunto
1	02/01/2026	REPORTE DECRETO 332
2	05/01/2026	Acta diciembre (FIRMA)
3	07/01/2026	RESPUESTA OFICIO n.° SEM-CMC-CM25-094-25 Intersección KR 80 X AC38c sur
4	07/01/2026	RV: Atención prioritaria Estado de avance intersección Isla del Sol
5	07/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-192 - Informe Mensual n.° 9 V1 del Mes de Diciembre de 2025.
6	07/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-193 - Informe Mensual n.° 8 V1 del Mes de Diciembre de 2025 - SSTMA
7	07/01/2026	PAC ENERO Y FEBRERO CONTRATO 2025-2781
8	09/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-194 - 2026-01-06 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-087-25

n.°	Fecha envió	Asunto
9	09/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-196 - 2026-01-06 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-180-25
10	09/01/2026	INFORME SEMANAL 16 - DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025
11	09/01/2026	INFORME SEMANAL 20 - DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025
12	09/01/2026	INFORME SEMANAL 21 - DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025
13	09/01/2026	INFORME SEMANAL 22 - DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025
14	09/01/2026	INFORME SEMANAL 23 - DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 04 DE ENERO DE 2026
15	13/01/2026	Consecutivo WEXT-2025-2781-185
16	13/01/2026	SEM-CMC-CM25-167-25 Radicación de Correspondencia
17	12/01/2026	SOLICITUD DE PRORROGA RESPUESTA REQUERIMIENTO INTERVENTORIA
18	14/01/2026	SOLICITUD TRAMITE NO PREVISTO
19	15/01/2026	INFORME SEMANAL 19 - DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025
20	15/01/2026	SOLICITUD REPLANTEO AK 80G X DG 3
21	15/01/2026	INFORME SEMANAL 18 - DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025
22	18/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-200 - 2026-01-18 Hallazgos comunicados SEM-CMC-CM25-182-25
23	18/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-201 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles - CDJ GROUP SAS
24	19/01/2026	VISITA VERIFICACIÓN POR INTERFERENCIA DE REDES KR 72J X CL 45 SUR
25	19/01/2026	Acta n.° 19 - GICE
26	19/01/2026	RV: VISITA VERIFICACIÓN POR INTERFERENCIA DE REDES KR 72J X CL 45 SUR
27	21/01/2026	SOLICITUD VISITA TÉCNICA AK 80G X DG 3
28	22/01/2026	PROGRAMACIÓN FIN DE SEMANA
29	22/01/2026	Solicitud Información adición y prorroga
30	24/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-202 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles - JVM GROUP SAS
31	27/01/2026	PROGRAMACIÓN AGENDA DE MEDICIONES CORTE ENERO
32	29/01/2026	OFICIO_WEXT-2025-2781-171 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles - JVM GROUP SAS.
33	29/01/2026	Respuesta al Oficio n.° SEM-CMC-CM25-183-26 Intersección proyectadas
34	29/01/2026	PROGRAMACIÓN SEMANAL - SEMANA 19 AL 24 DE ENERO DE 2026

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

4 ANEXOS

4.1. Anexo n.° 1. Directorio del personal profesional del Contratista

Tabla 40. Relación de personal profesional del Contratista

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
William Augusto Acosta López	Director	consorciomovilidad2025@gmail.com

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
Christian Roqueme Salazar	Ingeniero Especialista Tránsito	consorciotransito2025@gmail.com
Christian Felipe Gutiérrez García	Residente de Obra	williams.areatecnica2@gmail.com
María Paz Rosario Orjuela	Auxiliar de ingeniería	consorciomovilidad2025@gmail.com
Diana Maritza Ramos Cruz	Profesional SST	williams.arealidersst@gmail.com

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

4.2. Anexo n.° 2. Directorio del personal profesional de Interventoría

Tabla 41. Relación de personal profesional de la Interventoría

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
Valentín Eduardo Barajas Santos	Director de Interventoría	sem-director@redtic.com.co
Jaime Andrés García Avendaño	Coordinador Técnico de Interventoría	sem-coordinador-tecnico@redtic.com.co
Luis Carlos Daza Velásquez	Especialista tránsito y transporte	sem-esp-transitoytransporte@redtic.com.co
Mayte Dayana Gutierrez Barbosa	Ingeniero Residente obras civiles	Sem-ing-res-obrasciviles-2@redtic.com.co
Edgar Fernando Estupiñán	Ingeniero Residente Manejo Mantum	sem-ing-mantum@redtic.com.co
Gloria Claudia Martin Melo	Profesional calidad	sem-p-calidad@redtic.com.co
Deysi Katalina Moya Jiménez	Profesional en SST	sem-sst-1@redtic.com.co
Andrea Lizeth Vargas Soler	Profesional Ambiental	sem-p-ambiental@redtic.com.co
Ibeth Palacios Agudelo	Profesional Jurídico	sem-p-juridico@redtic.com.co
Laura María Castellanos Guerrero	Profesional Financiero y contable	sem-p-financiero@redtic.com.co
Tania Valentina Lombana Otalora	Auxiliar de ingeniería-Obra civil	sem-ing-res-obrasciviles-2@redtic.com.co

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

4.3. Anexo n.° 3 Directorio del personal profesional de la Entidad

Tabla 42. Relación de personal profesional de la Entidad

Nombre	Cargo	Correo Electrónico
Ronal Dayan Monroy Sandoval	Supervisor Cto de Interventoría	rmonroy@movilidadbogota.gov.co
Yeison Enrique Ibañez Guerrero	Apoyo a la Supervisión	yibanez@movilidadbogota.gov.co

Fuente: Elaboración propia Consorcio Movilidad Capital

4.4. Anexo n.° 4 evaluación del cumplimiento de las Obligaciones Contractuales del contrato.

Tabla 43. Obligaciones generales del Contratista

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
2. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
3. Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a 10 días calendario, una vez se haya perfeccionado el contrato.	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
4. Para la suscripción del acta de inicio el Contratista deberá allegar el compromiso antisoborno y SARLAFT vigente facilitado por la SDM.	Firma acta de inicio	Única	Si	Se realizó firma de acta de inicio el 29 de abril de 2025.
5. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones y/o Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte de este proceso de selección, así como en el ordenamiento jurídico y en los ofrecimientos adicionales de la propuesta.	Firma acta de inicio	Única	Si	El Contratista durante el periodo realizo actividades y presentación de requisitos contractuales.
6. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.	Firma acta de inicio	Única	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
7. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.	Firma acta de inicio	Única	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
8. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.	Firma documentos confidencialidad, compromiso antisoborno y sarlaft	Única	Si	No se han presentado novedades.
9. Atender de forma diligente e inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor y/o el/la supervisor(a) del contrato.	Respuesta comunicaciones Interventoría	mensual	No	La Interventoría evidencia que el Contratista no ha atendido las recomendaciones de forma oportuna, según

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
				los siguientes comunicados; SEM-CMC-CM25-183-26; SEM-CMC-CM25-188-25
10. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato.	Acta de pago parcial de obra	mensual	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
11. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales revistos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.	Acta de pago parcial de obra	mensual	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
12. Contar con los equipos, herramientas, insumos y/o personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	Aprobación de equipos y herramientas inicial	inicial y /o reemplazo de equipos	No	La Interventoría informa que no se han iniciado obras según cronograma, se presenta atrasos en las que están en ejecución, mediante los comunicados; SEM-CMC-CM25-183-26; SEM-CMC-CM25-188-25
13. Suministrar los uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad y salud en el trabajo, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.	Firma acta de inicio	mensual	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo - SST y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Firma acta de inicio	Mensual	No	La Interventoría manifiesta al Contratista hallazgos semanales del componente ambiental y SST.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
15. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.	Certificado de cumplimiento de pago de aportes	Mensual	No	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
16. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.	Certificado de cumplimiento de pago de aportes	Mensual	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
17. Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor y/o el/la supervisor(a) del mismo.	Presentación de informes y firma de actas de reunión	Mensual	No	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
18. Conocer y acatar las normas contractuales, manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.	Comunicaciones de incumplimiento por la entidad	Mensual	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
19. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación del mismo y presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.	Dirección de referencia para comunicaciones BEL-SDM-ADM-001-25 del 29 abril 2025	Inicial	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
20. En caso de cualquier novedad, reportar la situación de forma inmediata al interventor y/o al supervisor del contrato de manera escrita.	Actas de reunión y comité de obras	Periódico	Si	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
21. Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Actas de reunión y comité de obras	Periódico	Si	El Contratista participó en las reuniones citadas por la SDM y por la Interventoría.
22. Identificar e implementar oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato y en el sitio de la obra.	Aprobación hojas de vida personal	Mensual	No aplica	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
23. Atender los lineamientos previstos en la Ley 2040 de 2020 "*Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones*" sin que esto implique	Aprobación hojas de vida personal	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
afectaciones al cumplimiento del contrato, según aplique.				
24. El Contratista se obliga a prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.	Actas de reunión	Mensual	Si	No se han presentado novedades.
25. Atender los requerimientos de la Supervisión para una correcta ejecución del contrato.	Actas de reunión y comités de obra	Mensual	No	Durante el periodo el Contratista no presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil, esto se manifiesta en el Acta quincenal n.° 10 del 28 de enero de 2026.
26. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020, modificado por el artículo 2 del Decreto Distrital 634 de 2023. "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", "(...) *Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este decreto, los procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado y las tipologías contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza no requieran de personal para la ejecución del contrato y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisiciones a través de la bolsa de productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, comodatos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (...)*	Aprobación hojas de vida del personal	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
27. Mantener durante la ejecución del contrato el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expida el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación,	Aprobación hojas de vida del personal	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
de conformidad con la normativa aplicable en el artículo 1° del Decreto 392 de 2018. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del Contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables (cuando aplique).				
28. Las demás que se deriven del contrato que sean pertinentes para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y la invitación, la cual hará parte integral del futuro contrato	Lista de chequeo cumplimiento obligaciones contractuales	Mensual	Si	No se han presentado novedades.

Fuente: Minuta del Contrato n.° 2025 - 2781

Tabla 44. Obligaciones específicas del Contratista

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Desarrollar el objeto del contrato en la forma y condiciones previstas en el estudio previo, el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-01 Licitación y los sub anexos técnicos que lo componen, la propuesta presentada por el Contratista adjudicatario y el contrato suscrito.	Firma de contrato y acta de inicio de contrato de obra	Única	Cumple	No se han presentado novedades.
2. Presentar a la Interventoría los análisis de precios unitarios, listado unificado de insumos de todos y cada uno de los ítems del presente proceso, concordantes con la oferta económica con el objeto de que la Interventoría realice la revisión y aprobación. Los valores no deberán ser diferentes a los ofertados.	Aprobación precios unitarios	Única	No aplica	Durante el periodo ya se encuentran aprobados los APU del Contratista.
3. Realizar por parte de la Interventoría la revisión y aprobación a satisfacción de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente proceso y en la ley. La Interventoría deberá informar de manera escrita a la Entidad sobre la aprobación de todos y cada uno de los requisitos del contrato.	Aprobación de documentación contractual y requerida	Mensual	Cumple	Durante el periodo la Interventoría informó a la Entidad sobre la aprobación de todos y cada uno de los requisitos del contrato.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
4. El Contratista entregará a la Interventoría, un cronograma de actividades dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación, esto con el fin de asegurar el cumplimiento del contrato y planificar y controlar las actividades programadas.	Presentación de programa de obra	Inicial y o bajo una modificación contractual, mensual	No aplica	El Contratista ya presenta aprobado el cronograma inicial.
5. Garantizar la disponibilidad de los grupos de trabajo y sus recursos mínimos en los horarios establecidos por la Entidad.	Informes Mensuales, semanales y Bitácora	Mensual	No Cumple	Durante el periodo se solicitó al Contratista en el Acta quincenal n.° 10, del 28 de enero de 2026.
6. Cumplir los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos de reacción, definidos para las actividades de mantenimiento correctivo.	Informe Mensual	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
7. Hacer uso adecuado, proteger y reintegrar, cuando la SDM lo estime pertinente, los bienes que se le entreguen con ocasión de la ejecución del contrato.	Informe Mensual	Mensual	No aplica	No aplica durante el periodo.
8. Presentar las certificaciones de calidad de los materiales suministrados, a solicitud de la Entidad o de la Interventoría.	Informe Mensual	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
9. Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos y herramientas requeridos durante el plazo de ejecución del contrato. En el caso de que alguno de los equipos o herramientas presente fallas en la prestación del servicio, el Contratista deberá reemplazar dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto, sin que se afecte la programación de las labores a ejecutar ni las labores coordinadas con los otros grupos de mantenimiento.	Aprobación de equipos y herramientas Formatos de seguimiento por parte de Interventoría	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
10. En caso de haber ofertado como factor de calidad, el plan de calidad, el Contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. El plan de calidad deberá incluir los procedimientos técnicos y administrativos, formatos de control y reportes necesarios para desarrollar las actividades del contrato. El plan de calidad deberá ser entregado a la	Cumplimiento aprobación plan de calidad	Inicial	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó el plan de calidad, el cual se aprobó por la Interventoría.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
Interventoría dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y deberá ser aprobado por la Interventoría.				
11. Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y sistema de calidad del proyecto.	Cumplimiento aprobación plan de calidad	Inicial	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó el plan de calidad, el cual se aprobó por la Interventoría.
12. Mantener en perfecto estado de operación los bienes suministrados por la Secretaría.	Informe Mensual	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
13. En los eventos en los que se requiera la recuperación del espacio público afectado por las obras, el Contratista se debe regir por los lineamientos técnicos sobre construcción de vías, pavimentos y Cartilla de Espacio Público del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	Informe Mensual	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
14. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Actas de reunión y/o comunicaciones	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
15. El Contratista deberá formular y radicar para su aprobación un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) general, ante la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de la SDM. Estos planes de manejo de tránsito se deberán mantener vigentes durante todo el tiempo de ejecución del contrato.	Oficios radicados a GUPMT	Constante	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
16. Implementar y mantener toda la señalización en cantidad y ubicación del PMT tal y como sea aprobada por la Subdirección de Planes de manejo de Tránsito de la SDM, antes de efectuar cualquier labor en espacio público.	Aprobación COI SDM	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
17. Estar atento y dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad en temas de los PMT.	Aprobación COI SDM y o atención de	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
	observaciones de la entidad			requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
18. Garantizar la coordinación con la Interventoría, con el fin de hacer efectivas las actividades programadas.	Reuniones y/o comunicaciones escritas, seguimiento a programación	Mensual	No Cumple	Durante el periodo el Contratista presento atrasos en cronogramas de complementos e intersecciones nuevas, esto se manifestó en los siguientes comunicados SEM-CMC-CM25-183-26 SEM-CMC-CM25-188-26.
19. Informar de forma escrita al interventor cualquier problema relacionado con la ejecución del contrato.	Reuniones y/o comunicaciones escritas, seguimiento a programación	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
20. En los sitios donde se adelanten las obras, el Contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.
21. Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de estricto cumplimiento en el perímetro urbano de la ciudad.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades ingreso
22. Realizar el control de residuos de construcción y demolición, y presentar copia de los correspondientes certificados (reutilización, reciclaje y disposición final) producidos en las labores y obras en el mes.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
23. Controlar y reportar el empleo de los materiales de construcción y del Manejo de la vegetación.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	Cumple	No se han presentado novedades.

OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
24. En el caso de los bienes suministrados por el Contratista, deberá realizar el trámite de ingreso de éstos al almacén de la SDM, de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento Gestión de Bienes e Inventarios - Ingresos, Egresos y Traslados de Almacén (procedimiento PA01PR12) Y según Lo definido En el Instructivo para el ingreso, egreso y traslados de bienes n.° PA01-PR12-IN01.	Formatos e instructivos del almacén de la SDM	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
25. Reparación y/o restitución por su cuenta, de las obras que no sean satisfactorias por cumplimiento de estándares de calidad debidamente controladas por la Interventoría (obras defectuosas, incompletas o inaceptables).	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
26. Proporcionar y mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido. El cual se debe presentar dentro de los diez días hábiles una vez firmada el acta de inicio	Aprobación hojas de vida	Mensual	Si aplica	No se han presentado novedades.
27. Se obliga a tramitar las licencias y/o permisos de intervención en espacio público y demás necesarias para la correcta ejecución del contrato.	Correspondencia, Informe mensual	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
28. Coordinar, requerir la información planimétrica y verificar la existencia previa de redes de servicios públicos que puedan afectar la ejecución de las obras e informar a la Interventoría sobre posibles impedimentos para la ejecución de los trabajos por intersección con redes de servicios públicos domiciliarios.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales, Correspondencia	Mensual	Cumple	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.
29. Reponer, reparar o restituir cualquier daño o afectación a las redes de prestadores y/o operadores de servicios públicos que puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos.	Formatos de seguimiento por parte de Interventoría Bitácora, Informes mensuales, Correspondencia	Mensual	No aplica	No se han presentado novedades.
30. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	Actas, reuniones y/o comunicaciones escritas	Mensual	No aplica	Durante el periodo el Contratista presentó los requisitos exigidos para ejecución de obra civil.

Fuente: Minuta del Contrato n.° 2025 - 2781

Los anexos al presente informe se encuentran alojados en la siguiente ruta:

https://drive.google.com/drive/folders/1QsqiVxnc1dJO4ziHDYqNn4HOigfMOr5O?usp=drive_link
