INFORME TRANSVERSAL DE INTERVENTORÍA n.° 9

SST, AMBIENTAL, TRÁNSITO y CALIDAD

Contrato n.° 2025-2769



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2025

Versión n.° 2.0

Bogotá D.C. –febrero 2025

ELABORACIÓN Y REVISIÓN:

Componente SST y Ambiental					
Elaboró:	**Andrea Vargas Yenny Gaitán Ana Rodríguez Katalina Moya**	**Revisó:**	**Andrés García Avendaño**	**Aprobó:**	**Valentín Barajas Santos**
Fecha:	06/02/2026	Fecha:	06/02/2026	Fecha:	06/02/2026
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Profesionales en SST y Ambiental	Cargo:	Coordinador Técnico de Interventoría	Cargo:	Director de Interventoría

Componente Tránsito					
Elaboró:	**Luis Daza**	**Revisó:**	**Andrés García Avendaño**	**Aprobó:**	**Valentín Barajas Santos**
Fecha:	06/02/2026	Fecha:	06/02/2026	Fecha:	06/02/2026
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Especialista Tránsito y Transporte	Cargo:	Coordinador Técnico de Interventoría	Cargo:	Director de Interventoría

Componente Calidad					
Elaboró:	**Gloria Claudia Martin Melo**	**Revisó:**	**Andrés García Avendaño**	**Aprobó:**	**Valentín Barajas Santos**
Fecha:	06/02/2026	Fecha:	06/02/2026	Fecha:	06/02/2026
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Profesional en Calidad	Cargo:	Coordinador Técnico de Interventoría	Cargo:	Director de Interventoría

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS REALIZADOS	OBSERVACIONES
1.0	15/01/2026	Versión Inicial	Versión Inicial
2.0	06/02/2026	Atención a observaciones	Atención a observaciones

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	Informe SST y Ambiental, Tránsito y Calidad n.° 9 presentado por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL correspondiente a las actividades adelantadas del 01 al 31 de diciembre de 2025.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	06/02/2026		
Resumen	Se presentan las actividades realizadas por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL en el marco del Contrato de Interventoría n.° 2025-2769, respecto al seguimiento mensual de la verificación tanto integral como por aspecto, efectuada a contratistas cuyo objeto sea la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C. De igual forma, se relaciona el estado técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental del contrato, durante el período del presente informe.		
Formato	DOCX.	**Lenguaje**	Español
Código: NA	Versión 2.0		
Autor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL – Equipo de contrato		
Revisó	Andrés García Avendaño		

TABLA DE CONTENIDO

1. **INFORME SST Y AMBIENTAL** 11
1.1. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 11
1.1.1. Afiliaciones y/o soportes de pagos del personal al Sistema General de Seguridad Social Integral 11
1.1.2. Certificaciones pago de seguridad social y salarios contratistas 14
1.1.3. Certificaciones de la Interventoría 15
1.2. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL QUE INGRESA EN EL PERÍODO. 16
1.3. ACTIVIDADES DE SST EN EL PRESENTE PERIODO 17
1.3.1. Inducción y capacitación 17
1.3.2. Plan de Trabajo 20
1.3.3. Inspecciones SST 24
1.3.4. Elementos de Protección Personal y Dotación 25
1.4. INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO 26
1.5. CERTIFICADOS DE ALTURAS 28
1.6. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 29
1.7. CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 30
1.8. VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 31
1.8.1. Listado de vehículos 31
1.8.2. Inspecciones e inventario de vehículos 32
1.8.3. Relación de los equipos y/o maquinaria 33
1.9. ACOMPAÑAMIENTO SST INTERVENTORÍA EN LABORES EN CAMPO 34
1.10. ACTAS DE SOCIALIZACIÓN 39
1.11. GESTIÓN AMBIENTAL 40
1.11.1. Pin ambiental ante la SDA 40
1.11.2. Manejo de la vegetación 40
1.11.3. Manejo de cuerpos de agua y sumideros 42
1.11.4. Manejo de residuos de construcción y demolición RCD 44
1.12. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LAS INSTALACIONES DE BODEGA Y SERVICIOS DE HIGIENE CORRESPONDIENTES, DE LOS ESPACIOS ASIGNADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE 45
1.13. SEGUIMIENTO DECRETO 332 MODIFICADO POR DECRETO 634 DEL 2023 49
1.14. SEGUIMIENTO DECRETO 1082 DE 2015 - DISCAPACIDAD / APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 49
1.15. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL .. 50
1.16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 50
2. **INFORME DE TRÁNSITO** 52
2.1. SEGUIMIENTO PMT'S DEL CONTRATO 2025-2780 - CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD DE OBRAS CIVILES ZONA NORTE 52
2.1.1. PMT general 52
2.1.2. PMTs específicos 52

2.1.3. Seguimiento a PMTs general y específicos zona Norte 54
2.2. SEGUIMIENTO PMT'S DEL CONTRATO 2025-2781 - CONSORCIO MOVILIDAD 2025 DE OBRAS CIVILES ZONA SUR 55
2.2.1. PMT general 55
2.2.2. PMTs específicos 56
2.2.3. Seguimiento a PMTs general y específicos zona sur 58
2.3. SEGUIMIENTO PMT'S GENERAL DEL CONTRATO 2025-2782 DE MANTENIMIENTO DE POSTES 59
2.3.1. Notificación de PMT's Típicos a la SDM 59
2.3.2. Seguimiento a PMT's Típicos 59
2.4. SEGUIMIENTO PMT'S GENERAL DEL CONTRATO 2025-2783 DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y DE EQUIPOS 60
2.4.1. Notificación de PMT's Típicos a la SDM 60
2.4.2. Inventario de dispositivos de señalización para PMT's típicos 60
2.4.3. Seguimiento a PMT's Típicos 60
2.5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA SOBRE PMTS EN EL PERIODO DEL INFORME 61
2.6. CONCLUSIONES DEL COMPONENTE DE TRÁNSITO: 61
3. **INFORME GESTIÓN DE CALIDAD** 64
3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS 64
3.2. SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE CALIDAD 65
3.2.1. Seguimiento del cumplimiento del plan de calidad contrato 2025-2780 66
3.2.2. Seguimiento del cumplimiento del plan de calidad contrato 2025-2781 72
3.2.3. Seguimiento del cumplimiento del plan de calidad contrato 2025-2782 80
3.2.4. Seguimiento del cumplimiento del plan de calidad contrato 2025-2783 84
3.3. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES (APLICA SÓLO A POSTES Y OBRAS CIVILES) 87
3.4. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS POR LOS CONTRATISTAS .. 94
3.5. CREACIÓN DE DOCUMENTOS 95
3.6. CORRESPONDENCIA 98
3.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 99
4. **CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN Y REGISTROS DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES QUE GENERAN PUNTAJE ADICIONAL** 106

ÍNDICE DE TABLAS

tabla 1. Sst Resumen Afiliaciones Y/O Pagos De Seguridad Social Del Periodo 11
Tabla 2. Sst Personal Retirado Del Periodo 13
Tabla 3. Sst Personal Administrativo Y/O Operativo Adicional Relacionado Para El Presente Periodo 14
Tabla 4. Sst Examen Médico Ocupacional 16
Tabla 5. Sst Resumen Inducciones Del Contrato 18
Tabla 6. Sst Capacitaciones Contratistas 18
Tabla 7. Sst Resumen Plan De Trabajo De Contratistas 21
Tabla 8. Sst Inspecciones Interventoría Y Contratistas 24
Tabla 9. Sst Relación De Personal Accidentado En El Periodo 27
Tabla 10. Sst Indicadores De Accidentalidad 28
Tabla 11. Sst Comités Copasst 30
Tabla 12. Sst Consolidado Vehículos 31
Tabla 13. Sst Relación Inspecciones Sst 36
Tabla 14. Sst Registro Fotográfico Sst 37
Tabla 15. Sst Actas De Socialización Contratistas Obras Civiles 39
Tabla 16. Manejo De Vegetación Contrato 2025-2780 41
Tabla 17. Manejo De Vegetación Contrato 2025-2781 41
Tabla 18. Convenio De Baños Contrato 2025-2780 42
Tabla 19. Convenio De Baños Contrato 2025-2781 42
Tabla 20. Protección Sumideros 2025-2780 43
Tabla 21. Protección De Sumideros Contrato 2025-2781 43
Tabla 22. Consolidado Rcd Contrato 2025-2780 44
Tabla 23. Consolidado Rcd Contrato 2025-2781 44
Tabla 24. Registro Fotográfico De Las Condiciones De Salubridad 47
Tabla 25. Estado Y Vigencia Pmt General De Típicos. - Contrato 2025-2780 – Lote 1 – Zona Norte 52
Tabla 26. Relación De Sitios Con Pmt General Vigentes En Diciembre De 2025 - Contrato 2025-2780 52
Tabla 27. Relación De Pmt Específicos Vigentes En Diciembre - Contrato 2025-2780 – Lote 1-Zona Norte 52
Tabla 28. Relación De Pmt Específicos Radicados En Sdm Para Solicitud De Aprobación De La Entidad Pendientes De Aprobación En Diciembre 2025 - Contrato 2025-2780 – Lote 1-Zona Norte 53
Tabla 29. Relación De Pmt Específicos Aprobados Por Sdm En Diciembre 2025 - Contrato 2025-2780 – Lote 1-Zona Norte 54
Tabla 30. Estado Y Vigencia Pmt General De Típicos. - Contrato 2025-2781 – Lote 2 -Zona Sur 55
Tabla 31. Relación De Sitios Con Pmt General Vigentes En Diciembre - Contrato 2025-2781 – Lote 2 55

Tabla 32. Relación Y Estado Pmt Específicos Vigentes En Diciembre - Contrato 2025-2781 – Lote 2 -Zona Sur 56
Tabla 33. Relación De Pmt Específicos Radicados En Sdm Para Solicitud De Aprobación De La Entidad Pendientes De Aprobación En Diciembre - Contrato 2025-2781 – Lote 2 -Zona Sur 56
Tabla 34. Relación De Pmt Específicos Aprobados Por Interventoría Para Radicar En Sdm Para Solicitud De Aprobación De La Entidad En Diciembre - Contrato 2025-2781 – Lote 2 -Zona Sur 57
Tabla 35. Relación De Pmt Específicos Negados Por La Sdm En Diciembre - Contrato 2025-2781 – Lote 2-Zona Sur 57
Tabla 36. Estado Y Vigencia Pmt General De Típicos. - Contrato 2025-2782 – Lote 3 59
Tabla 37. Estado Y Vigencia Pmt General De Típicos. - Contrato 2025-2783 – Lote 4 60
Tabla 38. Factores De Los Planes De Calidad Evaluados Por Contrato Para El Periodo De Diciembre Del 2025 65
Tabla 39. Objetivos De Calidad Y Reporte De Resultados De Indicadores Mes De Diciembre Del 2025 - Contrato 2025-2780 67
Tabla 40. Objetivos De Calidad Y Reporte De Resultados De Indicadores Mes De Diciembre Del 2025 - Contrato 2025-2781 73
Tabla 41. Objetivos De Calidad Y Reporte De Resultados De Indicadores Mes De Diciembre Del 2025 _ Contrato 2025-2782 81
Tabla 42. Objetivos De Calidad Y Reporte De Resultados De Indicadores Mes De Diciembre Del 2025_Contrato 2025-2783 85
Tabla 43. Registro Fotográfico De Pruebas De Inspección De Pintura Practicadas Durante Diciembre En Bodega De La Contratista Ubicada En Calle 165 #56ª-45 91
Tabla 44. Registro Fotográfico De Pruebas De Inspección De Pintura Practicadas Durante Diciembre En La Ak 7 X Cl 72 Externo 1009 Id 152 92
Tabla 45. Relación De Documentación Al Mes De Diciembre Del 2025 _ Plan De Calidad Contrato 2025-2769 97
Tabla 46. Listado De Correspondencia Recibida Y Enviada En El Periodo De Diciembre Del 2025 98
Tabla 47. Relación De Contratos Y Condiciones Que Generaron Puntaje Adicional 106
Tabla 48. Relación De Informes Y Anexos Que Evidencian El Cumplimiento Por Parte Del Contratista 107

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Nivel de cumplimiento factores de calidad factores plan de calidad evaluados para contrato 2025- 2780 durante el periodo de diciembre del 2025 99
ilustración 2. Nivel de cumplimiento factores de calidad factores plan de calidad evaluados para contrato n.° 2025- 2781 durante el periodo de diciembre del 2025..... 101
ilustración 3. Nivel de cumplimiento factores de calidad factores plan de calidad evaluados para contrato n.° 2025- 2782 durante el periodo de diciembre del 2025..... 103
ilustración 4. Nivel de cumplimiento factores de calidad factores plan de calidad evaluados para contrato n.° 2025- 2783 durante el periodo de diciembre del 2025..... 105

Anexos

1. SST&A

- ANX 01. Personal
- ANX 02. Parafiscales Contratista
- ANX 03. Parafiscales Interventoría
- ANX 04. Actividades SST
- ANX 05. Documentos vehículos
- ANX 06. Equipo y maquinaria
- ANX 07. Verificación en campo Interventoría
- ANX 08. Actas de socialización
- ANX 09. Sistema gestión ambiental
- ANX 10. Condiciones de salubridad bodegas
- ANX 11. Seguimiento Decreto 634

2. TRÁNSITO

- ANX. 01. Seguimiento PMT's Cto 2025-2780
- ANX. 02. Seguimiento PMT's Cto 2025-2781
- ANX. 03. Seguimientos PMT’s Típicos Cto 2025-2782
- ANX. 04. Seguimientos PMT’s Típicos Cto 2025-2783
- ANX. 05. Correspondencia PMT's
- ANX. 06. Registros Fotográficos Seguimientos PMT

3. CALIDAD

- ANX 1. Requerimientos dotación
- ANX 2. Certificados cumplimiento P.C[1] x contrato
- ANX 3. Certificados cumplimiento ensayos
- ANX 4. Planes de Mejora
- ANX 5. Formatos generales de Interventoría
- ANX 6. Correspondencia

[1] P.C: Plan de calidad

INTRODUCCIÓN

La SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (en adelante la "SDM") mediante concurso de méritos abierto n.° SDM-CMA-3-2025, adjudicó el Contrato de Interventoría n.° 2025-2769 al CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL (en adelante la "Interventoría") con el objeto de "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.", durante el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2025 y el 15 de febrero de 2026.

Así, este informe se desarrolla en cumplimiento del numeral *4.1. INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA* del *Anexo Técnico 1A* del contrato 2025-2769, celebrado entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL, el cual establece:

> *"Mensualmente la Interventoría entregará un informe por cada contrato objeto de Interventoría a la Entidad, donde se indicará: descripción y localización de las actividades desarrolladas del contrato, una completa lista de las actividades desarrolladas por el interventor, enmarcando las actividades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas, una ficha técnica del contrato, relación de todos y cada uno de los indicadores establecidos para el contrato, un balance financiero y el estado de avance y cumplimiento de cada uno de los contratos; igualmente, se deben incluir los anexos que soporten la información relacionada."*

De esta manera, se incluye el resumen de las labores y actividades desarrolladas por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL durante el período del presente informe, relacionado con la Interventoría integral de la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C. para las actividades de SST, Ambiental, Transito y Calidad.

1. INFORME SST Y AMBIENTAL

1.1. Sistema general de seguridad social

1.1.1. Afiliaciones y/o soportes de pagos del personal al Sistema General de Seguridad Social Integral

Para el personal que trabajó para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025, en este informe se verificaron los soportes de pago de seguridad social o soportes de afiliación para el personal del contrato de Interventoría **CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL 2025-2769** y los contratos que esta tiene a su cargo, así:

CONTRATO 2025-2780 – CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD, componente obras civiles.
CONTRATO 2025-2781 – CONSORCIO MOVILIDAD 2025 componente obras civiles.
CONTRATO 2025-2782 – TPD componente postes.
CONTRATO 2025-2783 – YUNEX TRAFFIC 2025 componente eléctrico y equipos.

A continuación, se presenta resumen del personal contratado para el presente periodo:

Tabla 1. SST Resumen afiliaciones y/o pagos de seguridad social del periodo

CONTRATO	CANTIDAD TRABAJADORES MES ANTERIOR	NOVEDADES MES DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE			CANTIDAD TRABAJADORES 1 AL 31 DE DICIEMBRE
		Ingreso	Traslados	Retiros	
CONTRATO 2025–2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	39	2	0	0	41
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	58	0	0	30	28
/CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	81	3	0	16	74
CONTRATO 2025 -2782 TPD	32	1	0	2	32
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	134	0	0	0	134

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

- **Contrato 2025-2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL:** Para el presente periodo, se registró la novedad correspondiente al ingreso de dos (2) trabajadores que ejecuta funciones en el marco del contrato vigente. Como resultado de este ajuste, se presenta una variación en la relación de personal respecto del mes anterior, quedando un total de cuarenta y uno (41) trabajadores activos. Esta información se encuentra debidamente soportada con la documentación correspondiente. Asimismo, se adjuntan las planillas de seguridad social correspondientes al personal activo durante el mes reportado. Ver 1. SST\ANX-01. Personal\1. Contrato 2025-2769.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD:** Durante el presente período no se registraron ingresos de personal para el contrato, se reportó el retiro de treinta 30) trabajadores, para lo cual se evidencia un total del personal directo dentro del mínimo requerido de veintiocho (28) personas. Adicionalmente, se reporta el retiro de tres (3) personas como personal de apoyo para el contrato. Se verificó que la totalidad del personal se encuentre debidamente afiliada al Sistema General de Seguridad Social (SGSS), cumpliendo con los requisitos legales y contractuales establecidos. SST\ANX-01. Personal\2. Contrato 2025-2780

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el presente período se realizó la aprobación y verificación de tres (3) hojas de vida correspondientes al personal que. Adicionalmente, el Contratista reportó el retiro de dieciséis (16) personas y como personal de apoyo se cuentan con una (1) persona para un total de sesenta y ocho (68) trabajadores vinculados al contrato, se verificó que la totalidad del personal se encuentre debidamente afiliada al Sistema General de Seguridad Social (SGSS), cumpliendo con los requisitos legales y contractuales establecidos. Ver. Ver 1. SST\ANX-01. Personal\2. Contrato 2025-2781

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Para el presente periodo se registraron novedades de personal, ya que se reportó el retiro de dos (2) trabajadores, y el ingreso de uno (1) trabajador al contrato. En comparación con el mes anterior, se observa una variación en la cantidad de personal activo, quedando un total de 32 trabajadores. Esta información se encuentra debidamente respaldada con la documentación correspondiente. Ver 1. SST\ANX-01. Personal\2. Contrato 2025-2782.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Para el presente periodo, el Contratista reportó 134 personas fijas, así mismo, para el personal de apoyo reportaron 38 trabajadores, donde se retiraron dos (2) personas e ingresaron otras tres (3), para un total de 172 personas entre fijas y apoyo vinculadas al proyecto en el periodo ya mencionado, se cargan las planillas de la Seguridad Social del personal vigente. Ver 1. SST\ANX-01. Personal\2. Contrato 2025-2783

En la siguiente tabla se relaciona la cantidad de personas retiradas por los Contratistas y la Interventoría:

Tabla 2. SST Personal retirado del periodo

CONTRATO	# DE TRABAJADORES	EVIDENCIA
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	0	Ver ANX-01. Personal / SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS - DIC
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	33	Ver ANX-01. Personal / SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS - DIC
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	16	Ver ANX-01. Personal / SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS - DIC
CONTRATO 2025 -2782 TPD	2	Ver ANX-01. Personal / SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS - DIC
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	2	Ver ANX-01. Personal / SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS - DIC

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Ver 1. SST\ANX-01. Personal

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Para el periodo del presente informe no se registraron novedades relacionadas con el retiro de trabajadores en el marco del contrato vigente.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD:** Para el periodo del presente informe el Contratista presenta treinta (30) retiros de personal del Consorcio, y se realiza el reporte de tres (3) retiros del personal de apoyo.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Para el periodo del presente informe se presenta el retiro de dieciséis (16) personas del contrato, entre estas doce (12) personal de VYP, subcontratista que inició proceso de terminación de contrato, dicho proceso está asignado al áreajurídica del consorcio, quedan pendiente los soportes de retiro de este personal.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Para el período del presente informe, se registró la novedad correspondiente al retiro de dos (2) trabajadores que desempeñaban funciones en el marco de este contrato. Se adjuntan planillas de seguridad social con la novedad de retiro.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Para el periodo del presente informe, se presentaron dos (2) retiros del personal, se anexan planillas de seguridad social (retiro), notificación de examen de retiro y paz y salvo.

A continuación, se relaciona el personal de apoyo de los **CONTRATOS 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL, CONTRATO 2025-2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD, CONTRATO 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025, CONTRATO 2025-2782 TPD, CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025,** el cual hace parte del total reportado para el presente periodo:

Tabla 3. SST Personal administrativo y/o operativo adicional relacionado para el presente periodo

CONTRATO	CANTIDAD TRABAJADORES MES ANTERIOR PERSONAL DE APOYO	NOVEDADES 1 AL 31 DE DICIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO			PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE APOYO
		Ingresos	Traslados	Retiros	Total
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONTRATO 2025 - 2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	49	0	0	3	46
CONTRATO 2025 - 2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	0	1	0	0	1
CONTRATO 2025 - 2782 TPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	37	3	0	2	38

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

1.1.2. Certificaciones pago de seguridad social y salarios contratistas

Haciendo la verificación correspondiente, se certifica mediante Paz y Salvo los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios de los contratistas que aplican para el presente periodo.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD:** Para el presente periodo, el Contratista adjuntó los certificados de los pagos al Sistema General de Seguridad Social del personal de CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD y sus consorciados, cada uno con firma del representante legal y contador, también se remitió el certificado por parte del subcontratista PH Ingeniería, donde menciona la verificación de los pagos de seguridad social del personal mínimo requerido para este contrato.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Para el presente periodo, se registró el ingreso de tres (3) personas al contrato. En consecuencia, se adjuntan los certificados de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, así como los certificados parafiscales del personal del consorcio WILLIAMS.CO, Inversiones construcciones e ingeniería CDJ group S.A.S y de los subcontratistas: PH Ingeniería, AIPROS Asesorías Integrales de Proyectos Sostenibles y JVM GROUP SAS. Dichos certificados cuentan con la firma del representante legal y el contador de cada empresa.

  A su vez se reporta en el presente informe que el contratista informa que el subcontratista Vías y pavimentos consultoría y construcción Nit: 901.644.965-4, no adjunta las planillas de seguridad social puesto que inició el proceso de cancelación de contrato con el subcontratista por incumplimientos al contrato entre estos el pago de la planilla de seguridad social del personal.

  Por lo demás, se verificó que la totalidad del personal se encuentre debidamente afiliada al Sistema General de Seguridad Social (SGSS), cumpliendo con los requisitos legales y contractuales establecidos.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Para el presente periodo, el Contratista adjunta los certificados de Paz y Salvo correspondientes a los pagos realizados al Sistema General de Seguridad Social. Dichos certificados cuentan con la firma del representante legal y del revisor fiscal, y han sido avalados por la Interventoría.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Para el periodo de diciembre, el contratista adjunta los certificados de Paz y Salvo correspondientes a los pagos realizados al Sistema General de Seguridad Social. Dichos certificados cuentan con la firma del representante legal y del revisor fiscal y han sido avalados por la Interventoría.

  Igualmente, se anexa los certificados de Paz y Salvo correspondientes a los pagos realizados al Sistema General de Seguridad Social del mes de noviembre que quedaron pendientes del mes anterior y han sido avalados por la Interventoría.

  Se adjunta la certificación emitida por la Interventoría para los contratos 2025-2780, 2025-2781, 2025-2782 y 2025-2783, en donde se expresa que se han revisado y verificado los documentos soporte de pagos salariales de los contratistas.

  Ver 1. SST\ANX-02. Parafiscales Contratistas

1.1.3. Certificaciones de la Interventoría

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025, se emitieron los certificados de

parafiscales correspondientes a los componentes del Consorcio Movilidad Capital: REDTIC INGENIERÍA S.A.S - BIC e INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. INCOPLAN S.A. Para la certificación de CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL, se envía solo la certificación de parafiscales firmada por el representante legal.

Ver 1. SST\ANX-03. Parafiscales Interventoría Contrato 2025-2769

1.2. Diagnóstico de condiciones de salud del personal que ingresa en el período

A continuación, se relacionan los exámenes realizados durante este periodo:

Tabla 4. SST Examen médico ocupacional

CONTRATO	# DE TRABAJADORES	EVIDENCIA
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	2	Ver ANX-01. Personal / 1. 2025-2769 / 4. Seguimiento EMO
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	0	Ver ANX-01. Personal / 2. 2025-2780 / 5. Seguimiento EMO
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	3	Ver ANX-01. Personal / 3. 2025-2781 / 3. Seguimiento EMO / Seguimiento Divulgación EMO
CONTRATO 2025 -2782 TPD	1	Ver ANX-01. Personal / 4. 2025-2782 / 5. Seguimiento EMO
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	15	Ver ANX-01. Personal / 5. 2025-2783 / 5. Seguimiento EMO

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Durante este periodo, se realizó la notificación a dos (2) trabajadores de las recomendaciones médicas derivadas de los exámenes de ingreso practicados en esta etapa. Del mismo modo, se realizó el seguimiento correspondiente a las recomendaciones de tipo ocupacional emitidas por la IPS, dirigidas a los trabajadores que actualmente desempeñan labores en el consorcio. Estas acciones se llevaron a cabo con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las indicaciones médicas y promover el bienestar y la seguridad de los colaboradores dentro del entorno laboral. Como respaldo de este proceso de seguimiento, se anexa un archivo en formato Excel, junto con el listado de asistencia, en el cual se detalla el control efectuado sobre los exámenes médicos ocupacionales realizados a cada trabajador.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD:** Durante este periodo, el Contratista no reportó exámenes médicos ocupacionales puesto que no se presentaron ingresos en el periodo. Se anexa el seguimiento EMO de todo el personal del contrato.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante este periodo, el Contratista presentó tres (3) exámenes médicos ocupacionales correspondientes al personal que ingresó en el período. Se anexa el seguimiento EMO de todo el personal del contrato.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Durante este periodo, ingresó uno (1) trabajador al proyecto. Al cual se le realizó el examen médico de ingreso y notificación de las recomendaciones médicas emitidas durante este examen, igualmente se anexa un archivo en formato Excel que contiene el seguimiento detallado de los EMO realizados al personal, incluyendo las recomendaciones emitidas por la IPS, con el fin de garantizar la adecuada implementación de las medidas sugeridas y, de esta manera, promover el bienestar y la seguridad en el entorno laboral.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Durante este periodo, se realizaron quince (15) exámenes periódicos. Se reprograman cinco (5) exámenes médicos por vacaciones (Gloria Amparo Bobadilla, Carreño Ospina Federico, Buitrago Paula, Cardenas Victor, Carrillo Javier). Adicionalmente, para las personas que ingresaron, los exámenes se realizaron en octubre y noviembre del 2025 y estos se encuentran en la carpeta de ingresos. Así mismo, se anexa el seguimiento EMO de todo el personal del contrato.

  Ver Anexo 1. SST\ANX-01. Personal

1.3. Actividades de sst en el presente periodo

1.3.1. Inducción y capacitación

1.3.1.1. Inducciones

Se revisan y cruzan los soportes de inducción y reinducción de personal del presente periodo de acuerdo con el SG-SST específico para cada contrato.

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Para el mes de diciembre se llevaron a cabo dos (2) inducciones dirigidas al personal nuevo del proyecto, con el objetivo de familiarizarlos con las normativas, procesos y cultura organizacional de la organización. Se anexa el soporte correspondiente a este proceso.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Para el mes de diciembre no se presentaron inducciones, ya que no hubo ingreso de personal.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Para el mes de diciembre el contratista presenta tres (3) inducciones del personal que ingresó cada uno acompañado de su respectiva evaluación de conocimientos y registro de asistencia.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Para el mes de diciembre se llevó a cabo una (1) inducción dirigida al personal nuevo del contrato, con el objetivo de familiarizarse con las normativas, procesos y cultura organizacional. Se anexa el soporte correspondiente a este proceso.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Para el mes de diciembre, se llevaron a cabo tres (3) inducciones para el personal antiguo. Para las tres (3) personas que ingresaron, las inducciones se realizaron en octubre y noviembre de 2025 y los soportes se encuentran en la carpeta de ingresos, cumpliendo así con los protocolos de ingreso establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

  A continuación, se presenta un resumen del proceso de inducción específico para el personal que ingresó durante este periodo.

Tabla 5. SST Resumen inducciones del contrato

CONTRATO	CANTIDAD INDUCCIONES	EVIDENCIAS
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	2	Ver ANX-04. Actividades SST / 2. Inducciones / 1. Contrato 2025-2769
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	0	Ver ANX-04. Actividades SST / 2. Inducciones / 2. Contrato 2025-2780
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	3	Ver ANX-04. Actividades SST / 2. Inducciones / 3. Contrato 2025-2781
CONTRATO 2025 -2782 TPD	1	Ver ANX-04. Actividades SST / 2. Inducciones / 4. Contrato 2025-2782
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	3	Ver ANX-04. Actividades SST / 2. Inducciones / 5. Contrato 2025-2783

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

1.3.1.2. Capacitaciones

A continuación, se presenta cuadro resumen de capacitaciones según los soportes de los contratistas e Interventoría:

Tabla 6. SST Capacitaciones contratistas

CONTRATISTA	CANTIDAD	TEMA	FECHA	ASISTENTES
|CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	7	1. Pausas Activas	1 al 31 de diciembre de 2025	41
		2.Fortalecimiento de la comunicación para ambientes de trabajo sanos	9 de diciembre de 2025	41
		3.Prevención de lesiones osteomusculares	12 de diciembre de 2025	41
		4.Riesgo Público	15 de diciembre de 2025	41
		5. Valores Humanos	23 de diciembre de 2025	41

CONTRATISTA	CANTIDAD	TEMA	FECHA	ASISTENTES
		6.Como actuaren caso de un accidente Víal	13 de diciembre de 2025	41
		7.Mantenimiento preventivo	11 de diciembre de 2025	7
CONTRATO 2025 - 2780 CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	3	1. manejo de residuos sólidos y líquidos	05 de diciembre	13
		2. Charlas de seguridad	1 al 31 de diciembre de 2025	125
		3 riesgo vial PMT	22 de diciembre de 2025	14
CONTRATO 2025 - 2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	10	1. Inducciones	1 al 31 de diciembre de 2025	3
		2. Charlas de seguridad	1 al 31 de diciembre de 2025	69
		3 seguridad vial	03 de diciembre de 2025	23
		4 riesgo tecnológico	09 de diciembre de 2025	35
		5 trabajo en caliente	10 de diciembre de 2025	23
		6 control de incendios	11 de diciembre de 2025	23
		7 sensibilización uso adecuado EPP	15 de diciembre de 2025	23
		8 seguridad riesgo publico	15 de diciembre de 2025	23
		9 riesgo biomecánico	15 de diciembre de 2025	23
		10 manipulación de cargas	29 de diciembre de 2025	23
CONTRATO 2025 - 2782 TPD	3	1.Charlas de Seguridad	1 al 31 de diciembre de 2025	31
		2. (Pausas Activas)	1 al 31 de diciembre de 2025	31
		3. Actividad grupal en comunicación asertiva y trabajo en equipo	16 de diciembre de 2025	31
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	2	1. Charlas de seguridad	1 al 31 de diciembre de 2025	69
		2. Simulacro Riesgo Público	5 de diciembre de 2025	53

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Durante el mes de diciembre de 2025 se llevaron a cabo diversas jornadas de capacitación dirigidas a todo el personal de la organización, en cumplimiento del Plan de Trabajo establecido en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).Estas actividades fueron desarrolladas de acuerdo con el cronograma establecido, con el propósito de fortalecer la cultura organizacional en temas de prevención, autocuidado y seguridad laboral, promoviendo así entornos de trabajo saludables, seguros y sostenibles para todos los colaboradores.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el mes de diciembre de 2025, el Contratista presentó el programa de capacitaciones correspondiente a su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Como evidencia del cumplimiento de las actividades formativas, de acuerdo con la cantidad de capacitaciones programadas se ejecutan tres (3) dando así el 100% de cumplimiento, a su vez se menciona que se llevaron a cabo cincuenta y siete (57) charlas diarias de acuerdo con el cronograma de capacitaciones del contrato.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el mes de diciembre del 2025, el Contratista realizó sesenta y nueve (69) charlas que equivalen a los ocho (8) frentes de trabajo activos, no obstante, se da claridad que durante el mes algunas intersecciones no ejecutaron actividades por vencimiento de PMT, como también se menciona que se presentaron diez (10) capacitaciones de las cuales fueron programadas y ejecutadas por el área SST de acuerdo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se alcanzó un 100% de cumplimiento.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD**: Durante el mes de diciembre se ejecutaron las actividades programadas en el cronograma anual de capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), logrando un cumplimiento anual del 100 %. Estas actividades tuvieron como objetivo fortalecer el compromiso con la prevención de riesgos laborales.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Durante el período evaluado, el Contratista adjuntó el plan de intervención y capacitación, donde se realizó el seguimiento y se evidenció que se programaron y ejecutaron cuatro (4) actividades, cumpliendo con el 100% de las actividades programadas durante el mes. Estas incluyeron charlas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), así como simulacros en riesgo público, fortaleciendo las competencias del personal y promoviendo un entorno de trabajo seguro, sin embargo, es de resaltar que en la tabla 6. se registra solo dos (2) actividades, debido a que las dos (2) actividades restantes son las inducciones y capacitaciones específicas como cursos de alturas y manejo defensivo, los soportes de estas actividades se encuentran en las carpetas de los anexos 4 y 5.

  Ver 1 SST\ ANX-04. Actividades SST \1. Capac

1.3.2. Plan de Trabajo

A continuación, se relaciona el resumen de actividades referentes a la ejecución del plan de trabajo del **CONTRATO 2025-2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD,** componente obras civiles, **CONTRATO 2025-2781 - CONSORCIO MOVILIDAD 2025** componente obras civiles, **CONTRATO 2025-2782 - TPD** componente postes **CONTRATO 2025-2783 - YUNEX TRAFFIC 2025** componente eléctrico y equipos.

Tabla 7. SST Resumen plan de trabajo de contratistas

CONTRATO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	Inducción de Ingreso al nuevo personal Capacitación cómo actuar en caso de accidente vial Capacitación en Mantenimiento Preventivo Capacitación en Riesgo Público Revisión documentación Vehículos (Soat, Tecno-mecánica) Revisión Documentación Conductores (licencias, Seguridad Social) Seguimiento uso de EPP/ Dotación Sensibilizaciones SST Realización Pausas Activas Seguimiento recomendaciones médicas exámenes Ocupacionales Reunión mensual del Copasst Reunión Mensual CCL Inspecciones de Seguridad (locativa, equipos de emergencia, EPP, vehículos, motocicletas Verificación pagos de seguridad Social Actualización Indicadores de proceso, estructura, resultado Verificación y acompañamiento SST en Campo.	Actividades Programadas 46 Actividades Ejecutadas 44 Porcentaje Cumplimiento 96%
CONTRATO 2025 - 2780 CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	Actualizar la matriz de requisitos legales. Verificación de aportes financieros al SGSS Reuniones mensuales COPASST Elaboración de actas COCOLA y COPASST Programación de auditorías Inspecciones Herramientas, equipos de emergencia, vehículos, orden y aseo Compra y entrega de EPP Acción de mejora conforme a la revisión por la alta dirección Alimentar indicadores de estructura proceso y resultado	Programadas 26 actividades Ejecutadas 20 actividades Porcentaje cumplimiento 77%
CONTRATO 2025 - 2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	1. Revisión por la Alta Dirección. 2. Socialización y Notificación de riesgos 3. Capacitación de Inducción del SG SST 4. Reunión Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 5. Capacitación en Riesgo Tecnológico (Condiciones Seguridad)" COCOLA PROGRAMADAS EJECUTADAS 6. Realización de exámenes de ingreso. 7. Socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 8. Divulgación de las Políticas Establecidas en la empresa (SST, Política Alcohol, Seguridad Vial) 9. La actualización de la matriz de peligros. 10. Inspecciones de Uso de los EPP" 11. Inspecciones Riesgo Locativo	Programadas 23 actividades Ejecutadas 23 actividades Porcentaje cumplimiento 100%

CONTRATO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	12. Inspecciones de Orden y Aseo 13. Inspecciones de Equipos y Herramientas 14. Capacitación Uso, Almacenamiento y Mantenimiento de EPP. 15. Verificación de ejecución exámenes Ocupacionales 16. Responsabilidades, Autoridad y Rendición de cuentas 17. Divulgaciones de las lecciones Aprendidas 18. Estadística de Ausentismo, incapacidad, accidente laboral. 19. Control de incendios nivel básico 20. Capacitación de Riesgo Biomecánico. 21. Campaña de Orden y Aseo. 22. Capacitación del Curso Manejo Defensivo 23. Auditoría Interna del SG-SST" 24. Mantenimiento preventivo de las herramientas.	
CONTRATO 2025 -2782 TPD	Seguimiento recomendaciones médicas de exámenes de ingreso Asignación y Reposición de EPP Inspecciones de Seguridad (equipos de emergencia, locativas, sustancias químicas, EPP, Herramienta menor) Pausas Activas Capacitación Mensual Prevención de la distracción Reunión mensual Copasst Reunión Mensual CCL Proceso de subsanación hallazgos SST Revisión Licencias de Conducción, Soat, Tecno	Programadas 26 actividades Ejecutadas 24 actividades Porcentaje cumplimiento 92%
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	Seguimiento a la ejecución cronograma de trabajo EHS proyecto Entrega de informes mensuales con los soportes de la gestión EHS Pausas activas Entrega de dotación y/o indumentaria del contrato Entrega de elementos de protección personal Ejecución cronograma de inspecciones Inspección de grúa, vehículo y actividades de operación de grúa y brazo articulado. Verificación de la vigencia de los documentos de los vehículos. Indicadores de accidentalidad (Frecuencia, severidad y ausentismos) Realizar la verificación y programación del personal que realiza actividades de: operación de grúa, manejo defensivo y alturas. Realizar la verificación y programación del personal a exámenes médicos Realizar el seguimiento y programación de las inspecciones anuales de los equipos y herramientas (Alturas, escaleras, grúas) Diligenciamiento de la documentación EHS	Programadas 16 actividades Ejecutadas 16 actividades Porcentaje cumplimiento 100%

CONTRATO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	Inspecciones mensuales de sustancias químicas y kit de derrames Inspección en el sitio de trabajo de los elementos disponibles para atender una emergencia. Preparación y ejecución de simulacros: Alturas, eléctrico, vial, ambiental, público y Distrital	

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

El porcentaje de avance de la ejecución del plan de trabajo anual de los contratistas para el presente periodo se relaciona a continuación:

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Para el periodo del presente informe, se logró un cumplimiento del 96% en la ejecución de las actividades planificadas, del plan de trabajo del SGSST lo que equivale al desarrollo de 44 actividades de las 46 actividades programadas. Estas acciones se encuentran alineadas con el ciclo de mejora continua PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), en concordancia con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El objetivo principal de estas actividades fue fortalecer la cultura de prevención, promover el bienestar laboral y asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Para el periodo del presente informe, se ejecutó el plan de trabajo que contemplaba 26 actividades programadas, de las cuales se completaron 20, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 77% de las actividades del plan de trabajo según lo reportado por el Contratista.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Para el periodo del presente informe, se da cumplimiento al plan de trabajo donde se programaron 23 actividades de las cuales 23 fueron ejecutadas durante el mes de noviembre dando así un porcentaje de cumplimiento del 100%, según lo reportado por el Contratista.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD** Para el periodo del presente informe, la Interventoría llevó a cabo la verificación del cumplimiento en la ejecución de las actividades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme al plan de trabajo previamente aprobado. Como resultado de esta revisión, se evidenció un cumplimiento del 92% del cronograma de actividades. De un total de 26 actividades programadas, se ejecutaron 24 durante el periodo evaluado.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Para el periodo del presente informe, la Interventoría verificó el cumplimiento de la ejecución de 16 actividades SST conforme al plan de trabajo, abarcando la gestión de los programas de riesgo, capacitaciones, permisos de trabajo, análisis de tareas, divulgación de controles preoperacionales, gestión de reportes de seguridad y presentación oportuna de informes a la Interventoría, cumpliendo con el 100% de ejecución para el periodo establecido.
  Ver 1. SST\ ANX-04. Actividades SST \3. Seg_Plan_Trab

1.3.3. Inspecciones SST

A continuación, se presentan las inspecciones realizadas por parte del **CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA** y los contratos que esta tiene a su cargo, así:

Tabla 8. SST Inspecciones Interventoría y contratistas

Contrato	Inspección	Fecha
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	Inspección Equipos de emergencia Inspección EPP Inspección áreas Locativas	Del 1 al 31 de diciembre de 2025
CONTRATO 2025-2780 - CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD	Inspección a extintor Inspección botiquín Inspección orden y aseo Inspección sustancias químicas (anexo 4) Inspección EPP Inspección vehículos (anexo 5) Inspección herramienta y maquinaria (anexo 6)	Del 1 al 31 de diciembre de 2025
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	Inspección a extintor Inspección botiquín inspección camilla inspección EPP Inspección orden y aseo Inspección sustancias químicas (anexo 4) inspección vehículos (anexo 5) inspección Herramienta y maquinara (anexo 6)	Del 1 al 31 de diciembre de 2025
CONTRATO 2025 -2782 TPD	Inspección Equipos de emergencia Inspección Equipos de EPCC Inspección Equipos y Herramientas Inspección E.P.P Inspección de Kit de derrames Inspección de sustancias químicas Inspección de Vehículos Inspecciones Locativas	Del 1 al 31 de diciembre de 2025
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	Inspección de escaleras Inspección de orden y aseo Inspección de Herramientas Inspección de equipos emergencia Inspección de extintores Inspección de EHS en campo	Del 1 al 31 de diciembre de 2025

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Durante el presente período, se elabora el reporte correspondiente a las inspecciones realizadas, de acuerdo con el cronograma establecido. Entre las inspecciones efectuadas se incluyen: inspección de equipos de emergencia, inspección de elementos de protección personal (EPP), inspección de áreas locativas entre otras.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el presente período, se realizaron las actividades que se detallan en el cronograma de inspecciones mensuales adjunto, incluyeron la revisión de extintores, botiquines, camilla, orden y aseo y EPP. Por cada frente de trabajo, las inspecciones de los químicos, los vehículos, maquinaria y herramientas se encuentran en los anexos 4, 5 y 6.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el presente período, se ejecutaron inspecciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos. En el programa de inspecciones abarcó la verificación del estado operativo de extintores, botiquines de primeros auxilios, camilla de emergencia, elementos de protección personal (EPP), en los frentes de obra activos, el Contratista realiza refuerzo de los equipos de emergencia por áreas de trabajo.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD** Durante el presente período se llevaron a cabo inspecciones programadas a herramientas, equipos e instalaciones, con el objetivo de verificar su estado y condiciones de seguridad. Estas actividades incluyeron la revisión de extintores, botiquines de primeros auxilios, elementos de protección personal (EPP), elementos de protección contra caídas (EPCC, escaleras). Asimismo, se evaluaron las condiciones locativas de las áreas de trabajo y el almacenamiento de productos químicos, tanto en los diferentes frentes de obra como en la bodega del Contratista.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Durante el presente período, se verificó que el Contratista realizó las inspecciones mencionadas en la tabla 8, adicionalmente, la Interventoría corroboró la correcta ejecución de estas actividades mediante visitas de supervisión a los diferentes frentes de trabajo, garantizando así el adecuado monitoreo de las condiciones laborales, por lo cual se cumple el 100% de las inspecciones programadas.

  Ver 1 SST\ ANX-04. Actividades STT \4. Inspec

1.3.4. Elementos de Protección Personal y Dotación

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA: Durante** el período correspondiente a este informe, se realizó la entrega de la dotación y de los Elementos de Protección Personal (EPP) al personal que ingresó a ejecutar actividades en el marco del contrato. Asimismo, se efectuó la entrega de la dotación legal de calzado y vestido correspondiente al mes de diciembre, de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. De igual manera, se realizó seguimiento al uso adecuado de la dotación institucional o corporativa y de los EPP, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista dio cumplimiento a la obligación de suministrar reposición de EPP al

personal del contrato, realizando la asignación conforme al análisis de riesgos ocupacionales y perfil del cargo. Esta gestión garantiza las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo óptimo de las labores del proyecto, manteniendo trazabilidad del proceso a través de actas de entrega individuales y debidamente firmadas.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** correspondiente al presente informe, se realizó la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP), al personal que ingresó en el periodo, de acuerdo con el perfil de cargo de cada trabajador, Los registros que evidencian estas entregas se adjuntan como anexo al informe actual, lo que permite confirmar el cumplimiento de este compromiso relacionado con la seguridad en el trabajo, queda pendiente la entrega de dotación de un personal del consorcio según la profesional SST del contratista dichas entregas se realizarán en enero.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD** Durante el período del presente informe, el contratista realizó la entrega y reposición de los Elementos de Protección Personal (EPP) al personal, de acuerdo con las funciones desempeñadas, los riesgos asociados a cada actividad y la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista realizó la entrega obligatoria de los equipos de protección personal (EPP) y la dotación a su personal, conforme a los requisitos establecidos en la legislación actual. Los registros que evidencian estas entregas se adjuntan como anexo al informe actual, lo que permite confirmar el cumplimiento de este compromiso relacionado con la seguridad en el trabajo. Así mismo, a las tres (3) personas que ingresaron se les realiza la entrega de la dotación correspondiente, los soportes de estas se encuentran en la carpeta de ingresos.

Ver 1 SST\ ANX-04. Actividades SST \5. Ent EPP y Dot

1.4. Informe de accidentes e incidentes de trabajo

En cumplimiento de la Resolución 1401 de 2007, se debe registrar y notificar los accidentes e incidentes de trabajo que se presenten en la ejecución del contrato. Los trabajadores afectados deben reportar inmediatamente el accidente o incidente de cualquier tipo a su jefe inmediato, o al área SST- Ambiental.

Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA: Durante este periodo no se presentaron accidentes ni accidentes de trabajo.

Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD: El día 2 de diciembre de 2025 se presentó un accidente laboral del señor Yeray Montalvo en la Transversal 42 x Calle 4ª Ext. 2185. El trabajador se encontraba realizando trasiego de bordillos con carretilla cuando, al cruzar la avenida, realizó la señal de "Pare" a un vehículo que circulaba por la vía; sin embargo, el conductor hizo caso omiso y lo impactó. Como consecuencia de la caída, el trabajador se

golpeó con la carretilla que transportaba. Se realizó el reporte inmediato ante la ARL para evaluación médica, la cual determinó que no era necesaria incapacidad laboral. Se adjunta el Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo (FURAT) y el informe de investigación del accidente.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Para el presente periodo se presentó un accidente de trabajo, ocurrido el 03 de diciembre, en el cual se vio involucrado un trabajador del subcontratista VYP. El evento se presentó en la AK 14i x CL 84 sur Ext: 3121, donde el señor Keifrer Cuadros se encontraba realizando labores con un porro y se golpeó el dedo del pie derecho generando una fractura leve, generando una incapacidad de 15 días, Se adjuntan el Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo (FURAT) y el informe de investigación del accidente

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Durante este periodo no se presentó accidentes de trabajo, se presentó un incidente con daños materiales a vehículo de la empresa

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Durante este periodo no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo.

Tabla 9. SST Relación de personal accidentado en el periodo

CONTRATO	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	SEGUIMIENTO
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD	Fontalvo Yeray	1023971637	Ayudante de obra	Investigación accidente
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	Cuadros Keifrer	1232409462	Ayudante de obra	Investigación accidente
CONTRATO 2025 -2782 TPD	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

A continuación, se presenta un resumen de los indicadores de accidentalidad durante el periodo de ejecución correspondiente al presente informe:

Tabla 10. SST Indicadores de accidentalidad

n.° CONTRATO	n.° DE EMPLEADOS CONTRATISTA	n.° DE PERSONAS ACCIDENTADAS	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD	41	0	0	0	0
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD	74	1	0	0	0
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	68	1	0	0	0
CONTRATO 2025 -2782 TPD	31	0	0	0	0
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	172	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Ver 1 SST\ ANX-04. Actividades SST \6. Accidentalidad

1.5. Certificados de alturas

En cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021, por la cual establece los requisitos de seguridad para el desarrollo de trabajos en alturas, se deben mencionar todas las actividades y certificados de alto riesgo que se ejecutaron del 1 al 31 de diciembre.

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Durante este periodo, el personal de Interventoría con la competencia laboral de jefe de área llevó a cabo la supervisión y el acompañamiento de las actividades en alturas ejecutadas por el personal Contratista**.** Esta labor incluyó la verificación del cumplimiento de los protocolos de seguridad, el uso adecuado de los equipos de protección personal (EPP) y la correcta ejecución de los procedimientos establecidos. El objetivo principal fue garantizar la integridad física de los trabajadores y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de trabajo seguro en alturas.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante este periodo se ejecutaron permisos en caliente para actividades con uso de pulidora teniendo en cuenta que dichos trabajos se identifican como trabajos de alto riesgo, como también se realizan Análisis

de Trabajo Seguro en todas las actividades de los frentes de trabajo del contrato, además se presenta los certificados de alturas de los oficiales, inspector, tecnólogos y profesional SST de acuerdo con el anexo técnico.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante este período, Se realizaron diecinueve (19) Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para todas las actividades desarrolladas en los frentes de trabajo del contrato, y seis (6) permisos de trabajo en caliente debido al uso de pulidora, se presentan los certificados de alturas de los oficiales, profesional, tecnólogo e inspectores de los subcontratistas SST.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Durante este periodo se llevaron a cabo actividades TAR, en las cuales se diligenciaron los respectivos formatos y permisos requeridos, tales como: Análisis de Trabajo Seguro (ATS), Permiso de trabajo respectivos, para trabajos en alturas, trabajos en caliente, e izaje de cargas. Previamente a la ejecución de cada actividad, se realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normativa vigente, con el objetivo de garantizar condiciones seguras de trabajo, promover el autocuidado y prevenir accidentes.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Durante este periodo, el Contratista reportó cuatro (4) reentrenamientos y dos (2) coordinadores para trabajos en altura, así mismo se adjunta el seguimiento de cursos de alturas del personal del contrato, permisos de trabajo en alturas, permiso de trabajo con corriente eléctrica, permiso de trabajo en caliente, inspección preoperacional de equipos y los ATS del periodo correspondiente.

  Ver 1. SST\ ANX-04. Actividades SST \7. Tareas de alto Riesgo

1.6. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (copasst)

El COPASST, tiene como objetivo promover la prevención y la gestión de riesgos laborales, mejorando las condiciones de trabajo, por tal motivo se debe reflejar el seguimiento mensual.

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Durante el presente período se llevó a cabo la reunión mensual del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), realizada el día 29 de diciembre de 2025, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 2013 de 1986 y el Decreto 1072 de 2015. En el desarrollo de la reunión se abordaron los siguientes temas: rendición de cuentas, presentación del balance de las actividades ejecutadas durante el año, revisión y análisis de los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), seguimiento a los compromisos adquiridos, y la planificación del próximo período, incluyendo la programación de capacitaciones y auditorías. Finalmente, se realizó la elaboración y aprobación del acta correspondiente.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Para el presente período el día 19 de diciembre se llevó a cabo la reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) por parte del Contratista, donde se abordaron temas significativos

relacionados con la gestión de SST de la organización, los cuales se encuentran dentro del (SG-SST), se establecieron compromisos específicos.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Para el presente período el día 22 de diciembre se llevó a cabo la reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), en la cual el Contratista presentó los temas más relevantes relacionados con la mejora continua de los hallazgos identificados semanalmente por la Interventoría, y el accidente presentado el 3 de diciembre, de acuerdo con esto se establecen compromisos específicos para su implementación.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025: para** el presente período se llevó a cabo la reunión mensual del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), realizada el día 30 de diciembre de 2025. En esta sesión se abordaron temas de gran relevancia para la organización, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Entre los principales puntos tratados se destacó la revisión de los indicadores de accidentalidad, así como el análisis del desempeño general del SG-SST. Adicionalmente, se realizó la planificación del próximo período, que incluyó la programación de capacitaciones y auditorías.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** El 18 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) por parte del Contratista, durante la cual se abordaron temas significativos relacionados con la gestión de SST de la organización y se establecieron compromisos específicos de condiciones inseguras.

Tabla 11. SST comités COPASST

n.° CONTRATO	Fecha acta COPASST
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	29/12/2025
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD	19/12/2025
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	22/12/2025
CONTRATO 2025 -2782 TPD	30/12/2025
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	18/12/2025

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Ver 1. SST\ ANX-04. Actividades SST \8. COPASST

1.7. Clasificación y etiquetado de sustancias químicas

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el mes de diciembre, el contratista realizó la gestión de cumplimiento para el manejo de productos químicos en los frentes de obra. Esta gestión incluyó la verificación del etiquetado correcto, la disponibilidad de hojas de seguridad actualizadas, la elaboración de una matriz de compatibilidad química y la actualización del listado de productos químicos presentes en cada frente de obra. Adicionalmente, se realizó la rotulación adecuada de los vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas y se verificó la validez del certificado de capacitación del conductor.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el mes de diciembre de 2025, la Contratista adjunta matriz de compatibilidad de químicos, hojas de seguridad actualizadas, e inspección de kit de derrames, Asimismo, se evidenció la disposición temporal de las bolsas de cemento vacías en la bodega.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Durante el mes de diciembre de 2025 se realizó el seguimiento al cierre y al cumplimiento de las acciones correctivas, orientadas a eliminar la causa raíz de los hallazgos relacionados con el manejo de productos químicos, específicamente en aspectos de rotulación y disponibilidad de hojas de seguridad, de acuerdo con los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Durante el mes de diciembre de 2025, la Interventoría verificó el adecuado almacenamiento de sustancias químicas tanto en los frentes de trabajo como en la bodega.

  El Contratista Indica que, las hojas de seguridad han sido migradas a formato digital y se encuentran cargadas en el repositorio digital del canal de WhatsApp de Yunex, Siguiendo los principios corporativos de la compañía y dando cumplimiento a nuestra Política de gestión integrada, donde *"promovemos el cuidado del medio ambiente, impulsando el uso eficiente de la energía y los recursos naturales…",* por lo tanto, para el mes de diciembre se revisó en campo y se evidenció que los trabajadores si conocen el manejo del canal de WhatsApp y la búsqueda de las hojas de seguridad.

  Ver 1 SST\ ANX-04. Actividades SST \9. Relación químicos

1.8. Vehículos, equipos y maquinaria

1.8.1. Listado de vehículos

En cumplimiento a los requerimientos contractuales, se adjunta el consolidado de vehículos de todos los contratos:

Tabla 12. SST Consolidado Vehículos

Contrato	Vehículos	Motos	Grúas	Camionetas Tipo platón	Camiones	Total
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	16	7	0	0	0	23
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD	0	0	0	1	1	2
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	0	0	0	0	2	2
CONTRATO 2025 -2782 TPD	1	0	3	0	0	4
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	29	4	13	0	0	46

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

1.8.2. Inspecciones e inventario de vehículos

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Para este periodo Se adjunta un archivo en formato Excel que contiene los datos actualizados correspondientes a dieciséis (16) vehículos, siete (7) motocicletas disponibles durante el mes de diciembre. Asimismo, se incluye la información de los operadores o conductores asignados a cada uno de dichos vehículos, así como las inspecciones de vehículos y motocicletas**.**

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el mes de diciembre, el consorcio reportó dos vehículos en cumplimiento del anexo técnico del contrato: un camión con placa WPP 343, destinados al traslado de material, y una camioneta tipo platón de placa JXR814 para traslado de personal administrativo, el contratista reporta un mantenimiento preventivo del vehículo WPP 343 realizado el 12 de diciembre.

  A su vez se adjuntan los documentos del vehículo del subcontratista PH ingeniería de placas USD690 como apoyo al contrato donde se evidencia el cumplimiento de sus preoperacionales y mantenimientos.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Para el mes de diciembre, el Contratista reportó dos vehículos aprobados en cumplimiento del anexo técnico del contrato: dos camiones con placa KYP 683 y JKU 690, Del mismo modo se cuenta con la inspección preoperacional de los vehículos y la inspección mensual de cada uno de ellos, sin embargo, no se le realizaron mantenimientos preventivo o correctivos a ninguno de los vehículos en el presente mes queda programado un mantenimiento para el mes de enero del vehículo JKU690.

Para el presente mes el subcontratista PH realizó actividades con el vehículo USD 690 como apoyo al contrato donde se evidencia el cumplimiento de sus prácticas preoperacionales.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** para este periodo Se adjunta un archivo en formato Excel que contiene los datos actualizados correspondientes a los cuatro (4) vehículos utilizados durante este periodo para el desarrollo de las actividades. Asimismo, se incluye la información de los operadores o conductores asignados e inspecciones de cada uno de dichos vehículos,

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Para este periodo, se anexa las inspecciones preoperacionales de vehículos de diciembre de 2025. Así mismo, durante este periodo se realizó las actualizaciones documentales de los siguientes vehículos y personas:

  - Técnico mecánico: GPM 353, QXR 38E
  - SOAT: GPM 347. GPM 353, JQB 58E, QXR 38E
  - Pluma articulada: GLM 857, GPM 347, GPM 353
  - Mantenimientos: FON 455
  - Licencia de conducción: Erlendy Cruz, Ricardo Chía, William Morales, Jonathan Rodriguez
  - Curso de manejo defensivo: 5 trabajadores

  Igualmente, se adjunta documento en Excel donde se registran los datos actualizados de los vehículos y la tabla con el personal autorizado para conducción del periodo del 1 al 30 de diciembre de 2025.

  Ver 1. SST\ANX-05. Documentos Vehículos

1.8.3. Relación de los equipos y/o maquinaria

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el mes reportado, se presentaron las fichas técnicas, hojas de vida y formatos preoperacionales de las herramientas eléctricas y maquinaria del subcontratista PH Ingeniería (equipos 7x14, JT2720, y mini retroexcavadora), los cuales se encuentran en buenas condiciones, no se realizó mantenimiento a dicha maquinaría.

  Se realizó mantenimiento a la planta eléctrica ELITE 2G80. La maquinaria aprobada no requirió mantenimiento durante este periodo. Se verificó que todos los equipos se encuentren en buen estado y con funcionamiento óptimo.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el mes reportado, se ejecutaron actividades en los frentes de trabajo del contrato. De esta manera, el Contratista presentó las herramientas eléctricas y maquinaria del subcontratista, incluyendo las inspecciones realizadas,

a su vez se menciona que no se realizaron mantenimientos a herramienta y equipos del contrato; para el presente periodo no se realizó uso de maquinaria del subcontratista PH Ingeniería.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Durante el mes reportado, se documentaron y utilizaron diversos equipos y herramientas fundamentales para el desarrollo de las actividades programadas y ejecutadas garantizando la protección del personal y la mitigación efectiva de riesgos.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** La Interventoría verificó la documentación técnica de los equipos menores empleados (estibador, taladro, pulidora, equipo de soldar y motosoldador), incluyendo su correspondiente cronograma de inspecciones y hojas de vida. Durante el mes de diciembre se verificaron las inspecciones preoperacionales requeridas para los equipos empleados en las labores ejecutadas, dando cumplimiento a los estándares de seguridad industrial vigente.

Ver 1. SST\ANX-06. Equipo y Maquinaria

1.9. Acompañamiento SST Interventoría en labores en campo

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD: Para el presente mes** no se presentaron ingresos de personal al contrato se cuenta con un total de 28 personas directas para el contrato.
  Durante las verificaciones realizadas por la Interventoría en campo, se evidenciaron los siguientes hallazgos reiterativos en cuanto a:

  - Se evidencian cerramientos en condiciones deficientes, hallazgo reiterativo
  - No se evidencian equipos de emergencia, señalización SST y de condiciones inseguras en los frentes de trabajo, como tampoco cartelera.
  - Se evidencia personal subcontratista PH ingeniería sin dotación del contrato
  - Se deben dejar en óptimas condiciones de orden y aseo los frentes de trabajo donde no hay labores.

  La interventoría ha remitido estos hallazgos al contratista mediante comunicados oficiales enviados cada viernes para su atención y corrección. Si bien los hallazgos han sido subsanados dentro de los plazos establecidos, se identificó que algunos de ellos continúan siendo reiterativos. Por esta razón, se trasladarán al área de calidad con el fin de garantizar los cierres oportunos y definitivos.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Para el mes de diciembre, la Interventoría registró la aprobación de 3 hojas de vida donde se verificaron afiliaciones de seguridad social, entrega de EPP, inducciones y EMO. A la fecha el contratista cuenta con un total de 68 personas asignadas para el contrato.
  Durante las verificaciones realizadas por la Interventoría en campo, se evidenciaron los siguientes hallazgos reiterativos en cuanto a:

- Se siguen evidenciando cerramientos en todos los frentes de trabajo en malas condiciones
- Se evidencia a la fecha personal sin logos de cascos y barbuquejos.
- Se evidencia personal subcontratista PH ingeniería sin dotación del contrato
- Se evidencia la señalización alusiva SST como tampoco de las condiciones inseguras y del material.
- Se evidencian frentes de trabajo donde no hay labores de trabajo en pésimas condiciones de desorden y basura.

La Interventoría remitió estos hallazgos al contratista mediante comunicados semanales todos los viernes. Sin embargo, el Consorcio Movilidad 2025 no ha subsanado oportunamente los hallazgos dentro de los plazos establecidos. En consecuencia, el 11 de diciembre de 2025 se realizó una mesa de trabajo con la participación del área de calidad de la interventoría y los profesionales de calidad y SST del contratista, en la cual se revisaron los hallazgos reiterativos que permanecen sin subsanar a la fecha. Durante esta reunión se establecieron compromisos de acciones de mejora con el contratista, incluyendo fechas límite específicas para su cumplimiento: el 18 de diciembre de 2025 para la entrega parcial de las subsanaciones, y el 26 de diciembre de 2025 para la subsanación completa de todos los hallazgos reportados.

Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.-2025: Durante el período del presente informe se llevó a cabo un acompañamiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), enfocado en el desarrollo de actividades preventivas, correctivas y de atención a emergencias. Este acompañamiento incluyó la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de SST, con especial atención en tareas de alto riesgo, tales como: Trabajo en alturas, Trabajos eléctricos, Izaje de cargas, Otras actividades críticas, El objetivo principal de esta labor fue garantizar la seguridad del personal involucrado en dichas actividades.
Se realiza aprobación de hoja de vida de conductor de grúa mediante comunicados SEM-CMC-TPD- 070-25 con radicado ORFEO 202500001379172 del 17/12/2025

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** El 16 de diciembre del 2025 se realizó reunión con Yunex Traffic, en donde se registraron compromisos referentes a Programa de izaje de cargas, lavado de equipos de alturas y las mamparas que se usan para trabajos en caliente y cambio de los protectores respiratorios de los kits de derrames, se anexa el acta.

  El 16 de diciembre del 2025, la Interventoría realizó inventario de las grúas y camionetas, donde no se identificó algún hallazgo. Así mismo, ese día se realizó la revisión y verificación de la bodega de la Contratista ubicada en el parque empresarial Puerta del Sol, donde no se identificó ningún hallazgo.

  Igualmente, de las 43 verificaciones de campo realizadas en el periodo del 1 al 31 de diciembre, se identificaron 7 hallazgos por los logos en los cascos, elementos faltantes o mal estado en los

kits de derrames, entre otros, los cuales se informaron mediante correo electrónico y así mismo, fueron subsanados en su totalidad por el Profesional EHS del Contratista.

Ver 1. SST\ANX-07. Verificación en Campo Interventoría


Tabla 13. SST Relación inspecciones SST

CONTRATISTAS	PERIODO	CANTIDAD DE VISITAS
CONTRATO 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD	1 al 7 de diciembre de 2025	29
	8 al 14 de diciembre de 2025	15
	15 al 21 de diciembre de 2025	13
	22 al 28 diciembre de 2025	14
	29 al 31 diciembre de 2025	10
CONTRATO 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	1 al 7 de diciembre de 2025	21
	8 al 14 de diciembre de 2025	38
	15 al 21 de diciembre de 2025	32
	22 al 28 diciembre de 2025	14
	29 al 31 diciembre de 2025	5
CONTRATO 2025 -2782 TPD	1 al 7 de diciembre de 2025	3
	8 al 14 de diciembre de 2025	1
	15 al 21 de diciembre de 2025	5
	22 al 28 diciembre de 2025	2
	29 al 31 diciembre de 2025	1
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	1 al 7 de diciembre de 2025	13
	8 al 14 de diciembre de 2025	8
	15 al 21 de diciembre de 2025	12
	22 al 28 diciembre de 2025	7
	29 al 31 diciembre de 2025	3

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

A continuación, se registra evidencia fotográfica de las verificaciones en campo realizadas por parte de la Interventoría:

Tabla 14. SST Registro fotográfico SST

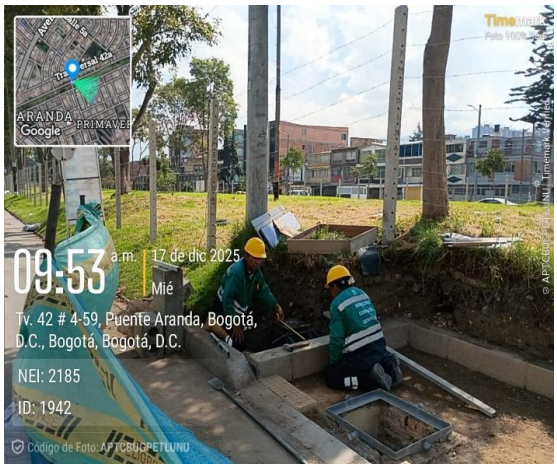S.G. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO FOTOGRÁFICO	
 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD Fecha: 17/12/25 Dirección: Tv 42 x Cl 4a NEI: 2185 ID: 1942	 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD Fecha: 12/12/2025 Dirección: Tv 42 x Cl 4a NEI:2185 ID:1942
S.G. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO FOTOGRÁFICO	
 CONSORCIO MOVILIDAD 2025 Fecha: 10/12/2025 Dirección: Tv 60 x Dg 70 sur NEI: 3122 ID:1922	 CONSORCIO MOVILIDAD 2025 Fecha: 16/12/2025 Dirección: AK 72 X Cl 9 NEI:2393 ID:819

S.G. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO FOTOGRÁFICO




TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA
Fecha: 23/12/2025 Dirección: Cl 75 con AK 7
EXT: 1008 ID:135



TRANPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA
Fecha: 23/12/2025 Dirección: Cl 75 con AK 7
EXT: 1008 ID:135

S.G. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO FOTOGRÁFICO

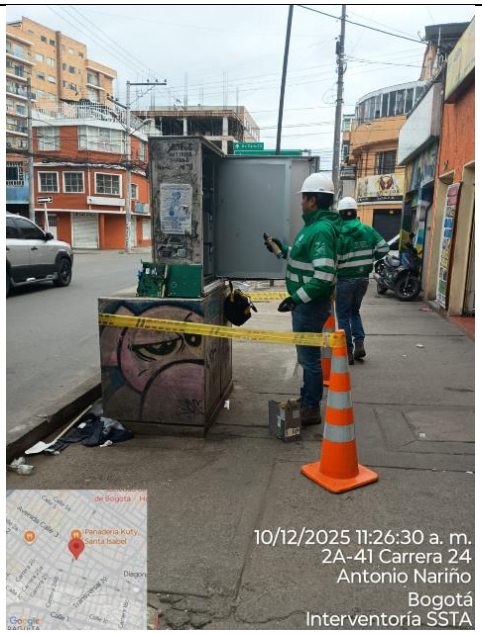

YUNEX TRAFFIC 2025
Fecha: 10/12/2025 Dirección: KR 24 X CL 3
EXT: 3426 ID: 634



YUNEX TRAFFIC 2025
Fecha: 18/12/2025 Dirección: KR 19 X AC 45
EXT: 2137 ID:407

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

1.10. Actas de socialización

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** En el presente periodo las actas de socialización anexas al presente informe corresponden a los frentes de trabajo que ejecutaron actividades durante diciembre. Se aclara que estas actas se generan al momento de iniciar operaciones en cada frente y no tienen periodicidad mensual.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** En el presente informe se relacionan las actas de socialización de los frentes de trabajo donde se ejecutaron actividades durante el mes. Es importante aclarar que las actas de socialización se elaboran únicamente al inicio de la ejecución en cada frente de trabajo y no de manera mensual. Por lo anterior, se presentan las actas correspondientes a los frentes de trabajo que estuvieron en ejecución durante el mes de diciembre.

Tabla 15. SST Actas de socialización contratistas obras civiles

n.° de CONTRATO	DIRECCIÓN	ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE OBRA
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	Cr 57 x Cll 3 NEI 3410-ID 772	Actividad iniciada en noviembre de 2025
	AK 19 x Cll 134 NEI 1302- ID 79	Actividad iniciada en octubre de 2025
	av. Cali x Cl 23 NEI 2843-ID 797	Inicio de actividad en octubre de 2025
	AK 101 x Cl 72 NEI 1564- ID 760	Inicio de actividad en octubre de 2025
	TV 42 x Cl 4 NEI 185-ID 142	Inicio de actividad en octubre de 2025
	Ak 50 x Cl 4f NEI 2950 – ID 742	Inicio de actividad en noviembre de 2025
	Ak x 50 A 8c sur NEI 3664- ID 767	Inicio de actividad en noviembre de 2025
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	KR 79 x CL 38C sur NEI 3454 ID 887	Socialización realizada el día 22 de julio de 2025
	AK 72 X Cl 9 NEI 2393 ID 819	Socialización realizada el día 25 de julio de 2025
	KR 80 x CLL 38 C SUR NEI 3873 ID 1168	Socialización realizada el día 09 de julio de 2025
	KR 14I x Cl 84 SUR NEI 3121 ID 1921	Socialización realizada el día 18 de julio de 2025
	KR 72 x Cl 9 NEI 2393 ID 819	Socialización realizada el día 25 de julio de 2025
	TV 60 x DG 70 SUR NEI 3122 ID 1922	Socialización realizada el día 25 de julio de 2025
	Kr 61G X Cl 67b NEI 3119 ID 1919	Socialización realizada el día 18 de diciembre de 2025
	KR 46ª AC 68 SUR NEI 3928 ID 1900	Socialización realizada el día 08 de septiembre de 2025

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Se aclara que para los contratos **2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO DE INGENIERÍA S.A.S**, y **2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025,** no se requiere este compromiso de actas de socialización. De acuerdo con lo anterior no se presentan evidencias en el anexo.

Ver 1. SST\ANX-08. Actas soc.

1.11. Gestión Ambiental

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Durante el periodo del presente informe se llevó a cabo sensibilización ambiental sobre “La ruta del reciclaje empieza aquí” en donde participó todo el personal operativo y administrativo.

1.11.1. Pin ambiental ante la SDA

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Para el contrato se asigna el Pin Ambiental n.° 27327 cuyo nombre del proyecto quedó registrado “CONTRATO n.° 2025-2780 DE 2025- SEMAFORIZACIÓN LOTE 1", allí se cargará toda la información correspondiente a la gestión de los RCD´S. De acuerdo con lo anterior, el día 17 de diciembre del 2025 se realizó el cargue de las certificaciones pendientes de la compra de material correspondiente a los meses de agosto y septiembre, así mismo se ejecutó el cargue mensual de RCD correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2025. Por otro lado, el día 26 de diciembre de 2025 se desarrolla revisión y ajuste a los reportes de RCD correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Como evidencia se anexan las actas correspondientes.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Para el contrato se asigna el Pin Ambiental n.° 27328, con nombre de proyecto registrado "CONTRATO 2025-2781 LOTE 2 ZONA SUR", en el cual se cargará toda la información relacionada con la gestión de los RCD´S. De acuerdo con lo anterior, el día 17 de diciembre de 2025 se ejecutó el cargue mensual de RCD correspondiente a los meses de septiembre y octubre, de igual manera, el día 23 de diciembre de 2025 se realizó el cargue mensual correspondiente al mes de noviembre. Por último, el día 24 de diciembre de 2025 se desarrolla revisión y ajuste a los reportes de RCD de los meses de mayo, junio, julio y agosto. Como evidencia se anexan las actas correspondientes.

1.11.2. Manejo de la vegetación

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD**: Durante el periodo del presente informe, el Contratista realiza la respectiva protección de los individuos arbóreos ubicados en las intersecciones en las cuales se encuentran realizando actividades:

Tabla 16. Manejo de vegetación contrato 2025-2780

DIRECCIÓN	CANTIDAD DE INDIVIDUOS ARBÓREOS PROTEGIDOS
AK 19 X CLL 134 EXT_1302 ID_79	6 árboles
KR 101 X AC 72 EXT_1564 ID_760	4 árboles
TV 42 X CLL 4ª EXT_2185 ID_1942	9 árboles
AK 50 X CLL 4F EXT_2950 ID_742	3 árboles
AK 50 X CLL 8 SUR EXT_3664 ID_767	3 árboles
KR 56 X CLL 3 EXT_3410 ID_772	0 árboles

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista realiza la protección a los individuos arbóreos encontrados en cada una de las intersecciones en donde están ejecutando actividades. Sin embargo, en donde han terminado actividades, el Contratista presenta el registro fotográfico donde ya no aplica la protección de estos individuos.

Tabla 17. Manejo de vegetación contrato 2025-2781

DIRECCIÓN	CANTIDAD DE INDIVIDUOS ARBÓREOS PROTEGIDOS
AK 79 X CL 38C SUR EXT_3454 ID_887	5 árboles
AK 80 X CL 38C SUR EXT_3873 ID_1168	4 árboles
AK 78K X CL 38C SUR EXT_ 3457 ID_ 881	6 árboles
KR 14 I X CL 84 SUR EXT_ 3121 ID_1921	22 árboles
TV 60 X DG 70 SUR EXT_3122 ID_1922	0 árboles
AV BOYACA (AK 72) X CL 9 EXT_ 2393 ID_819	1 árbol
KR 46ª X AC 68 SUR EXT_3928 ID_1900	6 árboles
KR 72 J X CL 45 SUR EXT_3816 ID_867	2 árboles
KR 61 G X CL67 B SUR EXT_3119 ID_1919	0 árboles

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

1.11.3. Manejo de cuerpos de agua y sumideros

1.11.3.1. Alquiler y/o convenio de baños

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista realizó los respectivos convenios del uso de baño para sus trabajadores garantizando las condiciones sanitarias mínimas de higiene para el uso de estos.

Tabla 18. Convenio de baños contrato 2025-2780

DIRECCIÓN	CONVENIO DE BAÑO
AK 19 X CLL 134 EXT_1302 ID_79	Se adjunta acuerdo de baño
KR 101 X AC 72 EXT_1564 ID_760	Se adjunta acuerdo de baño
TV 42 X CLL 4ª EXT_2185 ID_1942	Se adjunta acuerdo de baño
AK 50 X CLL 4F EXT_2950 ID_742	Se adjunta acuerdo de baño
AK 50 X CLL 8 SUR EXT_3664 ID_767	Se adjunta acuerdo de baño
KR 56 X CLL 3 EXT_3410 ID_772	Se adjunta acuerdo de baño

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista presenta los acuerdos de baño con el fin que el personal pueda hacer uso del servicio de baño cerca de las áreas de trabajo, garantizando las condiciones mínimas de higiene.

Tabla 19. Convenio de baños contrato 2025-2781

DIRECCIÓN	CONVENIO DE BAÑO
AK 79 X CL 38C SUR EXT_3454 ID_887 AK 80 X CL 38C SUR EXT_3873 ID_1168 AK 78K X CL 38C SUR EXT_ 3457 ID_ 881	Se adjunta acuerdo de baño
KR 14 I X CL 84 SUR EXT_ 3121 ID_1921	Se adjunta acuerdo de baño
TV 60 X DG 70 SUR EXT_3122 ID_1922	Se adjunta acuerdo de baño
AV BOYACA (AK 72) X CL 9 EXT_ 2393 ID_819	Se adjunta acuerdo de baño
KR 46ª X AC 68 SUR EXT_3928 ID_1900	Se adjunta acuerdo de baño
KR 72J X CL 45 SUR EXT_3816 ID_867	Se adjunta acuerdo de baño
KR 61 G X CL67 B SUR EXT_3119 ID_1919	Se adjunta acuerdo de baño

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

1.11.3.2. Protección a sumideros

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista realizó los cerramientos correspondientes a cada una de las áreas intervenidas, así como la protección de los sumideros cercanos a los frentes de trabajo.

Tabla 20. Protección sumideros 2025-2780

DIRECCIÓN	CANTIDAD DE SUMIDEROS PROTEGIDOS
AK 19 X CLL 134 EXT_1302 ID_79	5 sumideros
KR 101 X AC 72 EXT_1564 ID_760	5 sumideros
TV 42 X CLL 4ª EXT_2185 ID_1942	5 sumideros
AK 50 X CLL 4F EXT_2950 ID_742	1 sumideros
AK 50 X CLL 8 SUR EXT_3664 ID_767	2 sumideros
KR 56 X CLL 3 EXT_3410 ID_772	0 sumideros

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista reporta la protección de los sumideros presentes en las intersecciones, así como el cerramiento de las zonas de trabajo. Sin embargo, en donde han terminado actividades, el Contratista presenta el registro fotográfico donde ya no aplica la protección de estos.

Tabla 21. Protección de sumideros contrato 2025-2781

DIRECCIÓN	CANTIDAD DE SUMIDEROS PROTEGIDOS
AK 79 X CL 38C SUR EXT_3454 ID_887	4 sumideros
AK 80 X CL 38C SUR EXT_3873 ID_1168	5 sumideros
AK 78K X CL 38C SUR EXT_ 3457 ID_ 881	5 sumideros
KR 14 I X CL 84 SUR EXT_ 3121 ID_1921	0 sumideros
TV 60 X DG 70 SUR EXT_3122 ID_1922	5 sumideros
AV BOYACA (AK 72) X CL 9 EXT_ 2393 ID_819	2 sumideros
KR 46ª X AC 68 SUR EXT_3928 ID_1900	0 sumideros
KR 72J X CL 45 SUR EXT_3816 ID_867	1 sumidero
KR 61 G X CL67 B SUR EXT_3119 ID_1919	0 sumideros

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

1.11.4. Manejo de residuos de construcción y demolición RCD

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista en cumplimiento con el Decreto 507 de 2023 adjuntan los vales de transporte de RCD expedidos durante el mes, los cuales fueron entregados a las plantas de Maquinas Amarillas S.A.S, Eco Desarrollo e ingeniería S.A.S, Cemex y Reciclados industriales de Colombia S.AS. Por lo anterior, se anexan los respectivos certificados; así mismo los certificados pendientes de los RCD´S generados en el mes de noviembre.

Tabla 22. Consolidado RCD contrato 2025-2780

CONSOLIDADO RCD- PIN 27327 CONTRATO 2025-2780							
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD							
MES	% APROV. EN EL MES	MATERIAL APROV. EN TONELADA	MATERIAL INSTALADO NUEVO EN OBRA EN EL MES Ton	GESTOR	RCD DISPUESTO (VALES DE DISPOSICIÓN) Ton	RCD POR CERTIFICAR Ton	RCD REAL CERTIFICADO Ton
Diciembre	44%	42,92	61,15	Maquinas Amarillas Ecodesarrollo e Ingeniería Cemex Reciclados Industriales	311,63	311,63	262,41

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista en cumplimiento con el Decreto 507 de 2023 adjuntan los vales de transporte de RCD expedidos durante el mes, los cuales fueron entregados a las plantas de Greco S.A.S, Cemex, Máquinas amarillas y Eco Desarrollo e ingeniería S.A.S. Por lo anterior, se anexan los respectivos certificados; así mismo los certificados pendientes de los RCD´S generados en el mes de noviembre de San José Green Group y Eco Desarrollo e ingeniería S.A.S.

Tabla 23. Consolidado RCD contrato 2025-2781

CONSOLIDADO RCD- PIN 27328 CONTRATO 2025-2781							
CONSORCIO MOVILIDAD 2025							
MES	% APROV. EN EL MES	MATERIAL APROV. EN TONELADA	MATERIAL INSTALADO NUEVO EN OBRA EN EL MES Ton	GESTOR	RCD DISPUESTO (VALES DE DISPOSICIÓN) Ton	RCD POR CERTIFICAR Ton	RCD REAL CERTIFICADO Ton
Diciembre	49%	12	250	Ecodesarrollo e Ingeniería Cemex Greco Sas Máquinas Amarillas	107,8	107,8	86,40

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista realizó actividad ambiental sobre varias temáticas ambientales de acuerdo con los programas plasmados en el PIGA. Por otro lado, el día 22 de diciembre 2025 se desarrolló inspección a la bodega con el fin de validar la gestión ambiental ejecutada por el Contratista, durante la inspección se encontró en buenas condiciones la protección de los individuos arbóreos, uso adecuado de los puntos ecológicos, disposición

adecuada de colillas de soldadura en su recipiente metálico, separación de cartón, residuos especiales en el acopio temporal.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista desarrolló capacitación sobre la aplicación de enmienda al cambio climático. Además, realizó las inspecciones mensuales de baños, cafetería, oficinas, inspección de residuos, inspección de químicos, generación y clasificación de residuos sólidos. Adicionalmente, el día 16 de diciembre del 2025 se realizó inspección a la bodega con el fin de validar la gestión ambiental ejecutada por el Contratista, durante la inspección se evidenció todo en buenas condiciones con relación al uso adecuado de los puntos ecológicos, almacenamiento de sustancias químicas y residuos.

  Ver 1. SST\ANX_09. Sistema de Gestión Ambiental

  1.12. Verificación de las condiciones de salubridad de las instalaciones de bodega y servicios de higiene correspondientes, de los espacios asignados a la ejecución del contrato, acorde a la normatividad vigente

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Para el presente periodo el día 12 de diciembre interventoría realizó la verificación a la bodega asignada al contrato donde se evidenciaron 5 hallazgos en cuanto a:

  - Se evidencia material e insumos de otros contratos en la bodega.
  - Se debe actualizar el MEDEVAC de acuerdo con la cantidad del personal activo
  - Se evidencian 3 luminarias fundidas
  - Las fichas de seguridad del jabón de baño y el alcohol antiséptico se encuentran vencidas
  - No se evidencia señalización del sendero peatonal

  Dichos hallazgos fueron subsanados por el contratista el día 21 de diciembre.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** para el presente periodo el día 12 de diciembre interventoría realizó la verificación a la bodega asignada al contrato donde se evidenciaron 4 hallazgos en cuanto a:

  - se evidenciaron postes de otros contratos obstaculizando el paso peatonal, se debe contar un sendero peatonal
  - No se evidencian equipo de emergencia
  - Se evidencia material e insumos de otros contratos en la bodega.
  - No se evidencia la matriz de compatibilidad

  Dichos hallazgos debían ser subsanados por el contratista el día 22 de diciembre, sin recibir respuesta oportuna se remiten al área de calidad.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Durante el presente periodo se llevó a cabo una inspección a las instalaciones locativas, en particular a la bodega, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de condiciones de salubridad, servicios de higiene y adecuación de los espacios asignados para la ejecución del contrato, así:

- **Cumplimiento de Normas de Seguridad, Orden y Aseo**

  Como parte del proceso de control y verificación del cumplimiento de las normas de seguridad, se realizó una inspección en la bodega ubicada en la calle 165 #56-30. Durante la visita, se evaluaron diversos aspectos relacionados con la seguridad y el comportamiento del personal operativo. La información recolectada fue registrada en el formato SEM-TEC-M05-F01: **I**nspección General de Bodega, en el cual se evaluaron los siguientes aspectos: Cumplimiento de las normas de seguridad industrial, Uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), Condiciones de almacenamiento y organización de materiales, Señalización de seguridad y rutas de evacuación, Estado de equipos y herramientas de trabajo, Orden y limpieza general del área, Rotulación de sustancias químicas conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA),Otros elementos asociados a la gestión integral de la seguridad, en general, los ítems inspeccionados y evaluados presentan avances significativos en su nivel de cumplimiento, evidenciando mejoras en las prácticas de seguridad y en la gestión del área inspeccionada.

- **Servicios Sanitarios y Medidas de Higiene**
  Se constató la existencia de unidades sanitarias diferenciadas para cada género, encontrándose en óptimas condiciones de orden, limpieza y funcionamiento. Asimismo, se observó la implementación de medidas de control sanitario


- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** El 16 de diciembre de 2025 se realizó recorrido por las instalaciones de la bodega para verificar las condiciones de salubridad, entre otros ítems como se observa en la lista de chequeo anexa y registro fotográfico.

  Ver 1 SST/ ANX-10. condiciones salubridad bodegas


  A continuación, se presenta evidencia fotográfica referente a las condiciones de salubridad de las bodegas:

Tabla 24. Registro fotográfico de las condiciones de salubridad

SG. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATOS 2025-2780 Y 2025-2781

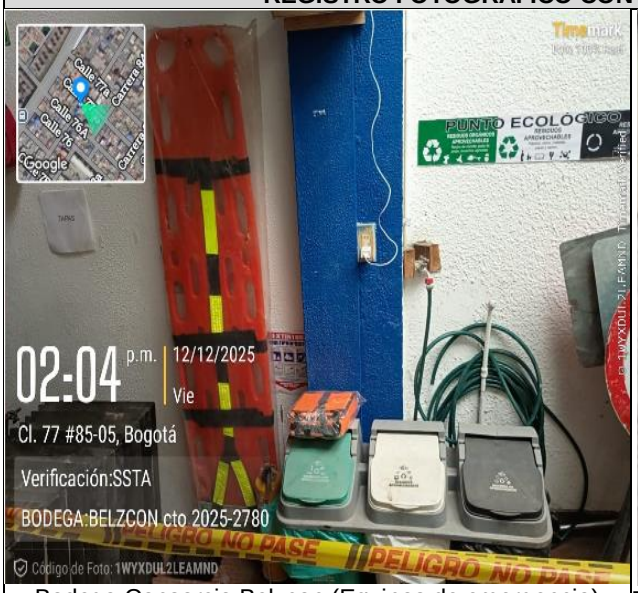

Bodega Consorcio Belzcon (Equipos de emergencia)
Fecha: 12/12/2025 Dirección: Calle 77 n.° 85-05

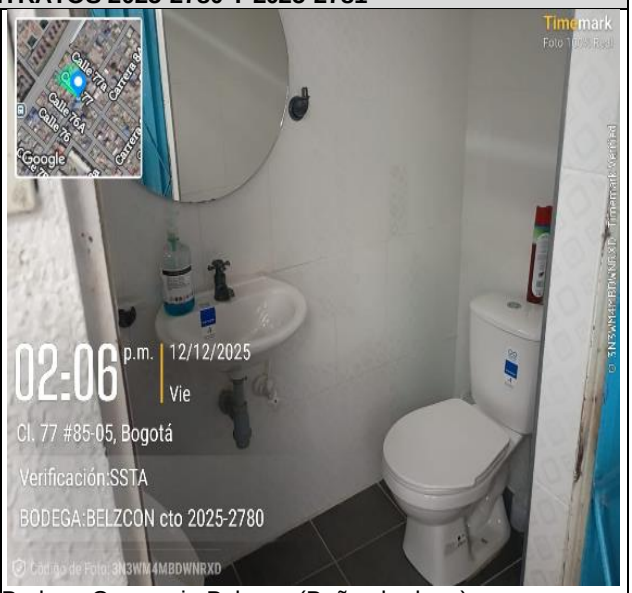

Bodega Consorcio Belzcon (Baños bodega)
Fecha: 12/12/2025 Dirección: Calle 77 n.° 85-05



Bodega Consorcio Movilidad 2025 (Verificación bodega)
Fecha: 12/12/2025 Dirección: CR 29 # 69-23




Bodega Consorcio Movilidad 2025 (Verificación cartelera SST) Fecha: 12/12/2025 Dirección: CR 29 # 69-23

S.G. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 2025-2782




Área de fabricación acabado de estructuras
TPD INGENIERÍA S.A. Fecha:22/12/2025
Dirección: Calle 165 # 56-30

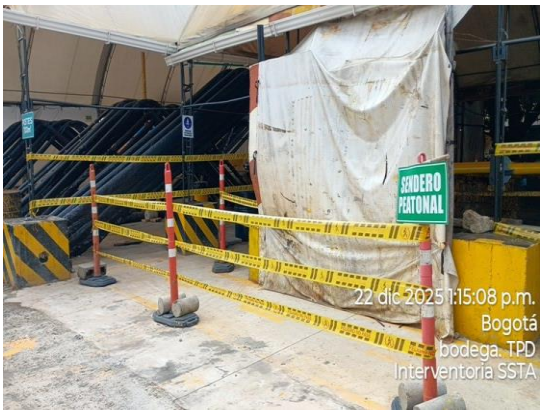

Verificación Existencia Sendero Peatonal
TPD INGENIERÍA S.A. Fecha: 22/12/2025
Dirección: Calle 165 # 56-30

S.G. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 2025-2783

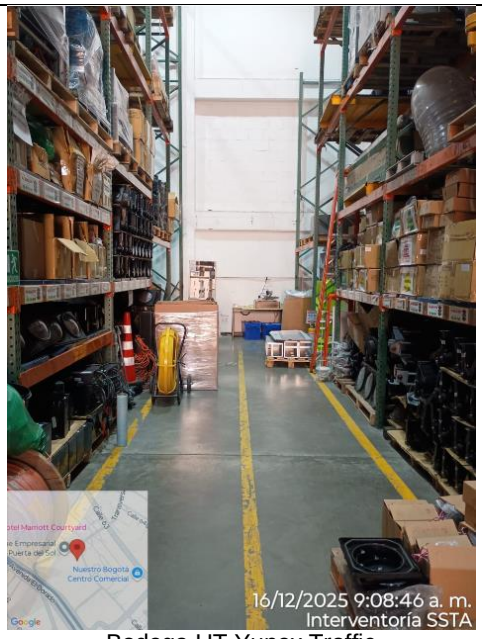

Bodega UT Yunex Traffic
Salubridad en bodega
Fecha: 16/12/2025 Dirección: Tv 93 #51-98



Bodega UT Yunex Traffic
Salubridad en bodega
Fecha: 16/12/2025 Dirección: Tv 93 #51-98

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

1.13. Seguimiento Decreto 332 modificado por Decreto 634 del 2023

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Para este periodo se dio cumplimiento a la contratación y vinculación de mujeres en el proyecto, conforme a lo establecido en el Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023. Se anexa la certificación correspondiente que respalda dicho cumplimiento.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Para este periodo, interventoría y contratista realizan el formulario del reporte semestral de mujeres, donde se evidencia el porcentaje del 14.29%, en conformidad con el Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023. En dicho certificado el Contratista a la fecha cumple con lo requerido por la norma del nivel de cumplimiento del 13,8%. El comunicado dirigido hacia la supervisión de movilidad se hará el siguiente periodo, con el certificado de cumplimiento y soportes del registro en el formulario de la Secretaría de Movilidad

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante este periodo, la interventoría y el contratista diligenciaron el formulario del reporte semestral de participación de mujeres, en el cual se evidencia un porcentaje del 14.71%, dando cumplimiento al Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023. Según dicho certificado, el Contratista cumple a la fecha con el nivel de cumplimiento requerido por la norma, que establece un mínimo del 13.8%. El comunicado dirigido a la supervisión de movilidad será remitido en el siguiente periodo, adjuntando el certificado de cumplimiento y los soportes del registro en el formulario de la Secretaría de Movilidad.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD:** Para el periodo evaluado, la interventoría, en conjunto con el contratista, realizó el reporte correspondiente al segundo semestre sobre el cumplimiento del Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad. En dicho reporte se evidencia un 19 % de participación en la contratación de mujeres, lo cual contribuye al fortalecimiento de los lineamientos de inclusión y equidad de género definidos por la normativa vigente.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Para el periodo de este informe, el Contratista tiene vinculado al proyecto 19 mujeres del total de integrantes que conforman el equipo de trabajo, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 332 con un porcentaje del 14,2%.

Ver 1 SST/ ANX-11. Seguimiento Decreto 634

1.14. Seguimiento Decreto 1082 de 2015 - Discapacidad / apoyo a la Industria Nacional

En ejercicio de las obligaciones asignadas mediante el Contrato de Interventoría n.° 2025-2769, celebrado entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el Consorcio Movilidad Capital, se anexan los certificados de vinculación de trabajadores con discapacidad vigente, emitido por el Ministerio del Trabajo y los certificados referentes al apoyo a la Industria Nacional durante la

ejecución del presente contrato , donde se evidencia el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en los artículos 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.9.

Ver 1 SST/ ANX-12. Certificado de discapacidad / apoyo a la Industria Nacional

1.15. Acuerdo de Confidencialidad y no Divulgación de Información Confidencial

En ejercicio de las obligaciones asignadas mediante el Contrato de Interventoría n.º 2025-2769, celebrado entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el Consorcio Movilidad Capital, se anexa el soporte del cumplimiento de los compromisos de confidencialidad por parte del personal vinculado al proyecto. El certificado anexado acredita el cumplimiento de estas disposiciones legales y de las obligaciones contractuales asociadas a la protección y manejo confidencial de la información durante la ejecución del contrato.

Ver 1 SST/ ANX-13. Documento Acuerdo de Confidencialidad / del Personal

1.16. Conclusiones y recomendaciones

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Mantener el compromiso activo de la alta dirección en los procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), ya que su liderazgo y participación influyen directamente en el fortalecimiento del autocuidado activo de los trabajadores. Este compromiso promueve entornos laborales más seguros, eficientes y saludables, fomenta una cultura preventiva sólida y refuerza el sentido de responsabilidad y compromiso de todo el personal con la seguridad y el bienestar en el trabajo.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Como conclusión para este contrato, se evidencia la necesidad de consolidar una cultura de seguridad basada en la responsabilidad compartida entre contratista y trabajadores. Esto incluye el refuerzo en el uso obligatorio y adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), la promoción de comportamientos seguros en el desarrollo de las actividades, y el establecimiento de canales efectivos para el reporte de condiciones inseguras. El compromiso activo de todo el personal en las capacitaciones y el seguimiento estricto de los procedimientos operativos son elementos clave para minimizar la accidentalidad y garantizar un ambiente laboral seguro.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Como conclusión, se sigue evidenciando la reiteración de hallazgos en los frentes de trabajo en cuanto la gestión SST. Por lo anterior, es necesario que la profesional SST del contratista refuerce concientizando al personal con el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) durante la ejecución de sus actividades, así como fomentar prácticas de autocuidado. Adicionalmente, se requiere dar cumplimiento a los estándares mínimos establecidos en la normatividad colombiana vigente sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA 2025:** Se recomienda establecer y fortalecer canales de comunicación asertivos, empáticos y efectivos

en todos los niveles de la organización, con especial énfasis en el personal de confianza, con el fin de garantizar una adecuada coordinación, seguimiento y ejecución de las actividades. Lo anterior permitirá fortalecer el compromiso con el autocuidado y asegurar el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), promoviendo así una cultura organizacional basada en la prevención, la responsabilidad y el trabajo colaborativo.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** En este periodo el Contratista entregó lo requerido en SST para el informe, igualmente, cumple con lo requerido en la normatividad colombiana sobre el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - SG-SST y el Programa de Seguridad vial – PESV y ha gestionado los hallazgos identificados durante este periodo.

2. INFORME DE TRÁNSITO

A continuación, se describen las actividades de tránsito adelantadas por esta Interventoría en el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025:

2.1. Seguimiento PMT's del Contrato 2025-2780 - CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD de obras civiles zona norte

2.1.1. PMT general

Al 31 de diciembre de 2025 continúa vigente el PMT general con fecha de finalización hasta el 28 de febrero de 2026:

Tabla 25. Estado y vigencia PMT General de Típicos. - Contrato 2025-2780 – Lote 1 – zona norte

FECHA DE SOLICITUD A SDM	RADICADO SDM	ESTADO	FECHA APROBACIÓN	OFICIO APROBACIÓN	DIRECCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
15/05/2025	202561201666352	**APROBADO**	16/06/2025	SPMT 202531207778511	La ciudad de Bogotá D.C.	16/06/2025	28/02/2026

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

La relación de sitios con PMT general vigente durante el mes de diciembre de 2025 para el contrato 2025-2780 autorizados por la Gerencia Única de PMT de la entidad fue la siguiente:

Tabla 26. Relación de sitios con PMT general vigentes en diciembre de 2025 - Contrato 2025-2780

ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	ESTADO PMT	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
1759-	2169 -	AK 50 X AC 63	Teusaquillo	Aprobado por SDM	51	18/12/2025	19-dic-25	9-ene-26
258	1488	KR 55 x CL 127	Suba	Plazo Finalizado	51	18/12/2025	19-dic-25	2-ene-26
201	2804	TV 3 X CL 53	Chapinero	Plazo Finalizado	51	18/12/2025	19-dic-25	2-ene-26

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

2.1.2. PMTs específicos

La relación de sitios con PMT específicos vigentes con aprobación de SDM para el contrato 2025-2780 en diciembre de 2025 es la siguiente:

Tabla 27. Relación de PMT específicos vigentes en diciembre - Contrato 2025-2780 – Lote 1-zona norte

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO DEL PMT	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
Nueva	1927	2184	KR 100 X CL 18	Fontibón	202561204576872	15/12/2025	Aprobado por SDM	52	26/12/2025	27-dic-25	26-feb-26
Complemento	742	1564	KR 101 X AC 72	Engativá	202561204424302	04/12/2025	Aprobado por SDM	50	11/12/2025	19-dic-25	12-feb-26

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO DEL PMT	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
Complemento	286	2057	KR 13 X CL 47	Chapinero	202561204132912	12/11/2025	Aprobado por SDM	52	26/12/2025	27-dic-25	29-ene-26
Complemento	291	2057	KR 13 X CL 46	Chapinero	202561204132912	12/11/2025	Aprobado por SDM	52	26/12/2025	27-dic-25	29-ene-26
Complemento	79	1302	AK 19 X AC 134	Usaquén	202561204424452	4/11/2025	Aprobado por SDM	50	11/12/2025	12-dic-25	29-ene-26
Nueva	767	P1007	TV 42 X CL 4 A	Puente Aranda	202561204424172	04/12/2025	Aprobado por SDM	50	11/12/2025	12-dic-25	29-ene-26
Complemento	770	3660	AK 50 X CL 1G	Puente Aranda	202561204424372	04/12/2025	Aprobado por SDM	50	11/12/2025	12-dic-25	29-ene-26

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Copia de los PMT específicos de complementos e intersecciones nuevas del contrato 2025-2780, junto con su respectivo radicado en la SDM y copia de los COI autorizados para el mes de diciembre de 2025, se incorporan al presente informe en el **ANX. 01** de los anexos del componente de Tránsito.

La relación de sitios con PMT específicos radicados en la Entidad en revisión de la SDM para el contrato 2025-2780, pendientes de aprobación en diciembre de 2025 es la siguiente:

Tabla 28. Relación de PMT específicos radicados en SDM para solicitud de aprobación de la Entidad pendientes de aprobación en diciembre 2025 - Contrato 2025-2780 – Lote 1-zona norte

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	N° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO DEL PMT
Complemento	857	2918	KR 103 A X CL 17	Fontibón	30/12/2025	202561204787412	31/12/2025	En revisión por SDM
Nueva	1927	2184	KR 100 X CL 18	Fontibón	14/12/2025	202561204576872	15/12/2025	En revisión por SDM
Complemento	742	1564	KR 101 X AC 72	Engativá	4/12/2025	202561204424302	4/12/2025	En revisión por SDM
Nueva	767	P1007	TV 42 X CL 4 A	Puente Aranda	4/12/2025	202561204424172	4/12/2025	En revisión por SDM
Complemento	770	3660	AK 50 X CL 1G	Puente Aranda	4/12/2025	202561204424372	4/12/2025	En revisión por SDM
Complemento	354	2749	KR 19A X CL 63	Teusaquillo	31/12/2025	202561204786382	31/12/2025	En revisión por SDM
Complemento	298	2132	KR 16 X AC 63	Teusaquillo	30/12/2025	202561204787202	31/12/2025	En revisión por SDM
Complemento	318	2132	KR 17 X AC 63	Teusaquillo	30/12/2025	202561204787202	31/12/2025	En revisión por SDM
Complemento	407	2137	KR 19 X AC 45	Teusaquillo	17/12/2025	202561204756932	29/12/2025	En revisión por SDM

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Copia del respectivo radicado en la SDM para los PMT específicos presentados a la Entidad en el mes de diciembre de 2025, se incorporan al presente informe en el **ANX. 01** de los anexos del componente de Tránsito.

En los siguientes sitios el contratista del Consorcio Belzcon Movilidad presentó a interventoría los PMT específicos correspondientes, los cuales fueron revisados por la interventoría, sin embargo, tuvieron que ser devueltos con observaciones de interventoría y al finalizar el mes de diciembre de 2025 aún continúan pendientes sin subsanar. Los sitios con PMT específicos devueltos es la siguiente:

- PMT complemento EXT_2762 ID_404, KR 17 X AC 32, fue devuelto el 29-dic-2025 dado que requiere actas de coordinación con el contrato EMB-163-2019.
- PMT complemento EXT_2762, ID_432, KR 16 X AC 32, devuelto el 29-dic-2025 dado que requiere actas de coordinación con el contrato EMB-163-2019.
- PMT complemento EXT_2961, ID_1167, KR 121 X CL 64, Devuelto el 29-dic-2025 dado que requiere acta de coordinación con el contrato SED-086-2023 - CONSORCIO INNFRA CARDENAL.
- PMT complemento EXT_1877, ID_167/183/1133, KR 58 Y KR 62 X AC 170 Y CL 169 B, Devuelto el 29-dic-2025 dado que requiere acta de coordinación con el contrato.
- PMT complemento EXT_1078, ID_ 1692, AV 9 X CL 127, No se puede ejecutar por permisos de ocupación de Cause y temas IDU.

La relación de sitios con PMT específicos aprobados por la Entidad (SDM) en diciembre de 2025 para el contrato 2025-2780, es la siguiente:

Tabla 29. Relación de PMT específicos aprobados por SDM en diciembre 2025 - Contrato 2025-2780 – Lote 1-zona norte

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	N° RADICADO SDM	ESTADO DEL PMT	COI	FECHA COI	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Nueva	1927	2184	KR 100 X CL 18	Fontibón	202561204576872	Aprobado por SDM	52	26/12/2025	07:00 - 21:00 22:00 - 05:00	24 HORAS	27-dic-25	26-feb-26
Complemento	742	1564	KR 101 X AC 72	Engativá	202561204424302	Aprobado por SDM	50	11/12/2025	7:00-21:00	24 HORAS	19-dic-25	12-feb-26
Complemento	286	2057	KR 13 X CL 47	Chapinero	202561204132912	Aprobado por SDM	52	26/12/2025	07:00 - 21:00	24 HORAS	27-dic-25	29-ene-26
Complemento	291	2057	KR 13 X CL 46	Chapinero	202561204132912	Aprobado por SDM	52	26/12/2025	07:00 - 21:00	24 HORAS	27-dic-25	29-ene-26
Complemento	79	1302	AK 19 X AC 134	Usaquén	202561204424452	Aprobado por SDM	50	11/12/2025	07:00-21:00	24 HORAS	12-dic-25	29-ene-26
Nueva	767	P1007	TV 42 X CL 4 A	Puente Aranda	202561204424172	Aprobado por SDM	50	11/12/2025	07:00-21:00	24 HORAS	12-dic-25	29-ene-26
Complemento	770	3660	AK 50 X CL 1G	Puente Aranda	202561204424372	Aprobado por SDM	50	11/12/2025	7:00-21:00	24 HORAS	12-dic-25	29-ene-26

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

2.1.3. Seguimiento a PMTs general y específicos zona Norte

Por parte de Interventoría se realizó en terreno el seguimiento a nueve (9) intersecciones, a las cuales se efectuó treinta y tres (33) seguimientos a PMTs entre generales y específicos, implementados por el contrato 2025-2780 en el mes de diciembre de 2025.

Copia de los formatos de seguimiento a los PMT general y específicos del contrato 2025-2780 – Lote 1 durante el mes de diciembre de 2025, se incorporan al presente informe en el **ANX. 01** de los anexos del componente de Tránsito.

El día 16 de diciembre de 2025 mediante comunicado SEM-CMC-SDM-118-25 radicado SDM n.° 202561204579052, se comunicó a la Supervisión de la SDM la NO pertinencia, viabilidad y conveniencia de continuar con la ejecución del proyecto de complemento de la intersección EXT_1078 ID_1692 - AK 9 x CL 127 en las condiciones actuales, con el fin de mitigar riesgos contractuales. Lo anterior atendiendo respuesta al Diagnóstico de los comunicados BEL-SDM-ADM-241-25 radicado SDM n.° 202561204129992 y BEL-SDM-ADM-264-25 radicado SDM n.° 202561204405382.

Durante este periodo se ha identificado reiteradamente la falta de personal y el abandono de obras por parte del contratista del CBM en especial las intersecciones:

- EXT_1564 ID_742 – KR 101 X AC 72
- EXT_3664 ID_759 - AK 50 x CL 8 sur (sin PMT).
- EXT_2950 ID_1930 - AK 50 x CL 4F (sin PMT).
- EXT_3410 ID_772 – KR 56 X AC 3.

2.2. Seguimiento PMT's del Contrato 2025-2781 - CONSORCIO MOVILIDAD 2025 de obras civiles zona sur

2.2.1. PMT general

Al 31 de diciembre de 2025 se encuentra vigente el PMT general con fecha de finalización hasta el 07 de marzo de 2026:

Tabla 30. Estado y vigencia PMT General de Típicos. - Contrato 2025-2781 – Lote 2 -zona sur

FECHA DE SOLICITUD A SDM	RADICADO SDM	ESTADO	FECHA APROBACIÓN	OFICIO APROBACIÓN	DIRECCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
15/05/2025	202561201705042	**APROBADO**	24/06/2025	SPMT 202531207916131	La ciudad de Bogotá D.C.	24/06/2025	07/03/2026

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

La relación de sitios con PMT general vigentes con corte al 31 de diciembre de 2025 del contrato 2025-2781, solicitados a la Gerencia Única de PMT y aprobados es la siguiente:

Tabla 31. Relación de sitios con PMT general vigentes en diciembre - Contrato 2025-2781 – Lote 2

ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	ESTADO PMT general	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
1269	3274	AK 10 X CL 4 SUR	SAN CRISTÓBAL	En ejecución	51	18/12/2025	19-dic-25	11-ene-26
993	3422	KR 19 X CL 10 B Sur	ANTONIO NARIÑO	Plazo Finalizado	49	4/12/2025	5-dic-25	20-dic-25
1176	3007	KR 1 X CL 87 C Sur	USME	Plazo Finalizado	49	4/12/2025	5-dic-25	20-dic-25

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Copia de las solicitudes de programación de PMT general y copia de los COI autorizados en el mes de diciembre de 2025 para el contrato 2025-2781 – Lote 2, se incorporan al presente informe en el **ANX. 02** de los anexos del componente de Tránsito.

2.2.2. PMTs específicos

La relación de sitios con PMT específicos vigentes con aprobación de SDM para el contrato 2025-2781 en diciembre de 2025 es la siguiente:

Tabla 32. Relación y estado PMT específicos vigentes en diciembre - Contrato 2025-2781 – Lote 2 -zona sur

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	N° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO PMT específico	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
Nueva	1920	3120	KR 24 X CL 18 Sur	ANTONIO NARIÑO	202561204235742	20/11/2025	Aprobado por SDM	52	26/12/2025	27-dic-25	26-feb-26
Complemento	879	3477	AK 80 G X DG 3	KENNEDY	202561204142742	13/11/2025	Aprobado por SDM	51	18/12/2025	19-dic-25	26-feb-26
Complemento	819	2393	AK 72 X CL 9	KENNEDY	202561203967642	30/10/2025	Aprobado por SDM	45	6/11/2025	7-nov-25	11-dic-25
Nueva	1921	3121	KR 14 I X CL 84 Sur	USME	202561203673972	6/10/2025	Aprobado por SDM PRORROGA N° 1	42	16/10/2025	17-oct-25	4-dic-25

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Copia de los PMT específicos de complementos e intersecciones nuevas del contrato 2025-2781, junto con su respectivo radicado en la SDM para el mes de diciembre de 2025, se incorporan al presente informe en el **ANX. 02** de los anexos del componente de Tránsito.

La relación de sitios con PMT específicos radicados en la Entidad en revisión de la SDM para el contrato 2025-2781, pendientes de aprobación en diciembre de 2025 es la siguiente:

Tabla 33. Relación de PMT específicos radicados en SDM para solicitud de aprobación de la Entidad pendientes de aprobación en diciembre - Contrato 2025-2781 – Lote 2 -zona sur

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	N° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO PMT específico
Complemento	325	2061	KR 13 X CL 34	SANTA FE	26/12/2025	202561204746002	29/12/2025	En revisión de SDM
Complemento	332	2061	KR 13 X CL 33	SANTA FE	26/12/2025	202561204746002	29/12/2025	En revisión de SDM
Complemento	969	3690	KR 14 X CL 2 SUR	ANTONIO NARIÑO	18/12/2025	202561204649772	19/12/2025	En revisión de SDM

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Copia del respectivo radicado en la SDM para los PMT específicos presentados a la Entidad en el mes de diciembre de 2025, se incorporan al presente informe en el **ANX. 02** de los anexos del componente de Tránsito.

En los siguientes sitios el contratista del Consorcio Movilidad 2025 presentó a interventoría los PMT específicos correspondientes, los cuales fueron revisados y aprobados por la interventoría para radicación en la SDM, así:

Tabla 34. Relación de PMT específicos aprobados por interventoría para radicar en SDM para solicitud de aprobación de la Entidad en diciembre - Contrato 2025-2781 – Lote 2 -zona sur

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	N° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO PMT específico
Complemento	325	2061	KR 13 X CL 34	SANTA FE	26/12/2025	202561204746002	29/12/2025	En revisión de SDM
Complemento	332	2061	KR 13 X CL 33	SANTA FE	26/12/2025	202561204746002	29/12/2025	En revisión de SDM
Complemento	969	3690	KR 14 X CL 2 SUR	ANTONIO NARIÑO	18/12/2025	202561204649772	19/12/2025	En revisión de SDM

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

En los siguientes sitios, no fueron aprobados los PMT específicos de varias intersecciones por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad mediante publicaciones de COI en el mes de diciembre de 2025, los cuales corresponden a las siguientes direcciones:

Tabla 35. Relación de PMT específicos negados por la SDM en diciembre - Contrato 2025-2781 – Lote 2-zona sur

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	N° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO PMT específico	COI - NEGADO	FECHA COI
Complemento	1082	3429	KR 19C X CL 48C Sur Y DG 48 Sur	TUNJUELITO	10/11/2025	202561204142852	13/11/2025	PMT Negado. Teniendo en cuenta que no se atendieron a las observaciones enviadas por SDM mediante correo electrónico el día 18-nov-25	52	26/12/2025
Complemento	969	3690	KR 14 X CL 2 SUR	ANTONIO NARIÑO	29/10/2025	202561203967802	30/10/2025	PMT Negado. No se atendieron la totalidad de las observaciones enviadas por correo electrónico los días 4-nov-25 y 26-nov-25, las cuales son:1.se reitera la observación "se debe presentar aval emitido por los profesionales de Transmilenio (BRT).	50	11/12/2025

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	N° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO PMT específico	COI - NEGADO	FECHA COI
Complemento	1168	3873	AK 80 X CL 38 C sur	KENNEDY	29/10/2025	202561203967532	30/10/2025	PMT Negado dado que no se atendieron todas las observaciones enviadas el 04-nov-25 y 05-12-25	49	4/12/2025
Complemento	887	3454	KR 79 X CL 38 C Sur	KENNEDY	29/10/2025	202561203967552	30/10/2025	PMT Negado. No presentó el Visto Bueno / Aval de Transmilenio (DTBRT y DTB), siendo la zona un corredor vital con rutas alimentadoras y SITP, lo que implica una potencial afectación de la operación y los paraderos	49	4/12/2025
Complemento	937	3916	TV 78 L X CL 68 A Sur	BOSA	23/10/2025	202561203892102	23/10/2025	PMT Negado. No se atendieron la totalidad de las observaciones enviadas por correo electrónico el 28 de octubre de 2025. No se presentó el acta de socialización con la totalidad de la comunidad afectada.	49	4/12/2025
Complemento	936	3916	TV 78 L X CL 68 Sur	BOSA	23/10/2025	202561203892102	23/10/2025	PMT Negado. No se atendieron la totalidad de las observaciones enviadas por correo electrónico el 28 de octubre de 2025. No se presentó el acta de socialización con la totalidad de la comunidad afectada.	49	4/12/2025

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

2.2.3. Seguimiento a PMTs general y específicos zona sur

Por parte de Interventoría se realizó en terreno el seguimiento a catorce (14) intersecciones, a las cuales se efectuó cincuenta y seis (56) seguimientos a PMTs generales y específicos implementados por el contrato 2025-2781 en el mes de diciembre de 2025.

Copia de los formatos de seguimiento a los PMT general y específicos del contrato 2025-2781 – Lote 2 durante el mes de diciembre de 2025, se incorporan al presente informe en el **ANX. 02** de los anexos del componente de Tránsito.
Intersección EXT_3121 ID_1921, KR 14I X CL 84 Sur desde el 04-dic-2025 no cuenta con PMT.

Intersección EXT_2393 ID_819_AK 72 X CL 9 desde el 11-dic-2025 no cuenta con PMT.

Se encuentra aún pendiente de parte del contratista del CM2025 dar respuesta escrita a la entidad sobre comunicados remitidos el mes pasado y el presente mes acerca de posibles INCUMPLIMIENTOS formulados por la Gerencia Única de PMT de la SDM en las siguientes intersecciones:

- EXT_3049 ID_1754 – KR 78K X CL 38 C Sur – comunicado SPMT_202531215451241 del 18-nov-2025.

- EXT_2393 ID_819 – KR 72 X CL 9 – comunicado SPMT_202531216473481 del 09-dic-2025.

2.3. Seguimiento PMT's general del Contrato 2025-2782 de mantenimiento de postes

A la fecha se encuentra vigente con aprobación por parte de la SDM mediante comunicado SPMT_202531206790011. La fecha de terminación quedó hasta el día 15 de febrero de 2026. El horario de preventivos y correctivos quedó entre las 9:00 a 15:00 horas y el horario para emergencias de 6:00 a 21:00 horas.

Tabla 36. Estado y vigencia PMT General de Típicos. - Contrato 2025-2782 – Lote 3

FECHA DE SOLICITUD A SDM	RADICADO SDM	ESTADO	FECHA APROBACIÓN	OFICIO APROBACIÓN	DIRECCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
30/04/2025	202561201471222	APROBADO EN EJECUCIÓN	09/05/2025	SPMT 202531206790011	La ciudad de Bogotá D.C.	09/05/2025	15/02/2026

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

2.3.1. Notificación de PMT's Típicos a la SDM

Durante diciembre de 2025 se reportaron a la Gerencia Única de PMTS diez y nueve (19) Intersecciones con PMT's típicos. Copia de estos reportes de programación de PMT en el mes de diciembre de 2025 se incorporan al presente informe en el **ANX. 03** de los anexos del componente de Tránsito.

2.3.2. Seguimiento a PMT's Típicos

Por parte de Interventoría se realizó en terreno el seguimiento a veintitrés (23) intersecciones semaforizadas, a las cuales se efectuó veintiocho (28) seguimientos a PMTs típicos implementados por el contrato 2025-2782 en el mes de diciembre de 2025, obteniendo que el 100 % de los PMT revisados cumple requisitos técnicos.

Copia de los formatos de seguimiento al PMT general de típicos del contrato 2025-2782 – Lote 3 durante el mes de diciembre de 2025, se incorporan al presente informe en el **ANX. 03** de los anexos del componente de Tránsito.

Copia de los registros fotográficos obtenidos en el seguimiento al PMT general de típicos del contrato 2025-2782 – Lote 3, se incorporan al presente informe en el **ANX. 06** de los anexos del componente de Tránsito.

2.4. Seguimiento PMT's general del Contrato 2025-2783 de mantenimiento eléctrico y de equipos

A la fecha se encuentra vigente con aprobación por parte de la SDM mediante comunicado SPMT_202531205280221. La fecha de terminación quedó hasta el día 15 de febrero de 2026. El horario de cierre y de trabajo quedó autorizado de 24 horas.

Tabla 37. Estado y vigencia PMT General de Típicos. - Contrato 2025-2783 – Lote 4

FECHA DE SOLICITUD A SDM	RADICADO SDM	ESTADO	FECHA APROBACIÓN	OFICIO APROBACIÓN	DIRECCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
23/04/2025	202561201371512	APROBADO EN EJECUCIÓN	29/04/2025	SPMT 202531205280221	La ciudad de Bogotá D.C.	29/04/2025	15/02/2026

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

2.4.1. Notificación de PMT's Típicos a la SDM

Durante el mes de diciembre de 2025 los viernes de cada semana la Interventoría realizó el reporte a la Gerencia de PMT de la SDM, de quinientos ocho (508) intersecciones semaforizadas con aplicación de PMT's típicos en actividades de mantenimiento eléctrico y de equipos. Las notificaciones a la Gerencia de PMT de la SDM junto con los listados de intersecciones remitidos semanalmente en diciembre de 2025 se incorporan al presente informe en el **ANX. 04** de los anexos del componente de Tránsito.

2.4.2. Inventario de dispositivos de señalización para PMT's típicos

El día 16 de diciembre de 2025, en instalaciones de la bodega de Yunex Traffic, por parte de Interventoría se realizó inventario de señalización y elementos de PMT a cada uno de los vehículos de grúas de eléctricos y vehículos de los grupos de equipos. No se encontró observaciones.

Copia de los formatos del inventario de señalización realizado al contrato 2025-2783 – Lote 4, se incorporan al presente informe en el **ANX. 04** de los anexos del componente de Tránsito.

2.4.3. Seguimiento a PMT's Típicos

Por parte de Interventoría se realizó en terreno el seguimiento a setenta y tres (73) intersecciones semaforizadas de la ciudad, a las cuales se efectuó noventa y siete (97)

seguimientos a PMTs típicos implementados por el contrato 2025-2783 en el mes de diciembre de 2025, obteniendo que el 100% de los PMT revisados cumple con los requisitos.
I
Copia de los formatos de seguimiento al PMT general de típicos del contrato 2025-2783 – Lote 4, se incorporan al presente informe en el **ANX. 04** de los anexos del componente de Tránsito.

Copia de los registros fotográficos obtenidos en el seguimiento al PMT general de típicos del contrato 2025-2783 – Lote 4, se incorporan al presente informe en el **ANX. 06** de los anexos del componente de Tránsito.

2.5. Relación de correspondencia sobre PMTs en el periodo del informe

En cuanto a la correspondencia enviada y recibida concerniente a los PMT's de los contratos 2025-2780, 2025-2781, 2025-2782 y 2025-2783, esta información se relaciona y se incorpora al presente informe en el **ANX. 05** de los anexos del componente de Tránsito.

2.6. Conclusiones del componente de Tránsito:

- **Contrato 2025-2769 Consorcio Movilidad Capital:**

  - Por parte de Interventoría se realizó en terreno el seguimiento a nueve (9) intersecciones, a las cuales se efectuó treinta y tres (33) seguimientos a PMTs entre generales y específicos, implementados por el contrato 2025-2780 en el mes de diciembre de 2025.

  - El día 16 de diciembre de 2025 mediante comunicado SEM-CMC-SDM-118-25 radicado SDM n.° 202561204579052, se comunicó a la Supervisión de la SDM la NO pertinencia, viabilidad y conveniencia de continuar con la ejecución del proyecto de complemento de la intersección EXT_1078 ID_1692 - AK 9 x CL 127 en las condiciones actuales, con el fin de mitigar riesgos contractuales. Lo anterior atendiendo respuesta al Diagnóstico de los comunicados BEL-SDM-ADM-241-25 radicado SDM n.° 202561204129992 y BEL-SDM-ADM-264-25 radicado SDM n.° 202561204405382.

  - Por parte de Interventoría, durante diciembre de 2025 se aprobaron en total nueve (9) PMT específicos de intersecciones, dos (2) PMT de nuevas y siete (7) PMT de complementos para el contrato 2025-2780 en los siguientes externos: nuevas EXT_2184 y P1007. De complementos los EXT_2918, EXT_1564, EXT_3660, EXT_2749, EXT_2132 con ID_298 Y 318 y el EXT_2137.
  - Por parte de Interventoría, durante diciembre de 2025 se aprobaron en total tres (3) PMT específicos de intersecciones de complementos para el contrato 2025-2781 en los siguientes externos: EXT_2061 con ID_325 y 332 y el EXT_3690.

  - Por parte de Interventoría se realizó en terreno el seguimiento a catorce (14) intersecciones, a las cuales se efectuó cincuenta y seis (56) seguimientos a PMTs generales y específicos implementados por el contrato 2025-2781 en el mes de diciembre de 2025.

- **Contrato 2025-2780 Consorcio Belzcon Movilidad - zona norte:**

  - Durante el mes de diciembre de 2025 no hubo programación de PMT General para mantenimiento en zona norte.

  - Durante el mes de diciembre de 2025, fueron aprobados por la SDM, mediante COI 50 del 11 de diciembre de 2025 y COI 52 del 26 de diciembre de 2025, los PMT específicos de las intersecciones nuevas EXT_2184 y EXT_P1007, ID_767 y además los PMT específicos de los complementos: EXT_1564, EXT_2057 con ID_286 y ID_291, EXT_1302 y EXT_3660.

  - Durante el mes de diciembre de 2025 se radicaron en la SDM nueve (9) PMT específicos de complementos para revisión de la entidad. Estos externos corresponden a: EXT_2918, ext_2184, EXT_1564, EXT_P1007, EXT_3660, EXT_2749, EXT_2132 con ID_298 y ID_318 y EXT_2137.

- **Contrato 2025-2781 Consorcio Movilidad 2025 – zona sur:**

  - Continúa del mes anterior aprobado el PMT general en el EXT_3274, EXT_3422 y EXT_3007 hasta finalización de su plazo el día 20 de diciembre de 2025.

  - Durante el mes de diciembre de 2025 se tuvo aprobados y vigentes cuatro (4) PMT específicos de intersecciones, dos PMT para nuevas en los EXT_3120 y EXT_3121 y dos(2) PMT específicos para intersecciones complementos en los externos EXT_3477 y EXT_2393.

  - Durante este mes de diciembre de 2025 se logró radicar en SDM para solicitud de aprobación de la Entidad tres (3) PMT específicos de intersecciones complementos correspondiente a los externos: EXT_3120, EXT_3429 y EXT_3477.

  - Durante este mes de diciembre de 2025 se logró radicar en la entidad (SDM) tres (3) PMT específicos de complemento en los siguientes externos: EXT_2016 con los ID_325 y 332, y EXT_3690.

- **Contrato 2025-2782 TPD Ingeniería S.A.S:**

  - El Contratista de TPD Ingeniería reportó en la programación de diciembre de 2025 diez y nueve (19) intersecciones semaforizadas con aplicación de PMT típicos del contrato 2025-2782.

- **Contrato 2025-2783 UT Yunex Traffic 2025:**

  - El Contratista de UT Yunex Traffic 2025 reportó en la programación de diciembre de 2025 quinientos ocho (508) intersecciones semaforizadas con aplicación de PMT típicos del contrato 2025-2783.

3. INFORME GESTIÓN DE CALIDAD

3.1. Actividades Realizadas

Durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2025 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Respecto a la dotación del personal del Consorcio Movilidad Capital, contrato de Interventoría 2025-2769, se indica que durante el mes de diciembre del 2025 se realizó entrega dotación (chaquetas, overoles, pantalones, cascos, entre otros) dando cumplimiento a las directrices establecidas en el Manual de Indumentaria de SDM.

- Con relación a la dotación del contrato 2025-2780, durante el mes de diciembre de la presente vigencia, el contratista Consorcio Belzcon Movilidad realizó entrega de EPP[2] tal como se indica en el capítulo 1.3. Actividades de SST en el Presente Periodo" y subcapítulo "1.3.4. Elementos de Protección Personal y Dotación", igualmente el proveedor del contratista PH e Ingeniería realizó entrega de dotación a (chaquetas, pantalones, cascos, chalecos reflectivos, entre otros) dando cumplimiento a las directrices establecidas en el Manual de Indumentaria de SDM.

- Respecto a la dotación del contrato 2025-2781, durante el mes de diciembre no se realizó entrega de dotación", sin embargo, la interventoría identificó en el periodo hallazgos de personas laborando sin la indumentaria[3] requerida para desarrollo de las actividades, así mismo se identificó indumentaria en malas condiciones. Teniendo en cuenta la situación indicada la interventoría lleva cabo mesa de trabajo con el contratista para tomar las medidas requeridas para la subsanación de los hallazgos. Los resultados del tratamiento del hallazgo de acuerdo con acciones para el cierre de no conformidad se presentan en el siguiente informe.

- Respecto a la dotación del contrato 2025-2782, a la fecha de emisión de este informe el contratista suministró los respectivos soportes y evidencias.

- Respecto a la dotación del contrato 2025-2783, durante el mes de diciembre de la presente vigencia, el contratista Yunex Traffic, realizó entrega dotación a (chaquetas, overoles, pantalones, cascos, entre otros) dando cumplimiento a las directrices establecidas en el Manual de Indumentaria de SDM.

Los soportes de la entrega de dotación correspondientes para cada uno de los contratos podrán ser consultados en el ANX 1. Requerimientos de dotación, subcarpetas contratos 2025-2769, 2025-2780 y 2025-2783, respectivamente.

---

[2] EPP: Elementos de protección personal

[3] Indumentaria: Corresponde al conjunto de prendas y elementos de vestimenta que utilizan las personas para el desarrollo de las actividades propias de su rol durante el desarrollo del proyecto. Es indumentaria comprende chaqueta, overoles, pantalones, cascos entre otros.

3.2. Seguimiento de los Planes de Calidad

A continuación, se detallan las actividades de seguimiento del cumplimiento de los planes de calidad para cada uno de los contratos.

- Contrato 2025-2769

Con relación al contrato 2025-2769, durante el periodo de diciembre de 2025, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Fortalecimiento y reestructuración de los controles para el uso y aplicación de los formatos establecidos por la interventoría y actualización del plan de calidad del contrato 2025-2769

- Revisión y actualización de los formatos del plan de calidad de la interventoría (Ver numeral 3.5. Creación de Documentos)

- Continuidad en el desarrollo del esquema de evaluación de los factores de calidad de acuerdo con el esquema de seguimiento definido para los contratos 2025-2780, 2025-2781, 2025-2782 y 2025-2783. En la siguiente tabla se detalla los factores evaluados específicamente para cada uno por cada contrato de acuerdo con el alcance de cada uno de los planes de calidad.

Tabla 38. Factores de los planes de calidad evaluados por contrato para el periodo de diciembre del 2025

Factores	Contrato 2025-2780	Contrato 2025-2781	Contrato 2025-2782	Contrato 2025-2783
Objetivos de calidad del proyecto e indicadores	Factor evaluado en el periodo	Factor evaluado en el periodo	Factor evaluado en el periodo	Factor evaluado en el periodo
Control de la información documentada	Factor evaluado en el periodo	Factor evaluado en el periodo	Factor evaluado en el periodo	Factor evaluado en el periodo
Recursos materiales e insumos	Factor no evaluado en el periodo	Factor no evaluado en el periodo	Factor evaluado en el periodo	No aplica
Procesos, productos y servicios proporcionados externamente	Factor no evaluado en el periodo	Factor no evaluado en el periodo	Factor no evaluado en el periodo	Factor en no evaluado en el periodo
Producción, provisión y conformidad de los productos y servicios	Factor evaluado en el periodo	Factor evaluado en el periodo	Factor evaluado en el periodo	Factor evaluado en el periodo
Seguimiento y Medición	Factor evaluado en el periodo	Factor evaluado en el periodo	Factor evaluado en el periodo	Factor evaluado en el periodo
Mejora Continua	Factor no evaluado en el periodo	Factor en implementación y evaluación de la eficacia de las	Factor en implementación y evaluación de la eficacia de las	Factor en implementación y evaluación de la eficacia de las

Factores	Contrato 2025-2780	Contrato 2025-2781	Contrato 2025-2782	Contrato 2025-2783
		acciones de mejora	acciones de mejora	acciones de mejora

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Movilidad Capital

3.2.1. Seguimiento del cumplimiento del plan de calidad contrato 2025-2780

Dentro del esquema de seguimiento del cumplimiento del plan de calidad del Consorcio Belzcon, para el periodo de diciembre se evaluaron los siguientes aspectos:

- Objetivos de calidad del proyecto e indicadores
- Control de la información documentada
- Producción, provisión y conformidad de los productos y servicios
- Seguimiento y medición
- Mejora continua.

- **Objetivos de calidad del proyecto e indicadores**

  Respecto a este ítem, durante el mes de diciembre, el Consorcio Belzcon Movilidad presentó los resultados de los indicadores mediante los cuales el Contratista mide el cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto.

  En la siguiente tabla se presenta la relación de objetivos de calidad y del proyecto y sus indicadores

Tabla 39. Objetivos de calidad y reporte de resultados de indicadores mes de diciembre del 2025 - Contrato 2025-2780

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	Indicador	Fórmula	Periodicidad	Meta	Periodo de medición	Variable n.° 1:	Variable n.° 2:	Resultados del Periodo
Garantizar que el 100% de las obras civiles se ejecuten dentro de los plazos previstos en los permisos otorgados por las autoridades competentes	Relación de los frentes de obra cerrados antes de los vencimientos de los planes de manejo de tránsito respecto a los frentes cerrados en el periodo. Esta métrica permite medir la eficacia en el cumplimiento de la programación de actividades de obra de acuerdo con los tiempos del PMT.	(n.° Frentes de obra cerrados antes del vencimiento del PMT en el periodo X / n.° total, frentes de obra cerrados en el periodo X) *100	Mensual	= 100%	Dic 2025	3	3	100% Los resultados indican que se logró la meta estimada para el periodo de acuerdo con el indicador.

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	Indicador	Fórmula	Periodicidad	Meta	Periodo de medición	Variable n.° 1:	Variable n.° 2:	Resultados del Periodo
Garantizar que el 100% de las obras civiles se ejecuten de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato	Relación correspondiente al n.° de frentes de obra cerrados sin incumplimientos respecto al n.° de frentes de obra cerrados en el periodo. Mediante este indicador se evalúa el porcentaje de frentes de obra que cerraron la conformidad, es decir cumpliendo criterios de aceptación del producto de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto	(n.° Frentes de obra cerrados sin incumplimientos en el periodo / n.° total, frentes de obra cerrados en el periodo) *100	Mensual	=100%	Dic 2025	7	7	100% Los resultados indican que se logró la meta estimada para el periodo de acuerdo con el indicador.

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	Indicador	Fórmula	Periodicidad	Meta	Periodo de medición	Variable n.° 1	Variable n.° 2	Resultados del Periodo
Cumplir con el 100% de las solicitudes de mantenimiento	Relación de mantenimientos ejecutados y cerrados efectivamente en el periodo respecto al número total de requerimientos de mantenimiento del periodo	(n.° Mantenimientos ejecutados en el periodo / n.° total, de mantenimientos solicitados en el periodo) *100	Mensual	= 100%	Dic 2025	4	4	100% Los resultados indican que se logró la meta estimada para el periodo de acuerdo con el indicador.

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Movilidad Capital

El certificado de cumplimiento del plan de calidad, así como el reporte de cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto e indicadores, plan de calidad del contrato 2025-2780, podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpeta ANX 2.3. Contrato 2025_2780, subcarpeta 1. Reporte cump obj calid.

- **Control de la información documentada**

  Con relación a este ítem, la Interventoría revisó las disposiciones establecidas en el plan de calidad del contrato 2025-2780, así como el listado maestro de documentos solicitado por la Interventoría con las actualizaciones al periodo de diciembre de la presente vigencia, igualmente se verificó la aplicación y uso de los formatos vigentes mediante la verificación de los registros[4] correspondientes al reporte semanal de obra, control de lluvias, seguimiento de PMT[5] y entrada a almacén, así como de los registros que constituyen anexos del informe mensual. Los resultados de esta verificación son los siguientes:

- A partir de la revisión del listado maestros de documentos, se identificó que para el periodo no se realizaron cambios y/o actualizaciones en los formatos. Igualmente se verificó que el contratista aplica efectivamente los controles en la información documentada[6] garantizando el uso y aplicación de los formatos vigentes, así como la disponibilidad y trazabilidad de los registros.

  El certificado de cumplimiento del plan de calidad, el listado maestro de documentos, podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpetas ANX 2.3. Contrato 2025_2780 y List Maest Doc., respectivamente.

- Se verificó el uso y aplicabilidad de las versiones vigentes de los formatos “Reporte semanal de obra”, “Control de Lluvias”, “Seguimiento de PMT” y “Entrada a almacén” mediante la validación de los registros de diciembre del contratista, confirmando su uso y aplicabilidad de acuerdo con las disposiciones establecidas en el listado maestro de documentos. Dado lo anterior la Interventoría ratifica el cumplimiento del este requisito de acuerdo con las disposiciones establecidas en el plan de calidad.

  El certificado de cumplimiento del plan de calidad, y los registros correspondientes a “Reporte semanal de obra”, “Control de Lluvias”, “Seguimiento de PMT” y “Entrada a almacén”, podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpetas ANX 2.3. Contrato 2025_2780 y Registros en Sitio., respectivamente.

---

[4] Registros: Documento que presenta la evidencia objetiva de que se han realizado actividades o alcanzado los resultados conforme a los requisitos establecidos

[5] PMT: Plan de manejo de tránsito

[6] Información documentada: Información que la organización debe mantener y conservar, en cualquier medio, y que es necesaria para el desarrollo del proyecto y evidencia del cumplimiento de los requisitos. Esta información corresponde al plan de calidad, caracterización de procesos, procedimientos, instructivos, formatos y registros

- Se verificó el uso y aplicabilidad de formatos que constituyen los registros del informe mensual del contratista. Esta verificación se realizó mediante revisión de los registros anexos al informe correspondiente al periodo de diciembre. Los resultados de esta verificación se registraron en el formato SEM-CAL-M01-F08. Aseguramiento de la aplicabilidad de los formatos y confirman su uso de acuerdo con las disposiciones establecidas en el listado maestro de documentos. Dado lo anterior la Interventoría ratifica el cumplimiento del este requisito de acuerdo con las disposiciones establecidas en el plan de calidad.

  El certificado de cumplimiento del plan de calidad, y el registro correspondiente SEM-CAL-M01-F08. Aseguramiento de la aplicabilidad de los formatos, podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpetas ANX 2.3. Contrato 2025_2780 y Registros Inform Mens Contratista., respectivamente.

- **Producción, provisión y conformidad de los productos y/o servicios**

  Con relación es este factor, la interventoría verifica la aplicación de los métodos de inspección y ensayos a materiales que confirman el cumplimiento de especificaciones (Resistencias de compresión de cilindros de concreto). Es importante mencionar que la interventoría realizó el seguimiento y verificación del cumplimiento de la toma de muestras para la aplicación de ensayos de laboratorio en los diferentes frentes de obra ejecutados durante el mes de diciembre de la vigencia del 2025. Durante este periodo se incorporó el formato SEM-TEC-M06-F07. Control de inspección y ensayos – Toma de muestras en campo [7], documento que constituye el registro donde se presenta la información de muestras que se tomaron en las diferentes intervenciones de obra civil especificando dirección, externo y demás datos relacionados.

  Es importante mencionar que los ensayos de resistencia de compresión de cilindros de concreto son validados en su conformidad por el Ingeniero Residente de Obra Civil y desde el componente de calidad se verifica y ratifica la aplicación de los métodos de inspección y ensayos de acuerdo con lo dispuesto en el plan de calidad para el periodo. (Ver ítem 3.3. Certificaciones de cumplimiento de ensayos de materiales).

- **Seguimiento y Medición**

  Se corroboró el monitoreo de los resultados de métricas de calidad mediante las cuales se evalúa el cumplimiento de los objetivos de calidad, tal como se indica en el ítem “Cumplimiento de objetivos de calidad del proyecto e indicadores” de este capítulo.

[7] **Formato SEM-TEC-M06-F07. Control de inspección y ensayos – Toma de muestras en campo:** En el capítulo 3.5. Creación de documentos se presenta las mejoras, incorporaciones, modificaciones, actualizaciones y/o derogaciones de los formatos del plan de calidad de interventoría contrato n.° 2025-2769.

- **Mejora Continua**

  Ver detalle en el capítulo 3.4. Seguimiento a las acciones de mejoramiento definidas por los contratistas.

3.2.2. Seguimiento del cumplimiento del plan de calidad contrato 2025-2781

Dentro del esquema de seguimiento del cumplimiento del plan de calidad del Consorcio Movilidad 2025, para el periodo de diciembre se evaluaron los siguientes aspectos:

- Objetivos de calidad del proyecto e indicadores
- Control de la información documentada
- Procesos, productos y/o servicios suministrados externamente
- Producción, provisión y conformidad de los productos y servicios
- Seguimiento y medición
- Mejora continua.

- **Cumplimiento de objetivos de calidad del proyecto e indicadores**

  Respecto a este ítem, durante el mes de diciembre, el Consorcio Movilidad 2025, presentó los resultados de los indicadores mediante los cuales el Contratista mide el cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto.

  En la siguiente tabla se presenta la relación de objetivos de calidad y del proyecto y sus indicadores

Tabla 40. Objetivos de calidad y reporte de resultados de indicadores mes de diciembre del 2025 - Contrato 2025-2781

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	Indicador	Fórmula	Periodicidad	Meta	Periodo de medición	Variable n.° 1: Q actividades entregadas o ejecutadas por fuera de fechas establecidas para el periodo	Variable n.° 2: Q actividades programadas para el periodo	Resultados del Periodo
Cumplir con los plazos estipulados	Relación de las actividades entregadas y/o ejecutadas fuera de las fechas estimadas para el periodo respecto a la cantidad de actividades programadas en el periodo	(Cantidad de actividades entregadas o ejecutadas por fuera de las fechas establecidas) / Cantidad de actividades programadas en el mes) X 100%	Mensual	< = 5%	Dic 2025	14	16	87,50% El resultado no alcanza la meta esperada y se categoriza como deficiente. Teniendo en cuenta los resultados del indicador la interventoría solicito la definición e implementación de medidas correctivas, las cuales se focalizaran en el fortalecimiento de esquema de control de actividades en obra y aseguramiento de cumplimiento de entregas dentro de las fechas esperadas, así como el cumplimiento de las especificaciones de los productos y/o servicio.

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	Indicador	Fórmula	Periodicidad	Meta	Periodo de medición	Variable n.° 1 n.° de Quejas y/o Reclamos por parte SDM y Partes Interesadas (Autoridades Regulatorias, Comunidad, Equipo de Proyecto, entre otros))	–	Resultados del Periodo
No tener más de dos (2) por parte del cliente y cualquier parte interesada (Autoridades Regulatorias, Comunidad, Equipo de Proyecto, entre otros)	Número de quejas y/o reclamos	# de quejas y/o reclamos y/o reclamos	Mensual	<= 2	Dic 2025	0	—	0 El resultado alcanza la meta esperada. Sin embargo, en el análisis de dato debe considerarse que, aunque formalmente no se presentaron o reclamos por parte de SDM, Interventoría u Otras Partes Interesadas, este resultado se complementa con los resultados correspondiente al indicador “Cumplir con los plazos estipulados”. Lo cual implícitamente puede estar generando insatisfacción en una (1) y/o varias de las partes interesadas, así

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES								
								como identificar una situación que requiere la solución por parte del contratista a una problemática específica. Por tanto, la interventoría solicito la definición e implementación de medidas correctivas, las cuales se focalizaran en el fortalecimiento de esquema de control de actividades en obra y aseguramiento de cumplimiento de las entregas dentro de las fechas establecidas.

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	Indicador	Fórmula	Periodicidad	Meta	Periodo de medición	Variable n.° 1 n.° de productos y/o servicios aprobados en la primera inspección	Variable n.° 2 n.° de productos y/o servicios entregados en el periodo	Resultados del Periodo
Cumplir a cabalidad con todas las especificaciones técnicas y manuales de diseño que exige el cliente	Cumplimiento de especificaciones productos y/o servicios componente obra civil	# de productos, productos y/o servicios aprobados en la primera inspección / # de productos, productos y/o servicios entregados	Mensual	>= 96%	Dic 2025	34	34	100% El resultado alcanza la meta esperada. Se evidencia mejora en los resultados a partir del fortalecimiento de esquemas de control por parte del Contratista, respecto a los criterios de liberación y aceptación.

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	Indicador	Fórmula	Periodicidad	Meta	Periodo de medición	Variable n° 1 # de trabajos con retrabajo	Variable n° 2 # total de trabajos ejecutados	Resultados del Periodo
Cumplir a cabalidad con todas las especificaciones técnicas y manuales de diseño que exige el cliente	Nivel de porcentaje de correcciones en trabajos	# de trabajos con retrabajo/ # total de trabajos ejecutados	Mensual	<= 5%	Nov 2025	0	34	0% Los resultados indican que el 0% productos y/o servicios fueron reprocesados para su aceptación. Se evidencia mejora en los resultados a partir del fortalecimiento de esquemas de control por parte del Contratista, respecto a los criterios de liberación y aceptación.

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	Indicador	Fórmula	Periodicidad	Meta	Periodo de medición	Variable n.° 1 # de reclamos por cumplimiento de especificaciones técnicas según el contrato n.° 2025-2781 y sus anexos	—	Resultados del Periodo
Cumplir a cabalidad con todas las especificaciones técnicas y manuales de diseño que exige el cliente	Número de reclamos por incumplimiento de las especificaciones técnicas	# de reclamos por cumplimiento de especificaciones técnicas según el contrato n.° 2025-2781 y sus anexos	Mensual	<= 5%	Dic 2025	0		0 Se presenta una mejora respecto a los resultados del periodo anterior al fortalecimiento de esquemas de control por parte del Contratista, respecto a los criterios de liberación y aceptación, control de salidas no conformes y fortalecimiento en la fase de planeación incrementado al porcentaje de cumplimiento de especificaciones

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Movilidad Capital

El certificado de cumplimiento del plan de calidad, así como el reporte de cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto e indicadores, plan de calidad del contrato 2025-2781, podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpeta ANX 2.3. Contrato 2025_2781, subcarpeta 1. Reporte cump obj calid.

- **Control de la información documentada**

Con relación a este ítem, la Interventoría revisó las disposiciones establecidas en el plan de calidad del contrato 2025-2781, así como el listado maestro de documentos solicitado por la Interventoría con las actualizaciones al periodo de diciembre de la presente vigencia, igualmente se verificó registros que constituyen anexos del informe mensual. Los resultados de esta verificación son los siguientes:

- A partir de la revisión del listado maestro de documentos, se identificó que para el periodo se incorporó el formato F-PCMOV-51-V00. Acta de Corte. Igualmente se verificó que el contratista aplica efectivamente los controles en la información documentada[8] garantizando el uso y aplicación de los formatos vigentes, así como la disponibilidad y trazabilidad de los registros.

  El certificado de cumplimiento del plan de calidad, el listado maestro de documentos, así como el formato F-PCMOV-51-V00. Acta de Corte, podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpetas ANX 2.3. Contrato 2025_2781 y List Maest Doc., respectivamente.

- **Producción, provisión y conformidad de productos y/o servicios**

Con relación es este factor, la interventoría verifica la aplicación de los métodos de inspección y ensayos a materiales que confirman el cumplimiento de especificaciones (Resistencias de compresión de cilindros de concreto). Es importante mencionar que la interventoría realizó el seguimiento y verificación del cumplimiento de la toma de muestras para la aplicación de ensayos de laboratorio en los diferentes frentes de obra ejecutados durante el mes de diciembre de la vigencia del 2025. Es importante mencionar que los ensayos de resistencia de compresión de cilindros de concreto son validados en su conformidad por el Ingeniero Residente de Obra Civil y desde el componente de calidad se verifica y ratifica la aplicación de los métodos de inspección y ensayos de acuerdo con lo dispuesto en el plan de calidad para el periodo. (Ver ítem 3.3. Certificaciones de cumplimiento de ensayos de materiales).

[8] Información documentada: Información que la organización debe mantener y conservar, en cualquier medio, y que es necesaria para el desarrollo del proyecto y evidencia del cumplimiento de los requisitos. Esta información corresponde al plan de calidad, caracterización de procesos, procedimientos, instructivos, formatos y registros

- **Seguimiento y Medición**

  Se corroboró el monitoreo de los resultados de métricas de calidad mediante las cuales se evalúa el cumplimiento de los objetivos de calidad, tal como se indica en el ítem “Cumplimiento de objetivos de calidad del proyecto e indicadores” de este capítulo.

- **Mejora Continua**

  Ver detalle en el capítulo 3.4. Seguimiento a las acciones de mejoramiento definidas por los contratistas.

3.2.3. Seguimiento del cumplimiento del plan de calidad contrato 2025-2782

Dentro del esquema de seguimiento del cumplimiento del plan de calidad de TPD Ingeniería, para el periodo de diciembre se evaluaron los siguientes aspectos:

- Objetivos de calidad del proyecto e indicadores
- Control de la información documentada
- Recursos materiales e insumos
- Producción, provisión y conformidad de los productos y servicios
- Seguimiento y medición
- Mejora continua.

- **Cumplimiento de objetivos de calidad del proyecto e indicadores**

  Respecto a este ítem, durante el mes de diciembre, el TPD Ingeniería, presentó los resultados de los indicadores mediante los cuales el Contratista mide el cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto.

  En la siguiente tabla se presenta la relación de objetivos de calidad y del proyecto y sus indicadores

Tabla 41. Objetivos de calidad y reporte de resultados de indicadores mes de diciembre del 2025 _ Contrato 2025-2782

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES							
Objetivos de calidad	Indicador	Meta	Periodicidad	Periodo	Variable n.° 1: Facturación Mensual	Variable n.° 2: Presupuesto	Resultados del periodo
Cumplimiento ejecución presupuestal	(Facturación mensual) / (Presupuesto) X 100%	=100%	Mensual	Dic 2025	El dato se relaciona en el informe ejecutivo del periodo	El dato se relaciona en el informe ejecutivo del periodo	100% Los resultados indican que se logró la meta estimada para el periodo
Objetivos de calidad	Indicador	Meta	Periodicidad	Periodo	Variable n.° 1: Órdenes de trabajo ejecutadas	Variable n.° 2: Órdenes de trabajo programadas	Resultados del periodo
Cumplimiento del cronograma	Órdenes de trabajo ejecutadas / Órdenes de trabajo programadas * 100	=100%	Mensual	Dic 2025	7 Actas parciales de recibo a satisfacción	7 Actas parciales de recibo a satisfacción	100% Los resultados indican que se logró la meta estimada para el periodo

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES							
Objetivos de calidad	Indicador	Meta	Periodicidad	Periodo	Variable n.° 1: Facturación Mensual	Variable n.° 2: Presupuesto	Resultados del periodo
Objetivos de calidad	Indicador	Meta	Periodicidad	Periodo	Variable n.° 1:	Variable n.° 2:	Resultados del periodo
Satisfacción del cliente	Cumplimiento de las obligaciones contractuales - acta de cumplimiento para pago	=100%	Mensual	Dic 2025	13 Actas parciales de recibo a satisfacción	13 Actas parciales de recibo a satisfacción	100% Los resultados indican que se logró la meta estimada para el periodo

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Movilidad Capital

El certificado de cumplimiento del plan de calidad, así como el reporte de cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto e indicadores, plan de calidad del contrato 2025-2782, podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpeta ANX 2.3. Contrato 2025_2782, subcarpeta 1. Reporte cump obj calid.

- **Control de la información documentada**

  Con relación a este ítem, la Interventoría revisó las disposiciones establecidas en el plan de calidad del contrato 2025-2782 respecto al control de la información documentada al igual que listado maestro de documentos. Los resultados de esta verificación son los siguientes:

- Los documentos requeridos para el desarrollo del contrato 2025-2782 y ejecución del proyecto han sido identificados, establecidos y categorizados de acuerdo con la estructura documental (Plan de calidad, procedimientos, instructivos, formatos).

- La información documentada es formalizada mediante los respectivos ciclos de revisión y aprobación por las instancias establecidas en el plan de calidad, lo anterior se corroboró a través de validación del respectivo plan de calidad.

- Se corroboró que se monitorea la aplicabilidad de la información documentada y se gestiona los cambios y actualizaciones de acuerdo con los requerimientos del proyecto. Durante el periodo de diciembre, se gestionaron los siguientes cambios:

  - Se modifica y actualiza el formato TPD-F-PCO2782-03. Orden de trabajo terreno corte V01, (Se deroga versión 0)

  - Se modifica y actualiza el formato TPD-F-PCO2782-08. Orden de trabajo pintura en terreno corte V01, (Se deroga versión 0)

  - Se modifica y actualiza el formato TPD-F-PCO2782-09. Orden de trabajo pintura den terreno corte total V01, (Se deroga versión 0)

  El certificado de cumplimiento del plan de calidad, así como el formato actualizado para el periodo, podrá ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpeta ANX 2.3. Contrato 2025_2782, subcarpeta 2. Control inf doc.

- **Recursos insumos y materiales**

  Durante la visita efectuada el 16 de diciembre del 2025, se verificaron las existencias en bodega de los materiales correspondientes a esmalte amarillo cromo medio rápido secado y anticorrosivo gris, así como las que están en uso, las cuales corresponden a los lotes de productos con certificados de calidad y materiales vigentes, identificados con los consecutivos P-0010671 y P-0010556. Lo cual confirma que los insumos y materiales cumplen con las especificaciones y las disposiciones establecidas en el plan de calidad.

El certificado de cumplimiento del plan de calidad, así como los certificados de calidad y materiales, podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpeta ANX 2.3. Contrato 2025_2782, subcarpeta 3. Materiales, respectivamente.

- **Seguimiento y Medición**

  Se corroboró los resultados de métricas de calidad mediante las cuales se evalúa el cumplimiento de los objetivos de calidad, tal como se indica en el ítem “Cumplimiento de objetivos de calidad del proyecto e indicadores” de este capítulo.

- **Mejora Continua**

  Ver detalle en el capítulo 3.4. Seguimiento a las acciones de mejoramiento definidas por los contratistas.

3.2.4. Seguimiento del cumplimiento del plan de calidad contrato 2025-2783

Dentro del esquema de seguimiento del cumplimiento del plan de calidad de Yunex Traffic, para el periodo de diciembre se evaluaron los siguientes aspectos:

- Objetivos de calidad del proyecto e indicadores
- Control de la información documentada
- Recursos de seguimiento y medición
- Producción, provisión y conformidad de los productos y servicios
- Seguimiento y medición
- Mejora continua.

- **Cumplimiento de objetivos de calidad del proyecto e indicadores**

  Respecto a este ítem, durante el mes de diciembre, el Contratista Yunex Traffic, presentó los resultados de los indicadores mediante los cuales el Contratista mide el cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto.

  En la siguiente tabla se presenta la relación de objetivos de calidad y del proyecto y sus indicadores

Tabla 42. Objetivos de calidad y reporte de resultados de indicadores mes de diciembre del 2025_Contrato 2025-2783

OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD	RESULTADOS
Cumplimiento del tiempo de Solución de solicitudes del componente de Equipos de Control de tráfico	TSS (%): ((A[9]-B[10])/(A)) *100	>=95%	Mensual	Los resultados de indicadores al mes de diciembre cumplen con meta y se registran en el informe básico mensual.
Cumplimiento del tiempo de Solución de solicitudes del componente de mantenimiento eléctrico.	TSS (%): ((A-B) /(A)) *100	>=99%	Mensual	Ídem
Calidad de la solución de incidentes del componente de mantenimiento eléctrico	CSI= 1- ((# órdenes de servicios reabiertos) / (#Total de órdenes de servicios recibidas)	>=98%	Mensual	Ídem

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Movilidad Capital

- **Control de la información documentada**

  Con relación a este ítem, la Interventoría revisó las disposiciones establecidas en el plan de calidad del contrato 2025-2783 respecto al control de la información documentada al igual que lo establecido en el listado maestro de documentos. Los resultados de esta verificación son los siguientes:

- Se corroboró que el Contratista Yunex Traffic controla y asegura la disponibilidad y uso de los documentos vigentes del plan de calidad, los cuales corresponden a manuales, procedimientos, instructivos y formatos, entre otros. Lo cual se verificó a partir de las actualizaciones que el Contratista realiza cuando se requieren cambios en su documentación, lo cual se evidencia en el listado maestro de documentos para el periodo.

  El certificado de cumplimiento del plan de calidad, así como el listado maestro de documentos, podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpeta ANX 2.3. Contrato 2025_2783.

- **Recursos _ Dispositivos seguimiento y medición**

  Respecto a este factor durante el mes de diciembre se corroboró que se aplican los controles establecidos en él plan de calidad respecto a plan de mantenimiento y calibración para asegurar la validez de las mediciones a fin de garantizar la conformidad de los servicios de eléctrico y electrónico y central de semaforización.

[9] A: Total mensual de solicitudes realizadas para atención

[10] B: Total mensual de solicitudes fuera de tiempo máximo establecido

En la visita realizada el 16 de diciembre en la intersección en la la ubicación KR 7 X CL 72 externo 1009 ID 152, se verificaron los equipos y dispositivos de medición, así sus respectivos certificados de calibración ratificando la confiabilidad y validez de los resultados inherentes a las mediciones y verificaciones técnicas realizadas.

Se validaron los certificados de calibración y funcionalidad de los equipos correspondientes a:

- Multímetro con número de serial n° 4563440SV
- Medidor de resistencia con número de serial n° E8522889
- Multímetro con número de serial n° 0872516
- Multímetro con número de serial n° C221556054
- Comprobador de aislamiento con número de serial n° 47870008
- Pinza amperimétrica con número de serial n° C241231394
- Multímetro con número de serial n° 62360363MV
- Pinza voltiamperimétrica con número de serial n° C243479735
- Pinza voltiamperimétrica con número de serial n° C243479747

Lo anterior ratifica que se cumple con las disposiciones establecidas en el plan de calidad del contrato No 2025-2783.

El certificado de cumplimiento del plan de calidad, así como los certificados de calibración, podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpetas ANX 2.3. Contrato No 2025_2783 y Recur equip y disps seg y medic, respectivamente.

- **Producción, provisión y conformidad de los productos y/o servicios**

Durante el periodo se verificó a partir de la trazabilidad la conformidad de los servicios de mantenimiento y los resultados de ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio), también se corroboró que no se presentaron salidas No Conformes a las especificaciones.

- **Seguimiento y Medición**

Se corroboró la confiabilidad y validez de los resultados inherentes a las mediciones y verificaciones a través los resultados de los indicadores de calidad los cuales corresponden al cumplimiento de las siguientes métricas:

- Cumplimiento del tiempo de solución de solicitudes del componente de equipos de control de tráfico, cual es mayor al 95%, dando cumplimento a la meta establecida.

- Cumplimiento del tiempo de solución de solicitudes del componente de mantenimiento eléctrico es mayor al 99%, %, dando cumplimento a la meta establecida.

- Calidad (cumplimiento de requisitos) de la solución de incidentes del componente de mantenimiento eléctrico es mayor 98%, dando cumplimento a la meta establecida.

  El certificado de cumplimiento del plan de calidad podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpeta ANX 2.3. Contrato 2025_2783

- **Mejora Continua**

  Ver detalle en el capítulo 3.4. Seguimiento a las acciones de mejoramiento definidas por los contratistas

3.3. Certificaciones de cumplimiento de ensayos de materiales (Aplica sólo a postes y obras civiles)

- **Contrato 2025-2780**

Con relación a este factor, la interventoría verifica la aplicación de los métodos de inspección y ensayos a materiales que confirman el cumplimiento de especificaciones (Resistencias de compresión de cilindros de concreto). Es importante mencionar que la interventoría realizó el seguimiento y verificación del cumplimiento de la toma de muestras para la aplicación de ensayos de laboratorio en los diferentes frentes de obra ejecutados durante el mes de diciembre de la vigencia del 2025. Igualmente, ingeniero residente de la interventoría revisa los registros de laboratorio de ensayos de compresión aplicados en cilindros de concreto de las muestras tomadas, los cuales confirman el cumplimiento de las especificaciones de los materiales y desde el componente de calidad se verifica que se aplicaron los métodos de inspección y ensayos de acuerdo con lo dispuesto en el plan de calidad del contrato 2025-2780.

Dado lo anterior la interventoría confirma que el contratista ha establecido y aplica los métodos de seguimiento y medición para asegurar la conformidad del producto e insumos, dando cumplimiento a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, numeral 8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio, literal c[11] y noma 10005:2018, numeral 6.16. Seguimiento y medición, literales a, b, c y d.

[11] **Numeral 8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio, literal c**: La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable, la implementación de actividades de seguimiento y medición (inspecciones, ensayos y/o pruebas) en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;

Nota: Para el periodo de diciembre se incorporó el formato SEM-TEC-M06-F07. Control de inspección y ensayos – Toma de muestras en campo [12], documento que constituye el registro donde se presenta la información de muestras que se tomaron en las diferentes intervenciones de obra civil especificando dirección, externo y demás datos relacionados. Para este periodo se inició la implementación de este formato de forma parcial para los ensayos de subbase granular y en próximo período se aplica todos los tipos de ensayos incluidos compresión de concreto

El certificado de cumplimiento de calidad y especificación de materiales podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, ANX 3. Certificados cumplimiento ensayos y subcarpetas contrato No. 2025-2780 y 1. Certif Calidad & Materiales, respectivamente. Así certificados de ensayos, podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 3. Certificados cumplimiento ensayos y subcarpetas contrato No. 2025-2780 y 2. Regist Ensay Laborat, correspondientemente.

- **Contrato 2025-2781**

Con relación a este factor, la interventoría verifica la aplicación de los métodos de inspección y ensayos a materiales que confirman el cumplimiento de especificaciones (Resistencias de compresión de cilindros de concreto). Es importante mencionar que la interventoría realizó el seguimiento y verificación del cumplimiento de la toma de muestras para la aplicación de ensayos de laboratorio en los diferentes frentes de obra ejecutados durante el mes de diciembre de la vigencia del 2025. Durante este periodo se incorporó el formato SEM-TEC-M06-F07. Control de inspección y ensayos – Toma de muestras en campo [13] documento que constituye el registro donde se presenta la información de muestras que se tomaron en las diferentes intervenciones de obra civil especificando dirección, externo y demás datos relacionados.

Igualmente, el ingeniero residente revisa los registros de laboratorio de ensayos de compresión aplicados en cilindros de concreto de las muestras tomadas, los cuales confirman el cumplimiento de las especificaciones de los materiales y desde el componente de calidad se verifica que se aplicaron los métodos de inspección y ensayos de acuerdo con lo dispuesto en el plan de calidad del contrato 2025-2781.

Dado lo anterior la interventoría confirma que el contratista ha establecido y aplica los métodos de seguimiento y medición para asegurar la conformidad del producto e insumos, dando cumplimiento a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, numeral 8.5.1. Control de la

[12] **Formato SEM-TEC-M06-F07. Control de inspección y ensayos – Toma de muestras en campo:** En el capítulo 3.5. Creación de documentos se presenta las mejoras, incorporaciones, modificaciones, actualizaciones y/o derogaciones de los formatos del plan de calidad de interventoría contrato n.° 2025-2769.

[13] **Formato SEM-TEC-M06-F07. Control de inspección y ensayos – Toma de muestras en campo:** En el capítulo 3.5. Creación de documentos se presenta las mejoras, incorporaciones, modificaciones, actualizaciones y/o derogaciones de los formatos del plan de calidad de interventoría contrato n.° 2025-2769.

producción y de la provisión del servicio, literal c[14] y noma 10005:2018, numeral 6.16. Seguimiento y medición, literales a, b, c y d.

El certificado de cumplimiento de calidad y especificación de materiales podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, ANX 3. Certificados cumplimiento ensayos y subcarpetas contrato No. 2025-2781 y 1. Certif Calidad & Materiales, respectivamente. Así mismo los registros de control de inspección y ensayos (toma de muestras en campo), podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 3. Certificados cumplimiento ensayos y subcarpetas contrato No. 2025-2781 y 2. Regist Control Insp & Ensayos, correspondientemente.

Los registros de ensayo de resistencias de compresión de cilindros de concreto y podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 3. Certificados cumplimiento ensayos y subcarpetas contrato No. 2025-2781 y 3. Regist Ensay Laborat, respectivamente.

- **Contrato 2025-2782**

El día 16 de diciembre de 2025, se realizaron las pruebas de inspección de pintura de postes metálicos, mediante muestras tomadas en la bodega del Contratista la cual está ubicada en la calle 165 #56 A – 45 y en terreno en la ubicación AK X CL72 externo 1009 ID 152.

La Interventoría solicitó pruebas en cuatro (4) postes diferentes, dos (2) de ellos ubicados en la bodega del Contratista que corresponden a un (1) poste T1 y un (1) poste T2 de 4,5 m. Los otros dos (2) postes corresponden a un (1) T1 y un (1) T2 de 5,5 m ubicados en AK 7 X CL72 externo 1009 ID 152.

Durante la inspección[15] de pintura, se dibujó con un bisturí sobre la superficie del poste pintado, una cuadrícula de cuarenta y nueve cuadros (49), sobre la cual se colocó cinta transparente de embalaje, con ancho de 48 mm y adhesivo acrílico, el cual fue posteriormente retirado, corroborando que el porcentaje de desprendimiento de los cuadros al retirar la cinta estuvo por debajo del 30%, lo cual está dentro del porcentaje máximo permitido. Dado lo anterior se concluye que el producto es conforme a las especificaciones de acuerdo con el anexo técnico 1D, numeral “7.1.2.2. Aplicación de la pintura.

Considerando las premisas expuestas, la Interventoría ratifica la conformidad de los resultados de las pruebas de pintura y certifica el cumplimiento de calidad y especificaciones de los materiales (Esmalte amarillo cromo medio rápido secado y esmalte negro rápido secado). Así

---

[14] **Numeral 8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio, literal c**: La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable, la implementación de actividades de seguimiento y medición (inspecciones, ensayos y/o pruebas) en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;


[15] **Inspección:** Actividad mediante la cual se examina un producto, proceso o servicio utilizando medición, observación, comparación o evaluación con requisitos específicos. El objetivo es verificar si cumple con las especificaciones de dimensiones y/o características de tipo visual

mismo confirma que se cumple con la frecuencia de las inspecciones de acuerdo con lo establecido en el plan de calidad de TPD Ingeniería.

El certificado de cumplimiento de calidad y los registros correspondientes a las pruebas de calidad de pintura podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, subcarpeta ANX 3. Certificados cumplimiento ensayos, subcarpeta Contrato 2025_2782.


En las siguientes tablas se presentan los registros fotográficos de la inspección realizada el 16 de diciembre del 2025 en la bodega de TPD Ingeniería y terreno.

Tabla 43. Registro fotográfico de pruebas de inspección de pintura practicadas durante diciembre en bodega de la contratista ubicada en calle 165 #56ª-45

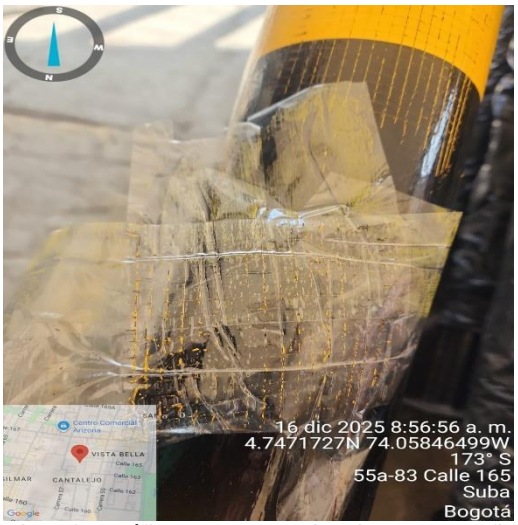PRUEBAS DE INSPECCIÓN DEL PERIODO	
 Registro fotográfico n.° 1. Primera actividad, se marcan puntos horizontal y verticalmente para trazar cuadrícula y se procede a trazar cuadrícula	 Registro fotográfico n.° 2. Se verifica cuadrícula para colocar cinta adhesiva extrafuerte para realizar prueba
 Registro fotográfico n.° 3. Se coloca cinta adhesiva y procede a retirarse	 Registro fotográfico n.° 4. Se retira cinta y se confirma que porcentaje de desprendimiento de cuadros está por debajo del 30%, dando cumplimiento a las especificaciones establecidas en la norma técnica NTC 811:2016 (métodos para medir la adhesión de un recubrimiento mediante el ensayo de cinta en pinturas), así como del anexo técnico 1D

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Movilidad Capital

Tabla 44. Registro fotográfico de pruebas de inspección de pintura practicadas durante diciembre en la AK 7 X CL 72 externo 1009 ID 152

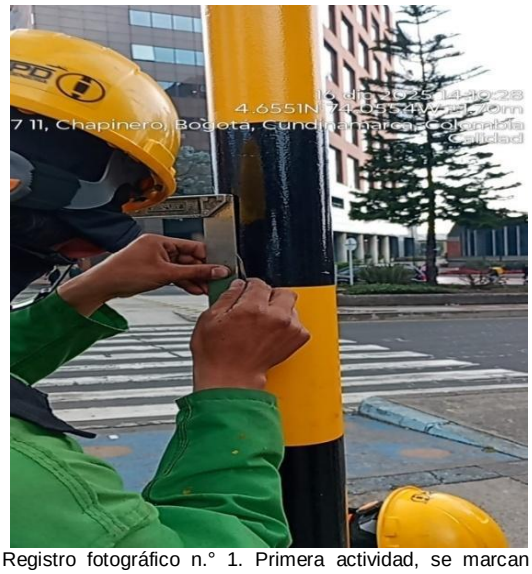PRUEBAS DE INSPECCIÓN DEL PERIODO	
 Registro fotográfico n.° 1. Primera actividad, se marcan puntos horizontal y verticalmente para trazar cuadrícula y se procede a trazar cuadrícula	 Registro fotográfico n.° 2. Se verifica cuadrícula para colocar cinta adhesiva extrafuerte para realizar prueba
 Registro fotográfico n.° 3. Se coloca cinta adhesiva y procede a retirarse	 Registro fotográfico n.° 4. Se retira cinta y se confirma que porcentaje de desprendimiento de cuadros está por debajo del 30%, dando cumplimiento a las especificaciones establecidas en la norma técnica NTC 811:2016 (métodos para medir la adhesión de un recubrimiento mediante el ensayo de cinta en pinturas), así como del anexo técnico 1D

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Movilidad Capital

También es importante mencionar que la durante la visita realizada a la bodega de TPD Ingeniería, el día 16 de diciembre del 2025, se verificaron los insumos correspondientes a esmalte negro de secado rápido, esmalte amarillo cromo medio de rápido secado, así como sus respectivos certificados. A continuación, se presenta los resultados:

- Esmalte amarillo cromo medio rápido secado, con certificado de calidad emitido el 25 de noviembre del 2025 por Pintuflex, con vigencia hasta el 15 de noviembre del 2026, este documento presenta los resultados de los ensayos aplicados al lote de producto P-0010671 bajo la norma técnica NTC 6325-Esmaltes sintéticos de secamiento al aire e instructivos, lo cual confirma que el insumo cumple con las especificaciones. Durante la visita se corroboró que las existencias en bodega de este material, así como las que están en uso corresponden a lote de producto indicado.

- Anticorrosivo gris, con certificado de calidad emitido el 28 de octubre del 2025 por Pintuflex, con vigencia hasta el 28 de octubre del 2026, este documento presenta los resultados de los ensayos aplicados al lote de producto P-0010556 bajo la norma técnica NTC 1651-Imprimantes anticorrosivos, lo cual confirma que el insumo cumple con las especificaciones. Durante la visita se corroboró que las existencias en bodega de este material, así como las que están en uso corresponden a lote de producto indicado.

De acuerdo con lo establecido en el plan de calidad de TPD Ingeniería, en el anexo correspondiente a la estructura desglosada de trabajo, la Interventoría ratifica que el Contratista ha establecido y aplica los métodos de seguimiento y medición para asegurar la conformidad del producto (acabados pintura de postes metálicos) de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por SDM, así como las etapas de aplicación de acuerdo con el proceso.

El certificado de cumplimiento de calidad y especificación de materiales podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, ANX 3. Certificados cumplimiento ensayos y subcarpetas contrato No. 2025-2782 y 1. Certif Calidad & Materiales, respectivamente. Así mismo el registro de la prueba de calidad de pintura del mes de diciembre, podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, ANX 3. Certificados cumplimiento ensayos y subcarpetas contrato No. 2025-2782 y 2. Prueba de pintura, correspondientemente.

Los certificados de materiales (esmalte amarillo cromo medio rápido secado y anticorrosivo gris), podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 3. Certificados cumplimiento ensayos, y subcarpetas contrato 2025-2782 y certificados de materiales, respectivamente.

3.4. Seguimiento a las acciones de mejoramiento definidas por los contratistas

- **Contrato 2025-2780**

  Durante el mes diciembre las acciones de mejora (correctivas y/o preventivas) se focalizan en el uso y aplicación de los formatos establecidos por el contratista de acuerdo con el plan de calidad del contrato del 2025-2780

- **Contrato 2025-2781**

  Durante el mes de diciembre se realiza seguimiento a la efectividad de las acciones de mejora (correctivas) desarrolladas para la eliminación de la causa raíz de los hallazgos en los componentes técnico, Mántum, PMT[16], SST[17], generando los siguientes resultados:

  - Se reiteran hallazgos en el componente de SST respecto suministro de dotación y EPP para la protección de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, así prevención de accidentes y enfermedades y cumplimiento regulatorio y normativo

  - Se reiteran hallazgos en el componente de SST respecto cerramientos y señalización los cuales previenen accidentes de trabajadores y terceros (comunidad, transeúntes, etc.), alertan sobre peligros, aseguran el cumplimiento de la normativa y orientan comportamientos seguros entre otros.

  - Se reiteran hallazgos en el componente de ambiental respecto al adecuada recolección y tratamiento de los RCD[18], la cual se focaliza en reducción de contaminación ambiental, prevención de riesgos que impactan las condiciones seguridad y salud de trabajadores y terceros (transeúntes y comunidad), aprovechamiento y reciclaje y cumplimiento de regulatorio y normativo.

  Teniendo en cuenta lo anterior nuevamente se llevó a cabo una mesa de trabajo con los profesionales de seguridad y salud en trabajo de la interventoría y el contratista para la revisión nuevamente de la causa raíz de los hallazgos que continúan retirándose y establecimiento de acciones focalizadas al cierre definitivo. El plan de acción redefinido podrá ser consultado en el reporte consolidado de acciones correctivas y/o preventivas. Los resultados de estas acciones se presentarán en el siguiente periodo.

  El reporte consolidado de acciones correctivas y/o preventivas actualizado al mes de diciembre, así el estatus de ejecución podrá ser consultados, podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 4. Plan de Mejoras, subcarpeta contrato 2025-2781.

[16] PMT: Plan de Manejo de Tránsito

[17] SST: Seguridad y Salud en el Trabajo

[18] RCD: Residuos de construcción y demolición

- **Contrato 2025-2782**

  Durante el mes de diciembre se alcanza un avance del 100% en la ejecución de los planes de acción para el cierre de hallazgos por parte del contratista en los componentes de SST[19] y ambiental. Durante este periodo también se realizó seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas y eliminación de la causa raíz de las no conformidades. El porcentaje de efectividad de la mejora del contratista es 90% destacando el compromiso del contratista. El porcentaje de efectividad se calculó a partir de las recurrencias que se presentaron en el periodo las cuales corresponden a cinco (5) de cuarenta y seis hallazgos acumulados al periodo de corte.

  El reporte consolidado de acciones correctivas y/o preventivas actualizado al mes de diciembre, así como el estatus de ejecución podrá ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 4. Plan de Mejoras, subcarpeta contrato 2025-2782.

- **Contrato 2025-2783**

  Respecto a la ejecución de las acciones de mejora, el contratista alcanzó un cien por ciento (100%) de avance, el cual representa la ejecución total de los planes de acción establecidos para cada uno de los hallazgos. Durante el siguiente periodo se realiza seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas mediante verificación de hallazgos en los que el contratista pudiese reincidir.

  El reporte consolidado de acciones correctivas y/o preventivas actualizado al mes de diciembre, así como el estatus de ejecución podrá ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 4. Plan de Mejoras, subcarpeta contrato 2025-2783.

3.5. Creación de documentos

Durante el periodo de diciembre realizaron incorporaciones, modificaciones y/o actualizaciones y/o derogaciones en los formatos del plan de calidad del contrato 2025-2769, para los componentes de obra civil, calidad y SST[20] y Ambiental. Tal como se especifica a continuación:

- Componente de obra civil

  - Se modifica y actualiza el formato SEM-TEC-M06-F01. Acta de replanteo, V02, (Se deroga versión 1)

  - Se modifica y actualiza el formato SEM-TEC-M06-F02. Orden de fabricación, V02, (Se deroga versión 1)

[19] SST: Seguridad y Salud en el Trabajo

[20] SST: Seguridad y Salud en el Trabajo

- Se modifica y actualiza el formato SEM-TEC-M06-F03. Seguimiento de actividades, V02, (Se deroga versión 1)
- Se modifica y actualiza el formato SEM-TEC-M06-F04. Memorias de cálculo, V02, (Se deroga versión 1)
- Se modifica y actualiza el formato SEM-TEC-M06-F07. Control de inspección y ensayos _ Toma de Muestras en Campo, V02, (Se deroga versión 1)
- Se modifica y actualiza el formato SEM-TEC-M06-F10. Control de lluvias, V02, (Se deroga versión 1)
- Se incorpora el formato SEM-TEC-M06-F11. Reporte de hallazgos, V01
- Se incorpora el formato SEM-TEC-M06-F13. Acta de recibo parcial interventoría semaforización Cto 2025-2780, V01
- Se incorpora el formato SEM-TEC-M06-F14. Acta de recibo parcial interventoría semaforización Cto 2025-2781, V01
- Se deroga el formato SEM-TEC-M06-F05. Orden de servicio, V01

- Componente de calidad
  - Se modifica y actualiza el formato SEM-CAL-M06-F08. Aseguramiento de la aplicabilidad de formatos, V01

- Componente de SST y Ambiental
  - Se formaliza el procedimiento SEM-TEC-M06-F01. Conformación del comité paritario V01

En la siguiente tabla se presenta el resumen consolidado a corte del 31 de diciembre del 2025, de los documentos registrados como vigentes en el listado maestro.

Tabla 45. Relación de documentación al mes de diciembre del 2025 _ Plan de calidad contrato 2025-2769

Proceso	Metodología y caracterización del proceso	Procedimiento	Manual	Reglamento	Formatos	Total, por Proceso
Control y vigilancia financiera y presupuestal	1	0	0	0	4	5
Gestión de calidad, evaluación y mejora continua	0	0	0	0	8	8
Gestión de la información documental	1	0	0	0	9	10
Gestión Mántum	1	0	0	0	1	2
SG-SST y Ambiental	1	2	1	1	34	39
Supervisión y control de la gestión de tránsito	1	0	0	0	2	3
Supervisión y control técnico del componente de los eléctricos y equipos de control de semaforización	1	0	0	0	19	20
Supervisión y control técnico del componente de obra civil	1	0	0	0	14	15
Supervisión y control técnico del componente de postes metálicos	1	0	0	0	11	12
Vigilancia del cumplimiento contractual y marco regulatorio	1	1	0	0	0	2
Total, por tipo de documento	9	2	1	1	97	116

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

El listado maestro de documentos del plan de calidad del contrato 2025-2769, con corte a diciembre del 2025, podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, subcarpetas ANX 5 Formatos

generales de Interventoría y 1. Listado Maest Doc, respectivamente. Así mismo los formatos incorporados, actualizados, modificados y/o derogados para los componentes de obra civil y calidad, podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, subcarpetas ANX 5 Formatos generales de Interventoría y 2.1. Formatos Comp O. Civil y 2.2. Formatos Comp Calidad, correspondientemente.

3.6. Correspondencia

Tabla 46. Listado de correspondencia recibida y enviada en el periodo de diciembre del 2025

FECHA	RADICADO SDM	ASUNTO	REMITENTE	ENTIDAD QUE RECIBE	ESTADO
22/Dic/25	TPD2782-244-25 con radicado Orfeo n° 202561204700022	Atención a requerimiento componente de calidad, factor cumplimiento de objetivos de calidad y resultados de indicadores.	TPD Ingeniería	Consorcio Movilidad Capital	Cerrado
31/Dic/25	TPD2782-253-25 con radicado Orfeo n° 202561204786312	Atención a requerimiento componente de calidad, factor cambios y actualizaciones de la información documentada focalizada en formatos	TPD Ingeniería	Consorcio Movilidad Capital	Cerrado
24/Dic/25	SEM-CMC-CM25-174-25 con radicado Orfeo n° 202561204727432	Acción correctiva programación semanal de actividades de obra	Consorcio Movilidad Capital	Consorcio Movilidad 2025	En seguimiento
31/Dic/25	SEM-CMC-SDM-134-25 con radicado Orfeo n° 202561204788122	Actualización del plan de calidad	Consorcio Movilidad Capital	SDM[21]	Cerrado, se presentó la respectiva sustentación por parte de la interventoría a SDM quien emite aprobación

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Los soportes de la correspondencia recibida y enviada durante el mes de diciembre podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, subcarpeta ANX 6 Correspondencia, subcarpetas “Enviadas”.

[21] SDM: Secretaria Distrital de Movilidad


3.7. Conclusiones y Recomendaciones

- **Contrato 2025-2780**

Respecto al plan de calidad del contrato 2025-2780, aprobado mediante el comunicado EM-CMC-CBM-083-23 del 18 de julio del 2025 con radicado en Orfeo con el consecutivo n.° 202561203439992, durante el periodo de diciembre se realizó la verificación de los factores de calidad correspondientes: a) objetivos de calidad, b) control de la información documentada, c) producción, provisión y conformidad de los productos y servicios, d) seguimiento y medición y e) mejora continua.

A continuación, se presenta el avance de cada de los factores de calidad evaluados para el periodo

Ilustración 1. Nivel de cumplimiento factores de calidad factores plan de calidad evaluados para contrato 2025- 2780 durante el periodo de diciembre del 2025

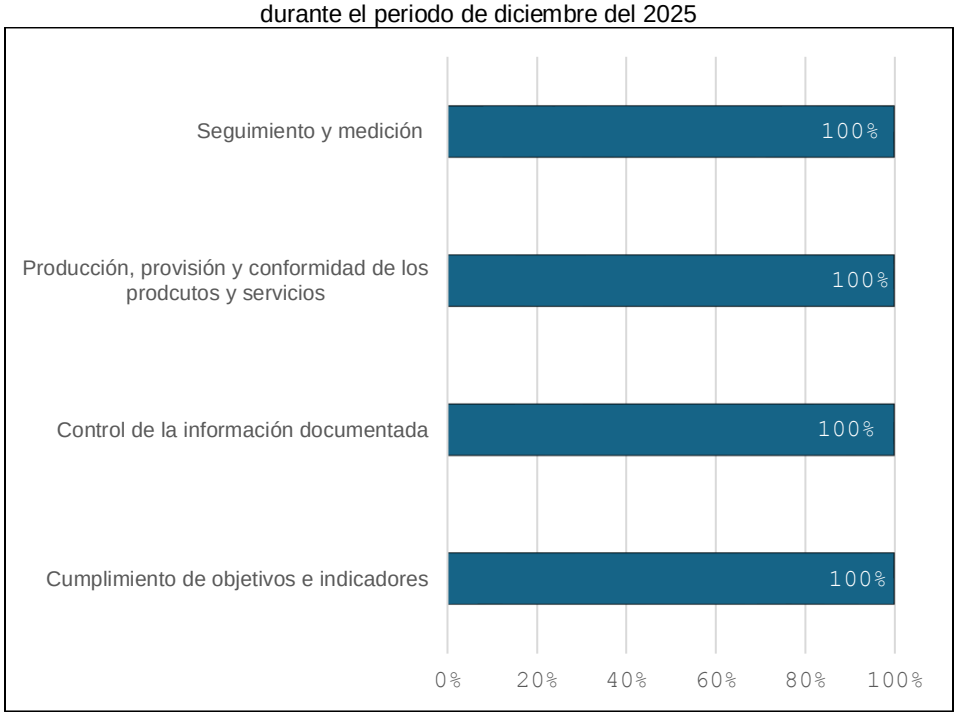

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

- Dado lo anterior se emiten las siguientes conclusiones:

  - El nivel de cumplimiento del plan de calidad del contratista Consorcio Belzcon Movilidad es del noventa y cuatro por ciento (94%).

- Respecto a la medición del nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad a través de indicadores se concluye que el contratista Consorcio Belzcon Movilidad cumple con las disposiciones establecidas en el plan de calidad.

- Respecto a los factores de producción, provisión y conformidad de los productos y servicios, y seguimiento y medición, se ratifica que el contratista cumple con disposiciones establecidas en el plan de calidad.

- Respecto al factor seguimiento y medición, para el periodo la interventoría incorporó mejoras en el proceso de seguimiento de toma de muestras de conos de cilindros de concreto para verificar la conformidad de productos. Esta mejora se incluye mediante el formato SEM-TEC-M06-F07. Control de inspección y ensayos – Toma de muestras en campo [22], documento que constituye el registro donde se presenta la información de muestras que se tomaron en las diferentes intervenciones de obra civil especificando dirección, externo y demás datos relacionados. Mediante esta acción de mejora se incrementa la confiabilidad técnica del contratista Consorcio Belzcon Movilidad.

- Respecto al factor de calidad control de información documentada, durante el periodo de diciembre se ratifica el cumplimiento del este requisito de acuerdo con las disposiciones establecidas en el plan de calidad, es importante mencionar que la interventoría implementó el registro SEM-CAL-M01-F08. Aseguramiento de la aplicabilidad de los formatos y confirman su uso de acuerdo con las disposiciones establecidas en el listado maestro de documentos del contratista.


- **Contrato 2025-2781**

Respecto al plan de calidad del contrato 2025-2781, aprobado mediante el comunicado SEM-CMC-CM25-071-25, 05 de septiembre del 2025, con radicado en Orfeo con el consecutivo n.° 202561203273912, durante el periodo de diciembre se realizó la verificación de los factores de calidad correspondientes: a) objetivos de calidad e indicadores, b) control de la información documentada, c) procesos, productos y servicios proporcionados externamente, d) producción, provisión y conformidad de los productos y servicios, e) seguimiento y medición y f) mejora continua.

A continuación, se presenta el avance de cada de los factores de calidad evaluados para el periodo

[22] **Formato SEM-TEC-M06-F07. Control de inspección y ensayos – Toma de muestras en campo:** En el capítulo 3.5. Creación de documentos se presentan las mejoras, incorporaciones, modificaciones, actualizaciones y/o derogaciones de los formatos del plan de calidad de interventoría contrato 2025-2769.

Ilustración 2. Nivel de cumplimiento factores de calidad factores plan de calidad evaluados para contrato n.° 2025-2781 durante el periodo de diciembre del 2025

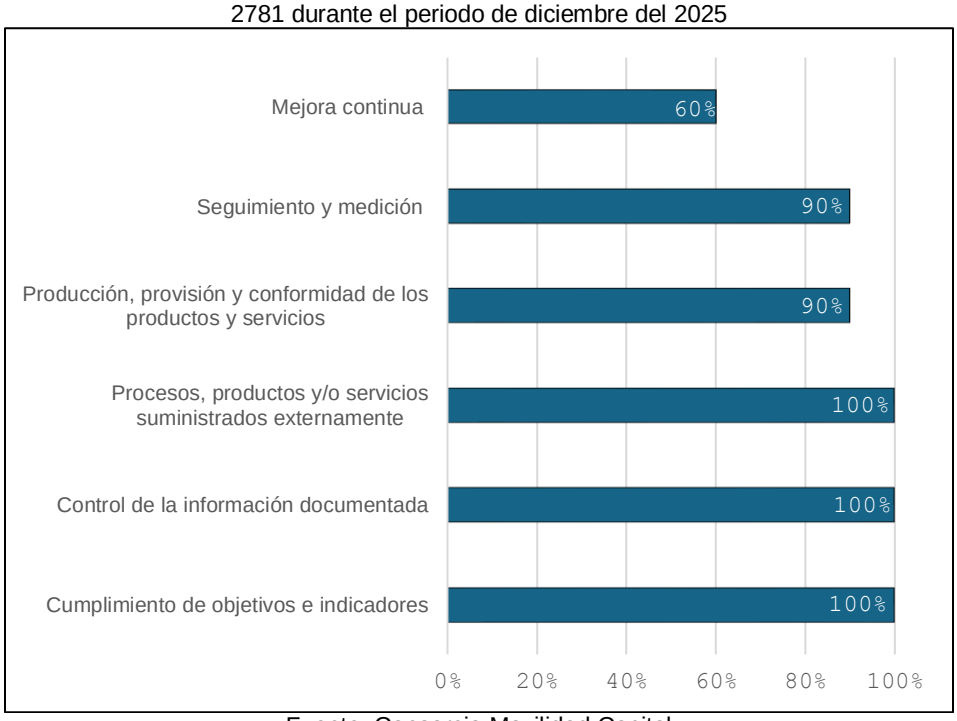

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

Dado lo anterior se emiten las siguientes conclusiones:

- El nivel de cumplimiento del plan de calidad del contratista Consorcio Movilidad 2025 es del noventa por ciento (90%).
- Respecto la medición del nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad a través de indicadores se concluye que el contratista Consorcio Movilidad 2025 cumple con las disposiciones establecidas en el plan de calidad. A partir del análisis de los resultados de indicadores se confirma el cumplimiento y mejora del contratista respecto al objetivo de calidad correspondiente al cumplimiento de especificaciones técnicas, respecto al objetivo cumplimiento de plazos estipulados, los resultados del indicador evidencian que no se alcanza la meta establecida. Las acciones de mejora se focalizan en el fortalecimiento de esquema de control de actividades en obra y aseguramiento de cumplimiento de entregas dentro de las fechas esperadas.
- El contratista Consorcio Movilidad 2025 cumple con los requisitos y controles establecidos en el plan de calidad, respecto a la información documentada (formatos) es importante mencionar que para el periodo de diciembre la interventoría implementó el registro SEM-CAL-M01-F08. Aseguramiento de la aplicabilidad de los formatos y confirman su uso de acuerdo con las disposiciones establecidas en el listado maestro de documentos del contratista.

- Respecto al factor de producción, provisión y conformidad de los productos y servicios, se continúa con el desarrollo de las medidas exigidas por la interventoría respecto a la programación y socialización semanal de actividades, acción que contribuye a la articulación entre las partes, mayor efectividad de los controles operacionales, mejoras en la coordinación y disponibilidad de recursos y mayor aseguramiento para el cumplimiento de especificaciones de los productos y/o servicios.

- Durante el periodo de diciembre se logró un avance del cien por ciento (100%) en el desarrollo los planes de acción para la eliminación de causa raíz de los hallazgos en los componentes técnico, Mántum, PMT[23], SST[24], Ambiental. Sin embargo, durante el periodo de diciembre se reiteraron hallazgos en los componentes de SST y Ambiental, concluyendo que las casusas reales de algunos hallazgos no han sido eliminadas, por tanto, se redefinen algunas acciones de mejora. Dado lo anterior se actualiza un nivel de cumplimiento del sesenta (60%) respecto a este factor.

- **Contrato n.° 2025-2782**


Respecto al plan de calidad del contrato 2025-2782, aprobado mediante el comunicado SEM-CMC-TPD-040-25, del 11 de julio del 20025, con radicado en Orfeo con el consecutivo n.° 202561202408362, durante el periodo de diciembre se realizó la verificación de los factores de calidad correspondientes: a) objetivos de calidad e indicadores, b) control de la información documentada, c) recursos e insumos y materiales, d) producción, provisión y conformidad de los productos y servicios, c) seguimiento y medición y e) mejora continua.

A continuación, se presenta el avance de cada de los factores de calidad evaluados para el periodo

[23] PMT: Plan de Manejo de Tránsito

[24] SST: Seguridad y Salud en el Trabajo

Ilustración 3. Nivel de cumplimiento factores de calidad factores plan de calidad evaluados para contrato n.° 2025-2782 durante el periodo de diciembre del 2025

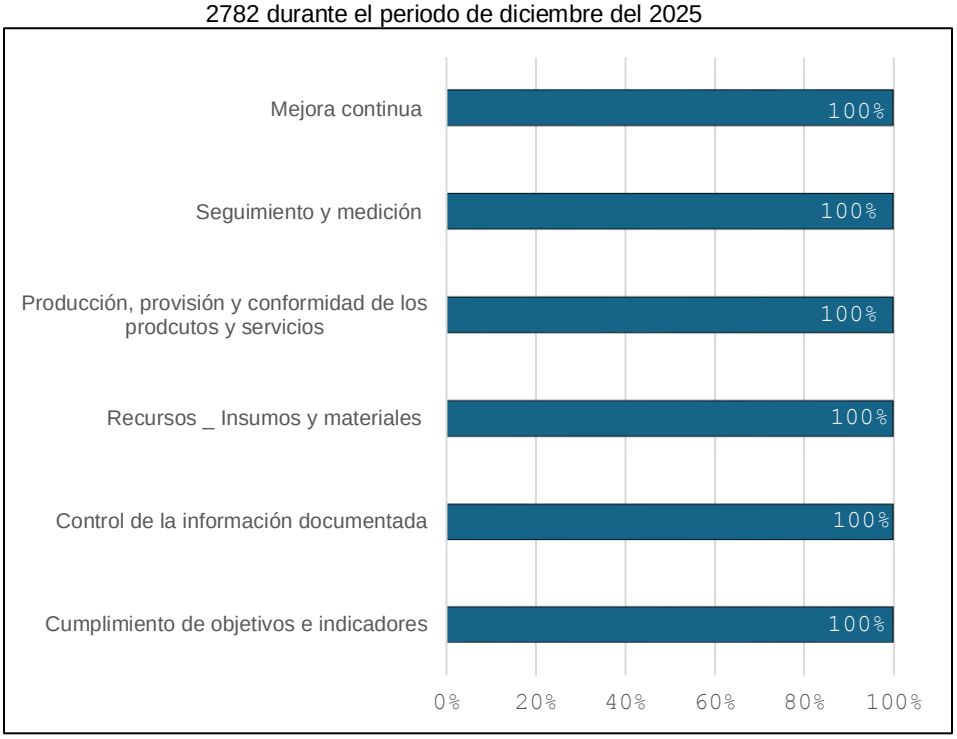

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

Dado lo anterior se emiten las siguientes conclusiones:

- El nivel de cumplimiento del plan de calidad del contratista TPD Ingeniería es del cien por ciento (100%).
- Respecto a la medición del nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad a través de indicadores se concluye que el contratista TPD Ingeniería cumple con las disposiciones establecidas en el plan de calidad.
- El contratista TPD Ingeniería cumple con los requisitos y controles establecidos en el plan de calidad, respecto a la información documentada[25] (formatos).
- Respecto al factor de calidad recursos, insumos y materiales, la interventoría ratifica que estos cumplen con las especificaciones requeridas para asegurar la conformidad de los postes metálicos de acuerdo con lo establecido en el plan de calidad.

[25] INFORMACIÓN DOCUMENTADA: Corresponde a la información que se debe controlar y mantener, para el desarrollo del proyecto incluye procedimientos, instructivos, formatos y documentos externos

- Respecto a los factores de producción, provisión y conformidad de los productos y servicios, y seguimiento y medición, se ratifica que el contratista cumple con disposiciones establecidas en el plan de calidad.

- Con relación al factor de calidad mejora continua, el contratista TPD Ingeniería alcanzó un cien por ciento (100%) de avance en desarrollo de los planes de acción para cada una de las acciones correctivas y/o preventivas establecidas para cada uno de los hallazgos

- El contratista alcanza un avance del 100% en la ejecución de los planes de acción para el cierre de hallazgos por parte del contratista en los componentes de SST[26] y ambiental, con un nivel de efectividad en la mejora del 90% destacando el compromiso del contratista.


- **Contrato n.° 2025-2783**

  Respecto al plan de calidad del contrato n° 2025-2783, aprobado mediante el comunicado SEM-CMC-YT25-018-25 del 21 de julio del 2025, con radicado en Orfeo con el consecutivo n.° 202561202536202, durante el periodo de diciembre se realizó la verificación de los factores de calidad correspondientes: a) objetivos de calidad e indicadores, b) control de la información documentada, c) recursos y dispositivos de seguimiento y medición, d) producción, provisión y conformidad de los productos y servicios, e) seguimiento y medición y f) mejora continua.

  A continuación, se presenta el avance de cada de los factores de calidad evaluados para el periodo

[26] SST: Seguridad y Salud en el Trabajo

Ilustración 4. Nivel de cumplimiento factores de calidad factores plan de calidad evaluados para contrato n.° 2025-2783 durante el periodo de diciembre del 2025

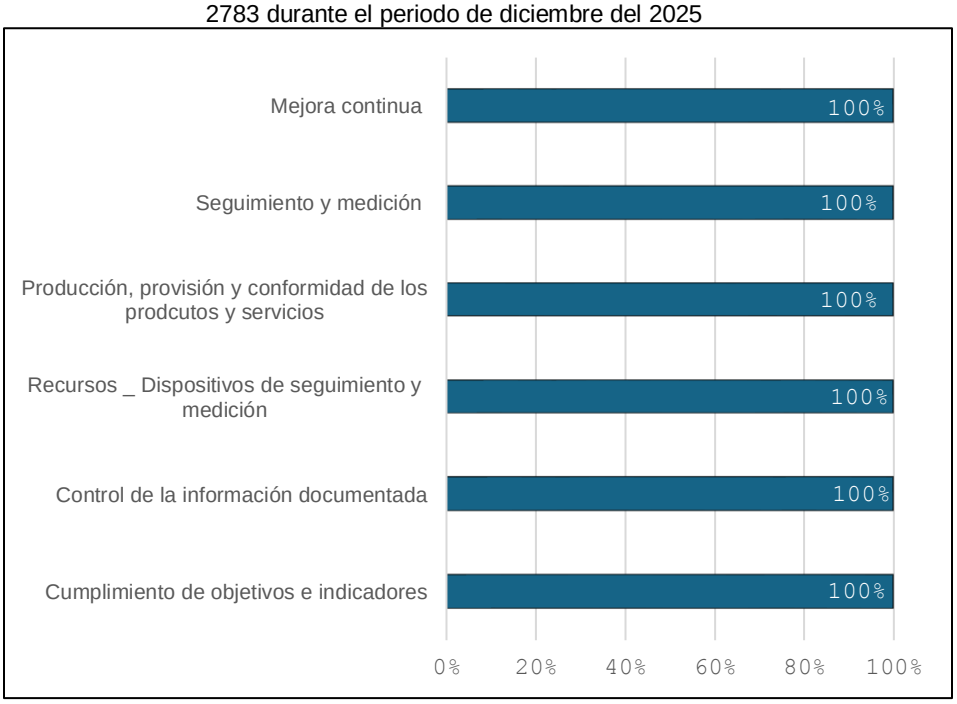

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

- Dado lo anterior se emiten las siguientes conclusiones:
- El nivel de cumplimiento del plan de calidad del contratista Yunex Traffic es del cien por ciento (100%)
- Respecto la medición del nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad a través de indicadores se concluye que el contratista Yunex Traffic cumple con las disposiciones establecidas en el plan de calidad
- El contratista Yunex Traffic cumple con los requisitos y controles establecidos en el plan de calidad, respecto a la información documentada[27] (formatos).
- Respecto al factor de calidad dispositivos de seguimiento y medición, la interventoría ratifica que estos cumplen con las especificaciones requeridas para asegurar la conformidad de los postes metálicos de acuerdo con lo establecido en el plan de calidad.

[27] INFORMACIÓN DOCUMENTADA: Corresponde a la información que se debe controlar y mantener, para el desarrollo del proyecto incluye procedimientos, instructivos, formatos y documentos externos

4. CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN Y REGISTROS DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES QUE GENERAN PUNTAJE ADICIONAL

En las siguientes tablas se especifica las condiciones que generaron puntaje adicional por contrato y la relación de los informes y la referenciación de los anexos donde podrán ser consultados los respectivos soportes que acreditan su cumplimiento

Tabla 47. Relación de contratos y condiciones que generaron puntaje adicional

Condición que generó puntaje adicional	Contrato 2025-2769	Contrato 2025-2780	Contrato 2025-2781	Contrato 2025-2782	Contrato 2025-2783
Vinculación de personas en condición de discapacidad	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado
Industria nacional	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	No Aplica
Emprendimientos y empresas de mujeres	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	No Aplica
MIPYME	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	No Aplica
Factor de calidad	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado
Decreto 332/2020 modificado por el 634 del 2023	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado	Puntaje Otorgado

Fuente: Interventoría

Tabla 48. Relación de informes y anexos que evidencian el cumplimiento por parte del contratista

Condición que generó puntaje adicional	Contrato 2025-2769	Contrato 2025-2780	Contrato 2025-2781	Contrato 2025-2782	Contrato 2025-2783
	Informe donde se detalla las actividades de verificación y aseguramiento ejecutadas por la interventoría y soportes que evidencias su cumplimiento	Informe donde se detalla las actividades de verificación y aseguramiento ejecutadas por la interventoría y soportes que evidencias su cumplimiento	Informe donde se detalla las actividades de verificación y aseguramiento ejecutadas por la interventoría y soportes que evidencias su cumplimiento	Informe donde se detalla las actividades de verificación y aseguramiento ejecutadas por la interventoría y soportes que evidencias su cumplimiento	Informe donde se detalla las actividades de verificación y aseguramiento ejecutadas por la interventoría y soportes que evidencias su cumplimiento
Vinculación de personas en condición de discapacidad	Informe Transversal de Interventoría n° 9, consultar anexos del componente de SST, carpeta ANX-13. Certificado de Discapacidad	Informe Básico de Interventoría n° 9 – Contrato 2025-2780, consultar anexo n° 16. aspectos que generan puntaje adicional	Informe Básico de Interventoría n° 9 – Contrato 2025-2781, consultar anexo n° 19. aspectos que generan puntaje adicional	Informe Básico de Interventoría n° 9 – Contrato 2025-2782, consultar anexo n° 13. aspectos que generan puntaje adicional	Informe Básico de Interventoría n° 9 – Contrato 2025-2782, consultar anexo n° 15. aspectos que generan puntaje adicional
Industria nacional	Informe Transversal de Interventoría n° 9, consultar anexos del componente de SST, carpeta ANX-15. Industria Nacional	Ídem	Ídem	Ídem	–
Emprendimientos y empresas de mujeres	Informe Transversal de Interventoría n° 9, consultar anexos del componente de SST, carpeta ANX-17. Certificado de Emprendimiento Mujeres	Ídem	Ídem	Ídem	–

Condición que generó puntaje adicional	Contrato 2025-2769	Contrato 2025-2780	Contrato 2025-2781	Contrato 2025-2782	Contrato 2025-2783
	Informe donde se detalla las actividades de verificación y aseguramiento ejecutadas por la interventoría y soportes que evidencias su cumplimiento	Informe donde se detalla las actividades de verificación y aseguramiento ejecutadas por la interventoría y soportes que evidencias su cumplimiento	Informe donde se detalla las actividades de verificación y aseguramiento ejecutadas por la interventoría y soportes que evidencias su cumplimiento	Informe donde se detalla las actividades de verificación y aseguramiento ejecutadas por la interventoría y soportes que evidencias su cumplimiento	Informe donde se detalla las actividades de verificación y aseguramiento ejecutadas por la interventoría y soportes que evidencias su cumplimiento
MYPIME	Informe Transversal de Interventoría n° 9, consultar anexos del componente de SST, carpeta ANX-16. Certificado MYPIME	Ídem	Ídem	Ídem	–
Factor de calidad	Informe Transversal de Interventoría n° 9, consultar capitulo n° 3	Informe Transversal de Interventoría n° 9, consultar anexo ANX 2. Certificados cumplimiento P.C[28] x contrato	Informe Transversal de Interventoría n° 9, consultar anexo ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato	Informe Transversal de Interventoría n° 9, consultar anexo ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato	Informe Transversal de Interventoría n° 9, consultar anexo ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato
Decreto 332/2020 modificado por el 634 del 2023	Informe Transversal de Interventoría n° 9, consultar anexos del componente de SST, carpeta ANX-11. Seguimiento Decreto 634	Informe Transversal de Interventoría n° 9, consultar anexos del componente de SST, carpeta ANX-11. Seguimiento Decreto 634	Informe Transversal de Interventoría n° 9, consultar anexos del componente de SST, carpeta ANX-11. Seguimiento Decreto 634	Informe Transversal de Interventoría n° 9, consultar anexos del componente de SST, carpeta ANX-11. Seguimiento Decreto 634	Informe Transversal de Interventoría n° 9, consultar anexos del componente de SST, carpeta ANX-11. Seguimiento Decreto 634

Fuente: Interventoría

[28] P.C: Plan de calidad

Los anexos al presente informe se encuentran alojados en la siguiente ruta:

https://drive.google.com/drive/folders/1XgAdXdGPTKFsTeee8578LQW94JodYbv5?usp=drive_link
