
REINPR SAS
CONSULTORIA Y OBRA CIVIL
NIT: 800.245854-7

INFORME MENSUAL No. 29

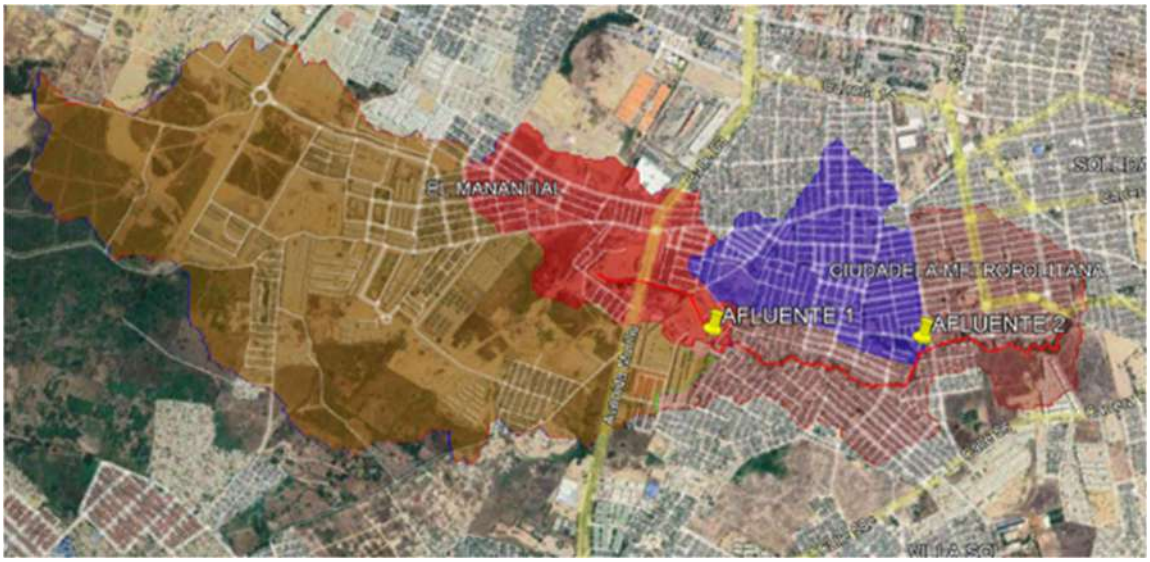

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0289 de 2023

INFORME MENSUAL No. 29

PERIODO DE EJECUCION:
DEL 15 ENERO 2025 AL 14 DE FEBRERO 2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

2.1 LOCALIZACIÓN 5
2.2 ACTIVIDADES A EJECUTAR 7
2.2.1 Etapa 1: Construcción 7
2.2.2 Etapa 2: Mantenimiento 12

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 13

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 13
3.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 14
3.3 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 21
3.4 PERSONAL DEL CONTRATISTA 25

4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 28

4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS 28

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 36

5.1 INFORMACIÓN GENERAL 36
5.2 PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORÍA 37
5.3 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 41

6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 42

6.1 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 50
6.2 ENSAYOS LABORATORIO 57
6.3 SEGUIMIENTO SST 58
6.4 SEGUIMIENTO SOCIAL 59
6.5 SEGUIMIENTO AMBIENTAL 60
6.6 PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DE OBRA 62

7 CONCLUSIONES 63

8 ANEXOS 65

ANEXO 1: ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 66
ANEXO 2: INFORMES SEMANALES 67
ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO 68
ANEXO 4: BITACORA DE OBRA 69
ANEXO 5: INSPECCIÓN SST 70
ANEXO 6: INSPECCIÓN SOCIAL 71
ANEXO 7: INSPECCIÓN AMBIENTAL 72
ANEXO 8: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE LA OBRA 73
ANEXO 9: PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 74
ANEXO 10: SEGUIMIENTO DE CALIDAD 75
ANEXO 11: PLANOS Y CARTERAS TOPOGRAFICAS 76

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1 Información General Contrato de Obra. ---------- 13
Tabla 3.2 Presupuesto de obra. ---------- 14
Tabla 5.1 Información General Contrato de Interventoría. ---------- 36
Tabla 5.2 Presupuesto Interventoría. ---------- 37

Tabla 5.3 Personal de la Interventoría. ----------24

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1. Localización del proyecto. Fuente: estudios previos definitivos---------- 6
Figura 2.2. Localización Especifica del Proyecto. Fuente: Estudios previos definitivos----- 7

INTRODUCCIÓN

Las características topográficas de la zona presentan pendientes longitudinales y transversales adecuadas para la evacuación de las aguas de escorrentía, sin embargo, por ser un terreno plano y no contar con obras adecuadas para el encausamiento de las escorrentías superficiales, en temporada de lluvias se presentan estancamientos y formación de grandes corrientes que afectan no solo viviendas, sino cualquier estructura que se atraviese a su paso, generando situaciones de riesgo para los habitantes que año tras año deben luchar con los estragos que deja la época invernal, que es cuando más vulnerables están sus viviendas, caminos, escuelas, entre otros.

Este informe corresponde al procesamiento documental, acompañamiento en campo y revisión de la ejecución de las actividades constructiva realizadas por el contratista de obra, que **REINGENIERÍA DE PROYECTOS SAS -REINPRO SAS** da aval y garantía que el proceso constructivo sea acorde a los diseños aprobados para construcción y que toda la documentación entregada por el contratista de obra **CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023** cumpla con los requisitos de calidad, eficiencia y eficacia para dar cumplimiento al **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0289 DE 2023: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"** de acuerdo con la propuesta presentada a la entidad contratante y con los términos de referencia que sirvieron de base al Contrato.

Siendo una de las obligaciones de la Interventoría evidenciar los alcances de la obra contratada, este informe contiene igualmente en consecuencia un recuento de las principales actividades a realizadas concernientes a la actividades de construcciones civiles que permiten llevar control estricto del avance de proyecto y medir los estándares de calidad, bajo el cumplimiento de la programación de obra, para garantizar que el contratista ejecute el proyecto en los tiempos pactados, con la calidad contratada y acorde al presupuesto contractual. Se Realizan los comentarios a las actividades a ejecutar y los cambios a resaltar en los alcances contractuales del contrato de obra.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en la región Caribe, departamento del Atlántico, específicamente en la zona urbana del municipio de Soledad.
El municipio de Soledad se encuentra ubicado en las coordenadas 10°54′35″N74°47′09″O limita por el norte con el distrito especial de Barranquilla, por el sur con el municipio de Malambo, por el oriente con el departamento de Magdalena y por el occidente con Galapa.

Soledad es un municipio perteneciente al departamento del Atlántico, ocupa el octavo lugar en cuanto a población en el país, y el tercero en la región, considerado por mucho tiempo uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional actualmente integra el área metropolitana de Barranquilla [1]

En la Figura 2.1 y Figura 2.2 se puede apreciar la localización del arroyo el platanal.

[1] Fuente: CRA, Estudios previos del proyecto.

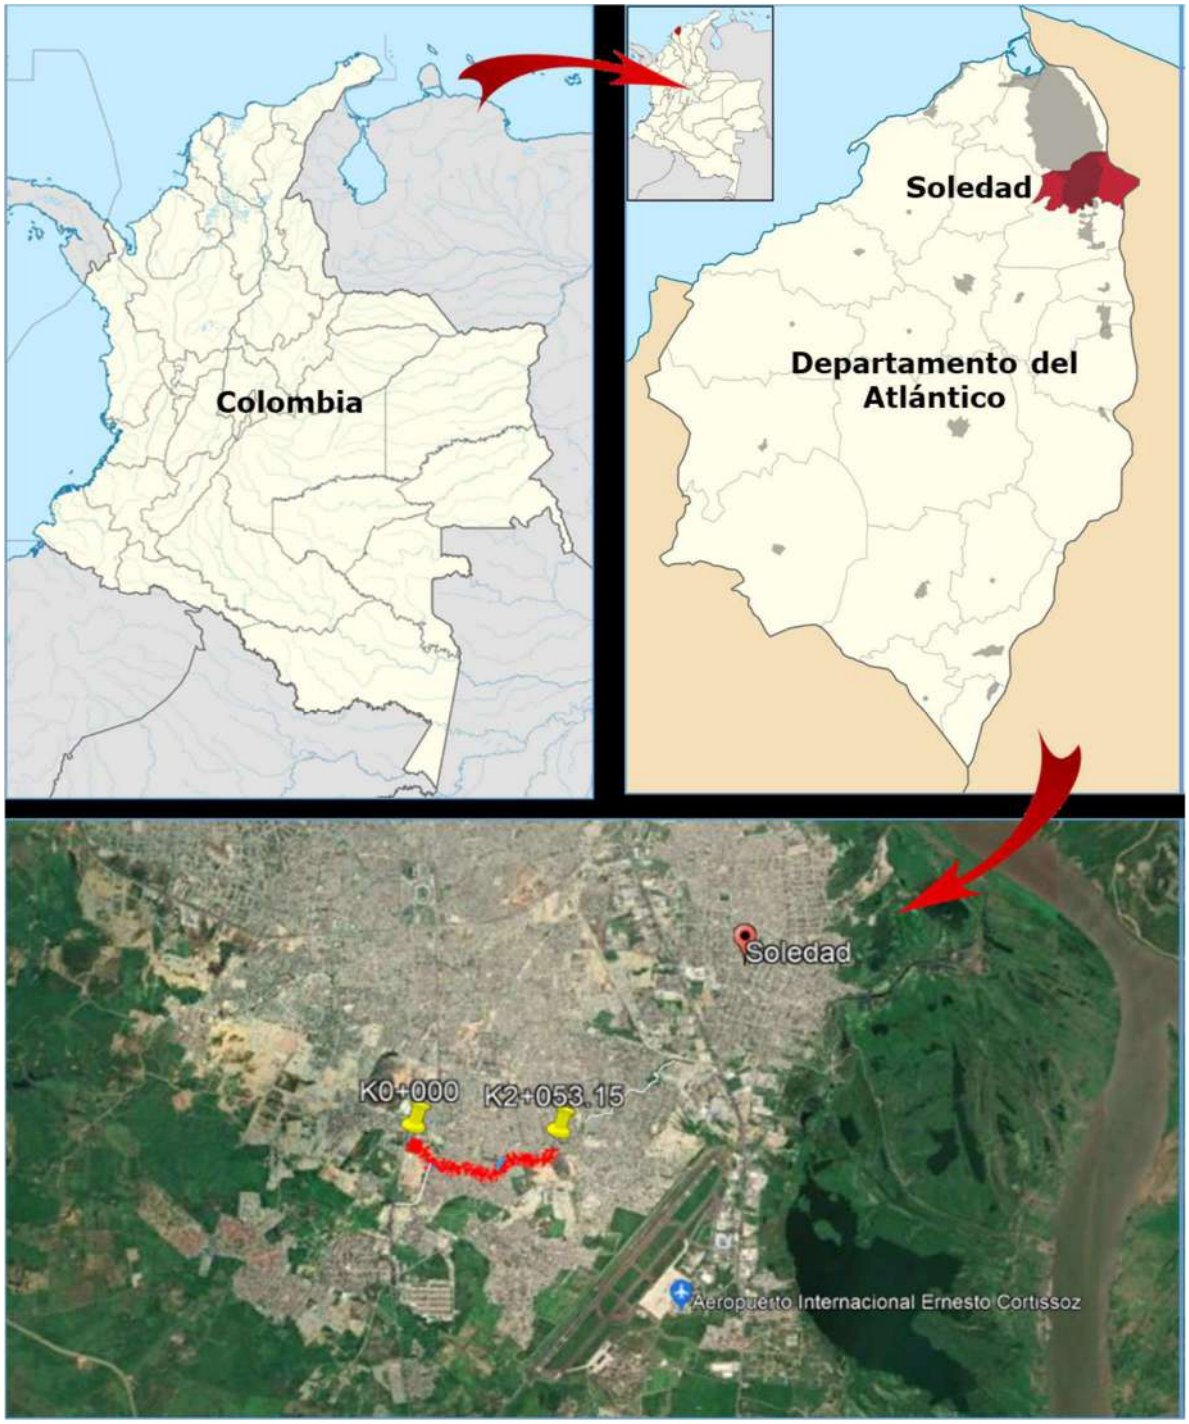


Figura 2.1. *Localización del proyecto. Fuente: estudios previos definitivos*

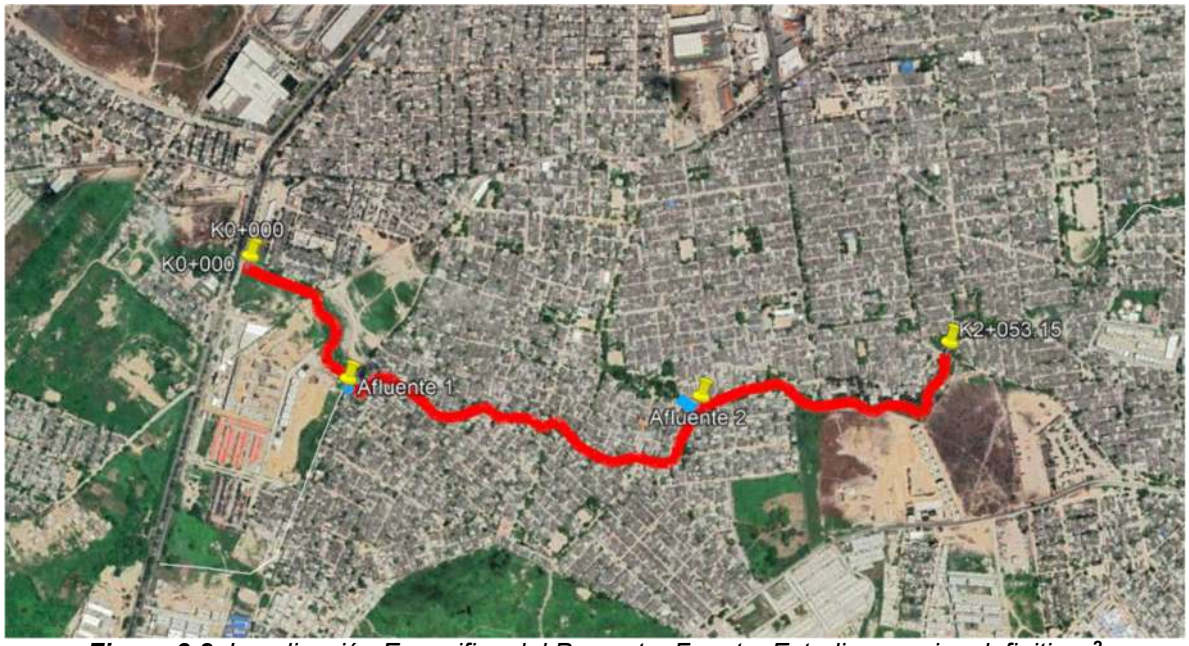


Figura 2.2. *Localización Especifica del Proyecto. Fuente: Estudios previos definitivos*[2]

2.2 ACTIVIDADES A EJECUTAR

El desarrollo del proyecto conlleva la ejecución de un plan de trabajo que involucra la puesta en marcha de una serie de actividades definidas previamente de manera lógica y secuencial, las cuales a continuación se detallan:

2.2.1 Etapa 1: Construcción

2.2.1.1 Revisión de estudios y diseños

El contratista será responsable de la correcta revisión de los estudios y diseño, realizando las observaciones que considere relevantes para la entrega final del producto.

Si el contratista por la misma naturaleza de la revisión, expone la necesidad de realizar algún cambio, estos deben contar con el visto bueno del personal profesional experto en cada área de su competencia.

Los estudios y diseños a revisar son: Estudio topográfico, Estudios de suelos, Diseño hidráulico y Diseño estructural.

[2] Fuente: CRA, Estudios previos del proyecto.

Al contar con la aprobación de la interventoría, el contratista debe proceder a presentar la actualización del presupuesto y por ende la programación ajustada a las nuevas condiciones generadas.

2.2.1.2 Capítulo I – Preliminares

El Contratista de Obra será responsable de la correcta Localización, trazado y replanteo del proyecto con respecto a los puntos topográficos localizados en los diseños, para garantizar en posición, dimensión y alineamiento, la construcción de la canalización en cada uno de tramos que lo requieran, así como también de la provisión de todos los instrumentos y elementos para el control de las obras.

Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presentara o detectará algún error en las posiciones, dimensiones o en la alineación de los canales, el Contratista de Obra, a requerimiento de la Interventoría, deberá a sus propias expensas, subsanar dicho error a satisfacción del mismo y de la Interventoría.

El control de cualquier trazado o alineamiento realizado por la Interventoría, no eximirá en ningún modo al Contratista de Obra de su responsabilidad en la realización correcta de las tareas correspondientes, dado que debe verificar previo a la ejecución de los trabajos.
El Contratista de Obra deberá completar, preservar y proteger todos los puntos de referencia y demás medios empleados para el trazado de las obras.

- Replanteo y control Topográfico: El Contratista es responsable de localizar, nivelar y controlar permanentemente las obras por ejecutar, siguiendo las referencias del proyecto y la previa aprobación del interventor. Estos trabajos incluyen las secciones que deberá levantar el Contratista a todo lo largo de la obra de canalización.

2.2.1.3 Capitulo II - Movimiento de tierras

El Contratista de Obra será responsable de realizar las siguientes actividades:

- Excavación Mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua. (Incluye cargue en volqueta. No incluye transporte a sitio de disposición final
- Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)
- Relleno con Material de Sitio
- Relleno Compacto en Piedra Ciclópea
- Suministro e Instalación de Geotextil Tejido Propyweave T2400 o W315 o similar para separación de capas granulares y estabilización de suelos
- Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.

- Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final menor de 5 kms.
- Repaleo Interno con cargador hasta punto de acopio de cargue distancia hasta 200 mts
- Excavación Manual en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua para nivelación de fondo o afinado de taludes. (Incluye cargue en volqueta)
- Tablestacado de Protección H=3,00 m. (para el 30% del total de la longitud)
- Pago de Derechos de botaderos
- Extensión y Disposición de Material Sobrante

La ejecución de los trabajos de excavación, relleno y demás actividades descritas anteriormente, el contratista debe contar con los equipos necesarios para la puesta en marcha de las actividades en el arroyo del platanal. El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los insumos, herramientas, accesorios, equipos y personal operativo necesario para la ejecución de estos ítems, al sitio de la obra.

Toda excavación o corte que hiciera el Contratista por fuera de la sección de diseño o de las tolerancias permitidas, ya fuera por negligencias o conveniencia de sus operaciones, correrá por su cuenta, y la Interventoría las podrá suspender si lo estima conveniente por razones técnicas o de otra índole.

En caso que dichas excavaciones pusieran en peligro la estabilidad de los taludes de la orilla u otras estructuras, el Contratista tomará las medidas del caso, para protegerlos a entera satisfacción de la Interventoría. Estos gastos correrán por cuenta del Contratista.

El Contratista también reparará a su costa cualquier daño que cause a terceros por excavaciones excesivas o inadecuadas, o inundaciones a viviendas o lotes por la inadecuada disposición del material de excavación.

Las características de la sección típica de las obras de canalización del arroyo el platanal es:

Tipo: Trapezoidal
Tipo: Rectangular

El transporte del material proveniente de la excavación en los sectores indicados en el proyecto y/o indicados por la Interventoría, al transporte y disposición del material de excavación hasta las zonas de depósito, según lo aprobado por la Interventoría y las recomendaciones del Plan de Manejo Ambiental.

La CRA ha estimado las cantidades de Repaleo a ejecutar según sectores, los cuales sin embargo pueden variar según levantamientos topográficos que realice la Interventoría de manera previa a la iniciación de los trabajos.

Para la ejecución de las obras el contratista deberá garantizar un equipo de excavación suficiente para desarrollar las actividades previstas en el Contrato en el plazo proyectado.

El Contratista deberá mantener las referencias topográficas cuando sean requeridas por el Interventor. El Contratista será el único responsable de todos los daños y perjuicios resultantes de no cumplir esta norma. Para lo no definido en este Pliego se utilizará como referente las Normas afines.

2.2.1.4 Capitulo III - Obras de drenaje y protección

El Contratista de Obra será responsable de realizar las siguientes actividades:

- Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60.
- Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para fondo de canal, incluye formaleteria.
- Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para muros de canal, incluye formaleteria.
- Suministro y colocación de concreto para Solado de 2000 PSI.
- Corte y Sello de Juntas Transversales.
- Suministro e Instalación de Cinta PVC 0-22 o similar para juntas de construcción.
- Barandas en Concreto de 3000 PSI de 0,20 m*0,20 m. (Columnas a 1,50 m, con Varillas de 1/2" 60.000 PSI. Estribos de 1/4" a 0,20 m)
- Tubería de Ø2" para Lloradero de Muros
- Andenes en Concreto espesor 10 cms.
- Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo).
- Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. (Para andenes 3/8" cada 0,30 mts ambos sentidos).

La ejecución de los trabajos de suministro, corte, figurado o colocación y demás actividades descritas anteriormente, el contratista debe contar con los insumos necesarios para la puesta en marcha de las actividades en el arroyo del platanal. El CONTRATISTA deberá proporcionar todos las herramientas, accesorios, equipos y personal operativo necesario para la ejecución de estos ítems, al sitio de la obra.

Las mediciones para control y pago de las actividades realizadas se conciliarán mediante memorias descriptivas, aprobado por la Interventoría, con base en las áreas de las secciones contempladas en los diseños del proyecto.
El espaciamiento entre los aceros será el establecido en los diseños y detalles estructurales.

Las mediciones de la canalización se conciliarán semanalmente, y simultáneamente por la Interventoría y el Contratista.

Una vez verificada las secciones de canalización, el Contratista debe entregar a la Interventoría las memorias de cantidades y registro fotográfico, cada mes y mediante acta firmada conjuntamente.

Para propósito de recibo de obra, el Contratista debe tener en cuenta que no se podrán recibir secciones parciales, sin la aprobación de todos los documentos que soporten dichas cantidades.

Adicionalmente, cuando las secciones de canalización no cumplan los criterios de aceptación dentro de las tolerancias especificadas, se le retendrá al Contratista la totalidad de canalización entre las secciones aceptadas.

Siempre que se cumplan las condiciones anteriores, se harán recibos parciales de obra por sectores y su recibo y aprobación definitiva quedarán condicionados a la entrega total del trabajo programado para un sector, con base en los diseños entregados por la CRA y/o aprobados por la Interventoría.

2.2.1.5 Capitulo IV – Manejo de aguas

Este ítem comprende el manejo de aguas ya sean de escorrentía superficial, nivel freático o propios del afluente, en donde el contratista contara con los equipos e insumos necesarios para la puesta en marcha de las actividades de manejo y control de aguas que permitan la ejecución o desarrollo normal de las obras de construcción de la canalización.

2.2.1.6 Capítulo V – Componente socio ambiental

El Contratista de Obra será responsable de realizar las siguientes actividades:

- Gestión social
- Educación Ambiental
- Fortalecimiento Institucional
- Gestión ambiental
- Recurso Humano

La ejecución de los trabajos del componente socio ambiental hace referencia a cada una de las subactividades necesarias para mitigar los impactos socio ambientales derivados de la eliminación de la cobertura vegetal y la ocupación de las vías municipales empleadas para el transporte de materiales de construcción y del retiro de RCD.

El Contratista es responsable de mantener informada a la comunidad y al personal propio de la obra mediante campaña radial, reuniones informativas, charlas e inducciones sobre la educación ambiental y en si la gestión ambiental, siguiendo las

referencias del proyecto y la previa aprobación del interventor. Estas actividades serán, según lo aprobado por la Interventoría y las recomendaciones del Plan de Manejo Ambiental.

Luego de concluir las actividades de canalización del arroyo el platanal, el Contratista de Obra deberá desmovilizar los equipos empleados para la ejecución de dichas actividades. Adicionalmente se debe desmontar cualquier elemento que se requiera instalar en sitio para la ejecución del proyecto, como es el caso de los campamentos de obra, puntos de acopio de equipos, dispositivos, entre otros.

2.2.2 Etapa 2: Mantenimiento

Luego de concluir las actividades de canalización del arroyo el platanal, el Contratista de Obra deberá garantizar el mantenimiento y conservación de la obra resultante de la ejecución según los diseños entregados por la CRA y/o aprobados por la interventoría. El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas, equipo y personal necesario para la ejecución de esta etapa, al sitio de la obra.

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 3.1 *Información General Contrato de Obra.*

CONTRATISTA:	CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023
PARTICIPANTES DEL CONSORCIO:	G.V.C. CONSTRUCCIONES S.A.S. - 50%
	CONSTRUCTORA ESPIGA SAS - 40%
	AURORA PROYECTOS E INVERSIONES SAS. - 10%
REPRESENTANTE LEGAL:	OMAR ALBERTO HADDAD CURE, identificado con la Cédula de Ciudadanía N°.72.131.991 expedida en Barranquilla.
CONTRATO No.	0251 DE 2023
OBJETO:	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".
VALOR INICIAL:	$ 27.220.819.943
VALOR ADICIONAL:	$9.767.979.973,76
VALOR TOTAL:	$ 36,988,799,916.76
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SESENTA (60) MESES
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	NOVENTA Y SEIS (96) MESES
FECHA DE INICIO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE JUNIO DE 2028
FECHA DE TERMINACION:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2031

GARANTÍAS

El Contratista CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023 Toma la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 400049654 con la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS S. A., y la póliza de seguro de Responsabilidad Civil por lesiones, muerte y/o daños materiales a terceros derivada de cumplimiento No.400049655 con la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS S. A. A, continuación, se relacionan los valores asegurados y las vigencias actualizadas de acuerdo al otro si No. 3 derivada del contrato No. 0251 de 2023.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		Iniciación	Terminación
Cumplimiento del contrato	$ 5.220.246.636,00	06/02/2024	17/03/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 1.305.061.659,00	06/02/2024	17/09/2029
Estabilidad de la obra	$ 5.444.163.988,60	12/05/2028	12/05/2033
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	$ 1.305.061.659,00	06/02/2024	14/09/2026

El Acta de Inicio para el desarrollo de las labores del Contrato de Obra No. 0251 DE 2023, fue suscrita el día 14 de septiembre de 2023 entre el Supervisor de la Entidad

Contratante, el representante legal de la Interventoría, y el Representante Legal del Contratista para ejecutar las obras del proyecto de **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**

3.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El día 1 de Noviembre de 2024 se llevó a cabo la suscripción del Otrosí No. 3, por medio del cual se adicionan recursos al contrato de obra para la ejecución de tramos adicionales e ítems no previstos. A continuación, se presenta el presupuesto general y el presupuesto actualizado según el otrosí No. 3, para el desarrollo de las actividades que comprende el proyecto:

***Tabla 3.2** Presupuesto Inicial de obra.*

PRESUPUESTO ETAPA I - CONSTRUCCION OBRA CIVIL						
ITEM	**ESPECIF.**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
		CAPÍTULO I – PRELIMINARES				
1,01	1P	Localización, Trazado y Replanteo	M2	9.732,50	$ 2.600,00	$ 25.304.500,00
1,02		Control Topográfico	MES	32,00	$ 8.540.000,00	$ 273.280.000,00
		CAPÍTULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2,01	600.2.4. - 22	Excavación Mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua. (Incluye cargue en volqueta. No incluye transporte a sitio de disposición final)	M3	17.888,78	$ 12.300,00	$ 220.031.994,00
2,02	610.2 - 22	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	M3	22.450,14	$ 110.200,00	$ 2.474.005.257,12
2,03	610.1 - 22	Relleno con Material de Sitio	M3	6.261,07	$ 40.700,00	$ 254.825.671,10
2,04	221.1 - 22	Relleno Compacto en Piedra Ciclópea.	M3	10.705,74	$ 136.600,00	$ 1.462.404.084,00
2,05	231 - 22	Suministro e Instalación de Geotextil Tejido Propyweave T2400 o W315 o similar para separación de capas granulares y estabilización de suelos.	M2	9.732,50	$ 11.300,00	$ 109.977.250,00
2,06	900.2 - 22	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final **mayor** de 5 kms.	M3-KM	329.645,49	$ 1.300,00	$ 428.539.137,00
2,07	3P	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final **menor** de 5 kms.	M3	4.829,97	$ 6.500,00	$ 31.394.805,00
2,08	4P	Repaleo Interno con cargador hasta punto de acopio de cargue distancia hasta 200 mt.s	M3	12.074,93	$ 4.400,00	$ 53.129.692,00
2,09	600,2,4	Excavación Manual en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua para nivelación de fondo o afinado de taludes. (Incluye cargue en volqueta)	M3	894,44	$ 50.000,00	$ 44.722.000,00
2,10	5P	Tablestacado de Protección H=3,00 m. (para el 30% del total de la longitud)	M2	3.783,60	$ 156.600,00	$ 592.511.760,00

PRESUPUESTO ETAPA I - CONSTRUCCION OBRA CIVIL						
ITEM	**ESPECIF.**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
2,11	6P	Pago de Derechos de botaderos	M3	11.773,05	$ 10.000,00	$ 117.730.500,00
2,12	7P	Extensión y Disposición de Material Sobrante	M3	3.924,35	$ 8.400,00	$ 32.964.540,00
		CAPÍTULO III - OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN				
3,01	640 - 22	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60.	KG	561.864,11	$ 8.300,00	$ 4.663.472.113,00
3,02	630- 22	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para fondo de canal, incluye formaleteria.	M3	2.919,75	$ 1.009.700,00	$ 2.948.071.575,00
3,03	630- 22	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para muros de canal, incluye formaleteria.	M3	2.880,13	$ 1.329.100,00	$ 3.827.980.783,00
3,04	630 - 22	Suministro y colocación de concreto para Solado de 2000 PSI.	M3	681,27	$ 711.300,00	$ 484.587.351,00
3,05	3P	Corte y Sello de Juntas Transversales.	ML	2.733,35	$ 27.800,00	$ 75.987.130,00
3,06	4P	Suministro e Instalación de Cinta PVC 0-22 o similar para juntas de construcción.	ML	2.102,35	$ 99.600,00	$ 209.394.060,00
3,07	5P	Barandas en Concreto de 3000 PSI de 0,20 m*0,20 m. (Columnas a 1,50 m, con Varillas de 1/2" 60.000 PSI. Estribos de 1/4" a 0,20 m)	ML	800,00	$ 381.000,00	$ 304.800.000,00
3,08	663,1-13	Tubería de Ø2" para Lloradero de Muros	ML	2.051,07	$ 19.700,00	$ 40.406.079,00
3,09	671 - 22	Andenes en Concreto espesor 10 cms.	M2	440,00	$ 88.500,00	$ 38.940.000,00
3,10	610.2 - 22	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	M3	88,00	$ 110.200,00	$ 9.697.600,00
3,11	640 - 22	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. (Para andenes 3/8" cada 0,30 mts ambos sentidos)	KG	1.971,20	$ 8.300,00	$ 16.360.960,00
		CAPÍTULO IV - MANEJO DE AGUAS				
4,1	6P	Manejo de Aguas	MES	24,00	$ 10.676.200,00	$ 256.228.800,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						**$ 18.996.747.641,22**
		CAPÍTULO V - COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL				
		GESTION SOCIAL				
5,01		Campaña Radial	Und	1,00	$ 1.705.000,00	$ 1.705.000,00
5,02		Reuniones Informativas con la Comunidad	Und	3,00	$ 2.307.000,00	$ 6.921.000,00
		EDUCACIÓN AMBIENTAL				
5,03		Inducción Ambiental a Comunidades	Und	3,00	$ 1.538.000,00	$ 4.614.000,00
5,04		Inducción Ambiental a Trabajadores	Und	3,00	$ 1.538.000,00	$ 4.614.000,00
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
5,05		Socialización del Proyecto con Organismos y Autoridades	Und	1,00	$ 1.538.000,00	$ 1.538.000,00

PRESUPUESTO ETAPA I - CONSTRUCCION OBRA CIVIL						
ITEM	**ESPECIF.**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
		GESTIÓN AMBIENTAL				
		Manejo ambiental de los residuos líquidos				
5,07		Canecas de 55 gal con tapa para almacenar residuos líquidos	Und	6,00	$ 227.800,00	$ 1.366.800,00
		Manejo ambiental de los residuos solidos				
5,08		Punto ecológico para almacenar residuos solidos	Und	3,00	$ 1.684.900,00	$ 5.054.700,00
		Mitigación de impactos por tránsito vehicular				
5,09		Dispositivos para el control y manejo de tráfico en la obra (señales preventivas, reglamentarias e informativas)	Glb	1,00	$ 5.384.500,00	$ 5.384.500,00
		RECURSOS HUMANOS				
5,10		Recursos humanos para implementación del plan de manejo ambiental (Incluye: Profesional Ambiental, Profesional SST y Profesional Social)	Mes	32,00	$ 10.470.000,00	$ 335.040.000,00
SUBTOTAL COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL						**$ 366.238.000,00**
					TOTAL COSTO DIRECTO-OBRA CIVIL	**$ 18.996.747.641,22**
ADMINISTRACION					26,04%	$ 4.946.753.085,77
IMPREVISTOS					2,00%	$ 379.934.952,82
UTILIDAD					6,95%	$ 1.320.273.961,06
TOTAL AIU					**34,99%**	**$ 6.646.961.999,66**
					TOTAL OBRAS	**$ 25.643.709.640,88**
					TOTAL COSTO DIRECTO COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL	**$ 366.238.000,00**
ADMINISTRACIÓN					16,02%	$ 58.671.327,60
					TOTAL COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL	**$ 424.909.327,60**
					REVISION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 27.406.900,00
					IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%)	$ 5.207.311,00
					TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 32.614.211,00**
					COSTO TOTAL DEL PROYECTO ETAPA I	**$ 26.101.233.179,48**

PRESUPUESTO ETAPA II - SEGUIMIENTO Y MONITOREO						
ITEM	**ESPECIF.**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
		CAPÍTULO VI - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO				
6,01		Limpieza de residuos sólidos sobre cauce	m3	6.093,34	$ 50.000,00	$ 304.667.000,00
6,02		Revisión y Mantenimiento de Juntas	ml	4.912,67	$ 27.800,00	$ 136.572.226,00
6,03		Retiro y Disposición Final de Residuos Solidos	m3/km	237.640,26	$ 1.300,00	$ 308.932.338,00
6,04		Pago de derechos de botadero	m3	7.921,34	$ 10.000,00	$ 79.213.400,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 829.384.964,00**
ADMINISTRACION					26,04%	$ 215.971.844,63
IMPREVISTOS					2,00%	$ 16.587.699,28
UTILIDADES					6,95%	$ 57.642.255,00
TOTAL AIU					**34,99%**	**$ 290.201.798,90**
					COSTO TOTAL SEGUIMIENTO Y MONITOREO ETAPA II	**$ 1.119.586.762,90**

Tabla 3.3 *Presupuesto Adicional de obra según Otrosí No. 3 del 01 de noviembre de 2024.*

PRESUPUESTO ETAPA I - CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL					CANTIDADES DE OBRA ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No.3 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	
ITEM	**ESPECIF.**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
		CAPÍTULO I - PRELIMINARES				
1,01	1P	Localización, Trazado y Replanteo	M2	$ 2.600,00	18.941,91	$ 49.248.973,04
1,02		Control Topográfico	MES	$ 8.540.000,00	32,00	$ 273.280.000,00
		CAPÍTULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2,01	600.2.4. - 22	Excavacion Mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua. (Incluye cargue en volqueta. No incluye transporte a sitio de disposición final)	M3	$ 12.300,00	27.719,46	$ 340.949.416,94
2,02	610.2 - 22	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	M3	$ 110.200,00	27.790,89	$ 3.062.555.795,77
2,03	610.1 - 22	Relleno con Material de Sitio	M3	$ 40.700,00	6.542,17	$ 266.266.117,62
2,04	221.1 - 22	Relleno Compacto en Piedra Piclópea.	M3	$ 136.600,00	13.982,60	$ 1.910.023.160,00
2,05	231 - 22	Suministro e Instalación de Geotextil Tejido Propyweave T2400 o W315 o similar para separación de capas granulares y establización de suelos.	M2	$ 11.300,00	15.171,50	$ 171.437.950,00
2,06	900.2 - 22	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final **mayor** de 5 kms.	M3-KM	$ 1.300,00	674.408,18	$ 876.730.632,51
2,07	3P	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final **menor** de 5 kms.	M3	$ 6.500,00	5.478,02	$ 35.607.131,09
2,08	4P	Repaleo Interno con cargador hasta punto de acopio de cargue distancia hasta 200 mt.s	M3	$ 4.400,00	25.182,47	$ 110.802.889,08
2,09	600,2,4	Excavacion Manual en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua para nivelación de fondo o afinado de taludes. (Incluye cargue en volqueta)	M3	$ 50.000,00	1.033,76	$ 51.687.888,89
2,10	5P	Tablestacado de Protección H=3,00 m. (para el 30% del total de la longitud)	M2	$ 156.600,00	4.665,60	$ 730.632.960,00
2,11	6P	Pago de Derechos de botaderos	M3	$ 10.000,00	24.086,00	$ 240.860.031,73
2,12	7P	Extensión y Disposición de Material Sobrante	M3	$ 8.400,00	4.289,77	$ 36.034.065,21
		CAPÍTULO III - OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN				
3,01	640 - 22	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60.	KG	$ 8.300,00	674.537,29	$ 5.598.659.505,63
3,02	630- 22	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para fondo de canal, incluye formaleteria.	M3	$ 1.009.700,00	3.422,00	$ 3.455.193.400,00
3,03	630- 22	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para muros de canal, incluye formaleteria.	M3	$ 1.329.100,00	3.336,13	$ 4.434.050.383,00
3,04	630 - 22	Sumnistro y colocación de concreto para Solado de 2000 PSI.	M3	$ 711.300,00	897,17	$ 638.157.021,00
3,05	3P	Corte y Sello de Juntas Transversales.	ML	$ 27.800,00	3.362,18	$ 93.468.696,67

3,06	4P	Suministro e Instalación de Cinta PVC 0-22 o similar para juntas de construcción.	ML	$ 99.600,00	3.203,22	$ 319.040.380,00
3,07	5P	Barandas en Concreto de 3000 PSI de 0,20 m*0,20 m. (Columnas a 1,50 m, con Varillas de 1/2" 60.000 PSI. Estribos de 1/4" a 0,20 m)	ML	$ 381.000,00	1.680,02	$ 640.087.937,50
3,08	663,1-13	Tuberia de Ø2" para Lloradero de Muros	ML	$ 19.700,00	2.271,57	$ 44.749.929,00
3,09	671 - 22	Andenes en Concreto espesor 10 cms.	M2	$ 88.500,00	1.310,74	$ 116.000.145,83
3,10	610.2 - 22	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	M3	$ 110.200,00	88,00	$ 9.697.600,00
3,11	640 - 22	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. (Para andenes 3/8" cada 0,30 mts ambos sentidos)	KG	$ 8.300,00	16.997,32	$ 141.077.744,39
		CAPÍTULO IV - MANEJO DE AGUAS				
4,1	6P	Manejo de Aguas	MES	$ 10.676.200,00	32,00	$ 341.638.400,00
		CAPÍTULO IV - MANEJO DE AGUAS				
NP-01		Demolición de concreto simple y reforzado, no incluye retiro de material	M³	$ 236.003,00	272,45	$ 64.299.607,36
NP-02		Rocería, limpieza y descapote de maleza, incluye retiro de material/basura a botadero	M2	$ 2.377,00	31.344,00	$ 74.504.688,00
NP-03		Anclaje de 1/2"	UND	$ 29.964,00	10.596,00	$ 317.498.544,00
NP-04		Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI dimensiones de 20cmx30cm para confinamiento de andenes, no incluye acero de refuerzo	ML	$ 117.842,00	3.441,00	$ 405.494.322,00
NP-05		Suministro y colocación de Concreto de 4000 PSI impermeabilizado para losa superior, incluye formaleta.	M3	$ 1.537.430,00	90,42	$ 139.011.605,85
SUBTOTAL OBRA CIVIL						**$ 24.988.746.922,10**
		CAPÍTULO V - COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL				
		GESTION SOCIAL				
5,01		Campaña Radial	Und	$ 1.705.000,00	1,00	$ 1.705.000,00
5,02		Reuniones Informativas con la Comunidad	Und	$ 2.307.000,00	3,00	$ 6.921.000,00
		EDUCACIÓN AMBIENTAL				
5,03		Inducción Ambiental a Comunidades	Und	$ 1.538.000,00	3,00	$ 4.614.000,00
5,04		Inducción Ambiental a Trabajadores	Und	$ 1.538.000,00	3,00	$ 4.614.000,00
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
5,05		Socialización del Proyecto con Organismos y Autoridades	Und	$ 1.538.000,00	1,00	$ 1.538.000,00
		GESTIÓN AMBIENTAL				
		Manejo ambiental de los residuos líquidos				
5,07		Canecas de 55 gal con tapa para almacenar residuos líquidos	Und	$ 227.800,00	6,00	$ 1.366.800,00
		Manejo ambiental de los residuos solidos				

5,08		Punto ecológico para almacenar residuos solidos	Und	$ 1.684.900,00	3,00	$ 5.054.700,00
		Mitigación de impactos por tránsito vehicular				
5,09		Dispositivos para el control y manejo de tráfico en la obra (señales preventivas, reglamentarias e informativas)	Glb	$ 5.384.500,00	1,00	$ 5.384.500,00
		RECURSOS HUMANOS				
5,10		Recursos humanos para implementación del plan de manejo ambiental (Incluye: Profesional Ambiental, Profesional SST y Profesional Social)	Mes	$ 10.470.000,00	32,00	$ 335.040.000,00
SUBTOTAL COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL						**$ 366.238.000,00**
					TOTAL COSTO DIRECTO-OBRA CIVIL	**$ 24.988.746.922,10**
					ADMINISTRACION 26,04%	$ 6.507.069.698,51
					IMPREVISTOS 2,00%	$ 499.774.938,44
					UTILIDAD 6,95%	$ 1.736.717.911,09
					TOTAL AIU 34,99%	**$ 8.743.562.548,04**
					TOTAL OBRAS	**$ 33.732.309.470,14**
					TOTAL COSTO DIRECTO COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL	**$ 366.238.000,00**
					ADMINISTRACIÓN 16,02%	$ 58.671.327,60
					TOTAL COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL	**$ 424.909.327,60**
					REVISION Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 27.406.900,00
					IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%)	$ 5.207.311,00
					TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 32.614.211,00**
					COSTO TOTAL DEL PROYECTO ETAPA I	**$ 34.189.833.008,74**
					COSTO TOTAL DEL PROYECTO ETAPA II	**$ 2.798.966.907,40**
					COSTO TOTAL DEL PROYECTO ETAPA I Y ETAPA II	**$ 36.988.799.916,14**

3.3 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

En la Tabla 3.4 se presenta el cronograma inicial del proyecto, así mismo en la Tabla 3.5 se detalla el cronograma del proyecto ajustado conforme al otrosí No. 3 del 01 de noviembre de 2024, indicando las actividades asociadas, así como la duración de cada una de estas.

Tabla 3.4 *Cronograma Inicial de actividades programadas, fecha inicio y fin, ajustado según acta de inicio 14 de septiembre de 2023.*

Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
Inicio: Proyecto Canal Platanal Soledad	**$ 27.220.819.942,38**	**60 mss**	**jue 14/09/23**	**lun 26/06/28**
Etapa I	**$ 26.101.233.179,47**	**37,4 mss**	**jue 14/09/23**	**lun 7/09/26**
Estudios y diseños	**$ 32.614.211,00**	**4 mss**	**jue 14/09/23**	**mar 9/01/24**
Total estudios y diseños	$ 32.614.211,00	4 mss	jue 14/09/23	mar 9/01/24
CAPÍTULO I - PRELIMINARES	**$ 403.059.216,55**	**32 mss**	**mar 9/01/24**	**mar 28/07/26**
Localización, Trazado y Replanteo	$ 34.158.544,55	30 mss	mar 9/01/24	lun 1/06/26
Control Topográfico	$ 368.900.672,00	32 mss	mar 9/01/24	mar 28/07/26
CAPÍTULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS	**$ 7.859.437.308,13**	**29 mss**	**mar 9/01/24**	**vie 1/05/26**
Excavación Mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua. (Incluye cargue en volqueta. No incluye transporte a sitio de disposición final)	$ 297.021.188,70	28 mss	mar 9/01/24	jue 2/04/26
Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	$ 3.339.659.696,58	28 mss	mié 7/02/24	vie 1/05/26
Relleno con Material de Sitio	$ 343.989.173,42	28 mss	mié 7/02/24	vie 1/05/26
Relleno Compacto en Piedra Ciclópea.	$ 1.974.099.272,99	25 mss	jue 7/03/24	mié 4/03/26
Suministro e Instalación de Geotextil Tejido Propyweave T2400 o W315 o similar para separación de capas granulares y estabilización de suelos.	$ 148.458.289,78	25 mss	mié 7/02/24	mié 4/02/26
Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.	$ 578.484.981,04	28 mss	mar 9/01/24	jue 2/04/26
Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final menor de 5 kms.	$ 42.379.847,27	28 mss	mar 9/01/24	jue 2/04/26
Repaleo Interno con cargador hasta punto de acopio de cargue distancia hasta 200 mt.s	$ 71.719.771,23	28 mss	mar 9/01/24	jue 2/04/26
Excavación Manual en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua para nivelación de fondo o afinado de taludes. (Incluye cargue en volqueta)	$ 60.370.227,80	26 mss	mié 7/02/24	mié 4/03/26
Tablestacado de Protección H=3,00 m. (para el 30% del total de la longitud)	$ 799.831.624,82	28 mss	mar 9/01/24	jue 2/04/26
Pago de Derechos de botaderos	$ 158.924.401,95	28 mss	mar 9/01/24	jue 2/04/26
Extensión y Disposición de Material Sobrante	$ 44.498.832,55	26 mss	mié 7/02/24	mié 4/03/26
CAPÍTULO III - OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN	**$ 17.035.329.859,07**	**29 mss**	**jue 4/04/24**	**mar 28/07/26**
Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60.	$ 6.295.221.005,34	26 mss	jue 4/04/24	vie 1/05/26
Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para fondo de canal, incluye formaleteria.	$ 3.979.601.819,09	26 mss	vie 3/05/24	lun 1/06/26
Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para muros de canal, incluye formaleteria.	$ 5.167.391.258,97	26 mss	lun 3/06/24	lun 29/06/26

Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
Suministro y colocación de concreto para Solado de 2000 PSI.	$ 654.144.465,11	26 mss	jue 4/04/24	vie 1/05/26
Corte y Sello de Juntas Transversales.	$ 102.575.026,79	26 mss	mar 2/07/24	mar 28/07/26
Suministro e Instalación de Cinta PVC 0-22 o similar para juntas de construcción.	$ 282.661.041,59	26 mss	lun 3/06/24	lun 29/06/26
Barandas en Concreto de 3000 PSI de 0,20 m*0,20 m. (Columnas a 1,50 m, con Varillas de 1/2" 60.000 PSI. Estribos de 1/4" a 0,20 m)	$ 411.449.520,00	25 mss	mié 10/07/24	mié 8/07/26
Tubería de Ø2" para Lloradero de Muros	$ 54.544.166,04	26 mss	sáb 18/05/24	lun 15/06/26
Andenes en Concreto espesor 10 cms.	$ 52.565.106,00	16 mss	sáb 23/11/24	mié 4/03/26
Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	$ 13.090.790,24	16 mss	jue 26/09/24	mar 6/01/26
Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. (Para andenes 3/8" cada 0,30 mts ambos sentidos)	$ 22.085.659,90	15 mss	mié 28/08/24	jue 5/02/26
CAPÍTULO IV - MANEJO DE AGUAS	**$ 345.883.257,12**	**30,09 mss**	**dom 14/04/24**	**lun 7/09/26**
Manejo de Aguas	$ 345.883.257,12	24 mss	dom 14/04/24	lun 7/09/26
CAPÍTULO V - COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL	**$ 424.909.327,60**	**32 mss**	**mié 14/02/24**	**mié 2/09/26**
GESTION SOCIAL	**$ 10.007.885,20**	**6,2 mss**	**mié 14/02/24**	**lun 12/08/24**
Campaña Radial	$ 1.978.141,00	1 ms	mié 14/02/24	jue 14/03/24
Reuniones Informativas con la Comunidad	$ 8.029.744,20	2 mss	mié 14/02/24	lun 12/08/24
EDUCACIÓN AMBIENTAL	**$ 10.706.325,60**	**6,2 mss**	**mié 14/02/24**	**lun 12/08/24**
Inducción Ambiental a Comunidades	$ 5.353.162,80	2 mss	mié 14/02/24	lun 12/08/24
Inducción Ambiental a Trabajadores	$ 5.353.162,80	2 mss	mié 14/02/24	lun 12/08/24
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**$ 1.784.387,60**	**2 mss**	**mié 14/02/24**	**jue 11/04/24**
Socialización del Proyecto con Organismos y Autoridades	$ 1.784.387,60	2 mss	mié 14/02/24	jue 11/04/24
GESTIÓN AMBIENTAL	**$ 402.410.729,20**	**32 mss**	**mié 14/02/24**	**mié 2/09/26**
Manejo ambiental de los residuos líquidos	**$ 1.585.761,36**	**8,18 mss**	**mié 14/02/24**	**mié 9/10/24**
Canecas de 55 gal con tapa para almacenar residuos líquidos	$ 1.585.761,36	4 mss	mié 14/02/24	mié 9/10/24
Manejo ambiental de los residuos solidos	**$ 5.864.462,94**	**5,24 mss**	**mié 14/02/24**	**lun 15/07/24**
Punto ecológico para almacenar residuos solidos	$ 5.864.462,94	2 mss	mié 14/02/24	lun 15/07/24
Mitigación de impactos por tránsito vehicular	**$ 6.247.096,90**	**1 ms**	**jue 14/03/24**	**vie 12/04/24**
Dispositivos para el control y manejo de tráfico en la obra (señales preventivas, reglamentarias e informativas)	$ 6.247.096,90	1 ms	jue 14/03/24	vie 12/04/24
RECURSOS HUMANOS	**$ 388.713.408,00**	**32 mss**	**mié 14/02/24**	**mié 2/09/26**
Recursos humanos para implementación del plan de manejo ambiental (Incluye: Profesional Ambiental, Profesional SST y Profesional Social)	$ 388.713.408,00	32 mss	mié 14/02/24	mié 2/09/26
Etapa II	**$ 1.119.586.762,91**	**23 mss**	**mié 26/08/26**	**lun 26/06/28**
CAPÍTULO VI - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	**$ 1.119.586.762,91**	**23 mss**	**mié 26/08/26**	**lun 26/06/28**
Limpieza de residuos sólidos sobre cauce	$ 411.269.983,30	20 mss	mié 26/08/26	jue 30/03/28
Revisión y Mantenimiento de Juntas	$ 184.358.847,88	19 mss	mié 26/08/26	mié 1/03/28
Retiro y Disposición Final de Residuos Solidos	$ 417.027.763,07	23 mss	mié 26/08/26	lun 26/06/28
Pago de derechos de botadero	$ 106.930.168,66	22 mss	mié 26/08/26	lun 29/05/28

Tabla 3.5 *Cronograma de actividades programadas, fecha inicio y fin, ajustado según el Otrosí No. 3 del 01 de Noviembre de 2024.*

Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin
Inicio: Proyecto Canal Platanal Soledad	**$ 36.988.799.916,14**	**jue 14/09/23**	**vie 27/06/31**
Etapa I	**$ 34.189.833.008,74**	**jue 14/09/23**	**lun 14/09/26**
Estudios y diseños	**$ 32.614.211,00**	**jue 14/09/23**	**mar 9/01/24**
Total estudios y diseños	$ 32.614.211,00	jue 14/09/23	mar 9/01/24
CAPÍTULO I - PRELIMINARES	**$ 435.381.860,71**	**mar 9/01/24**	**lun 1/06/26**
Localización, Trazado y Replanteo	$ 66.481.188,71	mar 9/01/24	lun 1/06/26
Control Topográfico	$ 368.900.672,00	mar 9/01/24	vie 1/05/26
CAPÍTULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS	**$ 10.574.560.493,61**	**mar 9/01/24**	**vie 1/05/26**
Excavacion Mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua. (Incluye cargue en volqueta. No incluye transporte a sitio de disposición final)	$ 460.247.617,92	mar 9/01/24	jue 2/04/26
Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	$ 4.134.144.068,71	mié 7/02/24	vie 1/05/26
Relleno con Material de Sitio	$ 359.432.632,17	mié 7/02/24	vie 1/05/26
Relleno Compacto en Piedra Piclópea.	$ 2.578.340.263,68	jue 7/03/24	mié 4/03/26
Suministro e Instalación de Geotextil Tejido Propyweave T2400 o W315 o similar para separación de capas granulares y establización de suelos.	$ 231.424.088,71	mié 7/02/24	mié 4/02/26
Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.	$ 1.183.498.680,82	mar 9/01/24	jue 2/04/26
Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final menor de 5 kms.	$ 48.066.066,25	mar 9/01/24	jue 2/04/26
Repaleo Interno con cargador hasta punto de acopio de cargue distancia hasta 200 mt.s	$ 149.572.819,97	mar 9/01/24	jue 2/04/26
Excavacion Manual en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua para nivelación de fondo o afinado de taludes. (Incluye cargue en volqueta)	$ 69.773.481,21	mié 7/02/24	mié 4/03/26
Tablestacado de Protección H=3,00 m. (para el 30% del total de la longitud)	$ 986.281.432,70	mar 9/01/24	jue 2/04/26
Pago de Derechos de botaderos	$ 325.136.956,84	mar 9/01/24	jue 2/04/26
Extensión y Disposición de Material Sobrante	$ 48.642.384,63	mié 7/02/24	mié 4/03/26
CAPÍTULO III - OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN	**$ 20.910.197.684,81**	**jue 4/04/24**	**mié 26/08/26**
Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60.	$ 7.557.630.466,66	jue 4/04/24	vie 1/05/26

Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para fondo de canal, incluye formaleteria.	$ 4.664.165.570,66	vie 3/05/24	lun 1/06/26
Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para muros de canal, incluye formaleteria.	$ 5.985.524.612,01	lun 3/06/24	lun 29/06/26
Sumnistro y colocación de concreto para Solado de 2000 PSI.	$ 861.448.162,65	jue 4/04/24	vie 1/05/26
Corte y Sello de Juntas Transversales.	$ 126.173.393,63	mar 2/07/24	mar 28/07/26
Suministro e Instalación de Cinta PVC 0-22 o similar para juntas de construcción.	$ 430.672.608,96	vie 3/05/24	lun 1/06/26
Barandas en Concreto de 3000 PSI de 0,20 m*0,20 m. (Columnas a 1,50 m, con Varillas de 1/2" 60.000 PSI. Estribos de 1/4" a 0,20 m)	$ 864.054.706,83	mar 21/01/25	mié 26/08/26
Tuberia de Ø2" para Lloradero de Muros	$ 60.407.929,16	sáb 18/05/24	lun 15/06/26
Andenes en Concreto espesor 10 cms.	$ 156.588.596,86	mar 21/01/25	vie 1/05/26
Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	$ 13.090.790,24	sáb 23/11/24	mié 4/03/26
Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. (Para andenes 3/8" cada 0,30 mts ambos sentidos)	$ 190.440.847,15	mar 7/01/25	mié 8/04/26
CAPÍTULO IV - MANEJO DE AGUAS	**$ 1.812.169.431,01**	**jue 1/02/24**	**vie 26/06/26**
Manejo de Aguas	$ 461.177.676,16	jue 1/02/24	vie 26/06/26
CAPÍTULO V - ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**$ 1.350.991.754,85**	**mar 12/11/24**	**lun 14/09/26**
Demolición de concreto simple y reforzado, no incluye retiro de material	$ 86.798.039,97	mar 12/11/24	lun 14/09/26
Recería, limpieza y descapote de maleza, incluye retiro de mateial/basura a botadero	$ 100.573.878,33	mar 12/11/24	vie 11/09/26
Anclaje de 1/2"	$ 428.591.284,55	mar 21/01/25	mié 26/08/26
Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI dimensiones de 20cmx30cm para confinamiento de andenes, no incluye acero de refuerzo	$ 547.376.785,27	mar 21/01/25	mié 26/08/26
Suministro y colocación de Concreto de 4000 PSI impermeabilizado para losa superior, incluye formaleta.	$ 187.651.766,73	mar 21/01/25	jue 20/03/25
CAPÍTULO VI - COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL	**$ 424.909.327,60**	**jue 14/09/23**	**lun 14/09/26**
GESTION SOCIAL	**$ 10.007.885,20**	**jue 14/09/23**	**mar 12/03/24**
Campaña Radial	$ 1.978.141,00	jue 14/09/23	vie 13/10/23
Reuniones Informativas con la Comunidad	$ 8.029.744,20	jue 14/09/23	mar 12/03/24
EDUCACIÓN AMBIENTAL	**$ 10.706.325,60**	**mié 20/03/24**	**lun 16/09/24**
Inducción Ambiental a Comunidades	$ 5.353.162,80	mié 20/03/24	lun 16/09/24
Inducción Ambiental a Trabajadores	$ 5.353.162,80	mié 20/03/24	lun 16/09/24

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**$ 1.784.387,60**	**mar 30/01/24**	**mié 28/02/24**
Socialización del Proyecto con Organismos y Autoridades	$ 1.784.387,60	mar 30/01/24	mié 28/02/24
GESTIÓN AMBIENTAL	**$ 402.410.729,20**	**jue 14/09/23**	**lun 14/09/26**
Manejo ambiental de los residuos líquidos	**$ 1.585.761,36**	**jue 14/09/23**	**jue 9/05/24**
Canecas de 55 gal con tapa para almacenar residuos líquidos	$ 1.585.761,36	jue 14/09/23	jue 9/05/24
Manejo ambiental de los residuos solidos	**$ 5.864.462,94**	**jue 1/02/24**	**sáb 19/04/25**
Punto ecológico para almacenar residuos solidos	$ 5.864.462,94	jue 1/02/24	sáb 19/04/25
Mitigación de impactos por tránsito vehicular	**$ 6.247.096,90**	**jue 1/02/24**	**mié 15/01/25**
Dispositivos para el control y manejo de tráfico en la obra (señales preventivas, reglamentarias e informativas)	$ 6.247.096,90	jue 1/02/24	mié 15/01/25
RECURSOS HUMANOS	**$ 388.713.408,00**	**mar 9/01/24**	**lun 14/09/26**
Recursos humanos para implementación del plan de manejo ambiental (Incluye: Profesional Ambiental, Profesional SST y Profesional Social)	$ 388.713.408,00	mar 9/01/24	lun 14/09/26
Etapa II	**$ 2.798.966.907,40**	**mar 15/09/26**	**vie 27/06/31**
CAPÍTULO - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	$ 2.798.966.907,40	mar 15/09/26	vie 27/06/31

3.4 PERSONAL DEL CONTRATISTA

La entidad contratante CRA aprobó con fecha del 15 de diciembre de 2023 el cambio solicitado por el contratista para los siguientes profesionales:

- Director de obra aprobado: JOSE DELATOUR
- Residente de obra: YISETH BRANGO
- Profesional en seguridad industrial y salud ocupacional: FAISAL CHEDRAUI

A continuación, se presenta la relación del personal profesional del contratista actualizado:

Tabla 3.5 *Personal Profesional y operativo del Contratista*

NOMBRE	CARGO	PROFESIÓN	CEDULA	MATRICULA
JOSE DELATOUR	DIRECTOR DE OBRA	Ingeniero Civil	8.638.632	08202-68908 ATL
YISETH BRANGO	RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero Civil	1.045.684.300	08202-249257 ATL
FAISAL CHEDRAUI	PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	Profesional SST	1.121.823.796	26238194034 CND
MIGUEL VARELA	EXPERTO ASESOR EN AREA HIDRAULICA	Ingeniero civil	85.441.892	08202-089251 ATL
ALVARO OROZCO	EXPERTO ASESOR EN AREA GEOTECNICA	Ingeniero civil	72.280.819	08202-126379 ATL
ALFREDO MARQUEZ	EXPERTO ASESOR EN AREA DE ESTRUCTURAS	Ingeniero civil	1.045.667.673	08202-211873 ATL
DANIEL GRAVINI	PROFESIONAL DE CALIDAD	Ingeniero Civil	1.045.741.697	021037-0517902 ATL
ENRIQUE PRINCIPE	PROFESIONAL PGIO	Ingeniero Civil	73.210.165	13202-191704
GUSTAVO SOLANO	INSPECTOR	Tecnólogo	72.004.331	N.A
YULIETH ORTEGA	PROFESIONAL SOCIAL	Profesional social	22.600.878	N.A
DANIELA GAVIRIA	PROFESIONAL AMBIENTAL	Profesional ambiental	1.140.896.132	021021-0531256 ATL
FERNANDO REYES	ALMACENISTA	Bachiller	73.232.314	N.A
MIGUEL SALAS	AUX. ALMACEN	Bachiller	1.128.126.752	N.A
FABIAN RIVERA	VIGILANTE	Bachiller	73.316.284	N.A
EMIGDIO SOLANO	VIGILANTE	Bachiller	73.117.716	N.A
HECTOR ROMERO	TOPOGRAFO	Tecnólogo	78.110.617	01-14882 CPNT
JORGE ZAMBRANO	AUX. TOPOGRAFIA	Técnico	2.760.941	NA
PEDRO ZAMBRANO	AUX. TOPOGRAFIA	Técnico	2.755.886	NA
CHEVERRA EDWIN	AUX. TOPOGRAFIA	Técnico	8.783.196	NA
ABEL MARTINEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	Técnico	19.586.168	N.A
LUIS MATUTE	OPERADOR DE MAQUINARIA	Técnico	1.128.054.193	N.A
JULIO ARRIETA	OPERADOR DE MAQUINARIA	Técnico	1.129.512.510	N.A
YONER CARRANZA	CONDUCTOR DE VOLQUETA	Técnico	1.143.224.231	N.A
GIOVANNY PALOMINO	OPERADOR DE MAQUINARIA	Técnico	1.045.703.042	N.A
MIGUEL NORIEGA	OPERADOR DE MAQUINARIA	Técnico	72.261.390	N.A
MANUEL RAMON	CONDUCTOR DE VOLQUETA	Técnico	73.376.974	N.A
WILMAR RAMOS	CONDUCTOR DE VOLQUETA	Técnico	85.261.672	N.A
RODRIGO RODRIGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	Técnico	1.050.276.624	N.A
LUIS PAYAREZ	AYUDANTE	Bachiller	73.270.722	N.A
JADRINTON CASTRO	OFICIAL	Bachiller	72.019.106	N.A
JHON CASTRO	AYUDANTE	Bachiller	1.007.174.195	N.A
ALDAIR CASTRO	AYUDANTE	Bachiller	1.007.174.198	N.A

NOMBRE	CARGO	PROFESIÓN	CEDULA	MATRICULA
FABIO NIETO	AYUDANTE	Bachiller	1.045.688.656	
EPIFANIO ROA	AYUDANTE	Primaria	98.610.827	N.A
SANDRO CASTRO AREVALO	AYUDANTE	Primaria	1.047.222.091	N.A
DILAN CONDE NAVARRO	AYUDANTE	Primaria	1.043.434.384	N.A
LUIS DE AVILA AGRESOTT	OFICIAL	Bachiller	72.209.544	N.A
JOSE CHAVEZ CRESPO	AYUDANTE	Bachiller	8.690.938	N.A
JUAN SERRANO ACOSTA	AYUDANTE	Bachiller	72.269.626	N.A
JONATHAN MONTERO REYES	AYUDANTE	Bachiller	1.143.160.286	N.A
JEAN PARRA CABALLERO	AYUDANTE	Bachiller	1.143.231.746	N.A
JONATHAN MONTERO ARIZA	AYUDANTE	Bachiller	1.002.136.416	N.A
ALEXANDER MANJARRES MONTENEGRO	AYUDANTE	Bachiller	72.436.865	N.A
ABELARDO POLO	AYUDANTE	Bachiller	72.295.377	N.A
HERNANDO LANUZA PADILLA	OFICIAL	Bachiller	72.125.399	N.A
JOSE MARIOTE SIMANCA	AYUDANTE	Bachiller	72.007.956	N.A
EUCLIDES ABAD LAYA	AYUDANTE	Bachiller	3.844.622	N.A
ISRAEL GONZALEZ ARIAS	AYUDANTE	Bachiller	6.158.443	N.A
LUIS LEAL MORALES	AYUDANTE	Bachiller	1.081.026.460	N.A
PEDRO ESCORCIA RODRIGUEZ	AYUDANTE	Bachiller	1.128.170.163	N.A
JHON SANABRIA FLOREZ	OFICIAL	Bachiller	1.095.932.528	N.A
JOSE CUETO DURAN	AYUDANTE	Bachiller	85.035.394	N.A

4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre el 15 de enero de 2026 al 14 de febrero de 2026:

Semana del 15 al 18 de enero de 2025

Jueves 15 de enero

- Armado de acero de refuerzo para barandas y anclajes de ½" en el tramo comprendido entre la abscisa K1+108 hasta la K1+121 en el tramo principal del arroyo.
- Relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+007 hasta la K0+015, en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Viernes 16 de enero

- Suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para vigas intermedias, pasamanos y columna de las barandas ubicadas entre las abscisas k1+108 hasta la K1+121 en el tramo principal del arroyo.
- Relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+015 hasta la K0+024, en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Suministro de concreto hidráulico de 4000 psi para losa superior entre las abscisas K0+037 a la K0+067 en el Afluente No. 1.

Sábado 17 de enero

- Trazado y replanteo para las barandas y anclajes de ½" en el tramo comprendido entre la abscisa K1+121 hasta la K1+133 en el tramo principal del arroyo.
- Relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+024 hasta la K0+030, en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Corte y sello de juntas de la losa superior K0+037 a K0+067 en el Afluente No. 1.

Domingo 18 de enero

- No se programaron actividades constructivas.

Semana del 19 al 25 de enero de 2026

Lunes 19 de enero

- Armado de acero de refuerzo de vigas intermedias, pasamanos y columnas de las barandas ubicadas entre las abscisas K1+121 hasta la K1+133 en el tramo principal de arroyo.
- Relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+030 hasta la K1+039, en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Limpieza y retiro de residuos sólidos en el Afluente 1, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+103 hasta la K0+180.

Martes 20 de enero

- Suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para vigas intermedias, pasamanos y columna de las barandas ubicadas entre las abscisas k1+121 hasta la K1+133 en el tramo principal del arroyo.
- Relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+039 hasta la K1+047, en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Limpieza y retiro de residuos sólidos en el Afluente 1, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+103 hasta la K0+050.

Miércoles 21 de enero

- Trazado y replanteo para las barandas y anclajes de ½" en el tramo comprendido entre la abscisa K1+133 hasta la K1+143 en el tramo principal del arroyo.
- Relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+047 hasta la K1+054, en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Jueves 22 de enero

- Armado de acero de refuerzo de vigas intermedias, pasamanos y columnas de las barandas ubicadas entre las abscisas K1+133 hasta la K1+143 en el tramo principal de arroyo.

- Relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+054 hasta la K1+064, en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Suministro de concreto hidráulico de 4000 psi para losa superior entre las abscisas K0+067 a la K0+097 en el Afluente No. 1.
- Limpieza y retiro de residuos sólidos en el Afluente 1, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+050 hasta la K0+000.

Viernes 23 de enero

- Suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para vigas intermedias, pasamanos y columna de las barandas ubicadas entre las abscisas k1+133 hasta la K1+143 en el tramo principal del arroyo.
- Relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+064 hasta la K1+073, en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Corte y sello de juntas de la losa superior K0+067 a K0+097 en el Afluente No. 1.

Sábado 24 de enero

- Relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+073 hasta la K1+090, en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Domingo 25 de enero

- No se programaron actividades constructivas.

Semana del 26 de enero al 01 de febrero de 2026

Lunes 26 de enero

- Relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+090 hasta la K1+099, en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Martes 27 de enero

- Relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+099 hasta la K1+106, en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Miércoles 28 de enero

- Relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+106 hasta la K1+113, en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Jueves 29 de enero

- Relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+113 hasta la K1+124, en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Limpieza y retiro de residuos sólidos en el Afluente 1, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+000 hasta la K0+120.

Viernes 30 de enero

- Trazado y replanteo para las barandas y anclajes de ½" en el tramo comprendido entre la abscisa K0+360 hasta la K0+381 en el tramo principal del arroyo.
- Relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+124 hasta la K1+137, en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Sábado 31 de enero

- Armado de acero de refuerzo de vigas intermedias, pasamanos y columnas de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+360 hasta la K0+381 en el tramo principal de arroyo.
- Relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+137 hasta la K1+143, en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Domingo 01 de febrero

- No se programaron actividades constructivas.

Semana del 02 al 08 de febrero de 2026

Lunes 02 de febrero

- Suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para vigas intermedias, pasamanos y columna de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+360 hasta la K0+381 en el tramo principal del arroyo.
- Limpieza y retiro de residuos sólidos en el tramo principal del Arroyo Platanal, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+000 hasta la K0+440.
- Encofrado para puente peatonal en la abscisa K0+642 en el tramo principal.

Martes 03 de febrero

- Trazado y replanteo para las barandas y anclajes de ½" en el tramo comprendido entre la abscisa K0+381 hasta la K0+400 en el tramo principal del arroyo.
- Limpieza y retiro de residuos sólidos en el tramo principal del Arroyo Platanal, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+440 hasta la K0+874.
- Armado de acero de refuerzo para puente peatonal en la abscisa K0+642 en el tramo principal.

Miércoles 04 de febrero

- Armado de acero de refuerzo de vigas intermedias, pasamanos y columnas de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+381 hasta la K0+400 en el tramo principal de arroyo.
- Limpieza y retiro de residuos sólidos en el tramo principal del Arroyo Platanal, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+874 hasta la K1+140.
- Demolición de losa superior existente de puente en la abscisa K1+150 en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Suministro de concreto para puente peatonal en la abscisa K0+642 en el tramo principal.

Jueves 05 de febrero

- Suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para vigas intermedias, pasamanos y columna de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+381 hasta la K0+400 en el tramo principal del arroyo.
- Limpieza y retiro de residuos sólidos en el tramo principal del Arroyo Platanal, en el tramo comprendido entre las abscisas K1+158 hasta la K1+546.
- Demolición de losa inferior existente de puente en la abscisa K1+150 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

- Excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado izquierdo, con profundidades entre 0 a 0.5 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Viernes 06 de febrero

- Trazado y replanteo para las barandas y anclajes de ½" en el tramo comprendido entre la abscisa K0+400 hasta la K0+418 en el tramo principal del arroyo.
- Limpieza y retiro de residuos sólidos en el tramo principal del Arroyo Platanal, en el tramo comprendido entre las abscisas K1+546 hasta la K1+893.
- Demolición de muros existente de puente en la abscisa K1+150 en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado izquierdo, con profundidades entre 0.5 a 1.1 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Sábado 07 de febrero

- Armado de acero de refuerzo de vigas intermedias, pasamanos y columnas de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+400 hasta la K0+418 en el tramo principal de arroyo.
- Limpieza y retiro de residuos sólidos en el tramo principal del Arroyo Platanal, en el tramo comprendido entre las abscisas K1+893 hasta la K2+010.
- Excavación para construcción de puente vehicular en el tramo principal en la abscisa K1+150.
- Excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado izquierdo, con profundidades entre 1.1 a 1.6 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Domingo 08 de febrero

- No se programaron actividades constructivas.

Semana del 09 al 14 de febrero de 2026

Lunes 09 de febrero

- Suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para vigas intermedias, pasamanos y columna de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+381 hasta la K0+400 en el tramo principal del arroyo.

- Retiro de material proveniente de la excavación para la construcción del puente vehicular en la abscisa K1+150 en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado izquierdo, con profundidades entre 1.6 a 2.05 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Martes 10 de febrero

- Trazado y replanteo para las barandas y anclajes de ½" en el tramo comprendido entre la abscisa K0+418 hasta la K0+441 en el tramo principal del arroyo.
- Relleno en piedra ciclópea para la construcción de puente vehicular en la abscisa K1+150 en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado izquierdo, con profundidades entre 2.05 a 2.60 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Miércoles 11 de febrero

- Armado de acero de refuerzo de vigas intermedias, pasamanos y columnas de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+418 hasta la K0+441 en el tramo principal de arroyo.
- Relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, primera capa, entre las abscisas K1+143 hasta la K1+150, en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Se continuó con el relleno en piedra ciclópea para la construcción de puente vehicular en la abscisa K1+150 en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado izquierdo, con profundidades entre 2.60 a 3.0 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Jueves 12 de febrero

- Suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para vigas intermedias, pasamanos y columna de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+418 hasta la K0+441 en el tramo principal del arroyo.
- Suministro de concreto de 2000 psi para solado en el fondo para la construcción de puente vehicular en el tramo principal en la abscisa K1+150.
- Excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado derecho, con profundidades entre 0 a 0.44 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Viernes 13 de febrero

- Trazado y replanteo para las barandas y anclajes de ½" en el tramo comprendido entre la abscisa K0+441 hasta la K0+464 en el tramo principal del arroyo.
- Relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, ultima capa, entre las abscisas K1+143 hasta la K1+150, en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Armado de acero de refuerzo para losa de fondo para puente vehicular en la abscisa K1+150 en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado derecho, con profundidades entre 0.44 a 0.93 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Sábado 14 de febrero

- Armado de acero de refuerzo de vigas intermedias, pasamanos y columnas de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+441 hasta la K0+464 en el tramo principal de arroyo.
- Se continuó con el armado de acero de refuerzo para losa de fondo para puente vehicular en la abscisa K1+150 en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado derecho, con profundidades entre 0.93 a 1.50 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 5.1 *Información General Contrato de Interventoría.*

CONTRATISTA:	REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS
CONTRATO No.	0289 DE 2023
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".
VALOR INICIAL:	$ 2.463.185.760
VALOR ADICIONAL:	$ 1,588,835,640
VALOR TOTAL:	$ 4,052,021,400.00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SESENTA (60) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL:	TREINTA Y SEIS (36) MESES
PLAZO TOTAL EJECUCIÓN:	NOVENTA Y SEIS (96) MESES
FECHA DE INICIO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE JUNIO DE 2028
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2031
GARANTÍAS	
El Contratista CREINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS Toma la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 11-44-101206443 con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S. A., A continuación, se relacionan los valores asegurados y las vigencias.	

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIAS**	
		Iniciación	**Terminación**
Cumplimiento del contrato	$ 182.893.480,00	14/09/2023	17/03/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 91.446.740,00	14/09/2023	14/09/2029
Calidad del servicio	$ 365.786.960,00	14/09/2023	14/09/2031

El Acta de Inicio para el desarrollo de las labores del Contrato No. 0289 DE 2023, fue suscrita el día 14 de septiembre de 2023 entre el representante legal de la Interventoría y supervisor del contrato para realizar la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**

5.2 PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, en la tabla 5.2. se presenta el presupuesto general de la interventoría:

Tabla 5.2 *Presupuesto Interventoría.*

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"						
PRESUPUESTO - ETAPA I INTERVENTORÍA OBRA FÍSICA						
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**F.M.**	**DEDICACION**	**VALOR SALARIO**	**MESES**	**VALOR TOTAL**
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
Director de Interventoría	1,00	2,40	50%	$ 6.000.000,00	36,00	$ 259.200.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	1,00	2,40	100%	$ 4.000.000,00	36,00	$ 345.600.000,00
Profesional de Calidad	1,00	2,40	50%	$ 3.000.000,00	32,00	$ 115.200.000,00
Experto Asesor Ambiental	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00
Experto Asesor en Hidráulica	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00
Experto Asesor en Geotecnia	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00
Experto Asesor en Estructuras	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00
Auxiliar Social	1,00	2,40	50%	$ 2.800.000,00	32,00	$ 107.520.000,00
Topógrafo	1,00	2,40	50%	$ 2.800.000,00	32,00	$ 107.520.000,00
Cadenero	1,00	2,40	50%	$ 1.400.000,00	32,00	$ 53.760.000,00
(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						**$ 1.062.720.000,00**
DESCRIPCIÓN			**UNIDAD**	**COSTO MENSUAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**
2. OTROS COSTOS DIRECTOS						
Alquiler de Vehículo Tipo Camioneta (Incluye: conductor, combustible y mantenimiento)			MES	$ 6.500.000	32,00	$ 208.000.000,00
Equipo Topográfico (Incluye: Estación, nivel y elementos complementarios. El tránsito equivale al 72%, el nivel al 18% y los elementos complementarios el 10% del valor de la tarifa).			MES	$ 3.200.000	32,00	$ 102.400.000,00
Elaboración de Informes			MES	$ 800.000	36,00	$ 28.800.000,00
Ensayos de Laboratorio			MES	$ 2.250.000	32,00	$ 72.000.000,00
(B) SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 411.200.000,00**
(C) = (A+B) TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 1.473.920.000,00**
DESCRIPCIÓN			**UNIDAD**	**COSTO MENSUAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**
3. COSTOS INDIRECTOS						
Oficina (Incluye Comunicaciones, Servicios Públicos y Papelería)			MES	$ 1.750.000,00	36,00	$ 63.000.000,00
(D) SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS						**$ 63.000.000,00**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRACIÓN (C) + (D)					**$ 1.536.920.000,00**
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)				19,0%	**$ 292.014.800,00**
	VALOR TOTAL DE LA ETAPA I INTERVENTORÍA OBRA FÍSICA					**$ 1.828.934.800,00**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

PRESUPUESTO - ETAPA II INTERVENTORÍA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA OBRA FÍSICA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	F.M.	DEDICACION	VALOR SALARIO	MESES	VALOR TOTAL
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
Director de Interventoría	1,00	2,40	30%	$ 6.000.000,00	24,00	$ 103.680.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	1,00	2,40	50%	$ 4.000.000,00	24,00	$ 115.200.000,00
Experto Asesor Ambiental	1,00	2,40	20%	$ 7.700.000,00	24,00	$ 88.704.000,00
Auxiliar Social	1,00	2,40	50%	$ 2.800.000,00	24,00	$ 80.640.000,00
(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						**$ 388.224.000,00**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO TOTAL
2. OTROS COSTOS DIRECTOS				
Alquiler de Vehículo Tipo Camioneta Media Jornada Diaria (Incluye: conductor, combustible y mantenimiento)	MES	$ 3.250.000	24,00	$ 78.000.000,00
Elaboración de Informes	MES	$ 800.000	24,00	$ 19.200.000,00
Jornada de sensibilización y capacitación para la adecuada Disposición y Recolección de Residuos Posconsumo mediante un grupo de quince (15) personas por jornada (Incluye: alimentación y refrigerio, elementos de protección para adecuada recolección, embalaje y transporte de residuos posconsumo).	JORNADA	$ 1.390.000	4,00	$ 5.560.000,00
(B) SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 102.760.000,00**
(C) = (A+B) TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 490.984.000,00**

Tabla 5.3 *Presupuesto Interventoría Actualizado según Adicional No. 1.*

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"											
PRESUPUESTO - ETAPA I INTERVENTORÍA OBRA FÍSICA							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 1				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	F.M.	DEDICACIÓN	VALOR SALARIO	MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	F.M.	DEDICACIÓN	MESES	VALOR TOTAL
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL											
Director de Interventoría	1,00	2,40	50%	$ 6.000.000,00	36,00	$ 259.200.000,00	1,00	2,40	77,8%	36,00	$ 403.200.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	1,00	2,40	100%	$ 4.000.000,00	36,00	$ 345.600.000,00	2,00	2,40	77,8%	36,00	$ 537.600.000,00
Profesional de Calidad	1,00	2,40	50%	$ 3.000.000,00	32,00	$ 115.200.000,00	1,00	2,40	81,3%	32,00	$ 187.200.000,00
Experto Asesor Ambiental	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00	1,00	2,40	25,0%	4,00	$ 18.480.000,00
Experto Asesor en Hidráulica	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00	1,00	2,40	25,0%	4,00	$ 18.480.000,00
Experto Asesor en Geotecnia	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00	1,00	2,40	25,0%	4,00	$ 18.480.000,00
Experto Asesor en Estructuras	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00	1,00	2,40	25,0%	4,00	$ 18.480.000,00
Auxiliar Social	1,00	2,40	50%	$ 2.800.000,00	32,00	$ 107.520.000,00	1,00	2,40	81,3%	32,00	$ 174.720.000,00
Topógrafo	1,00	2,40	50%	$ 2.800.000,00	32,00	$ 107.520.000,00	1,00	2,40	68,8%	32,00	$ 147.840.000,00
Cadenero	1,00	2,40	50%	$ 1.400.000,00	32,00	$ 53.760.000,00	1,00	2,40	68,8%	32,00	$ 73.920.000,00
(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						**$ 1.062.720.000,00**	**(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**				**$ 1.598.400.000,00**
DESCRIPCIÓN			**UNIDAD**	**COSTO MENSUAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**				**COSTO TOTAL**
2. OTROS COSTOS DIRECTOS											
Alquiler de Vehículo Tipo Camioneta (Incluye: conductor, combustible y mantenimiento)			MES	$ 6.500.000,00	32,00	$ 208.000.000,00	32,00				$ 208.000.000,00
Equipo Topográfico (Incluye: Estación, nivel y elementos complementarios. El tránsito equivale al 72%, el nivel al 18% y los elementos complementarios el 10% del valor de la tarifa).			MES	$ 3.200.000,00	32,00	$ 102.400.000,00	32,00				$ 102.400.000,00
Elaboración de Informes			MES	$ 800.000,00	36,00	$ 28.800.000,00	36,00				$ 28.800.000,00
Ensayos de Laboratorio			MES	$ 2.250.000,00	32,00	$ 72.000.000,00	32,00				$ 72.000.000,00
(B) SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 411.200.000,00**					**$ 411.200.000,00**
(C) = (A+B) TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 1.473.920.000,00**					**$ 2.009.600.000,00**
DESCRIPCIÓN			**UNIDAD**	**COSTO MENSUAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**				**COSTO TOTAL**
3. COSTOS INDIRECTOS											
Oficina (Incluye Comunicaciones, Servicios Públicos y Papelería)			MES	$ 1.750.000,00	36,00	$ 63.000.000,00	36,00				$ 63.000.000,00
(D) SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS						**$ 63.000.000,00**					**$ 63.000.000,00**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRACIÓN (C) + (D)					**$ 1.536.920.000,00**					**$ 2.072.600.000,00**
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)				19,0%	**$ 292.014.800,00**					**$ 393.794.000,00**
	VALOR TOTAL DE LA ETAPA I INTERVENTORÍA OBRA FÍSICA					**$ 1.828.934.800,00**					**$ 2.466.394.000,00**

Tabla 5.4 *Presupuesto Interventoría Actualizado según Adicional No. 1. ETAPA II Interventoría de seguimiento y monitoreo de la obra física.*

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"									
PRESUPUESTO - ETAPA II INTERVENTORÍA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA OBRA FÍSICA									
PRESUPUESTO - ETAPA II INTERVENTORÍA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA OBRA FÍSICA	CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 1		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	F.M.	DEDICACIÓN	VALOR SALARIO	MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	MESES	VALOR TOTAL
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
Director de Interventoría	1,00	2,40	30%	$ 6.000.000,00	24,00	$ 103.680.000,00	1,00	60,00	$ 259.200.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	1,00	2,40	50%	$ 4.000.000,00	24,00	$ 115.200.000,00	1,00	60,00	$ 288.000.000,00
Experto Asesor Ambiental	1,00	2,40	20%	$ 7.700.000,00	24,00	$ 88.704.000,00	1,00	60,00	$ 221.760.000,00
Auxiliar Social	1,00	2,40	50%	$ 2.800.000,00	24,00	$ 80.640.000,00	1,00	60,00	$ 201.600.000,00
(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						**$ 388.224.000,00**	**(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**		**$ 970.560.000,00**
DESCRIPCIÓN			**UNIDAD**	**COSTO**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**		**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**
2. OTROS COSTOS DIRECTOS									
Alquiler de Vehículo Tipo Camioneta Media Jornada Diaria (Incluye: conductor, combustible y mantenimiento)			MES	$ 3.250.000	24,00	$ 78.000.000,00		60,00	$ 195.000.000,00
Elaboración de Informes			MES	$ 800.000	24,00	$ 19.200.000,00		60,00	$ 48.000.000,00
Jornada de sensibilización y capacitación para la adecuada Disposición y Recolección de Residuos Posconsumo mediante un grupo de quince (15) personas por jornada (Incluye: alimentación y refrigerio, elementos de protección para adecuada recolección, embalaje y transporte de residuos posconsumo).			JORNADA	$ 1.390.000	4,00	$ 5.560.000,00		10,00	$ 13.900.000,00
(B) SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 102.760.000,00**	**(B) SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS**		**$ 256.900.000,00**
(C) = (A+B) TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 490.984.000,00**	**(C) = (A+B) TOTAL COSTOS DIRECTOS**		**$ 1.227.460.000,00**
DESCRIPCIÓN			**UNIDAD**	**COSTO MENSUAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**		**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**
3. COSTOS INDIRECTOS									
Oficina (Incluye Comunicaciones, Servicios Públicos y Papelería)			MES	$ 1.750.000,00	24,00	$ 42.000.000,00		60,00	$ 105.000.000,00
(D) SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS						**$ 42.000.000,00**	**(D) SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS**		**$ 105.000.000,00**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRACIÓN (C) + (D)					**$ 532.984.000,00**			**$ 1.332.460.000,00**
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)				19,0%	**$ 101.266.960,00**			**$ 253.167.400,00**
	VALOR TOTAL DE LA ETAPA II INTERVENTORÍA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA OBRA FÍSICA					**$ 634.250.960,00**			**$ 1.585.627.400,00**

5.3 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

A partir de enero de 2024 se dio inicio a la etapa de construcción del proyecto que tiene una duración de 32 meses.

Cabe resaltar que el día 05 de marzo de 2024 por medio de comunicado 001007 de la CRA se recibe concepto favorable para el cambio del director de interventoría, cambiando al Ing. Ramiro Mendoza por el Ing. Ismael Quintero, por lo tanto, el Ing. Ismael Quintero finalizado el periodo de estudios y diseño pasa de ser el asesor hidráulico a ejercer el cargo de director de interventoría.

A continuación, se presenta la relación del personal profesional de interventoría:

Tabla 5.3 *Personal Profesional de la Interventoría*

NOMBRE	CARGO	PROFESIÓN	CEDULA	MATRICULA
ISMAEL QUINTERO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Ingeniero Civil	72.161.532	08202-73691 ATL
JORGE FONTALVO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Ingeniero Civil	85.372.016	08202-139786 ATL
LUIS QUESADA	PROFESIONAL DE CALIDAD	Ingeniero Industrial	1.098.644.023	68228239164 STD
DAYANIS VARGAS	AUXILIAR SOCIAL	Técnico	1.045.732.411	N.A
MIGUEL SEVILLA	TOPOGRAFO	Ingeniero Civil	1.098.724.885	151037-0580407 STD
JAIRO CANOA	CADENERO	Bachiller-universitario en curso	5.135.331	N.A

6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el Interventor:

Semana del 15 al 18 de enero de 2025

Jueves 15 de enero

- Inspección del armado de acero de refuerzo para barandas y anclajes de ½" en el tramo comprendido entre la abscisa K1+108 hasta la K1+121 en el tramo principal del arroyo.
- Revisión de las actividades de relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+007 hasta la K0+015, en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Viernes 16 de enero

- Revisión del suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para vigas intermedias, pasamanos y columna de las barandas ubicadas entre las abscisas k1+108 hasta la K1+121 en el tramo principal del arroyo.
- Inspección de las actividades relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+015 hasta la K0+024, en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Revisión del suministro de concreto hidráulico de 4000 psi para losa superior entre las abscisas K0+037 a la K0+067 en el Afluente No. 1.

Sábado 17 de enero

- Revisión del trazado y replanteo para las barandas y anclajes de ½" en el tramo comprendido entre la abscisa K1+121 hasta la K1+133 en el tramo principal del arroyo.
- Inspección de las actividades de relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+024 hasta la K0+030, en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Chequeo del corte y sello de juntas de la losa superior K0+037 a K0+067 en el Afluente No. 1.

Domingo 18 de enero

- No se programaron actividades constructivas.

Semana del 19 al 25 de enero de 2026

Lunes 19 de enero

- Revisión del armado de acero de refuerzo de vigas intermedias, pasamanos y columnas de las barandas ubicadas entre las abscisas K1+121 hasta la K1+133 en el tramo principal de arroyo.
- Seguimiento a las actividades de relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+030 hasta la K1+039, en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Acompañamiento a las actividades de limpieza y retiro de residuos sólidos en el Afluente 1, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+103 hasta la K0+180.

Martes 20 de enero

- Revisión del suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para vigas intermedias, pasamanos y columna de las barandas ubicadas entre las abscisas k1+121 hasta la K1+133 en el tramo principal del arroyo.
- Inspección del relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+039 hasta la K1+047, en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Acompañamiento a las actividades de limpieza y retiro de residuos sólidos en el Afluente 1, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+103 hasta la K0+050.

Miércoles 21 de enero

- Supervisión del trazado y replanteo para las barandas y anclajes de ½" en el tramo comprendido entre la abscisa K1+133 hasta la K1+143 en el tramo principal del arroyo.
- Inspección de las actividades de relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+047 hasta la K1+054, en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Jueves 22 de enero

- Revisión del armado de acero de refuerzo de vigas intermedias, pasamanos y columnas de las barandas ubicadas entre las abscisas K1+133 hasta la K1+143 en el tramo principal de arroyo.
- Inspección de las actividades de relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+054 hasta la K1+064, en el tramo principal del Arroyo Platanal.

- Control del suministro de concreto hidráulico de 4000 psi para losa superior entre las abscisas K0+067 a la K0+097 en el Afluente No. 1.
- Acompañamiento a las actividades de limpieza y retiro de residuos sólidos en el Afluente 1, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+050 hasta la K0+000.

Viernes 23 de enero

- Control del suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para vigas intermedias, pasamanos y columna de las barandas ubicadas entre las abscisas k1+133 hasta la K1+143 en el tramo principal del arroyo.
- Revisión del relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+064 hasta la K1+073, en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Chequeo del corte y sello de juntas de la losa superior K0+067 a K0+097 en el Afluente No. 1.

Sábado 24 de enero

- Revisión de las actividades de relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+073 hasta la K1+090, en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Domingo 25 de enero

- No se programaron actividades constructivas.

Semana del 26 de enero al 01 de febrero de 2026

Lunes 26 de enero

- Revisión de las actividades de relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+090 hasta la K1+099, en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Martes 27 de enero

- Revisión de las actividades de relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+099 hasta la K1+106, en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Miércoles 28 de enero

- Revisión de las actividades de relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+106 hasta la K1+113, en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Jueves 29 de enero

- Revisión de las actividades de relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+113 hasta la K1+124, en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Acompañamiento a las actividades de limpieza y retiro de residuos sólidos en el Afluente 1, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+000 hasta la K0+120.

Viernes 30 de enero

- Seguimiento a las actividades de trazado y replanteo para las barandas y anclajes de ½" en el tramo comprendido entre la abscisa K0+360 hasta la K0+381 en el tramo principal del arroyo.
- Revisión de las actividades de relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+124 hasta la K1+137, en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Sábado 31 de enero

- Revisión del armado de acero de refuerzo de vigas intermedias, pasamanos y columnas de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+360 hasta la K0+381 en el tramo principal de arroyo.
- Revisión de las actividades de relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, última capa, entre las abscisas K1+137 hasta la K1+143, en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Domingo 01 de febrero

- No se programaron actividades constructivas.

Semana del 02 al 08 de febrero de 2026

Lunes 02 de febrero

- Control del suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para vigas intermedias, pasamanos y columna de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+360 hasta la K0+381 en el tramo principal del arroyo.
- Acompañamiento a las actividades de limpieza y retiro de residuos sólidos en el tramo principal del Arroyo Platanal, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+000 hasta la K0+440.
- Revisión del encofrado para puente peatonal en la abscisa K0+642 en el tramo principal.

Martes 03 de febrero

- Inspección del trazado y replanteo para las barandas y anclajes de ½" en el tramo comprendido entre la abscisa K0+381 hasta la K0+400 en el tramo principal del arroyo.
- Acompañamiento a las actividades de limpieza y retiro de residuos sólidos en el tramo principal del Arroyo Platanal, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+440 hasta la K0+874.
- Revisión del armado de acero de refuerzo para puente peatonal en la abscisa K0+642 en el tramo principal.

Miércoles 04 de febrero

- Revisión del armado de acero de refuerzo de vigas intermedias, pasamanos y columnas de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+381 hasta la K0+400 en el tramo principal de arroyo.
- Acompañamiento a las actividades de limpieza y retiro de residuos sólidos en el tramo principal del Arroyo Platanal, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+874 hasta la K1+140.
- Chequeo de la demolición de losa superior existente de puente en la abscisa K1+150 en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Control del suministro de concreto para puente peatonal en la abscisa K0+642 en el tramo principal.

Jueves 05 de febrero

- Control del suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para vigas intermedias, pasamanos y columna de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+381 hasta la K0+400 en el tramo principal del arroyo.
- Acompañamiento a las actividades de limpieza y retiro de residuos sólidos en el tramo principal del Arroyo Platanal, en el tramo comprendido entre las abscisas K1+158 hasta la K1+546.

- Chequeo de la demolición de losa inferior existente de puente en la abscisa K1+150 en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Inspección de la excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado izquierdo, con profundidades entre 0 a 0.5 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Viernes 06 de febrero

- Revisión del trazado y replanteo para las barandas y anclajes de ½" en el tramo comprendido entre la abscisa K0+400 hasta la K0+418 en el tramo principal del arroyo.
- Acompañamiento a las actividades de limpieza y retiro de residuos sólidos en el tramo principal del Arroyo Platanal, en el tramo comprendido entre las abscisas K1+546 hasta la K1+893.
- Demolición de muros existente de puente en la abscisa K1+150 en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado izquierdo, con profundidades entre 0.5 a 1.1 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Sábado 07 de febrero

- Revisión del armado de acero de refuerzo de vigas intermedias, pasamanos y columnas de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+400 hasta la K0+418 en el tramo principal de arroyo.
- Acompañamiento a las actividades de limpieza y retiro de residuos sólidos en el tramo principal del Arroyo Platanal, en el tramo comprendido entre las abscisas K1+893 hasta la K2+010.
- Revisión de la excavación para construcción de puente vehicular en el tramo principal en la abscisa K1+150.
- Inspección de la excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado izquierdo, con profundidades entre 1.1 a 1.6 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Domingo 08 de febrero

- No se programaron actividades constructivas.

Semana del 09 al 14 de febrero de 2026

Lunes 09 de febrero

- Control del suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para vigas intermedias, pasamanos y columna de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+381 hasta la K0+400 en el tramo principal del arroyo.
- Revisión del retiro de material proveniente de la excavación para la construcción del puente vehicular en la abscisa K1+150 en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Inspección de la excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado izquierdo, con profundidades entre 1.6 a 2.05 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Martes 10 de febrero

- Chequeo del trazado y replanteo para las barandas y anclajes de ½" en el tramo comprendido entre la abscisa K0+418 hasta la K0+441 en el tramo principal del arroyo.
- Verificación del relleno en piedra ciclópea para la construcción de puente vehicular en la abscisa K1+150 en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Control de la excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado izquierdo, con profundidades entre 2.05 a 2.60 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Miércoles 11 de febrero

- Inspección del armado de acero de refuerzo de vigas intermedias, pasamanos y columnas de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+418 hasta la K0+441 en el tramo principal de arroyo.
- Revisión de las actividades de relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, primera capa, entre las abscisas K1+143 hasta la K1+150, en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Se continuó con el control del relleno en piedra ciclópea para la construcción de puente vehicular en la abscisa K1+150 en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Inspección de la excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado izquierdo, con profundidades entre 2.60 a 3.0 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Jueves 12 de febrero

- Control del suministro de concreto hidráulico de 3000 psi para vigas intermedias, pasamanos y columna de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+418 hasta la K0+441 en el tramo principal del arroyo.
- Revisión del suministro de concreto de 2000 psi para solado en el fondo para la construcción de puente vehicular en el tramo principal en la abscisa K1+150.
- Inspección de la excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado derecho, con profundidades entre 0 a 0.44 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Viernes 13 de febrero

- Chequeo del trazado y replanteo para las barandas y anclajes de ½" en el tramo comprendido entre la abscisa K0+441 hasta la K0+464 en el tramo principal del arroyo.
- Seguimiento a las actividades de relleno con material de cantera tipo recebo en los laterales de los muros, ultima capa, entre las abscisas K1+143 hasta la K1+150, en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Revisión del armado de acero de refuerzo para losa de fondo para puente vehicular en la abscisa K1+150 en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Inspección de la excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado derecho, con profundidades entre 0.44 a 0.93 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Sábado 14 de febrero

- Revisión del armado de acero de refuerzo de vigas intermedias, pasamanos y columnas de las barandas ubicadas entre las abscisas K0+441 hasta la K0+464 en el tramo principal de arroyo.
- Se continuó con la revisión del armado de acero de refuerzo para losa de fondo para puente vehicular en la abscisa K1+150 en el tramo principal del Arroyo Platanal.
- Inspección de la excavación manual para zapatas de cimentación de puente peatonal aéreo, lado derecho, con profundidades entre 0.93 a 1.50 metros, ubicado en la abscisa K1+547 en el tramo principal del Arroyo Platanal.

6.1 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En el marco del seguimiento técnico adelantado al estado de ejecución de las actividades constructivas, y con base en la verificación en campo de las cantidades de obra ejecutadas, se determinó que, con corte al 14 de febrero de 2026, el Contratista de Obra registra un avance físico acumulado del 96,08%.

El porcentaje señalado fue establecido a partir del análisis comparativo entre las cantidades efectivamente ejecutadas y aquellas previstas en el presupuesto contractual aprobado. Dicho avance supera en 14,53 puntos porcentuales el 81,55% programado para la misma fecha en el cronograma de obra vigente, evidenciando un adelantamiento significativo frente a la línea base de programación.

Este comportamiento evidencia una ejecución eficiente, con adecuada planeación y gestión de recursos, permitiendo mantener un rendimiento superior al programado y garantizar la estabilidad operativa del proyecto sin afectar la calidad ni las especificaciones técnicas contractuales.


CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES FISICA EJECUTADAS

PRESUPUESTO ETAPA I - CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL			AVANCE FISICO ACUMULADO-EJECUTADO INFORME 29 ENERO 2026 - FEBRERO 2026
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	CAPÍTULO I - PRELIMINARES		
1.01	Localización, Trazado y Replanteo	M2	28,132.66
1.02	Control Topográfico	MES	26.00
	CAPÍTULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS		**CANTIDAD**
2.01	Excavación Mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua. (Incluye cargue en volqueta. No incluye transporte a sitio de disposición final)	M3	30,299.24
2.02	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	M3	30,956.82
2.03	Relleno con Material de Sitio	M3	0.00
2.04	Relleno Compacto en Piedra Ciclópea.	M3	15,815.34
2.05	Suministro e Instalación de Geotextil Tejido Propyweave T2400 o W315 o similar para separación de capas granulares y estabilización de suelos.	M2	17,902.85
2.06	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final **mayor** de 5 kms.	M3-KM	1,136,844.61

2.07	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final **menor** de 5 kms.	M3	0.00
2.08	Repaleo Interno con cargador hasta punto de acopio de cargue distancia hasta 200 mt.s	M3	26,755.21
2.09	Excavación Manual en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua para nivelación de fondo o afinado de taludes. (Incluye cargue en volqueta)	M3	34.56
2.10	Tablestacado de Protección H=3,00 m. (para el 30% del total de la longitud)	M2	5,321.67
2.11	Pago de Derechos de botaderos	M3	40,601.59
2.12	Extensión y Disposición de Material Sobrante	M3	0.00
			0.00
	CAPÍTULO III - OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN		**CANTIDAD**
3.01	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60.	KG	654,245.00
3.02	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para fondo de canal, incluye formaleteria.	M3	2,853.82
3.03	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para muros de canal, incluye formaleteria.	M3	2,666.83
3.04	Suministro y colocación de concreto para Solado de 2000 PSI.	M3	1,045.43
3.05	Corte y Sello de Juntas Transversales.	ML	3,598.76
3.06	Suministro e Instalación de Cinta PVC 0-22 o similar para juntas de construcción.	ML	5,576.10
3.07	Barandas en Concreto de 3000 PSI de 0,20 m*0,20 m. (Columnas a 1,50 m, con Varillas de 1/2" 60.000 PSI. Estribos de 1/4" a 0,20 m)	ML	1,837.00
3.08	Tubería de Ø2" para Lloradero de Muros	ML	2,439.70
3.09	Andenes en Concreto espesor 10 cms.	M2	0.00
3.10	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	M3	0.00
3.11	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. (Para andenes 3/8" cada 0,30 mts ambos sentidos)	KG	20,552.00
	CAPÍTULO IV - MANEJO DE AGUAS		**CANTIDAD**
4.1	Manejo de Aguas	MES	26.00
	CAPÍTULO V - ÍTEMS NO PREVISTOS		**CANTIDAD**
NP-01	Demolición de concreto simple y reforzado, no incluye retiro de material	M³	221.66
NP-02	Rocería, limpieza y descapote de maleza, incluye retiro de material/basura a botadero	M2	23,320.00
NP-03	Anclaje de 1/2"	UND	4,339.00

NP-04	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI dimensiones de 20cmx30cm para confinamiento de andenes, no incluye acero de refuerzo	ML	11.80
NP-05	Suministro y colocación de Concreto de 4000 PSI impermeabilizado para losa superior, incluye formaleta.	M3	54.80
SUBTOTAL OBRA CIVIL			
	CAPÍTULO VI - COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL		**CANTIDAD**
	GESTIÓN SOCIAL		
5.01	Campaña Radial	Und	1.00
5.02	Reuniones Informativas con la Comunidad	Und	2.00
	EDUCACIÓN AMBIENTAL		0.00
5.03	Inducción Ambiental a Comunidades	Und	2.00
5.04	Inducción Ambiental a Trabajadores	Und	2.00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		0.00
5.05	Socialización del Proyecto con Organismos y Autoridades	Und	1.00
	GESTIÓN AMBIENTAL		0.00
	Manejo ambiental de los residuos líquidos		0.00
5.07	Canecas de 55 gal con tapa para almacenar residuos líquidos	Und	6.00
	Manejo ambiental de los residuos solidos		0.00
5.08	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	Und	3.00
	Mitigación de impactos por tránsito vehicular		0.00
5.09	Dispositivos para el control y manejo de tráfico en la obra (señales preventivas, reglamentarias e informativas)	Glb	1.00
	RECURSOS HUMANOS		0.00
5.10	Recursos humanos para implementación del plan de manejo ambiental (Incluye: Profesional Ambiental, Profesional SST y Profesional Social)	Mes	26.00
SUBTOTAL COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL			
		TOTAL, PORCENTAJE	**Porcentaje total avance físico 96.08%**

RESUMEN DE CANTIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS

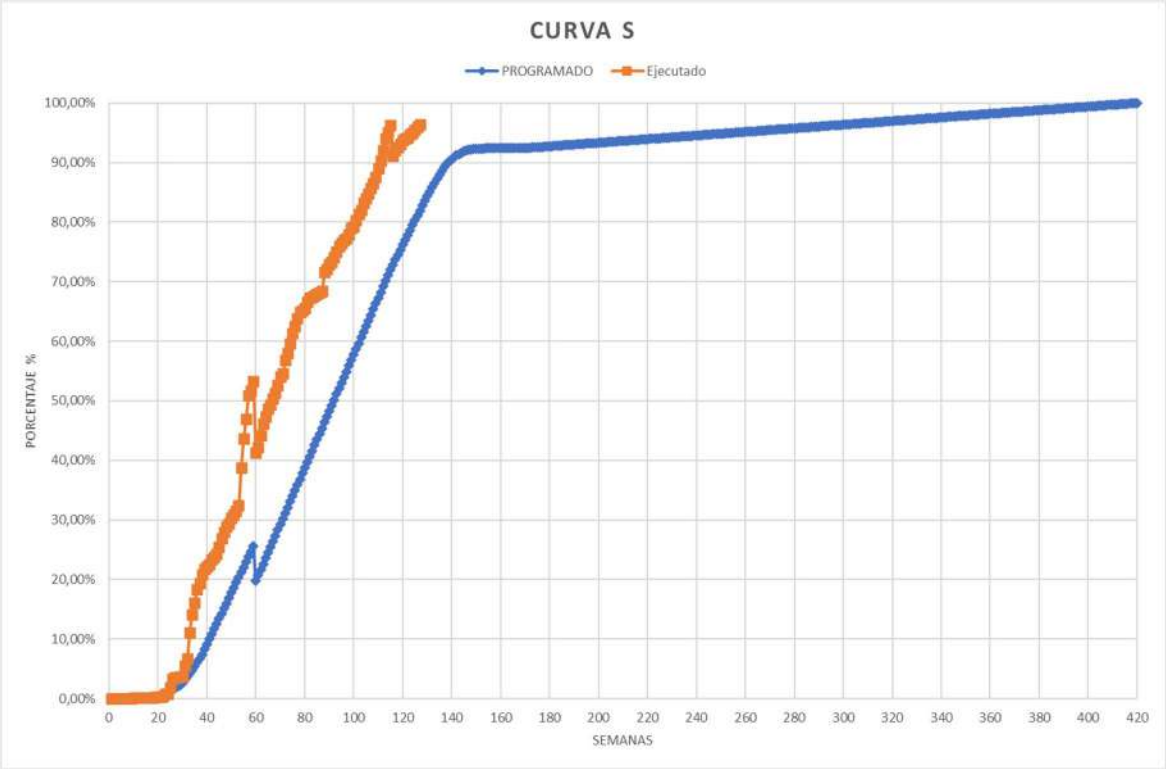

Curva S del proyecto Arroyo El Platanal Programado físico vs Ejecutado

Teniendo en cuenta la gráfica consolidada que refleja el avance físico, se determina que el Contratista de Obra presenta un desempeño superior al establecido en la programación vigente, alcanzando un avance acumulado del 96,08%, en comparación con el 81,55% previsto para la misma fecha de corte. Esta diferencia favorable confirma un adelantamiento respecto a la línea base definida en el cronograma contractual y evidencia un comportamiento constructivo eficiente.

Dicho resultado obedece a una planificación técnica adecuada de las actividades y a una gestión eficiente de los recursos humanos, técnicos y logísticos del proyecto, lo que ha permitido mantener una dinámica de ejecución sostenida y controlada. Se precisa que los porcentajes de avance fueron ajustados conforme a lo estipulado en el Otrosí No. 3, suscrito el 1 de noviembre de 2024, asegurando la correspondencia entre los indicadores de seguimiento, la estructura contractual vigente y la programación actualizada del proyecto.

Nota aclaratoria: El porcentaje de avance obra física reportado para el presente periodo corresponde al 96.08%, el cual es equivalente a $32.848.213.324,64. Así mismo, a corte del mes de febrero de 2026, se tiene ejecutado mayores cantidades

equivalentes a un valor acumulado de $4.911.796.504, las cuales se han registrado y soportado mediante acta de mayores cantidades No. 5.

CUADRO RESUMEN DE RECONOCIMIENTO DE MAYORES CANTIDADES

PRESUPUESTO ETAPA I - CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL			RECONOCIMIENTO DE MAYORES CANTIDADES ENERO - FEBRERO 2025
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	CAPÍTULO I - PRELIMINARES		
1.01	Localización, Trazado y Replanteo	M2	12,962.69
1.02	Control Topográfico	MES	0.00
	CAPÍTULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS		**CANTIDAD**
2.01	Excavación Mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua. (Incluye cargue en volqueta. No incluye transporte a sitio de disposición final)	M3	13,609.93
2.02	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	M3	4,284.41
2.03	Relleno con Material de Sitio	M3	0.00
2.04	Relleno Compacto en Piedra Ciclópea.	M3	3,804.39
2.05	Suministro e Instalación de Geotextil Tejido Propyweave T2400 o W315 o similar para separación de capas granulares y estabilización de suelos.	M2	17,469.30
2.06	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final **mayor** de 5 kms.	M3-KM	461,449.26
2.07	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final **menor** de 5 kms.	M3	0.00
2.08	Repaleo Interno con cargador hasta punto de acopio de cargue distancia hasta 200 mt.s	M3	35,701.66
2.09	Excavación Manual en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua para nivelación de fondo o afinado de taludes. (Incluye cargue en volqueta)	M3	0.00
2.10	Tablestacado de Protección H=3,00 m. (para el 30% del total de la longitud)	M2	7,947.00
2.11	Pago de Derechos de botaderos	M3	16,480.33
2.12	Extensión y Disposición de Material Sobrante	M3	0.00
	CAPÍTULO III - OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN		**CANTIDAD**
3.01	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60.	KG	4,065.71

PRESUPUESTO ETAPA I - CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL			RECONOCIMIENTO DE MAYORES CANTIDADES ENERO - FEBRERO 2025
3.02	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para fondo de canal, incluye formaleteria.	M3	19.99
3.03	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para muros de canal, incluye formaleteria.	M3	16.87
3.04	Suministro y colocación de concreto para Solado de 2000 PSI.	M3	8.00
3.05	Corte y Sello de Juntas Transversales.	ML	0.00
3.06	Suministro e Instalación de Cinta PVC 0-22 o similar para juntas de construcción.	ML	0.00
3.07	Barandas en Concreto de 3000 PSI de 0,20 m*0,20 m. (Columnas a 1,50 m, con Varillas de 1/2" 60.000 PSI. Estribos de 1/4" a 0,20 m)	ML	0.00
3.08	Tubería de Ø2" para Lloradero de Muros	ML	0.00
3.09	Andenes en Concreto espesor 10 cms.	M2	0.00
3.10	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	M3	0.00
3.11	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. (Para andenes 3/8" cada 0,30 mts ambos sentidos)	KG	0.00
	CAPÍTULO IV - MANEJO DE AGUAS		**CANTIDAD**
4.1	Manejo de Aguas	MES	0.00
	CAPÍTULO V - ÍTEMS NO PREVISTOS		**CANTIDAD**
NP-01	Demolición de concreto simple y reforzado, no incluye retiro de material	M³	0.00
NP-02	Rocería, limpieza y descapote de maleza, incluye retiro de material/basura a botadero	M2	0.00
NP-03	Anclaje de 1/2"	UND	0.00
NP-04	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI dimensiones de 20cmx30cm para confinamiento de andenes, no incluye acero de refuerzo	ML	0.00
NP-05	Suministro y colocación de Concreto de 4000 PSI impermeabilizado para losa superior, incluye formaleta.	M3	0.00
SUBTOTAL OBRA CIVIL			
	CAPÍTULO VI - COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL		**CANTIDAD**
	GESTIÓN SOCIAL		
5.01	Campaña Radial	Und	0.00
5.02	Reuniones Informativas con la Comunidad	Und	0.00
	EDUCACIÓN AMBIENTAL		

PRESUPUESTO ETAPA I - CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL			RECONOCIMIENTO DE MAYORES CANTIDADES ENERO - FEBRERO 2025
5.03	Inducción Ambiental a Comunidades	Und	0.00
5.04	Inducción Ambiental a Trabajadores	Und	0.00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		
5.05	Socialización del Proyecto con Organismos y Autoridades	Und	0.00
	GESTIÓN AMBIENTAL		
	Manejo ambiental de los residuos líquidos		
5.07	Canecas de 55 gal con tapa para almacenar residuos líquidos	Und	0.00
	Manejo ambiental de los residuos solidos		
5.08	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	Und	0.00
	Mitigación de impactos por tránsito vehicular		
5.09	Dispositivos para el control y manejo de tráfico en la obra (señales preventivas, reglamentarias e informativas)	Glb	0.00
	RECURSOS HUMANOS		
5.10	Recursos humanos para implementación del plan de manejo ambiental (Incluye: Profesional Ambiental, Profesional SST y Profesional Social)	Mes	0.00

6.2 ENSAYOS LABORATORIO

Durante el período comprendido entre el 15 de enero y el 14 de febrero de 2026, la Interventoría ejecutó actividades de seguimiento y control de calidad en el frente de obra, con el objetivo de verificar la correcta implementación de los procesos constructivos conforme a los planos de diseño, las especificaciones técnicas contractuales y la normatividad vigente aplicable. Estas actuaciones se desarrollaron en el marco del Plan de Calidad de la Obra, garantizando la coherencia entre las actividades ejecutadas en campo y los parámetros establecidos en los diseños estructurales y geotécnicos.

En este contexto, se realizaron controles topográficos sobre los rellenos compactados mediante levantamientos de verificación y chequeo de cotas, pendientes, alineamientos y secciones transversales, confirmándose la correspondencia con los niveles de diseño.

De manera complementaria, se efectuaron ensayos de densidad in situ utilizando el método del cono de arena, con el propósito de evaluar el grado de compactación de los rellenos estructurales dispuestos en los respaldos de muros. Los resultados obtenidos evidenciaron porcentajes de compactación acordes con los valores mínimos exigidos en las especificaciones técnicas del diseño geotécnico, garantizando condiciones adecuadas de capacidad portante, estabilidad global y comportamiento estructural del sistema de contención.

Asimismo, se llevó a cabo la toma y extracción de cilindros de concreto correspondientes a los elementos estructurales fundidos en sitio, particularmente barandas y losas superiores, los cuales fueron remitidos a un laboratorio para la realización de ensayos de resistencia a la compresión. Los resultados certificaron el cumplimiento de las resistencias de diseño establecidas, asegurando la trazabilidad del control de calidad del concreto y la confiabilidad estructural de los elementos ejecutados.

En general, los controles técnicos implementados durante el periodo evaluado permiten concluir que la obra se desarrolla bajo estándares adecuados de calidad, estabilidad y desempeño estructural, en estricta concordancia con los lineamientos contractuales y normativos vigentes. Los resultados satisfactorios de las verificaciones y ensayos respaldan la correcta aplicación de los procedimientos constructivos y contribuyen a garantizar la durabilidad, funcionalidad y seguridad de la infraestructura

6.3 SEGUIMIENTO SST

Durante el período comprendido entre el 15 de enero y el 14 de febrero de 2026, la Interventoría desarrolló actividades de seguimiento, control y verificación orientadas a evaluar la implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) ejecutado por el contratista en el frente de obra. Dichas acciones estuvieron encaminadas a constatar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales y la aplicación efectiva de las medidas preventivas y correctivas establecidas para la identificación, evaluación y control de riesgos, garantizando condiciones seguras para el desarrollo de las actividades constructivas.

En el marco de la gestión integral de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) aplicada al proyecto, se verificó la adecuada formulación, divulgación y aplicación de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS), garantizando la identificación, valoración y control de los riesgos inherentes a los procesos constructivos. De manera complementaria, se efectuó la inspección preoperacional de equipos, herramientas y maquinaria, con el propósito de asegurar su óptimo estado mecánico y funcional, minimizando la probabilidad de fallas operativas y la generación de condiciones subestándar en el frente de obra.

Igualmente, se realizó la revisión del estado, operatividad y ubicación estratégica de los elementos destinados a la atención de emergencias, tales como extintores, botiquines, señalización preventiva e informativa y rutas de evacuación, verificando su vigencia, accesibilidad y conformidad con los lineamientos establecidos en el plan de emergencias del proyecto y la normatividad vigente aplicable.

La Interventoría adelantó seguimiento al suministro y uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), constatando su correspondencia con la matriz de identificación de peligros, así como con la naturaleza específica de las actividades desarrolladas. Se evidenció la utilización permanente y correcta de los EPP por parte del personal operativo, en concordancia con lo dispuesto en el Programa de SST y los procedimientos internos de seguridad industrial implementados en la obra.

Adicionalmente, se revisó la documentación soporte del sistema, verificando la afiliación vigente del personal operativo y administrativo al Sistema de Seguridad Social Integral, condición obligatoria para su vinculación formal y para la cobertura frente a riesgos laborales, conforme a la legislación colombiana en materia laboral y de seguridad social.

Finalmente, se constató la ejecución periódica de capacitaciones y charlas técnicas de seguridad, orientadas a fortalecer la cultura de prevención, la adecuada identificación de peligros asociados a las actividades constructivas y la adopción de prácticas seguras en obra. Estas acciones contribuyen al mejoramiento continuo del desempeño en SST, a la reducción de la accidentalidad y al cumplimiento de los

objetivos establecidos dentro del sistema de gestión del proyecto, en armonía con los principios de sostenibilidad y responsabilidad socioambiental.

A continuación, se relacionan las acciones y temas tratados de manera general durante las charlas de seguridad y salud en el trabajo en el periodo evaluado:

- Misión, visión importancia de la seguridad y salud
- Importancia del uso de los EPP
- Manejo de basuras
- Riesgo biológico
- Diferencia entre accidente e incidente
- condiciones inseguras
- Enfermedad laboral
- Riesgo psicosocial
- Riesgo ergonómico
- Riesgo físico
- Riesgo mecánico
- Primeros auxilios
- Alcohol y drogas

Se adjunta al presente informe la Inspección Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente al período del 15 enero al 14 de febrero de 2026.

6.4 SEGUIMIENTO SOCIAL

En el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 14 de febrero de 2026, la Interventoría efectuó el seguimiento y control al funcionamiento operativo del Punto de Atención al Ciudadano (PAC), verificando su adecuada implementación como mecanismo institucional de gestión social del contrato. Este espacio se mantiene habilitado como canal formal para la recepción, radicación, categorización y trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) presentadas por la comunidad ubicada en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, constituyéndose en un instrumento clave para garantizar la transparencia, la trazabilidad de las actuaciones y el fortalecimiento de la participación comunitaria, en concordancia con lo establecido en el Plan de Gestión Social.

Como resultado de la revisión adelantada, se evidenció una interacción constante con la comunidad, reflejada en la atención de solicitudes asociadas al desarrollo de las actividades contractuales. Se constató que la mayoría de los requerimientos fueron gestionados dentro de los tiempos establecidos, encontrándose debidamente registrados en la matriz de seguimiento y control de PQRS, la cual se mantiene actualizada y alineada con los procedimientos definidos en el sistema de

gestión social del proyecto. Aquellas solicitudes que continúan en trámite cuentan con seguimiento técnico y administrativo, asegurando su control documental, trazabilidad y cierre conforme a los protocolos y plazos establecidos.

Finalmente, se deja constancia de que durante el periodo evaluado no se realizaron levantamientos de actas de vecindad, motivo por el cual no se generaron registros formales sobre el estado inicial de los predios colindantes. Esta situación será considerada dentro de los mecanismos de control técnico y administrativo del proyecto, a fin de prever su ejecución en etapas posteriores, garantizando el soporte documental correspondiente y una adecuada gestión preventiva frente a eventuales reclamaciones.

6.5 SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Con el propósito de prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales asociados a las actividades constructivas del proyecto de canalización, el Consorcio Canalización El Platanal 2023 estructuró e implementó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) como instrumento técnico de planificación, control y seguimiento ambiental. Este plan constituye el marco rector de la gestión ambiental del proyecto y se orienta a la protección de los componentes físico (aire, suelo y agua), biótico (flora y fauna) y socioeconómico en el área de influencia directa e indirecta, en concordancia con la normativa ambiental vigente y los compromisos contractuales adquiridos.

Durante el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 14 de febrero de 2026, el contratista ejecutó de manera continua las medidas de manejo contempladas en el PMA, enfocadas en el control y reducción de impactos, la gestión eficiente de recursos y el cumplimiento del marco regulatorio aplicable. Las acciones implementadas se concentraron principalmente en el control de emisiones atmosféricas, la gestión integral de residuos sólidos, la protección de la biodiversidad, la capacitación ambiental del personal y la adecuada manipulación y almacenamiento de materiales e insumos utilizados en las actividades constructivas.

En lo referente al control de emisiones de material particulado, se adoptaron medidas preventivas y correctivas dirigidas a minimizar la generación y dispersión de polvo durante las actividades de excavación, cargue, transporte y disposición de materiales. Entre las acciones implementadas se destacan la cobertura temporal de acopios, el uso obligatorio de carpas en volquetas para el transporte de material, la humectación periódica de vías internas y zonas de tránsito, así como la verificación del estado mecánico de la maquinaria para evitar emisiones por combustión incompleta. Estas medidas permitieron mantener niveles adecuados de calidad del aire y reducir posibles afectaciones a la comunidad y al entorno natural circundante.

En relación con la gestión integral de residuos sólidos, se aplicaron los principios de reducción en la fuente, segregación, almacenamiento temporal adecuado, aprovechamiento y disposición final controlada. Se verificó la correcta separación de residuos ordinarios y reciclables en puntos ecológicos señalizados y la entrega a gestores autorizados conforme a la normativa ambiental vigente. Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), fueron acopiados en zonas delimitadas, compactados y cubiertos para evitar dispersión, y posteriormente trasladados a sitios autorizados, garantizando trazabilidad y cumplimiento de las medidas establecidas en el PMA.

De manera complementaria, se desarrollaron jornadas de sensibilización ambiental dirigidas al personal operativo y administrativo, orientadas a fortalecer la cultura ambiental del proyecto y promover prácticas sostenibles en obra. Estas actividades incluyeron la promoción del uso eficiente del agua y la energía, el manejo adecuado de residuos, la prevención y atención oportuna de derrames de hidrocarburos, y la protección de los recursos naturales presentes en el área intervenida.

Se llevaron a cabo charlas técnicas y capacitaciones periódicas enfocadas en la prevención de impactos y la apropiación de buenas prácticas constructivas, consolidando un enfoque de mejora continua en el desempeño ambiental del proyecto. A continuación, se relacionan las charlas realizadas durante el periodo:

- Diferencia entre ecosistemas normales y ecosistemas sensibles
- Uso de residuos vegetales como cobertura
- Reconocer la fauna que habita la zona
- Campamentos limpios, trabajo seguro
- Los RCD no son un residuo cualquiera
- Residuos peligrosos: cuidado con lo que tocas
- Cada máquina tiene su operador
- Significado de las señales (preventivas, restrictivas, informativas)
- Importancia de controlar fugas y goteos en equipos y recipientes

Durante el periodo objeto de evaluación se verificó el suministro de 120 m³ de material tipo recebo, sin que se registrara ingreso de material pétreo adicional al proyecto. El material utilizado proviene de la Cantera La Fontana, explotación minera que cuenta con título y acto administrativo vigentes, otorgados mediante Resolución N.° 000379 de 2015 y Título Minero N.° KDD-15261, lo cual garantiza la legalidad de la fuente de abastecimiento, la trazabilidad del insumo y el cumplimiento de la normativa minera y ambiental aplicable a la extracción y comercialización de materiales de construcción.

El transporte del recebo se realizó conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), empleando volquetas en adecuado estado técnico y provistas de carpas de cobertura. Esta práctica permitió mitigar la dispersión de material particulado durante el traslado, controlar la generación de polvo en las vías de acceso y preservar la calidad del aire en el área de influencia del proyecto, reduciendo potenciales impactos sobre la comunidad y el entorno natural.

En relación con las condiciones operativas en campo, se constató que los frentes de obra cuentan con señalización ambiental y de seguridad instalada, la identificación de rutas de evacuación, la ubicación de zonas de acopio temporal de residuos y la señalización de puntos ecológicos. Estas medidas fortalecen la gestión preventiva, minimizan riesgos operacionales y contribuyen al control de impactos ambientales asociados a la actividad constructiva.

De igual manera, se verificó que las áreas destinadas al almacenamiento de materiales se encuentran debidamente delimitadas, organizadas y, cuando aplica, cubiertas, bajo supervisión permanente. Esta adecuada disposición logística favorece la eficiencia operativa, previene la contaminación del suelo y la posible afectación de cuerpos de agua por escorrentía o arrastre de sedimentos, y mantiene condiciones apropiadas de manejo ambiental y paisajístico dentro del área intervenida.

Se anexa la Inspección Ambiental Mensual, correspondiente al período comprendido entre el 15 de enero y el 14 de febrero de 2026, la cual actúa como soporte documental de las verificaciones realizadas y evidencia el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.

6.6 PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DE OBRA

Numero de acta parcial	Valor pagado	Fecha del acta
01	$1.294.188.501	05 de abril de 2024
02	$4.149.729.190	26 de junio de 2024
03	$1.748.096.680	24 de septiembre de 2024
04	$1.840.891.261	14 de noviembre de 2024
05	$1.748.096.680	13 de diciembre de 2024
06	$1.752.508.340	18 de marzo de 2025
07	$1.752.220.360,01	17 de junio de 2025

7 CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 14 de febrero de 2026, la Interventoría REINPRO S.A.S. ejecutó el seguimiento técnico integral al proyecto, orientado a verificar la conformidad de las actividades constructivas con los planos aprobados, las especificaciones técnicas particulares, el presupuesto contractual y el cronograma vigente, incluyendo los ajustes derivados del Otrosí N.° 3 del 1 de noviembre de 2024. Este proceso de supervisión permitió evaluar el desempeño físico de la obra, la calidad de los procedimientos constructivos y la eficiencia en la gestión técnica y administrativa implementada por el contratista.

El análisis consolidado del avance físico evidencia un comportamiento favorable, registrando un 96,08 % de ejecución acumulada frente al 81,55 % programado para la misma fecha de corte, lo que representa un adelantamiento significativo respecto a la línea base contractual. Este resultado refleja una adecuada planificación operativa, optimización de recursos humanos y equipos, así como un control permanente de las actividades en campo, manteniendo la obra dentro de los estándares de rendimiento, calidad y desempeño establecidos.

En el componente estructural, se desarrollaron actividades de corte, figurado y armado de acero de refuerzo para las losas superiores en el Afluente N.° 1, seguido del vaciado de concreto hidráulico con resistencia de diseño de 4.000 psi, garantizando el control de asentamiento, vibrado mecánico, curado y tolerancias geométricas conforme a las especificaciones técnicas. Adicionalmente, se ejecutó el suministro, instalación y anclaje de acero estructural para barandas, así como el vaciado de concreto de 3.000 psi en el tramo principal del Arroyo Platanal, asegurando la estabilidad estructural, funcionalidad y durabilidad de los elementos construidos.

De manera complementaria, se realizaron rellenos estructurales con material tipo recebo proveniente de fuente autorizada en los respaldos de los muros del tramo principal. Para el aseguramiento de la calidad, se ejecutaron ensayos de densidad in situ mediante el método del cono de arena, verificando el cumplimiento de los porcentajes mínimos de compactación exigidos por el diseño geotécnico. Igualmente, se efectuaron controles topográficos para validar cotas, espesores de capas y niveles proyectados. Los ensayos de resistencia a la compresión del concreto arrojaron resultados conformes con las resistencias de diseño, ratificando la calidad técnica del proceso constructivo.

En relación con las obras complementarias, se adelantaron excavaciones para la construcción de las cimentaciones del puente vehicular localizado en la abscisa K1+150 y del puente aéreo peatonal en la abscisa K1+547, ambos en el tramo principal del Arroyo Platanal.

Respecto al manejo de aguas superficiales, se implementaron medidas de control hidráulico consistentes en la instalación de barreras temporales, sistemas de entibación metálica y operación continua de motobombas para la evacuación de acumulaciones hídricas en los frentes de trabajo. Estas acciones garantizaron condiciones técnicas adecuadas para la ejecución segura y eficiente de las cimentaciones y estructuras proyectadas.

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la Interventoría verificó la aplicación del Programa de Gestión en Obra, incluyendo la correcta señalización preventiva, delimitación de áreas de riesgo, suministro y uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP), realización de inducciones y charlas de seguridad, inspecciones preoperacionales de equipos y control documental del personal. Se evidenció cumplimiento de los lineamientos legales y técnicos vigentes, asegurando condiciones seguras de trabajo y minimizando la probabilidad de incidentes.

Finalmente, en el componente ambiental, se constató la implementación efectiva del Plan de Manejo Ambiental (PMA), mediante la aplicación de medidas de prevención, mitigación y control de impactos. Se verificó el manejo adecuado de residuos sólidos, el control de emisiones y material particulado, así como la ejecución de actividades de sensibilización ambiental dirigidas al personal de obra, contribuyendo a la protección del entorno y al cumplimiento de las obligaciones ambientales del proyecto.

8 ANEXOS

ANEXO 1: Acta de seguimiento del contrato
ANEXO 2: Informes semanales
ANEXO 3: Registro fotográfico
ANEXO 4: Bitácora de obra
ANEXO 5: Inspección SST
ANEXO 6: Inspección social
ANEXO 7: Inspección Ambiental
ANEXO 8: Control y seguimiento de recursos de la obra
ANEXO 9: Planillas de seguridad social
ANEXO 10: Seguimiento de Calidad
ANEXO 11: Planos y carteras topográficas

ANEXO 1: ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

REINPRO SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		01	26/11/2021	17/08/2023

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
97	15 - ENE - 2026	8:20 am	9:25 am.	Soledad – Arroyo Platanal
Objeto de la reunión:	Seguimiento al contrato, avance de obra, cumplimiento de compromisos, estándares de calidad y seguridad en obra.			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.		***Contrato de Interventoría No.***	
Objeto del Contrato de obra	**Realizar la construcción de la canalización para la recuperación ambiental del arroyo platanal, ubicado en el municipio de soledad, departamento del atlántico**	***Objeto Contrato Interventoría***	**Interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto es: "Realizar la construcción de la canalización para la recuperación ambiental del arroyo platanal, ubicado en el municipio de soledad, departamento del atlántico"**
Contratista de obra	Consorcio Canalización el Platanal 2023	***Contratista de Interventoría***	Reingeniería de Proyectos SAS – REINPRO SAS

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Toma de detalles de calidad.	Contratista	14 - 01 - 2026	15 - 01 - 2026
2	en barandas.			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Powered by CamScanner

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245884-7	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		01	26/11/2021	17/08/2023

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
A la fecha se evidencia físicamente un avance del 94.22% VS 77.84% programado. sin incluir la ejecución de las mayores Cantidades de reconocimiento con un avance físico del 16.38%	Fecha: Descripción: Responsable:
• Se supervisa relleno de material de recebo K1+125 a K1+143. primera capa laterales de muro tramo principal ambos costados. • Se verifica armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de baranda K1+100 a K1+108 tramo principal ambos costados.	Fecha: Descripción: Responsable:
• Se inspecciona fundida de baranda en concreto K1+100 a K1+108 ambos costados tramo principal. • Se evidencia relleno de material de recebo K1+000 a K1+007 ultima capa laterales de muros. tramo principal ambos costados.	Fecha: Descripción: Responsable:
	Fecha: Descripción: Responsable:
	Fecha: Descripción: Descripción:

Powered by CamScanner

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Soledad a los 15 días del mes de Enero del 2026.

CONTRATISTA

Firma: YD
Nombre: YISETH BRANCO NEGRETE
Cargo: RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA

Firma: JA
Nombre: JORGE FONTALVO ALONSO
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

REINPRO SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		01	26/11/2021	17/08/2023

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
98	22 - ENE - 2026.	8:45am.	9:37 am	Soledad – Arroyo Platanal
Objeto de la reunión:	Seguimiento al contrato, avance de obra, cumplimiento de compromisos, estándares de calidad y seguridad en obra.			
INFORMACIÓN DE CONTRATOS				
Contrato de obra No.		***Contrato de Interventoría No.***		
Objeto del Contrato de obra	**Realizar la construcción de la canalización para la recuperación ambiental del arroyo platanal, ubicado en el municipio de soledad, departamento del atlántico**	***Objeto Contrato Interventoría***	**Interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto es: "Realizar la construcción de la canalización para la recuperación ambiental del arroyo platanal, ubicado en el municipio de soledad, departamento del atlántico"**	
Contratista de obra	Consorcio Canalización el Platanal 2023	***Contratista de Interventoría***	Reingeniería de Proyectos SAS – REINPRO SAS	

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Verificación de acero	Contratista	15 - 01 - 2026.	Cumpliendo
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Powered by CamScanner

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		01	26/11/2021	17/08/2023

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
A la fecha se evidencia físicamente un avance del 94.76% VS 78,67 programado sin incluir la ejecución de las mayores Cantidades de reconocimiento con un avance físico del 16.09%.	Fecha: Descripción: Responsable:
• Se verifica armado de acero de vigas intermedia, postamones y columnas de baandas K1+108 a K1+121 tramo principal ambos costados. • Se inspecciona fundida de baandas en concreto K1+108 a K1+121 ambos costados tramo principal.	Fecha: Descripción: Responsable:
• Se evidencia relleno de material de recebo. K1+039 a K1+047 ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados. Se verifica replanteo de baandas y anclajes de 1/2" para baandas en columnas K1+133 a	Fecha: Descripción: Responsable:
K1+143 ambos costados tramo principal.	Fecha: Descripción: Responsable:
	Fecha: Descripción: Descripción:

Powered by CamScanner

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Soledad a los 22 días del mes de Enero. del 2026.

CONTRATISTA

Firma: YB
Nombre: YISETH BRANCO NEGRETE
Cargo: RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA

Firma: JA
Nombre: JORGE FONTALVO ALONSO
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

REINPRO SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		01	26/11/2021	17/08/2023

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
99	29 - ENE - 2026.	8:16am.	9:33 am.	Soledad – Arroyo Platanal
Objeto de la reunión:	Seguimiento al contrato, avance de obra, cumplimiento de compromisos, estándares de calidad y seguridad en obra.			
INFORMACIÓN DE CONTRATOS				
Contrato de obra No.		***Contrato de Interventoría No.***		
Objeto del Contrato de obra	**Realizar la construcción de la canalización para la recuperación ambiental del arroyo platanal, ubicado en el municipio de soledad, departamento del atlántico**	***Objeto Contrato Interventoría***	**Interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto es: "Realizar la construcción de la canalización para la recuperación ambiental del arroyo platanal, ubicado en el municipio de soledad, departamento del atlántico"**	
Contratista de obra	Consorcio Canalización el Platanal 2023	***Contratista de Interventoría***	Reingeniería de Proyectos SAS – REINPRO SAS	

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Alineación y verticalidad	Contratista.	23-01-2026	Cumpliendo.
2	de los baiandas.			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Powered by CamScanner

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		01	26/11/2021	17/08/2023

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
A la fecha se evidencia fisicamente un. avance del 95.01% vs 79.50% progiomado. sin incluir la ejecución de las mayores Cantidades de reconocimiento con un avance. fisico del 15.51%.	Fecha: Descripción: Responsable:
• Se inspecciona fundida de losa superior K0+067 a K0+097 afluente A. • Se verifica fundida de bordones en concreto K1+133 a K1+143 ambos costados tramo principal.	Fecha: Descripción: Responsable:
• Se supervisa relleno de material de recebo K1+090 a K1+099 ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados. • Se inspecciona relleno de material de recebo K1+106 a K1+113 ultima capa laterales de muros	Fecha: Descripción: Responsable:
tramo principal ambos costados.	Fecha: Descripción: Responsable:
	Fecha: Descripción: Descripción:

Powered by CamScanner

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Soledad a los 29 días del mes de Enero. del 2026.

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: YISETH BRANCO NEGRETE
Cargo: RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: JORGE FONTALVO ALONSO
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		01	26/11/2021	17/08/2023

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
ADD.	05 - FEB - 2026.	8:52 am	9:48 am	Soledad – Arroyo Platanal
Objeto de la reunión:	Seguimiento al contrato, avance de obra, cumplimiento de compromisos, estándares de calidad y seguridad en obra.			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS			
Contrato de obra No.		*Contrato de Interventoría No.*	
Objeto del Contrato de obra	**Realizar la construcción de la canalización para la recuperación ambiental del arroyo platanal, ubicado en el municipio de soledad, departamento del atlántico**	*Objeto Contrato Interventoría*	**Interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto es: "Realizar la construcción de la canalización para la recuperación ambiental del arroyo platanal, ubicado en el municipio de soledad, departamento del atlántico"**
Contratista de obra	Consorcio Canalización el Platanal 2023	*Contratista de Interventoría*	Reingeniería de Proyectos SAS – REINPRO SAS

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR				
No.	**Descripción**	**Responsable**	**Fecha propuesta cumplimiento**	**Fecha Real cumplimiento**
1	Toma de Cilindros	Contratista	04/02/2026.	04/02/2026.
2	puente peatonal abs K0+642.			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Powered by CamScanner

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		01	26/11/2021	17/08/2023

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
A la fecha se evidencia fisicamente un avance del 95.49% VS 80.32% programado sin incluir la ejecución de los mayores Cantidades de reconocimiento con un avance físico del 15.17%.	Fecha: Descripción: Responsable:
• Se supervisa relleno de material de recebo K1+113 a K1+124 ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados. • Se verifica armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de bolardos K0+360 a K0+381 tramo principal ambos costados.	Fecha: Descripción: Responsable:
• Se evidencia Demolición de losa aéreo existente de puente K1+150 tramo principal. • Se inspecciona fundida en concreto de 4000 psi de puente peatonal abs K0+642 tramo principal.	Fecha: Descripción: Responsable:
	Fecha: Descripción: Responsable:
	Fecha: Descripción: Descripción:

Powered by CamScanner

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Soledad a los 5 días del mes de febrero del 2026.

CONTRATISTA

Firma: YD
Nombre: YISETH BRANCO NEGRETE
Cargo: RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA

Firma: JA
Nombre: JORGE FONTALVO ALONSO
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		01	26/11/2021	17/08/2023

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
101.	12 - FEB - 2026.	8:47am	9:54am	Soledad – Arroyo Platanal
Objeto de la reunión:	Seguimiento al contrato, avance de obra, cumplimiento de compromisos, estándares de calidad y seguridad en obra.			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.		*Contrato de Interventoría No.*	
Objeto del Contrato de obra	**Realizar la construcción de la canalización para la recuperación ambiental del arroyo platanal, ubicado en el municipio de soledad, departamento del atlántico**	*Objeto Contrato Interventoría*	**Interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto es: "Realizar la construcción de la canalización para la recuperación ambiental del arroyo platanal, ubicado en el municipio de soledad, departamento del atlántico"**
Contratista de obra	Consorcio Canalización el Platanal 2023	*Contratista de Interventoría*	Reingeniería de Proyectos SAS – REINPRO SAS

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Alineación y verticalidad	Contratista	05 - 01 - 2026	Cumpliendo
2	de las baiondas.			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Powered by CamScanner

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		01	26/11/2021	17/08/2023

TEMAS TRATADOS EN LA PRESENTE ACTA	COMPROMISOS
A la fecha se evidencia físicamente un avance del 96.02% VS 81.15% programado. sin incluir la ejecución de las mayores Cantidades de reconocimiento con un avance. físico del 14.87%.	Fecha: Descripción: Responsable:
• Se inspecciona fundida de bolardos en concreto KO+381 a KO+400 ambos costados tramo principal. • Se verifica replanteo de bolardos y anclajes de. 1/2" para bolardos en columnas KO+400 a KO+418 ambos costados tramo principal.	Fecha: Descripción: Responsable:
• Se evidencia excavación para puente vehicular K1+150 tramo principal. • Se evidencia excavación manual entre 1.1 mts a 1.6 mts de profundidad para zapatas de puente en concreto peatonal acero K1+547 tramo principal.	Fecha: Descripción: Responsable:
Lado izquierdo del canal.	Fecha: Descripción: Responsable:
	Fecha: Descripción: Descripción:

Powered by CamScanner

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Soledad a los 12 días del mes de Febrero. del 2026.

CONTRATISTA

Firma: YD
Nombre: YISETH BRANCO NEGRETE
Cargo: RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA

Firma: JA
Nombre: JORGE FONTALVO ALONSO
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ANEXO 2: INFORMES SEMANALES

REINPRO SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	15 DE ENERO DE 2026	**PERIODO No.**	122	DEL	**8/01/2026**	AL	**14/01/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SOLEDAD - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0289 DE 2023	CONTRATO No.:	0251 DE 2023
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	NOVENTA Y SEIS (96) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE SESENTA (60) MESES PARA LA ETAPA II
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	SEPTIEMBRE 14 DE 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	2,843	PLAZO ACTUALIZADO:	2,843
PLAZO TRANSCURRIDO:	853 EQUIVALE AL 30.00%	PLAZO TRANSCURRIDO:	853 EQUIVALE AL 30.00%
VALOR INICIAL :	$ 2,463,185,760.00	VALOR INICIAL :	$ 27,220,819,943.00
VALOR ADICION(ES):	$ 1,588,835,640.00	VALOR ADICION(ES):	$ 9,767,979,973.76
VALOR ACTUALIZADO:	$ 4,052,021,400.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 36,988,799,916.76
VALOR PAGADO:	$ 655,739,348.00	VALOR PAGADO:	$ 16,607,946,260.92
VALOR POR PAGAR:	$ 3,396,282,052.00	VALOR POR PAGAR:	$ 20,380,853,655.84
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	14/09/2023	14/09/2023	-
1	**ETAPA 1: CONSTRUCCION**	**14/09/2026**		
1.1	**REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**9/01/2024**	**30/01/2024**	
1.2	**CAPITULO 1: PRELIMINARES**	**1/06/2026**		
1.2.1	Localización, Trazado y Replanteo	1/06/2026	13/02/2024	-
1.2.2	Control Topográfico	1/05/2026		
1.3	**CAPITULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**1/05/2026**		
1.3.1	Excavación Mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua. (Incluye cargue en volqueta. No incluye transporte a sitio de disposición final)	2/04/2026		
1.3.2	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	1/05/2026		
1.3.3	Relleno con Material de Sitio	1/05/2026		
1.3.4	Relleno Compacto en Piedra Ciclópea.	4/03/2026		
1.3.5	Suministro e Instalación de Geotextil Tejido Propyweave T2400 o W315 o similar para separación de capas granulares y estabilización de suelos.	4/02/2026		
1.3.6	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.	2/04/2026		
1.3.7	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final menor de 5 kms.	2/04/2026		
1.3.8	Repaleo Interno con cargador hasta punto de acopio de cargue distancia hasta 200 mt.s	2/04/2026		
1.3.9	Excavación Manual en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua para nivelación de fondo o afinado de taludes. (Incluye cargue en volqueta)	4/03/2026		
1.3.10	Tablestacado de Protección H=3,00 m. (para el 30% del total de la longitud)	2/04/2026		
1.3.11	Pago de Derechos de botaderos	2/04/2026		
1.3.12	Extensión y Disposición de Material Sobrante	4/03/2026		
1.4	**CAPITULO III - OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION**	**26/08/2026**		
1.4.1	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60.	1/05/2026		
1.4.2	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para fondo de canal, incluye formaleteria.	1/06/2026		
1.4.3	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para muros de canal, incluye formaleteria.	29/06/2026		
1.4.4	Suministro y colocación de concreto para Solado de 2000 PSI.	1/05/2026		
1.4.5	Corte y Sello de Juntas Transversales.	28/07/2026		
1.4.6	Suministro e Instalación de Cinta PVC 0-22 o similar para juntas de construcción.	1/06/2026		
1.4.7	Barandas en Concreto de 3000 PSI de 0,20 m*0,20 m. (Columnas a 1,50 m, con Varillas de 1/2" 60.000 PSI. Estribos de 1/4" a 0,20 m)	26/08/2026		
1.4.8	Tubería de Ø2" para Lloradero de Muros	15/06/2026		
1.4.9	Andenes en Concreto espesor 10 cms.	1/05/2026		
1.4.10	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	4/03/2026		
1.4.11	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. (Para andenes 3/8" cada 0,30 mts ambos sentidos)	8/04/2026		
1.5	**CAPITULO IV - MANEJO DE AGUAS**	**26/06/2026**		
1.5.1	Manejo de Aguas	26/06/2026		
NP	**CAPITULO V - ITEMS NO PREVISTOS**	**14/09/2026**		
NP-01	Demolición de concreto simple y reforzado, no incluye retiro de material	14/09/2026		
NP-02	Rocería, limpieza y descapote de maleza, incluye retiro de material/basura a botadero	11/09/2026		
NP-03	Anclaje de 1/2"	26/08/2026		
NP-04	Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI dimensiones de 20cmx30cm para confinamiento de andenes, no incluye acero de	26/08/2026		
NP-05	Suministro y colocación de Concreto de 4000 PSI impermeabilizado para losa superior, incluye formaleta.	20/03/2025		
1.6	**CAPITULO VI - COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL**	**14/09/2026**		
1.6.1	**GESTION SOCIAL**	**12/03/2024**		
1.6.1.1	Campaña Radial	13/10/2023		
1.6.3	Reuniones Informativas con la Comunidad	12/03/2024	2/02/2024	
1.6.2	**EDUCACION AMBIENTAL**	**16/09/2024**	**17/05/2024**	
1.6.5	Inducción Ambiental a Comunidades	16/09/2024	17/05/2024	
1.6.6	Inducción Ambiental a Trabajadores	16/09/2024	17/05/2024	
1.6.3	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**28/02/2024**		
1.6.3.1	Socialización del Proyecto con Organismos y Autoridades	28/02/2024		
1.6.4	**GESTION AMBIENTAL**	**14/09/2026**		
1.6.4.1	**Manejo ambiental de los residuos líquidos**	**9/05/2024**	**6/03/2024**	
1.6.4.1.1	Canecas de 55 gal con tapa para almacenar residuos líquidos	9/05/2024	6/03/2024	
1.6.4.2	**Manejo ambiental de los residuos solidos**	**19/04/2025**	**24/04/2024**	
1.6.4.2.1	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	19/04/2025	24/04/2024	

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	15 DE ENERO DE 2026	PERIODO No.	122	DEL	8/01/2026	AL	14/01/2026

1.6.4.3	**Mitigación de impactos por tránsito vehicular**	**15/01/2025**	**29/02/2024**
1.6.4.3.1	Dispositivos para el control y manejo de tráfico en la obra (señales preventivas, reglamentarias e informativas)	15/01/2025	29/02/2024
1.6.4.4	**RECURSOS HUMANOS**	**14/09/2026**	
1.6.4.4.1	Recursos humanos para implementación del plan de manejo ambiental (Incluye: Profesional Ambiental, Profesional SST y	14/09/2026	
2	**ETAPA 2: MANTENIMIENTO**	**27/06/2031**	
2.1	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**	**27/06/2031**	
2.1.1	Limpieza de residuos sólidos sobre cauce	27/06/2031	
2.1.2	Revisión y Mantenimiento de Juntas	27/06/2031	
2.1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos Solidos	27/06/2031	
2.1.4	Pago de derechos de botadero	27/06/2031	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 1)	14/09/2026	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)	27/06/2031	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)	27/06/2031	

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 28,790,981,777.72	77.84%	16.38%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 32,213,660,659.53	94.22%	

Nota aclaratoria: Porcentaje de avance obra fisica correspondiente al 94.22% equivalente a $32.213.660.659,53; adicionalmente se tiene ejecutado en acta de mayores cantidades un valor acumulado de $4.911.796.504. En resumen, se lleva un valor acumulado total de $37.125.457.163,64 correspondiente a la obra fisica ejecutada + acta de reconocimiento de mayores cantidades ejecutado.

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 Se observan en obra tuberías de agua potable en el lecho del arroyo.
3.2 Vertimientos de aguas residuales constantes al cauce del arroyo

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Continuar con la limpieza general durante toda la semana, debido que se observa muchos acopios de RCD apilados	Contratista e Interventoría	14/01/2026
Implementar Acciones para el control y retiro de basuras.	Contratista e Interventoría	14/01/2026

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se realizaron las actividades con normalidad. Se continuo con la ejecución de las actividades constructivas en el tramo principal del arroyo. Se continuó con el retiro de RCD, residuos sólidos y sedimentos. En terminos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista de obra: Replanteo anclajes armado de acero y fundida de barandas, Relleno de material de recebo, Limpieza de canal, Armado acero de refuerzo y fundida en concreto losa superior de canal, Repaleo interno con minicargador; control topográfico y técnico correspondiente a las cantidades de obra ejecutadas, especificaciones y planos de diseños.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 08 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Relleno de material de recebo K1+125 a K1+143 Primera capa laterales de muro tramo principal ambos costados.Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+150 a K0+232 Afluente 2.Armado acero de refuerzo de losa superior K0+070 a K0+080 Afluente 1.

Viernes 09 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Relleno de material de recebo K0+880 a K0+886 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.Armado acero de refuerzo de losa superior K0+080 a K0+091 Afluente 1.

Sábado 10 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Replanteo de barandas y anclajes de 1/2" para barandas en columnas K1+100 K1+108 ambos costados tramo principal. Relleno de material de recebo K0+886 a K0+895 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.Armado acero de refuerzo de losa superior K0+091 a K0+097 Afluente 1.

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	15 DE ENERO DE 2026	**PERIODO No.**	122	DEL	**8/01/2026**	AL	**14/01/2026**

Domingo 11 de Enero, no se programaron actividades constructivas.

Lunes 12 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de barandas K1+100 a K1+108 tramo principal ambos costados. Relleno de material de recebo K0+895 a K0+906 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.Fundida de losa superior K0+007 a K0+037 Afluente 1.

Martes 13 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Fundida de barandas en concreto K1+100 a K1+108 ambos costados tramo principal. Relleno de material de recebo K0+906 a K1+000 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+000 a K0+056 Afluente 3.Corte de losa superior K0+007 a K0+037 Afluente 1.

Miércoles 14 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Replanteo de barandas y anclajes de 1/2" para barandas en columnas K1+108 K1+121 ambos costados tramo principal. Relleno de material de recebo K1+000 a K1+007 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+056 a K0+120 Afluente 3.

En resumen, el contratista alcanzó un avance obra fisica del 94,22%, realizando actividades de anclajes armado de acero de refuerzo y fundida de barandas, Relleno de material de recebo, Limpieza de canal, armado acero de refuerzo y fundida de losa superior de canal, Repaleo interno con minicargador.



Fundida de barandas en concreto K1+100 a K1+108 ambos costados tramo principal.



Armado acero de refuerzo de losa superior K0+070 a K0+080 Afluente 1.



Armado acero de refuerzo de losa superior K0+070 a K0+080 Afluente 1.



Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+000 a K0+056 Afluente 3.



Fundida de losa superior K0+007 a K0+037 Afluente 1.



Armado acero de refuerzo de losa superior K0+080 a K0+091 Afluente 1.

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA

REINPRO SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	22 DE ENERO DE 2026	PERIODO No.	123	DEL	15/01/2026	AL	21/01/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SOLEDAD - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	0289 DE 2023	CONTRATO No.:	0251 DE 2023
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	NOVENTA Y SEIS (96) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE SESENTA (60) MESES PARA LA ETAPA II
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	SEPTIEMBRE 14 DE 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	2,843	PLAZO ACTUALIZADO:	2,843
PLAZO TRANSCURRIDO:	860 EQUIVALE AL 30.25%	PLAZO TRANSCURRIDO:	860 EQUIVALE AL 30.25%
VALOR INICIAL :	$ 2,463,185,760.00	VALOR INICIAL :	$ 27,220,819,943.00
VALOR ADICION(ES):	$ 1,588,835,640.00	VALOR ADICION(ES):	$ 9,767,979,973.76
VALOR ACTUALIZADO:	$ 4,052,021,400.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 36,988,799,916.76
VALOR PAGADO:	$ 655,739,348.00	VALOR PAGADO:	$ 16,607,946,260.92
VALOR POR PAGAR:	$ 3,396,282,052.00	VALOR POR PAGAR:	$ 20,380,853,655.84
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	14/09/2023	14/09/2023	-
1	**ETAPA 1: CONSTRUCCION**	**14/09/2026**		
1.1	**REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**9/01/2024**	**30/01/2024**	
1.2	**CAPITULO 1: PRELIMINARES**	**1/06/2026**		
1.2.1	Localización, Trazado y Replanteo	1/06/2026	13/02/2024	-
1.2.2	Control Topográfico	1/05/2026		
1.3	**CAPITULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**1/05/2026**		
1.3.1	Excavación Mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua. (Incluye cargue en volqueta. No incluye transporte a sitio de disposición final)	2/04/2026		
1.3.2	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	1/05/2026		
1.3.3	Relleno con Material de Sitio	1/05/2026		
1.3.4	Relleno Compacto en Piedra Ciclópea.	4/03/2026		
1.3.5	Suministro e Instalación de Geotextil Tejido Propyweave T2400 o W315 o similar para separación de capas granulares y estabilización de suelos.	4/02/2026		
1.3.6	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.	2/04/2026		
1.3.7	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final menor de 5 kms.	2/04/2026		
1.3.8	Repaleo Interno con cargador hasta punto de acopio de cargue distancia hasta 200 mt.s	2/04/2026		
1.3.9	Excavación Manual en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua para nivelación de fondo o afinado de taludes. (Incluye cargue en volqueta)	4/03/2026		
1.3.10	Tablestacado de Protección H=3,00 m. (para el 30% del total de la longitud)	2/04/2026		
1.3.11	Pago de Derechos de botaderos	2/04/2026		
1.3.12	Extensión y Disposición de Material Sobrante	4/03/2026		
1.4	**CAPITULO III - OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION**	**26/08/2026**		
1.4.1	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60.	1/05/2026		
1.4.2	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para fondo de canal, incluye formaleteria.	1/06/2026		
1.4.3	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para muros de canal, incluye formaleteria.	29/06/2026		
1.4.4	Suministro y colocación de concreto para Solado de 2000 PSI.	1/05/2026		
1.4.5	Corte y Sello de Juntas Transversales.	28/07/2026		
1.4.6	Suministro e Instalación de Cinta PVC 0-22 o similar para juntas de construcción.	1/06/2026		
1.4.7	Barandas en Concreto de 3000 PSI de 0,20 m*0,20 m. (Columnas a 1,50 m, con Varillas de 1/2" 60.000 PSI. Estribos de 1/4" a 0,20 m)	26/08/2026		
1.4.8	Tubería de Ø2" para Lloradero de Muros	15/06/2026		
1.4.9	Andenes en Concreto espesor 10 cms.	1/05/2026		
1.4.10	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	4/03/2026		
1.4.11	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. (Para andenes 3/8" cada 0,30 mts ambos sentidos)	8/04/2026		
1.5	**CAPITULO IV - MANEJO DE AGUAS**	**26/06/2026**		
1.5.1	Manejo de Aguas	26/06/2026		
NP	**CAPITULO V - ITEMS NO PREVISTOS**	**14/09/2026**		
NP-01	Demolición de concreto simple y reforzado, no incluye retiro de material	14/09/2026		
NP-02	Rocería, limpieza y descapote de maleza, incluye retiro de material/basura a botadero	11/09/2026		
NP-03	Anclaje de 1/2"	26/08/2026		
NP-04	Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI dimensiones de 20cmx30cm para confinamiento de andenes, no incluye acero de	26/08/2026		
NP-05	Suministro y colocación de Concreto de 4000 PSI impermeabilizado para losa superior, incluye formaleta.	20/03/2025		
1.6	**CAPITULO VI - COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL**	**14/09/2026**		
1.6.1	**GESTION SOCIAL**	**12/03/2024**		
1.6.1.1	Campaña Radial	13/10/2023		
1.6.3	Reuniones Informativas con la Comunidad	12/03/2024	2/02/2024	
1.6.2	**EDUCACION AMBIENTAL**	**16/09/2024**	**17/05/2024**	
1.6.5	Inducción Ambiental a Comunidades	16/09/2024	17/05/2024	
1.6.6	Inducción Ambiental a Trabajadores	16/09/2024	17/05/2024	
1.6.3	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**28/02/2024**		
1.6.3.1	Socialización del Proyecto con Organismos y Autoridades	28/02/2024		
1.6.4	**GESTION AMBIENTAL**	**14/09/2026**		
1.6.4.1	**Manejo ambiental de los residuos líquidos**	**9/05/2024**	**6/03/2024**	
1.6.4.1.1	Canecas de 55 gal con tapa para almacenar residuos líquidos	9/05/2024	6/03/2024	
1.6.4.2	**Manejo ambiental de los residuos solidos**	**19/04/2025**	**24/04/2024**	
1.6.4.2.1	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	19/04/2025	24/04/2024	

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	22 DE ENERO DE 2026	PERIODO No.	123	DEL	15/01/2026	AL	21/01/2026

1.6.4.3	**Mitigación de impactos por tránsito vehicular**	**15/01/2025**	**29/02/2024**	
1.6.4.3.1	Dispositivos para el control y manejo de tráfico en la obra (señales preventivas, reglamentarias e informativas)	15/01/2025	29/02/2024	
1.6.4.4	**RECURSOS HUMANOS**	**14/09/2026**		
1.6.4.4.1	Recursos humanos para implementación del plan de manejo ambiental (Incluye: Profesional Ambiental, Profesional SST y	14/09/2026		
2	**ETAPA 2: MANTENIMIENTO**	**27/06/2031**		
2.1	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**	**27/06/2031**		
2.1.1	Limpieza de residuos sólidos sobre cauce	27/06/2031		
2.1.2	Revisión y Mantenimiento de Juntas	27/06/2031		
2.1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos Solidos	27/06/2031		
2.1.4	Pago de derechos de botadero	27/06/2031		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 1)	14/09/2026		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)	27/06/2031		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)	27/06/2031		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 29,097,377,088.19	78.67%	16.09%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 32,398,285,757.77	94.76%	

Nota aclaratoria: Porcentaje de avance obra fisica correspondiente al 94.76% equivalente a $32.398.285.755,77; adicionalmente se tiene ejecutado en acta de mayores cantidades un valor acumulado de $4.911.796.504. En resumen, se lleva un valor acumulado total de $37.310.082.261,88 correspondiente a la obra fisica ejecutada + acta de reconocimiento de mayores cantidades ejecutado.

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 Se observan en obra tuberías de agua potable en el lecho del arroyo.
3.2 Vertimientos de aguas residuales constantes al cauce del arroyo

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Continuar con la limpieza general durante toda la semana, debido que se observa muchos acopios de RCD apilados	Contratista e Interventoría	21/01/2026
Implementar Acciones para el control y retiro de basuras.	Contratista e Interventoría	21/01/2026

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se realizaron las actividades con normalidad. Se continuo con la ejecución de las actividades constructivas en el tramo principal del arroyo. Se continuó con el retiro de RCD, residuos sólidos y sedimentos. En terminos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista de obra: Replanteo anclajes armado de acero y fundida de barandas, Relleno de material de recebo, Limpieza de canal, fundida en concreto losa superior de canal, Corte y sello de juntas, Repaleo interno con minicargador; control topográfico y técnico correspondiente a las cantidades de obra ejecutadas, especificaciones y planos de diseños.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 15 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de barandas K1+108 a K1+121 tramo principal ambos costados. Relleno de material de recebo K1+007 a K1+015 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.

Viernes 16 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Fundida de barandas en concreto K1+108 a K1+121 ambos costados tramo principal. Relleno de material de recebo K1+015 a K1+024 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.Fundida de losa superior K0+037 a K0+067 Afluente 1.

Sábado 17 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Replanteo de barandas y anclajes de 1/2" para barandas en columnas K1+121 K1+133 ambos costados tramo principal. Relleno de material de recebo K1+024 a K1+030 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.Corte de losa superior K0+037 a K0+067 Afluente 1.

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	22 DE ENERO DE 2026	PERIODO No.	123	DEL	15/01/2026	AL	21/01/2026

Domingo 18 de Enero, no se programaron actividades constructivas.

Lunes 19 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de barandas K1+121 a K1+133 tramo principal ambos costados. Relleno de material de recebo K1+030 a K1+039 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+103 a K0+180 Afluente 1.

Martes 20 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Fundida de barandas en concreto K1+121 a K1+133 ambos costados tramo principal. Relleno de material de recebo K1+039 a K1+047 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+103 a K0+050 Afluente 1.

Miércoles 21 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Replanteo de barandas y anclajes de 1/2" para barandas en columnas K1+133 K1+143 ambos costados tramo principal. Relleno de material de recebo K1+047 a K1+054 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.

En resumen, el contratista alcanzó un avance obra fisica del 94,76%, realizando actividades de anclajes armado de acero de refuerzo y fundida de barandas, Relleno de material de recebo, Limpieza de canal, fundida de losa superior de canal, Corte y sello de juntas, Repaleo interno con minicargador.



Fundida de barandas en concreto K1+121 a K1+133 ambos costados tramo principal.



Fundida de losa superior K0+037 a K0+067 Afluente 1.



Fundida de losa superior K0+037 a K0+067 Afluente 1.



Corte de losa superior K0+037 a K0+067 Afluente 1.



Fundida de barandas en concreto K1+108 a K1+121 ambos costados tramo principal.



Fundida de losa superior K0+037 a K0+067 Afluente 1.

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA

REINPRO SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	29 DE ENERO DE 2026	PERIODO No.	124	DEL	22/01/2026	AL	28/01/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SOLEDAD - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	0289 DE 2023	CONTRATO No.:	0251 DE 2023
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	NOVENTA Y SEIS (96) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE SESENTA (60) MESES PARA LA ETAPA II
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	SEPTIEMBRE 14 DE 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	2,843	PLAZO ACTUALIZADO:	2,843
PLAZO TRANSCURRIDO:	867 EQUIVALE AL 30.50%	PLAZO TRANSCURRIDO:	867 EQUIVALE AL 30.50%
VALOR INICIAL :	$ 2,463,185,760.00	VALOR INICIAL :	$ 27,220,819,943.00
VALOR ADICION(ES):	$ 1,588,835,640.00	VALOR ADICION(ES):	$ 9,767,979,973.76
VALOR ACTUALIZADO:	$ 4,052,021,400.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 36,988,799,916.76
VALOR PAGADO:	$ 655,739,348.00	VALOR PAGADO:	$ 16,607,946,260.92
VALOR POR PAGAR:	$ 3,396,282,052.00	VALOR POR PAGAR:	$ 20,380,853,655.84
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	14/09/2023	14/09/2023	-
1	**ETAPA 1: CONSTRUCCION**	**14/09/2026**		
1.1	**REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**9/01/2024**	**30/01/2024**	
1.2	**CAPITULO 1: PRELIMINARES**	**1/06/2026**		
1.2.1	Localización, Trazado y Replanteo	1/06/2026	13/02/2024	-
1.2.2	Control Topográfico	1/05/2026		
1.3	**CAPITULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**1/05/2026**		
1.3.1	Excavación Mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua. (Incluye cargue en volqueta. No incluye transporte a sitio de disposición final)	2/04/2026		
1.3.2	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	1/05/2026		
1.3.3	Relleno con Material de Sitio	1/05/2026		
1.3.4	Relleno Compacto en Piedra Ciclópea.	4/03/2026		
1.3.5	Suministro e Instalación de Geotextil Tejido Propyweave T2400 o W315 o similar para separación de capas granulares y estabilización de suelos.	4/02/2026		
1.3.6	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.	2/04/2026		
1.3.7	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final menor de 5 kms.	2/04/2026		
1.3.8	Repaleo Interno con cargador hasta punto de acopio de cargue distancia hasta 200 mt.s	2/04/2026		
1.3.9	Excavación Manual en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua para nivelación de fondo o afinado de taludes. (Incluye cargue en volqueta)	4/03/2026		
1.3.10	Tablestacado de Protección H=3,00 m. (para el 30% del total de la longitud)	2/04/2026		
1.3.11	Pago de Derechos de botaderos	2/04/2026		
1.3.12	Extensión y Disposición de Material Sobrante	4/03/2026		
1.4	**CAPITULO III - OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION**	**26/08/2026**		
1.4.1	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60.	1/05/2026		
1.4.2	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para fondo de canal, incluye formaleteria.	1/06/2026		
1.4.3	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para muros de canal, incluye formaleteria.	29/06/2026		
1.4.4	Suministro y colocación de concreto para Solado de 2000 PSI.	1/05/2026		
1.4.5	Corte y Sello de Juntas Transversales.	28/07/2026		
1.4.6	Suministro e Instalación de Cinta PVC 0-22 o similar para juntas de construcción.	1/06/2026		
1.4.7	Barandas en Concreto de 3000 PSI de 0,20 m*0,20 m. (Columnas a 1,50 m, con Varillas de 1/2" 60.000 PSI. Estribos de 1/4" a 0,20 m)	26/08/2026		
1.4.8	Tubería de Ø2" para Lloradero de Muros	15/06/2026		
1.4.9	Andenes en Concreto espesor 10 cms.	1/05/2026		
1.4.10	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	4/03/2026		
1.4.11	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. (Para andenes 3/8" cada 0,30 mts ambos sentidos)	8/04/2026		
1.5	**CAPITULO IV - MANEJO DE AGUAS**	**26/06/2026**		
1.5.1	Manejo de Aguas	26/06/2026		
NP	**CAPITULO V - ITEMS NO PREVISTOS**	**14/09/2026**		
NP-01	Demolición de concreto simple y reforzado, no incluye retiro de material	14/09/2026		
NP-02	Rocería, limpieza y descapote de maleza, incluye retiro de material/basura a botadero	11/09/2026		
NP-03	Anclaje de 1/2"	26/08/2026		
NP-04	Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI dimensiones de 20cmx30cm para confinamiento de andenes, no incluye acero de	26/08/2026		
NP-05	Suministro y colocación de Concreto de 4000 PSI impermeabilizado para losa superior, incluye formaleta.	20/03/2025		
1.6	**CAPITULO VI - COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL**	**14/09/2026**		
1.6.1	**GESTION SOCIAL**	**12/03/2024**		
1.6.1.1	Campaña Radial	13/10/2023		
1.6.3	Reuniones Informativas con la Comunidad	12/03/2024	2/02/2024	
1.6.2	**EDUCACION AMBIENTAL**	**16/09/2024**	**17/05/2024**	
1.6.5	Inducción Ambiental a Comunidades	16/09/2024	17/05/2024	
1.6.6	Inducción Ambiental a Trabajadores	16/09/2024	17/05/2024	
1.6.3	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**28/02/2024**		
1.6.3.1	Socialización del Proyecto con Organismos y Autoridades	28/02/2024		
1.6.4	**GESTION AMBIENTAL**	**14/09/2026**		
1.6.4.1	**Manejo ambiental de los residuos líquidos**	**9/05/2024**	**6/03/2024**	
1.6.4.1.1	Canecas de 55 gal con tapa para almacenar residuos líquidos	9/05/2024	6/03/2024	
1.6.4.2	**Manejo ambiental de los residuos solidos**	**19/04/2025**	**24/04/2024**	
1.6.4.2.1	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	19/04/2025	24/04/2024	

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2020-11-24**

FECHA	29 DE ENERO DE 2026	**PERIODO No.**	124	DEL	**22/01/2026**	AL	**28/01/2026**

1.6.4.3	**Mitigación de impactos por tránsito vehicular**	**15/01/2025**	**29/02/2024**	
1.6.4.3.1	Dispositivos para el control y manejo de tráfico en la obra (señales preventivas, reglamentarias e informativas)	15/01/2025	29/02/2024	
1.6.4.4	**RECURSOS HUMANOS**	**14/09/2026**		
1.6.4.4.1	Recursos humanos para implementación del plan de manejo ambiental (Incluye: Profesional Ambiental, Profesional SST y	14/09/2026		
2	**ETAPA 2: MANTENIMIENTO**	**27/06/2031**		
2.1	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**	**27/06/2031**		
2.1.1	Limpieza de residuos sólidos sobre cauce	27/06/2031		
2.1.2	Revisión y Mantenimiento de Juntas	27/06/2031		
2.1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos Solidos	27/06/2031		
2.1.4	Pago de derechos de botadero	27/06/2031		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 1)	14/09/2026		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)	27/06/2031		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)	27/06/2031		

No.	**INDICADORES**	**VALORES**	**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO**
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 29,403,772,398.66	79.50%	15.51%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 32,483,760,340.29	95.01%	

Nota aclaratoria: Porcentaje de avance obra fisica correspondiente al 95.01% equivalente a $32.483.760.340,29; adicionalmente se tiene ejecutado en acta de mayores cantidades un valor acumulado de $4.911.796.504. En resumen, se lleva un valor acumulado total de $37.395.556.844,39 correspondiente a la obra fisica ejecutada + acta de reconocimiento de mayores cantidades ejecutado.

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 Se observan en obra tuberías de agua potable en el lecho del arroyo.
3.2 Vertimientos de aguas residuales constantes al cauce del arroyo

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
Continuar con la limpieza general durante toda la semana, debido que se observa muchos acopios de RCD apilados	Contratista e Interventoría	28/01/2026
Implementar Acciones para el control y retiro de basuras.	Contratista e Interventoría	28/01/2026

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se realizaron las actividades con normalidad. Se continuo con la ejecución de las actividades constructivas en el tramo principal del arroyo. Se continuó con el retiro de RCD, residuos sólidos y sedimentos. En terminos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista de obra: R armado de acero y fundida de barandas, Relleno de material de recebo, fundida en concreto losa superior de canal, Corte y sello de juntas, Repaleo interno con minicargador; control topográfico y técnico correspondiente a las cantidades de obra ejecutadas, especificaciones y planos de diseños.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 22 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de barandas K1+133 a K1+143 tramo principal ambos costados. Relleno de material de recebo K1+054 a K1+064 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.Fundida de losa superior K0+067 a K0+097 Afluente 1. Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+050 a K0+000 Afluente 1.

Viernes 23 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Fundida de barandas en concreto K1+133 a K1+143 ambos costados tramo principal. Relleno de material de recebo K1+064 a K1+073 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.Corte de losa superior K0+067 a K0+097 Afluente 1.

Sábado 24 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Relleno de material de recebo K1+073 a K1+090 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	29 DE ENERO DE 2026	**PERIODO No.**	124	DEL	**22/01/2026**	AL	**28/01/2026**

Domingo 25 de Enero, no se programaron actividades constructivas.

Lunes 26 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Relleno de material de recebo K1+090 a K1+099 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.

Martes 27 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Relleno de material de recebo K1+099 a K1+106 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.

Miércoles 28 de Enero, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Relleno de material de recebo K1+106 a K1+113 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.

En resumen, el contratista alcanzó un avance obra fisica del 95,01%, realizando actividades de armado de acero de refuerzo y fundida de barandas, Relleno de material de recebo, fundida de losa superior de canal, Corte y sello de juntas, Repaleo interno con minicargador.



Fundida de barandas en concreto K1+133 a K1+143 ambos costados tramo principal.



Fundida de losa superior K0+067 a K0+097 Afluente 1.



Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+050 a K0+000 Afluente 1.



Corte de losa superior K0+067 a K0+097 Afluente 1.



Fundida de losa superior K0+067 a K0+097 Afluente 1.



Fundida de barandas en concreto K1+133 a K1+143 ambos costados tramo principal.

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA

REINPRO SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	05 DE FEBRERO DE 2026	PERIODO No.	125	DEL	29/01/2026	AL	4/02/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SOLEDAD - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	0289 DE 2023	CONTRATO No.:	0251 DE 2023
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	NOVENTA Y SEIS (96) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE SESENTA (60) MESES PARA LA ETAPA II
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	SEPTIEMBRE 14 DE 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	2,843	PLAZO ACTUALIZADO:	2,843
PLAZO TRANSCURRIDO:	874 EQUIVALE AL 30.74%	PLAZO TRANSCURRIDO:	874 EQUIVALE AL 30.74%
VALOR INICIAL :	$ 2,463,185,760.00	VALOR INICIAL :	$ 27,220,819,943.00
VALOR ADICION(ES):	$ 1,588,835,640.00	VALOR ADICION(ES):	$ 9,767,979,973.76
VALOR ACTUALIZADO:	$ 4,052,021,400.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 36,988,799,916.76
VALOR PAGADO:	$ 655,739,348.00	VALOR PAGADO:	$ 16,607,946,260.92
VALOR POR PAGAR:	$ 3,396,282,052.00	VALOR POR PAGAR:	$ 20,380,853,655.84
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	14/09/2023	14/09/2023	-
1	**ETAPA 1: CONSTRUCCION**	**14/09/2026**		
1.1	**REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**9/01/2024**	**30/01/2024**	
1.2	**CAPITULO 1: PRELIMINARES**	**1/06/2026**		
1.2.1	Localización, Trazado y Replanteo	1/06/2026	13/02/2024	-
1.2.2	Control Topográfico	1/05/2026		
1.3	**CAPITULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**1/05/2026**		
1.3.1	Excavación Mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua. (Incluye cargue en volqueta. No incluye transporte a sitio de disposición final)	2/04/2026		
1.3.2	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	1/05/2026		
1.3.3	Relleno con Material de Sitio	1/05/2026		
1.3.4	Relleno Compacto en Piedra Ciclópea.	4/03/2026		
1.3.5	Suministro e Instalación de Geotextil Tejido Propyweave T2400 o W315 o similar para separación de capas granulares y estabilización de suelos.	4/02/2026		
1.3.6	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.	2/04/2026		
1.3.7	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final menor de 5 kms.	2/04/2026		
1.3.8	Repaleo Interno con cargador hasta punto de acopio de cargue distancia hasta 200 mt.s	2/04/2026		
1.3.9	Excavación Manual en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua para nivelación de fondo o afinado de taludes. (Incluye cargue en volqueta)	4/03/2026		
1.3.10	Tablestacado de Protección H=3,00 m. (para el 30% del total de la longitud)	2/04/2026		
1.3.11	Pago de Derechos de botaderos	2/04/2026		
1.3.12	Extensión y Disposición de Material Sobrante	4/03/2026		
1.4	**CAPITULO III - OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION**	**26/08/2026**		
1.4.1	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60.	1/05/2026		
1.4.2	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para fondo de canal, incluye formaleteria.	1/06/2026		
1.4.3	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para muros de canal, incluye formaleteria.	29/06/2026		
1.4.4	Suministro y colocación de concreto para Solado de 2000 PSI.	1/05/2026		
1.4.5	Corte y Sello de Juntas Transversales.	28/07/2026		
1.4.6	Suministro e Instalación de Cinta PVC 0-22 o similar para juntas de construcción.	1/06/2026		
1.4.7	Barandas en Concreto de 3000 PSI de 0,20 m*0,20 m. (Columnas a 1,50 m, con Varillas de 1/2" 60.000 PSI. Estribos de 1/4" a 0,20 m)	26/08/2026		
1.4.8	Tubería de Ø2" para Lloradero de Muros	15/06/2026		
1.4.9	Andenes en Concreto espesor 10 cms.	1/05/2026		
1.4.10	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	4/03/2026		
1.4.11	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. (Para andenes 3/8" cada 0,30 mts ambos sentidos)	8/04/2026		
1.5	**CAPITULO IV - MANEJO DE AGUAS**	**26/06/2026**		
1.5.1	Manejo de Aguas	26/06/2026		
NP	**CAPITULO V - ITEMS NO PREVISTOS**	**14/09/2026**		
NP-01	Demolición de concreto simple y reforzado, no incluye retiro de material	14/09/2026		
NP-02	Rocería, limpieza y descapote de maleza, incluye retiro de material/basura a botadero	11/09/2026		
NP-03	Anclaje de 1/2"	26/08/2026		
NP-04	Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI dimensiones de 20cmx30cm para confinamiento de andenes, no incluye acero de	26/08/2026		
NP-05	Suministro y colocación de Concreto de 4000 PSI impermeabilizado para losa superior, incluye formaleta.	20/03/2025		
1.6	**CAPITULO VI - COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL**	**14/09/2026**		
1.6.1	**GESTION SOCIAL**	**12/03/2024**		
1.6.1.1	Campaña Radial	13/10/2023		
1.6.3	Reuniones Informativas con la Comunidad	12/03/2024	2/02/2024	
1.6.2	**EDUCACION AMBIENTAL**	**16/09/2024**	**17/05/2024**	
1.6.5	Inducción Ambiental a Comunidades	16/09/2024	17/05/2024	
1.6.6	Inducción Ambiental a Trabajadores	16/09/2024	17/05/2024	
1.6.3	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**28/02/2024**		
1.6.3.1	Socialización del Proyecto con Organismos y Autoridades	28/02/2024		
1.6.4	**GESTION AMBIENTAL**	**14/09/2026**		
1.6.4.1	**Manejo ambiental de los residuos líquidos**	**9/05/2024**	**6/03/2024**	
1.6.4.1.1	Canecas de 55 gal con tapa para almacenar residuos líquidos	9/05/2024	6/03/2024	
1.6.4.2	**Manejo ambiental de los residuos solidos**	**19/04/2025**	**24/04/2024**	
1.6.4.2.1	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	19/04/2025	24/04/2024	

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	05 DE FEBRERO DE 2026	PERIODO No.	125	DEL	29/01/2026	AL	4/02/2026

1.6.4.3	**Mitigación de impactos por tránsito vehicular**	**15/01/2025**	**29/02/2024**
1.6.4.3.1	Dispositivos para el control y manejo de tráfico en la obra (señales preventivas, reglamentarias e informativas)	15/01/2025	29/02/2024
1.6.4.4	**RECURSOS HUMANOS**	**14/09/2026**	
1.6.4.4.1	Recursos humanos para implementación del plan de manejo ambiental (Incluye: Profesional Ambiental, Profesional SST y	14/09/2026	
2	**ETAPA 2: MANTENIMIENTO**	**27/06/2031**	
2.1	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**	**27/06/2031**	
2.1.1	Limpieza de residuos sólidos sobre cauce	27/06/2031	
2.1.2	Revisión y Mantenimiento de Juntas	27/06/2031	
2.1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos Solidos	27/06/2031	
2.1.4	Pago de derechos de botadero	27/06/2031	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 1)	14/09/2026	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)	27/06/2031	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)	27/06/2031	

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 29,710,167,709.13	80.32%	15.17%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 32,647,871,538.72	95.49%	

Nota aclaratoria: Porcentaje de avance obra fisica correspondiente al 95.49% equivalente a $32.647.871.538,72; adicionalmente se tiene ejecutado en acta de mayores cantidades un valor acumulado de $4.911.796.504. En resumen, se lleva un valor acumulado total de $37.559.668.042,83 correspondiente a la obra fisica ejecutada + acta de reconocimiento de mayores cantidades ejecutado.

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 Se observan en obra tuberías de agua potable en el lecho del arroyo.
3.2 Vertimientos de aguas residuales constantes al cauce del arroyo

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Continuar con la limpieza general durante toda la semana, debido que se observa muchos acopios de RCD apilados	Contratista e Interventoría	4/02/2026
Implementar Acciones para el control y retiro de basuras.	Contratista e Interventoría	4/02/2026

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se realizaron las actividades con normalidad. Se continuo con la ejecución de las actividades constructivas en el tramo principal del arroyo. Se continuó con el retiro de RCD, residuos sólidos y sedimentos. En terminos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista de obra: Relleno de material de recebo, Limpieza de canal, Anclaje, armado de acero y fundida de barandas en concreto, construcicion de puente peatonal en concreto, Repaleo interno con minicargador; control topográfico y técnico correspondiente a las cantidades de obra ejecutadas, especificaciones y planos de diseños.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 29 de Enero, supervisión, verificación y control de las siguientes actividades: Relleno de material de recebo K1+113 a K1+124 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados. Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+000 a K0+120 Afluente 1.

Viernes 30 de Enero, supervisión, verificación y control de las siguientes actividades: Replanteo de barandas y anclajes de 1/2" para barandas en columnas K0+360 K0+381 ambos costados tramo principal. Relleno de material de recebo K1+124 a K1+137 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.

Sábado 31 de Enero, supervisión, verificación y control de las siguientes actividades: Armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de barandas K0+360 a K0+381 tramo principal ambos costados. Relleno de material de recebo K1+137 a K1+143 Ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	05 DE FEBRERO DE 2026	**PERIODO No.**	125	DEL	**29/01/2026**	AL	**4/02/2026**

Domingo 01 de Febrero, no se programaron actividades constructivas. Se presentaron lluvias en horas de la tarde.

Lunes 02 de Febrero, supervisión, verificación y control de las siguientes actividades: Fundida de barandas en concreto K0+360 a K0+381 ambos costados tramo principal. Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+000 a K0+440 tramo principal. Encofrado para armado de acero de refuerzo de puente peatonal abs K0+642 tramo principal.

Martes 03 de Febrero, supervisión, verificación y control de las siguientes actividades: Replanteo de barandas y anclajes de 1/2" para barandas en columnas K0+381 K0+400 ambos costados tramo principal. Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+440 a K0+874 tramo principal. Armado de acero de refuerzo de puente peatonal abs K0+642 tramo principal incluye anclajes.

Miércoles 04 de Febrero, supervisión, verificación y control de las siguientes actividades: Armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de barandas K0+381 a K0+400 tramo principal ambos costados. Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+874 a K1+140 tramo principal. Demolición de losa aérea existentes de puente K1+150 tramo principal. Fundida en concreto de 4000psi de puente peatonal abs K0+642 tramo principal.

En resumen, el contratista alcanzó un avance obra fisica del 95,49%, realizando actividades de Relleno de material de recebo, Limpieza de canal, Anclaje, barandas en concreto, puente peatonal en concreto, Repaleo interno con minicargador



Demolicion de losa aerea existentes de puente K1+150 tramo principal.



Armado acero de refuerzo de puente peatonal abs K0+642 tramo principal incluye anclajes.



Fundida en concreto de 4000psi de puente peatonal abs K0+642 tramo principal.



Demolicion de losa aerea existentes de puente K1+150 tramo principal.



Anclaje para armado de refuerzo puente peatonal abs K0+642 tramo principal.



Fundida en concreto de 4000psi de puente peatonal abs K0+642 tramo principal.

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA

REINPRO SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	12 DE FEBRERO DE 2026	PERIODO No.	126	DEL	5/02/2026	AL	11/02/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SOLEDAD - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	0289 DE 2023	CONTRATO No.:	0251 DE 2023
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:		PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:	NOVENTA Y SEIS (96) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE SESENTA (60) MESES PARA LA ETAPA II
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	SEPTIEMBRE 14 DE 2023	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	SEPTIEMBRE 14 DE 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	2,843	PLAZO ACTUALIZADO:	2,843
PLAZO TRANSCURRIDO:	881 EQUIVALE AL 30.99%	PLAZO TRANSCURRIDO:	881 EQUIVALE AL 30.99%
VALOR INICIAL :	$ 2,463,185,760.00	VALOR INICIAL :	$ 27,220,819,943.00
VALOR ADICION(ES):	$ 1,588,835,640.00	VALOR ADICION(ES):	$ 9,767,979,973.76
VALOR ACTUALIZADO:	$ 4,052,021,400.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 36,988,799,916.76
VALOR PAGADO:	$ 655,739,348.00	VALOR PAGADO:	$ 16,607,946,260.92
VALOR POR PAGAR:	$ 3,396,282,052.00	VALOR POR PAGAR:	$ 20,380,853,655.84
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
0	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	14/09/2023	14/09/2023	-
1	**ETAPA 1: CONSTRUCCION**	**14/09/2026**		
1.1	**REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**9/01/2024**	**30/01/2024**	
1.2	**CAPITULO 1: PRELIMINARES**	**1/06/2026**		
1.2.1	Localización, Trazado y Replanteo	1/06/2026	13/02/2024	-
1.2.2	Control Topográfico	1/05/2026		
1.3	**CAPITULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**1/05/2026**		
1.3.1	Excavación Mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua. (Incluye cargue en volqueta. No incluye transporte a sitio de disposición final)	2/04/2026		
1.3.2	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	1/05/2026		
1.3.3	Relleno con Material de Sitio	1/05/2026		
1.3.4	Relleno Compacto en Piedra Ciclópea.	4/03/2026		
1.3.5	Suministro e Instalación de Geotextil Tejido Propyweave T2400 o W315 o similar para separación de capas granulares y estabilización de suelos.	4/02/2026		
1.3.6	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms.	2/04/2026		
1.3.7	Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final menor de 5 kms.	2/04/2026		
1.3.8	Repaleo Interno con cargador hasta punto de acopio de cargue distancia hasta 200 mt.s	2/04/2026		
1.3.9	Excavación Manual en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua para nivelación de fondo o afinado de taludes. (Incluye cargue en volqueta)	4/03/2026		
1.3.10	Tablestacado de Protección H=3,00 m. (para el 30% del total de la longitud)	2/04/2026		
1.3.11	Pago de Derechos de botaderos	2/04/2026		
1.3.12	Extensión y Disposición de Material Sobrante	4/03/2026		
1.4	**CAPITULO III - OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION**	**26/08/2026**		
1.4.1	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60.	1/05/2026		
1.4.2	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para fondo de canal, incluye formaleteria.	1/06/2026		
1.4.3	Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para muros de canal, incluye formaleteria.	29/06/2026		
1.4.4	Suministro y colocación de concreto para Solado de 2000 PSI.	1/05/2026		
1.4.5	Corte y Sello de Juntas Transversales.	28/07/2026		
1.4.6	Suministro e Instalación de Cinta PVC 0-22 o similar para juntas de construcción.	1/06/2026		
1.4.7	Barandas en Concreto de 3000 PSI de 0,20 m*0,20 m. (Columnas a 1,50 m, con Varillas de 1/2" 60.000 PSI. Estribos de 1/4" a 0,20 m)	26/08/2026		
1.4.8	Tubería de Ø2" para Lloradero de Muros	15/06/2026		
1.4.9	Andenes en Concreto espesor 10 cms.	1/05/2026		
1.4.10	Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo)	4/03/2026		
1.4.11	Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. (Para andenes 3/8" cada 0,30 mts ambos sentidos)	8/04/2026		
1.5	**CAPITULO IV - MANEJO DE AGUAS**	**26/06/2026**		
1.5.1	Manejo de Aguas	26/06/2026		
NP	**CAPITULO V - ITEMS NO PREVISTOS**	**14/09/2026**		
NP-01	Demolición de concreto simple y reforzado, no incluye retiro de material	14/09/2026		
NP-02	Rocería, limpieza y descapote de maleza, incluye retiro de material/basura a botadero	11/09/2026		
NP-03	Anclaje de 1/2"	26/08/2026		
NP-04	Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI dimensiones de 20cmx30cm para confinamiento de andenes, no incluye acero de	26/08/2026		
NP-05	Suministro y colocación de Concreto de 4000 PSI impermeabilizado para losa superior, incluye formaleta.	20/03/2025		
1.6	**CAPITULO VI - COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL**	**14/09/2026**		
1.6.1	**GESTION SOCIAL**	**12/03/2024**		
1.6.1.1	Campaña Radial	13/10/2023		
1.6.3	Reuniones Informativas con la Comunidad	12/03/2024	2/02/2024	
1.6.2	**EDUCACION AMBIENTAL**	**16/09/2024**	**17/05/2024**	
1.6.5	Inducción Ambiental a Comunidades	16/09/2024	17/05/2024	
1.6.6	Inducción Ambiental a Trabajadores	16/09/2024	17/05/2024	
1.6.3	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**28/02/2024**		
1.6.3.1	Socialización del Proyecto con Organismos y Autoridades	28/02/2024		
1.6.4	**GESTION AMBIENTAL**	**14/09/2026**		
1.6.4.1	**Manejo ambiental de los residuos líquidos**	**9/05/2024**	**6/03/2024**	
1.6.4.1.1	Canecas de 55 gal con tapa para almacenar residuos líquidos	9/05/2024	6/03/2024	
1.6.4.2	**Manejo ambiental de los residuos solidos**	**19/04/2025**	**24/04/2024**	
1.6.4.2.1	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	19/04/2025	24/04/2024	

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2020-11-24**

FECHA	12 DE FEBRERO DE 2026	**PERIODO No.**	126	DEL	**5/02/2026**	AL	**11/02/2026**

1.6.4.3	**Mitigación de impactos por tránsito vehicular**	**15/01/2025**	**29/02/2024**
1.6.4.3.1	Dispositivos para el control y manejo de tráfico en la obra (señales preventivas, reglamentarias e informativas)	15/01/2025	29/02/2024
1.6.4.4	**RECURSOS HUMANOS**	**14/09/2026**	
1.6.4.4.1	Recursos humanos para implementación del plan de manejo ambiental (Incluye: Profesional Ambiental, Profesional SST y	14/09/2026	
2	**ETAPA 2: MANTENIMIENTO**	**27/06/2031**	
2.1	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**	**27/06/2031**	
2.1.1	Limpieza de residuos sólidos sobre cauce	27/06/2031	
2.1.2	Revisión y Mantenimiento de Juntas	27/06/2031	
2.1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos Solidos	27/06/2031	
2.1.4	Pago de derechos de botadero	27/06/2031	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 1)	14/09/2026	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)	27/06/2031	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)	27/06/2031	

No.	**INDICADORES**	**VALORES**	**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO**
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 30,014,741,705.44	81.15%	14.87%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 32,829,077,653.66	96.02%	

Nota aclaratoria: Porcentaje de avance obra fisica correspondiente al 96.02% equivalente a $32.829.077.653,66; adicionalmente se tiene ejecutado en acta de mayores cantidades un valor acumulado de $4.911.796.504. En resumen, se lleva un valor acumulado total de $37.740.874.157,77 correspondiente a la obra fisica ejecutada + acta de reconocimiento de mayores cantidades ejecutado.

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 Se observan en obra tuberías de agua potable en el lecho del arroyo.
3.2 Vertimientos de aguas residuales constantes al cauce del arroyo

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
Continuar con la limpieza general durante toda la semana, debido que se observa muchos acopios de RCD apilados	Contratista e Interventoría	11/02/2026
Implementar Acciones para el control y retiro de basuras.	Contratista e Interventoría	11/02/2026

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se realizaron las actividades con normalidad. Se continuo con la ejecución de las actividades constructivas en el tramo principal del arroyo. Se continuó con el retiro de RCD, residuos sólidos y sedimentos. En terminos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista de obra: Limpieza de canal, Anclaje, armado de acero y fundida de barandas en concreto, construccion de puentes peatonal en concreto, Demolicion de puente existente, Repaleo interno con minicargador; control topográfico y técnico correspondiente a las cantidades de obra ejecutadas, especificaciones y planos de diseños.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 05 de Febrero, supervisión, verificación y control de las siguientes actividades: Fundida de barandas en concreto K0+381 a K0+400 ambos costados tramo principal. Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K1+158 a K1+546 tramo principal. Demolición de losa piso existentes de puente K1+150 tramo principal. Excavación manual entre 0mts a 0.5mts de profundidad para zapatas de puente en concreto peatonal aéreo K1+547 tramo principal lado izquierdo del canal.

Viernes 06 de Febrero, supervisión, verificación y control de las siguientes actividades: Replanteo de barandas y anclajes de 1/2" para barandas en columnas K0+400 K0+418 ambos costados tramo principal. Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K1+546 a K1+893 tramo principal. Demolición de muros existentes de puente K1+150 tramo principal. Excavación manual entre 0.5mts a 1.1mts de profundidad para zapatas de puente en concreto peatonal aéreo K1+547 tramo principal lado izquierdo del canal.

Sábado 07 de Febrero, supervisión, verificación y control de las siguientes actividades: Armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de barandas K0+400 a K0+418 tramo principal ambos costados. Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K1+893 a K2+010 tramo principal. Excavación para puente vehicular K1+150 Tramo principal. Excavación manual entre 1.1mts a 1.6mts de profundidad para zapatas de puente en concreto peatonal aéreo K1+547 tramo principal lado izquierdo del canal.

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	12 DE FEBRERO DE 2026	**PERIODO No.**	126	DEL	**5/02/2026**	AL	**11/02/2026**

Domingo 08 de Febrero, no se programaron actividades constructivas.

Lunes 09 de Febrero, supervisión, verificación y control de las siguientes actividades: Fundida de barandas en concreto K0+400 a K0+418 ambos costados tramo principal. Retiro de material proveniente de la excavación para puente vehicular K1+150 Tramo principal. Excavación manual entre 1.6 mts a 2.05 mts de profundidad para zapatas de puente en concreto peatonal aéreo K1+547 tramo principal lado izquierdo del canal.

Martes 10 de Febrero, supervisión, verificación y control de las siguientes actividades: Replanteo de barandas y anclajes de 1/2" para barandas en columnas K0+418 K0+441 ambos costados tramo principal. Relleno de piedra ciclópea puente vehicular K1+150 Tramo principal. Excavación manual entre 2.05mts a 2.60mts de profundidad para zapatas de puente en concreto peatonal aéreo K1+547 tramo principal lado izquierdo del canal.

Miércoles 11 de Febrero, supervisión, verificación y control de las siguientes actividades: Armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de barandas K0+418 K0+441 tramo principal ambos costados. Relleno de material de recebo K1+143 a K1+150 Primera capa laterales de muro tramo principal ambos costados. Continuación relleno de piedra ciclópea puente vehicular K1+150 Tramo principal. Excavación manual entre 2.60mts a 3.00mts de profundidad para zapatas de puente en concreto peatonal aéreo K1+547 tramo principal lado izquierdo del canal.

En resumen, el contratista alcanzó un avance obra fisica del 96,02%, realizando actividades de Limpieza de canal, fundida de barandas en concreto, construcicion de puentes peatonal en concreto, Demolicion de puente existente, Repaleo interno con minicargador



Demolicion de muros existentes de puente K1+150 tramo principal.



Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K1+893 a K2+010 tramo principal.



Fundida de barandas en concreto K0+400 a K0+418 ambos costados tramo principal.



Demolicion manual de losa piso existentes de puente K1+150 tramo principal.



Demolicion de muros existentes de puente K1+150 tramo principal.



Relleno de material de recebo K1+143 a K1+150 Primera capa laterales de muro tramo principal ambos costados.

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA

ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023 — CONTRATO No: 0251 DE 2023

INTERVENTORIA: REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS — CONTRATO No: 0289 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción:

Fundida de barandas en concreto K1+108 a K1+121 ambos costados tramo principal.



Descripción:

Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+000 a K0+440 tramo principal.



Descripción:

Corte de losa superior K0+067 a K0+097 Afluente 1.



Descripción:

Fundida en concreto de 4000psi de puente peatonal abs K0+642 tramo principal.



Descripción:

Demolicion de muros existentes de puente K1+150 tramo principal.



Descripción:

Fundida de barandas en concreto K1+121 a K1+133 ambos costados tramo principal.



Descripción:

Demolicion de losa aerea existentes de puente K1+150 tramo principal.



Descripción:

Fundida de losa superior K0+037 a K0+067 Afluente 1.

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROYECTO



Descripción:

Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K1+893 a K2+010 tramo principal.



Descripción:

Fundida de barandas en concreto K1+121 a K1+133 ambos costados tramo principal.



Descripción:

Fundida de losa superior K0+037 a K0+067 Afluente 1.



Descripción:

Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+050 a K0+000 Afluente 1.



Descripción:

Fundida de barandas en concreto K1+133 a K1+143 ambos costados tramo principal.



Descripción:

Armado acero de refuerzo de puente peatonal abs K0+642 tramo principal incluye anclajes.



Descripción:

Demolicion de muros existentes de puente K1+150 tramo principal.



Descripción:

Fundida de losa superior K0+067 a K0+097 Afluente 1.



Descripción:

Fundida de losa superior K0+067 a K0+097 Afluente 1.



Descripción:

Fundida de barandas en concreto K0+418 K0+441 ambos costados tramo principal.

ANEXO 4: BITACORA DE OBRA

Capa lateralei de muroi tramo principal amboi costadoi.
Fundida de loza superior K0+007 a K0+037 afluente 1.

YD JA.

13 de Enero 2026

- Supervisión, verificación y control de lai siguientei actividadei:
Fundida de baiandai en concreto K1+100 a K1+108 amboi costadoi tramo principal.
Relleno de material de recebo K0+906 a K1+000 ultima capa lateralei de muroi tramo principal amboi costadoi.
Limpieza y retiro de residuoi sólidoi sobre el canal entre K0+000 a K0+056 afluente 3.
Corte de loza superior K0+007 a K0+037 afluente 1.

YD JA.

14 de Enero 2026.

- Supervisión, verificación y control de lai siguientei actividadei:
Replanteo de baiandai y anclajei de 1/2" para baiandai en columnai K1+108 a K1+121 amboi costadoi tramo principal.
Relleno de material de recebo K1+000 a K1+007 ultima Capa lateralei de muroi tramo principal amboi costadoi.
Limpieza y retiro de residuoi sólidoi sobre el canal entre K0+056 a K0+120 afluente 3.

YD JA.

15 de Enero 2026.

- Supervisión, verificación y control de lai siguientei Actividadei:
Armado de acero de vigai intermedia, pasamanoi y columnai de baiandai K1+108 a K1+121 tramo principal amboi costadoi.

Powered by CamScanner

Relleno de material de recebo K1+007 a K1+015 ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.

YB JA

16 de Enero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Fundida de barandas en concreto K1+108 a K1+121 ambos costados tramo principal.
Relleno de material de recebo K1+015 a K1+034 ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.
Fundida de losa superior K0+037 a K0+067 afluente 1.

YB JA

17 de Enero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Replanteo de barandas y anclajes de 1/2" para barandas en columnas K1+121 a K1+133 ambos costados tramo principal.
Relleno de material de recebo K1+034 a K1+030 ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.
Corte de losa superior K0+037 a K0+067 afluente 1.

YB JA

18 de Enero 2026.

- No se programaron actividades constructivas.

YB JA

19 de Enero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:

Powered by CamScanner

Armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de baiandas K1+121 a K1+133 tramo principal ambos costados.
Relleno de material de recebo K1+030 a K1+039 ultima Capa laterales de muros tramo principal ambos costados.
Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+103 a K0+180 afluente 1.

YP JA

20 de Enero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Fundida de baiandas en concreto K1+121 a K1+133 ambos costados tramo principal.
Relleno de material de recebo K1+039 a K1+047 ultima Capa laterales de muros tramo principal ambos costados.
Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+103 a K0+050 afluente 1.

YP JA

21 de Enero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Replanteo de baiandas y anclajes de 1/2" para baiandas en columnas K1+133 a K1+143 ambos costados tramo principal.
Relleno de material de recebo K1+047 a K1+054 ultima Capa laterales de muros tramo principal ambos costados.

YP JA

22 de Enero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:

Powered by CamScanner

Armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de baiandas K1+133 a K1+143 tramo principal ambos costados.
Relleno de material de recebo K1+054 a K1+064 ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.
Fundida de losa superior K0+067 a K0+097 afluente 1.
Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+050 a K0+000 afluente 1.

YP JA

23 de Enero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Fundida de baiandas en concreto K1+133 a K1+143 ambos costados tramo principal.
Relleno de material de recebo K1+064 a K1+073 ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.
Corte de losa superior K0+067 a K0+097 afluente 1.

YP JA

24 de Enero 2026

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Relleno de material de recebo K1+073 a K1+090 ultima capa laterales de muros tramo principal ambos costados.

YP JA

25 de Enero 2026.

-No se programaron actividades constructivas.

YP JA

Powered by CamScanner

26 de Enero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Relleno de material de recebo K1+090 a K1+099 ultima Capa laterales de muros tramo principal ambos costados.

YP JA

27 de Enero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Relleno de material de recebo K1+099 a K1+106 ultima Capa laterales de muros tramo principal ambos costados.

YP JA

28 de Enero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Relleno de material de recebo K1+106 a K1+113 ultima Capa laterales de muros tramo principal ambos costados.

YP JA

29 de Enero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Relleno de material de recebo K1+113 a K1+124 ultima Capa laterales de muros tramo principal ambos costados.
Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+000 a K0+120 afluente 1.

YP JA

Powered by CamScanner

30 de Enero 2026.

-Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Replanteo de baiandas y anclajes de 1/2" para baiandas en columnas K0+360 a K0+381 ambos costados tramo principal.
Relleno de material de recebo K1+124 a K1+137 ultima Capa laterales de muros tramo principal ambos costados.

YP JA

31 de Enero 2026.

Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de baiandas K0+360 a K0+381 tramo principal ambos costados.
Relleno de material de recebo K1+137 a K1+143 ultima Capa laterales de muros tramo principal ambos costados.

YP JA

01 de Febrero 2026.

- No se programaron actividades constructivas. Se presentaron lluvias en horas de la tarde.

YP JA

02 de Febrero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Fundida de baiandas en concreto K0+360 a K0+381 ambos costados tramo principal.
Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K0+000 a K0+440 tramo principal.

Powered by CamScanner

Encofrado para armado de acero de refuerzo de puente peatonal abs KO+642 tramo principal.

03 de Febrero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Replanteo de baiandas y anclajes de 1/2" para baiandas en columnas KO+381 a KO+400 ambos costados tramo principal.
Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre KO+440 a KO+874 tramo principal.
Armado de acero de refuerzo de puente peatonal abs KO+642 tramo principal incluye anclajes.

04 de Febrero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de baiandas KO+381 a KO+400 tramo principal ambos.
Costados.
Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre KO+874 a K1+140 tramo principal.
Demolición de losa aérea existentes de puente K1+150 tramo principal
Fundido en concreto de 4000 psi de puente peatonal abs KO+642 tramo principal.

05 de Febrero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:

Powered by CamScanner

Fundida de baiandas en concreto K0+381 a K0+400 ambos costados tramo principal.
Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K1+158 a K1+546 tramo principal.
Demolición de loza piso existentes de puente K1+150 tramo principal.
Excavación manual entre 0mts a 0.5mts de profundidad para zapatas de puente en concreto peatonal aéreo K1+547 tramo principal lado izquierdo del canal.

YP JA

06 de Febrero 2026.

-Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Replanteo de baiandas y anclajes de 1/2" para baiandas en columnas K0+400 a K0+418 ambos costados tramo principal.
Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K1+546 a K1+893 tramo principal.
Demolición de muros existentes de puente K1+150 tramo principal.
Excavación manual entre 0.5mts a 1.1mts de profundidad para zapatas de puente en concreto peatonal aéreo K1+547 tramo principal lado izquierdo del canal.

YP JA

07 de Febrero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de baiandas K0+400 a K0+418 tramo principal ambos costados.
Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K1+893 a K2+010 tramo principal.

Powered by CamScanner

Excavación para puente vehicular K1+150 tramo principal.
Excavación manual entre 1.1mts a 1.6mts de profundidad para zapatas de puente en concreto peatonal aéreo K1+547 tramo principal lado izquierdo del canal

YP JA.

08 de Febrero 2026.

- No se programaron actividades constructivas.

YP JA

09 de Febrero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Fundida de baiandas en concreto K0+400 a K0+418 ambos costados tramo principal.
Retiro de material proveniente de la excavación para puente vehicular K1+150 tramo principal.
Excavación manual entre 1.6mts a 2.05mts de profundidad para zapatas de puente en concreto peatonal aéreo K1+547 tramo principal lado izquierdo del canal.

YP JA.

10 de Febrero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Replanteo de baiandas y anclajes de 1/2" para baiandas en columnas K0+418 a K0+441 ambos costados tramo principal.
Relleno de piedra ciclópea puente vehicular K1+150 tramo principal.
Excavación manual entre 2.05mts a 2.60mts de profundidad para zapatas de puente en concreto peatonal aéreo K1+547 tramo principal lado izquierdo del canal.

YP JA.

Powered by CamScanner

11 de Febrero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Armado de acero de vigas intermedia, pasamanos y columnas de baiandas K0+418 a K0+441 tramo principal ambos Costados.
Relleno de material de recebo K1+143 a K1+150 primera Capa laterales de muros tramo principal ambos costados.
Continuación relleno de piedra ciclópea puente vehicular K1+150 tramo principal.
Excavación manual entre 2.60mts a 3.00mts de profundidad para zapatas de puente en concreto peatonal aéreo K1+547 tramo principal lado izquierdo del canal.

YP JA.

12 de Febrero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Fundida de baiandas en concreto K0+418 a K0+441 ambos Costados tramo principal.
Relleno de material de recebo K1+150 a K1+158 primera Capa laterales de muros tramo principal ambos costados.
Suministro de solado puente vehicular K1+150 tramo principal.
Excavación manual entre 0mts a 0.44mts de profundidad para zapatas de puente en concreto peatonal aéreo K1+547 tramo principal lado derecho del canal.

YP JA

13 de Febrero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Replanteo de baiandas y anclajes de 1/2" para baiandas

Powered by CamScanner

en columnas K0+441 a K0+464 ambos costados tramo principal.
Relleno de material de recebo K1+143 a K1+149 ultima Capa en laterales de muros tramo principal ambos costados.
Armado acero de refuerzo losa de piso para puente vehicular K1+150 tramo principal.
Excavación manual entre 0.44 mts a 0.93 mts de profundidad para zapatas de puente en concreto peatonal aéreo K1+547 tramo principal lado derecho del canal.

YD JA

14 de Febrero 2026.

- Supervisión, verificación y control de las siguientes actividades:
Armado de acero de vigas intermedia, postamanos y columnas. de barandas K0+441 a K0+464 tramo principal ambos costados.
Relleno de material de recebo K1+149 a K1+158 ultima Capa en laterales de muros tramo principal ambos costados.
Continuación armado acero de refuerzo Losa de piso para puente vehicular K1+150 tramo principal.
Excavación manual entre 0.93 mts a 1.50 mts de profundidad para zapatas de puente en concreto peatonal aéreo K1+547 tramo principal lado derecho del canal.

YD JA

Powered by CamScanner

ANEXO 5: INSPECCIÓN SST

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST

REINPROSAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 900.244611-7

Código - FO - 1
Versión: 01
Fecha aprobación: 15/09/2023

FECHA: 22 - 01 - 2026. RESPONSABLE: Jorge Fontalvo.

LUGAR: SOLEDAD ATLÁNTICO

PROYECTO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

	SEMANA DE: 15 a 21 Enero 26	JUEVES			VIERNES			SABADO			LUNES			MARTES			MIERCOLES			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X			X			X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			X			X			X			X			X			X	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?	X			X			X			X			X			X			
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	X			X			X			X			X			X			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	X			X			X			X			X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	X			X			X			X			X			X			

Firma del contratista: Fesula CC:

Firma del Interventor: JEFA Fecha:

El Responsable de interventoria no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST

REINPRO SAS
CONSULTORIA Y OBRA CIVIL
NIT: 800.244884-7

Código - FO - 1
Versión: 01
Fecha aprobación: 15/09/2023

FECHA: 29 - 01 - 2026. RESPONSABLE: Jorge Fontalvo.

LUGAR: SOLEDAD ATLÁNTICO

PROYECTO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

SEMANA DE: 22 a 28 Enero 26

		JUEVES			VIERNES			SABADO			LUNES			MARTES			MIERCOLES			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X			X			X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			X			X			X			X			X			X	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?	X			X			X			X			X			X			
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	X			X			X			X			X			X			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	X			X			X			X			X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	X			X			X			X			X			X			

Firma del contratista: Fergus CC:

Firma del Interventor: JE LA Fecha:

El Responsable de interventoria no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST

REINPRO SAS
CONSULTORIA Y OBRA CIVIL
NIT: 806.246804-7

Código - FO - 1
Versión: 01
Fecha aprobación: 15/09/2023

FECHA: 05 - 02 - 2026. RESPONSABLE: Jorge Fontalvo

LUGAR: SOLEDAD ATLÁNTICO

PROYECTO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

	SEMANA DE: 29 Enero 2026 04 Febrero 2026.	JUEVES			VIERNES			SABADO			LUNES			MARTES			MIERCOLES			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X			X			X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			X			X			X			X			X			X	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?	X			X			X			X			X			X			
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	X			X			X			X			X			X			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	X			X			X			X			X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	X			X			X			X			X			X			

Firma del contratista: Fersula CC:

Firma del interventor: JEFA Fecha:

El Responsable de interventoría no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST

REINPRO SAS
CONSULTORIA Y OBRA CIVIL
NIT: 900.348864-7

Código - FO - 1
Versión: 01
Fecha aprobación: 15/09/2023

FECHA: 12 - 02 - 2026. RESPONSABLE: Jorge Fontalvo.

LUGAR: SOLEDAD ATLÁNTICO

PROYECTO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

SEMANA DE: 05 a 11 Febrero 26

		JUEVES			VIERNES			SABADO			LUNES			MARTES			MIERCOLES			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X			X			X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			X			X			X			X			X			X	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?	X			X			X			X			X			X			
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	X			X			X			X			X			X			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	X			X			X			X			X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	X			X			X			X			X			X			

Firma del contratista Fesula
CC:

Firma del Interventor JEffA
Fecha:

El Responsable de interventoria no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST

REINPRO SAS
CONSULTORIA Y OBRA CIVIL
NIT: 890.240856-7

Código - FO - 1
Versión: 01
Fecha aprobación: 15/08/2023

FECHA: 15 - 02 - 2026 RESPONSABLE: Jorge Fontalvo.

LUGAR: SOLEDAD ATLÁNTICO

PROYECTO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

SEMANA DE: 12 a 14 Febrero 26

		JUEVES			VIERNES			SABADO			LUNES			MARTES			MIERCOLES			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	X			X			X												
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X												
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X												
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X												
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X												
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X												
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X												
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X												
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X												
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X												
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X												
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X												
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?			X			X			X										
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X												
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X												
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X												
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X												
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X												
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X												
	¿Se evidencias las acciones correctivas?			X			X			X										
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X												
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			X			X			X										
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			X			X			X										
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	X			X			X												
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	X			X			X												
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	X			X			X												
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	X			X			X												
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	X			X			X												
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?	X			X			X												
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	X			X			X												
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	X			X			X												
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	X			X			X												
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	X			X			X												
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	X			X			X												
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			X			X			X										
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	X			X			X												
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	X			X			X												
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	X			X			X												
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	X			X			X												
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	X			X			X												
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	X			X			X												
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	X			X			X												
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	X			X			X												
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	X			X			X												
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados	X			X			X												
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	X			X			X												

Firma del contratista: Fecsult CC:

Firma del Interventor: JEPA Fecha:

El Responsable de interventoria no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

Powered by CamScanner

ANEXO:INFORME SST CONTRATISTA

CONSORCIO CANALIZACIÓN
EL PLATANAL 2023

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 29

DEL 15 DE ENERO 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.0251 DE 2023:

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

Contratista:

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023.

Interventoría:

REINGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

Contratante:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTTICO C.R.A

Supervisor:

Arq. Wladimir Orozco

Barranquilla Atlántico – FEBRERO 2026

TABLA DE CONTENIDO

1

1. OBJETIVOS 3
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO 3
2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 3
2.2. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA 4
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 4
3.1. PROBLEMAS PRESENTADOS 6
3.2. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6
3.3. SE RELACIONA CARACTERIZACIÓN DE ACCIDENTALIDAD DURANTE INICIO DE LA OBRA CON SUS HHT Y NÚMERO DE EMPLEADOS: 7
3.4. PLAN DE CAPACITACIÓN: 8
3.5. INSPECCIONES PLANEADAS 9
4. CONCLUSIONES 9
5. ANEXOS DE SEGURIDAD 9

1. OBJETIVOS

Establecer los requerimientos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como complemento para las actividades de mejoramiento del contrato de obra No. 0251 de 2023 **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".** en procesos, permitiendo desarrollar y promover la salud de los trabajadores, previniendo y controlando enfermedades ocupacionales y accidentes, permitiendo incrementar la salud física, mental, social del trabajador y conservación del medio ambiente se logra mediante acciones conjuntas como la reducción de residuos, el ahorro de agua y la energía, la reforestación y la educación ambiental.

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.1. Localización general

El proyecto se encuentra localizado en la región Caribe, departamento del Atlántico, específicamente en la zona urbana del municipio de Soledad.
El municipio de Soledad se encuentra ubicado en las coordenadas 10°54′35″N 74°47′09″O limita por el norte con el distrito especial de Barranquilla, por el sur con el municipio de Malambo, por el oriente con el departamento de Magdalena y por el occidente con Galapa.
Soledad es un municipio perteneciente al departamento del Atlántico, ocupa el octavo lugar en cuanto a población en el país, y el tercero en la región, considerado por mucho tiempo uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional actualmente integra el área metropolitana de Barranquilla.



Ilustracion 1. Localizacion de soledad en el departamento del atlantico.

2.2. Localización Especifica

El arroyo El Platanal es un cauce intermitente que recorre todo el sur occidente de Soledad a lo largo de una longitud de más de 6 mil metros, hasta unirse al trayecto del Río Magdalena, limita en ambas direcciones con los barrios Soledad 2000, Bonanza y Manuela Beltrán, en la calle 45 de Soledad.



Ilustración 2. Localización del proyecto.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo entre el 15 de enero 2025 al 14 de febrero del 2026 se realizaron las siguientes actividades en pro del bienestar laboral, Las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en obras civiles se realizan principalmente para prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales, protegiendo la integridad física y mental de los trabajadores ante riesgos como caídas, atrapamientos o exposición a maquinaria pesada. Además, buscan asegurar la continuidad de la obra, proteger equipos y cumplir con la normativa legal vigente.

Los fines específicos incluyen:

- **Gestión de riesgos:** Identificar, evaluar y controlar peligros en el sitio de construcción.
- **Prevención:** Evitar caídas a distinto nivel, golpes, atrapamientos, riesgos eléctricos y exposición a sustancias peligrosas.
- **Capacitación:** Instruir al personal sobre el uso seguro de maquinaria, herramientas y Elementos de Protección Personal (EPP).
- **Protección del entorno:** Salvaguardar no solo a los obreros, sino también los equipos y áreas aledañas.
- **Cumplimiento Normativo:** Garantizar que la obra cumpla con las disposiciones legales de seguridad y salud, evitando sanciones.

Estas acciones, basadas en la mejora continua, son fundamentales para fomentar una cultura de prevención en el sector de la construcción.

- Charla de seguridad:
- Misión -visión
- Importancia del uso de los elementos de los (EPP)
- Manejo de basura
- Riesgo biológico
- Diferencia entre accidente e incidente
- Condición insegura
- Enfermedad laboral
- Riesgo psicosocial
- Riesgo ergonómico
- Riesgo físico
- Riesgo mecánico
- Primeros auxilios
- Alcohol y droga

3.1. Problemas presentados

Durante este periodo comprendido entre el 15 de enero 2025 al 14 de febrero de 2026 se presentaron solicitudes por lideres comunales y veedores, en medio de reunión y llamadas telefónicas, donde manifestaron sus preocupaciones e inquietudes por falta de los rellenos laterales de los muros reparación de viviendas afectadas dentro el proceso constructivo, no se presentaron PQRS (peticiones, quejas, reclamos y solicitudes) por parte de la comunidad se realizó visita llegando a un acuerdo con los ciudadanos informándoles la continuación de los rellenos, reparaciones de tuberías y registros afectados por el paso de vehículos dando soluciones a sus solicitudes. Al igual que se les manifiesta que se han venido realizando reparaciones de las tuberías sanitarias afectadas durante el proceso.

No se han presentado quejas de seguridad por parte de los empleados, se ha laborado de manera eficiente evitando estas situaciones, implementando medidas como la cultura de seguridad y orden, uso de equipos de protección personal, mantenimiento adecuado de equipos y herramientas, capacitación y seguimiento de procedimientos seguros, reportar condiciones inseguras, asegurar el descanso y la concentración de los trabajadores.

3.2. Informe de seguridad y salud en el trabajo

Durante este periodo se realizó capacitación, charlas de seguridad con todo el personal vinculado para la generación de la revisión de estudios y diseños, sobre las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, medidas de gestión ambiental aplicadas y socializando el plan de gestión SST para su correcta implementación tanto en oficina como en obra.

Durante este periodo no se ha presentado accidentes laborales, a la fecha todo el personal labora de forma segura para el desarrollo de las actividades, manteniendo una comunicación clara entre compañeros para informar sobre peligros y compartir lecciones aprendidas, un lugar de trabajo ordenado y limpio reduce la probabilidad de tropiezos y resbalones, permitiendo que los trabajadores se concentren mejor

Se realizan indicadores del SST con el fin de realizar control mediante el formato caracterización de accidentalidad. También se les hace medición y control a todos los ausentismos laborales (enfermedad común, permisos, calamidades, entre otros).

La fórmula que se realiza para realizar el indicador de frecuencia y accidentalidad es el siguiente:

Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo	Es la relación entre el número de días perdidos y cargados por accidentes de Trabajo, durante un periodo y el total de HHT durante un periodo y multiplicado por K	ISAT= (N° Días perdidos y cargados por A.T en el periodo / N| HHT) X K
Índice de Lesiones Incapacitantes por A.T	Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Es un índice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su utilidad radica en la comparación entre diferentes periodos.	ILIAT= (IFIAT *ISAT) / 1000
Índice de Frecuencia de Incidentes de Trabajo	Es la relación entre el número total de I.T registrados en un periodo y el total de las HHT durante un periodo multiplicado por K (constante igual a 240.000).	IFIT = (N° Total de I.T. / N° HHT mensuales) X K

La interpretación del indicador:

Por cada 200.000 HHT se pierden por accidente de trabajo (0) días
Relación entre IF e IS
Por cada 200.000 HHT, se presentan (0) Incidentes de Trabajo en el año

3.3. Se relaciona caracterización de accidentalidad durante inicio de la obra con sus HHT y número de empleados:

TABLA DE INDICADORES 2023									
MES	AREA	# DE EMPLEADOS	# DE AT	HHT	# DIAS AUSENCIA	TASA	IF	IS	ILI
Diciembre	operativa	36	733		0	**0,00%**	**0**	**0**	**-**

Enero	operativa	36	733		0	**0,00%**	**0**	**0**	-

A la fecha no se han presentado accidentes ni incidentes laborales

3.4. Plan de capacitación:

Se relaciona plan de formación y toma de conciencia durante el periodo de revisión de estudios y diseños se continua con actividades de topografía en obra, instalación de piedra, replanteo instalación de geotextil, fundidas y demás con sus indicadores:

- Divulgación: Políticas en SST y política para el no consumo de tabaco, alcohol y drogas.

INDICADORES				
NOMBRE DEL INDICADOR	**FÓRMULA DEL INDICADOR**	**PERIODICIDAD**	**INTERPRETACIÓN**	**META**
% Cumplimiento de la formación	Nº de formaciones ejecutadas / Total de formaciones planeadas **X** 100	Semestral	Mide el % de cumplimiento de las actividades de formación planeadas dividiendo el Nº Formaciones Ejecutadas entre el Nº Formaciones Planeadas.	80%
% Eficacia de la formación	Nº Evaluaciones Satisfactorias / Total de Evaluados **X** 100	Semestral	Mide el % de cobertura del personal calculado del número de personas cubiertas por cada tema de formación dividido entre el total de personas a cubrir.	70%
% Cobertura de de la formación	Nº Personas cubiertas por cada formación / Nº Total Personal a cubrir **X** 100	Semestral	Mide el % de eficacia del personal calculado del número de evaluaciones que sobrepase la nota mínima de 3.0 dividido entre el total de evaluados.	80%

PERMISO DE TRABAJO GENERAL: para este periodo se realizan actividades relleno con material de recebo, barandas en concreto, limpieza de residuos sólidos del canal, armado de anclaje, fundida de barandas, demolición del puente vehicular tramo principal, solado armado de acero fundida de piso puente vehicular, excavaciones manuales para la construcción de zapatas del puente aéreo tramo principal, controles topográficos, por lo tanto, se realiza la apertura de permisos de trabajo general, por ser catalogada como actividad de riesgo moderado, tiene una validez semanal.

3.5. Inspecciones planeadas

Para el periodo se realizaron las siguientes inspecciones:

1-Inspecion pre operacional de Excavadora (excavadoras Doosan 340 (2 anexos)

2.Inspeccion pre operacional Komatsu pc 220

3-Inspeccion pre operacional Volquetas KODIAK DDA 613

4-Inspeccion pre operacional volqueta Kodiak QHJ 238

5-Inspeccion pre operacional volqueta Kodiak AAD 619

6-Inspeccion pre operacional mini cargador S185

7-Inspección de extintor

8-Inspeccion de botiquín

9- inspección de camilla

4. CONCLUSIONES

A la fecha el proyecto consiste en **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"** ha venido cumpliendo con el manejo ambiental, seguridad industrial, manteniendo un buen desarrollo laboral.

5. ANEXOS DE SEGURIDAD

A continuación, se observan actividades de SST que han sido realizadas, Charlas de seguridad, con el fin de crear conciencia sobre riesgos, prevenir accidentes y enfermedades laborales, mejorar el ambiente de trabajo y asegurar el cumplimiento de normativas y la promoción del bienestar de los empleados, crear cultura organizacional donde la seguridad sea una prioridad, haciendo que los empleados se involucren activamente en su propia seguridad y la de sus compañeros.

La señalización en obra tiene como fin advertir sobre posibles peligros y prohibir comportamientos que pongan en riesgo la vida de quienes están trabajando y la comunidad.

Se hace entrega de Epp al personal en obra, para reducir la exposición a riesgos laborales, como caídas de objetos pesados, pisadas sobre objetos punzantes, se utilizan para proteger diferentes partes del cuerpo, cómo los pies con botas de seguridad, las manos con guantes, la cabeza con cascos, contribuir a la prevención y detección temprana y oportuna de riesgos, mediante el monitoreo y control periódico del uso y manejo adecuado de los EPP.

La divulgación de política de seguridad y salud en el trabajo, tiene como fin controlar los riesgos y efectos adversos que el consumo de alcohol y drogas psicoactivas causa en las personas, la alteración de sus capacidades físicas y mentales, afectación de la salud, de la seguridad y del ambiente laboral

Punto ecológico están diseñados para la correcta disposición de los desechos. Estos depósitos son fundamentales para promover la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, contribuyendo así el cuidado del medio ambiente.

	
Señalizaciones en oficina	Camilla y extintor
	
Camilla, canecas y extintor	Inspección de botiquín
	
Charla de seguridad	Rutas de evacuacion
	
Punto Ecológico	Botiquin de seguridad

	
Camilla y punto de agua potable	Charla de seguridad
	
Charlas de seguridad	Inspección de botiquín y extintor
	
Punto de encuentro	Señalizaciones

ANEXO 1: PREOPERACIONALES

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MONTACARGA - MINICARGADOR

CODIGO:	FOSST - 19-02
VERSION:	1
FECHA:	SEP 23
PAGINA	1 DE 1

SEMANA DEL 15/01/26 AL 17/01/26 MARCA Bob Cat MODELO 2017 SERIE 5185

OPERADOR Brandon Garcia UBICACIÓN Soledad (Atlantico) PROYECTO C.C. Consorcio Platanal.

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras								NC		NC		NC		
	Direccionales traseras								NC		NC		NC		
	De trabajo delanteras							B		B		B			
	De trabajo traseras							B		B		B			
	De frenado							B		B		B			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)							B		B		B			
	Pito							B		B		B			
	Alarma de retroceso							B		B		B			
	Cinturón de seguridad							B		B		B			
	Frenos de servicio							B		B		B			
	Freno de parqueo							B		B		B			
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)							B B		B B		B B			
	Extintor de incendios								NC		NC		NC		
	Kit ambiental								NC		NC		NC		
	Silla del operador							B		B		B			
	Espejos laterales							B		B		B			
	Espejo central convexo								NA		NA		NA		
	Pasamanos de acceso							B		B		B			
	Dirección							B		B		B			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)							B B		B B		B B			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas							B		B		B			
	Estado pasadores							B		B		B			
	Mecanismo de giro							B		B		B			
	Mandos de avance							B		B		B			
	Guardas							B		B		B			
	Estado del bastidor							B		B		B			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN REALIZA EL REPORTE: Brandon Garcia FIRMA Brandon Garcia

NOMBRE Y APELLIDO QUIEN VERIFICA HSEQ: Yuliett Ortega V. FIRMA Yuliett

CONSORCIO CANALIZACION
EL PLATANAL 2023

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGA - MINICARGADOR

CODIGO:	FOSST - 19-02
VERSION:	1
FECHA:	SEP 23
PAGINA	1 DE 1

SEMANA DEL 19/01/26 AL 24/01/26 MARCA Bob Cat MODELO 2017 SERIE S1B5
OPERADOR Brandon Gaviria UBICACIÓN Soledad (Atlantico) PROYECTO C.C. Arroyo Platanal

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras		NC		NC		NC		NC		NC		NC		
	Direccionales traseras		NC		NC		NC		NC		NC		NC		
	De trabajo delanteras	B		B		B		B		B		B			
	De trabajo traseras	B		B		B		B		B		B			
	De frenado	B		B		B		B		B		B			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	B		B		B		B		B		B			
	Pito	B		B		B		B		B		B			
	Alarma de retroceso	B		B		B		B		B		B			
	Cinturón de seguridad	B		B		B		B		B		B			
	Frenos de servicio	B		B		B		B		B		B			
	Freno de parqueo	B		B		B		B		B		B			
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente- aceite motor-horómetro)	B B B		B B B		B B B		B B B		B B B		B B B			
	Extintor de incendios		NC		NC		NC		NC		NC		NC		
	Kit ambiental		NC		NC		NC		NC		NC		NC		
	Silla del operador	B		B		B		B		B		B			
	Espejos laterales	B		B		B		B		B		B			
	Espejo central convexo		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Pasamanos de acceso	B		B		B		B		B		B			
	Dirección	B		B		B		B		B		B			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	B B		B B		B B		B B		B B		B B			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	B		B		B		B		B		B			
	Estado pasadores	B		B		B		B		B		B			
	Mecanismo de giro	B		B		B		B		B		B			
	Mandos de avance	B		B		B		B		B		B			
	Guardas	B		B		B		B		B		B			
	Estado del bastidor	B		B		B		B		B		B			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN REALIZA EL REPORTE: Brandon Gaviria FIRMA: Brandon Gaviria

NOMBRE Y APELLIDO QUIEN VERIFICA HSEQ: Yulieth Ortega V. FIRMA: Yulieth

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGA - MINICARGADOR

CODIGO: FOSST - 19-02
VERSION: 1
FECHA: SEP 23
PAGINA 1 DE 1

SEMANA DEL 26/01/26 AL 31/01/26 MARCA MODELO SERIE

OPERADOR UBICACIÓN PROYECTO

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras		NC		NC		NC		NC		NC		NC		
	Direccionales traseras		NC		NC		NC		NC		NC		NC		
	De trabajo delanteras	B		B		B		B		B		B			
	De trabajo traseras	B		B		B		B		B		B			
	De frenado	B		B		B		B		B		B			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	B		B		B		B		B		B			
	Pito	B		B		B		B		B		B			
	Alarma de retroceso	B		B		B		B		B		B			
	Cinturón de seguridad	B		B		B		B		B		B			
	Frenos de servicio	B		B		B		B		B		B			
	Freno de parqueo	B		B		B		B		B		B			
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	B B B		B B B		B B B		B B B		B B B		B B B			
	Extintor de incendios		NC		NC		NC		NC		NC		NC		
	Kit ambiental		NC		NC		NC		NC		NC		NC		
	Silla del operador	B		B		B		B		B		B			
	Espejos laterales	B		B		B		B		B		B			
	Espejo contral convexo		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Pasamanos de acceso	B		B		B		B		B		B			
	Dirección	B		B		B		B		B		B			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	B B		B B		B B		B B		B B		B B			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	B		B		B		B		B		B			
	Estado pasadores	B		B		B		B		B		B			
	Mecanismo de giro	B		B		B		B		B		B			
	Mandos de avance	B		B		B		B		B		B			
	Guardas	B		B		B		B		B		B			
	Estado del bastidor	B		B		B		B		B		B			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN REALIZA EL REPORTE: Brandon Caviria FIRMA: Brandon Caviria

NOMBRE Y APELLIDO QUIEN VERIFICA HSEQ: Yuliceth Ortega V. FIRMA: Yuliceth

CONSORCIO CANALIZACION
EL PLATANAL 2023

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGA - MINICARGADOR

CODIGO: FOSST - 19-02	
VERSION: 1	
FECHA: SEP 23	
PAGINA 1 DE 1	

SEMANA DEL 21/10/26 AL 31/10/26 MARCA Bob Cat MODELO 331X SERIE 5185

OPERADOR Brandon Caurira UBICACIÓN Soledad (Atlantico) PROYECTO C.C arroyo Platanal.

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras		NL		NL		NL		NL		NL		NL		
	Direccionales traseras		NL		NL		NL		NL		NL		NL		
	De trabajo delanteras	B		B		B		B		B		B			
	De trabajo traseras	B		B		B		B		B		B			
	De frenado	B		B		B		B		B		B			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	B		B		B		B		B		B			
	Pito	B		B		B		B		B		B			
	Alarma de retroceso	B		B		B		B		B		B			
	Cinturón de seguridad	B		B		B		B		B		B			
	Frenos de servicio	B		B		B		B		B		B			
	Freno de parqueo	B		B		B		B		B		B			
	Indicadoras (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	B B B		B B B		B B B		B B B		B B B		B B B			
	Extintor de incendios		NL		NL		NL		NL		NL		NL		
	Kit ambiental		NL		NL		NL		NL		NL		NL		
	Silla del operador	B		B		B		B		B		B			
	Espejos laterales	B		B		B		B		B		B			
	Espejo central convexo		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Pasamanos de acceso	B		B		B		B		B		B			
	Dirección	B		B		B		B		B		B			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	B B		B B		B B		B B		B B		B B			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	B		B		B		B		B		B			
	Estado pasadores	B		B		B		B		B		B			
	Mecanismo de giro	B		B		B		B		B		B			
	Mandos de avance	B		B		B		B		B		B			
	Guardas	B		B		B		B		B		B			
	Estado del bastidor	B		B		B		B		B		B			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN REALIZA EL REPORTE		NOMBRE Y APELLIDO QUIEN VERIFICA HSEQ	
Brandon Caurira	FIRMA Brandon Caurira	Yuleth Ortega V.	FIRMA Yuleth

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGA - MINICARGADOR

CODIGO: FOSST - 15-02
VERSION: 1
FECHA: SEP 23
PAGINA 1 DE 1

SEMANA DEL 09/02/26 AL 14/02/26 MARCA Bobcat MODELO 2017 SERIE S185
OPERADOR Brandon Gaviria UBICACIÓN Soledad (Atlantico) PROYECTO C.C Arroyo Platanal.

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras		NL		NL		NL		NL		NL		NC		
	Direccionales traseras		NL		NL		NL		NL		NL		NC		
	De trabajo delanteras	B		B		B		B		B		B			
	De trabajo traseras	B		B		B		B		B		B			
	De frenado	B		B		B		B		B		B			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	B		B		B		B		B		B			
	Pito	B		B		B		B		B		B			
	Alarma de retroceso	B		B		B		B		B		B			
	Cinturón de seguridad	B		B		B		B		B		B			
	Frenos de servicio	B		B		B		B		B		B			
	Freno de parqueo	B		B		B		B		B		B			
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	B B B		B B B		B B B		B B B		B B B		B B B			
	Extintor de incendios		NL		NL		NL		NL		NL		NL		
	Kit ambiental		NL		NL		NL		NL		NL		NC		
	Silla del operador	B		B		B		B		B		B			
	Espejos laterales	B		B		B		B		B		B			
	Espejo central convexo		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Pasamanos de acceso	B		B		B		B		B		B			
	Dirección	B		B		B		B		B		B			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	B B		B B		B B		B B		B B		B B			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	B		B		B		B		B		B			
	Estado pasadores	B		B		B		B		B		B			
	Mecanismo de giro	B		B		B		B		B		B			
	Mandos de avance	B		B		B		B		B		B			
	Guardas	B		B		B		B		B		B			
	Estado del bastidor	B		B		B		B		B		B			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN REALIZA EL REPORTE: Brandon Gaviria FIRMA Brandon Gaviria

NOMBRE Y APELLIDO QUIEN VERIFICA HSEQ: Yolieth Ortega V. FIRMA Yolieth O.

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	**CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023** **INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL**	Código: FOSST-19 Fecha: Noviembre 21 de 2022 Versión: 03 | Página 1 de 1

OBRA:	Arroyo platanal	SEMANA DEL:	15-01-26	AL:	17-01-26
INPECCIONADO POR:	Yolieth Ortega V.				
LOCALIZACIÓN:	Soledad	PLACA:	OHJ 238		
MARCA:	Kodiak	MODELO:	2007	AÑO:	2007

ÍTEM	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIER C	MIER NC	JUE C	JUE NC	VIER C	VIER NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC	RECOMENDACIONES
SISTEMA DE DIRECCIÓN															
De Trabajo delanteras							/		/		/				
De trabajo traseras							/		/		/				
Direccionales Del. Y Traseras							/		/		/				
Stop Traseros							/		/		/				
SISTEMA ELECTRICO															
Espejo Retrovisor							/		/		/				
Espejos laterales							/		/		/				
Alarma (o pito) de Retroceso							/		/		/				
Pito Normal							/		/		/				
Switch Encendido							/		/		/				
*** Frenos de Servicio**							/		/		/				
***Freno de emergencia**							/		/		/				
Dirección/suspensión(Terminales)							/		/		/				
Cinturones de Seguridad							/		/		/				
Estado de la puertas							/		/		/				
Vidrio frontal en buen estado							/		/		/				
Limpia brisas							/		/		/				
Extintor (10 lbs) P.Q.S								x		x		x			No tiene
Botiquin Primeros Auxilios								x		x		x			No tiene
Estado de los asientos								x		x		x			Mal estado
***Indicadores (Hidraulico- voltimetro).**							/		/		/				
***Motor- Refrigerante-orometro, aire).**								x		x		x			
*** Velocimetro**							/		/		/				
Bateria y cables							/		/		/				
CARROCERIA															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos								x		x		x			
estado fisico (No lisas).							/		/		/				
MOTOR															
Control de fugas hidráulicas							/		/		/				
*** Estado de correas**							/		/		/				
Caja de cambios en buen estado.							/		/		/				
Radiador							/		/		/				
Tanque de combustible (Abrazaderas soporte)							/		/		/				
Mangueras en general							/		/		/				
Cadena carden							/		/		/				

C= Cumple/NC= No Cumple

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	OPERADOR	SUPERVISOR
NOMBRE:	Hermenegildo Londoño Acosta	Yolieth Ortega V.
FIRMA:	Hermenegildo Londoño Acosta	Yolieth

OBSERVACIONES: No tiene carpa para encarpar las luzes delanteras no prenden

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL EJVC

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL

Código: FOSST-19	
Fecha: Noviembre 21 de 2022	
Versión: 03	Página 1 de 1

OBRA:	Arroyo Platanal	SEMANA DEL:	19-01-26	AL:	24-01-26
INPECCIONADO POR:	Yoleth Ortega V.				
LOCALIZACIÓN:	Soledad	PLACA:	QH1238		
MARCA:	Kodiak	MODELO:	2007	AÑO:	2007

ÍTEM.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		RECOMENDACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
De Trabajo delanteras	/		/		/		/		/		/				
De trabajo traseras	/		/		/		/		/		/				
Direccionales Del. Y Traseras	/		/		/		/		/		/				
Stop Traseros	/		/		/		/		/		/				
Espejo Retrovisor	/		/		/		/		/		/				
Espejos laterales	/		/		/		/		/		/				
Alarma (o pito) de Retroceso	/		/		/		/		/		/				
Pito Normal	/		/		/		/		/		/				
Switch Encendido	/		/		/		/		/		/				
* Frenos de Servicio	/		/		/		/		/		/				
*Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/				
Dirección/suspensión(Terminales)	/		/		/		/		/		/				
Cinturones de Seguridad	/		/		/		/		/		/				
Estado de la puertas	/		/		/		/		/		/				
Vidrio frontal en buen estado	/		/		/		/		/		/				
Limpia brisas	/		/		/		/		/		/				
Extintor (10 lbs) P.Q.S		X		X		X		X		X		X			No tiene
Botiquín Primeros Auxilios		X		X		X		X		X		X			No tiene
Estado de los asientos		X		X		X		X		X		X			Mal Estado
*Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	/		/		/		/		/		/				
*Motor- Refrigerante-orometro, aire).		X		X		X		X		X		X			
* Velocimetro	/		/		/		/		/		/				
Batería y cables	/		/		/		/		/		/				
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X			
estado físico (No fisas).	/		/		/		/		/		/				
Control de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/				
* Estado de correas	/		/		/		/		/		/				
Caja de cambios en buen estado	/		/		/		/		/		/				
Radiador	/		/		/		/		/		/				
Tanque de combustible (Abrazaderas soporte)	/		/		/		/		/		/				
Mangueras en general	/		/		/		/		/		/				
Cadena cardan	/		/		/		/		/		/				

C= Cumple/NC= No Cumple

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	OPERADOR	SUPERVISOR	OBSERVACIONES:
NOMBRE:	Yoleth Ortega V.	Yoleth Ortega V.	No tiene Carpa para Encarpar no tiene Luzes delanteras
FIRMA:	Yoleth Ortega V.	Yoleth	

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023 INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL	Código: FOSST-19 Fecha: Noviembre 21 de 2022 Versión: 03 | Página 1 de 1

OBRA:	Arroyo Platanal	SEMANA DEL:	26-01-26	AL:	31-01-26
INPECCIONADO POR:	Yolith Ortega V.				
LOCALIZACIÓN:	Soledad	PLACA:	QHE238		
MARCA:	Kodiak	MODELO:	2007	AÑO:	2007

ÍTEM	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIER C	MIER NC	JUE C	JUE NC	VIER C	VIER NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC	RECOMENDACIONES
LUCES															
De Trabajo delanteras	/		/		/		/		/		/				
De trabajo traseras	/		/		/		/		/		/				
Direccionales Del. Y Traseras	/		/		/		/		/		/				
Stop Traseros	/		/		/		/		/		/				
SEGURIDAD															
Espejo Retrovisor	/		/		/		/		/		/				
Espejos laterales	/		/		/		/		/		/				
Alarma (o pito) de Retroceso	/		/		/		/		/		/				
Pito Normal	/		/		/		/		/		/				
Switch Encendido	/		/		/		/		/		/				
* Frenos de Servicio	/		/		/		/		/		/				
*Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/				
Dirección/suspensión(Terminales)	/		/		/		/		/		/				
Cinturones de Seguridad	/		/		/		/		/		/				
Estado de la puertas	/		/		/		/		/		/				
Vidrio frontal en buen estado	/		/		/		/		/		/				
Limpia brisas	/		/		/		/		/		/				
Extintor (10 lbs) P.Q.S		X		X		X		X		X		X			No tiene
Botiquín Primeros Auxilios		X		X		X		X		X		X			No tiene
Estado de los asientos		X		X		X		X		X		X			Mal Estado
*Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	/		/		/		/		/		/				
*Motor- Refrigerante-orometro, aire).		X		X		X		X		X		X			
* Velocimetro	/		/		/		/		/		/				
Bateria y cables	/		/		/		/		/		/				
CARROCERIA															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X			
estado fisico (No lisas).	/		/		/		/		/		/				
MOTOR															
Control de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/				
* Estado de correas	/		/		/		/		/		/				
Caja de cambios en buen estado.	/		/		/		/		/		/				
Radiador	/		/		/		/		/		/				
Tanque de combustible (Abrazaderas soporte)	/		/		/		/		/		/				
Mangueras en general	/		/		/		/		/		/				
Cadena cardan	/		/		/		/		/		/				

C= Cumple/NC= No Cumple

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	OPERADOR	SUPERVISOR	OBSERVACIONES:
NOMBRE:	Reynaldo Jaudaco Acosta	Yolith Ortega V.	No tiene carpa para encarpar no tiene luces de lanteras
FIRMA:	Reynaldo Jaudaco Acosta	Yolith	

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023 INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL	Código: FOSST-19 Fecha: Noviembre 21 de 2022 Versión: 03 | Página 1 de 1

OBRA:	Arroyo platanal	SEMANA DEL:	02-02-26	AL:	07-02-26
INPECCIONADO POR:	Yuleth Ortega V.				
LOCALIZACIÓN:	Soledad	PLACA:	QHJ 238		
MARCA:	Kodiak	MODELO:	2007	AÑO:	2007

ÍTEM	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIER C	MIER NC	JUE C	JUE NC	VIER C	VIER NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC	RECOMENDACIONES
De Trabajo delanteras	/		/		/		/		/		/				
De trabajo traseras	/		/		/		/		/		/				
Direccionales Del. Y Traseras	/		/		/		/		/		/				
Stop Traseros	/		/		/		/		/		/				
Espejo Retrovisor	/		/		/		/		/		/				
Espejos laterales	/		/		/		/		/		/				
Alarma (o pito) de Retroceso	/		/		/		/		/		/				
Pito Normal	/		/		/		/		/		/				
Switch Encendido	/		/		/		/		/		/				
* Frenos de Servicio	/		/		/		/		/		/				
*Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/				
Dirección/suspensión(Terminales)	/		/		/		/		/		/				
Cinturones de Seguridad	/		/		/		/		/		/				
Estado de la puertas	/		/		/		/		/		/				
Vidrio frontal en buen estado.	/		/		/		/		/		/				
Limpia brisas	/		/		/		/		/		/				
Extintor (10 lbs) P.Q.S		X		X		X		X		X		X			No tiene
Botiquin Primeros Auxilios		X		X		X		X		X		X			No tiene
Estado de los asientos		X		X		X		X		X		X			Mal estado
*Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	/		/		/		/		/		/				
*Motor- Refrigerante-orometro, aire).		X		X		X		X		X		X			
* Velocimetro	/		/		/		/		/		/				
Bateria y cables	/		/		/		/		/		/				
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X			
estado fisico (No tisas).	/		/		/		/		/		/				
Control de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/				
* Estado de correas	/		/		/		/		/		/				
Caja de cambios en buen estado.	/		/		/		/		/		/				
Radiador	/		/		/		/		/		/				
Tanque de combustible (Abrazaderas soporte)	/		/		/		/		/		/				
Mangueras en general	/		/		/		/		/		/				
Cadena carden	/		/		/		/		/		/				

C= Cumple/NC= No Cumple

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	OPERADOR	SUPERVISOR	OBSERVACIONES:
NOMBRE:	Braulio Jaraba Acosta	Yuleth Ortega V.	No tiene carpa para encarpar las luces delanteras no prenden
FIRMA:	Braulio Jaraba Acosta	Yuleth	

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL PUYO	**CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023** **INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL**	Código: FOSST-19 Fecha: Noviembre 21 de 2022 Versión: 03 | Página 1 de 1

OBRA:	Arroyo platanal	SEMANA DEL:	09-02-26	AL:	14-02-26
INPECCIONADO POR:	Yoliets Ortega V.				
LOCALIZACIÓN:	Soledad	PLACA:	QHJ238		
MARCA:	Kodiak	MODELO:	2007	AÑO:	2007

ÍTEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		RECOMENDACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
LUCES															
De Trabajo delanteras	/		/		/		/		/		/				
De trabajo traseras	/		/		/		/		/		/				
Direccionales Del. Y Traseras	/		/		/		/		/		/				
Stop Traseros	/		/		/		/		/		/				
SEGURIDAD															
Espejo Retrovisor	/		/		/		/		/		/				
Espejos laterales	/		/		/		/		/		/				
Alarma (o pito) de Retroceso	/		/		/		/		/		/				
Pito Normal	/		/		/		/		/		/				
Switch Encendido	/		/		/		/		/		/				
* **Frenos de Servicio**	/		/		/		/		/		/				
*Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/				
Dirección/suspensión(Terminales)	/		/		/		/		/		/				
Cinturones de Seguridad	/		/		/		/		/		/				
Estado de la puertas	/		/		/		/		/		/				
Vidrio frontal en buen estado	/		/		/		/		/		/				
Limpia brisas	/		/		/		/		/		/				
Extintor (10 lbs) P.Q.S		X		X		X	.	X		X	,	X			No tiene
Botiquin Primeros Auxilios		X		X		X		X		X		X			No tiene
Estado de los asientos		X		X		X		X		X		X			Mal estado
*Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	/		/		/		/		/		/				
*Motor- Refrigerante-orometro, aire).		X		X		X		X		X		X			
* Velocimetro	/		/		/		/		/		/				
Bateria y cables	/		/		/		/		/		/				
CARROCERIA															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X			
estado fisico (No fisas).	/		/		/		/		/		/				
MOTOR															
Control de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/				
* Estado de correas	/		/		/		/		/		/				
Caja de cambios en buen estado.	/		/		/		/		/		/				
Radiador	/		/		/		/		/		/				
Tanque de combustible (Abrazaderas soporte)	/		/		/		/		/		/				
Mangueras en general	/		/		/		/		/		/				
Cadena cardan	/		/		/		/		/		/				

C= Cumple/NC= No Cumple

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	OPERADOR	SUPERVISOR	OBSERVACIONES:
NOMBRE:		Yoliets Ortega V.	No tiene carga para encartar las luzes delanteras no prenden
FIRMA:		Yoliets	

AURORA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FSST - INSP - 14	
	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	FECHA	VERSIÓN
		3/03/2025	1

Nombre del proyecto: Consorio Canalización arroyo el Platanal

Nombre del conductor: Holys Rodriguez | Cédula: | ARL: Colmena | EPS: Salud total | N° lic. Conducción: | AFP:

Marca: Doosan | Modelo: 340 lcv | Tecnicomecánica vigente | SI | NO | NA | N° Seguro:

Kilometraje u horómetro del inicio de la semana o actividad: [ ] | Kilometraje u horómetro al finalizar la semana o la actividad: [ ]

Inspeccionado por/cargo: | Cedula:

Fechas de la semana: desde el día 15 del mes 01 Hasta el día 17 del mes 01 del año 20 26 | N° De Tarjeta de propiedad:

Lugar o área de producción:

Criterio de cumplimiento buen estado: C: cumple con el requisito, NC: No cumple, N/A: No aplica

Luces de trabajo delanteras				NC	NC	NC
Lueces de trabajo traseras				NC	NC	NC
Tabla de carga en un lugar visible				C	C	C
Espejos laterales				NC	NC	NC
Cinturon de seguridad				C	C	C
Extintor de incendios				C	C	C
Botiquín				NC	NC	NC
Asientos en buen estado				C	C	C
vidrio panoramico en buen estado				C	C	C
Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite de motor)				C C C C	C C C C	C C C C
Control de ingreso de humo (tubo de escape)				C C	C C	C C
Alarma de retroceso-pito				NC	NC	NC
Escaleras y apoyos de acceso				C	NC	C
Bateria y cables				C	C	C
Control de fugas hidraulicas				C	C	C
Estado pasadores				C	C	C
Orugas tensionadas /vena 1/2"				C	C	C
Mecanismos de giro (tornameza)				C	C	C
Corona de tornameza Buen estado				C	C	C
Mandos de avance				C	C	C
Mandos de estacionamiento				C	C	C
Estado general de balde				C	C	C
Mandos de levante de brazo				C	C	C
Mando Final				C	C	C
Cilindros en buen estado				C	C	C
Compartiemiento de motor aseado				C C	C C	C C
Manguera de agua y de alta presion aseado				C	C	C
zapatas				C	C	C
Rodillos superiores e inferiores der				C	C	C
Rodillos superiores e inferiores izq				C	C	C
Otros						
Firma Inspec. SST				Yuliana H.L.R	Yuliana H.L.R	Yuliana H.L.R
Firma Operador						

Aprobado por: Cargo: Firma:

Fuera de servicio: SI NO

OBSERVACIONES: Aire acondicionado Dañado

Alarma Retroceso intermitente

AURORA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FSST - INSP - 14	
	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	FECHA	VERSIÓN
		3/03/2025	1

Nombre del proyecto: Consorcio Canalización arroyo el platanal

Nombre del conductor: Maly Rodriguez | Cedula: | N° lic. Conducción:

ARL: Colmena | EPS: Salud Total | AFP:

Marca: Doosan | Modelo: 340 LCV | Tecnicomecánica vigente: SI / NO / NA | N° Seguro:

Kilometraje u horómetro del inicio de la semana o actividad: [ ] | Kilometraje u horómetro al finalizar la semana o la actividad: [ ]

Inspeccionado por/cargo: | Cedula:

Fechas de la semana: desde el día 19 del mes 01 Hasta el día 01 del mes 24 del año 20 26 | N° De Tarjeta de propiedad:

Lugar o área de producción:

Criterio de cumplimiento buen estado: C: cumple con el requisito, NC: No cumple, N/A: No aplica

Luces de trabajo delanteras	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Lueces de trabajo traseras	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Tabla de carga en un lugar visible	C	C	C	C	C	C
Espejos laterales	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cinturon de seguridad	C	C	C	C	C	C
Extintor de incendios	C	C	C	C	C	C
Botiquín	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Asientos en buen estado	C	C	C	C	C	C
vidrio panoramico en buen estado	C	C	C	C	C	C
Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite de motor)	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C
Control de ingreso de humo (tubo de escape)	C C	C C	C C	C C	C C	C C
Alarma de retroceso-pito	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Escaleras y apoyos de acceso	C	C	C	C	C	C
Bateria y cables	C	C	C	C	C	C
Control de fugas hidraulicas	C	C	C	C	C	C
Estado pasadores	C	C	C	C	C	C
Orugas tensionadas /vena 1/2"	C	C	C	C	C	C
Mecanismos de giro (tornameza)	C	C	C	C	C	C
Corona de tornameza Buen estado	C	C	C	C	C	C
Mandos de avance	C	C	C	C	C	C
Mandos de estacionamiento	C	C	C	C	C	C
Estado general de balde	C	C	C	C	C	C
Mandos de levante de brazo	C	C	C	C	C	C
Mando Final	C	C	C	C	C	C
Cilindros en buen estado	C	C	C	C	C	C
Compartiemiento de motor aseado	C	C	C	C	C	C
Manguera de agua y de alta presion aseado	C C	C C	C C	C C	C C	C C
zapatas	C	C	C	C	C	C
Rodillos superiores e inferiores der	C	C	C	C	C	C
Rodillos superiores e inferiores izq	C	C	C	C	C	C
Otros	C	C	C	C	C	C
Firma Inspec. SST	Yulieht	Yulieht	Yulieht	Yulieht	Yulieht	Yulieht
Firma Operador	MalyR	MalyR	MalyR	MalyR	MalyR	MalyR

Aprobado por: Cargo: Firma:

Fuera de servicio: SI NO

OBSERVACIONES: Aire acondicionado Dañado

Alarma Retroceso Dañado

AURORA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FSST - INSP - 14	
	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	FECHA	VERSIÓN
		3/03/2025	1

Nombre del proyecto: Consorcio Canalización arroyo el Platanal

Nombre del conductor: Holy Rodriguez | Cédula: | N° lic. Conducción:

ARL: Colmena | EPS: Salud Total | AFP:

Marca: Doosan | Modelo: 340 LCV | Tecnicomecánica vigente: SI / NO / NA | N° Seguro:

Kilometraje u horómetro del inicio de la semana o actividad: [ ] | Kilometraje u horómetro al finalizar la semana o la actividad: [ ]

Inspeccionado por/cargo: | Cedula:

Fechas de la semana: desde el día 26 del mes 01 Hasta el día 31 del mes 01 del año 20 26 | N° De Tarjeta de propiedad:

Lugar o área de producción:

Criterio de cumplimiento buen estado: C: cumple con el requisito, NC: No cumple, N/A: No aplica

ITEM	SEMANA					
Luces de trabajo delanteras	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Lueces de trabajo traseras	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Tabla de carga en un lugar visible	C	C	C	C	C	C
Espejos laterales	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cinturon de seguridad	C	C	C	C	C	C
Extintor de incendios	C	C	C	C	C	C
Botiquín	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Asientos en buen estado	C	C	C	C	C	C
vidrio panoramico en buen estado	C	C	C	C	C	C
Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite de motor)	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C
Control de ingreso de humo (tubo de escape)	C C	C C	C C	C C	C C	C C
Alarma de retroceso-pito	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Escaleras y apoyos de acceso	C	C	C	C	C	C
Bateria y cables	C	C	C	C	C	C
Control de fugas hidraulicas	C	C	C	C	C	C
Estado pasadores	C	C	C	C	C	C
Orugas tensionadas /vena 1/2"	C	C	C	C	C	C
Mecanismos de giro (tornameza)	C	C	C	C	C	C
Corona de tornameza Buen estado	C	C	C	C	C	C
Mandos de avance	C	C	C	C	C	C
Mandos de estacionamiento	C	C	C	C	C	C
Estado general de balde	C	C	C	C	C	C
Mandos de levante de brazo	C	C	C	C	C	C
Mando Final	C	C	C	C	C	C
Cilindros en buen estado	C	C	C	C	C	C
Compartiemiento de motor aseado	C	C	C	C	C	C
Manguera de agua y de alta presion aseado	C C	C C	C C	C C	C C	C C
zapatas	C	C	C	C	C	C
Rodillos superiores e inferiores der	C	C	C	C	C	C
Rodillos superiores e inferiores izq	C	C	C	C	C	C
Otros	C	C	C	C	C	C
Firma Inspec. SST	Yuliht	Yuliht	Yuliht	Yuliht	Yuliht	Yuliht
Firma Operador	H.yR	H.yR	H.yR	H.yR	H.yR	H.yR

Aprobado por: Cargo: Firma: SI NO

Fuera de servicio: SI NO

OBSERVACIONES: Alarma Retroceso Dañado

Aire acondicionado Dañado

AURORA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FSST - INSP - 14	
	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	FECHA	VERSIÓN
		3/03/2025	1

Nombre del proyecto: Consorcio Canalización Arroyo el Platanal

Nombre del conductor: Maly Rodriguez | Cédula: [illegible] | N° lic. Conducción:

ARL: Colmena | EPS: Salud Total | AFP:

Marca: Doosan | Modelo: 340LCV | Tecnicomecánica vigente | SI | NO | NA | N° Seguro:

Kilometraje u horómetro del inicio de la semana o actividad: [ ] | Kilometraje u horómetro al finalizar la semana o la actividad: [ ]

Inspeccionado por/cargo: | Cedula:

Fechas de la semana: desde el día 02 del mes 02 Hasta el día 07 del mes 02 del año 20 26 | N° De Tarjeta de propiedad:

Lugar o área de producción:

Criterio de cumplimiento buen estado: C: cumple con el requisito, NC: No cumple, N/A: No aplica

Luces de trabajo delanteras	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Lueces de trabajo traseras	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Tabla de carga en un lugar visible	C	C	C	C	C	C
Espejos laterales	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cinturon de seguridad	C	C	C	C	C	C
Extintor de incendios	C	C	C	C	C	C
Botiquín	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Asientos en buen estado	C	C	C	C	C	C
vidrio panoramico en buen estado	C	C	C	C	C	C
Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite de motor)	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C
Control de ingreso de humo (tubo de escape)	C C	C C	C C	C C	C C	C C
Alarma de retroceso-pito	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Escaleras y apoyos de acceso	C	C	C	C	C	C
Bateria y cables	C	C	C	C	C	C
Control de fugas hidraulicas	C	C	C	C	C	C
Estado pasadores	C	C	C	C	C	C
Orugas tensionadas /vena 1/2"	C	C	C	C	C	C
Mecanismos de giro (tornameza)	C	C	C	C	C	C
Corona de tornameza Buen estado	C	C	C	C	C	C
Mandos de avance	C	C	C	C	C	C
Mandos de estacionamiento	C	C	C	C	C	C
Estado general de balde	C	C	C	C	C	C
Mandos de levante de brazo	C	C	C	C	C	C
Mando Final	C	C	C	C	C	C
Cilindros en buen estado	C	C	C	C	C	C
Compartiemiento de motor aseado	C	C	C	C	C	C
Manguera de agua y de alta presion aseado	C C	C C	C C	C C	C C	C C
zapatas	C	C	C	C	C	C
Rodillos superiores e inferiores der	C	C	C	C	C	C
Rodillos superiores e inferiores izq	C	C	C	C	C	C
Otros	C	C	C	C	C	C
Firma Inspec. SST	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]
Firma Operador	M.yR	M.yR	M.yR	M.yR.	M.yR.	M.yR.

Aprobado por: Cargo: Firma:

Fuera de servicio: SI NO

OBSERVACIONES: Alt Dañado, Alarma Dañado

AURORA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FSST - INSP - 14	
	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	FECHA	VERSIÓN
		3/03/2025	1

Nombre del proyecto: Consorcio canalización arroyo el Platano

Nombre del conductor:	Mdy Rodriguez	Cédula:		N° lic. Conducción:				AFP
		ARL: Colmena		EPS: Salud total				
Marca: Doosan	Modelo: 34 lcv	Tecnicomecánica vigente	SI	NO	NA	N° Seguro		

Kilometraje u horómetro del inicio de la semana o actividad: [ ] Kilometraje u horómetro al finalizar la semana o la actividad: [ ]

Inspeccionado por/cargo: Cedula:

Fechas de la semana: desde el día 09 del mes 02 Hasta el día 14 del mes 02 del año 20 26 N° De Tarjeta de propiedad:

Lugar o área de producción:

Criterio de cumplimiento buen estado: C: cumple con el requisito, NC: No cumple, N/A: No aplica

ITEM	LUNES C / NC / NA	MARTES C / NC / NA	MIERCOLES C / NC / NA	JUEVES C / NC / NA	VIERNES C / NC / NA	SABADO C / NC / NA	DOMINGO C / NC / NA
Luces de trabajo delanteras	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
Lueces de trabajo traseras	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
Tabla de carga en un lugar visible	C	C	C	C	C	C	
Espejos laterales	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
Cinturon de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Extintor de incendios	C	C	C	C	C	C	
Botiquín	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
Asientos en buen estado	C	C	C	C	C	C	
vidrio panoramico en buen estado	C	C	C	C	C	C	
Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite de motor)	CC C C	CC CC	CC CC	CC CC	CC CC	CC CC	
Control de ingreso de humo (tubo de escape)	CC	CC	CC	CC	CC	CC	
Alarma de retroceso-pito	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
Escaleras y apoyos de acceso	C	C	C	C	C	C	
Bateria y cables	C	C	C	C	C	C	
Control de fugas hidraulicas	C	C	C	C	C	C	
Estado pasadores	C	C	C	C	C	C	
Orugas tensionadas /vena 1/2"	C	C	C	C	C	C	
Mecanismos de giro (tornameza)	C	C	C	C	C	C	
Corona de tornameza Buen estado	C	C	C	C	C	C	
Mandos de avance	C	C	C	C	C	C	
Mandos de estacionamiento	C	C	C	C	C	C	
Estado general de balde	C	C	C	C	C	C	
Mandos de levante de brazo	C	C	C	C	C	C	
Mando Final	C	C	C	C	C	C	
Cilindros en buen estado	C	C	C	C	C	C	
Compartiemiento de motor aseado	C	C	C	C	C	C	
Manguera de agua y de alta presion aseado	CC	CC	CC	CC	CC	CC	
zapatas	C	C	C	C	C	C	
Rodillos superiores e inferiores der	C	C	C	C	C	C	
Rodillos superiores e inferiores izq	C	C	C	C	C	C	
Otros:	C	C	C	C	C	C	
Firma Inspec. SST							
Firma Operador	M.d.y R	M.d.y R	M.d.y R	M.d.y R	M.d.y R	M.d.y R	

Aprobado por: Cargo: Firma:

Fuera de servicio: SI NO

OBSERVACIONES: Luz Dañado. Alarma Dañado

AURORA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FSST - INSP - 14	
	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	FECHA	VERSIÓN
		3/03/2025	1

Nombre del proyecto: Consorcio Capalización Arroyo el Platanal

Nombre del conductor: Abel Martinez | Cédula: | N° lic. Conducción:

ARL: Colmena | EPS: Sura | AFP:

Marca: Komatsu | Modelo: 220 pc | Tecnicomecánica vigente: SI / NO / NA | N° Seguro:

Kilometraje u horómetro del inicio de la semana o actividad: [ ] | Kilometraje u horómetro al finalizar la semana o la actividad: [ ]

Inspeccionado por/cargo: | Cedula:

Fechas de la semana: desde el día 15 del mes 01 Hasta el día 17 del mes 01 del año 2026 | N° De Tarjeta de propiedad:

Lugar o área de producción:

Criterio de cumplimiento buen estado: C: cumple con el requisito, NC: No cumple, N/A: No aplica

| | | |

AURORA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FSST - INSP - 14	
	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	FECHA	VERSIÓN
		3/03/2025	1

Nombre del proyecto: Consorcio Canalizacion arroyo el platanal

Nombre del conductor:	Abel Martinez	Cédula:			N° lic. Conducción:		
		ARL: Colmena		EPS: S. total		AFP:	
Marca: Komatzu	Modelo: 220 pc	Tecnicomecánica vigente	SI	NO	NA	N° Seguro	

Kilometraje u horómetro del inicio de la semana o actividad: [ ] Kilometraje u horómetro al finalizar la semana o la actividad: [ ]

Inspeccionado por/cargo: Cedula:

Fechas de la semana: desde el día 19 del mes 01 Hasta el día 24 del mes 01 del año 20 25 N° De Tarjeta de propiedad:

Lugar o área de producción:

Criterio de cumplimiento buen estado: C: cumple con el requisito, NC: No cumple, N/A: No aplica

Luces de trabajo delanteras	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Lueces de trabajo traseras	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Tabla de carga en un lugar visible	C	C	C	C	C	C
Espejos laterales	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cinturon de seguridad	C	C	C	C	C	C
Extintor de incendios	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Botiquin	C	C	C	C	C	C
Asientos en buen estado	C	C	C	C	C	C
vidrio panoramico en buen estado	C	C	C	C	C	C
Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite de motor)	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C
Control de ingreso de humo (tubo de escape)	C C	C C	C C	C C	C C	C C
Alarma de retroceso-pito	C	C	C	C	C	C
Escaleras y apoyos de acceso	C	C	C	C	C	C
Bateria y cables	C	C	C	C	C	C
Control de fugas hidraulicas	C	C	C	C	C	C
Estado pasadores	C	C	C	C	C	C
Orugas tensionadas /vena 1/2"	C	C	C	C	C	C
Mecanismos de giro (tornameza)	C	C	C	C	C	C
Corona de tornameza Buen estado	C	C	C	C	C	C
Mandos de avance	C	C	C	C	C	C
Mandos de estacionamiento	C	C	C	C	C	C
Estado general de balde	C	C	C	C	C	C
Mandos de levante de brazo	C	C	C	C	C	C
Mando Final	C	C	C	C	C	C
Cilindros en buen estado	C	C	C	C	C	C
Compartiemiento de motor aseado	C	C	C	C	C	C
Manguera de agua y de alta presion aseado	C C	C C	C C	C C	C C	C C
zapatas	C	C	C	C	C	C
Rodillos superiores e inferiores der	C	C	C	C	C	C
Rodillos superiores e inferiores izq	C	C	C	C	C	C
Otros	C	C	C	C	C	C
Firma Inspec. SST						
Firma Operador	Abel M.	Abel M.	Abel M.	Abel M.	Abel M.	Abel M.

Aprobado por: Cargo: Firma:

Fuera de servicio: SI NO

OBSERVACIONES: Aire Acondicionado Danado
Alarma Retroceso intermitente

AURORA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FSST - INSP - 14	
	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	FECHA	VERSIÓN
		3/03/2025	1

Nombre del proyecto: Consorcio Canalizacion arroyo el platanal

Nombre del conductor: Abel Martinez | Cédula: | N° lic. Conducción:

ARL: Colmena | EPS: S. TOTAL | AFP:

Marca: Komatzu | Modelo: 220 PC | Tecnicomecánica vigente | SI | NO | NA | N° Seguro

Kilometraje u horómetro del inicio de la semana o actividad: [ ] | Kilometraje u horómetro al finalizar la semana o la actividad: [ ]

Inspeccionado por/cargo: | Cedula:

Fechas de la semana: desde el día 26 del mes 01 Hasta el día 31 del mes 01 del año 2026 | N° De Tarjeta de propiedad:

Lugar o área de producción:

Criterio de cumplimiento buen estado: C: cumple con el requisito, NC: No cumple, N/A: No aplica

Luces de trabajo delanteras	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Lueces de trabajo traseras	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Tabla de carga en un lugar visible	C	C	C	C	C	C
Espejos laterales	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cinturon de seguridad	C	C	C	C	C	C
Extintor de incendios	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Botiquin	C	C	C	C	C	C
Asientos en buen estado	C	C	C	C	C	C
vidrio panoramico en buen estado	C	C	C	C	C	C
Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite de motor)	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C
Control de ingreso de humo (tubo de escape)	C C	C C	C C	C C	C C	C C
Alarma de retroceso-pito	C	C	C	C	C	C
Escaleras y apoyos de acceso	C	C	C	C	C	C
Bateria y cables	C	C	C	C	C	C
Control de fugas hidraulicas	C	C	C	C	C	C
Estado pasadores	C	C	C	C	C	C
Orugas tensionadas /vena 1/2"	C	C	C	C	C	C
Mecanismos de giro (tornameza)	C	C	C	C	C	C
Corona de tornameza Buen estado	C	C	C	C	C	C
Mandos de avance	C	C	C	C	C	C
Mandos de estacionamiento	C	C	C	C	C	C
Estado general de balde	C	C	C	C	C	C
Mandos de levante de brazo	C	C	C	C	C	C
Mando Final	C	C	C	C	C	C
Cilindros en buen estado	C	C	C	C	C	C
Compartiemiento de motor aseado	C	C	C	C	C	C
Manguera de agua y de alta presion aseado	C C	C C	C C	C C	C C	C C
zapatas	C	C	C	C	C	C
Rodillos superiores e inferiores der	C	C	C	C	C	C
Rodillos superiores e inferiores izq	C	C	C	C	C	C
Otros	C	C	C	C	C	C
Firma Inspec. SST	Yulieht	Yulieht	Yulieht	Yulieht	Yulieht	Yulieht
Firma Operador	Abel M.	Abel M.	Abel M.	Abel M.	Abel M.	Abel M.

Aprobado por: Cargo: Firma:

Fuera de servicio: SI NO

OBSERVACIONES: Aire acondicionado Danado

Plarma Retroceso intermitente

AURORA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FSST - INSP - 14	
	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	FECHA	VERSIÓN
		3/03/2025	1

Nombre del proyecto: Consorcio Canalización arroyo el Platanal

Nombre del conductor: Abel Hortnez | Cédula: | N° lic. Conducción:

ARL: colmena | EPS: Salud total | AFP:

Marca: Komatzu | Modelo: 220 pc | Tecnicomecánica vigente | SI | NO | NA | N° Seguro:

Kilometraje u horómetro del inicio de la semana o actividad: [ ] | Kilometraje u horómetro al finalizar la semana o la actividad: [ ]

Inspeccionado por/cargo: | Cedula:

Fechas de la semana: desde el día 02 del mes 02 Hasta el día 07 del mes 02 del año 20 26 | N° De Tarjeta de propiedad:

Lugar o área de producción:

Criterio de cumplimiento buen estado: C: cumple con el requisito, NC: No cumple, N/A: No aplica

Luces de trabajo delanteras	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Lueces de trabajo traseras	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Tabla de carga en un lugar visible	C	C	C	C	C	C
Espejos laterales	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cinturon de seguridad	C	C	C	C	C	C
Extintor de incendios	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Botiquín	C	C	C	C	C	C
Asientos en buen estado	C	C	C	C	C	C
vidrio panoramico en buen estado	C	C	C	C	C	C
Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite de motor)	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C
Control de ingreso de humo (tubo de escape)	C C	C C	C C	C C	C C	C C
Alarma de retroceso-pito	C	C	C	C	C	C
Escaleras y apoyos de acceso	C	C	C	C	C	C
Bateria y cables	C	C	C	C	C	C
Control de fugas hidraulicas	C	C	C	C	C	C
Estado pasadores	C	C	C	C	C	C
Orugas tensionadas /vena 1/2"	C	C	C	C	C	C
Mecanismos de giro (tornameza)	C	C	C	C	C	C
Corona de tornameza Buen estado	C	C	C	C	C	C
Mandos de avance	C	C	C	C	C	C
Mandos de estacionamiento	C	C	C	C	C	C
Estado general de balde	C	C	C	C	C	C
Mandos de levante de brazo	C	C	C	C	C	C
Mando Final	C	C	C	C	C	C
Cilindros en buen estado	C	C	C	C	C	C
Compartiemiento de motor aseado	C	C	C	C	C	C
Manguera de agua y de alta presion aseado	C C	C C	C C	C C	C C	C C
zapatas	C	C	C	C	C	C
Rodillos superiores e inferiores der	C	C	C	C	C	C
Rodillos superiores e inferiores izq	C	C	C	C	C	C
Otros	C	C	C	C	C	C
Firma Inspec. SST	Yulieht	Yulieht	Yulieht	Yulieht	Yulieht	Yulieht
Firma Operador	AbdM.	AbdM.	AbdM.	AbdM.	AbdM.	AbdM.

Aprobado por: Cargo: Firma:

Fuera de servicio: SI NO

OBSERVACIONES: Aire Acondicionado intermitente Dañado
Alarma Retroceso intermitente

AURORA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FSST - INSP - 14	
	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	FECHA	VERSIÓN
		3/03/2025	1

Nombre del proyecto: Consorcio Canalizacion arroyo el platanal

Nombre del conductor: Abel Martinez | Cedula: | N° lic. Conducción:

ARL: Colmena | EPS: Salud total | AFP:

Marca: Komatzu | Modelo: PC220 | Tecnicomecánica vigente | SI | NO | NA | N° Seguro:

Kilometraje u horómetro del inicio de la semana o actividad: [ ] | Kilometraje u horómetro al finalizar la semana o la actividad: [ ]

Inspeccionado por/cargo: | Cedula:

Fechas de la semana: desde el día 09 del mes 02 Hasta el día 14 del mes 02 del año 26 | N° De Tarjeta de propiedad:

Lugar o área de producción:

Criterio de cumplimiento buen estado: C: cumple con el requisito, NC: No cumple, N/A: No aplica

Luces de trabajo delanteras	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Luces de trabajo traseras	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Tabla de carga en un lugar visible	C	C	C	C	C	C
Espejos laterales	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cinturon de seguridad	C	C	C	C	C	C
Extintor de incendios	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Botiquín	C	C	C	C	C	C
Asientos en buen estado	C	C	C	C	C	C
vidrio panoramico en buen estado	C	C	C	C	C	C
Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite de motor)	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C
Control de ingreso de humo (tubo de escape)	C C	C C	C C	C C	C C	C C
Alarma de retroceso-pito	C	C	C	C	C	C
Escaleras y apoyos de acceso	C	C	C	C	C	C
Bateria y cables	C	C	C	C	C	C
Control de fugas hidraulicas	C	C	C	C	C	C
Estado pasadores	C	C	C	C	C	C
Orugas tensionadas /vena 1/2"	C	C	C	C	C	C
Mecanismos de giro (tornameza)	C	C	C	C	C	C
Corona de tornameza Buen estado	C	C	C	C	C	C
Mandos de avance	C	C	C	C	C	C
Mandos de estacionamiento	C	C	C	C	C	C
Estado general de balde	C	C	C	C	C	C
Mandos de levante de brazo	C	C	C	C	C	C
Mando Final	C	C	C	C	C	C
Cilindros en buen estado	C	C	C	C	C	C
Compartiemiento de motor aseado	C	C	C	C	C	C
Manguera de agua y de alta presion aseado	C C	C C	C C	C C	C C	C C
zapatas	C	C	C	C	C	C
Rodillos superiores e inferiores der	C	C	C	C	C	C
Rodillos superiores e inferiores izq	C	C	C	C	C	C
Otros	C	C	C	C	C	C
Firma Inspec. SST						
Firma Operador	Abel M.	Abel M.	Abel M.	Abel M.	Abel M.	Abel M.

Aprobado por: Cargo: Firma:

Fuera de servicio: SI NO

OBSERVACIONES: Aire acondicionado Dañado
Alarma Retroceso intermitente

AURORA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FSST - INSP - 14	
	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	FECHA	VERSIÓN
		3/03/2025	1

Nombre del proyecto: Consorcio Canalizacion arroyo el platanal

Nombre del conductor: Luis Matute | Cedula: | N° lic. Conducción:

ARL: | EPS: | AFP:

Marca: Doosan | Modelo: 340 LCV | Tecnicomecánica vigente: SI NO NA | N° Seguro:

Kilometraje u horómetro del inicio de la semana o actividad: [ ] | Kilometraje u horómetro al finalizar la semana o la actividad: [ ]

Inspeccionado por/cargo: | Cedula:

Fechas de la semana: desde el día 09 del mes 02 Hasta el día 14 del mes 02 del año 20 26 | N° De Tarjeta de propiedad:

Lugar o área de producción:

Criterio de cumplimiento buen estado: C: cumple con el requisito, NC: No cumple. N/A: No aplica

	LUNES C / NC / N/A	MARTES C / NC / N/A	MIERCOLES C / NC / N/A	JUEVES C / NC / N/A	VIERNES C / NC / N/A	SABADO C / NC / N/A
Luces de trabajo delanteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Lueces de trabajo traseras	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Tabla de carga en un lugar visible	c	c	c	c	c	c
Espejos laterales	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Cinturon de seguridad	c	c	c	c	c	c
Extintor de incendios	c	c	n	c	c	c
Botiquín	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Asientos en buen estado	c	c	c	c	c	c
vidrio panoramico en buen estado	c	c	c	c	c	c
Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite de motor)	c c	c c	c c	c c	c c	c c
Control de ingreso de humo (tubo de escape)	c c	c c	c c	c c	c c	c c
Alarma de retroceso-pito	c c	c c	c c	c c	c c	c c
Escaleras y apoyos de acceso	c	c	c	c	c	c
Bateria y cables	c	c	c	c	c	c
Control de fugas hidraulicas	c	c	c	c	c	c
Estado pasadores	c	c	c	c	c	c
Orugas tensionadas /vena 1/2"	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Mecanismos de giro (tornameza)	c	c	c	c	c	c
Corona de tornameza Buen estado	c	c	c	c	c	c
Mandos de avance	c	c	c	c	c	c
Mandos de estacionamiento	c	c	c	c	c	c
Estado general de balde	c	c	c	c	c	c
Mandos de levante de brazo	c	c	c	c	c	c
Mando Final	c	c	c	c	c	c
Cilindros en buen estado	c	c	c	c	c	c
Compartiemiento de motor aseado	c	c	c	c	c	c
Manguera de agua y de alta presion aseado	c c	c c	c c	c c	c c	c c
zapatas	c	c	c	c	c	c
Rodillos superiores e inferiores der	c	c	c	c	c	c
Rodillos superiores e inferiores izq	c	c	c	c	c	c
Otros	c	c	c	c	c	c
Firma Inspec. SST	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi	Yuleidi
Firma Operador	Luis M.	Luis M.	Luis M.	Luis M.	Luis M.	Luis M.

Aprobado por: Yuleidi Ortega V. Cargo: SST Firma:

Fuera de servicio: SI NO

OBSERVACIONES: Vidrios laterales en mal estado

AURORA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FSST - INSP - 14	
	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	FECHA	VERSIÓN
		3/03/2025	1

Nombre del proyecto: Consorcio canalización arroyo el Platanal.

Nombre del conductor: Luis Mateo | Cédula: 1.128.074.193 | N° lic. Conducción:

ARL: 1.128.074.193 | EPS: | AFP:

Marca: Doosan | Modelo: 340 LCV | Tecnicomecánica vigente | SI | NO | NA | N° Seguro:

Kilometraje u horómetro del inicio de la semana o actividad: [ ] | Kilometraje u horómetro al finalizar la semana o la actividad: [ ]

Inspeccionado por/cargo: | Cedula:

Fechas de la semana: desde el día 02 del mes 02 Hasta el día 07 del mes 02 del año 20 26 | N° De Tarjeta de propiedad:

Lugar o área de producción:

Criterio de cumplimiento buen estado: C: cumple con el requisito, NC: No cumple, N/A: No aplica

	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
Luces de trabajo delanteras	nc		nc		nc		nc		nc		nc	
Lueces de trabajo traseras	nc		nc		nc		nc		nc		nc	
Tabla de carga en un lugar visible	c		c		c		c		c		c	
Espejos laterales	nc		nc		nc		nc		nc		nc	
Cinturon de seguridad	c		c		c		c		c		c	
Extintor de incendios	c		c		c		c		c		c	
Botiquín	nc		nc		nc		nc		nc		nc	
Asientos en buen estado			c		c		c		c		c	
vidrio panoramico en buen estado	c		c		c		c		c		c	
Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite de motor)	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
Control de ingreso de humo (tubo de escape)	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
Alarma de retroceso-pito	c	c	c	c	c		c		c		c	
Escaleras y apoyos de acceso		c	c			c	c		c		c	
Bateria y cables	c			c	c		c		c		c	
Control de fugas hidraulicas		c	c			c	c		c		c	
Estado pasadores	c			c	c		c		c		c	
Orugas tensionadas /vena 1/2"	nc		nc		nc		nc			c		c
Mecanismos de giro (tornameza)	c			c	c		c		c			c
Corona de tornameza Buen estado		c	c			c	c		c			c
Mandos de avance	c			c	c		c			c	c	
Mandos de estacionamiento		c	c			c	c		c			c
Estado general de balde	c			c	c		c			c	c	
Mandos de levante de brazo		c	c			c	c		c			c
Mando Final	c			c	c		c			c	c	
Cilindros en buen estado		c	c			c	c		c			c
Compartiemiento de motor aseado	c			c	c		c			c	c	
Manguera de agua y de alta presion aseado	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
zapatas		c		c		c		c	c			c
Rodillos superiores e inferiores der		c	c		.c		c			c		c
Rodillos superiores e inferiores izq	c			c		c		c	c			c
Otros		c	c		c		c			c		c
Firma Inspec. SST	Julio H		Julio H		Julio H		Julio H		Julio H		Julio H	
Firma Operador	Cap16		Cap16		Cap16		Cap16		Cap16		Cap16	

Aprobado por: Cargo: Firma:

Fuera de servicio: SI NO

OBSERVACIONES: Vidrios laterales en mal estado

AURORA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FSST - INSP - 14	
	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	FECHA	VERSIÓN
		3/03/2025	1

Nombre del proyecto: Consorio canalizacion arroyo el Platanal

Nombre del conductor: Luis Matute | Cédula: 1.128 054 193 | N° lic. Conducción:

ARL: Colmena | EPS: S. Total | AFP:

Marca: Doosan | Modelo: 340 LCV | Tecnicomecánica vigente | SI | NO | NA | N° Seguro:

Kilometraje u horómetro del inicio de la semana o actividad: [ ] | Kilometraje u horómetro al finalizar la semana o la actividad: [ ]

Inspeccionado por/cargo: | Cedula:

Fechas de la semana desde el día 26 del mes 01 Hasta el día 31 del mes 01 del año 20 26 | N° De Tarjeta de propiedad:

Lugar o área de producción:

Criterio de cumplimiento buen estado: **C**: cumple con el requisito. **NC**: No cumple. **N/A**: No aplica

ITEM	LUNES C / NC / NA	MARTES C / NC / NA	MIERCOLES C / NC / NA	JUEVES C / NC / NA	VIERNES C / NC / NA	SABADO C / NC / NA	DOMINGO C / NC / NA
Luces de trabajo delanteras	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
Lueces de trabajo traseras	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
Tabla de carga en un lugar visible	C	C	C	C	C	C	
Espejos laterales	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
Cinturon de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Extintor de incendios	C	C	C	C	C	C	
Botiquin	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
Asientos en buen estado	C	C	C	C	C	C	
vidrio panoramico en buen estado	C	C	C	C	C	C	
Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite de motor)	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	
Control de ingreso de humo (tubo de escape)	C C	C C	C C	C C	C C	C C	
Alarma de retroceso-pito	C C	C C	C C	C C	C C	C	
Escaleras y apoyos de acceso	C	C	C	C	C	C	
Bateria y cables	C	C	C	C	C	C	
Control de fugas hidraulicas	C	C	C	C	C	C	
Estado pasadores	C	C	C	C	C	C	
Orugas tensionadas /vena 1/2"	C	C	C	C	C	C	
Mecanismos de giro (tornameza)	C	C	C	C	C	C	
Corona de tornameza Buen estado	C	C	C	C	C	C	
Mandos de avance	C	C	C	C	C	C	
Mandos de estacionamiento	C	C	C	C	C	C	
Estado general de balde	C	C	C	C	C	C	
Mandos de levante de brazo	C	C	C	C	C	C	
Mando Final	C	C	C	C	C	C	
Cilindros en buen estado	C	C	C	C	C	C	
Compartiemiento de motor aseado	C	C	C	C	C	C	
Manguera de agua y de alta presion aseado	C C	C C	C C	C C	C C	C C	
zapatas	C	C	C	C	C	C	
Rodillos superiores e inferiores der	C	C	C	C	C	C	
Rodillos superiores e inferiores izq	C	C	C	C	C	C	
Otros:	C	C	C	C	C	C	
Firma Inspec. SST	Yuliht	Yuliht	Yuliht	Yuliht	Yuliht	Yuliht	
Firma Operador	Luis G.	Luis G.	Luis G.	Luis G.	Luis G.	Luis G.	

Aprobado por: Cargo: Firma:

Fuera de servicio: SI NO

OBSERVACIONES: Vidrios laterales en mal estado

AURORA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FSST - INSP - 14	
	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	FECHA	VERSIÓN
		3/03/2025	1

Nombre del proyecto: Consorcio Canalización arroyo el Platanal.

Nombre del conductor: Luis C. Matute G. | Cédula: 1.123.054193 | N° lic. Conducción:

ARL: Colmena | EPS: Salud total | AFP:

Marca: Doosan | Modelo: 340 LCV | Tecnicomecánica vigente | SI | NO | NA | N° Seguro:

Kilometraje u horómetro del inicio de la semana o actividad: [ ] | Kilometraje u horómetro al finalizar la semana o la actividad: [ ]

Inspeccionado por/cargo: | Cedula:

Fechas de la semana: desde el día 19 del mes 01 Hasta el día 24 del mes 01 del año 20 26 | N° De Tarjeta de propiedad:

Lugar o área de producción:

Criterio de cumplimiento buen estado: C: cumple con el requisito, NC: No cumple, N/A: No aplica

Luces de trabajo delanteras	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Lueces de trabajo traseras	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Tabla de carga en un lugar visible	c	c	c	c	c	c
Espejos laterales	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Cinturon de seguridad	c	c	c	c	c	c
Extintor de incendios	c	c	c	c	c	c
Botiquín	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Asientos en buen estado	c	c	c	c	c	c
vidrio panoramico en buen estado	c	c	c	c	c	c
Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-acelte de motor)	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c	c c c
Control de ingreso de humo (tubo de escape)	c c	c c	c c	c c	c c	c c
Alarma de retroceso-pito	c c	c c	c c	c c	c c	c c
Escaleras y apoyos de acceso	c	c	c	c	c	c
Bateria y cables	c	c	c	c	c	c
Control de fugas hidraulicas	c	c	c	c	c	c
Estado pasadores	c	c	c	c	c	c
Orugas tensionadas /vena 1/2"	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Mecanismos de giro (tornameza)	c	c	c	c	c	c
Corona de tornameza Buen estado	c	c	c	c	c	c
Mandos de avance	c	c	c	c	c	c
Mandos de estacionamiento	c	c	c	c	c	c
Estado general de balde	c	c	c	c	c	c
Mandos de levante de brazo	c	c	c	c	c	c
Mando Final	c	c	c	c	c	c
Cilindros en buen estado	c	c	c	c	c	c
Compartiemiento de motor aseado	c	c	c	c	c	c
Manguera de agua y de alta presion aseado	c c	c c	c c	c c	c c	c c
zapatas	c	c	c	c	c	c
Rodillos superiores e inferiores der	c	c	c	c	c	c
Rodillos superiores e inferiores izq	c	c	c	c	c	c
Otros	c	c	c	c	c	c
Firma Inspec. SST	Julieth Cuy16	Julieth Cuy16	Julieth Cuy16	Julieth Cuy16	Julieth Cuy16	Julieth Cuy16
Firma Operador	Cuy16	Cuy16	Cuy16	Cuy16	Cuy16	Cuy16

Aprobado por: Cargo: Firma:

Fuera de servicio: SI NO

OBSERVACIONES: Vidrios laterales en mal estado

AURORA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FSST - INSP - 14	
	PREOPERACIONAL RETRO EXCAVADORA	FECHA	VERSIÓN
		3/03/2025	1

Nombre del proyecto: Consorcio Canalizacion arroyo el Platanal

Nombre del conductor: Luis Matute | Cedula: 1.128.054.773 | N° lic. Conducción:

ARL: Colmena | EPS: Salud total | AFP:

Marca: Doosan | Modelo: 340 lcv | Tecnicomecánica vigente | SI | NO | NA | N° Seguro:

Kilometraje u horómetro del inicio de la semana o actividad: [ ] | Kilometraje u horómetro al finalizar la semana o la actividad: [ ]

Inspeccionado por/cargo: | Ceduta:

Fechas de la semana: desde el día 15 del mes 01 Hasta el día 17 del mes 01 del año 20 26 | N° De Tarjeta de propiedad:

Lugar o área de producción:

Criterio de cumplimiento buen estado: C: cumple con el requisito, NC: No cumple, N/A: No aplica

Luces de trabajo delanteras				ne	nc	nc
Lueces de trabajo traseras				ne	nc	ne
Tabla de carga en un lugar visible				c	c	c
Espejos laterales				nc	nc	nc
Cinturon de seguridad				c	c	c
Extintor de incendios				ne	nc	nc
Botiquín				c	c	c
Asientos en buen estado				c	c	c
vidrio panoramico en buen estado				c	c	c
Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite de motor)				c c e e	c c c c	c c c c
Control de ingreso de humo (tubo de escape)				e c	c c	c c
Alarma de retroceso-pito				e	c	e
Escaleras y apoyos de acceso				c	c	c
Bateria y cables				c	c	c
Control de fugas hidraulicas				c	c	c
Estado pasadores				c	c	c
Orugas tensionadas /vena 1/2"				ne	nc	ne
Mecanismos de giro (tornameza)				c	c	e
Corona de tornameza Buen estado				c	c	c
Mandos de avance				c	n	n
Mandos de estacionamiento				e	c	c
Estado general de balde				c	c	c
Mandos de levante de brazo				c	c	c
Mando Final				c	c	c
Cilindros en buen estado				c	c	e
Compartiemiento de motor aseado				c	c	c
Manguera de agua y de alta presion aseado				c c	c c	c c
zapatas				c	c	c
Rodillos superiores e inferiores der				e	c	c
Rodillos superiores e inferiores izq				c	c	c
Otros				c	c	c
Firma Inspec. SST				Yulieth Cuello	Yulieth Cuello	Yulieth Cuello
Firma Operador						

Aprobado por: Cargo: Firma:

Fuera de servicio: SI NO

OBSERVACIONES:

Vidrios laterales en mal estado

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Código: FOSST-19
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL	Fecha: Noviembre 21 de 2022
	Versión: 03 — Página 1 de 1

OBRA:	Arroyo platanal	SEMANA DEL:	15-01-26	AL:	17-01-26
INPECCIONADO POR:					
LOCALIZACIÓN:	Soledad	PLACA:	DDA 613		
MARCA:	Kodiak	MODELO:	2007	AÑO:	2007

ÍTEM	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIER C	MIER NC	JUE C	JUE NC	VIER C	VIER NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC	RECOMENDACIONES
Luces de Trabajo delanteras							/		/		/				
Luces de trabajo traseras							/		/		/				
Direccionales Del. Y Traseras							/		/		/				
Stop Traseros							/		/		/				
Espejo Retrovisor							/		/		/				
Espejos laterales							/		/		/				
Alarma (o pito) de Retroceso							/		/		/				
Pito Normal							/		/		/				
Luces encendido.							/		/		/				
Frenos de Servicio							/		/		/				
Freno de emergencia							/		/		/				
Freno/suspensión(Terminales).							/		/		/				
Cinturones de Seguridad							/		/		/				
Cierre de la puertas							/		/		/				
Extintor en buen estado.							/		/		/				
Extintores								X		X		X			No Prenden
Extintor (10 lbs) P.Q.S								X		X		X			No Tiene
Botiquín Primeros Auxilios								X		X		X			No Tiene
Asientos								X		X		X			Mal Estado
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).							/		/		/				
Motor Refrigerante-orometro, aire).								X		X		X			No funciona
Tacometro							/		/		/				
Bornes y cables							/		/		/				
Llantas en buen estado							/		/		/		/		
Llantas Rines (No Rines),							/		/		/				
Sistema de fugas hidraulicas							/		/		/				
Sistema de correas							/		/		/				
Cableado cables en buen estado.							/		/		/				
Pines							/		/		/				
Pasadores Bujes (Almeadoras soporte)							/		/		/				
Observaciones en general							/		/		/				
Limpieza							/		/		/				

C= Cumple/NC= No Cumple

CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	OPERADOR	SUPERVISOR	OBSERVACIONES: Sin Carpa Para encarpar
NOMBRE	Daniel Cifuentes	Yulibeth Ortega V.	
FIRMA		Yulibeth	

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Código: FOSST-19
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL	Fecha: Noviembre 21 de 2022
	Versión: 03 — Página 1 de 1

OBRA:	Arroyo platanal	SEMANA DEL:	19-01-26	AL:	24-01-26
INPECCIONADO POR:					
LOCALIZACIÓN:	Soledad	PLACA:	DDA 613		
MARCA:	Kodiak	MODELO:	2007	AÑO:	2007

ÍTEM	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIER C	MIER NC	JUE C	JUE NC	VIER C	VIER NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC	RECOMENDACIONES
[illegible]															
de Trabajo delanteras	/		/		/		/		/		/				
de trabajo traseras	/		/		/		/		/		/				
[illegible]ales Del. Y Traseras	/		/		/		/		/		/				
Stop Traseros	/		/		/		/		/		/				
[illegible]															
spejo Retrovisor	/		/		/		/		/		/				
[illegible]s laterales	/		/		/		/		/		/				
[illegible]a (o pito) de Retroceso	/		/		/		/		/		/				
to Normal	/		/		/		/		/		/				
[illegible] encendido	/		/		/		/		/		/				
Frenos de Servicio	/		/		/		/		/		/				
[illegible] emergencia	/		/		/		/		/		/				
[illegible]suspensión(Terminales)	/		/		/		/		/		/				
Cinturones de Seguridad	/		/		/		/		/		/				
[illegible]a puertas	/		/		/		/		/		/				
[illegible] nominal en buen estado.		X		X		X	/	X		X	/	X			con una fisura
[illegible]nsas		X		X		X		X		X		X			No funciona
[illegible] (Cbs) P.Q.S		X		X		X		X		X		X			No tiene
[illegible] Primeros Auxilios		X		X		X		X		X		X			No tiene
[illegible]os asientos															
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	/		/		/		/		/		/				
[illegible] Refrigerante-orometro, aire).		X		X		X		X		X		X			No funciona
Odometro	/		/		/		/		/		/				
[illegible]s y cables	/		/		/		/		/		/				
[illegible]															
[illegible]s protegidas y sin abultamientos															
[illegible] (No roes,															
[illegible]															
[illegible] de fugas hidraulicas															
[illegible] en correas															
[illegible]bios en buen estado.															
[illegible]															
[illegible]mbustible (Almeadoras soporte)															
[illegible]ores en general															
[illegible]															

C= Cumple/NC= No Cumple

CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	OPERADOR	SUPERVISOR	OBSERVACIONES:
[illegible]	David Cifuentes.	Yuleth Ortega V.	No tiene carpa para encarpar
[illegible]	David Cifuentes	Yuleth	

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Código: FOSST-19
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL	Fecha: Noviembre 21 de 2022
	Versión: 03 — Página 1 de 1

OBRA:	Arroyo Platanal	SEMANA DEL:	26-01-26	AL:	31-01-26
INPECCIONADO POR:					
LOCALIZACIÓN:	Soledad	PLACA:	DDA 613		
MARCA:	Kodiak	MODELO:	2007	AÑO:	2007

ÍTEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		RECOMENDACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
[illegible]															
Luz Trabajo delanteras	/		/		/		/		/		/				
Luz trabajo traseras	/		/		/		/		/		/				
Direccionales Del. Y Traseras	/		/		/		/		/		/				
Stop Traseros	/		/		/		/		/						
[illegible]															
Espejo Retrovisor	/		/		/		/		/		/				
Espejos laterales	/		/		/		/		/		/				
Alarma (o pito) de Retroceso	/		/		/		/		/		/				
Pito Normal	/		/		/		/		/		/				
Aviso encendido.	/		/		/		/		/		/				
Frenos de Servicio	/		/		/		/		/		/				
Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/				
Amortiguadores/suspensión(Terminales).	/		/		/		/		/		/				
Direccionales de Seguridad	/		/		/		/		/		/				
Seguro de la puertas	/		/		/		/		/		/				
Extintor vigente en buen estado.		X		X		X		X		X		X			Tiene una fisura
Llantas en buenas		X		X		X		X		X		X			No funciona
Extintor (20 lbs) P.Q.S		X		X		X		X		X		X			No tiene
Botiquín Primeros Auxilios		X		X		X		X		X		X			No tiene
Estado de los asientos		X		X		X		X		X		X			Mal Estado
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	/		/		/		/		/		/				
Niveles (Refrigerante-orometro, aire).		X		X		X		X		X		X			No funciona
Horometro	/		/		/		/		/		/				
Pedales y cables	/		/		/		/		/		/				
[illegible]															
Mangueras pinturas y sin abultamientos	/		/		/		/		/		/				
Tuberías (No laxas)	/		/		/		/		/		/				
[illegible]															
Sistema de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/				
Tensión de correas	/		/		/		/		/		/				
Lubricantes en buen estado.	/		/		/		/		/		/				
[illegible]	/		/		/		/		/		/				
[illegible]	/		/		/		/		/		/				
Cilindros en general	/		/		/		/		/		/				
[illegible]	/		/		/		/		/		/				

C= Cumple/NC= No Cumple

ITEM CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	OPERADOR	SUPERVISOR	OBSERVACIONES:
NOMBRE:	David Cifuentes	Yulieth Ortega V.	Sin capa para encarpar
FIRMA:	David	Yulieth	

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023 INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL	Código: FOSST-19 Fecha: Noviembre 21 de 2022 Versión: 03 | Página 1 de 1

OBRA:	Arroyo platanal	SEMANA DEL:	02-02-26	AL:	07-02-26
INPECCIONADO POR:					
LOCALIZACIÓN:	Soledad	PLACA:	DDA 613		
MARCA:	Kodiak	MODELO:	2007	AÑO:	2007

ÍTEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		RECOMENDACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Frenos															
de Trabajo delanteras	/		/		/		/		/		/				
de trabajo traseras	/		/		/		/		/		/				
Bandas Frenales Del. Y Traseras	/		/		/		/		/		/				
stop Traseros	/		/		/		/		/		/				
Equipo															
espejo Retrovisor	/		/		/		/		/		/				
espejos laterales	/		/		/		/		/		/				
Alarma (o pito) de Retroceso	/		/		/		/		/		/				
Pito Normal	/		/		/		/		/		/				
Luces encendido	/		/		/		/		/		/				
Luces de Servicio	/		/		/		/		/		/				
Luces de emergencia	/		/		/		/		/		/				
Luces de suspensión(Terminales).	/		/		/		/		/		/				
Balizas de Seguridad	/		/		/		/		/		/				
Alarma en la puertas	/		/		/		/		/		/				
Extintor Nacional en buen estado.		X		X		X		X		X		X			con una fisura
Limpiabrisas		X		X		X		X		X		X			NO funciona
Extintor (10 lbs) P.Q.S		X		X		X		X		X		X			No tiene
Botiquín Primeros Auxilios		X		X		X		X		X		X			No tiene
Cinturones asientos		X		X		X		X		X		X			Mal Estado
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	/		/		/		/		/		/				
Motor (Refrigerante-orometro, aire).		X		X		X		X		X		X			No funciona
Horometro	/		/		/		/		/		/				
Bornes y cables	/		/												
Estructura															
Estructuras protuberas y sin abultamientos	/		/		/		/		/		/				
Pasadores (No laser)	/		/		/		/		/		/				
Sistema Hidraulico															
Inspección de fugas hidraulicas	/		/		/		/		/		/				
Estado de correas	/		/		/		/		/		/				
Mangueras en buen estado.	/		/		/		/		/		/				
Cilindros	/		/		/		/		/		/				
Ensamble Pin (Abrazaderas soporte)	/		/		/		/		/		/				
Observaciones en general	/		/		/		/		/		/				
Limpieza	/		/		/		/		/		/				

C= Cumple/NC= No Cumple

CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	OPERADOR	SUPERVISOR	OBSERVACIONES:
NOMBRE	David E. Fuentes	Yuleth Ortega V.	Sin Carpa Para encarpar
FIRMA		Yuleth	

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Código: FOSST-19
INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL	Fecha: Noviembre 21 de 2022
	Versión: 03 — Página 1 de 1

OBRA:	Arroyo platanal	SEMANA DEL:	09-02-26	AL:	14-02-26
INPECCIONADO POR:					
LOCALIZACIÓN:	Soledad	PLACA:	DDA 613		
MARCA:	Kodiak	MODELO:	2007	AÑO:	2007

ÍTEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		RECOMENDACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
[illegible]															
De Trabajo delanteras	/		/		/		/		/		/				
De trabajo traseras	/		/		/		/		/		/				
Direccionales Del. Y Traseras	/		/		/		/		/		/				
Stop Traseros	/		/		/		/		/		/				
[illegible]															
Espejo Retrovisor	/		/		/		/		/		/				
Espejos laterales	/		/		/		/		/		/				
Alarma (o pito) de Retroceso	/		/		/		/		/		/				
Pito Normal	/		/		/		/		/		/				
Motor encendido.	/		/		/		/		/		/				
Frenos de Servicio	/		/		/		/		/		/				
Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/				
Frenos de suspensión(Terminales).	/		/		/		/		/		/				
Cinturones de Seguridad	/		/		/		/		/		/				
Estado de la puertas	/		/		/		/		/		/				
Extintor Final en buen estado.		V		X		X		X		X		V			con fisura
Llanta Ponchadas		X		X		X		X		X		X			No funciona
Extintor (10 lbs) P.Q.S		X		X		X		X		X		X			No tiene
Botiquín Primeros Auxilios		X		X		X		X		X		X			No tiene
Estado de los asientos		X		X		X		X		X		X			Mal estado
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	/		/		/		/		/		/				
Niveles (Refrigerante-orometro, aire).		X		X		X		X		X		V			No funciona
Horometro	/		/		/		/		/		/		/		
Fusibles y Cables	/		/		/		/		/		/		/		
[illegible]															
Llantas pinchadas y sin abultamientos	/		/		/		/		/		/				
Rines (No rasos)	/		/		/		/		/		/				
[illegible]															
Revisión de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/				
Estado de correas	/		/		/		/		/		/				
Pasadores bien en buen estado	/		/		/		/		/		/				
[illegible]	/		/		/		/		/		/				
[illegible] (Ahuecadores soporto)	/		/		/		/		/		/				
Observaciones en general	/		/		/		/		/		/				
[illegible]	/		/		/		/		/		/				

C= Cumple/NC= No Cumple

ITEM CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	OPERADOR	SUPERVISOR	OBSERVACIONES: Sin carpa para encarpar
NOMBRE	David Cifuentes	Yuleth Ortega V.	
FIRMA	David C	Yuleth	

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023 INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL	Código: FOSST-19 Fecha: Noviembre 21 de 2022 Versión: 03 | Página 1 de 1

OBRA: Arroyo platanal | SEMANA DEL: 15-01-26 | AL: 17-01-26

INPECCIONADO POR:

LOCALIZACIÓN: Soledad | PLACA: DDA 619

MARCA: Kodiak | MODELO: 2007 | AÑO: 2007

ÍTEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		RECOMENDACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Luz Trabajo delanteras							/		/		/				
Luz trabajo traseras							/		/		/				
Direccionales Del. Y Traseras							/		/		/				
Stop Traseros							/		/		/				
Espejo Retrovisor							/		/		/				
Espejos laterales							/		/		/				
Alarma (o pito) de Retroceso							/		/		/				
Luz Normal							/		/		/				
Luz de encendido							/		/		/				
Puertas de Servicio							/		/		/				
Puerta emergencia							/		/		/				
Seguro suspensión(Terminales)							/		/		/				
Botones de Seguridad							/		/		/				
Seguro de puertas							/		/		/				
Extintor en buen estado.								X		X		X			Rajado
Llaves presas								X		X		X			No Tiene
Extintor (20 lbs) P.Q.S								X		X		X			No Tiene
Botiquín Primeros Auxilios								X		X		X			Mal Estado
Limpias asientos							/		/		/				
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).							/		/		/				
Niveles Refrigerante-orometro, aire).								X		X		X			No tiene
Cinturon							/		/		/				
Cables							/		/		/				
Llantas en buen estado y sin abultamientos							/		/		/				
Tuercas (No Ejes)							/		/		/				
Ausencia de fugas Hidraulicas							/		/		/				
Estado de correas							/		/		/				
Cambios en buen estado							/		/		/				
Pasadores							/		/		/				
Amortiguadores (Absorsadoras soporte)							/		/		/				
Observaciones en general							/		/		/				
Limpieza							/		/		/				

C= Cumple/NC= No Cumple

ITEM CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	OPERADOR	SUPERVISOR	OBSERVACIONES: Sin carpa para encarpar
NOMBRE	Deivis Gutierrez	Yuleth Ortega V.	
FIRMA	Deivis G	Yuleth	

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL

Código: FOSST-19	
Fecha: Noviembre 21 de 2022	
Versión: 03	Página 1 de 1

OBRA: Avenida platanal — SEMANA DEL: 19-01-26 — AL: 24-01-26

INPECCIONADO POR:

LOCALIZACIÓN: Soledad — PLACA: DDA 619

MARCA: Kodiak — MODELO: 2007 — AÑO: 2007

ÍTEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		RECOMENDACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Luces															
Luces de Trabajo delanteras	/		/		/		/		/		/				
Luces de trabajo traseras	/		/		/		/		/		/				
Direccionales Del. Y Traseras	/		/		/		/		/		/				
Stop Traseros	/		/		/		/		/		/				
Espejos															
Espejo Retrovisor	/		/		/		/		/		/				
Espejos laterales	/		/		/		/		/		/				
Alarma (o pito) de Retroceso	/		/		/		/		/		/				
Pito Normal	/		/		/		/		/		/				
Luces Encendido	/		/		/		/		/		/				
Frenos de Servicio	/		/		/		/		/		/				
Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/				
Amortiguadores/suspensión(Terminales)	/		/		/		/		/		/				
Cinturones de Seguridad	/		/		/		/		/		/				
Seguridad puertas	/		/		/		/		/		/				
Extintor nominal en buen estado.	/		/		/		/		/		/				
Luces Bengosas		X		X		X		X		X		X			No funcionan
Extintor (6lbs) P.Q.S		X		X		X		X		X		X			No tiene
Botiquín Primeros Auxilios		X		X		X		X		X		X			No tiene
Estado de los asientos		X		X		X		X		X		X			Mal Estado
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	/		/		/		/		/		/				
Indicador Refrigerante-orometro, aire).		X		X		X		X		X		X			No funciona
Horometro	/		/		/		/		/		/				
Cableria y cables	/		/		/		/		/		/				
Llantas															
Llantas completas y sin abultamientos	/		/		/		/		/		/				
Llantas (No ponchadas)	/		/		/		/		/						
Motor															
Control de fugas hidraulicas	/		/		/		/		/		/				
Estado de correas	/		/		/		/		/		/				
Mangueras en buen estado.	/		/		/		/		/		/				
Aceite	/		/		/		/		/		/				
Nivel combustible (Abrazaderas soporte)	/		/		/		/		/		/				
Observaciones en general	/		/		/		/		/		/				
Limpieza	/		/		/		/		/						

C= Cumple/NC= No Cumple

CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	OPERADOR	SUPERVISOR	OBSERVACIONES:
NOMBRE	Deivis Gutierrez	Yuleth Ortega V.	No tiene carpa para encarpar
FIRMA	Deivis G	Yuleth	

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL

Código: FOSST-19	
Fecha: Noviembre 21 de 2022	
Versión: 03	Página 1 de 1

OBRA: Arroyo platanal | SEMANA DEL: 26-01-26 | AL: 31-01-26

INPECCIONADO POR:

LOCALIZACIÓN: Soledad | PLACA: DDA 619

MARCA: Kodiak | MODELO: 2007 | AÑO: 2007

ÍTEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		RECOMENDACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Exteriores															
Luces de Trabajo delanteras	/		/		/		/		/		/				
Luces de trabajo traseras	/		/		/		/		/		/				
Direccionales Del. Y Traseras	/		/		/		/		/		/				
Stop Traseros	/		/		/		/		/		/				
Cabina															
Espejo Retrovisor	/		/		/		/		/		/				
Espejos laterales	/		/		/		/		/		/				
Alarma (o pito) de Retroceso	/		/		/		/		/		/				
Pito Normal	/		/		/		/		/		/				
Aviso encendido	/		/		/		/		/		/				
Frenos de Servicio	/		/		/		/		/		/				
Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/				
Freno de suspensión(Terminales)	/		/		/		/		/		/				
Balizas de Seguridad	/		/		/		/		/		/				
Seguros de puertas	/		/		/		/		/		/				
Extintor nal en buen estado.	/		/		/		/		/		/				
Limpia brisas	/		/		/		/		/		/				
Extintor (10 lbs) P.Q.S		X		X		X		X		X		X			No tiene
Botiquín Primeros Auxilios		X		X		X		X		X		X			No tiene
Estado de los asientos		X		X		X		X		X		X			Mal Estado
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	/		/		/		/		/		/				
Niveles (Refrigerante-orometro, aire).		X		X		X		X		X		X			No funciona
Cuentakilometro	/		/		/		/		/		/				
Cables y cables	/		/		/		/		/		/				
Estructura															
Estructuras pintadas y sin abultamientos	/		/		/		/		/		/				
Pasadores (No laso)	/		/		/		/		/		/				
Motor															
Ausencia de fugas hidráulicas	/		/		/		/		/		/				
Estado de correas	/		/		/		/		/		/				
Filtros en buen estado.	/		/		/		/		/		/				
Nivel	/		/		/		/		/		/				
Cilindros (Abrazaderas soporte)	/		/		/		/		/		/				
Observaciones en general	/		/		/		/		/		/				
Limpieza	/		/		/		/		/		/				

C= Cumple/NC= No Cumple

CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	OPERADOR	SUPERVISOR	OBSERVACIONES: Sin carpa para encarpar
NOMBRE	Dairo Gutierrez	Yulieth Ortega V.	
FIRMA	Dairo G.	Yulieth	

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL

Código: FOSST-19	
Fecha: Noviembre 21 de 2022	
Versión: 03	Página 1 de 1

OBRA: Arroyo platanal | SEMANA DEL: 02-02-26 | AL: 07-02-26

INPECCIONADO POR:

LOCALIZACIÓN: Soledad | PLACA: DDA 619

MARCA: Kodiak | MODELO: 2007 | AÑO: 2007

ÍTEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		RECOMENDACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Llantas															
Llantas de Trabajo delanteras	/		/		/		/		/		/				
Llantas de trabajo traseras	/		/		/		/		/		/				
Llantas Laterales Del. Y Traseras	/		/		/		/		/		/				
Stop Traseros	/		/		/		/		/		/				
Cabina															
Espejo Retrovisor	/		/		/		/		/		/				
Espejos laterales	/		/		/		/		/		/				
Alarma (o pito) de Retroceso	/		/		/		/		/		/				
Luz Normal	/		/		/		/		/		/				
Switch encendido.	/		/		/		/		/		/				
Frenos de Servicio	/		/		/		/		/		/				
Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/				
Cabina/suspensión(Terminales).	/		/		/		/		/		/				
Cinturones de Seguridad	/		/		/		/		/		/				
Seguros a puertas	/		/		/		/		/		/				
Limpiabrisa normal en buen estado.	/		/		/		/		/		/				
Limpiabrisas	/		/		/		/		/		/				
Extintor (Lbs) P.Q.S		X		X		X		X		X		X			No tiene
Botiquín Primeros Auxilios		X		X		X		X		X		X			No tiene
Estado de asientos		X		X		X		X		X		X			Mal Estado
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	/		/		/		/		/		/				
Niveles Refrigerante-orometro, aire).		X		X		X		X		X		X			No funciona
Odometro	/		/		/		/		/		/				
Estado y cables	/														
Estructura															
Estructura pintadas y sin abultamientos	/		/		/										
Pasadores (No laso)	/		/		/										
Mecanismos															
Inspección de fugas hidraulicas	/		/		/		/		/		/				
Estado de correas	/		/		/		/		/		/				
Pasadores en buen estado.	/		/		/		/		/		/				
	/		/		/		/		/		/				
Cilindros (Almeadoras soporte)	/		/		/		/		/		/				
Pasadores en general	/		/		/		/		/		/				
Mangueras	/		/		/		/		/		/				

C= Cumple/NC= No Cumple

EL ITEM CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	OPERADOR	SUPERVISOR	OBSERVACIONES:
NOMBRE	Deivis Contreras	Yuliseth Ortega V.	Sin carpa para encarpar
FIRMA	Deivis.	Yuliseth	

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL	**CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023** **INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL**	Código: FOSST-19 Fecha: Noviembre 21 de 2022 Versión: 03 | Página 1 de 1

OBRA:	Arroyo platanal	SEMANA DEL:	09-02-26	AL:	14-02-26
INPECCIONADO POR:					
LOCALIZACIÓN:	Soledad	PLACA:	PDA 619		
MARCA:	Kodiak	MODELO:	2007	AÑO:	2007

ÍTEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		RECOMENDACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
[illegible]															
e Trabajo delanteras	/		/		/		/		/		/				
De trabajo traseras	/		/		/		/		/		/				
Direccionales Del. Y Traseras	/		/		/		/		/		/				
Stop Traseros	/		/		/		/		/						
[illegible]															
Espejo Retrovisor	/		/		/		/		/		/				
Espejos laterales	/		/		/		/		/		/				
Alarma (o pito) de Retroceso	/		/		/		/		/		/				
Pito Normal	/		/		/		/		/		/				
Señal encendido	/		/		/		/		/		/				
Frenos de Servicio	/		/		/		/		/		/				
Freno de emergencia	/		/		/		/		/		/				
Frenos/suspensión(Terminales).	/		/		/		/		/		/				
Cinturones de Seguridad	/		/		/		/		/		/				
Cerradura puertas	/		/		/		/		/		/				
Señal Nocturnal en buen estado.	/		/		/		/		/		/				
Luces bajas	/		/		/		/		/		/				
Extintor (libras) P.Q.S		X		X		X		X		X		X			Notiene
Botiquín Primeros Auxilios		X		X		X		X		X		X			Notiene
Estado de los asientos		X		X		X		X		X		X			Mal estado
Indicadores (Hidraulico- voltimetro).	/		/		/		/		/		/				
Niveles (Refrigerante-orometro, aire).		X		X		X		X		X		X			No funciona
Horometro	/		/		/		/		/		/				
Motores y cables	/		/		/		/		/		/				
[illegible]															
Llantas protectas y sin abultamientos	/		/		/		/		/		/				
Rines (No tiene)	/		/		/		/		/		/				
[illegible]															
Control de fugas hidraulicas	/		/		/		/		/		/				
Estado de correas	/		/		/		/		/		/				
Pasadores en buen estado.	/		/		/		/		/		/				
[illegible]	/		/		/		/		/		/				
[illegible] (Abrazadera soporte)	/		/		/		/		/		/				
Observaciones en general	/		/		/		/		/		/				
[illegible]	/		/		/		/		/		/				

C= Cumple/NC= No Cumple

CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

OPERADOR	SUPERVISOR	OBSERVACIONES:
Dennis Cabrera	Yolieth ortega	Notiene Carpa para encarpar
Dennis C.	yulieth	

ANEXO 2: INSPECCIONES

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023 INSPECCION DE BOTIQUINES	Código: FOSST-37	
		Fecha: SEP-2023	
		Versión: 01	Página 1 de 1

Nombre del que Inspecciona: Yulieth Ortega Vega
Cargo: HSEQ
Fecha de Inspección: 05-02-2026
Ubicación del Botiquín: Tramo 3 - afluente 1 - Tramo 2

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	ESTADO B: Bien M: Mal	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
Guantes quirúrgicos	B	1x100	01-27
Tapabocas			
Copitos de algodón			
Curas			
Esparadrapo	B	4x5 Yds	27-09-28
Gasa	B	4und x 75 cm	10-07-28
Yodopavinona	B	1und x 120cm	27-11-26
Bajalenguas	B	20 und	09-27
Vendas elásticas	B	3 und 3x5	07-28
Vendaje triangular			
Ganchos nodriza			
Tijeras			
Termómetro	B	1Und	
Pinzas			
Linterna			
Pilas para linterna			
Libreta de notas			
Lapiz			
Venda algodon laminado	B	1und 5x5	
Venda de algodon laminado	B	1und 3x5	
Alcohol	B	1und	
Cloruro de Sodio	B		

OBSERVACIONES:

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

AURORA PROYECTOS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FSST- INSP - 03	
	INSPECCIÓN RECURSO PRIMEROS AUXILIOS (CAMILLA EMERGENCIAS)	FECHA	VERSIÓN
		3/03/2025	1

SEDE/ PROYECTO : Consorcio Canalizacion - Platanal
ÁREA INSPECCIONADA : Tramo 3 - Afluentes - Tramo 2 — FECHA INSPECCIÓN : 05-02-2026
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN : Yuliet Ortega Vega — CARGO : HSEQ

Marque con una equis (X) según criterio: B= Bueno M= Malo NA= No aplica

B: la condición encontrada cumple con los parámetros establecidos en los procedimientos.	M: la condición encontrada puede ocasionar lesiones graves, enfermedad grave o la muerte y daños considerables a la propiedad. Su intervención debe ser inmediata.	NO APLICA " NA" : El parámetro evaluado no aplica teniendo en cuenta el criterio de evaluación.

PARÁMETROS A CHEQUEAR	B	M	NA	OBSERVACIONES
Estructura sin fisuras ni deformaciones	X			
Correas completas y operativas	X			
Superficie limpia y desinfectada	X			
Tornillos, remaches y uniones en buen estado (si aplica)			X	
Asas seguras o sujetadores para traslado			X	
Sin oxidación en partes metálicas (si aplica)			X	
Fácil acceso y ubicación señalizada				
Peso manejable por una o dos personas	X			
Compatible con inmovilizador cervical (si aplica)	X			
Inmovilizador cervical cuenta con sistema para asegurar a la camilla	X			
Se cuenta con inmovilizadores para miembros superiores e inferiores				Correas

CONSORCIO CANALIZACION
EL PLATANAL 2023


INSPECCION DE EXTINTORES

Código: FOSST-15
Fecha: SEP-2023
Versión: 01 Página 1 de 1

REALIZADO POR: Yuliette Ortega Vega CARGO: Inspector de S.S.T.

FECHA	TIPO EXTINTOR No	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	CAPACIDAD NORMAL	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE CARGADO	UBICACION	ESTADO	OBSERVACIONES
	Multiproposito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20 libras				B	
	Multiproposito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20libras				B	
	Multiproposito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20libras				B	

CONVENCIONES:		Cumple ☐	No Cumple ☐		
A	Está en el lugar adecuado (visible)		H	Estado de la manguera de descarga y de la boquilla
B	Tiene señalización		I	Estado general del cilindro
C	El acceso está libre		J	Tiene instrucciones de operación.
D	Precintos estan colocados y en buen estado		K	Tarjeta de inspección marcada
E	Pasador de seguridad en su lugar		L	Estado general de mango y palanca
F	La presión es correcta		M	Válvula de Operación en posición de operación.
G	Manómetro en buen estado			

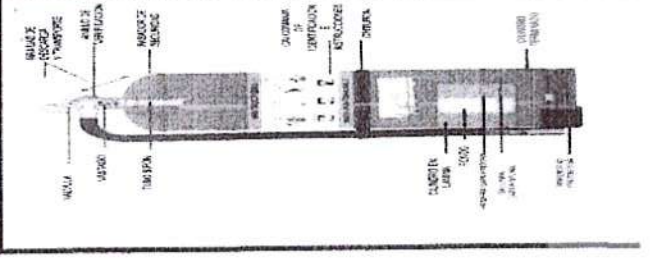

ANEXO 3: CHARLAS DE SEGURIDAD

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10 Versión: 01 Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción	✓	Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 16 Enero 2026 — Lugar: Soledad

Expositor: Yolieth Ortega Vega — Hora Inicio: 7:45 — Hora Final: 8 am

Temas: Misión, Visión, importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Procedimientos Orientados a prevenir accidentes, enfermedades etc.

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Brandon Lee Gaviria	1002014214	P.P.I	Operador Mini Cargador	Brandon Gaviria
2. Franklin Jaraba A.	72045.154	consorcio ppi	conductor	Franklin Jaraba
3. Luis Carlos Matute	1128054193	P.P.I	operador	Luis
4. Julio cesar Granado	1043151751	CMS	AX	Julio
5. Jesus M carrillo Pareso	1045170499	CMS	OF	Jesus C
6. Jorge caceres Bolua	1193155575	CMS	AX	Jorge C
7. Javid Sorabia carrillo	1045172522	CMS	AX	Javid S
8. Juan Escorcia	1048272170	CMS	AY	Juan Escorcia
9. Sebastian Fontalvo	1048289185	CMS	AY	Fontalvo
10. Jorge luis calvo	1045171194	CMS	OF	Jorge Luis
11. Alveiro Padilla	1001829865	CMS	OF	
12. Mauricio Ballesteros	1193585641	CMS	AY	
13. Jorge Zapata Molinares	1129522680	J.Z.M	Oficial	Jorge Zapata
14. Willian Saenz	1101382492	J.Z.M	Oficial	Willian Saenz

Número Total de Participantes: #20

Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento	✓	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 16 Enero 2026 — Lugar: Soledad

Expositor: a/oliets Ortega Vega — Hora Inicio: 7:15 — Hora Final: 8 am

Temas: Misión, Visión, importancia de la Seguridad y Salud en el trabajo Procedimientos orientados a prevenir accidentes en Fermedades laborales

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Aldair Gutierrez	1143458868	J.2M	Auxiliar	Aldair
2. Luis Peña Prins	1043146759	J.2M	Auxiliar	Luis Peña
3. Alfonso Rojas	72.207.088	J.2M	Auxiliar	Alfonso R.
4. David Duarte Gutierrez	1192765633	J.2.M	Auxiliar	David duarte
5. Hector Romero	78110617	CONS.PLT	Topografo	
6. Elkin Rivera	1042353671		ayudante	Elkin Rivera
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: #20 — Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 19 Enero 2026	Lugar: Soledad
Expositor: Yuliett Ortega Deyo	Hora Inicio: 7:30 Hora Final: 7:40
Temas: Importancia del uso de los EPP actuan como barrera ante riesgos Fisicos, quimicos, biologicos o electricos	Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Luis Carlos Matute	1128054193	P.P.I	Operador	LuisC.
2. Jorge Zapata Molinares	1129522680	JZM	Oficial	Jorge Zapata
3. Brandon lee Garcia	1002014211	P.P.I	Operador Mini Cargador	Brandon LeeGar.
4. Frankeinstonio Pesth	72045154	consorcio ppi	conductor	Frankeinstonio
5. Willian Saenz	1021382492	J.Z.M	Oficial	willian Saenz
6. Aldair Gutierrez	1143458868	J.ZM	Auxiliar	Aldair
7. Luis peña Prins	1043146759	J.ZM	Auxiliar	Luis Peña
8. Alfonso Rojas	72.207.088	J.ZM	Auxiliar	Alfonso R.
9. David Duarte Gutierrez	1192765633	J.Z.M	Aux	David duarte
10. Julio Cesar Granado	1043151751	CMS	AX	JULIO
11. Jesus M Carrillo Pareja	1045170499	CMS	OF	JESUS C
12. Jorge caceres Bolivia	1193155575	CMS	AX	Jorge
13. David Sarabia carrillo	1045172522	CMS	AX	David S
14. Juan Escorcia	1048272170	CMS		Juan Escorcia

Número Total de Participantes: #20	Firma del Expositor (es): Yuliett

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10 Versión: 01 Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 19 Enero 2026	Lugar: Soledad
Expositor: Yolleth Ortega Vega	Hora Inicio: 7:20 Hora Final: 7:35
Temas: Importancia del uso de los EPP actuan como barrera ante riesgos Fisicos, quimicos, biologico o electrico	Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Sebastian Fontalvo	1048 2844 85	CMS	AY	Fontalvo
2. Jorge luis caluo	1045171194	CMS	of	Jorge Luis
3. Alveiro padilla	1001829865	CMS	of	
4. Mauricio Bullestero	1193585741	CMS	Ay	
5. Hector Romero	78110617	Cons. PLT	Topografo	
6. Elkin Rivera	1042353674		ayudate	Elkin Rivera
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 20	Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 21 Enero 2026	Lugar: Soledad
Expositor: Yulieth Ortega Vega	Hora Inicio: 7:30 Hora Final: 8am
Temas: Manejo de basuras: Reutilización y correcta separación de residuos (orgánicos, inorgánicos y peligrosos) Para mitigar el impacto ambiental	Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Luis Carlos Matute	1122047193	P.P.I	operador	Luis C.
2. Brandon Joe Gaviria	1002014211	P.P.I	Operador Mini Cargador	Brandon Gaviria
3. Martin Londoño Acosta	72045,154	consorcio p p i	conductor	Martin Londoño
4. Julio cesar Granado	1043151751	CMS	A X	Julio
5. Jesus M Carrillo Paredo	1045170499	CMS	OF	Jesus C
6. Jorge caceres Bueno	1193155575	CMS	A X	Jorge
7. Javid Sarabia Carrillo	1045A75 22	CMS	A Y	Javid S
8. Juan Escorcia	1048222170	CMS		
9. Sebastian Fontalvo	1048289485	CMS	A Y	Fontalvo
10. Jorge luis calvo	1045171194	CMS	of	Jorge Luis
11. Alveiro Padilla	1001829865	CMS	OF	
12. Mauricio Ballesteros	1193585641	CMS	AY	
13. Jorge Zapata Molinares	1129522680	J.Z M	OFicial	Jorge Zapata
14. Willian Saenz	1101382492	J. ZM	OFicial	Willian Saenz
Número Total de Participantes: # 20		Firma del Expositor (es):		

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 21 Enero 2026 — Lugar: Soledad

Expositor: Yulieth Ortega Vega — Hora Inicio: 7:30 — Hora Final: 8am

Temas: Manejo de basuras: Reutilización y correcta separación de residuos (orgánicos, inorgánicos y peligrosos) para mitigar el impacto ambiental

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Aldair Gutierrez	1143458868	J.2.M	Auxiliar	Aldair
2. Luis Peña Prins	1043146759	J.2.M	Auxiliar	Luis Peña
3. Alfonso Rojas	72.207.088	J.2.M	Aux	Alfonso R.
4. David Duarte Gutierrez	1192765633	J.2.M	Auxiliar	David Duarte
5. Hector Romero	78110617	Cons. PST	Topografo	
6. Erika Rivera	1042353671		ayudante	Erika Rivera
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 20 — Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10 Versión: 01 Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	✓	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 23 Enero 2026 — Lugar: Soledad

Expositor: Yulieth Ortega Vega — Hora Inicio: 7:30 — Hora Final: 7:40

Temas: Riesgo Biologico: Exposición laboral a micoorganismos (virus, bacterias, hongos, parasitos) — Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Luis Carlos Matute	1128074193	P.P.I	operador	
2.	Jorge Zapata Molinares	1129522680	J.Z.M	Oficial	Jorge Zapata
3.	Brandon Lex Caviria	1002014211	P.P.I	Operador Mini Cargador	Brandon Lex Caviria
4.	Yhonkin Jonatan Acosta	72045.154	consorcio popi	conductor	Yhonkin Jonatan
5.	Willian Saenz	1101382492	J.Z.M	Oficial	Willian Saenz
6.	Aldair Gutierrez	1143458868	J.Z.M	Aux	Aldair
7.	Luis Peña Prins	1043146759	J.Z.M	AUX	Luis Peña
8.	Alfonso Rojas	72.207.088	J.Z.M.	Aux	Alfonso R.
9.	David Duarte Gutierrez	1192765633	J.Z.M		David Duarte
10.	Julio Cesar Granado	1043551755	CMS	AX	JULIO
11.	Jesus Carrillo Pareso	1045170499	CMS	OF	Jesus C
12.	Jorge Caceres Avelua	1193155575	CMS	AX	Jorge
13.	David Sarabia Carrillo	1045725522	CMS	AX	David S
14.	Juan Escorcia	1048272170	CMS		

Número Total de Participantes: 19 — Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	✓	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 23 Enero 2026 — Lugar: Soledad

Expositor: Yulieth Ortega Vega — Hora Inicio: — Hora Final:

Temas: Riesgo Biológico

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Sebastián Fontalvo	1048289485	CMS	AY	FonSalvo
2. Jorge luis calvo	3045 A11 94	CMS	of	Jorge Calvo
3. Alvaro Padilla	1001829865	CMS	Of	
4. Mauricio Balbuena	1193585641	CMS	Ay	
5. Hector Romero	7811067	Cons. PLT-	Topografo	
6. Elkin Rivera	1042353671		ayudante	Elkin Rivera
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 29 — Firma del Expositor (es): Yulieth

CONSORCIO CANALIZACION PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	✓	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 26 Enero 2026 — Lugar: Soledad

Expositor: Yolilth Ortega Vega — Hora Inicio: 7:30 — Hora Final: 7:45

Temas: Diferencia entre accidente e incidente accidente causa lesiones, daños o perdida incidente: Es un suceso inesperado que no produce daños

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Jorge Zapata Molinares	1129522680	J.2.M	Oficial	Jorge Zapata
2. Luis Carlos Matute	M1280741193	P.P.I	Operador	Luis C.
3. Willian Saenz	1101382492	J.2.M	Oficial	Willian Saenz
4. Aldair Gutierrez	3143458868	J.2.M	Aux	Aldair
5. Brandon Lee Gaviria	1002614214	P.P.I	Operador Mini Cargador	Brandon Gaviria
6. Alexander Fontalvo Ospino	72045.154	consorcio pppi	conductor	Alexander Fontalvo
7. Luis Peña Prins	1043146759	J.2.M	Aux	Luis Peña
8. Alfonso Rosas	72.207.088	J.2.M	Aux	Alfonso R.
9. David Duarte Gutierrez	1192765623	J.2.M		David Duarte
10. Julio Cesar Granado	1043151751	CMS	AX	Julio
11. Jesus Carrillo Pareja	1045170499	CMS	OF	JCSCC
12. Jorge Caceres Bueluas	1193155575	CMS	AX	JCR98
13. David Sarabia Carrillo	1045172522	CMS	AY	David S
14. Juan Escorcia	1048272170	CMS	AY	Juan

Número Total de Participantes: 20

Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 26 Enero 2026 — Lugar: Soledad

Expositor: Yuliett Ortega Vega — Hora Inicio: 7:30 — Hora Final: 7:45

Temas: Diferencia entre accidente e incidente

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Sebastian Fontalvo	1048289485	CMS	AY	FonCalvo
2. Jorge Luis Calvo	1045171194	CMS	OF	JORGE LUIS
3. Alveiro Padilla	1001829865	CMS	OF	
4. Mauricio Ballestero	1193585645	CMS	AY	
5. Hector Romero	72110617	CONS. PLT	Topografo	
6. ELKIN RIVERA	1042353671		ayudante	ELKIN RIVERA
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 20 — Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	✓	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 28 Enero 2026	Lugar: Soledad
Expositor: Yulieth Ortega Vega	Hora Inicio: 7:35 Hora Final: 7:93
Temas: Condicion insegura: Situacion o deficiencia Fisica en el trabajo que no brinda la Seguridad	Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Julio cesar Granado	1043157451	CMS	AY	JULIO
2. Luis Carlos Matute	1128054193	P.P.I	operador	Julio
3. Jesus M carrillo pareja	1045170499	CMS	OF	Jesus C
4. Brandon lee Gaviria	1002014211	P.P.I	operador Mini Cargador	BrandonLeeGaviria
5. Franklin Londoño Acosta	72.045.154	consorcio ppi	conductor	Franklin Londoño
6. Jorge caceres Buelva	11931555.75	CMS	AX	Jorge
7. David Sorabia Carrillo	1045172522	CMS	XX	David S
8. Juan Escorcia	1048272170	CMS	AX	Juan
9. Sebastian Fontalvo	1048289485	CMS	AY	Fontalvo
10. Jorge luis calvo	1045171194	CMS	OF	Jorge Luis
11. Mauricio Ballesteros	1143585641	CMS	AY	
12. Alveiro padilla	1001829865	CMS	OF	
13. Jorge zapata Molinares	1129522680	JZM	Oficial	Jorge Zapata
14. William Saenz	1101382492	JZM	Oficial	William Saenz

Número Total de Participantes: 20	Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10 Versión: 01 Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 28 Enero 2026	Lugar: Soledad
Expositor: Yulieth Ortega Vega	Hora Inicio: / Hora Final:
Temas: condicion insegura:	Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Aldair Gutierrez	1143458868	J.2.M	Auxilio	Aldair
2. Luis Peña Prins	1043146759	J.2M	Aux	Luis peña
3. Alfonso Rojas	72.207.088	J.2M	Auv	Alfonso R.
4. David Duarte Gutierrez	1192765633	J.2M	Aux	David Duarte
5. Hector Romero	78110617	Cons. PIT	Topografo	
6. Elkin Rivera	1042353671		ayudante	Elkin Rivera
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 20	Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	✓	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 30 Enero 2026	Lugar: Soledad
Expositor: Yuliuth Ortega Vega	Hora Inicio: / Hora Final:
Temas: Enfermedad laboral, estado Patológico contraido como resultado directo ala exposicion a factores de riesgo	Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Luis Carlos Matute	1128054193	P.P.1	Operador	LuMG
2. Willion Saenz	1101382492	J.Z.M	Oficial	willion Saenz
3. Brandon lee Gaviria	1002014211	P.P.1	Mini Cargador Operador	Brandon Gaviria
4. Hranklin Jaraba Acosta	72.045154	consorcio ppi	conductor	Hranklin Jaraba A
5. Mauricio Ballesteros	1193585641	CMS	Ay	
6. Sebastian Fontalvo	1048289485	CMS	A y	Fontalvo
7. Jorge Luis calvo	1045171194	CMS	of	Jorge Luis
8. Alveiro Padilla	1001829865	CMS	of	
9. Julio cesar Granado	1043151751	CMS	AX	JULIO
10. Jesus Carrillo Poreso	1045170499	CMS	OF	JESUS C
11. Jorge caceres Bolivar	1193155575	CMS	AX	Jorge
12. Javid Sarabia Carrillo	1045172522	CMS	A Y	javid S
13. Mauricio Ballesteros	1193585641	CMS		
14. Juan Escorcia	1048272170	CMS	AX	Juan

Número Total de Participantes: 21

Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 30 Enero 2026	Lugar: Soledad
Expositor: Yuliet Ortega Vega	Hora Inicio: / Hora Final:
Temas: Enfermedad laboral	Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Aldair Gutierrez	1143458868	J. Z. M	Aux	Aldair
2. Jorge zapata Molinares	1129522680	J. Z. M	Oficial	Jorge Zapata
3. Luis Peña Prins	1043146759	J. Z. M	Aux	Luis Peña
4. Alfonso Rojas	72 207.088	J. Z. M	Aux	Alfonso R
5. David Duarte Gutierrez	1192765633	J. Z. M	Aux	David Duarte
6. Hector Romero	78110617	Cons. PLT	Topografo	
7. Elkin Rivera	1012353671		ayudante	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 21	Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	/	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 02 de Feb 2026	Lugar: Soledad
Expositor: Yulieth Ortega Vega	Hora Inicio: / Hora Final:
Temas: Riesgo Psicosocial: condiciones de trabajo deficientes relacionados con la organización, gestión y contexto social del empleo que pueden causar daños	Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Brandon Lee Gaviria	1002014214	P.P. 1	Operador Mini Cargador	BrandonGaviria
2. [illegible]	72.045.154	consorcio ppi	conductor	[illegible]
3. Luis carlos Matute	1128074193	p. P. 1	operador	Luis C
4. Julio cesar Granado	1043151751	CM.S	AX	JULIO
5. Jesus M Carrillo Parejo	1045170499	CMS	OF	JESUS C
6. Jorge caceres Bueluas	1193155575	CMS	AX	Jorge
7. David Sorabia Carrillo	1045172522	CMS	AY	DAVID S
8. Mauricio Ballestero	1193585641	CMS	AY	[illegible]
9. Juan Escorcia	1048272170	CMS	AY	Juan
10. Sebastian Fontalvo	1048289485	CMS	AY	Fontalvo
11. Jorge luis calvo	1045171194	CMS	OF	Jorge Luis
12. Alveiro Padilla	1001829865	CMS	OF	[illegible]
13. Aldair Gutierrez	1143458868	J.2.M	Auxiliar	Aldair
14. Willian Saenz	1101382492	J.2.M	Oficial	William Saenz

Número Total de Participantes: 20	Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Codigo: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	/	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 02 de Feb 2026	Lugar: Soledad
Expositor: Yulieth Ortega Vega	Hora Inicio: / Hora Final:
Temas: Riesgo Psicosocial: condiciones de trabajo deficientes relacionados con la organización, gestión y contexto social del empleo que pueden causar daños	Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Brandon lee Gavira	1002014214	P.P.I	Operador Mini Cargador	Brandon Gavira
2. [illegible]	72.045.154	consorcio p p i	conductor	[illegible]
3. Luis carlos Matute	1128079193	p. P. I	operador	Luis
4. Julio cesar Granado	1043151751	CM.S	AX	JULIO
5. Jesus M Carrillo Pareja	1045170499	CMS	OF	JESUS C
6. Jorge caceres Bueluas	1193155575	CMS	AX	Jorge
7. David Sorabia Carrillo	1045172522	CMS	AY	David S
8. Mauricio Ballestero	1193585641	CMS	AY	[illegible]
9. Juan Escorcia	1048272170	CMS	AY	Juan
10. Sebastian Fontalvo	1048289485	CMS	AY	Fontalvo
11. Jorge luis calvo	1045171194	CMS	OF	Jorge Luis
12. Alveiro Padilla	1001829865	CMS	OF	[illegible]
13. Aldair Gutierrez	1143458868	J.2.M	Auxiliar	Aldair
14. Willian Saenz	1101382492	J.2.M	Oficial	willian Saenz

Número Total de Participantes: 20	Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 02 de Feb 2026	Lugar: Soledad	
Expositor: Yolitth Ortega Vega	Hora Inicio:	Hora Final:
Temas: Riesgo Psicosocial	Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Jorge Zapata Molinares	1129522680	J.Z.M	Oficial	Jorge Zapata
2. Luis Peña Prins	1043146759	J.Z.M	Aux	Luis Peña
3. Alfonso Rojas	72207088	J.Z.M	Aux	Alfonso R.
4. David Duarte Gutierrez	1192765683	J.Z.M	Aux	David Duarte
5. Hector Rojas	78110617	Cons. PLT	Topografo	
6. Elkin Rivera	1012353671		Ayudante	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 20	Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		**Charla Seguridad**	✓	**Charla Técnica**	
Re inducción		**Inducción**		**Reunión Informativa**	
Otro		**¿Cuál?**			

Fecha: 04 Feb 2026		**Lugar:** Soledad	
Expositor: Yuleth Ortega Vega		**Hora Inicio:**	**Hora Final:**
Temas: Riesgo Ergonomicos - movimientos repetitivos, posturas forzadas, manejo manual de cargas, vibraciones		**Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL**	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Luis Carlos Matute	1122054193	P. P. I	Operador	
2. Julio Cesar Granado	1043151751	CMS	AX	
3. Alejandro Urbina Acosta	72045154	consocio ppi	conductor	
4. Brandon lee Caviria	1002014211	P. P. I	Operador Mini Cargador	Brandon Caviria
5. Hector Ramos	78110617	CONS. PLT	TOPOGRAFO	
6. Jesus carrillo Poreso	1045170499	CMS	OF	Jesus C
7. Jorge caceres Buelvas	1193155575	CMS	AX	Jorge
8. Javid Sorubia Carrillo	1045172522	CMS	AY	Javid S
9. Mauricio Bullestero	1193585643	CMS	AY	
10. Sebastian Fontalvo	1048289485	CMS	AY	Fontalvo
11. Jorge Luis Calvo	1045171194	CMS	OF	Jorge Luis
12. Alveiro Padilla	1001829865	CMS	OF	
13. Aldair Gutierrez	1143458868	J.2.M	AUX	Aldair
14. Willion Saenz R.	1101382492	J.2.M	Oficial	Willion Saenz

Número Total de Participantes: 20	**Firma del Expositor (es):**

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica			
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa			
Otro		¿Cuál?					
Fecha: 04 de Feb, 2026				Lugar: Soledad			
Expositor: Yolieth Ortega Vega				Hora Inicio:		Hora Final:	
Temas: Riesgo Ergonomico				Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL			

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Jorge Zapata M	1129522680	J.2.M	Oficial	Jorge Zapata
2. Luis Peña Prins	1043146759	J.2M	AUX	Luis Peña
3. Alfonso Rojas	72.207.088	J.2.M	AUX	Alfonso R.
4. David Duarte G.	1192765633	J.2.M	AUX	David Duarte
5. Juan Escorcia	1048272170	CMS	AUX	Juan
6. Elkin RiveRA	1042353671	CMS	ayudante	Elkin RiveRA
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 20

Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10 Versión: 01 Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	✓	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 06-Feb 2026	Lugar: Soledad	
Expositor: Yulith Ortega Vega	Hora Inicio:	Hora Final:
Temas: Riesgo. Fisico – ruido, vibraciones, iluminacion, radiacion o Temperaturas extremas	Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Brandon lee Gaviria	1002014211	P.P.I	operador Mini Cargador	Brandon Gaviria
2. Franklin Jaudon Acosta	72045154	consorcio ppi	conductor	Franklin Jaudon
3. Julio Cesar Granado	1043151751	CMS	AX	Julio
4. Luis Carlos Matute	1128059193	P.P.I	operador	Carlos
5. Hector Rovira	78110617	CONS. PLT	Topografo	
6. Jesus Carrillo Pareso	1045170499	CMS	OF	Jesus C
7. Jorge Caceres Bustos	1193155575	CMS	AX	Jorge
8. David Sarabia Carrillo	1045172522	CMS	AY	David S
9. Mauricio Ballesteros	1143585641	CMS	AY	
10. Sebastian Fontalvo	1048289485	CMS	AY	Fontalvo
11. Jorge luis caluo	1045171194	CMS	Of	Jorge Caluo
12. Alveiro padilla	1001829865	CMS	Of	
13. Aldair Gutierrez	1143458868	JDM	Aux	Aldair
14. William Saenz R	1101382492	J.2 M	Oficial	William Saenz

Número Total de Participantes: 20	Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10 Versión: 01 Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 06 de Feb 2026 — Lugar: Soledad

Expositor: Yoluth Ortega Vega — Hora Inicio: — Hora Final:

Temas: Riesgo Físico — Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Jorge Zapata M.	1129522680	J.2.M	Oficial	Jorge Zapata
2. Luis Peña Prins	1043146759	J.2 M	Aux	Luis Peña
3. Alfonso Rojas	72207.088	J.2 M	Aux	Alfonso R
4. David Duarte G.	1142765633	J.2.M	AUX	David Duarte
5. Juan Escorcia	1048272170	CMS		Juan
6. Elkin Rivera	1042353671		ayudante	Elkin Rivera
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 20 — Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		**Charla Seguridad**	✓	**Charla Técnica**	
Re inducción		**Inducción**		**Reunión Informativa**	
Otro		**¿Cuál?**			

Fecha: 09 Feb 2026		**Lugar:** Soledad	
Expositor: Yuleth Ortega Vega		**Hora Inicio:**	**Hora Final:**
Temas: Riesgo mecanico - derivados de maquinaria, caida, golpes, cortes o atrapamiento		**Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL**	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Luis Carlos Matute	1128054193	P.P.I	Operador	
2. Brandon Lee Gaviria	1002014211	P.P.I	Operador Mini Cargador	
3. [illegible]	72045,154	Consorcioppi	Conductor	
4. Julio Cesar Granado	1043151751	C.M.S	AX	Julio
5. Jesus M Carrillo Pareso	1045170499	CMS	OF	Josus C
6. Jorge caceres Bueuas	1193155575	CMS	AX	Jorge
7. Javid Sarabia carrillo	1045172522	CMS	AX	Javid S
8. Mauricio Bellestero	1193585641	CMS	AY	
9. Juan Escorcia	1048272170	CMS	AY	Juan
10. Sebastian Fontalvo	1048289485	CMS	AY	Fontalvo
11. Jorge luis calvo	1045171194	CMS	OF	Jorge Luis
12. Alveiro padilla	1001829865	CMS	OF	
13. Aldair Gutierrez	1143458868	J.2.M	AUX	Aldair
14. Willian Saenz Rivera	1001382492	J.2.M	Oficial	Willian Saenz

Número Total de Participantes: 18	**Firma del Expositor (es):**

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 09-Feb, 2026	Lugar: Soledad	
Expositor: Yuliett Ortega Vega	Hora Inicio:	Hora Final:
Temas: Riesgo mecanico	Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Jorge zapata Molinares	1329522680	J.Z.M	Oficial	Jorge Zapata
2. Luis Peña Prins	1043146759	J.Z.M	Aux	Luis peña
3. Alfonso Rosas	72207088	J.Z.M	Aux	Alfonso R.
4. David Duarte Gutierrez	1192765133	J.Z.M	Aux	david duarte
5. Jacobo Pacheco	7811067	Cons.PIT	Topografo	
6. Elkin Rivera	1042353671		ayudante	Elkin rivera
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 18	Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		**Charla Seguridad**	√	**Charla Técnica**	
Re inducción		**Inducción**		**Reunión Informativa**	
Otro		**¿Cuál?**			

Fecha: 11 de Feb 2026		**Lugar:** Soledad	
Expositor: Yuleth Ortega Vega		**Hora Inicio:**	**Hora Final:**
Temas: Primeros Auxlios – actuaciones y tecnicas que permiten la atencion inmediata de un accidentado		**Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL**	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Brandon lee Gaviria	1001014211	P.P.I	operador Mini Cargador	BrandonGaviria
2. Franklin Jaraba Acosta	72045.154	consorcio ppi	Conductor	Franklin Jaraba
3. Luis carlos Matute	1128054193	P. P. I	operador	Luis C.
4. Julio Cesar Granado	1043351751	CMS	AX	JULIO
5. Jesus Carrillo Parejo	1045170499	CMS	OF	JESUS C
6. Jorge caceres Buelvas	1193155575	CMS	AX	JORGE
7. David Sarabia Carrillo	1045177522	CMS	AY	DAVID S
8. Mauricio Ballesteros	1193585641	CMS	AY	
9. Juan Escorcia	1048272170	CMS	AY	JUAN
10. Sebastian Fontalvo	1048284485	CMS	AY	FONTALVO
11. Jorge luis calvo	1045171194	CMS	OF	JORGE LUIS
12. Alveiro padilla	1001829865	CMS	OF	
13. Jorge zapata Molinares	1129522680	J.ZM	Oficial	Jorge Zapata
14. Willian Saenz	1101382492	J ZM	Oficial	Willian Saenz

Número Total de Participantes: 20

Firma del Expositor (es): Yuleth

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 11 de Feb 2026	Lugar: Soledad
Expositor: Yulieth Ortega Vega	Hora Inicio: / Hora Final:
Temas: Primeros Auxilios	Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Aldair Gutierrez	1143458868	J.2.M	Aux	Aldair
2. Luis Pena Prins	1043146759	J.2.M	Aux	Luis Peña
3. Alfonso Rojas	72.207.088	J.2.M	Aux	Alfonso R.
4. David Duarte Gutierrez	1192725633	J.2.M	Aux	David duarte
5. Hector Romero	78110617	Consorcio PIT	Topografo	
6. Elkin Rivera	1042353671		ayudante	Elkin Rivera
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 20	Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION PLATANAL 2023	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	V	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 13 - Feb - 2026 | Lugar: Soledad

Expositor: Yulith Ortega Vega | Hora Inicio: | Hora Final:

Temas: Alcohol y Drogas – afectan la dinamica del equipo y puede resultar un ambiente de Trabajo Toxico

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1 Aldair Gutierrez	1143458868	J.Z.M	AUX	Aldair
2. Brandon Lee Caviria	1002014211	P.P.I	Operador Mini Cargador	Brandon Caviria
3. Franklin Jaimes Acosta	72045154	consorcio ppi	Conductor	Franklin Jaimes A
4. Jus Matute	1128054193	P.P.I	operador	Jus M.
5. Julio cesar Granado	1043151751	C.M.S	AX	Julio
6. Jesus M Carrillo Poresso	1045170499	CMS	OF	JESUS C
7. Jorge caceres Bulvas	1193155575	CMS	AX	Jorge
8. Javid Sarabia Carrillo	1045172522	CMS	AX	david S
9 Mauricio Ballesteros	1193585643	CMS	AY	Mauricio
10. Juan ESoarcia	1048272170	CMS	AY	Juan
11 Sebastian Fontalvo	1048289485	CMS	AY	Fontalvo
12. Jorge Luis calvo	1045171194	CMS	OF	JORGE LUIS
13 Alveiro padilla	1001824865	CMS	OF	
14 willian Saenz	1101382492	J.Z.M	oficial	willian Saenz

Número Total de Participantes: 20 | Firma del Expositor (es):

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2027	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: FOSST-10
		Versión: 01
		Fecha: SEP 23

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 13 de Feb 2026 — Lugar: Soledad

Expositor: Yuliath Ortega Vega — Hora Inicio: — Hora Final:

Temas: Alcohol y Drogas

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Jorge Zapata Medinora	1129522680	J.2.M	Oficial	Jorge Zapata
2. Luis Peña Prins	1043146759	J. 2. M	AUX	luis peña
3. Alfonso Rojas	72.207.088	J.2.M	AUX	Alfonso R
4. David Duarte Gutierrez	1192765633	J.2 M	AUX	David
5. [illegible] Ramos	78110617	CONS. PLT	Topografo	
6. Elkin Rivera	1042353671		Ayudante	Elkin Rivera
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 20 — Firma del Expositor (es):

ANEXO 4: ANÁLISIS TRABAJO SEGURO

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

Código: FOSST-23
Versión: 01
Fecha SEP-2023
Página 1 de 1

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

1. IDENTIFICACIÓN Y VALIDEZ

ACTIVIDAD CRITICA: Vigencia de 24 horas.
ACTIVIDAD MODERADA: Vigencia de 7 días. ACTIVIDAD LEVE: Vigencia de 10 Días

CRITICA	✓	MODERADA	LEVE

FECHA DE EMISION	HORA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL EJECUTOR	No. DE PARTICIPANTES	EMPRESA
15 al 17 de enero 2026	7 am	Mauricio Martinez	13	
CAMPO	Soledad	LUGAR DONDE SE HARA LA ACTIVIDAD		

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Inspeccion del area, armado de anclajes y Fundidos de barandas tramo Principal, limpieza y retiro de residuos Solidos, Excavaciones manuales para construccion del puente aereo

2. TIPO DE TRABAJO

Seleccione la opción

Caliente		Frio	

ACTIVIDADES CRITICAS	SI	N/A
TRABAJO EN ALTURAS		✓
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		✓
EXCAVACION SUPERIOR A 1.5 m.		✓
IZAJE DE CARGAS		✓
MANIPULACION SUSTANCIAS QUIMICAS	✓	
TRABAJOS EN LAS VIAS	✓	
MANEJO DE EXPLOSIVOS		✓
TRABAJOS ELECTRICOS		✓

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Seleccione la opción	SI	N/A
Biologicos	✓	
FISICOS		
Ruido	✓	
Vibraciones	✓	
Temperaturas (frio, calor)	✓	
Iluminación deficiente		✓
Presión atmosferica	✓	
QUIMICOS		
Radiaciones Ionizantes		✓
Radiaciones No Ionizantes	✓	
Polvos organicos- Inorganicos		✓
Fibras		✓
liquidos		✓
Gases y vapores		✓
Humos metalicos-no metalicos		✓
Material particulado	✓	
Materiales toxicos		✓

Seleccione la opción	SI	N/A
BIOMECANICOS		
Posturas prolongadas	✓	
Movimientos repetitivos	✓	
Manipulación de cargas		✓
Posturas incomodas	✓	
Sobreesfuerzos		✓
CONDICIONES DE SEGURIDAD		
Mecánico (elementos de maquinas, herramientas, piezas a trabajar)	✓	
Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	✓	
Locativos - superficies-terrenos inestables		✓
Explosión		✓
Incendio	✓	
derrumbe	✓	
fuga		✓
Robos, Atracos, atentados, desorden publico	✓	
FENOMENOS NATURALES		
Sismos, terremotos, Vendaval, inundación	✓	

Especifique otros riesgos que no se hayan comtemplado:

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD

EPP	SI	N/A
Casco	✓	
Calzado de seguridad	✓	
Gafas de seguridad	✓	
Guantes Tipo:	✓	
Proteccion auditiva	✓	
Proteccion Respiratoria	✓	
Impermeables		✓
Arnes/Linea de vida/Anclaje/ Andamios		✓
Equipos de comunicación		✓

Lugar de Trabajo	SI	N/A
Demarcar el area/vallado?	✓	
Iluminacion adecuada?	✓	
Se cuentan con rutas de evacuación?	✓	
Se cuentan con salidas de emergencias?	✓	
Se cuentan con area de disposición de materiales señalizadas?	✓	
Se cuenta con el procedimiento de trabajo	✓	
Se cuentan con equipos para atender emergencias?	✓	
Se necesitan duchas/lavaojos?		✓
Detector personal H2S		✓

5. ESPECIFIQUE LOS RECURSOS A EMPLEAR DENTRO DE LA ACTIVIDAD

VEHICULOS	SI	MAQUINARIA	SI	EQUIPO MENOR	SI	MATERIALES	SI
Documentos del vehiculo vigentes.		Se cuenta con inspección preoperacional vigente		Se cuenta con inspección preoperacional vigente		Se cuentan con las hojas de seguridad de las sustancias quimicas	
Documentos de conductor vigentes.		Documentos del operador vigentes.		El equipo se encuentra en optimas condiciones para operar?		Las sustancias quimicas cuentan con las etiquetas HMIS.	

6. TRABAJO EN CALIENTE Norma de Certificacion del Soldador (DILIGENICAR LA PARTE DE MUESTREO DE ATMOSFERAS)

	Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
1	Existe material inflamable/equipos que lo contengan en un radio de 10 m?		✓
2	Fosas, zanjas y drenajes estan cubiertos y sellados?		✓
3	Debe humedecerse el area /cortina de agua?		✓
4	Es necesario evitar/interceptar dispersion chispas?		✓

Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
Puesta a tierra de herramientas/equipos		✓
Tuvo en cuenta la direccion del viento?		✓
Se dispone de mantas de asbesto?		✓

Especifique los equipos necesarios	SI	N/A
Equipos contra incendio		✓
Tipo:		
Capacidad:		✓
cantidad:		✓

7. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Nombres de las personas que van a ingresar:	N° Cedula
Nombre del Observador	

Verificación medidas de seguridad	SI	N/A
1 ¿Existen salidas de emergencia?		✓
2 ¿Cada persona que entra usa arnes y linea de vida?		✓
3 Cada persona que entra u observador dispone de equipo de aire autonomo		✓
4 Cada persona que entra cuenta con linea de aire c/mascara de cara completa		✓
5 Existe posibilidad de atrapamiento?		✓
6 La iluminacion y/o el equipo electrico utilizado, es igual o menor a 24 V?		✓
7 Las herramientas utilizadas son antichispa?		✓

Producto contenido en el tanque/recipiente	SI	N/A
La ropa utilizada brinda adecuada proteccion/tratamiento antiestatica?		✓
Se ha desenergizado el equipo?		✓
Se ha bloqueado y etiquetado el equipo?		✓
Se han colocado bridas ciegas/comales?		✓
Se han desvinculado tuberias y otros equipos?		✓
Se ha ventilado el equipo / bocas abiertas?		✓
El equipo esta conectado a tierra?		✓
El piso es resbaloso?		✓
EPP especiales?		✓
Disponible medico o personal de enfermeria?		✓
El area de seguridad fue demarcada?		✓
Equipo de aire para rescate/escape?		✓
Se cuenta con medios de comunicación en caso de una emergencia?		✓
Se cuenta con un medio de transporte en caso de emergencia?		✓

MUESTREO DE ATMOSFERAS

CRITERIO DE MEDICIÓN	Medición continua	SI	N/A	Registro cada hora	SI	N/A
			✓			✓

Responsable de la supervisión del trabajo:

Registre los datos de las mediciones hechas	Oxigeno (19,5% < % O2 < 22,5%)	LEL (Maximo permitido 10%)	H2S (Maximo permitido 10ppm)	CO (Maximo permitido 25ppm)
1 % / PPM				
2 HORA				

3 Nombre y firma del responsable de la medición		Equipo		# Serie		Fecha Calibración	

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre El solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota: El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabajo instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firme en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA	
Mauricio Martinez	TT.	Yuliet Ortega Vega	Yuliet Ortega V.

11. VALIDACIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor
1.	15 al 17 de Enero 2026	7am	5pm	Yuliet Ortega V. 1.006.008.826	Julio cesar Granado 1043151753
2	15 al 17	7am	5pm		Jesus carrillo P. 1045170499
3	15 al 17	7am	5pm		Jorge caceres 1143155575
4	15 al 17	7am	5pm		David Sorabia 1045132522
5	15 al 17	7am	5pm		Juan Escorcia 1048274170
6	15 al 17	7am	5pm		Luis Matute 1128054193
7	15 al 17	7am	5pm		Dalbar Rodriguez 85082041

12. SUSPENSIONES

Motivo Suspención	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor

Trabajo completo	Si	Hfa	Hora de Finalizacion:
	✓		5 Pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area
Nombre y Firma		

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre EL solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota: El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el traba instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firme en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR	EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA
Mauricio Martinez	Yulieth Ortega Vega / Yulieth Ortega V.

11. VALIDACIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor
1.	15 al 17 de enero 2026	7am	5pm	Yulieth Ortega V. 1065 600 878	Sebastian Fontalvo 1048284485
2	15 al 17	7am	5pm		Jorge Luis Calvo 1045171194
3	15 al 17	7am	5pm		Alvaro Padilla 1001829865
4	15 al 17	7am	5pm		Mauricio Ballesteros 1193585641
5	15 al 17	7am	5pm		Hector Romero 78110617
6	15 al 17	7am	5pm		Elkin Rivera 1042353673
7					

12. SUSPENSIONES

Motivo Suspencion	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor

Trabajo completo	SI	N/A	Hora de Finalizacion:
	✓		5 pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

Nombre y Firma	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

Código: FOSST-23
Versión: 01
Fecha: SEP-2023
Página 1 de 1

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

1. IDENTIFICACIÓN Y VALIDEZ

ACTIVIDAD CRITICA: Vigencia de 24 horas. ACTIVIDAD MODERADA: Vigencia de 7 días. ACTIVIDAD LEVE: Vigencia de 10 Días

CRITICA	✓	MODERADA		LEVE

FECHA DE EMISION	HORA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL EJECUTOR	No. DE PARTICIPANTES	EMPRESA
19 al 24 de enero 2026	7 am	Mauricio Martinez	13	
CAMPO	Soledad	**LUGAR DONDE SE HARA LA ACTIVIDAD**		

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Inspeccion del Area, armado de anclajes y Fundidos de barandas tramo Principal, limpieza y retiro de residuos Solidos, Excavaciones manuales para construccion del puente aereo

2. TIPO DE TRABAJO

Seleccione la opción

Caliente		Frio	

ACTIVIDADES CRITICAS	SI	N/A
TRABAJO EN ALTURAS		✓
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		✓
EXCAVACION SUPERIOR A 1.5 m.		✓
IZAJE DE CARGAS		✓
MANIPULACION SUSTANCIAS QUIMICAS	✓	
TRABAJOS EN LAS VIAS	✓	
MANEJO DE EXPLOSIVOS		✓
TRABAJOS ELECTRICOS		✓

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Seleccione la opción	SI	N/A
Biologicos	✓	
FISICOS		
Ruido	✓	
Vibraciones	✓	
Temperaturas (frio, calor)	✓	
Iluminación deficiente		✓
Presión atmosferica	✓	
QUIMICOS		
Radiaciones Ionizantes		✓
Radiaciones No Ionizantes	✓	
Polvos organicos- Inorganicos		✓
Fibras		✓
liquidos		✓
Gases y vapores		✓
Humos metalicos-no metalicos		✓
Material particulado	✓	
Materiales toxicos		✓

Seleccione la opción	SI	N/A
BIOMECANICOS		
Posturas prolongadas	✓	
Movimientos repetitivos	✓	
Manipulación de cargas		✓
Posturas incomodas	✓	
Sobreesfuerzos		✓
CONDICIONES DE SEGURIDAD		
Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar)	✓	
Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	✓	
Locativos - superficies-terrenos inestables		✓
Explosión		✓
incendio	✓	
derrumbe	✓	
fuga		✓
Robos, Atracos, atentados, desorden publico	✓	
FENOMENOS NATURALES		
Sismos, terremotos, Vendaval, inundación	✓	

Especifique otros riesgos que no se hayan comtemplado:

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD

EPP	SI	N/A
Casco	✓	
Calzado de seguridad	✓	
Gafas de seguridad	✓	
Guantes Tipo:	✓	
Proteccion auditiva	✓	
Proteccion Respiratoria	✓	
Impermeables		✓
Arnes/Linea de vida/Anclaje/ Andamios		✓
Equipos de comunicación		✓

Lugar de Trabajo	SI	N/A
Demarcar el area/vallado?	✓	
Iluminacion adecuada?	✓	
Se cuentan con rutas de evacuación?	✓	
Se cuentan con salidas de emergencias?	✓	
Se cuentan con area de disposición de materiales señalizadas?	✓	
Se cuenta con el procedimiento de trabajo	✓	
Se cuentan con equipos para atender emergencias?	✓	
Se necesitan duchas/lavaojos?		✓
Detector personal H2S		✓

5. ESPECIFIQUE LOS RECURSOS A EMPLEAR DENTRO DE LA ACTIVIDAD

VEHICULOS	SI	MAQUINARIA	SI	EQUIPO MENOR	SI	MATERIALES	SI
Documentos del vehiculo vigentes.		Se cuenta con inspección preoperacional vigente		Se cuenta con inspección preoperacional vigente		Se cuentan con las hojas de seguridad de las sustancias quimicas	
Documentos de conductor vigentes.		Documentos del operador vigentes.		El equipo se encuentra en optimas condiciones para operar?		Las sustancias quimicas cuentan con las etiquetas HMIS.	

6. TRABAJO EN CALIENTE Norma de Certificacion del Soldador (DILIGENICAR LA PARTE DE MUESTREO DE ATMOSFERAS)

Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
1 Existe material inflamable/equipos que la contengan en un radio de 10 m?		✓
2 Fosas, zanjas y drenajes estan controlados y sellados?		✓
3 Debe humedecerse el area /cortina de agua?		✓
4 Es necesario evitar/interceptar dispersion chispas?		✓

Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
Puesta a tierra de herramientas/equipos		✓
Tuvo en cuenta la direccion del viento?		✓
Se dispone de mantas de asbesto?		✓

Especifique los equipos necesarios	SI	N/A
Equipos contra incendio		✓
Tipo:		✓
Capacidad:		✓
cantidad:		✓

7. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Nombres de las personas que van a ingresar:	N° Cedula

Nombre del Observador

Verificación medidas de seguridad	SI	N/A
1 ¿Existen salidas de emergencia?		✓
2 ¿Cada persona que entra usa arnes y linea de vida?		✓
3 Cada persona que entra u observador dispone de equipo de aire autonomo		✓
4 Cada persona que entra cuenta con linea de aire c/mascara de cara completa		✓
5 Existe posibilidad de atrapamiento?		✓
6 La iluminacion y/o el equipo electrico utilizado, es igual o menor a 24 V?		✓
7 Las herramientas utilizadas son antichispa?		✓

Producto contenido en el tanque/recipiente	SI	N/A
La ropa utilizada brinda adecuada proteccion/tratamiento antiestatica?		✓
Se ha desenergizado el equipo?		✓
Se ha bloqueado y etiquetado el equipo?		✓
Se han colocado bridas ciegas/comales?		✓
Se han desvinculado tuberias y otros equipos?		✓
Se ha ventilado el equipo / bocas abiertas?		✓
El equipo esta conectado a tierra?		✓
El piso es resbaloso?		✓
EPP especiales?		✓
Disponible medico o personal de enfermeria?		✓
El area de seguridad fue demarcada?		✓
Equipo de aire para rescate/escape?		✓
Se cuenta con medios de comunicación en caso de una emergencia?		✓
Se cuenta con un medio de transporte en caso de emergencia?		✓

MUESTREO DE ATMOSFERAS

CRITERIO DE MEDICIÓN	Medición continua	SI	N/A	Registro cada hora	SI	N/A
			✓			✓

Responsable de la supervisión del trabajo:

Registre los datos de las mediciones hechas	Oxigeno (19,5% < % O2 < 22,5%)	LEL (Maximo permitido 10%)	H2S (Maximo permitido 10ppm)	CO (Maximo permitido 25ppm)
1 % / PPM				
2 HORA				

3 Nombre y firma del responsable de la medición		Equipo		# Serie		Fecha Calibración	

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre El solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota: El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabajo instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firme en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA	
Mauricio Martinez	TT.	Yulieth Ortega Vega	Yulieth Ortega V.

11. VALIDACIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor
1	15 al 24 de enero 2026	7am	5pm		Julio cesar Granado 1043151751
2	15 al 24	7am	5pm		Jesus carrillo P. 1045170499
3	15 al 24	7am	5pm		Jorge Caceres 1143155575
4	15 al 24	7am	5pm		Javid Surubia 1045172522
5	15 al 24	7am	5pm		Juan Escorcia 1048272170
6	15 al 24	7am	5pm		Luis Mafute 1128054193
7	15 al 24	7am	5pm		Daiber Rodriguez 85082041

12. SUSPENSIONES

Motivo Suspención	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor

Trabajo completo	SI	N/A
	✓	

Hora de Finalizacion: 5Pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

Nombre y Firma	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre EL solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota: El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el traba instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firme en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA	
Mauricio Martinez	TT.	Yulieth Ortega Vega	Yulieth Ortega V.

11. VALIDACIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor
1.	15 al 24 de Enero 2026	7am	5pm	Yulieth Ortega V. 1.060.880.260	Sebastian Contreras 1048284485
2	15 al 24	7am	5pm		Jorge Luis Calvo 1045137194
3	15 al 24	7am	5pm		Alveiro Padilla 1001822865
4	15 al 24	7am	5pm		Mauricio Ballesteros 1193585641
5	15 al 24	7am	5pm		Hector Romero 79110617
6	15 al 24	7am	5pm		Elkin Rivera 1042353671
7					

12. SUSPENSIONES

Motivo Suspención	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor

Trabajo completo	Si	N/A	Hora de Finalizacion:
	✓		5 pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area
Nombre y Firma		

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

Código: FOSST-23 | Versión: 01 | Fecha: SEP-2023 | Página 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN Y VALIDEZ

ACTIVIDAD CRÍTICA: Vigencia de 24 horas. ACTIVIDAD MODERADA: Vigencia de 7 días. ACTIVIDAD LEVE: Vigencia de 10 Días

CRITICA	MODERADA	LEVE
✓		

FECHA DE EMISION	HORA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL EJECUTOR	No. DE PARTICIPANTES	EMPRESA
26 al 31 de enero 2026	7 am	Mauricio Martinez	13	

CAMPO	LUGAR DONDE SE HARA LA ACTIVIDAD
	Soledad

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Inspeccion del area, armado de anclajes y Fundidas de barandas tramo Principal, limpieza y retiro de residuos Solidos, Excavaciones manuales para construccion del puente aereo

2. TIPO DE TRABAJO

Seleccione la opción

Caliente		Frio	

ACTIVIDADES CRITICAS	SI	N/A
TRABAJO EN ALTURAS		✓
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		✓
EXCAVACION SUPERIOR A 1.5 m.		✓
IZAJE DE CARGAS		✓
MANIPULACION SUSTANCIAS QUIMICAS	✓	
TRABAJOS EN LAS VIAS	✓	
MANEJO DE EXPLOSIVOS		✓
TRABAJOS ELECTRICOS		✓

Especifique otros riesgos que no se hayan comtemplado:

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Seleccione la opción	SI	N/A
Biologicos	✓	
FISICOS		
Ruido	✓	
Vibraciones	✓	
Temperaturas (frio, calor)	✓	
Iluminación deficiente		✓
Presión atmosferica	✓	
QUIMICOS		
Radiaciones Ionizantes		✓
Radiaciones No Ionizantes	✓	
Polvos organicos- Inorganicos		✓
Fibras		✓
liquidos		✓
Gases y vapores		✓
Humos metalicos-no metalicos		✓
Material particulado	✓	
Materiales toxicos		✓

Seleccione la opción	SI	N/A
BIOMECANICOS		
Posturas prolongadas	✓	
Movimientos repetitivos	✓	
Manipulación de cargas		✓
Posturas incomodas	✓	
Sobreesfuerzos		✓
CONDICIONES DE SEGURIDAD		
Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar)	✓	
Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	✓	
Locativos - superficies-terrenos inestables		✓
Explosión		✓
incendio	✓	
derrumbe	✓	
fuga		✓
Robos, Atracos, atentados, desorden publico	✓	
FENOMENOS NATURALES		
Sismos, terremotos, Vendaval, inundación	✓	

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD

EPP	SI	N/A
Casco	✓	
Calzado de seguridad	✓	
Gafas de seguridad	✓	
Guantes Tipo:	✓	
Proteccion auditiva	✓	
Proteccion Respiratoria	✓	
Impermeables		✓
Arnes/Linea de vida/Anclaje/ Andamios		✓
Equipos de comunicación		✓

Lugar de Trabajo	SI	N/A
Demarcar el area/vallado?	✓	
Iluminacion adecuada?	✓	
Se cuentan con rutas de evacuación?	✓	
Se cuentan con salidas de emergencias?	✓	
Se cuentan con area de disposición de materiales señalizadas?	✓	
Se cuenta con el procedimiento de trabajo	✓	
Se cuentan con equipos para atender emergencias?	✓	
Se necesitan duchas/lavaojos?		✓
Detector personal H2S		✓

5. ESPECIFIQUE LOS RECURSOS A EMPLEAR DENTRO DE LA ACTIVIDAD

VEHICULOS	SI	MAQUINARIA	SI	EQUIPO MENOR	SI
Documentos del vehiculo vigentes.		Se cuenta con inspección preoperacional vigente		Se cuenta con inspección preoperacional vigente	
Documentos de conductor vigentes.		Documentos del operador vigentes.		El equipo se encuentra en optimas condiciones para operar?	

MATERIALES	SI
Se cuentan con las hojas de seguridad de las sustancias quimicas	
Las sustancias quimicas cuentan con las etiquetas HMIS.	

6. TRABAJO EN CALIENTE Norma de Certificacion del Soldador (DILIGENCIAR LA PARTE DE MUESTREO DE ATMOSFERAS)

Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
1 Existe material inflamable/equipos que lo contengan en un radio de 10 m?		✓
2 Fosas, zanjas y drenajes estan cubiertos y sellados?		✓
3 Debe humedecerse el area /cortina de agua?		✓
4 Es necesario evitar/interceptar dispersion chispas?		✓

Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
Puesta a tierra de herramientas/equipos		✓
Tuvo en cuenta la dirección del viento?		✓
Se dispone de mantas de asbesto?		✓

Especifique los equipos necesarios	SI	N/A
Equipos contra incendio		✓
Tipo:		
Capacidad:		✓
cantidad:		

7. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Nombres de las personas que van a ingresar:	N° Cedula

Nombre del Observador

Verificación medidas de seguridad	SI	N/A
1 ¿Existen salidas de emergencia?		✓
2 ¿Cada persona que entra usa arnes y linea de vida?		✓
3 Cada persona que entra u observador dispone de equipo de aire autonomo		✓
4 Cada persona que entra cuenta con linea de aire c/mascara de cara completa		✓
5 Existe posibilidad de atrapamiento?		✓
6 La iluminacion y/o el equipo electrico utilizado, es igual o menor a 24 V?		✓
7 Las herramientas utilizadas son antichispa?		✓

Producto contenido en el tanque/recipiente	SI	N/A
La ropa utilizada brinda adecuada proteccion/tratamiento antiestatica?		✓
Se ha desenergizado el equipo?		✓
Se ha bloqueado y etiquetado el equipo?		✓
Se han colocado bridas ciegas/comales?		✓
Se han desvinculado tuberias y otros equipos?		✓
Se ha ventilado el equipo / bocas abiertas?		✓
El equipo esta conectado a tierra?		✓
El piso es resbaloso?		✓
EPP especiales?		✓
Disponible medico o personal de enfermeria?		✓
El area de seguridad fue demarcada?		✓
Equipo de aire para rescate/escape?		✓
Se cuenta con medios de comunicación en caso de una emergencia?		✓
Se cuenta con un medio de transporte en caso de emergencia?		✓

MUESTREO DE ATMOSFERAS

CRITERIO DE MEDICIÓN	Medición continua	SI	N/A	Registro cada hora	SI	N/A
			✓			✓

Responsable de la supervisión del trabajo:

Registre los datos de las mediciones hechas	Oxigeno (19,5% < % O2 < 22,5%)	LEL (Maximo permitido 10%)	H2S (Maximo permitido 10ppm)	CO (Maximo permitido 25ppm)
1 % / PPM				
2 HORA				

1 Nombre y firma del responsable de la medición		Equipo		# Serie		Fecha Calibración	

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre EL solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota: El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabajo instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firme en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA	
Mauricio Martinez	TP.	Yulith Ortega Vega	Yulith ortega V.

11. VALIDACIONES						12. SUSPENSIONES			
Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor	Motivo Suspencion	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor
1.		7am	5pm		Julio cesar Granado 1043151753			
2		7am	5pm		Jesus carrillo P. 1045170499			
3		7am	5pm		Jorge Caceres 1193155575			
4		7am	5pm		David Surabia 1045122522			
5		7am	5pm		Juan Escorcia 1048277470			
6		7am	5pm		Luis Matute 1128054193			
7		7am	5pm		Doiber Rodriguez 85082041			

Trabajo completo	SI	NO/A	Hora de Finalizacion:
	✓		5pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)		
	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area
Nombre y Firma		

EL original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre El solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota: El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabaj instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firme en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA	
Mauricio Martinez	TT.	Yulieth Ortega Vega	Yulieth Ortega V.

11. VALIDACIONES

12. SUSPENSIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor	Motivo Suspención	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor
1.	26 al 31 de ene 2026	7am	5pm		Sebastian Fontalvo 1048284485			
2	26 al 31	7am	5pm		Jorge Luis Calvo 1045171194			
3	26 al 31	7am	5pm		Alvaro Padilla 1001829865			
4	26 al 31	7am	5pm		Mauricio Ballestas 1143585641			
5	26 al 31	7am	5pm		Hector Romero 79110617			
6		7am	5pm		Elkin Rivera 1042353671			
7								

Trabajo completo: SI ✓ N/A

Hora de Finalizacion: 5 pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area
Nombre y Firma		

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

Código: FOSST-23 | Versión: 01 | Fecha: SEP-2023 | Página 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN Y VALIDEZ
ACTIVIDAD CRÍTICA: vigencia de 24 horas.
ACTIVIDAD MODERADA: vigencia de 7 días. ACTIVIDAD LEVE: Vigencia de 10 Días

CRITICA	✓	MODERADA		LEVE

FECHA DE EMISION	HORA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL EJECUTOR	No. DE PARTICIPANTES	EMPRESA
15 al 17 de enero 2026	7:00 am	Mauricio Martinez	9	
CAMPO	Soledad	**LUGAR DONDE SE HARA LA ACTIVIDAD**		

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Inspeccion del área, armado de anclaje, demolicion de puente Vehicular Tramo Principal, Soldado, armado de acero y Fundida de piso Tramo Principal

2. TIPO DE TRABAJO

Seleccione la opción			
Caliente		Frio	

ACTIVIDADES CRITICAS	SI	N/A
TRABAJO EN ALTURAS		✓
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		✓
EXCAVACION SUPERIOR A 1.5 m.		✓
IZAJE DE CARGAS		✓
MANIPULACION SUSTANCIAS QUIMICAS	✓	
TRABAJOS EN LAS VIAS	✓	
MANEJO DE EXPLOSIVOS		
TRABAJOS ELECTRICOS		

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Seleccione la opción	SI	N/A
Biologicos	✓	
FISICOS		
Ruido	✓	
Vibraciones	✓	
Temperaturas (frio, calor)	✓	
Iluminación deficiente		✓
Presión atmosferica	✓	
QUIMICOS		
Radiaciones Ionizantes		✓
Radiaciones No Ionizantes	✓	
Polvos organicos- inorganicos		✓
Fibras		✓
liquidos		✓
Gases y vapores		✓
Humos metalicos-no metalicos		✓
Material particulado	✓	
Materiales toxicos		✓

Seleccione la opción	SI	N/A
BIOMECANICOS		
Posturas prolongadas	✓	
Movimientos repetitivos	✓	
Manipulación de cargas		✓
Posturas incomodas	✓	
Sobreesfuerzos		✓
CONDICIONES DE SEGURIDAD		
Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar)	✓	
Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	✓	
Locativos - superficies-terrenos inestables		✓
Explosión		✓
Incendio	✓	
derrumbe	✓	
fuga		✓
Robos, Atracos, atentados, desorden publico	✓	
FENOMEMOS NATURALES		
Sismos, terremotos, Vendaval, inundación	✓	

Especifique otros riesgos que no se hayan comtemplado:

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD

EPP	SI	N/A
Casco	✓	
Calzado de seguridad	✓	
Gafas de seguridad	✓	
Guantes Tipo:	✓	
Proteccion auditiva	✓	
Proteccion Respiratoria		✓
Impermeables	✓	
Arnes/Linea de vida/Anclaje/ Andamios		✓
Equipos de comunicación		✓

Lugar de Trabajo	SI	N/A
Demarcar el area/vallado?	✓	
Iluminacion adecuada?	✓	
Se cuentan con rutas de evacuación?	✓	
Se cuentan con salidas de emergencias?	✓	
Se cuentan con area de disposición de materiales señalizadas?	✓	
Se cuenta con el procedimiento de trabajo	✓	
Se cuentan con equipos para atender emergencias?	✓	
Se necesitan duchas/lavaojos?		✓
Detector personal H2S		✓

5. ESPECIFIQUE LOS RECURSOS A EMPLEAR DENTRO DE LA ACTIVIDAD

VEHICULOS	SI	MAQUINARIA	SI	EQUIPO MENOR	SI	MATERIALES	SI
Documentos del vehiculo vigentes.		Se cuenta con inspección preoperacional vigente		Se cuenta con inspección preoperacional vigente		Se cuentan con las hojas de seguridad de las sustancias químicas	
Documentos de conductor vigentes.		Documentos del operador vigentes.		El equipo se encuentra en optimas condiciones para operar?		Las sustancias quimicas cuentan con las etiquetas HMIS.	

6. TRABAJO EN CALIENTE Norma de Certificacion del Soldador (DILIGENICAR LA PARTE DE MUESTREO DE ATMOSFERAS)

	Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
1	Existe material inflamable/equipos que lo contengan en un radio de 10 m?		✓
2	Fosas, zanjas y drenajes estan controlados y sellados?		✓
3	Debe humedecerse el area /cortina de agua?		✓
4	Es necesario evitar/interceptar dispersion chispas?		✓

Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
Puesta a tierra de herramientas/equipos		✓
Tuvo en cuenta la direccion del viento?		✓
Se dispone de mantas de asbesto?		✓

Especifique los equipos necesarios	SI	N/A
Equipos contra incendio		✓
Tipo:		
Capacidad:		
cantidad:		

7. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Nombres de las personas que van a Ingresar:	N° Cedula
Nombre del Observador	

Verificación medidas de seguridad	SI	N/A
1 ¿Existen salidas de emergencia?		✓
2 ¿Cada persona que entra usa arnes y linea de vida?		✓
3 Cada persona que entra u observador dispone de equipo de aire autonomo		✓
4 Cada persona que entra cuenta con linea de aire c/mascara de cara completa		✓
5 Existe posibilidad de atrapamiento?		✓
6 La iluminacion y/o el equipo electrico utilizado, es igual o menor a 24 V?		✓
7 Las herramientas utilizadas son antichispa?		✓

Producto contenido en el tanque/recipiente	SI	N/A
La ropa utilizada brinda adecuada proteccion/tratamiento antiestatica?		✓
Se ha desenergizado el equipo?		✓
Se ha bloqueado y etiquetado el equipo?		✓
Se han colocado bridas ciegas/comales?		✓
Se han desvinculado tuberias y otros equipos?		✓
Se ha ventilado el equipo / bocas abiertas?		✓
El equipo esta conectado a tierra?		✓
El piso es resbaloso?		✓
EPP especiales?		✓
Disponible medico o personal de enfermeria?		✓
El area de seguridad fue demarcada?		✓
Equipo de aire para rescate/escape?		✓
Se cuenta con medios de comunicación en caso de una emergencia?		✓
Se cuenta con un medio de transporte en caso de emergencia?		✓

MUESTREO DE ATMOSFERAS

CRITERIO DE MEDICIÓN	Medición continua	SI	N/A	Registro cada hora	SI	N/A	Responsable de la supervisión del trabajo:
			✓			✓	

	Registre los datos de las mediciones hechas	Oxigeno (19,5% < % O2 < 22,5%)	LEL (Maximo permitido 10%)	H2S (Maximo permitido 10ppm)	CO (Maximo permitido 25ppm)
1	% / PPM				
2	HORA				

3	Nombre y firma del responsable de la medición		Equipo		# Serie		Fecha Calibración	

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre El solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota: El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabajo, a instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firme en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA	
Mauricio Martinez		Yulieth Ortega Vega	Yulieth Ortega V.

11. VALIDACIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor
1.	15 al 17 de Ene 2026	7am	5pm		Brandon Cayria 1002 014211
2	15 al 17	7am	5pm	Yulieth Ortega V. 1.026.600.980	Jorge Zapata 1124521180
3	15 al 17	7am	5pm		Willian Saenz 1101382492
4	15 al 17	7am	5pm		Aldair Gutierrez 1143458868
5	15 al 17	7am	5pm		Luis Pena 1043146759
6	15 al 17	7am	5pm		Alfonso Rojas 72.207.088
7	15 al 17	7am	5pm		David Duarte 1192765633

Trabajo completo	SI	N/A	Hora de Finalizacion:
	✓		5pm

12. SUSPENSIONES

Motivo Suspención	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

Nombre y Firma	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre El solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota: El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabajo instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firma en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA	
Mauricio Martinez	TT	Yulieth Ortega Vega	Yulieth Ortega V.

11. VALIDACIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor
1.	15 al 17	7am	5pm	Yulieth Ortega 26008928	Hector Roman 78 11 0617
2	15 al 17	7am	5pm		Fran Klin londoño 72.045.184
3					
4					
5					
6					
7					

12. SUSPENSIONES

Motivo Suspención	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor

Trabajo completo	SI	N/A	Hora de Finalizacion:
	V		5pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

Nombre y Firma	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

Código: FOSST-23
Versión: 01
Fecha: SEP-2023
Página 1 de 1

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

1. IDENTIFICACION Y VALIDEZ
ACTIVIDAD CRÍTICA: vigencia de 24 horas.
ACTIVIDAD MODERADA: vigencia de 7 días. ACTIVIDAD LEVE: Vigencia de 10 Días

	CRITICA	✓	MODERADA		LEVE
FECHA DE EMISION	HORA DE EMISIÓN		NOMBRE DEL EJECUTOR	No. DE PARTICIPANTES	EMPRESA
19 al 24 de enero 2026	7:00 am		Mauricio Martinez	9	
CAMPO	Soledad		LUGAR DONDE SE HARA LA ACTIVIDAD		

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Inspeccion del area, limpiezu de residuos solidos del conud, se continua con la demolicion del puente, relleno con material de receba

2. TIPO DE TRABAJO

Seleccione la opción			
Caliente		Frio	

ACTIVIDADES CRITICAS	SI	N/A
TRABAJO EN ALTURAS		✓
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		✓
EXCAVACION SUPERIOR A 1.5 m.		✓
IZAJE DE CARGAS		✓
MANIPULACION SUSTANCIAS QUIMICAS	✓	
TRABAJOS EN LAS VIAS	✓	
MANEJO DE EXPLOSIVOS		✓
TRABAJOS ELECTRICOS		✓

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Seleccione la opción	SI	N/A
Biologicos	✓	
FISICOS		
Ruido	✓	
Vibraciones	✓	
Temperaturas (frio, calor)	✓	
Iluminación deficiente		✓
Presión atmosferica	✓	
QUIMICOS		
Radiaciones ionizantes		✓
Radiaciones No ionizantes	✓	
Polvos organicos- inorganicos		✓
Fibras		✓
liquidos		✓
Gases y vapores		✓
Humos metalicos-no metalicos		✓
Material particulado	✓	
Materiales toxicos		✓

Seleccione la opción	SI	N/A
BIOMECANICOS		
Posturas prolongadas	✓	
Movimientos repetitivos	✓	
Manipulación de cargas		✓
Posturas incomodas	✓	
Sobreesfuerzos		✓
CONDICIONES DE SEGURIDAD		
Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar)	✓	
Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	✓	
Locativos - superficies-terrenos inestables		✓
Explosión		✓
incendio	✓	
derrumbe	✓	
fuga		
Robos, Atracos, atentados, desorden publico	✓	
FENOMEMOS NATURALES		
Sismos, terremotos, Vendaval, inundación	✓	

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD

EPP	SI	N/A
Casco	✓	
Calzado de seguridad	✓	
Gafas de seguridad	✓	
Guantes Tipo:	✓	
Proteccion auditiva	✓	
Proteccion Respiratoria		✓
Impermeables	✓	
Arnes/Linea de vida/Anclaje/ Andamios		✓
Equipos de comunicación		

Lugar de Trabajo	SI	N/A
Demarcar el area/vallado?	✓	
Iluminacion adecuada?	✓	
Se cuentan con rutas de evacuación?	✓	
Se cuentan con salidas de emergencias?	✓	
Se cuentan con area de disposición de materiales señalizadas?	✓	
Se cuenta con el procedimiento de trabajo	✓	
Se cuentan con equipos para atender emergencias?	✓	
Se necesitan duchas/lavaojos?		✓
Detector personal H2S		✓

Especifique otros riesgos que no se hayan comtemplado:

5. ESPECIFIQUE LOS RECURSOS A EMPLEAR DENTRO DE LA ACTIVIDAD

VEHICULOS	SI	MAQUINARIA	SI	EQUIPO MENOR	SI	MATERIALES	SI
Documentos del vehiculo vigentes.	✓	Se cuenta con inspección preoperacional vigente	✓	Se cuenta con inspección preoperacional vigente	✓	Se cuentan con las hojas de seguridad de las sustancias quimicas	✓
Documentos de conductor vigentes.	✓	Documentos del operador vigentes.	✓	El equipo se encuentra en optimas condiciones para operar?	✓	Las sustancias quimicas cuentan con las etiquetas HMIS.	✓

6. TRABAJO EN CALIENTE Norma de Certificacion del Soldador (DILIGENICAR LA PARTE DE MUESTREO DE ATMOSFERAS)

	Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
1	Existe material inflamable/equipos que lo contengan en un radio de 10 m?		✓
2	Fosas, zanjas y drenajes estan controlados y sellados?		✓
3	Debe humedecerse el area /cortina de agua?		✓
4	Es necesario evitar/interceptar dispersion chispas?		✓

Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
Puesta a tierra de herramientas/equipos		✓
Tuvo en cuenta la direccion del viento?		✓
Se dispone de mantas de asbesto?		✓

Especifique los equipos necesarios	SI	N/A
Equipos contra incendio		✓
Tipo:		
Capacidad:		
cantidad:		

7. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Nombres de las personas que van a ingresar:	N° Cedula
Nombre del Observador	

Verificación medidas de seguridad	SI	N/A
1 ¿Existen salidas de emergencia?		✓
2 ¿Cada persona que entra usa arnes y linea de vida?		✓
3 Cada persona que entra u observador dispone de equipo de aire autonomo		✓
4 Cada persona que entra cuenta con linea de aire c/mascara de cara completa		✓
5 Existe posibilidad de atrapamiento?		✓
6 La iluminacion y/o el equipo electrico utilizado, es igual o menor a 24 V?		✓
7 Las herramientas utilizadas son antichispa?		✓

Producto contenido en el tanque/recipiente	SI	N/A
La ropa utilizada brinda adecuada proteccion/tratamiento antiestatica?		✓
Se ha desenergizado el equipo?		✓
Se ha bloqueado y etiquetado el equipo?		✓
Se han colocado bridas ciegas/comales?		✓
Se han desvinculado tuberias y otros equipos?		✓
Se ha ventilado el equipo / bocas abiertas?		✓
El equipo esta conectado a tierra?		✓
El piso es resbaloso?		✓
EPP especiales?		✓
Disponible medico o perosnal de enfermeria?		✓
El area de seguridad fue demarcada?		✓
Equipo de aire para rescate/escape?		✓
Se cuenta con medios de comunicación en caso de una emergencia?		✓
Se cuenta con un medio de transporte en caso de emergencia?		✓

MUESTREO DE ATMOSFERAS

CRITERIO DE MEDICIÓN	Medición continua	SI	N/A	Registro cada hora	SI	N/A	Responsable de la supervisión del trabajo:
			✓			✓	

Registre los datos de las mediciones hechas		Oxigeno (19,5% < % O2 < 22,5%)	LEL (Maximo permitido 10%)	H2S (Maximo permitido 10ppm)	CO (Maximo permitido 25ppm)
1	% / PPM				
2	HORA				
3	Nombre y firma del responsable de la medición		Equipo	# Serie	Fecha Calibración

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre El solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota: El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabajo, instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firme en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA	
Mauricio Martinez	TP	Yulieth Ortega Vega	Yulieth Ortega V.

11. VALIDACIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor
1	19 al 24	7am	5pm		Brandon Gaviria 1002 014211
2	19 al 24	7am	5pm		Jorge Zapata 1129526180
3	19 al 24	7am	5pm		Willian Saenz 1101382492
4	19 al 24	7am	5pm	Yulieth Ortega C. 1260084199	Aldair Gutierrez 1193458868
5	19 al 24	7am	5pm		Luis Pena 1043146759
6	19 al 24	7am	5pm		Alfonso Rojas 72.207.088
7	19 al 24	7am	5pm		David Duarte 1192765633

12. SUSPENSIONES

Motivo Suspención	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor

Trabajo completo: SI ✓ | N/A

Hora de Finalizacion: 5pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

Nombre y Firma	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre El solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota: *El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabajo instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S*

Apertura del Permiso (Firma en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA	
Mauricio Martinez	PP	Yulith Ortega Vega	Yulith Ortega V.

11. VALIDACIONES

12. SUSPENSIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor	Motivo Suspención	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor
1	19 al 24	7am	5pm	Yulith Ortega 26000825	Hector Roman 78 11 0617			
2	19 al 24	7am	5pm	Yulith Ortega 26000825	Franklin londoño 72.045.154			
3								
4								
5								
6								
7								

Trabajo completo	SI	N/A	Hora de Finalizacion:	5pm
	V			

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

Nombre y Firma	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

Código: FOSST-23
Versión: 01
Fecha: SEP-2023
Página 1 de 1

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

1. IDENTIFICACIÓN Y VALIDEZ
ACTIVIDAD CRÍTICA: Vigencia de 24 horas.
ACTIVIDAD MODERADA: Vigencia de 7 días. ACTIVIDAD LEVE: Vigencia de 10 Días

CRITICA	MODERADA	LEVE
	✓	

FECHA DE EMISION	HORA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL EJECUTOR	No. DE PARTICIPANTES	EMPRESA
26 al 31 de enero 2026	7:00 am	Mauricio Martinez	9	
CAMPO		LUGAR DONDE SE HARA LA ACTIVIDAD		
	Soledad			

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Inspeccion del area, Limpieza de residuos solidos, continuacion con la demolicion del puente vehicular Tramo Principal

2. TIPO DE TRABAJO

Seleccione la opción				ACTIVIDADES CRITICAS	SI	N/A
Caliente		Frio		TRABAJO EN ALTURAS		✓
				TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		✓
				EXCAVACION SUPERIOR A 1.5 m.		✓
				IZAJE DE CARGAS		✓
				MANIPULACION SUSTANCIAS QUIMICAS	✓	
				TRABAJOS EN LAS VIAS	✓	
				MANEJO DE EXPLOSIVOS		✓
				TRABAJOS ELECTRICOS		✓

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Seleccione la opción	SI	N/A
Biologicos	✓	
FISICOS		
Ruido	✓	
Vibraciones	✓	
Temperaturas (frio, calor)	✓	
Iluminación deficiente		✓
Presión atmosferica	✓	
QUIMICOS		
Radiaciones Ionizantes		✓
Radiaciones No ionizantes	✓	
Polvos organicos- inorganicos		✓
Fibras		✓
liquidos		✓
Gases y vapores		✓
Humos metalicos-no metalicos		✓
Material particulado	✓	
Materiales toxicos		✓

Seleccione la opción	SI	N/A
BIOMECANICOS		
Posturas prolongadas	✓	
Movimientos repetitivos	✓	
Manipulación de cargas		✓
Posturas incomodas	✓	
Sobreesfuerzos		✓
CONDICIONES DE SEGURIDAD		
Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar)	✓	
Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	✓	
Locativos - superficies-terrenos inestables		✓
Explosión		✓
Incendio	✓	
derrumbe	✓	
fuga		
Robos, Atracos, atentados, desorden publico	✓	
FENOMENOS NATURALES		
Sismos, terremotos, Vendaval, Inundación	✓	

Especifique otros riesgos que no se hayan comtemplado:

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD

EPP	SI	N/A
Casco	✓	
Calzado de seguridad	✓	
Gafas de seguridad	✓	
Guantes Tipo:	✓	
Proteccion auditiva	✓	
Proteccion Respiratoria		✓
Impermeables	✓	
Arnes/Linea de vida/Anclaje/ Andamios		✓
Equipos de comunicación		

Lugar de Trabajo	SI	N/A
Demarcar el area/vallado?	✓	
Iluminacion adecuada?	✓	
Se cuentan con rutas de evacuación?	✓	
Se cuentan con salidas de emergencias?	✓	
Se cuentan con area de disposición de materiales señalizadas?	✓	
Se cuenta con el procedimiento de trabajo	✓	
Se cuentan con equipos para atender emergencias?	✓	
Se necesitan duchas/lavaojos?		✓
Detector personal H2S		✓

5. ESPECIFIQUE LOS RECURSOS A EMPLEAR DENTRO DE LA ACTIVIDAD

VEHICULOS	SI	MAQUINARIA	SI	EQUIPO MENOR	SI	MATERIALES	SI
Documentos del vehiculo vigentes.	✓	Se cuenta con inspección preoperacional vigente	✓	Se cuenta con inspección preoperacional vigente	✓	Se cuentan con las hojas de seguridad de las sustancias quimicas	✓
Documentos de conductor vigentes.	✓	Documentos del operador vigentes.	✓	El equipo se encuentra en optimas condiciones para operar?	✓	Las sustancias quimicas cuentan con las etiquetas HMIS.	✓

6. TRABAJO EN CALIENTE Norma de Certificacion del Soldador (DILIGENICAR LA PARTE DE MUESTREO DE ATMOSFERAS)

Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
1 Existe material inflamable/equipos que lo contengan en un radio de 10 m?		✓
2 Fosas, zanjas y drenajes esun controlados y sellados?		✓
3 Debe humedecerse el area /cortina de agua?		✓
4 Es necesario evitar/interceptar dispersion chispas?		✓

Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
Puesta a tierra de herramientas/equipos		✓
Tuvo en cuenta la direccion del viento?		✓
Se dispone de mantas de asbesto?		✓

Especifique los equipos necesarios	SI	N/A
Equipos contra incendio		✓
Tipo:		
Capacidad:		✓
cantidad:		✓

7. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Nombres de las personas que van a ingresar:	N° Cedula
Nombre del Observador	

Verificación medidas de seguridad	SI	N/A
1 ¿Existen salidas de emergencia?		✓
2 ¿Cada persona que entra usa arnes y linea de vida?		✓
3 Cada persona que entra u observador dispone de equipo de aire autonomo		✓
4 Cada persona que entra cuenta con linea de aire c/mascara de cara completa		✓
5 Existe posibilidad de atrapamiento?		✓
6 La iluminacion y/o el equipo electrico utilizado, es igual o menor a 24 V?		✓
7 Las herramientas utilizadas son antichispa?		✓

Producto contenido en el tanque/recipiente	SI	N/A
La ropa utilizada brinda adecuada proteccion/tratamiento antiestatica?		✓
Se ha desenergizado el equipo?		✓
Se ha bloqueado y etiquetado el equipo?		✓
Se han colocado bridas ciegas/comales?		✓
Se han desvinculado tuberias y otros equipos?		✓
Se ha ventilado el equipo / bocas abiertas?		✓
El equipo esta conectado a tierra?		✓
El piso es resbaloso?		✓
EPP especiales?		✓
Disponible medico o personal de enfermeria?		✓
El area de seguridad fue demarcada?		✓
Equipo de aire para rescate/escape?		✓
Se cuenta con medios de comunicación en caso de una emergencia?		✓
Se cuenta con un medio de transporte en caso de emergencia?		✓

MUESTREO DE ATMOSFERAS

CRITERIO DE MEDICIÓN	Medición continua	SI	N/A	Registro cada hora	SI	N/A	Responsable de la supervisión del trabajo:
			✓			✓	

Registre los datos de las mediciones hechas	Oxigeno (19,5% < % O2 < 22,5%)	LEL (Maximo permitido 10%)	H2S (Maximo permitido 10ppm)	CO (Maximo permitido 25ppm)
1 % / PPM				
2 HORA				
3 Nombre y firma del responsable de la medición				

Equipo		# Serie		Fecha Calibración	

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre El solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota: El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabajo, a instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firme en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA	
Mauricio Martinez	TP.	Yulieth Ortega Vega	Yulieth Ortega V.

11. VALIDACIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor
1	26 al 31-01-2026	7am	5pm	Yulieth Ortega C. 1.060.650.190	Brandon Gaviria 1002 014211
2	26 al 31	7am	5pm		Jorge Zapata 1129522180
3	26 al 31	7am	5pm		Willian Saenz 1101382492
4	26 al 31	7am	5pm		Aldair Gutierrez 1143488868
5	26 al 31	7am	5pm		Luis Pena 10431467 59
6	26 al 31	7am	5pm		Alfonso Rojas 72.207.088
7	26 al 31	7am	5pm		David Duque 1192765633

12. SUSPENSIONES

Motivo Suspención	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor

Trabajo completo	SI	N/A	Hora de Finalizacion:
	V		5 pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area
Nombre y Firma		

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre El solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota: El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabajo instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firma en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA	
Mauricio Martinez		Yulieth Ortega Vega	Yulieth Ortega V.

11. VALIDACIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor
1	26 al 31	7am	5pm	Yulieth Ortega 26000878	Hector Roman 78110617
2	26 al 31	7am	5pm	Yulieth Ortega 26000878	Franklin londoño 72.045.184
3					
4					
5					
6					
7					

12. SUSPENSIONES

Motivo Suspención	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor

Trabajo completo	SI	N/A	Hora de Finalizacion:
	✓		5pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area
Nombre y Firma		

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

CONSORCIO CANALIZACIÓN
EL PLATANAL 2023

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

Código: FOSST-23
Versión: 01
Fecha: SEP-2023
Página 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN Y VALIDEZ
ACTIVIDAD CRÍTICA: vigencia de 24 horas.
ACTIVIDAD MODERADA: vigencia de 7 días. ACTIVIDAD LEVE: Vigencia de 10 días

CRITICA	✓	MODERADA		LEVE

FECHA DE EMISION	HORA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL EJECUTOR	No. DE PARTICIPANTES	EMPRESA
02 de Feb al 07 2026	7:00 am	Mauricio Martinez	9	
CAMPO		LUGAR DONDE SE HARA LA ACTIVIDAD		
	Soledad			

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Inspeccion del área, armada de acero, limpieza de residuos para Fundida de Piso Puente Vehicular Tramo Principal

2. TIPO DE TRABAJO

Seleccione la opción			
Caliente		Frio	

ACTIVIDADES CRITICAS	SI	N/A
TRABAJO EN ALTURAS		✓
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		✓
EXCAVACION SUPERIOR A 1.5 m.		✓
IZAJE DE CARGAS		✓
MANIPULACION SUSTANCIAS QUIMICAS	✓	
TRABAJOS EN LAS VIAS	✓	
MANEJO DE EXPLOSIVOS		✓
TRABAJOS ELECTRICOS		✓

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Seleccione la opción	SI	N/A
Biologicos	✓	
FISICOS		
Ruido	✓	
Vibraciones	✓	
Temperaturas (frio, calor)	✓	
Iluminación deficiente		✓
Presión atmosferica	✓	
QUIMICOS		
Radiaciones Ionizantes		✓
Radiaciones No ionizantes	✓	
Polvos organicos- Inorganicos		✓
Fibras		✓
liquidos		✓
Gases y vapores		✓
Humos metalicos-no metalicos		✓
Material particulado	✓	
Materiales toxicos		✓

Seleccione la opción	SI	N/A
BIOMECANICOS		
Posturas prolongadas	✓	
Movimientos repetitivos	✓	
Manipulación de cargas		✓
Posturas incomodas	✓	
Sobreesfuerzos		✓
CONDICIONES DE SEGURIDAD		
Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar)	✓	
Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	✓	
Locativos - superficies-terrenos inestables		✓
Explosión		✓
Incendio	✓	
derrumbe	✓	
fuga		
Robos, Atracos, atentados, desorden publico	✓	
FENOMENOS NATURALES		
Sismos, terremotos, Vendaval, inundación	✓	

Especifique otros riesgos que no se hayan comtemplado:

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD

EPP	SI	N/A
Casco	✓	
Calzado de seguridad	✓	
Gafas de seguridad	✓	
Guantes Tipo:	✓	
Proteccion auditiva	✓	
Proteccion Respiratoria		✓
Impermeables	✓	
Arnes/Linea de vida/Anclaje/ Andamios		✓
Equipos de comunicación		
Lugar de Trabajo	**SI**	**N/A**
Demarcar el area/vallado?	✓	
Iluminacion adecuada?	✓	
Se cuentan con rutas de evacuación?	✓	
Se cuentan con salidas de emergencias?	✓	
Se cuentan con area de disposición de materiales señalizadas?	✓	
Se cuenta con el procedimiento de trabajo	✓	
Se cuentan con equipos para atender emergencias?	✓	
Se necesitan duchas/lavaojos?		✓
Detector personal H2S		✓

5. ESPECIFIQUE LOS RECURSOS A EMPLEAR DENTRO DE LA ACTIVIDAD

VEHICULOS	SI	MAQUINARIA	SI	EQUIPO MENOR	SI	MATERIALES	SI
Documentos del vehiculo vigentes.	✓	Se cuenta con inspección preoperacional vigente	✓	Se cuenta con inspección preoperacional vigente	✓	Se cuentan con las hojas de seguridad de las sustancias quimicas	✓
Documentos de conductor vigentes.	✓	Documentos del operador vigentes.	✓	El equipo se encuentra en optimas condiciones para operar?	✓	Las sustancias quimicas cuentan con las etiquetas HMIS.	✓

6. TRABAJO EN CALIENTE Norma de Certificacion del Soldador (DILIGENICAR LA PARTE DE MUESTREO DE ATMOSFERAS)

	Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
1	Existe material inflamable/equipos que lo contengan en un radio de 10 m?		✓
2	Fosas, zanjas y drenajes estan controlados y sellados?		✓
3	Debe humedecerse el area /cortina de agua?		✓
4	Es necesario evitar/interceptar dispersion chispas?		✓

Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
Puesta a tierra de herramientas/equipos		✓
Tuvo en cuenta la direccion del viento?		✓
Se dispone de mantas de asbesto?		✓

Especifique los equipos necesarios	SI	N/A
Equipos contra incendio		✓
Tipo:		
Capacidad:		
cantidad:		

7. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Nombres de las personas que van a Ingresar:	N° Cedula
Nombre del Observador	

Verificación medidas de seguridad	SI	N/A
1 ¿Existen salidas de emergencia?		✓
2 ¿Cada persona que entra usa arnes y linea de vida?		✓
3 Cada persona que entra u observador dispone de equipo de aire autonomo		✓
4 Cada persona que entra cuenta con linea de aire c/mascara de cara completa		✓
5 Existe posibilidad de atrapamiento?		✓
6 La iluminacion y/o el equipo electrico utilizado, es igual o menor a 24 V?		✓
7 Las herramientas utilizadas son antichispa?		✓

Producto contenido en el tanque/recipiente	SI	N/A
La ropa utilizada brinda adecuada proteccion/tratamiento antiestatica?		✓
Se ha desenergizado el equipo?		✓
Se ha bloqueado y etiquetado el equipo?		✓
Se han colocado bridas ciegas/comales?		✓
Se han desvinculado tuberias y otros equipos?		✓
Se ha ventilado el equipo / bocas abiertas?		✓
El equipo esta conectado a tierra?		✓
El piso es resbaloso?		✓
EPP especiales?		✓
Disponible medico o perosnal de enfermeria?		✓
El area de seguridad fue demarcada?		✓
Equipo de aire para rescate/escape?		✓
Se cuenta con medios de comunicación en caso de una emergencia?		✓
Se cuenta con un medio de transporte en caso de emergencia?		✓

MUESTREO DE ATMOSFERAS

CRITERIO DE MEDICIÓN	Medición continua	SI	N/A	Registro cada hora	SI	N/A	Responsable de la supervisión del trabajo:
			✓			✓	

Registre los datos de las mediciones hechas		Oxigeno (19,5% < % O2 < 22,5%)	LEL (Maximo permitido 10%)	H2S (Maximo permitido 10ppm)	CO (Maximo permitido 25ppm)
1	% / PPM				
2	HORA				
3	Nombre y firma del responsable de la medición		Equipo	# Serie	Fecha Calibración

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre El solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota: El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabajo, a instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firme en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA	
Mauricio Martinez	PP	Yuliet Ortega Vega	Yuliet Ortega V.

11. VALIDACIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor
1	02 al 07 de Feb 2026	7am	5pm	Yuliet O. Ortega V. 1.600.818	Brandon Gaviria 1002 014211
2	02 al 07	7am	5pm		Jorge Zapata 1379522180
3	02 al 07	7am	5pm		Willian Saenz 1101382492
4	02 al 07	7am	5pm		Aldair Gutierrez 1143458868
5	02 al 07	7am	5pm		Luis Pena 10431467 59
6	02 al 07	7am	5pm		Alfonso Rojas 72.207.088,
7	02 al 07	7am	5pm		David Duarte 1192765633

12. SUSPENSIONES

Motivo Suspensión	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor

Trabajo completo	SI	N/A	Hora de Finalizacion:
	✓		5pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

Nombre y Firma	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre El solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota: El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabajo instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firma en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA	
Mauricio Martinez		Yulieth Ortega Vega	Yulieth Ortega V.

11. VALIDACIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor
1.	07 al 07	7am	5pm	Yulieth Ortega 1.140.860.878	Hector Romero 78 11 0617
2	02 al 07	7am	5pm		Frank Lin londoño 72.045.154
3					
4					
5					
6					
7					

12. SUSPENSIONES

Motivo Suspención	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor

Trabajo completo	SI	N/A	Hora de Finalizacion:
	✓		5pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

Nombre y Firma	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

Código: FOSST-23
Versión: 01
Fecha: SEP 2023
Página 1 de 1

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

1. IDENTIFICACIÓN Y VALIDEZ
ACTIVIDAD CRÍTICA: Vigencia de 24 horas.
ACTIVIDAD MODERADA: vigencia de 7 días, ACTIVIDAD LEVE: Vigencia de 10 Días

CRITICA	✓	MODERADA		LEVE

FECHA DE EMISION	HORA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL EJECUTOR	No. DE PARTICIPANTES	EMPRESA
09 de 14 de Feb 2026	7:00 am	Mauricio Martinez	9	
CAMPO	LUGAR DONDE SE HARA LA ACTIVIDAD			
	Soledad			

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Inspeccion del area, limpieza de residuos solidos, continuacion de armado de acero y fundida de Piso del Puente Vehicular Tromo Principal

2. TIPO DE TRABAJO — Seleccione la opción

Caliente		Frio	

ACTIVIDADES CRITICAS	SI	N/A
TRABAJO EN ALTURAS		✓
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		✓
EXCAVACION SUPERIOR A 1.5 m.		✓
IZAJE DE CARGAS		✓
MANIPULACION SUSTANCIAS QUIMICAS	✓	
TRABAJOS EN LAS VIAS	✓	
MANEJO DE EXPLOSIVOS		✓
TRABAJOS ELECTRICOS		✓

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Seleccione la opción	SI	N/A
Biologicos	✓	
FISICOS		
Ruido	✓	
Vibraciones	✓	
Temperaturas (frio, calor)	✓	
Iluminación deficiente		✓
Presión atmosferica	✓	
QUIMICOS		
Radiaciones Ionizantes		✓
Radiaciones No Ionizantes	✓	
Polvos organicos- Inorganicos		✓
Fibras		✓
liquidos		✓
Gases y vapores		✓
Humos metalicos-no metalicos		✓
Material particulado	✓	
Materiales toxicos		✓

Seleccione la opción	SI	N/A
BIOMECANICOS		
Posturas prolongadas	✓	
Movimientos repetitivos	✓	
Manipulación de cargas		✓
Posturas Incomodas	✓	
Sobreesfuerzos		✓
CONDICIONES DE SEGURIDAD		
Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar)	✓	
Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	✓	
Locativos - superficies-terrenos inestables		✓
Explosión		✓
Incendio	✓	
derrumba	✓	
fuga		
Robos, Atracos, atentados, desorden publico	✓	
FENOMENOS NATURALES		
Sismos, terremotos, Vendaval, Inundación	✓	

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD

EPP	SI	N/A
Casco	✓	
Calzado de seguridad	✓	
Gafas de seguridad	✓	
Guantes Tipo:	✓	
Proteccion auditiva	✓	
Proteccion Respiratoria		—
Impermeables	✓	
Arnes/Linea de vida/Anclaje/ Andamios		✓
Equipos de comunicación		

Lugar de Trabajo	SI	N/A
Demarcar el area/vallado?	✓	
Iluminacion adecuada?	✓	
Se cuentan con rutas de evacuación?	✓	
Se cuentan con salidas de emergencias?	✓	
Se cuentan con area de disposición de materiales señalizadas?	✓	
Se cuenta con el procedimiento de trabajo	✓	
Se cuentan con equipos para atender emergencias?	✓	
Se necesitan duchas/lavaojos?		✓
Detector personal H2S		✓

Especifique otros riesgos que no se hayan contemplado:

5. ESPECIFIQUE LOS RECURSOS A EMPLEAR DENTRO DE LA ACTIVIDAD

VEHICULOS	SI
Documentos del vehiculo vigentes.	✓
Documentos de conductor vigentes.	✓

MAQUINARIA	SI
Se cuenta con inspección preoperacional vigente	✓
Documentos del operador vigentes.	✓

EQUIPO MENOR	SI
Se cuenta con inspección preoperacional vigente	✓
El equipo se encuentra en optimas condiciones para operar?	✓

MATERIALES	SI
Se cuentan con las hojas de seguridad de las sustancias quimicas	✓
Las sustancias quimicas cuentan con las etiquetas HMIS.	✓

6. TRABAJO EN CALIENTE Norma de Certificacion del Soldador (DILIGENICAR LA PARTE DE MUESTREO DE ATMOSFERAS)

Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
1 Existe material inflamable/equipos que lo contengan en un radio de 10 m?		✓
2 Fosas, zanjas y drenajes estan controlados y sellados?		✓
3 Debe humedecerse el area /cortina de agua?		✓
4 Es necesario evitar/interceptar dispersion chispas?		✓

Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
Puesta a tierra de herramientas/equipos		✓
Tuvo en cuenta la direccion del viento?		✓
Se dispone de mantas de asbesto?		✓

Especifique los equipos necesarios	SI	N/A
Equipos contra incendio		✓
Tipo:		
Capacidad:		
cantidad:		

7. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Nombres de las personas que van a Ingresar:	N° Cedula

Producto contenido en el tanque/recipiente	SI	N/A
La ropa utilizada brinda adecuada proteccion/tratamiento antiestatica?		✓
Se ha desenergizado el equipo?		✓
Se ha bloqueado y etiquetado el equipo?		✓
Se han colocado bridas ciegas/comales?		✓
Se han desvinculado tuberias y otros equipos?		✓
Se ha ventilado el equipo / bocas abiertas?		✓
El equipo esta conectado a tierra?		✓
El piso es resbaloso?		✓
EPP especiales?		✓
Disponible medico o personal de enfermeria?		✓
El area de seguridad fue demarcada?		✓
Equipo de aire para rescate/escape?		✓
Se cuenta con medios de comunicación en caso de una emergencia?		✓
Se cuenta con un medio de transporte en caso de emergencia?		✓

Nombre del Observador

Verificación medidas de seguridad	SI	N/A
1 ¿Existen salidas de emergencia?		✓
2 ¿Cada persona que entra usa arnes y linea de vida?		✓
3 Cada persona que entra u observador dispone de equipo de aire autonomo		✓
4 Cada persona que entra cuenta con linea de aire c/mascara de cara completa		✓
5 Existe posibilidad de atrapamiento?		✓
6 La iluminacion y/o el equipo electrico utilizado, es igual o menor a 24 V?		✓
7 Las herramientas utilizadas son antichispa?		✓

MUESTREO DE ATMOSFERAS

CRITERIO DE MEDICIÓN	Medición continua	SI	N/A	Registro cada hora	SI	N/A
			✓			✓

Responsable de la supervisión del trabajo:

Registre los datos de las mediciones hechas	Oxigeno (19,5% < % O2 < 22,5%)	LEL (Maximo permitido 10%)	H2S (Maximo permitido 10ppm)	CO (Maximo permitido 25ppm)
1 % / PPM				
2 HORA				

3 Nombre y firma del responsable de la medición		Equipo		# Serie		Fecha Calibración	

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre El solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota: El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabajo, a instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firme en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA	
Mauricio Martinez		Yulieth Ortega Vega	Yulieth Ortega V.

11. VALIDACIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor
1	09 al 14	7am	5pm		Brandon Gaviria 1002 014211
2	09 al 14	7am	5pm		Jorge Zapata 1329521180
3	09 al 14	7am	5pm		William Saenz 1101382492
4	09 al 14	7am	5pm		Aldair Gutierrez 1143488868
5	09 al 14	7am	5pm		Luis Pena 1043146759
6	09 al 14	7am	5pm		Alfonso Rojas 72.207.088
7	09 al 14	7am	5pm		David Duarte 1192765633

12. SUSPENSIONES

Motivo Suspención	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor

Trabajo completo: SI ✓ N/A

Hora de Finalizacion: 5pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

Nombre y Firma	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre El solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota:El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabajo, a instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firme en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA	
Mauricio Martinez		Yulieth Ortega Vega	Yulieth Ortega V.

11. VALIDACIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor
1	09 al 14	7am	5pm	Yulieth Ortega 26000828	Hector Romero 78110617
2	09 al 14	7am	5pm		Frank Lin londoño 72045154
3					
4					
5					
6					
7					

12. SUSPENSIONES

Motivo Suspención	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor

	Si	N/A		
Trabajo completo	✓		Hora de Finalizacion:	5pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area
Nombre y Firma		

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

Código: FOSST-23
Versión: 01
Fecha: SEP-2023
Página 1 de 1

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

1. IDENTIFICACIÓN Y VALIDEZ

ACTIVIDAD CRÍTICA: Vigencia de 24 horas.
ACTIVIDAD MODERADA: vigencia de 7 días. ACTIVIDAD LEVE: Vigencia de 10 Días

CRITICA ✓ | MODERADA | LEVE

FECHA DE EMISION	HORA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL EJECUTOR	No. DE PARTICIPANTES	EMPRESA
02 de Feb al 07 Feb 2026	7 am	Mauricio Martinez	13	
CAMPO	Soledad	LUGAR DONDE SE HARA LA ACTIVIDAD		

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Inspeccion del areas armado de anclajes y Fundidos de barandas tramo principal, limpieza y retiro de residuos Solidos, Excavaciones manuales para construccion del puente aereo

2. TIPO DE TRABAJO

Seleccione la opción			
Caliente		Frio	

ACTIVIDADES CRITICAS	SI	N/A
TRABAJO EN ALTURAS		✓
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		✓
EXCAVACION SUPERIOR A 1.5 m.		✓
IZAJE DE CARGAS		✓
MANIPULACION SUSTANCIAS QUIMICAS	✓	
TRABAJOS EN LAS VIAS	✓	
MANEJO DE EXPLOSIVOS		✓
TRABAJOS ELECTRICOS		✓

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Seleccione la opción	SI	N/A
Biologicos	✓	
FISICOS		
Ruido	✓	
Vibraciones	✓	
Temperaturas (frio, calor)	✓	
Iluminación deficiente		✓
Presión atmosferica	✓	
QUIMICOS		
Radiaciones ionizantes		✓
Radiaciones No Ionizantes	✓	
Polvos organicos- inorganicos		✓
Fibras		✓
liquidos		✓
Gases y vapores		✓
Humos metalicos-no metalicos		✓
Material particulado	✓	
Materiales toxicos		✓

Seleccione la opción	SI	N/A
BIOMECANICOS		
Posturas prolongadas	✓	
Movimientos repetitivos	✓	
Manipulación de cargas		✓
Posturas incomodas	✓	
Sobreesfuerzos		✓
CONDICIONES DE SEGURIDAD		
Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar)	✓	
Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	✓	
Locativos - superficies-terrenos inestables		✓
Explosión		✓
incendio	✓	
derrumbe	✓	
fuga		✓
Robos, Atracos, atentados, desorden publico	✓	
FENOMENOS NATURALES		
Sismos, terremotos, Vendaval, inundación	✓	

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD

EPP	SI	N/A
Casco	✓	
Calzado de seguridad	✓	
Gafas de seguridad	✓	
Guantes Tipo:	✓	
Proteccion auditiva	✓	
Proteccion Respiratoria	✓	
Impermeables		✓
Arnes/Linea de vida/Anclaje/ Andamios		✓
Equipos de comunicación		✓

Lugar de Trabajo	SI	N/A
Demarcar el area/vallado?	✓	
Iluminacion adecuada?	✓	
Se cuentan con rutas de evacuación?	✓	
Se cuentan con salidas de emergencias?	✓	
Se cuentan con area de disposición de materiales señalizadas?	✓	
Se cuenta con el procedimiento de trabajo	✓	
Se cuentan con equipos para atender emergencias?	✓	
Se necesitan duchas/lavaojos?		✓
Dutector personal H2S		✓

Especifique otros riesgos que no se hayan comtemplado:

5. ESPECIFIQUE LOS RECURSOS A EMPLEAR DENTRO DE LA ACTIVIDAD

VEHICULOS	SI	MAQUINARIA	SI	EQUIPO MENOR	SI	MATERIALES	SI
Documentos del vehiculo vigentes.		Se cuenta con inspección preoperacional vigente		Se cuenta con inspección preoperacional vigente		Se cuentan con las hojas de seguridad de las sustancias quimicas	
Documentos de conductor vigentes.		Documentos del operador vigentes.		El equipo se encuentra en optimas condiciones para operar?		Las sustancias quimicas cuentan con las etiquetas HMIS.	

6. TRABAJO EN CALIENTE Norma de Certificacion del Soldador (DILIGENICAR LA PARTE DE MUESTREO DE ATMOSFERAS)

Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
1 Existe material inflamable/equipos que lo contengan en un radio de 10 m?		✓
2 Fosas, zanjas y drenajes estan controlados y sellados?		✓
3 Debe humedecerse el area /cortina de agua?		✓
4 Es necesario evitar/interceptar dispersion chispas?		✓

Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
Puesta a tierra de herramientas/equipos		✓
Tuvo en cuenta la direccion del viento?		✓
Se dispone de mantas de asbesto?		✓

Especifique los equipos necesarios	SI	N/A
Equipos contra incendio		✓
Tipo:		
Capacidad:		
cantidad:		

7. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Nombres de las personas que van a ingresar:	N° Cedula

Nombre del Observador

Verificación medidas de seguridad	SI	N/A
1 ¿Existen salidas de emergencia?		✓
2 ¿Cada persona que entra usa arnes y linea de vida?		✓
3 Cada persona que entra u observador dispone de equipo de aire autonomo		✓
4 Cada persona que entra cuenta con linea de aire c/mascara de cara completa		✓
5 Existe posibilidad de atrapamiento?		✓
6 La iluminacion y/o el equipo electrico utilizado, es igual o menor a 24 V?		✓
7 Las herramientas utilizadas son antichispa?		✓

Producto contenido en el tanque/recipiente	SI	N/A
La ropa utilizada brinda adecuada proteccion/tratamiento antiestatica?		✓
Se ha desenergizado el equipo?		✓
Se ha bloqueado y etiquetado el equipo?		✓
Se han colocado bridas ciegas/comales?		✓
Se han desvinculado tuberias y otros equipos?		✓
Se ha ventilado el equipo / bocas abiertas?		✓
El equipo esta conectado a tierra?		✓
El piso es resbaloso?		✓
EPP especiales?		✓
Disponible medico o perosnal de enfermeria?		✓
El area de seguridad fue demarcada?		✓
Equipo de aire para rescate/escape?		✓
Se cuenta con medios de comunicación en caso de una emergencia?		✓
Se cuenta con un medio de transporte en caso de emergencia?		✓

MUESTREO DE ATMOSFERAS

CRITERIO DE MEDICIÓN	Medición continua	SI	N/A	Registro cada hora	SI	N/A	Responsable de la supervisión del trabajo:
			✓			✓	

Registre los datos de las mediciones hechas	Oxigeno (19,5% < % O2 < 22,5%)	LEL (Maximo permitido 10%)	H2S (Maximo permitido 10ppm)	CO (Maximo permitido 25ppm)
1 % / PPM				
2 HORA				

3 Nombre y firma del responsable de la medición		Equipo		# Serie		Fecha Calibración

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre El solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota: El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabajo, a instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firme en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA
Mauricio Martinez		Yulieth Ortega Vega / Yulieth Ortega V.

11. VALIDACIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor
1.	02 al 07 de Feb 2026	7am	5pm		Julio cesar Granado 1043151753
2	02 al 07	7am	5pm		Jesus Carrillo P. 1045170499
3	02 al 07	7am	5pm		Jorge Caceres 1143155575
4	02 al 07	7am	5pm		David Sarabia 1045172522
5	02 al 07	7am	5pm		Juan Escorcia 1048272470
6	02 al 07	7am	5pm		Luis Mafute 1128054193
7	02 al 07	7am	5pm		Daiber Rodriguez 85082041

12. SUSPENSIONES

Motivo Suspención	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor

Trabajo completo	SI	N/A	Hora de Finalizacion:
	✓		5Pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area
Nombre y Firma		

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre EL solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Notice El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabajo, instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firme en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL ÁREA	
Mauricio Martinez	PP.	Yulieth Ortega Vega	Yulieth Ortega V.

11. VALIDACIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor
1	02 de Febrero 2026	7am	5pm	Yulieth Ortega	Sebastian Montalvo 1048284485
2	02 al 07	7am	5pm		Jorge Luis Calvo 1085170194
3	02 al 07	7am	5pm		Alvaro Padilla 1001829865
4	02 al 07	7am	5pm		Mauricio Balleston 1193585641
5	02 al 07	7am	5pm		Hector Romero 79110617
6	02 al 07	7am	5pm		Elkin Rivera 1042353671
7					

12. SUSPENSIONES

Motivo Suspencion	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor

Trabajo completo: SI ✓ / N/A

Hora de Finalizacion: 5 pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area
Nombre y Firma		

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

Código: FOSST-23
Versión: 01
Fecha: SEP-2023
Página 1 de 1

PERMISO DE TRABAJO GENERAL

1. IDENTIFICACIÓN Y VALIDEZ

ACTIVIDAD CRÍTICA: vigencia de 24 horas.
ACTIVIDAD MODERADA: vigencia de 7 días. ACTIVIDAD LEVE: Vigencia de 10 Días

CRITICA	MODERADA	LEVE
✓		

FECHA DE EMISION	HORA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL EJECUTOR	No. DE PARTICIPANTES	EMPRESA
09 al 14 de Feb 2026	7 am	Mauricio Martinez	13	
CAMPO	Soledad	LUGAR DONDE SE HARA LA ACTIVIDAD		

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ins del area, demolición del Puente Vehicular Tramo Principal, Soldado Cormol de acero, limpieza y retiro de residuos Solidos del Canal

2. TIPO DE TRABAJO

Seleccione la opción

Caliente [ ] Frio [ ]

ACTIVIDADES CRITICAS

ACTIVIDADES CRITICAS	SI	N/A
TRABAJO EN ALTURAS		✓
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS		✓
EXCAVACION SUPERIOR A 1.5 m.		✓
IZAJE DE CARGAS		✓
MANIPULACION SUSTANCIAS QUIMICAS	✓	
TRABAJOS EN LAS VIAS	✓	
MANEJO DE EXPLOSIVOS		✓
TRABAJOS ELECTRICOS		✓

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Seleccione la opción	SI	N/A
Biologicos	✓	
FISICOS		
Ruido	✓	
Vibraciones	✓	
Temperaturas (frio, calor)	✓	
Iluminación deficiente		✓
Presión atmosferica	✓	
QUIMICOS		
Radiaciones ionizantes		✓
Radiaciones No ionizantes	✓	
Polvos organicos- inorganicos		✓
Fibras		✓
liquidos		✓
Gases y vapores		✓
Humos metalicos-no metalicos		✓
Material particulado	✓	
Materiales toxicos		✓

Seleccione la opción	SI	N/A
BIOMECANICOS		
Posturas prolongadas	✓	
Movimientos repetitivos	✓	
Manipulación de cargas		✓
Posturas incomodas	✓	
Sobreesfuerzos		✓
CONDICIONES DE SEGURIDAD		
Mecánico (elementos de maquinas, herramientas, piezas a trabajar)	✓	
Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	✓	
Locativos - superficies-terrenos inestables		✓
Explosión		✓
incendio	✓	
derrumbe	✓	
fuga		✓
Robos, Atracos, atentados, desorden publico	✓	
FENOMENOS NATURALES		
Sismos, terremotos, Vendaval, inundación	✓	

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD

EPP	SI	N/A
Casco	✓	
Calzado de seguridad	✓	
Gafas de seguridad	✓	
Guantes Tipo:	✓	
Proteccion auditiva	✓	
Proteccion Respiratoria	✓	
Impermeables		✓
Arnes/Linea de vida/Anclaje/ Andamios		✓
Equipos de comunicación		✓

Lugar de Trabajo	SI	N/A
Demarcar el area/vallado?	✓	
Iluminacion adecuada?	✓	
Se cuentan con rutas de evacuación?	✓	
Se cuentan con salidas de emergencias?	✓	
Se cuentan con area de disposición de materiales señalizadas?	✓	
Se cuenta con el procedimiento de trabajo	✓	
Se cuentan con equipos para atender emergencias?	✓	
Se necesitan duchas/lavaojos?		✓
Detector personal H2S		✓

Especifique otros riesgos que no se hayan comtemplado:

5. ESPECIFIQUE LOS RECURSOS A EMPLEAR DENTRO DE LA ACTIVIDAD

VEHICULOS	SI	MAQUINARIA	SI	EQUIPO MENOR	SI	MATERIALES	SI
Documentos del vehiculo vigentes		Se cuenta con inspección preoperacional vigente		Se cuenta con inspección preoperacional vigente		Se cuentan con las hojas de seguridad de las sustancias quimicas	
Documentos de conductor vigentes.		Documentos del operador vigentes		El equipo se encuentra en optimas condiciones para operar?		Las sustancias quimicas cuentan con las etiquetas HMIS.	

6. TRABAJO EN CALIENTE Norma de Certificacion del Soldador (DILIGENICAR LA PARTE DE MUESTREO DE ATMOSFERAS)

	Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
1	Existe material inflamable/equipos que lo contengan en un radio de 10 m?		✓
2	Fosas, zanjas y drenajes estan controlados y sellados?		✓
3	Debe humedecerse el area /cortina de agua?		✓
4	Es necesario evitar/interceptar dispersion chispas?		✓

Marque con una X la opción que aplique	SI	N/A
Puesta a tierra de herramientas/equipos		✓
Tuve en cuenta la direccion del viento?		✓
Se dispone de mantas de asbesto?		✓

Especifique los equipos necesarios	SI	N/A
Equipos contra incendio		✓
Tipo:		
Capacidad:		
cantidad:		

7. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Nombres de las personas que van a ingresar:	N° Cedula

Nombre del Observador

Verificación medidas de seguridad	SI	N/A
1 ¿Existen salidas de emergencia?		✓
2 ¿Cada persona que entra usa arnes y linea de vida?		✓
3 Cada persona que entra u observador dispone de equipo de aire autonomo		✓
4 Cada persona que entra cuenta con linea de aire c/mascara de cara completa		✓
5 Existe posibilidad de atrapamiento?		✓
6 La iluminacion y/o el equipo electrico utilizado, es igual o menor a 24 V?		✓
7 Las herramientas utilizadas son antichispa?		✓

Producto contenido en el tanque/recipiente	SI	N/A
La ropa utilizada brinda adecuada proteccion/tratamiento antiestatica?		✓
Se ha desenergizado el equipo?		✓
Se ha bloqueado y etiquetado el equipo?		✓
Se han colocado bridas ciegas/comales?		✓
Se han desvinculado tuberias y otros equipos?		✓
Se ha ventilado el equipo / bocas abiertas?		✓
El equipo esta conectado a tierra?		✓
El piso es resbaloso?		✓
EPP especiales?		✓
Disponible medico o personal de enfermeria?		✓
El area de seguridad fue demarcada?		✓
Equipo de aire para rescate/escape?		✓
Se cuenta con medios de comunicación en caso de una emergencia?		✓
Se cuenta con un medio de transporte en caso de emergencia?		✓

MUESTREO DE ATMOSFERAS

CRITERIO DE MEDICIÓN	Medición continua	SI	N/A	Registro cada hora	SI	N/A
			✓			✓

Responsable de la supervisión del trabajo.

Registre los datos de las mediciones hechas	Oxigeno (19,5% < % O2 < 22,5%)	LEL (Maximo permitido 10%)	H2S (Maximo permitido 10ppm)	CO (Maximo permitido 25ppm)
% / PPM				
HORA				

Nombre y firma del responsable de la medición		Equipo		# Serie		Fecha Calibración	

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre EL solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9.	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota: El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesaries para ejecuter el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabajo, a instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firme en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA	
Mauricio Martinez	TT	Yulieth Ortega Vega	Yulieth Ortega V.

11. VALIDACIONES

Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor
1.	09 al 14 de Feb 2026	7am	5pm	Yulieth Ortega V 1140800226	Oiber Rodriguez 8508 2041
2	09 al 14	7am	5pm		Juan Escorcia 1048 272170
3	09 al 14	7am	5pm		Julio Granado 1043 151751
4	09 al 14	7am	5pm		Jorge Caceres 1193155575
5	09 al 14	7am	5pm		David Sarabia 1045172523
6	09 al 14	7am	5pm		Jesus Carrillo 1045170499
7	09 al 14	7am	5pm		Luis Mateus 1128054193

12. SUSPENSIONES

Motivo Suspención	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor

Trabajo completo	SI	N/A	Hora de Finalizacion:
	✓		5 pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)

	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area
Nombre y Firma		

EL original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

8.	Especifique las Medidas preventivas acordadas entre EL solicitante / Autoridad del area / Interventoria / Autoridad (Cliente)
9	Que hacer en caso de una emergencia:
10.	FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

Nota:El sitio ha sido inspeccionado por nosotros y certificamos que reune las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el trabajo arriba indicado. En consecuencia nos comprometemos, antes de iniciar el trabajo, a instruir a los trabajadores en relacion con los riesgos inherentes a la ejecucion del mismo, mediante la lectura y discusion de los respectivos procedimientos y A.T.S

Apertura del Permiso (Firme en el area según la criticidad de la actividad)

EJECUTOR		EMISOR/AUTORIDAD DEL AREA	
Mauricio Martinez	TT	Yulieth Ortega Vega	Yulieth Ortega V.

11. VALIDACIONES					12. SUSPENSIONES		
Dia	Fecha (dd/mm/aa)	Hora Inicio (am - pm)	Hora Fin (am-pm)	Nombre y # Documento Emisor	Nombre y # Documento Ejecutor	Motivo Suspención	Hora (am - pm)	Nombre y Documento Emisor
1.	09 al 14	7am	5pm	Yulieth Ortega 1090426260	Sebastian Fontalvo 1048284485			
2	09 al 14	7am	5pm		Jorge Luis Calvo 1045171194			
3	09 al 14	7am	5pm		Alvaro Padilla 1001898765			
4	09 al 14	7am	5pm		Mauricio Ballesteros 1193585841			
5	09 al 14	7am	5pm		Hector Romero 7911061?			
6	09 al 14	7am	5pm		Elkin Rivera 1042353671			
7								

Trabajo completo	SI	N/A	Hora de Finalizacion:
	✓		5 pm

13. Cierre de Permiso de trabajo y recepcion de area de trabajo (respetar firmas en la apertura del mismo)		
	Ejecutor	Emisor / Autoridad del area
Nombre y Firma		

El original de este documento debe permanecer con el autoridad del area y la copia con el Ejecutor

ANEXO 6: INSPECCIÓN SOCIAL

FECHA DE LA INSPECCIÓN: Mes enero 15 al 14 de febrero de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.: **0251 DE 2023**	**CONTRATISTA:** CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Soledad

FRENTE DE OBRA: Arroyo El Platanal

INTERVENTORÍA: REINGENIERÍA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS

2. OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN

Realizar seguimiento a la implementación del Plan de gestión social.

3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN INSPECCIONES ANTERIORES

COMPROMISO	ESTADO
Seguimiento y cierre de PQRS	Durante el periodo
Iniciar cierre de actas de vecindad	No se realiza
Charlas a los trabajadores	Durante el periodo
Realizar reunión con la veeduría mensualmente	No se realiza

1. INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Ítem	Eje Social	Si	No	N.A	Indique evidencia u Observación (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque
1	Reuniones de inicio			X	Se realizo al inicio de la obra	N.A
2	Reuniones con líderes	X			No	No cumple
3	Reuniones extraordinarias	X			SI	SI
4	Reunión final de obra			X	N.A	N.A
2. DIVULGACIÓN						
5	Valla publicitaria	X			Se instaló en enero 2024	Si cumple
6	Volantes de información			X	N.A	N.A
7	Volantes de invitación			X	N.A	N.A
8	Oficios	X			N.A	N.A
9	Cartelera Informativas en el PAC			X	N.A	N.A
3. RESTITUCIÓN DE BIENES AFECTADOS.						
10	Levantamiento de actas de vecindad			X	Se realizo el levantamiento al 100%	Si cumple
4. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA						
11	Punto de atención a la comunidad ubicado en terranova etapa 2	X			Kra 9D #63-47	Si cumple

12	Atención y solución a las PQRS presentadas	X			Se presentaron PQRS, se anexa Matriz de PQRS	En ejecución
13	Reuniones con los funcionarios de las JAC, alcaldías, e instituciones de servicios públicos.			X	N.A	N.A
5. PEDAGOGÍA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL						
14	Talleres de sensibilización			X	N.A	N.A
15	Actividades lúdicas y recreativas			X	N.A	N.A
6. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA.						
16	Charlas educativas	X			Formato de asistencia a charlas o capacitaciones	Si cumple
17	A personal de cuadrilla y administrativo	X			Acta de capacitaciones	Si cumple
7. VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA						
18	Contratación de mano de obra no calificada residente al área adyacente	X			Planillas	Si cumple
19	Listado del personal de obra no calificada	X			Formato de listado de asistencia	Si cumple

8. OBSERVACIONES ADICIONALES

No. De Ítem	OBSERVACIONES

9. LISTADO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS	FECHA
Seguimiento y cierre de PQRS	Durante el periodo
Iniciar cierre de actas de vecindad	Durante el periodo
Charlas a los trabajadores	Durante el periodo
Realizar reunión con la veeduría mensualmente	Durante el periodo

9. LISTADO DE COMPROMISOS

INTERVENTORÍA	CONTRATISTA
NOMBRE: Liliana Pacheco	**NOMBRE: Yulieth Ortega**
FIRMA: 	**FIRMA:** 
CARGO: Auxiliar Social	**CARGO: Profesional social**

ANEXO: INFORME SOCIAL CONTRATISTA

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023

INFORME GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL

DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.0251 DE 2023:

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

Contratista:

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023.

Interventoría:

REINGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.

Contratante:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

Supervisor:

Arq. Wladimir Orozco

Barranquilla Atlántico – Febrero 2026

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023	**INFORME GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL**

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 4
   2.1. OBJETIVO GENERAL 4
   2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. COMPONENTES 5
3.1. COMPONENTE LECTURA TERRITORIAL 5
   3.1.1. Relación actividades desarrolladas 5
3.2. COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 7
   3.2.1. Relación actividades desarrolladas 7
3.3. COMPONENTE DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 8
   3.3.1. Relación actividades desarrolladas 8
3.4. COMPONENTE DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, ACTIVIDADES TÉCNICAS DE LA OBRA. 9
   3.4.1. Relación actividades desarrolladas 9
3.5. COMPONENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 10
   3.5.1. Relación actividades desarrolladas 10
   3.5.2. Consulta de opinión en la comunidad: 10
   3.5.3. Cronograma: 10
4. CONCLUSIÓN 12
5. ANEXOS 12

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023	**INFORME GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL**

1. INTRODUCCIÓN

Como parte del cumplimiento del Objeto de Contrato **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**

El contratista CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023, a través de la Profesional Social, realiza actividades que se encuentran dentro del marco de cumplimiento del Plan de Gestión Social. Estas actividades tuvieron como objeto principal el reconocimiento del área directa e indirecta del proyecto y su población, entre ello, la identificación de líderes y otras áreas de la población representativa en el municipio de soledad, especialmente en los barrios terranova 2, villa del Carmen 1 y 2, villa carla, los cusules, los loteros, villa valentina, ciudadela metropolitana etapa 1 y 2, altos de la metro, nueva esperanza y villa Karina.

Es importante anotar que el Estado Colombiano ha reconocido a los ciudadanos como entes primarios e indispensables en el control y buen desarrollo de las obras públicas, por ello la importancia de que las primeras actividades de este proyecto estén encaminadas a generar la mayor participación comunitaria en esta obra la cual es de gran envergadura e importancia para el municipio de soledad.

Las actividades aquí descritas comprenden la gestión impartida por la firma contratista en el periodo comprendido entre el 15 enero al 14 de febrero de 2026.

Para una mejor ilustración y seguimiento al cumplimiento PGS, se presentan los objetivos del Plan de Gestión Social; así mismo los componentes resultantes de él, que aplican al proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar mecanismos de participación, mediante condiciones que permitan fortalecer la construcción del tejido social e interrelación con la comunidad, para definir medidas en pro de la prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los impactos negativos y potenciar los efectos positivos en la comunidad durante la ejecución de las obras.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y contextualizar a través del componente de lectura territorial el área directa e indirecta de intervención.
- Definir las medidas para la prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los impactos negativos y la potenciación de los efectos positivos en la comunidad durante su ejecución.
- Socializar el proyecto a desarrollar por parte del contratista a las comunidades objeto de intervención, así como las actividades que se desarrollen antes durante y después de la obra.
- Instalar un punto de Atención a la Comunidad con el objeto de atender y brindar la información pertinente a la comunidad objeto de intervención.
- Contribuir mediante la vinculación de mano de obra local calificada y no calificada del área de influencia directa e indirecta, la generación de empleo.
- Hacer acompañamiento al área técnica en el levantamiento de las actas de Vecindad, y cuando sea requerida la presencia del profesional social, siempre en Pro del buen desarrollo de la ejecución del proyecto.

3. COMPONENTES

El Plan de Gestión Social propuesto para este proyecto, está conformado por seis (06) componentes, los cuales tendrán desarrollo en la medida que el proyecto vaya avanzando de acuerdo con sus etapas: Pre-Constructiva, Constructiva y final.

Los componentes son:

1. Componente Lectura Territorial
2. Componente Participación Ciudadana
3. Componente Comunicación y Divulgación
4. Componente Acompañamiento Social-Actividades Técnicas de la Obra
5. Componente Gestión Humana y Contratación Mano de Obra
6. Componente Monitoreo, evaluación y seguimiento.

3.1. COMPONENTE LECTURA TERRITORIAL

3.1.1. Relación actividades desarrolladas

Diagnóstico inicial.

Se realizó un inventario sobre la longitud total del arroyo a canalizar, se identificó el número de viviendas, números de locales comerciales y locales institucionales, en los barrios de influencia.

Ver tabla 1. *Mapa de actores.*

Nombre y Apellidos	Cargo	Institución	Celular	Correo electrónico
Bladimir Orozco	Supervisor	C.R.A	3004397218	worozco@crautonoma.gov.co
Jaider Molina	Secretario de obras publicas	Alcaldía de soledad	3007412728	
Carlos Valencia	Secretario de gobierno	Alcaldía de soledad	3134322670	

Lourdes González	Secretaria de planeación	Alcaldía de Soledad	3017546762	planeacion@soledad-atlantico.gov.co
Eloísa Ariza	Presidente JAC	Barrio Villa del Carmen 2	301331248	eloisaariza3112@gmail.com
Guido Pérez	Presidente JAC	Barrio Ciudadela metropolitana 2 y 3	3044930275	guidoperezmeza02@gmail.com
Geidy Sarmiento	Presidente JAC	Barrio Terranova 2	3162409761	jacterranova2soledad@gmail.com
Yasmin Lara	Presidente JAC	Barrio Villa Karina	3014524362	esteladnd@gmail.com
Miguel Martínez	Presidente JAC	Barrio los Cusules	3022998317	mmartinezandree@yahoo.com
Alberto Caraballo	Presidente JAC	Barrio ciudadela metropolitana etapa 1	3002343197	acaraballop1@gmail.com
Luz Pacheco	Presidente JAC	Barrio los loteros	3168870125	Amparopachecod@gmail.com
Gustavo Polo	Presidente JAC	Barrio villa del Carmen 1	310746855	gustavoramiropologarcia@gmail.com
Micaela García	Presidente JAC	Barrio altos de la metro	3116713494	migaga18@outlook.es
Wilmer Fontalvo	Presidente JAC	Barrio villa Karla	3023214645	wilmersegundofontalvo@gmail.com
Ever Tovar	Presidente JAC	Barrio Bello horizonte	3012007528	
Ibeth Rodelo	Presidente JAC	Barrio villa valentina		ibethrodelo15@gmail.com

Tabla 1. *Mapa de actores*

3.2. COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3.2.1. Relación actividades desarrolladas

Durante el período correspondiente, no fue posible llevar a cabo el Comité de Veeduría debido a situaciones de fuerza mayor que impidieron garantizar las condiciones necesarias para su realización. Por tal motivo, se está a la espera de que la veeduría establezca la nueva fecha, teniendo en cuenta que se acordó que la reunión se llevará a cabo en el día que ellos dispongan, a fin de evitar contratiempos con los asistentes.

ACTIVIDAD	Preliminar	MES		
		1	16	32
Participación y Coordinación Interinstitucional				
Reunión de Inicio de Obra				
Reunión de Seguimiento de Obra				
Reunión de Finalización de Obra				

Tabla 2. *Cronograma socialización*

No. Reuniones de comité de veeduría / No. De reuniones programadas *100

No. Reuniones de veeduría realizadas	No. De reuniones programadas	Indicador
0	0	0%

Tabla 3. *Indicadores socialización*

Comité de Sostenibilidad y Veeduría:

En el área de influencia del proyecto se encuentra una veeduría conformada legalmente bajo la resolución No. 037/2021 que fue inscrita en el registro público de la personería municipal de soledad el día 31 de agosto de 2021, los integrantes están descritos en la siguiente tabla.

Ver anexo 2. Resolución conformación de veeduría.

Nombre y Apellidos
Geidy Tomasa Sarmiento Jiménez
Moisés Emiro Diaz Ortega
Helmuth Enrique Maldonado
Luz Amparo Pacheco Diaz
Newton José Mercado Beltrán
Miguel Emiro Vital Arrieta
Boris Patrick Arboleda Beltrán

Tabla 4. *Integrantes de comité de veeduría*

3.3. COMPONENTE DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.3.1. Relación actividades desarrolladas

Durante el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 14 de febrero de 2026, se mantuvo en funcionamiento el punto de atención a la comunidad**.** En este lapso se recibió un (1) PQRS, presentadas por:

Laudith Fonseca Navarro, quien manifiesta que su vivienda sufrió afectaciones en general debido a las actividades que se encuentran realizando para la construcción de la canalización.

Desde el 21 de marzo se viene implementando un plan de atención personalizada, en donde la profesional social se va acercar a tomar los PQRS de manera personal a cada usuario que ha demostrado su inconformidad vía telefónica o de manera verbal, con el objetivo de mantener una mejor trazabilidad de la atención social dentro del proyecto.

La implementación de esta estrategia ha disminuido en gran medida las inconformidades, dado que una comunidad informada de manera constante de los trabajos adelantados por el contratista de obra, están más tranquilos y conscientes de los tiempos de ejecución de cada actividad.

Punto de atención a la comunidad PAC

Se cuenta con la oficina para la atención al ciudadano, PAC (Punto de Atención a la comunidad).

Ubicada en el municipio de soledad, Calle 64 #9-07 urbanización terranova 2 lote 35 de la manzana 1, este se encuentra identificado con pendón informativo, la atención de manera presencial son los martes y jueves en el horario de 2 pm a 5pm.

Además, se dispone del siguiente correo electrónico y línea telefónica:

- canalizacionelplatanal2023@gmail.com
- 3156498926

Gestión de PQRS:

Se muestra el consolidado donde se proyectará la recepción de las manifestaciones ciudadanas; que se presenten a lo largo del proyecto. Dichas manifestaciones serán discriminadas de la siguiente manera:

- Quejas – referidos en el cuadro con la letra Q.
- Peticiones- referidos en el cuadro con la letra P.
- Reclamos- referidos en el cuadro con la letra R.
- Solicitudes- referidos en el cuadro con la letra S.

Para el periodo de corte del presente informe, no se recibieron manifestaciones ciudadanas.

Ver Anexo No 3 Formato de Recepción de quejas y reclamos
Ver Anexo No 4 MATRIZ DE PQRS.

3.4. COMPONENTE DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, ACTIVIDADES TÉCNICAS DE LA OBRA.

3.4.1. Relación actividades desarrolladas

El acta de vecindad es un documento que permite conocer el estado físico del inmueble antes del inicio de la obra y una vez finalizada la misma, así, en caso de alguna reclamación, establecer la responsabilidad o no del contratista en la avería de los mismos.

Se deben realizar actas de vecindad donde se incluyan las viviendas, predios adyacentes al corredor estaciones y demás zonas con posible afectación por desvíos, o transporte de maquinaria.

Lo anterior con el fin de realizar censos al 100% de cada uno de los predios, lotes y negocios incluidos en la zona de influencia directa de la obra, para evaluar y registrar el estado de las mismas antes de iniciar las obras.

En concordancia de lo anterior, se tienen 563 viviendas de influencia directa a las obras de canalización del arroyo el platanal que requieren el levantamiento de las actas de vecindad.

A la fecha del presente informe se llevan un total de 563 actas levantadas, logrando completar la totalidad de actas contempladas en el proyecto y alcanzando así el 100%.

Estas fueron organizadas con su respectivo registro fotográfico, se elaboró un listado o consolidado y fue enviado a la interventoría para su aprobación y correspondiente firma. A la fecha recibimos el concepto aprobatorio de las actas de vecindad por parte de la interventoría del proyecto.

3.5. COMPONENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

3.5.1. Relación actividades desarrolladas

3.5.2. Consulta de opinión en la comunidad:

3.5.3. Cronograma:

A continuación, se presenta el cronograma general de actividades del Plan de Gestión Social (PGS)

INFORME GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	ENE. 2024				FEB. 2024				MARZ. 2024				ABR. 2024				MAY. 2024				JUN. 2024				JUL. 2024				AGOS. 2024				SEP. 2024				OCT. 2024				NOV. 2024				DIC. 2024				SEP. 2026			
	SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Identificacon Mapa de Actores			■	■																																																
Realización de Actas de Vecindad Apertura/cierre				■																																																
Realización Videos de Vias				■																																																
Realizacion de Convocatoria a Reunion de Socialización				■																																															
Reunión de Socializacion Inicial					■																																															
Reunion de Socializacion Avance																																																			
Reunion de Socializacion Final																																																			
Contratación de Personal						■							■																																							
Jornada de Armonización																												■																								
Atención PAC						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gestión PQRS							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Realizacion de Informes Mensuales							■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■			
Acompañamiento Comité de Obras							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Conformación Comité de Sostenibilidad																■																																						
Reuniones de Seguimiento								■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■	
Realización de Piezas Comunicativas						■							■								■																																

Tabla 5. Cronograma de actividades

4. CONCLUSIÓN

En el periodo comprendido entre el 15 enero 14 febrero de 2026, se dio cumplimiento a las actividades de gestión social, enmarcadas en el Plan de Gestión; de la siguiente manera:

- ✓ Se continua con la atención a la comunidad en el punto habilitado.
- ✓ Se brinda atención a la comunidad vía telefónica.
- ✓ Nos encontramos a la espera de fijar fecha para la realización de la reunión de veeduría.

5. ANEXOS

Anexo 1: Resolución de conformación veeduría

Anexo 2: Matriz PQRS

Anexo 3: Formato de Recepción de quejas y reclamos

Anexo 4: Registro fotográfico

ANEXO 1: RESOLUCION CONFORMACION VEEDURIA

RESOLUCION No. 037/2021
(AGOSTO 31 de 2021)

POR MEDIO DEL CUAL SE INSCRIBE EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SOLEDAD LA VEEDURIA CIUDADANA DE COMUNALES INDEPENDIENTES DEL NORTE Y SUROCCIDENTE DE SOLEDAD "VECINOS".

El suscrito Personero Municipal de Soledad (Atlántico) en uso de sus facultades legales que le confiere el inciso segundo de los artículos 3 y 18 de la Ley 850 de 2003 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley No. 850 del 2003, por medio de la cual se reglamenta las veedurías ciudadanas en su artículo 1º. Manifiesta: "**Definición.** Se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público"...

Igualmente el artículo 2º. De la misma ley expresa: **Facultad de constitución.** Todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglos a la ley podrán constituir veedurías ciudadana".

Por otro lado el artículo 3º. Sobre los Procedimiento expresa: **Procedimiento.** Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, las organizaciones civiles o los ciudadanos, procederán a elegir de una forma democrática a los veedores, luego elaboraran un documento o acta de constitución en la cual conste el nombre de los integrantes, documentos de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia.

La inscripción de este documento se realizará ante las Personería Municipales o Distritales o ante las cámaras de comercio, quienes deberán llevar registro público de las veedurías inscritas en su jurisdicción.

Que las ciudadanas **GEYDY TOMASA SARMIENTO JIMENEZ y HELMUNTH MALDONADO PANTOJA** identificadas con cedulas de ciudadanías No. 32.942.188, 72.232.223, en calidad de Presidente y Vicepresidente, Solicitaron a este Despacho mediante oficio de fecha 11 Agosto de 2021 y radicado con el número interno 3332 de fecha 11 de Agosto de 2021, la inscripción de la **LA VEEDURIA CIUDADANA DE COMUNALES INDEPENDIENTES DEL NORTE Y SUROCCIDENTE DE SOLEDAD "VECINOS"**

Que la **LA VEEDURIA CIUDADANA DE COMUNALES INDEPENDIENTES DEL NORTE Y SUROCCIDENTE DE SOLEDAD "VECINOS** "tendrá como **OBJETO PRINCIPAL:** La vigilancia de la gestión pública y la gestión administrativa, con sujeción al

Powered by CamScanner

servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Sera materia de especial importancia en la vigilancia ejercida por la veeduría ciudadana la correcta aplicación de los recursos públicos, la forma como estos se asignen conforme a las disposiciones legales y a los planes, programas, y proyectos debidamente aprobados.

Que la **LA VEEDURIA CIUDADANA DE COMUNALES INDEPENDIENTES DEL NORTE Y SUROCCIDENTE DE SOLEDAD "VECINOS",** ejercerá todas las funciones, instrumentos de acción, derechos y deberes consignados en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la ley 850 de 2003, fijando su domicilio principal es CRA 10B Nro. 63-05 Terranova II ubicado en el Municipio de Soledad Atlántico, Correo: veeduriavecinos@gmail.com teléfono: 3162409761.

La duración de la **LA VEEDURIA CIUDADANA DE COMUNALES INDEPENDIENTES DEL NORTE Y SUROCCIDENTE DE SOLEDAD "VECINOS",** es de Diez (10) Años contados a partir de la expedición de la presente resolución, sin perjuicio de ser prorrogada por quienes ejerzan como veedores.

Que los miembros fundadores y/o constituyentes de la Veeduría Ciudadana aportaron con la solicitud de inscripción, el acta de constitución de la **LA VEEDURIA CIUDADANA DE COMUNALES INDEPENDIENTES DEL NORTE Y SUROCCIDENTE DE SOLEDAD "VECINOS",** los estatutos que regirán dicha Veeduría y que será parte integral de la misma y demás requisitos establecidos por la Ley 850 de 2003, por lo que se procede a inscribir en el registro público a los veedores designados.

Por todo lo anterior, el Personero Municipal de Soledad, en usos de sus facultades legales

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Inscribir la constitución de la **LA VEEDURIA CIUDADANA DE COMUNALES INDEPENDIENTES DEL NORTE Y SUROCCIDENTE DE SOLEDAD "VECINOS":** Vigilar la gestión pública y administrativa territorial y su deber ser, traducidos en acciones encaminadas a servir a la comunidad.

ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER como en efecto se hace a los miembros de la **LA VEEDURIA CIUDADANA DE COMUNALES INDEPENDIENTES DEL NORTE Y SUROCCIDENTE DE SOLEDAD "VECINOS** "así:

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	DIRECCION
1. GEYDY TOMASA SARMIENTO JIMENEZ	32.942.188	Calle 62ª # 9d-15 terranova 2
2.MOISES EMIRO DIAZ ORTEGA	72.170.608	Calle 67b # 7c-45
3.HELMUTH ENRIQUE MALDONADO	72.232.223	Kra 9b #39-32 Manuela Beltrán
4.LUZ AMPARO PACHECO DIAZ	45.449.097	Calle 68 #8-45 Los loteros
5. NEWTON JOSE MERCADO BELTRAN	8.763.030	Calle 59b #9 -21 Los Cusules
6. MIGUEL EMIRO VITAL ARRIETA	73.111.909	Cra 36# 58-55 Balcones
7. BORIS PATRICK ARBOLEDA BELTRAN	72.180.924	Calle 56c # 1d-64

Powered by CamScanner

8.ELOISA ARIZA CAMARGO	37.980.828	Calle 61# 3-03 V carmen2.

ARTÍCULO TERCERO: DURACIÓN. Es de Diez (10) Años contados a partir de la expedición de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: NIVEL TERRITORIAL. De conformidad con el Acta de Constitución que se presenta, el nivel territorial de la actividad de la Veeduría es Municipio de Soledad y Departamento del Atlántico.

ARTICULO QUINTO: Que la **LA VEEDURIA CIUDADANA DE COMUNALES INDEPENDIENTES DEL NORTE Y SUROCCIDENTE DE SOLEDAD "VECINOS",** deberá sujetarse a lo establecido en la Ley 850 de 2003, acatar el régimen de prohibiciones e impedimentos señalados por las misma, cumplir cabalmente su propio reglamento de funcionamiento y los mecanismos de regulación del comportamiento de sus miembros.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la Fecha de Expedición

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Soledad, a los (31) días del mes de Agosto del año dos Mil veintiuno (2021).

ARISTARCO ROMERO MERIÑO
Personero Municipal de Soledad

Elaboro: Iván Bolívar Castro; Secretario general

Powered by CamScanner

12 MAR. 2024
805
3:55 pm
Mabeylis Meléndez.

Doctor
BENJAMIN LATORRE
PERSONERO MUNICIPAL DE SOLEDAD

REFERENCIA: SOLICITUD DE MODIFICACION DE ALGUNOS MIENBROS DE LA VEEDURIA "VECINOS"

GEYDY TOMASA SARMIENTO JIMENEZ, identificada con la C.C. N.º 32.942.188 de San Estanislao Bol, actuando en nombre propio y como presidente de la VEEDURÍA CIUDADANA DE COMUNALES INDEPENDIENTES DEL NORTE Y SUROCCIDENTE DE SOLEDAD "VECINOS", solicitamos muy respetuosamente a este despacho se realice modificación en los miembros que conforman la veeduría "VECINOS" LA CUAL FUE INCRITA, RECONOCIDA por esta PERSONERIA MUNICIPAL DE SOLEDAD con RESOLUCIÓN N.º 037/2021 DE AGOSTO 31 DE 2021.

Se realice la modificación de los miembros conforme al acta Nº005 del 15 de mayo de 2022, el cual modifico los miembros de la veeduría de la siguiente manera.

Secretaria a la señora ELOISA ARIZA CAMARGO C.C. 37.980.8028

Asesor Jurídico HENRY ROBERTO ACUÑA C.C. 72.202.059

Vocal Asesor LUIS VENTURA C.C. Nº 9.094.795

Anexo al presente documnto.

Acta 005 de 15 de mayo de 2022

Oficio de descargo a la anterior secretaria LUZ AMPARO PACHECO

Carta de renuncia del señor MIGUEL EMIRO VITAL ARRIETA

Cordialmente,

Geydy Sarmiento J.

GEYDY TOMASA SARMIENTO JIMENEZ
C.C. 32.942188 de San Etanislao BOL
Presidente de "VECINOS"

Powered by CamScanner

ANEXO 2: MATRIZ PQRS

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023	**MATRIZ DE PQR`S**	Formato	FCI-018
		Versión	1.0
		Fecha	15/09/2023

PROYECTO REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. CONTRATO DE OBRA No. 0251 DE 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023 PERIODO 15 ENE 14 DE FEB 2026

No. Consecutivo	Fecha	Manifestante	Dirección	Asunto	Tipología				Gestión	Solución				Estado
					R	P	Q	S		RP	I	D	E/V	Fecha de cierre
1		Jac Loteros	Afluente #3	Solicitud de barandas,tapa de registro,limpieza del lote aledaño al canal,limpieza del canal	X				se relizo limpieza del canal en 2 ocaciones el dia 16/05/25 ,se instalo tapa de registro el dia 09/09/25,de realizo limpieza de lote aledaño al canal.la presidenta de accion comunal programara reunio con la CRA para definir la instalacion de barandas en conjunto con los propietarios del lote,lo cual ellos se openen a barandas porque quieren tapa del canal,estamos a la espera de la reunion para dar respuesta a la comunidad del sector				1	En revisión
2	**28/05/2024**	Comunidad	Calle 64 #9-07	Se acerco la señora Mayra Suarez solicitando se le regalara material (piedra ciclópea) y relleno debido que por las fuertes lluvias se le estaba socavando su vivienda ubicada en calle 61B frente #5-94(No presenta nomenclatura).		1						1		21/05/2024
3	**6/06/2024**	Comunidad	Calle 56c #6b	Comunidad del barrio altos de la metro de la calle 56c #6b manifestaron por vía telefónica que la calle en mención, se dejo material acopiado obstruyendo evacuación de aguas lluvias por tal motivo sufrieron inundación en sus viviendas.			1		Se le dio cumplimiento a su queja de manera inmediata. Se envió la maquinaria necesaria para realizar el retiro del material que obstruía y no se presentaron afectaciones en el inmueble ni en electrodomésticos.				1	6/06/2024
4	**17/06/2024**	Filadelfo Miranda Martinez	Altos de la metro	El señor Filadelfo Miranda se acerco a las oficinas en barrio el barrio terranova de soledad manifesto a las oficinas en el barrio terranova de soledad, manifesto que por los trabajos de la maquinaria perteneciente a la obra y las constantes lluvias se ha debilitado le terreno, causando socavacion en su vivienda.										En revisión
5	**28/06/2024**	Comunidad	Altos de la metro	El señor Dagoberto Zabala Arrieta, el día 28 de junio en reunión con la comunidad que, por los trabajos realizados con maquinaria pesada en el arroyo al hacer la deviación provisional del cause de las aguas se debilitó el terreno, causando que el muro lateral de su vivienda ubicada en la calle 55 a 6 f 03 en el barrio altos de la metro colapsara		1			El mismo día se le informa al señor Dagoberto que una vez finalizadas la actividades se procederá a realizar la reparación, el día 23 /09 /2024 se realiza visita y la vivienda se encuentra cerrada					
6	**29/06/2024**	Dagoberto zabula Arrieta	Altos de la metro	El señor Dagoberto en una reunion con la cuminidad manifesto que por los trbjdores realizados con maquinaria pesada en el arroyo al hacer la desviacion										En revisión
7	**9/07/2024**	Jorge Ortega	Cra 9 Acta de vecindad 5	Usuario informa que su vivienda sufrió afectaciones por falta de relleno de los muros y las constantes vibraciones de la maquina, por tal razón considera que se encuentra en riesgo y temor que los muros puedan colapsar, solicitando de manera urgente se les solucione el relleno			1		Se realiza relleno				1	15/12/2024
8	**11/07/2024**	Geovanis Padilla	Calle 56B # no presenta	Usuario manifiesta vía telefónica, que la retroexcavadora estaba realizando excavaciones en el canal, y se produjo volcamiento de una árbol, que afecto su vivienda en techo y muro, por lo que solicita la reparación de los daños causados ya que no puede dormir tranquilo pensando que los muros pueden colapsar totalmente			1		Se realizo visita y estamos organizando los materiales para darle solución lo antes posible					En ejecución
9	**16/07/2024**	Comunidad	terranova etapa 2	La comunidad del tramo 1 barrio terranova etapa 2 bloquearon la vía solicitando de manera urgente el relleno de los laterales del muro debido a que sus viviendas están sufriendo afectaciones como desplazamientos en los muros y hundimientos en los pisos			1		Se le dio cumplimiento a su queja de manera inmediata. Y se les informo que sus viviendas estaban construidas en zona de alto riesgo				1	16/07/2024
10	**17/07/2024**	Comunidad	Cra 9 Terranova	Se acerca a nuestras oficinas las señora Sola María Quiroz y el señor Jorge Ortega manifestando de forma escrita que su vivienda ubicada en la Cra 9 del barrio terranova sufrió afectaciones por falta de relleno de los muros y vibración de la maquina, por tal razones encuentra en riesgo y tiene temor que los muros de su vivienda puedan colapsar			1		Se inicia de manera inmediata a rellenar los laterales de los muros a solicitud de la propietaria de la vivienda, queda pendiente una próxima visita y solucionar temas de los muros.				1	17/07/2024
11	**17/07/2024**	Javier Yime Martínez	Altos de la metro	La vivienda antes de iniciar actividades se encontraba con afectaciones en los muros, presentaba desplazamientos en general y hundimientos de pisos, al iniciar las actividades con las maquinarias pesadas la inquilina manifestó que sentia temor de que colapsara por las vibraciones,		1			Se dialoga con el propietario para llegar a un acuerdo de reubicación para evitar un accidente o una tragedia					En revisión

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023	**MATRIZ DE PQR`S**	Formato	FCI-018
		Versión	1.0
		Fecha	15/09/2023

PROYECTO REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. CONTRATO DE OBRA No. 0251 DE 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023 PERIODO 15 ENE 14 DE FEB 2026

No. Consecutivo	Fecha	Manifestante	Dirección	Asunto	Tipología				Gestión	Solución				Estado
					R	P	Q	S		RP	I	D	E/V	Fecha de cierre
12	**30/07/2024**	Edilson Alvarado	Altos de la metro	La vivienda antes de iniciar actividades se encontraba con afectaciones en los muros, presentaba desplazamientos en general y hundimientos de pisos al iniciar las actividades con las maquinarias pesadas la inquilina manifestó que sentia temor por las vibraciones,		1			Se dialoga con el propietario para llegar a un acuerdo de reubicación para evitar un accidente o una tragedia					En revisión
13	**6/08/2024**	Comunidad	Cra 6A Bello Horizonte	Se acerca la señora Tania Mosquera en representación de la comunidad de la Cra 6A barrio bello horizonte la reparación de los andenes de la calle, las tapas de los manjoles que fueron dañadas por la maquinaria y el retiro de planchones o estibas que están obstaculizando el paso peatonal ya que esto ha ocasionado varios accidentes.		1			El dia 9 de agosto se les hizo visita inspeccionando los manjoles y retiros de entibado y el dia 15 de agosto se le realizo reparación de las tapas de los MH y limpieza de tuberías de los mismos ubicados en la cra 6a con 57b barrio bello horizonte, firma la ciudadana en representación de la comunidad el cierre del PQR a satisfacción.				1	9/08/2024
14	**12/08/2024**	Marlon Maertinez	Cra 6c #56c-15	El señor Marlon Martínez habitante del sector Altos de la metro manifestó que uno de los carros de polimix le reventaron los cables de la luz desde hace una semana y nadie se ha comunicado para darle solución a su afectación.	1				Se atendio al llamado y se le realizo una visita al siguiente día de presentada su queja para corroborar los daños causados, se contacto un servicio particular de la empresa aire y se compraron 32 metros de cable numero 6 para hacerle la instalación de las redes eléctricas y darle solución a su queja, quedando el PQR cerrado a satisfacción del ciudadano.				1	13/08/2024
15	**23/08/2024**	Lydiana Castaño	Altos de la metro	La señora se comunico por via whatsspp, manifestando que el dia 22 de gosto, en las horas de la noche uno de los camiones de cemento con placas wcuz95 a cargo del señor Rony catillo al pasar por el frente se su vivienda revento las redes electricas y a su vez desprendo los contadores.			1							En revisión
16	**5/09/2024**	Yovani Padilla	Calle 56B # no presenta	Debido a las fuertes lluvias el señor Yiovani manifiesta que por los trabajos que se están realizando se da la condición para quela casa colapse, lo cual hace que tambien pierdan los utencilios del hogar.			1		Se reubicó a la familia, por parte del proyecto se han asumido los gasos de la reubicación					
17	**6/09/2024**	Comunidad	Altos de la metro	El señor Alfonso Botero Tous identificado con CC 72283919 se comunicó vía telefónica el día 07 de septiembre del 2024 manifestando que debido a las vibraciones de las máquinas hace aproximadamente un mes, le colapsó el muro del cerramiento (patio) se acercón al personal de mano de obra no calificada exponiendoles en caso	1				Se continua realizando la actividad de relleno y estabilización de terreno para proceder con la reparación del muro y de esta forma dar cierre					En ejecucion
18	**7/09/2024**	Alfonso Botero Tous	Altos de la metro	Se comunico por via telefonica el dia 7 de septiembre de 2024 manifestando que debido a las vibraciones de las maquinas hace aproximadamente 1 mes a colapsado el muro del cerraiento (patio) se acerco al personal de mano de obra no calificado, exploniendo el caso.			1							En revisión
19	**17/09/2024**	Yaquelin Mejia prins	Altos de la metro	Yaqueline Mejia Prins se dirijio a consorcio canalizacion, para qe relizarmos inspeccion a la vivienda ubicada en la calle del tramo 3 de alto de la metropolitana.		1								En revisión
20	**22/09/2024**	Comunidad	Altos de la metro	El señor Angel Dionicio Gutiérrez Torres, por vía telefónica se comunicó al consorcio manifestando que un muro lateral derecho de la vivienda colapso, por las fuertes lluvias que se presentaron debido a que en el sector se estaban realizando actividades con la retro excavadora, el señor Ángel argumenta que todo se dio por los movimiento de tierra que se habían realizado	1				El mismo día se realizó la visita al inmueble, se llega a un acuerdo entre las partes para su reubicación reconociendo los gastos que esto pudieran incurrir					En ejecucion
21	**23/09/2024**	Angel Dionisio Gutierrez Torres	Altos de la metro	El señor Dionisio Torres manifesto que un muro de la vivienda lateral derecho colpso por las fuertes lluvias que se presentaron debido a que en el se encontraba la maquinaria realizando actividades con la retro excavadora.			1							En revisión
22	**23/09/2024**	Alexander Salceo	Altos de la metro											
23	**17/10/2024**	Comunidad	Villa Valentina	Agilizacon de trabajo de relleno solucitud de para agilizar la obra antes e 10 dia										En revisión
24	**22/11/2024**	Julio Pino de las salas	Altos de la metro	El ciudadano se comunico por via teletonica, manifectando que el cerramiento del patio de la vivienda habia colpsado. Ya que los trabajadores con las maquinarias, ubicadas obcisa 1+700 barrio Altos de la metro										En revisión
25	**18/12/2024**	Soraya parra perez	Carra 47#57-10											

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023	MATRIZ DE PQR`S	Formato	FCI-018
		Versión	1.0
		Fecha	15/09/2023

PROYECTO REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. CONTRATO DE OBRA No. 0251 DE 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023 PERIODO 15 ENE 14 DE FEB 2026

No. Consecutivo	Fecha	Manifestante	Dirección	Asunto	Tipología				Gestión	Solución				Estado
					R	P	Q	S		RP	I	D	E/V	Fecha de cierre
26	**23/01/2025**	Yoselin Barcelo	calle 59g1#4c-43	la ciudadana yoselin barcelo nieblas se comunico por vía telefónica ,manifestó que su vivienda ubicada en la dirección en mención anterior ha sufrido afectaciones en el piso del patio y muros de la cocina debido a las vibraciones de las maquinarias , De igual forma manifestó que el día que se le vaya hacer la inspección se le notifique con tiempo debido a que ella tiene un perro bravo y el único que lo controla es el esposo			1		Se realizo visita y estamos organizando los materiales para darle solución lo antes posible. El Ing. le informa a la ciudadana que se realizará la visita para ver si la queja es procédete. Se llama a la ciudadana y se informa que no se pudo realizar la visita ya que el esposo no se encontraba y el es quien controla a la mascota (perro grande y bravo), nos encontramos a la disposición de la disponibilidad de la ciudadana				1	en ejecución
27	**30/01/2025**	Victor consuegra	Barrios Loteros	el señor Víctor Consuegra se dirigió a la C.R.A para colocar un P.Q.R. se atiende su solicitud hoy 30/01/2025 en el predio villa Jordán que colinda con el barrio los Loteros y el colegio CENCAES manifestando sobre la maleza que se encuentra dentro del canal que se esta ejecutando y aguas represadas en el empalme con la calle murillo , solicitando que se le reponga un cerramiento que se encontraba existente antes de que iniciáramos la obra ,s van a verificar las fotos iniciales para mirar si es procedente el reclamo del señor Víctor .	1				Se le dio cumplimiento a su queja de manera inmediata. Y se le informo que no hemos finalizado la obra una vez se culmine las actividades en un 100% se procederá hacer las reparaciones iniciales del periodo. Dentro de los compromisos con el señor vector, se realizó limpieza al canal, se instalaron dos hiladas en bloc abujardado y adecuación del lote, la actividades se realizaron en la fechas del 5 al 16 de mayo, no se ha cerrdo el PQR ya que se encuentra pendiente el cerramiento del mismo con madera				1	en ejecución
28	**26/03/2025**	Angel Dionisio Gutierrez Torres	Altos de la metro											En revisión
29	**8/05/2025**	Enilda Salcedo triana	Altos de la metro	La Señora Enilda manifiesta que por no haber realizado los rellenos el agua no tiene por donde salir, lo cual la está afectando de manera negativa por filtraciones a la vivienda	1				Se manifiesta a la ciudadana que se procederá a realizar llenos de los muros laterale del canal para así evitar posibles filtraciones en su vivienda					En ejecucion
30	**8/05/2025**	Edith Ecorcia	Altos de la metro	La ciudadana manifesto por via telefonica que sufrio inundaciones, en el inmueble debido a que el agua no se encotraba encausada al canal principal.										En revisión
31	**3/07/2025**	Marbeluz Bonqueth caro	Villa Carmen #2	La ciudadana Marbelluz Bonqueth manifecto por medio de oficio, su vivienda ha sufrido afectaciones estruturales, el lugar la sra solicita que se le realice una visita tecnica y risgo reparacion	1									En revisión
32	**7/09/2025**	Yesica Margarita Escorcia llanes	Primero de Enero	La señora Yesica Ecorcia llanes se comunico por correo elctronico el dia 11 de marzo de 2025, manifesto que su vivienda sufrio afactaciones por la maquina que se encuntra realizando actividades para la ejecucion del alcantarillado en el barrio primero de enero en municipio de barranoa atlantico.	1									En revisión
33	**27/09/2025**	Marley correa Santacruz	Villa Carmen #2	La ciudadana se acerca a la oficina, manifestando que sufrio afestaciones										En revisión
34	**27/09/2025**	Mayra Suarez Orozco	Villa Carmen #2	La ciudadana se acerca a la oficina manifestando que sufrio inundaciones debido que no han hecho los rellenos y el agua se metio al inmueble y sufrio perdidas materiales a causa de las inundaciones, por falta de proteccion debido que la fuerza del agua arrastro los sacos que tenian como trinchera										En revisión
36	**30/09/2025**	Roque pacheco	Villa Valentina	El ciudadano se comunico por via teletonica, manifecta por via telefonica y mensaje de texto, que el muro colapso de encerramiento del patio, por la actividades que se encuentran realizando en el tramo 2	1				se lerealizo visita al propietario de inmueble de dia 01/10/2025 y hoy 24/10/2025 se le da inicio al levantamiento de muro.					En ejecucion
37	**18/10/2025**	Mria Edith Rodelo de	Villa Valentina	La ciudadana en mencion, manifiesta que al momento de ingresar la maquinaria colpso el muro del corregimiento del patio.			1							En revisión
38	**19/10/2025**	Silvana Anaya Turisso	Villa de Carmen #1	la ciudadana manifiesta que su inmueble sufrio afectaciones debido a los trabajos realizados, se le manifiesta a la señora que el dia de realizar el acta de vencidad, la vivienda ya presentaba afectaciones en los muros y valorar si la queja es proceso de el, para iniciar llegar a un mutuo acuerdo.	1									En revisión

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023	**MATRIZ DE PQR`S**	Formato	FCI-018
		Versión	1.0
		Fecha	15/09/2023

PROYECTO REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. CONTRATO DE OBRA No. 0251 DE 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023 PERIODO 15 ENE 14 DE FEB 2026

No. Consecutivo	Fecha	Manifestante	Dirección	Asunto	Tipología				Gestión	Solución				Estado
					R	P	Q	S		RP	I	D	E/V	Fecha de cierre
39	**3/11/2025**	Maria Luisa Pabon Yaneth	Cll61 C # 5-45	La ciudaddana se comunica con el consorcio por via tefonca, manifentando que sufrio socavación en fachada (piso) y desprendimiento del mismo, debido que la maquinaria habia realisado excavacion para las actividades que se encuntran relizando, se presentaron fuertes lluvias y estas ocacionaron el desprendimiento del piso ya que el terreno se encontraba movido.	1									En revisión
40	**3/11/2025**	Luz Elena Martinez Vergara	Cll 61 C #5-45	La ciudadana se comunica con el consorcio có por via tefonca, manifentando que sufrio socavación en fachada (piso) desprendimiento del mismo y cubiernta flontal, debido que la maquinaria habia realisado excavacion para las actividades que se encuntran relizando, se presentaron fuertes lluvias y estas ocacionaron el desprendimiento del piso ya que el terreno se encontraba movido .	1									En revisión
41	**12/11/2025**	Patricia Niebles Moreno	CL6 C#-69	EN mencion se acerca a la oficina manifestando que por donde se va a construir la canalizacion es un lote de su propiedad.	1									En revisión
42	**8/01/2026**	Leiser Alvarez Mejia	Cra 5C #57C-63	La ciudadana manifiesta que, al momento de realizar los desvíos de las aguas dentro del arroyo, el talud colapsó, causando que el cerramiento del patio se debilitara y colapsara.	1									En revisión
43	**8/01/2026**	Silvia Monterosa Michilena	Cra 5C #57-03 apto 3	menciona que por los trabajos que se realizan, sufrió afectaciones en su vivienda, específicamente en sala y habitaciones.	1									En revisión
44	**8/01/2026**	Breidy Garavito Mercado	Cra 5C #57C-10	comunica que al momento de estar fundiendo, se desprendió la tubería que conducía la mezcla, ocasionando que la misma le salpicara toda la fachada de la vivienda con el concreto	1									En revisión
45	**3/02/2026**	Laudith Fonseca Navarro	Cll 57B #6B-52 Apto 2	Manifiesta que su vivienda sufrió afectaciones en general debido a las actividades que se encuentran realizando para la construcción de la canalización.	1									En revisión
				Total	13	6	11	0						

Tipología **R** Reclamo; **P** Petición; **Q** Queja; **S** Sugerencia

Solución **RP** Reparación; **I** Indemnización; **D** Donación o servicio; **E/V** Escrita/verbal

OBSERVACIONES

Yulieth Ortega V.

Firma profesional social contratista

Nombre: Yulieth Ortega

Liliana Pacheco V

Vo Bo Interventoría

Nombre: Liliana Pacheco

ANEXO 3: FORMATO DE RECEPCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS

CONSORCIO CANALIZACIÓN PLATANAL 2023	ATENCIONES CIUDADANAS	Formato	FCI-017
		Versión:	1.0
		Fecha:	6/09/2023

FECHA 08 02 M 2026 **CONSECUTIVO**

1. INFORMACION DEL CONTRATO

No del contrato: **0251 DE 2023** Contratista: **CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023**

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

2. INFORMACION DEL MANIFESTANTE

Nombres y apellidos: Laudith Fonseca Navarro

C.C. 22737867 Teléfono: 3052153585 Acta de vecindad N°

Dirección: CL 57B #65-52 AP 102 Barrio: Bello Horizonte

3. TIPO DE MANIFESTACION Petición [ ] Queja [ ] Reclamo [ ] Sugerencia [ ]

4. FORMA DE SOLICITUD Telefónico [ ] Escrito [ ] Verbal [V] Correo electronico [ ]

5. DESCRIPCION DE LA MANIFESTACION CIUDADANA La ciudadana se acerca a nuestra oficina manifestando que su vivienda ubicada en la CL 57B sufrio afectaciones en general debido a las actividades que nos encontramos realizando se le informa a la ciudadana que se realizara una visita y se registrara el registro fotografico antes de iniciar las actividades y constatar si lo que es procedente.

Laudith Fonseca
Firma del peticionario

CC 22.737.867

Yulieth Ortega U.
Firma representante del contratista

Cargo: Trab Social

Nombre de la documentación que acompaña a la manifestación

Observaciones

ANEXO 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	Formato	FCI-013
		Versión	2
		Fecha:	15/09/2023

PROYECTO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				
CONTRATO DE OBRA	0251 DE 2023	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023	**PERIODO**	15 ENE A 14 FEB 2026

			
Foto No 1	Atencion a la comunidad - Barrio Altos de la metro	**Foto No 2**	Atencion a la comunidad - Barrio Altos de la metro

ANEXO 7: INSPECCIÓN AMBIENTAL

FORMATO SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL DEFINIDAS EN EL PMA DEL PROYECTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

PERIODO REPORTADO: 15 de enero al 14 de febrero 2026

FECHA DE INSPECCIÓN: 14 febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.: 0251 DE 2023	**CONTRATISTA:** CONSORCIO EL PLATANAL 2023


OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - CRA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto se encuentra localizado en la región Caribe, departamento del Atlántico, específicamente en la zona urbana del municipio de Soledad. Se encuentra ubicado en las coordenadas 10°54′35″N74°47′09″O limita por el norte con el distrito especial de Barranquilla, por el sur con el municipio de Malambo, por el oriente con el departamento de Magdalena y por el occidente con Galapa.

Soledad es un municipio perteneciente al departamento del Atlántico, ocupa el octavo lugar en cuanto a población en el país, y el tercero en la región, considerado por mucho tiempo uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional actualmente integra el área metropolitana de Barranquilla

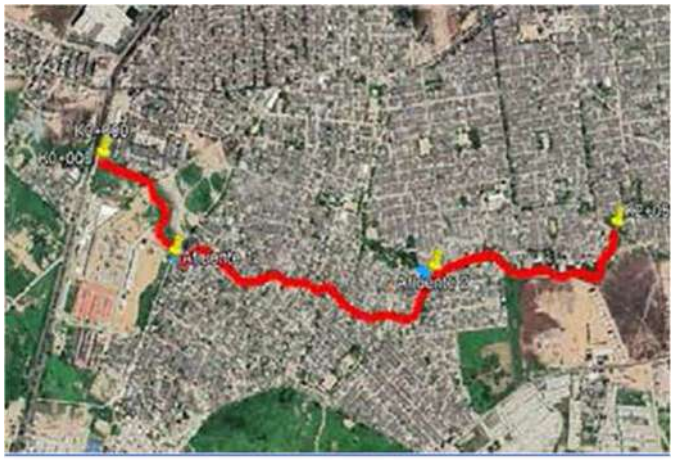

2. OBJETIVO

Llevar a cabo el seguimiento a las medidas de manejo ambiental definidas en los programas de manejo ambiental formulados por el Contratista de Obra en el Plan de Manejo Ambiental, con la finalidad de prever, controlar y mitigar la generación de efectos adversos en el área de influencia del proyecto.

3. INSPECCIÓN GENERAL

Se debe diligenciar marcando con una "X" según corresponda en cada uno de los requerimientos descritos a continuación, de igual manera diligenciar los datos adicionales requeridos:

Información ambiental general asociada al proyecto sujeta de inspección	Si	No	NA	Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
Indicar el número de trabajadores en obra que se encuentran laborando durante el periodo reportado: 32	X			Relación lista de personal en obra	Sí
				Inspección en obra	Si
				Otros:	

¿Se requiere de licencia Ambiental para la ejecución del proyecto?		**X**			
¿El proyecto cuenta con un Plan de Manejo Ambiental y/o documento equivalente para el manejo y control de impactos ambientales?	**X**			Plan de manejo ambiental aprobado	**Aprobado**
¿El Contratista de Obra dispone del personal encargado para la implementación del PMA en la Obra?	**X**			**Nombre:** Daniela Gaviria Gallego **Matricula:** 021021-0531256 ATL	
¿El Contratista de Obra cuenta con un cronograma de charlas y/o capacitaciones?	**X**			Cronograma de capacitaciones	**SI**
¿Se llevan a cabo charlas y/o capacitaciones al equipo de trabajo relacionadas con temáticas ambientales?	**X**			Lista de asistencia de capacitaciones	**SI**
				Registro Fotográfico de capacitación	**SI**
¿El Contratista de Obra dio a conocer al equipo de trabajo el alcance y las medidas de manejo a realizar en la obra mediante una jornada de socialización?	**X**			Lista de asistencia	**SI**
¿El Contratista de Obra cuenta con los insumos, materiales didácticos, personal, y recursos disponibles para la implementación del PMA?	**X**			Registros fotográficos	**SI**
¿Se encuentran ubicados en obras puntos ecológicos (canecas) para la disposición adecuada de los residuos sólidos generados?	**X**			Registros fotográficos	**SI**

4. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN INSPECCIONES ANTERIORES	
COMPROMISO	**ESTADO**
Señalizar y demarcar los frentes de obra oportunamente	SI CUMPLE
Cubrir oportunamente los RCD y materiales pétreos acopiados en frentes de obra	SI CUMPLE

5. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL DEFINIDOS EN EL PMA


5.1. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS SENSIBLES

MEDIO BIÓTICO

Objetivo: Garantizar la preservación de los ecosistemas sensibles localizados en el área de influencia directa del proyecto

Meta: Capacitar al 100% del personal sobre el cuidado de los ecosistemas sensibles
Cuidar el ecosistema durante la ejecución de los trabajos.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas /No de capacitaciones programadas) X 100	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	SI

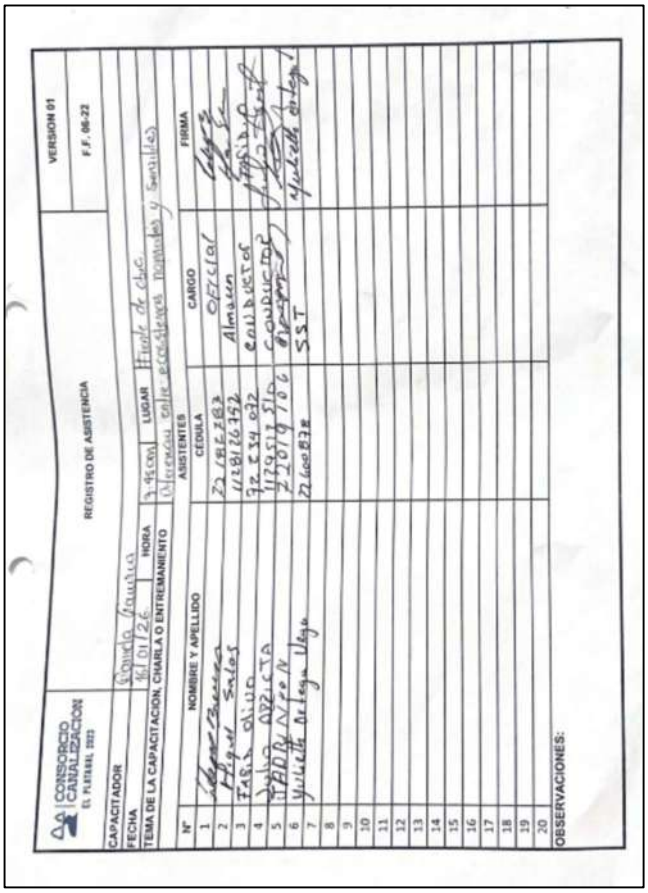

REGISTRO DE ASISTENCIA — CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023 — VERSION 01 — F.F. 06-22

CAPACITADOR: Sandra Fonseca — FECHA: 16/01/26 — HORA: 9:45 am — LUGAR: Frente de obra — TEMA DE LA CAPACITACION, CHARLA O ENTRENAMIENTO: Diferencias entre ecosistemas terrestres y Sensibles

N°	NOMBRE Y APELLIDO	ASISTENTES CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Angel Barrera	72.181.383	Oficial	
2	Ligdi Salas	1.128.167.362	Almacen	
3	Fabio Oliva		Ayudante	
4	Jairo Arrieta	72.234.032	Conductor	
5	Pedro Nieto	1.129.517.516	Operario	
6	Yuliseth Ortega Vega	1.140.838.838	SST	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:




5.2. PROGRAMA DE MANEJO DE REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL (DESCAPOTE) Y REVEGETALIZACIÓN DEL ÁREA INTERVENIDA

MEDIO BIÓTICO

Objetivo: Realizar restauración de las zonas de suelo destinadas para tal fin en la ronda hídrica del arroyo el platanal.

Meta:
Capacitar al 100% al equipo de trabajo sobre la importancia del cuidado de la cobertura vegetal y la revegetalización del área descapotada.
Realizar la compensación forestal de acuerdo con lo establecido por la CRA.
Realizar intervención forestal según inventario forestal.
Restaurar el 100% del área intervenida en las actividades de descapote.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas /No de capacitaciones programadas) X 100	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	SI
2	(área recuperada/ áreas descapotadas) X 100%			X	Registros fotográficos	NO
3	(Árboles sembrado / Árboles medida compensatoria) X 100%			X	Registro fotográfico Informe de compensación	NO

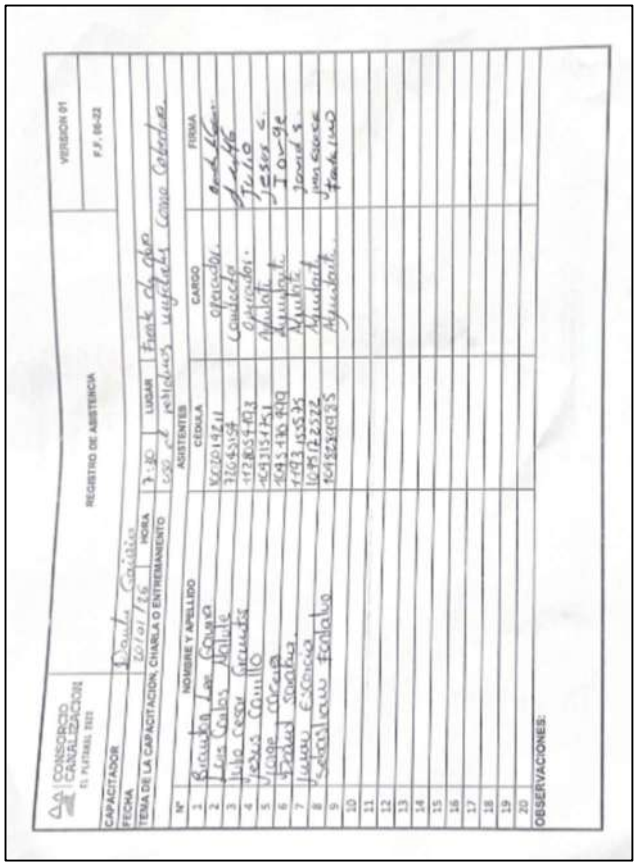

REGISTRO DE ASISTENCIA

CAPACITADOR: Dovis Castillo
FECHA: 6/07/22
HORA: 7:30
LUGAR: Frente de obra
TEMA DE LA CAPACITACION, CHARLA O ENTRENAMIENTO: Los 3 pericles y seguridad Cosa Colectiva

N°	NOMBRE Y APELLIDO	ASISTENTES CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Ruben Dario Cogollo	1.143.135.211	operador	
2	Luis Carlos Muñoz	1.143.135.54	Conductor	
3	Julio Cesar Miranda	1.128.554.403	Operador	
4	Jesus Castillo	1.143.134.761	Ayudante	
5	Jorge Cogollo	1.143.134.810	Ayudante	
6	Isabel Sanchez	1.143.135.535	Ayudante	
7	Hubert Exposito	1.143.122.372	Ayudante	
8	Jesus Eduardo Escalona	1.143.122.135	Ayudante	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:




5.3. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE FAUNA.

MEDIO BIÓTICO

Objetivo: Proteger la fauna existente en el área de influencia directa (AID)

Meta: Capacitar al 100% del personal de obra en mecanismos de protección de fauna.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas /No de capacitaciones programadas) X 100	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	SI

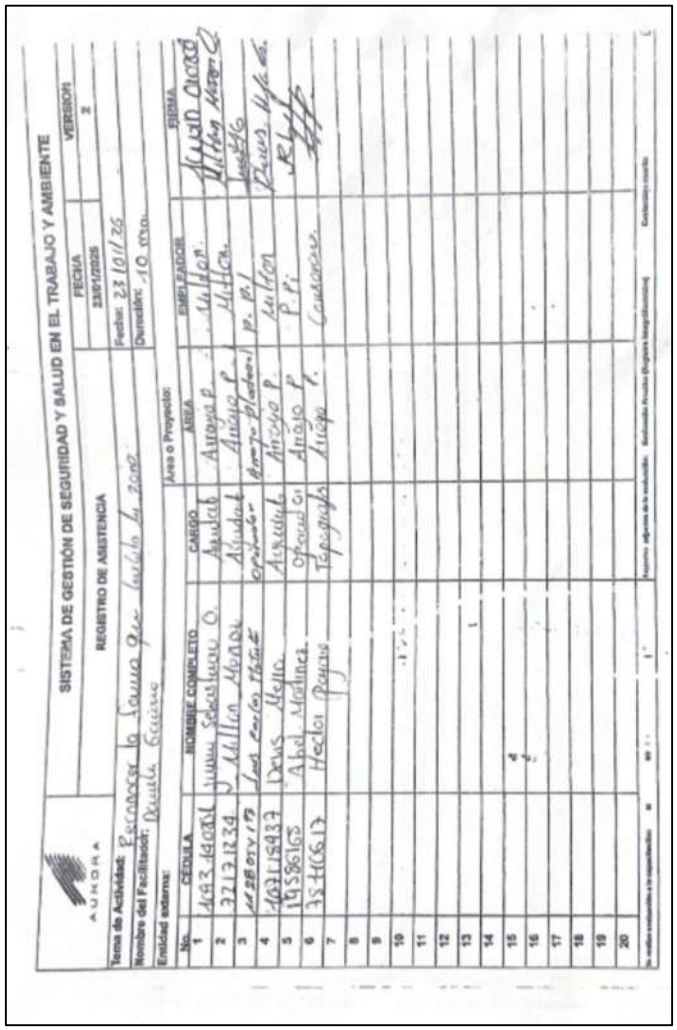
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

REGISTRO DE ASISTENCIA

AURORA

VERSION: 2

FECHA: 23/10/25

Tema de Actividad: Reconocer la fauna que habita la zona

Nombre del Facilitador: Paula Gaviria

Entidad externa:

Área o Proyecto:

Fecha: 23/10/25

Duración: 10 min

No.	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	AREA	EMPLEADOR	FIRMA
1	1143.140.841	Yuvan Sebastian O.	Ayudante	Arroyo P.	Yulfran	Yuvan Oviedo
2	3212.12.34	Yulfran Mendoza	Ayudante	Arroyo P.	Yulfran	Yulfran Mendoza
3	1.128.057.173	Jose emilio Pitre	Operador	Arroyo Platanal	Yulfran	Jose Pitre
4	1.001.159.937	Davis Mello	Ayudante	Arroyo P.	Yulfran	Davis Mello
5	1.143.986.165	Abel Molinet	Operador	Arroyo P.	P.I.	Abel Molinet
6	3.511.066.13	Hector Pajaro	Topografo	Arroyo P.	Contratista	Hector Pajaro
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



5.4. PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE

MEDIO BIÓTICO

Objetivo: Mitigar las molestias causadas a la comunidad durante la ejecución de la obra
Controlar la generación de ruido y material en suspensión que se genere durante la ejecución de la obra.

Meta: Capacitar al 100% del personal de obra en el manejo de los equipos y maquinaria y en el uso adecuado de los elementos de protección individual.
Revisar el 100% de los certificados de gases de los vehículos vinculados al proyecto.
Humectar al 100% de las áreas desprovista de acabado en los días de no lluvia o cuando se requieran
Instalar al 100% la señalización preventiva, como: 20 km/h.
Cumplir con el carpado del 100% del parque automotor que transporte materiales de construcción.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100	X			Registro Asistencia capacitación Registro fotográfico	SI
2	(No de certificados vigentes/ No. total de certificados) x100%	X			Registro técnico mecánico	SI
3	(No de riegos desarrollados / No riegos Programados) X 100%	X			Registro fotográfico	SI
4	(No de señalizaciones preventivas/No. total de señalización)	X			Registro fotográfico	SI
5	(No de volquetas capardas / total de volquetas en obra)	X			Registro fotográfico	SI



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 179953737

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CIRCUNVALAR
NIT: 900357258
No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-070-001
Fecha de expedición: 2025/01/22
Fecha de vencimiento: 2026/01/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA: PKF675
CLASE: CAMION
MARCA: DODGE
MODELO: 1980
SERVICIO: Particular
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 6194
NRO. MOTOR: T9B1616V65
NRO. CHASIS: DT9B1616
VIN:
LÍNEA: D 600
COLOR: VERDE
NOMBRE PROPIETARIO: CESAR C. BRITO V.

FIRMA DEL RESPONSABLE
HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO

Concesión RUNT 2.0 SAS / NIT 901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930081

5.5. PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PÉTREOS

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Prevenir, mitigar y/o controlar los impactos ambientales que se generen por el manejo de los materiales de construcción.
Establecer las medidas y acciones conducentes a la obtención de materiales para la ejecución de obras y definir las acciones para el manejo de los materiales en el sitio de las obras y sitios de acopio temporal.

Meta: Adquirir 100% material de fuentes de materiales autorizada
Realizar buen manejo de los acopios de materiales

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(Volumen material de cantera utilizado/ Volumen material de cantera licenciado) x 100	X			Permisos ambientales proveedores	SI
2	(Acopios bien manejados/ total de acopios en la obra) x 100	X			Registro fotográfico.	SI


5.6. PROGRAMA DE INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALES

MEDIO ABIÓTICO


Objetivo: Prevenir, minimizar y controla los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal.

Meta:
Capacitar al 100% del personal del proyecto sobre el uso de las instalaciones temporales del proyecto.
Recuperar las áreas intervenidas.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No. de capacitaciones realizadas/No. Capacitaciones programadas) x 100%	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	SI
2	(No. De áreas recuperadas / No. De áreas intervenidas) x 100%			X	Registro fotográfico.	NO

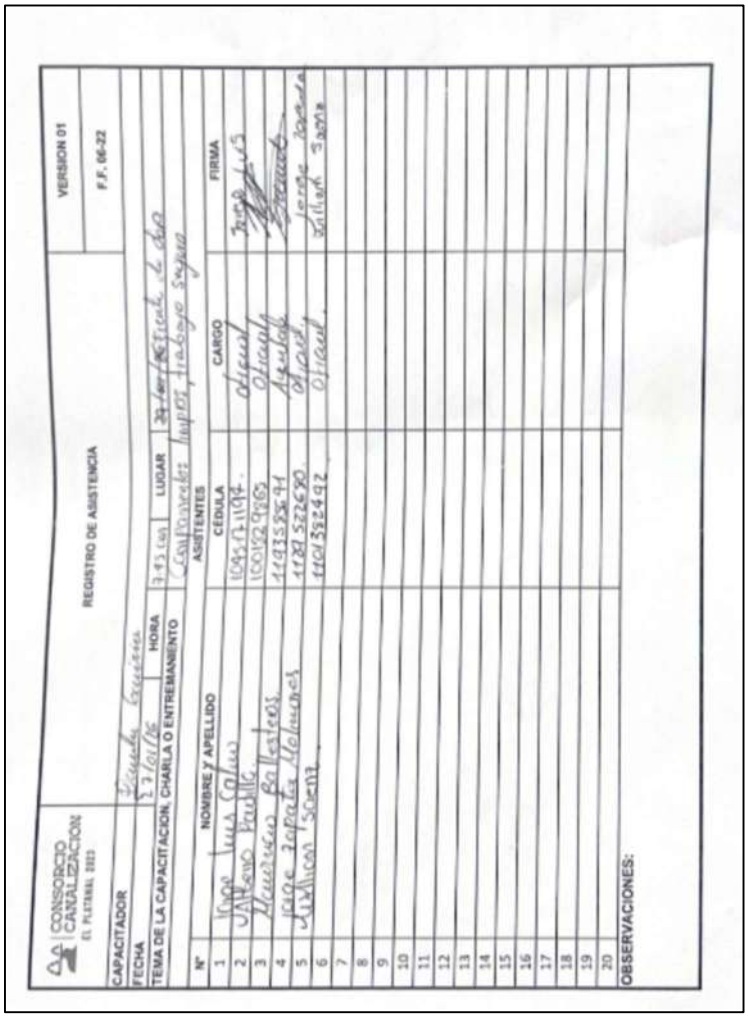



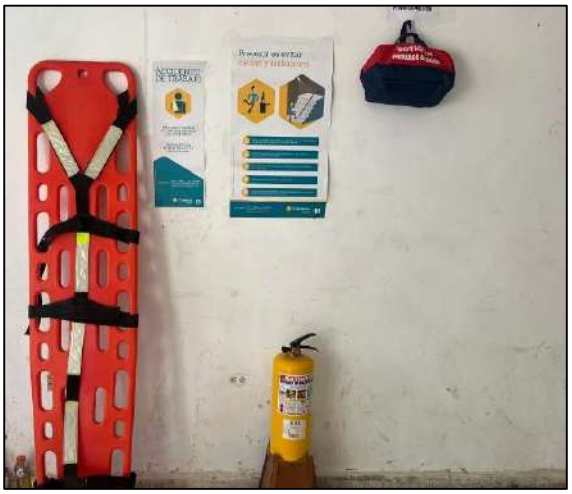


5.7. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Realizar el manejo y la disposición adecuada de RCD.

Meta: Retirar el 100% del material de excavación, demolición y sobrantes de construcción del arroyo el platanal
Capacitar al 100% del personal en la disposición final de los RCD
Aprovechar el 50% del material de excavación (El porcentaje puede variar de acuerdo con las características mecánicas del suelo)

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(Cantidad de volumen RCD dispuesto en sitios autorizados/ Volumen de RCD total a disponer) X 100%	X			Registro viajes de volquetas Registro fotográfico.	SI
2	(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico	SI

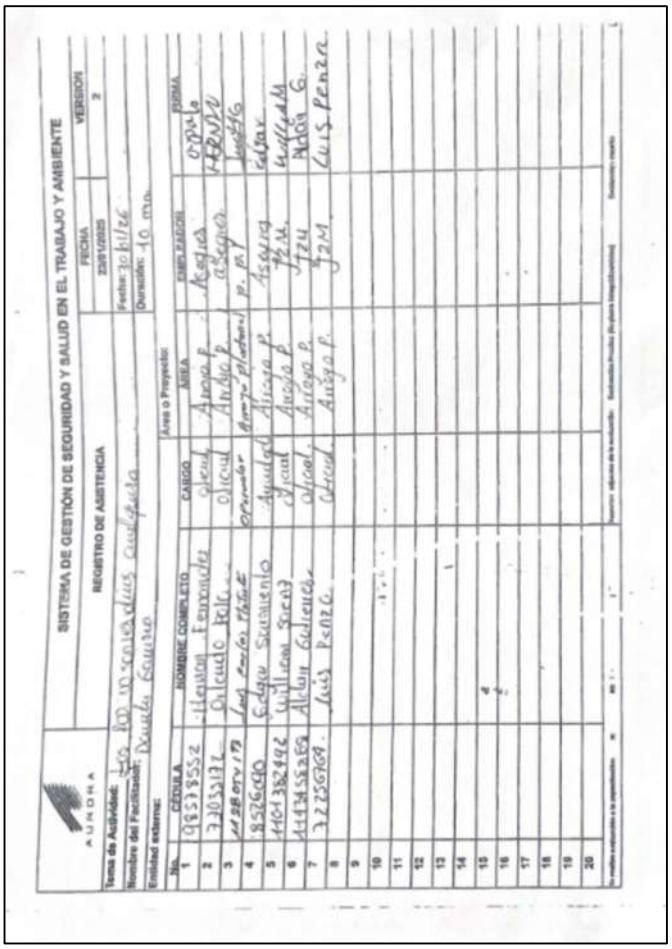
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSION 2

No.	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	9857 5552	Hernan Fernandez	Oficial	Aguas P.	
2	3203	Oficial Rdc	Oficial	Aguas P.	
3	1158	Ing Carlos Mate	Operador	Aguas P.	
4	8536	Edgar Saavedra	Ayudante	Aguas P.	
5	1401	William Sierra	Oficial	Aguas P.	
6	1113	Alvin Gallardo	Oficial	Aguas P.	
7	1225	Luis Perez	Oficial	Aguas P.	




5.8. PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O LÍQUIDOS, CONVENCIONALES Y ESPECIALES

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Minimizar cualquier impacto adverso sobre la salud de los trabajadores y el medio ambiente por el mal manejo y disposición final de los residuos generados durante el desarrollo del proyecto

Meta: Capacitar al 100% del personal del proyecto en el manejo adecuado de los residuos sólidos y/o líquidos, convencionales y especiales.
Clasificar el 100% de los residuos sólidos desde la fuente.
Instalar 100% de los puntos ecológicos en obra.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico	SI
2	(No de residuos clasificados (bolsas)/(No total de residuos (bolsas)) x 100%	X			Registro fotográfico.	SI
3	(No de puntos instalados / No. de puntos a instalar) X 100%	X			Registro fotográfico	SI

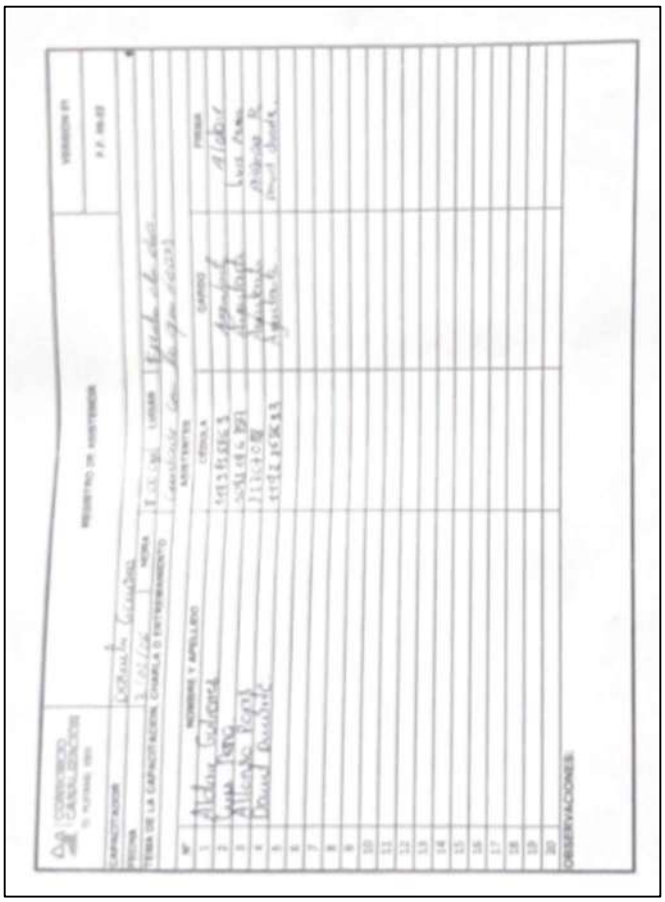




5.9. PROGRAMA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Prevenir los impactos que se puedan generar por el manejo de la maquinaria, equipos y vehículos.

Meta: Capacitar al 100% del personal sobre el manejo de las maquinarias, equipos y vehículos
Realizar el 100% de las inspecciones de control

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100	**X**			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	**SI**
2	(No de inspecciones desarrolladas / No. Inspecciones Programadas) X 100%	**X**			Registros de mantenimiento y/o inspecciones	**SI**

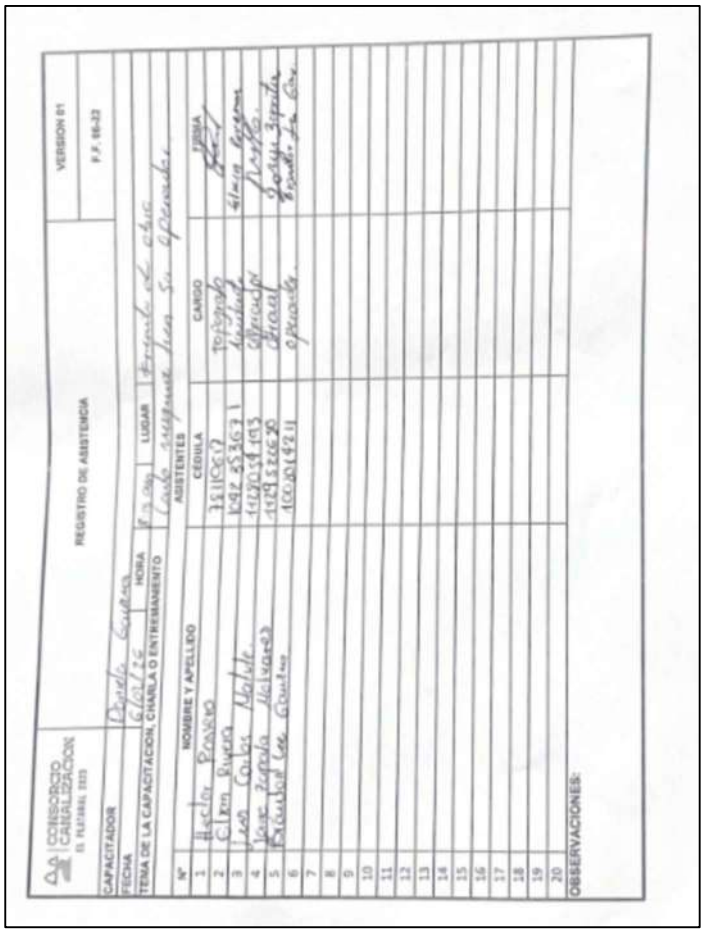




5.10. PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y AISLAMIENTO DE OBRA

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Evitar accidentes de las personas que ingresan al frente de obra

Meta: Capacitar al 100% del personal sobre el uso correcto de la señalización y aislamiento de obra
Instalar el 100% de las señalizaciones y cerramiento necesarias en el frente de obra

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100	**X**			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	**SI**
2	(No. de señales instaladas/No. de señales a instalar) x 100%	**X**			Registro fotográfico	**SI**

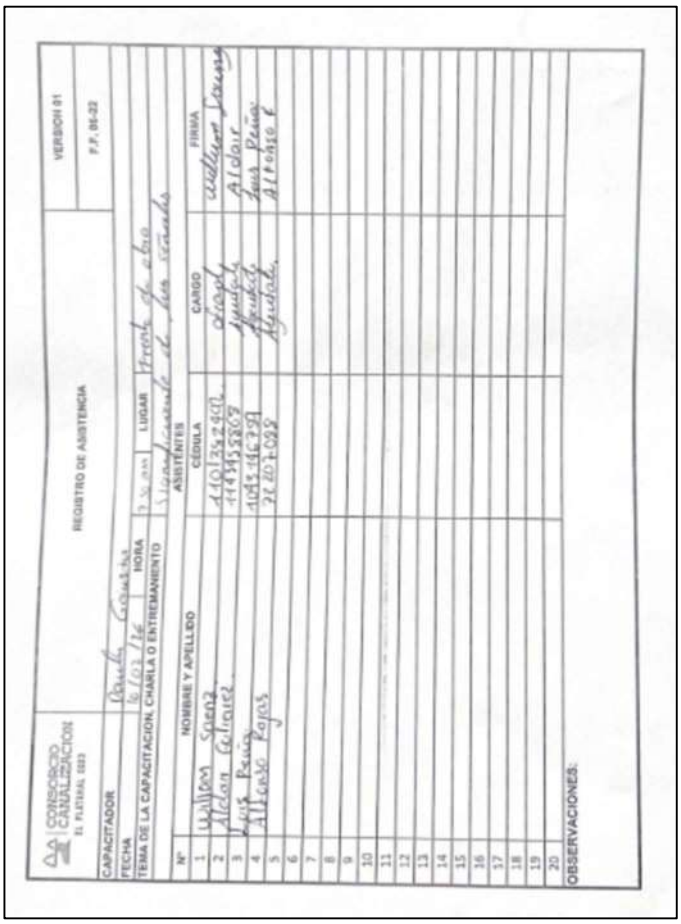
REGISTRO DE ASISTENCIA

CAPACITADOR: Oswaldo Cabarcas
FECHA: 16/03/16
HORA: 3:30 pm
TEMA DE LA CAPACITACION, CHARLA O ENTRENAMIENTO: Uso adecuado de las señales
LUGAR: Frente de obra

Nº	NOMBRE Y APELLIDO ASISTENTES	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	William Sierra	1.101.334.401	Oficial	
2	Aldair Salgado	1.143.455.869	Ayudante	Aldair
3	Luis Perez	1.045.467.291	Ayudante	Luis Perez
4	Alexis Rojas	1.120.6058	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:






5.11. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Diseñar medidas de manejo que controlen y prevengan los efectos que pudiera causar el mal manejo de los residuos líquidos domésticos e industriales sobre el medio ambiente en la zona del proyecto

Meta: Entregar el 100% de los RESPEL generados en obra a un gestor autorizados.
Colocar un baño portátil por cada 15 trabajadores.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(Residuos líquidos entregados/ Residuos líquidos generados) x 100			X	Registro fotográfico.	SI
2	(RESPEL entregados / RESPEL generados) x 100			X	Registro fotográfico.	NA
3	(N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas) x 100	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	SI

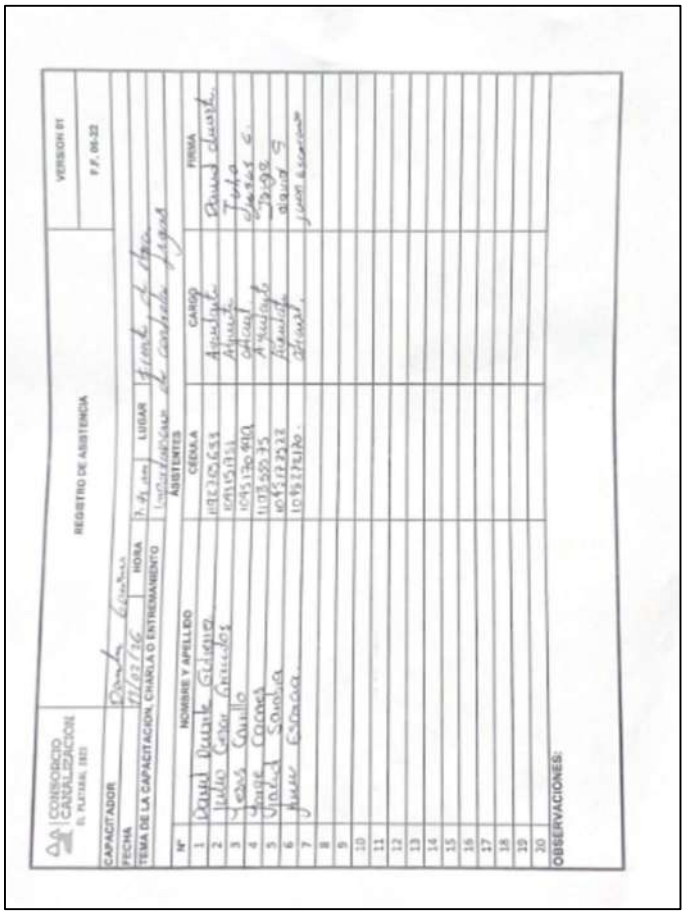
REGISTRO DE ASISTENCIA

CAPACITADOR: Diana Cardona
FECHA: Marzo
HORA: 7 a.m.
LUGAR: Frente de Obra
TEMA DE LA CAPACITACION, CHARLA O ENTRENAMIENTO: Capacitación de cuidado Propio

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Raul Duran Gridaz	1[illegible]6651	Ayudante	Raul Duran
2	Julio Cesar Arrieta	1045[illegible]1	Ayudante	Julio
3	Jose Cuello	1045130980	Oficial	Jose C.
4	Jorge Cardona	1143[illegible]35	Ayudante	Jorge
5	Yoleth Sanjuan	1045[illegible]23	Ayudante	Yoleth
6	Juan Estrada	1045[illegible]80	Oficial	Juan Estrada
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:



5.12. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Objetivo: Capacitar y sensibilizar al personal de obra

Meta: Capacitar al 100% del personal de obra sobre temas ambientales, seguridad y salud en el trabajo y sobre el comportamiento con las comunidades.
Sensibilizar al 100% del personal sobre los impactos asociados al proyecto

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas) X 100	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	SI
2	(No. de personas sensibilizadas/No. de personas a sensibilizar) x 100%	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico	SI

Fecha	Actividad	Responsable
16/01/2026	Diferencia entre ecosistemas normales y ecosistemas sensibles	Daniela Gaviria
20/01/2026	Uso de residuos vegetales como cobertura	Daniela Gaviria
23/01/2026	Reconocer la fauna que habita la zona	Daniela Gaviria
27/01/2026	Campamentos limpios, trabajo seguro	Daniela Gaviria
30/01/2026	Los RCD no son un residuo cualquiera	Daniela Gaviria
3/02/2026	Residuos peligrosos: cuidado con lo que tocas	Daniela Gaviria
6/02/2026	Cada máquina tiene su operador	Daniela Gaviria
10/02/2026	Significado de las señales (preventivas, restrictivas, informativas)	Daniela Gaviria
13/02/2026	Importancia de controlar fugas y goteos en equipos y recipientes	Daniela Gaviria

5.13. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Objetivo: Mantener informada y resolver dudas e inquietudes presentadas por comunidad y personal interesado.

Meta: Implementar un sistema que permita atender y dar respuesta a las inquietudes, dudas y quejas de manera oportuna al 100% de las situaciones que se genere con las comunidades del área de influencia del proyecto
Informar al 100% de la comunidad y actores involucrados en el proyecto

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No. de solicitudes atendidas / No. de Solicitudes recibidas) x 100%	X			Registro de solicitudes realizadas.	SI
2	(No. de reuniones realizadas/ No. de reuniones programadas) x 100%	X			Registro fotográfico Registro de asistencia.	SI

5.14. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL						
MEDIO SOCIOECONÓMICO						
Objetivo: Contratar personal de mano de obra no calificada de las zonas cercanas al proyecto						
Meta: Vincular al 100% del personal no calificado que requiera la obra.						
Ítem	**Indicador**	**Cumplimiento de Indicador**			**Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)**	**Marque (Si /No según sea el caso)**
		Si	**No**	**NA**		
1	(No. de personas contratadas de la zona/ No. de personas requeridas de la zona) x 100%	**X**			Registro de vinculación del personal certificado de residencia en la zona	**SI**

5.15. PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD						
MEDIO SOCIOECONÓMICO						
Objetivo: Realizar levantamiento de actas de vecindad a los predios que se encuentren más próximos al área a intervenir.						
Meta: Dejar registro 100% de los predios (viviendas, construcciones, establecimientos) que se encuentren cerca del área del proyecto.						
Ítem	**Indicador**	**Cumplimiento de Indicador**			**Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)**	**Marque (Si /No según sea el caso)**
		Si	**No**	**NA**		
1	No. De actas de vecindad elaboradas/ No. de viviendas y establecimientos identificados x 100%			**X**	Actas y registro fotográfico	**N/A**
2	(No. de actas de vecindad cierre ejecutadas/ No. de actas de vecindad cierre programadas) x 100%		**X**		Actas y registro fotográfico	**NO**
Las actas de vecindad iniciales ya fueron levantadas en su totalidad						

6. LISTADO DE COMPROMISOS	
COMPROMISOS	**FECHA**
Señalizar y demarcar los frentes de obra oportunamente	Durante el periodo
Continuar charlas al personal de acuerdo con las fichas del PMA	Durante el periodo

ANEXO: INFORME AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME AMBIENTAL N°25

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”

SOLEDAD - ATLÁNTICO

PERIODO

15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2026

MEDIO BIÓTICO

1. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS SENSIBLES


Para este programa se definió como objetivo principal garantizar la preservación de los ecosistemas naturales localizados en el área de influencia directa del proyecto. Para ello se realizarán charlas en las cuales se capacite al equipo de trabajo en temáticas relacionadas con la importancia de la conservación y protección de los ecosistemas presentes en el área del proyecto, las acciones a implementar para garantizar su permanencia y la normatividad asociada a este componente. El día 16 de enero de 2026 se realizó una charla al personal operativo sobre diferencia entre ecosistemas normales y ecosistemas sensibles.



Diferencia entre ecosistemas normales y ecosistemas sensibles

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Meta:	Capacitar al 100% del personal sobre el cuidado de los ecosistemas sensibles.
Indicador de calificación:	$\frac{No\ de\ capacitaciones\ realizadas}{No\ de\ capacitaciones\ programadas}\ x\ 100\%$ *(1/1) x 100% = 100%*

Formato Asistencia Charla

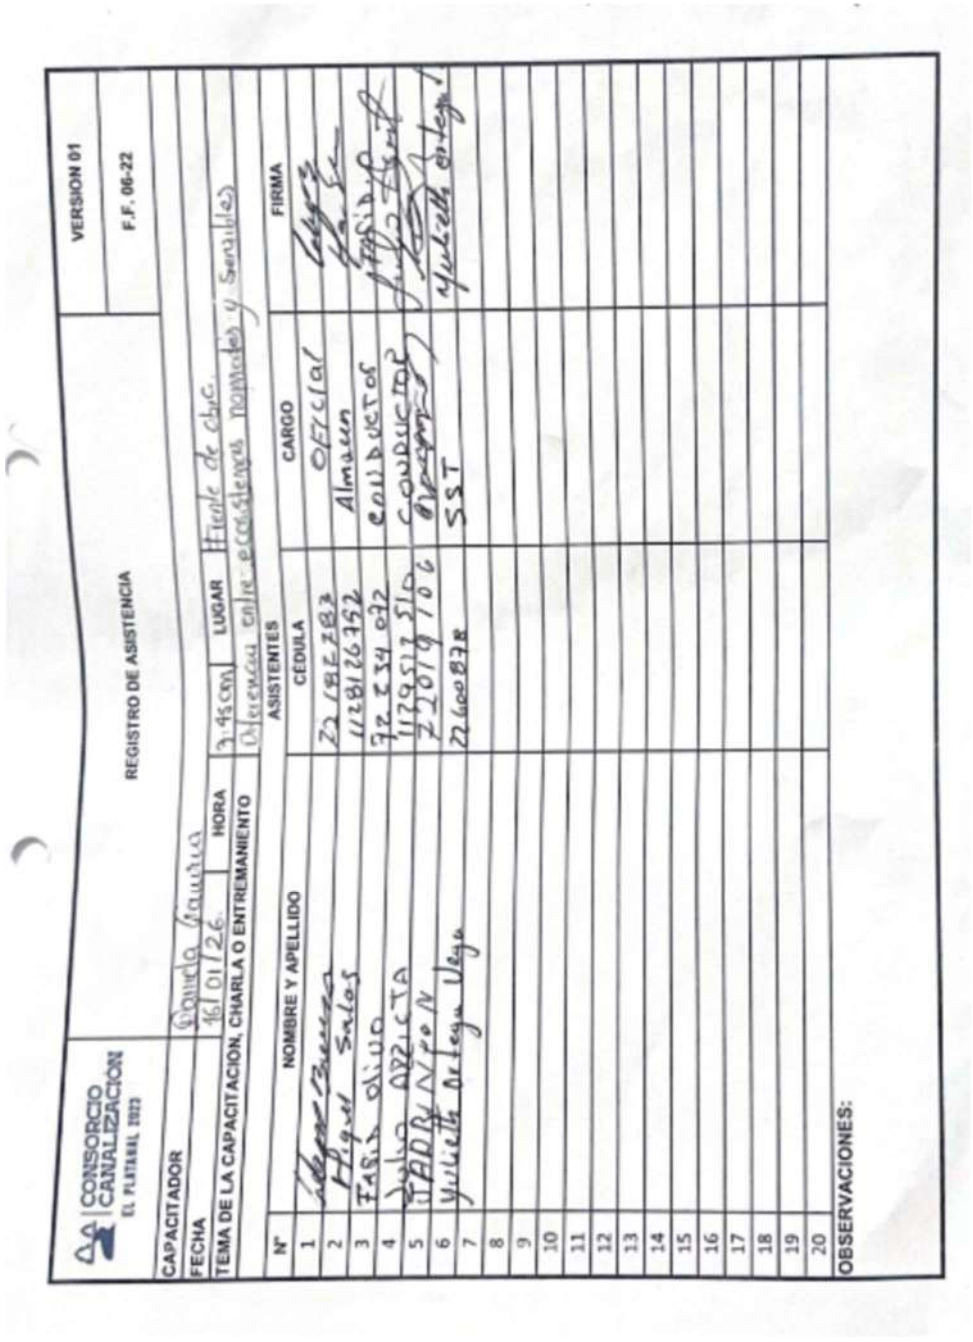

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSION 01

F.F. 06-22

CAPACITADOR: Oswaldo Gaviria

FECHA: 16/01/26 HORA: 3:45 pm LUGAR: Frente de obra

TEMA DE LA CAPACITACION, CHARLA O ENTRENAMIENTO: Diferencias entre ecosistemas nombrados y Sensibles

ASISTENTES

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edgar Bueno	7.182.783	OFICIAL	
2	Miguel Salas	1.128.167.952	Almacen	
3	Fabio oliva	72.234.072	conductor	
4	Julio Arrieta	1.129.519.510	CONDUCTOR	
5	FABIAN Leon	7.201.919.706	Operario	
6	Yuliett Ortega Vega	22.600.878	SST	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

2. PROGRAMA DE MANEJO DE REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL (DESCAPOTE) Y REVEGETALIZACIÓN DEL ÁREA INTERVENIDA

El objetivo definido para este programa se centra en restaurar las zonas en las que debido a los requerimientos del proyecto se deban realizar intervenciones sobre la cobertura vegetal.

El día 20 de enero de 2026 se llevó a cabo charla al personal sobre el uso de residuos vegetales como cobertura.

Durante el periodo, se realizó relleno en el lateral del muro y estabilización del terreno.

Hasta la fecha, no se han realizado intervenciones a especies arbóreas, ya sea poda o tala, por lo tanto, no ha sido necesario realizar ninguna medida compensatoria.


La restauración de las áreas intervenidas en las actividades de descapote, se realizará a medida que se finalicen las intervenciones por tramo.

	
Excavación para puente vehicular	*Excavación para puente vehicular*

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Meta:	Capacitar al 100% al personal sobre el cuidado y revegetalización del área intervenida.
Indicador de calificación:	$\frac{No\ de\ capacitaciones\ realizadas}{No\ de\ capacitaciones\ programadas}\ x\ 100\%$ *(1/1) x 100% = 100%*

Meta:	Restaurar el 100% del área intervenida en las actividades de descapote.
Indicador de calificación:	$\frac{\text{Hectáreas recuperadas}}{\text{Hectáreas descapotadas}}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$ *(0/0) x 100% = 0%*
Nota aclaratoria	*La actividad se tiene prevista ejecutar cuando el avance del proyecto se encuentre en un 95%*
Meta:	Sembrar totalidad de árboles de la medida compensatoria
Indicador de calificación:	$\frac{\text{Arboles sembrados}}{\textit{Arboles medida compensatoria}}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$ *(0/0) x 100% = 0%*
Nota aclaratoria	*La actividad se tiene prevista ejecutar cuando el avance del proyecto se encuentre en un 95%*

Formato Asistencia Charla

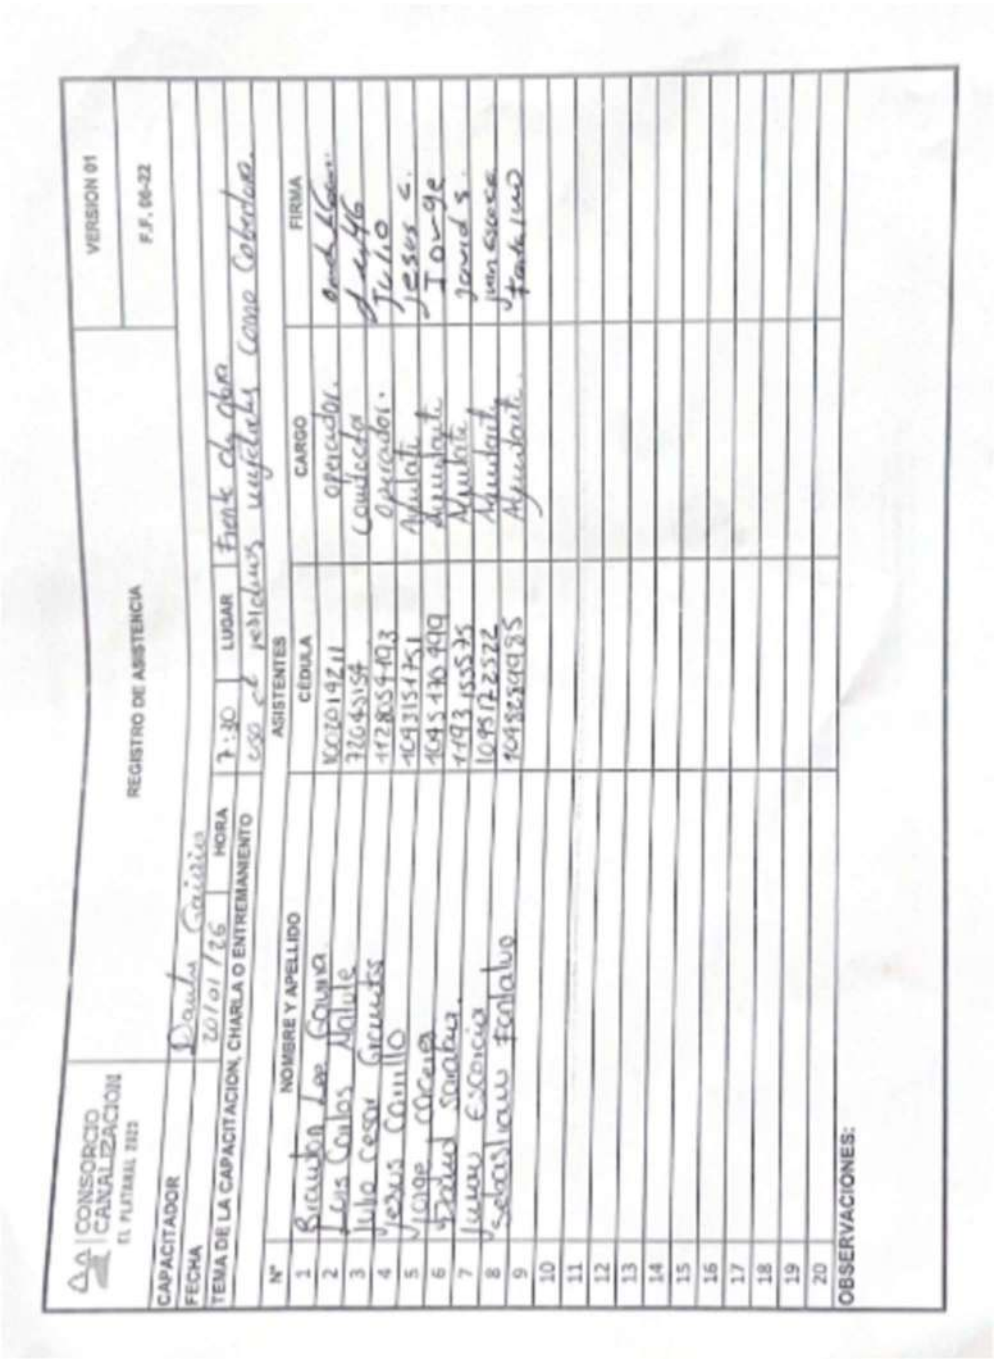

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSION 01

F.F. 06-22

CAPACITADOR: David Galvis

FECHA: 6/01/26 HORA: 7:30 LUGAR: Frente de obra

TEMA DE LA CAPACITACION, CHARLA O ENTRENAMIENTO: uso de residuos ordinarios como Cobertura

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Reinaldo Lee Correa	1006019211	operador	
2	Luis Carlos Alzate	3264315	Conductor	
3	Julio Cesar Grueso	1128054103	Operador	
4	Jesus Carrillo	1093151251	Ayudante	
5	Jorge Correa	1095430499	Ayudante	
6	Rafael Sarabia	1193155535	Ayudante	
7	Hubey Escorcia	1095122522	Ayudante	
8	Sebastian Fontalvo	1095999185	Ayudante	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

3. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE FAUNA

Para este programa se definió como objetivo principal proteger la fauna silvestre que se encuentra presente en el área de influencia directa del proyecto. Para ello se llevarán a cabo charlas enfocadas en el manejo, protección y conservación de las especies que se encuentren dentro del área de influencia directa del proyecto, así mismo se darán a conocer las estrategias para prever las perturbaciones de su hábitat.


Durante el desarrollo de actividades de excavaciones en el lecho del arroyo, no se tuvo presencia de fauna por lo que no fue necesario ahuyentar, capturar, transportar y/o reubicación de ésta.

- *Queda prohibido a todo el personal de obra la alimentación, caza o tenencia de animales silvestres.*
- *Está prohibido criar animales domésticos, tales como perros, gatos, cerdos, etc., en las instalaciones.*
- *Evitar los ruidos excesivos (mantenimiento mecánico adecuado de los equipos).*

El día 23 de enero de 2026 se lleva a cabo charla al personal sobre reconocer la fauna que habita la zona.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Meta:	Capacitar al 100% del personal de obra en mecanismos de protección de fauna.
Indicador de calificación:	$\frac{No\ de\ capacitaciones\ realizadas}{No\ de\ capacitaciones\ programadas}\ x\ 100\%$ *(1/1) x 100% = 100%*

Formato Asistencia Charla

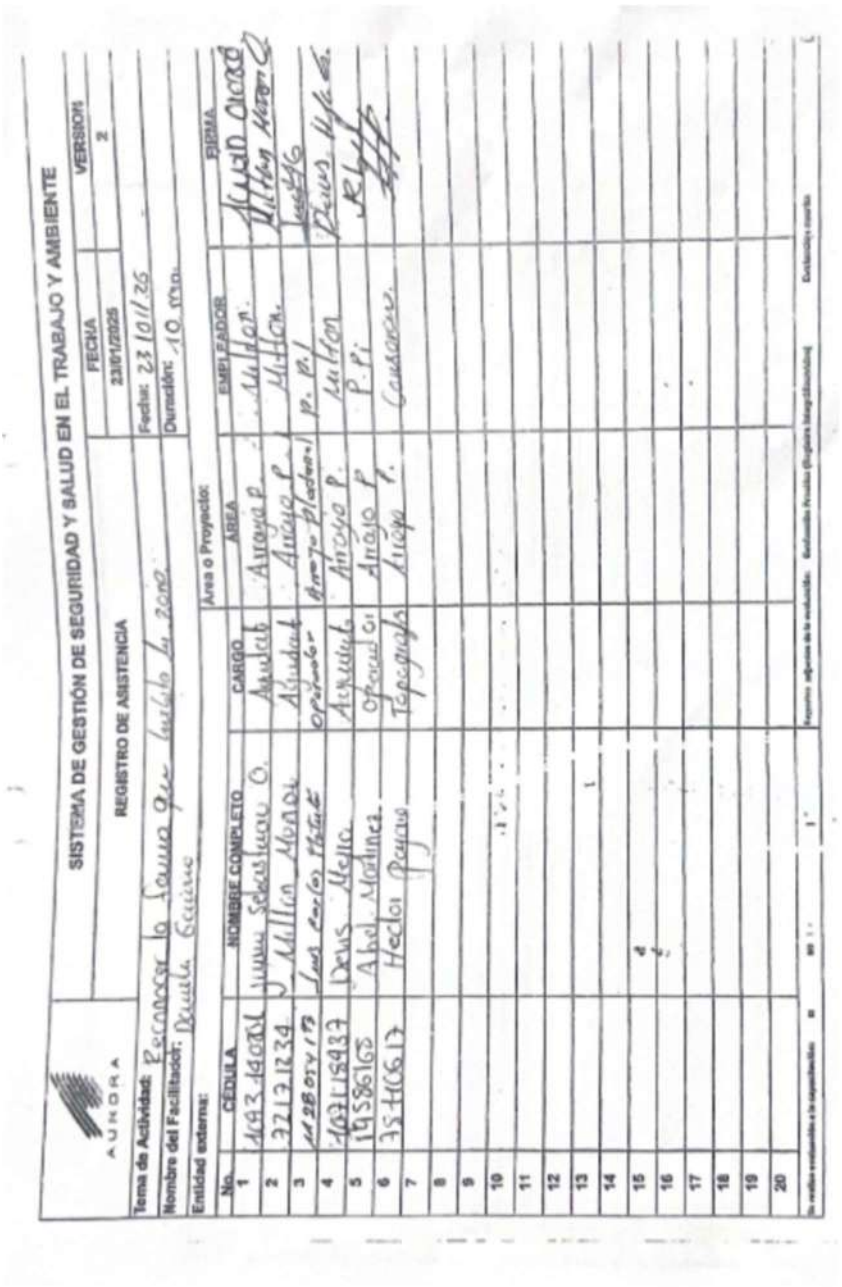

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

AURORA

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 23/01/2025

VERSION: 2

Tema de Actividad: Reconocer lo Sumo que hubo la zona

Fecha: 23/01/25

Nombre del Facilitador: Daniela Gelvez

Duración: 10 min.

Entidad externa:

Area o Proyecto:

No.	CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	AREA	EMPLEADOR	FIRMA
1	1093466031	Jhon Sebastian O.	Auxiliar	Arenga P.	Aurora	
2	3213234	Julian Mendez	Alumbrado	Arenga P.	Aurora	
3	1128057173	Jose carlos Ortiz	operador	Arenga Plataforma	P. P.	
4	1091158937	Deus Uello	Auxiliar	Arenga P.	Aurora	
5	1915861765	Abel Molina	Oficial	Arenga P.	P. P.	
6	3574066173	Hector Reyes	Topografo	Arenga P.	Consorcio	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

MEDIO ABIÓTICO

4. PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE

Para este programa se definió como objetivo principal de prevenir y controlar la generación de ruido como resultado de las actividades constructivas del proyecto y controlar la generación de material particulado que resulte de las actividades constructivas del proyecto. A continuación, se detallan las acciones realizadas:

Control de emisiones y material particulado

Durante este periodo se realizó la revisión técnico mecánica (inspección del certificado de gases) de los vehículos empleados durante la ejecución de las actividades constructivas del proyecto (volquetas y vehículos).



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 175953737

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CIRCUNVALAR
NIT: 900357258
No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-070-001
Fecha de expedición: 2025/01/22
Fecha de vencimiento: 2026/01/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA: PKF675
CLASE: CAMION
MARCA: DODGE
MODELO: 1980
SERVICIO: Particular
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 6194
NRO. MOTOR: T9B1616V65
NRO. CHASIS: DT9B1616
VIN:
LÍNEA: D 600
COLOR: VERDE
NOMBRE PROPIETARIO: CESAR C. BRITO V.

FIRMA DEL RESPONSABLE
HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO

Concesión RUNT 2.0 SAS / NIT:901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930081

Técnico mecánica volqueta PKF-675

Control de ruido

Durante el periodo comprendido entre el 15 de enero al 14 de febrero de 2026, se realizan sensibilizaciones con el personal, en la cuales se enfatiza la necesidad de conservar un ambiente de trabajo propicio para los colaboradores, como, por ejemplo, usar pitos de vehículos y cualquier otro objeto que genere ruido, estrictamente en casos necesarios.

Control de lluvia

FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	DURACIÓN
1/02/2026	9:00 a. m.	5:00 p. m.	8 horas
2/02/2026	1:00 p. m.	6:00 p. m.	5 horas

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Meta:	Capacitar al 100% del personal de obra en el manejo de los equipos y maquinaria y en el uso adecuado de los elementos de protección individual.
Indicador de calificación:	$\frac{No\ de\ capacitaciones\ realizadas}{No\ de\ capacitaciones\ programadas}\ x\ 100\%$ *(1/1) x 100%= 100%*
Meta:	Revisar el 100% de los certificados de gases (tecnicomecánica) de los vehículos vinculados al proyecto.
Indicador de calificación:	$\frac{No\ de\ certificados\ vigentes}{No.total\ de\ certificados}\ x\ 100\%$ *(16/16) x 100%= 100%*
Meta:	Humectar al 100% el área desprovista de acabado en días de no lluvia o cuando se requiera.
Indicador de calificación:	$\frac{No\ de\ riegos\ desarrollados}{No.\ riesgos\ programados}\ x\ 100\%$ *(12/12) x 100%=100%*

Meta:	Instalar al 100% la señalización preventiva, como velocidad máxima 20 km/h.
Indicador de calificación:	$\frac{No\ de\ señalizaciones\ preventivas\ instaladas}{No.total\ de\ señalización} x\ 100\%$ *(16/16) x 100%= 100%*
Meta:	Cumplir con el carpado del 100% del parque automotor que transportes materiales de construcción
Indicador de calificación:	$\frac{No\ de\ volquetas\ carpadas}{No.total\ de\ volquetas\ en\ obra} x\ 100\%$ *(16/16) x 100%= 100%*

5. PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PÉTREOS

Este programa se definió con el objetivo de prevenir, mitigar y/o controlar los impactos ambientales que se generen por el manejo de los materiales de construcción, además se busca establecer las medidas y acciones conducentes a la obtención de materiales para la ejecución de obras y definir las acciones para el manejo de los materiales en el sitio de las obras y sitios de acopio temporal.

Durante el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 14 de febrero de 2026, se efectuó la gestión, recepción y uso de materiales pétreos provenientes de la cantera La Fontana, autorizada mediante la Resolución N.º 000379 de 2015 y el título minero N.º KDD-15261. En este lapso se suministró 120 m³ material de recebo y 0 m³ de piedra. A la fecha se presenta un acumulado total de 47922 m³ de recebo y 24525 m³ de piedra, empleados en el desarrollo del proyecto.

En el periodo mencionado, no hubo almacenamiento temporal de material pétreo.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Meta:	Adquirir material de fuentes de materiales autorizada
Indicador de calificación:	$\frac{Vol.material\ de\ cantera\ utilizado}{Vol.material\ de\ cantera\ licenciado}\ x\ 100\%$ *(72,447 / 72,447) x 100%= 100%*
Nota aclaratoria:	Se aumenta cantidad de volumen de material de cantera licenciado, teniendo en cuenta las mayores cantidades de obra en las actividades de canalización
Meta:	Realizar buen manejo de los acopios de materiales.
Indicador de calificación:	$\frac{No\ acopios\ con\ buen\ manejo}{No\ total\ de\ acopios\ en\ obra}\ x\ 100\%$ *(0/0) x 100% = 100%*


6. PROGRAMA DE INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS TEMPORALES

Este programa se formuló con el objetivo principal de prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales negativos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento de obra y áreas de acopio temporal de material e insumos.

El campamento principal se encuentra ubicado en la dirección calle 64 #09-07 en el Municipio de Soledad, Atlántico, punto en el cual se realizará la recepción y atención de las solicitudes presentadas por la comunidad y el municipio en general. Este se encuentra provisto de punto ecológico, botiquín, extintor, camilla, señalización preventiva e informativa de seguridad y salud en el trabajo, un punto de hidratación.


El día 27 de enero de 2026 se dictó charla al personal operativo sobre Campamentos limpios, trabajo seguro.

La recuperación de las áreas intervenidas para la operación del campamento, se llevará a cabo una vez finalicen las actividades constructivas.

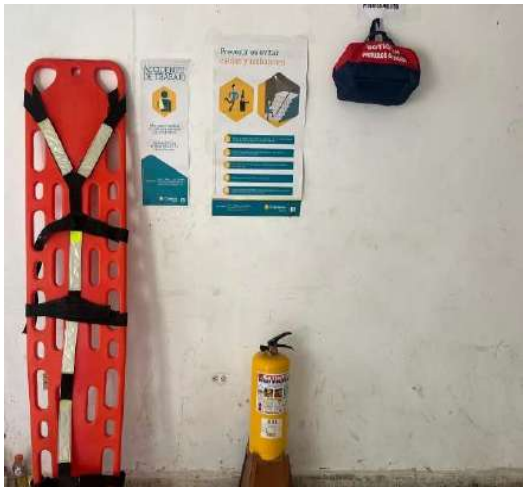	
Unidad sanitaria de oficina administrativa	*Kit de emergencia en campamento de obra.*

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Meta:	Capacitar al 100% del personal del proyecto sobre el uso adecuado de las instalaciones temporales del proyecto.
Indicador de calificación:	$\frac{\textbf{No de capacitaciones realizadas}}{\textbf{No de capacitaciones programadas}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$ *(1/1) x 100% = 100%*
Nota aclaratoria	*Las charlas se brindan al personal por frente de obra, esto, con el objetivo de no interrumpir las actividades que se estén realizando en otros frentes.*
Meta:	Recuperar el 100% de áreas intervenidas para la operación del campamento.
Indicador de calificación:	$\frac{\textbf{No de acciones desarrolladas}}{\textbf{No de acciones programadas}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$ *(0/0) x 100% = 0%*
Nota aclaratoria	*La actividad se tiene prevista ejecutar cuando se realice el desmonte del campamento, es decir cuando la obra física se encuentre al 100%*

Formato Asistencia Charla

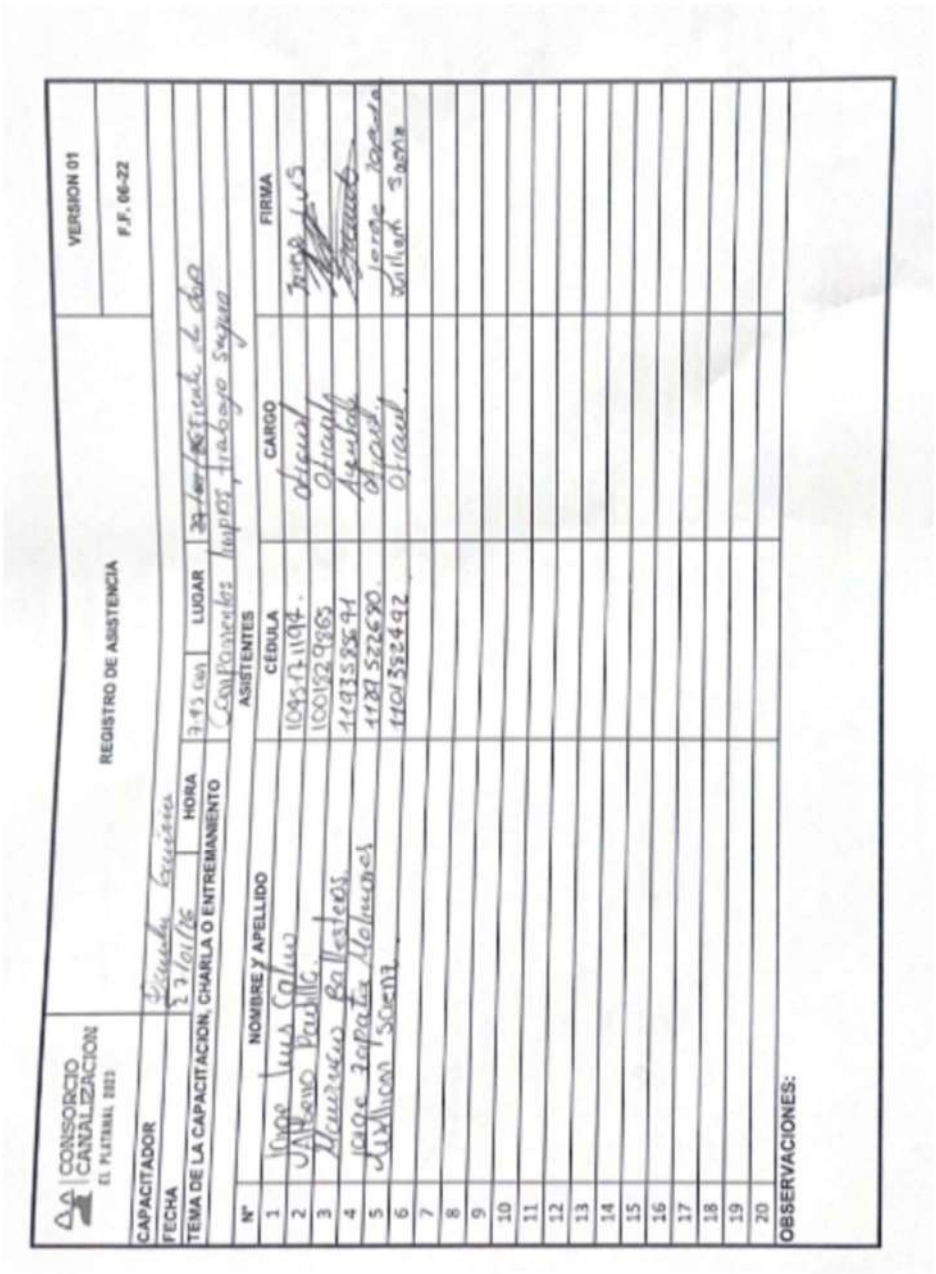

CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSION 01

F.F. 06-22

CAPACITADOR: Eduardo Cisneros

FECHA: 27/10/22 HORA: 3:45 pm LUGAR: Patio Oficina de dpto

TEMA DE LA CAPACITACION, CHARLA O ENTRENAMIENTO: Conservacion Riesgos, trabajo seguro

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Hugo Luis Calvo	1093721194	Oficial	
2	Jairo Pabilo	1005229865	Oficial	
3	Mauricio Bolaños	1193558491	Ayudo	
4	Jorge Zapata Melendez	1087522690	Oficial	
5	Julian Sierra	1004532492	Oficial	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

7. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RCD

Este programa se definió con la finalidad de realizar el manejo y la disposición adecuada del material resultante de las actividades de excavación.


Durante el periodo comprendido entre el 15 de enero al 14 de febrero de 2026, no se obtuvo material de excavación, sin embargo, el material de RCD resultado de actividades de limpieza y de excavación de meses anteriores, fue depositado en LADRILLERA BARRANQUILLA LTDA. Sitio aprobado por la autoridad competente, garantizando su adecuado manejo.



Los RCD no son un residuo cualquiera

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Meta:	Disponer el 100% del material extraído del arroyo el platanal
Indicador de calificación:	$\frac{Cantidad\ de\ volumen\ de\ material\ dispuesto\ en\ sitio\ autorizado}{Volumen\ de\ material\ total\ a\ disponer}\ x\ 100\%$ *(61.928 m³/ 62.942 m³) x 100% = 98.38%*
Meta:	Capacitar al 100% del personal en la disposición final de los RCD
Indicador de calificación:	$\frac{No\ de\ capacitaciones\ realizadas}{No\ de\ capacitaciones\ programadas}\ x\ 100\%$ *(1/1) x 100% = 100%*

Formato Asistencia Charla

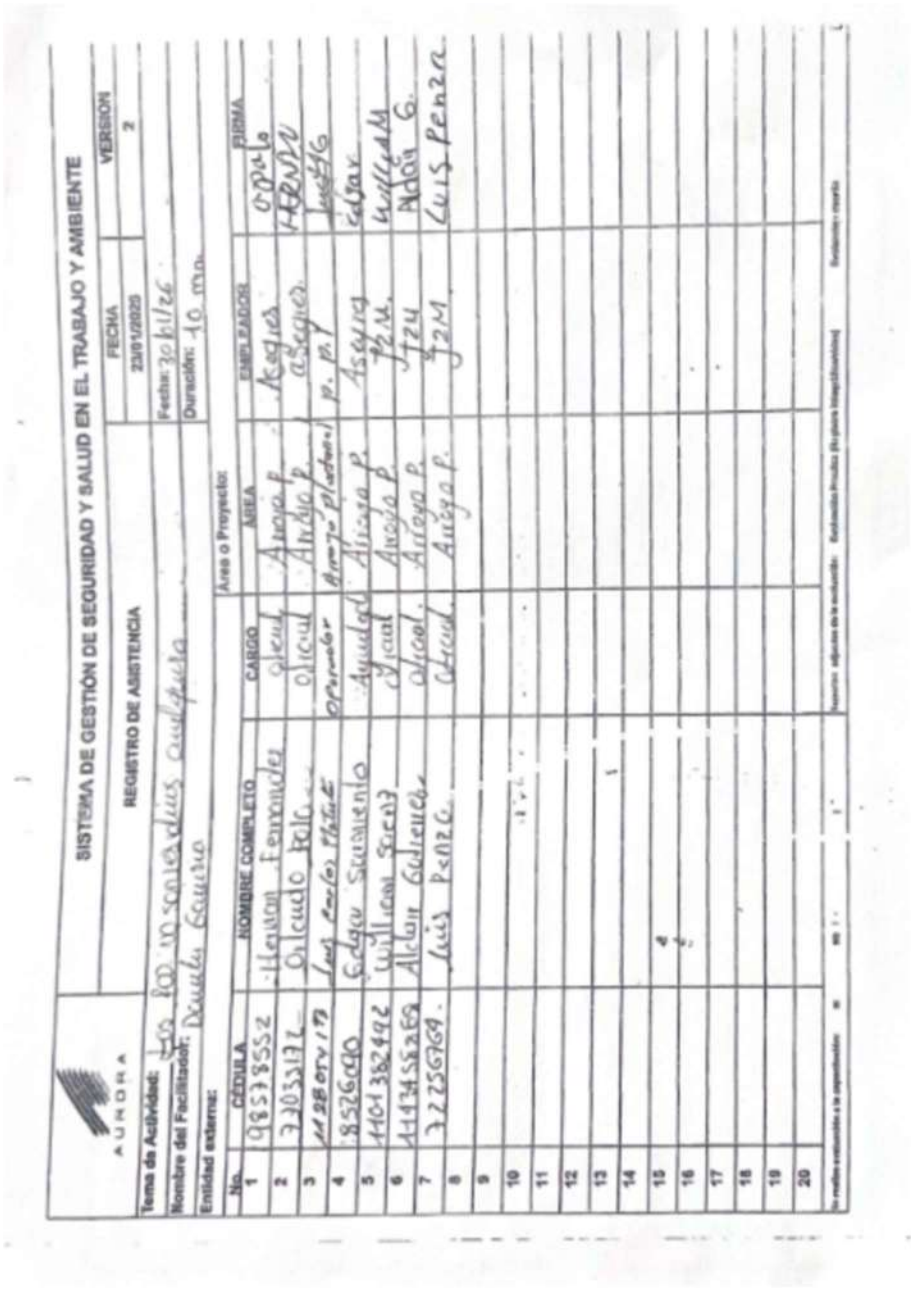

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

AURORA

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 23/01/2023

VERSION: 2

Tema de Actividad: Charla de inducción

Fecha: 30/01/26

Nombre del Facilitador: Daniela Gaviria

Duración: 10 min

Entidad externa:

Area o Proyecto:

No.	CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	AREA	EMPLEADOR	FIRMA
1	98538552	Heiver Fernandez	Oficial	Arenas P.	Aegies	
2	1103331137	Orlando Rolon	Oficial	Arenas P.	asegies	
3	1098617179	Luis Carlos Mateus	operador	Arenas Piedras	p. p.y	
4	85260980	Edgar Saavedra	Ayudante	Arenas P.	Asayra	
5	1101382492	William Sierra	Oficial	Arenas P.	Y.Z.M.	
6	1114358269	Alexis Gutierrez	Oficial	Arenas P.	Y.Z.M	
7	1122567969	Luis Perez	Oficial	Arenas P.	Y.Z.M	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Nombre completo y/o seguridad: [illegible] Nombre página de la evaluación: [illegible] Evaluación Prueba (Ruptura Integral/Interna): [illegible] Evaluación: [illegible]

8. PROGRAMA DE MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS Y/O LÍQUIDOS, CONVENCIONALES Y ESPECIALES

Para este programa se definió como objetivo principal minimizar cualquier impacto adverso sobre la salud de los trabajadores y el medio ambiente por el mal manejo y disposición final de los residuos generados durante el desarrollo del proyecto.

El manejo de los residuos sólidos comunes generados en el campamento de obra será realizado mediante la separación en la fuente y entrega a INTERASEO S.A.S E.S.P. empresa recolectora de aseo que opera en el municipio de Soledad, Atlántico.

En el campamento de alojamiento temporal y frente de obra, se dispuso un punto ecológico, el cual cuenta con caneca blanca, negra y verde, de acuerdo con el código de colores definidos en la Resolución N°2184 de 2019, para la disposición, separación y manejo de los residuos generados.


Para los residuos líquidos domiciliarios se cuenta con un baño fijo en el campamento temporal de obra y un baño portátil en el frente de obra, a los cuales se les realiza aseo 2 veces por semana.

El día 3 de febrero de 2026 se brindó charla al personal sobre residuos peligrosos: cuidado con lo que tocas

	
Punto ecológico oficina.	*Punto ecológico frente de obra*

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Meta:	Capacitar al 100% del equipo de trabajo de la obra en el manejo adecuado de los residuos sólidos y/o líquidos, convencionales y especiales
Indicador de calificación:	$\frac{No\ de\ capacitaciones\ realizadas}{No\ de\ capacitaciones\ programadas}\ x\ 100\%$ *(1/1) x 100% = 100%*
Meta:	Clasificar el 100% de los residuos sólidos desde la fuente
Indicador de calificación:	$\frac{No\ de\ residuos\ clasificados\ (bolsas)}{No\ total\ de\ residuos\ (bolsas)}\ x\ 100\%$ *(72/72) x 100% = 100%*
Meta:	Instalar 100% de los puntos ecológicos en obra
Indicador de calificación:	$\frac{No\ de\ puntos\ instalados}{No\ de\ puntos\ a\ instalar}\ x\ 100\%$ *(3/3) x 100% = 100%*

Formato Asistencia Charla

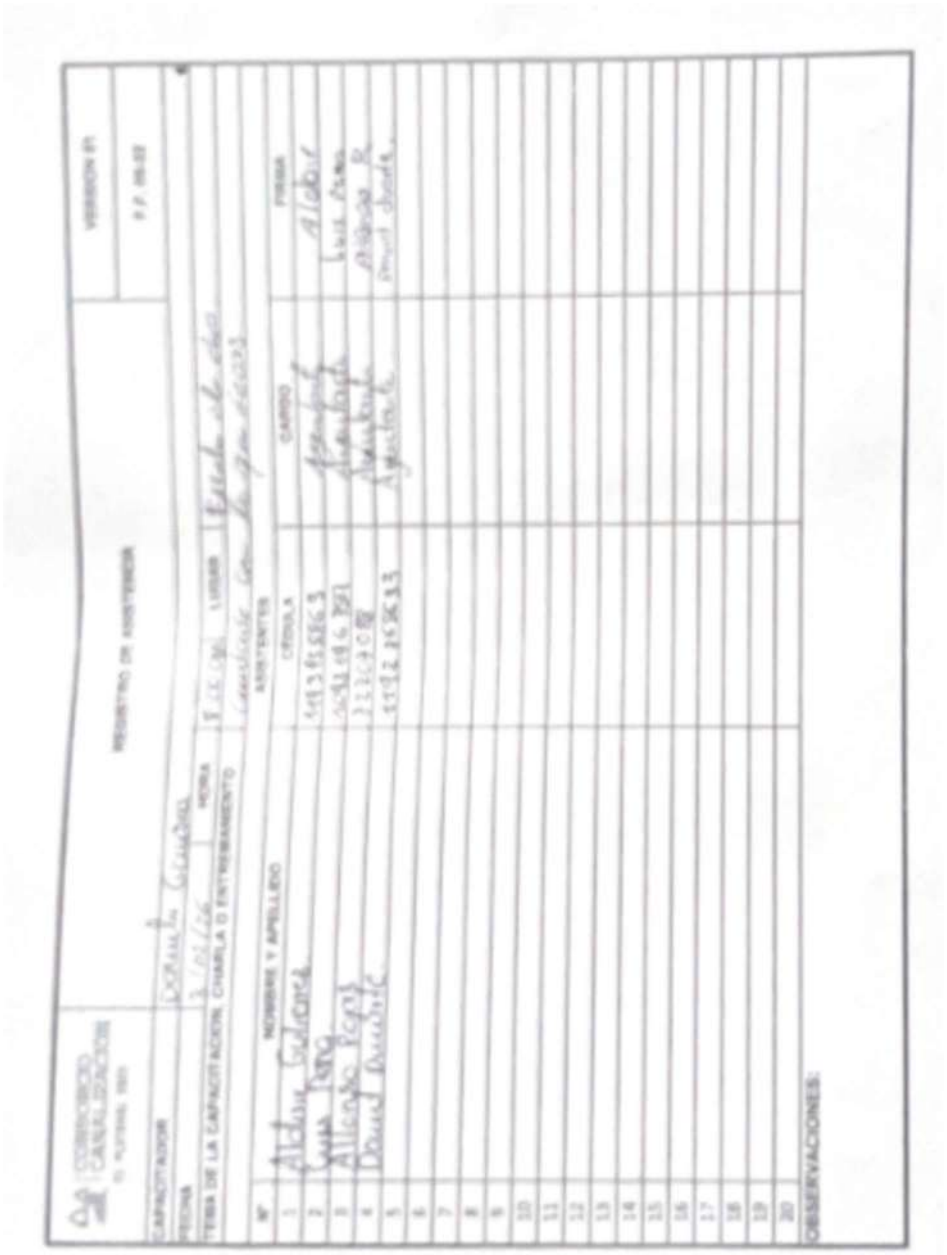

9. PROGRAMA DE MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Este programa se definió con el objetivo de prevenir los impactos que se puedan generar por el manejo de la maquinaria, equipos y vehículos.

Durante el periodo comprendido entre el 15 de enero al 14 de febrero de 2026, se realizaron inspecciones a la maquinaria y vehículos empleados en obra: botiquín de primeros auxilios, extintores, inspección detallada; además cada operador diariamente debe realizar una inspección a sus equipos con un formato llamado preoperacional, en el que se registra el estado de estos y poder programar los mantenimientos preventivos cada cierto tiempo.

En el informe de Seguridad y Salud en el trabajo se detallan el número y tipo de inspecciones realizadas durante el periodo reportado.




Cada máquina tiene su operador

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Meta:	Capacitar al 100% del personal sobre el manejo de las maquinarias, equipos y vehículos.
Indicador de calificación:	$\frac{\textit{No de capacitaciones realizadas}}{\textit{No de capacitaciones programadas}}\ x\ 100\%$ *(1/1) x 100% = 100%*
Meta:	Realizar el 100% de las inspecciones de control.

Indicador de calificación:	$\frac{\textit{No de inspecciones desarrolladas}}{\textit{No.Inspecciones Programadas}}\ x\ 100\%$ *(87/87) x 100% = 100%* *Se realizaron: Inspección de Botiquines, Inspección de Extintores, Inspección Detallada de la Maquinaria y Vehículos.*

Formato Asistencia Charla

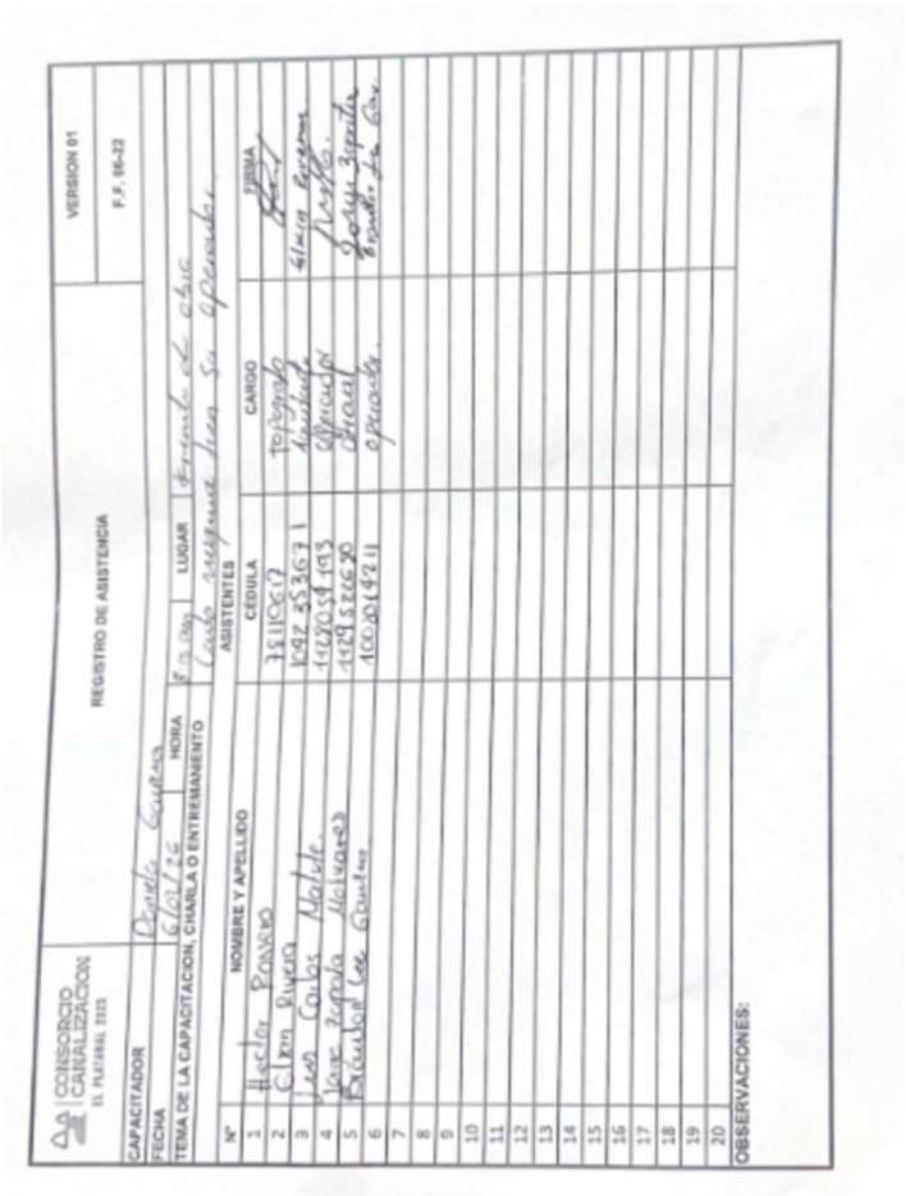

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSION 01

F.F. 06-22

CAPACITADOR: Danilo Cortes

FECHA: 6/12/22 HORA: 8 a.m. LUGAR: Frente de obra

TEMA DE LA CAPACITACION, CHARLA O ENTRENAMIENTO: Cuido adecuado de los elementos de

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Hector Pinzon	1118552612	Topografo	
2	Cleiver Rincon	1097853671	Ayudante	Cleiver Rincon
3	Jhon Carlos Valbuena	1192054193	Operador	Jhon Carlos Valbuena
4	Jaime Zapata Velasquez	1193526620	Oficial	Jaime Zapata
5	Reinaldo Cruz Gonzalez	1006014211	Operador	Reinaldo Cruz Gonzalez
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

10. PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y AISLAMIENTO DE OBRA

El objetivo principal de este programa consiste en evitar accidentes del personal de obra, habitantes del sector o vehículos que ingresan al frente de obra, por lo cual el Consorcio canalización el Platanal 2023 dispondrá de la señalización correspondiente en la obra, así como de la realización de capacitaciones (charlas) al personal operativo.


En el campamento principal y en toda área en la cual se desarrollan las actividades operativas del proyecto, se llevó a cabo la señalización con carteles informativos, preventivos, reglamentarios y de seguridad, además de capacitar al personal del uso correcto de esta señalización.

	
Señalización campamento	*Señalización campamento*

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Meta:	Capacitar al 100% de los trabajadores de la obra sobre el uso correcto de la señalización y aislamiento de obra.
Indicador de calificación:	$\frac{No.\ de\ capacitaciones\ realizadas}{No.\ de\ capacitaciones\ programadas}\ x\ 100\%$ *(1/1) x 100% = 100%*

Meta:	Instalar el 100% de las señalizaciones y cerramiento necesarias en el frente de obra
Indicador de calificación:	$\frac{No.\ de\ señales\ instaladas}{No.\ de\ señales\ a\ instalar}\ x\ 100\%$ *(16/16) x 100% =100%*

Formato Asistencia Charla

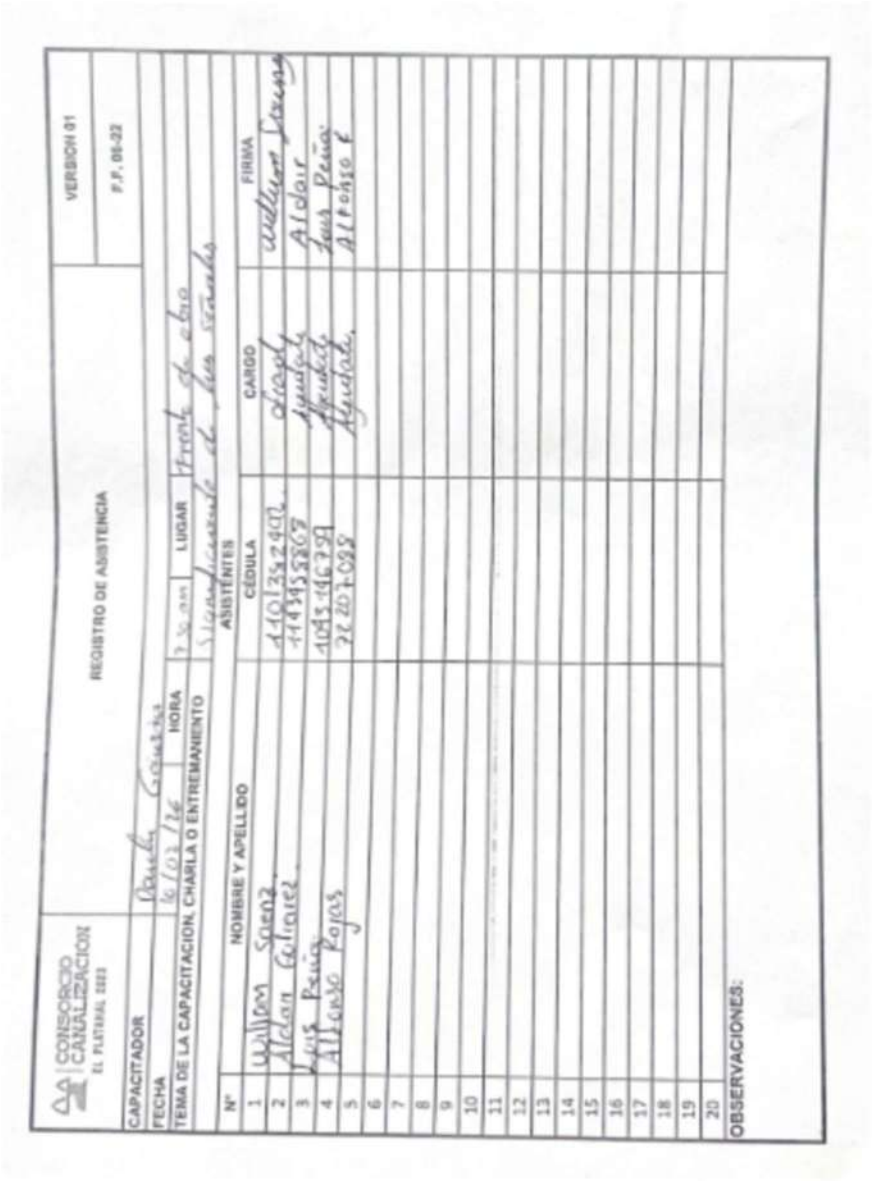

11. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDO, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTICAS QUÍMICAS

Este programa se formuló con la finalidad de diseñar medidas de manejo que controlen y prevengan los efectos que pudiera causar el mal manejo de los residuos líquidos domésticos e industriales sobre el medio ambiente en la zona del proyecto.

Los residuos líquidos generados en el periodo provienen únicamente por el uso de baños. Durante el periodo, se contó con un baño fijo del campamento de obra, el cual se encuentra conectado a la red de alcantarillado del municipio de Soledad y una cabina sanitaria portátil a la cual se le realiza limpieza dos veces por semana.

Durante el periodo no se presentó ningún tipo de fuga o derrames de agua, aceites o combustibles.




Limpieza de cabina sanitaria instalada en frente de obra.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Meta:	Instalar el 100% de los baños necesarios en el frente de obra
Indicador de calificación:	$\frac{No.\ de\ residuos\ liquidos\ entregados}{No.\ de\ residuos\ liquidos\ generados}\ x\ 100\%$ *(10/10) x 100% = 100%*

Meta:	Entregar al gestor autorizado el 100% de los RESPEL generados en obra
Indicador de calificación:	$\frac{No.\ RESPEL\ entregados}{No.\ RESPEL\ generados}\ x\ 100\%$ *(0/0) x 100% =0%*
Nota aclaratoria	*A la fecha no se ha generado residuos RESPEL*
Meta:	Capacitar al 100% del personal sobre el manejo adecuado de RESPEL en obra
Indicador de calificación:	$\frac{No.\ de\ capacitaciones\ realizadas}{No.\ de\ capacitaciones\ programadas}\ x\ 100\%$ *(1/1) x 100% = 100%*

Formato Asistencia Charla

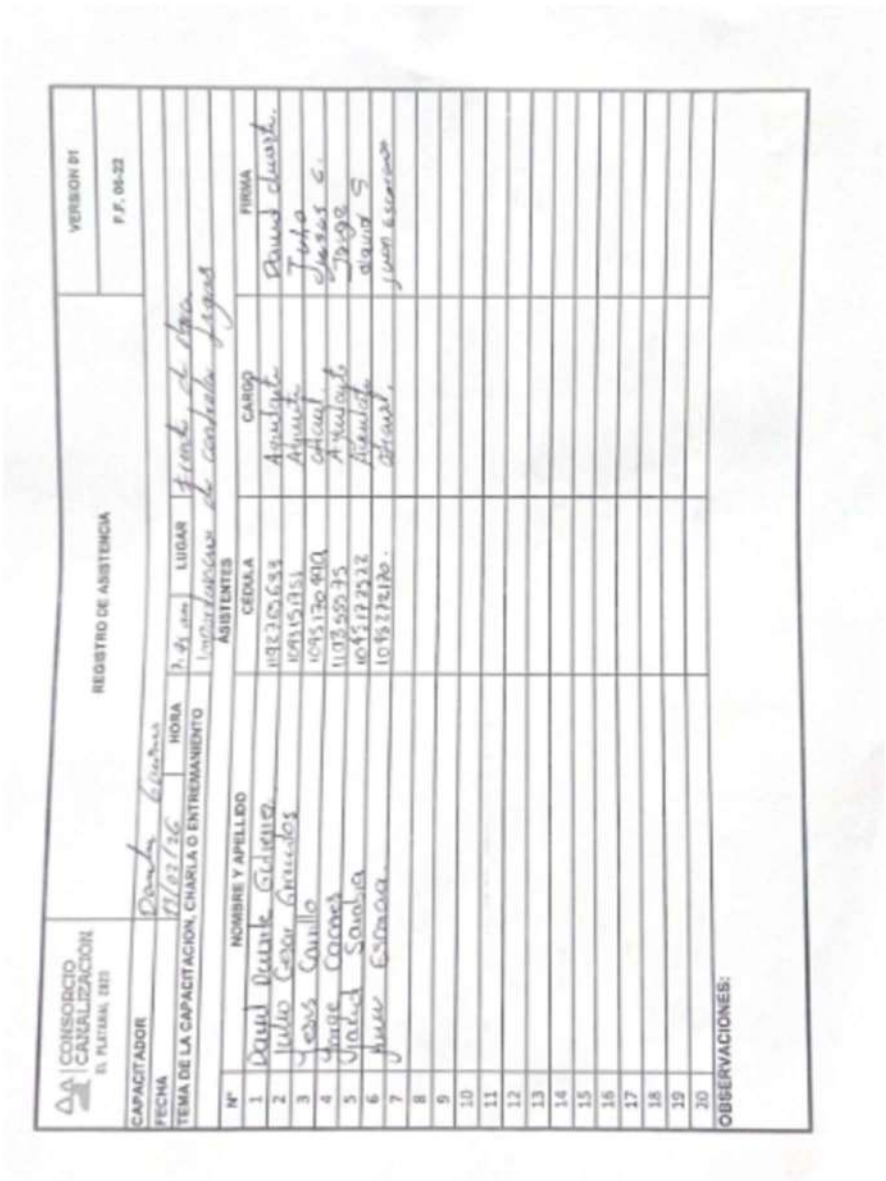

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSION 01

F.F. 06-22

CAPACITADOR: Paola Cardona

FECHA: 11/07/22 HORA: 7:45 am LUGAR: Frente al Pozo

TEMA DE LA CAPACITACION, CHARLA O ENTRENAMIENTO: Importancia de contar con seguro

ASISTENTES

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Daniel Duarte Gelviz	1102805653	Ayudante	Daniel Duarte.
2	Julio Cesar Gonzalez	1065925351	Ayudante	Julio
3	Jesus Carrillo	1095130490	Oficial	Jesus C.
4	Jorge Caceres	1103592375	Ayudante	Jorge
5	Yoleth Sanchez	1065122522	Ayudante	Yoleth Sanchez
6	Jhon Estevez	1065122120	Ayudante	Jhon Estevez
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

MEDIO SOCIOECONÓMICO

12. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

Este programa se formuló con la finalidad de capacitar y sensibilizar al personal de obra en temáticas relacionadas con el medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, en las cuales se resalten la importancia de la preservación del medio ambiente, la flora, la fauna y los ecosistemas sensibles, así como las medidas y directrices que deben tomarse para salvaguardad la seguridad y salud del trabajador.

Listado de charlas del 15 enero al 14 de febrero de 2026.

Fecha	Actividad	Responsable
16/01/2026	Misión, visión importancia de la seguridad y salud	Yulieth Ortega
19/01/2026	Importancia del uso de los EPP	Yulieth Ortega
21/01/2026	Manejo de basuras	Yulieth Ortega
23/01/2026	Riesgo biológico	Yulieth Ortega
26/01/2026	Diferencia entre accidente e incidente	Yulieth Ortega
28/01/2026	condiciones inseguras	Yulieth Ortega
30/01/2026	Enfermedad laboral	Yulieth Ortega
2/02/2026	Riesgo psicosocial	Yulieth Ortega
4/02/2026	Riesgo ergonómico	Yulieth Ortega
6/02/2026	Riesgo físico	Yulieth Ortega
9/02/2026	Riesgo mecánico	Yulieth Ortega
11/02/2026	Primeros auxilios	Yulieth Ortega
13/02/2026	Alcohol y drogas	Yulieth Ortega

Fecha	Actividad	Responsable
16/01/2026	Diferencia entre ecosistemas normales y ecosistemas sensibles	Daniela Gaviria
20/01/2026	Uso de residuos vegetales como cobertura	Daniela Gaviria
23/01/2026	Reconocer la fauna que habita la zona	Daniela Gaviria
27/01/2026	Campamentos limpios, trabajo seguro	Daniela Gaviria
30/01/2026	Los RCD no son un residuo cualquiera	Daniela Gaviria
3/02/2026	Residuos peligrosos: cuidado con lo que tocas	Daniela Gaviria
6/02/2026	Cada máquina tiene su operador	Daniela Gaviria
10/02/2026	Significado de las señales (preventivas, restrictivas, informativas)	Daniela Gaviria

13/02/2026	Importancia de controlar fugas y goteos en equipos y recipientes	Daniela Gaviria

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Meta:	Capacitar al 100% del personal de obra sobre temas ambientales, seguridad y salud en el trabajo y sobre el comportamiento con las comunidades
Indicador de calificación:	$\frac{No.\ de\ capacitaciones\ realizadas}{No.\ de\ capacitaciones\ programadas}\ x\ 100\%$ *(20/20) x 100% = 100%*
Meta:	Sensibilizar al 100% del personal en obra sobre los impactos asociados al proyecto.
Indicador de calificación:	$\frac{No.\ de\ personas\ sensibilizadas}{No.de\ personas\ a\ sensibilizar}\ x\ 100\%$ *(36/36) x 100% = 100%*

13. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD

Mediante la implementación de este programa se busca mantener informada y resolver dudas e inquietudes, peticiones, quejas y reclamos presentadas por comunidad y personal interesado.

El día 2 de febrero de 2024 se llevó a cabo la socialización del proyecto con la comunidad del barrio terranova 2, ésta se realizó en las instalaciones de Villas del Carmen 1, ubicado el Municipio de Soledad, Atlántico. Durante esta jornada se informó a la comunidad el alcance del proyecto, duración, presupuesto y beneficios que tendrá para el sector; así mismo se atendieron las dudas e inquietudes formuladas por los asistentes a la reunión.

Durante el periodo, se recibió un (1) PQRS por parte de la comunidad. La información detalla del presente programa se encuentra en el seguimiento social.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Meta:	Implementar un sistema que permita atender y dar respuesta a las inquietudes, dudas y quejas de manera oportuna al 100% de las situaciones que se genere con las comunidades del área de influencia del proyecto.
Indicador de calificación:	$\frac{No.\ de\ solicitudes\ atendidas}{No.\ de\ solicitudes\ recibidas}\ x\ 100\%$ *(1/1) x 100% = 100%*
Meta:	Informar al 100% de la comunidad y actores involucrados en el proyecto
Indicador de calificación:	$\frac{No.de\ reuniones\ realizadas}{No.de\ reuniones\ programadas}\ x\ 100\%$ *(0/0) x 100% = 100%*

14. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL

Se implementa este programa con el objetivo de contratar personal de mano de obra no calificada de las zonas cercanas al proyecto

Durante el periodo del 15 enero al 14 de febrero de 2026, el consorcio canalización el platanal 2023, se emplearon personas del área de influencia directa del proyecto como mano de obra no calificada.

La información detalla del presente programa se encuentra en el seguimiento social.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Meta:	Vincular al 100% del personal no calificado que requiera la obra
Indicador de calificación:	$\frac{No.\ de\ personas\ contratadas\ de\ la\ zona}{No.\ de\ personas\ requeridas\ de\ la\ zona}\ x\ 100\%$ *(5/5) x 100% = 100%*

15. PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

Este programa se formuló con la finalidad de realizar levantamiento de actas de vecindad a los predios que se encuentren más próximos al área a intervenir.

Al periodo del 15 enero al 14 de febrero de 2026, ya se encuentran realizadas el 100% de las actas de vecindad de los predios cercanos al proyecto, próximamente se dará inicio al cierre de éstas.

En el informe social se encuentran las actas de vecindad elaboradas para cada uno de los predios.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Meta:	Dejar registro 100% de los predios (viviendas, construcciones, servicios públicos) que se encuentren cerca del área del proyecto.
Indicador de calificación:	$\frac{No.De\ actas\ de\ vecindad\ ejecutadas}{No.de\ actas\ de\ vecindad\ programadas}\ x\ 100\%$ *(563/563) x 100% = 100%*
Meta:	Dejar registro 100% de los predios (viviendas, construcciones, servicios públicos) que se encuentren cerca del área del proyecto.
Indicador de calificación:	$\frac{No.De\ actas\ de\ vecindad\ de\ cierre\ ejecutadas}{No.de\ actas\ de\ vecindad\ de\ cierre\ programadas}\ x\ 100\%$ *(0/0) x 100% = 0%*

ANEXO 8: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE LA OBRA

CONTROL DE EQUIPOS DEL CONTRATISTA

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 ENERO 2026 Y EL 14 DE FEBRERO DE 2026 — **FECHA INICIO** 14 de septiembre de 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023 — **CONTRATO No.** 0251 DE 2023

INTERVENTOR: REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS — **CONTRATO No.** 0289 DE 2023

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
ESTACIÓN TOPOGRAFICA		X		X		LOCALIZACIÓN, NIVELACION, REPLANTEO, TOMA DE CARTERAS TOPOGRAFICAS	
RETROEXCAVADORA KOMATSU		X		X		RELLENOS, TRASIEGOS, LIMPIEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL	
RETROEXCAVADORA DOUSAND 1 (340)		X		X		RELLENOS, TRASIEGOS, LIMPIEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL	
RETROEXCAVADORA SANY SY75C		X		X		RELLENOS, TRASIEGOS, LIMPIEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL	
RETROEXCAVADORA HYUNDAI MC7003		X		X		RELLENOS, TRASIEGOS, LIMPIEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL	
BOBCAT		X		X		TRANSPORTE MATERIALES, TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION, RECEBO Y PIEDRA CICLOPEA, REPALEO INTERNO	
BOBCAT 2		X		X		TRANSPORTE MATERIALES, TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION, RECEBO Y PIEDRA CICLOPEA, REPALEO INTERNO	
BOBCAT 3		X		X		TRANSPORTE MATERIALES, TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION, RECEBO Y PIEDRA CICLOPEA, REPALEO INTERNO	
VIBROCOMPACTADOR MICKEY		X		X		COMPACTACIÓN DE RELLENOS	
VIBROCOMPACTADOR RANA		X		X		COMPACTACIÓN DE RELLENOS	
VOLQUETA 20UND		X		X		SUMINISTRO MATERIALES Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION, REPALEO	
3 MOTOBOMBAS		X	X			MANEJO DE AGUAS	
3 HIDROLAVADORAS		X	X			MANEJO DE AGUAS	

ING. JORGE FONTALVO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".
NUMERO DE CONTRATO:	0251 DE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023
INTERVENTOR:	REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS
NUMERO DE CONTRATO:	0289 DE 2023
SUPERVISOR:	WLADIMIR OROZCO
MUNICIPIO:	SOLEDAD - ATLANTICO

No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE		OBSERVACIONES
1	jueves, 15 de enero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
2	viernes, 16 de enero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
3	sábado, 17 de enero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
4	domingo, 18 de enero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
5	lunes, 19 de enero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
6	martes, 20 de enero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
7	miércoles, 21 de enero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
8	jueves, 22 de enero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
9	viernes, 23 de enero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
10	sábado, 24 de enero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
11	domingo, 25 de enero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
12	lunes, 26 de enero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
13	martes, 27 de enero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
14	miércoles, 28 de enero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
15	jueves, 29 de enero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
16	viernes, 30 de enero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
17	sábado, 31 de enero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
18	domingo, 1 de febrero de 2026	0	8			Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales. Se presetan lluvias durante todo el dia.
19	lunes, 2 de febrero de 2026	3	5			Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales. Se presetan lluvias durante todo el dia.
20	martes, 3 de febrero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
21	miércoles, 4 de febrero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
22	jueves, 5 de febrero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
23	viernes, 6 de febrero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
24	sábado, 7 de febrero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
25	domingo, 8 de febrero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
26	lunes, 9 de febrero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
27	martes, 10 de febrero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
28	miércoles, 11 de febrero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
29	jueves, 12 de febrero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
30	viernes, 13 de febrero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.
31	sábado, 14 de febrero de 2026	8				Se evidencia presencia de aguas servidas dentro del arroyo, producto de vertimientos ilegales.

SOL	227
LLUVIA	13



Firma: _____

Nombre: Jorge Fontalvo

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
NÚMERO DE CONTRATO:	0251 DE 2023 **PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/01/2026 y el 14/02/2026**
CONTRATISTA:	CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023
INTERVENTOR:	REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa		X	
- Buen estado		X	
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente		X	
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	X		
- Diurna	X		Se mantiene duplicada la vigilancia, por el efecto de la inseguridad de los sectores en que se está ejecutando las obras.
- Nocturna	X		Se mantiene duplicada la vigilancia, por el efecto de la inseguridad de los sectores en que se está ejecutando las obras.
EMERGENCIAS			
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		

Firma:

Nombre: ING. JORGE FONTALVO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTROL DIARIO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ENERO 2026 A 14 FEBRERO DE 2026 — PLAZO: 36 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023 — CONTRATO No. 0251 DE 2023

INTERVENTOR: REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS — CONTRATO No. 0289 DE 2023

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	ENERO 2026																	FEBRERO 2026													OBSERVACIONES
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	
CARGO																																
DIRECTOR DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
RESIDENTE DE OBRA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
EXPERTO ASESOR EN AREA HIDRAULICA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
EXPERTO ASESOR EN AREA GEOTECNICA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
EXPERTO ASESOR EN AREA DE ESTRUCTURAS	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
PROFESIONAL DE CALIDAD	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
PROFESIONAL PGIO	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
INSPECTOR	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
ALMACENISTA	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
AUX ALMACEN	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
AYUDANTES	19	19	19		19	19	19	19	19	19		19	19	19	19	19	19		19	19	19	19	19	19		19	19	19	19	19	19	
VIGILANTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
PERSONAL CONTRATISTA	**32**	**32**	**32**	**2**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**2**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**2**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**2**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**TOTAL PERIODO**

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

ING- JORGE FONTALVO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ANEXO 9: PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800245854	7	REINGENIERIA DE PROYECTOS LIMITADA REINPRO LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BQ	CL 87 42 A 236 AP 2 A	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3789582	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	9499161081	9499161081	E	2026/02/12	2026/02/20	BANCO DE BOGOTA		$5,662,160

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BQ (6 Afiliados)																								**$20,463,500**	**$3,274,300**			**$20,463,500**	**$818,700**			**$20,463,500**	**$818,700**			**$20,463,500**		**$750,500**		$0	$0		**$5,662,160**
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)																								**$10,463,500**	**$1,674,300**			**$10,463,500**	**$418,700**			**$10,463,500**	**$418,700**			**$10,463,500**		**$54,400**		$0	$0		**$2,565,960**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)																								**$10,463,500**	**$1,674,300**			**$10,463,500**	**$418,700**			**$10,463,500**	**$418,700**			**$10,463,500**		**$54,300**		$0	$0		**$2,565,960**
1	CC	5135331	CANOVA JAIRO																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,260
2	CC	1098724885	SEVILLA MIGUEL																			230301	30	$2,240,000	$358,400	EPS010	30	$2,240,000	$89,600	CCF07	30	$2,240,000	$89,600	14-25	30	$2,240,000	0.522%	$11,700	30	$0	$0	Si	$549,300
3	CC	1016015594	POLO JESUS																			230901	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF07	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
4	CC	1042442380	PACHECO LILIANA													X						25-14	1	$93,330	$15,000	ESSC07	1	$93,330	$3,800	CCF07	1	$93,330	$3,800	14-25	1	$93,330	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,600
5	CC	1042442380	PACHECO LILIANA									X										25-14	29	$2,706,670	$433,100	ESSC07	29	$2,706,670	$108,300	CCF07	29	$2,706,670	$108,300	14-25	29	$2,706,670	0.522%	$14,200	29	$0	$0	Si	$663,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																								**$6,000,000**	**$960,000**			**$6,000,000**	**$240,000**			**$6,000,000**	**$240,000**			**$6,000,000**		**$417,700**		$0	$0		**$1,857,700**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																								**$6,000,000**	**$960,000**			**$6,000,000**	**$240,000**			**$6,000,000**	**$240,000**			**$6,000,000**		**$417,700**		$0	$0		**$1,857,700**
6	CC	72161532	QUINTERO ISMAEL																			230901	30	$6,000,000	$960,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF07	30	$6,000,000	$240,000	14-25	30	$6,000,000	6.960%	$417,700	30	$0	$0	Si	$1,857,700
Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)																								**$4,000,000**	**$640,000**			**$4,000,000**	**$160,000**			**$4,000,000**	**$160,000**			**$4,000,000**		**$278,500**		$0	$0		**$1,238,500**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																								**$4,000,000**	**$640,000**			**$4,000,000**	**$160,000**			**$4,000,000**	**$160,000**			**$4,000,000**		**$278,500**		$0	$0		**$1,238,500**
7	CC	85372016	FONTALVO JORGE																			230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF07	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	6.960%	$278,500	30	$0	$0	Si	$1,238,500
Total			**Afiliados(6)**																					$20,463,500	$3,274,300			$20,463,500	$818,700			$20,463,500	$818,700			$20,463,500		$750,500		$0	$0		$5,662,160

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$3,274,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$675,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$998,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1.600.000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$750,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	6	$750,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$818,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	6	$818,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$818,700
SANITAS	EPS005	806,008,394	7	1	$546,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	901,037,916	2	4	$160,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$112,100
TOTAL				**6**	**$5,662,200**

ANEXO 10: SEGUIMIENTO DE CALIDAD

REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 800.245854-7	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD			CODIGO:	FR-PRO-003
				FECHA:	
				VERSION:	2


LOCALIZACION	ELEMENTO	ABSCISA	TIPO Y METODO	FECHA DEL ENSAYO	RESULTADO OBTENIDO % ALCANZADO	OBSERVACIONES
tramo principal	Relleno Estructural	K1+010.	Densidad cono de arena	15/01/2026	96,3.	
tramo principal	Relleno Estructural	K1+010.	Densidad cono de arena.	15/01/2026	95,4	
aFluente1	Loia Superior tapa	K0+050	Resistencia a la Compresión	16/01/2026.	112,9.	28 (Días).
afluente1	Loia Superior tapa.	K0+097	Resistencia a la Compresión	22/01/2026.	92,7	14 (Días).
tramo principal	Relleno Estructural	K1+064	Densidad cono de arena	22/01/2026	94,7	
tramo principal	Relleno Estructural	K1+064	Densidad cono de arena.	22/01/2026.	96,3.	
tramo principal	Relleno Estructural	K1+140	Densidad cono de arena.	31/01/2026.	96,8	
tramo principal	Relleno Estructural	K1+140	Densidad cono de arena.	31/01/2026.	95,7.	
tramo principal.	Puente Peatonal	K0+642	Resistencia a la Compresión	04/02/2026.	81,3.	7 (Días).

Powered by CamScanner


ANEXO 11: PLANOS Y CARTERAS TOPOGRAFICAS

REVISION RELLENO RECEBO


1+ 032




1+ 068




1+ 104




1+ 140




1+ 038



1+ 074



1+ 110



TERRENO NATURAL


ÁREA DE EXCAVACIÓN

ÁREA PIEDRA CICLOPEA


AREA DE CONCRETO

ÁREA RELLENO RECEBO


1+ 008




1+ 044




1+ 080




1+ 116




1+ 014




1+ 050




1+ 086




1+ 122




1+ 020




1+ 056




1+ 092




1+ 128




1+ 026




1+ 062



1+ 098



1+ 134



Reingeniería de Proyectos S.A.S - REINPRO SAS
NIT.800245854-7

INTERVENTORÍA

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACION PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

CONTRATISTA:

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023
NIT.9017 | 5000-6

CONTIENE:

AVANCE DE OBRA - REVISIÓN DE INTERVENTORIA

notas:

LEVANTÓ:

EQUIPO CONSULTOR

Reingeniería de Proyectos S.A.S - REINPRO SAS

INTERVENTORÍA

REALIZÓ:

EQUIPO CONSULTOR

Reingeniería de Proyectos S.A.S - REINPRO SAS

INTERVENTORÍA

ESCALA:	FECHA:
1:200	2026
PLANCHA No.:	DE:
01	01

ESPECIALIDAD:

RELLENORECEBO

CONSECUTIVO:


1/1

ARCHIVO:


REVISIÓN DE AVANCE - INFORME 29

REVISION CONCRETOS LOSA SUPERIOR AFLUENTE 1


0+ 072




0+ 042




0+ 078




0+ 048




0+ 084




0+ 054




0+ 090




0+ 060



0+ 096



0+ 066



TERRENO NATURAL

ÁREA DE EXCAVACIÓN

ÁREA PIEDRA CICLOPEA

AREA DE CONCRETO

ÁREA RELLENO RECEBO

Reingeniería de Proyectos S.A.S - REINPRO SAS
NIT.800245854-7

INTERVENTORÍA

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

CONTRATISTA:

CONSORCIO CANALIZACIÓN EL PLATANAL 2023
NIT.901715000-8

CONTIENE:

AVANCE DE OBRA - REVISIÓN DE INTERVENTORIA

notas:

LEVANTÓ:

EQUIPO CONSULTOR

Reingeniería de Proyectos S.A.S - REINPRO SAS

INTERVENTORÍA

REALIZÓ:

EQUIPO CONSULTOR

Reingeniería de Proyectos S.A.S - REINPRO SAS

INTERVENTORÍA

ESCALA:	FECHA:
1:200	2026
PLANCHA No.:	DE:
01	01

ESPECIALIDAD:

CONCRETOS

CONSECUTIVO:

1/1

ARCHIVO:

REVISIÓN DE AVANCE - INFORME 29
