INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA
DICIEMBRE DE 2025

ARMADA NACIONAL



BARRIO BOCAGRANDE-TIERRA BOMBA Y MANZANILLO
INFORME FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 0077-ARC-CBNL01-2025

INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES,
LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025

ARMADA NACIONAL	**INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES,** **LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025** **LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA DE CONFORMIDAD CON LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO "A DEL CONTRATO. CONTRATO No. 0067-ARC-CBNL06-2025**	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS.**
CARTAGENA	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 0077-ARC-CBNL01-2025**	**INFORME FINAL** **LOTE 1**

INFORME MENSUAL

INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES,
LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025

INTERVENTOR: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
DICIEMBRE DE 2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN. 5

1. OBJETIVO 7

1.1 OBJETIVO GENERAL 7

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 7

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO. 8

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 10

3.1. LOTE 1 10

4. INFORMACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA. 20

4.1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 20

4.2. ESTADO FINANCIERO 22

5. ASPESTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO INTERVENTORÍA 23

5.1. PERSONAL INTERVENTORÍA 23

5.2. LAS FUNCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 23

6. CONTRATO DE OBRA NO. 0076 LOTE 1 24

7. ASPESTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 28

7.1. PERSONAL DE OBRA. 28

8. ESTADO FINANCIERO CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 28

8.1. CANTIDADES EJECUTADAS CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 28

9. INFORME SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 32

10. ASPECTOS TÉCNICOS. CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 33

10.1. MATERIALES DE OBRA. 33

10.2. CONTROL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 33

10.3. ESTADO DE LA OBRA 33

10.4. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN 34

11. OBSERVACIONES, INQUIETUDES Y DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 34

12. REGISTRO FOTOGRAFICO FRENTES EN EJECUCION CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 36

13. INFORMES SEMANALES CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 49

14. BITACORA DE OBRA INFORME DIARIO CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 49

15. CORRESPONDENCIA CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 49

15.1. CORREOS ENVIADOS 49

15.2. CORREOS RECIBIDOS 52

15.3. OFICIOS DIRIGIDOS A SUPERVISIÓN 54

15.4. OFICIOS DIRIGIDOS AL CONTRATISTA 54

16. CONCLUSIONES CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 55

NUM	ANEXOS	PAG
1	POLIZAS INTERVENTORIA	56
2	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA	62
3	POLIZAS CONTRATISTA	69
4	INFORME SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	79
5	PROGRAMACION	137
6	INFORMES SEMANALES	139
7	BITACORA	175
8	CORRESOS ENVIADOS	185
9	CORREOS RECIBIDOS	222

INTRODUCCIÓN.

En desarrollo de su función Constitucional la Armada Nacional tiene como misión "Desarrollar operaciones navales con el propósito de contribuir a la defensa de la soberanía la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional, así como a la protección y desarrollo de los intereses nacionales.". En concordancia con lo anterior, el Departamento de Alojamientos Militares de la Base Naval No.1 ARC "BOLÍVAR" tiene como misión Institucional "brindar apoyo logístico a las unidades y componentes que conforman la Fuerza Naval del Caribe, con el propósito de contribuir a la defensa y seguridad en los espacios marítimo, fluvial y terrestre, coadyuvando en las operaciones ofensivas a lograr la destrucción de la capacidad de acción armada y de las fuentes de financiamiento de los grupos narcoterroristas".

En desarrollo de la función citada con antelación, uno de los objetivos fundamentales, se relaciona con el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones físicas y bienes inmuebles de las diferentes unidades que la componen, con el fin de garantizar que las mismas cumplan con los estándares óptimos para que el personal que trabaja en ellos puedan desarrollar sus actividades laborales y dar cumplimiento a la misión institucional sin ningún tiempo de contratiempo, teniendo en cuenta la importancia de las actividades que se realizan a bordo de las instalaciones que integran la Fuerza Naval del Caribe.

Así mismo, la conservación de la integralidad y los bienes en las condiciones de habitabilidad de las instalaciones que utilizan los tripulantes de cada una de las unidades que integran los complejos militares, ya que dichas instalaciones impactan positivamente en el bienestar del personal quienes velan por el cumplimiento de fines del Estado y el cumplimiento de los deberes establecidos en la Constitución Política.

Para lograr la finalidad citada, el Departamento de Alojamientos Militares con apoyo de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura fueron los encargados de verificar el mantenimiento físico de las viviendas e instalaciones de las dependencias y componentes de la guarnición de Cartagena que presentan actualmente diferentes novedades a nivel de su infraestructura física, debido a la vetustez de sus instalaciones y el impacto que produce el ambiente de la costa Caribe.

Las actividades de mantenimiento son requeridas para las instalaciones de la Fuerza Naval del Caribe, Flotilla de Superficie del Caribe, Flotilla de Submarinos del Caribe, Batallón de I.M. No.12, Escuela de Submarinos del Caribe, Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota, Escuela Internacional de Guardacostas, Centro de Desarrollo Naval, Departamento de Administración BNL01, Departamento de Servicios Generales BNL01,

Departamento de Alojamientos Militares BNL01, Estación Naval de Tierra Bomba, Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNl01, Oficina de Planeación BNL01 y Escuela de Superficie del Caribe, los cuales son requeridas para garantizar la conservación y prolongación en el tiempo de la vida útil de cada uno de los inmuebles operativos y administrativos, disponer de mayor cantidad de unidades u oficinas, y demás instalaciones habitables para atender la necesidad actual. Razón por la cual se hace necesario recuperar el estado básico de los inmuebles consistente en la intervención de: estructuras, techos, pisos, mampostería, cielo raso, cerramientos, sistemas eléctricos, sistema de plomería, de gas e hidráulico de agua potable y sanitaria, requiriéndose el cambio total de las tuberías de cada uno de los sistemas, entre otras actividades.

De igual forma, se requiere contratar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones de la Base Naval ARC "Bolívar", los componentes de la Fuerza Naval del Caribe y Alojamientos Militares, para evitar incurrir en futuros daños estructurales que pongan en riesgo las instalaciones, por consiguiente, la integridad de quienes habitan o hacen uso de ellas; así mismo se espera prevenir sobrecostos en reparaciones, producidas por el excesivo deterioro que conlleva un mantenimiento no previsto.

Para el caso de los alojamientos militares presentan una serie de deterioros en muros, pisos, tejas, instalaciones eléctricas; así mismo, se evidencian humedades, fisuras en muros, vigas estructurales, entre otros, cuya causa es relacionada al tiempo y el uso que lleva a través del mismo. De igual forma, se incluyen otros factores que inciden con el deterioro de las estructuras como lo es el clima (humedad, temperatura, lluvias, etc..), los agentes patógenos como el comején, que reducen la vida útil de los soportes de las cubiertas en madera, y por lo cual la madera en su adquisición e instalación debe ser tratada con los productos acordes para prolongar la durabilidad de este material. Motivos por los cuales, se hace necesario realizar un mantenimiento que permita conservar las mismas en buen estado, sea estructural, de funcionamiento y presentación.

Por lo anterior, y conforme a la planeación de ejecución de obras de mantenimiento a las Unidades militares de la Armada Nacional, para el 2025 se destinaron partidas presupuestales con el fin de recuperar la funcionalidad y mejorar la imagen institucional de las edificaciones de viviendas militares.

1. OBJETIVO

1.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar la INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Garantizar que los compromisos adquiridos entre el contratista de obra y la entidad contratante, la ARMADA NACIONAL, se cumplan a cabalidad dentro de los términos de tiempo establecidos.

Velar por la seguridad en la ejecución de las obras, es decir, cuidar por la integridad física de trabajadores, beneficiarios y funcionarios de las instalaciones.

Revisar el autocontrol y demás responsabilidades del constructor.

Registrar el avance que tiene el proyecto desde el inicio de las labores de obra e Interventoría para ejercer el control y seguimiento de la misma.

Indicar las condiciones del contrato de obra civil y su aplicación.

Presentar y analizar la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de las actividades del contrato.

Mantener informada a la armada de la ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance y conforme a los términos de referencia y al Contrato de Obra Civil.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO.

ARMADA NACIONAL

la Armada Nacional en Cartagena se inicia en 1810 con la Comandancia General de Marina de la Provincia de Cartagena, creada durante la independencia para organizar una fuerza naval propia. Cartagena fue un centro fundamental para la Armada, con la creación del primer astillero naval en 1949, la consolidación de la Base Naval ARC Bolívar, y la formación de sus miembros en las escuelas allí establecidas, como la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla

Orígenes en la Independencia (1810)

El 12 de septiembre de 1810, la Junta Suprema Gubernativa de Cartagena, bajo la dirección de José María García de Toledo, creó la Comandancia General de Marina de la Provincia de Cartagena, aboliendo el apostadero español. Esta institución fue la base de la actual Armada Nacional de Colombia y asumió el control del comercio marítimo y fluvial.


Desarrollo y Fortalecimiento en Cartagena

Escuelas Navales:
Se crearon varias escuelas navales en Cartagena, incluyendo una en 1811, aunque desapareció con la reconquista española.
Restablecimiento de la Armada:
Después del conflicto con Perú (1932-1933), la Armada Nacional se reestableció, lo que llevó a la fundación de la Escuela Naval de Cadetes en Cartagena en 1935.
Creación del Astillero:
En 1949, la Armada inició la construcción de su primer astillero naval en Cartagena, construyendo 25 buques fluviales.
Base Naval ARC Bolívar:
La base naval se creó formalmente el 21 de septiembre de 1934, convirtiéndose en un centro clave para la Fuerza Naval del Caribe, con la presencia de la Flotilla de Superficie, la Estación de Guardacostas y el Batallón de Infantería de Marina No. 12.

Roles actuales

La Base Naval ARC Bolívar es crucial para la seguridad de Colombia, apoyando operaciones marítimas y terrestres en la región.

La Armada colabora en la lucha contra el narcotráfico, la protección del medio ambiente y la seguridad de la vida humana en el mar desde Cartagena.

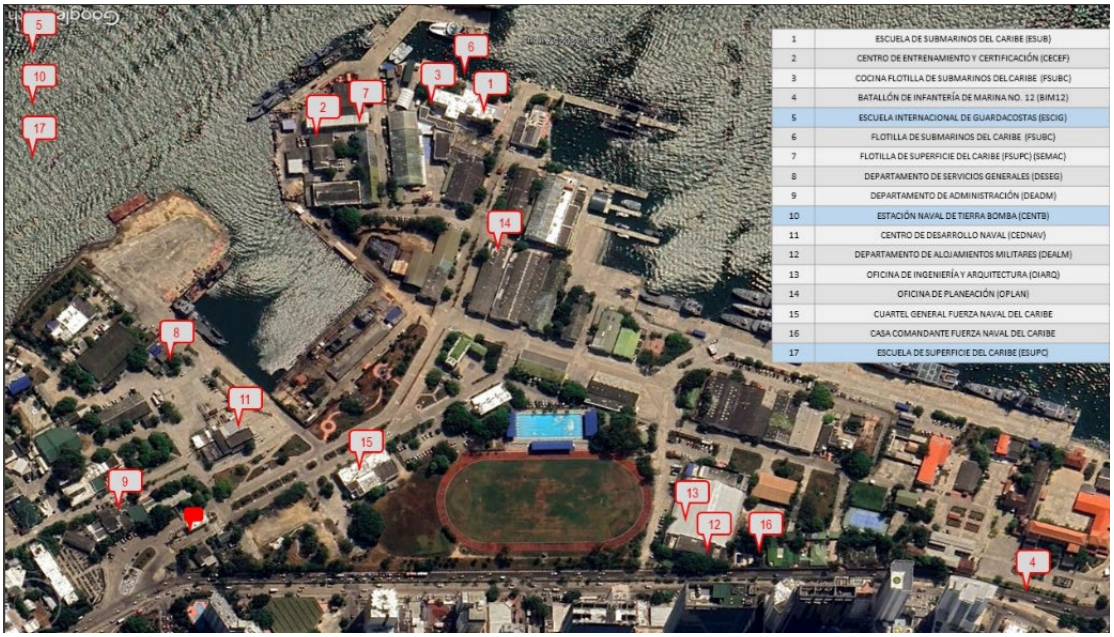

LOCALIZACIÓN

La principal base de la Armada Nacional en Cartagena es la Base Naval ARC Bolívar, ubicada en el sector de Boca grande, y la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" se encuentra en el Barrio El Bosque, sector Manzanillo, entrada a la Escuela Naval

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO


3.1. LOTE 1

Con el presupuesto otorgado para la presente vigencia se estima la intervención de oficinas, cocinas, alojamientos, cerramientos perimetrales de instalaciones militares a cargo de la BNL01 y compontes FNC, así como actividades destinadas al mantenimiento y recuperación de las viviendas fiscales de la Guarnición de Cartagena, que implicarían específicamente siguientes trabajos:

- Mantenimiento de sistemas eléctricos, luminarias y tableros eléctricos
- Mantenimiento de sistemas de agua potable, aguas residuales, cajas, registros, sondeo, limpieza de desagües y saneamiento.
- Remodelación de baños, cocinas, incluyendo reemplazo sistemas de plomería (hidráulicos), de gas, y eléctricos.
- Trabajos para corregir las filtraciones de agua en dependencias administrativas, operacionales y viviendas fiscales.
- Impermeabilización de azoteas en mal estado.
- Cambio de cielo raso y trabajos para corregir humedad por lluvias.
- Trabajos de carpintería, detalles de acabados y pintura
- Instalación y cambio de techos


Descripción de las necesidades identificadas:
LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC
1. ESCUELA DE SUBMARINOS DEL CARIBE (ESUBC): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. El usuario manifiesta que tiene deficiencias en su estructura, por lo cual requieren trabajos de mantenimiento y adecuación de áreas de biblioteca y aulas, con la intervención de cielo raso, cambio de luminarias e instalación de detectores de humo, con el fin de fortalecer las medidas contraincendios.



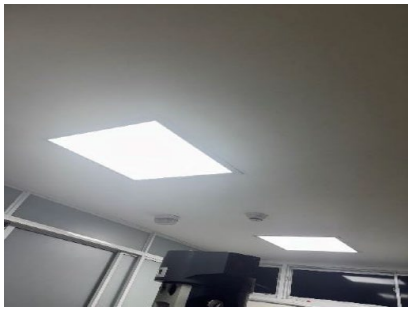

2. CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE LA FLOTA (CECEF): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos

identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. El usuario manifiesta que tiene deficiencias en su estructura administrativa, por lo cual requieren trabajos de mantenimiento y adecuación de áreas de oficina y dependencias, con la intervención del techo (por ingreso de aguas lluvias), cambio de cielo raso, cambio de luminarias y sistemas eléctricos, cambio de pisos, pintura interior e intervención de puertas en carpintería metálica y de madera.

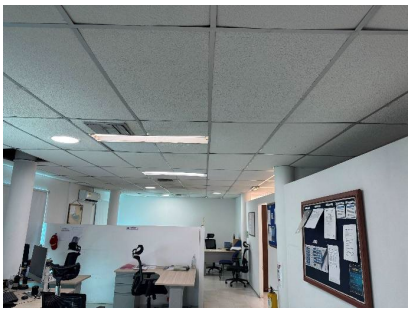



3. COCINA DE LA FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE (COCINA FSUBC): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. El usuario manifiesta que tiene deficiencias en la operación del servicio de cocina, con dificultades en los sistemas de desagües de aguas residuales, funcionamiento de campanas extractoras y condiciones de los materiales de recubrimiento que dificultan la limpieza de la dependencia. Por lo cual se ejecutaría trabajos de mantenimiento y adecuación integral de la cocina de la cámara de la Flotilla de Submarinos del Caribe, para la intervención y cambio de pisos, instalación de enchape de muros y nuevo cielo raso, intervención y puesta en funcionamiento de la campana extra.





4. CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL BATALLÓN DE I.M. No. 12 (BIM12): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego

de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:

a. El usuario manifiesta que el cerramiento perimetral de la unidad ha sufrido un avanzado deterioro de los elementos de concreto y acero por la exposición al medio marino y a la salpicadura de las aguas lluvias y los vehículos que transitan por la avenida San Martín, por lo cual se requieren trabajos de demolición y reconstrucción del cerramiento perimetral deteriorado del Batallón de Infantería de Marina No. 12, consistente en demolición de estructuras de concreto, reconstrucción en concreto reforzado de vigas cimientos, columnas, vigas aéreas y tubos de cerramiento.






5. ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS (ESCIG) (UBICADO EN LA ENAP): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:


a. El usuario manifiesta que tiene deficiencias en su estructura educativa, ya que requiere aislamiento del aula de motores, mejoramiento de cielo raso, iluminación de áreas comunes y la instalación de elementos que protejan al personal de la lluvia para acceso a sus instalaciones, por los tanto se requieren trabajos de mantenimiento y adecuación de áreas de aula de motores, adecuación de cerramientos internos y luminarias, construcción de marquesinas para protección de fachadas contra la lluvia. Adecuación de cielo rasos de corredores en primer y segundo nivel.



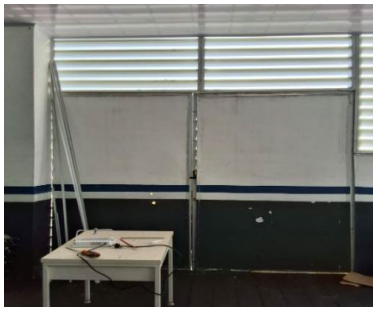

6. FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE (FSUBC): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:

a. El usuario manifiesta novedades en la estructura de soporte del tanque de almacenamiento de agua sobre el edificio, de igual forma requiere el mantenimiento de las baterías sanitarias de los alojamientos del mismo edificio. De acuerdo a la vista, la reparación de la estructura del tanque garantiza los medios para el abastecimiento de agua a la edificación y revertir el deterioro, de igual forma las baterías de baños requieren una renovación de las superficies de recubrimiento y cambios de aparatos sanitarios. Por lo cual se recomienda al usuario la ejecución de trabajos de intervención estructural sobre el tanque elevado en concreto sobre el edificio de Comando, intervención y mantenimiento de baterías de baños de alojamientos, e intervención de la red eléctrica externa e interna de las dependencias.

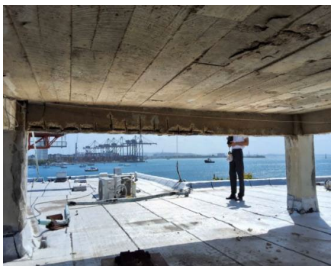



7. FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE: Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. En razón al plan de evacuación del edifico de la Flotilla de Superficie del Caribe, el usuario requiere la adecuación de las antiguas oficinas de señalización marítima para su uso como nuevo cuartel general. Por lo tanto, re recomienda la ejecución de los trabajos de mantenimiento y adecuación de las antiguas oficinas de Señalización Marítima, para el traslado de las oficinas de la Flotilla de Superficie a estas dependencias, incluyen la adecuación de baños, divisiones internas, pasamanos, sala de juntas, divisiones modulares en vidrios, ventanas, y sistema de impulsión de agua potable.





8. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES BNL01 (DESEG BNL01): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:

a. El usuario manifiesta el ingreso de aguas lluvias por el techo que conforma la oficina administrativa del Departamento de Servicios generales, por lo cual se recomiendan los trabajos de intervención estructural sobre el techo de la oficina, incluye el cambio de teja, reforzamiento de estructura, instalación de canales y bajantes de agua lluvia, cambio de cielo raso y luminarias.




9. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN BNL01 (DEADM BNL01): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. El usuario manifiesta el ingreso de aguas lluvias por el techo que conforma la oficina del Departamento de Administración, por lo cual se recomienda la ejecución de trabajos de intervención sobre el techo en el sector Oficinas Asesores Jurídicos, mantenimiento e impermeabilización de vigas canales, cambios de pendientes para mejoramiento de manejo de las aguas lluvias.





10. ESTACIÓN NAVAL DE TIERRA BOMBA (ENTB): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. El usuario manifiesta que cuenta con deterioro de los elementos que conforman las puertas y marcos metálicos de las lacas del alojamiento de los infantes de marina que conforman la compañía de seguridad de la ENTB, por lo cual los trabajos recomendados corresponden a la intervención para el suministro e instalación de puerta de acceso a lacas de los alojamientos de infantes de marina.





11. CENTRO DE DESARROLLO NAVAL (CEDNAV): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son: a. El usuario manifiesta que la dependencia tiene problemas de ingreso de agua lluvias por techo, requiere la habilitación de un acceso externo para salida de material especial, requiere el mantenimiento de piso existente y mantenimiento de los muros interiores afectados por la humedad, por lo cual luego de la visita se recomienda la ejecución de los trabajos de mantenimiento y adecuación de las oficinas que permitan corrección de goteras por ingreso de agua lluvia en techo, ampliación de accesos externos y construcción de carpintería metálica para puertas, pintura de muros, mantenimiento a piso existente, impermeabilización de techo, mantenimiento canales aguas lluvias y mantenimiento eléctrico de la dependencia.





12. DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES BNL01 (DEALM BNL01): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos

identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. El usuario manifiesta el ingreso de aguas lluvias por el techo que conforma la oficina del Departamento de Alojamientos militares, por lo cual se recomienda la ejecución trabajos de intervención para el mantenimiento de techos, bajantes y canelas de aguas lluvias ubicadas en el tercer nivel del edifico del Coliseo.



13. OFICINA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA BNL01 (OIARQ BNL01): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
14.
a. El usuario manifiesta que se ven afectado el lucimiento y estado de la oficina en razón las deficiencias en iluminación interna, deterioro en cielo rasos, ingreso de aguas lluvias por el techo y por rotura de vidrio de ventana, por lo cual se recomienda la ejecución de obras de trabajos de mantenimiento y adecuación de las oficinas que intervenir cielo raso,
b. cambio de luminarias, cambio de vidrios ventanas, mantenimiento de techos, bajantes y canales de aguas lluvias.



15. OFICINA DE PLANEACIÓN BNL01 (OPLAN BNL01): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. El usuario manifiesta que se ha presentado deterioros excesivos sobre la placa de concreto ubicada sobre la oficina, presentando fisuras, posiblemente asociado a novedades estructurales del edificio. Luego de la visita se determina un plan para intervención de las novedades que van desde actividades a corto plazo y a mediano plazo, que permitirán atender

la novedad. Por lo tanto, se considera de especial importancia la ejecución de estos.




16. CUARTEL GENERAL FUERZA NAVAL DEL CARIBE (CGFNC); Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. Los trabajos de mantenimiento y adecuación del piso de acceso a la oficina de familias, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad al ingreso a esa dependencia, con una superficie suficientemente rugosa para tal fin.
b. Mantenimiento de los muebles y mesón de pantry interno del Cuartel General FNC, ya que se denotan deterioro de los muebles producidos por la humedad de los sistemas de ventilación interna
c. Mantenimiento cielo raso en oficina del Departamento N3 FNO, que fueron causados por antiguas entradas de agua lluvia a través del techo.




17. CASA COMANDO FNC (CASA CFNC): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. Trabajos de intervención para el cambio de entrepaños internos del closet, cambio de los existentes en madera por PVC, porque se denotó deterioro por humedad al interior de los closets.

b. Mantenimiento de la ventanería en madera de la casa, se encontró la hay problemas en la operación de herrajes y demás elementos, así como deterioro en secciones de las estructuras de madera.
c. Cambio de piso en sala de reuniones, ya que se evidencia el deterioro del piso existente laminado por la humedad.





18. ESCUELA DE SUPERFICIE DEL CARIBE (ESUPC) (UBICADO EN LA ENAP): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. El usuario manifiesta que la estructura actual donde desarrolla ejercicios de entrenamiento no cuenta con una superficie adecuada, bombeada (para la escorrentía del agua superficial) y estructura techada para proteger al personal de los rayos del sol durante los entrenamientos, por lo cual se recomienda la ejecución de trabajos de mantenimiento de pavimento en concreto de plaza de entrenamiento, canales de aguas lluvias, que incluye la instalación de techo con estructura de soportes para instrucción
b. Mantenimiento y adecuación de cerramiento perimetral, ya que se ha visto afectado últimamente por el embate del mar y por las condiciones meteomarinos y salinidad del ambiente.
c. Conformación de rellenos seleccionados para habilitación acceso vial al complejo de entrenamiento, ya que la unidad no cuenta con una estructura vial apropiada para el ingreso a la dependencia, lo que ha deteriorado vehículos y elementos que se desean ingresar para los ejercicios.





LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC

LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC

DEPENDENCIA	UNIDAD USUARIA ACTIVIDAD	REC	SIT	PRESUPUESTO (COP)
BIM12	Mantenimiento cerramiento perimetral BIM12	10	CSF	228.200.000,00
BNL01 DINDE	Mantenimiento centro de desarrollo naval	10	CSF	5.695.240,00
BNL01 ENTB	Mantenimiento estación naval de Tierra Bomba	10	CSF	3.600.000,00
BNL01	Mantenimiento Edificio OPLAN – DEADM – DESEG - DEALM - OIARQ	16	SSF	353.700.000,00
CECEF	Mantenimiento centro de entrenamiento y certificación de la flota	10	CSF	82.220.400,00
ESCIG	Mantenimientos Escuela Internacional de Guardacostas	16	SSF	9.000.000,00
ESUBC	Mantenimiento escuela de submarinos del Caribe	10	CSF	14.069.528,00
FNC	Mantenimiento casa de comando FNC	10	CSF	45.000.000,00
FNC	Mantenimiento dependencias cuartel general FNC	10	CSF	40.761.599,00
FNC	Mantenimiento dependencias cuartel general FNC	10	CSF	8.428.593,00
FSUBC	Mantenimientos baños Flotilla de Submarinos	10	CSF	18.000.000,00
FSUBC	Mantenimientos edificio Flotilla de Submarinos	10	CSF	72.000.000,00
FSUBC	Mantenimientos cocina Flotilla de Submarinos	16	CSF	13.140.000,00
FSUPC	Mantenimiento instalaciones SEMAC para traslado CGFSUPC	10	CSF	139.400.000,00
ESUPC	Mantenimiento escuela contraincendios de la Escuela de Superficie	10	CSF	90.909.090,00
TOTAL LOTE 1				**1.124.124.450,00**

 Vigencia: 2025: Acuerdo respaldo contenido en el CDP No. 12925 de fecha 28/01/2025, hasta por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECIENUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.331.219.481,00) incluido el IVA y AIU demás erogaciones que correspondan.

LOTE I - MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC por valor MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (1.124.124.450,00) acuerdo respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 12925 de fecha 28/01/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA.

4.1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CUADRO RESUMEN CON INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

ID	SUSPENSIONES Y PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
1	CONTRATO No.	0077-ARC-CBNL01-2025
2	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
3	REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO LEON AMAYA
4	NIT	71336012
5	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025
6	VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($205.958.060.00), incluido IVA, y demás erogaciones que correspondan.
7	VALOR ADICION 1	$ 23.883.300,00
8	FECHA ADICION 1	10-11-2025
7	VALOR TOTAL	$ 229.841.360,00
8	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 30 de diciembre de 2025.
9	FECHA ACTA DE INICIO:	14 de agosto de 2025.
10	FECHA TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2025.

CUADRO RESUMEN ACTUALIZACION GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	PÓLIZA N	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	65-46-101060801	14/08/2025	06/07/2026	$41.191.612
Salarios y Prestaciones Sociales		14/08/2025	05/01/2029	$10.297.903
Calidad del servicio		14/08/2025	06/07/2026	$41.191.612
RCE	65-54-101007588	14/08/2025	05/01/2026	$284.700.000

CUADRO RESUMEN ACTUALIZACION GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SEGÚN ADICION 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	PÓLIZA N	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	65-46-101060801	14/08/2025	06/05/2026	$45.968.272
Salarios y Prestaciones Sociales		14/08/2025	05/01/2029	$11,492.068
Calidad del servicio		14/08/2025	06/07/2026	$45.968.272
RCE	65-54-101007588	14/08/2025	05/01/2026	$284.700.000

Ver anexo 1

4.2. ESTADO FINANCIERO

RELACIÓN DE ACTAS C. DE INTERVENTORÍA			
VALOR INICIAL CONTRATO			$205.958.060.00
ADICION 1			$23.883.300
VALOR TOTAL CONTRATO			$ 229.841.360
ACTA N°	% AVANCE	VALOR ACTA	ESTADO
ACTA 1	30,6%	$ 63.026.166	FACTURADA CANCELADA
ACTA 2	20,51%	$ 42.243.972	FACTURADA CANCELADA
ACTA 3	21,38%	$ 49,152,712	
ACTA FINAL	32,81%	$ 75,421,510	
TOTAL, ACUMULADO	**100%**	$ 229.841.360	

5. ASPESTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO INTERVENTORÍA

5.1. PERSONAL INTERVENTORÍA

RICARDO LEON AMAYA	Director de Interventoría
ANDRES ROMERO MONTALVO	Residente de Interventoría Lote 1
OMAIRA ESTER VENENCIA CASAS	Profesional HSE y Gestión Ambienta Lote 1
KEVIN DE JESUS CORRALES CAFIEL	Supervisor operativo Lote 1

Ver anexo 2 Seguridad social interventoría

5.2. LAS FUNCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

A. De oficina:

- ✓ Reuniones con supervisión, contratista y funcionarios de la armada
- ✓ Seguimiento administrativo al contratista de obra
- ✓ Evaluación técnica de los diferentes frentes a intervenir.
- ✓ Control de personal
- ✓ Elaboración de informes semanales, con su respectivo registro fotográfico.
- ✓ Verificación del cumplimiento contractual de todas las normas legales vigentes.
- ✓ Solicitud de documentación referente a inicio de obra por parte del contratista.
- ✓ Verificación del cumplimiento legal vigente por parte del contratista de la seguridad social, seguridad industrial y salud ocupacional.
- ✓ Verificación y seguimiento del cumplimiento del manejo socio-ambiental para la construcción de obras.

B. De Campo:

- ✓ Recorrido de los diferentes frentes a intervenir
- ✓ Evaluación operativa de los diferentes frentes a intervenir.
- ✓ Seguimiento técnico y operativo de las actividades en ejecución.

6. CONTRATO DE OBRA NO. 0076 LOTE 1

CUADRO RESUMEN CON INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ID	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
1	CONTRATO No.	0076-ARC-CBNL01-2025
2	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAMAR
3	REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR
4	NIT	901.973.262-6
5	OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE. LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC
6	VALOR INICIAL:	$ MIL VEINTINUVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($1.029.154.049.13) INCLUIDO AIU, IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.
7	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025.
8	FECHA ACTA DE INICIO:	14 de AGOSTO de 2025
9	MODIFICATORIO No1	31 DE OCTUBRE DE 2025
10	ADICION N01	$ 94.970.400,46
11	PRORROGA N01	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
12	MODIFICATORIO No2	1 DE DICIEMBRE DE 2025
13	ADICION N02	$ 60.283.728,28
14	PRORROGA N02	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
15	MODIFICATORIO No3	28 DE DICIEMBRE DE 2025

12	FECHA TERMINACIÓN:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

CUADRO RESUMEN GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	**POLIZA N.**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560 74 994000035606	08/08/2025	31/10/25	$427,050,000.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	560 47 994000192099	08/08/2025	28/02/2026	$ 205,830,809.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	560 47 994000192099	VER NOTA	ACLARATORIA	$411,661,619.60
GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	560 47 994000192099	24/09/2021	31/12/2024	$51,457,702.45
CALIDAD DEL SERVICIO	560 47 994000192099	08/08/2025	28/02/2026	205,830,809.80

ACTUALIZACION DE POLIZAS POR FIRMA DE ACTA DE INICIO 14 DE AGOSTO DE 2025

AMPAROS	**POLIZA N.**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560 74 994000035606-ANEXO 3	14/08/2025	06/11/25	$427,050,000.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	560 47 994000192099	14/08/2025	10/03/2026	$ 205,830,809.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	560 47 994000192099	VER NOTA ACLARATORIA		$411,661,619.60
GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	560 47 994000192099	14/08/2025	06/11/2028	$51,457,702.45
CALIDAD DEL SERVICIO	560 47 994000192099	14/08/2025	10/03/2026	205,830,809.80

ACTUALIZACION DE POLIZAS MODIFICATORIA No1 31 DE OCTUBRE DE 2025 ANEXO 3

AMPAROS	**POLIZA N.**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560 74 994000035606-ANEXO 3	14/08/2025	01/12/25	$427,050,000.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	560 47 994000192099	14/08/2025	07/04/2026	$ 224,824,890.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	560 47 994000192099	VER NOTA ACLARATORIA		$449,649,780.40
GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	560 47 994000192099	14/08/2025	01/12/2028	$56,206,222.55
CALIDAD DEL SERVICIO	560 47 994000192099	14/08/2025	07/04/2026	$224,824,890.20

ACTUALIZACION DE POLIZAS MODIFICATORIA No3 28 DE DICIEMBRE DE 2025

AMPAROS	**POLIZA N.**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560 74 994000035606- ANEXO 7	14/08/2025	30/12/25	$427,050,000.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	560 47 994000192099 ANEXO 8	14/08/2025	06/05/2026	$ 236,881,635.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	560 47 994000192099 ANEXO 8	VER NOTA ACLARATORIA		$ 473,763,271.20
GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	560 47 994000192099 ANEXO 8	14/08/2025	30/12/2028	$ 59,220,408.90
CALIDAD DEL SERVICIO	560 47 994000192099 ANEXO 8	14/08/2025	06/05/2026	$236,881,635.60

ANEXO 3

NOTA ACLARATORIA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

7. ASPESTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

7.1. PERSONAL DE OBRA.

La empresa contratista de obra labora con el siguiente personal en el proyecto:

JENRY RODRÍGUEZ CRUZ – C.C. 79.539.550	Director de Obra.
MARÍA DEL CARMEN VILLAMIZAR VEGA – C.C. 32.909.910	Profesional HSE y Gestión Ambiental
ANA MARÍA CUENTAS RUA – C.C. 1.128.049.464	Ing Residente

8. ESTADO FINANCIERO CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

RELACIÓN DE ACTAS DE OBRA					
VALOR DEL CONTRATO			$1.029.154.049.13		
ACTA N°	**% AVANCE**	**VALOR ACTA**	**AMORTIZACION ANTICIPO**	**NETO A PAGAR**	**ESTADO**
ANTICIPO	0%				
ACTA PARCIAL No1	13,1%	$134.627.711,73	$0	**$**134.863.766,73	cancelada
ACTA PARCIAL No2	58,8%	$696.429.669,06	$0	$696.429.669,06	cancelada
ACTA FINAL	29,83%	$353.350.797,49	$0	$353.350.797,49	En espera
TOTAL, ACUMULADO	**100%**	**$ 1.184.408.178,28**	**$0**	**$1.184.408.178,28**	En espera

El contratista en compañía de interventoría hace entrega formal de toda la documentación necesaria para la legalización del cobro No2 y final por parte del contratista.

8.1. CANTIDADES EJECUTADAS CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

Con respecto al contrato de obra, se valoran las cantidades ejecutadas a diciembre 30 de 2025:

FRENTES	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**
FN1 Mantenimiento instalaciones Escuela de	$ 14.069.564,00	100%

Submarinos del Caribe (ESUBC)		
FN2-Mantenimiento instalaciones Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF)	$ 82.220.720,90	100%
F3-Mantenimiento y adecuación cocina de Flotiila de Submarinos del Caribe (FSUBC)	$ 13.145.795,86	100%
F4-Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)	$ 262.573.134,02	100%
F5-Mantenimiento instalaciones Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)	$ 9.352.538,19	100%
F6-Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe	$ 90.000.000,00	100%
F7-Mantenimiento y adecuación de antiguo edificio de SEMAC para la Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC)	$ 139.399.028,34	100%
F8-Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG)	$ 24.518.334,49	100%


F9-Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Administración BNL01 (DEADM)	$ 110.648.151,99	100%
F10-Mantenimiento y adecuación instalaciones Estación Naval de Tierra Bomba (CENTB)	$ 10.222.216,20	100%
F11-Mantenimiento y adecuación instalaciones Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV)	$ 7.208.823,14	100%
F12-Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Alojamientos Militares (DEALM)	$ 6.489.194,44	100%
F13-Mantenimiento y adecuación instalaciones Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 (OIARQ)	$ 20.147.377,15	100%
F14- Mantenimiento y adecuación Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)	$ 195.713.817,25	100%
F15-Mantenimiento y adecuación Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)	$ 50.521.480,37	100% 100%

F16-Mantenimiento y adecuación Casa Comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Comando CFNC)	$ 43.680.976,31	100%
F17-Mantenimiento y adecuación Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)	$ 104.503.427,50	100%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 1.184.408.178,28
TOTAL FACTURAS PRESENTE MES	2
TOTAL FACTURADO PRESENTE MES	1.049.780.466,55
TOTAL ACUMULADO FACTURADO	$ 1.184.408.178,28

RELACION TECNICA-OPERATIVA AL 30 DE DICIEMBE DE 2025						
ITEM	**% PROGRAMADO ACUMULADO**	**% EJECUTADO ACUMULADO**	**ADELANTO Y/O ATRASO**	**VALOR FACTURADO**	**FRENTES ENTREGADOS OPERATIVAMENTE**	**FRENTES EN EJECUCION**
1	100%	100%	0%	$1.184.408.178,28	17	0

El contratista hasta el 30 de diciembre de 2025 ha generado 2 actas parciales y una final que representan el 100% del monto total contratado.

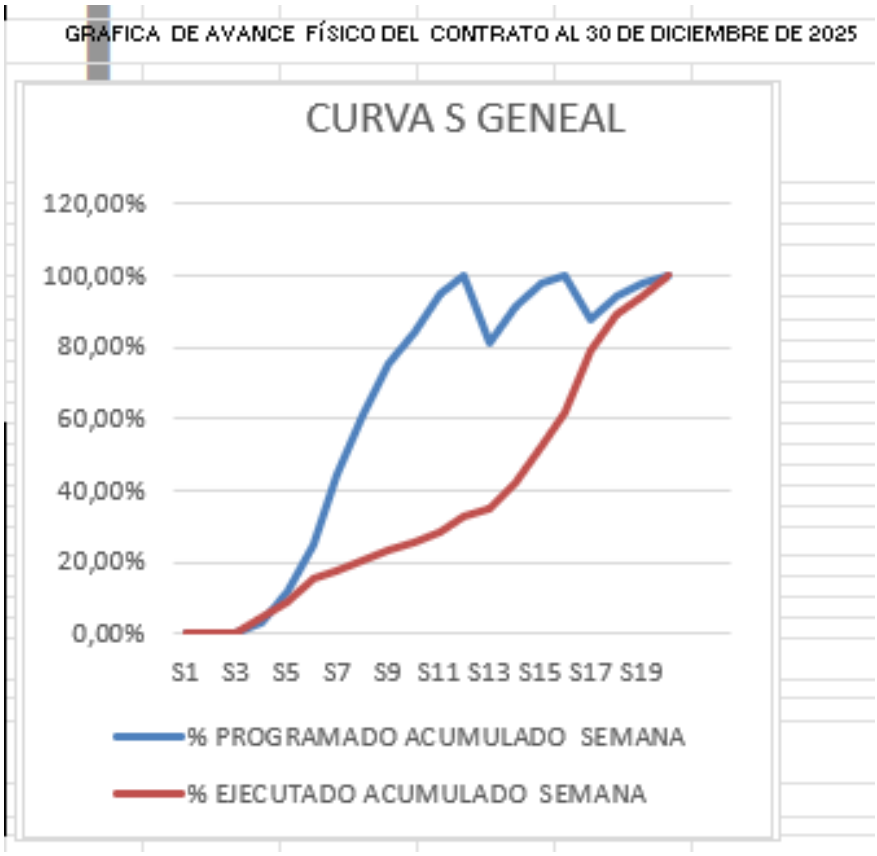

9. INFORME SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

Ver anexo 4

10. ASPECTOS TÉCNICOS. CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

10.1. MATERIALES DE OBRA.

A la fecha se han suministrado los siguientes materiales de obra.

- Cemento
- Arena
- Triturado
- Acero de refuerzo
- Madera para formaleta
- Superboard
- Estuco
- Pintura
- Enchapes
- Material hidrosanitario
- Manto edil
- PVC board

10.2. CONTROL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

A la fecha se han suministrado los siguientes equipos y herramientas

- Herramientas menores
- Bobtca con martillo demoledor
- Volquetas sencillas
- Furgón
- Martillo demoledor

10.3. ESTADO DE LA OBRA

El proyecto inicia con la firma del acta de inicio el 14 de agosto del 2025.
El 31 de octubre se legaliza modificatorio No1 mediante adición presupuestal por un monto de $ 94.970.400,46

El 31 de octubre de 2025 mediante modificatorio No1 se legaliza prorroga por 30 días calendario, el plazo contractual se extiende hasta el 30 de noviembre de 2025 mediante modificatoria No1.

El 1ro de diciembre mediante modificatorio No2 se legaliza la segunda adición presupuestal por un monto de $ $60.283.728.28

El 1ro de diciembre de 2025 mediante modificatorio No2 se legaliza prorroga por 30 días calendario, el plazo contractual se extiende hasta el 30 de diciembre de 2025 mediante modificatorio No2.

El 29 de diciembre se legaliza la 3ra modificación contractual donde se modifica el anexo técnico manteniendo el valor contractual y el plazo de ejecución según modificatorio No2

A la fecha del corte del presente informe, se presentan 17 frentes entregados, contratista e interventoría se encuentran en proceso de liquidación contractual.

10.4. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN

Avance acumulado programado: 100% al 30 de diciembre de 2025.

Porcentaje acumulado ejecutado: 100% al 30 de diciembre de 2025.

Porcentaje de atraso entre ejecutado acumulado y acumulado programado: 0%

Total presupuesto ejecutado programado: $ 1.184.408.178,28
Total presupuesto físico ejecutado: $ 1.184.408.178,28
Diferencia presupuesto ejecutado vs programado: $ 0

Ver anexo 5

11. OBSERVACIONES, INQUIETUDES Y DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

Para el corte a 30 de diciembre de 2025, se encuentran 17 frentes de trabajo entregados, el 23 de diciembre el contratista solicita modificación al contrato para modificación al anexo técnico. Interventoría hace la respectiva revisión de dicha solicitud y del alcance de las necesidades contractuales a modificar.

- Frente No1. Mantenimiento instalaciones Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC): frente terminado en un 100% operativamente

- Frente No2. Mantenimiento instalaciones Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF). frente terminado en un 100% operativamente .

- Frente No3. Mantenimiento y adecuación cocina de Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC). frente terminado en un 100% operativamente.

- Frente 4. Batallón de infantería No12(BIM12) frente terminado en un 100% operativamente.

- Frente 5. Escuela internacional de guardacostas (ESCIG) frente terminado en un 100% operativamente.

- Frente 6. Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe. frente terminado en un 100% operativamente.

- Frente 7. Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC) – SEMAC- frente terminado en un 100% operativamente.

- Frente 8. Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG) frente terminado en un 100% operativamente.

- Frente 9. Departamento de administración (DEADM) frente terminado en un 100% operativamente.

- Frente 10. Estación Naval de Tierra Bomba (CENTB) frente terminado en un 100% operativamente.

- Frente 11. Mantenimiento y adecuación instalaciones Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV) frente terminado en un 100% operativamente.

- Frente 12. Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Alojamientos Militares (DEALM). frente terminado en un 100% operativamente.

- Frente 13. Mantenimiento y adecuación instalaciones Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 (OIARQ). frente terminado en un 100% operativamente.

- Frente 14 oficina de planeación. actividades contractuales en construcción. frente terminado en un 100% operativamente.

- Frente 15. Mantenimiento y adecuación Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC). frente terminado en un 100% operativamente.

- Frente 16. Mantenimiento y adecuación Casa comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Comando CFNC). actividades contractuales al 100% de ejecución.

- Frente 17 escuela de superficie del caribe. frente terminado en un 100% operativamente.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO FRENTES EN EJECUCION CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

- Frente No1. Mantenimiento instalaciones Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC)






- FN2-Mantenimiento instalaciones Centro de Entrenamiento



Frente No3. Mantenimiento y adecuación cocina de Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC)

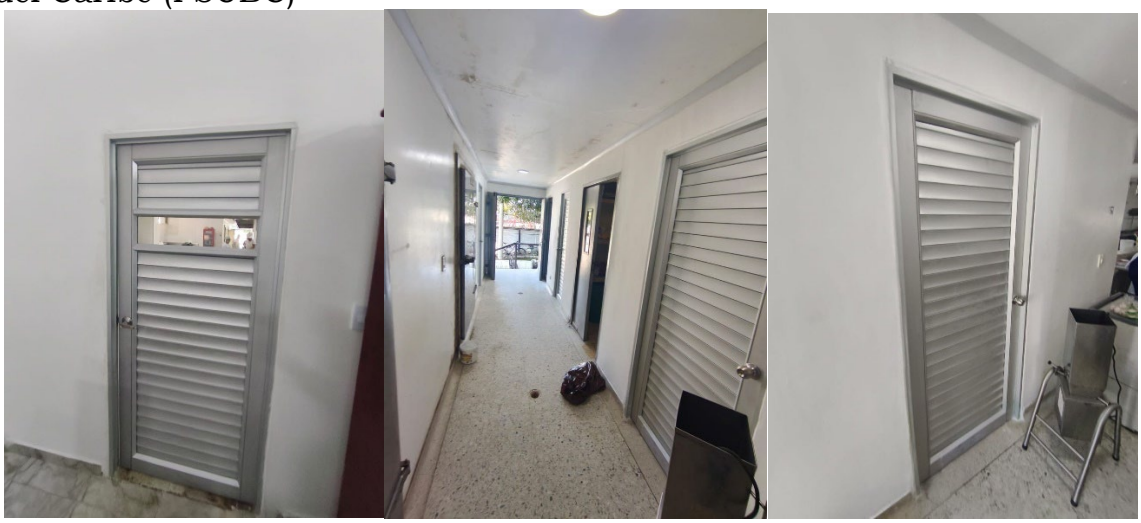



F4-Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)



Frente 5 Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)




F6-Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe





F7-Mantenimiento y adecuación de antiguo edificio de SEMAC para la Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC)





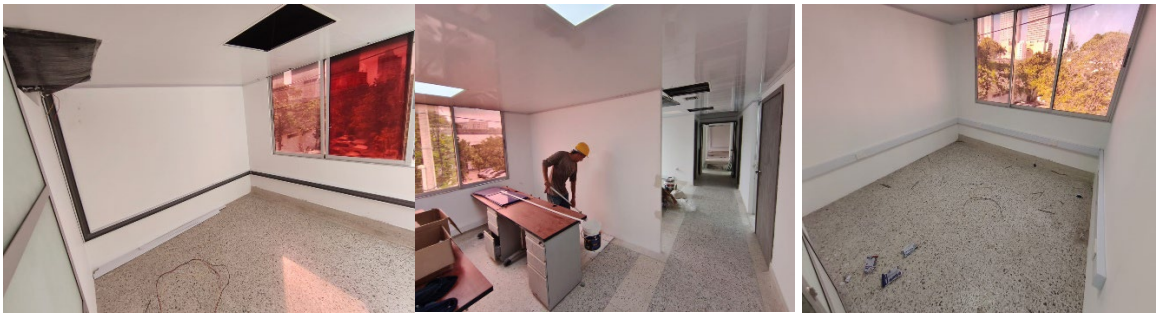




FRENTE No8.Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG)



- Frente 9. Departamento de administración (DEADM)

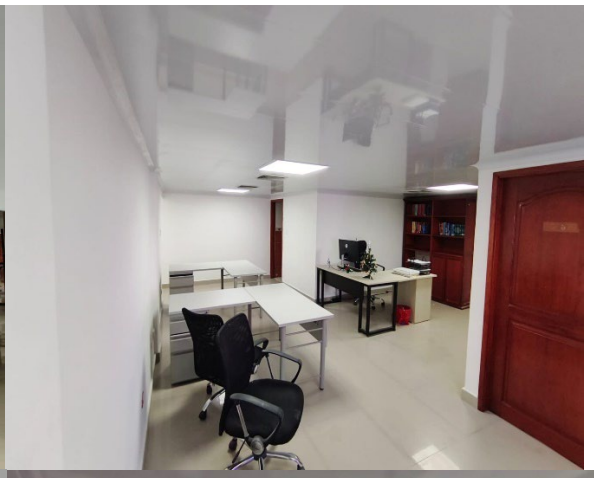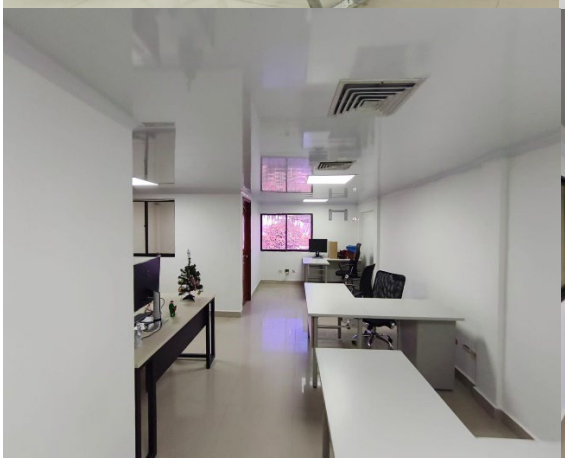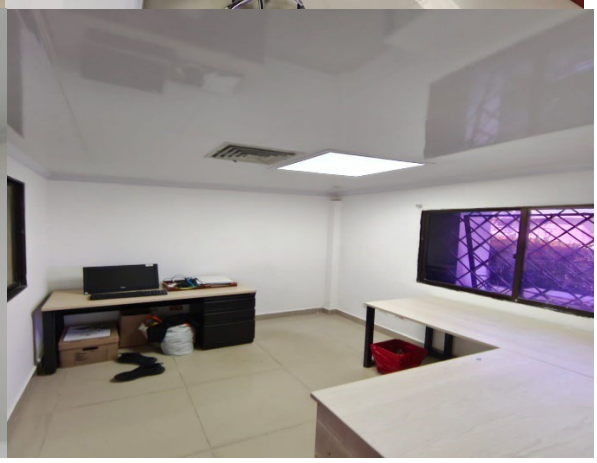




Frente 10 Estación Naval de Tierra Bomba (CENTB)



- Frente 11 Centro de Desarrollo Naval (CEDNA



• Frente 13. Mantenimiento y adecuación instalaciones Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 (OIARQ)

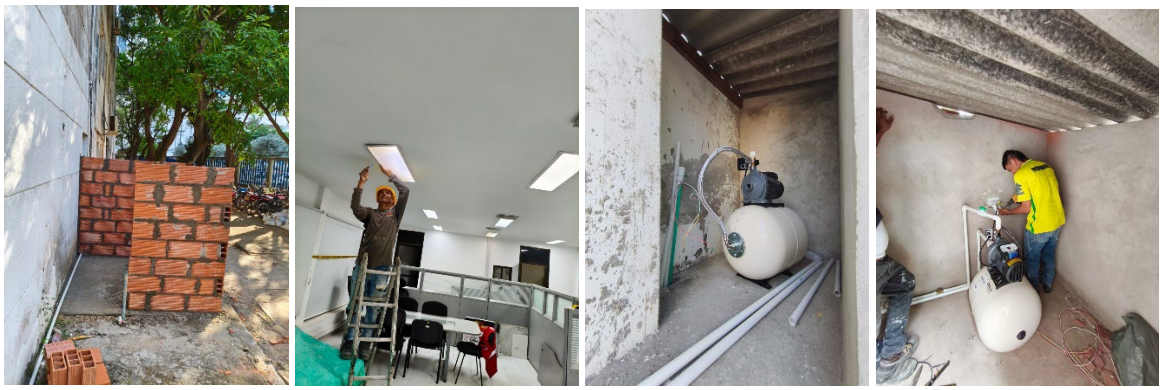

F14- Mantenimiento y adecuación Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)





F15-Mantenimiento y adecuación Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)





F16-Mantenimiento y adecuación Casa comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Comando CFNC)



F17-Escuela contra incendio-manzanillo







13.INFORMES SEMANALES CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

Durante este periodo se realizaron los informes semanales correspondientes, los cuales se relacionan en este cuadro

SEGUIMIENTO INFORMES SEMANALES				
SEMANA	**PERIODO**	**VALOR PROGRAMADO**	**VALOR EJECUTADO**	**% DE ADELANTO Y/O ATRASO**
16	01/12/2025 al 07/12/2025	$ 766.622.229,44	$ 865.132.401,75	9,19%
17	08/12/2025 al 14/12/2025	$ 967.321.029,03	$ 986.875.128,93	4,91%
18	15/12/2025 al 21/12/2025	$ 1.107.089.654,83	$ 1.048.849.414,23	3,68%
19	22/12/2025 al 30/2/2025	$ 1.184.408.178,24	$ 1.184.408.178,24	0%
	totales	$ 1.184.408.178,24	$ 1.184.408.178,24	0%

Ver anexo 6

14.BITACORA DE OBRA INFORME DIARIO CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

Como cumplimiento del informe diario de interventoría y obra, se anexa copia de la Bitácora de Obra en el periodo correspondiente a diciembre de 2025.

Ver anexo 7

15.CORRESPONDENCIA CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida durante el presente mes.

15.1. CORREOS ENVIADOS

FECHA	DE	PARA	ASUNTO
01/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co,	oficio 29 intv ponencia 2

01/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co,	oficio 29 respuesta ponencia intv
01/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co,	solicitud de modificacion No2 contratista
03/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	acta de interventoria No3
04/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	oficio situacion enchape frente 6
05/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	oficio No61
05/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	oficio No62
05/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	balance final frente 7
08/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	Solicitud definición marquesina correspondiente al frente 5
09/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	BALANCE FINAL ACTUALIZADO FRENTES
09/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	oficio No63
10/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	informe semanal semana del 1 a 7 de noviembre
12/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	acta parcial N1 lote 1
12/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	balances actualizados frentes lote 1
12/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	acta parcial No2 lote 1

13/12/2025	construramil@gmail.com	consorcioinframar@gmail.com	REVISIÓN Y AJUSTE BALANCE PARA FACTURACIÓN
16/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	INFORME SEMANAL DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025
18/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	balance final modificatorio
22/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	informe semanal del 15 al 21 de diciembre de 2025
23/12/2025	construramil@gmail.com	consorcioinframar@gmail.com	informacion ponencia No3 contrato 076 inframar
23/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	ponencia No3
24/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	Solicitud modificatorio Nro. 3
24/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	Remisión de Apus, mayores y menores, cronograma y los documentos del contador
26/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	(sin asunto)
26/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	analisis de mercado nps modificatorio No3
28/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	informacion ponencia 3 nps y cotizaciones
28/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	cotizaciones nps mod3
29/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	informe semanal del 22 al 30 de diciembre lote 1
29/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	oficio 64
30/12/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	oficio No65

30/12/2025	construramil@gmail.com	consorcioinframar@gmail.com	Aprobación facturación electrónica acta final

Ver anexo 8

15.2. CORREOS RECIBIDOS

01/12/2025	consorcioinframar@gmail.com	construramil@gmail.com	Solicitud_de_modificatorio_y_prorroga_Nro.2
01/12/2025	consorcioinframar@gmail.com	construramil@gmail.com	Solicitud_de_modificatorio_y_prorroga_Nro.2
01/12/2025	consorcioinframar@gmail.com	construramil@gmail.com	Reporte novedades de obra respecto al enchape del baño del capitan frente 6
01/12/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Solicitud definición marquesina correspondiente al frente 5
05/12/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Remisión de pólizas actualizadas conforme al Segundo Modificatorio del contrato.
05/12/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Remisión del plan de contingencia solicitado en el Oficio_62_ARMF1
05/12/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Entrega APU s Actividades Eléctricas adicionales Frente No.9
10/12/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Respuesta a solicitud de actualización de diseño estructural – Frente No. 09
10/12/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Formato e Información para entrega a Satisfacción de Frentes
10/12/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	REVISION BALANCE 1 de 2
10/12/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Remisión de fichas técnicas solicitadas – Frentes del contrato
12/12/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Corte 2 (Revisado)
12/12/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	REVISIÓN Y AJUSTE BALANCE PARA FACTURACIÓN

12/12/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Remisión documentación – Factura Acta No. 2
15/12/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	PANTALLAZO APROBACIÓN FACTURACIÓN
15/12/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Remisión documentación – Factura Acta No. 1
18/12/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	documentos revisados para modificatorio 3
20/12/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Solicitud modificatorio Nro. 3
20/12/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Acta de recepción final
24/12/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Solicitud modificatorio Nro. 3
24/12/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Remisión de Apus, mayores y menores, cronograma y los documentos del contador Recibidos LOTE 1
24/12/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	balance actualizado
26/12/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	balance para acta No. 2
26/12/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	NP´S MODIFICATORIO 3
26/12/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Balance frente 3
28/12/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	ejemplos actas
28/12/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	ACTA FINAL
29/12/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Cotizaciones Np - Modificatorio 3
30/12/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Aprobación facturación electrónica
30/12/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Remisión documentación – Factura Acta No. 3

Ver anexo 9

15.3. OFICIOS DIRIGIDOS A SUPERVISIÓN

FECHA	DE	PARA	ASUNTO
04/12/2025	Interventoría	DUARTE BECERRA STEPHANIA	ACTA DE INTERVENTORIA 3
07/12/2025	Interventoría	administración	ENTREGA DE INFORME MENSUAL LOTE 1
23/12/2025	Interventoría	Supervisión	SOLICITUD MODIFICACION No3 DEL CONTRATO 0076- ARC-CBNL01-2025.
24/12/2025	Interventoría	Supervisión	ANALISIS DE ESTUDIO DE MERCADO SEGÚN MODIFICATORIO No3 DEL CONTRATO DE REFERENCIA.


15.4. OFICIOS DIRIGIDOS AL CONTRATISTA

FECHA	DE	PARA	ASUNTO
5/12/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	SOLOCITUD ENTREGA APUs FRENTE 9.
5/12/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA PARA ENTREGA DE TRABAJOS EN LOTES EN EJECUCION Y POR INICIAR
9/12/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	SOLICITUD DE FICHAS TECNICAS DE LOS 17 FRENTES CONTRACTUALES
9/12/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	Oficio de inconformidad trabajos en ejecución frente 17 Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)
30/12/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	Entregables para liquidación de obra
23/11/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	INCUMPLIMIENTO DE REITERACION SOLICITUDES PENDIENTES
24/11/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	SOLICITUD ENTREGA FORMAL FRENTES A INTERVENTORIA

16.CONCLUSIONES CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

Para la fecha del 30 de diciembre de 2025 se encuentra la obra de un 100% ejecutada. En ese sentido, se espera que el contratista entregue todo el material producto de los entregables que le den legalidad a la entrega administrativa del proceso contractual.

Atentamente



RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría

ANEXO 1

POLIZAS INTERVENTORIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-46-101060801	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	11	2025	14	08	2025	00:00	05	01	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT: 901.202.489-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 34 B NRO. 81 A - 70 INT 201	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5591724

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ARMADA NACIONAL BASE NAVAL NO 1 ARC BOLIVAR	NIT: 800.141.645-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 2 10 02	CARTAGENA, BOLIVAR	6013692000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 0077-ARC-CBNL01-2025 DE INTERVENTORIA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA,PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOSY SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES, LOTE 1 MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2 MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA DE CONFORMIDAD CON LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD DEL SERVICIO	14/08/2025	06/07/2026	$45,968,272.00	$41,191,612.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/08/2025	06/05/2026	$45,968,272.00	$41,191,612.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/08/2025	05/01/2029	$11,492,068.00	$10,297,903.00

ACLARACIONES

-

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION (ADICION Y MODIFICACION DEL ANEXO TECNICO - ECONOMICO) AL CONTRATO No. 0077 ARC-CBNL01-2025, SE AUMENTA EL VALOR EN LA SUMA DE $23.883.300 PARA UN TOTAL DE $229.841.360, POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LAS GARANTIAS

-

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE DOCUMENO CONTINUAN EN VIGOR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******25,542.00	$ *******8,000.00	$ *******6,372.00	$ **********39,915.00	$ ******103,428,612.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRANDES NUMEROS LIMITADA AGENCIA DE	72936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-46-101060801

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Ricardo Amaya.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-46-101060801	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	11	2025	14	08	2025	00:00	05	01	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT: 901.202.489-3

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CL 34 B NRO. 81 A - 70 INT 201		MEDELLIN, ANTIOQUIA	5591724

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ARMADA NACIONAL BASE NAVAL NO 1 ARC BOLIVAR	NIT: 800.141.645-7

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CL 2 10 02		CARTAGENA, BOLIVAR	6013692000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-46-101060801

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Ricardo Amaya.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF072936A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

RCE CONTRATO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-54-101007588	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	11	2025	14	08	2025	00:00	05	01	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT: 901.202.489-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 34 B NRO. 81 A - 70 INT 201	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5591724

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT: 901.202.489-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 34 B NRO. 81 A - 70 INT 201	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5591724

BENEFICIARIO: 800141645 - LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL-BASE NAVAL NO. 1 ARC BOLÍVAR Y/O TERCEROS AFECTA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 0077-ARC-CBNL01-2025 DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES: S CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES, LOTE 1 MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2 MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA DE CONFORMIDAD CON LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	14/08/2025	05/01/2026	$284,700,000.00	
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV				
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/08/2025	05/01/2026	$284,700,000.00	
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV				

ACLARACIONES

-

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION (ADICION Y MODIFICACION DEL ANEXO TECNICO - ECONOMICO) AL CONTRATO No. 0077 ARC-CBNL01-2025, SE DEJA CONSTANCIA DEL AUMENTO DE VALOR EN LA SUMA DE $23.883.300 PARA UN TOTAL DE $229.841.360.

-

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE DOCUMENO CONTINUAN EN VIGOR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRANDES NUMEROS LIMITADA AGENCIA DE	72936	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-54-101007588

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

RCE CONTRATO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-54-101007588	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	11	2025	14	08	2025	00:00	05	01	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS — **IDENTIFICACIÓN** NIT: 901.202.489-3

DIRECCIÓN: CL 34 B NRO. 81 A - 70 INT 201 — **CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA — **TELÉFONO:** 5591724

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS — **IDENTIFICACIÓN** NIT: 901.202.489-3

DIRECCIÓN: CL 34 B NRO. 81 A - 70 INT 201 — **CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA — **TELÉFONO:** 5591724

BENEFICIARIO: 800141645 - LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL-BASE NAVAL NO. 1 ARC BOLÍVAR Y/O TERCEROS AFECTA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/08/2025	05/01/2026	$284,700,000.00	
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV				
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	14/08/2025	05/01/2026	$284,700,000.00	
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV				
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	14/08/2025	05/01/2026	$284,700,000.00	
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV				
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	14/08/2025	05/01/2026	$284,700,000.00	
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV				

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-54-101007588

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF072936A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

RCE CONTRATO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-54-101007588	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	11	2025	14	08	2025	00:00	05	01	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS		NIT: 901.202.489-3
DIRECCIÓN:	CL 34 B NRO. 81 A - 70 INT 201	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:** 5591724

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS		NIT: 901.202.489-3
DIRECCIÓN:	CL 34 B NRO. 81 A - 70 INT 201	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:** 5591724

BENEFICIARIO: 800141645 - LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL-BASE NAVAL NO. 1 ARC BOLÍVAR Y/O TERCEROS AFECTA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-54-101007588

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF072936A

ANEXO 2

SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-06, 12:25:31 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA INDEPENDIENTES. **Numéro Planilla:** 82813666

Periodo Cotización: diciembre 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 06/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA		
Documento	CC71336012	**Dirección**	CRA 80A # 32 EE – 72 INT 1219
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5840012
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71336012	AMAYA MOSQUERA RICARDO LEON	57	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$1.423.500	$227.800	(EPS010) EPS SURA	$1.423.500	$178.000	6,960	$1.423.500	$99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$504.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$0	$227.800	$178.000	$99.100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$504.900	$0	$504.900

ENLACE OPERATIVO, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

063

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73197488		ROMERO MONTALVO ANDRES MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio san fernando la florida	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2059268654	9497469706	I	2026/01/23	2026/01/05	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	73197488	ROMERO ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73197488		ROMERO MONTALVO ANDRES MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio san fernando la florida	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2059268654	9497469706	I	2026/01/23	2026/01/05	BANCOLOMBIA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1072531194
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KEVIN DE JESUS CORRALES CAFIEL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 14 #6A-03	TELÉFONO:	7731484
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997683883**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2059688428

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 405.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	45763450
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OMAIRA ESTHER VENENCIA CASAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	MZ 8 LT 6 ETP 3 BLAS DE LEZO	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4536506439**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Diciembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/01/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9108776424

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230306	230201- PORVENIR	1	$ 227.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.760	$ 0	$ 227.760
SUBTOTALES:										**$ 227.760**	**$ 0**	**$ 227.760**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 177.938	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.938	$ 0	$ 0	$ 177.938
SUBTOTALES:													**$ 177.938**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 177.938**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	ARL14-11 SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 99.268	$ 0	$ 0	$ 99.268
SUBTOTALES:									**$ 99.268**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.268**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD							ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 45763450	VENENCIA CASAS OMAIRA ESTHER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301 PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.760	SANITAS	30	$ 1.423.500	$ 177.938	$ 0	$ 177.938	SURA	30	99.268	1.423.500			$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 504.966**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-06, 12:41:33 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numero Planilla:** 1078557608

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 06/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS		
Documento	NI901202489	**Dirección**	CR 80A #32EE - 72
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	5591724
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	AMAYA MOSQUERA RICARDO LEON	**Identificación**	CC 71336012
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1128051060	DEULOFEUTH CARRERA KAREN DAYANA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 73197488	ROMERO MONTALVO ANDRES MAURICIO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 1072531194	CORRALES CAFIEL KEVIN DE JESUS	59	00		T															0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 30871824	PADILLA TEJEDOR TERESA	59	00		T															0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 92447182	RAMOS CARABALLO ILICH VLADIMIR	59	00		T															0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 45763450	VENECIA CASAS OMAIRA ESTER	59	00	R	T															0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 8.541.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.600	$ 0	$ 594.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

068

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 3

POLIZAS CONTRATISTA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2024
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2019

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5608303938

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000192099 **ANEXO: 6**

Compañía de Seguros

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	02	01	2026

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	02	01	2026

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO INFRAMAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.973.262-6**

DIRECCIÓN: CARRERA 1F 39 76 OF 801 CIUDAD: TUNJA, BOYACÁ TELÉFONO: 3105602708

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.141.645-7**

BENEFICIARIO: **. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.141.645-7**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	14/08/2025	07/04/2026	236,881,635.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	14/08/2025	01/12/2028	59,220,408.90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	473,763,271.20
CALIDAD DEL SERVICIO	14/08/2025	07/04/2026	236,881,635.60

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 7174650 - PINZON AGUILAR, MIGUEL ALEJANDRO - PART: 50.00%
NIT 820003010 - CEROM DE COLOMBIA. S.A.S - PART: 50.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800141645 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA MODIFICACION
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE SE CONOCE DEL TERCER MODIFICATORIO, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,006,746,951.30	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.	2119	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560830393

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE20700B08FB795C

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000192099** ANEXO: 6

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO INFRAMAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.973.262-6**

ASEGURADO: **. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.141.645-7**

BENEFICIARIO: **. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.141.645-7**

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO.0076-ARC-CBNL01-2025, DE FECHA 08/08/2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE.
LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2024
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2019

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5608303938

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000192099 ANEXO: 7

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: ANULACION DE ANEXO TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	02	01	2026

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	02	01	2026

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO INFRAMAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.973.262-6**

DIRECCIÓN: CARRERA 1F 39 76 OF 801 CIUDAD: TUNJA, BOYACÁ TELÉFONO: 3105602708

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.141.645-7**

BENEFICIARIO: **. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.141.645-7**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	14/08/2025	07/04/2026	-236,881,635.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	14/08/2025	01/12/2028	-59,220,408.90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	-473,763,271.20
CALIDAD DEL SERVICIO	14/08/2025	07/04/2026	-236,881,635.60

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 7174650 - PINZON AGUILAR, MIGUEL ALEJANDRO - PART: 50.00%
NIT 820003010 - CEROM DE COLOMBIA. S.A.S - PART: 50.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800141645 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA MODIFICACION
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE SE CONOCE DEL TERCER MODIFICATORIO, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ (1,006,746,951.30	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.	2119	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560830393

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE20700B08FB795B

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000192099** ANEXO: 7

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO INFRAMAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.973.262-6**

ASEGURADO: **. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.141.645-7**

BENEFICIARIO: **. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.141.645-7**

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO.0076-ARC-CBNL01-2025, DE FECHA 08/08/2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE.
LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2024
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2019

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5608303938

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000192099 ANEXO: 8

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	02	01	2026

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	02	01	2026

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO INFRAMAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.973.262-6**

DIRECCIÓN: CARRERA 1F 39 76 OF 801 CIUDAD: TUNJA, BOYACÁ TELÉFONO: 3105602708

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.141.645-7**

BENEFICIARIO: **. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.141.645-7**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	14/08/2025	06/05/2026	236,881,635.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	14/08/2025	30/12/2028	59,220,408.90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	473,763,271.20
CALIDAD DEL SERVICIO	14/08/2025	06/05/2026	236,881,635.60

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 7174650 - PINZON AGUILAR, MIGUEL ALEJANDRO - PART: 50.00%
NIT 820003010 - CEROM DE COLOMBIA. S.A.S - PART: 50.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800141645 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA MODIFICACION
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE SE CONOCE DEL TERCER MODIFICATORIO, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,006,746,951.30	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.	2119	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560830393

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBDE20700B08FB795A

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000192099** ANEXO: 8

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO INFRAMAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.973.262-6**

ASEGURADO: **. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.141.645-7**

BENEFICIARIO: **. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.141.645-7**

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO.0076-ARC-CBNL01-2025, DE FECHA 08/08/2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE.
LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2024
Somos a Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5608303953

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000035606 **ANEXO:7**

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGE: 560 RAMO: 74 PAP:

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	02	01	2026		VIGENCIA DE LA PÓLIZA	14	08	2025	23:59		30	12	2025	23:59	138	FECHA DE IMPRESIÓN	02	01	2026
					VIGENCIA DESDE				A LAS					A LAS	DIAS				

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO MODIFICACION

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	
VIGENCIA DEL ANEXO	14	08	2025	23:59		30	12	2025	23:59	138
				VIGENCIA DESDE	A LAS				VIGENCIA HASTA	A LAS DIAS

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **CONSORCIO INFRAMAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.973.262-6**

DIRECCIÓN: CARRERA 1F 39 76 OF 801 CIUDAD: TUNJA, BOYACÁ TELÉFONO: 3105602708

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CONSORCIO INFRAMAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.973.262-6**

DIRECCIÓN: CARRERA 1F 39 76 OF 801 CIUDAD: **TUNJA, BOYACÁ** TELÉFONO: 3105602708

BENEFICIARIO: IDENTIFICACIÓN:

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO INFRAMAR NIT : 901973262

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOLÍVAR CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS

DIRECCION: SEGUN CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: INDUSTRIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 427,050,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	427,050,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	427,050,000.00		
	RCE PATRONAL	427,050,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	427,050,000.00		
	GASTOS MEDICOS	427,050,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	427,050,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

ASEGURADOS ADICIONALES

NIT 800141645 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR, .

OBJETO DE LA MODIFICACION
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE SE CONOCE DEL TERCER MODIFICATORIO, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

OBJETO DE LA POLIZA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.	2119	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560830395

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

ACGONZALEZ 0

CBDE20700B08FB7957

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000035606** ANEXO: 7

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO INFRAMAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.973.262-6**

ASEGURADO: **CONSORCIO INFRAMAR** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.973.262-6**

BENEFICIARIO: IDENTIFICACIÓN:

TEXTO ITEM 1

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.0076-ARC-CBNL01-2025 REFERENTE A: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE.
LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (PLO)- CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y DENTRO DE LOS LIMITES Y SUBLIMITES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA MISMA, LA COMPAÑÍA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA, POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE EL CONTRATANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2347 DEL CÓDIGO CIVIL.

PERJUICIOS PATRIMONIALES
DAÑO EMERGENTE: VALOR ASEGURADO $427.050.000 EVENTO/VIGENCIA
LUCRO CESANTE: VALOR ASEGURADO $427.050.000 EVENTO/VIGENCIA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES: VALOR ASEGURADO $427.050.000 EVENTO/VIGENCIA.
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES VALOR ASEGURADO $427.050.000 EVENTO/VIGENCIA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS VALOR ASEGURADO $427.050.000 EVENTO/VIGENCIA
RCE PATRONAL VALOR ASEGURADO $427.050.000 EVENTO/VIGENCIA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS VALOR ASEGURADO $427.050.000 EVENTO/VIGENCIA
GASTOS MEDICOS VALOR ASEGURADO $427.050.000 EVENTO/VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA VALOR ASEGURADO $427.050.000 EVENTO/VIGENCIA

NOTA: ASEGURADO/MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ARMADA NACIONAL BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVARNIT : 800.141.645-7 Y CONSORCIO INFRAMAR NIT: : 901.973.262-6.
BENEFICIARIO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ARMADA NACIONAL BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVARNIT : 800.141.645-7 .

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000035606 **ANEXO:** 7 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 3

TOMADOR: CONSORCIO INFRAMAR **IDENTIFICACION:** 901.973.262-6

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CONSORCIO INFRAMAR	901973262-6	SEGUN CONTRATO	CARTAGENA DE INDIAS	0.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

ANEXO 4

INFORME SST INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL SST N 3

PERIODO

01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, ASÍ: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC".

UBICACIÓN

CRA. 2 #10-82 Bocagrande Cartagena de Indias.

ELABORADO POR:

OMAIRA ESTER VENENCIA CASAS

RES.
RESIDENTE HSEQ
CONSLTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
   2.1. OBJETIVO GENERAL 5
   2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 5
   3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
   3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA 7
   3.3. ALCANCE DEL PROYECTO DE OBRA 8
   3.4. ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS 8
4. EJECUCIÓN Y CONTROL DEL SG SST EN OBRA 9
   4.1. MANEJO SST FRENTE CARTAGENA 9
   4.2. SEGUIMIENTO DEL PERSONAL CONTRATO OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025 CARTAGENA. 9
      4.2.1. PERSONAL NUEVO 9
      4.2.2. ANTIGUO ..... ¡Error! Marcador no definido.
      4.2.3. RETIRO 11
      4.2.4. ANALISIS SEGUIMIENTO DE PERSONAL CONTRATO OBRA No.0036-ARC-CBNL01-2025 - CARTAGENA 12
   4.3. ENTREGA DE EPI CONTRATO OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025 - CARTAGENA 13
   4.4. INDUCCIONES CONTRATO OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025 - CARTAGENA 14
   4.5. EXAMENES CONTRATO OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025 - CARTAGENA 15
      4.5.1. EXAMENES CONTRATO OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025 - CARTAGENA 16
   4.6. PLAN DE EMERGENCIAS 16
      4.6.1. CAMILLAS, EXTINTORES Y BOTIQUINES 17
   4.7. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 17
      4.7.1. SANEAMIENTO BÁSICO 17
   4.8. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 17

4.8.1. PROGRAMA DE INSPECCIONES 17
4.8.2. ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS 18
4.8.3. CAPACITACIONES 18
4.8.4. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 19
4.9. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 19
4.9.1. MORBILIDAD Y AUSENTISMO 19
4.9.2. TAREAS DE ALTO RIESGO 20
4.9.3. ACCIDENTALIDAD 20
4.9.4. INDICADORES SST 21
4.10. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA 23
4.10.1. COMITÉS 24
4.11. Registro fotográfico ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5. CONCLUSIONES 24
6. ANEXOS 25

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones de contratista adquiridas a través del contrato **No. 0036-ARC.CBNL01-2025** realizó el contrato de ***"MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, ASÍ: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC",*** se remite a la Base Naval No. 01 ARC "Bolívar" de la armada nacional, el informe Mensual de seguridad y salud en el trabajo No. 2 de la etapa de mantenimiento, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2025.

Documentando el control del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST del proyecto, en el cual se incluye la entrega de documentación de ingreso (inducciones, entrega de EPP, afiliaciones, notificación de riesgo, exámenes de ingreso) y retiros (paz y salvos y notificación de examen de egreso) del personal, pago de seguridad social y honorarios de personal vinculado al proyecto, soportes de formación e inspección, reporte de actos y condiciones inseguras, reporte de accidentalidad e incidentes, reporte del cumplimiento de los indicadores propuestos por el contratista de obra, reporte del cumplimiento del plan de trabajo y gestión adelantada según los formatos SST aplicables al proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Presentar los registros de ejecución y control de las actividades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST del contrato de Obra **No.0036- ARC-CBNL01-2025** ejecutado por el **CONSORCIO INFRAMAR** durante el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2025.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir las actividades desarrolladas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.
- Generar registros que evidencien el cumplimiento de las actividades SST por parte del contrato de obra.
- Cumplir con la totalidad de las actividades SST dando cumplimento a lo establecido en el contrato, a las leyes, decretos, resoluciones, normas, manuales y guías de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente para el contrato.
- Ejecutar las medidas de manejo de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Cumplir con el reporte de pagos de seguridad social del personal de obra
- Reportar el cumplimiento de los indicadores establecidos en el SG-SST.
- Cumplir con la documentación mínima requerida del personal nuevo, antiguo y retiros.
- Cumplir con los lineamientos SST establecidos por la entidad contratante.
- Reportar el manejo de la accidentalidad presentada en el proyecto.
- Reportar el cumplimiento del plan de formación establecidos en el contrato.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Para el presente periodo que comprende del 01 al 31 de Diciembre de 2025, CONSORCIO INFRMAR, da cumplimiento a los requerimientos que plantea la Base Naval No. 01 ARC “Bolívar” de la armada nacional, el informe Mensual Ambiental No. 1 al mantenimiento a todo costo, por el sistema de precios unitarios y sin fórmula de reajuste de los bienes inmuebles de la armada nacional de la fuerza naval del caribe, así: lote 1: mantenimiento instalaciones BNL01 y componentes FNC, en lo concerniente a las actividades de ejecución definidas en el proyecto:

DESCRIPCIÓN	OBRA
N° de Contrato	No. 75-6-10036-25
Nombre	CONSORCIO INFRAMAR
NIT	901.973.262-6
Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, ASÍ: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC
Plazo Total Estimado del Contrato	Dos (2) Meses
Adición al contrato	-
Total de meses de ejecución	Dos (2) Meses
Fecha inicio	14 de agosto 2025
Fecha finalización	31 de diciembre 2025
Fecha finalización adición	-
Representante Legal	MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR
Residente SST	MARÍA VILLAMIZAR VEGA
Dirección	Paseo bolívar cr 17

Tabla 1. Datos generales del proyecto

3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA

El proyecto se ubica en la ciudad de Cartagena y consiste en el mantenimiento de los siguientes frentes:

UNIDAD	MUNICIPIO	ID	INMUEBLE	ESTADO DE LEGALIZACIÓN	DIRECCIÓN
BOLIVAR	CARTAGENA		BASE NAVAL	PROPIEDAD	CRA 2 #10-82 BOCAGRANDE

A continuación, se muestra la zona de intervención:

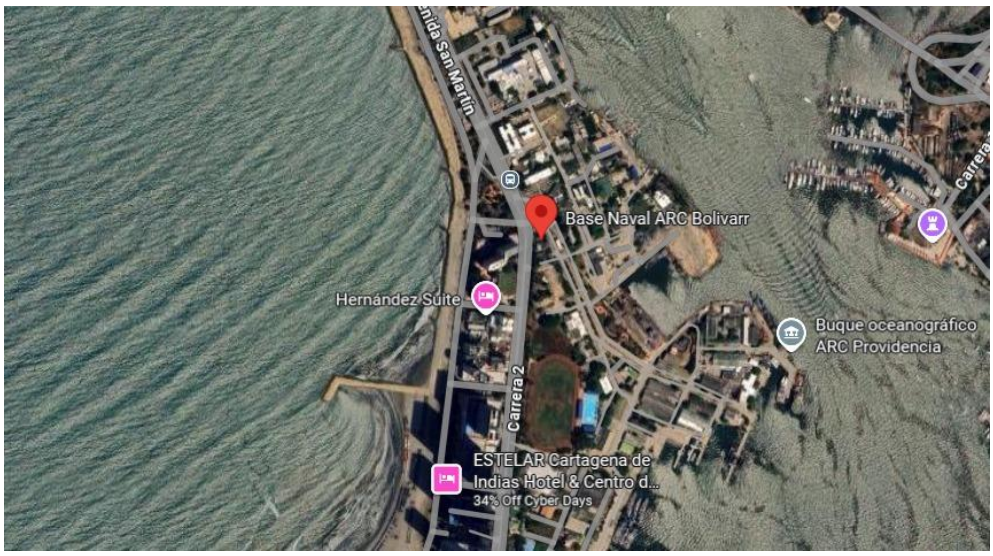




Ilustración 1. Localización del proyecto

3.3. ALCANCE DEL PROYECTO DE OBRA

Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas en la CRA. 2 #10-82 bocagrande Cartagena de Indias.

3.4. ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS

Las actividades constructivas realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de al 31 de Diciembre de 2025, fueron las siguientes:

No	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
1	Demolición
2	Instalación de drywall
3	Instalación de pisos
4	Estuco de muros
5	Estructuración de muros

Tabla 2. Actividades ejecutadas en el periodo de reporte

4. EJECUCIÓN Y CONTROL DEL SG SST EN OBRA

4.1. MANEJO SST FRENTE CARTAGENA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Diciembre de 2025, el contratista desarrollo las siguientes actividades:

- Afiliaciones al sistema general de seguridad social al personal de la etapa construcción.
- Inducciones de ingreso
- Suministro y entrega de dotación
- Prevención y promoción de la salud
- Identificación de equipos de emergencia.
- Seguimiento y reporte de accidentalidad.
- Seguimiento y reporte de actos y condiciones inseguras.
- Registro de tareas de alto riesgo.(no se están realizando)
- Reporte de programa de inspección.
- Desarrollo de plan de formación.
- Inspeccion de equipos y herramientas a utilizar
- Verificacion de orden y aseo en los frentes de obra.

4.2. SEGUIMIENTO DEL PERSONAL CONTRATO OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025 CARTAGENA.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Diciembre de 2025, se presentó el siguiente manejo de personal:

4.2.1. PERSONAL

No	CONTRATISTA	CONTRATO	NOMBRE	CEDULA	CARGO	INGRESO
1	DS SOLUCIONES	LABORAL	Andry Arney Yuco	7.701.209	Oficial	1/09/2025
2	DS SOLUCIONES	LABORAL	Jose Ramiro Perdomo Palacios	1.075.216.296	Maestro	1/09/2025
3	DS SOLUCIONES	LABORAL	Leopoldo Silva Echavez	9.263.699	Ayudante	1/09/2025
4	DS SOLUCIONES	LABORAL	Alfonso Yepes Reina	12.129.046	Oficial	1/09/2025
5	DS SOLUCIONES	LABORAL	Milton Javier Perdomo Palacios	1.117.516.789	Oficial	1/09/2025

No	CONTRATISTA	CONTRATO	NOMBRE	CEDULA	CARGO	INGRESO
6	DS SOLUCIONES	LABORAL	Jose Camilo Perdomo Quiroz	1.076.502.027	Ayudante	1/09/2025
7	DS SOLUCIONES	LABORAL	Cristian Camilo García Rivera	1.075.260.846	Oficial	1/09/2025
8	DS SOLUCIONES	LABORAL	Cesar Eduardo Garzón Olaya	1.075.302.178	Oficial	1/09/2025
9	DS SOLUCIONES	LABORAL	Henry Mallungo Caicedo	1.003.829.320	Ayudante	1/09/2025
10	DS SOLUCIONES	LABORAL	Samuel Mauricio Diaz Tafur	7.733.095	Oficial	1/09/2025
11	DS SOLUCIONES	LABORAL	John Fredy Murgueitio Cabrera	1.117.530.300	Ayudante	1/09/2025
12	CONSORCIO INFRAMAR	LABORAL	Ana María Cuentas Rua	1.128.049.464	RESIDENTE DE OBRA	19/08/2025
13	CONSORCIO INFRAMAR	LABORAL	María Villamizar Vega	32.909.910	COORDINADOR SST	21/08/2025
14	DS SOLUCIONES	LABORAL	David de la oz Medrano	73.206.950	Ayudante	18/09/2025
15	DS SOLCIONES	LABORAL	Jairo Alberto Murillo Pajaro	1.047.426.113	Oficial	18/09/2025
16	DS SOLUCIONES	LABORAL	Rueben Dairo Sierra de la Hoz	1.047.464.128	Ayudante	18/09/2025D
17	DS SOLUCIONES	LABORAL	Deivis Beltran Perez	73189668	Ayudante	10/10/2025
18	DS SOLUCIONES	LABORAL	Agustin Olescuagua urrutria	73128985	Ayudante	10/10/2025
19	DS SOLUCIONES	LABORAL	Carlos Espitia Lopez	1072524941	Ayudante	14/10/2025
20	DS SOLUCIONES	LABORAL	Diego Fernando Perdomo Palaios	1081167616	Ayudante	12/10/2025
21	DS SOLUCIONES	LABORAL	Duverney Ipuz Quintero	1.003.805.630	Ayudante	18/09/2025

Tabla 3. Seguimiento ingreso de personal Contrato No.0036- ARC-CBNL01-2025

4.2.2. RETIRO

Durante el periodo de reporte se presentaron () retiros en el contrato.

No	CONTRATISTA	CONTRATO	NOMBRE	CEDULA	CARGO	RETIRO
1	DS SOLUCIONES	LABORAL	Duverney Ipuz Quintero	1003805630	Ayudante	25/10/2025
2	DS SOLUCIOONES	LABORAL	Ruben Dario Sierra	1047464128	Ayudante	20/10/2025

Tabla 4. Seguimiento personal retirado Contrato No.0036- ARC-CBNL01-2025

4.2.3. ANALISIS SEGUIMIENTO DE PERSONAL CONTRATO OBRA No.0036-ARC-CBNL01-2025 - CARTAGENA

4.2.4.

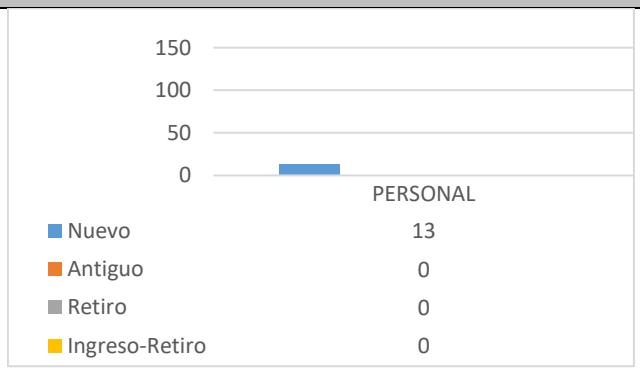
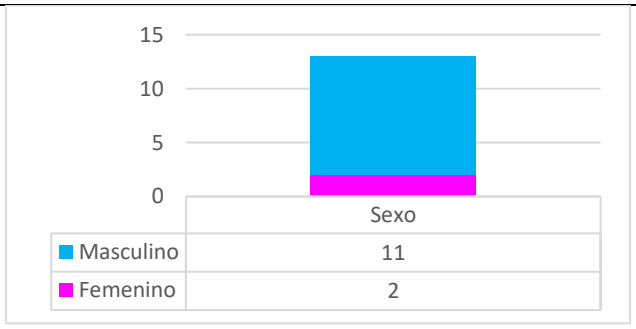
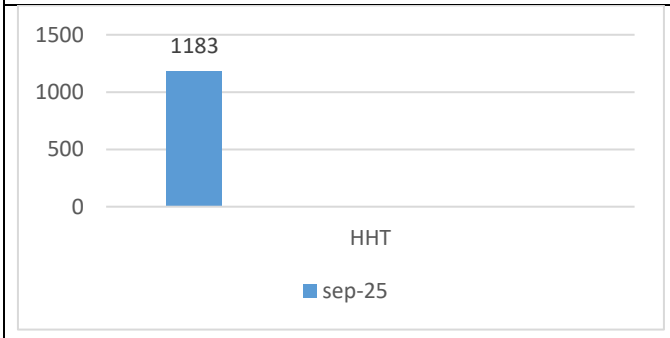
SEGUIMIENTO DE PERSONAL CONTRATO OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025 - CARTAGENA	
	**Total, personal:** 18 Trabajadores Nuevo: 5 personas Antiguo: 13 personas Retiro: 2 personas Ingreso-retiro: 0 persona En el **anexo 2** se presenta el Formato seguimiento de personal
	99,74% Masculino: 11 trabajadores 0,26% Femenino: 2 trabajadores
	En el mes de reporte se registraron 5040 horas hombres trabajadas

Tabla 5. Análisis seguimiento personal contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025

4.3. ENTREGA DE EPI CONTRATO OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025 - CARTAGENA

El durante el periodo de reporte el contratista realizó le entrega de EPP a (05) trabajadores que ingresaron al CONTRATO OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025 – CARTAGENA. En el **anexo 3** se adjuntan los soportes de entrega de EPP'S firmados por cada uno de los trabajadores.

Nombre	Cedula	Cargo	Fecha de entrega epp	Botas	Cascos	Guantes	Gafas	Tapaoidos	Mascarillas
ANDRY ARNEY YUCO	7.701.209	oficial	1/10/2025	1	1	1	1	1	1
JOSE RAMIRO PERDOMO PALACIOS	1.075.216.296	maestro	11/102025	1	1	1	1	1	1
LEOPOLDO SILVA ECHAVEZ	9.263.699	ayudante	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
ALFONSO YEPES REINA	12.129.046	oficial	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
MILTON JAVIER PERDOMO PALACIOS	1.117.516.789	oficial	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
JOSE CAMILO PERDOMO QUIROZ	1.076.502.027	ayudante	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
CRISTIAN CAMILO GARCIA RIVERA	1.075.260.846	oficial	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
CESAR EDUARDO GARZON OLAYA	1.075.302.178	oficial	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
HENRY MALLUNGO CAICEDO	1.003.829.320	ayudante	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
SAMUEL MAURICIO DIAZ TAFUR	7.733.095	oficial	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
JOHN FREDY MURGUEITIO CABRERA	1.117.530.300	ayudante	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
MARIA DEL CARMEN VILLAMIZAR VEGA	32.909.910	coord. sst	21/08/2025	0	1	0	1	1	0
ANA MARIA CUENTAS RUA	1.128.049.464	Residente de obra	19/08/2025	0	1	0	1	1	0
TOTAL				11	13	11	13	13	11

Tabla 6. Entrega de EPP contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025

A continuación, se relaciona el manejo de los EPP por el DS SOLUCIONES - CONSORCIO INFRAMAR:

SEGUIMIENTO	Dic 04
ENTREGA INGRESOS	5
REPOSICIÓN	15
TOTAL	20

Tabla 7. Cobro de EPP contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025

4.4. INDUCCIONES CONTRATO OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025 - CARTAGENA

Durante el periodo el CONSORCIO INFRAMAR realizó (05) inducciones corporativas. Ver **anexo 1**. Algunos temas que se contemplaron dentro de la inducción fueron:

- Presentación de la empresa y generalidades.
- Políticas corporativas (HSEQ, No alcohol, drogas y tabaquismo, seguridad vial, derechos humanos, no acoso laboral, cliente).
- Presentación del sistema integrado de gestión.
- Control y distribución de documentación.

- Aspectos legales en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
- Deberes y derechos del sistema de riesgos laborales.
- Peligros para la seguridad y salud en el trabajo presentes en la labor, así como sus medidas de prevención y control.
- Formación, prevención y peligros de orden público en la zona.
- Aspectos e impactos ambientales presentes en la labor, así como sus medidas de prevención y control.
- Programas del sistema integrado de gestión (Gestión de riesgos, Programas de Vigilancia Epidemiológica y Gestión Ambiental).
- Reglamentos de higiene y seguridad industrial (ARL de la empresa).
- Uso adecuado y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal.
- Funciones y Responsabilidades específicas en HSE de acuerdo con su cargo, descritas en el Manual de Funciones y Descripción del Puesto de trabajo.
- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
- Comité de convivencia laboral.
- Planes de emergencia en la empresa y procedimiento en caso de accidente de trabajo.

Durante el mes se presentaron 4 sesión (no se a terminado), teniendo una duración de 1 horas, con una cobertura de 13 trabajadores:

Fecha	Tema	Sesiones	Tiempo	N° de Asistentes	
			Horas	Asist.	Prog.
8/09/2025	Inducción SST	1	1	05	05
TOTAL		1	1	05	05

Tabla 8. Reporte de inducciones Contrato OBRA No. 75-6-10036-25
Fuente. Autor

4.5. EXAMENES CONTRATO OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025 - CARTAGENA

Durante el mes de reporte, se realizó un total de (05) exámenes médicos de ingreso.

Acorde a los resultados se realizó la línea base de condiciones de salud con base en las recomendaciones del examen ocupacional de ingreso. Ver **anexo 1**

Al personal que se retiró se le realizo la notificación de examen de egreso; sin embargo, ninguno asistió a su realización.

TIPO DE EXAMEN MEDICO	CANTIDAD
Examen de ingreso	13
Examen periódico	0
Examen egreso	0

Tabla 9. Seguimiento exámenes médicos contratista

4.5.1. EXAMENES CONTRATO OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025 - CARTAGENA

Durante el periodo de reporte se validó 13 exámenes de ingreso, a continuación, se presenta el seguimiento realizado a los exámenes del periodo de reporte:

No	EMPRESA	NOMBRE	CC	CARGO	EMO	RECOMENDACIÓN
1	DS SOLUCIONES	Deivis beltran Perez	73189868	Ayudante	16/10/2025	Uso de EPP, hábitos saludables, realización de pausas activas.
2	DS SOLUCIONES	Agustin OLescuagua Urrutria	73128085	Ayudante	23/08/2025	Uso de EPP, hábitos saludables, realización de pausas activas,
3	DS SOLUCIONES	Carlos espitia lopez	1072524941	ayudante	23/08/2025	Uso de EPP, hábitos saludables, realización de pausas activas.
4	DS SOLUCIONES	Diego Fernando Perdomo	1081157616	oficial	23/08/2025	Uso de EPP, hábitos saludables, realización de pausas activas, seguimiento visual.
5	DS SOLUCIONES	Wilfran Escorcia Moreno	100710056	Ayudante	23/08/2025	Uso de EPP, hábitos saludables, realización de pausas activas.

Tabla 10. Seguimiento de recomendaciones médicas Contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025
Fuente. Autor

4.6. PLAN DE EMERGENCIAS

Se informa que durante el periodo de reporte no se presentaron emergencias en el contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025

4.6.1. CAMILLAS, EXTINTORES Y BOTIQUINES

El CONSORCIO INFRAMAR informa que, en instalaciones de las oficinas y frentes de obra, se cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias que son de la base tales como camilla y extintores los cuales se encuentran en condiciones adecuadas, para el periodo de reporte se contó con los siguientes elementos de emergencia.

FRENTE	Punto de hidratación	Punto ecológico	Baños	Elementos de emergencia (Botiquín Camillas, Extintor
Frente CARTAGENA	1 unidad	0 unidad	2 unidad	4 unidades

Tabla 11. Relación elementos de emergencia Contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025
Fuente. Autor

4.7. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

4.7.1. SANEAMIENTO BÁSICO

El Contratista en el presente informe no cuenta con baños portatiles lo cual esta incmpliendo con lo qe pide la resolcion 2400 de 1979 qe exije que por cada 10 trabajadores debe contar con una bateria sanitaria y realizar su respectiva limpieza constantemente.

Nota : El contratista usa los baños de la base naval en los diferentes frentes donde realiza actividades .

Ítems	Frentes de Obra	Unidades Sanitarias	Genero		Lavamanos
			M	F	
1	Frente Base Naval	2	1	1	1

Tabla 12. Puntos Sanitarios activos contrato de Obra No.0036- ARC-CBNL01-2025

4.8. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

4.8.1. PROGRAMA DE INSPECCIONES

Durante el periodo de reporte, se informa que con forme al plan de trabajo se realizaron actividades de inspección de elementos de protección personal, orden y aseo y herramientas menores.

INSPECCIÓN REALIZADA	FECHA	FRENTE	OBSERVACION	PLAN DE ACCIÓN
Camilla y Botiquín	02/12/2025	CARTAGENA	Ninguna	NA
Extintores	02/12/2025	CARTAGENA	Ninguna	NA
Inspección EPP	02/12/2025	CARTAGENA	Ninguna	NA
Preoperacional taladro	02/12/2025	CARTAGENA	Ninguna	NA
Preoperacional pulidora	02/12/2025	CARTAGENA	Ninguna	NA
Preoperacional Taladro neumático	n/a	CARTAGENA	Ninguna	NA

Tabla 13. Seguimiento inspecciones contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025
Fuente. Autor

En el **anexo 4** se presentan los soportes de inspección correspondientes.

4.8.2. ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS

Durante el periodo de reporte se presentaron (0) actos y condiciones inseguras.

4.8.3. CAPACITACIONES

Durante el mes de reporte se realizan 4 sesiones de formación en 5 minutos presentado un 100 % en la cobertura:

Fecha	Tema	Sesiones	Tiempo	No Asistentes	
			Horas	Prog.	Cobe.
11/12/2025	Herramientas cortantes	1	5m	17	17
12/12/2025	Accidentes e incidentes	1	5m	16	16
05/12/2025	Proteccion solar	1	5m	16	16
06/12/2025	Ingreso y salida del personal del batallon	1	5m	10	10
TOTAL		1	1	10	10

Tabla 14. Seguimiento capacitaciones contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025

En el **anexo 4** se presentan los soportes de capacitación del contratista

4.8.4. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Se realiza la identificación y almacenamiento de las sustancias químicas registradas en el proyecto conforme a lo establecido en el procedimiento de sustancias químicas del SG SST del proyecto y el decreto 1496 de 2018 el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

Para ello se realizó el registro de los productos químicos a través del “inventario de sustancias químicas”, el cual se presenta en el **anexo 7** del presente documento.

4.9. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

4.9.1. MORBILIDAD Y AUSENTISMO

Durante el periodo de reporte se presentaron (0) días de ausentismo laboral.

No	Nombre	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de finalización	TIPO						Días
					EG	EL	AL	PT	VC	IN	perdidos
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL					0	0	0	0	0	0	0
EG (Enfermedad General) - EL (Enfermedad Laboral) - AL (Accidente Laboral) - PT (Permiso de trabajo) - VC											

Tabla 15. Seguimiento ausentismo contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025

4.9.2. TAREAS DE ALTO RIESGO

En el periodo de reporte,no se están realizaron actividades de alto riesgo.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	TIPO	FECHA	FRENTE	OBSERVACIONES
n/a	n/a		CARTAGENA	NINGINA

Tabla 16. Seguimiento ATS contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025

En el **anexo 5**, se presenta los soportes correspondientes de los ATS mencionados.

4.9.3. ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo de reporte no se presentaron accidentes laborales.

- **SEGUIMIENTO DE ACCIDENTALIDAD DEL PROYECTO**

Durante la ejecución del contrato se han presentado los siguientes casos y cierres de accidentalidad

INFORME	PERIODO	AL	DIAS DE INCAPACIDAD	TIPO AL	FECHA	NOMBRE AFECTADO	PARTE AFECTADA	CIERRE O TRAMITE
1	na	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1	na	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Tabla 19. Consolidado AL- contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025
Fuente. Autor

4.9.4. INDICADORES SST

A continuación, se relaciona los indicadores reportados por el CONSORCIO INFRAMAR, para el periodo de reporte.

NOMBRE	FÓRMULA	VARIABLES	CALCULO			RESULTADO	
Severidad de accidentalidad	(Número días perdidos por accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Número de días laborales perdidos por accidentes de trabajo	Número de días perdidos AT * 100 / Número de trabajadores			0 / 18 * 100	0%
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes	Numero de AT * 100 / Número de trabajadores			0 / 18 * 100	0%
Proporción accidentes mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Número de accidentes mortales de trabajo que se presentaron en el mes	Numero de AT mortales * 100 / Número de trabajadores			0 / 18 * 100	0%
Prevalencia de la enfermedad laboral	(Número de enfermedad laboral en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Número de enfermedad laboral presentado en el mes	Numero de EL * 100 / Número de trabajadores			0 / 18 * 100	0%
Prevalencia de la enfermedad laboral	((Número de casos nuevos de enfermedad laboral / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	Número de enfermedad laboral presentado en el mes	Número de casos nuevos EL * 100 / Número de trabajadores			0 / 18 * 100	0%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	0	Número de días de trabajo programados en el mes	19	((22/25)*100) *100 / (22*25)	0%
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	Capacitaciones realizadas	6	Capacitaciones programadas	6	6 / 6 * 100	100%

NOMBRE	FÓRMULA	VARIABLES	CALCULO			RESULTADO	
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingreso en el periodo *100	Número de personas con Inducciones realizada en el periodo	13	Personal que ingreso en el periodo	13	$\frac{18}{18} * 100$	100%
%Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el contratista, interventor o supervisor.	Número inspecciones realizadas	5	Número de inspecciones programadas	5	$\frac{5}{5} * 100$	100%
% Cumplimiento del Plan HSE ó SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	Número de actividades realizadas	12	Número de actividades programadas	12	$\frac{12}{12} * 100$	100%
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	Número de afiliados al SGSSI	13	Número de trabajados contratados	13	$\frac{18}{18} * 100$	100%
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	Número de participantes en actividades de capacitación	6	Número de personas con necesidades de capacitación	6	$\frac{6}{6} * 100$	100%
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	Número de acciones correctivas cerradas	0	Número de hallazgos	0	$\frac{0}{0} * 100$	100%

Tabla 20. Indicadores de gestión contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025

Se cumplimiento al 100% de las actividades, dando cumplimiento con las actividades SST en el mes de reporte.

4.10. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

De acuerdo con el cronograma de actividades SST del contrato OBRA No. 75-6-10036-25 ejecutado por el CONSORCIO INFRAMAR se tuvo un cumplimiento del 100% de las 13 actividades programadas.

ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS	13
REPROGRAMADAS	0
EJECUTADAS	13
CUMPLIMIENTO	100%

Tabla 21. Actividades cronograma de actividades Contrato No.0036- ARC-CBNL01-2025

A continuación, se relaciona las actividades programadas por el contratista para el periodo del presente informe:

No	ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN	ESTADO DE ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN O REPROGRAMACIÓN
1	Inducción SGSS, ATEP, EPP, Plan de emergencias, Socialización RHSI, Políticas, COPASST, socialización del proyecto, protocolos de bioseguridad. (A demanda)	Participaron 13 personas (aun esta en proceso)	EJECUTADA	TODO EL MES
2	Socialización de procedimientos (incluido en la inducción general).	Participaron 13 personas	EJECUTADA	TODO EL MES
3	Notificaciones de riesgos (A demanda)	Participaron 13 personas	EJECUTADA	TODO EL MES
4	Investigación accidentes de trabajo (A demanda)	Para el presente periodo no se presentaron accidentes laborales	EJECUTADA	NO APLICA
5	Investigación accidentes e incidentes	Para el presente periodo no se presentaron accidentes laborales	EJECUTADA	NO APLICA
6	Exámenes médicos de ingreso	Se realizó a 13 personas	EJECUTADA	TODO EL MES
7	Exámenes médicos de egreso	Durante el mes no se presentaron retiros de personal	EJECUTADA	NO APLICA
8	Realización/Actualización inventario de sustancias químicas	Se realizó inventario	EJECUTADA	MES DE REPORTE
9	Socialización plan de emergencias	Se socializó en la inducción general a 13 personas	EJECUTADA	TODO EL MES
10	Reporte, atención y evaluación de emergencias presentadas (A demanda)	No se presentaron emergencias durante el periodo, por lo cual no fue requirió su realización	EJECUTADA	NO APLICA

Tabla 19. Actividades programadas por el contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025 plan de trabajo SST
Fuente. Autor

4.10.1. COMITÉS

- **COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

En el presente mes el contratista no presento evidencias de renion de comité paritario de sald ocpacional.

- **COMITÉ PARITARIO DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLA)**

En el presnete mes el contratista no presento evidencias de realizacion de comité de convivencia

- **BRIGADA DE EMERGENCIAS**

Dando cumplimiento legal, el CONSORCIO INFRAMAR conformó la brigada de emergencias el 3 de septiembre de 2025,

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
1	MARÍA VILLAMIZAR VEGA	COORDINADOR BRIGADA
2	MILTON PERDOMO PALACIOS	BRIGADISTA

Tabla 24. Conformación brigada de emergencias
Fuente. Autor

5. CONCLUSIONES

5.1. Conclusiones gestión contratista de obra

- Durante el período no se presentaron accidentes laborales, a continuación, se presenta el resumen de los indicadores de accidentalidad presentados en el mes:
  - **Frecuencia de accidentalidad:** Se determinó que en el periodo de reporte se generó un índice de frecuencia de 0 accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores.
  - **Severidad de accidentalidad:** Para el mes de reporte se perdió 0% días por accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores.
  - **Accidentes mortales:** No han ocurrido accidentes mortales, por tal motivo el porcentaje de accidentes de trabajo mortales en el periodo de reporte es de 0.

- **Prevalencia de la enfermedad laboral:** No se han reportado enfermedades laborales por tal motivo la cantidad de casos la cantidad de casos de enfermedad laboral por cada 100.000 trabajadores durante el periodo de reporte es de 0.
- **Incidencia de la enfermedad laboral:** No se han reportado enfermedades laborales por tal motivo por cada 100.000 trabajadores, existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral.
- **Ausentismo por causa medica**: 0% se perdió de los días programados de trabajo.

- Del programa de inspección se cumplió con 100% de las inspecciones programadas (6 de 6 inspecciones).
- Para el programa de capacitación se cumplió con el 100% según lo programado (4 de 4 capacitación).
- Se cumplió con la documentación de ingreso de los 13 trabajadores que se incorporaron en el periodo (inducciones, afiliaciones de seguridad social, entrega de EPP).
- El contratista garantizo el pago de nómina y seguridad social del 100% de sus trabajadores teniendo una cobertura a los 13 trabajadores incorporados en el periodo.
- Se realizó la reunión del COPASST y COCOLA el no se han realizado.

6. ANEXOS

Anexo 1 Registro inspecciones

Anexo 2. Registro entrega de EPP


Anexo 3. Registro capacitaciones

Anexo 4. Registro de ATS y permiso de trabajo

Anexo 5. Acta utilización de escombros

Anexo 6. Seguridad social


Anexo 7. Registro fotográfico

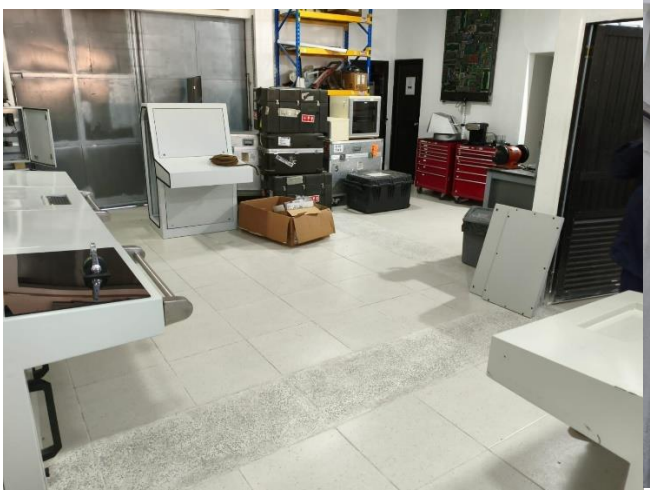







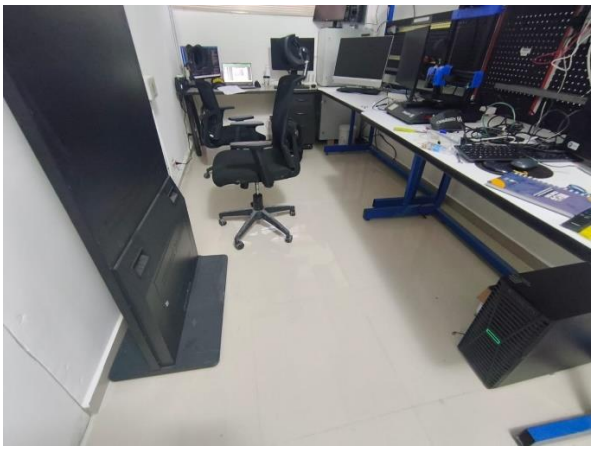

















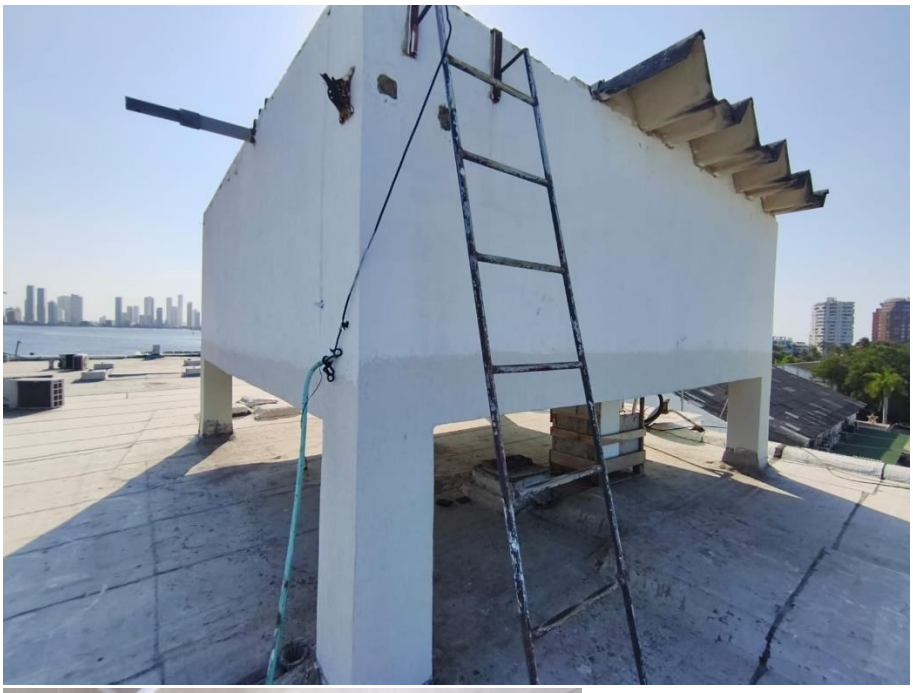

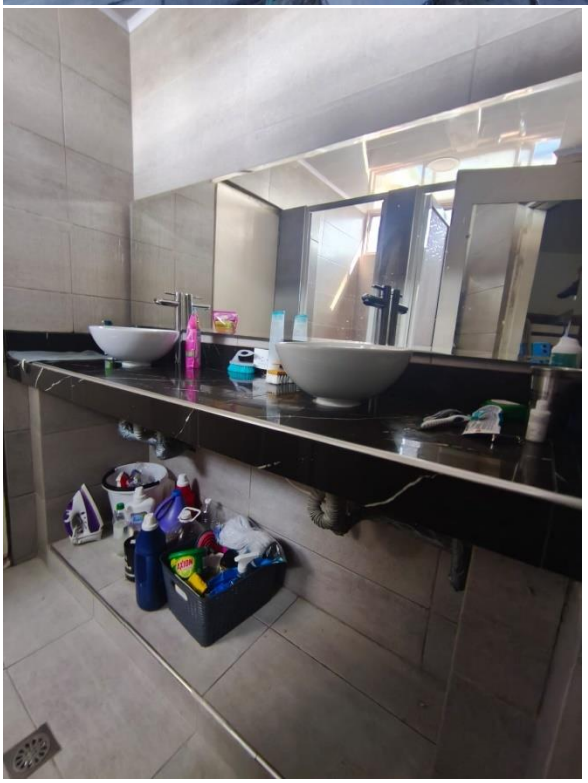









CONSORCIO INFRAMAR

VERSIÓN 1	FORMATO DE INSPECCION EN OBRA	CÓDIGO: BN1-SST-FM-62
FECHA: 01/11/2024		PAGINA: 1 de 1

Fecha de realización de la inspección: 26/09/2025

Lugar de la inspección: BASE NAVAL - CTG **Inspección No.** 2

Área de trabajo a inspeccionar: Frente 2 - Frente 4

ITEM	SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	La iluminacion es adecuada para la labor desarrollada en cada uno de los espacios de las instalaciones.	✓			
2	Percepcion de particulas en el ambiente.	✓			
3	Materiales de obra organizados.	✓			
4	Senderos peratonales Habilitados y señalizados.			✓	
5	Los frentes de obra cuentan con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente, separado por sexo, ventilados y en perfecto funcionamiento.	✓			
6	Los servicios sanitarios estan dotados de elementos de Higiene personal(jabon, toallas desechables, papel higienico).	✓			
7	Existen lugares adecuados para el consumo de alimentos y descanso adecuado de los trabajadores.	✓			
8	Existen recipientes para la recoleccion interna de desechos solidos o basuras.(suficientes,adecuados, bien ubicados e identificados.)	✓			
9	Las basuras se remueven con frecuencia necesaria para evitar la generacion de olores, contaminacion y proliferacion de plagas.	✓			
10	Los sitios aledaños a los frentes de trabajo se encuentran aseados y limpios.	✓			
11	Existen equipos e implementos de seguridad claramente ubicados y en funcionamiento.	✓			
12	Es adecuado el nivel del suelo y las areas resbalosas.	✓			
13	El sitio de almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas, cuentan con la ventilación adecuada?	✓			
14	Los productos químicos llevan una marca que permite su identificación y en casos de ser peligrosos adicionalmente llevan una etiqueta donde se especifica los peligros y precauciones de seguridad?	✓			
15	Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	✓			
16	Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?		✓		

Nombres y apellidos de quien realiza la inspección:	MARÍA VILLAMIZAR	**FIRMA:**	
Nombres y apellidos responsable de área:	JOSE [illegible]	**FIRMA:**	

Nota: En caso de observar en la inspeccion realizada la necesidad de elaborar procedimientos o tomar acciones que eliminen , reduzcan o minimicen el riesgo mencione en la casilla de observaciones sus recomendaciones.

CONSORCIO INFRAMAR

VERSIÓN 1	FORMATO DE INSPECCION EN OBRA	CÓDIGO: BN1-SST-FM-62
FECHA: 01/11/2024		PAGINA: 1 de 1

Fecha de realización de la inspección: 24/12/2025

Lugar de la inspección: BASE NAVAL - CT6 **Inspección No.** 5

Área de trabajo a Inspeccionar: FRENTE 7 - 6

ITEM	SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	La iluminacion es adecuada para la labor desarrollada en cada uno de los espacios de las instalaciones.	✓			
2	Percepcion de particulas en el ambiente.	✓			
3	Materiales de obra organizados.	✓			
4	Senderos peratonales Habilitados y señalizados.			✓	
5	Los frentes de obra cuentan con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente, separado por sexo, ventilados y en perfecto funcionamiento.	✓			
6	Los servicios sanitarios estan dotados de elementos de Higiene personal(jabon, toallas desechables, papel higienico).	✓			
7	Existen lugares adecuados para el consumo de alimentos y descanso adecuado de los trabajadores.	✓			
8	Existen recipientes para la recoleccion interna de desechos solidos o basuras.(suficientes,adecuados, bien ubicados e identificados.)	✓			
9	Las basuras se remueven con frecuencia necesaria para evitar la generacion de olores, contaminacion y proliferacion de plagas.	✓			
10	Los sitios aledaños a los frentes de trabajo se encuentran aseados y limpios.	✓			
11	Existen equipos e implementos de seguridad claramente ubicados y en funcionamiento.	✓			
12	Es adecuado el nivel del suelo y las areas resbalosas.	✓			
13	El sitio de almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas, cuentan con la ventilación adecuada?	✓			
14	Los productos químicos llevan una marca que permite su identificación y en casos de ser peligrosos adicionalmente llevan una etiqueta donde se especifica los peligros y precauciones de seguridad?	✓			
15	Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	✓			
16	Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	✓			

Nombres y apellidos de quien realiza la inspección:	MARIA VILLAMIZAR	**FIRMA:**	MARIA V
Nombres y apellidos responsable de área:	CARLOS COMBARIZA	**FIRMA:**	

Nota: En caso de observar en la inspeccion realizada la necesidad de elaborar procedimientos o tomar acciones que eliminen , reduzcan o minimicen el riesgo mencione en la casilla de observaciones sus recomendaciones.

CONSORCIO INFRAMAR

VERSIÓN 1 FECHA: 01/11/2024	FORMATO DE INSPECCION EN OBRA	CÓDIGO: BN1-SST-FM-62 PAGINA: 1 de 1

Fecha de realización de la inspección: 5/11/2025


Lugar de la inspección: BASE NAVAL - CTG **Inspección No.** 3

Área de trabajo a inspeccionar: FRENTE 4-7-14

ITEM	SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	La iluminacion es adecuada para la labor desarrollada en cada uno de los espacios de las instalaciones.	✓			
2	Percepcion de particulas en el ambiente.	✓			
3	Materiales de obra organizados.	✓			
4	Senderos peratonales Habilitados y señalizados.			✓	
5	Los frentes de obra cuentan con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente, separado por sexo, ventilados y en perfecto funcionamiento.	✓			
6	Los servicios sanitarios estan dotados de elementos de Higiene personal(jabon, toallas desechables, papel higienico).	✓			
7	Existen lugares adecuados para el consumo de alimentos y descanso adecuado de los trabajadores.	✓			
8	Existen recipientes para la recoleccion interna de desechos solidos o basuras.(suficientes,adecuados, bien ubicados e identificados.)	✓			
9	Las basuras se remueven con frecuencia necesaria para evitar la generacion de olores, contaminacion y proliferacion de plagas.	✓			
10	Los sitios aledaños a los frentes de trabajo se encuentran aseados y limpios.	✓			
11	Existen equipos e implementos de seguridad claramente ubicados y en funcionamiento.	✓			
12	Es adecuado el nivel del suelo y las areas resbalosas.	✓			
13	El sitio de almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas, cuentan con la ventilación adecuada?	✓			
14	Los productos químicos llevan una marca que permite su identificación y en casos de ser peligrosos adicionalmente llevan una etiqueta donde se especifica los peligros y precauciones de seguridad?	✓			
15	Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	✓			
16	Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	✓			

Nombres y apellidos de quien realiza la inspección:	MARÍA VILLAMIZAR	**FIRMA:**	MARÍA V.
Nombres y apellidos responsable de área:	JOSE FRANCISCO PEREZ	**FIRMA:**	

Nota: En caso de observar en la inspeccion realizada la necesidad de elaborar procedimientos o tomar acciones que eliminen , reduzcan o minimicen el riesgo mencione en la casilla de observaciones sus recomendaciones.

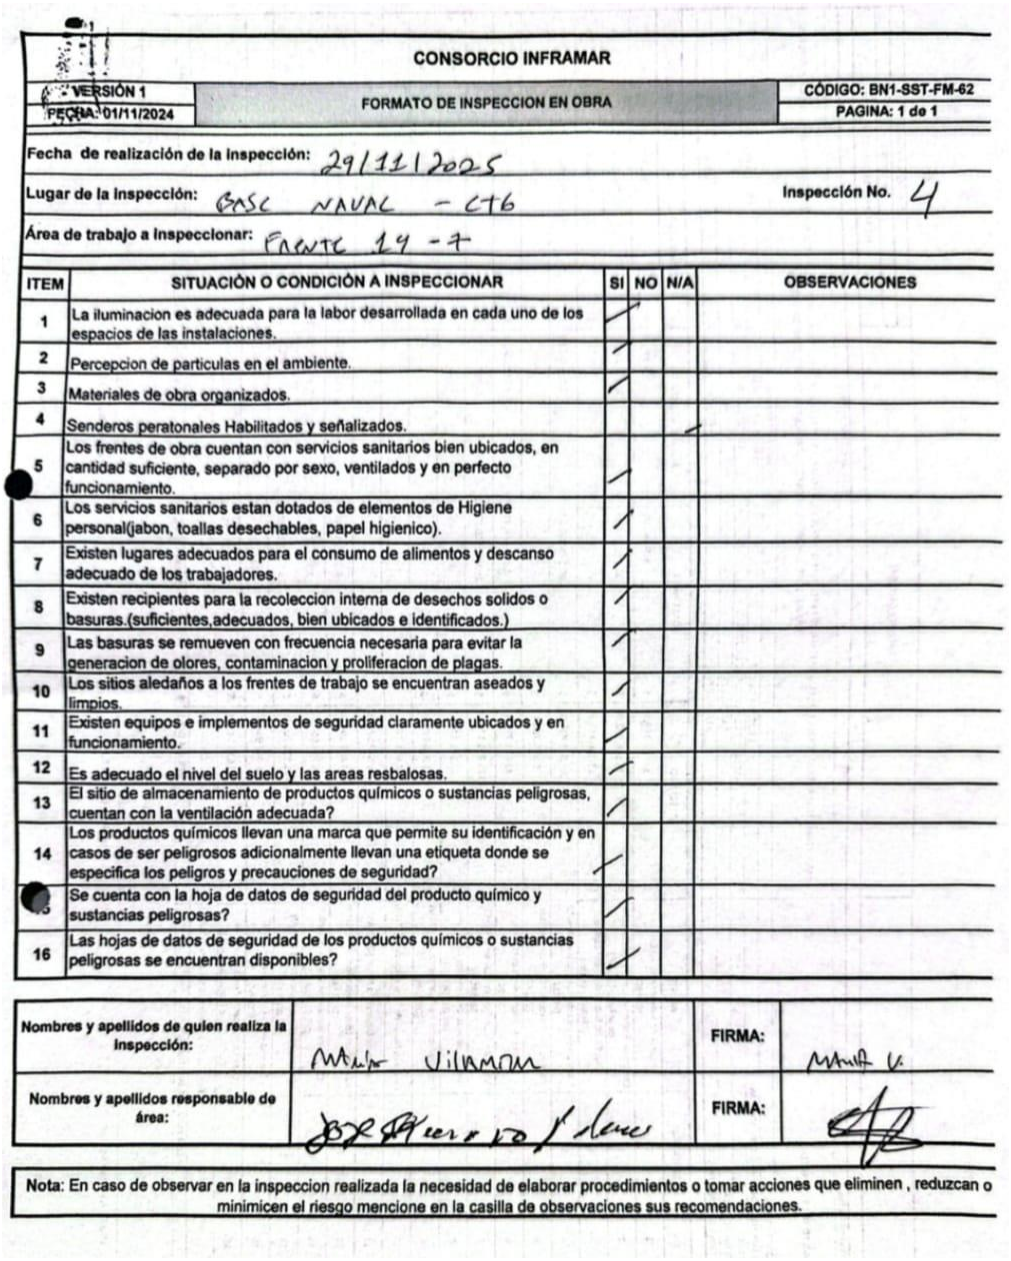

CONSORCIO INFRAMAR

VERSIÓN 1 FECHA: 01/11/2024	FORMATO DE INSPECCION EN OBRA	CÓDIGO: BN1-SST-FM-62 PAGINA: 1 de 1

Fecha de realización de la inspección: 29/11/2025

Lugar de la inspección: BASE NAVAL - CTG — Inspección No. 4

Área de trabajo a inspeccionar: FRENTE 14 - 7

ITEM	SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	La iluminacion es adecuada para la labor desarrollada en cada uno de los espacios de las instalaciones.	✓			
2	Percepcion de particulas en el ambiente.	✓			
3	Materiales de obra organizados.	✓			
4	Senderos peratonales Habilitados y señalizados.			✓	
5	Los frentes de obra cuentan con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente, separado por sexo, ventilados y en perfecto funcionamiento.	✓			
6	Los servicios sanitarios estan dotados de elementos de Higiene personal(jabon, toallas desechables, papel higienico).	✓			
7	Existen lugares adecuados para el consumo de alimentos y descanso adecuado de los trabajadores.	✓			
8	Existen recipientes para la recoleccion interna de desechos solidos o basuras.(suficientes,adecuados, bien ubicados e identificados.)	✓			
9	Las basuras se remueven con frecuencia necesaria para evitar la generacion de olores, contaminacion y proliferacion de plagas.	✓			
10	Los sitios aledaños a los frentes de trabajo se encuentran aseados y limpios.	✓			
11	Existen equipos e implementos de seguridad claramente ubicados y en funcionamiento.	✓			
12	Es adecuado el nivel del suelo y las areas resbalosas.	✓			
13	El sitio de almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas, cuentan con la ventilación adecuada?	✓			
14	Los productos químicos llevan una marca que permite su identificación y en casos de ser peligrosos adicionalmente llevan una etiqueta donde se especifica los peligros y precauciones de seguridad?	✓			
15	Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	✓			
16	Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	✓			

Nombres y apellidos de quien realiza la inspección:	Mauricio Villamar	FIRMA:	
Nombres y apellidos responsable de área:	[illegible]	FIRMA:	

Nota: En caso de observar en la inspeccion realizada la necesidad de elaborar procedimientos o tomar acciones que eliminen , reduzcan o minimicen el riesgo mencione en la casilla de observaciones sus recomendaciones.

}

CONSORCIO INFRAMAR

VERSIÓN 1	FORMATO DE INSPECCION EN OBRA	CÓDIGO: BN1-SST-FM-62
FECHA: 01/11/2024		PAGINA: 1 de 1

Fecha de realización de la inspección: 26/09/2025


Lugar de la inspección: BASE NAVAL - CTG **Inspección No.** 2

Área de trabajo a inspeccionar: Frente 2 - Frente 4

ITEM	SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	La iluminacion es adecuada para la labor desarrollada en cada uno de los espacios de las instalaciones.	✓			
2	Percepcion de particulas en el ambiente.	✓			
3	Materiales de obra organizados.	✓			
4	Senderos peratonales Habilitados y señalizados.			✓	
5	Los frentes de obra cuentan con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente, separado por sexo, ventilados y en perfecto funcionamiento.	✓			
6	Los servicios sanitarios estan dotados de elementos de Higiene personal(jabon, toallas desechables, papel higienico).	✓			
7	Existen lugares adecuados para el consumo de alimentos y descanso adecuado de los trabajadores.	✓			
8	Existen recipientes para la recoleccion interna de desechos solidos o basuras.(suficientes,adecuados, bien ubicados e identificados.)	✓			
9	Las basuras se remueven con frecuencia necesaria para evitar la generacion de olores, contaminacion y proliferacion de plagas.	✓			
10	Los sitios aledaños a los frentes de trabajo se encuentran aseados y limpios.	✓			
11	Existen equipos e implementos de seguridad claramente ubicados y en funcionamiento.	✓			
12	Es adecuado el nivel del suelo y las areas resbalosas.	✓			
13	El sitio de almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas, cuentan con la ventilación adecuada?	✓			
14	Los productos químicos llevan una marca que permite su identificación y en casos de ser peligrosos adicionalmente llevan una etiqueta donde se especifica los peligros y precauciones de seguridad?	✓			
15	Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	✓			
16	Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	✓			

Nombres y apellidos de quien realiza la inspección:	MARÍA VILLAMIZAR	**FIRMA:**	
Nombres y apellidos responsable de área:	JOSE [illegible]	**FIRMA:**	

Nota: En caso de observar en la inspeccion realizada la necesidad de elaborar procedimientos o tomar acciones que eliminen , reduzcan o minimicen el riesgo mencione en la casilla de observaciones sus recomendaciones.

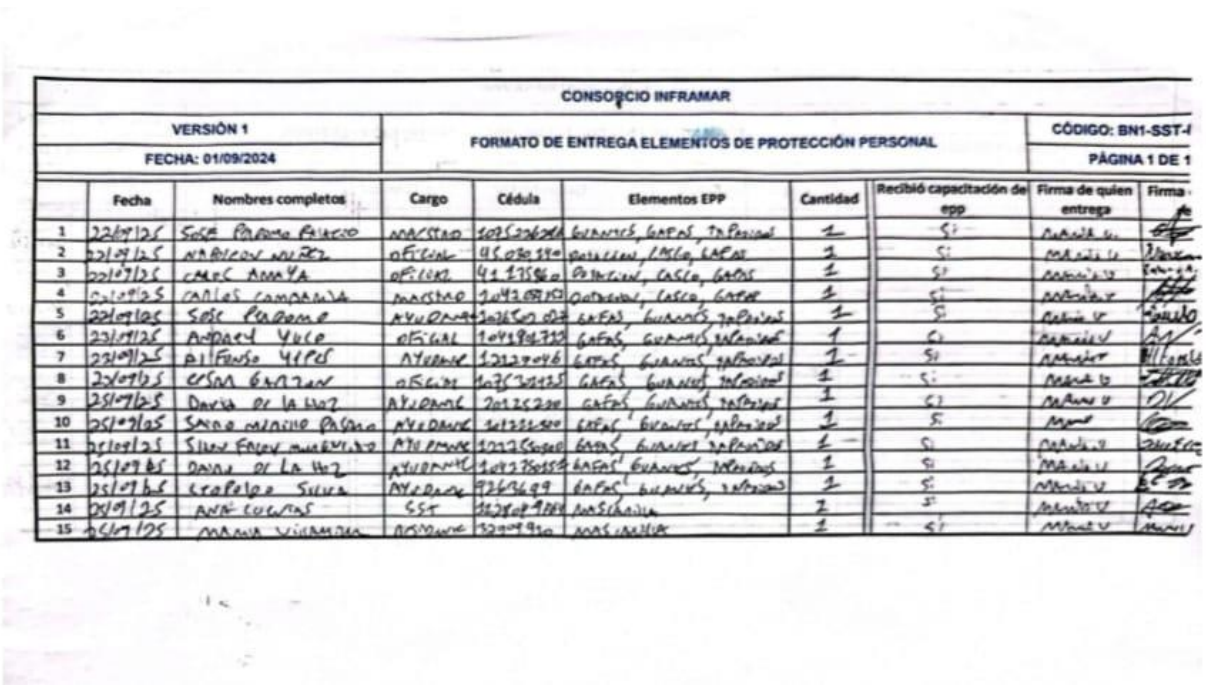

CONSORCIO INFRAMAR

VERSIÓN 1 FECHA: 01/09/2024	FORMATO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CÓDIGO: BN1-SST-F PÁGINA 1 DE 1

	Fecha	Nombres completos	Cargo	Cédula	Elementos EPP	Cantidad	Recibió capacitación de epp	Firma de quien entrega	Firma
1	22/09/25	JOSE PERDOMO PALACIO	MAESTRO	1035226048	GUANTES, GAFAS, TAPABOCAS	1	SI		
2	22/09/25	MARLON MUÑOZ	OFICIAL	95030190	GUANTES, CASCO, GAFAS	1	SI		
3	22/09/25	CAMILO AMAYA	OFICIAL	1117530	GUANTES, CASCO, GAFAS	1	SI		
4	22/09/25	CARLOS CAMARGO	MAESTRO	1042	GUANTES, CASCO, GAFAS	1	SI		
5	22/09/25	JOSE PERDOMO	AYUDANTE	1076	GAFAS, GUANTES, TAPABOCAS	1	SI		
6	23/09/25	ANDRES YUCA	OFICIAL	1049	GAFAS, GUANTES, TAPABOCAS	1	SI		
7	23/09/25	ALFONSO YEPES	AYUDANTE	1212	GAFAS, GUANTES, TAPABOCAS	1	SI		
8	24/09/25	CESAR BARRAZA	OFICIAL	1073	GAFAS, GUANTES, TAPABOCAS	1	SI		
9	25/09/25	DAVID DE LA HOZ	AYUDANTE	1012	GAFAS, GUANTES, TAPABOCAS	1	SI		
10	25/09/25	SARGO MANCILLA PASTRANA	AYUDANTE	1012	GAFAS, GUANTES, TAPABOCAS	1	SI		
11	25/09/25	SILVIO ENRIQUE MARTINEZ	AYUDANTE	1012	GAFAS, GUANTES, TAPABOCAS	1	SI		
12	25/09/25	DAVID DE LA HOZ	AYUDANTE	1012	GAFAS, GUANTES, TAPABOCAS	1	SI		
13	25/09/25	LEOPOLDO SILVA	AYUDANTE	9263699	GAFAS, GUANTES, TAPABOCAS	1	SI		
14	26/09/25	ANA LUCIANA	SST	1129	MASCARILLA	1	SI		
15	26/09/25	MARIA VILLAMIZAR	AYUDANTE	1129	MASCARILLA	1	SI		



CONSORCIO INFRAMAR

VERSIÓN 1 FECHA: 01/09/2024	FORMATO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CÓDIGO: BN1-SST-F PÁGINA 1 DE 1

	Fecha	Nombres completos	Cargo	Cédula	Elementos EPP	Cantidad	Recibió capacitación de	Firma de quien entrega	Firma d
1	28/11/2025	CARLOS GARCIA	AYUDANTE	1117530300	guantes	1	SI		
2	28/11/2025	LEOPOLDO SILVA	AYUDANTE	9263699	guantes	1	SI		
3	28/11/2025	JOSE PERDOMO	AYUDANTE	1076502027	gafas,mascarilla	1	SI		
4	28/11/2025	UBALDO OROZCO	OFICIAL	9145632	gafas,guantes	1	SI		
5	28/11/2025	AGUSTIN OLASCUAGA	OFICIAL	73128985	gafas,guantes	1	SI		
6	19/11/2025	WILFRAN ESCORCIA	AYUDANTE	1007170056	gafas,guantes	1	SI		
7	19/11/2025	DIMAX LAVAO	AYUDANTE	1003828588	dotacion,gafas,guantes	1	SI		
8	29/11/2025	LUIS SARABIA	OFICIAL	8801699	dotacion,gafas,guantes	1	SI		
9	29/11/2025	JUAN PERDOMO	OFICIAL	7726890	gafas,guantes	1	SI		
10	30/11/2025	ALFONSO YEPES	OFICIAL	12129046	guantes	1	SI		
11	31/11/2025	CARLOS COMBARIZA	MAESTRO	11201452	guantes,gafas	1	SI		
12	31/11/2025	CARLOS ESPITIA	OFICIAL	1072525564	dotacion,gafas,guantes	1	SI		
13	31/11/2025	LUIS FERNANDO PALENCIA MOLA	OFICIAL	1193457137	guantes	1	SI		
14	19/11/2025	ROBERTO PABUENA	AYUDANTE	1002191218	guantes	1	SI		
15	31/10/2025	CARLOS ALBERTO AMAYA VARGAS	OFICIAL	1075287758	gafas,mascarilla	1	SI		

CONSORCIO INFRAMAR

VERSIÓN 1	FORMATO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CÓDIGO: BN1-SST-F
FECHA: 01/09/2024		PÁGINA 1 DE 1

	Fecha	Nombres completos	Cargo	Cédula	Elementos EPP	Cantidad	Recibió capacitación de	Firma de quien entrega	Firma c rec
1	28/10/2025	JHON MURGUEITIO	AYUDANTE	1117530300	guantes	1	SI	MUV	
2	28/10/2025	LEOPOLDO SILVA	AYUDANTE	9263699	guantes	1	SI	MUV	
3	28/10/2025	JOSE PERDOMO	AYUDANTE	1076502027	gafas,mascarilla	1	SI	MUV	
4	28/10/2025	UBALDO OROZCO	OFICIAL	9145632	dotacion,gafas,guantes	1	SI	MUV	
5	28/10/2025	AGUSTIN OLASCUAGA	OFICIAL	73128985	dotacion,gafas,guantes	1	SI	MUV	
6	28/10/2025	WILFRAN ESCORCIA	AYUDANTE	1007170056	dotacion,gafas,guantes	1	SI	MUV	
7	28/10/2025	CARLOS ESPITIA	OFICIAL	1072525564	dotacion,gafas,guantes	1	SI	MUV	
8	28/10/2025	FRANKLIN CARMONA	AYUDANTE	73191820	dotacion,gafas,guantes	1	SI	MUV	
9	29/10/2025	JUAN PERDOMO	OFICIAL	7726890	gafas,guantes	1	SI	MUV	
10	30/10/2025	ALFONSO YEPES	OFICIAL	12129046	guantes	1	SI	MUV	
11	31/10/2025	CARLOS COMBARIZA	MAESTRO	11201452	guantes,gafas,dotacion	1	SI	MUV	
12	31/10/2025	CARLOS ESPITIA	OFICIAL	1072525564	dotacion,gafas,guantes	1	SI	MUV	
13	31/10/2025	LUIS FERNANDO PALENCIA MOLA	OFICIAL	1193457137	guantes	1	SI	MUV	
14	31/10/2025	ANGEL ALVAREZ SIERRA	AUX.ING	1043635508	casco	1	SI	MUV	
15	31/10/2025	CARLOS ALBERTO AMAYA VARGAS	OFICIAL	1075287758	gafas,mascarilla	1	SI	MUV	

CONSORCIO INFRAMAR

VERSIÓN 1	FORMATO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CÓDIGO: BN1-SST-F
FECHA: 01/09/2024		PÁGINA 1 DE 1

	Fecha	Nombres completos	Cargo	Cédula	Elementos EPP	Cantidad	Recibió capacitación de epp	Firma de quien entrega	Firma
1	22/09/25	SOFIA PERDOMO PALACIO	MAESTRO	1075276348	GUANTES, GAFAS, TAPAOIDO	1	SI	MARIA V.	
2	22/09/25	MARLON MUÑOZ	OFICIAL	85.038.190	GUANTES, CASCO, GAFAS	1	SI	MARIA V.	
3	22/09/25	CARLOS AMAYA	OFICIAL	91.175.860	GUANTES, CASCO, GAFAS	1	SI	MARIA V.	
4	22/09/25	CARLOS COMPARIZA	MAESTRO	1042.091.859	GUANTES, CASCO, GAFAS	1	SI	MARIA V.	
5	22/09/25	JOSE PERDOMO	AYUDANTE	1076502027	GAFAS, GUANTES, TAPAOIDO	1	SI	MARIA V.	
6	23/09/25	ANDRES YEPES	OFICIAL	1049.996.793	GAFAS, GUANTES, TAPAOIDO	1	SI	MARIA V.	
7	23/09/25	ALFONSO YEPES	AYUDANTE	1212.129.046	GAFAS, GUANTES, TAPAOIDO	1	SI	MARIA V.	
8	24/09/25	CESAR GARZON	OFICIAL	1073.709.925	GAFAS, GUANTES, TAPAOIDO	1	SI	MARIA V.	
9	25/09/25	DAVID DE LA HOZ	AYUDANTE	7012.529.200	GAFAS, GUANTES, TAPAOIDO	1	SI	MARIA V.	
10	25/09/25	SARAO MANCILLA PALMA	AYUDANTE	1143.332.540	GAFAS, GUANTES, TAPAOIDO	1	SI	MARIA V.	
11	25/09/25	SILVIO ENRIQUE MURGUEITIO	MAESTRO	1077.596.040	GAFAS, GUANTES, TAPAOIDO	1	SI	MARIA V.	
12	25/09/25	DAVID DE LA HOZ	AYUDANTE	1.093.750.559	GAFAS, GUANTES, TAPAOIDO	1	SI	MARIA V.	
13	25/09/25	LEOPOLDO SILVA	MAESTRO	9263699	GAFAS, GUANTES, TAPAOIDO	1	SI	MARIA V.	
14	26/09/25	ANA CUELLAR	SST	1.128.049.884	MASCARILLA	1	SI	MARIA V.	
15	26/09/25	MARIA VILLAMIZAR	ASEADORA	1.094.990	MASCARILLA	1	SI	MARIA V.	

CONSORCIO INFRAMAR

VERSIÓN 1 FECHA: 01/09/2024	FORMATO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CÓDIGO: BN1-SST- PÁGINA 1 DE 1

	Fecha	Nombres completos	Cargo	Cédula	Elementos EPP	Cantidad	Recibió capacitación de epp	Firma de quien entrega	Firma re
1	1/09/2025	ANDRY YUCO	OFICIAL	7703709	ROPACION, CASCO, GAFAS, GUANTES	1	Si		
2	1/09/2025	JOSE PALACIOS QUIROZ	AYUDANTE	1076502027	ROPACION, CASCO, GAFAS, GUANTES	1	SI		
3	1/09/2025	LEOPOLDO SILVA	AYUDANTE	9263699	ROPACION, CASCO, GAFAS, GUANTES	1	SI		
4	1/09/2025	ALFONSO YEPES	OFICIAL	12129046	ROPACION, CASCO, GAFAS, GUANTES	1	SI		
5	1/09/2025	MILTON PERDOMO	OFICIAL	1073576939	ROPACION, CASCO, GAFAS, GUANTES	1	Si		
6	1/09/2025	SAMUEL DIAZ	OFICIAL	7733095	ROPACION, CASCO, GAFAS, GUANTES	1	Si		
7	1/09/2025	SOHN MORELECTRO	AYUDANTE	1123753050	ROPACION, CASCO, GAFAS, GUANTES	1	Si		
8	1/09/2025	HENRY MALLEN GO	AYUDANTE	1005121938	ROPACION, CASCO, GAFAS, GUANTES	1	Si		
9	1/09/2025	JOSE PERDOMO	MAESTRO	1075121946	ROPACION, CASCO, GAFAS, GUANTES	1	SI		
10	1/09/2025	CRISTIAN GARCIA	OFICIAL	1075360986	ROPACION, CASCO, GAFAS, GUANTES	1	Si		
11	1/09/2025	CESAR BARRAN	OFICIAL	1073130986	ROPACION, CASCO, GAFAS, GUANTES	1	Si		
12	1/09/2025	DARIA VILLAMIZAR	SST	52.909.920	CASCO, GAFAS, GUANTES	1	Si		
13	1/09/2025	ANA GUANTAS	AYUDANTE	1123049966	CASCO, GAFAS, ARNES, GUANTES	1	SI		
14									
15									

CONSORCIO INFRAMAR

VERSIÓN 1 FECHA: 01/09/2024	FORMATO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CÓDIGO: BN1-SST-F PÁGINA 1 DE 1

	Fecha	Nombres completos	Cargo	Cédula	Elementos EPP	Cantidad	Recibió capacitación de	Firma de quien entrega	Firma d rec
1	20/12/2025	CARLOS GARCIA	AYUDANTE	1117530300	guantes	1	SI	M.V.V.	
2	20/12/2025	LEOPOLDO SILVA	AYUDANTE	9263699	guantes	1	SI	M.V.V.	LEO
3	20/12/2025	JOSE PERDOMO	AYUDANTE	1076502027	gafas,mascarilla	1	SI	M.V.V.	JP
4	24/12/2025	UBALDO OROZCO	OFICIAL	9145632	gafas,guantes	1	SI	M.V.V.	UBaldo
5	24/12/2025	AGUSTIN OLASCUAGA	OFICIAL	73128985	gafas,guantes	1	SI	M.V.V.	Agustin
6	24/12/2025	WILFRAN ESCORCIA	AYUDANTE	1007170056	gafas,guantes	1	SI	M.V.V.	Wilfran
7	26/12/2025	DIMAX LAVAO	AYUDANTE	1003828588	gafas,guantes	1	SI	M.V.V.	Dimax
8	26/12/2025	LUIS SARABIA	OFICIAL	8801699	gafas,guantes	1	SI	M.V.V.	Luis B.
9	26/12/2025	JUAN PERDOMO	OFICIAL	7726890	gafas,guantes	1	SI	M.V.V.	Juan
10	26/12/2025	ALFONSO YEPES	OFICIAL	12129046	guantes	1	SI	M.V.V.	Alfonso
11	16/12/2025	CARLOS COMBARIZA	MAESTRO	11201452	guantes,gafas	1	SI	M.V.V.	Carlos
12	16/12/2025	CARLOS ESPITIA	OFICIAL	1072525564	gafas,guantes	1	SI	M.V.V.	Carlos
13	16/12/2025	LUIS FERNANDO PALENCIA MOLA	OFICIAL	1193457137	guantes	1	SI	M.V.V.	Luis
14	19/12/2025	ROBERTO PABUENA	AYUDANTE	1002191218	guantes	1	SI	M.V.V.	Roberto
15	16/12/2025	CARLOS ALBERTO AMAYA VARGAS	OFICIAL	1075287758	gafas,mascarilla	1	SI	M.V.	Carlos

CONSORCIO INFRAMAR

Versión: 02	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06
Fecha: 01/21/2024		Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• Politica de Prevencion contra el consumo de Alcohol, tabaco y Drogas, dar a conocer a los colaboradores las politicas q tiene la Empresa	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [X] Otro [ ]

FECHA INICIO	15 09 2025	FECHA FIN	15/09/2025	LUGAR	BASE NAVAL - CARTAGENA
HORA INICIO	1:30 Pm	HORA FIN	1:35 Pm		
NOMBRE DEL CURSO	• Politica de Prevencion contra el consumo de Alcohol, tabaco y Drogas				
EXPOSITOR	Maria Villamizar			FIRMA	

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Victor javier perdomo	1175167889	Of	
2	John Freddy Jurado	7777370200	AYUDANTE	
3	Henry Mallozzo Caicedo	1002829220	AY	
4	Carlos Alberto Anaya	1075287758	Oficial	
5	Leonardo [illegible]	926199	[illegible]	
6	Salud Mauricio	7733095	oficial	
7	Cesar Eduardo Garzon	1.073202178	oficial	
8	Andrey Avney Yuco	7701909	Oficial	
9	Alfonso Yepes R.	12129046	oficial	
10	[illegible]	1023216296	Oficial	

OBSERVACIONES

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02	**ASISTENCIA A CAPACITACIONES**	**BN1-SST-FM-06**
Fecha: 01/21/2024		**Página 1 de 1**

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• EL COMPANERISMO TRABAJO EN EQUIPO; CON EL FIN DE ALCANZAR UN OBJETIVO COMUN DE MANERA EFICIENTE, GENERANDO RESULTADOS OPTIMOS.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [X] Otro [ ]

FECHA INICIO	17/09/2025	**FECHA FIN**	17/09/2025	**LUGAR**	BASE NAVAL – CT6
HORA INICIO	12:40 Pm	**HORA FIN**	1:45 Pm		
NOMBRE DEL CURSO	EL COMPANERISMO TRABAJO EN EQUIPO				
EXPOSITOR	Maria Villamizar			**FIRMA**	Maria V.

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Andrey Arroyo	7701209	Oficial	
2	Jose Camilo Perdomo Quiroz	1076502027	Ayudante	
3	[illegible]	92636 90	[illegible]	
4	Carlos Gilberto [illegible]	1075287750	Oficial	Carlos Gilberto A.
5	[illegible]	1075216796	Oficial	
6	Cesar Eduardo Garzón	1075302178	Oficial	
7	Samuel Mauricio	7733095	Oficial	
8	[illegible]	1175/6734	OF	
9	Alfonso Lopez R.	12 129046	OF	Alfonso
10	Henry Mallungo	1003879320	Ayudante	Henry Mallungo

OBSERVACIONES

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02	**ASISTENCIA A CAPACITACIONES**	**BN1-SST-FM-06**
Fecha: 01/21/2024		**Página 1 de 1**

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• DISPOSICION RCD SE HABLO SOBRE EL PROCESO DE GESTIONAR LOS MATERIALES DESECHADOS DURANTE LA CONSTRUCCION, RENOVACION O DEMOLICION, BUSCANDO ASI UNA DISPOSICION FINAL CON UN ENTE CERTIFICADO	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [ ] Otro [X]

FECHA INICIO	19/09/2025	**FECHA FIN**	19/09/2025	**LUGAR**	BASE NAVAL – CTG
HORA INICIO	12:10 Pm	**HORA FIN**	12:20		
NOMBRE DEL CURSO	• DISPOSICION RCD				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			**FIRMA**	MARIA. V

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Victor javier p.	1193516784	OF	
2	Carlos Gilberto Ayala Ayala	1075207758	Oficial	Carlos Gilberto A.
3		7075716796	OF	
4	Saul Mauricio D	7733095	oficial	SAUL
5	JOHN FREDY MORALES	7717557200	AYUDA	JOHN FREDY
6	Jose Camilo Perdomo Quiroz	7076501027	ayudante	Camilo
7	LEONARDO JAVIER	926-3699	LIMPIA	LEONARDO
8	CESAR EDUARDO GARZON	1.075302178	Oficial	
9	Napoleon Nuñez Bautista	1095219810	OFICIAL	napoleon Nuñez
10	ANDRES FELIPE YULO	7701809	OFICIAL	

OBSERVACIONES

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02 Fecha: 01/21/2024	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06 Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• PAUSA ACTIVA, ESTOS SON CORTOS EJERCICIOS DURANTE LA JORNADA LABORAL, A DURAN DE 5-10 MINUTOS, EVITAN EL ESTRES, LUMBALGIAS Y CALAMBRES.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [ ] Otro [+]

FECHA INICIO	20 09 2025	FECHA FIN	20 09 2025	LUGAR	BASE NAVAL – CT6
HORA INICIO	11:00 AM	HORA FIN	11:10 AM		
NOMBRE DEL CURSO	• PAUSA ACTIVA				
EXPOSITOR	MARÍA VILLAMIZAR			FIRMA	MARIA V.

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	1075216296	OF	[illegible]
2	LEOLDO[illegible]VA	926399	[illegible]	LEOLDO
3	SOLLEL MAURICIO	7733095	OFICIAL	SOLLEL
4	JOHAN FREDY MURILLO	1118730000	AYUDA	JOHAN
5	ANDRES [illegible]	7701909	OFICIAL	[illegible]
6	WILTON JAVIER [illegible]	1075178479	OF	[illegible]
7	NAPOLEON [illegible]	1075219810	OF	NAPOLEON
8	CARLOS [illegible]	1075268758	OFICIAL	CARLOS
9	DAVID DE LA [illegible]	75206950	OPERAR	[illegible]
10	JESUS A. MURILLO [illegible]	1047426113	OFICIAL	[illegible]

OBSERVACIONES

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02 **Fecha: 01/21/2024**	**ASISTENCIA A CAPACITACIONES**	**BN1-SST-FM-06** **Página 1 de 1**

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• GOLPE DE CALOR, CUANDO LAS PERSONAS ESTAN SOMETIDAS A TEMPERATURAS ALTAS, OCASIONANDO UNA EMERGENCIA GRAVE, EL PERSONAL DEBE ESTAR HIDRATADO.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [/] Otro [ ]

FECHA INICIO	22/09/2025	**FECHA FIN**	22/09/2025	**LUGAR**	BASE NAVAL – CT6
HORA INICIO	11:50 AM	**HORA FIN**	12:00PM		
NOMBRE DEL CURSO	GOLPE DE CALOR.				
EXPOSITOR	MANUEL VILLAMIZAR			**FIRMA**	

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	1075216296	OF	[illegible]
2	[illegible]	1120145[illegible]		
3	[illegible]	926799	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	7733095	OFICIAL	[illegible]
5	ALFONSO YEPES	1217904[illegible]	OFI	ALFONSO
6	JOHN FREDY MURILLO [illegible]	[illegible]	AUXILIO	JOHN
7	ANDRES YULO	77019[illegible]	OFICIAL	[illegible]
8	Milton javier	1118516784	OF	[illegible]
9	Napoleon Nuñez	1035219810	oficial	[illegible]
10	Jose Camilo Perdomo Quiroz	1076502029	AYUDANTE	[illegible]

OBSERVACIONES

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02	**ASISTENCIA A CAPACITACIONES**	**BN1-SST-FM-06**
Fecha: 01/21/2024		**Página 1 de 1**

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• PAUSA ACTIVA, CONTOS ESCUCHAS, A SENSATIZAR DURANTE LA JORNADA LABORAL PARA DISMINUIR EL ESTRES, LA FATIGA LABORAL Y CALAMBRES.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [ ] Otro [X]

FECHA INICIO	23/09/2025	**FECHA FIN**	23/09/2025	**LUGAR**	BASE NAVAL - CT6
HORA INICIO	12:05 pm	**HORA FIN**	12:15 PM		
NOMBRE DEL CURSO	• PAUSA ACTIVA				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			**FIRMA**	MARIA V.

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	JOHN FREDY MORALES	CC 1177976[illegible]	AYUNTE	JOHN
2	Victor javier [illegible]	1135163[illegible]	OF	[illegible]
3	Cesar Eduardo	1.075307178	oficial	[illegible]
4	[illegible]	1075216796	OF	[illegible]
5	Sandra Mauricio	7733095	oficial	[illegible]
6	[illegible]	926[illegible]	IN -	[illegible]
7	JOSE Camilo Perdomo	7076502027	ayudante	Camilo
8	Nayoloán [illegible]	1075214810	OF	[illegible]
9	ALFONSO YEPES R	17124046	OF	ALFONSO
10	Andrey [illegible]	7701909	oficial	[illegible]

OBSERVACIONES

CONSORCIO INFRAMAR

Versión: 02	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06
Fecha: 01/21/2024		Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• IMPORTANCIA DEL USO DE EPP, PROTEGER LA INTEGRIDAD FISICA Y LA SALUD DE LOS TRABAJADORES, PREVINIENDO ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES CAUSADAS POR RIESGOS	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [X] Otro [ ]

FECHA INICIO	24 09 2025	FECHA FIN	24 09 2025	LUGAR	BASE NAVAL - CTG
HORA INICIO	12:15 PM	HORA FIN	12:20 PM		
NOMBRE DEL CURSO	IMPORTANCIA DEL USO DE EPP				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Cesar Eduardo Garzon	1.075307178	oficial	
2	SAUL MAURICIO	7733095	oficial	
3	Milton javier R.	1125678[illegible]	OF	
4	LEONARDO [illegible]	91676 96	VIGIA	LEONARDO
5	Andrey Anny Yulo	7701 209	oficial	
6	DANIEL EDUARDO MORENO	1122526200	AUXILIAR	
7	Napoleón Nuñez	1075219810	Oficial	
8	Camilo Perdomo Quiroga	7076502027	ayudante	Camilo
9	ALFONSO YEPES R.	17124046	OFI	ALFONSO
10	Carlos Alberto Amaya	1075287758	Oficial	Carlos Alberto A.

OBSERVACIONES

CONSORCIO INFRAMAR

Versión: 02	**ASISTENCIA A CAPACITACIONES**	**BN1-SST-FM-06**
Fecha: 01/21/2024		**Página 1 de 1**


TEMA (S)	**TIPO DE FORMACIÓN**
• PAUSA ACTIVA CON LOS EJERCICIOS A SE REALIZAN EN LA JORNADA LABORAL PARA EVITAR EL ESTRES, LA FATIGA Y MEJORAR EL RENDIMIENTO.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [ ] Otro [X]

FECHA INICIO	25/09/2025	**FECHA FIN**	25/09/2025	**LUGAR**	BASE NAVAL - CTG
HORA INICIO	12:00 PM	**HORA FIN**	12:30 PM		
NOMBRE DEL CURSO	PAUSA ACTIVA				
EXPOSITOR	MANUEL VILLAMIZAR			**FIRMA**	

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Pablo Enrique Lombana	1120145 2.	OFI	
2	Cesar Eduardo Castro	1.075302178	oficial	
3	SAUL ALARCÓN	773295	OFICIAL	SAUL
4	[illegible]	1075163 59	Of	
5	[illegible]	1075287759	Oficial	
6	Camilo Perdomo Quiroz	1076502027	ayudante	Camilo
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	ALFONSO LOPEZ	12179046	OFI	ALFONSO
9	[illegible]	270 909.	OFICIAL	[illegible]
10	[illegible]	1045219610	OFI	[illegible]

OBSERVACIONES

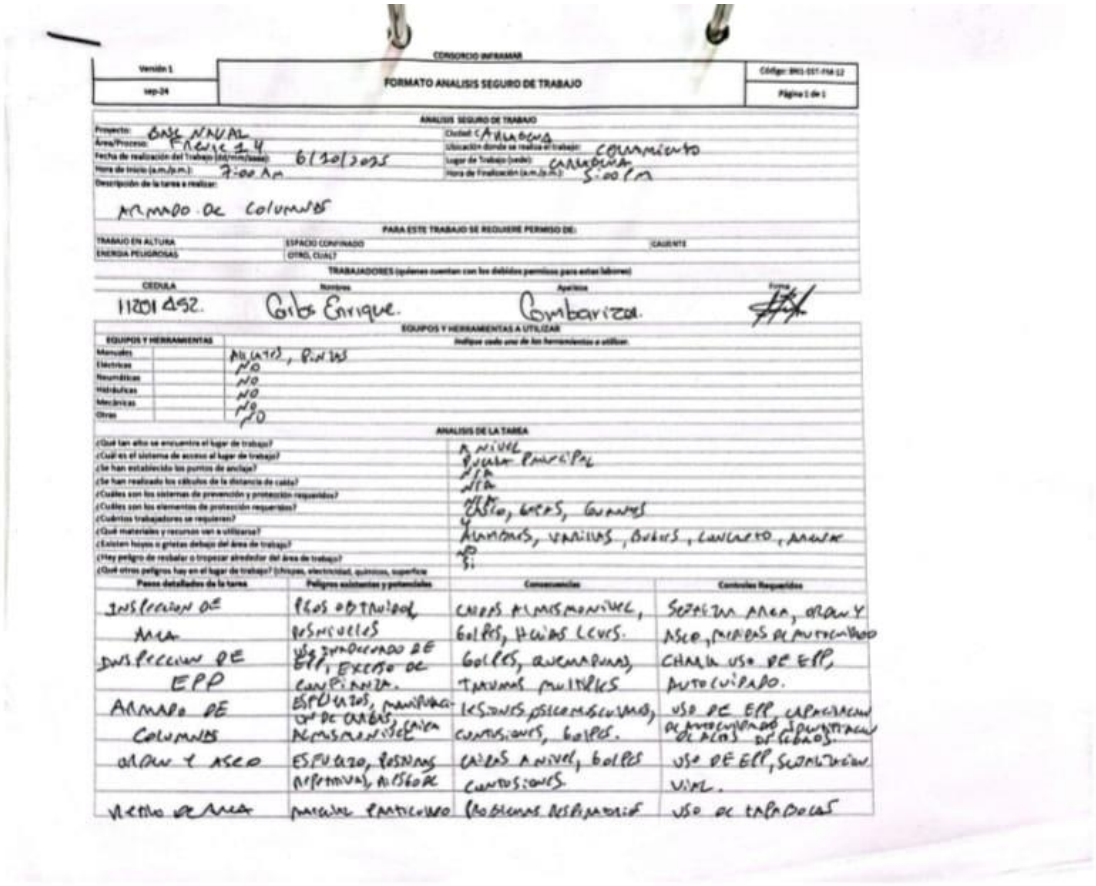

CONSORCIO INFRAMAR

Versión 1 | sep-24 | FORMATO ANALISIS SEGURO DE TRABAJO | Código: [illegible] | Página 1 de 1

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Proyecto: BASE NIVAL
Área/Proceso: FRENTE 4
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 6/10/2025
Hora de inicio (a.m./p.m.): 7:00 AM
Ciudad: CARTAGENA
Ubicación donde se realiza el trabajo: COLUMNAS
Lugar de Trabajo (sede): CARTAGENA
Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 PM
Descripción de la tarea a realizar:
ARMADO DE COLUMNAS

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

TRABAJADORES (quienes cuentan con los debidos permisos para estas labores)

CEDULA	Nombres	Apellidos	Firma
11201452.	Carlos Enrique.	Combariza.	


EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales		ALICATES, PINZAS
Electricas		NO
Neumáticas		NO
Hidráulicas		NO
Mecánicas		NO
Otras		NO

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A NIVEL
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	RUTA PRINCIPAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	CASCO, GAFAS, GUANTES
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	
¿Cuántos trabajadores se requieren?	4
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	ALAMBRES, VARILLAS, BOLAS, CONCRETO, AGUA
¿Existen huyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (Ahogos, electricidad, químicos, superficie	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
INSPECCION DE AREA	RIESGO BIOLOGICO, RESBALONES	CAIDAS A NIVEL, GOLPES, HERIDAS LEVES.	SEÑALIZAR AREA, ORDEN Y ASEO, CHARLAS DE AUTOCUIDADO
INSPECCION DE EPP	DESPLAZAMIENTO DE EPP, EXCESO DE CONFIANZA.	GOLPES, QUEMADURAS, TRAUMAS MULTIPLES	CHARLA USO DE EPP, AUTOCUIDADO.
ARMADO DE COLUMNAS	ESFUERZO, POSTURAS INCORRECTAS, MANIPULACION DE CARGAS, ATRAPAMIENTO	LESIONES OSTEOMUSCULARES, CONTUSIONES, GOLPES.	USO DE EPP, CAPACITACION EN LEVANTAMIENTO DE PESOS, DISTRIBUCION DE CARGAS.
ORDEN Y ASEO	ESFUERZO, POSTURAS INCORRECTAS, ATRAPAMIENTO	CAIDAS A NIVEL, GOLPES CONTUSIONES.	USO DE EPP, SEÑALIZACION VIAL.
RETIRO DE AREA	MATERIAL PARTICULADO	PROBLEMAS RESPIRATORIOS	USO DE TAPABOCAS

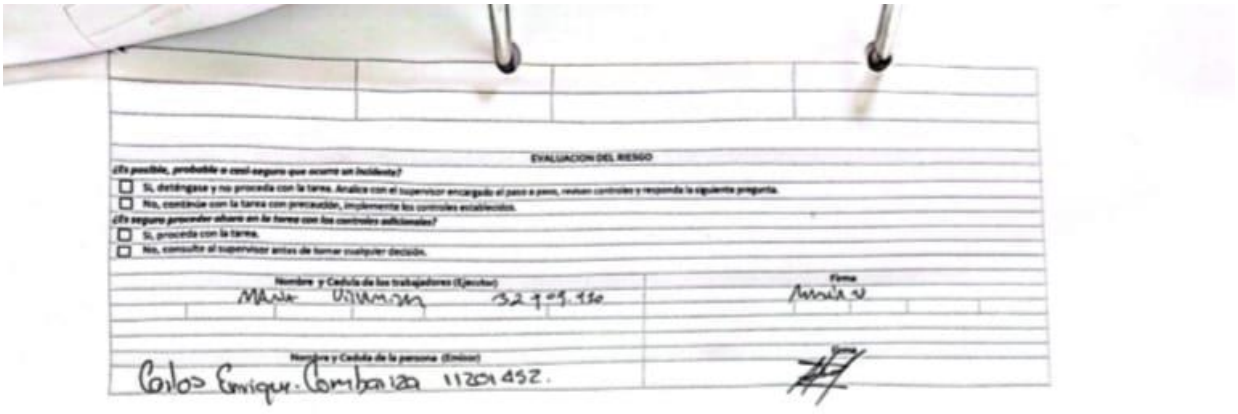

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?


- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Maria Villamizar 52.709.950	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Carlos Enrique Combariza 11201452.	

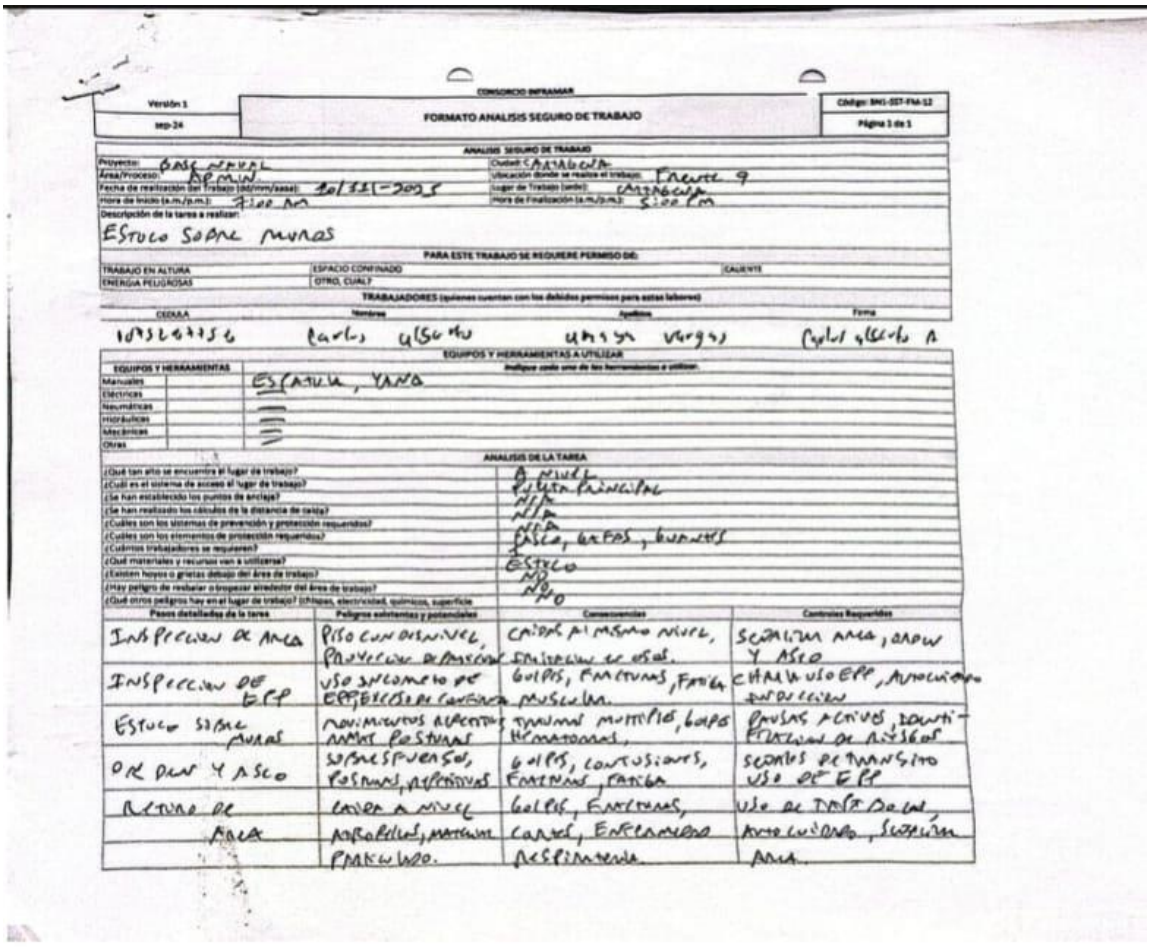

CONSORCIO INFRAMAR

Versión 1 | sep-24 | FORMATO ANALISIS SEGURO DE TRABAJO | Código: INFRA-SST-FR-12 | Página 1 de 1

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Proyecto: BASE NAVAL
Área/Proceso: ADMIN.
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 10/12/2025
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 AM
Ciudad: CARTAGENA
Ubicación donde se realiza el trabajo: Frente 9
Lugar de Trabajo (sede): CARTAGENA
Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 PM

Descripción de la tarea a realizar:
ESTUCO SOBRE MUROS

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGÍA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

TRABAJADORES (quienes cuentan con los debidos permisos para estas labores)

CEDULA	Nombres	Apellidos	Firma
1093267756	Carlos Ulloa	Yanys Vargas	Carlos Ulloa A

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR


Indique cada uno de las herramientas a utilizar.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Manuales		ESPATULA, YANA
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A NIVEL
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	RUTA PRINCIPAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	N/A
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	BASICO, GAFAS, GUANTES
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	ESTUCO
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (Físicos, electricidad, químicos, superficie	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
INSPECCION DE AREA	PISO CON DESNIVEL, PROYECCION DE PARTICULAS	CAIDA AL MISMO NIVEL, EXPOSICION DE RUIDO.	SEÑALIZAR AREA, ORDEN Y ASEO
INSPECCION DE EPP	USO INCORRECTO DE EPP, EJERCICIO DE CARGA	GOLPES, FRACTURAS, FATIGA MUSCULAR.	CHARLA USO EPP, AUTOCUIDADO PROTECCION
ESTUCO SOBRE MUROS	MOVIMIENTOS REPETITIVOS MMSS POSTURAS	TUNNEL MUTIPLE, GOLPES HERIDAS.	PAUSAS ACTIVAS, IDENTIFICACION DE RIESGOS
ORDEN Y ASEO	SOBREESFUERZO, POSTURAS, REPETITIVAS	GOLPES, CONTUSIONES, FRACTURAS, FATIGA	SEÑALES DE TRANSITO USO DE EPP
RETIRO DE AREA	CAIDA A NIVEL	GOLPES, FRACTURAS,	USO DE TARJA DE LINEA,
	ATROPELLOS, MATERIAL	CORTES, ENFERMEDAD	AUTOCUIDADO, SEÑALIZACION
	FRACTURADO.	RESPIRATORIA.	AREA.

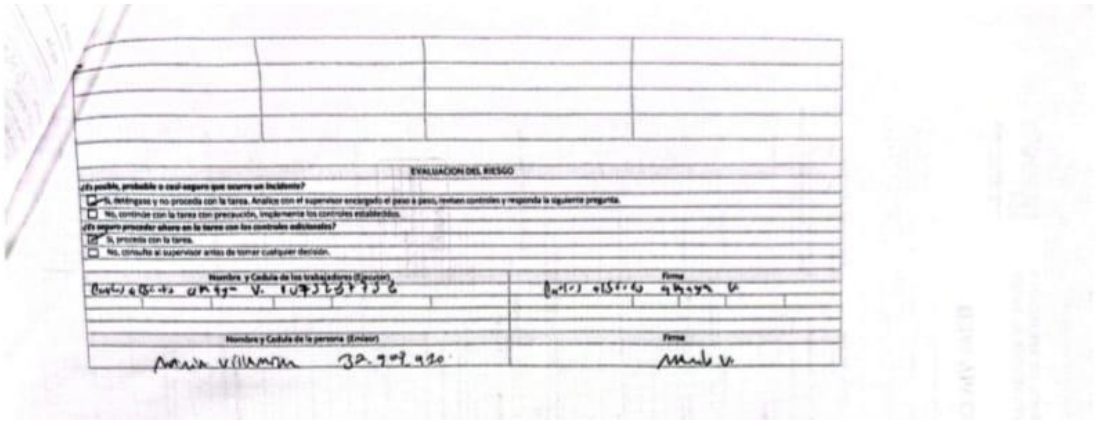


EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?
- [x] Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- [ ] No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
- [x] Si, proceda con la tarea.
- [ ] No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Carlos Ulloa Yanys V. 1093267756	Carlos Ulloa Yanys V.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
MARIA VILLAMIZAR 32.909.930	Maria V.

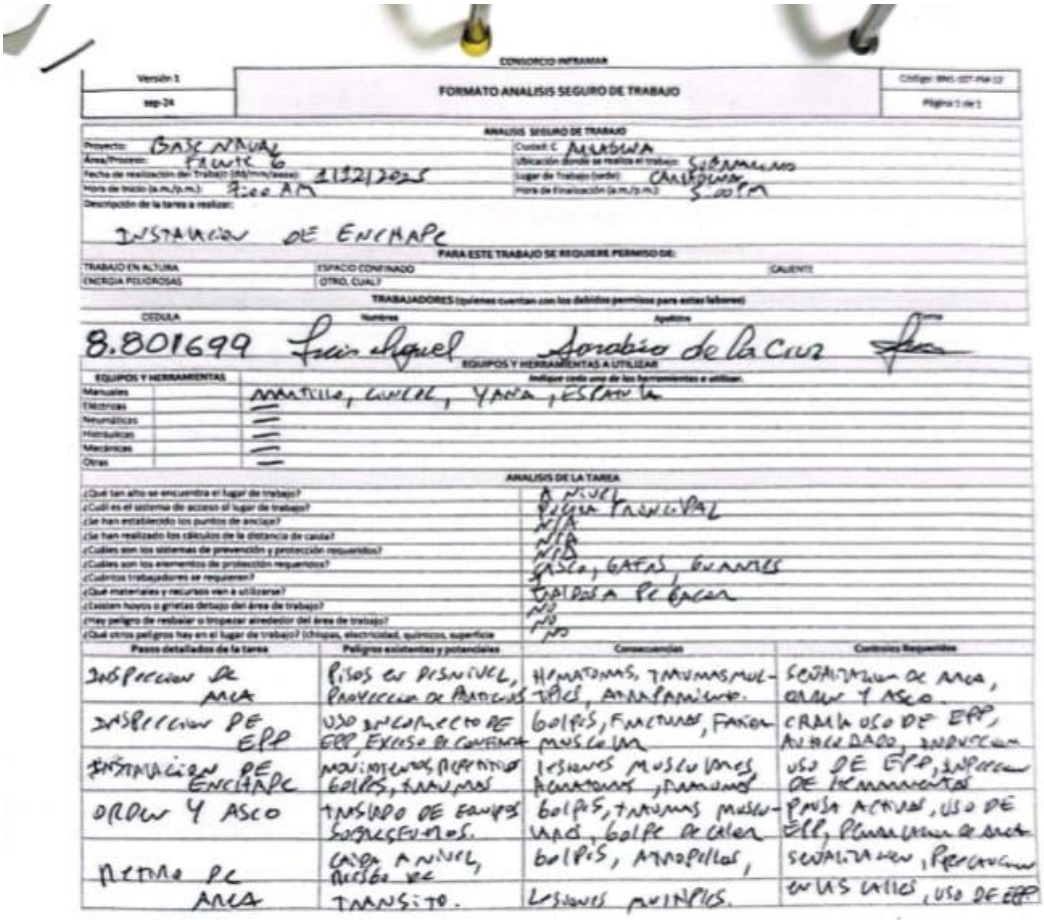

CONSORCIO INFRAMAR

Versión 1	FORMATO ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	Código:
sep-24		Página 1 de 1

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Proyecto: BASE NAVAL — Ciudad: C. MAICAO
Área/Proceso: FRENTE 6 — Ubicación donde se realiza el trabajo: SUBMARINOS
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 21/2/2025 — Lugar de Trabajo (vereda): CAMPAMENTO
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 9:00 AM — Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 PM
Descripción de la tarea a realizar: INSTALACION DE ENCHAPE

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA | ESPACIO CONFINADO | CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS | OTRO, CUAL?

TRABAJADORES (quienes cuentan con los debidos permisos para estas labores)

CEDULA	Nombres	Apellidos	Firma
8.801699	Francisco	Sorabio de la Cruz	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

Manuales	X	MARTILLO, CINCEL, YARA, ESPATULA
Eléctricas		—
Neumáticas		—
Hidráulicas		—
Mecánicas		—
Otras		—

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A NIVEL
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	VIGILIA PRINCIPAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	N/A
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	CASCO, GAFAS, GUANTES
¿Cuántos trabajadores se requieren?	
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	CARRETILLA DE ENCHAPE
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie	NO

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
INSPECCION DE AREA	PISOS EN DESNIVEL, PROYECCION DE PARTICULAS	HEMATOMAS, TRAUMAS MUSCULARES, ATRAPAMIENTO.	SEÑALIZACION DE AREA, ORDEN Y ASEO.
INSPECCION DE EPP	USO INCORRECTO DE EPP, EXCESO DE CONFIANZA	GOLPES, FRACTURAS, FATIGA MUSCULAR	CHARLA USO DE EPP, ANALISIS DE TAREA, INSPECCION
INSTALACION DE ENCHAPE	MOVIMIENTOS REPETITIVOS, GOLPES, TRAUMAS	LESIONES MUSCULARES, HEMATOMAS, TRAUMAS	USO DE EPP, INSPECCION DE HERRAMIENTAS
ORDEN Y ASEO	TRANSPORTE DE EQUIPOS SOBRESFUERZOS.	GOLPES, TRAUMAS MUSCULARES, GOLPE DE CALOR	PAUSA ACTIVA, USO DE EPP, PLANIFICACION DE TAREA
RETIRO DE AREA	CAIDA A NIVEL, RUIDO DE TRANSITO.	GOLPES, ATRAPAMIENTOS, LESIONES AUDITIVAS.	SEÑALIZACION, PRECAUCION EN LAS VIAS, USO DE EPP

EVALUACION DEL RIESGO


¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

☑ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Francisco 8.801699 Enchapador	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
MARIA VILLAMIZAR 32.909.920	MARIA.V

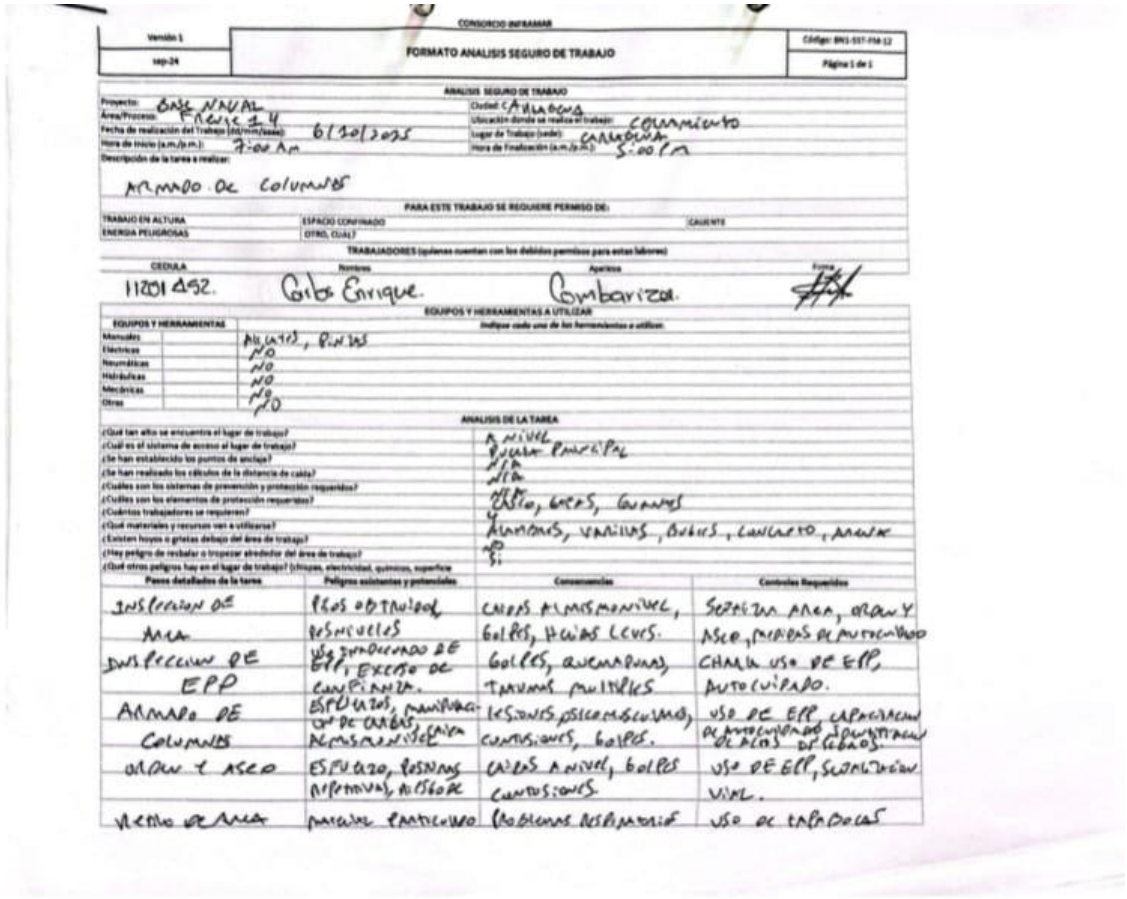

CONSORCIO INFRAMAR

Versión 1	FORMATO ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	Código: INS-SST-Fto-12
sep-24		Página 1 de 1

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Proyecto: BASE NAVAL — Ciudad: CARTAGENA
Área/Proceso: FASE 1 Y 4 — Ubicación donde se realiza el trabajo: CUARTELILLO
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 6/10/2025 — Lugar de Trabajo (sede): CARTAGENA
Hora de inicio (a.m./p.m.): 7:00 AM — Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 PM
Descripción de la tarea a realizar:
ARMADO DE COLUMNAS

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

TRABAJADORES (quienes cuentan con los debidos permisos para estas labores)

CEDULA	Nombres	Apellidos	Firma
1120145 2.	Carlos Enrique.	Combariza.	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Indique cada una de las herramientas a utilizar.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Manuales		ALICATES, PINZAS
Eléctricas		NO
Neumáticas		NO
Hidráulicas		NO
Mecánicas		NO
Otras		NO

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A NIVEL
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	ESCALERA PRINCIPAL
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	N/A
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	CASCO, GAFAS, GUANTES Y
¿Cuántos trabajadores se requieren?	ALAMBRES, VARILLAS, BOTAS, CONCRETO, ARNES
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	NO
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (físicos, electricidad, químicos, superficie	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
INSPECCION DE AREA	PISOS OBSTRUIDOS, RESBALONES	CAIDAS A MISMO NIVEL, GOLPES, HERIDAS LEVES.	SEÑALIZAR AREA, ORDEN Y ASEO, PAUSAS DE AUTOCUIDADO
INSPECCION DE EPP	USO INCORRECTO DE EPP, EXCESO DE CONFIANZA.	GOLPES, QUEMADURAS, TRAUMAS MULTIPLES	CHARLA USO DE EPP, AUTOCUIDADO.
ARMADO DE COLUMNAS	ESFUERZOS, MANIPULACION DE CARGAS, CAIDA MISMO NIVEL	LESIONES OSTEOMUSCULARES, CONTUSIONES, GOLPES.	USO DE EPP, CAPACITACION DE MOVIMIENTOS REPETITIVOS Y LEVANTAMIENTO DE CARGAS.
ORDEN Y ASEO	ESFUERZO, POSTURAS INAPROPIADAS, ATRAPAMIENTO	CAIDAS A NIVEL, GOLPES CONTUSIONES.	USO DE EPP, SEÑALIZACION VIAL.
RETIRO DE AREA	PISOS RESBALOSOS	PROBLEMAS RESPIRATORIOS	USO DE TAPABOCAS



EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?
- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consultar al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
MARIA VILLAMIZAR 52.905.930	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Carlos Enrique Combariza 1120145 2.	

Cartagena, D.T. y C., 26 de diciembre de 2025


Señora Teniente de Corbeta.
CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA.
Supervisora de Contrato
Cartagena-Bolívar.

Asunto: Informe de Gestión y utilización de escombro para la realización de rellenos y Mantenimientos a *las instalaciones de la Regional de Inteligencia Naval del Caribe "RINCA".*

Con toda atención me dirijo a la señora Teniente de Corbeta CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA, Supervisora de Contrato de obra No. 0076-ARC-CBNL01-2025, con el fin de ponerla en conocimiento de los trabajos que se realizaron por parte de ésta unidad, con un material de escombro que fue donado por parte de la Supervisora de Contrato, en un aproximado de 110 metros cúbicos, el cual se utilizó en diferentes trabajos de pavimentación y el relleno para la elaboración del piso del quiosco de la Regional de Inteligencia Naval del Caribe "RINCA".

EVIDENCIA DE TRABAJOS REALIZADOS.

1.

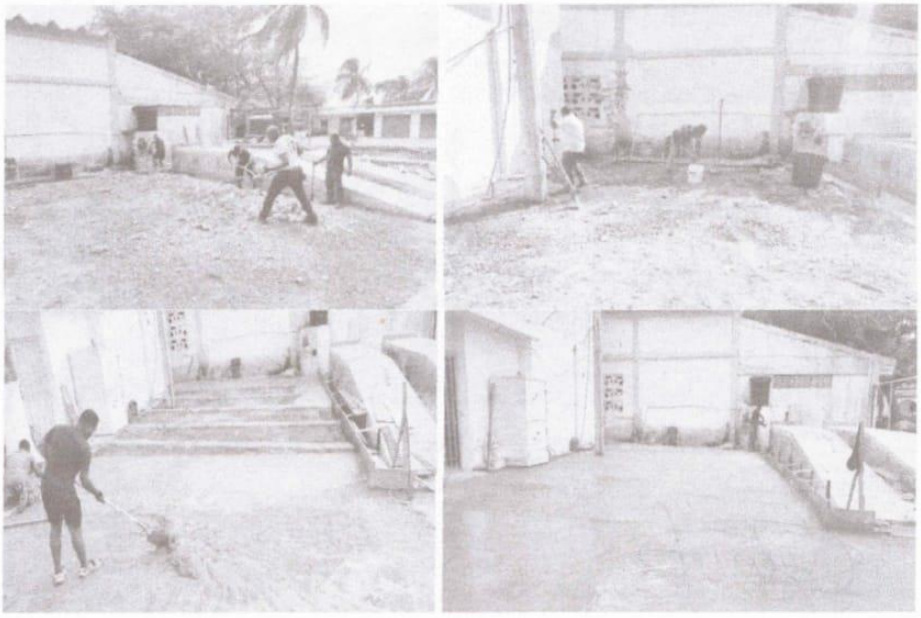

Pavimentación de zonas externas, laterales y cárcamo de la unidad.

2.



Relleno y elaboración del piso del quiosco de la unidad.

Atentamente,

Sargento Viceprimero de I.F LEÓN MEJÍA ÓSCAR DAVID.
Gestor de Mantenimiento Regional de Inteligencia Naval del Caribe.

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35809611
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-24

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901190763	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 8 NO 19 35	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SOFYFE@HOTMAIL.ES	TELÉFONO	8624916
FAX	8624916	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1098645078	PRIMER APELLIDO	MENDOZA	SEGUNDO APELLIDO	OTERO
PRIMER NOMBRE	BORIS	SEGUNDO NOMBRE	DAVID		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
29		$15.278.900		35809611

Página 1 2025-12-24 11:44:04 ASOPAGOS SA -

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075287758	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	AMAYA VARGAS CARLOS ALBERTO	$1.423.500
CC-73199255	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	BANQUEZ FRANCO LEONARDO FABIO	$1.423.500
CC-11201452	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	COMBARIZA CARLOS ENRIQUE	$1.423.500
CC-1075287263	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	CUELLAR JUAN ESTEVEN	$1.423.500
CC-1007170056	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	ESCORCIA MORENO WILFRAN	$1.423.500
CC-1072524941	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	ESPITIA LOPEZ CARLOS AGUSTO	$1.423.500
CC-10939015	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	FUENTES RAMOS JAIRO ANTONIO	$1.423.500
CC-1022931235	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	GARCIA TORRES CARLOS ANDRES	$1.423.500
CC-73131497	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	GOMEZ HERRERA RUBEN DARIO	$1.423.500
CC-1143358656	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	GONZALEZ LEON JULIO ADRIAN	$1.423.500
CC-1128062245	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	HERNANDEZ CAMARGO JOSE ALEXANDER	$1.423.500
CC-1002198843	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	HERRERA BLANQUICET LUIS MIGUEL	$1.423.500
CC-1003655741	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	JIMENEZ TORRES LEOVIGILDO	$1.423.500
CC-1003828588	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	LAVAO QUEVEDO DIMAS EDUARDO	$1.423.500
CC-1003829320	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	MALLUNGO CAICEDO HENRY	$1.423.500
CC-1006418823	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	MUÑOZ CHAVARRIAGA ALEXIS	$1.423.500
CC-91448093	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	NARVAEZ CASTRO EDWIN FRANCISCO	$1.423.500
CC-73128985	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	OLASCOAGA URUETA AGUSTIN	$1.423.500
CC-9145632	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	OROZCO CASTILLO UBALDO	$1.423.500
CC-1002191218	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	PABUENA ESPITIA ROBERTO CARLOS	$1.423.500
CC-1072524820	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	PALENCIA AHUMADA CRISTIAN DAVID	$1.423.500
CC-1193457137	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	PALENCIA MOLA LUIS FERNANDO	$1.423.500
CC-1075216296	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	PERDOMO PALACIOS JOSE RAMIRO	$1.423.500
CC-1076502027	01	No	No	No	13	1	5429001	Fijo	PERDOMO QUIROZ JOSE CAMILO	$1.423.500
CC-7726890	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	PERDOMO VALDERRAMA JUAN CARLOS	$1.423.500
CC-1041975979	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	SALGADO LUNA YEFFERSON	$1.423.500
CC-73139060	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	SANCHEZ ROMERO WILBERTO	$1.423.500
CC-9263699	01	No	No	No	13	1	5429001	Fijo	SILVA ECHAVEZ LEOPOLDO	$1.423.500
CC-12129046	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	YEPES REINA ALFONSO	$1.423.500

Página 2 2025-12-24 11:44:04 ASOPAGOS SA -

CC-1075287758	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	AMAYA VARGAS CARLOS ALBERTO	$1.423.500
CC-73199255	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	BANQUEZ FRANCO LEONARDO FABIO	$1.423.500
CC-11201452	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	COMBARIZA CARLOS ENRIQUE	$1.423.500
CC-1075287263	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	CUELLAR JUAN ESTEVEN	$1.423.500
CC-1007170056	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	ESCORCIA MORENO WILFRAN	$1.423.500
CC-1072524941	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	ESPITIA LOPEZ CARLOS AGUSTO	$1.423.500
CC-10939015	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	FUENTES RAMOS JAIRO ANTONIO	$1.423.500
CC-1022931235	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	GARCIA TORRES CARLOS ANDRES	$1.423.500
CC-73131497	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	GOMEZ HERRERA RUBEN DARIO	$1.423.500
CC-1143358656	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	GONZALEZ LEON JULIO ADRIAN	$1.423.500
CC-1128062245	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	HERNANDEZ CAMARGO JOSE ALEXANDER	$1.423.500
CC-1002198843	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	HERRERA BLANQUICET LUIS MIGUEL	$1.423.500
CC-1003655741	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	JIMENEZ TORRES LEOVIGILDO	$1.423.500
CC-1003828588	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	LAVAO QUEVEDO DIMAS EDUARDO	$1.423.500
CC-1003829320	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	MALLUNGO CAICEDO HENRY	$1.423.500
CC-1006418823	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	MUÑOZ CHAVARRIAGA ALEXIS	$1.423.500
CC-91448093	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	NARVAEZ CASTRO EDWIN FRANCISCO	$1.423.500
CC-73128985	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	OLASCOAGA URUETA AGUSTIN	$1.423.500
CC-9145632	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	OROZCO CASTILLO UBALDO	$1.423.500
CC-1002191218	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	PABUENA ESPITIA ROBERTO CARLOS	$1.423.500
CC-1072524820	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	PALENCIA AHUMADA CRISTIAN DAVID	$1.423.500
CC-1193457137	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	PALENCIA MOLA LUIS FERNANDO	$1.423.500
CC-1075216296	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	PERDOMO PALACIOS JOSE RAMIRO	$1.423.500
CC-1076502027	01	No	No	No	13	1	5429001	Fijo	PERDOMO QUIROZ JOSE CAMILO	$1.423.500
CC-7726890	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	PERDOMO VALDERRAMA JUAN CARLOS	$1.423.500
CC-1041975979	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	SALGADO LUNA YEFFERSON	$1.423.500
CC-73139060	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	SANCHEZ ROMERO WILBERTO	$1.423.500
CC-9263699	01	No	No	No	13	1	5429001	Fijo	SILVA ECHAVEZ LEOPOLDO	$1.423.500
CC-12129046	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	YEPES REINA ALFONSO	$1.423.500

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 73199255	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 11201452	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1075287263	COLFONDOS	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1007170056	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1072524941	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 10939015	PORVENIR	21	$996.450	0.1600000	$159.500	$0	$0	$159.500	$0	$0	$0
CC - 1022931235	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 73131497	PROTECCION	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1143358656	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1128062245	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1002198843	PROTECCION	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1003655741	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1003828588	PROTECCION	21	$996.450	0.1600000	$159.500	$0	$0	$159.500	$0	$0	$0
CC - 1003829320	PROTECCION	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1006418823	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 91448093	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 73128985	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 9145632	PROTECCION	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1002191218	PORVENIR	13	$616.850	0.1600000	$98.700	$0	$0	$98.700	$0	$0	$0
CC - 1072524820	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1193457137	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1075216296	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1076502027	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 7726890	COLPENSIONES	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1041975979	PORVENIR	21	$996.450	0.1600000	$159.500	$0	$0	$159.500	$0	$0	$0
CC - 73139060	PROTECCION	19	$901.550	0.1600000	$144.300	$0	$0	$144.300	$0	$0	$0
CC - 9263699	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 12129046	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075287758	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 73199255	EPS-S COOSALUD	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$3.400
CC - 11201452	FAMISANAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1075287263	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$3.400
CC - 1007170056	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1072524941	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 10939015	SALUD TOTAL	21	$996.450	0.0400000	$39.900	$0	0	$0	0	$0	21	$996.450	5	0.0696000	$69.400
CC - 1022931235	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 73131497	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$3.400
CC - 1143358656	EPS-S COOSALUD	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$3.400
CC - 1128062245	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$3.400
CC - 1002198843	EPS CAJACOPI	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$3.400
CC - 1003655741	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$3.400
CC - 1003828588	SANITAS	21	$996.450	0.0400000	$39.900	$0	0	$0	0	$0	21	$996.450	5	0.0696000	$69.400
CC - 1003829320	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$3.400
CC - 1006418823	SANITAS	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$3.400
CC - 91448093	SALUD TOTAL	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$3.400
CC - 73128985	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$3.400
CC - 9145632	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$3.400
CC - 1002191218	EPS CAJACOPI	13	$616.850	0.0400000	$24.700	$0	0	$0	0	$0	13	$616.850	5	0.0696000	$43.000
CC - 1072524820	EPS CAJACOPI	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$3.400
CC - 1193457137	SALUD TOTAL	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$3.400
CC - 1075216296	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$3.400

Página 5 2025-12-24 11:44:04 ASOPAGOS SA -

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1076502027	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$3.400
CC - 7726890	SANITAS	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	5	0.0696000	$3.400
CC - 1041975979	EPS-S MUTUAL - MOV	21	$996.450	0.0400000	$39.900	$0	0	$0	0	$0	21	$996.450	5	0.0696000	$69.400
CC - 73139060	EPS-S COOSALUD	19	$901.550	0.0400000	$36.100	$0	0	$0	0	$0	19	$901.550	5	0.0696000	$62.800
CC - 9263699	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 12129046	FAMISANAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075287758	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73199255	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11201452	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075287263	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007170056	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1072524941	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10939015	COMFENALCO CARTAGENA	21	$996.450	0.0400000	$39.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022931235	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73131497	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1143358656	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1128062245	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002198843	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

Página 6 2025-12-24 11:44:04 ASOPAGOS SA -

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1003655741	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003828588	COMFENALCO CARTAGENA	21	$996.450	0.0400000	$39.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003829320	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006418823	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91448093	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73128985	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9145632	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002191218	COMFENALCO CARTAGENA	13	$616.850	0.0400000	$24.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1072524820	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193457137	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075216296	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1076502027	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7726890	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1041975979	COMFENALCO CARTAGENA	21	$996.450	0.0400000	$39.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73139060	COMFENALCO CARTAGENA	19	$901.550	0.0400000	$36.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9263699	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12129046	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0


TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11										
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	18	$1.412.500	$0	$0	$0	$0	9	$8.000	$0	$0	$1.420.500
PROTECCION	9	$1.017.600	$0	$0	$0	$0	9	$5.800	$0	$0	$1.023.400
COLFONDOS	1	$7.600	$0	$0	$0	$0	9	$100	$0	$0	$7.700
COLPENSIONES	1	$7.600	$0	$0	$0	$0	9	$100	$0	$0	$7.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	9	$700	$0	$114.700	$0	0	$0	$0	$114.700	$0	$0	$114.700
EPS CAJACOPI	3	$28.500	$0	0	$0	0	$0	$28.500	9	$200	$0	$28.700	$0	0	$0	$0	$28.700	$0	$0	$28.700
SANITAS	4	$100.700	$0	0	$0	0	$0	$100.700	9	$600	$0	$101.300	$0	0	$0	$0	$101.300	$0	$0	$101.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$60.800	$0	0	$0	0	$0	$60.800	9	$400	$0	$61.200	$0	0	$0	$0	$61.200	$0	$0	$61.200
NUEVA E.P.S. S.A.	7	$178.600	$0	0	$0	0	$0	$178.600	9	$1.100	$0	$179.700	$0	0	$0	$0	$179.700	$0	$0	$179.700
EPS-S MUTUAL - MOV	4	$45.600	$0	0	$0	0	$0	$45.600	9	$300	$0	$45.900	$0	0	$0	$0	$45.900	$0	$0	$45.900
SALUD TOTAL	3	$43.700	$0	0	$0	0	$0	$43.700	9	$300	$0	$44.000	$0	0	$0	$0	$44.000	$0	$0	$44.000
EPS-S COOSALUD	3	$39.900	$0	0	$0	0	$0	$39.900	9	$300	$0	$40.200	$0	0	$0	$0	$40.200	$0	$0	$40.200

ANEXO 5

PROGRAMACION

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1					
2		**LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC**	**119 días**	**lun 11/08/25**	**mar 30/12/25**
3		**Mantenimiento instalaciones Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC)**	**13 días**	**vie 10/10/25**	**sáb 25/10/25**
17		**Mantenimiento instalaciones Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF)**	**32 días**	**jue 4/09/25**	**vie 10/10/25**
49		**Mantenimiento y adecuación cocina de Flotiila de Submarinos del Caribe (FSUBC)**	**22 días**	**jue 30/10/25**	**mar 25/11/25**
56		**Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)**	**25 días**	**mar 2/12/25**	**mar 30/12/25**
71		**Mantenimiento instalaciones Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)**	**9 días**	**vie 12/12/25**	**lun 22/12/25**
74		**Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe**	**19 días**	**mar 2/12/25**	**mar 23/12/25**
85					
86		**Mantenimiento y adecuación de antiguo edificio de SEMAC para la Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC)**	**75 días**	**mar 2/09/25**	**sáb 29/11/25**
156		**Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG)**	**74 días**	**lun 11/08/25**	**vie 7/11/25**
173					
174		**Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Administración BNL01 (DEADM)**	**24 días**	**mar 2/12/25**	**lun 29/12/25**
206					
207		**Mantenimiento y adecuación instalaciones Estación Naval de Tierra Bomba (CENTB)**	**12 días**	**lun 24/11/25**	**sáb 6/12/25**
212					
213		**Mantenimiento y adecuación instalaciones Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV)**	**12 días**	**mar 2/12/25**	**lun 15/12/25**
224		**Mantenimiento y adecuación instalaciones Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 (OIARQ)**	**61 días**	**jue 18/09/25**	**sáb 29/11/25**
241					
242		**Mantenimiento y adecuación Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)**	**49 días**	**jue 2/10/25**	**sáb 29/11/25**
308					
309		**Mantenimiento y adecuación Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)**	**16 días**	**mar 2/12/25**	**vie 19/12/25**
338		**Mantenimiento y adecuación Casa Comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Comando CFNC)**	**13 días**	**vie 5/09/25**	**vie 19/09/25**
354		**Mantenimiento y adecuación Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)**	**26 días**	**lun 1/12/25**	**mar 30/12/25**
374					
375					
376					
377					
378					
379					
380					
381					

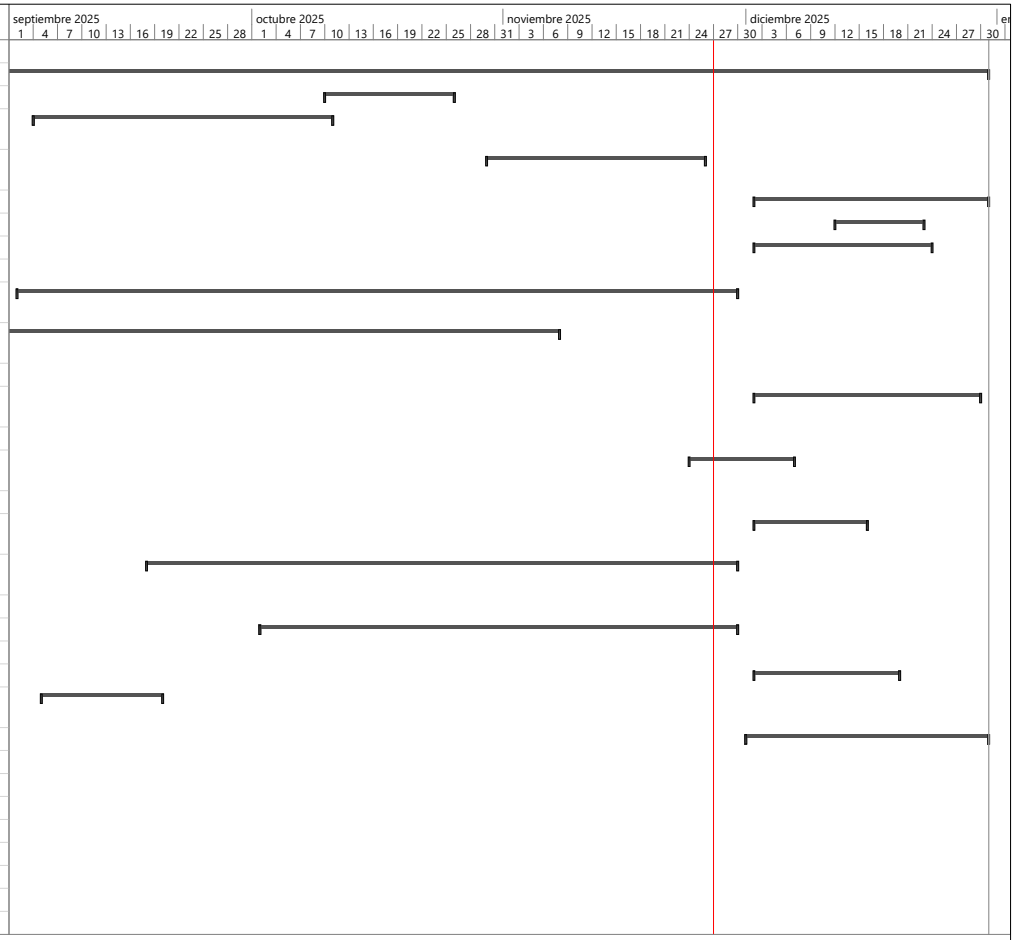

Proyecto: cronograma
Fecha: jue 27/11/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

ANEXO 6

INFORMES SEMANALES

CONSTRUCTORAM	INFORME SEMANAL			
	Oficio:		Fecha:27/09/2025	Folios

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 17 PERIODO: **01/12/2025 AL 30/12/2025**

CONTRATO : 0076-ARC-CBNL01-2025

OBJETO:MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE,LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FIJO

DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 205.958.060)

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAMAR
CONTRATO No.:	0077-ARC-CBNL01-2025	CONTRATO No.:	0076-ARC-CBNL01-2025
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 205.958.060)	VALOR INICIAL:	$ 1.029.154.049,00
		VALOR PAG. INTER, ANT.	$
VALOR ADICIÓN 1:		VALOR ADICIÓN 1:	$4.073.489,46 $
VALOR ACTUALIZADO:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.124.154.449,46
PLAZO INICIAL:	30 de diciembre de 2025.	PLAZO INICIAL:	31 de octubre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	30 de diciembre de 2025.	PLAZO ACTUALIZADO CON PRORROGA Y	30 de noviembre de 2025
FECHA DE FIRMA ADICIÓN 1	10/11/2025	FECHA DE FIRMA PRORR OGA 1	31 de octubre de 2025
VALOR ADICION No1	$ 23.883.300,00	PLAZO ACTUALIZADO CON PRORROGA Y Y MODIFICACIONES	30 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL+ADICION	$ 229.841.360,00	FECHA DE FIRMA PRORR OGA 2	1 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	xxx	VALOR ADICION No2	50.353.730,20 $
FECHA DE REINICIACI ÓN 1	xxx	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.184.486.177,76
FECHA DE INICIACIÓN:	1/09/2025	FECHA DE INICIACIÓN:	1/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 de diciembre de 2025.	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 de diciembre de 2025.	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 de diciembre de 2025
VALOR EJECUTADO	$ 199.497.705,14 83,59%	VALOR EJECUTADO	$ 995.135.401,70 84,00%
VALOR POR EJECUTAR:	$ 39.373.859 16,41%	VALOR POR EJECUTAR:	$ 189.050.047,76 16,17%
VALOR FACTURADO:	$ 195.997.139 84,41%	VALOR FACTURADO:	$ 154.495.854,68 13,00%
VALOR POR FACTURAR:	$ 134.874.225,00 45,59%	VALOR POR FACTURAR:	$ 865.893.794,04 86,83%

2.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS	x		en espera de actualizacion de polizas según acta de inicio
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES	x		
ACTAS DE VECINDAD		x	
DEBIDO A LA LEGALIZACION DEL ACTA CONSORCIAL EL ACTA DE INICIO QUEDO LEGALIZADA CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2025			
SE ESPERA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA ENTREGA DE LA TOTAL DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION DE ACTA PARCIAL			
EN ESPERA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION POR PARTE DE LA ENTIDAD.		x	EN ESPERA DE LEGALIZACION POR PARTE DE CURADURIA
EL 31 DE OCTUBRE SE LEGALIZA PRORROGA POR 30 DIAS CALENDARIO O HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y ADICION AL CONTRATO No1 POR UN VALOR DE $94970400,46			

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	SI	NO	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN
LICENCIAS DE CONSTRUCCION		x	EN ESPERA DE LEGALIZACION POR PARTE DE CURADURIA	
SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICOS	x		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS RED GAS	x		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS RED HIDRAULICO SANITARIO	x		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS RED AGUA	x		ACTIVO	

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

SEMANA	PERIODO	MONTO ACUMULADO PROGRAMADO AL 07/12/2025	% PROGRAMADO SEMANA	% PROGRAMADO ACUMULADO SEMANA	MONTO EJE SEMANA	% EJECUTADO SEMANA	% EJECUTADO ACUMULADO SEMANA	DIFERENCIA
S1	15/08/2025-20/08/2025	$ -	0,00%	0,00%	$ -	0,00%	0,00%	0,00%
S2	21/08/2025-27/08/2026	$ -	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
S3	28/08/2025-31/08/2027	$ -	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
S4	01/09/2025-07/09/2025	$ 30.350.525,29	2,95%	3,27%	$ 48.605.958,06	4,43%	4,43%	1,16%
S5	08/09/2025-14/09/2026	$ 84.462.963,86	8,21%	11,49%	$ 42.798.226,08	4,16%	8,59%	-3,01%
S6	15/09/2025-21/09/2027	$ 218.297.662,80	21,21%	25,00%	$ 67.937.589,40	6,60%	15,19%	-9,81%
S7	22/09/2025-28/09/2028	$ 387.390.682,58	37,64%	44,00%	$ 26.845.285,23	2,61%	17,80%	-26,20%
S8	29/09/2025-05/10/2029	$ 532.672.852,41	51,76%	51,00%	$ 24.209.356,37	2,35%	20,15%	-30,85%
S9	06/10/2025-12/10/2030	$ 726.677.722,16	70,61%	75,00%	$ 35.575.455,63	3,46%	23,61%	-51,39%
S10	13/10/2025-19/10/2031	$ 834.429.456,13	81,08%	84,00%	$ 17.990.128,01	1,75%	25,36%	-58,64%
S11	20/10/2025-26/10/2032	$ 855.380.851,84	83,85%	96,00%	$ 20.359.597,03	1,98%	28,31%	-64,62%
S12	27/10/2025-31/10/2033	$ 1.022.154.049,14	100,00%	100,00%	$ 45.124.699,22	4,38%	32,69%	-67,31%
S13	01/11/2025-09/11/2034	$ 868.230.995,53	84,36%	81,00%	$ 25.962.102,06	2,31%	35,00%	-46,00%
S14	10/11/2025-16/11/2035	$ 1.007.451.832,35	89,62%	91,00%	$ 82.163.977,72	7,31%	42,31%	-48,69%
S15	17/11/2025-23/11/2036	$ 1.092.701.133,99	97,20%	98,00%	$ 113.090.148,49	10,14%	52,45%	-45,55%
S16	24/11/2025-30/11/2037	$ 1.124.124.449,59	100,00%	100,00%	$ 105.017.662,31	9,40%	61,85%	-38,15%
S17	01/12/2025-7/12/2025	$ 766.622.229,44	64,73%	88,00%	$ 200.935.371,33	16,97%	78,81%	-9,19%
TOTAL		$ 766.622.229,44	64,73%	88,00%	$ 865.132.401,75			

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

		Tiempo total establecido	TOTAL DIAS CALENDARIO	Tiempo transcurrido(dias calendario)	
% TIEMPO TRANSCURRIDO	83,45%		139	116	

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2025

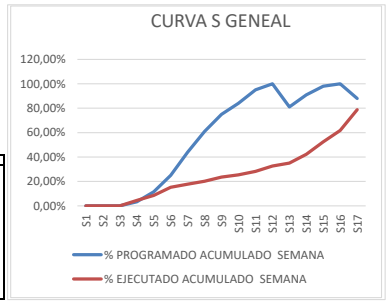

FRENTES EN EJECUCION

FRENTE	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	VALOR PRESUPUESTO + ADICION	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	% PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	
1	$ 13.099.269,80	$ 14.069.528	$ 13.741.701,55	98%	100%	$ 14.069.528,00	Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC)
2	$ 76.666.972,08	$ 82.220.400	$ 82.206.483,26	100%	100%	$ 82.220.400,00	Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF)
3	$ 11.130.463,99	$ 13.140.000	$ 13.122.495,34	100%	100%	$ 13.140.000,00	Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC) - Cocina
4	$ 209.915.455,06	$ 260.367.709	$ 112.918.187,66	43%	29%	$ 75.506.635,53	Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)
5	$ 9.879.764,17	$ 9.000.000	$ 0,00	0%	0%	$ 0,00	Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)
6	$ 82.831.739,85	$ 85.519.609	$ 85.519.609,48	100%	26%	$ 22.235.098,48	Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC)
7	$ 124.813.178,37	$ 130.751.900	$ 130.751.900,00	100%	100%	$ 130.751.900,00	Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC) - SEMAC
8	$ 26.241.374,53	$ 24.519.037	$ 24.519.037,40	100%	100%	$ 24.519.037,40	Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG)
9	$ 76.920.089,99	$ 126.266.968	$ 24.271.255,98	19%	51%	$ 64.396.153,50	Departamento de Administración BNL01 (DEADM)
10	$ 4.674.774,10	$ 10.221.801	$ 2.555.450,35	25%	100%	$ 10.221.801,41	Estación Naval de Tierra Bomba (CENTB)
11	$ 5.522.576,20	$ 7.207.533	$ 3.603.766,36	50%	61%	$ 4.396.594,95	Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV)
12	$ 6.489.194,44	$ 6.489.194	$ 6.489.194,44	100%	100%	$ 6.489.194,44	Departamento de Alojamientos Militares (DEALM)
13	$ 11.705.636,01	$ 20.147.380	$ 18.132.642,35	90%	100%	$ 20.147.380,39	Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 (OIARQ)
14	$ 195.478.100,55	$ 194.515.660	$ 194.515.659,93	100%	100%	$ 194.515.659,93	Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)
15	$ 46.041.994,62	$ 51.780.613	$ 46.602.551,84	90%	58%	$ 30.032.755,63	Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)
16	$ 43.616.041,94	$ 43.668.654	$ 43.469.150,50	100%	100%	$ 43.668.654,09	Casa Comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Comando CFNC)
17	$ 84.327.403,43	$ 104.522.190	$ 62.713.314,22	60%	29%	$ 30.311.435,21	Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)
VALOR TOTAL	$ 1.029.154.049,14	$ 1.124.488.179,34	$ 995.135.401,70	79%	66%	$ 766.622.229,44	

	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA			
	Código:	Versión:	Fecha:15/08/2025-27/08/2025	Página:


3.3 CONTROL DE PRESUPUESTO

INFORME SEMANAL No. 17 PERIODO:

N. SEMANA	PERIODO	PROGRAMADO ($) SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO ($)	($) EJECUTADO	($) EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA $
s1	**15/08/2025-20/08/2025**	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$	
s2	**21/08/2025-27/08/2026**	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$ 0	
s3	**28/08/2025-31/08/2027**	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$ 0	
s4	**01/09/2025-07/09/2025**	$ 30.350.525,29	$ 30.350.525,29	$ 45.605.958	$ 45.605.958	
s5	**08/09/2025-14/09/2026**	$ 84.462.963,86	$ 114.813.489,15	$ 42.798.227	$ 88.404.185	
s6	**15/09/2025-21/09/2027**	$ 103.484.173,75	$ 218.297.662,90	$ 67.937.569	$ 156.341.754	-$ 61.955.908,45
s7	**22/09/2025-28/09/2028**	$ 169.093.019,67	$ 387.390.682,58	$ 26.848.288	$ 183.190.043	-$ 204.200.639,90
s8	**29/09/2025-05/10/2029**	$ 145.282.169,83	$ 532.672.852,41	$ 24.209.356	$ 207.399.399	-$ 325.273.453,35
s9	**06/10/2025-12/10/2030**	$ 194.004.869,69	$ 726.677.722,10	$ 35.575.456	$ 242.974.855	-$ 483.702.867,42
s10	**13/10/2025-19/10/2031**	$ 107.751.734,03	$ 834.429.456,13	$ 17.990.128	$ 260.964.983	-$ 573.464.473,44
s11	**20/10/2025-26/10/2032**	$ 121.551.395,81	$ 955.980.851,94	$ 30.369.558	$ 291.334.541	-$ 664.646.311,33
s12	**27/10/2025-31/10/2033**	$ 73.173.197,19	$ 1.029.154.049,14	$ 45.124.699	$ 336.459.240	-$ 692.694.809,30
s13	**01/11/2025-09/11/2034**	-$ 160.923.053,58	$ 868.230.995,55	$ 25.962.102	$ 362.421.342	-$ 505.809.653,65
s14	**10/11/2025-16/11/2035**	$ 139.220.836,77	$ 1.007.451.832,32	$ 82.163.878	$ 444.585.220	-$ 562.866.612,70
s15	**16/11/2025-23/11/2036**	$ 85.249.301,67	$ 1.092.701.133,99	$ 113.990.148	$ 558.575.368	-$ 534.125.765,88
s16	**24/11/2025-30/11/2037**	$ 31.423.315,60	$ 1.124.124.449,59	$ 105.617.662	$ 664.193.030	-$ 459.931.419,17
s17	**01/12/2025-7/12/2025**	-$ 357.502.220,15	$ 766.622.229,44	$ 200.939.371	$ 865.132.402	$ 98.510.172,31

MES	TOTAL PRESUPUESTAL PROGRAMADO ($)	TOTAL PRESUPUESTAL EJECUTADO ($)	% TOTAL PRESUPUESTAL ACUMULADO PROGRAMADO	% TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		ATRASO O AVANCE EN $
TOTAL	**$ 766.622.229,44**	**$ 865.132.401,75**	**65%**	**73%**		$ 98.510.172,31

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

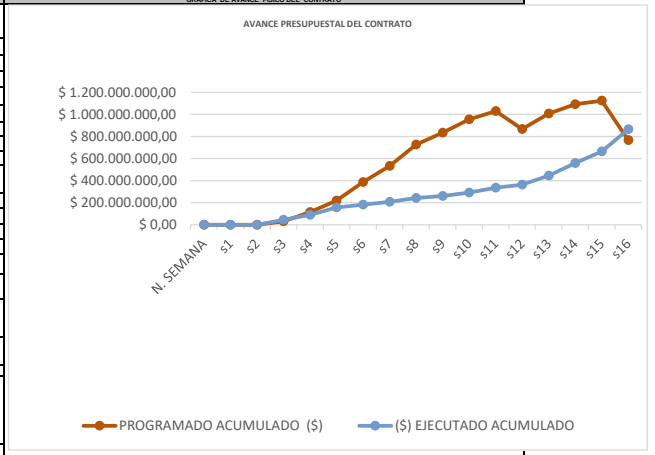

OBSERVACIONES

A LA FECHA SE PRESENTA UNA DIFERENCIA ENTRE ACUMULADO PROGRAMADO Y ACUMULADO EJECUTADO DE $98510172,31 Y UN ATRASO DEL 9,19% EN AVANCE FISICO

SITUACION TECNICO-ECONOMICA

FRENTES ACTIVOS:10

SE LEGALIZA PRORROGA HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 Y UNA ADICION PRESUPUESTAL DE $60.283.728,28

FRENTE 1	ESCUELA DE SUBMARINO DEL CARIBE(ESUBC):se terminan actividades en este frente,pendiente por recibir por interventoria.
FRENTE 2	CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION DE LA FLOTA(CECEF):las actividades estan a un 100% de ejecucion,interventoria en espera de entrega por parte del contratista
FRENTE 3	FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE-COCINA:se terminan actividades en este frente,pendiente por recibir por interventoria.
FRENTE 4	BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No12.(bim1)se continua con actividades de fundida de viga de cimentacion, fundida de antepecho ,en ejecucion de viga de amarre superior y fundida de tuberia 3" sanitaria.
FRENTE 5	ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS(ESCIG)en espera de incio de actividades por parte del contratista..
FRENTE 6	FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE (FSUBC)se continuan trabajos de acabados en baño.
FRENTE 7	FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE(SEMAC)en espera de de toma de detalles y activiades faltantes
FRENTE 8	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES(DESEG)frente terminado,en espera de entrega formal por parte del contratista.
FRENTE 9	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION(DEDM)en ejecucion de actividades de fundida de viga superior,montaje estructura metalica y cubierta en area inicialmente entregada para ejecucion de actividades.se inicia actividades parte elctrica en cubierta.
FRENTE 10	ESTACION DE TIERRA BOMBA(CNTB)en espera por instalacion de puertas en loker.
FRENTE 11	CENTRO DE DESARROLLO NAVAL(CEDNAV)en ejecucion de actividades legalizadas en ponencia
FRENTE 12	DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES(DEALM)en espera de entrega de actividades por parte del contratista.
FRENTE 13	OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA(OIARQ)en ejecucion de construccion de caseta para instalacion de bomba hidroflow.en mantenimiento de ventaneria existente
FRENTE 14	OFICINA DE PLANEACION BNLO1,se finalizan actividades en este frente,interventoria en espera de entrega por parte del contratista.
FRENTE 15	DEPENDENCIA DEL CUARTEL GENERAL FNC.en ejecucion de actividades contractuales
FRENTE 16	CASA COMANDANTE FUERZA NAVAL DEL CARIBE.LAS ACTIVIDADES ESTAN EJECUTADAS EN UN 100%,EL CONTRATISTA DEBE SUBSANAR DETALLES EN VENTANERIA,SE REALIZARÁ VISITA TECNCIA EL LUNES 29 DE SEPTEIMBRE DE 2025 PARA CERRAR BALANCE DE CANTIDADES.
FRENTE 17	ESCUELA DE SUPERFICIE DEL CARIBE.se finalizan activiades de obra civil,en espera de incio de actividades de montaje de estructur metalica

COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA LA PROXIMA SEMANA	RESPONSABLE	FECHA MAX DE ENTREGA
AUMENTO DE RENDIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	CONTRATISTA	10/12/2025

INFORME SEMANAL CONTRATISTA FRENTE 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE No17 Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)






Mantenimiento y adecuación Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)






Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)







Departamento de Administración BNL01 (DEADM)







FRENTE No7Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC) - SEMAC






FRENTE 15






Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC)






INFORME HSE
CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC LOTES: 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.

	0076-ARC-CBNL01-2025		
OBJETO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAMAR		
NIT	901973262-6		
PERIODO DEL INFORME	01-12-2025	**FECHA DEL INFORME**	06-12-2025

DIRECCION DEL PROYECTO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
Documentos solicitados y revisados sobre Seguridad y Salud en el Trabajo	Durante el periodo de informe, se han revisado los siguientes documentos: Informe SST y Ambiental, que corresponde al periodo 2025. Anexos: • Planillas de seguridad social (afiliaciones) Ds soluciones, consorcio inframar noviembre 2025. • Pausas activas 3 registros • Inspeccion de herramientas • Charlas 3 registros • Preoperacionales . 2 registro • Inspección de puestos de trabajo
Señalización, demarcación y controles en la construcción	N/A
Accidentes e Incidentes de trabajo	En el periodo del mes de diciembre no se han presentado accidentes laborales
Gestión de amenazas	Se realiza recorrido de seguridad en obra para identificación de posibles condiciones inseguras para evitar materialización de accidentes laborales.

Otros aspectos de índole de Seguridad y Salud en el Trabajo.	**Capacitaciones de Seguridad** • 5/10 protección solar • 3/12 ingreso y salida personal batallón • 1/12 ingreso y salida personal base naval
ACTIVIDAD	**OBSERVACIÓN**
	Personal del proyecto Durante el periodo del informe se contó con la participación temporal y permanente del siguiente personal:

Empresa	Personal
PERSONAL ADMINISTRATIVO	2
PERSONAL OPERATIVO	18
TOTAL	20

INFORME AMBIENTAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
DOCUMENTOS MEDIO AMBIENTE	Se presento plan de manejo ambiental.

INFORME HSE
CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC LOTES: 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.

CERTIFICADOS	***Residuos de obra*** • ***Residuos:*** Retales de icopor, escombro
SUSTANCIAS QUIMICAS	N/A
PUNTOS DE ACOPIO RESIDUOS	• Proyecto cuenta con un punto de acopio para materiales aprovechables.
INSTALACIONES LOCATIVAS	En buen estado.

REGISTROS FOTOGRAFICOS

PAUSAS ACTIVAS



INFORME HSE
CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC LOTES: 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.

CHARLAS DE SEGURIDAD 05 MINUTOS










INFORME HSE
CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC LOTES: 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.







Nombre del coordinador SST
Profesiónal sst
CC.45.763.450
Licencia SST Resolución N°1067

	INFORME SEMANAL			
Código:			Fecha:07/08/2025	Página:

1. INFORME SEMANAL

INFORME SEMANAL No. 18 PERIODO: **04/12/2025 AL 14/12/2025**

CONTRATO : 0075-ARC-CBNL01-2025

OBJETO:MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PERIODO UNITARIOS Y SIN PÓRDIDA DE REAJUSTE DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE,LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES PMO

DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 205.958.060)

2. RESUMEN DE CONTRATOS

2.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTOR ÍA			CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAMAR	
CONTRATO No.:	0077-ARC-CBNL01-2025	CONTRATO No.:	0075-ARC-CBNL01-2025	
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 205.958.060)	VALOR INICIAL:	$	1.029.154.049,00
		VALOR PAG. INTER, ANT.	$	
VALOR ADICIÓN 1:		VALOR ADICIÓN 1:		84.070.469,46 $
VALOR ACTUALIZADO:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($	VALOR ACTUALIZADO:	$	1.124.124.448,46
PLAZO INICIAL:	30 de diciembre de 2025.	PLAZO INICIAL:	31 de octubre de 2025	
PLAZO ACTUALIZADO:	30 de diciembre de 2025.	PLAZO ACTUALIZADO CON PRORROGA Y	30 de noviembre de 2025	
FECHA DE FIRMA ADICIÓN 1	10/11/2025	FECHA DE FIRMA PRORR OGA 1	31 de octubre de 2025	
VALOR ADICION No1	$ 23.883.300,00	PLAZO ACTUALIZADO CON PRORROGA Y Y MODIFICACIONES	30 de diciembre de 2025	
VALOR INICIAL+ADICION	$ 229.841.360,00	FECHA DE FIRMA PRORR OGA 2	1 de diciembre de 2025	
FECHA DE SUSPENSI ÓN 1	xxx	VALOR ADICION No2		60.260.750,38 $
FECHA DE REINICIACI ÓN 1	xxx	VALOR ACTUALIZADO	$	1.184.409.177,24
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2025	FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 de diciembre de 2025.	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de octubre de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 de diciembre de 2025.	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 de diciembre de 2025	
VALOR EJECUTADO	$ 108.407.750,14	50,50%	VALOR EJECUTADO	$ 600.575.128,93	55,50%
VALOR POR EJECUTAR:	$ 99.573.809	39,51%	VALOR POR EJECUTAR:	$ 197.645.888,69	13,34%
VALOR FACTURADO:	$ 108.307,138	51,11%	VALOR FACTURADO:	$ 134.680.804,68	13,60%
VALOR POR FACTURAR:	$ 104.574.522,00	49,09%	VALOR POR FACTURAR:	$ 969.203.704,04	86,40%

2.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS	x		en espera de actualizacion de polizas segun acta de inicio
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES	x		
ACTAS DE VECINDAD		x	
DEBIDO A LA LEGALIZACION DEL ACTA CONSORCIAL EL ACTA DE INICIO QUEDO LEGALIZADA CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2025			
SE ESPERA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA ENTREGA DE LA TOTAL DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION DE ACTA PARCIAL EN ESPERA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION POR PARTE DE LA ENTIDAD.		x	EN ESPERA DE LEGALIZACION POR PARTE DE
EL 31 DE OCTUBRE SE LEGALIZA PRORROGA POR 30 DIAS CALENDARIO O HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y ADICION AL CONTRATO No1 POR UN VALOR DE $34970400,46			

2. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

LICENCIAS, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES	SI	NO	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACI
LICENCIAS DE CONSTRUCCION		x	EN ESPERA DE LEGALIZACION POR PARTE DE CURADURIA	
SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICOS	x		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS RED GAS	x		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS RED HIDRAULICO SANITARIO	x		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS RED AGUA	x		ACTIVO	

2.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

SEMANA	PERIODO	MONTO ACUMULADO PROGRAMADO AL 14/12/2025	% PROGRAMADO SEMANA	% PROGRAMADO ACUMULADO SEMANA	MONTO $ EJE SEMANA	% EJECUTADO SEMANA	% EJECUTADO ACUMULADO SEMANA	DIFERENCIA
S1	15/08/2025-20/08/2025	$ -	0,00%	0,00%	$ -	0,00%	0,00%	0,00%
S2	21/08/2025-27/08/2026	$ -	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
S3	28/08/2025-31/08/2027	$	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
S4	01/09/2025-07/09/2025	$ 30.350.525,29	2,95%	3,27%	$ 45.605.958,06	4,43%	4,43%	1,16%
S5	08/09/2025-14/09/2026	$ 84.462.963,86	8,21%	11,48%	$ 42.736.226,98	4,16%	8,59%	-3,04%
S6	15/09/2025-21/09/2027	$ 218.297.662,80	21,21%	25,00%	$ 67.937.569,40	6,60%	15,19%	-9,81%
S7	22/09/2025-28/09/2028	$ 387.390.682,58	37,64%	44,00%	$ 26.848.288,23	2,61%	17,80%	-26,20%
S8	29/09/2025-05/10/2029	$ 530.472.852,41	51,76%	61,00%	$ 24.209.356,37	2,35%	20,15%	-40,85%
S9	06/10/2025-12/10/2030	$ 726.677.722,10	70,61%	75,00%	$ 35.575.455,63	3,46%	23,61%	-51,39%
S10	13/10/2025-19/10/2031	$ 834.429.456,13	81,08%	84,00%	$ 17.399.129,01	1,75%	25,36%	-58,64%
S11	20/10/2025-26/10/2032	$ 955.980.851,94	92,89%	93,00%	$ 30.369.957,93	2,95%	28,31%	-64,69%
S12	27/10/2025-31/10/2033	$ 1.029.154.049,14	100,00%	100,00%	$ 45.124.699,22	4,38%	32,69%	-67,31%
S13	01/11/2025-09/11/2034	$ 868.230.955,55	84,36%	91,00%	$ 25.982.102,06	2,53%	35,22%	-55,78%
S14	10/11/2025-16/11/2036	$ 1.007.451.822,32	89,62%	91,00%	$ 82.183.877,72	7,31%	42,31%	-48,69%
S15	17/11/2025-23/11/2036	$ 1.092.791.133,99	97,20%	98,00%	$ 113.990.148,49	10,14%	52,45%	-45,55%
S16	24/11/2025-30/11/2037	$ 1.124.124.448,03	100,00%	100,00%	$ 105.617.662,31	9,40%	61,85%	-38,15%
S17	01/12/2025-7/12/2025	$ 766.622.229,44	64,73%	88,00%	$ 200.939.371,33	16,97%	78,81%	-9,19%
S18	08/12/2025-14/12/2026	$ 967.321.029,03	81,67%	94,00%	$ 121.742.727,17	10,28%	89,09%	-4,91%
TOTAL		$ 967.321.029,03	81,67%	94,00%	$ 966.575.128,93			

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total estimado		TOTAL DIAS CALENDARIO	Tiempo transcurrido(días calendario)	
% TIEMPO TRANSCURRIDO	88,49%	139	123	

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025

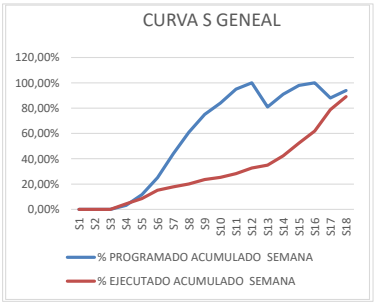

FRENTES EN EJECUCION

FRENTE	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	VALOR PRESUPUESTO + ADICION	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	% PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	
1	$ 13.099.269,80	$ 14.069.528	$ 14.069.528	100%	100%	$ 14.069.528,00	Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC)
2	$ 76.666.972,08	$ 82.220.400	$ 82.206.483,26	100%	100%	$ 82.220.400,00	Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF)
3	$ 11.130.463,99	$ 13.140.000	$ 13.122.495,94	100%	100%	$ 13.140.000,00	Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC) - Cocina
4	$ 209.915.455,06	$ 260.367.709	$ 188.198.489,24	72%	69%	$ 189.259.010,67	Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)
5	$ 9.879.764,17	$ 9.000.000	$ 0,00	0%	22%	$ 1.980.000,00	Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)
7	$ 82.631.739,85	$ 85.519.609	$ 85.519.609,48	100%	88%	$ 85.587.746,18	Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC)
7	$ 124.813.178,37	$ 130.751.901	$ 130.751.900,50	100%	100%	$ 130.751.900,50	Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC) - SEMAC
8	$ 26.241.374,53	$ 24.519.037	$ 24.519.037,40	100%	100%	$ 24.519.037,40	Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG)
9	$ 76.920.089,99	$ 126.266.968	$ 52.382.007,89	41%	76%	$ 95.982.895,41	Departamento de Administración BNL01 (DEADM)
10	$ 4.674.774,10	$ 10.221.901	$ 9.000.000,00	88%	100%	$ 10.221.901,41	Estación Naval de Tierra Bomba (CENTB)
11	$ 5.522.576,20	$ 7.207.533	$ 5.500.000,00	76%	94%	$ 6.775.080,75	Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV)
12	$ 6.489.194,44	$ 6.489.194	$ 6.489.194,44	100%	100%	$ 6.489.194,44	Departamento de Alojamientos Militares (DEALM)
13	$ 11.785.656,01	$ 20.147.380	$ 19.132.642,26	95%	100%	$ 20.147.380,39	Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 (OIARQ)
14	$ 195.478.100,55	$ 194.515.660	$ 194.515.659,93	100%	91%	$ 177.559.240,54	Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)
15	$ 46.041.994,62	$ 51.780.613	$ 49.000.000,00	95%	100%	$ 51.780.613,76	Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)
16	$ 43.616.041,94	$ 43.668.654	$ 43.489.150,50	100%	100%	$ 43.668.654,09	Casa Comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Comando CFNC)
17	$ 84.327.403,43	$ 104.522.190	$ 70.000.000,00	67%	81%	$ 83.758.530,13	Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)
VALOR TOTAL	$ 1.029.154.049,14	$ 1.184.409.179,24	$ 966.575.128,93	82%	82%	$ 967.321.029,03	

CONSTRUCTORA RAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S. NIT: 901024455-3	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA			
	Código:	Versión:	Fecha:15/08/2025-27/08/2025	Página:


3.3 CONTROL DE PRESUPUESTO

INFORME SEMANAL No. 17 PERIODO:

N. SEMANA	PERIODO	PROGRAMADO ($) SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO ($)	($) EJECUTADO	($) EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA $
s1	**15/08/2025-20/08/2025**	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$	
s2	**21/08/2025-27/08/2026**	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$ 0	
s3	**28/08/2025-31/08/2027**	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$ 0	
s4	**01/09/2025-07/09/2025**	$ 30.350.525,29	$ 30.350.525,29	$ 45.605.958	$ 45.605.958	
s5	**08/09/2025-14/09/2026**	$ 84.462.963,86	$ 114.813.489,15	$ 42.798.227	$ 88.404.185	
s6	**15/09/2025-21/09/2027**	$ 103.484.173,75	$ 218.297.662,90	$ 67.937.569	$ 156.341.754	-$ 61.955.908,45
s7	**22/09/2025-28/09/2028**	$ 169.093.019,67	$ 387.390.682,58	$ 26.848.288	$ 183.190.043	-$ 204.200.639,90
s8	**29/09/2025-05/10/2029**	$ 145.282.169,83	$ 532.672.852,41	$ 24.209.356	$ 207.399.399	-$ 325.273.453,35
s9	**06/10/2025-12/10/2030**	$ 194.004.869,69	$ 726.677.722,10	$ 35.575.456	$ 242.974.855	-$ 483.702.867,42
s10	**13/10/2025-19/10/2031**	$ 107.751.734,03	$ 834.429.456,13	$ 17.990.128	$ 260.964.983	-$ 573.464.473,44
s11	**20/10/2025-26/10/2032**	$ 121.551.395,81	$ 955.980.851,94	$ 30.369.558	$ 291.334.541	-$ 664.646.311,33
s12	**27/10/2025-31/10/2033**	$ 73.173.197,19	$ 1.029.154.049,14	$ 45.124.699	$ 336.459.240	-$ 692.694.809,30
s13	**01/11/2025-09/11/2034**	-$ 160.923.053,58	$ 868.230.995,55	$ 25.962.102	$ 362.421.342	-$ 505.809.653,65
s14	**10/11/2025-16/11/2035**	$ 139.220.836,77	$ 1.007.451.832,32	$ 82.163.878	$ 444.585.220	-$ 562.866.612,70
s15	**16/11/2025-23/11/2036**	$ 85.249.301,67	$ 1.092.701.133,99	$ 113.990.148	$ 558.575.368	-$ 534.125.765,88
s16	**24/11/2025-30/11/2037**	$ 31.423.315,60	$ 1.124.124.449,59	$ 105.617.662	$ 664.193.030	-$ 459.931.419,17
s17	**01/12/2025-7/12/2025**	-$ 357.502.220,15	$ 766.622.229,44	$ 200.939.371	$ 865.132.402	$ 98.510.172,31
s18	**08/12/2025-14/12/2026**	$ 200.698.799,59	$ 967.321.029,03	$ 121.742.727	$ 986.875.129	$ 19.554.099,89

MES	TOTAL PRESUPUESTAL PROGRAMADO ($)	TOTAL PRESUPUESTAL EJECUTADO ($)	% TOTAL PRESUPUESTAL ACUMULADO PROGRAMADO	% TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		ATRASO O AVANCE EN $
TOTAL	**$ 967.321.029,03**	**$ 986.875.128,93**	**82%**	**83%**		**$ 19.554.099,89**

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

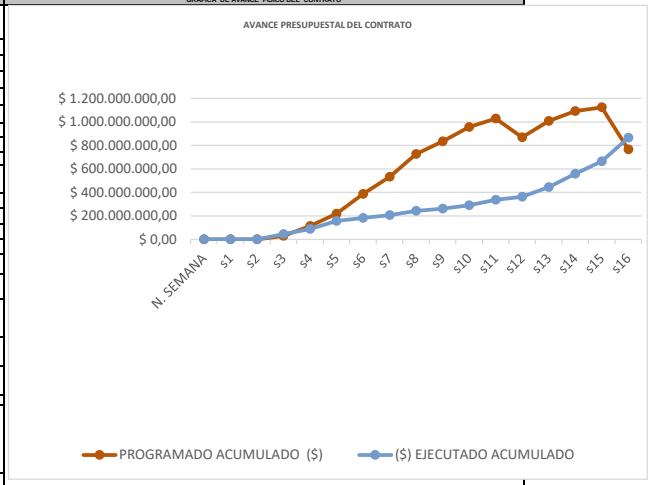

OBSERVACIONES

A LA FECHA SE PRESENTA UNA DIFERENCIA ENTRE ACUMULADO PROGRAMADO Y ACUMULADO EJECUTADO DE $19,554,099.89 Y UN ATRASO DEL 4,91% EN AVANCE FISICO

SITUACION TECNICO-ECONOMICA

FRENTES ACTIVOS:7

SE LEGALIZA PRORROGA HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 Y UNA ADICION PRESUPUESTAL DE $60.283.728,28

FRENTE 1	ESCUELA DE SUBMARINO DEL CARIBE(ESUBC):se terminan actividades en este frente,pendiente por recibir por interventoria.
FRENTE 2	CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION DE LA FLOTA(CECEF):las actividades estan a un 100% de ejecucion,interventoria en espera de entrega por parte del contratista
FRENTE 3	FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE-COCINA:se terminan actividades en este frente,pendiente por recibir por interventoria.
FRENTE 4	BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No12.(bim1)se continua con actividades de fundida de viga de cimentacion, fundida de antepecho ,en ejecucion de viga de amarre superior y fundida de tuberia 3" sanitaria.
FRENTE 5	ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS(ESCIG)en espera de incio de actividades por parte del contratista..
FRENTE 6	FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE (FSUBC)en espera de instalacion de cielo raso faltante
FRENTE 7	FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE(SEMAC)en espera de de toma de detalles y activiades faltantes
FRENTE 8	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES(DESEG)frente terminado,en espera de entrega formal por parte del contratista.
FRENTE 9	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION(DEDM)se inicia actividades de desmonte e instalacion de cielo raso en pcv 9mm
FRENTE 10	ESTACION DE TIERRA BOMBA(CNTB)en espera por instalacion dintel superior en drywall
FRENTE 11	CENTRO DE DESARROLLO NAVAL(CEDNAV)en ejecucion de actividades legalizadas en ponencia
FRENTE 12	DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES(DEALM)en espera de entrega de actividades por parte del contratista.
FRENTE 13	OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA(OIARQ)en espera de instalacion de sanitario y suiche para encendido de baño.
FRENTE 14	OFICINA DE PLANEACION BNLO1,se finalizan actividades en este frente,interventoria en espera de entrega por parte del contratista.
FRENTE 15	DEPENDENCIA DEL CUARTEL GENERAL FNC.en espera de toma de detalles en mueble superior cocina
FRENTE 16	CASA COMANDANTE FUERZA NAVAL DEL CARIBE.LAS ACTIVIDADES ESTAN EJECUTADAS EN UN 100%,EL CONTRATISTA DEBE SUBSANAR DETALLES EN VENTANERIA,SE REALIZARÁ VISITA TECNCIA EL LUNES 29 DE SEPTEIMBRE DE 2025 PARA CERRAR BALANCE DE CANTIDADES.
FRENTE 17	ESCUELA DE SUPERFICIE DEL CARIBE.se finalizan activiades de obra civil,en espera de incio de actividades de montaje de estructur metalica

COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA LA PROXIMA SEMANA	RESPONSABLE	FECHA MAX DE ENTREGA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CUBIERTA FRENTE 5 Y 17	CONTRATISTA	16/12/2025
TOMA DE DETALLES EN FRENTES PARA ENTREGA FORMAL	CONTRATISTA	17/12/2025

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO AL

INFORME SEMANAL CONTRATISTA FRENTE 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE No17 Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)



FRENTE 11



Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)



Departamento de Administración BNL01 (DEADM)



FRENTE 15



Ricardo Amaya.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORME HSE
CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC LOTES: 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.

	0076-ARC-CBNL01-2025		
OBJETO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAMAR		
NIT	901973262-6		
PERIODO DEL INFORME	09-12-2025	**FECHA DEL INFORME**	13-12-2025

DIRECCION DEL PROYECTO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
Documentos solicitados y revisados sobre Seguridad y Salud en el Trabajo	Durante el periodo de informe, se han revisado los siguientes documentos: Informe SST y Ambiental, que corresponde al periodo 2025. Anexos: • Planillas de seguridad social (afiliaciones) Ds soluciones, consorcio inframar noviembre 2025. • Pausas activas 2 registros • Inspeccion de herramientas • Charlas 2 registros • Preoperacionales . 2 registro • Inspección de puestos de trabajo
Señalización, demarcación y controles en la construcción	N/A
Accidentes e Incidentes de trabajo	En el periodo del mes de diciembre no se han presentado accidentes laborales

Gestión de amenazas	Se realiza recorrido de seguridad en obra para identificación de posibles condiciones inseguras para evitar materialización de accidentes laborales.
Otros aspectos de índole de Seguridad y Salud en el Trabajo.	**Capacitaciones de Seguridad** • 11/12 Herramientas cortantes • 12/12 Accidentes e incidentes
ACTIVIDAD	**OBSERVACIÓN**
	Personal del proyecto Durante el periodo del informe se contó con la participación temporal y permanente del siguiente personal:

Empresa	Personal
PERSONAL ADMINISTRATIVO	2
PERSONAL OPERATIVO	18
TOTAL	20

INFORME HSE
CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC LOTES: 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.

INFORME AMBIENTAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
DOCUMENTOS MEDIO AMBIENTE	Se presento plan de manejo ambiental.
CERTIFICADOS	***Residuos de obra*** • ***Residuos:*** Retales de icopor, escombro
SUSTANCIAS QUIMICAS	N/A
PUNTOS DE ACOPIO RESIDUOS	• Proyecto cuenta con un punto de acopio para materiales aprovechables.
INSTALACIONES LOCATIVAS	En buen estado.

INFORME HSE
CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC LOTES: 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.

REGISTROS FOTOGRAFICOS

PAUSAS ACTIVAS





CHARLAS DE SEGURIDAD 05 MINUTOS






INFORME HSE
CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC LOTES: 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.







Nombre del coordinador SST
Profesiónal sst
CC.45.763.450
Licencia SST Resolución N°1067

CONSTRUCTORA RAM	**INFORME SEMANAL**		
	Código:	**Fecha:07/08/2025**	**Página:**

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 19 **PERIODO:** **10/12/2025 AL 21/12/2025**

CONTRATO : 0076-ARC-CSNL01-2025

OBJETO:MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE,LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES PNC

DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 205.958.060)

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**		
INTERVENTOR:	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS**		**CONTRATISTA:**	**CONSORCIO INFRAMAR**	
CONTRATO No.:	**0077-ARC-CSNL01-2025**		**CONTRATO No.:**	**0076-ARC-CSNL01-2025**	
VALOR INICIAL:	**DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 205.958.060)**		**VALOR INICIAL:**	**$**	**1.029.154.049,00**
			VALOR PAG. INTER, ANT.	**$** -	
VALOR ADICIÓN 1:			**VALOR ADICIÓN 1:**		**84.970.400,46 C**
VALOR ACTUALIZADO:	**DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($**		**VALOR ACTUALIZADO:**	**$**	**1.184.124.449,46**
PLAZO INICIAL:	**30 de diciembre de 2025.**		**PLAZO INICIAL:**	**31 de octubre de 2025**	
PLAZO ACTUALIZADO:	**30 de diciembre de 2025.**		**PLAZO ACTUALIZADO CON PRÓRROGA Y**	**30 de noviembre de 2025**	
FECHA DE FIRMA ADICIÓN 1	**10/11/2025**		**FECHA DE FIRMA PRORR OGA 1**	**31 de octubre de 2025**	
VALOR ADICION No1	**$ 23.883.300,00**		**PLAZO ACTUALIZADO CON PRÓRROGA Y Y MODIFICACIONES**	**30 de diciembre de 2025**	
VALOR INICIAL+ADICION	**$ 229.841.360,00**		**FECHA DE FIRMA PRORR OGA 2**	**1 de diciembre de 2025**	
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	**xxx**		**VALOR ADICION No2**		**69.086.738,58 C**
FECHA DE REINICIACIÓN 1	**xxx**		**VALOR ACTUALIZADO:**	**$**	**1.184.456.177,74**
FECHA DE INICIACIÓN:	**14/08/2025**		**FECHA DE INICIACIÓN:**	**14/08/2025**	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**30 de diciembre de 2025.**		**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	**31 de octubre de 2025**	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**30 de diciembre de 2025.**		**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	**30 de diciembre de 2025**	
VALOR EJECUTADO	**$ 193.094.395,79**	**88,02%**	**VALOR EJECUTADO**	**$ 1.048.849.414,23**	**88,56%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 48.817.181**	**22,73%**	**VALOR POR EJECUTAR:**	**$ 135.606.763,51**	**13,17%**
VALOR FACTURADO:	**$ 168.307.138**	**91,11%**	**VALOR FACTURADO:**	**$ 831.007.368,88**	**79,17%**
VALOR POR FACTURAR:	**$ 154.874.553,69**	**49,97%**	**VALOR POR FACTURAR:**	**$ 353.526.707,84**	**31,43%**

2.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
VIGENTES LAS POLIZAS	x		en espera de actualizacion de polizas según acta de inicio
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES	x		
ACTAS DE VECINDAD		x	
DEBIDO A LA LEGALIZACION DEL ACTA CONSORCIAL EL ACTA DE INICIO QUEDO LEGALIZADA CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2025			
SE ESPERA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA ENTREGA DE LA TOTAL DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION DE ACTA PARCIAL			
EN ESPERA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION POR PARTE DE LA ENTIDAD.		x	EN ESPERA DE LEGALIZACION POR PARTE DE
EL 31 DE OCTUBRE SE LEGALIZA PRORROGA POR 30 DIAS CALENDARIO O HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y ADICION AL CONTRATO No1 POR UN VALOR DE $84970400,46			

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

LICENCIAS, PERMISOS Y/O CERTIFICADOS	**SI**	**NO**	**DESCRIPCIÓN DEL ESTADO**	**FECHA DE APROBACIÓN**
LICENCIAS DE CONSTRUCCION	x			
SERVICIOS PUBLICOS EL ECTRICOS	x		**ACTIVO**	
SERVICIOS PUBLICOS RED GAS	x		**ACTIVO**	
SERVICIOS PUBLICOS RED HIDRAULICO SANITARIO	x		**ACTIVO**	
SERVICIOS PUBLICOS RED AGUA	x		**ACTIVO**	

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

SEMANA	**PERIODO**	**MONTO ACUMULADO PROGRAMADO AL 14/12/2025**	**% PROGRAMADO SEMANA**	**% PROGRAMADO ACUMULADO SEMANA**	**MONTO EJE SEMANA**	**% EJECUTADO SEMANA**	**% EJECUTADO ACUMULADO SEMANA**	**DIFERENCIA**
S1	15/08/2025-20/08/2025	$ -	0,00%	0,00%	$ -	0,00%	0,00%	0,00%
S2	21/08/2025-27/08/2025	$ -	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
S3	28/08/2025-31/08/2027	$ -	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
S4	01/09/2025-07/09/2025	$ 30.350.525,29	2,95%	3,27%	$ 45.605.958,06	4,43%	4,43%	1,16%
S5	08/09/2025-14/09/2026	$ 84.462.963,86	8,21%	11,60%	$ 42.738.226,38	4,16%	8,59%	-3,01%
S6	15/09/2025-21/09/2027	$ 218.297.662,90	21,21%	25,00%	$ 67.937.569,40	6,60%	15,19%	-9,81%
S7	22/09/2025-28/09/2028	$ 387.390.682,58	37,64%	44,00%	$ 25.648.289,23	2,61%	17,80%	-26,20%
S8	29/09/2025-05/10/2029	$ 532.672.852,41	51,76%	61,00%	$ 24.209.356,37	2,35%	20,15%	-40,85%
S9	06/10/2025-12/10/2030	$ 726.677.722,10	70,61%	75,00%	$ 35.575.455,63	3,46%	23,61%	-51,39%
S10	13/10/2025-19/10/2031	$ 834.426.458,13	81,08%	84,00%	$ 17.880.128,01	1,73%	25,35%	-58,65%
S11	20/10/2025-26/10/2032	$ 956.880.811,84	92,99%	95,00%	$ 30.369.557,93	2,95%	28,31%	-66,69%
S12	27/10/2025-31/10/2033	$ 1.020.154.049,14	100,00%	100,00%	$ 45.124.699,22	4,38%	32,69%	-67,31%
S13	01/11/2025-09/11/2034	$ 868.230.995,55	84,36%	81,00%	$ 25.982.102,06	2,31%	35,00%	-46,00%
S14	10/11/2025-16/11/2035	$ 1.007.451.833,32	89,62%	91,00%	$ 82.163.877,72	7,31%	42,31%	-48,69%
S15	17/11/2025-23/11/2036	$ 1.000.701.133,92	97,30%	98,00%	$ 113.990.148,49	10,14%	52,45%	-45,55%
S16	24/11/2025-30/11/2037	$ 1.124.124.449,59	100,00%	100,00%	$ 105.617.662,31	9,40%	61,85%	-38,15%
S17	01/12/2025-7/12/2025	$ 786.822.229,44	64,73%	88,00%	$ 200.939.371,33	16,97%	78,81%	-9,19%
S18	08/12/2025-14/12/2026	$ 967.321.023,83	81,67%	94,00%	$ 121.742.727,17	10,28%	89,09%	-4,91%
S19	15/12/2025-21/12/2027	$ 1.107.089.654,83	93,47%	98,00%	$ 61.874.285,30	5,23%	95,32%	-3,68%
TOTAL		$ 1.107.089.654,83	93,47%	94,00%	$ 1.048.849.414,23			

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total estipulado		**TOTAL DIAS CALENDARIO**	**Tiempo transcurrido(días calendario)**	
% TIEMPO TRANSCURRIDO	**93,53%**	**139**	**130**	

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025

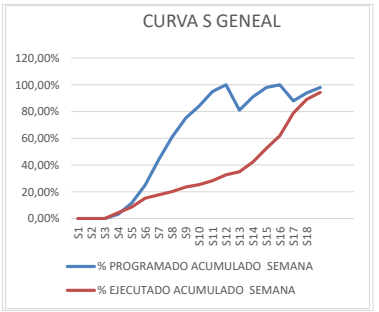

FRENTES EN EJECUCION

FRENTE	**VALOR PRESUPUESTO INICIAL**	**VALOR PRESUPUESTO + ADICIONES**	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA**	**% EJECUTADO A LA FECHA**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**	**VALOR PROGRAMADO ACUMULADO**	
1	$ 13.099.269,80	$ 14.069.528	$ 14.069.528	100%	100%	$ 14.069.528,00	**Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC)**
2	$ 76.666.972,08	$ 82.220.400	$ 82.206.483,36	100%	100%	$ 82.220.400,00	**Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF)**
3	$ 11.130.463,99	$ 13.140.000	$ 13.122.495,04	100%	100%	$ 13.140.000,00	**Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC) - Cocina**
4	$ 209.915.455,06	$ 260.367.709	$ 206.945.420,03	79%	91%	$ 236.934.614,94	**Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)**
5	$ 9.879.764,17	$ 9.000.000	$ 3.000.000,00	33%	89%	$ 8.010.000,00	**Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)**
6	$ 82.631.739,85	$ 85.519.609	$ 85.519.609,48	100%	91%	$ 77.822.944,63	**Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC)**
7	$ 124.813.178,37	$ 130.751.901	$ 130.751.900,93	100%	100%	$ 130.751.900,93	**Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC) - SEMAC**
8	$ 26.241.374,53	$ 24.519.037	$ 24.519.037,40	100%	100%	$ 24.519.037,40	**Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG)**
9	$ 76.920.089,99	$ 126.266.968	$ 85.730.087,47	68%	90%	$ 113.640.270,89	**Departamento de Administración BNL01 (DEADM)**
10	$ 4.674.774,10	$ 10.221.801	$ 10.221.801,41	100%	100%	$ 10.221.801,41	**Estación Naval de Tierra Bomba (CENTB)**
11	$ 5.522.576,20	$ 7.207.533	$ 7.207.532,71	100%	94%	$ 6.775.080,75	**Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV)**
12	$ 6.489.194,44	$ 6.489.194	$ 6.489.194,44	100%	100%	$ 6.489.194,44	**Departamento de Alojamientos Militares (DEALM)**
13	$ 11.705.656,01	$ 20.147.380	$ 19.400.000,00	96%	100%	$ 20.147.380,39	**Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 (OIARQ)**
14	$ 195.478.100,55	$ 194.515.660	$ 194.515.659,53	100%	91%	$ 177.029.292,54	**Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)**
15	$ 46.041.964,62	$ 51.780.613	$ 51.780.613,15	100%	100%	$ 51.780.613,15	**Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)**
16	$ 43.616.041,94	$ 43.668.654	$ 43.668.653,50	100%	100%	$ 43.668.654,00	**Casa Comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Comando CFNC)**
17	$ 84.327.403,43	$ 104.522.190	$ 70.000.000,00	67%	89%	$ 89.889.083,72	**Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)**
VALOR TOTAL	**$ 1.029.154.049,14**	**$ 1.184.456.179,34**	**$ 1.048.849.414,23**	**89%**	**99%**	**$ 1.107.089.654,83**	

CONSTRUORAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S. NIT: 901024489-3	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA			
	Código:	Versión:	Fecha:15/08/2025-27/08/2025	Página:


3.3 CONTROL DE PRESUPUESTO

INFORME SEMANAL No. 19 PERIODO:

N. SEMANA	PERIODO	PROGRAMADO ($) SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO ($)	($) EJECUTADO	($) EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA $
s1	**15/08/2025-20/08/2025**	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$	
s2	**21/08/2025-27/08/2026**	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$ 0	
s3	**28/08/2025-31/08/2027**	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$ 0	
s4	**01/09/2025-07/09/2025**	$ 30.350.525,29	$ 30.350.525,29	$ 45.605.958	$ 45.605.958	
s5	**08/09/2025-14/09/2026**	$ 84.462.963,86	$ 114.813.489,15	$ 42.798.227	$ 88.404.185	
s6	**15/09/2025-21/09/2027**	$ 103.484.173,75	$ 218.297.662,90	$ 67.937.569	$ 156.341.754	-$ 61.955.908,45
s7	**22/09/2025-28/09/2028**	$ 169.093.019,67	$ 387.390.682,58	$ 26.848.288	$ 183.190.043	-$ 204.200.639,90
s8	**29/09/2025-05/10/2029**	$ 145.282.169,83	$ 532.672.852,41	$ 24.209.356	$ 207.399.399	-$ 325.273.453,35
s9	**06/10/2025-12/10/2030**	$ 194.004.869,69	$ 726.677.722,10	$ 35.575.456	$ 242.974.855	-$ 483.702.867,42
s10	**13/10/2025-19/10/2031**	$ 107.751.734,03	$ 834.429.456,13	$ 17.990.128	$ 260.964.983	-$ 573.464.473,44
s11	**20/10/2025-26/10/2032**	$ 121.551.395,81	$ 955.980.851,94	$ 30.369.558	$ 291.334.541	-$ 664.646.311,33
s12	**27/10/2025-31/10/2033**	$ 73.173.197,19	$ 1.029.154.049,14	$ 45.124.699	$ 336.459.240	-$ 692.694.809,30
s13	**01/11/2025-09/11/2034**	-$ 160.923.053,58	$ 868.230.995,55	$ 25.962.102	$ 362.421.342	-$ 505.809.653,65
s14	**10/11/2025-16/11/2035**	$ 139.220.836,77	$ 1.007.451.832,32	$ 82.163.878	$ 444.585.220	-$ 562.866.612,70
s15	**16/11/2025-23/11/2036**	$ 85.249.301,67	$ 1.092.701.133,99	$ 113.990.148	$ 558.575.368	-$ 534.125.765,88
s16	**24/11/2025-30/11/2037**	$ 31.423.315,60	$ 1.124.124.449,59	$ 105.617.662	$ 664.193.030	-$ 459.931.419,17
s17	**01/12/2025-7/12/2025**	-$ 357.502.220,15	$ 766.622.229,44	$ 200.939.371	$ 865.132.402	$ 98.510.172,31
s18	**15/12/2025-21/12/2026**	$ 200.698.799,59	$ 967.321.029,03	$ 121.742.727	$ 986.875.129	$ 19.554.099,89
s19	**08/12/2025-14/12/2027**	$ 139.768.625,80	$ 1.107.089.654,83	$ 61.974.285	$ 1.048.849.414	-$ 58.240.240,60

MES	TOTAL PRESUPUESTAL PROGRAMADO ($)	TOTAL PRESUPUESTAL EJECUTADO ($)	% TOTAL PRESUPUESTAL ACUMULADO PROGRAMADO	% TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		ATRASO O AVANCE EN $
TOTAL	**$ 1.107.089.654,83**	**$ 1.048.849.414,23**	**93%**	**89%**		**-$ 58.240.240,60**

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

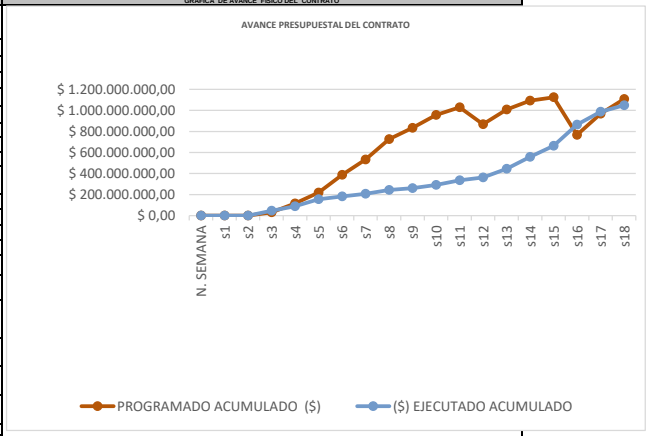

OBSERVACIONES

A LA FECHA SE PRESENTA UNA DIFERENCIA ENTRE ACUMULADO PROGRAMADO Y ACUMULADO EJECUTADO DE $58.240.240,60 Y UN ATRASO DEL 3,68% EN AVANCE FISICO

SITUACION TECNICO-ECONOMICA

FRENTES ACTIVOS:4
SE LEGALIZA PRORROGA HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 Y UNA ADICION PRESUPUESTAL DE $60.283.728,28

FRENTE 1	ESCUELA DE SUBMARINO DEL CARIBE(ESUBC):usuario firma a satisfaccion la terminacion de las actividades contractuales
FRENTE 2	CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION DE LA FLOTA(CECEF):las actividades estan a un 100% de ejecucion,interventoria en espera de entrega por parte del contratista
FRENTE 3	FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE-COCINA:se terminan actividades en este frente,pendiente por recibir por interventoria.
FRENTE 4	BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No12.(bim1)en ejecucion ultimo tramo de fundida de viga de cimentacion, fundida de antepecho ,en ejecucion de viga de amarre superior y fundida de tuberia 3" sanitaria.en ejecucion de corte y fundida de anden perimetral zona externa
FRENTE 5	ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS(ESCIG)en ejecucion de actividades de instalacion de cubierta exterior.
FRENTE 6	FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE (FSUBC)en ejecucion de cielo raso faltante
FRENTE 7	FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE(SEMAC)en espera de de toma de detalles y activiades faltantes
FRENTE 8	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES(DESEG)frente terminado,en espera de entrega formal por parte del contratista.
FRENTE 9	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION(DEDM)en actividades de montaje de cielo raso en pvc e impermeabilizacion de cubierta.
FRENTE 10	ESTACION DE TIERRA BOMBA(CNTB)usuario firma a satisfaccion la terminacion de las actividades contractuales
FRENTE 11	CENTRO DE DESARROLLO NAVAL(CEDNAV)usuario firma a satisfaccion la terminacion de las actividades contractuales
FRENTE 12	DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES(DEALM)en espera de entrega de actividades por parte del contratista.
FRENTE 13	OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA(OIARQ)en espera de instalacion de sanitario y suiche para encendido de baño.
FRENTE 14	OFICINA DE PLANEACION BNLO1,se finalizan actividades en este frente,interventoria en espera de entrega por parte del contratista.
FRENTE 15	DEPENDENCIA DEL CUARTEL GENERAL FNC,frente terminado,en espera de entrega formal por parte del contratista.
FRENTE 16	CASA COMANDANTE FUERZA NAVAL DEL CARIBE.en espera de ejecucion de istalacion de canaleta amazonas zona perimetral cubierta
FRENTE 17	ESCUELA DE SUPERFICIE DEL CARIBE.se finalizan activiades de obra civil,en espera de incio de actividades de montaje de estructur metalica

COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA LA PROXIMA SEMANA	RESPONSABLE	FECHA MAX DE ENTREGA
TOMA DE DETALLES EN FRENTES PARA ENTREGA FORMAL EN FRENTES	CONTRATISTA	26/12/2025

INFORME SEMANAL CONTRATISTA FRENTE 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE No17 Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)



Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)



Departamento de Administración BNL01 (DEADM)



FRENTE No6 SUBMARINOS



Ricardo Amaya.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INFORME HSE
CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC LOTES: 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.

	0076-ARC-CBNL01-2025		
OBJETO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAMAR		
NIT	901973262-6		
PERIODO DEL INFORME	15-12-2025	**FECHA DEL INFORME**	20-12-2025

DIRECCION DEL PROYECTO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
Documentos solicitados y revisados sobre Seguridad y Salud en el Trabajo	Durante el periodo de informe, se han revisado los siguientes documentos: Informe SST y Ambiental, que corresponde al periodo 2025. Anexos: • Planillas de seguridad social (afiliaciones) Ds soluciones, consorcio inframar noviembre 2025. • Pausas activas 2 registros • Inspeccion de herramientas • Charlas 2 registros • Preoperacionales . 2 registro • Inspección de puestos de trabajo

INFORME HSE
CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC LOTES: 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.

Señalización, demarcación y controles en la construcción	N/A
Accidentes e Incidentes de trabajo	En el periodo del mes de diciembre no se han presentado accidentes laborales
Gestión de amenazas	Se realiza recorrido de seguridad en obra para identificación de posibles condiciones inseguras para evitar materialización de accidentes laborales.
Otros aspectos de índole de Seguridad y Salud en el Trabajo.	**Capacitaciones de Seguridad** • Respetar señalización de obra • Uso adecuado de herramientas en Navidad
ACTIVIDAD	**OBSERVACIÓN**

Personal del proyecto

Durante el periodo del informe se contó con la participación temporal y permanente del siguiente personal:

Empresa	Personal
PERSONAL ADMINISTRATIVO	2
PERSONAL OPERATIVO	18
TOTAL	20

INFORME HSE
CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC LOTES: 2:
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.

INFORME AMBIENTAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
DOCUMENTOS MEDIO AMBIENTE	Se presento plan de manejo ambiental.
CERTIFICADOS	***Residuos de obra*** • ***Residuos:*** Retales de icopor, escombro
SUSTANCIAS QUIMICAS	N/A
PUNTOS DE ACOPIO RESIDUOS	• Proyecto cuenta con un punto de acopio para materiales aprovechables.
INSTALACIONES LOCATIVAS	En buen estado.

INFORME HSE

CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025

MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1:

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC LOTES: 2:

MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.

REGISTROS FOTOGRAFICOS

PAUSAS ACTIVAS





CHARLAS DE SEGURIDAD 05 MINUTOS






INFORME HSE
CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC LOTES: 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.







Nombre del coordinador SST
Profesiónal sst
CC.45.763.450
Licencia SST Resolución N°1067

	INFORME SEMANAL			
	Cédula:		**Fecha:27/08/2025**	**Página:**

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 29 **PERIODO:** **REVISADO AL SEMANAS**

CONTRATO : 0076-ARC-CBNL01-2025

OBJETO:MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBELOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
INTERVENTOR:	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS**	**CONTRATISTA:**	**CONSORCIO INFRAMAR**
CONTRATO No.:	**0077-ARC-CBNL01-2025**	**CONTRATO No.:**	**0076-ARC-CBNL01-2025**
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 205.958.060)	**VALOR INICIAL:**	$ 1.025.154.049,00
		VALOR PAG. INTER, ANT.	$ -
		VALOR ADICIÓN 1:	**$4.575.455,40 $**
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($	**VALOR ACTUALIZADO:**	**$ 1.184.184.449,40**
PLAZO INICIAL:	**30 de diciembre de 2025.**	**PLAZO INICIAL:**	**31 de octubre de 2025**
PLAZO ACTUALIZADO:	**30 de diciembre de 2025.**	**PLAZO ACTUALIZADO CON PRORROGA Y**	**30 de noviembre de 2025**
FECHA DE FIRMA ADICIÓN 1	10/11/2025	**FECHA DE FIRMA PRORR ÓGA 1**	**31 de octubre de 2025**
VALOR ADICION No1	$ 23.883.300,00	**PLAZO ACTUALIZADO CON PRORROGA Y Y MODIFICACIONES**	**30 de diciembre de 2025**
VALOR INICIAL+ADICION	$ 229.841.360,00	**FECHA DE FIRMA PRORR ÓGA 2**	**1 de diciembre de 2025**
FECHA DE SUSPENSI ÓN 1	xxx	**VALOR ADICION No2**	**$6.320.729,30 $**
FECHA DE REINICIACI ÓN 1	xxx	**VALOR ACTUALIZADO:**	**$ 1.184.408.178,70**
FECHA DE INICIACIÓN:	**14/08/2025**	**FECHA DE INICIACIÓN:**	**14/08/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**30 de diciembre de 2025.**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	**31 de octubre de 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**30 de diciembre de 2025.**	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	**30 de diciembre de 2025**
VALOR EJECUTADO	**$ 209.841.360,00**	**100,00%**	**VALOR EJECUTADO**	**$ 1.184.408.178,70**	**100,00%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 0**	**0,00%**	**VALOR POR EJECUTAR.**	**$ 0,00**	**0,00%**
VALOR FACTURADO:	**$ 198.957.180**	**94,81%**	**VALOR FACTURADO:**	**$ 894.857.980,00**	**75,57%**
VALOR POR FACTURAR:	**$ 10.884.180,00**	**5,19%**	**VALOR POR FACTURAR:**	**$ 289.550.197,84**	**24,43%**

2.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
VIGENTES LAS POLIZAS	x		en espera de actualizacion de polizas segin acta de inicio
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES	x		
ACTAS DE VECINDAD		x	
DEBIDO A LA LEGALIZACION DEL ACTA CONSORCIAL EL ACTA DE INICIO QUEDO LEGALIZADA CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2025			
SE ESPERA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA ENTREGA DE LA TOTAL DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION DE ACTA PARCIAL			
EN ESPERA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION POR PARTE DE LA ENTIDAD		x	EN ESPERA DE LEGALIZACION POR PARTE DE
EL 31 DE OCTUBRE SE LEGALIZA PRORROGA POR 30 DIAS CALENDARIO O HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y ADICION AL CONTRATO No1 POR UN VALOR DE $9497040,46			

2.3 ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

LICENCIAS, PERMISOS Y/O ESTUDIOS	**SI**	**NO**	**DESCRIPCIÓN DEL ESTADO**	**FECHA DE APROBACIÓN**
LICENCIAS DE CONSTRUCCION	x			
SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICOS	x		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS RED GAS	x		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS RED HIDRAULICO SANITARIO	x		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS RED AGUA	x		ACTIVO	

2.4 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

SEMANA	**PERIODO**	**MONTO ACUMULADO PROGRAMADO AL 14/DICIEMBRE**	**% PROGRAMADO SEMANA**	**% PROGRAMADO ACUMULADO SEMANA**	**MONTO $ SEMANA**	**% EJECUTADO SEMANA**	**% EJECUTADO ACUMULADO SEMANA**	**DIFERENCIA**
S1	15/08/2025-20/08/2025	$ -	0,00%	0,00%	$ -	0,00%	0,00%	0,00%
S2	21/08/2025-27/08/2025	$ -	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
S3	28/08/2025-31/08/2027	$	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
S4	01/09/2025-07/09/2025	$ 30.390.535,29	2,90%	3,27%	$ 45.605.958,06	4,43%	4,43%	1,16%
S5	08/09/2025-14/09/2026	$ 84.462.963,86	8,21%	11,48%	$ 43.798.228,58	4,16%	8,59%	-3,01%
S6	15/09/2025-21/09/2027	$ 218.297.662,90	21,21%	25,69%	$ 67.937.569,40	6,60%	15,19%	-3,91%
S7	22/09/2025-28/09/2028	$ 387.390.683,58	37,64%	44,09%	$ 26.848.288,23	2,61%	17,80%	-26,30%
S8	29/09/2025-05/10/2029	$ 539.672.885,41	51,78%	51,09%	$ 54.389.358,37	5,29%	23,15%	-27,93%
S9	06/10/2025-12/10/2030	$ 726.677.722,10	70,61%	75,09%	$ 35.575.465,63	3,46%	23,61%	-51,39%
S10	13/10/2025-19/10/2031	$ 834.425.456,13	81,08%	84,50%	$ 17.995.128,01	1,75%	25,36%	-58,64%
S11	20/10/2025-26/10/2032	$ 995.385.851,84	92,89%	95,09%	$ 30.369.557,93	2,95%	28,31%	-66,69%
S12	27/10/2025-31/10/2033	$ 1.029.154.049,14	100,00%	100,00%	$ 45.124.699,22	4,38%	32,69%	-67,31%
S13	01/11/2025-09/11/2034	$ 868.230.995,55	84,36%	81,00%	$ 25.962.102,06	2,31%	35,00%	-49,00%
S14	10/11/2025-16/11/2035	$ 1.007.461.830,32	89,62%	91,00%	$ 82.183.877,72	7,31%	42,31%	-48,69%
S15	17/11/2025-23/11/2036	$ 1.092.791.113,39	97,22%	98,00%	$ 113.890.148,42	13,14%	55,45%	-42,55%
S16	24/11/2025-30/11/2037	$ 1.126.124.449,99	100,00%	100,00%	$ 105.617.462,31	9,40%	64,85%	-35,15%
S17	01/12/2025-7/12/2025	$ 706.622.229,44	64,73%	88,00%	$ 200.930.271,33	16,97%	78,81%	-9,19%
S18	08/12/2025-14/12/2026	$ 967.241.229,03	91,67%	94,00%	$ 121.742.727,17	10,28%	89,09%	-4,91%
S19	15/12/2025-21/12/2027	$ 1.107.689.654,63	93,47%	98,00%	$ 61.974.386,30	5,23%	94,32%	-3,68%
S20	22/12/2025-30/12/2028	$ 1.184.408.178,24	100,00%	100,00%	$ 135.558.764,01	11,45%	100,00%	0,00%
TOTAL		$ 1.184.408.178,24	100,00%	100,00%	$ 1.184.408.178,24			

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total ofrecimiento		**TOTAL DIAS CALENDARIO**	**Tiempo transcurrido(dias calendario)**
% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,00%	139	139

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025

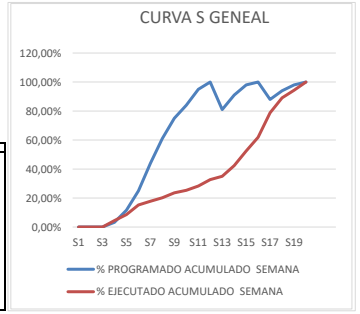

FRENTES EN EJECUCION


FRENTE	**VALOR PRESUPUESTO INICIAL**	**VALOR PRESUPUESTO + ADICION**	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA**	**% EJECUTADO A LA FECHA**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**	**VALOR PROGRAMADO ACUMULADO**	
1	$ 13.099.269,80	$ 14.069.528	$ 14.069.528	100%	100%	$ 14.069.528,00	**Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC)**
2	$ 76.666.972,08	$ 82.220.400	$ 82.220.400	100%	100%	$ 82.220.400,00	**Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF)**
3	$ 11.130.463,99	$ 13.140.000	$ 13.140.000	100%	100%	$ 13.140.000,00	**Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC) - Cocina**
4	$ 209.915.455,06	$ 260.367.709	$ 260.367.709	100%	100%	$ 260.367.708,72	**Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)**
5	$ 9.879.764,17	$ 9.000.000	$ 9.000.000	100%	100%	$ 9.000.000,00	**Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)**
6	$ 92.631.739,85	$ 85.519.609	$ 85.519.609	100%	100%	$ 85.519.608,48	**Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC)**
7	$ 124.813.178,37	$ 130.751.901	$ 130.751.901	100%	100%	$ 130.751.900,92	**Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC) - SEMAC**
8	$ 26.241.374,53	$ 24.519.037	$ 24.519.037	100%	100%	$ 24.519.037,40	**Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG)**
9	$ 76.920.089,99	$ 126.266.968	$ 126.266.968	100%	100%	$ 126.266.967,93	**Departamento de Administración BNL01 (DEADM)**
10	$ 4.674.774,10	$ 10.221.801	$ 10.221.801	100%	100%	$ 10.221.801,41	**Estación Naval de Tierra Bomba (CENTB)**
11	$ 5.522.576,20	$ 7.207.533	$ 7.207.533	100%	100%	$ 7.207.532,71	**Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV)**
12	$ 6.489.194,44	$ 6.489.194	$ 6.489.194	100%	100%	$ 6.489.194,44	**Departamento de Alojamientos Militares (DEALM)**
13	$ 11.705.656,01	$ 20.147.380	$ 20.147.380	100%	100%	$ 20.147.380,39	**Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 (OIARQ)**
14	$ 195.478.100,55	$ 194.515.660	$ 194.515.660	100%	100%	$ 194.515.659,53	**Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)**
15	$ 46.041.994,62	$ 51.780.613	$ 51.780.613	100%	100%	$ 51.780.612,15	**Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)**
16	$ 43.616.041,94	$ 43.668.654	$ 43.668.654	100%	100%	$ 43.668.654,09	**Casa Comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Comando CFNC)**
17	$ 84.327.403,43	$ 104.522.190	$ 104.522.190	100%	100%	$ 104.522.190,37	**Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)**
VALOR TOTAL	**$ 1.029.154.049,14**	**$ 1.184.408.178,24**	**$ 1.184.408.178,24**	**100%**	**100%**	**$ 1.184.408.178,24**	

CONSTRUCTORA RAM S.A.S. NIT. 901202489-3	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA			
	Código:	Versión:	Fecha:15/08/2025-27/08/2025	Página:

3.3 CONTROL DE PRESUPUESTO

INFORME SEMANAL No.	20	PERIODO:	GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

N. SEMANA	PERIODO	PROGRAMADO ($) SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO ($)	($) EJECUTADO	($) EJECUTADO ACUMULADO
s1	**15/08/2025-20/08/2025**	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$
s2	**21/08/2025-27/08/2026**	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$ 0
s3	**28/08/2025-31/08/2027**	$ 0,00	$ 0,00	$ -	$ 0
s4	**01/09/2025-07/09/2025**	$ 30.350.525,29	$ 30.350.525,29	$ 45.605.958	$ 45.605.958
s5	**08/09/2025-14/09/2026**	$ 84.462.963,86	$ 114.813.489,15	$ 42.798.227	$ 88.404.185
s6	**15/09/2025-21/09/2027**	$ 103.484.173,75	$ 218.297.662,90	$ 67.937.569	$ 156.341.754
s7	**22/09/2025-28/09/2028**	$ 169.093.019,67	$ 387.390.682,58	$ 26.848.288	$ 183.190.043
s8	**29/09/2025-05/10/2029**	$ 145.282.169,83	$ 532.672.852,41	$ 24.209.356	$ 207.399.399
s9	**06/10/2025-12/10/2030**	$ 194.004.869,69	$ 726.677.722,10	$ 35.575.456	$ 242.974.855
s10	**13/10/2025-19/10/2031**	$ 107.751.734,03	$ 834.429.456,13	$ 17.990.128	$ 260.964.983
s11	**20/10/2025-26/10/2032**	$ 121.551.395,81	$ 955.980.851,94	$ 30.369.558	$ 291.334.541
s12	**27/10/2025-31/10/2033**	$ 73.173.197,19	$ 1.029.154.049,14	$ 45.124.699	$ 336.459.240
s13	**01/11/2025-09/11/2034**	-$ 160.923.053,58	$ 868.230.995,55	$ 25.962.102	$ 362.421.342
s14	**10/11/2025-16/11/2035**	$ 139.220.836,77	$ 1.007.451.832,32	$ 82.163.878	$ 444.585.220
s15	**16/11/2025-23/11/2036**	$ 85.249.301,67	$ 1.092.701.133,99	$ 113.990.148	$ 558.575.368
s16	**24/11/2025-30/11/2037**	$ 31.423.315,60	$ 1.124.124.449,59	$ 105.617.662	$ 664.193.030
s17	**01/12/2025-7/12/2025**	-$ 357.502.220,15	$ 766.622.229,44	$ 200.939.371	$ 865.132.402
s18	**08/12/2025-14/12/2027**	$ 200.698.799,59	$ 967.321.029,03	$ 121.742.727	$ 986.875.129
s19	**15/12/2025-21/12/2026**	$ 139.768.625,80	$ 1.107.089.654,83	$ 61.974.285	$ 1.048.849.414
s20	**22/12/2025-30/12/2027**	$ 77.318.523,41	$ 1.184.408.178,24	$ 135.558.764	$ 1.184.408.178
MES	**TOTAL PRESUPUESTAL PROGRAMADO ($)**	**TOTAL PRESUPUESTAL EJECUTADO ($)**	**% TOTAL PRESUPUESTAL ACUMULADO PROGRAMADO**	**% TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	
TOTAL	**$ 1.184.408.178,24**	**$ 1.184.408.178,24**	**100%**	**100%**	

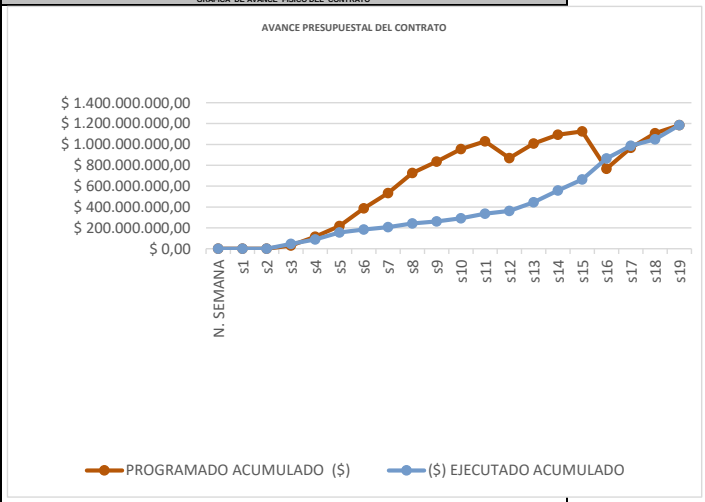

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA FINALIZA EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES CON UN MONTO FINAL DE $1´184,408,178,24

SITUACION TECNICO-ECONOMICA

FRENTES RECIBIDOS:17

FRENTE 1	ESCUELA DE SUBMARINO DEL CARIBE(ESUBC):RECIBIDO
FRENTE 2	CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION DE LA FLOTA(CECEF):RECIBIDO
FRENTE 3	FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE-COCINA:RECIBIDO
FRENTE 4	BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No12.(bim1)RECIBIDO
FRENTE 5	ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS(ESCIG)RECIBIDO
FRENTE 6	FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE (FSUBC)RECIBIDO
FRENTE 7	FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE(SEMAC)RECIBIDO
FRENTE 8	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES(DESEG)RECIBIDO
FRENTE 9	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION(DEDM)RECIBIDO
FRENTE 10	ESTACION DE TIERRA BOMBA(CNTB)RECIBIDO
FRENTE 11	CENTRO DE DESARROLLO NAVAL(CEDNAV)RECIBIDO
FRENTE 12	DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES(DEALM)RECIBIDO
FRENTE 13	OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA(OIARQ)RECIBIDO
FRENTE 14	OFICINA DE PLANEACION BNL01,RECIBIDO
FRENTE 15	DEPENDENCIA DEL CUARTEL GENERAL FNC.RECIBIDO
FRENTE 16	CASA COMANDANTE FUERZA NAVAL DEL CARIBE.RECIBIDO
FRENTE 17	ESCUELA DE SUPERFICIE DEL CARIBE.RECIBDIO

	INFORME SEMANAL CONTRATISTA FRENTE 1			

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE No17 Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)

Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)



Departamento de Administración BNL01 (DEADM)



FRENTE No6 SUBMARINOS



FRENTE No7 Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC) - SEMAC



FRENTE No5



Ricardo Amaya.	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INFORME HSE

CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025

MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1:

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC

LOTES:

2:

MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.

	0076-ARC-CBNL01-2025		
OBJETO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAMAR		
NIT	901973262-6		
PERIODO DEL INFORME	22-12-2025	**FECHA DEL INFORME**	27-12-2025

INFORME HSE
CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1:

DIRECCION DEL PROYECTO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
Documentos solicitados y revisados sobre Seguridad y Salud en el Trabajo	Durante el periodo de informe, se han revisado los siguientes documentos: Informe SST y Ambiental, que corresponde al periodo 2025. Anexos: • Planillas de seguridad social (afiliaciones) Ds soluciones, consorcio inframar noviembre 2025. • Inspeccion de herramientas • No se registran pausas activas • Inspección de puestos de trabajo

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC LOTES: 2:

MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.

Señalización, demarcación y controles en la construcción	N/A
Accidentes e Incidentes de trabajo	En el periodo del mes de diciembre no se han presentado accidentes laborales
Gestión de amenazas	Se realiza recorrido de seguridad en obra para identificación de posibles condiciones inseguras para evitar materialización de accidentes laborales.

Otros aspectos de índole de Seguridad y Salud en el Trabajo.	**Capacitaciones de Seguridad** • Compartir de navidad
ACTIVIDAD	**OBSERVACIÓN**

CARTAGENA.

Personal del proyecto

Durante el periodo del informe se contó con la participación temporal y permanente del siguiente personal:

Empresa	Personal
PERSONAL ADMINISTRATIVO	2
PERSONAL OPERATIVO	18
TOTAL	20

INFORME HSE

CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025

MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1:

INFORME HSE
CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC LOTES: 2:
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA.

INFORME AMBIENTAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
DOCUMENTOS MEDIO AMBIENTE	Se presento plan de manejo ambiental.
CERTIFICADOS	***Residuos de obra*** • ***Residuos:*** Retales de icopor, escombro
SUSTANCIAS QUIMICAS	N/A
PUNTOS DE ACOPIO RESIDUOS	• Proyecto cuenta con un punto de acopio para materiales aprovechables.
INSTALACIONES LOCATIVAS	En buen estado.

INFORME HSE
CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1:

CARTAGENA.

REGISTROS FOTOGRAFICOS








INFORME HSE
CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTE 1:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC LOTES: 2:
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN







Nombre del coordinador SST
Profesiónal sst
CC.45.763.450
Licencia SST Resolución N°1067

ANEXO 7

BITACORA

100

19 Noviembre 2025 Entrada: 6:30am Salida: 7pm

→ Personal en obra: Profesionales: Residente civil (1)
Residente HSEQ (1)
Topógrafo Instrumentista
Técnicos: Ayudantes y oficiales (16)
Maestro (1)

→ Actividades Ejecutadas:
1) Frente 4: (13 trabajadores) Armado y fundida viga entrepiso, Pintura caravanato.
2) Frente 6: (2 Trabajadores) Actividades mantenimiento estatores fase
3) Frente 9: (4 trabajadores) Actividades mantenimiento estator, cuarto para Instalación de Limpieza e Instalación de estatores
4) Frente 17: (4 trabajadores) Armado de Estructura cubierta. Se realizó demarcación de los Pedestales para nivelación dado que los ejes generaron cambios.
5) Peapaca de Almacén se realizó montaje de Viga entrepiso fase
→ 20 de Diciembre 2025 Entrada: 6:30am Salida: 5pm
Actividades Ejecutadas:
1) Frente 4: (13 trabajadores) Actividades formaletaje de columnas 2° tramo caravanato, Pintura tratamiento caravanato, retiro de Escombros residuos Andar.
2) Frente 6: (2 trabajadores) Actividades de: Encintado y resane do de estator.
3) Frente 9: (4 trabajadores) Actividades Mantenimiento estator en Superboard y Terminación de Instalación estator para Pre
4) Frente 5: (3 trabajadores) Se realizan montaje de tramo de cerchas: Área entrada.
5) No se realizan trabajos en Frente 17; El Personal se traslada en frente 6 y frente 4. Se programó festivo el día 22/12/2025.
→ 22 de Diciembre 2025 Entrada: 6:30am Salida: 7pm
Actividades Ejecutadas:
1) Frente 4: (6 trabajadores) Toma detalles, y formaletaje de columnas 2° tramo caravanato.
2) Frente 6: (1 trabajador) Actividad Empacallado estator
3) Frente 9: (6 trabajadores) Instalación de viguetas cuna, resane de tramo, cuarto para Instalación de Limpieza.
4) Frente 17: (2 trabajadores) Encofrado 4 Pedestales para fundida.

23 de Diciembre
→ Actividades
1) Frente 4: (
2) Frente 5: (
3) Frente
4) Frente
→ 24 de D
Actividad
1) Frente
Para fu
2) Fren
ción d
3) Fren
de fo
→) 26
30
Se
ver
Mi

⇒ Actividades Ejecutadas:

1) Frente 4: (13 trabajadores) Actividades de Pintura Estructura carretera, fundida Viga Antepecho, Trabajo Actividad corte y abra- cion Anden en un Ancho de 50cm.

2) Frente 7: (2 trabajadores) Actividad de Instalación Bailante Empuje- ra.

3) Frente 9: (2 trabajadores) Actividades de Estructuración Estructuras

4) Frente 15: (2 trabajadores) Actividades de Ejecuta Pintura afirm Jefe Tecnico y Terminación de Puesta poo: oficina de frontera.

→ 16 de DICIEMBRE 2020 Entrada: 6:30am Salida: 7pm.

- Actividades Ejecutadas:

1) Frente 4: (13 trabajadores) En horas de la mañana se realizó Actividad de fundida de Viga cuarto 2° tramo carretera, corte de Anden y demolición Tramo Cuarto. En horas de la Tarde se realizó fundida de antepecho, aplicación Pintura carretera.

2) Frente 7: (2 Trabajadores) En horas de la Mañana se realizó toma detalles observaciones realizadas por Capitanía. Revisión Pendiente los detalles en puentes.

3) Frente 9: (2 trabajadores) Actividades de Instalación Cunetas PVC.

4) Frente 11: (2 trabajadores) Corte y reinstalación de puente. con Esto quedó Terminado Las Actividades en este frente.

5) Frente 17: Se realizó Actividad de corte y armado Estructura de cuneta.

→ 17 de DICIEMBRE 2020. Entrada: 6:30am Salida: 7pm.

- Actividades Ejecutadas:

1) Frente 4: (11 trabajadores) Actividades desencofrado viga y cimentación y armado de Parrilla. Tramo fin Horte viga cuarto, Portera de carramento y cuneteria Demolición - Armado tramo Cuarto.

2) Frente 9: (3 trabajadores) continuación de Actividad Instalación cubierta

3) Frente 10: (2 trabajadores) Instalación de Pintel en superboard en Locker.

4) Frente 15: (1 colaborador) Se realizan Actividades de Grillado de pre Cuarto

5) Frente 17: (3 Trabajadores) continuación Actividad de Armado Estructura metálica. Se Presentó novedad con los Ejes de los Pedestales se con su Hanei Para la. Demolición total o parcial de los Pedestales.

23 de Diciembre 2025 Entrada: 6:30am Salida: 5pm.

→ Actividades Ejecutadas:

1) Frente 4: (5 trabajadores) Actividades de fenal de trama anden, Toma de detalles y Protec. tubos comunitario.

2) Frente 5: (2 trabajadores) continuación de Actividades Instalación Margeconia.

3) Frente 9: (5 trabajadores) continuación de Instalación de Cámaras circ. r200.

4) Frente 17: (3 trabajadores) Actividades de fenal y Pedestales.

Chalo Ctr

→ 24 de Diciembre 2025. Entrada: 6:30am Salida: 3pm.

Actividades Ejecutadas:

1) Frente 4: (5 trabajadores) Se realizan Actividades de relleno, alistado Para fenal. trama anden, toma detalles.

2) Frente 9: (5 trabajadores) Se realizan Actividades de Limpieza, Instalación de remate circ. r200 e Instalación de Cámaras.

3) Frente 17: (3 trabajadores) Actividades de reificación de Ejes y armado de formaleta. para fenal. de Pedestales.

Chalo Ctr

→ 26 de Diciembre 2025. Entrada: 6:30am Salida: 5pm.

30/12/2025

Se finalizan Actividades de forma apertura en los 17 frentes en Interventoría; Se espera por parte del contratista la entrega de la parte administrativa con todos los anexos solicitados mediante oficio.

de viga cimiento y Tapa de detalles.
2) Frente C: (1 trabajador) Se realizan Actividades de Terminación Instalación Enchape Cuarto oficiales.
3) Frente 7: (1 Trabajador y 2 auxiliares) Se realizan Actividades de Limpieza, arreglo gato hidráulico puente acceso y reinstalación de división de drywall cuarto capitan.
4) Frente 9: (6 Trabajadores) Se realizan Actividades de Limpieza viga canal Instalada, Instalación de Estructura Cubierta y los Trabajos Eléctricos Para lo cual se. Tiene que. desenergizar el área.
5) Frente 18: (3 trabajadores) Se realizan actividades de conexión Eléctrica Hidroflex. Esta Actividad fue Terminada y se puso en funcionamiento el Sistema Para En Automático Para así fuga en el cuarto de Conexión Hidráulica.
6) Frente 17: (4 trabajadores) Se realizan Actividades de fundida. de Ultimo tramo de placa de Entrepiso, con esta Actividad queda Terminados Los cuatro ejes en Este frente.
7) Se realizan. Los Tapas de detalles y correcciones. en Muelle del Patio frente 15.

→ 9 de Diciembre 2025. Entrada: 6:30 am Salida: 7pm.

Personal En obra: Profesionales: Residente Civil (2).
Residente HSEQ (2).
Inspector Interventoría.
Técnicos: Ayudantes y oficiales.
Maestros (3).

→ Equipos y Herramientas: Mezcladora, Pulidora, Equipo Soldadura, H. menor.
→ Actividades Ejecutadas:
1) Frente 4: (6 trabajadores) Se realizan Actividades de formaleteria Cuarto Techo y armada de formaleteria viga cimiento.
2) Frente C: (1 trabajador) Terminación Enchape Cuarto oficiales. e Instalación de Pinturas cuartos.
3) Frente 7: (2 trabajadores) Terminación Instalación Mamposteria, Limpieza quedo Para diario "Instalación de Pinturas cuartos y retoques repartidos Por Supervisión del frente.
4) Frente 9: (7 Trabajadores) Actividades de cubierta y revisión Eléctrica Para Instalación de Puntos de Iluminación.

4 de Diciembre 2025. Entrada: 6:30am Salida: 7pm.

→ Personal en obra: Profesionales: Residente civil (2)
Residente HSEQ (2)
Inspector Interventoría.
Técnicos: Ayudantes y oficiales (21)
Maestros (3)

→ Actividades Ejecutadas:

1) Frente 4: (7 trabajadores) Se continua con Actividades de Armado de formaletería columnas, viga superior y cortepecho Para fundirla.

2) Frente 8: (1 trabajador) Se realizan trabajos de resane en áreas faltantes y toma detalles en varios de Pendtes.

3) Frente 6: (2 trabajadores) Se realizan trabajos de Limpieza área del Tanque Elevado y continuación de trabajo en los oficios.

4) Frente 7: (2 trabajadores) Se realizan Actividades de Limpieza, Toma detalles, Fijado Muebles Baño de capitan e Instalación de Cornisa faltante. Pendiente. ajuste. de Pendtes correderas de Pantry y Vestier que nos con los varios, Instalación de Cerraderos, Terminación de Instalación de Marquesinas, Instalación de accesorios en baños faltantes y Pintura de acabados.

5) Frente 9: (6 trabajadores y 2 colaboradores Electricos) Se Realizan trabajos de Armado de viga Canal, Instalación de Estructura, cubierta y lámina, trabajos Electricos en el area de viga canal.

6) Frente 10: (1 trabajador) Se realizan trabajos de Acabados, Toma de Varios y Pendte faltantes.

7) Frente 13: (2 trabajadores) Se Continuan con trabajos de Pintura e Instalación Electrica para Sistema Hidraulico.

8) Frente 17: (4 trabajadores) Se continua con trabajos de obra civil sobre Placa de Entrepiso.

→ 5 de Diciembre 2025 Entrada: 6:30am Salida: 7pm.

Personal en Obra: Profesionales: Residente civil (2)
Residente HSEQ (2)
Inspector Interventoria
Tecnicos: Ayudantes y Oficiales (21)
Maestros (3)

3at Presentación 2020

Entrada: 6:30am Salida: 7pm

93

→ Personal en obra: Profesionales: Residente civil (2)
Residente HSEQ (2)
Inspector Interventoría.
Técnicos: Arquitectos y Oficiales (17)
Maestros (2)

→ Equipos y herramientas: Mezcladora, taladro, Perforadora, Equipo de Soldadura Manual.

→ Actividades Ejecutadas:

1) Frente 4: (7 trabajadores) Se continua con trabajos de Armada de formaletería de columnas, antepecho y viga. Soportar. Para fundida. Caso oficialato. En el día de Ayer. En horas de la tarde. Se llevó reunión con Supervisión y Capitanía, este manifestó no aceptar el Enchapé colocado en el área de Ubicación del Espejo tras Estar Precariamente. aprobada por supervisión.

2) Frente 7: (3 trabajadores) Se realizaron Actividades de Completa, Instalación de Extractores y acabado en Mueble capitan. Para Instalados los Extractores como fueron Establecidos y ahora la capitanía sugiere una Modificación a lo mismo como la Exigente Existente. En la fachada. Actividad no Establecida en el contrato.

3) Frente 9: (3 trabajadores) Se realizan Actividades de Pintura de Canal, Preparación Para fundida de trama viga Llorat c. Instalación de Cubierta. Se hizo Entrada del Eléctrico para los trabajos requeridos

5) Frente 10: (2 trabajadores) Se continua con Actividades de Terminación Manpostaria. Cocker, Esta Actividad debe quedar Terminada. El día de hoy.

6) Frente 11: (1 trabajador) Se continua con Actividades de corte Para granito Lavado y alzado de cubierta.

7) Frente 13: (2 trabajadores) Se continua con Actividades de Pinturas de Tinteros. Pendiente El Mantenimiento de las canales de los Puentes.

8) Frente 15: (2 colaboradores) Se realizan Actividades de tomas detalles de cubierta Superior Pendiente.

98

12 de Diciembre 2025 Entrada: 6:30am Salida: 7pm.

→ Personal en obra: Profesionales: Residente civil (2)
Residente HSEQ (2)
Inspector Interventoría.
Técnicos: Ayudantes y oficiales (18).
Maestros (3)

→ Actividades Ejecutadas:
1) Frente 4: (12 Trabajadores) Actividades de formaletería viga Antepecho y Armado viga cuarto. 2° Tramo Corredor.
2) Frente 6: (1 Trabajador) Instalación de Tuberías Baño oficina
3) Frente 9: (5 Trabajadores) Actividades de Estructuración cielo raso y Trabajos de cubierta.
4) Frente 10: (2 Trabajadores) Actividades de pintura de Lacker.
5) Frente 11: (1 Trabajador) Actividades Instalación de Zócalos.

→ 13 de Diciembre 2025. Entrada: 6:30am Salida: 7pm.
Personal En obra: Profesionales: Residente civil (2)
Residente HSEQ (2)
Inspector Interventoría
Técnicos: Ayudantes y oficiales (13).
Maestros (3)

→ Actividades Ejecutadas:
1) Frente 4: (11 Trabajadores) Actividades formaletería viga Soporte, Toma detalles, Figurado de Aceros y Terminación Armado escaleras 2° Tramo corredor.
2) Frente 7: (4 trabajadores y 2 colaboradores) Toma detalles, Limpieza y corrección de observaciones realizadas.
3) Frente 9: (1 trabajador) Instalación Estructura cielo raso. Resane Pendiente y Mantenimiento de cubierta y Actividades contractuales.
4) Frente 11: (1 trabajador) Terminación Instalación de Enchape piso.
5) Frente 15 se realizan Actividades de Toma detalles. Medida para y Puerta piso oficina familia.

→ 15 de Diciembre 2025. Entrada: 6:30am Salida: 7pm.
Personal En obra: Profesionales: Residente civil (2)
Residente HSEQ (2)
Inspector Interventoría.
Técnicos: Ayudantes y oficiales (16)
Maestros (3)

2 de Diciembre 2025 Entrada: 6:30 a.m. Salida: 7 pm

→ Personal Encargado: Profesionales: Residente civil (1)
Residente HSEQ (1)
Inspector Telecomunicaciones
Técnicos: Ayudantes y Oficiales (20)
Maestros: (3)

→ Equipos y Herramientas: Maquinaria, Vehículos, Formaletas, Equipos Menores, Herramientas Manuales.

→ Actividades Ejecutadas:

1) Frente 4: (7 trabajadores) Se realizan trabajos de Cimentación de viga antepecho y viga superior, figurado de Acero.

2) Frente 6: (1 trabajador) Se continúa con trabajos de Viga y Terminación Locas-Oficinas.

3) Frente 7: (3 trabajadores) Se continúa con Actividades de Instalación de Andamio. El Frente de cual fue abandonado, Pegar donde Pintar, Al momento del recorrido no se contaba con material para esta Actividad.

4) Frente 10: (2 trabajadores) Se continúa con Actividades de Levante y Acabados de Muros.

5) Frente 11: (1 trabajador) Se está aperturando del Frente con Actividad de corte sobre Franja Para granito lavado.

6) Frente 13: (2 trabajadores) Se realizan Actividades de Pintura Sobre Muros. Queda Pendiente la Conexión Eléctrica al Lavaplatos y mantenimiento de cerramiento Drywall.

7) Frente 15: Se realizan trabajos de Instalación Accesorios de Baños Sanitarios. Pendiente Instalación de Espejo. Los trabajos del Pintor Sujeto a la llegada del material Vano dado que en tránsito Ayer en la tarde se Pinchó. y de. ofrece de Fundición Sujeto a Secado del Granito fue Pasado

8) Frente 17: (4 trabajadores) Se continúan con Actividades Sobre Placa de Entrepiso y Terminación de Instalación de Plafones.

ANEXO 8

CORREOS ENVIADOS

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

oficio 29 intv ponencia 2

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 1 de diciembre de 2025 a las 9:47 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

OFICIO_29_ARMSP.pdf
565K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

oficio 29 respuesta ponencia intv

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 1 de diciembre de 2025 a las 4:02 p.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

OFICIO_29_ARMSP.pdf
565K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

solicitud de modificacion No2 contratista

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 1 de diciembre de 2025 a las 4:05 p.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

BN1_127_2025_Solicitud_de_modificatorio_y_prorroga_Nro.2..pdf
994K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

oficio situacion enchape frente 6

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 4 de diciembre de 2025 a las 11:46 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

BN1 133 2025 Reporte novedades de obra respecto al enchape del baño del capitan frente 6.pdf
302K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

oficio No61

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 5 de diciembre de 2025 a las 9:11 a.m.
Para: Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com>, Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

OFICIO_61_solicitud de apu.pdf
436K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

oficio No62

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 5 de diciembre de 2025 a las 9:11 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>, Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

OFICIO_62_ARMF1.pdf
454K

Gmail construramil <construramil@gmail.com>

balance final frente 7

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 5 de diciembre de 2025 a las 10:56 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

balance final de cantidades frentes.xlsx
134K

Gmail construramil <construramil@gmail.com>

Solicitud definición marquesina correspondiente al frente 5

4 mensajes

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 5 de diciembre de 2025 a las 10:06 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com

Cartagena, 05 de diciembre de 2025

BN1 134
2025

Señores
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No 1 ARC “BOLIVAR”
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
Cartagena

Referencia: “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA”

BALANCE MODIFICATORIO FRENTE 5 ACT.xlsx

BN1 134 2025 Solicitud definición marquesina correspondiente al frente 5.pdf
659K

construramil <construramil@gmail.com> 5 de diciembre de 2025 a las 10:44 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

[Texto citado oculto]
--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

BN1 134 2025 Solicitud definición marquesina correspondiente al frente 5.pdf
659K

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 5 de diciembre de 2025 a las 11:00 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>


Señores
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
NIT. 901.202.489-3

Representante Legal: Ricardo León Amaya Mosquera

Referencia: Contrato de interventoría No. 0077-ARC-CBNL01-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC".

Cordial saludo, me permito enviar respuesta al oficio No. BN1 134 2025 de fecha 05 de diciembre de 2025 suscrito por el contratista de obra. Esta supervisión se permite aprobar el diseño y balance del frente 5 tal como se muestra en este documento, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas directamente por el usuario, así:

1. Perfilería con acabado blanco
2. Color de la marquesina gris, acuerdo foto anexa, (tercera lámina de la imagen)

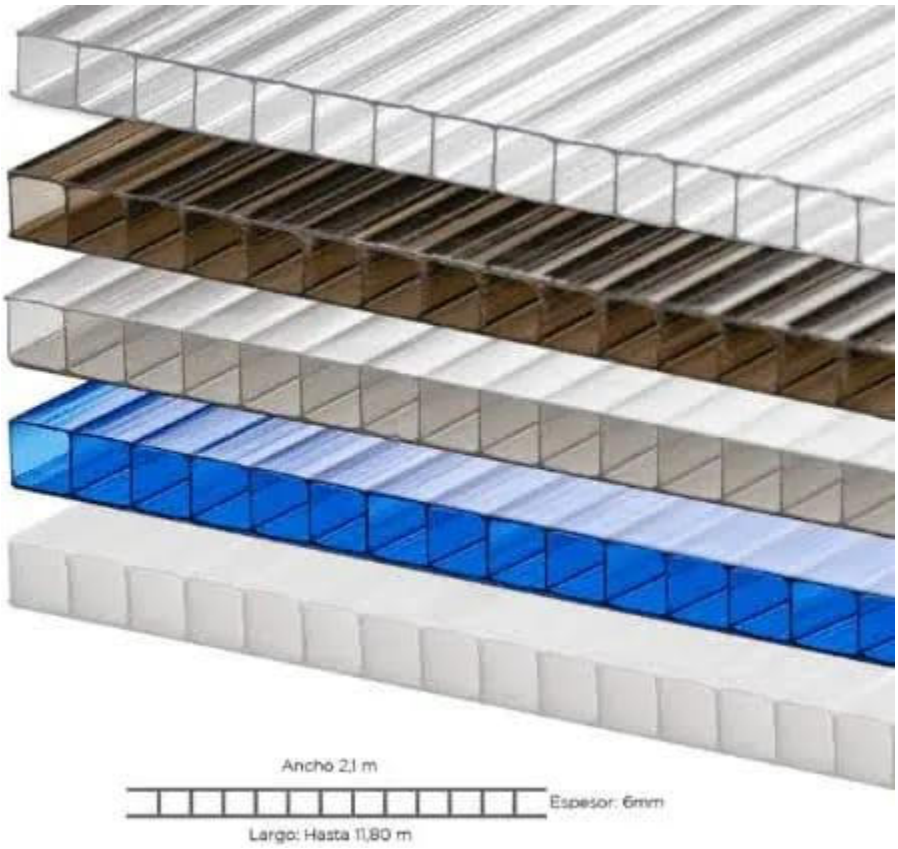

Respetuosamente,

De: "construramil" <construramil@gmail.com>
Para: "Diana Marcela Castillo Sierra" <diana.castillo@armada.mil.co>
Enviados: Viernes, 5 de Diciembre 2025 10:44:08
Asunto: Fwd: Solicitud definición marquesina correspondiente al frente 5

[Texto citado oculto]

--

Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

construramil <construramil@gmail.com> 8 de diciembre de 2025 a las 7:21 a.m.
Para: Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com>, Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Referencia: Contrato de interventoría No. 0077-ARC-CBNL01-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC".

se adjunta respuesta de supervision sobre frente 5,instalacion de marquesina

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

BALANCE FINAL ACTUALIZADO FRENTES

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 9 de diciembre de 2025 a las 12:13 p.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

buenas tardes,se adiciona balance frente 14 al archivo
--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

balance final de cantidades frentes.xlsx
151K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

oficio No63

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 9 de diciembre de 2025 a las 2:38 p.m.
Para: Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com>, Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

OFICIO_63_ARMF1.pdf
446K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

informe semanal semana del 1 a 7 de noviembre

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 10 de diciembre de 2025 a las 12:51 p.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

informe semanal dic 1al 7.pdf
1399K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

acta parcial N1 lote 1

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 12 de diciembre de 2025 a las 10:30 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

ACTA PARCIAL_SABANA_CORTE_No._1_lote_1.xlsx
721K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

balances actualizados frentes lote 1

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 12 de diciembre de 2025 a las 10:41 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

balance final de cantidades frentes.xlsx
219K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

acta parcial No2 lote 1

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 12 de diciembre de 2025 a las 3:35 p.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

1. SABANA CORTE No. 2 lote 1.xlsx
945K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

REVISIÓN Y AJUSTE BALANCE PARA FACTURACIÓN

2 mensajes

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 12 de diciembre de 2025 a las 8:09 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

Señores
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
NIT. 901.202.489-3
Representante Legal: Ricardo León Amaya Mosquera

Referencia: Contrato de interventoría No. 0077-ARC-CBNL01-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC".

Cordial saludo, me permito enviar archivo Excel con la revisión de los frentes para el Corte No. 2 ajustado en formato para entrega, después de efectuada la verificación, la factura No. 2 debería ser por valor de $ 696.429.668,76

Respetuosamente,

--

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera
Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

ANEXO TECNICO CONTRATO No. 0077-ARC-CBNL01-2025.XLSX
277K

construramil <construramil@gmail.com> 13 de diciembre de 2025 a las 8:24 a.m.
Para: Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com>

Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

[Texto citado oculto]

ANEXO TECNICO CONTRATO No. 0077-ARC-CBNL01-2025.XLSX
277K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

INFORME SEMANAL DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 16 de diciembre de 2025 a las 9:48 p.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

INFORME SEMANAL DEL 8 AL 14 DIC FRENTE 1.pdf
1259K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

balance final modificatorio

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 18 de diciembre de 2025 a las 9:59 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

2 archivos adjuntos

balance final de cantidades frentes.xlsx
253K

BASE DE DATOS 12-12.xlsx
16K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

informe semanal del 15 al 21 de diciembre de 2025

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 22 de diciembre de 2025 a las 2:24 p.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

informe semanal semana19 del 15 al 21 de dic+sst.pdf
1139K

Gmail construramil <construramil@gmail.com>

informacion ponencia No3 contrato 076 inframar

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 23 de diciembre de 2025 a las 11:20 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

BALANCE MODIFICATORIO 3.xlsx

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

5 archivos adjuntos

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

CRONOGRMA MODIFICATORIO 3.mpp
851K

PONENCIA No. 03 CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025 - V1.DOCX
859K

INFORME TÉCNICO DE JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (29-31).pdf
271K

OFICIO_33_ARMSP.pdf
461K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

ponencia No3

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 23 de diciembre de 2025 a las 2:25 p.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

PONENCIA No. 03 CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025 - V1.DOCX
860K

Gmail construramil <construramil@gmail.com>

Solicitud modificatorio Nro. 3

11 mensajes

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 23 de diciembre de 2025 a las 9:02 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com

Cartagena, 23 de diciembre de 2025

BN1 140 2025

Señores
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No 1 ARC “BOLIVAR”
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
Señores:
Ricardo León Amaya Mosquera
RL CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
Cartagena

Referencia: “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA”

BALANCE MODIFICATORIO 3.xlsx

CRONOGRMA MODIFICATORIO 3.mpp

INFORME TÉCNICO DE JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (29-31).pdf

2 archivos adjuntos

BN1 141 2025 Declaración sobre la no afectación del equilibrio económico contractual, cumplimiento capacidad financiera, técnica y juridico.pdf
52K

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 23 de diciembre de 2025 a las 10:56 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com

[Texto citado oculto]

INFORME TÉCNICO DE JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (29-31).pdf
271K

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 24 de diciembre de 2025 a las 8:18 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com

Cordial saludo, adjunto el modificatorio con correcciones

El mar, 23 dic 2025 a las 9:02, Diego Alberto Farfan Gomez (<diego.farfan@grupoinget.com>) escribió:
[Texto citado oculto]

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

---

construramil <construramil@gmail.com> 24 de diciembre de 2025 a las 8:26 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
[Texto citado oculto]

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 24 de diciembre de 2025 a las 10:38 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

El mar, 23 dic 2025 a las 9:02, Diego Alberto Farfan Gomez (<diego.farfan@grupoinget.com>) escribió:
[Texto citado oculto]

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

---

construramil <construramil@gmail.com> 24 de diciembre de 2025 a las 10:40 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

---------- Forwarded message ---------
De: **Diego Alberto Farfan Gomez** <diego.farfan@grupoinget.com>
Date: mié., 24 de diciembre de 2025 10:38 a. m.
Subject: Re: Solicitud modificatorio Nro. 3
To: construramil <construramil@gmail.com>

[Texto citado oculto]

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

---

construramil <construramil@gmail.com> 24 de diciembre de 2025 a las 11:08 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

---------- Forwarded message ---------
De: **Diego Alberto Farfan Gomez** <diego.farfan@grupoinget.com>
Date: mar., 23 de diciembre de 2025 9:02 a. m.
Subject: Solicitud modificatorio Nro. 3
To: construramil <construramil@gmail.com>
Cc: <consorcioinframar@gmail.com>
[Texto citado oculto]

BN1 141 2025 Declaración sobre la no afectación del equilibrio económico contractual, cumplimiento capacidad financiera, técnica y juridico.pdf
52K

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 24 de diciembre de 2025 a las 11:08 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

El mar, 23 dic 2025 a las 9:02, Diego Alberto Farfan Gomez (<diego.farfan@grupoinget.com>) escribió:
[Texto citado oculto]

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

---

construramil <construramil@gmail.com> 24 de diciembre de 2025 a las 11:10 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

---------- Forwarded message ---------
De: **Diego Alberto Farfan Gomez** <diego.farfan@grupoinget.com>
Date: mié., 24 de diciembre de 2025 11:08 a. m.
Subject: Re: Solicitud modificatorio Nro. 3
To: construramil <construramil@gmail.com>

[Texto citado oculto]

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 24 de diciembre de 2025 a las 11:16 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

El mar, 23 dic 2025 a las 9:02, Diego Alberto Farfan Gomez (<diego.farfan@grupoinget.com>) escribió:
[Texto citado oculto]

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

---

construramil <construramil@gmail.com> 24 de diciembre de 2025 a las 11:18 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

---------- Forwarded message ---------
De: **Diego Alberto Farfan Gomez** <diego.farfan@grupoinget.com>
Date: mié., 24 de diciembre de 2025 11:16 a. m.
Subject: Re: Solicitud modificatorio Nro. 3
To: construramil <construramil@gmail.com>

[Texto citado oculto]

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

Gmail construramil <construramil@gmail.com>

Remisión de Apus, mayores y menores, cronograma y los documentos del contador

2 mensajes

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 24 de diciembre de 2025 a las 11:21 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

4 archivos adjuntos

- **BALANCE MODIFICATORIO 3.pdf** 669K
- **CRONOGRAMA MODIFICATORIO 3.pdf** 344K
- **NP.pdf** 11222K
- **E. DOCUMENTOS CONTADOR.pdf** 831K

construramil <construramil@gmail.com> 24 de diciembre de 2025 a las 11:22 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

---------- Forwarded message ---------
De: **Diego Alberto Farfan Gomez** <diego.farfan@grupoinget.com>
Date: mié., 24 de diciembre de 2025 11:22 a. m.
Subject: Remisión de Apus, mayores y menores, cronograma y los documentos del contador
To: construramil <construramil@gmail.com>

4 archivos adjuntos

- **BALANCE MODIFICATORIO 3.pdf** 669K
- **CRONOGRAMA MODIFICATORIO 3.pdf** 344K
- **NP.pdf** 11222K
- **E. DOCUMENTOS CONTADOR.pdf** 831K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

(sin asunto)

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 26 de diciembre de 2025 a las 8:36 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

FORMATO_ACTA_DE_RECEPCIÓN_PARCIAL No2_.DOC
131K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

analisis de mercado nps modificatorio No3

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 26 de diciembre de 2025 a las 3:56 p.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

OFICIO_34_ARMSP.pdf
550K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

informacion ponencia 3 nps y cotizaciones

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 28 de diciembre de 2025 a las 7:18 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

5 archivos adjuntos

- **OFICIO_34_ARMSP.pdf** 565K
- **COTIZACION ELECTRICA (2).pdf** 1793K
- **COTIZACION ELECTRICA (1).pdf** 1793K
- **COTIZACION CIELO (2).pdf** 1793K
- **COTIZACION CIELO (1).pdf** 1793K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

cotizaciones nps mod3

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 28 de diciembre de 2025 a las 8:38 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

4 archivos adjuntos

1. COTIZACIÓN ELECTRICA MT.docx.pdf
152K

1. COTIZACIÓN ELECTRICA ALDAVA.pdf
174K

COTIZACIÓN APM cubierta.pdf
2372K

COTIZACION cubierta2.pdf
19664K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

informe semanal del 22 al 30 de diciembre lote 1

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 29 de diciembre de 2025 a las 1:40 p.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

informe semanal del 22 al 30 de diciembre lote1 077.pdf
931K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

oficio 64

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 29 de diciembre de 2025 a las 8:50 p.m.
Para: Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com>, Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

OFICIO_64_ARMF1.pdf
687K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

oficio No65

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 30 de diciembre de 2025 a las 11:00 a.m.
Para: Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com>, Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

OFICIO_65_ARMF1.pdf
454K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

Aprobación facturación electrónica acta final

1 mensaje

construramil <construramil@gmail.com> 30 de diciembre de 2025 a las 11:34 a.m.
Para: Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com>

Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

Minhacienda.pdf
145K

ANEXO 9

CORREOS RECIBIDOS

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

Solicitud_de_modificatorio_y_prorroga_Nro.2

1 mensaje

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 1 de diciembre de 2025 a las 10:08 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

BN1_127_2025_Solicitud_de_modificatorio_y_prorroga_Nro.2.pdf
1215K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

Solicitud_de_modificatorio_y_prorroga_Nro.2

1 mensaje

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 1 de diciembre de 2025 a las 3:11 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

BN1_127_2025_Solicitud_de_modificatorio_y_prorroga_Nro.2.pdf
1215K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

Reporte novedades de obra respecto al enchape del baño del capitan frente 6

1 mensaje

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 3 de diciembre de 2025 a las 3:48 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com

Cartagena, 03 de diciembre de 2025

BN1 133 2025

Señores
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No 1 ARC "BOLIVAR"
Te. Diana Castillo

Señores:
Ricardo León Amaya Mosquera
RL CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

Asunto: Comunicación de novedades relacionadas con el suministro e instalación de enchape.

BN1 133 2025 Reporte novedades de obra respecto al enchape del baño del capitan frente 6.pdf
306K

Gmail construramil <construramil@gmail.com>

Solicitud definición marquesina correspondiente al frente 5

4 mensajes

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 5 de diciembre de 2025 a las 10:06 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com

Cartagena, 05 de diciembre de 2025

BN1 134
2025

Señores
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No 1 ARC “BOLIVAR”
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
Cartagena

Referencia: “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA”

BALANCE MODIFICATORIO FRENTE 5 ACT.xlsx

BN1 134 2025 Solicitud definición marquesina correspondiente al frente 5.pdf
659K

construramil <construramil@gmail.com> 5 de diciembre de 2025 a las 10:44 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

[Texto citado oculto]
--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

BN1 134 2025 Solicitud definición marquesina correspondiente al frente 5.pdf
659K

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 5 de diciembre de 2025 a las 11:00 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>


Señores
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
NIT. 901.202.489-3

Representante Legal: Ricardo León Amaya Mosquera

Referencia: Contrato de interventoría No. 0077-ARC-CBNL01-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC".

Cordial saludo, me permito enviar respuesta al oficio No. BN1 134 2025 de fecha 05 de diciembre de 2025 suscrito por el contratista de obra. Esta supervisión se permite aprobar el diseño y balance del frente 5 tal como se muestra en este documento, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas directamente por el usuario, así:

1. Perfilería con acabado blanco
2. Color de la marquesina gris, acuerdo foto anexa, (tercera lámina de la imagen)

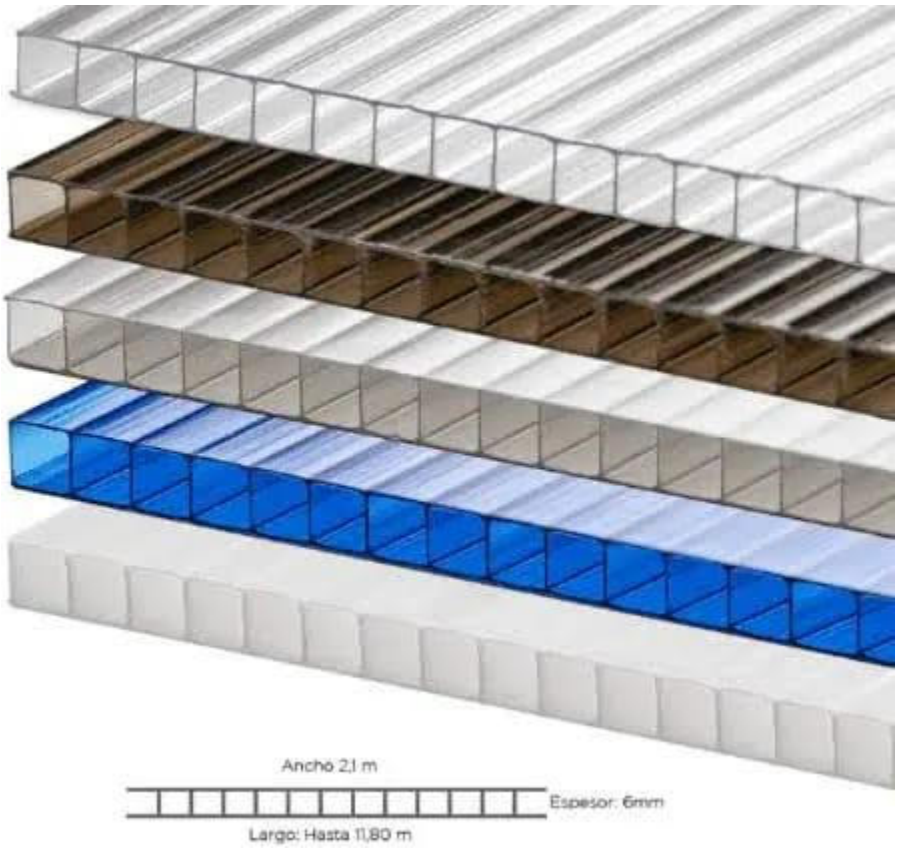

Respetuosamente,

De: "construramil" <construramil@gmail.com>
Para: "Diana Marcela Castillo Sierra" <diana.castillo@armada.mil.co>
Enviados: Viernes, 5 de Diciembre 2025 10:44:08
Asunto: Fwd: Solicitud definición marquesina correspondiente al frente 5

[Texto citado oculto]

--

Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

---

construramil <construramil@gmail.com> 8 de diciembre de 2025 a las 7:21 a.m.
Para: Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com>, Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Referencia: Contrato de interventoría No. 0077-ARC-CBNL01-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC".

se adjunta respuesta de supervision sobre frente 5,instalacion de marquesina

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

Gmail construramil <construramil@gmail.com>

Remisión de pólizas actualizadas conforme al Segundo Modificatorio del contrato.

1 mensaje

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 5 de diciembre de 2025 a las 6:34 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com

Cartagena, 05 de diciembre de 2025

BN1 135
2025

Señores
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No 1 ARC “BOLIVAR”
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
Cartagena

Referencia: “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA”

4 archivos adjuntos

BN1 135 2025 Remisión de pólizas actualizadas conforme al Segundo Modificatorio del contrato.pdf
277K

560-47-994000192099-5.PDF
100K

560-47-994000192099-4.PDF
100K

560-74-994000035606-6.PDF
104K

Gmail construramil <construramil@gmail.com>

Remisión del plan de contingencia solicitado en el Oficio_62_ARMF1

1 mensaje

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 6 de diciembre de 2025 a las 12:13 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com

Cartagena, 06 de diciembre de 2025

BN1 136
2025

Señores
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No 1 ARC “BOLIVAR”
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
Cartagena

Referencia: “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA”

BN1 2025 136 Plan de Contingencia.pdf
570K

Gmail construramil <construramil@gmail.com>

Entrega APU s Actividades Eléctricas adicionales Frente No.9

1 mensaje

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 9 de diciembre de 2025 a las 5:04 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com

Cartagena, 09 de diciembre de 2025

BN1 137
2025

Señores
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No 1 ARC “BOLIVAR”
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
Cartagena

Referencia: “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA”

NP ELECTRICOS.xlsx

BN1 137 2025 Entrega APU s Actividades Eléctricas adicionales Frente No.9.pdf
324K

Gmail construramil <construramil@gmail.com>

Re: Respuesta a solicitud de actualización de diseño estructural – Frente No. 09

9 mensajes

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 31 de octubre de 2025 a las 6:56 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

Señores
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
NIT. 901.202.489-3
Representante Legal: Ricardo León Amaya Mosquera

Referencia: Contrato de interventoría No. 0077-ARC-CBNL01-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC".

En atención al oficio mediante el cual la interventoría remite los planos estructurales generados y enviados por el contratista, me permito informar que la información recibida no corresponde a lo solicitado por esta supervisión.

Por lo anterior, se remiten nuevamente los planos con la información base, precisando que únicamente se requiere el diseño estructural de las uniones entre los perfiles metálicos de la estructura de la cubierta y las vigas cinta en concreto, conforme a las condiciones establecidas en los planos arquitectónicos y estructurales de la edificación.

Agradezco dar trámite a la elaboración y entrega de dicho diseño, con el fin de continuar con el proceso de revisión y validación correspondiente.

Respetuosamente,

De: "construramil" <construramil@gmail.com>
Para: "Diana Marcela Castillo Sierra" <diana.castillo@armada.mil.co>
Enviados: Viernes, 31 de Octubre 2025 14:27:21
Asunto: oficio No25

Referencia: Contrato de interventoría No. 0077-ARC-CBNL01-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC"

--
Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

--



Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

3 archivos adjuntos

DPTO ADMON CUBIERTA (2).dwg
419K

DPTO ADMON CUBIERTA-Presentación1.pdf
156K

DPTO ADMON CUBIERTA-Presentación2.pdf
249K

---

construramil <construramil@gmail.com> 2 de noviembre de 2025 a las 7:48 a.m.
Para: Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com>, Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Señores
consorcio consorico inframar

Referencia: Contrato de interventoría No. 0077-ARC-CBNL01-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC".

se permite informar que la información recibida no corresponde a lo solicitado por la supervision del contrato.

Por lo anterior, se remiten nuevamente los planos con la información base, precisando que únicamente se requiere el diseño estructural de las uniones entre los perfiles metálicos de la estructura de la cubierta y las vigas cinta en concreto, conforme a las condiciones establecidas en los planos arquitectónicos y estructurales de la edificación.

se solicita dar trámite a la elaboración y entrega de dicho diseño, con el fin de continuar con el proceso de revisión y validación correspondiente.

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

DPTO ADMON CUBIERTA (2).dwg
419K

DPTO ADMON CUBIERTA-Presentación1.pdf
156K

DPTO ADMON CUBIERTA-Presentación2.pdf
249K

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 13 de noviembre de 2025 a las 3:14 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Estimados,

En atención a su comunicación, se adjunta la corrección correspondiente al diseño estructural solicitado, conforme a las observaciones y planos remitidos.

Quedamos atentos a sus comentarios y validación.

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

DPTO ADMON CUBIERTA._2V3_161025pdf.pdf
292K

DPTO ADMON CUBIERTA_V3_161025.dwg
443K

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 13 de noviembre de 2025 a las 5:09 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Se adjunta la ficha técnica de la cubierta
[Texto citado oculto]

Ficha-Tecnica-Ekoroof-Cubiertas-y-Cerramientos-Industriales.pdf.pdf
1350K

---

construramil <construramil@gmail.com> 14 de noviembre de 2025 a las 8:41 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Buenos días se adjunta diseño estructural de cubierta de administración por parte del contratista, cualquier inquietud favor comunicar

Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

DPTO ADMON CUBIERTA._2V3_161025pdf.pdf
292K

DPTO ADMON CUBIERTA_V3_161025.dwg
443K

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 18 de noviembre de 2025 a las 8:23 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

Señores
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
NIT. 901.202.489-3
Representante Legal: Ricardo León Amaya Mosquera

Referencia: Contrato de interventoría No. 0077-ARC-CBNL01-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC".

Cordial saludo, me permito informar que, una vez revisado el diseño estructural de la cubierta del área de Administración, este se aprueba para su ejecución, en la medida que cumple con los criterios técnicos y los parámetros establecidos para el proyecto.

No obstante, es importante precisar que dentro del diseño se están contemplando elementos cortavientos, los cuales NO son requeridos, teniendo en cuenta que las cerchas que conforman la estructura funcionan como vigas de confinamiento, garantizando la estabilidad y rigidez necesarias sin necesidad de dichos elementos adicionales. Por lo anterior, se solicita ajustar el diseño eliminando los cortavientos propuestos, manteniendo las consideraciones estructurales previamente validadas.

Agradezco realizar la actualización correspondiente y remitir la versión final del diseño estructural.

Respetuosamente,

De: "construramil" <construramil@gmail.com>
Para: "Diana Marcela Castillo Sierra" <diana.castillo@armada.mil.co>
Enviados: Viernes, 14 de Noviembre 2025 8:41:19
Asunto: Fwd: Respuesta a solicitud de actualización de diseño estructural – Frente No. 09

[Texto citado oculto]

--

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera
Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

---

construramil <construramil@gmail.com> 19 de noviembre de 2025 a las 1:55 p.m.
Para: Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com>

[Texto citado oculto]

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 19 de noviembre de 2025 a las 2:07 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

Cordial saludo
Se adjunta el diseño actualizado de la cubierta del frente 9, con las consideraciones estipuladas.

[Texto citado oculto]

DPTO ADMON CUBIERTA._2V4_161025pdf.pdf
221K

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 10 de diciembre de 2025 a las 11:42 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

De: "Diana Marcela Castillo Sierra" <diana.castillo@armada.mil.co>
Para: "construramil" <construramil@gmail.com>
Enviados: Viernes, 31 de Octubre 2025 18:56:05
Asunto: Re: Respuesta a solicitud de actualización de diseño estructural – Frente No. 09

[Texto citado oculto]

--



Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

---

3 archivos adjuntos

DPTO ADMON CUBIERTA (2).dwg
419K

DPTO ADMON CUBIERTA-Presentación1.pdf
156K

DPTO ADMON CUBIERTA-Presentación2.pdf
249K

Gmail construramil <construramil@gmail.com>

Formato e Información para entrega a Satisfacción de Frentes

2 mensajes

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 13 de noviembre de 2025 a las 9:34 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

Señores
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
NIT. 901.202.489-3
Representante Legal: Ricardo León Amaya Mosquera

Referencia: Contrato de interventoría No. 0077-ARC-CBNL01-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC".

Cordial saludo, en atención al proceso de entrega de los diferentes frentes de obra a los usuarios, me permito remitir el formato establecido para la elaboración de las actas de entrega, junto con la lista consolidada de los usuarios que recibirán las áreas intervenidas.

La información enviada tiene como propósito facilitar la coordinación y formalización de las entregas, garantizando que cada usuario cuente con el registro correspondiente y que se deje constancia del estado en el cual se reciben los espacios.

Quedo atenta a comentarios.

Respetuosamente,

--



Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

2 archivos adjuntos

USUARIOS POR FRENTE.xlsx
14K

FORMATO APROBACIÓN O DEVOLUCIÓN DEL USUARIO MANTO-FT-311-JEMAT.doc
157K

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 10 de diciembre de 2025 a las 11:58 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

De: "Diana Marcela Castillo Sierra" <diana.castillo@armada.mil.co>
Para: "construramil" <construramil@gmail.com>
Enviados: Jueves, 13 de Noviembre 2025 9:34:01
Asunto: Formato e Información para entrega a Satisfacción de Frentes

[Texto citado oculto]

--



Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

2 archivos adjuntos

USUARIOS POR FRENTE.xlsx
14K

FORMATO APROBACIÓN O DEVOLUCIÓN DEL USUARIO MANTO-FT-311-JEMAT.doc
157K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

REVISION BALANCE 1 de 2

1 mensaje

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 10 de diciembre de 2025 a las 5:24 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

Respetuosamente,

--

BASE DE DATOS (Autoguardado) - copia.xlsx
15K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

Remisión de fichas técnicas solicitadas – Frentes del contrato

1 mensaje

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 10 de diciembre de 2025 a las 7:41 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com

Cartagena, 09 de diciembre de 2025

BN1 138
2025

Señores
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No 1 ARC “BOLIVAR”
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
Cartagena

Referencia: “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA”

23. FICHAS TECNICAS.rar

BN1 138 2025 Remisión de fichas técnicas solicitadas – Frentes del contrato.pdf
246K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

Corte 2 (Revisado)

1 mensaje

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 12 de diciembre de 2025 a las 4:46 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

Señores
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
NIT. 901.202.489-3
Representante Legal: Ricardo León Amaya Mosquera

Referencia: Contrato de interventoría No. 0077-ARC-CBNL01-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC".

Cordial saludo, me permito enviar archivo Excel con la revisión de los frentes para el Corte No. 2

Respetuosamente,

--

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera
Año 2025 #Navegando al corazón de los colombianos

Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

1. SABANA CORTE No. 2 lote 1.xlsx
952K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

REVISIÓN Y AJUSTE BALANCE PARA FACTURACIÓN

2 mensajes

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 12 de diciembre de 2025 a las 8:09 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

Señores
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
NIT. 901.202.489-3
Representante Legal: Ricardo León Amaya Mosquera

Referencia: Contrato de interventoría No. 0077-ARC-CBNL01-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC".

Cordial saludo, me permito enviar archivo Excel con la revisión de los frentes para el Corte No. 2 ajustado en formato para entrega, después de efectuada la verificación, la factura No. 2 debería ser por valor de $ 696.429.668,76

Respetuosamente,

--

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera
Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

ANEXO TECNICO CONTRATO No. 0077-ARC-CBNL01-2025.XLSX
277K

construramil <construramil@gmail.com> 13 de diciembre de 2025 a las 8:24 a.m.
Para: Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com>

Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

[Texto citado oculto]

ANEXO TECNICO CONTRATO No. 0077-ARC-CBNL01-2025.XLSX
277K

Gmail construramil <construramil@gmail.com>

Remisión documentación – Factura Acta No. 2

1 mensaje

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 13 de diciembre de 2025 a las 1:38 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com

Cartagena, 13 de diciembre de 2025

BN1 139
2025

Señores
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No 1 ARC “BOLIVAR”
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
Cartagena

Referencia: “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA”

ACTA 2.rar

BN1 139 2025 Remisión documentación – Factura Acta No. 2.pdf
247K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

PANTALLAZO APROBACIÓN FACTURACIÓN

1 mensaje

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 15 de diciembre de 2025 a las 10:13 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

Respetuosamente,

--

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera
Año 2025 #Navegando al corazón de los colombianos

Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

PANTALLAZO ACTA 2.docx
2978K

Gmail construramil <construramil@gmail.com>

Remisión documentación – Factura Acta No. 1

1 mensaje

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 17 de diciembre de 2025 a las 3:57 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com

Cartagena, 17 de diciembre de 2025

BN1 139
2025

Señores
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No 1 ARC “BOLIVAR”
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
Cartagena

Referencia: “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA”

ACTA 1.rar

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

documentos revisados para modificatorio 3

1 mensaje

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 18 de diciembre de 2025 a las 10:45 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

Respetuosamente,
--



Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

4 archivos adjuntos

- **ANEXO TECNICO CONTRATO No. 0077-ARC-CBNL01-2025.XLSX**
  339K
- **PONENCIA No. 03 CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025 - V1.DOCX**
  866K
- **BASE DE DATOS 12-12.xlsx**
  16K
- **balance final de cantidades frentes (3).xlsx**
  253K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

Solicitud modificatorio Nro. 3

1 mensaje

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 20 de diciembre de 2025 a las 5:44 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com

BALANCE MODIFICATORIO 3.xlsx

2 archivos adjuntos

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
1759K

INFORME TÉCNICO DE JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (29-31).pdf
4570K

Gmail construramil <construramil@gmail.com>

Acta de recepción final

1 mensaje

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 22 de diciembre de 2025 a las 3:57 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

Respetuosamente,

--



Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

FORMATO ACTA DE RECEPCIÓN FINAL.DOC
114K

Gmail construramil <construramil@gmail.com>

Solicitud modificatorio Nro. 3

11 mensajes

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 23 de diciembre de 2025 a las 9:02 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com

Cartagena, 23 de diciembre de 2025

BN1 140 2025

Señores
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No 1 ARC “BOLIVAR”
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
Señores:
Ricardo León Amaya Mosquera
RL CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
Cartagena

Referencia: “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA”

BALANCE MODIFICATORIO 3.xlsx

CRONOGRMA MODIFICATORIO 3.mpp

INFORME TÉCNICO DE JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (29-31).pdf

2 archivos adjuntos

BN1 141 2025 Declaración sobre la no afectación del equilibrio económico contractual, cumplimiento capacidad financiera, técnica y juridico.pdf
52K

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 23 de diciembre de 2025 a las 10:56 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com

[Texto citado oculto]

INFORME TÉCNICO DE JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (29-31).pdf
271K

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 24 de diciembre de 2025 a las 8:18 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com

Cordial saludo, adjunto el modificatorio con correcciones

El mar, 23 dic 2025 a las 9:02, Diego Alberto Farfan Gomez (<diego.farfan@grupoinget.com>) escribió:
[Texto citado oculto]

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

---

construramil <construramil@gmail.com> 24 de diciembre de 2025 a las 8:26 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
[Texto citado oculto]

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 24 de diciembre de 2025 a las 10:38 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

El mar, 23 dic 2025 a las 9:02, Diego Alberto Farfan Gomez (<diego.farfan@grupoinget.com>) escribió:
[Texto citado oculto]

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

---

construramil <construramil@gmail.com> 24 de diciembre de 2025 a las 10:40 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

---------- Forwarded message ---------
De: **Diego Alberto Farfan Gomez** <diego.farfan@grupoinget.com>
Date: mié., 24 de diciembre de 2025 10:38 a. m.
Subject: Re: Solicitud modificatorio Nro. 3
To: construramil <construramil@gmail.com>

[Texto citado oculto]

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

---

construramil <construramil@gmail.com> 24 de diciembre de 2025 a las 11:08 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

---------- Forwarded message ---------
De: **Diego Alberto Farfan Gomez** <diego.farfan@grupoinget.com>
Date: mar., 23 de diciembre de 2025 9:02 a. m.
Subject: Solicitud modificatorio Nro. 3
To: construramil <construramil@gmail.com>
Cc: <consorcioinframar@gmail.com>
[Texto citado oculto]

BN1 141 2025 Declaración sobre la no afectación del equilibrio económico contractual, cumplimiento capacidad financiera, técnica y juridico.pdf
52K

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 24 de diciembre de 2025 a las 11:08 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

El mar, 23 dic 2025 a las 9:02, Diego Alberto Farfan Gomez (<diego.farfan@grupoinget.com>) escribió:
[Texto citado oculto]

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

---

construramil <construramil@gmail.com> 24 de diciembre de 2025 a las 11:10 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

---------- Forwarded message ---------
De: **Diego Alberto Farfan Gomez** <diego.farfan@grupoinget.com>
Date: mié., 24 de diciembre de 2025 11:08 a. m.
Subject: Re: Solicitud modificatorio Nro. 3
To: construramil <construramil@gmail.com>

[Texto citado oculto]

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 24 de diciembre de 2025 a las 11:16 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

El mar, 23 dic 2025 a las 9:02, Diego Alberto Farfan Gomez (<diego.farfan@grupoinget.com>) escribió:
[Texto citado oculto]

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

---

construramil <construramil@gmail.com> 24 de diciembre de 2025 a las 11:18 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

---------- Forwarded message ---------
De: **Diego Alberto Farfan Gomez** <diego.farfan@grupoinget.com>
Date: mié., 24 de diciembre de 2025 11:16 a. m.
Subject: Re: Solicitud modificatorio Nro. 3
To: construramil <construramil@gmail.com>

[Texto citado oculto]

BN1 140 2025 Solicitud de modificatorio # 3.pdf
975K

Gmail construramil <construramil@gmail.com>

Remisión de Apus, mayores y menores, cronograma y los documentos del contador

2 mensajes

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 24 de diciembre de 2025 a las 11:21 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

4 archivos adjuntos

- **BALANCE MODIFICATORIO 3.pdf** 669K
- **CRONOGRAMA MODIFICATORIO 3.pdf** 344K
- **NP.pdf** 11222K
- **E. DOCUMENTOS CONTADOR.pdf** 831K

construramil <construramil@gmail.com> 24 de diciembre de 2025 a las 11:22 a.m.
Para: Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co>

Atentamente,

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

---------- Forwarded message ---------
De: **Diego Alberto Farfan Gomez** <diego.farfan@grupoinget.com>
Date: mié., 24 de diciembre de 2025 11:22 a. m.
Subject: Remisión de Apus, mayores y menores, cronograma y los documentos del contador
To: construramil <construramil@gmail.com>

4 archivos adjuntos

- **BALANCE MODIFICATORIO 3.pdf** 669K
- **CRONOGRAMA MODIFICATORIO 3.pdf** 344K
- **NP.pdf** 11222K
- **E. DOCUMENTOS CONTADOR.pdf** 831K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

balance actualizado

1 mensaje

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 24 de diciembre de 2025 a las 4:54 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

Respetuosamente,

--



Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

ANEXO TECNICO CONTRATO No. 0077-ARC-CBNL01-2025.XLSX
327K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

balance para acta No. 2

1 mensaje

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 26 de diciembre de 2025 a las 9:54 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

Respetuosamente,

--



Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

ANEXO TECNICO CONTRATO No. 0077-ARC-CBNL01-2025.XLSX
327K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

NP´S MODIFICATORIO 3

1 mensaje

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 26 de diciembre de 2025 a las 2:04 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com, Cristian Yesid Caina Gamba <cristian.caina@grupoinget.com>, anacuentas2015@gmail.com

Cordial saludo, adjunto los Items No Previstos correspondientes al modificatorio Nro. 3

NP MODIFICATORIO 3.pdf
5978K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

Balance frente 3

1 mensaje

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 26 de diciembre de 2025 a las 6:19 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

Respetuosamente,

--



Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

ANEXO TECNICO CONTRATO No. 0077-ARC-CBNL01-2025.XLSX
335K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

ejemplos actas

1 mensaje

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 28 de diciembre de 2025 a las 9:14 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

Respetuosamente,

--



Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

2 archivos adjuntos

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL 0035-18122024-2.doc
145K

FORMATO ACTA DE RECEPCIÓN FINAL CTO 0103-ARC-BNL01-2025 Vo.03.DOC
228K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

ACTA FINAL

1 mensaje

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 28 de diciembre de 2025 a las 9:20 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

Respetuosamente,

--



Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

ACTA FINAL CONTRATO No. 0076.pdf
510K

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

Cotizaciones Np - Modificatorio 3

1 mensaje

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 29 de diciembre de 2025 a las 8:33 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com, Cristian Yesid Caina Gamba <cristian.caina@grupoinget.com>, anacuentas2015@gmail.com

- 1. COTIZACIÓN ELECTRICA ALDAVA.pdf
- 1. COTIZACIÓN ELECTRICA MT.docx.pdf
- COTIZACION CIELO (1).pdf
- COTIZACIÓN APM (1).pdf

Gmail **construramil <construramil@gmail.com>**

Aprobación facturación electrónica

1 mensaje

Diana Marcela Castillo Sierra <diana.castillo@armada.mil.co> 30 de diciembre de 2025 a las 11:30 a.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>

Respetuosamente,

--



Teniente de Corbeta **CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA**
Analista de Arquitectura
diana.castillo@armada.mil.co
Teléfono: (605) 6501400 Ext. 11624
Carrera 2 No. 10-02 Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.armada.mil.co

Minhacienda.pdf
145K

Gmail construramil <construramil@gmail.com>

Remisión documentación – Factura Acta No. 3

1 mensaje

Diego Alberto Farfan Gomez <diego.farfan@grupoinget.com> 30 de diciembre de 2025 a las 4:15 p.m.
Para: construramil <construramil@gmail.com>
CC: consorcioinframar@gmail.com

Cartagena, 30 de diciembre de 2025

BN1 142
2025

Señores
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No 1 ARC “BOLIVAR”
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
Cartagena

Referencia: “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA”

2 archivos adjuntos

BN1 142 2025 Remisión documentación – Factura Acta No. 3.pdf
315K

ACTA 3.rar
8562K
