
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 128 DEL 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRERA 11 DESDE LA CALLE 9 HASTA LA QUEBRADA VILLANUEVA EN EL CASCO ANTtGUO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"

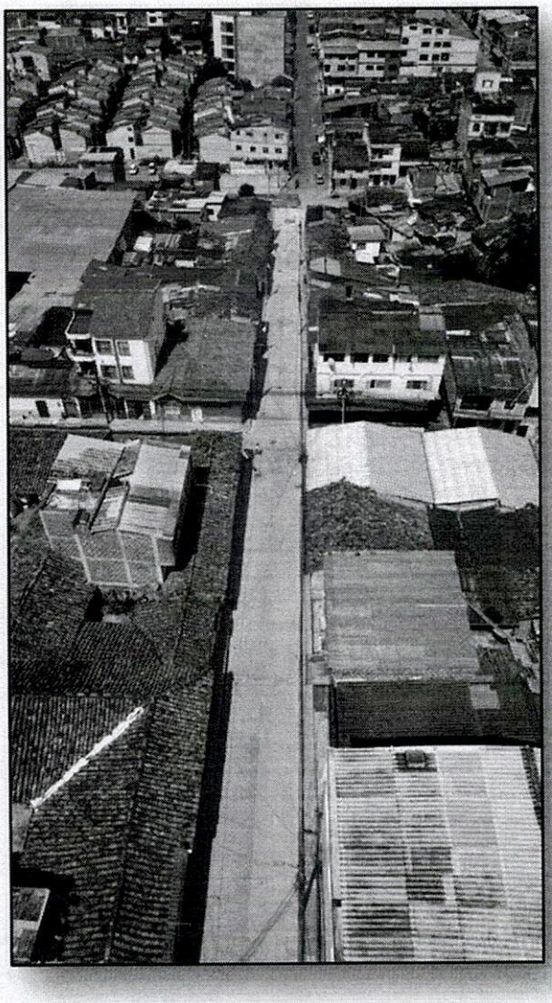

PERIODO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 22 DE DICIEMBRE DE 2025 – 02 DE FEBRERO DE 2026 A 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATISTA: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

1. INTRODUCCIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato "OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRERA 11 DESDE LA CALLE 9 HASTA LA QUEBRADA VILLANUEVA EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" se ubica en el casco urbano del Municipio de Piedecuesta, Santander en la Carrera 11 desde la Calle 9 hasta la Quebrada Villanueva en el casco antiguo, y está incluido en El PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - P.S.M.V.- PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER dentro de la descripción detallada de los programas, proyectos y actividades en el periodo de vigencia para los alcantarillados sanitario y pluvial, como complemento al colector construido sobre la Carrera 9 entre la Calle 10 y la Quebrada Villanueva, cuyo objetivo fue el de captar los caudales pluviales provenientes desde la Carrera 15 y que para su funcionamiento óptimo se recomendó la construcción del colector de la Carrera 11.

1.2 LOCALIZACIÓN

El sitio de estudio se encuentra en el casco antiguo del municipio de Piedecuesta, específicamente en la Carrera 11, desde la Calle 9 hasta la Quebrada Villanueva. Esta área es de acceso fácil a las principales vías de comunicación y servicios públicos, dentro del núcleo urbano tradicional del municipio. Las coordenadas exactas del sitio son 6°59'22.22"N y 73°2'52.91"O.



Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

1 TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA: Nº 128 DE 2025

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:				128 DE 04 DE ABRIL DE 2025			
OBJETO:				"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRERA 11 DESDE LA CALLE 9 HASTA LA QUEBRADA VILLANUEVA EN EL CASCO ANTtGUO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"			
VALOR INICIAL:				TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($365.381.889,00) MCTE			
VALOR ADICIONAL:				N/A			
PLAZO INICIAL:				UN (01) MES Y DIEZ (10) DÍAS			
PLAZO ADICIONAL:				N/A			
CONTRATISTA:				MPT ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.792.233-1 R/L CARLOS AUGUSTO PARRA SÁNCHEZ C.C. 91.157.998 DE FLORIDABLANCA			
SUPERVISOR:				LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTÍNEZ JEFE OFICINA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Acta de designación de 25/08/25			
INTERVENTOR CONTRATO:				N/A			
ANTICIPO (XXX%)				N/A			
FECHA DE INICIACIÓN:				30-04-2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº 01	Nº	Nº	22/12/2025	día mes año	día mes año	día mes año
AMPLIACIÓN AL ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº 01	Nº	Nº	22-01-2026	día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº 01	Nº	Nº	02/02/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN:				29-12-2025			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				19-03-2026			
MUNICIPIO:				PIEDECUESTA (S)			
OFICINA GESTORA:				PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			

COPIA CONTROLADA

VALOR A COBRAR	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($16.573.722,48) MCTE
PERIODO DE COBRO	30 DE NOVIEMBRE A 22 DE DICIEMBRE 2025 – 02 DE FEBRERO DE 2026 A 28 DE FEBRERO DE 2026
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	89.82%

1.2 RELACIÓN DE ACTAS


ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO	30-07-2025	Ninguna
PAGO PARCIAL No. 01	22-08-2025	$122.099.665,85 (37.13%)
MODIFICATORIA No. 01	05-12-2025	No se afecta el valor del contrato
PAGO PARCIAL No. 02	29-11-2025	$156.694.023,10 (47.65%)

1.3 PRESUPUESTO CONTRACTUAL


Piedecuestana DE SERVICIOS PÚBLICOS e.s.p.	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRERA 11 DESDE LA CALLE 9 HASTA LA QUEBRADA VILLANUEVA EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA							
PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA DE OBRA								
DESCRIPCION	CANTIDAD	CATEGORIA	ASIGNACION BASICA	FACTRO MULTIPLICADO	COSTO MENSUAL UNITARIO	TIEMPO	DEDICACION	VALOR
TECNICO ADMINISTRATIVO								
Director de interventoria	1	Profesional Especializado	$ 4.830.000	2,40	$ 11.592.000,00	8,00	40%	$ 37.094.400,00
Residente de interventoria	1	Profesional	$ 3.500.000	2,40	$ 8.400.000,00	6,00	100%	$ 50.400.000,00
Especialista hidraulico	1	Profesional Especializado	$ 4.500.000	2,40	$ 10.800.000,00	8,00	30%	$ 25.920.000,00
Ingeniero Ambiental	1	Profesional	$ 2.500.000	2,40	$ 6.000.000,00	8,00	30%	$ 14.400.000,00
Comision topografica	1	Tecnologo	$ 2.500.000	2,40	$ 6.000.000,00	8,00	100%	$ 48.000.000,00
Conductor	1	administrativo	$ 1.300.000	2,40	$ 3.120.000,00	8,00	100%	$ 24.960.000,00
							SUBTOTAL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO	$ 200.774.400,00
OTROS GASTOS								
Camioneta 2000 cc	1		$ 4.000.000	1,50	$ 6.000.000	6,00	100%	$ 36.000.000,00
Oficina (papeleria, equio	1		$ 1.000.000	1,50	$ 1.500.000	8,00	100%	$ 12.000.000,00
Impresión de planos e informes	1		$ 457.000	1,50	$ 685.500	8,00		$ 5.484.000,00
Ensayo proctor modificado	2		$ 95.000	1,50	$ 285.000	1,00		$ 285.000,00
Ensayo Densidad de campo	50		$ 55.000	1,50	$ 4.125.000	1,00		$ 4.125.000,00
Ensayo de Resistencia a la compresion en concreto	50		$ 8.534	1,50	$ 640.050	1,00		$ 640.050,00
							SUBTOTAL OTROS GASTOS INTERVENTORIA	$ 58.534.050,00
							COSTO TOTAL INTERVENTORIA DE OBRA AJUSTADO	$ 259.311.378,99
							IVA 19%	$ 49.269.162,01
							TOTAL	$ 308.580.541,00
TECNICO ADMINISTRATIVO								
Residente de interventoria	1	Profesional	$ 3.500.000	2,40	$ 8.400.000,00	2,00	100%	$ 16.800.000,00
Especialista hidraulico	1	Profesional Especializado	$ 4.500.000	2,40	$ 10.800.000,00	2,00	30%	$ 6.480.000,00
Asistente Administrativo	1	Administrativo	$ 2.500.000	2,40	$ 6.000.000,00	2,00	100%	$ 12.000.000,00
							SUBTOTAL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO	$ 35.280.000,00
OTROS GASTOS								
Camioneta 2000 cc	1		$ 4.000.000	1,50	$ 6.000.000,00	2,00	100%	$ 12.000.000,00
Impresión de planos e informes	1		$ 299.545	1,50	$ 449.318,21	1,00	100%	$ 449.318,21
							SUBTOTAL OTROS GASTOS INTERVENTORIA	$ 12.449.318,21
							COSTO TOTAL INTERVENTORIA DE OBRA AJUSTADO	$ 47.732.225,21
							IVA 19%	$ 9.069.122,79
							TOTAL	$ 56.801.348,00
							TOTAL	$ 365.381.889,00


Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

1.4 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:

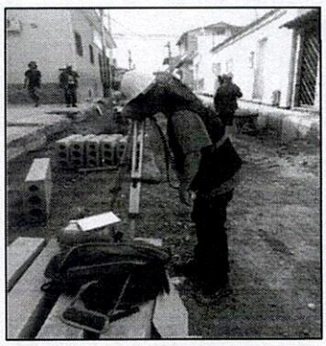



Localización y replanteo

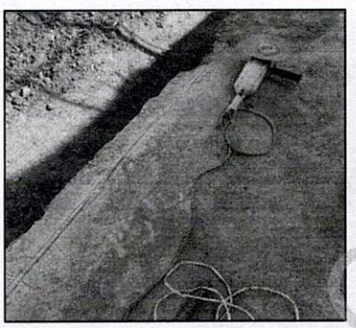

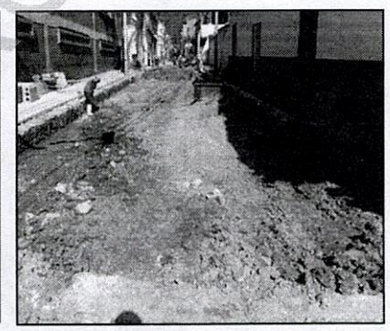


Corte y demolición de andén y pavimento



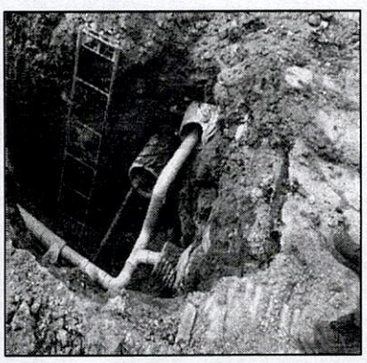

Retiro de tubería y manejo de aguas sanitaria




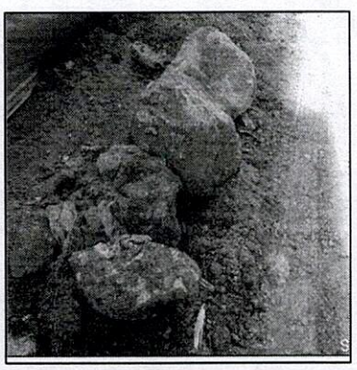




Excavación en material granular y roca

COPIA CONTROLADA



Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

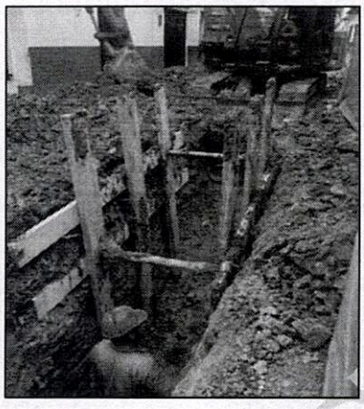Entibado.




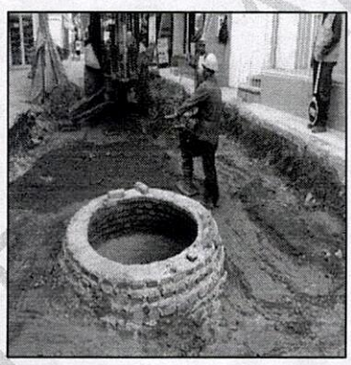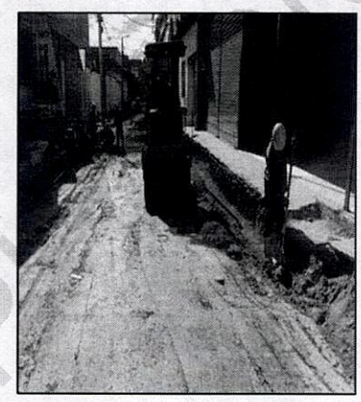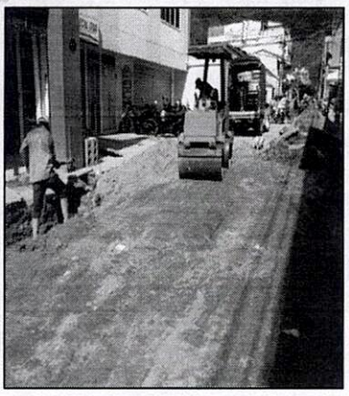


Relleno con material de excavación compactado

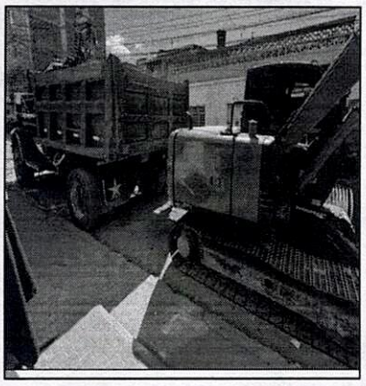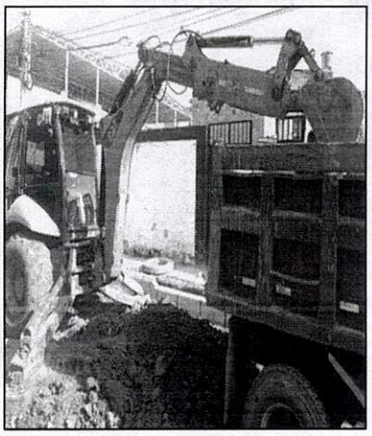



Cargue, retiro y disposición de material sobrante

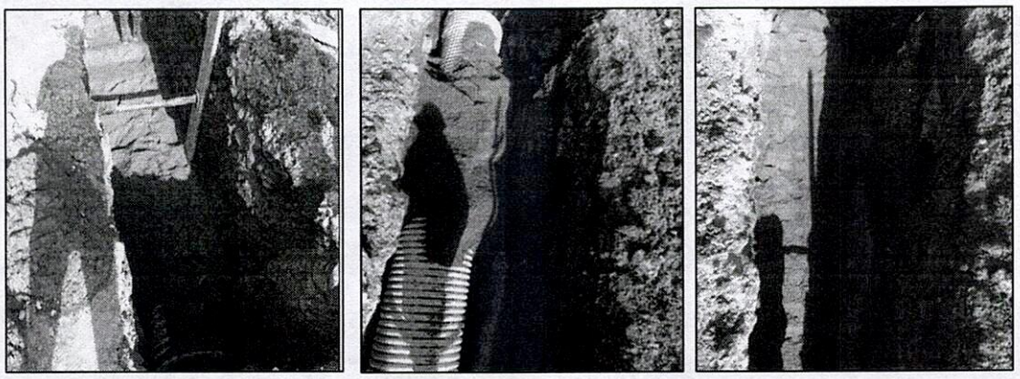
Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co



Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para cimentación de tubería

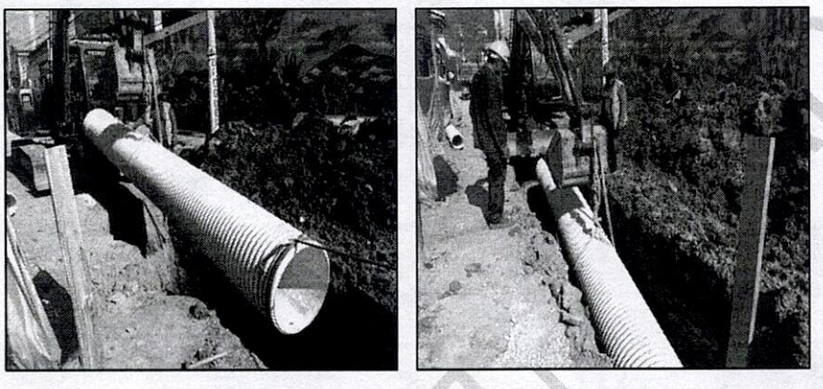

Suministro e instalación tubería alcantarillado.

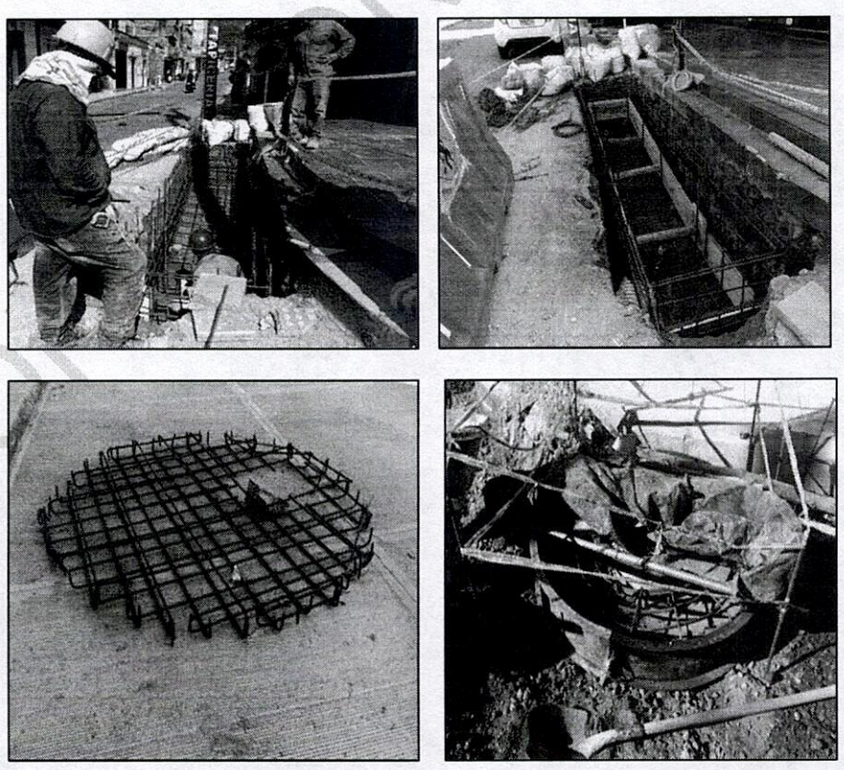



Suministro y colocación de acero de refuerzo
fy=4200Kg/cm2.

COPIA CONTROLADA

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co


Suministro y colocación de concreto de 4000 Psi.

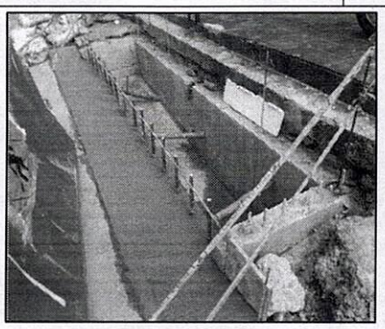

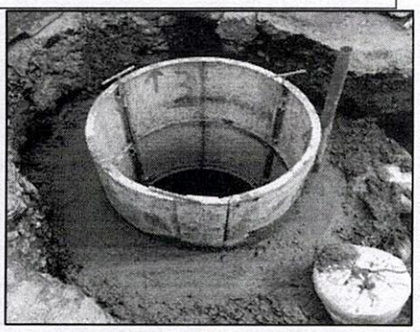


Mampostería para pozos.




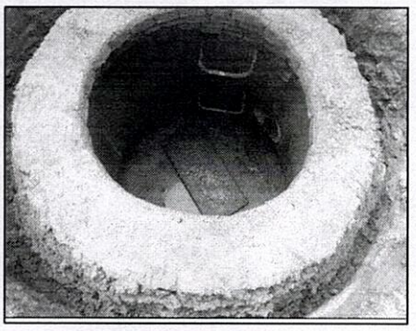




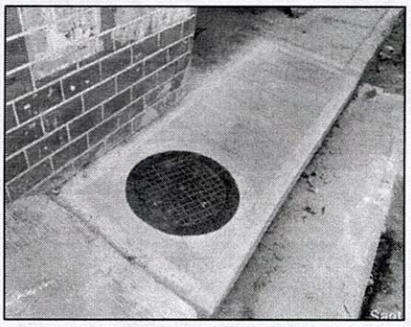


Aros y contra aros

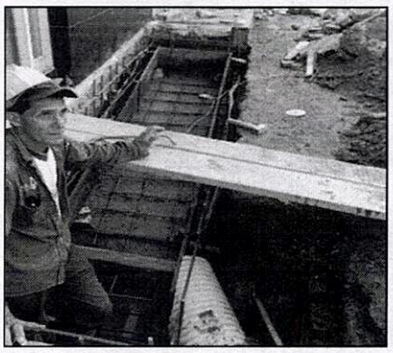

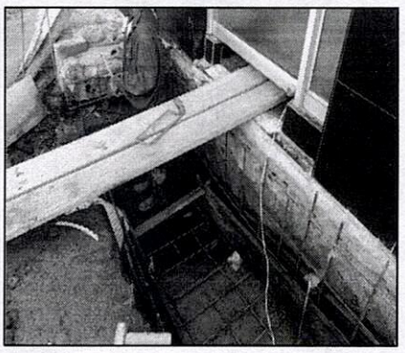


Suministro e instalación de cinta PVC H.15cm.

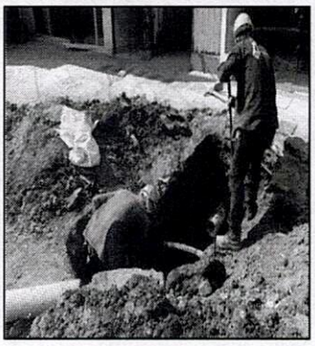






Conexión domiciliaria longitud menor o igual a 6,00m.

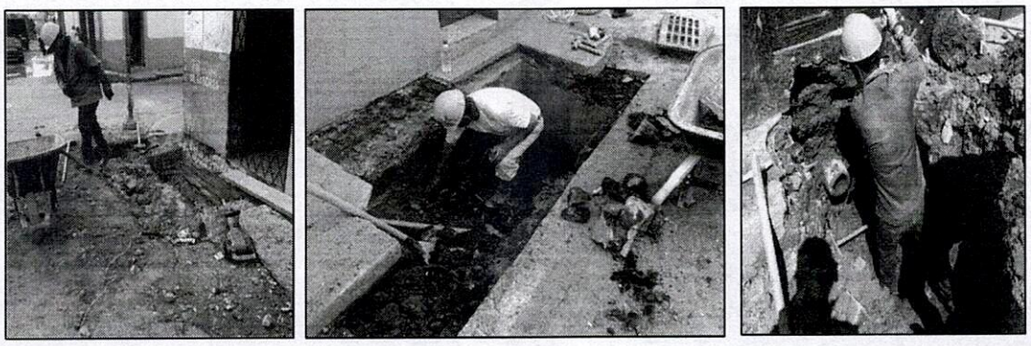

Demolición de estructuras en concreto y mampostería.

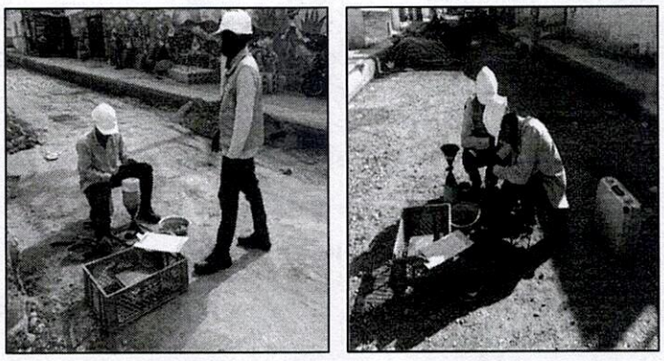

Toma de ensayos.

1.5 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

- Control del cumplimiento de la programación de los trabajos.
- Verificación de cumplimiento por parte del contratista de la afiliación del personal de obra al Sistema General de Seguridad Social.
- Actualizar diariamente la bitácora
- Cumplimiento del cronograma.

1.6 RELACIÓN PERSONAL INTERVENTORÍA:

CARGO	NOMBRE	AFILIACIÓN
Director de interventoría	Roberto Carlos Molina	Si
Residente de Interventoría	Yefferson Alexander Ortega	Si
Ingeniero Ambiental	Andrea Carolina Delgado	Si
Especialista Hidráulico	Andrea Carolina Delgado	Si
Topógrafo	Andrés Felipe Cardozo Martínez	Si
Conductor	Álvaro Martínez Casadiego	Si
Profesional adicional	Erwin Andrés Suárez Martínez	Si

1.7 OTROS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA:

DESCRIPCIÓN	CANT
Camioneta 2000cc.	1
Oficina (papelería, equipos, etc).	1

COPIA

Impresión de planos e informes.	1
Ensayo Próctor modificado	3
Ensayo de densidad de campo	30
Ensayo de resistencia a la compresión en concreto	20

1.8 ACTIVIDADES AMBIENTALES:

- Verificación al cumplimiento de las normas básicas de seguridad y ambientales que sean aplicables.
- Verificación de los certificados de residuos y desechos que el proyecto de obra genera, garantizando su disposición final.
- Garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos.
- Ejecutar el objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas correspondientes, cumpliendo con cada una de las exigencias técnicas descritas en la Ficha Técnica, el Pliego de condiciones y la propuesta presentada.
- Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades a realizar durante la ejecución del contrato.

1.9 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

- Cerramiento en lona verde para la seguridad de los peatones o vehículos.
- Control al uso adecuado de los EPP.

1.10 CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

1.10.1 PÓLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATO

AMPARO	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	4246529	04-04-2025	04-04-2026
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	4246529	04-04-2025	04-12-2028
RESPONSABILIDAD CIVIL	013001010228	04-04-2025	04-04-2026

1.10.2 PÓLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE INICIO

AMPARO	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	4246529	30-04-2025	30-04-2026
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	4246529	30-04-2025	30/12/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL	013001010228	30-04-2025	30-04-2026

1.10.3 PÓLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE SUSPENSIÓN, ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN Y ACTA DE RE INICIO


AMPARO	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	4246529	30-04-2025	10-06-2026
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	4246529	30-04-2025	09/02/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL	013001010228	30-04-2025	10-06-2026

1.10.4 PÓLIZAS ACTUALIZADAS PRÓRROGA No. 01

AMPARO	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	4246529	30-04-2025	19-07-2026
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	4246529	30-04-2025	29/03/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL	013001010228	30-04-2025	19-07-2026

1.11 AVANCE DE OBRA

MESES	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
TOTAL MENSUAL PROGRAMADO	75,68%	86,03%	86,03%	95,82%
TOTAL MENSUAL EJECUTADO	84,78%	88,93%	88,93%	89,82%

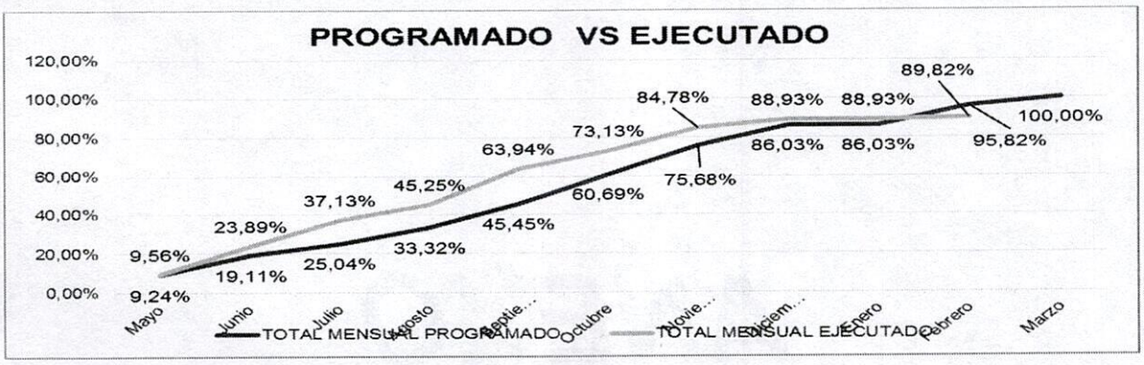

1.12 OBSERVACIONES

En el presente informe se verifica un avance físico de obra ejecutado del 11,31 %. No obstante, para dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Quinta del Contrato **"FORMA DE PAGO. La empresa Piedecuestana de Servicios Públicos pagará al contratista el valor del presente contrato así: a) Mediante actas parciales de avance, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, previa presentación de las respectivas actas y del informe de obra con la respectiva aprobación de la supervisión. Así mismo, el contratista, deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, con la especificación de costos unitarios y cantidades totales, constancia de pago de aportes a seguridad social y parafiscales con certificación de cumplimento expedida por el supervisor y los demás documentos necesarios para el pago de la respectiva cuenta de cobro b) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se efectuará con el acta de liquidación del contrato previa entrega de la totalidad de las cantidades contratadas."** en el Acta de Pago No. 03 y su anexo se presenta un avance equivalente al 5,04 %, para un total acumulado de 89,82%, dando así cumplimiento a la cláusula referida.

LEIDY JOHANA BUITRAGO MARTÍNEZ
JEFE OFICINA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUPERVISORA

Proyectó: Gustavo A. Gómez Acevedo. Profesional Universitario – Supervisor de Obras

ELABORÓ	FECHA	REVISÓ	FECHA	APROBÓ	FECHA
Profesional Universitario Supervisor de Obra	28/04/2025	Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	28/04/2025	Jefe de Oficina Planeación Institucional	28/04/2025

ANEXO

Acta parcial No. 03

Piedecuestana

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03

CONTRATO DE INTERVNENTORIA No. 128-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRERA 11 DESDE LA CALLE 9 HASTA LA QUEBRADA VILLANUEVA EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Entidad contratante	EMPRESA MUNICIPAL DE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS		
Contratista	MPT ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.792.233-1 R/L CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ C.C. 91.157.998 de Floridablanca	**% EJECUTADO**	5,04%

CONDICIONES INICIALES

DESCRIPCION	CANTIDAD	CATEGORIA	ASIGNACION BASICA	FACTRO MULTIPLICADO	COSTO MENSUAL UNITARIO	TIEMPO	DEDICACION	VALOR
TECNICO ADMINISTRATIVO								
Director de interventoria	1	Profesional Especializado	$ 4.830.000	2,40	$ 11.592.000,00	8,00	40%	$ 37.094.400,00
Residente de interventoria	1	Profesional	$ 3.500.000	2,40	$ 8.400.000,00	6,00	100%	$ 50.400.000,00
Especialista hidraulico	1	Profesional Especializado	$ 4.500.000	2,40	$ 10.800.000,00	8,00	30%	$ 25.920.000,00
Ingeniero Ambiental	1	Profesional	$ 2.500.000	2,40	$ 6.000.000,00	8,00	30%	$ 14.400.000,00
Comision topografica	1	Tecnologo	$ 2.500.000	2,40	$ 6.000.000,00	8,00	100%	$ 48.000.000,00
Conductor	1	administrativo	$ 1.300.000	2,40	$ 3.120.000,00	8,00	100%	$ 24.960.000,00
							SUBTOTAL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO	**$ 200.774.400,00**
OTROS GASTOS								
Camioneta 2000 cc	1		$ 4.000.000	1,50	$ 6.000.000	6,00	100%	$ 36.000.000,00
Oficina (papeleria, equio	1		$ 1.000.000	1,50	$ 1.500.000	8,00	100%	$ 12.000.000,00
Impresión de planos e informes	1		$ 457.000	1,50	$ 685.500	8,00		$ 5.484.000,00
Ensayo proctor modificado	2		$ 95.000	1,50	$ 285.000	1,00		$ 285.000,00
Ensayo Densidad de campo	50		$ 55.000	1,50	$ 4.125.000	1,00		$ 4.125.000,00
Ensayo de Resistencia a la compresion en concreto	50		$ 8.534	1,50	$ 640.050	1,00		$ 640.050,00
							SUBTOTAL OTROS GASTOS INTERVENTORIA	**$ 58.534.050,00**
							COSTO TOTAL INTERVENTORIA DE OBRA AJUSTADO	**$ 259.311.378,99**
							IVA 19%	**$ 49.269.162,01**
							TOTAL	**$ 308.580.541,00**
TECNICO ADMINISTRATIVO								
Residente de interventoria	1	Profesional	$ 3.500.000	2,40	$ 8.400.000,00	2,00	100%	$ 16.800.000,00
Especialista hidraulico	1	Profesional Especializado	$ 4.500.000	2,40	$ 10.800.000,00	2,00	30%	$ 6.480.000,00
Asistente Administrativo	1	Administrativo	$ 2.500.000	2,40	$ 6.000.000,00	2,00	100%	$ 12.000.000,00
							SUBTOTAL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO	**$ 35.280.000,00**
OTROS GASTOS								
Camioneta 2000 cc	1		$ 4.000.000	1,50	$ 6.000.000,00	2,00	100%	$ 12.000.000,00
Impresión de planos e informes	1		$ 299.545	1,50	$ 449.318,21	1,00	100%	$ 449.318,21
							SUBTOTAL OTROS GASTOS INTERVENTORIA	**$ 12.449.318,21**
							COSTO TOTAL INTERVENTORIA DE OBRA AJUSTADO	**$ 47.732.225,21**
							IVA 19%	**$ 9.069.122,79**
							TOTAL	**$ 56.801.348,00**
							TOTAL	**$ 365.381.889,00**

OBSERVACIONES: EN FUNCION A LA CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO, SE ESTABLE LO SIGUIENTE:

La Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos determinó realizar el pago de la ejecución del objeto a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste. El pago del valor del contrato se hará de la siguiente forma: A. Mediante actasparciales de avance de obra e interventoria, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrab de interventoria, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes, aprobado por el supervisor de la empresa y de conformidad con la siguiente formulación: VP = An *VC — 10% (An*VC) VP = Valor a pagar An = Avance de las obras ejecutadas, expresado en porcentaje VC = Valor del contrato. A. Último pago correspondienteal 10% del valor del contrato de interventoria que se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: Aprobación de las pólizas. Liquidación del contrab de obra y acta determinación del contrato de interventoria.

Por lo cual se establece lo siguiente para el siguiente mes:
VP= VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA
VP= An*VC - 10% (An*VC)

An= 5,04%
VC= $ 365.381.889,00

VP= (5,04%*$ 365.381.889,00)- 10% (5,04%*$ 365.381.889,00)
VP= $ 16.573.722,48

Dado lo anterior, se concluye que el valor a pagar en la presente acta (VP) para la presente acta PARCIAL No 3 es de **$ 16.573.722,48 DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (M/CTE)**
