| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| | Ejecución de Proyecto | 2 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR**

**ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

**SEMANA N.** 23 **DEL** 21/07/2025 **AL** 27/07/2025

**CONTRATO No** CIN-1707-2024 (Número de Contrato)

## 1. ANTECEDENTES

**OBJETO DEL CONTRATO**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO** CON-1698-2024

(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

**CONTRATISTA** CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.901.435-5 (Escriba el NIT del contratista)

**INTERVENTOR** GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830.010.109-8 (Escriba el NIT del Interventor)

**APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION FDLCB** CESAR CASTRO MELO

(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU )

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 3 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2025 (Año)

**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** 2 (Día) **DE** 7 (Mes) **DE** 2025 (Año)

| Contrato de Obra | | Contrato de Interventoría | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | $ 1.536.896.364,00 | Valor Inicial | $ 153.689.636,00 |
| Valor Actualizado | $ 1.536.896.364,00 | Valor Actualizado | $ 153.689.636,00 |
| No. empleos Directos generados | 15 | No. empleos Directos generados | 6 |
| No. empleos Indirectos generados | | No. empleos Indirectos generados | |

## 2. AVANCES DEL PROYECTO

| | PROGRAMADO | | | EJECUTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CONTRATO** | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | 6,34% | 68,42% | Trabajo Ejecutado | 4,00% | 70,13% |
| Valor del Trabajo Programado | $ 135.058.393,00 | $ 1.458.025.075,00 | Valor del Trabajo Ejecutado | $ 85.295.351,00 | $ 1.494.531.225,00 |
| **ETAPA/FASE DIAGNOSTICO** | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | 0,00% | 100,00% | Trabajo Ejecutado | 0,00% | 100,00% |
| Valor del Trabajo Programado | $ - | $ - | Valor del Trabajo Ejecutado | $ - | $ - |
| **ETAPA/FASE MITIGACIÓN** | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | 6,34% | 62,08% | Trabajo Ejecutado | 4,00% | 70,13% |
| Valor del Trabajo Programado | $ 135.058.393,00 | $ 1.458.025.075,00 | Valor del Trabajo Ejecutado | $ 85.295.351,00 | $ 1.494.531.225,00 |

**RESUMEN CRONOGRAMA**

| FRENTE O COMPONENTE | % PROGRAM (FÍSICO) | % EJECUTADO (FÍSICO) | % VARIACIÓN | ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA |
|---|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| | Ejecución de Proyecto | 2 |

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR**

**ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

**SEMANA N.** 23 **DEL** 21/07/2025 **AL** 27/07/2025

**CONTRATO No** **CIN-1707-2024**
(Numero de Contrato)

**METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA**

| DESCRIPCIÓN META FISICA | UNIDAD | TOTAL PROYECTO | PROGRAMADO | | EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMANAL | ACUMULADO | SEMANAL | ACUMULADO |
| N.A. | N.A. | N.A. | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

**COMPONENTE TÉCNICO**

• Se hace acompañamiento en actividades perforación en el ultimo tercio de la pantalla del talud (profundidad de 6 m)
• Se hizo acompañamiento en el proceso de construcción del muro en gavión, verificacondo la correcta instalación de los tensores de la caja y asegurando que no se tenga sobretamaño en el material rocoso.
• Se tienen a la fecha un total de 1220 m de perforación, de los cuales 100 m corresponden a lo adicionado para abarcar el talud restante, el restante 1120 corresponden a la meta fisica inicial.

**COMPONENTE SOCIAL**

**PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**

• Visita de inspección aleatoria a la oficina de atención y sus elementos, sin novedad alguna (23-07-25).

**PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD**

**Reuniones extraordinarias:**

• Asistencia y participación en la reunión de seguimiento de las afectaciones identificadas en la TV 59, entre contratista, interventoría y comunidad (23-07-25).

**COMITÉS**

• Asistencia y participación en el comité de seguimiento al proyecto (23-07-25).

**REPORTES**

• Informe semanal: Elaboración del informe semanal 23.

**CORRESPONDENCIA**

Correspondencia recibida:
• CRB2024 -110-2025 Respuesta a comunicado GMC-139-167-2025 Solicitud actualización cronograma y presupuesto social (24-07-25).
• CRB2024 -112-2025 Dando respuesta al oficio GMC-139-174-2025 (25-07-25).

Correspondencia enviada:
• GMC-139-167-2025 - Solicitud actualización cronograma y presupuesto social (21-07-25).
• GMC-139-174-2025 - Rta CRB2024 -110-2025 - Solicitud actualización cronograma y presupuesto social (24-07-25).

**COMPONENTE SST**

Desde el componente SST se realizan inspecciones permanentes al frente de trabajo, por parte del profesional SST de interventoría donde se verifica lo siguientes:

• La instalación de los puntos de anclaje y las líneas de vida para el desarrollo de los trabajos en alturas, en suspensión.
• Se verificó que los equipos de alturas estuvieran en buenas condiciones físicas y que cumplieran con los documentos y certificaciones para desarrollas las tareas de perforación en suspensión.
• Se realiza seguimiento que el contratista realizara la charla pre operacional, se diligenciaran los Análisis de trabajo seguro en alturas y se firmaran los permisos de trabajo seguro en alturas.
• Se realiza seguimiento a la entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores de manera oportuna.
• Se verifica por parte de interventoría que el contratista tenga en obra la unidad sanitaria para el servicio de los trabajadores
• Se inspeccionó en obra la disponibilidad del punto de atención de emergencias que consta de una camilla, un botiquín y un extintor.
• Se inspecciona en obra que las máquinas de perforación cuenten con el extintor y que este recargado con fecha vigente.
• Se realiza seguimiento a la señalización de prevención instalada en obra para evitar el ingreso de personal ajeno a la obra y evitar accidentes.
• Se verifico que el área de trabajo esté debidamente aislada cuando se desarrollan las actividades
• Se acompaña al contratista en la inspección de herramientas de mano con la que se desarrollan las actividades por parte de los trabajadores verificando que estén en buenas condiciones.

## 4. PRECIOS NO PREVISTOS

N.A.

## 5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

N.A.

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| | Ejecución de Proyecto | 2 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR**

**ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

**SEMANA N.** 23 **DEL** 21/07/2025 **AL** 27/07/2025


**CONTRATO No** **CIN-1707-2024**
(Numero de Contrato)

## 6. REGISTRO FOTOGRAFICO




Descripción Foto 1.

Avance construcción muro en gavión.

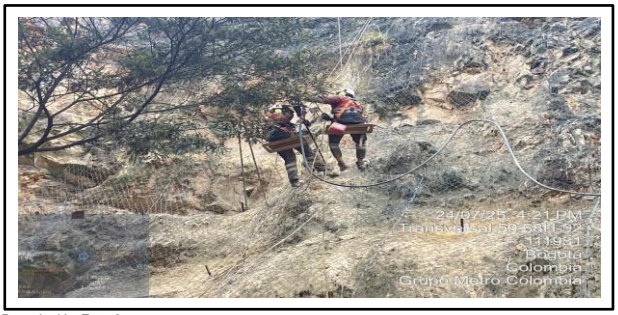


Descripción Foto 2.

Actividades de perforación (profundidad 4 m) tramo adicional




Descripción Foto 3.

Visita de inspección aleatoria a la oficina de atención y sus elementos, sin novedad alguna (23-07-25).




Descripción Foto 4.

Asistencia y participación en la reunión de seguimiento de las afectaciones identificadas en la TV 59, entre contratista, interventoría y comunidad (23-07-25).

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintiocho (Día en letras) ( 28 ) (Día en números) días del mes de julio (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S
