FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	Ejecución de Proyecto	2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 5 **DEL** 3/03/2025 **AL** 9/03/2025

CONTRATO No CIN-1707-2024 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CON-1698-2024

(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.901.435-5 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830.010.109-8 (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION FDLCB CESAR CASTRO MELO

(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 3 (Dia) **DE** 2 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 3 (Dia) **DE** 6 (Mes) **DE** 2025 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 1.536.896.364,00	Valor Inicial	$ 153.689.636,00
Valor Actualizado	$ 1.536.896.364,00	Valor Actualizado	$ 153.689.636,00
No. empleos Directos generados	15	No. empleos Directos generados	6
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO		EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	12,50%	29,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor del Trabajo Programado	$ 332.994.212,00	$ 448.261.439,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -
ETAPA/FASE DIAGNOSTICO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	100,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -
ETAPA/FASE MITIGACIÓN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	11,55%	19,05%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor del Trabajo Programado	$ 332.994.212,00	$ 448.261.439,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	Ejecución de Proyecto	2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 5 **DEL** 3/03/2025 **AL** 9/03/2025

CONTRATO No **CIN-1707-2024**
(Número de Contrato)

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
N.A.	N.A.	N.A.				

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO

• Se remitió invitación para el comité de obra de fecha marzo 05 de 2025 en el punto critico de Bonanza Sur
• Se remitió el 1er llamado de atención por el NO inicio de las actividades de obra en el punto critico a mitigar.
• Se realiza de nuevo la solicitud de entrega del cronograma, PMT, APU's contractuales, etc.
• Se radica informe semanal No. 4.
• Se radica informe por presuntos incumplimientos de parte del Contratista de obra.
• Se emiten observaciones al cronograma de obra V.1.

COMPONENTE SOCIAL

• Asistencia y participación en el comité de obra, entre la Entidad, Contratista e Interventoría.
• Elaboración y radicación de los siguientes oficios enviados al contratista, así:
  1. GMC-139-026-2025 - Reiteración entrega PGS (04-03-25).
  2. GMC-139-035-2025 - Respuesta comunicado CRB2024-012-2025 Entrega de Plan de Gestion Social (07-03-25).

COMPONENTE SST

• Asistencia y participación en el comité de obra de fecha marzo 05 de 2025.
• Se da aprobación a equipos por parte del contratista de obra.
• Se hace la 3er solicitud de documentos de ingreso para el personal minimo que ya se encuentra aprobado por parte de Interventoría.
• Se hace revisión del Plan Seguridad y salud en el trabajo del Contrato No. 1698-2024.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

N.A.

FORMATO			
Informe semanal de interventoría			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
	Ejecución de Proyecto	2	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 5 **DEL** 3/03/2025 **AL** 9/03/2025

CONTRATO No **CIN-1707-2024**
(Número de Contrato)

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

N.A.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Recorrido y comité de seguimiento No. 4 al Contrato obra No. 1698-2024




Descripción Foto 2.

Recorrido y comité de seguimiento No. 4 al Contrato obra No. 1698-2024



Descripción Foto 1.

Recorrido y comité de seguimiento No. 4 al Contrato obra No. 1698-2024

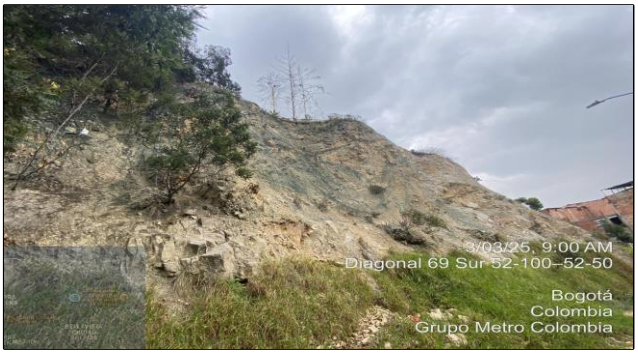

Descripción Foto 2.

Recorrido y comité de seguimiento No. 4 al Contrato obra No. 1698-2024

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Diez (Día en letras) (10) (Día en números) días del mes de marzo (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S
