FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	Ejecución de Proyecto	2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 9 **DEL** 31/03/2025 **AL** 6/04/2025

CONTRATO No CIN-1707-2024 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CON-1698-2024 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO RCA BOLIVAR 2024 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.901.435-5 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830.010.109-8 (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION FDLCB CESAR CASTRO MELO (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 3 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 3 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2025 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 1.536.896.364,00	Valor Inicial	$ 153.689.636,00
Valor Actualizado	$ 1.536.896.364,00	Valor Actualizado	$ 153.689.636,00
No. empleos Directos generados	15	No. empleos Directos generados	6
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	1,17%	4,61%	0,92%	6,54%
Valor del Trabajo Programado	$ 17.995.436,00	$ 70.940.008,00	$ 14.116.103,00	$ 100.508.108,00
ETAPA/FASE DIAGNOSTICO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ -	$ -	$ -
ETAPA/FASE MITIGACIÓN	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,90%	3,44%	0,92%	6,54%
Valor del Trabajo Programado	$ 17.995.436,00	$ 70.940.008,00	$ 14.116.103,00	$ 100.508.108,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 9 **DEL** 31/03/2025 **AL** 6/04/2025

CONTRATO No **CIN-1707-2024**
(Número de Contrato)

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
N.A.	N.A.	N.A.				

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO

• Se tiene aprobación por parte de la SDM al PMT a implementar por parte del Contratista de obra.
• Se realizan 6 perforaciones adicionales, para un total de 40 perforaciones.
• 204 m perforados en total, parte izquierda del talud.
• Se esta a la espera por parte de la entidad sobre el Otro Si modificatorio para el Contrato de obra, incluyendo el punto Bonanza Sur y la inclusión de los NP's.

COMPONENTE SOCIAL

Programa de Divulgación e Información a la comunidad

• **Reunión con entidad pública:** Asistencia y participación en la reunión con el profesional representante del Consejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático Local, para la presentación del proyecto por parte del contratista (02-04-25).
• **Valla y aviso:** Revisión y aprobación de los diseños elaborados por el contratista para la valla del proyecto y el aviso de la oficina de atención a la comunidad (31-03-25), los cuales fueron enviados por correo electrónico a la Entidad, para concepto.

Programa de Atención a la Ciudadanía

• Se realiza seguimiento a la PQRSD No. 1 (02-04-25).

Programa de acompañamiento a actividades técnicas

• **Actas de vecindad de inicio:** Revisión documental y aprobación de las actas de vecindad de inicio del proyecto (03-04-25).

Programa de contratación y capacitación

• Elaboración y proyección del oficio GMC-139-067-2025 - Respuesta CRB2024 -043-2025 porcentaje personal (01-04-25).

Reportes

• Revisión y aprobación de los informes mensuales sociales 1 y 2 del contratista.

Comités

• Asistencia y participación en el comité de obra de seguimiento semanal al proyecto (02-04-25).

COMPONENTE SST

Desde el componente SST se realizan inspecciones permanentes al frente de trabajo, por parte del profesional SST de interventoría donde se verifica lo siguientes:

• La instalación de los puntos de anclaje y las líneas de vida para el desarrollo de los trabajos en alturas, en suspensión.
• Se verificó que los equipos de alturas estuvieran en buenas condiciones físicas y que cumplieran con los documentos y certificaciones para desarrollas las tareas de perforación en suspensión.
• Se realiza seguimiento que el contratista realizara la charla pre operacional, se diligenciaran los Análisis de trabajo seguro en alturas y se firmaran los permisos de trabajo seguro en alturas.
• Se realiza seguimiento a la entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores de manera oportuna.
• Se verifica por parte de interventoría que el contratista tenga en obra la unidad sanitaria para el servicio de los trabajadores
• Se inspeccionó en obra la disponibilidad del punto de atención de emergencias que consta de una camilla, un botiquín y un extintor.
• Se inspecciona en obra que las máquinas de perforación cuenten con el extintor y que este recargado con fecha vigente.
• Se realiza seguimiento a la señalización de prevención instalada en obra para evitar el ingreso de personal ajeno a la obra y evitar accidentes.
• Se verifico que el área de trabajo esté debidamente aislada cuando se desarrollan las actividades
• Se acompaña al contratista en la inspección de herramientas de mano con la que se desarrollan las actividades por parte de los trabajadores verificando que estén en buenas condiciones.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	Ejecución de Proyecto	2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 9 **DEL** 31/03/2025 **AL** 6/04/2025

CONTRATO No **CIN-1707-2024**
(Número de Contrato)


4. PRECIOS NO PREVISTOS

N.A.

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.


N.A.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

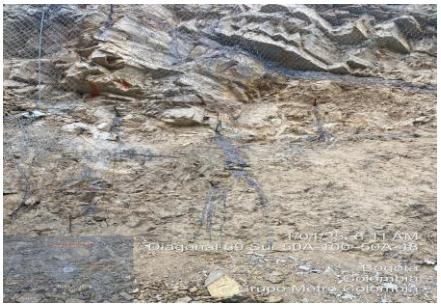

Descripción Foto 1.

Perforación e inyección pernos parte inferior talud.

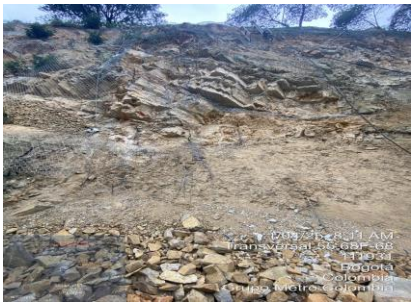

Descripción Foto 2.

Perforación e inyección pernos parte inferior talud.



Descripción Foto 3.

Perforación e inyección pernos parte inferior talud.

Descripción Foto 4.

N/A

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Siete (Día en letras) (7) (Día en números) días del mes de abril (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S
